INFORME ANUAL 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 1.1

aysa

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1

1 Obras Ejecutadas

TOMO 1.2

2 Mejora y Mantenimiento de Redes

3 Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos

4 Elementos Principales de la Red – Inventario

5 Certificación de Normas

6 Diagnósticos y Estudios

7 Estudios Ambientales

8 Gestión de Laboratorio

9 Desarrollo de la Comunidad

10 Plan de Prevención y Emergencias (PPE)

TOMO 2

11 Cobertura del Servicio de Agua Potable

12 Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable

13 Cartografía Expansión Agua Potable

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3

14 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales

15 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento

16 Instalaciones faltantes en la Red de Desagües Cloacales

17 Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

TOMO 4

18 Cartografía Agua Potable – Rehabilitación y Renovación

TOMO 5

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES (Planos Unificados)

19 - Rehabilitación Hidráulica.

20 - Rehabilitación Estructural.

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6

TOMO 6:

21 Aspectos Comerciales

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

21.2 Aspectos vinculados con la medición

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

21.4 Aspectos vinculados con la recaudación

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

21.6 Información adicional

22 Aspectos Económico-Financieros

22.1 a 22.5 Formatos vinculados a los Estados Contables de AySA (Tomo Apartado "Formatos Contables 2025").

22.6 Indicadores

22.7 Balance Económico Social

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1:

1 OBRAS EJECUTADAS

1.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.1.A	A) Obras en Plantas Potabilizadoras, Estaciones Elevadoras, Pozos de Agua, Rebombeos, y Plantas Tratamiento Agua Subterránea. Nuevas Áreas - Obras de Agua Potable.
	01.1.B	B) Ríos Subterráneos.
	01.1.C	C) Automatismo y Comunicaciones.
	01.1.D	D) Energía.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 02	01.1.01-IAT1-O-PRO-PS 01	PSS - Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 03	01.1.02-IAT1-O-PRO-PS 02	Pozos de Rebombeo de Agua Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 07	01.1.10-IAT1-O-A-PRO-PSM 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General San Martín.
PL IA N° 08	01.1.11-IAT1-O-A-PRO-PMB 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General Manuel Belgrano.
PL IA N° 09	01.1.13-IAT1-O-A-PRO-PJMR 01	Obras en el Establecimiento Juan Manuel de Rosas.
	01.1.21-IAT1-O-A-PRO-POI 01	Plantas Potabilizadoras de Osmosis Inversa (POI).
	01.1.23-IAT1-O-A-PRO-PII 02	Plantas Potabilizadoras de Intercambio Iónico (PII).
	01.1.24-IAT1-O-A-PRO-PAD 03	Plantas Potabilizadoras de Adsorción (PAD).
PL IA N° 11	01.1.30-IAT1-O-A-TRA-EE	Obras en Estaciones Elevadoras Paitoví, Centro, Caballito, Floresta, Devoto, Saavedra, Villa Adelina, Tres de Febrero, Morón, Matanza, Lanús y Quilmes.

1.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.2	Obras en Plantas Depuradoras, Estaciones de Bombeo, etc. Nuevas Areas - Obras de Saneamiento.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 19	01.2.20-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste.
	01.2.20A-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste II.
PL IA N° 20	01.2.21-IAT1-O-S-PRO-PDN 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Norte.
PL IA N° 21	01.2.22-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 01	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel.
	01.2.22A-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 02	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel II.
PL IA N° 21bis	01.2.23-IAT1-O-S-PRO-PDH 01	Obras en el Planta de Depuración Hurlingham.
PL IA N° 22	01.2.24-IAT1-O-S-PRO-PDBU 01	Obras en el Planta de Depuración Barrio Uno.
PL IA N° 22bis	01.2.25-IAT1-O-S-PRO-PDSC 01	Obras en el Planta de Depuración Santa Catalina.
	01.2.25.01-NA-IAT1-O-S-PRO-PDC 01	Obras en el Planta de Depuración Las Catonas.
	01.2.25.02-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFe 01	Obras en el Planta de Depuración Ferrari.
	01.2.25.03-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFV 01	Obras en el Planta de Depuración Florencio Varela.
	01.2.25.04-NA-IAT1-O-S-PRO-PDG 01	Obras en el Planta de Depuración Garín.
	01.2.25.05-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMN 01	Obras en el Planta de Depuración Merlo Norte.
	01.2.25.06-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMS 01	Obras en el Planta de Depuración Maquinista Savio.
	01.2.25.07-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPP 01	Obras en el Planta de Depuración Guernica (Pte. Perón).
	01.2.25.08-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPR 01	Obras en el Planta de Depuración Paso del Rey.
	01.2.25.09-NA-IAT1-O-S-PRO-PDBV 01	Obras en el Planta de Depuración Bella Vista.
	01.2.25.10-NA-IAT1-O-S-PRO-PDCH 01	Obras en el Planta de Depuración Champagnat
	01.2.25.11-NA-IAT1-O-S-PRO-PDESC 01	Obras en el Planta de Depuración Escobar
PL IA N° 14	01.2.26-IAT1-O-S-TRA-EB 01	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Wilde.
PL IA N° 15	01.2.27-IAT1-O-S-TRA-EB 02	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Boca-Barracas.
	01.2.28-IAT1-O-S-TRA-EB 03	Obras en Estaciones de Bombeo Centro, Norte y Sur.
	01.2.29-IAT1-O-S-TRA-EB 00	Obras en Planta Berazategui.
PL IA N° 13	01.2.30-IAT1-O-S-TRA-PLC 01	Obras en Grandes Conducciones Pluviocloacales.

1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 23	01.3.31-IAT1-O-X CONTRATO	Obras ejecutadas por vía contractual.
	01.3.33-IAT1-O-A (A+T)	Listado de Obras por convenio (A+T).
	01.3.34-IAT1-O-S (C+T)	Listado de Obras por convenio (C+T).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.2:

2 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 25	35-IAT1-O-A-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes de agua.
PL IA N° 26	36-IAT1-O-A-MyM 02	Redes de agua. Elementos de maniobra intervenidos.
PL IA N° 27	37-IAT1-O-A-MyM 03	Medidores colocados y/o intervenidos.
PL IA N° 28	38-IAT1-O-A-MyM 04	Conexiones domiciliarias de agua potable.
PL IA N° 29	39-IAT1-O-S-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes cloacales.
PL IA N° 30	40-IAT1-O-S-MyM 02	Conexiones domiciliarias de cloacas.

3 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos.
	03.2-IAT1-O-X-MyM-T 01	Mantenimiento de Grandes Equipos y Electrobombas.

4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED - INVENTARIO

4.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 31 A	42-IAT1-I-A-RED 01	Redes de Agua - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 31 B	43-IAT1-I-A-RED 02	Redes de Agua - Porcentaje por Material de cañería instalada.
	44-IAT1-I-A-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Agua.

4.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 32 A	45-IAT1-I-S-RED 01	Redes de Cloacas - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 32 B	46-IAT1-I-S-RED 02	Redes de Cloacas - Porcentajes por Material de cañería instalada.
	47-IAT1-I-S-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Desagües Cloacales.

5. CERTIFICACIÓN DE NORMAS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Laboratorios Central y de Plantas. Certificación ISO, IRAM, etc.

6 DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Diagnósticos y Estudios.

7 ESTUDIOS AMBIENTALES

Código Anterior	Código Actual	Título
		7.1 Estudios Ambientales.
		7.2 Control del Recurso.

8 GESTION DE LABORATORIO

Código Anterior	Código Actual	Título
		Gestión de Laboratorio.

9 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Código Anterior	Código Actual	Título
		Texto descriptivo de las tareas de AySA para el Desarrollo de la Comunidad.
		9.1 Anexos
		9.2 Planos

10 PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE)

Código Anterior	Código Actual	Título
		PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 2:

11. Cobertura del servicio de Agua Potable

11.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

11.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 33	48-IAT2-C-A-TRA 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Area Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A	49-IAT2-C-A-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A (Nuevas Áreas)	49-IAT2-C-A-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 34B	50-IAT2-C-A-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio de Agua Potable.
ex PL IA N° 35	51-IAT2-C-A-TRA 04	Expansión de redes de distribución de agua potable. Obras habilitadas en el año (por Partido).

12. Instalaciones Faltantes en la Red de Agua Potable

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 36	52-IAT2-C-A-RED 01	Red de Agua. Cierre de mallas faltantes (por Región y Partido).

13. Cartografía Expansión Agua

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IEADRC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IEASFE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Fernando.
	IEASIS-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Isidro.
	IEASMA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Martín.
	IEATIG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tigre.
	IEAVIC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Vicente López.
	IEAESC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Escobar.
	IEAJCP-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - José C. Paz.
	IEAMAR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Malvinas Argentinas.
	IEASMG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Miguel.
	IEAPIL-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IEAMAT-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - La Matanza.
	IEAHUR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Hurlingham.
	IEAITU-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ituzaingó.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Morón.
	IEATRE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tres de Febrero.
	IEAMER-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Merlo.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IEAALM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Almirante Brown.
	IEAEST-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Esteban Echeverría.
	IEAEZE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ezeiza.
	IEALOM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lomas de Zamora.
	IEAPPE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IEAAVE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Avellaneda.
	IEALAN-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lanús.
	IEAQLM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Quilmes.
	IEAFVA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3:

14. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales

14.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

14.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 38A	54-IAT3-C-S-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas.
	54-IAT3-C-S-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 38B	55-IAT3-C-S-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población beneficiada con obras o con servicio en trámite de habilitación.
ex PL IA N° 39	56-IAT3-C-S-TRA 04	Expansión de redes colectoras de desagües cloacales. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

15. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales según Sistema de Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 40	57-IAT3-C-S-PRO 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Area servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 41	58-IAT3-C-S-PRO 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario.
	61-IAT3-C-S-PRO 04	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 42	59-IAT3-C-S-PRO 03	Expansión de redes colectoras de Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

16. Instalaciones Faltantes en la Red de Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 43	60-IAT3-C-S-RED 01	Red de Cloacas. Colectoras faltantes (por Región y Partido).

17. Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IETDRC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IETSFE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Fernando.
	IETSIS-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Isidro.
	IETSMA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Martín.
	IETTIG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tigre.
	IETVIC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Vicente López.
	IETESC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Escobar.
	IETJCP-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - José C. Paz.
	IETMAR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Malvinas Argentinas.
	IEATMG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Miguel.
	IEATPIL-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IETMAT-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - La Matanza.
	IETCHUR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Hurlingham.
	IETITU-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ituzaingo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Morón.
	IETTRE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tres de Febrero.
	IETMER-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Merlo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IETALM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Almirante Brown.
	IETEST-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Esteban Echeverría.
	IETEZE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ezeiza.
	IETLOM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lomas de Zamora.
	IETPPE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IETAVE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Avellaneda.
	IETLAN-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lanús.
	IETQLM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Quilmes.
	IETFVA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 4:

18. CARTOGRAFÍA AGUA POTABLE (Planos de Rehabilitación y Renovación de Redes)

18.1 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRADRCF-2025	* Región Capital Federal.

18.2 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRASFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRASIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRASMA-2025	* Partido San Martín.
	IRATIG-2025	* Partido Tigre.
	IRAVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRAESC-2025	* Partido Escobar.
	IRAJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRAMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRASMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRAPIL-2025	* Partido Pilar.

18.3 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRAITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRAMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRAMOR-2025	* Partido Morón.
	IRATRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRAMER-2025	* Partido Merlo.
	IRAMOR-2025	* Partido Moreno.

18.4 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRAEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRAEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRALOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRAPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

18.5 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRALAN-2025	* Partido Lanús.
	IRAQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRAFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 5:

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES UNIFICADA (Rehabilitación Hidráulica y Estructural):

19. Rehabilitación Hidráulica.
20. Rehabilitación Estructural.

19/20.1 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCDRCF-2025	* Región Capital Federal.

19/20.2 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCSFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRCSIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRCSMA-2025	* Partido San Martín.
	IRCTIG-2025	* Partido Tigre.
	IRCVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRCESC-2025	* Partido Escobar.
	IRCJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRCMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRCSMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRCPIL-2025	* Partido Pilar.

19/20.3 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRCITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRCMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRCMOR-2025	* Partido Morón.
	IRCTRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRCMER-2025	* Partido Merlo.
	IRCMOR-2025	* Partido Moreno.

19/20.4 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRCEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRCEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRCLOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRCPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

19/20.5 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRCLAN-2025	* Partido Lanús.
	IRCQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRCFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6:

21 ASPECTOS COMERCIALES

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

Código Anterior	Código Actual	Título
300		Ingresos Año 2025.
301		Anexo de Ventas Año 2025 (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
302		Evolución de los Ingresos.
303		Emisión General y art. 34 Año 2025 - Grupos bimetrales - Ciclos completos de facturación.
304		Facturación a Consorcios del último ciclo completo de facturación. Todas las frecuencias.
305		Facturación Emisión Genereal. Ultimo ciclo completo de facturación bimestral.
307		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Capital Federal.
308		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Gran Buenos Aires.
309		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Capital Federal.
310		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Gran Buenos Aires.
311		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Capital Federal.
312		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Gran Buenos Aires.
313		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 08 - Capital Federal.
314		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - Residencial.
315		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - Residencial.
316		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - Residencial.
317		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - No Residencial.
318		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - No Residencial.
319		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - No Residencial.
320		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral - Factura Media.

21.2 Aspectos vinculados con la medición

Código Anterior	Código Actual	Título
330		Medidores cambiados e instalados en el Año 2025.
331		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 01 (Agua). Consumo del último año - Bimestralizado.
332		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 05 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
333		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
334		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 01 (Agua). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
335		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 05 (Agua y cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
336		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de Servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
337		Pérdida de Cuota Fija por mes, en cantidades de instalaciones y en Tarifa Básica Bimestral (TBB).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
306		Detalle de Unidades Funcionales.
350		Evolución del número de usuarios. Unidades funcionales.

21.4 Aspectos vinculados a la recaudación

Código Anterior	Código Actual	Título
360		Total Recaudado.
361		Ritmo de recaudación .
362		Evolución de la Recaudación y Evolución de la Recaudación por Categoría de Usuarios.

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
321		Cuentas a cobrar vencidas y a vencer al 31/12/2025 por Región, tipo de cliente, régimen y categoría de cliente.
322		Conciliación de créditos por servicios (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
370		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (por antigüedad).
371		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (con vencimientos operados por Año Contractual).
372		Impago vencido por rango de deuda al 31/12/25. Emisión por todo concepto, desagregado por Región y Grandes Usuarios.
373		Cuentas a cobrar a vencer y vencidas al 31/12/25, por Distrito y antigüedad de la deuda. Gráfico.
374		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25 por distrito, por situación comprobante y antigüedad de la deuda.
376		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25, correspondientes a ciertos Clientes fiscales. Detalle de las cuentas a cobrar originales más recargos extracontables teóricos estimados.
379		Deuda Vencida al 31/12/2025 más recargos extracontables teóricos estimados.

21.6 Información Adicional

Código Anterior	Código Actual	Título
323		Consumos de la previsión para deudores de dudoso cobro y ajustes de facturación del año 2025.
324		Cargo por corte de servicio - Intervenciones realizadas e imporetes de facturación devengados durante el año 2025.
375		Convenios de pagos.
377		Cargo por titularidad no informada año 2025.
380		Estimación de otras quitas y condonaciones de deuda extracontables otorgadas durante el Año 2025.
381		Recargos e intereses por demora de pago devengados durante el año 2025.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

22 ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS - TARIFA SOCIAL

22.1 a 22.5

Presentado en Tomo separado denominado "FORMATOS CONTABLES 2025".

22.6 Indicadores

Código Anterior	Código Actual	Título
850-851		Indicadores.
852		Benchmarking.

22.7 Balance económico social

Código Anterior	Código Actual	Título
900		Programa de tarifa social - Total.
901		Programa de tarifa social - Usuarios Residenciales.
902		Programa de tarifa social - Casos Sociales.
903		Programa de tarifa social - Instituciones sin fines de lucro.
904		Programa de tarifa social - Detalle de Usuarios Residenciales.
905		Programa de tarifa social - Detalle de Casos Sociales.
906		Programa de tarifa social - Detalle de Instituciones sin fines de lucro.
910		Plan Agua más Trabajo.
920		Programa de Barrios Carenciados - Modelo Participativo de Gestión (MPG).
930		Resumen de Expansión de Agua por Plan.
940		Resumen de Expansión de Desagües Cloacales por Plan.
950		Balance Económico Social.
970		Total de Usuarios con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
971		Total de Usuarios RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
972		Total de Usuarios NO RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
973		Total de Usuarios BALDÍOS con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.

1. OBRAS EJECUTADAS

1.1.AGUA POTABLE

INFORME ANUAL

Obras Ejecutadas Concesión Original

Dirección de Agua
2025

INDICE

Obras de Mayor envergadura en Plantas Potabilizadoras 2
Planta Manuel Belgrano 2
Planta San Martin 30
Obras de Mayor envergadura de Estaciones Elevadoras 75
Estación Elevadora Saavedra 76
Estación Elevadora Devoto 77
Estación Elevadora Lanús 78
Estación Elevadora Quilmes 79
Estación Elevadora Paitovi 79
Estación Elevadora Morón 80
Estación Elevadora de Tres de Febrero 80
Estación Elevadora Caballito 81
Estación Elevadora La Matanza 82
Estación Elevadora Villa Adelina 83
Estación Elevadora Villa Adelina I 84
Estación Elevadora Villa Adelina II 84
Estación Elevadora Centro 84
Estación Elevadora Floresta 85
Obras de Mayor envergadura en Pozos de Agua y Rebombeos 85
Pozos 85
Nuevas perforaciones 86
Rebombeos 91
Obras de Mayor envergadura en Plantas de Tratamiento de Agua Subterránea 99

Obras de Mayor envergadura en Plantas Potabilizadoras

Planta Manuel Belgrano

Toma de Agua Cruda

Fabricación de soportes, instalación de paneles solares y banco de baterías
Objetivo: contar con una fuente de alimentación renovable para el equipamiento instalado en la Torre Toma.
Descripción: se realizó la confección de las estructuras para cinco paneles, con hierro ángulo y planchuelas del stock propio de PMB, y el montaje e instalación de los mismos.







Paneles solares en construcción e instalados

Porcentaje de avance: 100%
Limpieza de recatas internas de las compuertas de Torre Toma
Objetivo: preparación de las recatas para la instalación del nuevo sistema de rejas de la Torre Toma.
Descripción: se confeccionó el dispositivo para poder realizar la limpieza de las recatas. Se trata de un cuadrante estructural que simula ser una compuerta. El mismo presenta un filo en su borde inferior, que al ir

desplazándolo por las recatas iría limpiando su interior. Para sumergir la estructura por las recatas, se confeccionó una guía en ambos lados con caño roscado, que a medida que se va sumergiendo se va roscando y superponiendo para poder llegar a la parte más baja de las recatas.



Dispositivo para la limpieza de las recatas, fabricado en el Taller de PMB

Porcentaje de avance: 40%

Elevación de Agua Cruda

Reparación integral de la reja N°3 de Agua Cruda

Objetivo: puesta en valor y reposición del servicio de la reja N°3 para desbaste en cámara de carga.

Descripción: el trabajo constó del reemplazo de las cajas y rodamientos del eje de accionamiento y de los rodamientos de los rodillos. También se mecanizaron los rodillos, se reemplazaron los rodamientos del motorreductor y los cables de acero, y se realizó limpieza y pintura en todo el equipo.



Estado de la reja al inicio de los trabajos



Reja N°3 instalada

Porcentaje de avance: 100%

Reparación de la bomba de lubricación N°2 de Agua Cruda

Objetivo: puesta en valor y reposición del servicio de la bomba N°2 de lubricación.

Descripción: se reemplazaron los rodamientos, mecanizado de casquillo, reemplazo de aro de desgaste y empaquetaduras, limpieza, pintura, montaje y alineación.



Bomba N°2 de lubricación antes y después de la reparación

Porcentaje de avance: 100%

Instalación de un nuevo turbidímetro de alto rango en Agua Cruda

Objetivo: actualizar el equipamiento de medición de turbiedad en Agua Cruda, mediante la adquisición de un equipo más moderno y de mayor rango al anterior.

Descripción: el nuevo equipo adquirido es un turbidímetro marca Hach, modelo Surface Scatter 7 sc, cuyo rango de medición va de 0 a 9999 NTU. Fue instalado y puesto en servicio el día 18/06.



Nuevo turbidímetro en Agua Cruda

Porcentaje de avance: 100%
Cambio de un variador para las bombas N°5 y 6 de Agua Cruda
Objetivo: aumentar la confiabilidad de servicio en Agua Cruda con un variador de velocidad nuevo de última tecnología.
Descripción: se planteó la renovación del variador N°1 por uno nuevo de tecnología actual, ya que el existente cumplió sus años de servicio y se considera obsoleto. Para el PI 2025, se realizó el estudio e ingeniería para el nuevo equipo, que derivó en la OC N°80232 adjudicada al proveedor.
Porcentaje de avance: 20%

Floculación y Sedimentación – Planta Convencional

Reparación integral de floculador y puente barredor: decantadores N°1, 4, 5, 6, 10, 13 y 14
Objetivo: llevar a cabo los mantenimientos programados para restablecimiento del funcionamiento de las unidades de floculación y extracción de barros de la Planta Convencional.
Descripción: a continuación se detallan las intervenciones realizadas durante 2025.
Decantador N°1. Fecha de intervención: desde el 07/10 hasta el 15/10/25.

- Reemplazo de los carreteles gastados de la línea 6.
- Reemplazo de tres bastidores rotos.
- Soldadura en brida de eje porta bastidor de la línea 1
- Reemplazo de pasamuro de la línea 4.
- Del lado de la galería de mecanismos se reemplaza reductor lateral izquierdo del floculador 1-2, se reemplazan todas las empaquetaduras y se confecciona ménsulas para sujeción de columna soporte de reductor rota de la línea 1.
- Reemplazo de cables guía, ajuste de rieles y engrase de ruedas, cables y rieles del puente barredor.
- Limpieza integral de floculador y decantador.

Decantador N°4. Fecha de intervención: desde el 10/02 hasta el 03/03/25.

- Limpieza integral de floculador y decantador

Decantador N°5. Fecha de intervención: desde el 01/07 hasta el 12/07/25.

- Reparación de tres líneas cortadas a la salida.
- Reemplazo de carreteles de una línea por desgaste.
- Reemplazo de todas las empaquetaduras.
- Reemplazo de ruedas del puente barredor.
- Regulación de chapas de barrido.
- Ajuste de cables guías.
- Engrase de ruedas, cables y rieles.
- Limpieza integral de floculador y decantador.

Decantador N°6. Fecha de intervención: desde el 04/03 hasta el 28/03/25.

- Mantenimiento integral del floculador.
- Reemplazo dos conjuntos de carcaza portarrueda, ruedas, bujes y ejes.
- Ajuste de cables guías.
- Engrase de ruedas, cables y rieles.
- Limpieza integral de floculador y decantador.

Decantador N°10. Fecha de intervención: desde el 28/12/24 hasta el 07/01/25, y desde el 02/10 hasta el 06/10/25.

- Reemplazo las empaquetaduras de todas las líneas.
- Reemplazo de dos carreteles por encontrase el buje de bronce desplazado.
- Reemplazo de la bulonería de un carretel de salida.
- Verificación del estado de todas las líneas.
- Reemplazo de un conjunto de rueda, buje y eje.
- Reemplazo de bulonería y de chapas.
- Engrase de rieles, ruedas, cables y balancines.
- Limpieza integral de floculador y decantador.

Decantador N°11. Fecha de intervención: desde el 17/10 hasta el 07/11/25.

- Limpieza integral de floculador y decantador.

Decantador N°13. Fecha de intervención: desde el 01/04 hasta el 24/05/25.

- Mantenimiento integral del floculador.
- Reemplazo de conjunto de las cuatro ruedas, bujes y ejes.
- Ajuste de cables guías y engrase de ruedas, cables y rieles.
- Limpieza integral de floculador y decantador.

Decantador N°14. Fecha de intervención: desde el 25/02 hasta el 01/03/25

- Reemplazo de dos carreteles que se encontraban muy gastados de la línea 1.
- Reemplazo del pasamuro que se encontraba torcido y primer carretel de la línea 2, que tenía la brida desoldada.
- Reemplazo y soldadura de brida con refuerzos en el eje porta bastidor de la línea 6.
- Reemplazo de todas las empaquetaduras.
- Ajuste de cables guías y engrase de ruedas, cables y rieles.
- Limpieza integral de floculador y decantador.

Porcentaje de avance: 100%

Limpieza de canales de agua decantada

Objetivo: acondicionamiento de los canales de agua decantada, mediante la eliminación de vegetación y sedimentos de cal y de barro.

Descripción: debido a la dosificación de lechada de cal en canales de agua decantada, se produce la sedimentación de residuo en la parte final de los mismos, achicando su sección. A su vez, sobre este residuo crece vegetación acuática, que al desprenderse, genera taponamientos en los filtros. Para mitigar los efectos y continuar con los trabajos iniciados en 2024, se realizó la limpieza del canal de decantada suroeste, mediante la utilización de una bomba arenera y un camión con hidrogrúa que posicionaba la bomba en distintas zonas del canal. Al finalizar las labores de remoción de suciedad gruesa, se ejecutó una limpieza con un hidrante y una lanza especial fabricada en Taller, para remover sedimentos con mayor detalle. Resta realizar la limpieza del canal noroeste, programada por razones operativas para 2026.

Porcentaje de avance: 75%

Floculación y Sedimentación – Módulo Superpulsator

Reparación integral del difusor de coagulante y cambio de la bomba de agua de arrastre
Objetivo: restablecer la óptima dosificación de coagulante en el Módulo.
Descripción: los caños guía de la bomba se encontraban muy deteriorados, al igual que la base soporte. Los caños guía fueron desmontados y reemplazados por caños nuevos, fabricados en el Taller de PMB. Se reparó la base soporte y se reemplazó la bomba dispersora. El dispersor también se encontraba en mal estado, obstruido con residuo de coagulante. Se desmontó, se trasladó al Taller para realizarle una limpieza, y luego se volvió a montar.
Porcentaje de avance: 100%
Renovación del motor y ventilador "E" del módulo
Objetivo: aumentar la eficiencia mecánica y energética, al mismo tiempo que disminuir los mantenimientos correctivos por rotura mecánica o eléctrica.
Descripción: se reemplazaron el motor y la turbina por un equipo nuevo. También en tablero de comando se reemplazó la protección térmica acorde al consumo del nuevo motor. Los trabajos fueron ejecutados por Mantenimiento Eléctrico, entre los meses de marzo y abril.



Nuevo motor del ventilador “E” del Módulo

Porcentaje de avance: 100%

Filtros

Reparación integral de filtros zona Norte: filtros N°4, 5 y 23

Objetivo: realizar la reparación y puesta en servicio de las unidades mencionadas, mediante la obra civil completa y la carga de manto filtrante nuevo.

Descripción: en los tres casos, la obra fue llevada a cabo por la contratista, y los trabajos constaron de la reconstrucción completa de la estructura del filtro, la carga de arena nueva y la desinfección correspondiente del manto antes de la puesta en servicio. El filtro N°4 estuvo fuera de servicio entre el 22 de enero y el 5 de agosto; el N°5 entre el 9 de abril y el 23 de septiembre, mientras que el N°23 entre el 28 de octubre de 2024 y el 8 de abril de 2025.



Obra del filtro N°23




Obra del filtro N°4




Obra del filtro N°5

Porcentaje de avance: 100%
Reparación integral de filtros zona Norte: filtro N°11
Objetivo: realizar la reparación y puesta en servicio de la unidad mencionada, mediante la obra civil completa y la carga de manto filtrante nuevo.
Descripción: la obra está siendo llevada a cabo por la empresa. El filtro quedó fuera de servicio el día 8 de octubre. Al cierre de este informe, ya se habían realizado las tareas de demolición, y se encontraba en proceso el hormigonado.



Obra del filtro N°11 en curso

Porcentaje de avance: 75%

Reparación integral de filtros zona Norte: filtro N°17

Objetivo: realizar la reparación y puesta en servicio de la unidad mencionada, mediante la obra civil completa y la carga de manto filtrante nuevo.

Descripción: la obra está siendo ejecutada por la contratista Infraestructura Urbana. La unidad fue sacada de servicio el día 10 de noviembre. Al cierre del presente informe, se encontraba en curso el proceso de demolición.



Obra del filtro N°17 en curso

Porcentaje de avance: 25%

Reparación de falsos fondos de filtros del Módulo N° 5 y 8

Objetivo: ejecutar la reparación de los falsos fondos de las unidades filtrantes mencionadas para recuperar su capacidad operativa.

Descripción: se ejecutaron las reparaciones de los encuentros de los falsos fondos de los filtros N°5 y 8 del Módulo Superpulsator. Estas roturas ocasionaban un lavado deficiente, lo que repercutía en la calidad del agua filtrada. Las obras de reparación fueron llevadas a cabo por la empresa contratista. El filtro N°8 estuvo fuera de servicio entre el 5 de agosto y el 27 de octubre, mientras que el N°5 entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre.



Obra de reparación del filtro N°5



Obra de reparación del filtro N°8

Porcentaje de avance: 100%

Reemplazo del codo de bajada de lavado del filtro N° 23 norte incluyendo el reacondicionamiento del hormigón en el punto de impacto del caño

Objetivo: recuperar el normal funcionamiento del filtro N°23 de la zona norte.

Descripción: a continuación se detalla el paso a paso de los trabajos realizados.

- Se desmontaron el codo y el conducto en mal estado, se posicionaron en el suelo y se realizaron cortes de los mismos para su disposición.
- Se reparó brida pasamuro desacoplada, para luego montarla en el hueco del filtro
- Se soldaron hierros para amarre, se armó encofrado y se realizó la carga del hormigón.
- Una vez curado el hormigón, se trasladó el nuevo codo espiga desde el Taller hasta la galería de filtros.

- Con el conducto en el filtro correspondiente, se procedió al vaciado del tanque de lavado de filtros para poder desmontar la válvula de lavado.
- Después de que la válvula fue desmontada, se comenzó con el montaje del codo espiga nuevo, posicionándolo y acoplándolo en la brida pasamuro.
- En el extremo de la espiga, se montó una nueva junta de desarme, y luego nuevamente la válvula de lavado.
- Al finalizar con el montaje, se confeccionaron dos ménsulas y se instalaron junto al codo para incrementar la seguridad de que sea despedido nuevamente.



Estado del codo del filtro N°23 antes de la reparación



Codo del filtro N°23 reparado

Porcentaje de avance: 100%

Instalación de medición de turbiedad por filtro

Objetivo: incorporar la medición de turbiedad a cada filtro en forma individual y con reporte a Topkapi, de modo tal de poder identificar en tiempo real el aporte de cada filtro a la turbiedad total del agua filtrada, y con esa información tomar acciones en la operación.

Descripción: el seguimiento de este trabajo se encuentra desarrollado en la acción correctiva AC-AGU-PMB-2022-018. El ingreso de materiales fue trasladado del PI 2024 al PI 2025 por cuestiones presupuestarias, pero el avance de la gestión al cierre de este informe se encuentra demorado.

Porcentaje de avance: 50%

Recambio de la válvula de soplado del filtro N°1 de la zona sur

Objetivo: restablecer el normal funcionamiento del lavado del filtro N°1 de la zona sur.

Descripción: por fallas en el funcionamiento de válvula, que afectaba al sistema de lavado del filtro, se llevó a cabo el cambio de válvula mariposa de 14” tipo Wafer. La tarea fue realizada por el sector Electromecánica de Procesos el día 29/08.
Porcentaje de avance: 100%
Reparación de bajada de tanque de lavado de los filtros N°4, 13 y 22 de zona norte
Objetivo: reacondicionamiento de las cañerías empleadas para el lavado de filtros, debido al estado de deterioro en que se encuentran.
Descripción: se trata de una tarea crítica, ya que la no reparación de estas cañerías puede derivar en la salida de servicio de los filtros asociados. En el filtro N°4, se realizó la reparación de la pinchadura con parches de chapas, por conducto en mal estado. En el filtro N°13, se reparó brida pasamuro de bajada del filtro, que se encontraba en muy mal estado. En el filtro N°22, se realizó una reparación sobre la costura del conducto a la altura de la planta baja de la galería.



De izquierda a derecha, cañerías de bajada de los filtros N°4 (después de reparación), 13 (antes de reparación) y 22 (después de reparación)
Porcentaje de avance: 100%

Servicios auxiliares

Drenaje
Reparación integral de las bombas A, B y C de drenaje de planta
Objetivo: restablecimiento del funcionamiento de las bombas de drenaje, de manera de tenerlas operativas la mayor parte del tiempo posible.
Descripción: para lograr una reparación óptima de las bombas, se confeccionó un dispositivo para el alineado de la transmisión. Este dispositivo fue presentado en el Informe Anual 2024. Mediante su incorporación, se pudo comprobar el desbalanceo que presentaban los ejes de transmisión con los acoplamientos rígidos partidos. En la reparación integral, el alineado y ajuste se utilizaron todos los componentes nuevos que ingresaron, los cuales a continuación se describen.

- Siete ejes intermedios de transmisión con chavetas, medialunas y casquillos de inoxidables.
- Ocho estrellas porta cojinetes nuevas con sus respectivos bujes cojinetes de poliuretano.
- El eje de registro con sus chavetas, medialunas y casquillo de empaquetadura.
- Los ocho acoplamientos rígidos partidos.
- Los siete caños columna.
- Los casquillos de inoxidable del eje de impulsor.
- Impulsor fabricado con aleación de bronce SAE 68 C.
- Buje cojinete del cuerpo difusor.
- Los siete caños camisa de PEAD para refrigeración de cojinetes.
- Cojinete porta rodamientos y ambos rodamientos.
- Cuerpo difusor, campana de aspiración y columna inferior siguen siendo componentes viejos.





Imágenes de distintos componentes de las bombas de drenaje

Porcentaje de avance: 100%

Desmontaje y montaje de nueva bomba B del drenaje del Módulo

Objetivo: reemplazo de un equipo de bajo rendimiento por un equipo nuevo para el drenaje del Módulo.

Descripción: se realizó el desmontaje de la bomba B, que presentaba un rendimiento muy bajo. En su lugar se montó una bomba nueva, marca KSB modelo KRTK 205.

Porcentaje de avance: 100%

Nueva línea de alimentación para lubricación de bombas de drenaje desde el tanque de lavado de filtros

Objetivo: evitar que en las paradas de planta las bombas de drenaje funcionen sin refrigeración de cojinetes.

Descripción: se procedió a la instalación de una nueva línea auxiliar proveniente del tanque de lavado de filtros. Se instaló un bypass de válvulas, donde se puede seleccionar si la alimentación es tomada de las bombas de agua clorada, como ocurre normalmente, o se toma de esta nueva línea. Con esto se asegura la refrigeración de las bombas ante cualquier inconveniente.



Nueva línea de alimentación de lubricación de bombas de drenaje

Porcentaje de avance: 100%

Adquisición de nuevas bombas de drenaje de Planta

Objetivo: contar con equipamiento de respaldo para asegurar el servicio de drenaje de Planta Convencional por la mayor parte del tiempo.

Descripción: el seguimiento de esta gestión se encuentra detallado en la acción preventiva AP-AGU-PMB-2022-005. El proveedor KSB entregó un equipo en marzo, pero dado que el mismo no se encontraba en concordancia con el pliego, no fue recepcionado. Luego de repetidos reclamos a lo largo del año, finalmente se concretaron las entregas de las cuatro bombas a partir de octubre. La última bomba se recibió el día 26 de diciembre.

Porcentaje de avance: 100%

Limpieza integral de la cámara de drenaje

Objetivo: realizar el acondicionamiento de la cámara de drenaje, mediante la extracción de arena acumulada.

Descripción: durante 2025, se comenzó con la gestión de la contratación de un servicio de limpieza integral de la cámara de drenaje de Planta. Al cierre de este informe, ya se han presentado los documentos necesarios para la contratación y se está a la espera de la notificación de la OC.

Porcentaje de avance: 20%

Adquisición e instalación de caudalímetros en drenaje del Módulo

Objetivo: medición del caudal de drenaje del Módulo, para mejorar el cálculo de los balances de agua producida y evaluar el rendimiento de las bombas.

Descripción: con respecto al informe 2024, se decidió el lugar de la instalación y las modificaciones necesarias a realizar en la cañería. Resta coordinar los trabajos de ejecución.

Porcentaje de avance: 80%

Instalación de un nuevo tablero eléctrico para el control de las bombas

Objetivo: renovar el CCM (Centro de Control de Motores) para que sea compatible con las nuevas bombas de drenaje, y a la vez confiabilizar el sistema.

Descripción: el CCM nuevo ingresó en el mes de junio de 2024. Se realizó la obra civil para la instalación en la galería de filtros, quedando montado en febrero de 2025. Finalmente, fue energizado y puesto en servicio el día 22 de octubre.



CCM para las bombas de drenaje

Porcentaje de avance: 100%

Lavado de filtros

Reparación integral de la bomba C de lavado de filtros

Objetivo: restablecimiento del funcionamiento del equipo mencionado, de modo tal de tenerlo operativo lo más rápido posible y no sobrecargar al resto de las bombas.

Descripción: reparación integral de la bomba que constó de las siguientes tareas.

- Reemplazo de los casquillos de inoxidable de los ejes de transmisión y mecanizado
- Reemplazo de los bujes cojinetes de poliuretano de las estrellas y cuerpo difusor,
- Adaptación y balanceo del impulsor
- Alineación de la transmisión en el dispositivo de alineación
- Reemplazo de rodamientos de la caja y de la estrella porta rodamiento
- Limpieza y pintura

Porcentaje de avance: 100%

Cambio de válvula de la red de servicio interno a lavado de los filtros

Objetivo: asegurar el aporte de agua de la red de servicio interno al tanque de lavado de filtros en función de las necesidades del proceso.

Descripción: el colector de impulsión de servicio interno cuenta con una cañería que empalma hacia la subida del tanque de lavado de filtros. Esta cañería posee una válvula que se abre en caso de necesidad de reforzar el llenado del tanque, o ante una eventual falla de la sala de las bombas de lavado. La válvula que se encontraba instalada presentó fallas, que no permitían su cierre total, ocasionando desviaciones indeseadas del flujo de agua de la red de servicio interno al tanque. El cambio de válvula fue realizado para corregir esta situación.

Porcentaje de avance: 100%

Reemplazo de los tres sopladores del Módulo

Objetivo: optimizar el lavado de filtros, considerando el desgaste de los equipos a reemplazar.

Descripción: trabajo que no presentó avances en 2025. El equipo instalado no presenta el rendimiento esperado, por lo cual el proveedor se encuentra evaluando sus curvas de rendimiento.



Soplador A del Módulo

Porcentaje de avance: 33%

Adquisición de bombas de lavado de filtros

Objetivo: contar con equipamiento de respaldo para no poner en riesgo el servicio de lavado de filtros de Planta Convencional.

Descripción: la adquisición de nuevas bombas de lavado de filtros se encuentra gestionada y con Orden de Compra (N°75854). El proveedor KSB se encuentra demorado en el avance de la fabricación de los equipos, dado que le estuvo dando prioridad a la fabricación de las bombas de drenaje de Planta, que ya fueron entregadas. Esta gestión se encuentra en la acción AC-AGU-PMB-2023-011.

Porcentaje de avance: 50%

Instalación de un nuevo tablero eléctrico para el control de las bombas

Objetivo: confiabilizar y modernizar el CCM de lavado de filtros.

Descripción: la adquisición del CCM fue llevada a cabo mediante la Orden de Compra N°75555. El proveedor realizó la entrega en el mes de abril. Durante los meses siguientes se planificó la construcción de banquinas para el montaje en la galería de filtros, quedando finalmente instalado para el mes de noviembre.



CCM de lavado de filtros

Porcentaje de avance: 100%

Servicio interno

Reparación de las bombas A y B

Objetivo: restablecer el servicio de los equipos mencionados.

Descripción: reparación integral de las bombas que constó de las siguientes tareas.

- Reemplazo de los casquillos de inoxidable de los ejes de transmisión y mecanizado
- Reemplazo de los bujes cojinetes de poliuretano de las estrellas y cuerpo difusor,
- Adaptación y balanceo del impulsor
- Alineación de la transmisión en el dispositivo de alineación
- Reemplazo de rodamientos de la caja y de la estrella porta rodamiento
- Limpieza y pintura

Porcentaje de avance: 100%

Cambio de la cañería principal de agua arrastre de cloro

Objetivo: reemplazar la cañería de agua de arrastre de cloro por deterioro de la actual.

Descripción: durante 2025 se detectó la necesidad del reemplazo del conducto de agua de arrastre. El inicio de los trabajos corresponde al personal de Distrito Quilmes, que debe realizar las tareas de apertura del suelo para poder efectuar el relevamiento de la cañería. La provisión y el cambio del caño lo realizará Talleres Varela.

Porcentaje de avance: 20%

Adquisición de nueva bomba para agua clorada

Objetivo: actualizar el parque de bombas de agua clorada mediante la compra de equipamiento nuevo.

Descripción: se gestionó la compra de una bomba nueva, adjudicada a la empresa contratista, mediante la OC N°79458. Al cierre de este informe se espera por la entrega de la bomba, programada para febrero.

Porcentaje de avance: 60%.

Cambio completo de la cañería de bajada de servicio interno

Objetivo: llevar a cabo el reemplazo del conducto de bajada del tanque de servicio interno, debido al estado de deterioro del actual.

Descripción: luego de reiteradas intervenciones por pinchaduras y roturas de la cañería mencionada, se tomó la decisión de efectuar directamente su reemplazo. El proveedor TAN MAC, mediante la OC N°79511, ya hizo entrega de los materiales. Al cierre de este informe, PMB está planificando las tareas del reemplazo.

Porcentaje de avance: 40%

Instalación de un nuevo tablero eléctrico para el control de las bombas

Objetivo: confiabilizar y modernizar el CCM de servicio interno.

Descripción: la adquisición del CCM fue llevada a cabo mediante la Orden de Compra N°75555. El proveedor realizó la entrega en el mes de septiembre de 2024. Durante los meses siguientes se planificó la construcción de banquinas para el montaje en la galería de filtros, quedando finalmente instalado para el mes de noviembre de 2025. Para la puesta en marcha, se necesita realizar la canalización de los cables de alimentación, y se espera por la modificación y mejora del comando del tablero, incluida en la OC N°80315 a realizarse en febrero de 2026.



CCM de servicio interno

Porcentaje de avance: 80%

Dosificación de productos químicos

Alcalinización

Reparación integral del apagador N°3 de cal

Objetivo: llevar a cabo la reparación del equipo N°3 de apagado de cal para reincorporarlo al sistema.

Descripción: mantenimiento profundo del equipo, encarado por las múltiples y sucesivas fallas. Los trabajos comenzaron en el mes de julio, están siendo llevados a cabo por Electromecánica de Procesos, y constan de:

- Cambio de rulemanes en la dosificación de cal
- Cambio de cadena para sacar residuos (pendiente)
- Reemplazo de paletas gastadas
- Limpieza de ejes amasadores y batea
- Limpieza de cañerías de desagote
- Reparación de caja reductora (pendiente)
- Reparación de embrague de amasado

Porcentaje de avance: 70%

Reemplazo de un apagador de cal

Objetivo: confiabilización del sistema de alcalinización, mediante la modernización del parque de apagadores de cal.

Descripción: obra que forma parte del PI 2025, y que se encuentra en proceso de compra bajo la OC N°79672. Al cierre del informe, se está a la espera de la entrega del equipo, prevista para julio de 2026.

Porcentaje de avance: 40%

Reparación integral de dos bombas de agua de cal en Bernal IV

Objetivo: restablecer el servicio de dosificación de agua de cal en Bernal IV.

Descripción: se enviaron a reparar los dos motorreductores de las bombas al proveedor. Luego de recibir los reductores reparados, se montaron en sus respectivas bombas, se reemplazaron las mangueras internas y se realizó limpieza de los accesorios. Por último, se armó la bomba y se agregó aceite siliconado a la bomba y aceite lubricante al motorreductor.





Bombas N°2 y 3 de Bernal IV montadas

Porcentaje de avance: 100%

Coagulantes

Cambio del punto de dosificación de cloruro férrico

Objetivo: optimizar la dosificación y los tiempos de mezcla del cloruro férrico.

Descripción: el punto de dosificación original del cloruro férrico se encontraba al ingreso del conducto de agua cruda hacia el Módulo, inmediatamente después del tamiz. Esta configuración no brindaba resultados esperados al proceso. Luego de la realización de ensayos en laboratorio, se determinó que la mejor

configuración se logra dosificando PAC y luego cloruro férrico. Bajo esta línea, se realizó una prueba temporal de dosificación de cloruro férrico a la altura de los vertederos, con resultados negativos debido a reacciones paralelas entre el polielectrolito y el férrico. En consecuencia, se decidió volver la dosificación de férrico al punto original. Al cierre de este informe, se encuentra en estudio la implementación de un punto nuevo de dosificación de férrico, que respete los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio, para poder realizar una nueva prueba en planta.
Porcentaje de avance: 50%
Colocación de medidor de caudal en fábrica de coagulante
Objetivo: instalación de un medidor de caudal de agua para la alimentación de la producción de la fábrica de coagulante.
Descripción: para comenzar con los trabajos, se solicitó un caudalímetro de 4” a Planta Juan Manuel de Rosas, que fue retirado el día 12/10. Este caudalímetro no se encontraba calibrado, por lo cual se iniciaron las gestiones para realizar su calibración, mediante el SAM N°644 de Instrumentación. Para realizar la instalación, se requiere de la fabricación de un carretel, que será fabricado por el Taller de Mantenimiento.
Porcentaje de avance: 50%
Instalación de la bomba N°2 de cloruro férrico
Objetivo: contar con una bomba de backup para la dosificación del cloruro férrico.
Descripción: antes del montaje da la bomba, se realizó una modificación en los acoples de la cañería de aspiración y la cañería de impulsión. Ambos acoples eran de espiga, por lo que con el correr del tiempo y el ambiente corrosivo, se oxidaban las abrazaderas de las mangueras, y con la presión de la impulsión se desacoplaban, derramando cloruro férrico por la sala. Para evitar este inconveniente, se confeccionaron dos bridas de PVC y dos insertos de teflón para poder adaptarla a las conexiones de la bomba.



Bomba N°2 de cloruro férrico
Porcentaje de avance: 100%
Cloración
Construcción de batea de contención de tanques de hipoclorito
Objetivo: llevar a cabo la construcción de bateas de contención para los tanques de almacenamiento de hipoclorito de sodio de las zonas norte y sur.
Descripción: los tanques de almacenamiento de hipoclorito de sodio fueron instalados en el año 2021. Dado el carácter de urgencia que tuvo la obra de instalación en aquél momento por las malas condiciones del agua cruda, los tanques quedaron instalados sobre plataformas. Las bateas de contención para derrames que debían construirse quedaron pendientes hasta 2025. Entre los meses de octubre y noviembre se ejecutaron las obras, a cargo de la empresa contratista.



Tanque de hipoclorito norte



Tanque de hipoclorito sur

Porcentaje de avance: 100%

Incorporación de pasarelas de acceso seguro a las dársenas

Objetivo: incrementar los niveles de seguridad con que los operadores de Producción y Mantenimiento realizan sus operaciones cotidianas en la zona de las dársenas de cloro.

Descripción: la gestión de la compra para la obra de instalación de pasarelas se inició en septiembre de 2024, adjudicándose en abril de 2025 a la empresa JP Servicio Técnico Montajes Industriales SRL mediante la OC N°78644. Los trabajos se iniciaron en el mes de julio, quedando finalizados en octubre.



Pasarelas de acceso seguro a las dársenas de cloro

Porcentaje de avance: 100%

Reemplazo de cuatro equipos completos de evaporación y dosificación de cloro

Objetivo: puesta en valor y confiabilización del sistema de dosificación de cloro, mediante el reemplazo de los cuatro equipos que tienen el rendimiento más bajo por equipos nuevos.

Descripción: de los equipos adquiridos, se ha realizado el montaje de los evaporadores N°4 y 9, y del clorador N°9. Los equipos son marca Wallace & Tiernan.



Evaporador N°9



Clorador N°9

Porcentaje de avance: 50%

Automatización de los cloradores

Objetivo: llevar a cabo los trabajos necesarios para que las dosis de cloro puedan ser modificadas desde Topkapi. Con esto se busca optimizar el tiempo de respuesta, sobre todo en momentos en que las dosis de cloro requieren cambios frecuentes, y con ello confiabilizar el sistema de desinfección.

Descripción: durante 2025, el sector Instrumentación terminó con las tareas de automatización de los equipos de dosificación de cloro, quedando los diez equipos en servicio con dosis controladas por telecomando.

Porcentaje de avance: 100%

Instalación de un sistema de habilitación manual de las dársenas 1 y 2 de cloro

Objetivo: contar con un sistema independiente del PLC para la habilitación de la dosificación de cloro desde las dársenas N°1 y 2.

Descripción: los trabajos constaron de la construcción de un tablero eléctrico que cuenta con la capacidad de habilitación de las válvulas eléctricas y neumáticas de las dársenas mencionadas. El tablero fue fabricado por el sector Instrumentación. A partir del accionamiento de estas válvulas, se permite realizar una maniobra de habilitación similar a la que se realiza con los cilindros de 1 tonelada. El tablero fue ubicado en la Sala de Guardia, y desde el 16/07 se encuentra en servicio.



Tablero eléctrico en Sala de Guardia

Porcentaje de avance: 100%

Instalación de tanque de hipoclorito de sodio en el Módulo

Objetivo: contar con un tanque de almacenamiento de hipoclorito de sodio en el Módulo, para dosificación durante los lavados de filtros.

Descripción: se montó un sistema automatizado de almacenamiento de hipoclorito, medición de nivel y control de tiempo de una bomba peristáltica Dura 25 para la dosificación en los lavados de los filtros del Módulo. Fue llevado a cabo durante el mes de noviembre.



Tanque de hipoclorito instalado para el lavado de filtros del Módulo, con su bomba Dura 25

Porcentaje de avance: 100%

Sistema de dosificación de hipoclorito de sodio

Objetivo: llevar a cabo la adquisición de los materiales necesarios para incorporar a Topkapi el sistema de hipoclorito de sodio. Con esto se busca optimizar la gestión integral del recurso.

Descripción: se realizó el pedido en el PI 2025 de los caudalímetros, sensores de nivel, válvulas y actuadores eléctricos necesarios. Este pedido derivó en dos órdenes de compra, las N°79789 y 79258. La primera contiene los caudalímetros y válvulas con actuadores, estas últimas entregadas el día 18/12. Resta la entrega de los caudalímetros. Por otro lado, de la OC N°79258, ya fueron entregados los sensores de nivel.

Porcentaje de avance: 60%

Reemplazo del tanque de hipoclorito de la zona norte con su pipping completo

Objetivo: llevar a cabo el recambio del tanque de hipoclorito de sodio de zona norte que se encontraba dañado.

Descripción: el día sábado 30/08, durante un evento de amonio, quedó fuera de servicio el tanque de almacenamiento de hipoclorito que se encontraba instalado en la zona norte, a causa de una fractura estructural. Dada la magnitud de la rotura, no fue posible una reparación, por lo que hubo que reemplazar el tanque. Los trabajos fueron encarados el lunes 01/09, finalizándose para el viernes siguiente. El nuevo tanque instalado es el que se muestra en el ítem “Construcción de batea de contención de tanques de hipoclorito”.

Porcentaje de avance: 100%

Construcción, montaje y puesta en marcha de un nuevo TGBT para el sistema de dosificación de cloro

Objetivo: aumentar la confiabilidad de servicio, la seguridad al operador, la seguridad durante mantenimiento, las prestaciones y la operación diaria del tablero de dosificación de cloro.

Descripción: se realizó la ingeniería del nuevo tablero de dosificación de cloro en el PI 2025. Al cierre de este informe, el proceso de compra se encuentra en etapa de licitación. Se espera que los oferentes presenten las ofertas en febrero del 2026.

Porcentaje de avance: 40%

Neutralización

Cambio de las dos torres de neutralización y acondicionamiento del pipping

Objetivo: actualización del sistema de neutralización mediante adquisición de nuevas torres.

Descripción: el trabajo se encuentra en etapa de gestión, habiéndose adjudicado la Orden de Compra al proveedor.

Porcentaje de avance: 40%

Construcción, montaje y puesta en marcha de un nuevo TGBT para el sistema de neutralización

Objetivo: aumentar la confiabilidad de servicio, la seguridad al operador, la seguridad durante mantenimiento, las prestaciones y la operación diaria del tablero de neutralización.

Descripción: se realizó la ingeniería del nuevo tablero de neutralización en el PI 2025. Al cierre de este informe, el proceso de compra se encuentra en etapa de licitación. Se espera que los oferentes presenten las ofertas en febrero del 2026.

Porcentaje de avance: 40%

Sistemas energéticos

Tendido de un nuevo cable de MT para el alimentador N° 2 desde la nueva SET A a la SET D
Objetivo: aumentar la confiabilidad y continuidad de servicio de la alimentación eléctrica a la subestación D.
Descripción: se realizó la ingeniería para selección del nuevo cable para el alimentador 2 de la SET D. Se llevó a cabo el tendido por la nueva traza y todos los trabajos que incluyeron la conexión y puesta en servicio del mismo. La ejecución de los trabajos fue en el mes de agosto.



Trabajos de tendido de cables

Porcentaje de avance: 100%
Retrofit de las dos celdas de entrada de energía a la SET D
Objetivo: aumentar la confiabilidad y prestaciones de los alimentadores de la SET D.
Descripción: se realizó el retrofit de las celdas de alimentación de la SET D, incluyendo interruptores, sistemas de protección y maniobra nuevos. Al tratarse de equipamiento de última tecnología, aumenta el nivel de confiabilidad y las prestaciones disponibles en la celda. Se espera por una parada parcial de Agua Cruda para la puesta en marcha del comando nuevo.





Retrofit de las dos celdas de la SET D

Porcentaje de avance: 90%
Construcción de cañeros para un nuevo cable de alimentación para la SET D
Objetivo: alimentación de la SET D a través de un nuevo alimentador desde la SET A nueva.
Descripción: se realizó el relevamiento, ingeniería, canalización, compra y construcción de nuevas canalizaciones para el nuevo cable hacia la SET D, aumentando la confiablidad del servicio y permitiendo el avance en otros trabajos para la actualización del sistema eléctrico de la planta.




Cañeros para el cable hacia la SET D

Porcentaje de avance: 100%

Tendido de cables y traspaso de cargas del TGBT de la vieja SET A al TGBT de la nueva SET A

Objetivo: aumentar la confiabilidad y prestaciones de los alimentadores e interruptores de cada carga que se alimenta desde la SET A, al mismo tiempo que optimizar las protecciones y mediciones eléctricas.

Descripción: se llevó a cabo la desconexión y retracción de los cables de BT del TGBT de la vieja SET A para ser impactados en el TGSACA de la nueva SET A. En la mayoría de los cables se realizaron empalmes para completar los metros del tendido al nuevo tablero. Las tareas fueron realizadas en varios operativos de parada de planta, entre los meses de julio y septiembre.




A la izquierda, el TGBT de la SET A original, y a la derecha el TGBT de la nueva SET A.

Porcentaje de avance: 100%

Traspaso de cables de MT de la SET C y SET D desde la SET A vieja a la nueva SET A

Objetivo: puesta en marcha y traspaso de cargas a la nueva SET A, alimentada de la nueva SET AT.

Descripción: se desarrolló la retracción de los cables de los alimentadores 1 y 2 de las SET C y D desde la SET A vieja, para luego impactarlos en la nueva subestación A. Estos trabajos se realizaron con personal propio del establecimiento en diferentes paradas de planta nocturnas, ya que por encontrarse en trincheras energizadas era necesario el corte total de energía. Puesto que en la SET D se había realizado previamente el tendido de un nuevo cable para el alimentador 2, se impactó en las celdas un solo cable de los antiguos sobre el alimentador 1 de la SET D, quedando el restante cable a disposición para otro uso.

Porcentaje de avance: 100%

Cambio de celda de acople de barras del TGMT de Bernal I

Objetivo: aumentar la confiabilidad de servicio, la seguridad al operador, la seguridad durante mantenimiento y las prestaciones del tablero de media tensión de Bernal I.

Descripción: se planteó la renovación de la celda de acople de Bernal I, desde un seccionador a un interruptor. Ya se encuentra emitida la OC N°80111, adjudicada a la empresa ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A. Restan los trabajos de montaje por parte del proveedor.

Porcentaje de avance: 80%

Retrofit de las dos celdas de entrada de energía al TGMT de Agua Cruda

Objetivo: aumentar la confiabilidad y prestaciones de los alimentadores N°1 y N°2 del tablero de 6,6 kV de Agua Cruda

Descripción: se encuentra en proceso la realización del retrofit de las celdas de alimentación N°1 y N°2 del tablero de 6,6 kV de Agua Cruda, incluyendo interruptores, sistema de protección y maniobra nuevo. Al tratarse de equipamiento de última tecnología aumenta el nivel de confiabilidad y las prestaciones disponibles en la celda.



Tareas de retrofit de las celdas de Agua Cruda

Porcentaje de avance: 80%

Construcción, montaje y puesta en marcha de un nuevo TGBT para la SET C

Objetivo: contar con un tablero provisorio para cargas de baja tensión auxiliares de planta en la SET C mientras se realiza el revamping de la misma.

Descripción: se diseñó un tablero con cualidades de seguridad, confiabilidad y prestaciones de alto nivel en concordancia a las nuevas instalaciones en planta. Al momento del cierre del informe, se encuentra en etapa de licitación mediante el CP N°64656.

Porcentaje de avance: 40%

Instalación de un nuevo transformador de 4 MVA para la SET D

Objetivo: renovación del parque de transformadores de planta que han cumplido su periodo de vida útil.

Descripción: se realizó la ingeniería para la selección del transformador. Al cierre de este informe, se encuentra en fabricación bajo la OC N°79194, adjudicada a la empresa CAT S.A.

Porcentaje de avance: 40%

Varios

Reparación integral del compresor de aire comprimido de planta Sullair LS 12-75

Objetivo: restablecer el normal funcionamiento del compresor Sullair LS 12-75.

Descripción: el equipo no podía ser puesto en servicio, dado que a cada intento de hacerlo se apagaba por pérdida de presión. Ante esto, se encaró una reparación integral conjunta entre Taller y Oficina Técnica de Mantenimiento. La misma constó de:

- Reparación de la válvula piloto, por destrabado del soporte del disco con el resorte
- Regulación del tornillo de la válvula reguladora de presión
- Corrección del valor de P1Max al recomendado por el manual (9,3 Bar)
- Verificación de la continuidad de una corriente de aire en el post enfriador para descartar obstrucción con agua
- Limpieza de la válvula de control, y pulido de sus componentes

Porcentaje de avance: 100%

Reparación y puesta en valor de las dos líneas de dosificación de carbón activado

Objetivo: restablecer el normal funcionamiento del sistema de dosificación del carbón activado en polvo.

Descripción: se realizó el mantenimiento integral, limpieza y ajuste de todas las partes electromecánicas de los dos equipos de dosificación de carbón activado, además de la limpieza y ajuste de bornes del tablero eléctrico. Se probó el funcionamiento de cada línea por separado, logrando un resultado positivo en cada caso.

Porcentaje de avance: 100%

Incorporación de nuevas máquinas, herramientas y puesta en valor de las actuales de gran porte en Taller
Objetivo: actualizar y renovar el parque de herramientas del Taller de Mantenimiento.
Descripción: se realizó la puesta en valor por parte del personal del Taller de Mantenimiento Mecánico de la máquina agujereadora radial.



Máquina agujereadora del Taller de Mantenimiento

Por otra parte, a partir de la gestión de inversiones del 2025, se incorporaron las siguientes máquinas y herramientas, las cuales se encuentran en proceso de instalación.

- Guillotina hidráulica CNC
- Plegadora hidráulica CNC
- Taladradora fresadora
- Fresadora Industrial
- Sierra sin fin







Nueva maquinaria del Taller de Mantenimiento

Porcentaje de avance: 100%

Instalación de un banco de baterías para la alarma general de planta

Objetivo: garantizar la continuidad operativa de la alarma general de planta.

Descripción: se realizó la selección de una UPS, que fue entregada bajo la OC N°79400 adjudicada al proveedor DIGILOG S.A. Los trabajos necesarios para la instalación de la misma se encuentran en proceso.

Porcentaje de avance: 80%

Reparación de las bombas A y B contra Incendio de la zona sur

Objetivo: restablecer el normal funcionamiento de los equipos de bombeo contra incendio.

Descripción: ambas bombas fueron reparadas en el Taller. En los dos equipos se reemplazaron los rodamientos, aros de desgaste, casquillos de eje y mecanizado, bulonería, empaquetaduras, limpieza, arenado y pintura. Al montar la bomba A, se tuvo que adaptar un nuevo motor que tenía una base diferente a la original.



Bomba A de servicio contra incendio

Porcentaje de avance: 100%

Obras de expansión

Ampliación Capacidad de Potabilización (SA 851)

Objetivo: incrementar la capacidad de producción de agua potable de la planta, en aproximadamente un 50% por encima de la capacidad instalada, para hacer frente a la creciente demanda.

Descripción: obra sin avances en 2025.

Porcentaje de avance: 52,30%

Construcción de Río Subterráneo Sur + EE N°1 (SA853 + SA864)
Objetivo: transporte y elevación del agua potable producida por los nuevos módulos de ampliación.
Descripción: obra sin avances en 2025.
Porcentaje de avance: 73,97%
Nueva Estación Elevadora de Agua Cruda – 1° Etapa (SA852)
Objetivo: construcción de una nueva estación elevadora de agua cruda, con la capacidad suficiente para elevar los nuevos volúmenes de producción.
Descripción: obra sin avances en 2025.
Porcentaje de avance: 30,94%

Planta San Martin

Mejoras Operativas y de mantenimiento

A continuación, se mencionan las obras de mejora y mantenimiento realizadas en Planta San Martín.

Elevación

- **Instalación de caudalímetros en Sala Nueva de Agua Cruda:** se instaló un caudalímetro por tiempo de tránsito en la impulsión de la bomba elevadora Nº9. Para ello, se realizaron tomas en carga en la cañería de impulsión, donde posteriormente se colocaron los transductores del instrumento. Se ejecutó el cableado correspondiente, tanto de la alimentación eléctrica como de la señal de reporte. Finalmente, se programó el instrumento y se corroboró su correcto funcionamiento una vez puesta en marcha la bomba.



Decantación

Mantenimiento de instalaciones

Sector A1

- Reparación y modificación de caja reductora para la válvula de alimentación 20-1-1 del decantador n°20.



Sector B

- **Limpieza en el decantador pulsator N°3** (fecha de Inicio 24/03/25 - fecha de finalización 12/04/25).
- **Mantenimiento preventivo del tamiz.** Revisión del tensado de la cadena del tamiz y desgaste de los componentes internos.



Limpieza en el decantador pulsator N°4 (Fecha de inicio 16/04/24 - Fecha de finalización 12/05/25)



Limpieza en el decantador pulsator N°1 (Fecha de inicio 13/05/24 – fecha de finalización: 2/6/25).



Renovación de 3 válvulas manuales y 5 de extracción de fango.





Limpieza del decantador pulsator n°2 (Fecha de inicio: 03/06/25 – Fecha de finalización: 23/06/25)







Mantenimiento caudalimetro de agua cruda de entrada al sector B

Se realizó mantenimiento del caudalímetro dado que el mismo presentaba corrosión entre los conectores de alimentación debido a que la cámara donde se encuentra el instrumento se inundó por una pérdida de agua de la red interna. Se limpió el instrumento, y se verificó su programación y correcto funcionamiento. Finalmente, se verificó toda la cadena de transmisión.



Sector C

- **Recambio de soplador N°1 del sistema de vacío de los sifones.**

Se realizó la instalación de un nuevo soplador marca REPICKY en reemplazo del antiguo equipo marca HIBBON que ya no contaba con repuestos originales ni servicio técnico. Para su instalación, se realizó un nuevo anclaje al piso, nuevo tendido de cañerías de entrada y salida en material PEAD y electrofusión. Por último se realizó el conexionado y la puesta en servicio.






Se realizó la instalación de un variador de velocidad en el soplador de vacío. Dicho trabajo fue realizado para disminuir tanto la corriente de arranque como para reducir el estrés mecánico del equipo y prolongar así su vida útil.



- **Montaje del tamiz N°3 de Cámara N° 7.**

El domingo 23 de marzo entre las 6 am y las 12 pm se realizó el calafateo de la compuerta correspondiente al tamiz N°3. Con la asistencia del equipo de buceo se logró sellar el paso de agua desde la cámara N°7 al recinto del tamiz. Esta tarea permitió efectuar el achique y luego el montaje del tamiz para su puesta en servicio.

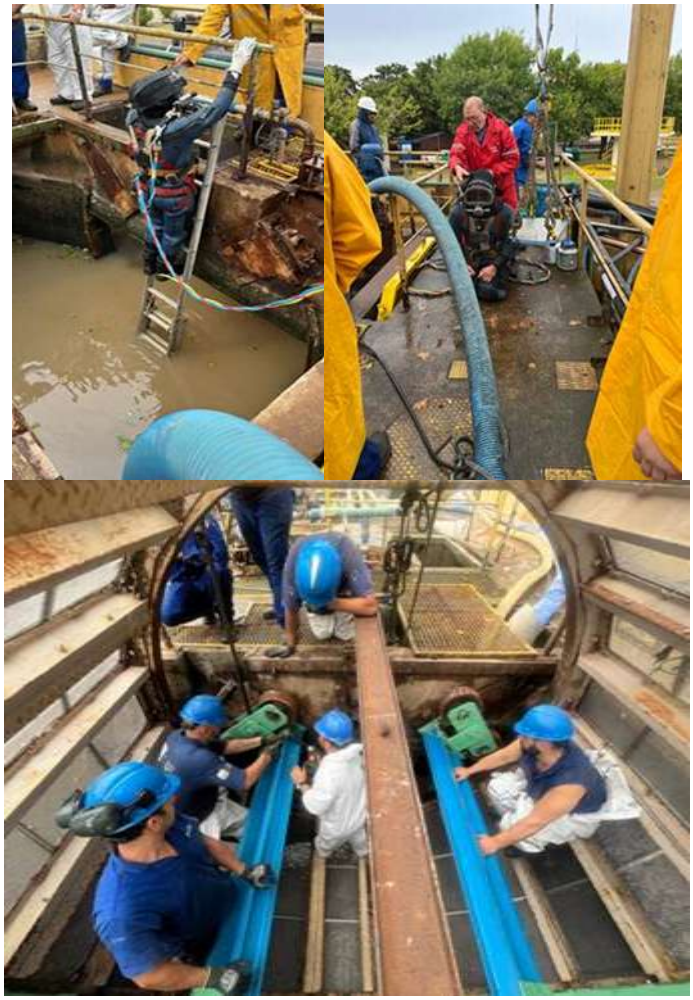

- **Limpieza del decantador pulsator n°3** (Fecha de inicio: 7/7 – Fecha de finalización: 8/8)

Se realizó la limpieza el total de las tolvas quedando en óptimas condiciones favoreciendo la extracción de fango. Se encontró gran taponamiento de los conductos de alimentación, producto del pasaje de residuos.




Antes de la limpieza








Luego de la limpieza

- **Limpieza decantador pulsator n°4** (Fecha de inicio 11/08/25, Fecha de finalización: 15/9/25).

Se encontró gran taponamiento de los conductos de alimentación, producto del pasaje de residuos.







- **Limpieza de decantador pulsator n°1** (Fecha de inicio 16/09/25 – fecha de finalización: 6/10/25).







- **Limpieza decantador pulsator n°2** (Fecha de inicio 07/10/25- Fecha de Finalización 31/10/25).



Filtración

Obra civil

- **Reparación y restauración de compuertas y recatas de alimentación de Filtros impares en la Batería XI.**

Se realizaron las reparaciones de las unidades N°1, 3, 5, 7, 9 y 11 en las cuales se rellenaron los bordes de las compuertas y se enderezaron todas las recatas en taller de Mantenimiento.



- **Reparación de tapa de falso fondo y colocación de deflector en unidad N°9 de la Batería de Filtros XI**



Obra electromecánica

- **Batería XII. Filtro N°2.** Se realizó el cambio de las válvulas de insuflación. Las dos válvulas tenían un notorio deterioro, que producía un constante ingreso de agua a la galería de la batería generando el funcionamiento de las bombas de achique constante.





- **Batería XII. Filtro N°4. Reparación del actuador de la válvula de drenaje.** Se desarmó el actuador de la válvula de drenaje del filtro 4 de la batería XII y se la trasladó al taller donde se procedió a cambiar los rodamientos deteriorados por bujes fabricados íntegramente en el taller. Luego del cambio y las pruebas pertinentes se volvió a colocar y se comprobó el perfecto funcionamiento junto a la válvula. El filtro quedo nuevamente en servicio.





- **Batería XII. Cambio de válvulas de lavado superficial**

En concordancia con la parada de las bombas de sala Elevadoras Principales se lograron establecer las condiciones para realizar el cambio de dos válvulas de lavado superficial en los filtros 2 y 3 de la batería XII.



- **Batería X**. **Recambio de válvulas de agua para lavado superficial.** En coordinación con el operativo de montaje del tamiz N°3 en cámara N°7, se programó el cambio de dos válvulas de lavado superficial en dos filtros de Batería X (filtro N°7 paño sur y filtro N°2 paño norte). En dicho operativo se bajó el nivel del canal de agua decantada a valores que permitieron trabajar sobre las válvulas. En condiciones normales de operación, este trabajo no se puede realizar por el excesivo caudal sobre las válvulas a intervenir.



Luego se modificaron las trasmisiones de ambas válvulas de lavado superficial. Se modificaron los vástagos para adecuarlos a las válvulas y actuadores nuevos y además se puso en valor las camisas que estaban deterioradas.



- **Sector “B”.** Se realizó el cambio de eyectores de agua de lavado superficial dañados en todos los filtros del sector.




- **Sector B. Filtro N°10.** Se realizó el cambio de válvula de 500mm de agua de lavado.



Luego del recambio de la válvula de agua de lavado del filtro 10, se procedió al cambio de la válvula a reserva también deteriorada. Se reemplazó por primera vez por una válvula mariposa.



La instalación de la válvula se realizó con un carretel desarrollado por oficina técnica. Luego de la colocación de la válvula se hicieron todas las pruebas necesarias para dejar el filtro nuevamente operativo.

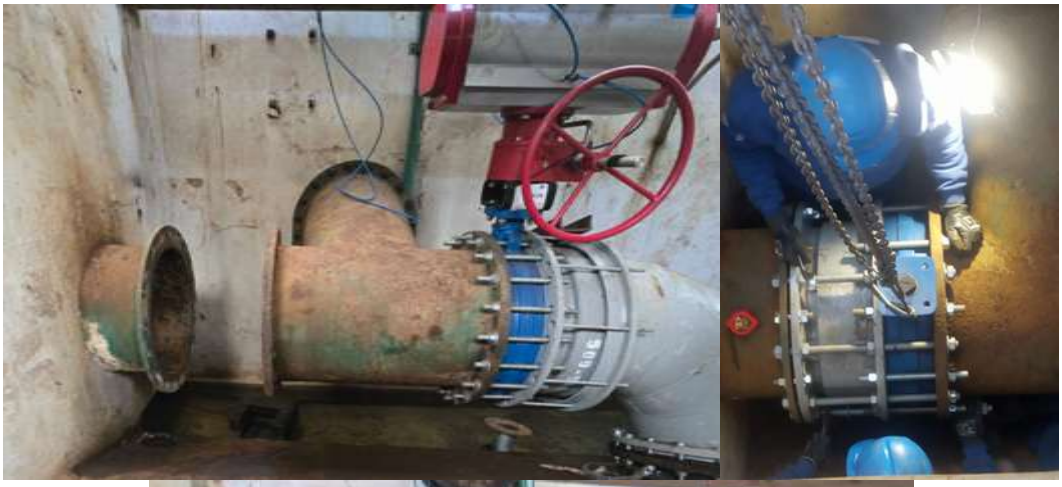



- **Batería III. Filtro N°8. Cambio de actuador en la válvula de alimentación de agua decantada.** Se determinó con varias pruebas que el actuador neumático se trabo indefectiblemente y se procedió a su cambio. Una vez realizado, el filtro quedo nuevamente en servicio. El actuador anterior tenía el pistón quebrado.





- **Batería III. Filtro N°4. Cambio de válvula de agua de lavado.** Se procedió al desmontaje de la válvula existente y posterior montaje de la válvula DN 600 y los dos carreteles que se reacondicionaron. Se reinstalo el actuador y se dejó nuevamente el filtro en servicio.





- **Batería IV. Filtro N°1. Cambio de válvula de agua de lavado.** Se procedió al cambio de la válvula DN 600 de agua de lavado. Este cambio se realizó en varias etapas, primero se sacó la válvula junto a los carretes. Luego se revisó el espesor de los carretes, se verifico que estaba dentro de las especificaciones para ese diámetro, se procedió a la limpieza de ambos carretes y al pintado con pintura epóxica. Luego se procedió a la reinstalación, dejando nuevamente el filtro en servicio.



- **Batería I**. **Filtro N°4. Reparación sistema de Drenaje.** Se renovaron los anclajes y se reinstalo el plato de drenaje totalmente reparado en el taller. El filtro quedo nuevamente en servicio.



Sistema de agua para lavado de filtros

- Se realizaron mantenimientos correctivos en Bombas N°3 y N°4 de la Sala de agua para lavado de filtros.

Instalaciones

- **Mantenimiento de Filtros Batería IX a XII Tercera Etapa (OC 73.272).**

Entre enero de 2023 y junio de 2025, se desarrollaron los trabajos para el mantenimiento integral de las unidades y asegurar niveles óptimos de los mantos filtrantes de:

- Batería IX: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 11
- Batería X: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11 y 12
- Batería XII: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12

Las tareas realizadas consistieron en:
- Reparaciones de falso fondo
- Recambio de toberas rotas
- Hidrolavado y limpieza de cajas y sistema de lavado superficial
- Tamizado de arena para retiro de residuos
- Compensación y nivelación de arena

Dosificación de productos químicos

Coagulante

- **Dispersor de coagulantes Sector B (OC 74.930).**

La obra se ejecutó entre junio de 2023 y abril de 2025, fecha del acta de trasferencia de la misma. Su objetivo fue mejorar la inyección de coagulante con el fin optimizar su mezcla, conseguir que sea más rápida y por ende lograr un ahorro en este insumo químico. Las tareas contemplaron:

- Achique de la cámara 6 para evaluación y limpieza de las recatas existentes.
- Fabricación de patines de teflón y sistema de izaje.
- Construcción de carreteles y cañería de agua de arrastre.
- Armado de cañerías para coagulantes.
- Instalación del difusor y bomba de agua de arrastra.
- Instalación embudo dosificador y acople de cañerías de coagulante.




- **Trabajos en la sala de bombas y piletones de coagulante**. Se cambió una bomba de transvase de sulfato de aluminio que presento roturas en la carcasa generando pérdidas. Por otro lado se cambió la válvula de ingreso de trasvase del piletón 2 de sulfato de aluminio.



- **Mantenimiento preventivo de los dispersores de coagulante a los sectores A1 y A2.**

Se realizó el mantenimiento preventivo de los dispersores ubicados en Cámara N° 9 y N° 10.



- **Cal**

- **Dosificación de agua de Cal (CA70022).** Entre enero y marzo, se iniciaron las pruebas de revisión del funcionamiento de las instalaciones de la Planta de cal. Las mismas consistieron en:


✓ Medición de vibraciones bombas agua filtrada. Diagnóstico y propuesta de correcciones
✓ Medición de vibraciones en bombas de agua de cal. Diagnóstico y propuesta de correcciones
✓ Revisión del cálculo del cable de bomba 3 y 4 de agua de cal 4 mm^2 para 30 A.
✓ Revisión de operación y correcciones de TGBT de Agua filtrada y agua de cal. Correcciones en tableros eléctricos y automatismos Agua filtrada. Modificación del circuito de comando, para conmutación con selectora manual

- ✓ Relevamiento en la sala de drenajes de saturadores. En el mismo, se determinó que se debe fabricar un colector para las cuatro descargas a drenaje hasta tanto se ponga en marcha las instalaciones e tratamiento de barros.
- ✓ Pruebas y correcciones de bombeo de agua filtrada, dosificación de agua de cal (con agua), funcionamiento de puentes y agitadores.
- ✓ Pruebas realizadas en bombas peristálticas y sistema de extracción de barros
- ✓ Realización de cañería para expulsión de aire de bombas de dosificación
- ✓ Pruebas de lazos de control y lógicas de funcionamiento.







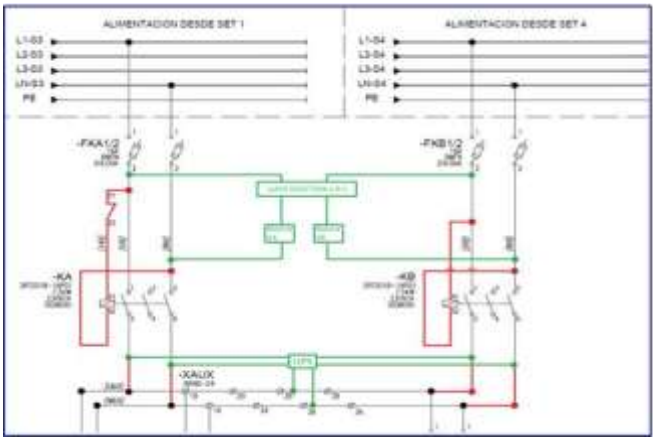


A partir de mayo de 2025 se comenzaron las pruebas de puesta en marcha de la Planta de Agua de Cal, que se siguen realizando con la finalidad de lograr optimizar el sistema en modo automático, tanto para la

preparación de agua de cal (con las bombas de agua filtrada regulando en base a un por nivel objetivo de cisterna de agua de cal y las bombas de lechada de cal regulando en base a una concentración objetivo de preparación de agua de cal), como para la dosificación (con las bombas de agua de cal regulando en base al pH objetivo de cada reserva).

- ✓ Primeras 4 semanas: pruebas de 8 a 20 h. Capacitación de las guardias de Calidad y Funcionamiento. Luego se mantiene la operación las 24 horas.
- ✓ Crucial la ubicación de puntos de muestreo de agua de cal en colector y luego en bajada de cada saturador, para identificar problemas de preparación (parámetros de seguimiento TAC y turbiedad). No contemplado originalmente.
- ✓ La operación remota se realiza a través de un servidor web del HMI ubicado en la Planta de Agua de Cal, configurado para replica de pantalla como una página de internet, accediendo solamente desde CPU de las guardias y en Jefatura. Sin historización de datos.
- ✓ Alimentación de lechada a saturadores solamente desde cisterna Norte.
- ✓ Posibilidad de dosificación de lechada de cal a reservas desde cisterna sur



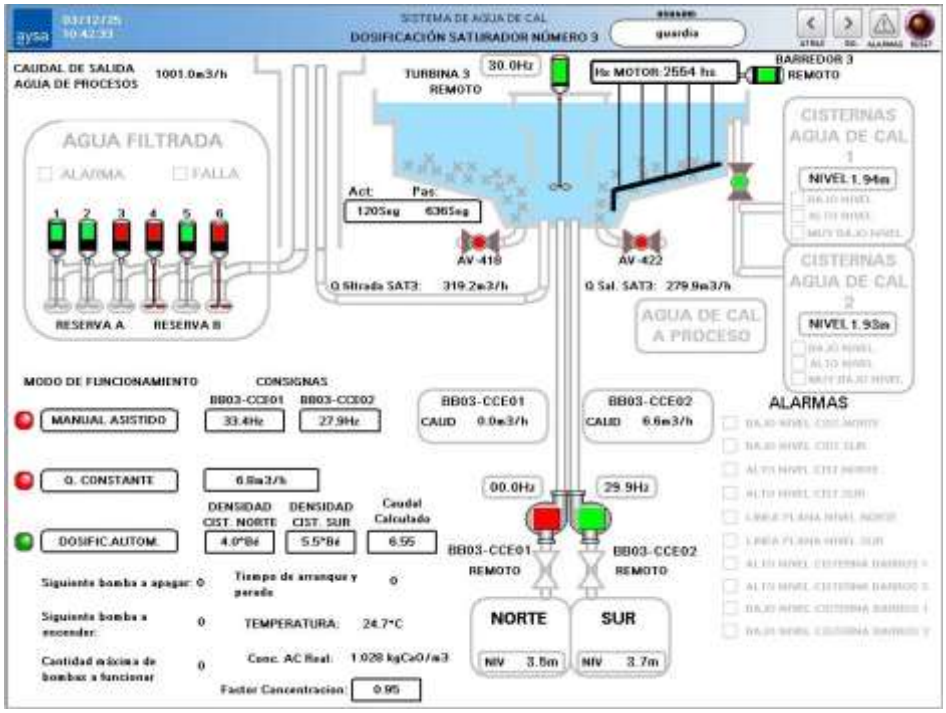

En septiembre de 2025 se entrega la Cisterna Sur de lechada de cal para instalación de bombas de alimentación a los saturadores, con lo que se desafectan las bombas de dosificación de lechada de cal a reservas, reduciendo así la capacidad de ajuste de pH.
En noviembre de 2025 se habilita la dosificación de lechada a los saturadores desde la Cisterna Sur. Además, se habilitan las bombas centrífugas para dosificación de lechada de la Cisterna Sur al Canal A y Auxiliar, sumadas a las bombas centrífugas ya existentes en la Cisterna Norte a dichos puntos de dosificación.

Próximos pasos.

- ✓ Resolver fallas regulación caudal de agua filtrada.
- ✓ Resolver fallas dosificación de agua de cal.
- ✓ Evaluar configuración de variadores o modificación a variadores regenerativos
- ✓ Evaluar perturbaciones hidráulicas dosificación a reserva J (Salida Norte) y E (Salida Centro).
- ✓ Minimizar los atascamiento bombas dosificadores de agua de cal.
- ✓ Continuar con el desarrollo de los modos de funcionamiento: Nivel constante cisterna de agua de cal y pH constante
- ✓ Poner en marcha el sistema de tratamiento de barros
- ✓ Cumplimiento de pH. Establecer condiciones de calidad de agua cruda y dosificación de coagulante y cloro, en las cuales el sistema podría no ser insuficiente.

- ➢ **Fabricación e instalación de tornillos transportadores de piedra de cal (OC 76361).**

El tornillo antiguo presentaba un bajo rendimiento debido al desgaste natural por uso y múltiples intervenciones de mantenimiento correctivo.
Se trabajó durante dos semanas en la remoción del tornillo existente e instalación de dos nuevos tornillos, los cuales permiten cargar al mismo tiempo 2 silos y otorgan mayor flexibilidad operativa al sistema de carga.
Se logró completar el recambio sin interrumpir el funcionamiento del sistema, trabajando en los horarios sin actividad de carga.








- **Limpieza de cisternas de lechada de cal. P**ersonal del área desobstructores efectuó la limpieza:

Cisterna Norte los días: 8/5- 2/6 - 3/6 - 31/07 – 01/08
Cisterna Sur los días: 9/5 - 18/6 - 19/6 - 30/07

- **Trabajos en los apagadores de cal viva.**

Se realizaron los siguientes trabajos para mejorar el sistema de producción de lechada de cal:

- Cambio del rodillo de ajuste y el sensor de cinta rota en apagador N°4.
- Cambio de paletas saca residuos en apagador N° 4. Se cambió la totalidad de las paletas saca residuos del apagador N°4 con el fin de mejorar la expulsión de los residuos que se generan en el proceso de apagado de CAL.
- Se detectó, en un mantenimiento preventivo, el defecto en un rodamiento en el apagador 2. Cuando se desarmo el equipo, se pudo verificar que el eje no sufrió daños por lo que solo se cambió el rodamiento defectuoso.

- **Cloro**

- **Cambio de válvula para la precloración al sector B**. Se detectó un gran deterioro en la válvula que se maniobra para la precloración al Sector B. se colocó una nueva.



- **Renovación de conexiones de cilindros de cloro en baterías de las Plantas de Cloro 1 y 2.** Se concluyó con el proyecto de renovación de todos los conjuntos, válvula automática niple reforzado y válvula aguja, en ambas plantas de Cloro. Los últimos cambios fueron de Batería N°1 de la Planta de Cloro I. El funcionamiento correcto de estas válvulas incrementa la seguridad a la hora de operar y mantener ambas salas de cloro.



  - Planta de cloro I

- **Mantenimiento correctivo del TGBT:**

Debido a reiteradas fallas, se decidió llevar a cabo una renovación de parte del circuito. El objetivo principal de las modificaciones fue permitir la desenergización individual de cada electroválvula asociada a los tambores de cloro de ambas baterías, facilitando así su intervención de manera segura y sin afectar el resto del sistema.
Como parte de esta renovación, se procedió a desmontar el PLC antiguo, que se encontraba fuera de servicio, con el fin de liberar espacio dentro del gabinete. Una vez realizada esta tarea, se diseñó el nuevo circuito de comando y se efectuó el cableado correspondiente. Posteriormente, se realizaron pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del nuevo circuito. Una vez confirmada su operatividad, se procedió al conexionado de los tambores de ambas baterías y de sus respectivos manifolds al nuevo sistema de comando. Además, se conectaron las señales y reportes necesarios al PLC para permitir el funcionamiento automático del sistema.
Finalmente, se retiraron todos los componentes obsoletos con el fin de optimizar el espacio y la organización del tablero.




A su vez, se realizó el mantenimiento preventivo general del TGBT, realizándose varias mejoras en los sistemas de protección.



- **Cambio de válvulas automáticas en batería 1**

Debido a que algunas válvulas automáticas en la batería 1 comenzaron a atascarse, y coincidiendo con un cambio de niples programado, se decidió reemplazar tres válvulas de diferentes de dicha batería. Se instalaron nuevas válvulas automáticas, niples y válvulas aguja, lo que garantiza la seguridad en las maniobras.

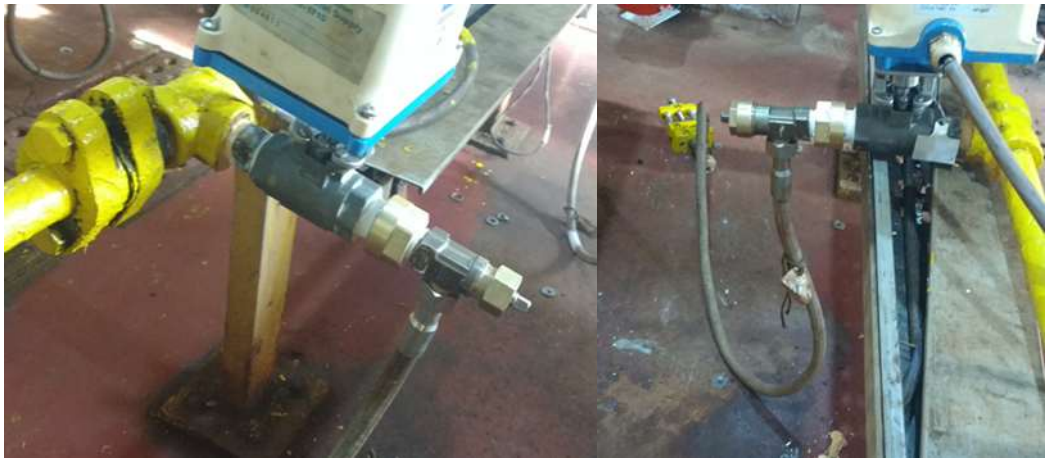

- Planta de cloro II

➢ **Reemplazo de válvulas**

Se cambiaron las últimas tres válvulas de cloro líquido que tenían los niples comprometidos por la corrosión.





➢ **Cambio de bomba de recirculación de agua en el evaporador 9.**

Se detectó una gran pérdida de agua en el evaporador 9, razón por la cual se procedió al cambio y se eliminaron las perdidas. El equipo quedo en servicio.



- **Polielectrolito**

- **Dosificación de polieletrolito al sector “A1”.**

Se procedió a realizar el cambio de la bomba de dosificación de polielectrolito al sector A1 por presentar problemas en el motor eléctrico.

- **Dosificación de polieletrolito al sector “A2”.**

Debido a un mal funcionamiento, se procedió al reemplazo del variador de la bomba de polielectrolito al sector A2. Una vez instalado el nuevo equipo, se realizaron las conexiones eléctricas correspondientes y se llevó a cabo su programación. Finalmente, se verificó el correcto funcionamiento del sistema. Adicionalmente, se detectó una falla en el actuador de la válvula asociada al mismo sector, lo que impedía el funcionamiento de la bomba en modo automático. Se realizó la reparación del actuador y se probó el sistema completo, corroborando su operación normal.





- **Sistema de Dosificación Polielectrolito en Sector B (OC 72.751).** A fines de 2022 comenzó la ejecución la obra para la instalación de un nuevo sistema de dosificación con el objetivo de disponer de redundancia para la preparación y dosificación de polielectrolito en el sector B. Se ejecutaron las siguientes tareas:
  - Provisión e Instalación de sistema de preparación de polielectrolito.
  - Provisión e Instalación de bombas dosificadoras.
  - Provisión e Instalación de cañerías, válvulas, soportes y accesorios.
  - Provisión e Instalación de caudalímetros electromagnéticos.
  - Instalaciones eléctricas, instalaciones de automatismo y control
  - Revisión del programa para realizar PEM y pruebas funcionales.



A julio de 2025 las tareas se encuentran finalizadas, pero para su operación aún falta conexión y visualización con sistema SCADA.

Sistemas energéticos

Obras

Mantenimiento de Instalaciones

- **Mantenimiento preventivo SET N°5** (O.T N° 5890641)

Se realizó el mantenimiento en dos etapas, primero la Sección n°2, dejando la Sección n°1 activa y viceversa.





- **Montaje y Puesta en Marcha de Tableros baja tensión Sala Impelentes (OC 74746).** Renovación del tablero eléctrico. Se reemplazaron los tableros de doble alimentación para la conmutación de los servicios internos, implementando una mejora operativa significativa: doble alimentación eléctrica individual para cada excitatriz estática, lo que permite cambiar la alimentación de un equipo a la vez. El tablero eléctrico también se reubicó por encima de la cota máxima de inundación.



- **Mantenimiento preventivo de tableros bombas elevadoras de agua cruda N°1 a N°5.** El día 26/06 se realizó la inspección de Río Subterráneo en el tramo de PSM - Devoto y Barrancas –


Saavedra, requiriendo una parada programada de las EE Saavedra, Devoto, Villa Adelina I, Villa Adelina II, Villa Adelina, Morón y Tres de Febrero. Previendo la posibilidad de disminuir la producción de PSM, se programó la parada de las bombas N°1 a N°5 de Sala Elevadoras Principales, para realizar el mantenimiento preventivo de los tableros de potencia.



- **Mantenimiento preventivo en sub estación transformadora N°4.** Se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente al año 2025, se limpiaron los equipamientos y se revisaron todas las instalaciones de la SET.



- **Mantenimiento preventivo en tableros de potencia y comando de Sala de Cal.** Se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente, se acondicionaron los equipos y se revisaron todas las instalaciones.

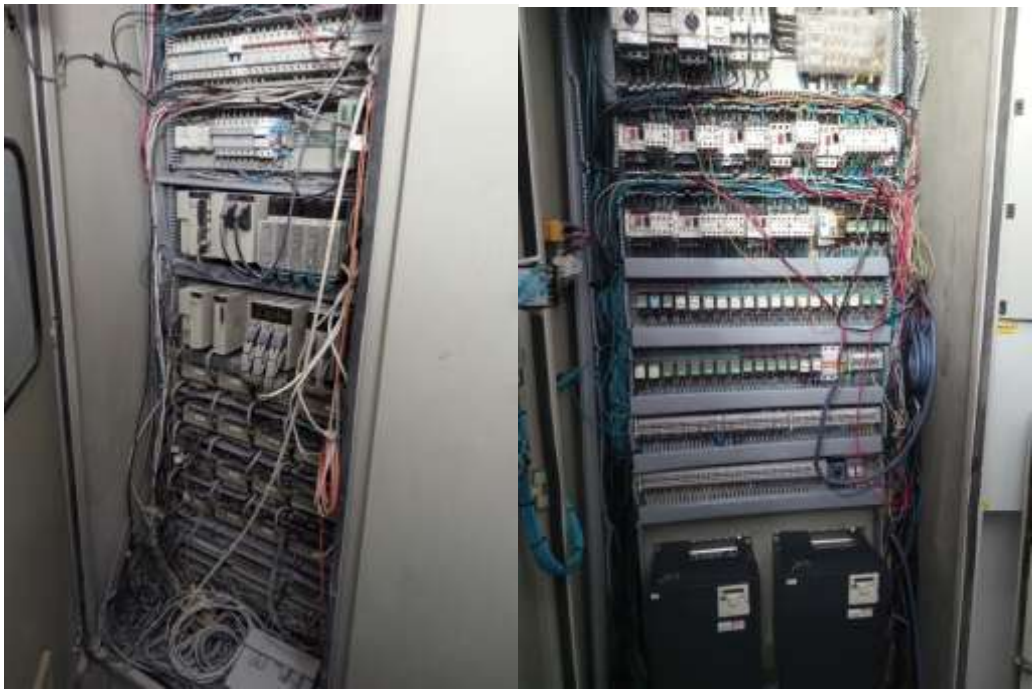

- **Mantenimiento preventivo en sub estación transformadora N°2.** Se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente al año 2025, se limpiaron los equipamientos y se revisaron todas las instalaciones de la SET.

Drenajes

Drenaje A

- **Mantenimiento Preventivo del TGBT (O.T N° 5837807).** Se realizó el mantenimiento preventivo. Se mejoró la identificación en los tableros.



- **Renovación del sistema de impulsión en el manifold**. La sala de bombeo denominada Drenaje A, recibe el aporte de agua del lavado de los decantadores de los sectores A1, A2, B y C; y de los filtros de las baterías I, II, III y sector B. La sala cuenta con 3 equipos de bombeo cuya impulsión confluye en un manifold, el cual presentaba pérdidas por deterioro de las 3 cañerías y respectivas válvulas de retención y de cierre. El deterioro de estas últimas provocaba que, ante la parada de las bombas, se generara un cierre brusco con grandes vibraciones en los cuerpos de cañería agravando su daño.




Estado previo a la renovación.

Dada la antigüedad de las instalaciones, el recambio de las secciones requirió de trabajos especiales para la adaptación de las piezas, como por ejemplo la confección de bridas cortando a medida el para poder ensamblar las secciones con la cañería principal (norma OSN).



Esta unión entre los caños, la válvula de retención y la válvula antigua llevó además una junta de desarme para absorber cualquier diferencia. En el Taller de Mantenimiento de la Planta se diseñó un sistema para realizar el reemplazo de las piezas afectando mínimamente la operación.

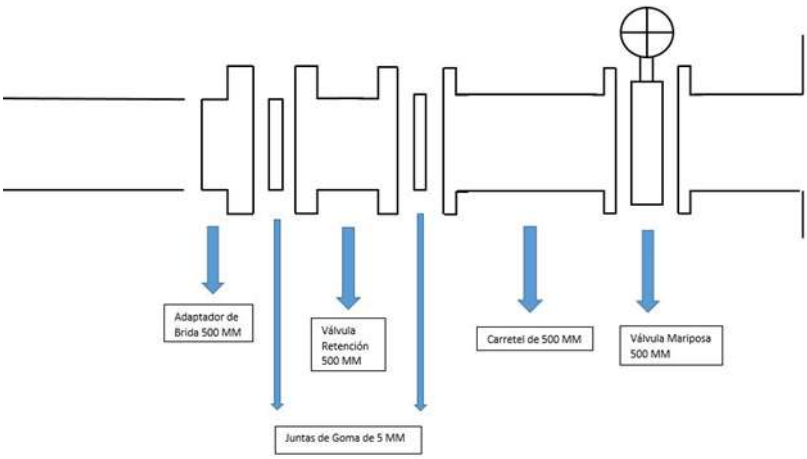

Nuevo manifold Drenaje A

Se ensamblaron en taller todas las piezas para ser trasladadas a la zona de trabajo y verificar las medidas, previo al montaje.



Antes de la intervención, se montó en el brocal N°1 una bomba de pozo de 1000 m3/h con cañería móvil para disponer de un sistema de bombeo bypass para absorber cualquier pérdida que pudiera presentarse luego de realizadas las maniobras por parte de Producción y Calidad, para garantizar la desafectación del drenaje.

Con dos grupos de trabajo en simultáneo, se procedió a la intervención planificada. Se realizaron los cortes y montaje de las piezas correspondientes a las impulsiones de las posiciones de las bombas N°1 y 2 en una primera etapa, y luego se procedió de igual forma en la posición de la bomba N°3.





Las tareas se desarrollaron en un lapso de 7 horas, con un total de 12 personas de mantenimiento mecánico avocadas a las mismas.



Estado luego de la renovación.

La renovación de las instalaciones permitió:

- eliminar las pérdidas del sistema de bombeo, mejorando el mantenimiento integral y limpieza de la sala correspondiente.
- minimizar el riesgo de inundación y deterioro consecuente de las instalaciones.
- aumentar significativamente la eficacia del cierre de las válvulas de retención que, al tener un sistema de contrapeso, minimizan los impactos bruscos y vibraciones de las cañerías asociadas aumentando su durabilidad.

Drenaje B

- Cortocircuito en cable de alimentador en SET 4. Se procedió a la excavación y retiro de cable mordido que generaba cortocircuito en el interruptor de alimentación.





- **Mantenimiento Preventivo del TGBT.** Se realizó el mantenimiento preventivo. Se mejoró la identificación en los tableros.







Depósitos, oficinas, parques

- **Balizas de emergencia**

Se realizó la instalación y el cableado de balizas de emergencia para replicar la alarma de evacuación en sectores donde la misma no se escucha correctamente. Dichos sectores fueron:

- Oficina de operador de cal
- Oficina de operador en Impelentes Principales
- Subsuelo de filtros de Sector B
- Subsuelo de Batería XI
- Subsuelo de Batería XII







- **Mejoras en sistema de muestreo para control de calidad del proceso.**


La división de Mantenimiento, en colaboración con la división de Calidad, realizó un relevamiento del estado de los tableros de comando y, junto al área de Automatismo, se estableció la disponibilidad de entradas y el estado de la programación de las señales para generar el reporte de marcha de las bombas de muestreo en la pantalla “Puntos de Muestreo de Calidad” en el sistema SCADA Topkapi. A continuación, se detallan las tareas realizadas en cada punto de muestreo.

Caseta 1 (Río Norte) - Caseta 2 (Sector A2) - Caseta 3 (Sector C) - Caseta 4 (Sector A1) y Caseta 12 (cámara 1):

- Cableado y conexionado de señales de marcha en el PLC.
- Verificación en Topkapi.


Caseta 5 (Canal Auxiliar y Batería IX/XI):

- Renovación integral del tablero de comando.
- Recableado y conexionado de bombas de muestreo.
- Cableado y conexionado de señales de marcha en el PLC.
- Verificación en Topkapi.

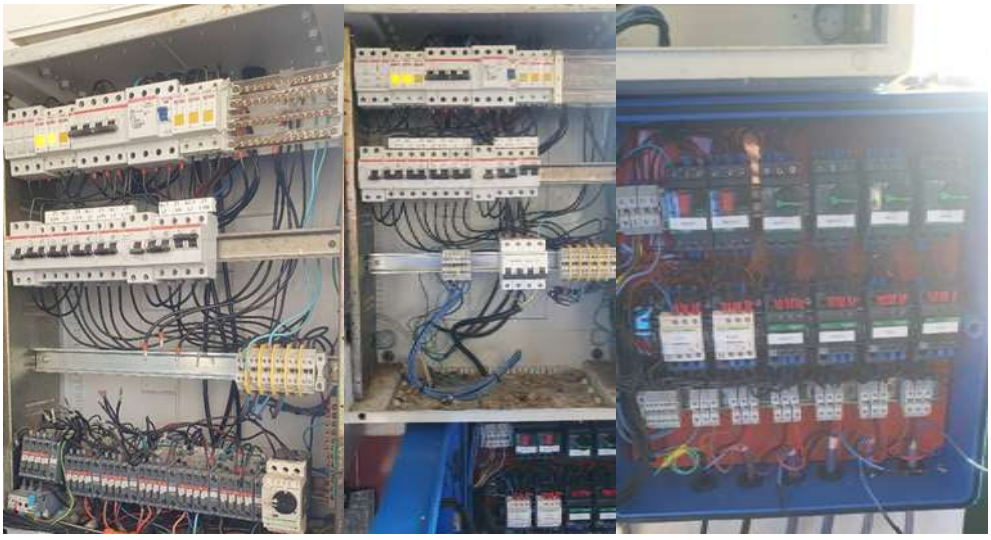

Caseta 9 (Río Sur)

- Renovación integral del tablero de comando.
- Recableado y conexionado de bombas de muestreo.
- Cableado y conexionado de señales de marcha en el PLC.
- Verificación en Topkapi

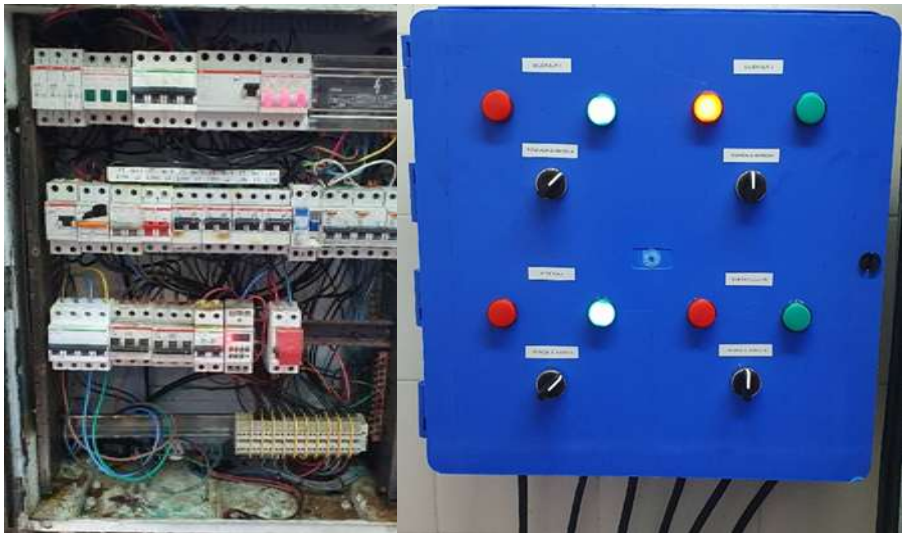

A continuación, se presenta el estado actual de los reportes en Topkapi.

- **Caudalímetro aporte de agua decantada al Lago Regatas.** Se identificó que éste se apagaba de forma intermitente y, al realizar mediciones, se determinó que había un problema en la fuente interna del instrumento. Se desinstaló el mismo y se procedió a su desarmado en el taller. Se identificaron componentes de la fuente en mal estado, los cuales fueron cambiados. Finalmente se reinstaló la electrónica en el punto de medición y se verificó su correcto funcionamiento y reporte en sistema SCADA Topkapi.
- **Mantenimiento correctivo en la balanza de camiones.** El día 2/6/2025 se detectó un error en el funcionamiento del indicador de la balanza, quedando el equipo fuera de servicio. Al contactar al fabricante del equipo, se indicó que presentaba una falla en una de las celdas de la balanza o de entrada al indicador. Se realizó su reparación y posterior calibración.

- **Reacondicionamiento del sector de bombas en Impelentes ribereñas.** A su vez, personal de Ensachetadora, continúo con el reacondicionamiento en el Sector de bombas en Impelentes ribereñas, llevando a cabo las siguientes tareas:
    - Desarme tablero principal esquinero, baterías en desuso, bombas de refrigeración y cebado
    - Armado y soldado de baranda circulación zona pupitre
    - Pintado baranda superior de sala
    - Pintado escalera y colocación de anti deslizantes
    - Pintado portones zona norte
    - Hidrolavado general






- **Retiro de residuos peligrosos (asbesto).** El mismo fue asignado, a la empresa Contratista. con la OC 78795. El día 29/7 se dio comienzo a las tareas de recolección, adecuación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos caracterizados como peligrosos corriente Y36 Asbestos. Dichos residuos de generación eventual, corresponden a conductos de fibrocemento con asbestos los cuales han sido retirados de las instalaciones originales de los decantadores N° 3 y 4 del Sector B. Se procedió al retiro y disposición de 26.340 kg de materiales contaminados con asbestos.






Instalación de variador (7) ATV6000 Estación de bombeo R9

Durante el mes de mayo se dio inicio al proceso de recambio del variador N. º 7 de la estación elevadora de salida R9. Como primera etapa se realizó el desmontaje del equipo existente, lo que permitió liberar el espacio necesario para la nueva instalación.





Posteriormente, el personal de mantenimiento mecánico efectuó el relevamiento de medidas y construyó una nueva base estructural, adecuada para soportar el nuevo variador, asegurando la estabilidad del equipo y la accesibilidad para futuras tareas de mantenimiento.

Durante los meses de junio y julio se completaron las tareas de montaje e instalación del nuevo variador. El personal de mantenimiento realizó la instalación de bandejas porta cables y el tendido de los conductores de señal y potencia, garantizando una correcta conexión eléctrica y el adecuado funcionamiento del sistema. Posteriormente, se iniciaron las tareas de pre comisionado y puesta en marcha a cargo del proveedor Schneider.





Instalación de variador (5) ATV6000 Estación de bombeo R9

Durante el mes de septiembre se continuó con el proceso de recambio de los variadores de frecuencia en media tensión. En esta oportunidad, el recambio correspondió al equipo N. º 5. El personal de mantenimiento mecánico realizó el desmontaje del equipo existente, así como el montaje y la nivelación de la nueva base estructural.



Durante el mes de octubre se instalaron nuevos soportes para las bandejas del tendido eléctrico y se soldaron los soportes correspondientes al piso técnico. Asimismo, se trasladaron los variadores originales y las campanas de extracción, dejándolos bajo resguardo.

Adicionalmente, se realizó el ajuste completo del piso técnico en el entorno del variador. Por su parte, el sector de Instrumentación finalizó el armado de las bandejas portacables y el tendido de los cables de señal desde el PLC hasta el variador. Los primeros días de noviembre, se iniciaron las tareas de pre comisionado y puesta en marcha a cargo del proveedor Schneider.

Instalación de arrancadores suaves en Bombeo de barros 701:

El personal de mantenimiento realizó el recambio de los interruptores eléctricos originales de tipo estrella-triángulo por arrancadores suaves en los 3 (tres) equipos de bombeo utilizados para el bombeo de los barros del proceso de lavado de filtros.

Esta mejora permite optimizar el control de arranque y parada de las electrobombas, brindando un funcionamiento más eficiente y seguro. Además, se reduce significativamente el impacto mecánico sobre las válvulas de retención, minimizando los golpes hidráulicos y prolongando la vida útil del sistema.

La implementación de arrancadores suaves representa un avance en la confiabilidad operativa y en la protección de los componentes del sistema de bombeo.



Instalación de protección mecánica en SET R9

Debido a la imposibilidad de poder ingresar a la sala de transformadores de media tensión ya que la sala de trasformadores carecía de una condición segura para realizar intervenciones y mantenimientos preventivos, se realizó una pequeña obra para poder instalar un tabique separador con un material aislante.

Con esta mejora, personal de mantenimiento eléctrico puede ingresar a la sala de trasformadores y realizar trabajo sin riesgo y sin desafectar el servicio.



Renovación y recambio de portones metálicos

Durante el mes de julio, mediante un contratista de la DAL, se llevaron a cabo tareas de reemplazo y readecuación en los portones metálicos de ingreso a la Planta de Carbón Activado, así como en el portón metálico de acceso a la sala de motores, lado sur, de la Estación Elevadora de Salida (R9).



Obras de Mayor envergadura de Estaciones Elevadoras

GRUPOS DE BOMBEO:

Mantenimientos de Bomba:

EE MOR Grupo N°4 01/25 B4 Cambio de sello mecánico
EE LAN Grupo N°4 03/25 B4 Buje de prensa y primera estrella.
EE VA1 Grupo N°6 03/25 B6 Cambio de extremo líquido.
EE DEV Grupo N°3 05/25 B3 Mantenimiento preventivo.

EE FLO Grupo N°5 06/25 B5 Mantenimiento integral.
EE SAA Grupo N°6 06/25 B6 Reparación en caja de rodamiento de bomba.
EE MOR Grupo N°6 06/25 B6 Reparación en cojinete y sello mecánico.
EE QUI Grupo N°3 08/25 B3 Reparación en cojinete.
EE QUI Grupo N°4 09/25 B4 Reparación en caja de rodamiento de bomba.
EE LAN Grupo N°6 12/25 B6 Mantenimiento integral.
EE QUI Grupo N°2 12/25 B2 Mantenimiento integral.
EE TF Grupo N°3 12/25 B3 Reparación.

Mantenimientos de Motores:

EE DEV Grupo N°3 05/25 M3 Mantenimiento preventivo.
EE SAA Grupo N°1 10/25 M1 Reparación por problemas de aislación.
EE VA Grupo N°1 10/25 M1 Reparación por problemas de aislación.
EE MAT Grupo N°6 11/25 M6 Reparación por problemas de aislación.
EE VA2 Grupo N°2 11/25 M2 Reparación por problemas de aislación.
EE VA1 Grupo N°5 11/25 M5 Reparación.
EE VA Grupo N°6 12/25 M6 Reparación.

Mejoras en Grupos de Bombeo:

EE CAB Grupo N°1 09/25 Puesta en Marcha de Variador de Velocidad

Grupos de Bombeo Fuera de Servicio al Finalizar el Año:

EE CEN Grupo N°3 Desde el 04/23, Bomba inactiva.
EE CEN Grupo N°1 Desde el 02/25, Variador fuera de servicio.
EE CON Grupo N°4 Desde el 03/25, Falla eléctrica en motor.
EE VA1 Grupo N°6 Desde el 06/25, Bomba en reparación.
EE VA Grupo N°5 Desde el 07/25, Falla en rodamiento de bomba.
EE FL Grupo N°2 Desde el 09/25, Mantenimiento de bomba.
EE SAA Grupo N°2 Desde el 10/25, Falla en caja de prensa.
EE CEN Grupo N°4 Desde el 12/25, Falla en anillos rozantes de motor.

OBRAS Y MEJORAS DESTACADAS:

En las Estaciones Elevadoras se han realizado obras que permitieron aumentar la disponibilidad de electrobombas a los efectos de acompañar a la creciente demanda de agua, como así también la estética y la seguridad de los operarios e instalaciones.

Estación Elevadora Saavedra

Nuevos variadores de velocidad.

Se reactivó la obra en junio. Avance de la misma 70%.



Trabajos en Saavedra
Avance de obra 100% de todos.

- Renovación de los monitores de parámetros eléctricos en la totalidad de las electrobombas. De esta manera se obtendrán datos eléctricos más confiables.

- Se generaron en TopKapi las curvas de rendimiento para cada grupo de bombeo. Con esta mejora se tendrá un mayor control sobre el funcionamiento de las electrobombas.

- Pintura completa de la sala de hipoclorito.

Estación Elevadora Devoto

Trabajos en Devoto
Avance de obra 100% de todos.

- Nivelación de piso y colocación de rodapié en pasarela sobre la cañería del colector. Dicho trabajo representa un incremento en la seguridad del personal de la sala.



- Se generaron en TopKapi las curvas de rendimiento para los grupos de bombeo que se encuentran funcionando sobre la salida a San Martin. Con esta mejora se tendrá un mayor control sobre el funcionamiento de las electrobombas.

Estación Elevadora Lanús

Trabajos en Lanús

Avance de obra 100% de todos.

- Se llevó a cabo la instalación de una segunda bomba dosificadora de hipoclorito de sodio. De esta manera, en caso de ser necesario, se tiene un refuerzo en la cloración del agua a servicio, teniendo en cuenta el gran caudal de agua que bombea la sala.



- Renovación de los monitores de parámetros eléctricos en la totalidad de las electrobombas. De esta manera se obtendrán datos eléctricos más confiables.

- Se generaron en TopKapi las curvas de rendimiento para los grupos de bombeo que funcionan en la línea del Rebombeo Temperley. Con esta mejora se tendrá un mayor control sobre el funcionamiento de las electrobombas.

Estación Elevadora Quilmes

Trabajos en Quilmes

Avance de obra 100% de todos.

- Reparación y colocación de compresor de sistema antiariete con mano de obra propia. De esta manera se agilizaron tiempos y se logró mayor confiabilidad en el sistema.



- Recambio de cañerías de refrigeración en los cinco grupos de bombeo.

- Reparación de pérdida en codo superior de cañería antiariete.

- Renovación de los monitores de parámetros eléctricos en la totalidad de las electrobombas. De esta manera se obtendrán datos eléctricos más confiables.

Estación Elevadora Paitovi

Trabajos en Constitución.

- Pintura de paredes y techo.
  Avance de obra 60%. No hubo avance con respecto al año pasado por falta de presupuesto.

Estación Elevadora Morón

Trabajos en Morón.

- Readecuación completa de taller y pañol de la sala. De esta manera se cedió un espacio para la construcción de una nueva oficina y espacio de trabajo para el sector de Mediciones.

Avance de obra 100%.



- Renovación de módulos de señal de Protecciones Eléctricas.
Avance de obra 100%.

- Instalación de nuevo caudalímetro de salida Red secundaria de agua Ituzaingo.
Avance de obra 95%. Todavía pendiente por reestructuración de Inspección de Obra.

- Renovación de los monitores de parámetros eléctricos en la totalidad de las electrobombas. De esta manera se obtendrán datos eléctricos más confiables.

Estación Elevadora de Tres de Febrero

Trabajos en Tres de Febrero

Avance de obra 100%

- Renovación completa de cañería de drenaje.
Avance de obra 100%.



Estación Elevadora Caballito

- Instalación de Variador de Velocidad en EB N°1. Con mano de obra de AySA

Avance de obra 100%



Trabajos en Caballito

Avance de obra 100% de todos.

- Mejoras en vinculaciones para asegurar la continuidad de las masas, según informe de PAT. En materia de HyS, es una mejora fundamental.

- Se llevó a cabo la instalación de una segunda bomba dosificadora de hipoclorito de sodio. De esta manera, en caso de ser necesario, se tiene un refuerzo en la cloración del agua a servicio, teniendo en cuenta el gran caudal de agua que bombea la sala.

- Renovación de los monitores de parámetros eléctricos en la totalidad de las electrobombas. De esta manera se obtendrán datos eléctricos más confiables.

Estación Elevadora La Matanza

- Reacondicionamiento de automatismo.

Avance de obra 80%



Trabajos en La Matanza

Avance de obra 100% de todos.

- Instalación de fichas de conexión con su correspondiente cableado en dos interruptores.



- Reparación y adecuación eléctrica para funcionamiento de actuador de colector principal.

- Renovación de los monitores de parámetros eléctricos en la totalidad de las electrobombas. De esta manera se obtendrán datos eléctricos más confiables.

- Instalación de nuevas cañerías de agua, en el sanitario de sala de válvulas.

Estación Elevadora Villa Adelina

Trabajos en Villa Adelina.

- Adecuación del depósito de combustible.

Se finalizó la obra.



- Renovación de los monitores de parámetros eléctricos en la totalidad de las electrobombas. De esta manera se obtendrán datos eléctricos más confiables.

Estación Elevadora Villa Adelina I

- Sin Novedades.

Estación Elevadora Villa Adelina II

- Sin Novedades.

Estación Elevadora Centro

Trabajos en Centro.

- Renovación de los monitores de parámetros eléctricos en la totalidad de las electrobombas. De esta manera se obtendrán datos eléctricos más confiables.

- Se generaron en TopKapi las curvas de rendimiento para cada grupo de bombeo. Con esta mejora se tendrá un mayor control sobre el funcionamiento de las electrobombas.

- Pintura completa de la sala de hipoclorito.

- Pintura completa del pupitre de comando.



Estación Elevadora Floresta

Trabajos en Floresta

- Obra de renovación de MT y BT. Instalación de Variador de Velocidad. Avance del 40%. Esta obra se reactivó en junio de 2025.



- Mantenimiento completo en bombas depresoras de napas. Avance del 100%.

Obras de Mayor envergadura en Pozos de Agua y Rebombeos

Las obras de mejora ejecutadas durante el año 2025 han estado dirigidas a garantizar la continuidad del servicio, asegurar el proceso de desinfección y confiabilizar la operación de pozos y rebombeos de agua.
Durante el corriente año se ejecutaron los siguientes trabajos en bases operativas, rebombeos y tanques de agua:

Pozos

Intervención de equipamiento

Se procedió a la intervención de los distintos componentes que conforman las instalaciones de los pozos:

- 138 gabinetes (tareas de pintura, refacción, cambios de puertas)
- 96 electrobombas para garantizar el caudal de extracción
- 36 dosificadores para dar confiabilidad a la desinfección
- 27 tableros (instalación de submonitor, renovación de componentes)

- 153 caudalimetros y 102 sensores de presión instalados en los pozos para continuar con el objetivo de tecnológizar los pozos

- 330 visualizando en el sistema SCADA (Topkapi)

- 3 renovaciones de válvulas

Rehabilitación de pozos

El departamento de perforaciones realizo trabajos de rehabilitación de los siguientes pozos AB076, AB097, EE013, EEU012, EEN007 y LO113 solicitados debido a bajo rendimiento hidráulico y presencia de material sedimentado en el fondo de la perforación.

Las tareas incluyeron, en líneas generales:
- el descenso y retiro de cañerías para la extracción del material de fondo
- limpieza química de filtros
- ensayos de bombeo para la determinación de parámetros hidráulicos.

Cegado de pozos

Se realizaron trabajos de cegado de los siguientes pozos AB069, AB077, AB078, AB079, AB080, AB081, AB082, AB083, EE062, QU118, LMO160, LMO163 que presentaban un deterioro estructural severo y/o un riesgo para los transeúntes.
Las tareas incluyeron el desmantelamiento del pozo (retiro de bombas, tableros, manifold, etc) y el sellado definitivo de la perforación para garantizar la protección del acuífero, evitando la contaminación por agentes externos y asegurando que las perforaciones queden fuera de servicio.

Nuevas perforaciones

En el transcurso del año se habilitaron a servicio las siguientes nuevas perforaciones que contribuyeron a mejorar la calidad del servicio y regularizar problemáticas de calidad, a saber:

Pozo	Base	Sistema de distribución	Departamento	Fecha de habilitación
EEZ029	PAPP	BATERIA EZEIZA	RYPAS	28-enero
EEZ032	PAPP	BATERIA EZEIZA	RYPAS	28-febrero
EEZ031	PAPP	BATERIA EZEIZA	RYPAS	28-febrero
EEZ030	PAPP	BATERIA EZEIZA	RYPAS	28-febrero
EEZ027	PAPP	BATERIA EZEIZA	RYPAS	28-febrero
EE066	PAPP	RED - SANTA ISABEL	RYPAS	29-marzo
EEU026	PAPP	BATERIA UNION	RYPAS	27-agosto
AB109	PAPP	BATERIA GLEW	RYPAS	1-octubre
AB108	PAPP	BATERIA GLEW	RYPAS	14-octubre
AB107	PAPP	BATERIA GLEW	RYPAS	14-octubre

EEZ028	PAPP	BATERIA EZEIZA	RYPAS	20-noviembre
AB106	PAPP	BATERIA GLEW	RYPAS	18-noviembre
LO152	PAS	PLANTA - LO152	RYPAS	30-diciembre

Recuperación de pozos

Se realizaron tareas de recuperación y puesta en servicio de cuatro pozos, que se encontraban fuera de servicio. Los trabajos incluyeron la fabricación y colocación de puertas para gabinetes y tapas de cámara y la instalación y/o recambio de cajas de medidor, fusibles NH, módulos eléctricos y acometida.

Se ejecutaron tareas de cableado, instalación de interruptores termo magnéticos y tableros reparados. Se gestionó el alta de suministro eléctrico a través del área de Energía y una vez habilitada la misma, se realizaron las correspondientes puestas a tierra y se solicitó el alarmado completo de los pozos.

Se llevó a cabo el montaje de manifold y la instalación de electrobombas reparadas incluyendo mangas de impulsión según correspondía. Finalmente, se colocaron cerraduras anti vandálicas y se realizaron tareas de pintura general, quedando los pozos en condiciones de operación.

Pozo	Fecha de habilitación	Sistema	Potencia
LMO319	12/5/2025	POI VIRREY DEL PINO	10Hp
LMO322	29/07/2025	POI VIRREY DEL PINO	25Hp
LMO323	15/12/2025	POI VIRREY DEL PINO	25Hp
LMO351	05/06/2025	POI VIRREY DEL PINO	25Hp



Antes LMO351



Después LMO351



Antes LMO319



Después LMO319



Antes LMO322



Después LMO322



Antes LMO323



Después LMO323

Instalación de instrumentación

En línea con los objetivos de la empresa de instrumentar la totalidad de los pozos con sensores de presión y caudalimetros, se continuó avanzando en esta tarea, alcanzando al cierre del año 2025 una cobertura del 43 % con medidores de caudal y del 28 % con sensores de presión, en el área original de concesión.

Base	Caudalimetros Instalados	Sensor de presión
PAMO	71	88
PAO	52	14
PAPP	6	
PAS	24	

Los caudalimetros electromagnéticos requieren el cumplimiento de distancias mínimas de instalación tanto aguas arriba como aguas abajo, con el objetivo de asegurar un perfil de flujo adecuado y la correcta medición del caudal. En función de ello, PAMO diseñó y fabricó una pieza especial que permite respetar dichas distancias, garantizando el correcto funcionamiento del equipo.



Mantenimiento preventivo de cámaras

En base a un relevamiento integral del estado de las instalaciones, se implementó un plan de mejora a lo largo del año 2025.
A partir de la priorización de los casos de mayor urgencia y el abordaje particular de cada situación, se logró en PAMO una mejora perceptible, al 54% de las cámaras se les realizo una refacción de manera integral.
Estas acciones, en conjunto con la ejecución de mantenimientos preventivos, contribuyen a garantizar la durabilidad y el correcto funcionamiento de las instalaciones.





Automatización de Batería Ezeiza

En conjunto con personal de Planta de Tratamiento de Aguas Subterráneas, y el departamento de Tablero Eléctricos de Talleres Varela, la base de PAPP trabajo para la automatización de los pozos de la Batería Ezeiza.
El objetivo principal del sistema de funcionamiento automatizado es permitir la puesta en marcha y la parada de los pozos de manera automática, en función del nivel de la cisterna y de la calidad del agua de salida de la planta de tratamiento.





Optimización del almacenamiento de Hipoclorito de Sodio en pozos

Con el objetivo de aumentar la autonomía operativa y reducir los traslados a los puntos más alejados, se incrementó la capacidad de almacenamiento de NaClO. Esta mejora se implementó mediante el reemplazo de tanques por otros de mayor capacidad o mediante la incorporación de bateas vinculadas de 145 litros.



Rebombeos

Intervención de equipamiento

Se procedió a la intervención de los distintos componentes que conforman las instalaciones de los rebombeos:

- Renovación de 9 electrobombas de manera de asegurar la continuidad del servicio.
- Reemplazo de 2 válvulas para asegurar el funcionamiento de las bombas.
- Reemplazo de 2 caudalimetros y la instalación de 1 caudalimetro en rebombeo La Serenísima, mejorando la confiablidad del dato de producción.
- Renovación de 3 sensores de presión para la automatización del sistema, lo que contribuye a una operación más segura y eficiente.

Obras de Mayor envergadura en Plantas de Tratamiento de Agua Subterránea

EXPANSIÓN DEL SERVICIO

Durante el corriente año no se habilitaron nuevas plantas de tratamiento de agua subterránea.

CENTRO OPERATIVO VIRREY DEL PINO

Planta Ósmosis Inversa Virrey del Pino

- En Marzo se reemplazó el arranque suave en la bomba de permeado 306 (submódulo 3-2).

- En Noviembre se coloca caudalímetro de inserción (gestionado por la Gerencia) en caño de salida, con transmisión al Topkapi. Aún se está trabajando ya que la medición es inestable.



MN147

- En Marzo se realizó el cambio de las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio y todo el sistema de mangueras correspondiente.
- En Septiembre.se realizaron las siguientes mejoras edilicias con la finalidad de volver a tratar en la planta:
  - Cierre de la cámara de ACUMAR (para evitar taponamientos por acumulación de residuos).



  - Acondicionamiento de portón de ingreso al predio que había sido vandalizado.



Luego de estos trabajos, se comenzó el reacondicionamiento de la planta y se volvieron a colocar el compresor y las bombas dosificadoras de antiincrustante. También se solicitó la reinstalación de los equipos de medición online. El día 29-9 comenzaron las pruebas de funcionamiento del tratamiento.





CENTRO OPERATIVO 9 DE ABRIL

Planta de intercambio iónico Llavallol LO152 (ex LO107)

- En Noviembre se realizó una modificación del tratamiento de la planta con el objetivo de tratar agua con mayor concentración de nitratos respecto de la concentración de diseño: Se agregaron 2 módulos simples para incrementar el caudal de tratamiento.

En el mes de Diciembre, comenzaron los trabajos de puesta en marcha del pozo LO152 que reemplazó por roturas al pozo LO107 y la planta de tratamiento con las modificaciones detalladas en el punto anterior.





Planta de ósmosis inversa 9 de Abril

- En el mes de septiembre se realizaron mejoras en el equipo de CIP
  - Se instaló un conmutador horario.
  - Se instaló una boya de nivel de parada de resistencias.
  - Se modificó el funcionamiento del testigo de resistencias.

Las mejoras realizadas en el equipo CIP permiten optimizar la limpieza química del sistema de ósmosis inversa. El conmutador horario asegura que el agua esté lista a la temperatura adecuada al inicio de la jornada, evitando demoras. La boya de nivel protege las resistencias ante imprevistos, garantizando continuidad y seguridad en el calentamiento. Por último, el testigo visual facilita el control operativo y reduce errores. En conjunto, estas mejoras incrementan la eficiencia, la confiabilidad y la seguridad del proceso.






Planta de ósmosis inversa Santa Catalina

Durante el primer trimestre del año se realizaron los siguientes trabajos:

- La conexión a PLC de las bombas de hipoclorito BD800 y BD801 para su comando vía Topkapi y automatización. De esta manera se optimizará el consumo de cloro para desinfección y se podrán operar las bombas de forma remota.

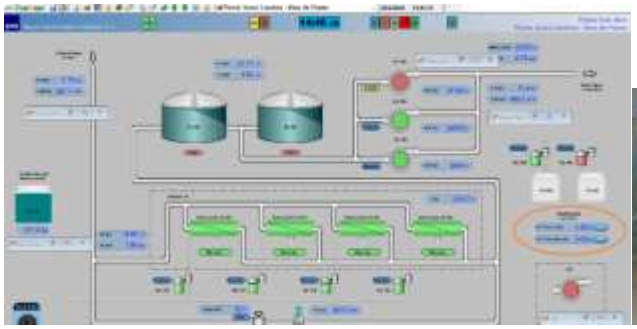



- Se implementó el nuevo automatismo de inyección de cloro que dosifica proporcionalmente al caudal de agua a servicio. El automatismo permite operar y dosificar de forma remota en modo manual o automático. De esta manera se disminuyen las horas fuera de norma por fallas de bomba o roturas de mangueras debido a la posibilidad de relevo remoto.



CENTRO OPERATIVO BARRIO UNO

Planta de ósmosis inversa La Celia

- Durante Agosto se realizó la Instalación de una válvula solenoide en la inyección de antiincrustante para evitar posibles succiones del producto cuando la planta está parada

Planta de ósmosis inversa Glew

- En el mes de Agosto se ejecutó la Instalación y conexión de una bomba dosificadora de hipoclorito de respaldo (de este modo hay reserva en caso de fallas en la bomba primaria).
- Se realizó operativo nocturno en conjunto con personal de Mantenimientos Eléctricos de Talleres Varela y se efectuó el mantenimiento íntegro en la sala de transformadores y en la sala sepam.



Planta de adsorción Barrio Uno

- Marzo Se realizó un nuevo empalme de cañerías de pozos EEZ038, EEZ039, EEZ006 y EEZ007, para minimizar pérdidas de carga en la alimentación de las cisternas Se reubicó el caudalímetro de alimentación y se colocó su display de información en sala de tableros y comandos y se solicitó su conexión y calibración.

Planta de adsorción Ezeiza

Debido a que el tratamiento por adsorción fue discontinuado en esta planta por el ingreso del pozo al Hipopuelche con el objetivo de optimizar su funcionamiento para reducir costos de operación, se realizaron los siguientes trabajos durante el año:

- En conjunto con automatismos, se escaló el caudalímetro de ingreso del caudal a la cisterna proveniente de los pozos del acuífero Puelche.
- Para evitar el rebalse de la cisterna
    - Se reemplazó el sensor de nivel de la cisterna.
    - Se reemplazó la boya de nivel alto que indica la alarma de nivel alto de cisterna y se reguló a 4,95.
- Se rehabilitó el sistema de desinfección con Hipoclorito de sodio
- Julio Se reemplazó la instalación de inyección de hipoclorito a la cañería de ingreso, por una nueva (manguera totalmente nueva) que va desde las bombas dosificadoras, hasta el punto de inyección en la

cañería de salida, reduciendo notoriamente los metros de recorrido de manguera de inyección, y facilitando la detección y manipulación de potenciales pérdidas.

- Sistema de dosificación de Hipoclorito de sodio, se realizó construcción, instalación y puesta en servicio de nuevo tablero de eléctrico y de comando.



Tablero con corrosión



Nuevo Tablero aislado

- En conjunto con personal de Montaje de Grandes Conductos, se unió la cañería de impulsión, dejando obsoleto el colector de portafiltros bolsa que generaba mucha pérdida de carga hidráulica. Este trabajando se realizó en el operativo programado del día 29/9.

Antes	Después
	

- En conjunto con el sector de Montaje de Talleres Varela se realizó la modificación de los impulsores de las bombas BS2 y BS3, reduciéndolos en una etapa, con la finalidad de mejorar el comportamiento de las mismas en las condiciones normales de impulsión. Entre noviembre y Diciembre se realizó el montaje de estas bombas modificadas.





OBRAS DE ENVERGADURA

Planta de ósmosis inversa Virrey del Pino - Cisterna de Salida

- Durante todo el año estuvo parada la obra de la cisterna de salida de la planta de ósmosis inversa Virrey del Pino. Durante Junio fue renegociado el contrato con la empresa de LIHUE para la continuación de la obra. La empresa dio inicio a la generación de las OC para la adquisición de los equipamientos faltantes. Está proyectado que la obra físicamente en el lugar comience a inicios del 2026.

Centro Operativo Virrey del Pino - Oficinas

- Durante el mes de Mayo se finalizaron y se entregaron las obras de las nuevas oficinas, vestuarios, pañol y comedor. Quedó pendiente a cargo de la DAL de resolución la Red corporativa en las oficinas. Motivo por el cual todavía no pueden ser utilizadas por el personal.









Planta de ósmosis inversa 9 de Abril - Ampliación de tratamiento

- Durante el año no hubo avances en la obra de ampliación del tratamiento. Se prevé su continuación durante el año 2026

OBRAS EN EJECUCIÓN Y PROYECTADAS PARA EL 2026

OBRAS	TIPO DE TRATA-MIENTO	UBICACIÓN	REGIÓN	Estado al 12/2025
Planta Barrio Dos (Nueva)	Ósmosis Inversa	Los Chivatos y Almafuerte – Barrio Uno - Ezeiza	Sudoeste	A la espera de la transferencia a AySA del Procrear
Cisterna Salida Virrey del Pino	Osmosis Inversa	Fraguiero 5800 – Virrey del Pinoi – La Matanza	Oeste	En ejecución
Ampliación tratamiento planta 9 de abril	Osmosis inversa	Prayones 3150, esq Palleros – Monte Grande E. Echverría	Sudoeste	Ejecución pliego
Ampliación Rayo de Sol	Osmosis Inversa		Sudoeste	Ejecución pliego
Planta San Miguel	Intercambio Iónico		Sudoeste	Ejecución pliego


aysa

INFORME ANUAL

Obras Ejecutadas -AMBA

Dirección de Agua
2025

INDICE

Obras de Mayor Envergadura en Pozos de Agua y Rebombeos 1

Pozos 1

Rebombeos 9

Obras de Mayor envergadura en Plantas de Tratamiento de Agua Sub. 9

EXPANSIÓN DEL SERVICIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

CENTRO OPERATIVO VIRREY DEL PINO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

OBRAS EN EJECUCIÓN Y PROYECTADAS PARA EL 2025 ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Obras de Mayor Envergadura en Pozos de Agua y Rebombeos

Las obras de mejora ejecutadas durante el año 2025 han estado dirigidas a garantizar la continuidad del servicio, asegurar el proceso de desinfección y confiabilizar la operación de pozos y rebombeos de agua. Se ejecutaron los siguientes trabajos en bases operativas, rebombeos y tanques de agua:

Pozos

Renovación de equipamiento

Se procedió a la renovación de:

- 173 gabinetes (tareas de pintura, refacción, cambios de puertas)
- 51 electrobombas para garantizar el caudal de extracción
- 89 dosificadores para dar confiabilidad a la desinfección
- 89 tableros (instalación de submonitor, renovación de componentes)
- 174 caudalimetros y 135 sensores de presión instalados en los pozos para continuar con el objetivo de tecnológizar los pozos
- 415 visualizando en el sistema SCADA (Topkapi)
- 1 renovación de válvula

Rehabilitación de pozos

El departamento de Perforaciones llevó adelante trabajos de rehabilitación en los pozos MI010, MI052, MI007, PI012, PI049, FV032, FV048, FV049, FV098, FV108, MR046, MR052 MR006, debido a problemas de bajo rendimiento hidráulico, filtros y portafiltros colmatados y la acumulación de material sedimentado en el fondo de las perforaciones.
De manera general, las intervenciones comprendieron el desmontaje de cañerías para la remoción de sedimentos, la limpieza química de los filtros, reemplazo de los mismos en los casos que fuera necesario y la realización de ensayos de bombeo orientados a la obtención de parámetros hidráulicos de operación.

Cegado de pozos

Al igual que en el radio original de la concesión, el sector de Perforaciones ejecutó el cegado de nueve pozos (FV091, FV077, FV044, FV059, GU011, MR099, MR048, MA005 y MI004) en el área correspondiente a Nuevos Partidos. Estas perforaciones presentaban daños estructurales significativos que impedían su rehabilitación y puesta en servicio. En consecuencia, y con el objetivo de mitigar riesgos para el entorno y resguardar el acuífero, se procedió al retiro de los componentes electromecánicos y al cegado definitivo de las perforaciones.

Nuevas perforaciones

En el transcurso del año se habilitaron a servicio las siguientes nuevas perforaciones que contribuyeron a mejorar la calidad del servicio y regularizar problemáticas de calidad, a saber:

Pozo	Base	Sistema de distribución	Departamento	Mes
MR086	PAMR	RED	RYPAO	6-enero
ME102	PAME	TANQUE ARCO IRIS	RYPAO	10-enero
FV184	PAFV	RED	RYPAS	14-enero
FV167	PAFV	BATERIA ING. ALLAN	RYPAS	17-enero
GU031	PAPP	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	RYPAS	27-febrero
FV174	PAFV	BATERIA SAN NICOLAS	RYPAS	6-febrero
PI084	PAN	RED	RYPAN	13-marzo
MI067	PASM	REBOMBEO MUÑIZ	RYPAN	5-mayo
FV178	PAFV	RED	RYPAS	28-julio

MR104	PAMR	RED	RYPAO	17-noviembre
GU027	PAPP	BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	RYPAS	21-noviembre
GU029	PAPP	BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	RYPAS	22-diciembre
GU028	PAPP	BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	RYPAS	19-diciembre

Instalación de instrumentación en pozos

Como resultado de las tareas de instalación de equipos de medición, durante el año 2025, se alcanzó un 51% de pozos con medición de caudal y un 34% de pozos con medición de presión, fortaleciendo el control operativo y la disponibilidad de información para la toma de decisiones.


Base	Caudalimetro	Sensor de presión
PAME	24	38
PAMR	37	41
PAPP	14	
PAFV	30	1
PAN	44	31
PASM	25	24

Instalación de instrumentación en puntos de convergencia

Se realizó la instalación de caudalimetro en distintos puntos de convergencia, Tanque San Martín (PAPP), Tanque Mayol (PAFV), Tanque Loma Grande (PAME) y el reemplazo del caudalimetro de Tanque La Perlita y Tanque Trujui (PAMR), permitiendo la medición y el monitoreo continuo de las variables operativas.
La información obtenida es visualizada en el sistema SCADA (Topkapi), facilitando el seguimiento en tiempo real y el control del funcionamiento del sistema.


- Tanque San Martin



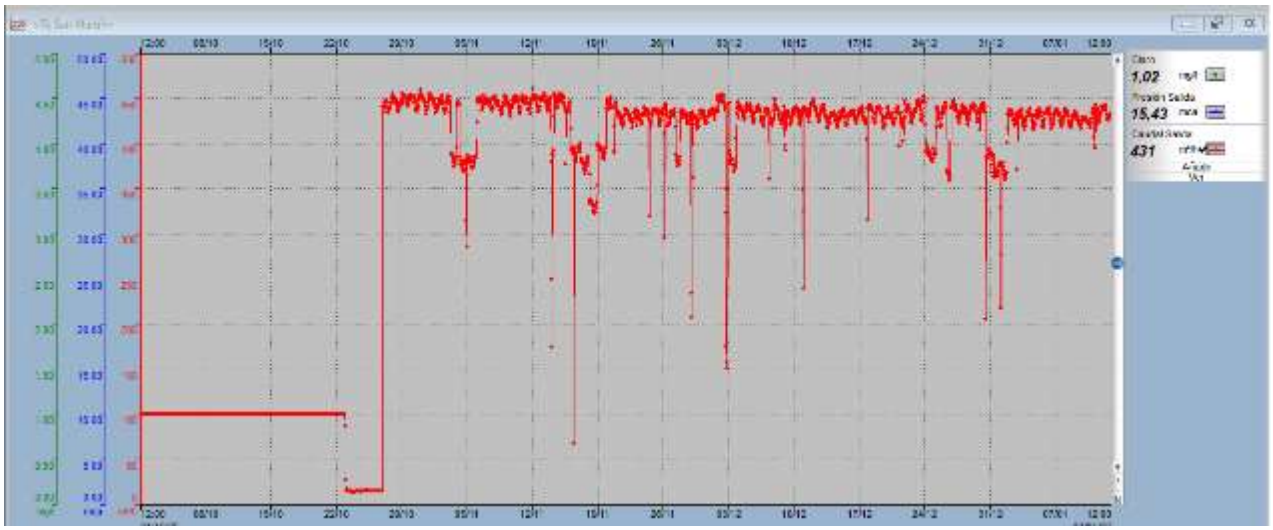

- Tanque Mayol




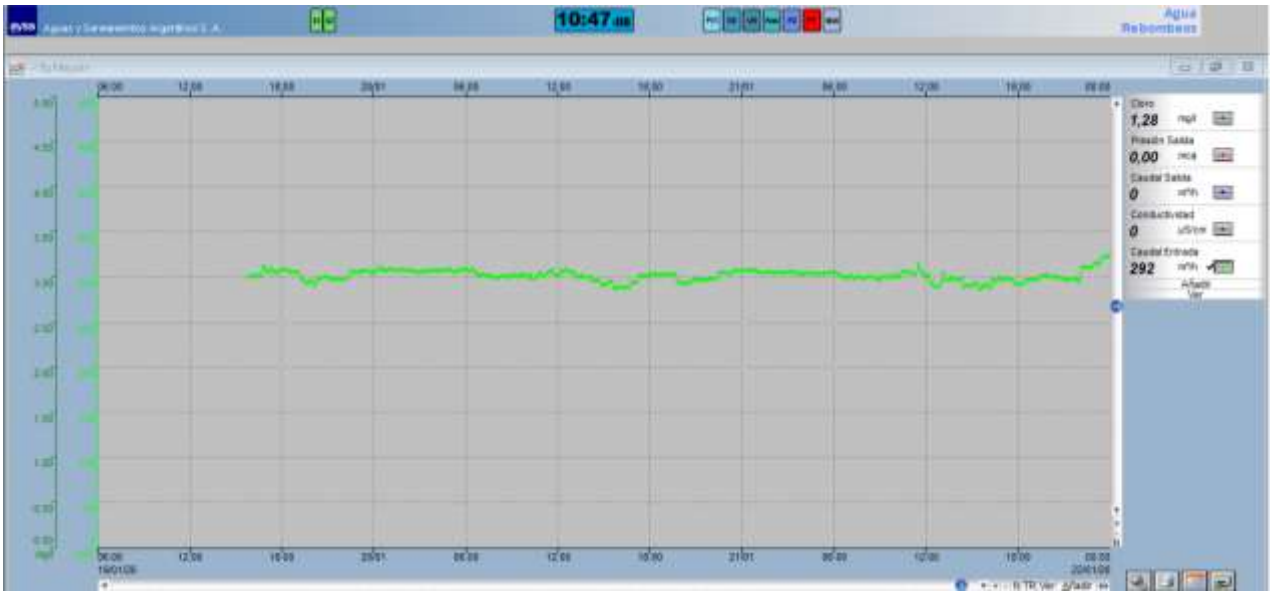


- Tanque La Perlita






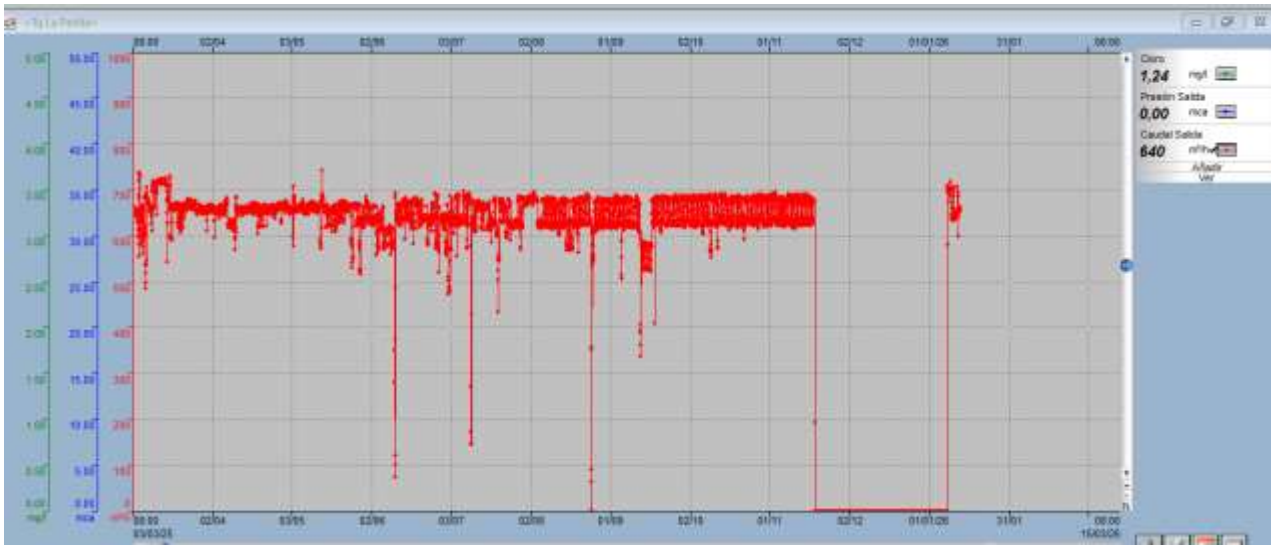

- Medición de Tanque Loma Grande

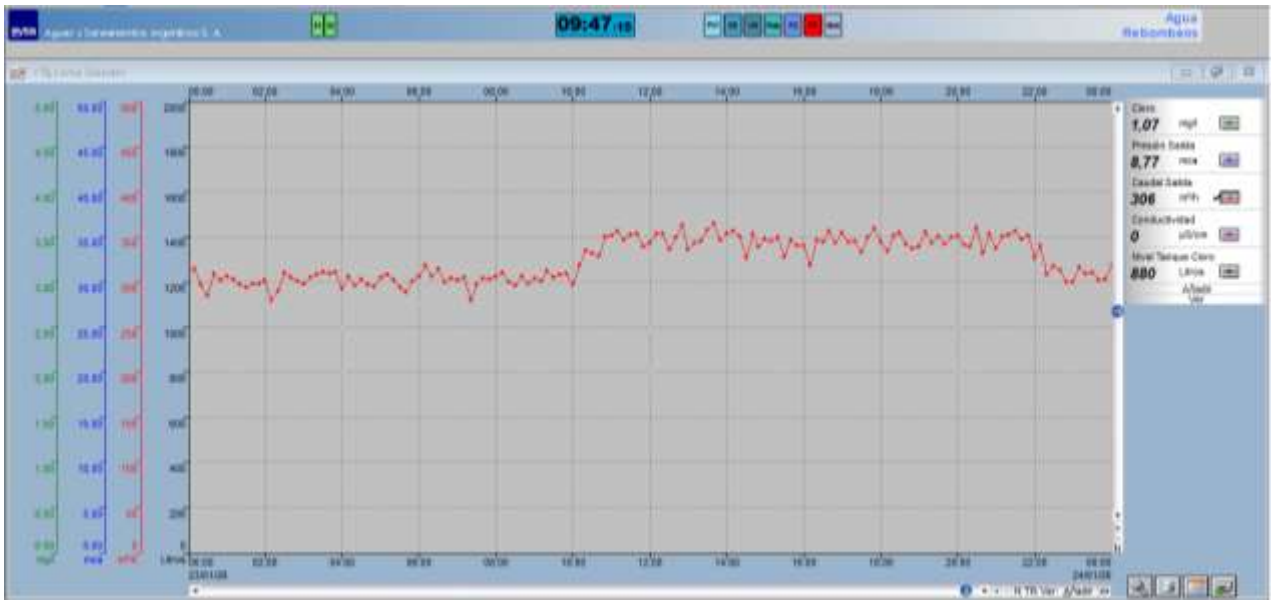

- Medicion Tanque Trujui

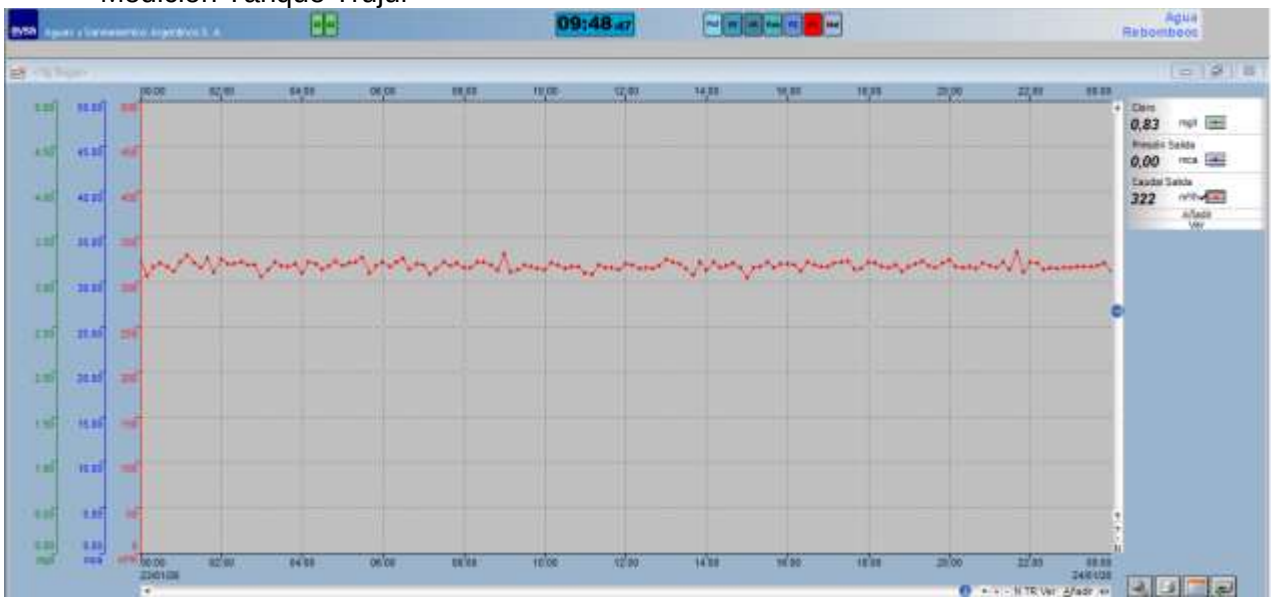

Mantenimiento preventivo de cámaras

A partir del análisis del estado general de las instalaciones, se desarrolló durante 2025 un plan de intervención enfocado en los puntos de mayor criticidad.
La ejecución de mejoras puntuales y refacciones integrales permitió alcanzar, en PAMR, la puesta en valor del 84 % de las cámaras.



Trabajos de herrería en PAMR

Durante el período informado se ejecutaron diversos trabajos de adecuación y herrería asociados a las instalaciones, se realizaron reducciones y armado de piezas especiales a medida en taller de herrería.
Adicionalmente, se llevaron adelante 97 trabajos de herrería complementarios, incluyendo la fabricación y adecuación de tapas de cámara y puertas de gabinetes, y se efectuó el reacondicionamiento de 13 manifold existentes, contribuyendo a la puesta en valor de las instalaciones.



Modificación del punto de inyección de Hipoclorito de Sodio en pozos

Se adaptaron los puntos de inyección para optimizar y reducir el impacto corrosivo del hipoclorito en las instalaciones. En el caso de PAPP, la inyección se ubicó en el gabinete de cloración, mientras que en PAFV se realiza directamente sobre la cañería.
Esta disposición evita el contacto directo del hipoclorito de sodio con el manifold, posiciona el punto de inyección en el centro de la cañería y favorece una mejor difusión del producto, reduciendo además la presión directa sobre la válvula de inyección.






En el caso de PASM ejecutó el armado e instalación del sistema de inyección de hipoclorito de sodio fuera de la cámara del pozo. Los trabajos incluyeron la construcción del nuevo punto de inyección, su hormigonado, la fijación de tapa de fundición y la canalización exterior hasta el gabinete de cloración.
Adicionalmente, se incorporó una manguera en la salida del punto de inyección, lo que evita la cristalización del NaClO reduciendo la necesidad de destapes y el desgaste de los componentes del sistema.
La relocalización del punto de inyección fuera de la cámara evita la corrosión de los componentes internos, que podrían generarse ante pérdidas o roturas en la manguera de inyección. Además, se

mejora significativamente la condición de higiene y seguridad para el personal, al disminuir la exposición directa a agentes corrosivos durante las tareas operativas y de mantenimiento.



Rebombeos

- - Con el objetivo de evitar filtraciones y daños estructurales en las instalaciones civiles se repararon 2 cámaras.
- - Reemplazo de una bomba en Rebombeo Guarida asegurando la continuidad del servicio y mejorando la confiabilidad operativa del mismo.
- - Para confiabilizar los datos de producción se instalación de un caudalimetro de entrada en el rebombeo Guarida y en el rebombeo Sarmiento. También se realizó el reemplazo de los caudalimetros en Parque San Martin y Moreno

Obras de Mayor envergadura en Plantas de Tratamiento de Agua Sub.

Expansión del Servicio

Durante el corriente año no se habilitaron nuevas plantas de tratamiento de agua subterránea.

CENTRO OPERATIVO VIRREY DEL PINO

Obras de Mejora en Instalaciones en Servicio

No se realizaron obras de mejora durante el transcurso del año

Mayores Dificultades

Plantas de Adsorción CAG

- Durante el año se fueron produciendo la rotura de varios big bags que contenían el CAG saturado dentro de los depósitos de residuos peligrosos por la demora en la disposición. El mismo se recogió y se colocó en bolsones nuevos hasta su retiro.




- Desde el mes de septiembre no se cuenta con resultados de análisis de control de calidad de orgánicos en el Laboratorio Central (plantas de CAG). Las muestras se llevaron hasta el mes de diciembre, pero fueron dadas de baja ya que el equipo se encontraba de baja.

Planta Adsorción CAG Moreno

- Durante los meses de marzo, mayo y octubre esta planta funcionó a modo bypass (sin tratamiento), debido a las reiteradas anomalías bacteriológicas de uno del pozo que abastece esta planta (MO046). El lavado del pozo posterior a la desinfección debe hacerse a través de las instalaciones de la planta, pero no debe ingresar cloro al manto de CAG, ya que le hace perder las propiedades de adsorción del compuesto orgánico tratado.

Planta Osmosis Inversa Merlo

- Durante las noches de los días 25,26 y 27 de Enero asistió la GTO por falla en el pozo externo y en la bomba de impulsión B4 (quedando de reserva al ser reemplazada por la B5 como bomba principal)
- Por decaimiento en el rendimiento de las membranas se realizó su reemplazo en el mes de junio. Al contar con un solo equipo, la planta funcionó fuera de norma durante este trabajo.

Al abrir los tubos de presión, se encontró un gel similar al que se analizó en Santa Catalina y 9 de Abril. El mismo fue enviado al Laboratorio Central y está siendo estudiado con el proveedor del antiincrustante.



Novedades

Plantas de Adsorción CAG

- Luego de un año, a partir del mes de junio se comenzó a vaciar los depósitos de CAG, posibilitando el cambio de medio si se requiere. El medio saturado se trasladó a Planta Manuel Belgrano, a la espera de su regeneración a través de la empresa Contratista. La OC fue emitida en Diciembre de este año. Los trabajos de regeneración se ejecutarán durante el año 2026
-




Planta Adsorción CAG San Miguel Centro

- Durante el año 2025 la planta continuó en reserva (junto a los pozos) a la espera de la disposición final del CAG saturado que se encuentra en el depósito de residuos peligrosos para poder realizar el cambio de medio necesario por falta de OC para la disposición final del residuo de CAG. Por el nuevo Marco Regulatorio, la planta queda fuera de servicio desde agosto 2025. Durante el mes de diciembre se comienza a gestionar el desarme de la misma para devolución del predio.


aysa

INFORME ANUAL 2025

Automatismos y Sistemas de Control

Tabla de contenido

1. TRABAJOS REALIZADOS 2

2. OBRAS Y PROYECTOS 2

3. AUTOMATISMO 5

4. SISTEMAS DE CONTROL 10

Automatismos y Sistemas de control

El Departamento Automatismos y Sistemas de Control, dependiente de la Gerencia de Comunicaciones y Automatismos, es el responsable de la gestión de los sistemas de automatismos y control de las instalaciones de producción y transporte, de las Direcciones de Agua y Saneamiento de AySA. Define los lineamientos y redacta las especificaciones técnicas (ET) de Automatismos y Sistemas de Control de toda obra nueva o de aquellas modificaciones que deban realizarse sobre las instalaciones existentes. Da seguimiento al desarrollo de las obras, participando activamente en las etapas de ingeniería (revisión) y en las etapas de puesta en marcha (supervisión). Es relevante destacar la importancia de la definición de los lineamientos ya que es el responsable del mantenimiento del parque instalado una vez concluido el período de garantía de las obras.

Por otro lado, el Departamento también es responsable de los Sistemas de Control (o sistemas SCADA). El Topkapi, sistema SCADA que se utiliza en AySA, recibe toda la información del funcionamiento de las Plantas, Estaciones de bombeo y de las redes de transporte de los líquidos permitiendo su monitoreo y control. En forma complementaria se operan los Automatismos de establecimientos e instalaciones de agua y saneamiento a través de controladores lógicos programables (PLCs), ejecutando comandos locales o tele comandos a distancia. Los PLCs realizan toda la secuencia automática de las operaciones (por ejemplo: arranque y detención de bombas, apertura y cierre de compuertas, operación de válvulas reguladoras, etc.)

Para responder a las necesidades de Automatismos y Sistemas de Control anteriormente mencionadas, el proceso se encuentra organizado de la siguiente manera:

- **Obras y Proyectos**
  - Elaboración de lineamientos (Especificaciones Técnicas)
  - Revisión de ingeniería
  - Supervisión e inspección de Obra
- **Automatismo**
  - Mantenimiento correctivo
  - Mantenimiento preventivo (Migraciones y mejoras)
- **Sistemas de Control**
  - Mantenimiento correctivo
  - Mantenimiento preventivo (Mejoras)
  - Revisión de ingeniería (Aplicaciones Topkapi)

1. TRABAJOS REALIZADOS

Resumen de Órdenes de Trabajo (OT)

En el año 2025 el Departamento recibió **1483** solicitudes de trabajo. Respecto al año anterior, esa cifra disminuyó un **18,9 %** (1721 solicitudes en 2024).

Durante el período analizado, la tasa de resolución de órdenes de trabajo del Departamento de Automatismos y Sistemas de Control alcanzó el **94,6%**.

A continuación, se grafica la distribución de trabajos entre los sectores, siendo el área de Automatismos la que concentra la mayor actividad en comparación a las restantes áreas del sector.



Figura 1 **–** Distribución de trabajos por sector

2. OBRAS Y PROYECTOS

Durante el año 2025 el sector continuó trabajando con una cantidad reducida de personal, integrada por un supervisor y un analista.

No obstante, se continuó trabajando en la elaboración de pliegos y en el seguimiento de proyectos, conforme a la demanda de los diversos clientes internos.

Asimismo, se avanzó en la ejecución de proyectos propios de la Gerencia de Comunicaciones y Automatismos, orientados a la reducción de equipamiento y a la renovación del parque instalado por obsolescencia tecnológica, especialmente en aquellos casos donde el mantenimiento y la

reposición de componentes resultaban altamente complejos y representaban riesgos operativos para determinados procesos.

En este marco, se intervinieron instalaciones correspondientes a Impelentes Planta San Martín, Estación Elevadora La Matanza y Rebombeos.

Durante el Año 2025 se trabajó en las siguientes obras de relevancia:

Obras en Curso: Revisión de ingeniería, FAT, SAT

- Planta San Martín:
  - Dosificación Polielectrolito (OC72751) (PEM)
  - Agua de Cal (CA 70022)
  - Impelentes Principales (OC72747)
  - Sector B – Difusores de Coagulante (OC74390)
- Rebombeo Benquez (OC72229)
- Estación Elevadora Saavedra (CA70047)
- Estación Elevadora Floresta (CA70053)
- Estación Elevadora Matanza (OC75380)
- Hipopuelche La Lata (SA70301)
- Planta Dock Sud (RC004)
- Planta Sudoeste – Rejas (OC71503)
- EBC Llavallol (SC70319)
- EBC Cristóbal Colón (VC70023)
- Colaboración con tableros para Batería de Pozos de Agua de Ezeiza, “Proyecto Createch360”

Elaboraciones de ET y proyectos:

- Planta Manuel Belgrano:
  - Set C
  - Renovación Electromecánica – Filtros Norte
- Planta San Martín:
  - Sector C
  - Coagulante Sector C

Nuevo Tablero de Sulfato

- Planta Depuradora Hurlingham:

  Módulo 1 – Actualización de Sistemas de Automatismo

  Módulo 2 – Actualización de Sistemas de Automatismo

- Planta Depuradora Norte:

  Ampliación módulo 3

  Recambio desarenador 3

- Monitoreo remoto – PD Santa Catalina
- Monitoreo remoto – PD Presidente Perón
- Monitoreo remoto – Concentradora PD El Jagüel
- Monitoreo remoto – Concentradora PD Sudoeste
- Monitoreo remoto – Concentradora PD Norte
- POI Rayo de Sol – Ampliación (SA70337)
- Pozo Hipopuelche en POI 9 de Abril (SA70338)
- Actualización ETAUT3-133 Planta Sudoeste – Lavado de arenas
- ETAUT3-103 SA70311 – Planta Intercambio Iónico Barrio San Miguel

Análisis de Factibilidades Técnicas/Económicas de necesidades de clientes internos:

- Planta Manuel Belgrano:

  Automatización de barredores

  Tablero de bombas de servicio interno

  Tablero de bombas de lavado de filtro

  Tablero de drenaje

  Transmisión de señales del SET D al Topkapi

  Renovación de casetas de calidad

- PD Hurlingham – Módulo 1: Actualización de sistemas de Automatismo [1]
- Planta San Martín:

  Optimización de coagulante mediante inteligencia artificial [1]

  Renovación de casetas de calidad

- Planta Juan Manuel de Rosas – Mudanza de torre toma
- Estaciones de Bombeo Cloacal varias - Monitoreo de EBC sin PLC

[1] Proyectos en curso

3. AUTOMATISMO

Pozos de Agua:

Durante el año 2025 se trabajó para normalizar el estado de los pozos. Con la colaboración de otros sectores de la GCyA se realizaron las siguientes tareas: Relevamientos de tableros existentes, retiro de tableros fuera de servicio, reacondicionamiento de tableros existentes, instalación de tableros nuevos, conexión de instrumentos, configuración de escalados de sensores, configuración de parámetros de energía, reporte a SCADA (Topkapi).

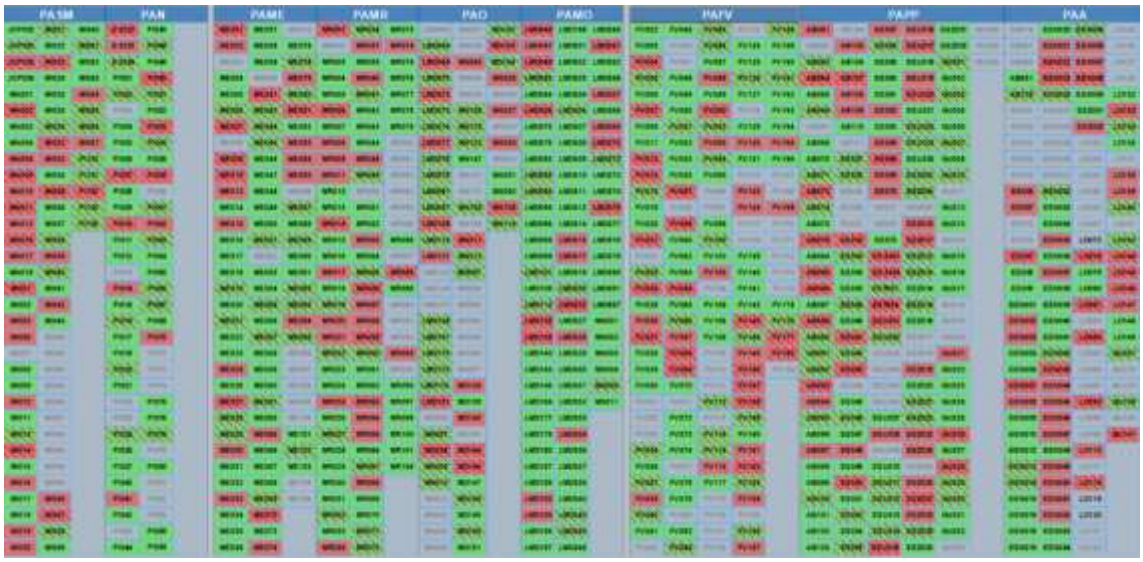


Figura 2 - Pozos de agua

Estaciones de Bombeo Cloacal:

Se realizaron trabajos mantenimiento en varias EBC. Se trabajó en conjunto con Radiocomunicaciones para recambio de SIM en aquellos sitios en donde fallaba el automatismo.

También durante el 2025 se continuó trabajando en la optimización de las EBC. Entre las tareas realizadas están la carga de programa estándar, carga de parámetros eléctricos al PLC para su posterior reporte, altas en SCADA.



Figura 3 - EBC - Vista general

Válvulas Reguladoras:

Se continúa con las instalaciones de equipamientos de automatismos en VR diseñadas tiempo atrás. Se realiza puesta en marcha y visualización en Topkapi. Se planifica continuar en con estos trabajos en 2026.



Figura 4 - Válvulas Reguladoras

Estación Elevadora Caballito:

En conjunto con personal de Estaciones Elevadoras y Direcciones de Agua, Mantenimiento y Talleres se instaló un nuevo variador de velocidad en la Estación Elevadora Caballito, una actualización tecnológica que, además de los beneficios relacionados con la sostenibilidad de la operación, permite administrar con mayor precisión los caudales impulsados: mejora la confiabilidad del servicio, reduciendo los costos asociados a energía y potabilización.

Los trabajos para la puesta en marcha fueron los siguientes:

- Desconexión del motor existente para reemplazo por nuevo motor.
- Modificación de la traza del cable de media tensión existente y colocación de nuevas bandejas porta cables.
- Colaboración en la instalación del variador.
- Conexión del nuevo motor.
- Nuevos cableados de señales entre el variador y el PLC de la sala.
- Nuevos cableados de potencia (baja y media tensión).
- Cableados de vinculación interna entre los módulos del variador.
- Redacción de la memoria de funcionamiento para posterior programación del PLC.
- Supervisión de puesta en marcha realizada por el fabricante del equipo.

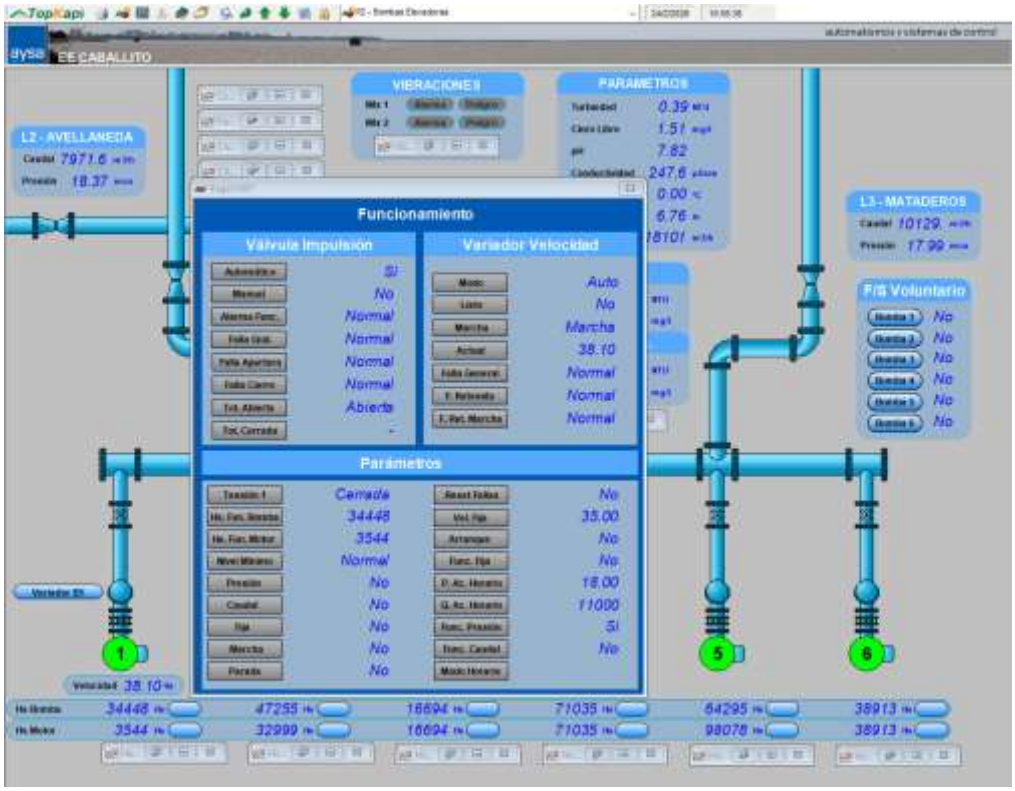


Figura 5 – E.E. Caballito

Mejoras y Actualizaciones en Tanques, Rebombeos y Plantas:

Se realizaron trabajos de mejoras y actualizaciones en diferentes sitios, lo que incluyó agregados en mediciones para su posterior reporte en SCADA.



Figura 6 - Resumen Tanques y Rebombeos



Figura 7 - Resumen Plantas

Migraciones de Equipamiento:

Se realizaron migraciones de equipamiento obsoleto con el fin de actualizar el parque instalado, logrando también tener un sistema más confiable y actualizado.

Entre las migraciones destacadas se encuentran los filtros de Planta Manuel Belgrano, que tenían PLC sin soporte, y se actualizaron los equipos de Automatismos a equipamiento actual.

De similar manera se hizo en otros sitios del parque instalado, como pueden ser válvulas reguladoras, Estaciones de Bombeo Cloacal, tableros de distintas plantas de Agua y de Saneamiento.

Plan Verano:

Se reserva y prepara equipamiento de Automatismos en Planta San Martín. De esta forma se minimizan los tiempos de reparación y puesta en funcionamiento de las instalaciones afectadas por fallas potenciales durante el período estival.

Alivio de Cargas:

Se realizaron modificaciones en el bloque de programación que se cargó en distintos PLC de la concesión para poder cumplir con el esquema de alivio de cargas, dicho esquema es un procedimiento de Emergencia, diseñado para remediar la inestabilidad entre oferta y demanda de un sistema Eléctrico, previniendo el colapso del sistema de potencia mediante la desconexión de carga.

El bloque modificado se cargó y se probó para Planta Depuradora Norte y se actualizará para los siguientes sitios:

- EE La Matanza
- EE Villa Devoto
- EE Centro
- EE Caballito
- EE Villa Adelina
- EE Saavedra
- EE Floresta
- EE Paitovi
- EE Lanús
- EE Quilmes
- EE Tres de Febrero
- EE Morón
- EBC Wilde
- EBC Boca Barracas
- PP Berazategui
- Planta Manuel Belgrano
- Planta Juan Manuel de Rosas
- Planta San Martin

4. SISTEMAS DE CONTROL

Optimización del licenciamiento:

Se realizó un relevamiento general de las licencias SCADA y se redujo la cantidad de licencias, protocolos y opciones. De esta forma se logró un ahorro de aproximadamente 10% en el costo del contrato de mantenimiento anual.

Licenciamiento Anual SCADA Topkapi:

Se realizó como todos los años el inventario de las licencias hardware USB, análisis del parque instalado y futuro y se generaron los requerimientos de compra para el año próximo.

Actualización de versión de software SCADA y nuevas funcionalidades:

Se realizó la actualización de la versión del software SCADA en 3 Estaciones Elevadoras a fin de probar el correcto funcionamiento. Terminadas las pruebas se procederá a realizar la actualización en todos los sitios viables. Se analizarán los requerimientos de hardware, software y licenciamiento para completar la actualización del todo el parque instalado.

Se comenzó el desarrollo de una nueva aplicación en la última versión disponible para visualizar los Pozos de Agua Norte. Se utilizará para realizar pruebas de visualización con aspecto diferente y acceso por web.

Se realizó una prueba de concepto inicial para implementar nuevas funcionalidades en la nueva versión de software SCADA. Se continuarán realizando pruebas de concepto en entorno de desarrollo para verificar el correcto funcionamiento. Su implementación en producción quedará sujeta a la actualización del software.

Basada en la aplicación productiva, se genera desde cero la nueva aplicación de monitoreo de Planta Depuradora Ferrari para probar y verificar las características de la nueva versión.

Actualización de Sitios en SANEAMIENTO:

Se realizaron trabajos de configuración para mantener actualizado el parque de Estaciones de Bombeo Cloacal (EBC) y Puntos de Monitoreo de Red Cloacal (PMR).



Figura 8 - Sinóptico EBC



Figura 9 - Sinóptico PMR

Se completaron las pantallas sinópticas y configuración para presentar toda la información requerida del nuevo Colector Margen Izquierdo (CMI) del Sistema Riachuelo. La información ya es accedida por personal de operaciones desde Planta de Pretratamiento Dock Sud.

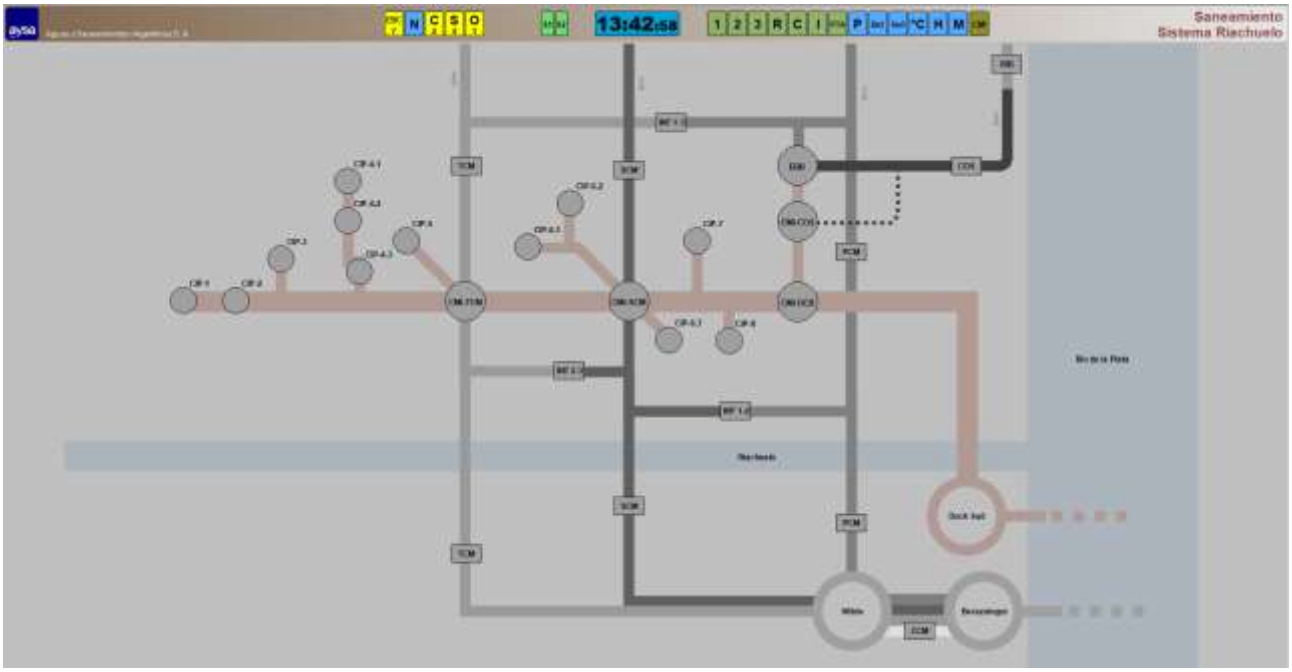


Figura 10 - Sinóptico Sistema Riachuelo CMI/CPI

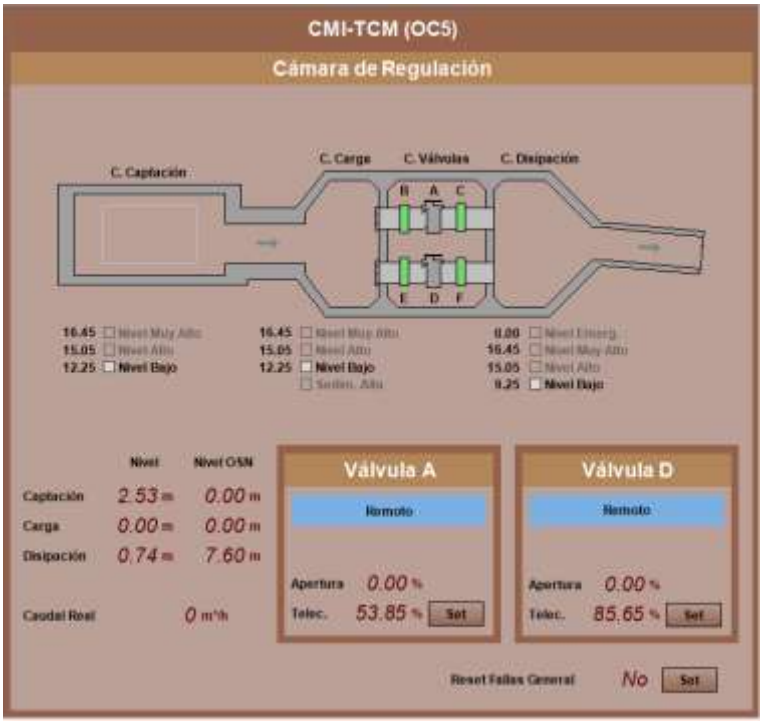


Figura 11 - Sinóptico Detalle CMI

Plan verano:

Se reserva y prepara equipamiento de Sistemas de Control en almacenes estratégicos de la concesión. De esta forma se minimizan los tiempos de reparación y puesta en funcionamiento de las instalaciones afectadas por fallas potenciales durante el período estival.

Instalación de Sistemas Ininterrumpidos de Energía (UPS):

Los UPS protegen a los equipos de daños que pueden ocurrir durante un corte de energía o una sobretensión, los cuales pueden dañar los componentes electrónicos o provocar la pérdida de datos. Cuando un puesto de supervisión SCADA se queda sin energía eléctrica, los operadores pierden la visibilidad de la planta, imposibilitando su monitoreo y operación; también ocasiona la pérdida de datos y trazabilidad, entre otros efectos. La instalación de UPS en los sistemas SCADA permite que, ante eventuales cortes de energía por fallas en el suministro eléctrico o descargas atmosféricas, los equipos permanezcan energizados y protegidos garantizando la operación de planta.

Durante el año 2025 se completó la instalación de Sistemas Ininterrumpidos de Energía (UPS) a todos los sistemas de control SCADA que iniciara en el año 2024 para garantizar su funcionamiento y disponibilidad. Como parte de la adecuación de almacenes ya se encuentran en almacén

energizadas las UPS restantes que quedan como stock para ampliaciones SCADA o fallas en las UPS ya instaladas.

Plantas con UPS en sistemas SCADA:

- Control Centralizado de Agua (4 UPS)
- Control Centralizado de Saneamiento (4 UPS)
- Planta Potabilizadora Gral. San Martín (10 UPS)
- Planta Potabilizadora Gral. Belgrano (6 UPS)
- Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas (6 UPS)
- Planta de Ósmosis Inversa Virrey del Pino (5 UPS)
- Planta de Ósmosis inversa 9 de Abril (2 UPS)
- Planta Desnitrificadora Barrio Uno (4 UPS)
- Establecimiento Wilde (4 UPS)
- Estación Bombeo Cloacal Boca Barracas (1 UPS)
- Planta Tratamiento Hurlingham (1 UPS)
- Planta Depuradora Catonas (3 UPS)
- Planta Depuradora Lanús (3 UPS)
- Planta Depuradora Fiorito (3 UPS)
- Planta Depuradora Catonas (3 UPS)
- Planta Depuradora Santa Catalina (1 UPS)
- Planta Depuradora Ferrari (3 UPS)
- Planta Pretratamiento Berazategui (3 UPS)
- Planta Depuradora El Jagüel (3 UPS)
- Planta Depuradora Norte (4 UPS)
- Planta Depuradora Sudoeste (4 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Caballito (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Centro (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Constitución (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Devoto (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Floresta (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Lanús (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Matanza (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Morón (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Quilmes (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Saavedra (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Tres de Febrero (1 UPS)
- Estación Elevadora de Agua Villa Adelina (1 UPS)

Pozos de agua:

Se continúa adicionando pozos de agua al SCADA a medida que se completa la instalación de automatismos y radiocomunicación. También se actualizan las pantallas de detalle de pozo por cada una de las bases operativas. Esto facilitará la visualización en los puestos supervisores de

cada base, resumiendo solo los pozos en los que tienen injerencia. Se realizaron actualizaciones de la configuración de comunicación garantizando la disponibilidad de información.

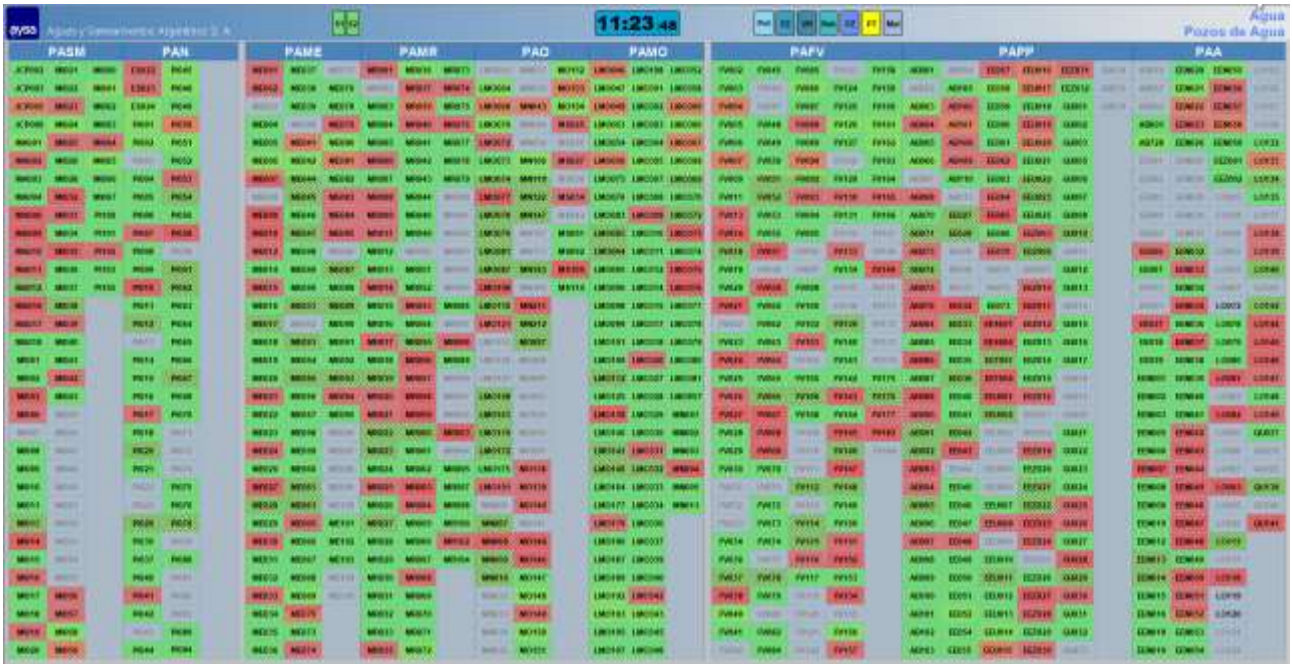


Figura 12 - Pozos de Agua

Se comienza la generación de una nueva aplicación solo para Pozos Norte. El objetivo es conocer la nueva versión de SCADA y probar nuevas filosofías de visualización y tratamiento, eventos, alarmas y datos reales e históricos.

Actualización en Sinópticos resumen EEAGUARD:

Se realizan mejoras, junto a personal de CCA (Control Centralizado de Agua), en la organización y contenido de información de todos los sinópticos de resumen para facilitar el monitoreo por parte de la guardia de tres turnos.

Mejoras y actualizaciones:

Se realizaron mejoras y actualizaciones menores en diversas aplicaciones:

Alivio de Carga:

Permite visualizar el correcto suministro de energía en grandes equipos rotantes Control Centralizado de Energía**.**

Planta Potabilizadora San Martín - Nueva Planta de Cal:

En esta primera etapa se diseñan los sinópticos de la nueva planta de cal en conjunto con personal de producción y laboratorio de planta. Completados los trabajos de configuración de lógica y puesta en marcha, se avanzará en la unificación de ambas plantas de cal (vieja y nueva).

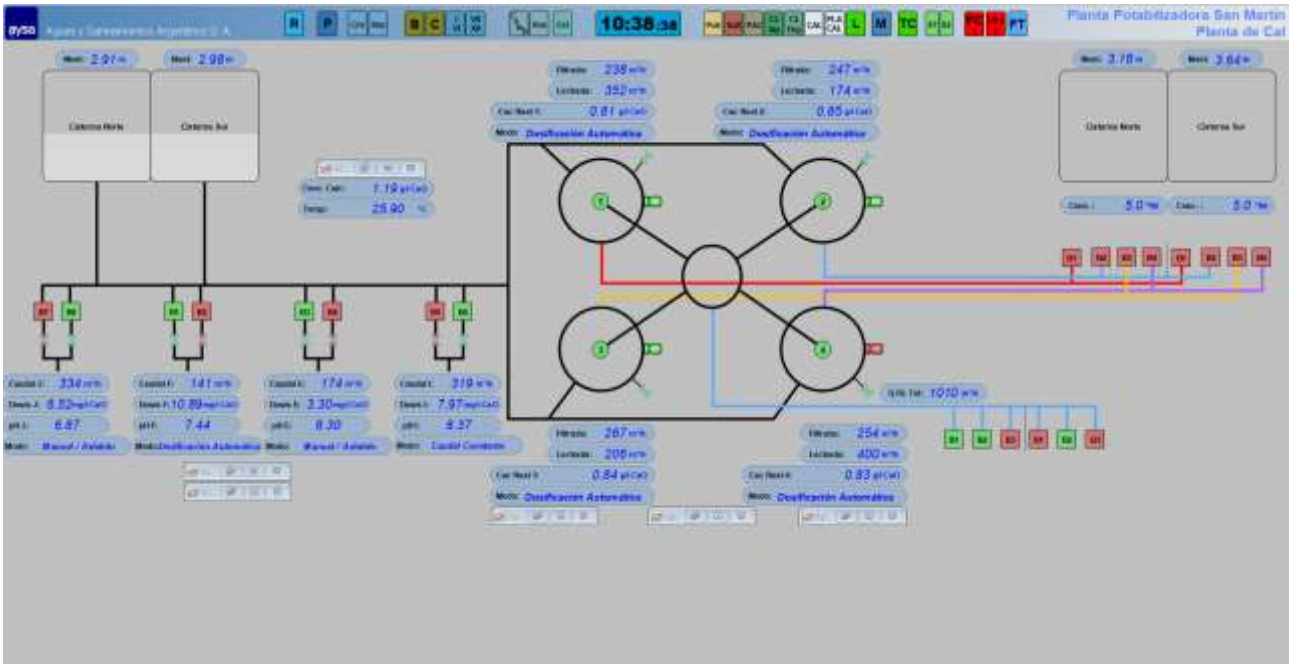


Figura 13 – Nueva Planta de Cal

Administración de Usuarios SCADA:

Se realizaron altas, bajas y modificaciones de usuarios SCADA Topkapi y Topkapi Open Client (conexión remota) de todos los sitios de la concesión. Se colabora con auditoria interna generando listados de usuarios autorizados a utilizar el SCADA. Se generó documentación para ordenamiento el flujo de trabajo cuando llega órdenes de trabajo por ABMB de usuarios.

Asistencia en migración Rebombeo Vétere:

Se realizó la migración del PLC del Rebombeo Vétere, requiriendo actualización de tablas y sinópticos en SCADA EEAGUARD.

Normalización Infraestructura SCADA Planta Pretratamiento Berazategui:

Se realizó el recambio de la infraestructura SCADA, se acondicionó el rack y se instalaron UPS para resguardar los servidores SCADA y los clientes SCADA remotos en planta.

Planta Potabilizadora San Martín - Impelentes Principales – Finalización de la actualización SCADA por Migración del PLC:

Se completan los trabajos de mejora y actualización para visualizar la nueva implementación de automatismos. Se genera nuevo sinóptico estándar para visualizar el estado de funcionamiento de la redundancia de PLC M580 y permitir un diagnóstico al personal de mantenimiento.

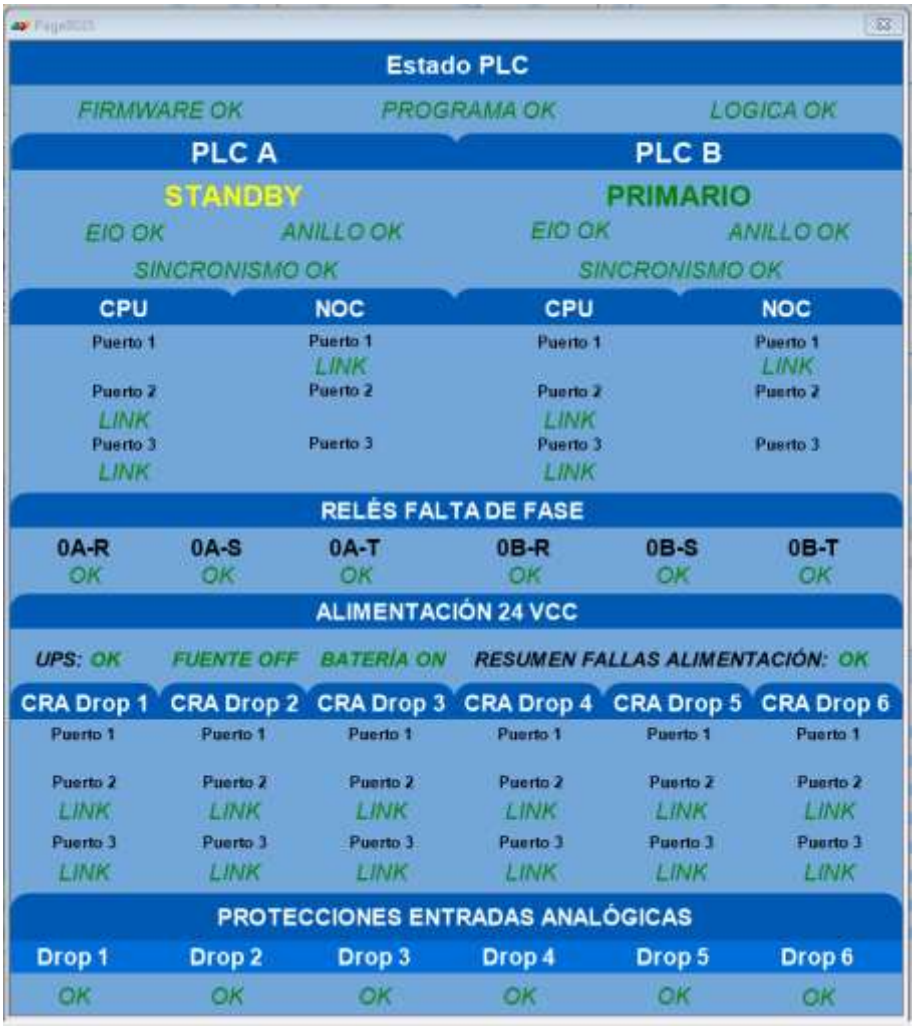


Figura 14 - Impelentes Principales – Diagnóstico Redundancia PLC

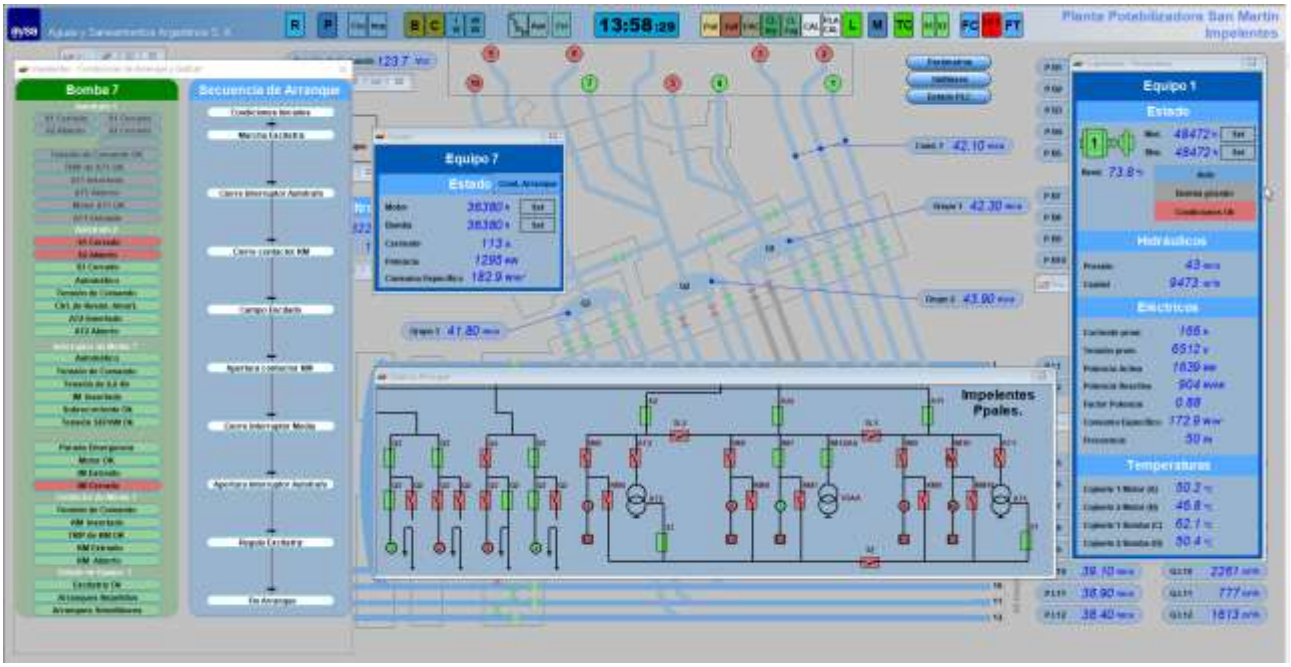


Figura 15 - Impelentes Principales – Popups bombas y Unifilar

Planta Potabilizadora San Martín – Laboratorio de Planta:

Junto a personal de laboratorio de planta se acondicionaron los sinópticos para mejorar la operación de la guardia de tres turnos.



Figura 16 - PSM – Resumen Laboratorio de Planta

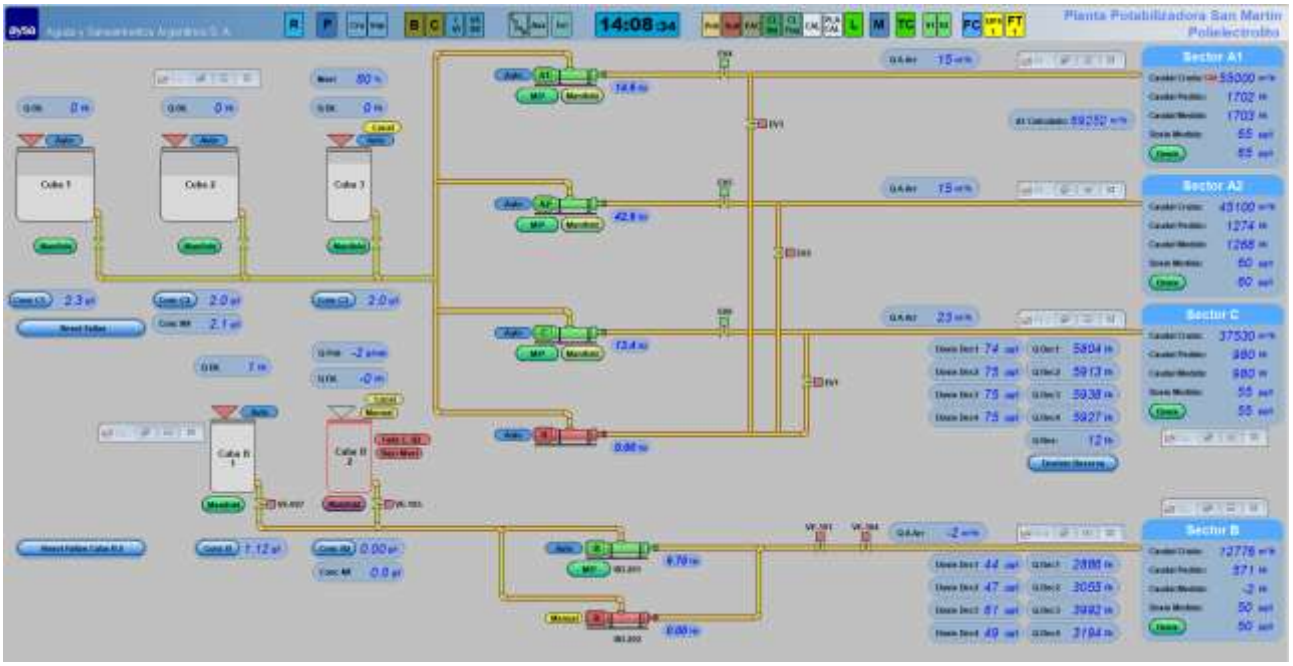


Figura 17 - PSM – Laboratorio de Planta – Polielectrolito

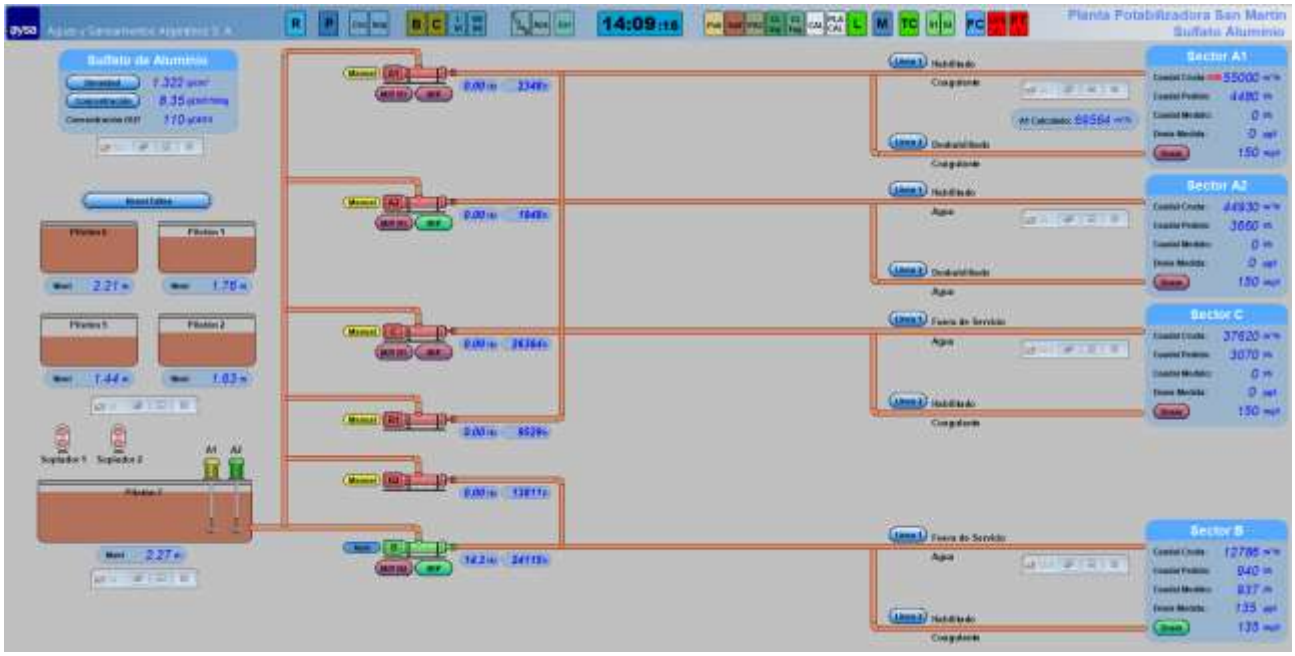


Figura 18 - PSM – Laboratorio de Planta - Sulfato

Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas – Impulsión:

Junto a personal de funcionamiento y jefatura se acondicionan los sinópticos para reflejar el nuevo modo de funcionamiento de los variadores de frecuencia de las bombas principales de impulsión.

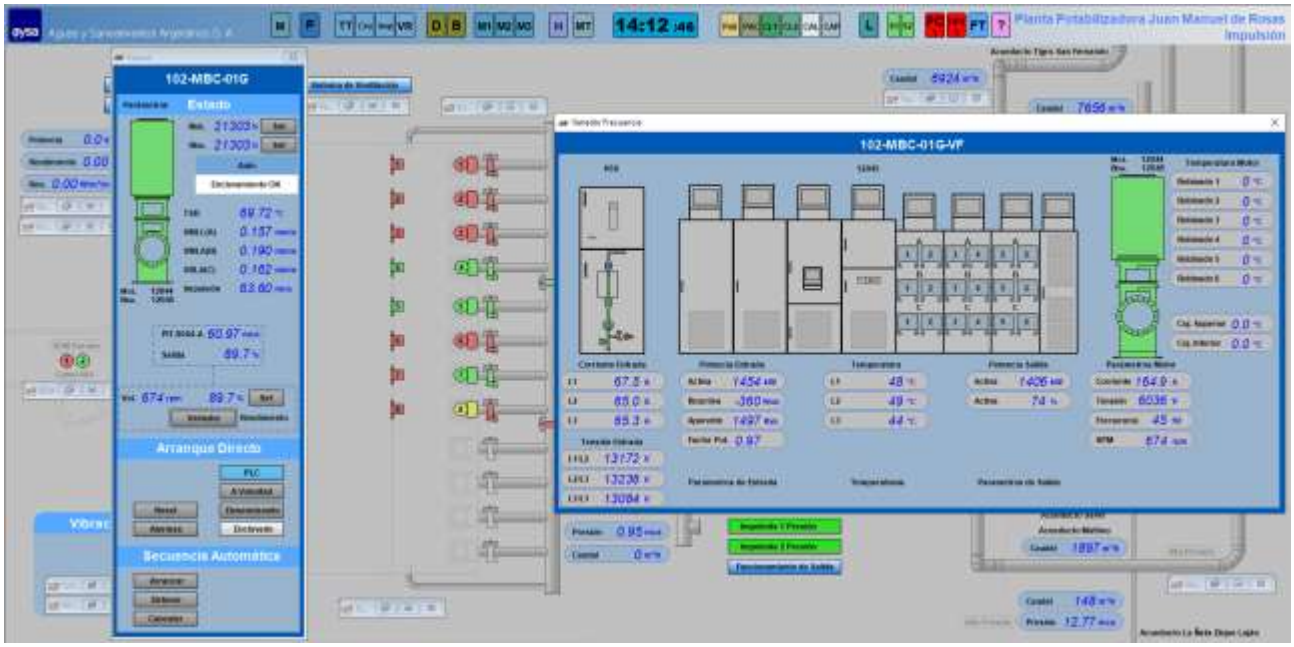


Figura 19 - PMR – Impulsión

INFORME ANUAL 2025

Automatismos y Sistemas de Control

Nuevos Partidos

Tabla de contenido

Trabajos realizados en nuevos partidos **1**

1 Obras y Proyectos **1**

2 Mantenimiento **1**

3 Sistemas de control **4**

Trabajos realizados en nuevos partidos

Durante el 2025 el área de Automatismos y Sistemas de Control desarrolló los siguientes trabajos en los nuevos partidos

1 Obras y Proyectos

Durante el Año 2025 se trabajó en las siguientes obras de relevancia:

Obras en Curso: Revisión de ingeniería, FAT, SAT

- Planta Champagnat (NC70187)
- Planta Maquinista Savio – Rejas (OC71179)
- Planta Catonas – Ferrari (OC71512)
- Planta Escobar – Rejas (OC70196)
- Planta Garín – Rejas (OC70196)
- EBC San Jorge (SC70311) (PEM)
- EBC Los Berros (NC70175) (PEM)
- EBC San Carlos (OC70260)

Elaboración de Especificaciones Técnicas y Proyectos

- ETAUT3-103 SA70311 – Planta Intercambio Iónico Barrio San Miguel
- Planta Depuradora Merlo Norte – Revamping (OC70297)
- Planta Depuradora Escobar (NC702658)
- Monitoreo remoto – Concentradora Planta Depuradora Ferrari
- Monitoreo remoto – Planta Depuradora Florencio Varela
- Monitoreo remoto – Concentradora Planta Depuradora Catonas

2 Mantenimiento

Pozos de Agua:

Durante el año **2025** se trabajó para normalizar el estado de los pozos.

Con la colaboración de otros sectores de la GCyA se realizaron las siguientes tareas: Relevamientos de tableros existentes, retiro de tableros fuera de servicio, reacondicionamiento de tableros existentes, instalación de tableros nuevos, conexión de instrumentos, configuración de escalados de sensores, configuración de parámetros de energía, reporte a SCADA (Topkapi).

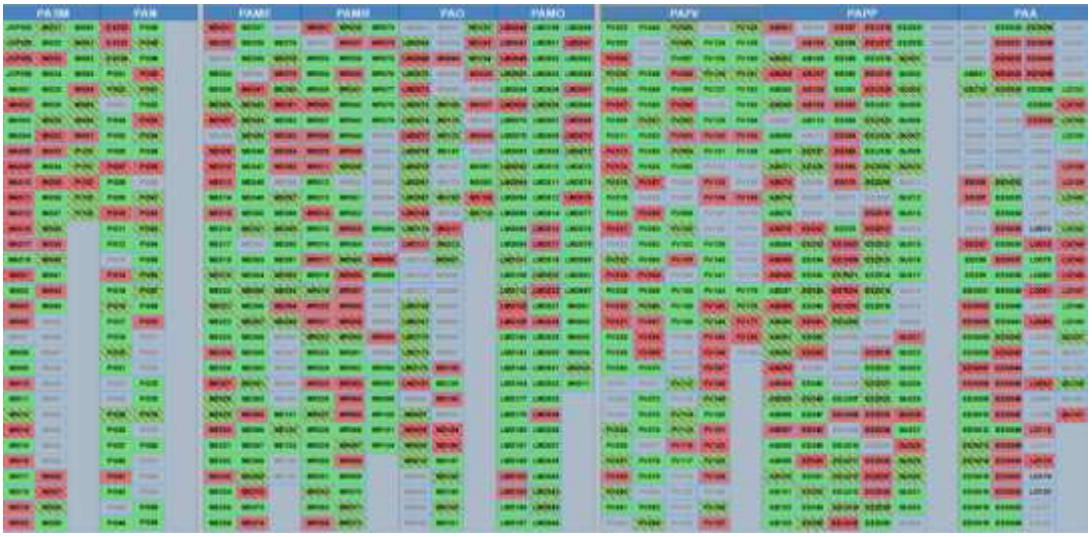


Figura 1 - Pozos de agua

Estaciones de Bombeo Cloacal:

Se realizaron trabajos mantenimiento en varias EBC.

Se trabajó en conjunto con Radiocomunicaciones para recambio de SIM en aquellos sitios en donde fallaba el automatismo. También durante el 2025 se continuó trabajando en la optimización de las EBC. Entre las tareas realizadas están la carga de programa estándar, carga de parámetros eléctricos al PLC para su posterior reporte, altas en SCADA.



Figura 2I - EBC - Vista general

Válvulas Reguladoras:

Se continúa con las instalaciones de equipamientos de automatismos en VR diseñadas tiempo atrás. Se realiza puesta en marcha y visualización en Topkapi. Se planifica continuar en con estos trabajos en 2026.



Figura 3II - Válvulas Reguladoras

Mejoras y Actualizaciones en Tanques, Rebombeos y Plantas:

Se realizaron trabajos de mejoras y actualizaciones en diferentes sitios, lo que incluyó agregados en mediciones para su posterior reporte en SCADA.



Figura 4 - Resumen Tanques y Rebombeos



Figura 5 - Resumen Plantas

3 Sistemas de control

Redundancia Planta Depuradora Catonas:

Con motivo de contar con sistemas redundantes que aseguren la operación y supervisión de los procesos mediante el Sistema SCADA se comenzaron las tareas y configuraciones necesarias para dejar en esta configuración a la aplicación de agua PDCATONAS. Se completa la implementación el servidor primario proporcionando 10 conexiones concurrentes Open Client para acceder al mismo, permitiendo que clientes externos puedan consultarlo. Ambos servidores se trasladaron a un rack normalizado, asegurando alimentación eléctrica desde UPS y doble acceso a la red de datos. Se planifica la adquisición de licenciamiento para completar las funcionalidades requeridas por jefatura de planta.

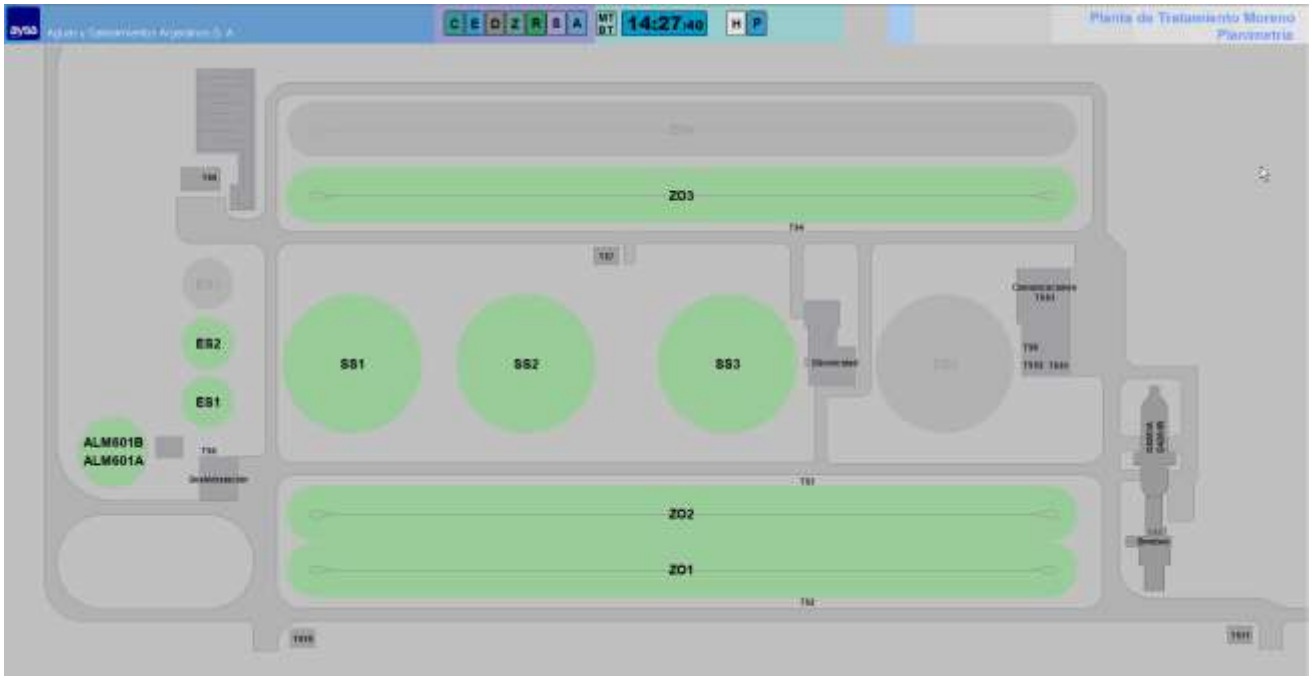


Figura 6 - Planta Depuradora Catonas - Vista Planta

Redundancia Planta Depuradora Ferrari:

Con motivo de contar con sistemas redundantes que aseguren la operación y supervisión de los procesos mediante el Sistema SCADA se comenzaron las tareas y configuraciones necesarias para dejar en esta configuración a la aplicación de agua PDFERRARI. Ambos servidores se trasladaron a un rack normalizado, asegurando alimentación eléctrica desde UPS y doble acceso a la red de datos. Se planifica la adquisición de licenciamiento para completar las funcionalidades requeridas por jefatura de planta.

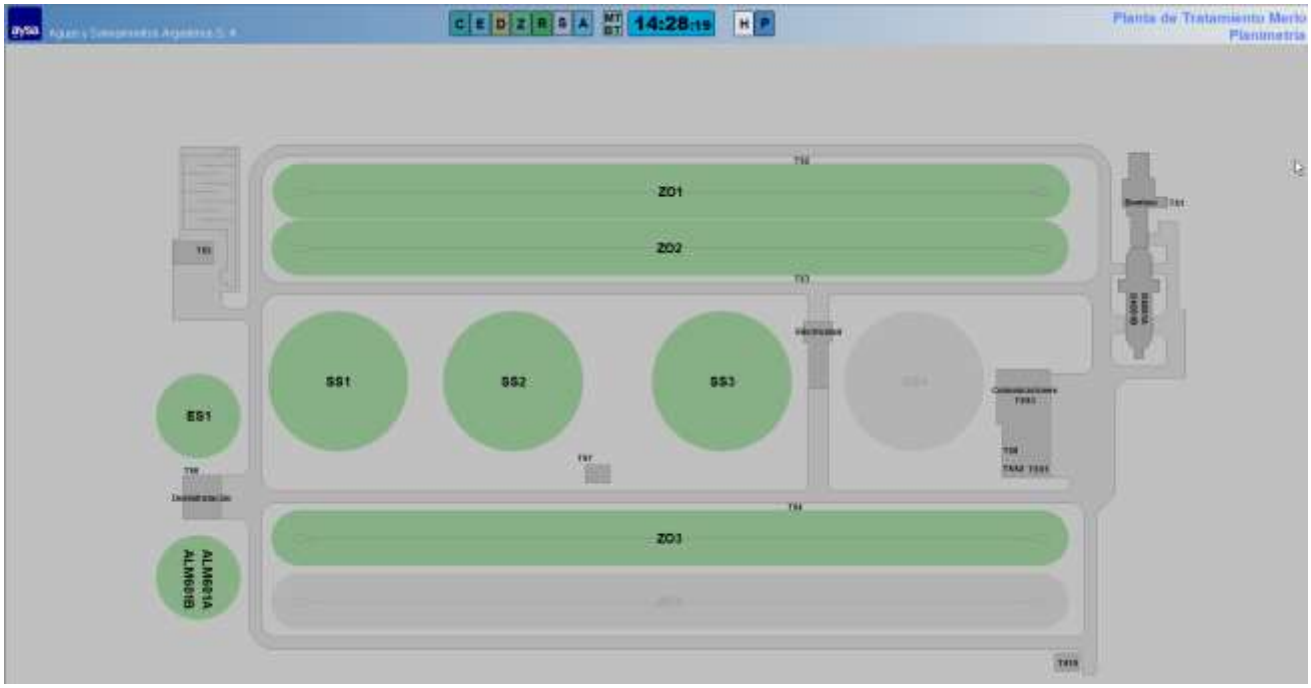


Figura 7 - Planta Depuradora Ferrari - Vista Planta

Mejoras y actualizaciones de Tanques, Rebombeos y Plantas:

Se realizaron nuevos sinópticos, mejoras y actualizaciones en SCADA EEAGUARD:



Figura 8 - Resumen Tanques y Rebombeos



Figura 9 - Resumen Plantas

Pozos de agua:

Se continúa adicionando pozos de agua al SCADA a medida que se completa la instalación de automatismos y radiocomunicación. También se actualizan las pantallas de detalle de pozo por cada una de las bases operativas. Esto facilitará la visualización en los puestos supervisores de cada base, resumiendo solo los pozos en los que tienen injerencia. Actualizaciones de la configuración de comunicación garantizando la disponibilidad de información.

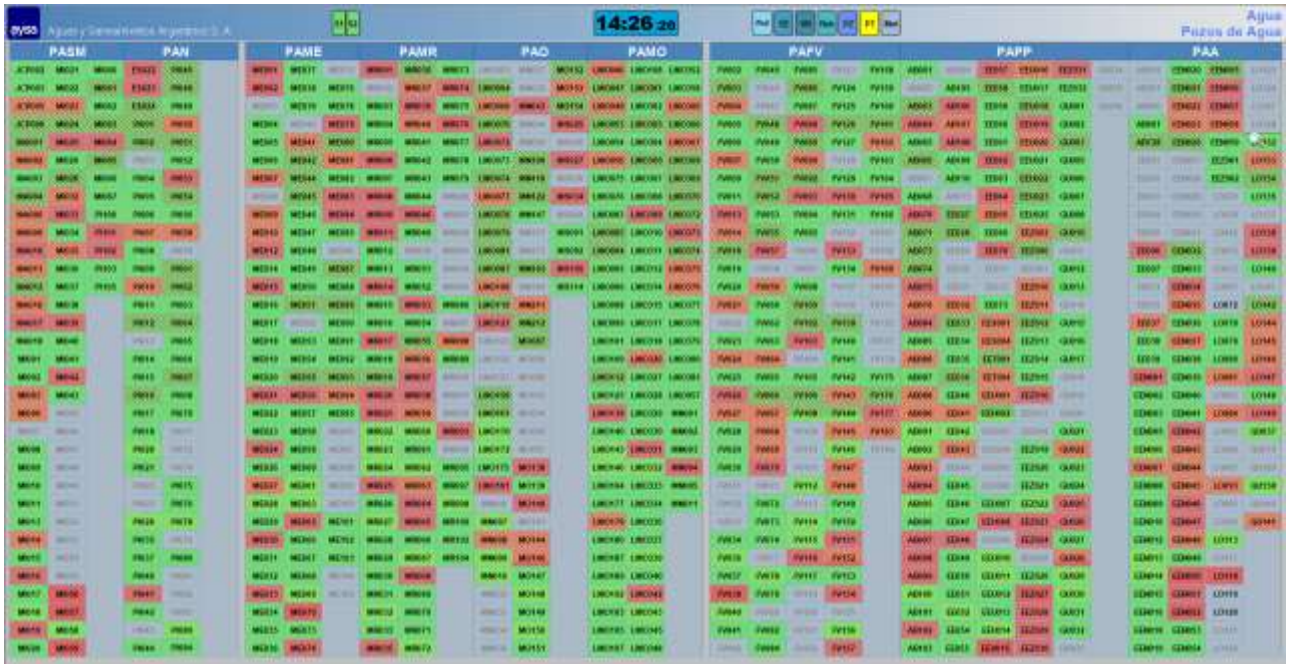


Figura 10 - Pozos de Agua

Actualización de Sitios en SANEAMIENTO:

Se realizaron trabajos de configuración para mantener actualizado el parque de Estaciones de Bombeo Cloacal (EBC) y Puntos de Monitoreo de Red Cloacal (PMR).



Figura 11 - Sinóptico EBC



Figura 12 - Sinóptico PMR

INFORME ANUAL 2025

Energía

Contenido

1 Sistema de Gestión de la Energía..... 3
2 EJE 1: Eficiencia Comercial - Contratación en Mercado Eléctrico Mayorista y Distribuidoras 5
3 EJE 2: Eficiencia Operativa - Continuidad del Servicio – Calidad de Energía - Monitoreo..... 12
4 EJE 3: Eficiencia Energética - Eficiencia en el uso de la energía eléctrica..... 18
5 Planes futuros:..... 20

La gestión de la energía eléctrica en la empresa es un capítulo de especial relevancia debido a su incidencia en los costos operativos y su impacto ambiental.

A continuación, se presenta una breve descripción de la cuestión, las acciones desarrolladas en la materia y las líneas de trabajo a desarrollar.

1 Sistema de Gestión de la Energía

El objetivo principal de disponer de un Sistema de Gestión de la Energía radica en la importancia del suministro en la explotación y la expansión del sistema de agua y saneamiento.

La energía eléctrica es imprescindible para el desarrollo de la actividad que lleva a cabo AySA S.A. en su área de acción.

El sistema se basa en objetivos y acciones de mejora continua alineados en cuatro conceptos principales:

- Dar confiabilidad a los sistemas y procesos existentes, de modo de asegurar la operación y monitoreo continuo de las instalaciones, elevando los niveles de seguridad de las personas.
- Desarrollar planes de mejora que apunten a la reducción del consumo específico y por ende el costo específico de operación del servicio, asociados a incrementar el rendimiento energético de las instalaciones y al recambio tecnológico de equipos
- Acompañar y asegurar la expansión de los servicios de agua y saneamiento garantizando la ampliación del servicio eléctrico que permita su puesta en funcionamiento en tiempo y forma
- Asociado a la participación global de este insumo crítico en el presupuesto operativo de la empresa, establecer estrategias para la mejora en las condiciones comerciales de contratación y de abastecimiento energético.

Por otra parte, la complejidad del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la cantidad y diversidad de instalaciones de alimentación y distribución eléctricas existentes en AySA S.A., hacen que resulte fundamental desarrollar planes de Energía Eléctrica, que permitan:

- Garantizar la operatividad del servicio en el corto, mediano y largo plazo, a través de la racionalización, el mantenimiento y la optimización de los recursos disponibles en materia energética y económica.
- Procurar satisfacer las necesidades actuales y futuras sin afectar el medio ambiente.
- Fomentar el desarrollo de la conciencia por la eficiencia energética, mantener el interés y el compromiso de los niveles estratégicos, tácticos y operativos e identificar metas en las áreas involucradas.
- Procurar la mejora en los procesos de eficiencia energética, a través de nuevos desarrollos tecnológicos en los equipos, nuevas herramientas de análisis energético y nuevos procesos de gestión.

La Gestión de la Energía se divide en 3 ejes bien diferenciados:

- Eje 1: Eficiencia Comercial – Contratación en Mercado Eléctrico Mayorista y Distribuidoras
- Eje 2: Eficiencia Operativa - Continuidad del Servicio – Calidad de Energía - Monitoreo
- Eje 3: Eficiencia Energética – Eficiencia en el uso de la energía eléctrica – Certificación ISO 50.001

Estos ejes se caracterizan por contar con diferentes planes de acción, que permiten en su implementación alcanzar los objetivos propuestos.

Los desafíos que se presentan en el próximo quinquenio están asociados a la disponibilidad de recursos para poder cumplimentar con los planes, acceso a financiamiento disponibilidad de tecnología asociada a la mejora y a la eficiencia y a la flexibilidad en las contrataciones asociada a las reglamentaciones y regulaciones del servicio eléctrico.


Los planes tienen como alcance la totalidad de los suministros de energía eléctrica y de gas de la empresa, actuales y futuros asociados al plan de expansión y/o mejora de los servicios de agua y saneamiento.

2 EJE 1: Eficiencia Comercial - Contratación en Mercado Eléctrico Mayorista y Distribuidoras

2.1. Generalidades:


El abastecimiento a los puntos de consumo de energía eléctrica de AySA S.A. se realiza a través de las redes de distribución eléctrica de las empresas distribuidoras que prestan el servicio (EDENOR y EDESUR según corresponda).

Actualmente, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 26 municipios del conurbano bonaerense del área de concesión, la empresa cuenta 1455 suministros, de los cuales 791 son abastecidos por EDENOR (54 %) y 664 por EDESUR (46 %).

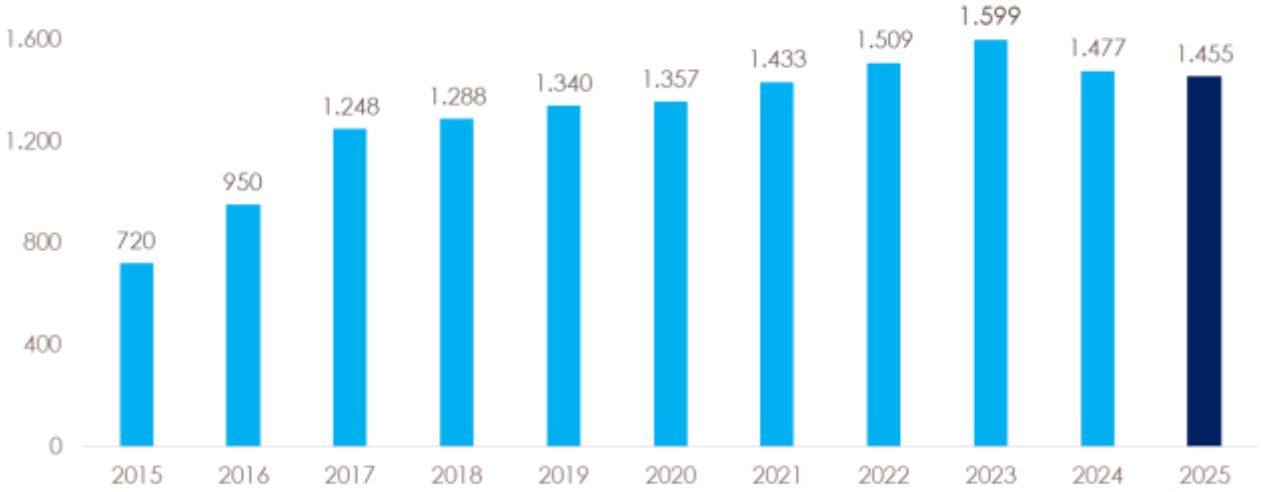

EVOLUCIÓN DE SUMINISTROS OPERATIVOS POR AÑO

AySA S.A es el principal consumidor de energía del área metropolitana con una demanda total de **793,5 GWh** durante 2025.

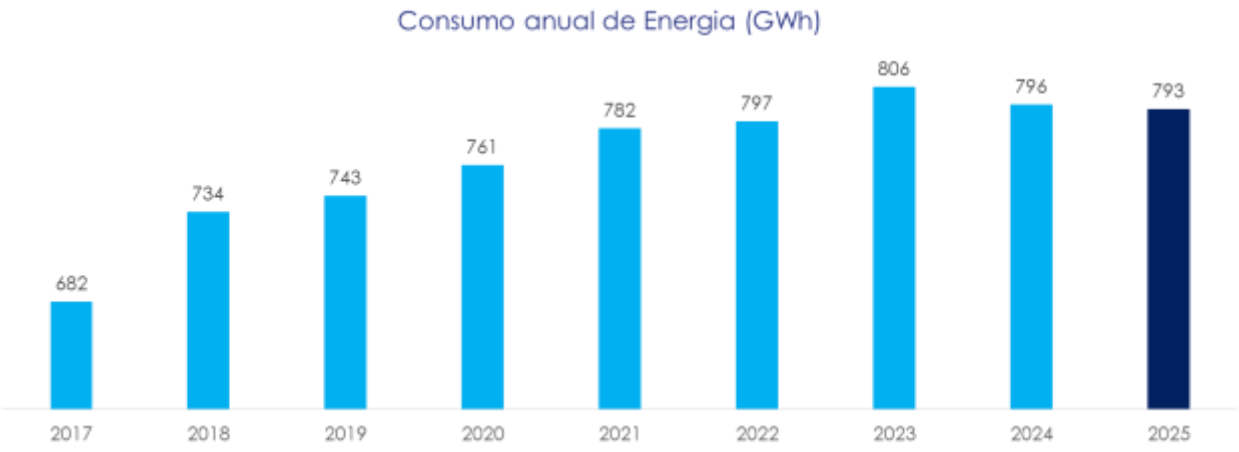

2.2. Gestión Comercial en el Mercado Eléctrico Mayorista y Distribuidoras

La Gestión Comercial es la que permite el seguimiento de la facturación de las distribuidoras y las empresas proveedoras mayoristas de energía. Es fundamental para el seguimiento económico-financiero y permite tener un control sobre desvíos de potencia, de factor de potencia y también detectar efectos y cargos de nuevas regulaciones y errores de facturación.


2.3. Gestión del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

AySA como agente del Mercado Minorista es abastecida por las Distribuidoras EDENOR y EDESUR, en cambio en el mercado Mayorista la energía es abastecida por CAMMESA y distintos contratos con Generadores. Actualmente se cuenta con 4 contratos de abastecimiento de energía en el MEM:

1. Generación Térmica Plus Contrato con TermoAndes (AES Argentina) vigente hasta el 31/01/2026 hasta 18 MW de Energía Térmica de abastecimiento de la Demanda Excedente.
2. Generación Renovable eólica contrato con Vientos La Genoveva II (Central Puerto) vigente hasta el 0 1/09/2029 hasta 87.600 MWh/año.
3. Generación Renovable solar contrato con con Helios Santa Rosa II (Tassarolli) vigente hasta el 01/05/2026 hasta 15.000 MWh/año.
4. Generación Renovable contrato con el conjunto Generador Genneia vigente hasta el 30/04/2030 por 300.000 MWh/año

2.4. Distribución mensual de consumos por Proveedor de energía Mayorista:

La Potencia Media para los GUMA en el período 2025 fue de 64,2MW y el consumo anual fue de 562 GWh.

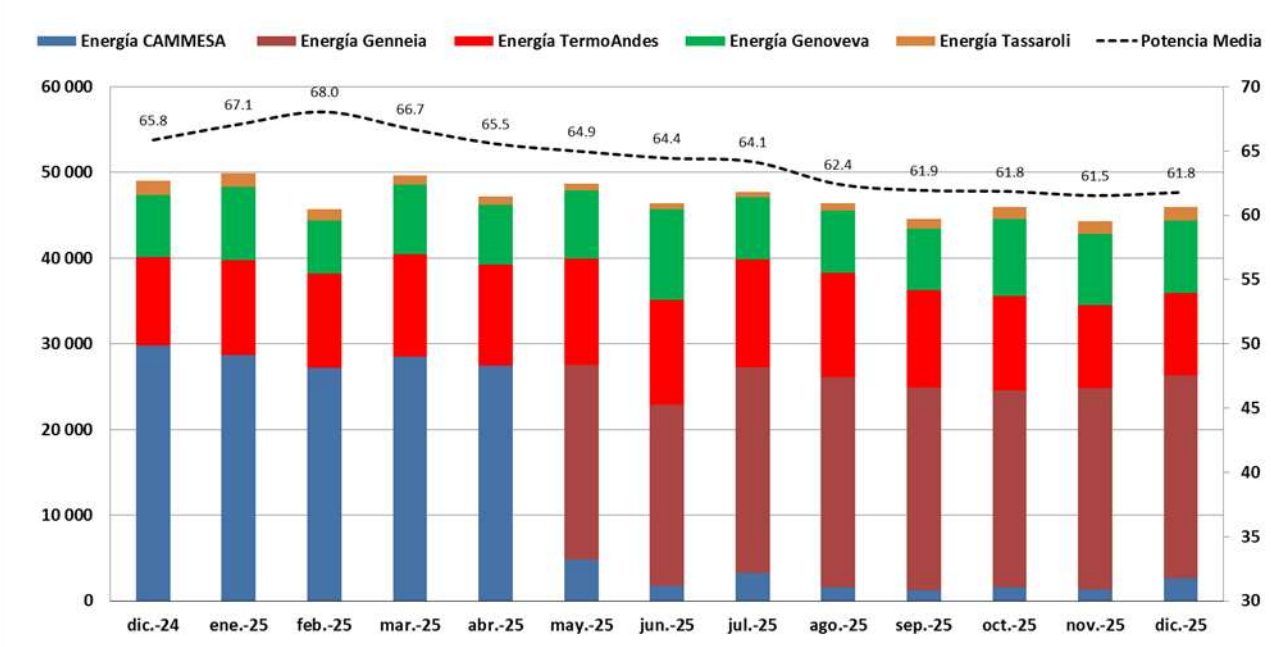

Los contratos realizados en el MEM permiten obtener ahorros significativos y una mayor previsibilidad en el costo de la energía.

Los contratos a término vigentes presentan precios anual promedios menores a los costos de la energía provista por CAMMESA, generando ahorros por precio más bajo y por efectos de los incentivos regulatorios (descuentos en potencia por contratos plus y descuentos por contratos de energía renovable).

2.5. Incorporación de Energías Renovables a la matriz de abastecimiento de energía de AySA

En relación a la Ley 26.190/15 y 27.191/16 de renovables, AySA S.A. cuenta con 25 suministros alcanzados por la misma.

Ley de Energía Renovables establece que todos los Grandes Usuarios de la Argentina consuman un porcentaje creciente de sus demandas con abastecimiento de EERR. Los suministros alcanzados por la ley en AySA se abastecen con contratos de energía renovable o bien a través del programa de compras conjuntas de Cammesa.

Durante el 2025 el cumplimiento de la ley de renovables dio un promedio del 55,19%, en contraste con el 22,29% logrado durante el año 2024.

A partir de mayo de 2025 se firmó un contrato con Genneia para la provisión de energía renovable. Este contrato asegura 300GWh año de energía renovable permitiendo cumplir sobradamente la ley de renovables y generando una disminución muy significativa de la huella de carbono.



2.6. Gestión del Mercado Eléctrico Minorista - Distribuidora

En el Mercado Eléctrico Minorista AySA tiene 1413 suministros cuya Energía es abastecida de manera Directa por las empresas Distribuidoras EDENOR y EDESUR.

Desde el 2024 se trabaja en el marco de un Plan de eficiencia, parte de ese plan consiste en relevar y dar de baja aquellos suministros que no aportaban a los servicios que brinda AYSA y que estaban sin consumo de energía. Como resultado durante este periodo **se dieron de baja 176** suministros, Mientras que fueron dados de alta 40 nuevos suministros a los efectos de mejora del servicio en el área de concesión.

2.7. Seguimiento y control de la Facturación

Anualmente se verifican los datos de aproximadamente 18.000 facturas de energía eléctrica correspondientes a todos los suministros y cuentas operativas. La información recabada permite realizar:

- Verificación de Cuentas Operativas
- Control de Facturación
- Contraste de lectura Facturas vs. Monitoreo
- Pago de Facturas aprobadas
- Provisiones mensuales del insumo energía
- Emisión de reclamos por facturación errónea
- Recontratación de potencia
- Proyección de consumos y presupuesto

2.8. Evaluación Regulatoria

Mercado Mayorista

La provisión de energía de AySA se realiza tanto en forma directa con las empresas distribuidoras (Edenor y Edesur) como a través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En este marco, AySA posee la categoría de Gran Usuario, con 20 suministros GUMA y 22 GUME, clasificación determinada por CAMMESA, organismo responsable de la operación y administración del MEM.

El MEM es un mercado regulado por leyes, decretos y resoluciones específicas. Hasta el año 2005, AySA debía abastecer la totalidad de su demanda a través de CAMMESA. En 2006, mediante la Resolución Nº 1281/2006 de la Secretaría de Energía, se habilitó la posibilidad de contratar la demanda excedente —tomando como base el consumo del año 2005— con generadores bajo el esquema de Energía Plus.

Posteriormente, la Ley 27.191 (2015) incorporó la opción de contratar dicho excedente en el mercado de energías renovables (MATER).

Durante el 2025 ya partir de la Resoluciones 21/2025 y especialmente la N.º 400/2025, el mercado avanza hacia un esquema de mayor desregulación, eliminando el concepto de

Energía Plus y habilitando la contratación de la totalidad de la demanda en el mercado en lugar de solo la excedente.

Factor de Potencia

El 5 de febrero de 2024 el ENRE publicó en el Boletín oficial la Resolución 85/2024. La misma eleva el límite del cos phi de 0,85 a 0,95 límite de penalización al Usuario para todas las categorías Tarifarias con el fin de "Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad fijando metodologías apropiadas" establecen para EDENOR y EDESUR nuevos límites del Factor de Potencia Inductivo.

Apenas se conoció la nueva normativa en 2024, y considerando el nivel de compensación del factor de potencia en las instalaciones de AySA, se realizó una estimación del aumento en las multas previsto por la aplicación del nuevo valor límite de factor de potencia de 0,95. Simultáneamente se realizaron gestiones ante el ENRE y la Secretaría de Energía que dieron como resultado la publicación de nuevas resoluciones que aliviaron el impacto económico de la resolución original.

- **Resolución ENRE N.º 85/2024**
  Establece el "Programa para la Mejora del Factor de Potencia", elevando el límite mínimo del factor de potencia inductivo de 0,85 a **0,95**. Esta medida busca alinear los estándares nacionales con las normativas internacionales y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.
- **Resolución ENRE N.º 222/2024**
  Modifica aspectos de la resolución anterior, detallando los recargos aplicables a los usuarios que no cumplan con el nuevo límite de factor de potencia.
- **Resolución ENRE N.º 544/2024**
  Precisa criterios técnicos del programa, incluyendo requisitos para la instalación de equipos de corrección del factor de potencia y establece un cronograma progresivo para la aplicación de recargos.
- **Resolución ENRE N.º 628/2024**
  Establece que los usuarios residenciales monofásicos quedan exentos de la obligación de corregir el factor de potencia y, por lo tanto, no se les aplicarán recargos por este concepto.
- **Resolución ENRE N.º 76/2025**

Establece la reducción al 10% del recargo que correspondería para un factor de potencia entre 0.85 y 0.95 con revisiones trimestrales.


Dado el gran impacto económico que generan las nuevas resoluciones, se realizó un estudio de inversión para compensar los sitios y evitar el futuro cargo por multas. Los trabajos de compensación comenzarán en 2026.

2.9. Autogeneración de Energía

Autogeneración in situ – Prueba Piloto en Planta San Martín

Desde el año 2021 en Planta San Martin funciona un piloto de autogeneración solar correspondiente a una potencia instalada (Pi) de 20 kWp. Durante el 2023 se realizó la ampliación del parque Fotovoltaico a 60 kWp de potencia que empezó a generar en marzo 2024.

	2021	2025
Potencia instalada (kWp)	20	60
Generación anual (kWh/año)	30.000	98.886
Factor de **capacidad** (FC)	17,6%	18,8%

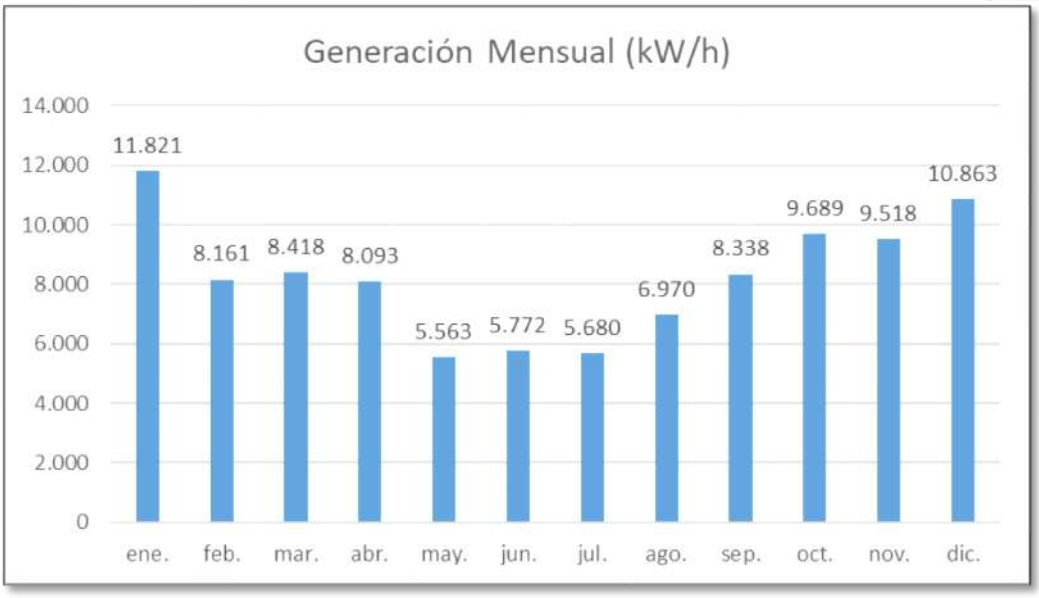


Esta prueba Piloto sirve para ver el efecto del rendimiento del recurso solar en el área de concesión y permite evaluar proyectos futuros. Para el año 2025 dio un Factor de Capacidad de 18,8%.

3 EJE 2: Eficiencia Operativa - Continuidad del Servicio – Calidad de Energía - Monitoreo

3.1. Continuidad del Servicio de Abastecimiento de Energía - Gestión de reclamos eventos de Cortes de Servicio – GTO

Durante el año 2025 se registraron un total de 3841 solicitudes de interrupciones en el servicio eléctrico, con un promedio de duración de 33 horas.

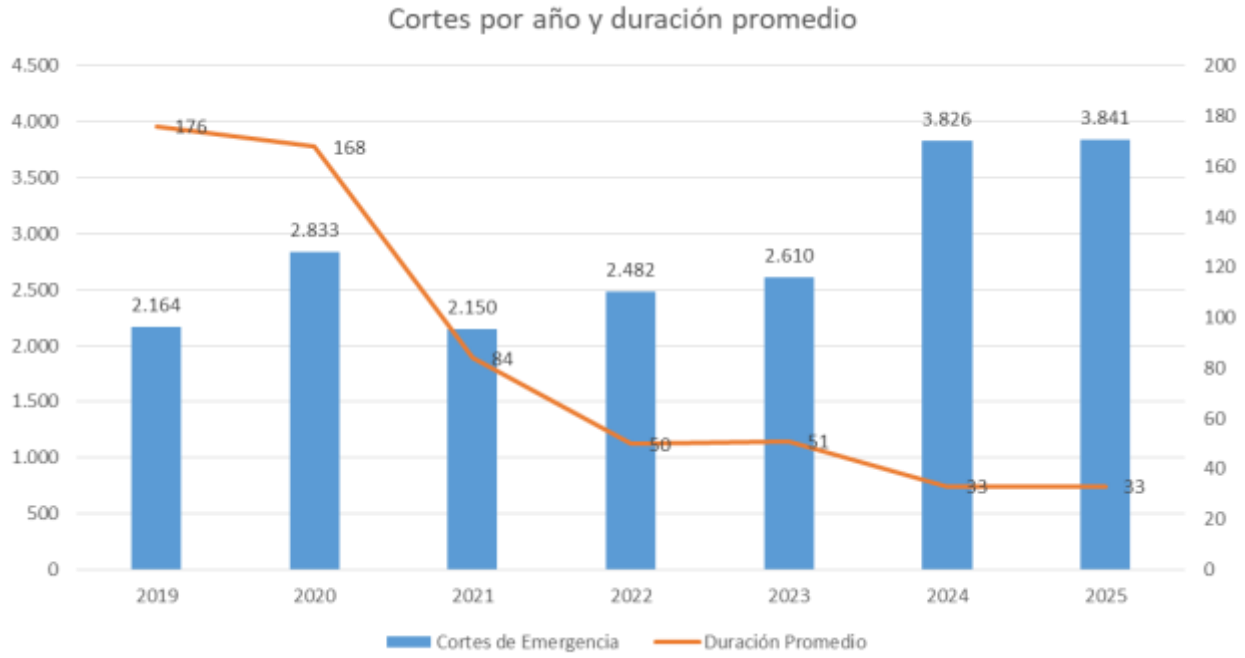

CANTIDAD DE CORTES POR AÑO /HORAS PROMEDIO

El gráfico adjunto muestra el trabajo continuo que se viene desarrollando se logró una mejora en el tiempo promedio de resolución de las afectaciones al servicio pasando de 176 hs a 33 hs.

Las razones de esta mejora fueron:

1. La incorporación de la Guardia 3 Turnos en el Centro de Monitoreo para la Operación de Alta Tensión en Planta Manuel Belgrano.
2. El seguimiento 24x365 hs de los Cortes de Servicio asociados a Energía con esta guardia como soporte.
3. Reducción total del tiempo de corte por reducción considerable del tiempo de detección de interrupciones y de gestión de los reclamos.

Se observa también que el número de reclamos asociados a afectaciones en el servicio eléctrico creció año a año, esto se debe a varias razones:

1. El incremento de suministros a gestionar – expansión
2. La eficiente ejecución del Plan de Monitoreo para detección de cortes en sitios que no tienen personal fijo

Ante la aparición de un evento que afecte a los suministros categorizados como urgencia o primer prioridad, se actuó con todos los medios disponibles para su solución, trabajando con

las áreas y sus responsables y las empresas distribuidoras, para que intervengan en el sitio afectado, atendiendo el inconveniente con la mayor urgencia y responsabilidad que implica un suministro de tal magnitud para el servicio que presta AySA S.A.

Se trabaja en forma coordinada con la Gerencia de Rodados para la provisión de los grupos electrógenos en los suministros críticos o aislados que requerían energía en forma urgente y la empresa distribuidora no podía solucionar en el corto plazo.

3.2. Centro de Control de Operaciones de Alta Tensión (COAT) - Centro de Monitoreo de energía (CME)

Durante el 2023 se implementó el Centro de Operaciones de Alta Tensión de AySA, de acuerdo a los procedimientos exigidos por CAMMESA. Durante el mes de octubre de 2023 se realizó la conexión de AT en Planta Manuel Belgrano.

Desde el COAT se realiza el monitoreo en línea del consumo eléctrico, esto permite un mejor control y operación de las instalaciones de AySA y es una herramienta fundamental para monitorear la calidad de energía que se recibe por parte de las empresas distribuidoras.

Desde la creación del COAT se generaron 81 solicitudes de servicio para registro y gestión con SACME de las Operaciones en Alta Tensión de la Planta Potabilizadora General Belgrano, 38 de dichas solicitudes fueron generadas durante el año 2025. Todas las maniobras críticas realizadas fueron exitosas.

Entre las principales tareas de rutina llevadas a cabo por el COAT se destacan:

- Seguimiento de Variaciones de Tensión e Interrupciones
- Reclamos por calidad de energía
- Termografías
- Monitoreo en línea de eventos de energía
- Cálculo y presentación trimestral de las Declaraciones Estacionales ante CAMMESA
- Participación en auditorías de CAMMESA

3.3. Eficiencia Operativa – Plan de Monitoreo Evolución

Durante el 2025 se dio continuidad al Plan de Monitoreo y se destaca que a diciembre se cuenta con 1040 suministros eléctricos con medición de respaldo propia, equivalente al **71%**

del parque de suministros con medición de respaldo y de calidad de servicio, que reportan en línea al Centro de Monitoreo de Energía.

La energía medida en estos suministros representa el **91%** de la demanda total de AySA:



GRAFICO: EVOLUCIÓN SUMINISTROS CON MEDICION ON LINE

El Plan de medición comenzó en 2016:

- Etapa 1 se comenzó con los Suministros Principales
- Etapa 2 y 3 Suministros Críticos
- Etapa 4 y 5 Sectorización de Grandes instalaciones para Eficiencia Energética
- Etapa 6 (en curso) – Sectorización de Grandes instalaciones para Eficiencia Energética
- Etapa Banco Mundial – Suministros menores a 50 kW con incidencia directa en el servicio. Producción de Agua Subterránea y Estaciones de Bombeo Cloacal.

En el proyecto de Banco Mundial, además de la medición de energía, los tableros instalados permiten transmitir señales de caudal y presión facilitando la operación y control de los pozos.

Es decir las instalaciones están preparadas para la incorporación de caudalímetros y sensores de presión lo que permitiría un seguimiento de las variables de **eficiencia energética** continua y precisa.


Como se mencionó en Etapa 4 y 5 En el marco del proyecto de eficiencia energética y con el fin de mejorar la medición, se trabajó con la sectorizaron de los consumos de 16 establecimientos de importancia.

La **sectorización permite** conocer en detalle el consumo eléctrico de las distintas partes de los procesos dando lugar a **acciones de eficiencia** más efectivas. También se sectorizaron los consumos de las instalaciones múltiples que comparten un mismo suministro eléctrico, por ejemplo, un predio donde hay un rebombeo y un pozo de agua.

3.4. Gestión de Nuevos Suministros (NNSS)

Desde la Gestión de NNSS durante 2025 se incorporaron 17 nuevas instalaciones y se dieron de baja 39, quedando un total de Suministros Operativos de 1455.

Durante el año 2025 se continuó con el seguimiento de bajas de suministros eléctricos con bajo o poco consumo.

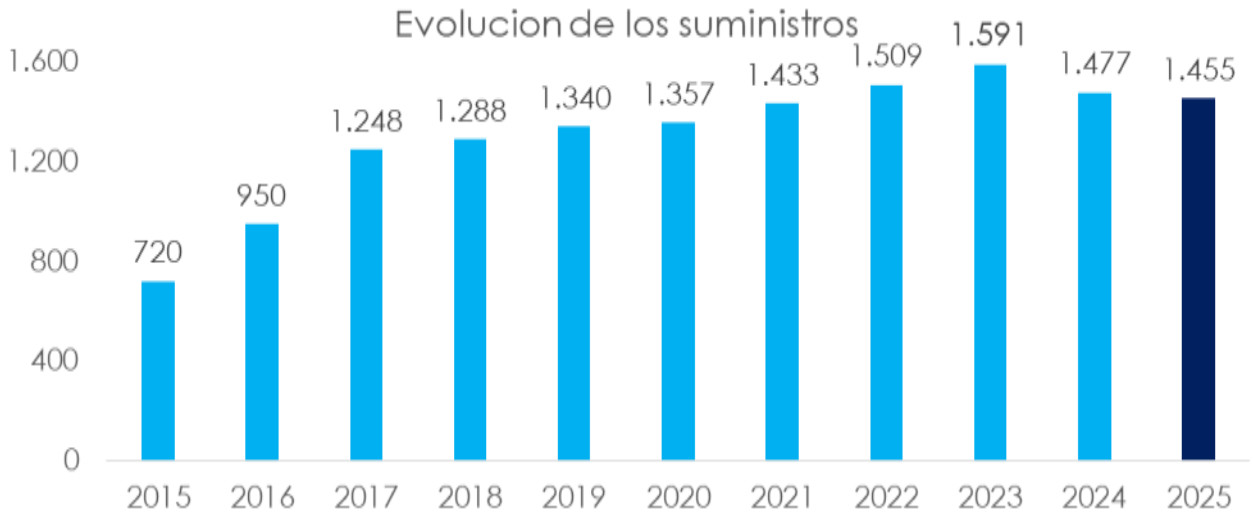

3.5. Sistema de Medición Comercial (SMEC)

Desde el Centro de monitoreo se llevan a cabo todas las gestiones relacionadas con la medición y operación de los suministros que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

- Alivio de Carga (renovación de equipos)
- Medidores SMEC (renovación de medidores)
- Proyectos SMEC (altas de nuevos suministros en el mercado mayorista)

3.6. Seguimiento de la demanda y respaldo demanda MEM

Con el objetivo de brindar servicios a los sectores operativos sobre el nivel de consumo y de potencia máxima se emiten reportes con detalle de consumo, potencia, factor de potencia, variaciones entre periodos y rendimiento.

3.7. Confiabilidad del servicio

Para aumentar la continuidad, confiabilidad y seguridad del abastecimiento eléctrico se ha trabajado en diferentes proyectos:

- Proyecto de Obra para Normalización tensión en instalaciones Pasaje de 6.6kV a 13.2kV (Paitoví, Caballito, Devoto, Centro, Boca Barracas). El proyecto de Paitoví se encuentra en ejecución en su parte civil y de adecuación del lado de la distribuidora.
- Adquisición de Storage de alta potencia 1MW (banco de batería de alta velocidad de transición)
- Renovación de equipamiento de electromecánico de las cámaras de media tensión de la distribuidora en Elevadoras Floresta y Matanza 13.2kV. El proyecto de Floresta se encuentra en ejecución.
- Implementación exitosa de Sub Estación Móvil 13,2 kV a 6,6 kV.
    - Inicio: un evento en pandemia en la EE Devoto dejó sin servicio por tiempo prolongado a la Elevadora. Para evitar futuras afectaciones de ese tipo, se diseñó una subestación móvil, que tiene la capacidad de reemplazar y permite operar al 100 % las instalaciones con tensión NO normalizada (6,6kV).
    - Falla en un transformador interno principal de PSM - la SE Móvil estuvo emplazada entre diciembre 2023 y febrero 2024 en uno de los alimentadores principales de PSM. De esta manera AySA se aseguró el 100% de operatividad y maniobrabilidad de Planta San Martín en verano, hasta la reparación del transformador.
    - El 10 de febrero de 2024 se trasladó la sub estación móvil a la Estación Elevadora Caballito donde estuvo durante 5 meses dado funcionamiento a la Elevadora, luego del incendio producido en la Sub Estación Caballito de EDESUR el 10-02-2024.
    - Durante el 2025 la Sub Estación móvil se emplazó en la Estación Elevadora Villa Devoto para reforzar la confiabilidad de la alimentación de dicha elevadora.

- Sobre el final de 2025 se trasladó la SE a Planta San Martín para comenzar los trabajos de mantenimiento de uno de los transformadores principales de planta.

4 EJE 3: Eficiencia Energética - Eficiencia en el uso de la energía eléctrica

4.1. Certificación Norma ISO 50001:2018

El Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) fue certificado bajo la norma ISO 50001:2018 en el año 2022. El sistema permite optimizar de manera centralizada el desempeño energético y la eficiencia bajo un sistema de mejora continua; y también identificar coordinadamente oportunidades de reducción de utilización de cualquier tipo de energía que se utilice dentro de AySA S.A.

La etapa de auditoria externa, a cargo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) tuvo como objetivo verificar el diseño del SGEn en base al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 50001:2018 y se desarrolló entre el 11 y el 21 de octubre de 2022.

A fines del mes de diciembre de 2022 se recibió la recomendación de certificación de la norma 50001:2018, emitida por el IRAM. La certificación proporciona a la compañía un marco internacionalmente reconocido para la gestión y mejora de su desempeño energético, reduciendo su impacto ambiental y la posiciona como un modelo ejemplar en gestión de la calidad y la energía, exigiendo un compromiso de ahorro energético y económico año tras año.


Durante octubre de 2023, IRAM realizó la primera auditoría de seguimiento para verificar la continuidad del sistema de gestión recomendando el mantenimiento de la certificación. En Noviembre de 2024 se realizó la segunda auditoría de seguimiento con resultado exitoso y finalmente durante octubre y noviembre del 2025 se recertificó la norma.

4.2. Resultados

AySA estableció en 2021 como objetivo: “Reducir el 1% del consumo eléctrico total con respecto a la base de 2021”.

Este objetivo fue cumplido para el año 2022 alcanzando un ahorro del 1,4% equivalente a 11,5 GWh. El ahorro del 2023 fue del 1,7% y en 2024 de 1,8% equivalente a 15,4 GWh. En el 2025 fue de 15.8 GWh (2%)

A continuación, se grafica el consumo esperado de energía para los años 2020-2025 y el consumo real obtenido luego de las acciones de eficiencia llevadas a cabo.

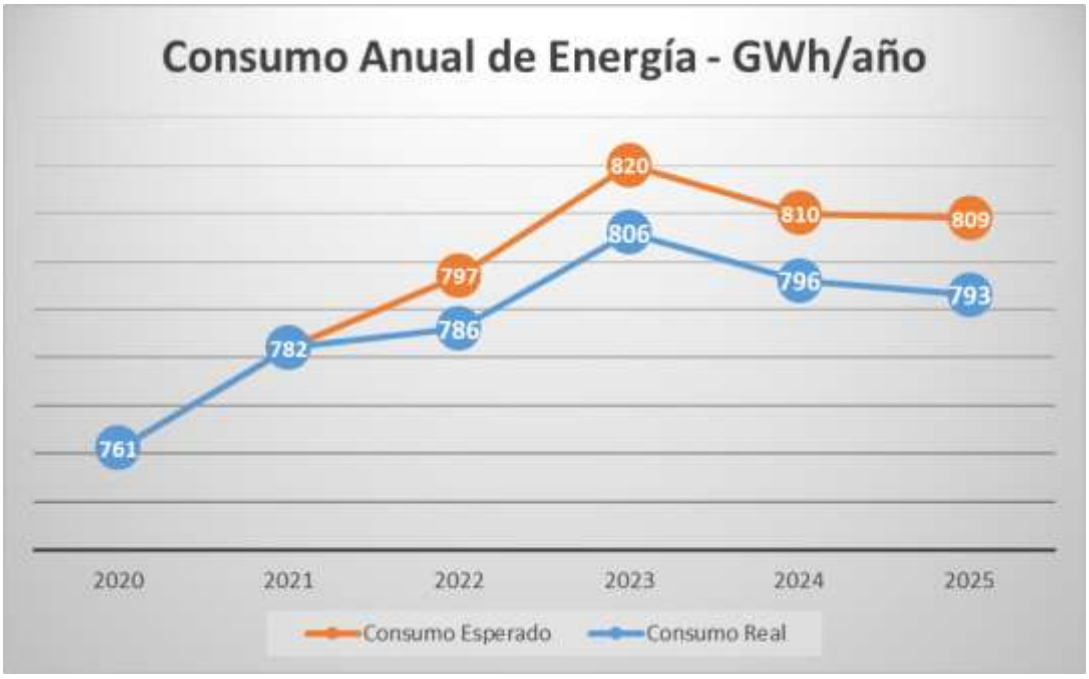

CONSUMO ESPERADO VS REAL

4.3. Programa con el Banco Mundial

Desde el año 2021 al 2025 se trabajó en un programa con el Banco Mundial (BIRF) sobre Mejora de Eficiencia en AySA S.A. Para el sector de energía se habían definido varios ejes de trabajo con un plazo de cumplimiento de 5 años. Si bien el plan se discontinuó a principio del 2025 se logró cumplir casi en su totalidad uno de sus ejes de trabajo referido al monitoreo de los consumos eléctricos.

4.3.1. Plan de Monitoreo de Consumo Distribuido

Este eje de trabajo ha permitido la financiación de 1000 equipos de medición los cuales se han instalado en su totalidad.

Durante el 2023 el Banco Mundial, a través de su agente verificador certificó 17,2 GWh de ahorros anualizados equivalentes a un 63,6% del objetivo comprometido. La verificación (en

mayo y septiembre de 2023) comprendió acciones de eficiencia en 205 pozos de agua y 23 estaciones de bombeo cloacal.

Durante el 2024 se verificaron 3,6 GWh más de ahorro anuales llegando a un 75% de avance del programa para este eje de acción. La verificación de Marzo comprendió acciones de eficiencia en 63 pozos de agua y 10 estaciones de bombeo cloacal.

Si bien el programa se discontinuó en 2025 durante ese período se logró reducir un total de **4 GWh que sumados a los ahorros presentados con anterioridad totalizaron 24,34 GWh equivalentes a un 89,7% de avance en el objetivo final.**

Entre las acciones de eficiencia llevadas a cabo en pozos de agua y estaciones de bombeo cloacal se destacan:

- Pozos de Agua
    - Cambios por bombas de mayor eficiencia y recambio de bombas por bombas nuevas de similares características
    - Reparación de bombas (limpieza y cambio de impulsores)
    - Optimización de bombeo (limpieza de filtros, ajuste de altura de bombeo)
- Estaciones de Bombeo Cloacal
    - Cambios por bombas de mayor eficiencia y recambio de bombas por bombas nuevas de similares características
    - Reparación de bombas (limpieza y cambio de impulsores y rebobinado de motores)
    - Maniobras en red (aumento de caudal por derivación de redes y limpieza de impulsiones y llegadas)
    - Optimización de bombeo (ajuste de niveles de aspiración, ciclos de arranque de bombas, variadores y limpieza mecánica de cámaras de aspiración)

5 Planes futuros:

Gestión Técnico/Operativa y Monitoreo:

- **Factor de Potencia**
    - Se está trabajando para minimizar los desvíos regularizando las instalaciones que presenten multas.

- **Interrupciones de Servicio**
  - Se seguirá trabajando junto al servicio y a las empresas distribuidoras para mejorar la calidad y continuidad del servicio.
- **Incorporación de Grandes Consumos**
  - Durante el 2026 se incorporará al servicio la Planta Dock Sud en Alta Tensión implicando un nuevo desafío para la operación y control del Centro de Monitoreo.

Gestión Comercial y MEM:

- **Contratación de Energía**
  - Dada la desregulación del mercado mayorista desde la res 400/2025 se buscará contratar el total de la demanda de los grandes usuarios de manera de obtener previsibilidad en los costos de la energía.
- **Ajuste de Potencia**
  - Se dará especial atención a la contratación de potencia para evitar multas o sobrecontrataciones.
- **Baja de suministros**
  - Se continuará con la baja de suministros pertenecientes a instalaciones que han dejado de estar operativas por diversos motivos.

Eficiencia Energética:

- **Sistema de Gestión**
  - Se continuará con el objetivo de reducción de 1% de energía
- **Proyectos de Aprovechamiento energético**
  - Se buscará avanzar en distintos proyectos de cogeneración o aprovechamiento de subproductos de depuración (barros y biogás)

Observaciones Generales: Los datos de consumo de energía se basan en la facturación recibida de las Distribuidoras hasta la fecha de elaboración del informe. En caso de haber diferencias, estos corresponden a los ciclos de facturación y emisión de las facturas por parte de las Distribuidoras.

Los tiempos de gestión para la obtención de los datos pendientes dependerán de los plazos administrativos de cada Distribuidora y sus posibles adecuaciones.

1.1.1. Planillas

aysa	**POZOS SEMISURGENTES** **ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y** **OBRAS EJECUTADAS**	**Informe Anual** **Año 2025** **101-IAT1-O-A-PRO-PS 01** / **ex PL IA N° 01/02/04/06**

REGION	DISTRITO	ESTADO DE SERVICIO AL 31/12/25				
		En Funcionamiento	En Reserva	Fuera de Servicio (parado)	Cegados // Sellados // Desactivados	Total en condiciones de Funcionar
SUDOESTE	Almirante Brown	46	8	17	1	**54**
	Esteban Echeverría	96	1	14	1	**97**
	Ezeiza	31	6	11	0	**37**
	Lomas de Zamora	7	0	3	1	**7**
	TOTAL	**180**	**15**	**45**	**3**	**195**
SUDESTE	Quilmes	4	0	0	0	**4**
	TOTAL	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**
OESTE	Morón	14	4	1	11	**18**
	La Matanza Oeste	106	14	3	21	**120**
	La Matanza Norte	16	0	1	2	**16**
	La Matanza Sur	7	2	0	1	**9**
	TOTAL	**143**	**20**	**5**	**35**	**163**
TOTALES		**327**	**35**	**50**	**38**	**362**

OBRAS EJECUTADAS									
OBRA CIVIL	OBRA ELECTROMECANICA			OBRA HIDRAULICA				VARIOS	
Gabinete	Electrobomba	Dosificador	Tablero	Válvulas	Caudalímetro	Sensores de Presión	Aforos // Rehabilitación	Automatismos	CEGADOS / SELLADOS / OTROS
12	13	4	3	1	6	0	2	54	8
21	20	6	6	1	14	0	3	92	1
4	2	1	0	0	3	0	0	41	0
3	3	2	0	1	4	0	1	2	0
40	**38**	**13**	**9**	**3**	**27**	**0**	**6**	**189**	**9**
1	3	1	1	0	3	0	0	3	1
1	**3**	**1**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**1**
22	7	4	8	0	9	6	0	11	0
52	35	11	8	0	99	93	0	112	2
16	9	7	1	0	13	1	0	8	0
7	4	0	0	0	2	2	0	7	0
97	**55**	**22**	**17**	**0**	**123**	**102**	**0**	**138**	**2**
138	**96**	**36**	**27**	**3**	**153**	**102**	**6**	**330**	**12**

Tipo	Totales en uso	Equipos en uso:			Equipos en reserva	
		Nuevos	Reparados	Sin intervención	Nuevos	Reparados
Electrobombas:	362	3	93	266		
Gabinete:	362	0	138	224		
Dosificadores:	162	35	1	126		
Tableros:	362	0	27	335		
Válvulas:	362	3	0	359		
Caudalímetros:	153	76	0	77		
Sensores Presión :	102	32	0	70		
Automatismos:	330	0	0	330		
Aforos // Rehabilitación	6	N/A	N/A	N/A		
Cegados / Sellados / Otros:	12	N/A	N/A	N/A		

Descripciones y/o notas especiales de las obras ejecutadas en pozos	
Nota 1: Pozos con dosificadores solo los que cloran	
Nota 2: Fuera de Servicio (parado): incluye PARADO, F/TEN, TERCEROS	
Nota 3: 13 pozos habilitados en 2025	
Lomas de Zamora	1
Almirante Brown	4
Ezeiza	6
Esteban Echeverria	2

POZOS SEMISURGENTES
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y
OBRAS EJECUTADAS - NUEVAS ÁREAS

Informe Anual Año 2025	
101-IAT1-O-A-PRO-PS 01-NA	exPL IA N° 01/02/04/06

REGION	DISTRITO	ESTADO DE SERVICIO AL 31/12/25				
		En Funcionamiento	En Reserva	Fuera de Servicio (parado)	Cegados // Sellados // Desactivados	Total en condiciones de Funcionar
SUDESTE	Florencio Varela	144	0	2	3	144
	Pte. Perón	25	3	1	1	28
	TOTAL	**169**	**3**	**3**	**4**	**172**
OESTE	Moreno	79	2	0	4	81
	Merlo	86	2	0	1	88
	TOTAL	**165**	**4**	**0**	**5**	**169**
NORTE	San Miguel	50	0	1	3	50
	Malvinas Argentinas	10	0	0	0	10
	José C Paz	9	0	0	0	9
	Pilar	56	2	1	2	58
	Escobar	4	0	0	0	4
	TOTAL	**129**	**2**	**2**	**5**	**131**
TOTALES		**463**	**9**	**5**	**14**	**472**

OBRAS EJECUTADAS									
OBRA CIVIL	OBRA ELECTROMECANICA			OBRA HIDRAULICA				VARIOS	
Gabinete	Electrobomba	Dosificador	Tablero	Válvulas	Caudalímetro	Sensores de Presión	Aforos // Rehabilitación	Automatismos	CEGADOS / SELLADOS / OTROS
26	27	30	19	0	30	1	5	115	4
0	0	1	10	0	14	0	0	25	1
26	**27**	**31**	**29**	**0**	**44**	**1**	**5**	**140**	**5**
61	9	20	23	0	37	41	3	78	2
42	11	22	10	0	24	38	0	82	0
103	**20**	**42**	**33**	**0**	**61**	**79**	**3**	**160**	**2**
9	2	2	7	0	22	21	3	40	1
2	0	0	1	0	0	0	0	10	1
4	0	0	2	0	3	3	0	9	0
29	2	12	15	1	41	30	2	52	0
0	0	2	2	0	3	1	0	4	0
44	**4**	**16**	**27**	**1**	**69**	**55**	**5**	**115**	**2**
173	**51**	**89**	**89**	**1**	**174**	**135**	**13**	**415**	**9**

Tipo	Totales en uso	Equipos en uso:			Equipos en reserva	
		Nuevos	Reparados	Sin intervención	Nuevos	Reparados
Electrobombas:	472	7	44	421		
Gabinete:	472	1	172	299		
Dosificadores:	310	41	48	221		
Tableros:	472	2	87	383		
Válvulas:	472	1	0	471		
Caudalímetros:	174	107	0	67		
Sensores Presión :	135	99	0	36		
Automatismos:	415	0	0	415		
Aforos // Rehabilitación	13	N/A	N/A	N/A		
Cegados / Sellados / Otros:	9	N/A	N/A	N/A		

Descripciones y/o notas especiales de las obras ejecutadas en pozos	
Nota 1: Pozos con dosificadores solo los que cloran	
Nota 2: Fuera de Servicio (parado): incluye PARADO, F/TEN, TERCEROS	
Nota 3: 13 pozos habilitados en 2025	
San Miguel	1
Pilar	1
merlo	1
Moreno	2
Presidente Peron	4
Florencio Varela	4

POZOS DE REBOMBEO DE AGUA

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y

OBRAS EJECUTADAS

Informe Anual

Año 2025

102-IAT1-O-A-PRO-PS 02 | **exPL IA N° 03 // 05**

Rebombeo	Ubicación	Localidad	ESTADO DE SERVICIO AL 31/12/25	OBRAS EJECUTADAS											
					OBRA CIVIL	OBRA ELECTROMECANICA			OBRA HIDRAULICA				VARIOS	
			En Uso / Stand by	Fecha de Finalización de las Obras	Gabinete // Cámara	Bomba	Motor	Tablero	Válvulas	Caudalímetro	Sensores de Presión // Nivel	Planta Dosificación	Transmisión a Distancia	Cisterna // Tanque
C. Mezcla B°	Calle 600 y Av. Central	Ciudad Evita	En Uso			1				1				
Atepam	Waksman y Acuña	Hurlingham	En Uso											
Quinta Presidencial	Carlos Villate 1000 y Hernán	Olivos	En Uso											
Caseros	Valentín Gómez y Cavassa	Caseros	En Uso			2			1					
Benquez	Coronel Lynch y 12 de Agosto	Lanús	En Uso			1				1				
Vetere	Murature 1170 y Ginebra	L.de Zamora	En Uso			4			1					
La Serenísima	Av. Espora esq. Francia	Longchamps	En Uso							1	1			
Temperley	M. De Arrotea e/ Italia e Hipólito	Temperley	En Uso			1								
9 de Abril	Prayones 3150 e/Palleros	E. Echeverría	En Uso											
Banfield	11 de Septiembre 1702 y Acuña	Banfield	En Uso								1			
Llavallol	Magallanes 1950 e/ Ucrania y	L.de Zamora	En Uso								1			
Booster Rafael	Fardman 2981, entre Ascasubi	La Matanza	En Uso											
TOTALES					**0**	**9**	**0**	**0**	**2**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**

Elementos Intervenidos:

Tipo		Total	Nuevos	Reparados
Gabinete // Cámara				
Electrobomba Achique		9	7	2
Motores				
Tableros:				
Válvulas:		2	2	0
Caudalímetros:		3	3	0
Sensores Presión :		3	3	0
Automatismos:	Vía telefónica			
	Vía radio			

Descripciones y/o notas especiales de las obras ejecutadas en pozos:

aysa	**POZOS DE REBOMBEO DE AGUA** **ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y** **OBRAS EJECUTADAS - NUEVAS AREAS**	**Informe Anual** **Año 2025** **102-IAT1-O-A-PRO-PS 02-NA** | **exPL IA N° 03 // 05**

Rebombeo	Ubicación	Localidad	ESTADO DE SERVICIO AL 31/12/25	OBRAS EJECUTADAS										
					OBRA CIVIL	OBRA ELECTROMECANICA			OBRA HIDRAULICA				VARIOS	
			En Uso / Stand by	Fecha de Finalización de las Obras	Gabinete // Cámara	Bomba	Motor	Tablero	Válvulas	Caudalímetro	Sensores de Presión // Nivel	Planta Dosificación	Transmisión a Distancia	Cisterna // Tanque
Cruce Varela	Sargento Cabral N° 1222 Ex 872	Florencio Varela	En Uso											
San Luis	Av. Los inmigrantes y calle N° 1363	Florencio Varela	En Uso											
Sarmiento	Calle 1404-498	Florencio Varela	En Uso		1					1				
La Guarida	Juan José Paso y Padre Ustarroz	San Miguel	En Uso							1				
Muñiz	Conesa 1300	San Miguel	En Uso			1								
Moreno 1	Lincoln entre Necochea y Entre Ríos	Moreno	En Uso							1				
Parque San Martín	12 de Febrero entre Del Valle A. y Fleming	Merlo	En Uso		1					1				
Booster Vatteone	Vicente López y Planes y Entre ríos	Florencio Varela	En Uso											
TOTALES					**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**

Elementos Intervenidos:					Descripciones y/o notas especiales de las obras ejecutadas en pozos
Tipo		Total	Nuevos	Reparados	
Gabinete // Cámara		2	0	2	
Electrobomba		1	1	0	
Motores					
Tableros:					
Válvulas:					
Caudalímetros:		4	4	0	
Sensores Presión :					
Automatismos:	Vía telefónica				
	Vía radio				

	OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA PLANTA POTABILIZADORA GENERAL SAN MARTÍN Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 110-IAT1-O-A-PRO-PSM 01 | exPL IA Nº 07

DESCRIPCIÓN	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	Observaciones
ELEVACIÓN DE AGUA CRUDA			
OBRA ELECTROMECÁNICA	Instalación de caudalimetros en Sala Nueva de Agua Cruda.	100	septiembre
DECANTACIÓN			
INSTALACIONES	Sector C. Recambio de soplador n°1 del sistema de vacío de los sifones	100	febrero
	Sector C.Montaje del tamiz n°3 de Cámara n° 7. Calafateo de la compuerta correspondiente al tamiz n°3.	100	marzo
	Sector C. Intalación de variador de velocidad en Soplador de vacío.	100	marzo
	Sector B. Limpieza y mantenimiento pulsator n°3	100	abril
	Sector B. Tamiz: se procedió a revisar el tensado de la cadena del tamiz y desgaste de los componentes internos.	100	abril
	Sector B. Limpieza y mantenimiento pulsator n°4	100	mayo
	Sector A1. Decantador n°20. Reparación y modificación de caja reductora para la válvula de alimentación 20-1-1	100	mayo
	Sector B. Renovación de válvulas manuales y de extracción de fangos.	100	mayo
	Sector B. Limpieza y mantenimiento pulsator n°1	100	junio
	Sector B. Limpieza y mantenimiento pulsator n°2	100	junio
	Sector B. Mantenimiento integral caudalimetro de agua cruda de entrada	100	junio
	Sector C. Limpieza y mantenimiento del pulsator n°3	100	agosto
	Sector A1. Fabricación de Reja para Canal Alimentación.	100	agosto
	Sector C. Limpieza y mantenimiento del pulsator n°4	100	septiembre
	Sector C. Limpieza y mantenimiento pulsator n°1	100	octubre
	Sector C. Limpieza y mantenimiento pulsator n°2	100	octubre
FILTROS			
OBRA CIVIL	Bateria XI: Reparación y restauración de compuertas y recatas de alimentación de filtros impares	100	Enero
	Bateria XI: Reparación y colocación de deflector en unidad n°9	100	Enero
	Reacondicionamiento de barandas en Baterías de filtros VII a XII	80	Mayo 2024 (suspendida)
OBRA ELECTROMECÁNICA	Sala de lavado de filtros. Mantenimiento correctivo Bombas N°3 y N°4.	100	Enero
	Batería XII . Filtro N°2. Cambio de las válvulas de insuflación.	100	febrero
	Sector B. Cambio de eyectores de agua de lavado superficial dañados en todos los filtros	100	febrero
	Bateria X (filtro N°7 paño sur y filtro N°2 paño norte). Recambio válvulas de agua para lavado superficial.	100	marzo
	Sector B: Mantenimiento de las válvulas de accionamiento manual en la sala de sopladores de vacío.	100	abril
	Sector B. Filtro 10. Reemplazo de válvula de reserva y puesta en servicio	100	julio
	Batería III. Filtro 8. Cambio de actuador en la válvula de alimentación	100	octubre
	Bateria XI. Reparación de Filtro n°2	40	diciembre
SISTEMA DE LAVADO	Batería X. Filtro n°2 y n°7. Modificación de las trasmisiones de las válvulas de lavado superficial. Modificación de los vástagos para adecuarlos a la válvulas y actuadores nuevos. Puesta en valor las camisas que estaban deterioradas	100	mayo
	Sector B. Filtro 10. Reemplazo de la válvula de agua de lavado.	100	mayo
	Batería XII. Filtro 4. Reparación del actuador de la válvula de drenaje	100	junio
	Batería XII. Filtros 2 y 3. Cambio de válvulas de lavado superficial	100	junio
	Bateria IV. Filtro 1. Cambio de válvula de agua de lavado	100	julio
	Bateria I. Filtro 4. Reparación sistema de Drenaje	100	agosto
	Bateria III. Filtro 4. Reparación de válvula de agua de lavado	100	septiembre
INSTALACIONES	Mantenimiento de Filtros Batería IX a XII Tercera Etapa (OC 73.272).	100	junio
	Reposición de Arena en Baterías VII y VIII	85	Junio 2024 (suspendida)
DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
COAGULANTE	Dispersor de coagulantes Sector B (OC 74.930).	100	marzo
	Trabajos en la sala de bombas y piletones	100	julio
	Mantenimiento preventivo de los dispersores de coagulante a los sectores A1 y A2	100	septiembre

	OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA PLANTA POTABILIZADORA GENERAL SAN MARTÍN Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 110-IAT1-O-A-PRO-PSM 01 | exPL IA Nº 07

DESCRIPCIÓN	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	Observaciones	
	Almacenamiento de Sulfato y PAC	16	Marzo 2024. (OC 72866 rescindida)	
CAL	Cambio de bomba de Cal al canal auxiliar.	100	febrero	
	Limpieza de la cisterna Norte y cisterna Sur	100	mayo	
	Cambio de bomba n°7 de lechada de cal y desobstrucción de línea de cal (a la reserva F).	100	mayo	
	Limpieza de la cisterna Norte y cisterna Sur	100	junio	
	Trabajos en el Apagador 4 de Cal y en la bomba 3 de agua filtrada para la preparación de lechada	100	julio	
	Limpieza de la cisterna Norte y cisterna Sur	100	julio	
	Cambio de válvula de bypass apagador n°4.	100	agosto	
	Mantenimiento preventivo en el apagador 2	100	octubre	
	Fabricación e instalación de tornillos transportadores de piedra de cal (OC 76361).	100	octubre	
	Dosificación de agua de Cal (CA70022).	99	diciembre	
CLORO	Planta de cloro I. Mantenimiento correctivo del TGBT	100	abril	
	Sector B. Cambio de válvula para la precloración	100	abril	
	Planta de cloro II. Evaporador 9. Cambio de bomba de recirculación de agua	100	junio	
	Planta de cloro I. Bateria 1. Cambio de válvulas automáticas	100	junio	
	Planta de cloro I. Renovación de válvulas de cloro líquido	100	agosto	
POLIELECTROLITO	Sistema de Dosificación Polielectrolito en Sector B (OC 72.751).	100	diciembre	Pendiente la implementación Automatismos
	Cambio de bomba de dosificación	100	agosto	
	Reemplazo del variador de la bomba de polielectrolito al sector A2.	100	septiembre	
SISTEMAS ENERGÉTICOS				
INSTALACIONES	Mantenimiento Correctivo de Transformador de Media Tensión (OC 75407).	100	enero	
	Montaje y Puesta en Marcha de Tableros baja tensión Sala Impelentes (OC 74746).	100	enero	
	Mantenimiento preventivo en SET n°5	100	febrero	
	Mantenimiento Preventivo del tablero Drenaje A.	100	febrero	
	Mantenimiento Preventivo del tablero Drenaje B.	100	febrero	
	Mantenimiento preventivo de tableros bombas elevadoras de agua cruda N°1 a N°5.	100	junio	
	Mantenimiento preventivo en sub estación transformadora N°4.	100	septiembre	
	Mantenimiento preventivo en tableros de potencia y comando de Sala de Cal	100	septiembre	
	Planta de cloro I. Mantenimiento preventivo y correctivo en tablero de baja tensión	100	octubre	
	Mantenimiento preventivo en SET n°2	100	octubre	
	Mantenimiento preventivo de tableros bombas elevadoras de agua cruda N°9 a N°13	100	octubre	
DRENAJES				
DRENAJE A	Renovación de Sistema de impulsión en el manifold	100	abril	
	Mantenimiento correctivo bomba N°3	100	julio	
DEPÓSITOS, OFICINAS, PARQUES				
INSTALACIONES	Instalación y el cableado de balizas de emergencia para replicar la alarma de evacuación en sectores donde la misma no se escucha correctamente. Dichos sectores fueron: Oficina de operador de cal, Oficina de operador en Impelentes Principales, Subsuelo de filtros de Sector B, Subsuelo de Batería XI y el Subsuelo de Batería XII.	100	mayo - septiembre	
	Reaparición de cañería de red interna	100	junio	
	Bombas de Muestreo de puntos para control de calidad del proceso. Relevamiento del estado en los tableros de comando. Renovación de tableros, recableados y conexionados	100	junio	
	Caudalímetro aporte de agua decantada al Lago Regatas. Reemplazo de fuente y reinstalación	100	junio	
	Cambio de válvula en cañería de 250 del Laboratorio de planta.	100	junio	
	Reparación y calibración de balanza de camiones.	100	agosto	
	Reacondicionamiento en el sector de bombas en Impelentes ribereñas	100	junio	

OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GENERAL MANUEL BELGRANO

Período: 01 de Enero al 31 de diciembre del 2025

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %
	TOMA DE AGUA CRUDA	
Obra Eléctrica	Fabricación de soportes, instalación de Paneles Solares y banco de baterías	100%
Obra Civil	Limpieza de recatas internas de las compuertas de torre toma	40%
	ELEVACION DE AGUA CRUDA	
Obra Electromecánica	Reparación integral de la reja N° 3 de Agua Cruda	100%
	Reparación de la bomba N° 2 de lubricación de Agua Cruda	100%
	Instalación de un nuevo turbidimetro de alto rango en Agua Cruda	100%
	Adquisición y Montaje de un medidor de UV	50%
	Cambio de un variador para la bomba N°5 y 6 de Agua Cruda	20%
	FLOCULACION - SEDIMENTACIÓN - PLANTA CONVENCIONAL	
Obra Electromecánica	Reparación integral de floculador y puente barredor: decantadores N° 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14	100%
	Limpieza de canales de agua decantada	75%
	FLOCULACION - SEDIMENTACIÓN - MODULO SUPERPULSATOR	
Obra Electromecánica	Reparación integral del difusor de coagulante y cambio de la bomba de agua de arrastre	100%
	Renovación del motor y ventilador "E" del módulo	100%
	FILTROS	
Obra Civil	Reparación integral de filtros Zona Norte: filtros N° 4, 5 y 23	100%
	Reparación integral de filtros Zona Norte: filtros N° 11	75%
	Reparación integral de filtros Zona Norte: filtros N° 17	25%
	Reparación de falsos fondos de filtros del Módulo N° 5 y 8	100%
	Reemplazo del codo de bajada de lavado del filtro N° 23 norte incluyendo el reacondicionamiento del hormigón en el punto de impacto del caño	100%
Obra Electromecánica	Instalación de medición de turbiedad por filtro	50%
	Recambio de la válvula de soplado del filtro N° 1 de la zona sur	100%
	Reparación de bajada de tanque de lavado de los filtros N°4, 13 y 22 de zona norte	100%
	SERVICIOS AUXILIARES - DRENAJE	
Obra Electromecánica	Reparación Integral de las Bombas A, B y C de drenaje de Planta	100%
	Desmontaje y montaje de nueva bomba B del drenaje del Módulo	100%
	Nueva línea de alimentación para lubricación de bombas de drenaje desde el tanque de lavado de filtros	100%
	Adquisición de nuevas bombas de drenaje de Planta	100%
	Limpieza integral de la cámara de drenaje	20%
	Adquisición e instalación de caudalímetros en drenaje de Módulo	80%
Obra Eléctrica	Instalación de un nuevo tablero eléctrico para el control de bombas	100%
	SERVICIOS AUXILIARES - LAVADO DE FILTROS	
Obra Electromecánica	Reparación Integral de la Bomba "C" de Lavado de Filtros	100%
	Cambio de válvula de la red de servicio interno a lavado de los filtros	100%
	Reemplazo de los 3 sopladores del Módulo	33%
	Adquisición de bombas de lavado de filtros	50%
Obra Eléctrica	Instalación de un nuevo tablero eléctrico para el control de bombas	100%
	SERVICIOS AUXILIARES - SERVICIO INTERNO	
Obra Electromecánica	Reparación bombas A y B	100%
	Cambio de la cañería principal de agua arrastre de cloro	20%
	Adquisición de nueva bomba para agua clorada	60%
	Cambio completo de la cañería de bajada de Servicio Interno	40%
Obra Eléctrica	Instalación de un nuevo tablero eléctrico para el control de bombas	80%
	DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS - ALCALINIZACIÓN	
Obra Electromecánica	Reparación integral del apagador N° 3 de cal	70%
	Reemplazo de 1 apagador de Cal	40%

OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GENERAL MANUEL BELGRANO

Período: 01 de Enero al 31 de diciembre del 2025

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %
	Reparación integral de 2 bombas de agua de cal en Bernal IV	100%
	DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS - COAGULANTES	
Obra Electromecánica	Cambio del punto de dosificación de Cloruro Férrico	50%
	Colocación de medidor de caudal en fábrica de coagulante	50%
	Instalación de la bomba N° 2 de cloruro férrico	100%
	DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS - CLORACION	
Obra Civil	Construcción de batea de contención de tanques de hipoclorito	100%
	Incorporación de pasarelas de acceso seguro a las dársenas	100%
Obra Electromecánica	Reemplazo de 4 equipos completos de evaporación y dosificación de cloro	50%
	Automatización de los Cloradores	100%
	Instalación de un sistema de habilitación manual de las dársenas 1 y 2 de cloro	100%
	Instalación de tanque de Hipoclorito de Sodio en el Módulo	100%
	Sistema de dosificación de hipoclorito de sodio	60%
	Reemplazo del tanque de hipoclorito de la zona norte con su pipping completo	100%
Obra Eléctrica	Construcción, montaje y puesta en marcha de un nuevo TGBT para el sistema de dosificación de Cloro	40%
	DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS - NEUTRALIZACIÓN	
Obra Electromecánica	Cambio de las 2 torres de neutralización y acondicionamiento del pipping	40%
Obra Eléctrica	Construcción, montaje y puesta en marcha de un nuevo TGBT para el sistema de Neutralización	40%
	SISTEMAS ENERGETICOS	
Obra Eléctrica	Tendido de un nuevo cable de MT para el alimentador N° 2 desde la nueva SET A a la SET D	100%
	Retrofit de las 2 celdas de entrada de energía a la SET D	90%
	Construcción de cañeros para un nuevo cable de alimentación para la SET D	100%
	Tendido de cables y traspaso de cargas del TGBT de la vieja SET A al TGBT de la nueva SET A	100%
	Traspaso de cables de MT de la SET C y SET D desde la SET A vieja a la nueva SET A	100%
	Cambio de celda de acople de barras del TGMT de Bernal I	80%
	Retrofit de las 2 celdas de entrada de energía al TGMT de Agua Cruda	80%
	Construcción, montaje y puesta en marcha de un nuevo TGBT para la SET	40%
	Instalación de un nuevo transformador de 4 MVA para la SET D	40%
	VARIOS	
Obra Electromecánica	Reparación integral del compresor de aire comprimido de planta Sullair LS 12-75	100%
	Reparación y puesta en valor de las 2 líneas de dosificación de carbón activado	100%
	Incorporación de nuevas máquinas herramientas y puesta en valor de las actuales de gran porte en taller	100%
	Instalación de un banco de baterías para la alarma general de planta	80%
	Reparación de las bombas A y B contra Incendio de la zona sur	100%
	OBRAS DE EXPANSIÓN	
Sistema de Agua Sur (SAS)	Ampliación Capacidad de Potabilización (SA851)	52,30%
	Construcción de Río Subterráneo Sur + EE N°1 (SA853 + SA864)	73,97%
	Nueva Estación Elevadora de Agua Cruda – 1° Etapa (SA852)	30,94%

Informe Anual Año 2025	
IAT1-O-A-PRO-PMB 01	exPL IA Nº 08

PERSPECTIVAS 2026
Restan las tareas en campo
Cancelado por cuestiones de presupuesto.
En proceso de compra.
Por cuestiones operativas solo se realizó la limpieza de 1 de los canales
Resta la adquisición del sistema de bombeo. No hubo avances con respecto al año anterior por presupuesto.
Resta la entrega de la última bomba
Se encuentra en proceso de compra.
Resta realizar el montaje
Ya se instaló 1 soplador. Resta la instalación de los 2 restantes.
Resta la entrega de las bombas por parte del proveedor
En proceso de ingeniera por personal de Grandes Conductos
En proceso de compra. Resta que el proveedor entregue.
En proceso de compra. Resta que el proveedor entregue.
Resta la puesta en marcha
Resta el recambio de cadena y caja reductora.
En proceso de compra. Resta que el proveedor entregue.

Informe Anual Año 2025	
IAT1-O-A-PRO-PMB 01	exPL IA Nº 08

PERSPECTIVAS 2026
Se encuentra en estudio una nueva configuración
Resta la fabricación de una pieza para su instalación
Se instalaron 2 equipos
Resta la instalación del equipamiento y la entrega de las válvulas
En proceso de compra.
En proceso de compra. Resta que el proveedor entregue.
En proceso de compra.
Restan las pruebas y ajustes de configuración de la puesta en marcha
Restan los trabajos de montaje por parte del proveedor
Queda restante el montaje de los interruptores y circuitos de comando y protección.
En proceso de compra.
En proceso de compra. Resta que el proveedor entregue.
En proceso de instalación
No hubo avances
No hubo avances
No hubo avances

	OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR JUAN MANUEL DE ROSAS Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 113-IAT1-O-A-PRO-PJMR 01

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES	
ELEVACION DE AGUA CRUDA				
DECANTACION				
FILTROS				
Instalacion de arrancadores suaves bombas de barros	Instalacion de arrancadores suaves en bombas de barros de decantadores 701	100,0%		
IMPULSION				
Recambio de variador de media tension en bomba 7	Instalacion y puesta en marcha de variador ATV6000 en bomba 7	100,0%		
Recambio de variador de media tension en bomba 5	Instalacion y puesta en marcha de variador ATV6000 en bomba 5	100,0%		
DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS				
VARIOS				
Instalacion de arrancadores suaves bombas de barros	Instalacion de arrancadores suaves en bombas de barros de decantadores 701	100,0%		
Proteccion mecanica en sala de transformadores de MT	Instalacion de tabique de PRFV en sala de transformadores de la SET R9	100,0%		
Recambio de portones metalicos en instalaciones	Recambio de portones metalicos en sala de bombeo R9 y en Planta de CAP	100,0%		

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE OSMOSIS INVERSA** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **121-IAT1-O-A-PRO-POI 01**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
Virrey del Pino	Incorporación de cisterna de salida	70,0%	Se definió la continuación de la obra en julio 2025. Durante el segundo semestre la contratista comienza las gestiones de compra de materiales. El comienzo físico se realizará con el ingreso de los mismos en segundo semestre 2026. El plazo de finalización es de 18 meses a partir del 1/7/2025.
	Renovación integra del área de oficinas	95,0%	Se recepcionaron las oficinas. Falta la red corporativa
	Reemplazo de arrancador suave de bomba de permeado 306	100,0%	
	Instalación de caudalímetro de inserción a la salida de planta	100,0%	
La Celia	Instalación de una válvula solenoide en la inyección de antiincrustante para evitar posibles succiones del producto cuando la planta está parada	100,0%	
9 de Abril	Ampliación del sistema de tratamiento	80,0%	Se dio de baja Orden de Compra. Sin avances durante 2025.
	Mejoras en equipo de limpieza (CIP) de membranas	100,0%	
MN147	Reemplazo de bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio y del sistema de mangueras correspondiente.	100,0%	
	Cierre de la cámara de ACUMAR (para evitar taponamientos por acumulación de residuos).	100,0%	
	Acondicionamiento de portón de ingreso al predio	100,0%	
Glew	Instalación y conexión de una bomba dosificadora de hipoclorito de respaldo	100,0%	
	Mantenimiento integral en la sala de transformadores y sala sepam	100,0%	
Santa Catalina	Conexión de bombas de hipoclorito al PLC y automatización de las mismas	100,0%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE OSMOSIS INVERSA** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **121-IAT1-O-A-PRO-POI 01**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES

aysa	OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LAS PLANTAS DE INTERCAMBIO IÓNICO Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 123-IAT1-O-A-PRO-PII 02

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
LO107	Inclusión de dos módulos simples de tratamiento	100,0%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LAS** **PLANTAS DE INTERCAMBIO IÓNICO** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **123-IAT1-O-A-PRO-PII 02**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
Escobar	instalación de cañerías separadas para cada equipo de tratamiento	90,0%	No se finaliza la mejora ya que la planta queda FUERA DE SERVICIO en marzo 2023 por reemplazo por agua superficial en radio servido.

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LAS PLANTAS DE ADSORCIÓN** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **124-IAT1-O-A-PRO-PAD 03**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
Ezeiza	Cambio del sensor de nivel de cisterna y boya de nivel	100,0%	
	Sistema de inyección de hipoclorito: instalación de nuevo punto de dosificación de hipoclorito y construcción de nuevo tablero eléctrico y de comando	100,0%	
	Instalación de puesta a tierra en sala de tableros	100,0%	
	Desafectación de los portafiltros en la impulsión de salida	100,0%	
	Modificación de los impulsores de las bombas BS2 y BS3	100,0%	
Barrio Uno	Nuevo empalme de cañerías de pozos EE038, EE039, EE006 y EE007, para minimizar pérdidas de carga en la alimentación de las cisternas	100,0%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LAS PLANTAS DE ADSORCIÓN** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **124-IAT1-O-A-PRO-PAD 03**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LAS PLANTAS DE AIR STRIPPING** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-A-PRO-PAS 04**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
Planta San Miguel Centro (air stripping)	Adquisición del equipo	50,0%	Se da de baja la OC 76331 en noviembre 2025 ya que se elimina el contaminante a tratar del MR.
	Obra civil para instalación de la planta	30,0%	Queda sin efecto por lo mencionado más arriba

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA QUILMES** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** | **exPL. IA Nº 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Cañerías de refrigeración en electrobombas	Nuevas cañerías de refrigeración en los 5 grupos de bombeo	100%	
Cañería de sistema antiariete	Importante reparación de pérdida	100%	
Reparación de compresor de sistema antiariete	Reparación e instalación de compresor con mano de obra propia	100%	
Monitores de parámetros eléctricos	Renovación de los mismos en las electrobombas	100%	
INSTALACIONES			
Tapas de cámaras del predio	Renovación de las mismas por unas de material liviano (PRFV)	100%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA SAAVEDRA** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** / **exPL IA Nº 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Tres motores con variadores de velocidad	En obra	70%	Se reactivó la obra en junio de 2025
Monitores de parámetros eléctricos	Renovación de los mismos en las electrobombas	100%	
Curvas de rendimiento	Se generaron en TopKapi las curvas de rendimiento para cada grupo de bombeo. De esta manera se tiene un mejor control del funcionamiento.	100%	
INSTALACIONES			
Sala de hipoclorito	Pintura completa	100%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA DEVOTO** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** / **exPL IA Nº 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Curvas de rendimiento	Se generaron en TopKapi las curvas de rendimiento para los grupos de bombeo N°1 y N°6. De esta manera se tiene un mejor control del funcionamiento.	100%	
INSTALACIONES			
Sala de Válvulas	Nivelación de piso y colocación de rodapié en pasarelas sobre la cañería colector	100%	

	OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA LANUS Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 IAT1-O-A-TRA-EE 01 | exPL IA Nº 20

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Monitores de parámetros eléctricos	Renovación de los mismos en las electrobombas	100%	
Curvas de rendimiento	Se generaron en TopKapi las curvas de rendimiento para los grupos de bombeo N°1 y N°2. De esta manera se tiene un mejor control del funcionamiento.	100%	
INSTALACIONES			
Dosificación de hipoclorito	Instalación de una segunda bomba dosificadora	100%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA PAITOVI** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** / **exPL IA Nº 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
INSTALACIONES			
Paredes y techo	Pintura	60%	No hubo avance por falta de presupuesto
Pupitre de comenado	Pintura completa	100%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA MORON** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** / **exPL IA N° 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
Nueva oficina y espacio de trabajo para el sector de "Mediciones"	Readecuación completa de taller y pañol	100%	
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Protecciones Eléctricas	Renovación de módulos de señal	100%	
Salida Red secundaria de agua Ituzaingo	Instalación de nuevo caudalímetro	95%	Por reestructuración de inspección de obra. finalizacion Dic.2026 EEA
Monitores de parámetros eléctricos	Renovación de los mismos en las electrobombas	100%	
INSTALACIONES			

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA 3 DE FEBRERO** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** / **exPL IA Nº 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Sala de bombas	Renovación completa de cañería de drenaje	100%	Se pudo contar con materiales nuevos, por lo que se reemplazó completamente
INSTALACIONES			

	OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA CABALLITO Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 IAT1-O-A-TRA-EE 01 | exPL IA Nº 20

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Instalación de Variador de Velocidad en EB N°1	Instalación completa del mismo, con mano de obra propia de AySA	100%	
PAT	Mejoras en vinculaciones para asegurar la continuidad de las masas	100%	
Monitores de parámetros eléctricos	Renovación de los mismos en las electrobombas	100%	
INSTALACIONES			
Dosificación de hipoclorito	Instalación de una segunda bomba dosificadora	100%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA MATANZA** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** IAT1-O-A-TRA-EE 01 / exPL IA Nº 20

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Actuador de colector principal	Reparación y adecuación eléctrica para funcionamiento de actuador	100%	
Fichas de interruptores	Instalación de fichas de conexión con su correspondiente cableado en dos interruptores	100%	
Monitores de parámetros eléctricos	Renovación de los mismos en las electrobombas	100%	
INSTALACIONES			
Sanitario de sala de válvulas	Instalación de nuevas cañerías de agua	100%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA VILLA ADELINA** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** / **exPL IA Nº 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Monitores de parámetros eléctricos	Renovación de los mismos en las electrobombas	100%	
INSTALACIONES			
Depósito de combustible	Adecuación	100%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA ADELINA I** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** / **exPL IA Nº 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
*			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
*			
INSTALACIONES			
*			

*** SIN NOVEDADES**

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA ADELINA II** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** | **exPL IA Nº 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
*			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
*			
INSTALACIONES			
*			

*** SIN NOVEDADES**

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA CENTRO** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-A-TRA-EE 01** / **exPL IA Nº 20**

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Monitores de parámetros eléctricos	Renovación de los mismos en las electrobombas	100%	
Curvas de rendimiento	Se generaron en TopKapi las curvas de rendimiento para cada grupo de bombeo. De esta manera se tiene un mejor control del funcionamiento.		
INSTALACIONES			
Depósito de combustible	Pintura completa	100%	

aysa	**OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO REALIZADAS EN LA ESTACION ELEVADORA FLORESTA** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** IAT1-O-A-TRA-EE 01 | exPL IA Nº 20

Descripción	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
Renovación de tableros de MT y BT. Instalación de variador de velocidad	En obra	40%	Se reactivó la obra en junio
Bombas depresoras de napas	Mantenimiento completo	100%	
INSTALACIONES			

1.2.SANEAMIENTO

INFORME ANUAL 2025

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO

OBRAS EJECUTADAS

INDICE

1 OBRAS EJECUTADAS.....3

1.1 OBRAS EJECUTADAS EN PLANTAS DEPURADORAS..... 3

1.1.1 PLANTA SUDOESTE..... 3

1.1.2 PLANTA NORTE..... 6

1.1.3 BARRIO UNO 18

1.1.4 PLANTA EL JAGÜEL Y EL JAGÜEL AMPLIACIÓN 18

1.1.5 PLANTA HURLINGHAM 20

1.1.6 PLANTA SANTA CATALINA 21

1.1.7 PLANTA LANÚS 22

1.1.8 PLANTA FIORITO.....**¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

1.1.8 PLANTA BERAZATEGUI .....**¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

1.2 OBRAS EJECUTADAS EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL…….**¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

1.2.1 ESTABLECIMIENTO WILDE……24

1.2.2 ESTABLECIMIENTO BOCA BARRACAS ……..……25

1.2.3 ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDO CLOACAL……..…25

1. OBRAS EJECUTADAS

1.1 OBRAS DE ENVERGADURA EN PLANTAS DEPURADORAS

1.1.1 PLANTA SUDOESTE

MODULO I

Principales Obras:

- Tendido eléctrico fuerza motriz, comando y modificación tirajes de salida en compactadores hidráulicos sector rejas.
- Adecuación del sistema de agua tanque principal, reparación de ambas bombas centrifugas y recambio de 2 válvulas de retención.
- Control, adecuación y calibración anual de compresores.
- Calibración de pinzas amperométricas, multímetros, etc.
- Reemplazo de válvula de retención en bomba dosificadora de cloruro férrico.
- Cumplimiento del plan preventivo Máximo.
- Cumplimiento de cronograma de Termografías y Vibraciones.
- Reemplazo de electroválvulas direccionales en auxiliares 1 y 2.
- Se realiza el recambio de la primera etapa reductora en motorreductor del sedimentador primario 2.
- Renovación de guardamotor, contactor y módulo de contacto de electrobomba cámara Sur auxiliar 1.
- Remplazo de electrobomba por una nueva en auxiliar 2 cámara sur.
- Se inician las tareas de reparación e instalación de crapodina dentada nueva en percolador secundario 2.
- Se instala bomba centrifuga reparada de lavado en sector rejas finas / gruesas.
- Recambio de válvula de deformación elástica de sedimentador primario 4 cámara sur.
- Se inician las tareas de desmontaje del percolador secundario 4.
- Reparación de placa electrónica suma de sensores para puesta en valor de balanza de camiones.
- Reparación de brazo reticulado estructural, reemplazo de gomas barredoras y contrapeso en sedimentador primario 3.
- Se inician las reparaciones del percolador primario 1.
- Reemplazo de las tapas de calle Janer (ingreso a módulo 2 y derivación).

VACIADERO

Principales Obras:

- Reemplazo de corona dentada en tamiz A.
- Adecuación de los rodillos de cinta transportadora.
- Modificación del automatismo del compactador de residuos.

PLANTA DE LAVADO DE ARENAS

Principales Obras:

- Adecuación del puente grúa.
- Acondicionamiento cañería de tolva y manguera de electrobomba.
- Instalación de variador de frecuencia para optimizar extracción de arenas del tornillo.

MODULO II

Principales Obras:

- Recambio de cabezal, correas, alineación y puesta en marcha compresor a pistón EB02.
- Instalación de interruptor termomagnético general para rejas nuevas automáticas gruesas del ERE, limpieza general de base de apoyo por montaje y preparación de bombas para asistir a la instalación de dichas rejas.
- Reparación integral del riel puente DD01.
- Acondicionamiento, limpieza, recambio de peras bajo nivel y válvula retención de cámara EB02.
- Reemplazo y regulación de limite torque de motor en reja 1 ERE.
- Reemplazo de bomba de elevación n° 1 para acondicionamiento de sellos internos, se coloca backup.
- Reparación de compuerta de ingreso principal de líquido cloacal CC01.
- Adecuación de línea de alimentación eléctrico en sector Microalgas.
- Reparación de equipo autónomo de aire comprimido para tareas de limpieza rejas gruesas fijas – automática.
- Adecuación del tablero de transferencia de UPS / equipo de medición MT en sala Edenor.
- Recambio de equipo soplante de aspiración de arenas en puente DD02.
- Renovación de chapas perímetro sobrenadante en SS08.
- Soplante SP02TA se repara válvula de arranque suave.
- Reparación integral equipo de ventilación n°7 ERE.
- Ensayo anual de Transformadores.
- Verificación anual de compresores.
- Se retira motor principal de soplante SP03TA, se realiza mantenimiento preventivo y se vuelve a armar, se alinea, se controla vibración y queda en servicio.
- Medición y control de PAT.
- Desmontaje de motor eléctrico de soplante SP01TA para su adecuación.
- Renovación de sensor lazo 4-20mma para control de presión, además se modifica el automatismo dejando una presurizadora con accionamiento directo.
- En los extractores EVCT01, 02 y 03 se realiza un mantenimiento integral (ajuste, alineación, recambio de correas, soldado de partes defectuosas).
- Cumplimiento del plan preventivo Máximo.
- Reparación completa de guía en una media caña de almacenador para agitadores.
- Cumplimiento de cronograma de Termografías y Vibraciones.
- Cumplimiento del Plan de Calibraciones de equipos de medición eléctrica.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS


Principales Obras:

- Reemplazo de purgador automático en pulmón de aire línea flotación.
- Renovación de conexiones flexibles de alta presión en cabezales de equipos compresores.
- Recambio de presostato control de corte en equipo compresor sala TS3.
- En almacenador n°1 se colocan 2 agitadores nuevos en posición 3 y 4, además se construye soporte desmontable para pera de seguridad de bajo nivel.
- Renovacion de contactores principales de compresor n°2.
- Mantenimiento correctivo / preventivo de cañería, guías y soporte de electrobomba n°3 LP.
- Se instalan bombas de cavidad progresiva en posición 1 y 2 del espesador 1.
- Se reemplaza variador de frecuencia en soplante n°1.
- Modificación de sistema de pera de nivel y reubicación de sensor de nivel de Cámara Vaquita LP.

- Modificación de sistema de peras de nivel en Cámara N°1.
- Reforma cañería de Lodo de Espesador N°1 (instalación de válvula esclusa para desobstrucción de cañerías).
- Reforma cañería de Lodo de Espesador N°2 (instalación de válvula esclusa para desobstrucción de cañerías).
- Reforma Coanda N°1 (mangueras de inyección de agua, placa filtrante).
- Reforma Coanda N°3 (mangueras de inyección de agua, placa filtrante).
- Reforma ingreso a Sala de arenas (sector contenedores).
- Reforma rejillas/desagües Sala de Bombeo de Espesamiento.
- Reubicación de sensor de nivel en cámara de recirculación de arenas.
- Reemplazo de válvula esclusa en ingreso a Flotador N°3.
- Reemplazo de válvula esclusa en ingreso a Flotador N°4.
- Reemplazo de válvula pick en cañería de Drenaje de Flotador N°3.
- Modificación e instalación de válvula esclusa en cañería de Drenaje de Flotador N°3.
- Reparación de barredor de fondo de Flotador N°3.
- Instalación de placas regulables en vertedero de Flotador N°4.
- Modificación de cañerías e instalación de bombas C17A (de otro sector) en Sala de Lodos Mixtos.
- Reparación de guías de Agitadores y modificación de pera de nivel de Almacenador 2B.
- Reparación de guías de Agitadores y modificación de pera de nivel de Almacenador 1B.
- Reemplazo de Agitadores N°3 y N°4 de Almacenador 1B.
- Mantenimiento mayor de Centrífuga N°3.
- Mantenimiento "Smek" de Centrífuga N°5.
- Ensayo anual de Transformadores.
- Verificación anual de compresores.
- Medición y control de PAT.
- Cumplimiento del plan preventivo Máximo.
- Cumplimiento de cronograma de Termografías.

1.1.2. PLANTA NORTE

En el siguiente plano se ubican los sitios en los que se realizaron obras y trabajos relevantes en Planta Depuradora Norte, durante el año 2025:

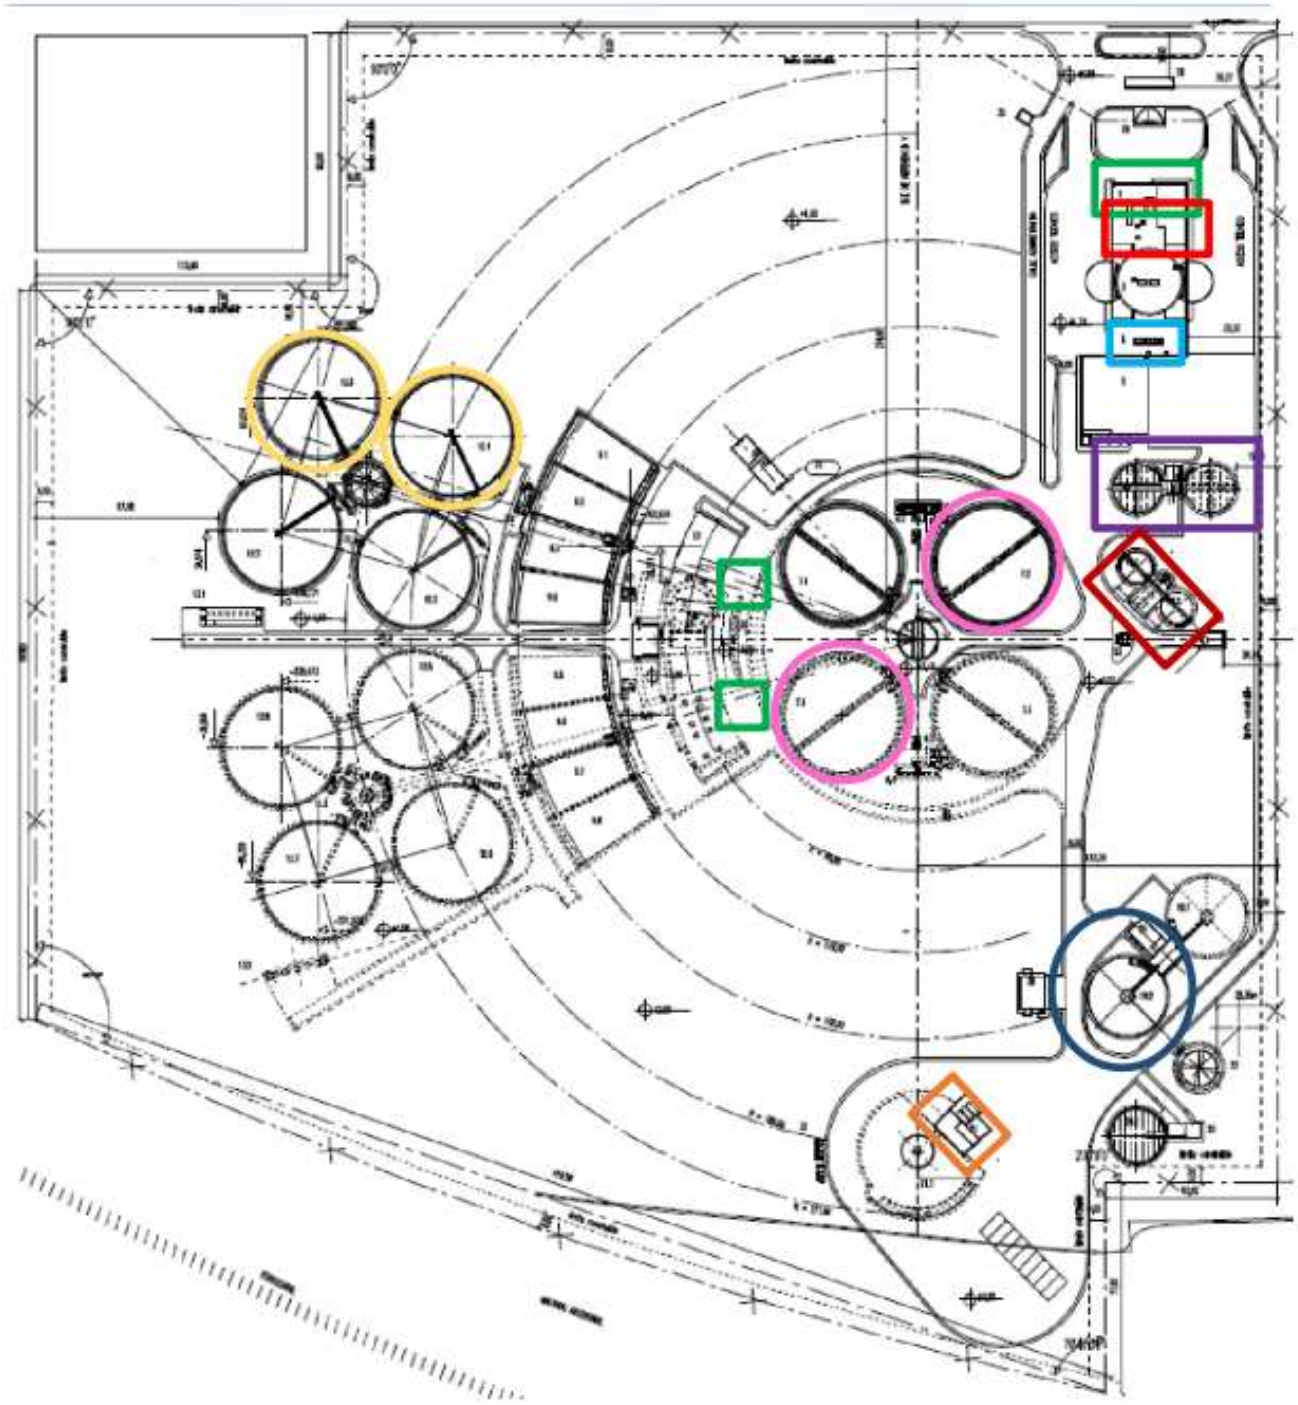

Principales Obras

PRETRATAMIENTO

CAMBIO DE BOMBA DE ELEVACIÓN Nº2

INTERVENCIONES FRECUENTES SOBRE LAS BOMBAS DE ELEVACIÓN

La DMyT intervino en reiteradas ocasiones los sellos/empaquetaduras de las bombas de elevación debido a reiteradas pérdidas de agua.

REPARACIÓN DEL HIDROCICLÓN Nº1 (OC Nº78850).

Se realizaron los siguientes trabajos:

- Desmontaje y traslación de la unidad completa a un lugar adaptado en donde realizar el trabajo, para realizarle una intervención con arenado de toda la unidad, con el fin de inspeccionar corrosión oculta. Si la hubiera, se repararía.
- Sistema de oscilación:
    - Se reemplazaron todos los bujes de bronce por rodamientos, pertenecientes al mecanismo de oscilación.
    - Se reemplazaron los alemites (8 unidades) de los distintos rodamientos.
    - Se fabricó un juego de brazos (4 unidades), donde en un extremo (eje superior) poseen una camisa con su respectivo rodamiento, respetando el diámetro del eje, y en el eje inferior posee un eje macizo del mismo diámetro actual, el cual se une a un cojinete, con su respectivo rodamiento. Dichos brazos soporte tienen la misma longitud desde centro de eje a centro de eje, y la misma rigidez estructural que los anteriores. El mismo se realizó de un material sólido, apto a las condiciones extremas de corrosión del líquido tratado.
- Cubas, principal y vertedera:
    - Se **reacondicionaron las cubas** debido al deterioro por corrosión, en la intervención con el arenado y al rozamiento de las palas raspadoras.
- Conjunto raspador:
    - Se repararon todas **las paletas rascadoras del conjunto barredor** y pintado todo el conjunto raspador con pintura epoxi para brindar resistencia al ambiente abrasivo.

- Hidrociclón:
    - Se reemplazaron **los soportes, superior e inferior** de la tubería (cono) por soportes construidos en material **galvanizado**, o resistente a ambientes abrasivos, debido a su deterioro.
    - Además, se reemplazó la llave esférica de 1 1/2" ubicada en el codo de descarga.
- Toda la unidad fue pintada con pintura epoxi, de color celeste en su exterior y de color negro en su interior.

REPARACIÓN DE TAMICES (OC Nº79790. ET Nº637).

Poner en marcha los dos tamices de planta. Las tareas para tal fin fueron las siguientes:

- Retiro del motorreductor, el conjunto de cuna/tornillo sinfín y sus respectivos accesorios.
- Reparación del motorreductor marca **SEW Eurodrive**, No. de serie **570245110101000I I4**, cuya función es el accionamiento del tornillo sinfín del tamiz y descarga en volquete.
- Reparación del tornillo sinfín de acero inoxidable, cuya función es el transporte y descarga de barros desde el tamiz hasta el volquete.
- Reparación e instalación de cuna de desgaste en acero de alta performance mecánica.
- Reparación e instalación del sistema de acople entre el eje del sinfín y el eje del motorreductor.

TRATAMIENTO PRIMARIO

REPARACIÓN DEL MOTORREDUCTOR DEL DECANTADOR 7.4 OC Nº78082.

- Limpieza en profundidad con desengrasante del tipo ecológico o biodegradable, tanto interior como exterior y las piezas que lo componen.
- Control sobre las piezas para verificar si existe algún tipo de desgaste, en caso de tenerlos, proceder a reemplazarlas. Las piezas a verificar serían las siguientes:
    - Ejes, de salida, de entrada, e intermedio
    - Anillo eje de salida
    - Tapas retenes
    - Arandelas circlip
    - Carcasas

  - Tapones de aireación
  - Galgas de ajuste
  - Distanciador
  - Excéntrica
  - Bridas
  - Rodillos de arrastre
  - Pernos de arrastre *
  - Ventilador
  - Tapa del ventilador
  - Eje de entrada
  - Anillo eje de entrada
  - Tornillos
  - Anillo portapernos
  - Discos cycloidales
  - Excéntrica
  - Rodillos
  - Pernos
  - Chaveta
  - Bomba de aceite
  - Control flujo de aceite
  - Indicador nivel de aceite
  - Tapones
  - Disco de levas
  - Tornillo de enganche
  - Engrasador
- Reemplazo de todos los rodamientos del equipo como de retenes y juntas
- Llenado con el aceite según DIN 51517 y a la temperatura ambiente y/o servicio de acuerdo a la clase de viscosidad según DIN 51519. Reemplazar, según corresponda, el aislante de plaqueta del motor.
- Ajuste tiraje del motor.
- Reemplazo de bulones dañados por bulones en acero inoxidable tipo AISI 304.

REACONDICIONAMIENTO DE PÍVOT CENTRAL DECANTADOR 7.2 MI.
(OC Nº78320/21. ET Nº601)

Los trabajos realizados fueron los siguientes:

- **Desmontaje:**

- Se desmontó la cubierta y elementos de protección que impidan el acceso al sistema de pívot.
- Se identificaron puntos de desgaste o daño a reparar.
- Se desconectó el Sistema de Rotación. En este punto se debieron identificar y etiquetar cables y conexiones para facilitar su reconexión.
- Se retiraron los rodamientos y sellos que soportan el sistema de pívot.

- **Limpieza y Preparación**

- Se limpiaron todas las superficies de montaje y aseguraron que no queden residuos ni corrosión que puedan afectar al estado y operación del sistema de pívot.
- Se inspeccionó el estado de los componentes adyacentes (soportes, estructuras) y repararon o reemplazaron los que fueron necesarios.
- Se reemplazó el rodamiento de esferas central PF25TF.

- **Montaje:**

- Se verificó que todos los componentes a instalar estén presentes y en condiciones aptas para su instalación (eje, rodamientos, sellos, pernos, etc.).
- Se prepararon las herramientas necesarias para el montaje, incluyendo llaves, grúas, gatos hidráulicos, lubricantes y equipos de medición.
- Se colocó el sistema de pívot reparado.
- Se instalaron los nuevos rodamientos y verificaron su alineación y lubricación.
- Se colocó el colector de electricidad.
- Se verificó la alineación.
- Se realizaron las fijaciones con los pernos y abrazaderas correspondientes
- Se verificaron los torques.
- Se instalaron los sellos nuevos para asegurar una protección adecuada contra la entrada de contaminantes.
- Se acopló el Sistema de Rotación
- Se reconectó la instalación eléctrica con sus respectivas medidas de control y seguridad.

- Se energizó los equipos para pruebas.

  - **Pruebas y PES:**

- Se realizaron las pruebas de funcionamiento y de alineación.
- Se aplicó lubricante en todos los puntos necesarios según las especificaciones del fabricante.
- Se reinstalaron cubiertas protectoras y elementos de seguridad.
- Se verificaron los torques.
- Se limpió y ordenó del área de trabajo.
- Se retiraron los equipos y medidas de Seguridad instaladas para realizar el trabajo.
- Se dejó operativa la instalación.

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

CLARIFICADOR 12.1

Reparación de motorreductor, eje, rodamientos y colocación de nuevo caudalímetro.

- **Reparación de las cañas telescópicas y el barredor de fondo**

  Con personal propio, se realizaron las siguientes tareas:

  - Inspección de las cañas telescópicas para verificar su estado, procediendo a la reparación de las mismas debido al estado de corrosión por factores ambientales y de uso.
  - Reemplazo de la totalidad de los barredores de goma de fondo. Debido al tiempo de operación continua de la unidad, los barredores sufrieron desgaste y no barren en la totalidad de la platea.

CLARIFICADOR 12.1

Reparación de tolva y barredor superficial con personal propio.

Se realizaron las siguientes tareas:

- Reparación de estructura metálica de puente barredor y tolva. Ambos se encontraban doblados.

TRATAMIENTO DE BARROS

REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL ESPESADOR DE LODOS Nº1 (OC 78345. ETNº612).

El mismo se encontraba con varios deterioros a reparar: la reparación de juntas constructivas, reparaciones puntuales en el hormigón, reparación de fisuras, reparación de superficies con rotura de hormigón por corrosión.

Estas fueron reparadas con morteros y selladores poliuretánicos específicos.

Luego, se preparó la superficie para su impermeabilización. Consistió en una limpieza abrasiva tipo barrido (arenado), sin deteriorar demasiado el substrato para lograr una rugosidad y además poder liberarla de cualquier fragmento flojo que pudiese tener la misma, a su vez se ejecutará el perfilado de las paredes para el sellado de orificios existentes mediante la aplicación sobre la superficie de morteros específicos.

Se aseguró que el hormigón quede libre de aceites, grasas, suciedad o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adhesión del mortero. Por ello, se realizó la limpieza abrasiva y descontaminante, mediante hidrolavado, para disolver y eliminar la grasitud.

Para su impermeabilización, se procedió a la realización del revestimiento aplicando primero una mano de Auto Imprimante Epoxi Altos Solidos EP-306 Epocoat, para luego aplicar un revestimiento Epoxi sin solventes REA-700 Epocoat, el cual se utilizó mediante rodillos logrando una película de 400 micrones, dejando secar entre mano y mano un mínimo de 6 horas y máximo de 48 horas.



Antes de la impermeabilización




Espesador impermeabilizado

REEMPLAZO DE BOMBA CENTRÍFUGA POR BOMBA TORNILLO APL19 EN SALA DE BOMBAS DE LODOS ESPESADOS

PROVISIÓN DE TAMBOR+TABLERO CENTRÍFUGAS (RC 390119. OCNº77657. ET Nº377)

REPARACIÓN DEL EXTERIOR DEL DIGESTOR.

Como consecuencia de la tormenta del 17 de diciembre de 2023, el exterior del digestor sufrió daños en sus paredes exteriores. (OC Nº78850. ET Nº599), por lo que se repusieron con la instalación de 62,5m2 de chapas conformadas Nº 27 galvanizadas, provistas en placas/paneles de 3.40mx7m cada uno; así como también el reemplazo de todos los insertos, anclajes, materiales y accesorios necesarios para asegurar su correcta instalación considerando la adecuada contención de la aislación térmica del digestor anaeróbico.




REPARACIÓN SOBREPRESORES

Se solicitó la reparación de los sobrepesores marca **MAPRO, modelo CL 46/1 G serie 510184 y 66070.** Por medio de la **OC Nº78847, ET Nº611**, en la cual se solicitó lo siguiente:

Desmontaje:

- Inspección
- Desconexión y desmontaje del equipo
- Reparación, incluye:

- Pulido de camisa
- Cambio de sellos, rodamientos, juntas, paletas
- Realizar pintura
- Cambio de manómetros y válvulas

- Pruebas
- Colocar los sobrepresores/sopladores de biogás reparados, en cada lugar.
- Realizar las fijaciones con los pernos y abrazaderas correspondientes.
- Verificar torques.
- Reconectar la instalación eléctrica y líneas de biogás, con sus respectivas medidas de control y seguridad.
- Energizar equipos para pruebas.

Montaje:

- Colocar los sobrepresores/sopladores de biogás reparados, en cada lugar.
- Realizar las fijaciones con los pernos y abrazaderas correspondientes.
- Verificar torques.
- Reconectar la instalación eléctrica y líneas de biogás, con sus respectivas medidas de control y seguridad.
- Energizar equipos para pruebas.

Pruebas y PES:

- Realizar prueba de presión neumática
- Realizar pruebas de funcionamiento.
- Realizar pruebas de alineación.
- Aplicar lubricante en todos los puntos necesarios según las especificaciones del fabricante.
- Verificar torques.
- Limpiar y ordenar del área de trabajo.
- Retirar equipos y medidas de Seguridad instaladas para realizar el trabajo.
- Dejar operativa la instalación

DEPÓSITOS, OFICINAS Y PARQUES

MANTENIMIENTO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN (LOCAL ELÉCTRICO Nº1) (OT Nº 6913673).

El Local Nº1 se encarga de distribuir la energía eléctrica a toda la Planta, la cual proviene de la subestación de seccionadores de media tensión (13,2 KV) provisto por la empresa Edenor S.A.

De allí, a través de los transformadores, se reducen los 13,2KV a 380V.

Como último paso, se utilizan otros transformadores encargados de generar la carga neutra para el uso de la energía eléctrica en la Panta.

El trabajo realizado implicó la colaboración de la empresa Edenor S.A., de quién se requería asistencia para realizar el corte general y su posterior reconexión a la red eléctrica. También se contó con la presencia de personal de Talleres Varela.





Primero se realizó el corte de energía y posteriores testeos necesarios para intervenir en Local n°1. Esto consistió en limpieza del mismo y mantenimiento de los transformadores 1AN-1BN.





Al final, se restableció la energía, paulatinamente volviendo a cada sector de la planta.

RECONSTRUCCIÓN DE MEDIANERA CON FÁBRICA FATE.

Otro sector afectado por la tormenta del 17 de diciembre de 2023, fue la medianera con Fábrica Fate, la cual se desplomó prácticamente en su totalidad.

Durante el año corriente, la totalidad de la medianera fue reconstruida.



Medianera caída



Medianera reparada

PERSPECTIVAS PARA EL 2026:

Con la puesta en valor de la Planta para un revamping, todas las obras y actividades pendientes están contempladas ahí, dentro de las cuales están:

- Realizar reemplazo de todo el sistema de Rejas Gruesas y Rejas Finas MI y MII (Revamping) // Reparación integral de las 4 bombas hidráulicas de rejas gruesas del MI y MII (PI).
- Se proyecta reacondicionar los 4 puentes desarenadores y colocar las bombas de arenas nuevas, y reparación de tablero eléctrico del puente N°3.
- Se proyecta reemplazo de hidrociclones.
- Reacondicionamiento de Pivot Central Decantador 7.1 MI
- Instalación de Turbocompresor pendiente: no se realizaron avances porque en distintas ocasiones se cayó el concurso por la instalación del equipo.
- Reparación de filtraciones Digestor N°2.
- Reparar la estructura interior de la cámara de insonorización.
- Provisión de tambor + tablero Centrífugas: queda Vincular tableros al PLC Centrífugas N°1 y N°3.

En curso, sin haber finalizado aun:

- Reparación compresor de biogas. OC 78419
- Reparación actuadora de válvula. OC 79950.

1.1.3. PLANTA BARRIO UNO

Principales Obras

La planta contó en 2025 con las siguientes obras de mantenimiento:

Línea de Barros:

- Reparación de las playas de secado, obra finalizada.

1.1.4. PLANTA EL JAGÜEL Y PLANTA EL JAGÜEL AMPLIACIÓN

PLANTA EL JAGÜEL

Principales Obras

Se dio inicio a la PUESTA EN VALOR DE PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL MÓDULO I" (SC70287)

PLANTA EL JAGÜEL AMPLIACIÓN

Principales Obras

La planta contó en este período con siguientes obras de mantenimiento:

Entrada:

Cámara de entrada: Retiro de tapa de cámara y limpieza de cámara de llegada 100%

Desbaste y Bombeo:

Rejas gruesas: Fabricación e instalación de rejas gruesas 100%

Reparación de Puente Grúa: Reparación de Puente Grúa PG-105 100%

Reparación de Reja Fina: Reparación de compuertas y Reja fina RF-101. 100%

Reparación de Reja Fina: Gestión para reparación de reja fina RF-102 50%

Reparación de ventilación forzada: Reparación de Ventilación Forzada VF-101 10%

Pretratamiento:

Reparación de Tamices: Reparación de Tamiz TR-01 y Tamiz TR-02 10%

Reparación de Puentes traslacionales: Reparación de Puente Traslacional PUT-101 50%

Reparación de Puentes traslacionales: Reparación de Puente Traslacional PUT-102 10%

Tratamiento 1° y 2°:

Reparación de Sedimentadores primarios: Reparación de Sedimentador Primarios PSP-101 y PSP-102 20%

Fabricación de pistas de rodadura de sedimentadores primarios y secundarios: Fabricación de pistas de rodaduras 100%

Colocación de pistas: Colocación de pistas de rodadura en sedimentadores primarios 100%

Reparación de Sprinklers: Reparación de Sprinkler SPK-101 y SPK-102 100%

Cámara de Contacto y Bombeo Final:

Reparación de sensor de nivel: Reparación de sensor de nivel para el funcionamiento en automático de las bombas de emisario BS-106 y BS-108. 100%

Espesamiento de Lodos:

Reparación de tamiz: Reparación de Tamiz TR-03 100%

Digestión de Lodos (Sistema de Biogás):

Compresores de biogás: Instalación de 3er compresor de Biogás. 100%

Reparación de compresores de biogás: Reparación de compresores de biogás COB-101 y COB-102 70%

Digestión de Lodos (Sistema de Calefaccionado):

Tanque de combustible de caldera: Fabricación en acero inoxidable e instalación de tanque de combustible para la caldera 100%

Caldera: Reemplazo de quemador y servicio de mantenimiento en caldera 100%

Deshidratación:

Mantenimiento de decantadores centrífugos: Mantenimiento mayor mecánico del tambor, tornillo sinfín y caja reductora. Revisión de sensores y parámetros de funcionamiento. 80%

Reparación de tablero: Reparación de tablero eléctrico de CEN-102 60%

Traslado de tableros de comando de centrífugas: Traslado a planta baja los tableros eléctricos de ambas centrífugas100%

Reparación de Silo de lodos: Limpieza, reparación de rajaduras, reemplazo de marco de tolva de tornillo del fondo de Silo 40%

Tablero Principal:

Reemplazo de transformador: Adquisición de transformador seco de 13,2 kVA 70%

1.1.5. PLANTA HURLINGHAM

Principales Obras

Durante el 2025, se continuó con la puesta en marcha del M2:

Sector Pretratamiento:

M1:

- Se ajustó el funcionamiento de las nuevas rejas
- Se termina el desmontaje de sistema de elevación de arenas
- Se cambia un sensor de gases
- Reacondicionamiento de Trincheras

M2:

- Se reparó el sedimentador 1
- Se reparó el ciclón del clasificador de arenas
- Se acondicionó el clasificador
- Se ajustó el manejo de la disposición de arenas
- Se modificó la operación de las bombas de arenas
- Se acondicionaron las bombas PIC de las líneas de lavado de arena
- Se reparan bombas de drenaje
- Se repara bomba de lodos a espesar
- Se acondiciona cámara de lodos a espesar
- Se repara clarificador primario

Clamaras de Aireación:

M2

- Ajuste de sistema de control

Sector Recirculación:

M1:

- Reparación de Bomba de Recirculación "C"

M2:

- Ajuste de caudalímetro de recirculación
- Reparación de bomba de lodos excedentes
- Acondicionamiento de cámara y ajuste de niveles

Sedimentadores Secundarios (Clarificadores):

M1:

- Reemplazo motor-reductor clarificador "B" y "C"

M2:

- Reparación de dos sedimentadores
- Reparación de bombas de vacío de sedimentadores

Sector Deshidratación:

M1:

- Cambio de Rodillos Filtro 2
- Cambio de Sistema de Corrección de Banda F3

M2:

- Puesta en marcha de una centrífuga
- Instalación de tomas de agua de proceso
- Puesta en marcha de UPP
- Puesta en marcha de bombeo de lodos mixtos
- Acondicionamiento de Silo

Sala de Soplantes:

M2:

- Envío a reparación de un soplante
- Conexionado de monitoreo térmico
- Acondicionamiento de instalación de soplantes

Automatización:

M2:

- Acondicionamiento del sistema
- Relevamiento de necesidades faltantes

Laboratorio:

- Incorporación de muestreos del M2
- Disposición de viales de DQO utilizados
- Avance en la producción de viales propios para la DQO
- Optimización del plan de muestreo minimizando insumos reduciendo el consumo a la mitad
- Calibración de método fotométrico de viales comerciales de DQO

Taller de Mantenimiento:

- Construcción de distintos sectores de estibado con enrejados
- Fabricación de una mesa de trabajo para soldadura
- Asignación de funciones a los locales: uno de herrería y otro eléctrico
- Reparación y adecuación de tuberías de agua caliente de taller nuevo
- Construcción de estantería nueva en herrería para dar solución a un requerimiento de HyS
- Instalación de compresor nuevo en Herrería y construcción de línea de aire comprimido

Flotación y Espesado:

- Reparación de tornillo de transporte de tamiz
- Reparación de compactadora
- Reparación y adecuación de conducto de compactados
- Adecuación de funcionamiento de espesado
- Puesta en marcha de lodos flotados
- Acondicionamiento de cámara de lodos a flotar
- Reparación de agitadores de lodos mixtos
- Reparación de agitador de cámara de lodos a flotar
- Reparación de agitador de cal
- Cambio de sistema de detección de nivel en tanque presurizado
- Reparación de válvula reguladora automática Bray

General:

- Reparación de bombas de drenajes generales
- Reparación de bombas de aguas excedentes
- Reparación de bombas de agua de proceso
- Adecuación del control de bombas de agua de procesos
- Reparación de extractores de salas
- Recuperación de la comunicación del TS1

1.1.6. PLANTA SANTA CATALINA

Principales Obras

Mantenimiento general de planta

- Se realizan modificaciones en filtro banda.
- Fabricación y colocación de barandas en deshidratación.
- Fabricación de soporte para cañería de agua e inyección de floculante en deshidratación.
- Fabricación y colocación de rampas metálicas, para mejorar la movilidad de contenedores (desechos de reja).
- Colocación de cuenta horas a equipos de planta.
- Se realiza reemplazo de tramos de baranda en sistema Unitank (según informe de HyS).
- Reparación de cañería en cámara de ingreso a planta.
- Se coloca cooler en tablero eléctrico de soplante para mejorar flujo de ventilación.
- Se colocan barandas en escaleras Móviles (según informe de HyS).

- Se colocan protección de acrílico en tableros eléctricos (según informe de HyS).
- Fabricación y colocación de soporte para sonda de nivel en cámara de elevación.
- Modificación en manga de descarga del tornillo transportador de deshidratación.
- Se arma, modifica y amura el equipo de izaje en pasarela de Unitank (según informe de HyS).

Funcionamiento

- Vaciado y la limpieza de los canales desarenadores.
- Vaciado y la limpieza de la cámara de contacto (laberinto).

Generales

- Se realiza la implementación del sistema Máximo.
- Se realiza la implementación de Sistema Lims.

Se finalizan las siguientes obras iniciadas en años anteriores:

- Se realiza la reparación de fisuras en el hormigón de los desarenadores.
- Se realiza la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de medición de oxígeno disuelto y potencial Redox para el reactor biológico.

1.1.7. PLANTA LANÚS

Principales Obras

Mantenimiento general de Planta

- Se reemplazó el embrague de la centrífuga B.
- Se repararon las bombas de agua industrial.
- Se cambió el motor del aireador H.
- Se trasladó el aireador F al reactor 3.
- Se reparó una pérdida de aceite hidráulico en la reja C.
- Se reparó una la rueda de clarificador D, tenía una falla en su eje.
- Se instaló una bomba de agua industrial reparada.
- Se reemplazó el arrancador suave del aireados H.
- Se llevó a Balancear el tambor de la centrífuga A.
- Se cambió una de las bombas de recirculación.
- Se reparó el tornillo de la tolva de dosificación de polímero.
- Se cambió el variador de frecuencia de la bomba de recirculación 2.
- Se realizó el mantenimiento integral de los soplantes Repicky.
- Se automatizó el grupo electrógeno.
- Se reparó el tornillo dosificador de polímeros.
- Se colocó bomba tornillo Novarotors para la centrifuga B (en posición 502A)
- Se alineo cinta transportadora grande en el sector de rejas.
- Se repara una señal lumínica en el tablero de la reja A.
- Se corrigió el nivel de la pala de la reja fina A, se revisó el automatismo de la reja B y se arregló una pérdida del circuito hidráulico de la reja C.
- Se realizó un techo para los tableros de los Hidrociclones.
- Se solucionó una perdida en una brida a la salida de bomba de agua industrial.
- Se revisaron los reductores de clarificadores A y C.
- Se revisó y reparo tornillo extractor de barro de centrifuga A y B por ruido anormal, se hizo cambio de aceite también.
- Se realizó el cambio de los rodamientos del motor de la cinta transportadora chica.

- Se realizó una reparación en el empalme de la cañería que llega desde la Villa Olímpica. Si bien este trabajo se realizó fuera de la planta tuvo como consecuencia en incremento del caudal diario.
- Se realizó el cambio del motorreductor del tornillo de descarga de lodos.
- Se reparó y alineó el rodillo de acero inoxidable y la pala de la reja C.
- Se realizó el cambio de las bombas a tornillo 502 A y B por unas nuevas.
- Se realizó la reparación (fabricación de codo + brida) de la bomba de lodos excedentes A.

Funcionamiento

- Se mantienen limpios los desarenadores y el sector de tratamiento de grasas.
- Se realiza la limpieza periódica de rejas gruesas y finas
- Se realiza la rotación de equipos de aireación y agitación (Aeromix) de reactores biológicos.
- Se mantiene la limpieza de los clarificadores.
- Se realiza la limpieza general del canal de salida (Parshall) de efluente de planta a cargo del personal del sector funcionamiento de planta.
- Se realizan recorridas permanentes de planta, a fin de detectar posibles ingresos de contaminantes.

1.1.8. PLANTA FORITO

Principales Obras

Procesos y mantenimiento general de planta

A continuación, se detallan algunas de las tareas más relevantes de mejoras y reparación de unidades y equipos de la planta. Se continúa con el plan de mantenimiento preventivo definido.

- Reparación del tanque australiano de agua industrial, el cual permite operar toda la planta en modo automático.
- Se repararon los HMI de las decanter.
- Comenzó con la obra de agua de reusó.
- Mantenimiento integral de todos los sopladores de planta.
- Limpieza y vaciado del segundo compartimento del almacenador.

Funcionamiento

Se operó de manera continuo toda la línea liquida y toda la línea de lodos.

1.1.9. PLANTA BERAZATEGUI

Principales Obras

Obras Civiles

- Colocación de muro perimetral y portones de acceso
- Construcción de Nuevo Emisario
- Construcción de Nueva Estación de Bombeo de Salida
- Construcción del nuevo pañol
- Adecuación del Depósito de Hidrocarburos y Residuos
- Reacondicionamiento de puentes de desarenado/desengrasado

Reacondicionamiento general de planta

- Se realizó la instalación del Tornillo de Arquímedes N°5 reparado.
- Se avanza con el cambio de bandejas porta cables de las Islas N°3 y 4. Las Islas N°1 y 2 ya se encuentran finalizadas.
- Se avanza con los trabajos de reparación de tamices, a la fecha se encuentra finalizado el 50 % de los trabajos.

1.2 OBRAS DE ENVERGADURA EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL

1.2.1. PLANTA WILDE

Mantenimiento

Sala 4ta.

- Electrobomba N°1 se repara extremo de cuerpo líquido y amortiguador neumático correspondiente a la válvula de retención.
- Electrobomba N° 2 se cambia el rodamiento del eje intermedio.
- Electrobomba N° 3 se repara extremo líquido y aro estacionario, Michel y rodamientos inferior y superior del cuerpo de bomba.
- Electrobomba N° 5 se repara extremo líquido y aro estacionario.
- Se cumplió con el Mantenimiento preventivo de electrobombas principales, rejas, cinta, compactador, tableros de baja y media tensión principales y secundarios, electrobombas Flygt 5100 y 3085, transformadores de MT y BT, actuadores de aspiración e impulsión, sistema antiariete, compresores, motores, válvulas hidráulicas y sistema hidráulico.

Sala 3ra.

- Debido a la puesta en marcha de la planta de Dock sud esta sala se mantiene en Stand By.
- Electrobomba N° 1 fuera de servicio por rotura de caracol, del sector de TV nos informan que no se volverá a armar esta bomba quedando como repuesto el motor, impulsor y línea de ejes.
- Electrobomba N° 3 con problemas de válvula de aspiración.
- Mantenimiento Preventivo de electrobombas principales, rejas, cinta, compactador, tableros de baja y media tensión principales y secundarios, electrobombas Flygt 5100 y 3085, transformadores de MT y BT, actuadores de aspiración e impulsión, sistema antiariete, compresores, motores principales, sistema de desarenado, válvulas hidráulicas y sistema hidráulico.

Obras

Se continúa con la obra de restauración del viejo taller eléctrico y pañol

Desarenado y grampeo:

Se limpió el canal N° 5 y se extrajeron sedimentos por grampeo en las Cámaras de enlace, canales N° 1 y 2 de sala 3, canales N° 1 y 6 de sala 4ª y por sistema de desarenado de sala 3ª y 4ª.

Otros

- Se cumplió con el plan de calibración de los equipos de medición, detectores de gases, sometidos a presión.

1.2.2. PLANTA BOCA BARRACAS

Principales Obras

Obras Electromecánicas:

- Se realiza la modificación y el montaje de la compuerta vinculante de la Obra Complementaria 9 quedando finalizado y operativo el sistema de accionamiento
- Se avanza con los trabajos de recambio de interruptores de media tensión
- Se automatiza el sistema de Rejas incluyendo en el sistema la automatización la cinta transportadora y el compactador de RSU.

1.2.3. ESTACIONES DE BOMBEO DE LÍQUIDO CLOACAL

Con el objeto de mejorar el aspecto visual/estructural de las instalaciones, (además de cumplir con recomendaciones de H&S, como así también por requisitos del SGI), en todas las EBC se realizó mantenimiento de pintura y se gestionaron las OT vía la Dirección de Apoyo Logístico (DAL), donde se requirió mantenimiento edilicio menor y se hicieron las mejoras sugeridas por H y S (cartelería, señalización, etc).

Principales Obras

OBRAS CIVILES

Se ejecutaron y se encuentran en proceso de ejecución obras civiles en varias estaciones de bombeo de líquido cloacal de las siguientes zonas:

Pozos Zona Norte:

ZN-07 EB7

- Pintura General del predio (paredes-tapas-cordones)
- Reparación de filtraciones en zona de tableros de rejas
- Iluminación perimetral

ZN-08 EB8

- Pintura General del predio (paredes-tapas-cordones) y exterior
- Iluminación perimetral

ZN-18 Boulogne Grande

- Pintura General del predio y exterior
- Fabricación y colocación de tapas de cámara

ZN-22 Pocitos

- Pintura General

ZN-23 Carapachay

- Pintura General del predio (paredes-tapas-cordones, nicho) y exterior

ZN-19 Martínez

- Fabricación y colocación de tapas de cámara
- Modificación de portón principal solicitado por resguardo patrimonial para colocación de alarma

ZN-17 Santa Rita

- Pintura de nicho de TGB

ZN-13 Barco Centenera

- Pintura General del predio (paredes-tapas-cordones, nicho)

ZN-41 Regatas

- Pintura General del predio (paredes-tapas-cordones, nicho)

ZN-12 Rosales

- Construcción de nuevo pilar de energía
- Traslado de medidor de EDENOR

ZN-26 Enamur

- Pintura General del predio (paredes-tapas-cordones, nicho)
- Iluminación perimetral

ZN-49 Fleni

- Reparación de portón de ingreso

ZN-52 Las Tunas

- Cambio de techo de zona de tablero de sala de rejas

ZN-50 U11

- Pintura General del predio (paredes-tapas-cordones) y exterior

ZN-12 Bajo San Isidro

- Fabricación y colocación de portón en sala de rejas solicitado por resguardo patrimonial para instalación de sistema de alarmas

Base Norte

- Ampliación de pañol del sector.
- Iluminación de nuevo sector de pañol

Pozos Zona Oeste:

ZO-01 Mendelsohn

- Se realizó la renovación de los baños (femenino y masculino)
- Se gestionó y se instaló fibra óptica para contar con red corporativa.
- Construcción de una oficina para el pañol y se reacondiciona el pañol (pintura general, colocación de protecciones en aberturas, colocación de alarmas, etc.).

Se realizó la construcción de nichos nuevos para los tableros eléctricos de las siguientes EBCs:

Estación de Bombeo Gaboto.
Estación de Bombeo Dolores.
Estación de Bombeo Corcova.
Estación de Bombeo 25 de Mayo
Estación de Bombeo Belloso
Estación de Bombeo Bristol

Pozos Zona Centro:

ZC-17 Cildañez:

- Se terminaron las obras del vestuario nuevo y el comedor nuevo
- Se renovaron las iluminarias del sector
- Se comenzó trabajos de pintura en base
- Se solicitó OT para reposición de luces del ascensor
- Se solicitó OT para reparación de la mampostería de sala de capataces por filtración de agua.
- Se solicitó OT por filtración de agua en oficinas.
- Se reparó la escalera en ZC23 Puerto II.
- Reparación de la compuerta de entrada en ZC23 puerto II
- Reparación de la compuerta en ZC20 Fátima

Pozos Zona Luis Guillón:

ZG-20 Turdera 2

- Mantenimiento edilicio, Reparación de cañería de agua de red.

ZG-28 MAGDALENA

- Mantenimiento edilicio por filtraciones en techos y ambientes de espacios comunes

Pozos Zona Florencio Varela:

ZV-22 Solano la Florida:

- Se construyó Garita para personal de seguridad, 2 salas de media tensión para el alojamiento de 1 transformador de MT Nuevo y la reubicación del existente.

Pozos Zona Sur:

Base EBC Sur

- Obra finalizada 07-2025

ZS-34 Santo Domingo:

- Se realizó renovación de la losa superior, la cual se encontraba en avanzado grado de deterioro. (Observado por EBC Sur e informado por HyS, ejecutado por la DAL)

ZS-96 Avellaneda Oeste

- Instalación de membrana en medianera (DAL)

Pozos Zona Laferrere:

ZF-16 Ibáñez

- Paredón perimetral en ejecución (DAL).

ZF-05 Evita

- Reparación de boquete en paredón por vandalismo (DAL).

ZF-15 TUYUTI:

- Paredón perimetral Ejecutada (DAL).

En todas las EBC se realizó limpieza y mantenimiento general de predio.

Pozos Zona Villa Tesei:

ZT-07 Caseros

- Construcción e instalación de tapas de cámaras por deterioro.

ZT-08 De la Vega

- Construcción e instalación de tapa para protección de Fusibles NH.
- Cambio de Guías y soportes a 3 electrobombas

ZT-11 La Cautiva

- Construcción e instalación de tapa para protección de Fusibles NH.

ZT-31 Hurlingham

- Construcción de descarga de líquidos cloacales debajo de compactador de residuos.

ZT-37 Villa Tesei

- Construcción e instalación de resguardo el sector engranajes y rodillos de rejas

ZT-46 San Martin

- Construcción e instalación de resguardo el sector engranajes y rodillos de rejas

ZT-29 William Morris

- Construcción e instalación de pasarelas y barandas para maniobra de compuertas y sector de bombas.
- Pintura a desniveles y barandas.

ZT-38 William Morris II

- Construcción e instalación de resguardo el sector engranajes y rodillos de rejas

OBRAS ELECTROMECÁNICAS:

A fin de asegurar el funcionamiento de las instalaciones y adecuarlas a las tareas operativas, de mantenimiento y de control, en cumplimiento con las recomendaciones de H&S y los requisitos del SGI, se ejecutaron tareas en varias estaciones de bombeo de líquido cloacal en las siguientes zonas:

Pozos Zona Norte:

ZN-52 Las Tunas

- Cableado de potencia de las 4 líneas por vandalismo

ZN-18 Boulogne Grande

- Colocación de sondas de nivel.

ZN-25 Vicente López

- Renovación de cableado y componentes en TGB principal
- Construcción de tablero adicional para la 3er bomba, para operativos en el Ribereño.

ZN-35 Beiro

- Renovación de barras guías
- Construcción y montaje de tablero general, con automatismo, preparado para comunicación remota
- Comunicación remota, reporta en TKP

ZN-10 Quirno Costa

- Renovación de voluta n°1 y equipo de bombeo

ZN-55 Maschwitz

- Reparación de guías en sistema de rejas
- Colocación de fines de carrera en reja n°1y2
- Remplazo completo de cable de acero en equipo de izaje n°1

ZN-41 Regatas

- Cambio de soporte de guía n°1
- Montaje de barra guía n°1
- Cambio de equipo de bombeo n°1

ZN-02 Tigre II

- Reparación de cañería de impulsión n°1 dentro de cámara húmeda
- Colocación de junta BTR
- Colocación de sonda de nivel
- Cambio de soporte de guía de izaje n°1

ZN-12 Bajo San Isidro

- Remplazo de válvula exclusa n°2
- Remplazo de válvula de retención n°2
- Remplazo de cañería de impulsión DN200 dentro de cámara húmeda
- Colocación de sonda de nivel

ZN-50 U11

- Renovación de conductores de potencia línea n°1
- Renovación de arrancadores suave línea n°1 y 2
- Colocación de sonda de nivel

ZN-02 Tigre II

- Reparación de cañería de impulsión n°1 dentro de cámara húmeda
- Colocación de junta BTR
- Colocación de sonda de nivel
- Cambio de soporte de guía de izaje n°1

ZN-23 Carapachay

- Reparación de cañería de impulsión en cámara de válvulas
- Colocación de sonda de nivel

ZN-51 Benavidez

- Cableado y puesta en marcha de arrancador suave n°2 y 3
- Colocación de sonda de nivel
- Se dejan las 4 líneas operativas y comunicando.
- Cambio de ramal de impulsión dentro de la EBC DN400 (Grandes Conductos)

ZN-05 Tigre V

- Remplazo de borneras de paso en las 3 líneas de comando
- Remplazo de cables de potencia líneas n°2
- Colocación de sonda de nivel

ZN-04 Tigre IV

- Acondicionamiento de tablero para visualización de TKP
- Cambio de módulo de entradas analógicas
- Colocación de sonda de nivel
- Renovación de las 2 válvulas de retención

ZN-06 Tigre VI

- Construcción y remplazo de cañería de impulsión n°2
- Colocación de sonda de nivel
- Remplazo de cable de alimentación desde bajada de la compañía.

ZN-47 Sargento Cabral

- Desmontaje de estructura de aparejo de elevación
- Construcción de tablero nuevo y montaje del mismo
- Colocación de sonda de nivel

ZN-37 Barrio San Martin

- Desmontaje de tablero, sistema de alarma, equipo de bombeos etc. (se desvincula la EBC)

ZN-43 Boulogne Oeste

- Renovación general de TGB
- Cableado de comunicación y potencia
- Colocación de sonda de nivel

ZN-14 Rosales

- Canalización para cableado de tablero
- Traslado de acometida

ZN-34 Sucre

- Construcción de tablero nuevo y montaje del mismo
- Colocación de sonda de nivel

ZN-36 Barrio Perón

- Remplazo de soportes de guías
- Colocación de sonda de nivel

ZN-17 Santa Rita

- Construcción y montaje de TGB nuevo apto para comunicación y automatismo
- Se comunica remotamente con visualización en Sistema TKP
- Colocación de sonda de nivel

ZN-35 Beiro

- Construcción y montaje de TGB nuevo apto para comunicación y automatismo
- Se comunica remotamente con visualización en Sistema TKP
- Colocación de sonda de nivel

ZN-07 EB7

- Cambio de impulsion de la linea n°2 en dos etapas, la pieza fue construida por el sector de Herreria de T.V., y el montaje en su totalidad a cargo del personal de EBC Norte.

  Etapa 1

  - Limpieza de camara de aspiracion durante varios dias con camion desobstructor y descenso del personal.
  - Retiro de cañeria y elementos asociados (bridas, cono, curva 90°) en camara humeda
  - Retiro y corte de espiga y junta de desarme en camara de valvulas
  - Retiro de soporte de guias y barrales de izaje
  - Demoler hormigón para liberar cañería de cámara de válvulas en zona de pasa muros

- Luego se tomo longitud de la cañeria fabricada, la cual se traslado a Talleres para el ajuste de medidas.

Etapa 2

- Limpieza de camara de aspiracion durante varios dias con camion desobstructor y descenso del personal.
- Armado de cañeria en su totalidad en el exterior para tomar medidas in situ, para ejecutar el montaje en la ubicación definida.
- Montaje de brida en codo base, en el punto de inicio de cañeria de impuulsion, para colocacion de cono reductor.
- Montaje de cañeria y curva de 90°, atravesando el pasamuro hacia la camara de valvulas.
- Corte a medida y colocacion de espiga a fin de permitir la correcta vinculacion con la valvula exclusa DN 600 exixtente.
- Ajustes de soportes (perchas) y colocacion de barrales de izaje.
- Soldadura de soportes estructurales en camara de aspiracion encargados de sostener la cañeria.
- Empotramiento y sellado (hormigonado) de cañería de cámara de válvulas en zona de pasa muros.

Pozos Zona Oeste:

ZO-01 Mendelsohn

- Se instaló una bomba Flygt con tecnología Concertor en el brocal N°1
- Renovación del tablero eléctrico en sala de bombeo

ZO-02 Barcker

- Se reemplazó el tablero eléctrico por uno nuevo fabricado en TV

ZO-03 Argentina

- Se reemplazaron las guías de las bombas N°1 y 3 dentro de la cámara de aspiración.
- Instalación de alfombras dieléctricas en sala de tableros

ZO-08 Viedma

- Reparación del tanque antiariete N°1
- Instalación de alfombras dieléctricas en sala de tableros

ZO-10 Corcova

- Se reemplazó el tablero eléctrico por uno nuevo fabricado en TV

ZO-11 Bristol

- Se reemplazó el tablero eléctrico por uno nuevo fabricado en TV

ZO-12 Velloso

- Se reemplazó el tablero eléctrico por uno nuevo fabricado en TV

ZO-13 Colombres

- Renovación de equipos de bombeo (Flygt 3045 por unas Flygt 3085)
- Renovación de impulsiones por cambio de modelo de equipos de bombeo (110 mm)
- Se reemplazó el tablero eléctrico por uno nuevo fabricado en TV

Pozos Zona Centro

- Renovación de cañería de impulsión de la bomba 1 en ZC22 Puerto I
- Mejora en TGBT de ZC-15 Lugano I-II instalándole un Multi Smart permitiendo que este comunique y se visualice por Top Kapi.
- Renovación de tablero de ZC-21 Planetario permitiendo que este comunique y se visualice por Top Kapi.
- Renovación de impulsores de las electrobombas de ZC13 Chilavert.
- Renovación de impulsores y volutas en ZC25 Chilavert II.
- Renovación del aparejo en ZC25 Chilavert II
- Renovación de impulsor y voluta en la electrobomba N° 3 de ZC22 puerto I.
- Reparación de compuerta de entrada en ZC13 Chilavert, ZC25 Chilavert II, ZC22 Puerto I (falta instalarla) y ZC23 Puerto II.

Pozos Zona Luis Guillón:

ZG-01 VILLA DIAMANTE

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

ZG-32 ADROGUE SUR I

- Reparación de portón de ingreso vehicular a la EBC y mantenimiento correctivo de iluminación general.

ZG-02 FRAY LAGOS

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

ZG-03 ITAPIRU

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

ZG-13 LUIS GUILLON

- Mantenimiento correctivo de la EBC por filtraciones en techo
- Mantenimiento edilicio por reparación de impulsión. Pintura y señalización,
- Fabricación de cañeras para organización de materiales de herrería en stock
- Mantenimiento preventivo (Trabajos de pintura en general) barandas de contención, espacios comunes y tapas de cámara.

ZG-04 PIÑEIRO

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

ZG-14 SAN JAVIER

- Modificación de tapa de cámara húmeda (sensores de nivel).
- Pintura de tapas de cámara de electrobombas.
- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

ZG-06 LAS COLONIAS

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

ZG-16 ALTOS 2

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.
- Reparación de puerta de sala de rejas.
- Mantenimiento correctivo de iluminación y mampostería. Mantenimiento edilicio

ZG-08 OBRANOR

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

ZG-19 LA YAYA

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.
- Acondicionamiento de nicho de tablero eléctrico para instalación de tablero de monitoreo de energía en la EBC.
- Reparación de portón de ingreso
- Reparación de alambrado perimetral.

ZG-11 LA UNIÓN

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial. Reparación de cañería de agua de red.

ZG-26 AMERICA UNIDA

- Reparación de alambrado perimetral por vandalismo
- Pintura de tapas de cámara de cámara de aspiración
- Pintura de sistema antiariete

ZG-12 SPEGAZZINI

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.
- Reparación de cañería de agua de red.

ZG-21 CONSTANZÓ

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.
- Mantenimiento correctivo de iluminación del predio.

ZG-17 SANTA ELENA

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

ZG-18 RUCCI

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.
- Obra revamping (Suspendida)

ZG-09 ALTE BROWN

- Modificación de tapa de cámara húmeda (sensores de nivel).
- Pintura de tapas de cámara de electrobombas.

ZG-25 BALCARCE SUR

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

ZG-28 MAGDALENA

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.
- Mantenimiento correctivo en sala de media tensión.

ZG-22 ADROGUE SUR 2

- Acondicionamiento de la EBC por instalación de alarma, refuerzo de seguridad por parte de Resguardo Patrimonial.

Pozos Zona Florencio Varela:

ZV-22 Solano

- Montaje de Celda Modular Compacta de MT Bajo carga, para alimentación de 2 trasformadores de MT, renovación de 2 Bombas Flygt 3231.
- Montaje de 1 transformador de MT.

ZV-65 Ramal Quilmes Sur

- Montaje e instalación de compactador de residuos de rejas automáticas. Renovación de 1 Bomba Flygt 3306.
- Renovación de1 equipos de Bombeo Bomba Flygt 3171, también se montó una bomba de achique en cámara de válvulas Flygt 3045.

ZV-78 Senzabello

- Modificación de circuito de Arranque y parada para una desaceleración paulatina de los equipos de bombeo (By Pass) para proteger la electrónica del arrancador suave, y evitar golpes de ariete y proteger la cañería de impulsión, también se renovaron los conductores de potencia de equipos de bombeo.

ZV-73 Planificado

- ZV-73 Planificado: Instalación de conductores y caja de borneras para montaje de puente Grúa eléctrico.

Pozos Zona Sur:

Base EBC Sur

- Obra finalizada 07-2025

ZS-34 Santo Domingo:

- Se realizó renovación de la losa superior, la cual se encontraba en avanzado grado de deterioro. (Observado por Ebc Sur e informado por HyS, ejecutado por la DAL)

ZS-96 Avellaneda Oeste

- Instalación de membrana en medianera (DAL)

EBC SUR

- Limpieza de todos los predios semanalmente.
- Mantenimiento, ajuste y reparación de Biofiltros en las EBC ZS-17 Falucho, ZS-37 Este Avellaneda, ZS-90 Ramal Avellaneda (Escarificación de Compost, cambio de cañerías averiadas, reparación de forzador de aire)

Pozos Zona Oeste Laferrere:

ZF-06 El Bajo

- Recambio de impulsor, aro de desgaste, tapa guía de impulsor en 5 electro bombas 3356. Debido al desgaste de los componentes
- Reparación de estructura, Construcción de rodillos, Remplazo de banda de goma, Reemplazo de rodamiento de rodillos en cinta trasportadora
- Reacondicionamiento y modificaciones en estructura de Rejas.
- Construcción de Tapas para fosa en sala de rejas
- Mantenimiento de transformadores 1 y 2, pintura de salas y todo lo relacionado a HyS
- Reparación de coolers de tablero general de baja tensión

ZF-01 Barrio Alas

- Renovación de Cañería, válvulas en impulsión de salida
- Reparación de portón en Cámara de entrada

ZF-03 Barrio Sarmiento

- Instalación de Equipo de medición de caudal OC 77390 Meditecna S.R.L
- Colocación y fijación de codo base en equipo de bombeo

ZF-07 Algarrobo

- Reparación y reacondicionamiento de escaleras en cámara de válvulas.

Informado por HyS PRS.

- Restauración de biofiltro, se encontraba fuera de servicio.
- Instalación de Equipo de medición de caudal OC 77390 Meditecna S.R.L
- Remplazo de Cables de potencia en electrobombas 3171

ZF-05 Evita

- Reparación de caja de engranajes de compuerta salida impulsión.
- Mantenimiento de transformadores 1 y 2, pintura de salas y todo lo relacionado a HyS
- Reparación de coollers de tablero general de baja tensión.

ZF-08 Venezuela

- Instalación de Equipo de medición de caudal OC 77390 Meditecna S.R.L
- Reparación de compuerta mural y guias de canasto
- Renovación de cables de potencia de medidor de energía hacia tablero TB

ZF-09 La Candela

- Instalación de Equipo de medición de caudal OC 77390 Meditecna S.R.L
- Reparación y modificación de escalera de Biofiltro

Pozos Pilar:

ZP-01 Agustoni

- Reubicación de Tablero de comando y potencia (se retira el tablero viejo y, se amura el nuevo).
- Reubicación de Grupo Electrógeno.
- Instalación de soporte para bandejas porta cables, y montajes de las mismas.
- Reemplazo de conductores de potencia, desde medidor a tablero general.
- Conexión de tablero general nuevo.
- Conexión de tablero general a grupo electrógeno.
- Conexión de luminaria exterior.
- Renovación de todos los conductores de potencia.
- Conexión de tablero de comunicación.
- Colocación de chapa en portón de ingreso, por impacto visual.

ZP-04 189 Viviendas

- Renovación y montaje de soporte superior de izaje.

ZP-07 Uruguay y Brasil

- Fabricación de puertas para nicho de Tablero eléctrico.
- Montaje de puertas en la EBC, por renovación.

ZP-09 Cementerio

- Cableado de medidor a térmica de corte general. Montaje de caja estanca con toma corrientes y, térmica de corte general para conexión de electrobombas, colocación de rejas y candados por reiterados hechos de vandalismo.

ZP-10 Lauria

- Amurar estructura de tapa de cámara húmeda.
- Reemplazo de tapas de cámara húmeda (construidas en taller de EBC Pilar).
- Fabricación y montaje de soporte para sensores.
- Renovación de cañería de impulsión, válvula de retención, manifold y, modificación de soporte superior de izaje.
- Cambio de válvula Esclusa.

ZP-12 Springdale

- Fabricación de estructura de izaje, para montaje y desmontaje de electrobombas.
- Montaje de estructura en EBC, y se pintó.

ZP-18 La casualidad

- Fabricación y montaje de canasto de retención de sólidos.

ZP-22 Pilarica

- Fabricación de estructura de izaje, para montaje y desmontaje de electrobombas.
- Montaje de estructura en EBC.

ZP-31 La Montura

- Se modifica techo de la EBC, y apertura en lo loza media, para descenso de electrobombas en brocales nuevos.
- Montaje y conexión de tablero de electrobomba inteligente.
- Montaje de electrobomba inteligente con sus respectivas conexiones, instalación de sensores de la misma.
- Instalación de bandeja porta cable, instalación de llave térmica general nuevo, instalación de puesta a tierra.
- Modificación de soportes superiores de barras guías.

ZP-34 Tortugas 1

- Extensión de barras guías.
- Renovación de montaje superior de barras guías.

ZP-37 Ayres Nexo Pinazo

- Modificación de tapa en cámara húmeda, para facilitar limpieza de sensores.

ZP-38 Altos de Campo Grande

- Renovación de conductores de potencia, desde tablero a electrobomba.
- Renovación y montaje de soporte superior de izaje.

ZP-42 USAL

- Renovación de cañerías y válvulas, dentro de cámara húmeda, al 50%.

ZP-45 Lagartos 1

- Fabricación de tapas y marcos, en taller EBC Pilar por renovación.
- Desmontaje de tapas y marcos viejos y, montajes de los nuevos, y trabajo de pintura.
- Instalación de caja y térmica para corte general y, renovación de cableado de potencia.

ZP-46 Lagartos 2

- Instalación de caja y térmica para corte general y, renovación de cableado de potencia.
- Instalación de tablero, para electrobomba inteligente (Concertor).

ZP-47 Lagartos 3

- Instalación de caja y térmica para corte general y, renovación de cableado de potencia.
- Reemplazo de válvulas de retención y esclusa.

Pozos Zona Villa Tesei:

ZT-08 De la Vega

- Acometida de 90Kw del medidor al tablero de interruptor de entrada
- Se cambiaron 3 líneas de guías para electrobombas
- Se cambió impulsor a electrobomba n°3
- Se montó Electrobomba 3202 cambiando la 3201 anterior

ZT-09 17 de Agosto

- Instalación de electrobomba 3127 en brocal 2

ZT-11 La Cautiva

- Se montó nuevo interruptor de entrada y pilar con medidor

ZT-12 Juan XXIII

- Cambio de cañería de impulsión desde codo base hasta válvulas de líneas 1 y 2
- Se cambió electrobomba 3127 en línea 1

ZT-14 Loma Hermosa

- Cambio de cañería de impulsión, válvulas de líneas 1 y 2
- Se cambió electrobomba 3127 en línea 1
- Cambio de bolas de válvulas re retención de líneas 1 y 2
- Instalación de electrobombas 3153 en línea 2
- Cambio de impulsor y electrobombas 3153 línea 1 y línea 2

ZT -30 Loma Hermosa II

- Instalación de programa en variadores de velocidad según niveles de cámara.
- Calibración de caudalímetro.

ZT -31 Hurlingham

- Reparación de sistemas de rejas 1 y 2 y compactador.
- Construcción de descarga de compactador a cámara de aspiración.
- Revisión de electrobombas en varias ocasiones.

ZT – 34 Nueva Ituzaingo

- Instalación de programa en variadores de velocidad según niveles de cámara
- Calibración de caudalímetro.

ZT – 38 William Morris II

- Calibración de caudalimetro.
- Reparación de cargador de ups 110v.
- Adecuación de espacio para instalación de variador de velocidad en línea 2.
- Reparación de contactos internos de contactores de línea 3 y línea 4.
- Cambio de arrancadores suaves de línea 3 y línea 4.

ZT – 46 San Martin

- Calibración de caudalimetro.
- Reparación de puente grúa
- Instalación de electrobomba en línea 2.
- Se adecuaron cableado de potencia en línea 2
- Se realizó montaje de arrancador suave línea 2
- Se realizó conexionado interruptor principal línea 2

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES:

En este aspecto se mencionan las tareas/obras que son similares en todas las estaciones de bombeo de todas las zonas que conforman nuestro sector y ellas son:

Pozos Zona Norte:

- Realización de **65** Limpiezas de cámaras húmedas del sector y **5** limpiezas de cámaras en plantas de tratamiento.
- Disposición de **196 m³** de residuos sólidos por limpiezas de cámaras

Pozos Zona Oeste:

- En el taller se realizan los cambios de impulsores, cables de electrobombas para mejorar su funcionamiento, pruebas de aislación y limpieza.
- Se ejecutan trabajos de herrería, reparaciones de cerramientos perimetrales, pintura edilicia y de nichos nuevos.
- Capacitación al personal en reparación de electrobombas y electricidad.
- Cambio de cables de potencia y manguitos para ajustes del cable.
- Reparación de maquinarias de mano usadas diariamente.
- Construcción de anexos para depósitos y comedor.
- Limpieza profunda e hidrolavado general de cámaras de aspiración propias, según la programación y/o reprogramación en caso de cancelación eventual.
- Limpieza de cámaras de aspiración en Plantas depuradoras de rutina, y emergencias.

Pozos Zona Centro:

- Realización de **69** Limpiezas de cámaras húmedas del sector y **62** limpiezas de cámaras en plantas de tratamiento.
- Disposición de**1420 m³** de residuos sólidos por limpiezas de cámaras.

Pozos Zona Luis Guillón:

ZG-03 ITAPIRU:

- Se reemplazó electrobomba y regulo impulsor

ZG-18 RUCCI:

- Automatización y mantenimiento preventivo de grupo Electrógeno.

ZG-19 LA YAYA:

- Reemplazo de tablero de potencia y comandos (TGBT).

OBJETIVO: alcanzar el correcto funcionamiento de la EBC, por medio de un nuevo TGBT que cuente con PLC, automatismo y la posibilidad de un control y visualización de funcionamiento a distancia.

ZG-07 LLAVALLOL:

- Mantenimiento correctivo y preventivo (Cambio de máximo adaptador).
- Se destapo cañería de aspiración de la línea de bombeo Nro. 3.
- Se renovó electrobomba 3301, se montó en brocal Nro. 1 y se reemplazó impulsor.
- Se mecanizó voluta de brocal N°2

ZG-20 TURDERA 2

- Reparación de impulsión de línea de bombeo Nro. 1
- Colocación y actualización de PLC en tablero eléctrico.

ZG-04 PIÑEIRO

- Se reemplazó electrobomba y regulo impulsor.

ZG-08 OBRANOR

- Colocación e instalación de caudalimetro

ZG-13 LUIS GUILLON

- Colocación e instalación de caudalímetro
- Reparación de impulsión por rotura de cañería.
- Colocación e instalación de electrobomba
- Mantenimiento correctivo y preventivo en sala de rejas
- Trabajos en general sistemas de rejas, ajustes de mangueras hidráulicas, soportes, Mantenimiento preventivo de tablero de comandos.

ZG-09 ALTE BROWN

- Reparación de cañería impulsión ramal 2.

ZG-26 AMERICA UNIDA

- Automatización y mantenimiento preventivo de grupo Electrógeno
- Reparación de impulsión por rotura de cañería.

ZG-19 LA UNION

- Se reemplazó electrobomba y regulo impulsor.

ZG-17 SANTA ELENA

- Mantenimiento correctivo y preventivo en electrobomba.

ZG-21 CONSTANZÓ

- Mantenimiento correctivo y preventivo en sala de rejas
- Trabajos en general sistemas de rejas, reacondicionamiento de central hidráulica, ajustes mecánicos en apertura y cierre, ajustes de mangueras hidráulicas, soportes.
- Trabajos mecánicos en compuerta de ingreso, actuador.

ZG-10 ALTOS II

- Mantenimiento correctivo en actuador de compuerta
- Trabajos en general sistemas de rejas, ajustes de mangueras hidráulicas, soportes, Mantenimiento preventivo de tablero de comandos.

ZG-23 MANZANA 70

- Reacondicionamiento de tablero de potencia y comandos (TGBT).
- OBJETIVO: alcanzar el correcto funcionamiento de la EBC, por medio de un nuevo TGBT que cuente con PLC, automatismo y la posibilidad de un control y visualización de funcionamiento a distancia.

ZG-28 MAGDALENA

- Mantenimiento correctivo y preventivo en tablero eléctrico y celdas de media tensión.
- Limpieza profunda e hidrolavado general de cámaras de aspiración, según la programación y/o reprogramación en caso de cancelación eventual.

Pozos Zona Florencio Varela:

- Limpieza profunda e hidrolavado general de cámaras de aspiración, según la programación y/o reprogramación en caso de cancelación eventual.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas (tableros, transformadores, Interruptores termomagnético, Variadores de frecuencia, Controladores programables, termografías, etc.).
- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones mecánicas (elementos de izaje, actuadores, compuertas, válvulas, rejas de desbaste, canastos de retención de sólidos, etc.).

- Análisis del funcionamiento de las instalaciones y la evaluación de la posibilidad de mejora ante algún desvío hallado.
- Se realizaron tareas de plomerías en varias EBC's.
- Realización de termografías y ajustes según las mismas, en la totalidad de las EBC's.

Pozos Zona Sur:

ZS-08 Roca

- Renovación de cañería n°1.
- Mantenimiento a válvula compuerta.

ZS-12 Wilde Este

- Renovación de TGBT e inclusión de EBC al Topkapi.

ZS-16 Don Bosco Norte

- Reemplazo de carreteles, maxi adaptadores, juntas y bulonería de ambos ramales en la estación de bombeo.

ZS-33 Defensa

- Reemplazo de válvulas de retención en ambos ramales.

ZS-34 Santo Domingo

- Renovación de cañerías de impulsión interna.
- Reemplazo de válvulas de retención.

ZS-37 Este Avellaneda

- Instalación de 2do transformador, junto con IdO.
- Mantenimiento a transformador 1, en conjunto con Talleres Valera.

ZS-41 Lomas Este

- Reemplazo de válvulas de retención en los 3 ramales.
- Mantenimiento a válvula compuerta e instalación de vástago – actuador para su maniobra

Pozos Zona Oeste Laferrere:

- Limpieza profunda e hidrolavado general de cámaras de aspiración, según la programación y/o reprogramación en caso de cancelación eventual.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas (tableros, transformadores, Interruptores termomagnéticos, Variadores de frecuencia, Controladores programables, termografías, etc).

- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones mecánicas (elementos de izaje, actuadores, compuertas, válvulas, rejas de desbaste, canastos de retención de sólidos, etc.).
- Reparaciones y/o instalación banco de capacitores p/corregir factor de potencia a los efectos de eliminar/reducir penalidades por energía reactiva.
- Se logra instalar un hardware de comunicación en las EBC ZF-08 Venezuela para reportar al Topkapi, en cumplimiento con nuestro plan de comunicación.
- Colocación de tableros de medición de calidad de energía de monitoreo remoto, en **16** EBC.
- Análisis del funcionamiento de las instalaciones y la evaluación de la posibilidad de mejora ante algún desvío hallado.
- Se realizaron tareas de plomerías en varias EBC´s
- Realización de termografías y ajustes según las mismas, en la totalidad de las **16** EBC´s.
- Capacitación al personal, cursos de electricidad aplicada a la industria / tablero de comando y control / media tensión básico / electromecánica II / Excel Básico 1/2/3 / Excel avanzado 4/5 / Automatismo industrial, las clases fueron dictadas en sede Castañares y Avellaneda 212.
- Se realizaron **26** Limpiezas de cámaras húmedas del sector.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas (tableros, transformadores, Interruptores termomagnético, Variadores de frecuencia, Controladores programables, termografías, etc.) en las **16** EBC's.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones mecánicas (elementos de izaje, actuadores, compuertas, válvulas, rejas de desbaste, canastos de retención de sólidos, etc.) en la **16** EBC's.
- Se realizó tareas de plomería en varias EBC's.
- Se colocó cartelería identificadora en las **16** EBC's.
- Mensualmente se realizó la limpieza de tableros en las EBC **16** EBC's.
- Semanalmente se realizó mantenimiento de biofiltro.
- Mensualmente se realizó limpieza de predios en las **16** EBC's.
- Mensualmente se realizó limpieza de cámaras de válvulas en las **16** EBC's.
- 2 veces al día se realiza control y análisis de Topkapi en distintas EBCs.
- Diariamente se realiza la verificación de equipos de desbaste (rejas en las EBC).
- Semanalmente se realizó la limpieza de sensores de nivel en las **16** EBCs.
- Semanalmente se realizó el mantenimiento de grupos electrógenos.

Pozos Zona Pilar:

- Limpieza profunda e hidrolavado general de cámaras de aspiración, según la programación y/o reprogramación en caso de cancelación eventual. (según disponibilidad de camión desobstructor).

Pozos Zona Villa Tesei:

- Limpieza profunda e hidrolavado general de cámaras de aspiración, según la programación y/o reprogramación en caso de cancelación eventual.

INFORME ANUAL 2025

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO

OBRAS EJECUTADAS

(NUEVOS PARTIDOS)

INDICE

1 OBRAS EJECUTADAS EN PLANTAS DEPURADORAS (AMBA) 3

1.1 PLANTA DEPURADORA BELLA VISTA 3

1.2 PLANTA DEPURADORA LAS CATONAS 3

1.3 PLANTA DEPURADORA ESCOBAR 5

1.4 PLANTA DEPURADORA FERRARI 9

1.5 PLANTA DEPURADORA GARÍN 11

1 OBRAS EJECUTADAS EN PLANTAS DEPURADORAS (AMBA)

1.1 PLANTA DEPURADORA BELLA VISTA

Mantenimiento general de la planta

- Se inició la implementación del sistema Máximo.
- Reparación en TV de las bombas de elevación N°3 y N°5.
- Readaptación de cañería de bomba de polímeros por ser la bomba en préstamo más larga de la original.
- Se reparó en varias ocasiones el manchón de traslación del motorreductor del clarificador N°1.
- Mantenimientos preventivos de todas las unidades de planta según el cronograma del plan de mantenimiento.
- Se instaló un nuevo soplante con su respectivo aparejo eléctrico.
- Se reparó y coloco en su lugar la compuerta de entrada en la cañería de llegado de EBc los Berros.
- Se colocó bomba a tornillo de extracción de lodos N°1 a deshidratación reparada.
- Se cumplió el 90% de los trabajos preventivos, según el plan de mantenimiento de planta.
- Se comenzaron a reparar y cambiar bombas y barredores de los clarificadores en la Planta de Campo Ruso, planta satélite de Bella Vista. La misma se llevó la mayoría del tiempo de los trabajos de mantenimiento.

Funcionamiento

En el 2025 se cumplió con el 99% del plan anual de mantenimientos preventivos hasta el mes de octubre.

A partir del mes de noviembre del 2025 se ha comenzado a trabajar con el sistema Máximo en la generación de solicitudes de servicio, mantenimientos correctivos y preventivos.

1.2 PLANTA DEPURADORA LAS CATONAS

Obra de reemplazo de tecnología de deshidratación de barros.

Se reanudó la OC 71512, por el cambio de tecnología de deshidratación, a cargo de la empresa BHY. Detalles de los avances:

- Recepción de equipos en planta.
- Construcción de nueva sala de tableros eléctricos.
- Construcción de plataforma para sistema de agua.
- Instalación de tanques, cañerías y bombas de agua.
- Fabricación de techado para sistema de agua.
- Se comienza la instalación de nuevas cañerías de barro de almacenador a equipos.

- Construcción e instalación de viga para apoyo de tornillos deshidratadores.




- Se comienza la instalación de pileta de preparación de polímero, bombas, cañerías y caudalimetros.
- Instalación de bases y tanques floculadores.







Mantenimiento general de planta

- A fin de avanzar con la obra de cambio de tecnología de deshidratación OC 71512, y dejar el espacio físico para los nuevos equipos; se desinstalaron e instalaron los tanques de preparación de polímero existentes para dar continuidad con el proceso de deshidratación.







- Ejecución de plan de mantenimiento preventivo en todos los equipos de planta.
- Mantenimiento de bandas filtrantes para evitar rotura en fleje de unión; así mismo se cambiaron piñones, corona y cadenas, palas rascadoras inferiores y superiores, palpadores de centrado y corrección de banda en ambos equipos.
- Mantenimiento y limpieza de impulsores de bombas de agua de lavado de bandas filtrantes.





- Cambio de ruedas de traslación en sedimentador N°3.



- El proyecto para la instalación de una **tercera bomba de cavidad progresiva** para el envio de barros espesados al almacenador, quedo condicionado por los materiales requeridos. Se encuentra en gestión por medio de los depósitos de la DPyE. Avance de 35%.



- Reparación de bombas de espesadores A y B. Cambio de estatores, rotores, sellos, manguito de acople, junta de tapa de inspección.






- Fabricación y cambio de 13 tapas de cámaras de hormigón, por tapas metálicas a fin de que sea más seguro y práctico poder movilizarlas.



- Finalización de instalación de placas pista en los sedimentadores en el **N°2 y N°3** por personal de mantenimiento, quedando todas las unidades con las pistas instaladas.



- Adquisición de repuestos y reparación de 8 equipos aireadores tornado. Detalle:
  - instalación de kit propelas.
  - cambio y modificación de agarre de líneas de engrase.
  - cambio de caja estanco y cable de señal.
  - pintura de cubre filtros de aire.
  - cambio de filtros de aire.
  - verificación y megahdo de bobinado de motores.
  - verificación de consumo eléctrico.







- Reparación de reja fina, cambio de eslabones de cadena.




- Operativo de limpieza con apoyo de camión desobstructor en canal desarenador A.





- Reparación de anclajes en caño de protección en las boyas de automatización de bombas de elevación.




- Refuerzo y cambio de anclajes y piso flotante de bombas de elevación para mayor seguridad del personal.




- Cambio e instalación de variadores en soplador N°2 y bomba de elevación N°1. Ambos variadores fueron llevados a Talleres Varela para su reparación.




Funcionamiento

- Limpieza de cámara Parshall.




- Limpieza de cámara de grasa.





- Limpieza de cámara elevación.



Generales

- Trabajos de pintura en diferentes sectores de la planta.



1.3 PLANTA DEPURADORA ESCOBAR

Principales Obras

Rejas Automáticas

Se continua con la instalación de las rejas automáticas. Al día de la fecha tenemos un avance de obra del 90%. No hubo avances durante 2025



Fosa de gruesos

Ante el incremento de caudal afluente por 1.900 nuevas conexiones en la ciudad de Belén de Escobar, se procede a agregar una tercera bomba de elevación en modo.

En el Taller de Planta se fabricó un soporte para colocar una pera de nivel de bomba auxiliar.



Sala de Bombas de Elevación

Durante el mes de junio se instalaron válvulas de retención (a Clapeta), para esto se realizó la modificación de las cañerías de impulsión en ambas bombas. Junto a esta intervención se procedió a realizar la pintura de las cañerías de impulsión.



Tanque Imhoff

Durante el mes de septiembre se reemplazaron las ruedas del puente barredor en la parte más alta de la unidad. Se reemplazaron los ejes, portarodamientos y rodamientos.

Respecto de la parte eléctrica, se dio cumplimiento a la recomendación de H&S y se reemplazó el colector central de 3 (tres) pistas, por otro de 4 (cuatro) pistas.

Continuando con temas cinemáticos, se reemplazó el manchón de la corona por un acoplamiento GUMMI.

Se reparó la pista interna (mampostería)



Clarificador

Durante el mes de agosto, en relación a la parte eléctrica, se dio cumplimiento a la recomendación de H&S y se reemplazó el colector central de 3 (tres) pistas, por otro de 4 (cuatro) pistas.

Limpieza de la Unidad para inspección de las gomas del puente barredor.



General de Planta

- **Laboratorio de Planta**



La DAL gestionó la reparación y/o renovación las cortinas de laboratorio. Tarea que se llevó a cabo durante el mes de septiembre.

- **Sala de Tableros**

Reparación y renovación de cortinas de laboratorio. Tarea que se llevó a cabo durante el mes de septiembre.



- **General**

Durante el 2025 se han recibido los caudalímetros, los cuales se encuentran pendientes de instalación.

1.4 PLANTA DEPURADORA FERRARI

Principales Obras

Ingreso Principal

- Trabajos de nuevo tornillo en compuerta de ingreso y colocación de actuador. (Realizado por personal de planta)
- Trabajos de trincheras, cañeros y cámaras para tendido eléctrico de equipo compactador. (Realizado por personal de mantenimiento).
- Trabajos de adecuación de puente grúa y colocación de aparejo eléctrico. (Realizado por personal de planta)

- Provisión de motor reductor y puesta en marcha de tren desarenador B (Realizado por personal de planta - Mantenimiento).
- Trabajos de reparación e instalación de equipos seguido de puesta en marcha de zanja de oxidación N°3.
- Gestión adquisición y ejecución del reemplazo de pisos en cámara de grasas por PRFV. (Realizado por Personal de planta Mantenimiento).
- Adecuaciones en barandas de cámara de grasa y construcción de extractor de grasas. (Realizado por personal de mantenimiento).
- Adecuación de tolvas para compactador de extracción de grasas. (Realizado por personal de mantenimiento).
- Modificación de tornillo de compuerta, para colocación de actuador. (Realizado por personal de mantenimiento de planta y T.V).

Mantenimiento general de planta:

- Se cumplió con el plan de mantenimiento preventivo sobre los diferentes equipos instalados en funcionamiento y Back up con un promedio mensual de 461 OT y otras 16 OT por mantenimiento correctivo. - y puestas en servicio. (Realizado por personal de mantenimiento).
- Intervenciones/reparaciones en Bombas Espesadores.
- Intervenciones/reparaciones en Mixers Almacenador.
- Intervenciones/reparaciones en Bombas Almacenador.
- Intervenciones/reparaciones en equipos de aireación de Zanjas 1, 2, y3.

Laboratorio

- Adquisición de nueva PC y se trabaja con sistema LIMS.
- Gestión, adquisición y ejecución de lavadora automática.
- Continuamos con la Implementación de procedimientos e instructivos que serán agregados en el sistema de gestión.
- En este año se recepcionaron y se realizaron los ensayos solicitados por las plantas Merlo y Paso de Rey.
- Implementación de envío de muestra de Barros al LC, muestreos realizado por planta.
- Se dió cumplimiento con los planes de capacitación.

Funcionamiento:

- Implementación de planilla digital de contadores horarios de todos los equipos.
- Planes de capacitación completos.
- Incorporación de PC en el sector, con avances de digitalizar las ODT.
- Incorporación de sistema de alarma contra incendio.
- Cumplimiento del plan preventivo.
- Gestion y adquisición de nuevo Topkapi por incorporación a la red corporativa.

Deshidratación:

- Reparación equipos filtro banda a cargo de Mantenimiento de planta en ambos equipos. (Realizado por personal de planta).
- Reparaciones correctivas en bombas de cavidad progresiva.

- Readecuación de pasarelas de operación, para UPP de Polímeros por modificaciones de obra (Realizado por personal de planta).
- Inicio de obra de cambio de tecnología (OC 71512) Empresa BYH
- Gestión con avance de Ejecución calle interna Planta 64961(DAL)
- Colocación de lavaojos (Realizado por personal de planta).
- Cumplimiento de plan de frecuencia, implementación de plan anual preventivo, implementación de planilla de datos diarios, implementación de ODT, implementación de libro de novedades.
- Cumplimiento de plan anual de pintura de mejora y seguridad.
- Planes de capacitación completos.
- Construcción de sector de higiene lavamanos.
- Gestion y adquisición de nuevo Topkapi por incorporación a la red corporativa.

Generales:

- Se realizaron los trabajos de sistema de alarma de incendio en toda la planta.
- Incorporación de la red corporativa en toda la planta.
- Se realizó la colocación de pararrayos.
- Puesta en servicio de grupo electrógeno.
- Todos los sectores cumplieron con el 100% de los planes de capacitación.
- Gestión y ejecución de mantenimiento de Trafo. (Realizado por T.V)
- Gestión y avance de reparación de calle interna sector rollof. (DAL).
- Trabajos Generales de Pintura en planta. (Trabajo realizado por todos los sectores).
- Planificación de reutilización de efluente, para agua de lavado de filtros d banda. finalizado (Realizado por personal de mantenimiento).
- Avances con respecto a la implementación de sistema Máximo.
- Gestion de avance de estructura documental de planta.

1.5 PLANTA DEPURADORA GARÍN

Principales Obras

Rejas Automáticas

Se continúa con la instalación de las rejas automáticas. Al día de la fecha tenemos un avance de obra del 90%. No hubo avances durante 2025.

Foso de gruesos

En el mes de enero se construyen los muertos de Hormigón Armado.



Durante el mes de mayo se renovó la estación de bombeo. Se retiró 1 (una) bomba Grunfos (cámara seca) de operación manual y pera. Se instalaron 2 (dos) bombas Flygt (3102), con sus respectivos variadores de velocidad. Ambas funcionan en 38 Hz para que el caudal esté ajustado a la capacidad de la Planta. Se las utiliza en forma alternada.



Se colocó una pasarela para poder realizar las tareas de mantenimiento y limpieza de las bombas.

También se construyó un pórtico en perfilería de acero desde donde, mediante un aparejo, se elevan cualquiera de las 2 (dos) bombas para su limpieza y mantenimiento.



La construcción, instalación y readecuación de la estación de bombeo se realizó completamente con personal de mantenimiento de Planta Depuradora Escobar. Se recuperó parte de la cañería que estaba instalada.

Reactor Aeróbico

Cuando se renovó la Estación de Bombeo, se procedió a la limpieza de la Zanja de Oxidación. Se realizó vaciado y barrido hidráulico del reactor bilógico con personal de Funcionamiento de la Planta Garín.



Durante el mes de octubre se retiraron los 2 (dos) Flow Jet, que cumplían la función de oxigenar el Licor Mezcla, y en su lugar se instalaron 2 (dos) equipos Tornado (agitación + aireación), por parte de la empresa WPG. A esta fecha, aún faltan realizar ajustes.

Ambos equipos son de uso alternativo.





Clarificador

Se procedió a la limpieza de la unidad.

En el mes agosto se renovó integralmente el Tren Cinemático del Carro de Traslación de la recirculación. Se gestionó la compra de otro para tener de Back Up, dado la criticidad del carro para llevar a cabo el proceso.

Bomba de Recirculación

En el Clarificador había instaladas y funcionando 2 (dos) bombas de Recirculación, 1 (una) montada en el Carro de Traslación, y la otra estaba fija, en el fondo de la unidad, en el extremo donde se encuentran los vertederos. Esta última bomba se quemó y fue retirada.

Se planifica para el 2026, montar 1 (una) bomba Flygt 3102 montada en el carro de traslación, con capacidad para ser izada y así facilitar su mantenimiento. Dicha bomba contará con su respectivo variador de velocidad y válvula para recircular un caudal ajustado al proceso de la Planta.

Generales

Se renovó el contenedor que cumple la función vestuario sanitario en el mes de octubre.



Se instalaron los caudalímetros Khrone y Nivus durante el mes de noviembre. Queda pendiente el de recirculación de Lodos.



aysa	**OBRAS REALIZADAS** **PLANTA DEPURADORA SUDOESTE I** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-S-PRO-PDSO-01**

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
AFLUENTE DE PLANTA	Instalacion, montaje y puesta en servicio de compactadores hidraulicos	60%	Sobre la salida de cada tornillo acoplar cada compactador hidraulico
	Reparacion de Reja Fina 4	10%	Realizar RC
	Reparacion de Reja Gruesa 2	10%	Realizar RC
	Adquisicion de Frenos de Rejas	100%	OC 77472 (Finalizado)
	Re adecuacion de compuerta ingreso a Planta	100%	Con OC 76826 (Finalizado)
ELEVACION	Adquisicion de variador de frecuencia	50%	RC 304920
DECANTACIÓN PRIMARIA	Impermeabilizacion sedimentador primario	10%	Se realiza RC para la impermeabilizacion de 1 sedimentador PI2026
TRATAMIENTO BIOLÓGICO	Pintura de barandas de Cámara Sur y Norte	45%	DAL- Continuar con las tareas de Pintura, se envia solicitud 700381 para continuar con la adecuacion,
	Reparacion y montaje de campana central Percolador Primario N°1	60%	OC 79125 / OC 79903
	Percolador Secundario N° 2/3: Provisión, colocacion y disposicion final de paneles	80%	TV realiza las tareas finales se encuentra en la etapa de puesta en marcha con repuestos de Planta.
	Realización de la impermeabilización y reparación de 2 Sedimentadores+C12:F12+C16	10%	OC 79816
BOMBEO DE BARROS	Adquisicion de agitadores	100%	OC 78157 (Finalizado)
	Reparacion Bombas Centrifugas Barros	90%	OC 78036 Se continua con la entrega de bombas para Reparacion
	Sonda de medicion de mantos planta de barros (reparación)	100%	OC N° 78048 (realizada)
	Reparacion Bomba Tornillo CP15K	100%	OC 78033 APS Arturo Pinto
	Adquisicion Bombas Planta de Barros	30%	RC 305007 A la espera de Aprobacion de RC (anulado)
	Renovacion Pastillas Sensores de Gases Barros	100%	OC N° 77066 (sólo entregaron items 1 y 2) - OC finalizada
	Adquisicion de Bombas a Tornillo CP15K	20%	RC N° 304918 / SI 9926 (correspondiente a PI 2025)
BOMBEO BARROS DE MOD 1 (VAQUITA)	Reforma y adecaución de Cámara de LP	10%	CP 64412
	Modificación de sistema de peras de nivel y reubicación de sensor de nivel	100%	-
C1 - C2	Reforma cañerías de LB	10%	RC N° 337792
	Modificación de sistema de peras de nivel en C1.	100%	-
ESPESAMIENTO	Reforma cañería de Lodo de Espesador N°1 (instalación de válvula esclusa para desobstrucción de cañerías)	100%	-
	Reforma cañería de Lodo de Espesador N°2 (instalación de válvula esclusa para desobstrucción de cañerías)	100%	-
	Reforma cañería de Lodo de Espesador N°3 (instalación de válvula esclusa para desobstrucción de cañerías)	20%	Se realizará cuando se saque de servicio dicho Espesador.
	Reforma Coanda N°1 (mangueras de inyección de agua, placa filtrante)	90%	Falta puesta en marcha y prueba.
	Reforma Coanda N°3 (mangueras de inyección de agua, placa filtrante)	100%	-
	Reforma ingreso a Sala de arenas (sector contenedores)	100%	Realizado por DAL.
	Reforma rejillas/desagues Sala de Bombeo	100%	Realizado por DAL.
	Reforma cañería agua de servicio de Coandas	0%	-
	Mantenimiento mayor de Tamices gruesos	5%	Incluído en GE 2026.
	Mantenimiento mayor de Coandas	5%	Incluído en GE 2026.
	Reubicación de sensor de nivel en cámara de recirculación	100%	-
FLOTACIÓN	Reemplazo de válvula esclusa en ingreso a Flotador N°3	100%	-
	Reemplazo de válvula esclusa en ingreso a Flotador N°4	100%	-
	Reemplazo de válvula pick en cañería de Drenaje de Flotador N°3	100%	-
	Modificación e instalación de válvula esclusa en cañería de Drenaje de Flotador N°3	100%	-
	Reparación de barredor de fondo de Flotador N°3	100%	-
	Instalación de placas regulables en vertedero de Flotador N°4	100%	-
LODOS MIXTOS	Modificación de cañerías e instalación de bombas C17A (de otro sector)	100%	-
	Mantenimiento mayor de Tamices finos	5%	Incluído en GE 2026.
	Mantenimiento mayor de Soplantes de Biogás	70%	OC N° 78643 (EPAM), a la espera de entrega del último equipo y de repuestos.
	Mantenimiento mayor de Compresores de Biogás	10%	OC N° 78643 (EPAM), a la espera de entrega del segundo equipo y de repuestos.
	Reforma de cañería de agua de refrigeración de Compresores de Biogás (instalación de válvulas esféricas, para aislar equipos)	30%	Se modifica la cañería a medida que se van desmontando los Compresores para su mantenimiento mayor.

DIGESTIÓN	Mantenimiento de Calderas (3 equipos)	10%	OC N° 79868 (GESFUS), a la espera de disponibilidad de proveedor para comenzar con los mantenimientos.
	Mantenimiento de Calderas, Quemadores y ensayos	5%	Incluído en GE 2026.
	Vaciado y limpieza de Digestor N°4	20%	A la espera de la habilitación de otro Almacenador, y de la disponibilidad de una bomba C17 (reparación o adquisición).
ALMACENADORES	Reparación de guías de Agitadores y modificación de pera de nivel de Almacenador 2B	100%	-
	Reparación de guías de Agitadores y modificación de pera de nivel de Almacenador 1B	80%	A la espera de instalación de bomba de achique para finalizar limpieza de la unidad, y su posterior puesta en marcha.
	Reemplazo de Agitadores de Almacenador 1B	100%	Se reemplazaron por equipos nuevos.
	Reparación de guías de Agitadores y modificación de pera de nivel de Almacenador 1A	0%	Se programa inicio de tareas una vez que se ponga en servicio Almacenador 1B
	Reparación de guías de Agitadores y modificación de pera de nivel de Almacenador 3A	0%	Se programa inicio de tareas una vez que se ponga en servicio Almacenador 1A
DESHIDRATACIÓN	Mantenimiento mayor de Centrífuga N°1	30%	OC N° 76800 (GEA), a la espera de finalización de mantenimiento mayor de Centrífuga N°2.
	Mantenimiento mayor de Centrífuga N°2	40%	OC N° 76800 (GEA), a la espera de compra de repuestos solicitados por GEA.
	Mantenimiento mayor de Centrífuga N°3	100%	OC N° 76800 (GEA), realizado.
	Mantenimiento "Smek" de Centrífuga N°4	20%	OC N° 76800 (GEA), a la espera de la compra de repuestos/equipos faltantes (variador de velocidad, unidad de lubricación y pantalla HMI) incluídos en PI 2025 y PI 2026.
	Mantenimiento "Smek" de Centrífuga N°5	100%	OC N° 76800 (GEA), realizado.
OTROS	Adquisición de bombas centrífugas varias	30%	OC N° 79526 (GRUNDFOS), a la espera de la entrega de los equipos.
	Adquisición de crapodinas (Espesadores/Flotadores)	30%	OC N° 79494 (ACCINSA), a la espera de la entrega de los materiales.
	Adquisición de bombas tornillo	20%	RC N° 304918 / SI 9926 (correspondiente a PI 2025)
	Adquisición de Secadores de aire	100%	OC N° 79313 (EPAM)
	Adquisición de Agitadores varios	100%	OC N° 78157 (GUNDFOS).
	Adquisición de Agitadores verticales	100%	OC N° 79701 (METALURGICA CERRITO)
	Mantenimiento de Transformadores	100%	OC N° 78079 (CAMBIASSO)
	Calibración de sensores de gases fijos	100%	OC N° 78083 (NOETEC)
	Ensayo de compresores de aire	100%	OC N° 78189 (AGNOLETTO)
	Medición, muestreo y análisis de Biogás	100%	OC N° 78468 (INDUSER)
	Medición y control de PAT	100%	OC N°
LAVADO DE ARENAS	Construcción de base de hormigón para Tamiz	40%	Se logro finalizar la obra referente a la extension del puente grua. Para el resto de las tareas se continuara en el 2026 por gastos e inversiones. No se logro avanzar con estos items debido a que le proyecto de Planta Espejo se encuentra paralizado por el momento.
	Construcción de tabique para contención de arenas	10%	
	Instalación de Clasificador de arenas	10%	
	Extensión de recorrido de puente grúa	100%	
	Extensión de tabiques de fosa de lavado	10%	
	Reparación de rejillas de drenaje	30%	
VACIADERO Y PRETRATAMIENTO	Reperacion del sistema de ventilacion con mejora en Biofiltrado del aire	10%	Se adecuo el actual sistema de ventilacion, por lo tanto se anula esta obra.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	Termografia	100%	
	Vibraciones	100%	
	Mantenimiento Repicky	50%	Mantenimiento preventivo cuatrimestral OC 79105 Repicky
DEPÓSITOS, OFICINAS Y PARQUES	Rehabilitación en toda la planta.	90%	Realizar Rc para adquisicion de Pinturas, para trabajos con personal propio de planta. Adecuaciones en proceso de reaizacion por parte de la DAL.
	Insumos de laboratorio	60%	Se incoporan en Explotacion 2026 (Gastos)
	Calibración de equipos de instrumentación de planta	75%	
	Calibración de equipos de laboratorio	80%	
	Calibración de equipos de medición eléctrica - Calibracion de Pertigas	100%	
	Renovacion de equipamiento de taller - Adquisición de máquinas y herramientas	30%	Se incorporan en PI 2025
	Ferreteria - Insumos	40%	Se incorporan en PI 2026. En proceso de realizacion de RC.
	Adecuación de sala de máquinas de planta vieja	0%	El objetivo fue planteado para poder utilizarlo como deposito del pañol. Mediante relevamientos con los distintos sectores de planta, y tambien motivos en cuanto a la seguridad e higiene del personal, se
	Luminarias	100%	
	Adecuacion y reparacion de hidrantes	100%	
	Pavimentado de acceso a Vaciadero	100%	
	Mantenimiento de central de alarma contra incendio	40%	Se realiza solicitud DAL

aysa	**OBRAS REALIZADAS** **PLANTA DEPURADORA SUDOESTE II** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-S-PRO-PDSO-02**

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
AFLUENTE DE PLANTA			
Rejas ERE	Sustitucion rejas ERE	**70%**	OC 71503 Brigde Hydrogen- falta montaje de tornillo compactador y tablero automatismo.
	Reparacion de compuerta CC01	**100%**	
	Reemplazo Sensores de Gases ERE	**100%**	
ELEVACIÓN			
	Reparacion de Almeja	**100%**	Con OC 77497
TRATAMIENTO BIOLÓGICO			
	Desmontaje de motor electrico para mantenimiento integral SP01TA	**50%**	Activo entregado a talleres varela
Tanques de aireación	Adquisición de Turbosoplador	**0%**	Baja
DECANTACIÓN SECUNDARIA			
Sedimentadores Secundarios	Renovacion de chapas perimetral sobrenadante en SS08	**100%**	
AGUAS INDUSTRIALES			
	Adquisicion de sensores para control automatico de presion	**100%**	
MANTENIMIENTO PREDICTIVO			
	Ensayo de transformadores	**100%**	
	Verificación anual de compresores	**100%**	
	Termografía	**100%**	
	Medición y control de PAT	**100%**	
	Vibraciones	**100%**	
DEPÓSITOS, OFICINAS Y PARQUES			
Calibración de equipos de instrumentación de planta	Calibración de caudalímetros, sensores de nivel, etc	**100%**	Continuar con la calibracion periodica de los equipos de medicion asociados a calidad
Calibración de equipos de medición eléctrica		**100%**	
Renovación de equipamiento de taller	Adquisición de máquinas y herramientas	**80%**	Se incorpora en PI 2026. No avanza en % de objetivo debido a que el año pasado no se habilitaron a las fichas de inversiones.
Ferretería	Insumos	**80%**	Se incorporan en PI 2026. En proceso de realizacion de RC.

OBRAS REALIZADAS EN LA **PLANTA DEPURADORA NORTE** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025**	
	IAT1-O-S-PRO-PDN 01	**exPL IA N° 21**

Descripción		Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
PRETRATAMIENTO	**Rejas**	-	-	Realizar reemplazo de todo el sistema de Rejas Gruesas y Rejas Finas MI y MII (Revamping) // Reparación integral de las 4 bombas hidráulicas de rejas gruesas del MI y MII (PI)
	Desarenado/Desengrasado	Se repararon con fuerza propia el puente desarenado Nº1 y se instalaron dos nuevas bombas de arena.	75%	Se proyecta reacondicionar los 4 puentes desarenadores y colocar las bombas de arenas nuevas, y reparación de tablero eléctrico del puente N°3. Contemplado en el revamping.
	Tratamiento de arenas	Se repararo Hidrociclon N°1 y N°3 - N° 2 no tiene reparación (se debe reemplazar)	100%	Se proyecta reemplazo de 3 Hidrociclones + provisión de un 4to.
	Tratamiento de grasas	-	-	-
	Bomba de elevación	Cambio de bomba de elevación Nº2 .	100%	-
SEDIMENTACIÓN PRIMARIA	**Decantador**	Reparación de motorreductor de decantador 7.4 MII	100%	
	Decantador	Reacondicionamiento de Pivot Central Decantador 7.2 MI	100%	Reacondicionamiento de Pivot Central Decantador 7.1 MI (Revamping)
TRATAMIENTO BIOLOGICO Y SECUNDARIO	**Cámaras de aireación**	-	-	-
	Sistema de aireación	Instalación de Turbocompresor pendiente	0%	• Instalación turbo soplador, se colocó en su momento un 10% por la gestión realizada desde planta en reiteradas oportunidades (RC). El equipo se encuentra en nuestro pañol, a la espera de su instalación cuando comience el revamping, con lo cual se considera un regreso al 0%.
	Sistema de aireación	Grandes conductos reparó las pérdidas en las válvulas de la cámara de insonorización. Es necesario un trabajo adicional para reparar la estructura interior.	100%	Se contempla Reparación de estructura interior contemplada en el Revamping.
	Recirculación	Se mejoró el funcionamiento de los MI y MII colocando bombas de lodos nuevas que envían barro a los flotadores.	100%	-
	Clarificador 12.1	Se reparó motorreductor, eje, rodamientos y se colocó nuevo caudalímetro.	100%	-
	Clarificador 12.1	Se repararon las cañas telescópicas y el barredor de fondo con personal propio.	100%	-
	Clarificador 12.4	Se reparó tolva y barredor superficial con personal propio.	100%	-
	Clarificadores 12.5, 12.6, 12.7 y 12.8	-		-
TRATAMIENTO DE BARROS	**Espesador**	Reparación de la esctructura e impermeabilización del Espesador Nº1.	100%	-
	Espesador	Se hizo prueba piloto colocando bomba tornillo en el espesador	100%	-
	Espesador	Se reemplazó bomba centrífuga por bomba tornillo APL19 en Sala de Bombas de Lodos Espesados	100%	-
	Espesador	Poner en marcha los dos tamices de planta.	100%	-
	Flotación	-	-	-
	Camara de Lodos Mixtos	-	-	-
	Digestion	Impermeabilización y reparación de filtraciones Digestor N°2	0%	Impermeabilización y reparación de filtraciones Digestor N°2 (Revamping)
	Digestion	Reparación de recubrimiento de Digestor MI, caídas por el temporal del día 17/12/2023.	100%	-
	Digestion	Reparación sobrepresores.	100%	-
	Digestion	Reparación compresor de biogas.	50%	En curso OC 78419.
	Deshidratacion	Provisión de tambor+tablero Centrífugas	100%	Vincular tableros al PLC Centrífugas N°1 y N°3
	Antorcha	Reparación actuador de válvula.	50%	En curso OC 79950.
DEPOSITOS, OFICINAS Y PARQUES	**General**	Instalación de sistema de Alarma de Incendio Nuevo.	90%	-
	General	Se reparó medianera lindera a Fate destruída por temporal del día 17/12/2023.	100%	-
	General	Mantenimiento de transformadores y celdas de media tensión	100%	-
	Pañol	-		
	Cisterna	-		

aysa	**OBRAS REALIZADAS EN LA** **PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-S-PRO-PDEJ 01** / **exPL IA Nº 22**

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
PRETRATAMIENTO			
TRATAMIENTO BIOLÓGICO			
CLARIFICACIÓN			
RECIRCULACIÓN			
LÍNEA DE BARROS y DESHIDRATACIÓN			
OFICINAS, DEPÓSITOS, TALLERES y PARQUE			

	OBRAS REALIZADAS PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL 2 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
		IAT1-O-S-PRO-PDEJ 01	exPL IA Nº 22

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ENTRADA			
Cámara de entrada	Retiro de tapa de cámara y limpieza de cámara de llegada.	100%	
DESBASTE Y BOMBEO			
Rejas gruesas	Fabricación e instalación de rejas gruesas	100%	
Puente Grúa	Reparación de Puente Grúa PG-105	100%	
Reja Fina	Reparación de compuertas y Reja fina RF-101.	100%	
Reja Fina	Reparación de reja fina RF-102	50%	Puesta en marcha de reja fina RF-102
Ventilación forzada	Reparación de Ventilación Forzada VF-101	10%	Puesta en marcha del equipo. La reparación queda sujeta a la asignación de presupuesto 2026, ya que en 2025 no se asignaron fondos.
PRETRATAMIENTO			
Tamices	Reparación de Tamiz TR-01 y Tamiz TR-02	10%	Reparación de TR-02 y puesta en marcha. La reparación queda sujeta a la asignación de presupuesto 2026, ya que en 2025 no se asignaron fondos.
Puentes traslacionales	Reparación de Puente Traslacional PUT-101	50%	Puesta en marcha.
Puentes traslacionales	Reparación de Puente Traslacional PUT-102	10%	La reparación queda sujeta a la asignación de presupuesto 2026, ya que en 2025 no se asignaron fondos.
TRATAMIENTO 1° Y 2°			
Sedimentadores primarios	Reparación de Sedimentador Primarios PSP-101 y PSP-102	20%	Reparación y puesta en marcha de PSP-101. La reparación queda sujeta a la asignación de presupuesto 2026, ya que en 2025 no se asignaron fondos.
Sedimentadores primarios y secundarios	Fabricación de pistas de rodaduras	100%	
Colocación de pistas	Colocación de pistas de rodadura en sedimentadores primarios	100%	
Lechos percoladores	Reparación de Sprinkler SPK-101 y SPK-102	100%	
CÁMARA DE CONTACTO Y BOMBEO FINAL			
Sensores de nivel	Reparación de sensor de nivel para el funcionamiento en automático de las bombas de emisario BS-106 y BS-108.	100%	
ESPESAMIENTO DE LODOS			
Tamiz	Reparación de Tamiz TR-03	100%	
DIGESTIÓN DE LODOS (SISTEMA DE BIOGÁS)			
Compresores de biogás.	Instalación de 3er compresor de Biogás.	100%	

Compresores de biogás	Reparación de compresores de biogás COB-101 y COB-102	70%	Puesta en marcha de los compresores.
DIGESTIÓN DE LODOS (SISTEMA DE MEZCLADO)			
DIGESTIÓN DE LODOS (SISTEMA DE CALEFACCIONADO)			
Tanque de combustible de caldera	Fabricación en acero inoxidable e instalación de tanque de combustible para la caldera	100%	
Caldera	Reemplazo de quemador y servicio de mantenimiento en caldera	100%	
DESHIDRATACIÓN			
Decantadores centrífugos	Mantenimiento mayor mecánico del tambor, tornillo sinfín y caja reductora. Revisión de sensores y parámetros de funcionamiento.	80%	Realización del Balanceo dinámico del tambor para la puesta en marcha. La reparación se demoro por falta de repuestos importados.
Tablero eléctrico	Reparación de tablero electrico de CEN-102	60%	Puesta en marcha del equipo.
Tableros de comando de centrífugas	Traslado a planta baja los tableros eléctricos de ambas centrífugas	100%	
Silo de lodos	Limpieza, reparación de rajaduras, reemplazo de marco de tolva de tornillo del fondo de Silo	40%	Puesta en servicio de la unidad.
LABORATORIO			
TABLERO PRINCIPAL			
Transformador	Adquisición de transformador seco de 13,2 kVA	70%	Instalación de transformador
VEHÍCULOS DE PLANTA			
OBRA CIVIL Y OTRAS OBRAS			

Descripción		Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
PRETRATAMIENTO	**Sector Pretratamiento**	Cambio de Sensor de Rejas	100%	Reacondicionamiento de compuertas de entrada
		Cambio de Sensores de Gases	33%	Completar cambio de Sensores de H2S y HCN
	Desarenador	Reparación Tornillo A	10%	Inversión presentada, Presupuesto aprobado, CP en marcha. Realizar Obra
TRATAMIENTO BIOLÓGICO	**Cámaras de Aireación Extendida**	Instalacion de Bombas de Vaciadero	10%	Pliego y proyecto de inversión
		Reacondicionamiento de compuertas de salida de reactoras	10%	Pliego y proyecto de inversión
		Reparación de sistema de aireación de Reactor A	10%	Pliego y proyecto de inversión
	Instrumentos	Cambio de sondas de Oxigeno	10%	Pliego y proyecto de inversión
SOPLANTES	**Motores**			Instalación de 2 variadores de velocidad
	Soplantes	Recuperación de la comunicación del TG	100%	Puesta en servicio de soplantes 7 y 10
		Reacondicionamiento de Trincheras	70%	Proyectado PI 2026.
SEDIMENTADORES SECUNDARIOS	**Clarificadores**	Reemplazo motor-reductor clarificador "B" y "C"	100%	
	Recirculación de lodos	Reparación de Bomba de Recirculación "C"	100%	
DESHIDRATACIÓN	**Filtros de Banda**	Cambio de Rodillos Filtro 2	100%	Cambio integral del Filtro 1
		Cambio de Sistema de Corrección de Banda F3	100%	Reparación integral de Filtro 2
	Cámara Seca			Conexión de línea de suministro de lodo a deshidratar con cámara de M2
	Sector Deshidratación	Reacondicionamiento de UPP automática	66%	Reinstalación de Sistema de preparación Manual de Polímero de respaldo
		Recuperación de la comunicación del TS1	50%	Reparación de suelo de hormigón de soporte de Contenedores de 10 t
		Modificación del sistema de descarga de lodos deshidrtados a Roll Off	10%	Incluido en PI 2026
		Aumento de capacidad del pozo de drenaje.	10%	Incluido en PI 2026
SALIDA DE PLANTA	**Laberinto**	Se comenzó a trabajar con Mejora y mantenimiento para el reemplazo y renovación de las compuertas	10%	Se cancela la renovacion hasta que haya presupuesto asignado.
TRABAJOS EN GENERAL	**Automatización**	Migración a sistema Topkapi. Por pedido de automatización se solicita a la dirección el plan de obras de módulo I y II de PDH, para continuar con la etapa 2.	50%	Se derivan fondo des los Proyectos de Inversion para continuar con la gestion.
		Unificación de sistemas de Topkapi M1 y M2	10%	A la espera de modificaciones por parte de Automatismo
		Automatizar el control sobre los soplantes del M1	10%	A la espera del reemplazo de los controladores en Soplantes
	General	Instalación del tablero de la nueva perforación de agua de procesos	20%	Finalización de instalación de tablero de pozo nuevo de agua de procesos
		Incorporación del sistema Máximo en Planta.	100%	

aysa	**OBRAS REALIZADAS EN LA PLANTA DEPURADORA BARRIO UNO** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual Año 2025** IAT1-O-S-PRO-PDBU 01 / ex PL IA Nº 22

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE (%)	Perspectivas para el Año 2026
PRETRATAMIENTO			
ELEVACION			
TRATAMIENTO BIOLOGICO			
CLARIFICACION			
LINEA DE BARROS			
Playas de secado	Reparación de playas de secado	100%	
INSTALACION ELECTRICA			
Tablero eléctrico general			
DEPOSITOS, OFICINAS Y PARQUES			
Obras civiles y otras obras	Ampliación en la Planta Depuradora. Descripción general de la obra La misma contempla la construcción de: - 300 m2 Edificio Administrativo de Planta. - 30 m2 Garita de Vigilancia. - 25 m2 Depósitos de Combustible + Residuos peligrosos. - 75 m2 de Estacionamiento Semi Cubierto. - 75m2 de Estacionamiento Descubierto. - 1105 m2 Pavimento Vehicular + Camiones.	60%	Obra paralizada

OBRAS REALIZADAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES SANTA CATALINA
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025
Planilla IA Nº 21

ITEM	DESCRIPCIÓN	TAREAS REALIZADAS	AVANCE (%)	COMENTARIOS	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2026
2	**PRETRATAMIENTO:** Desarenadores, rejas	Reparación de fisuras en el hormigón del desarenador.	100%	La empresa Bairestron realizó la reparación de fisuras en el hormigón del desarenador	Proyecto finalizado.
3	**TRATAMIENTO BIOLÓGICO, DECANTACION Y CLARIFICACION**	Instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de medición de oxígeno disuelto y potencial Redox para el reactor.	100%	La empresa Meditecna finalizó la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de medición de oxígeno disuelto y potencial Redox para el reactor.	Proyecto finalizado. Se solicitó a la DAL la instalacion de puesta a tierra para resguardar la vida útil del equipamiento.
4	**ESTABILIZACIÓN y ESPESAMIENTO DE LODOS**				
5	**DESHIDRATACION DE LODOS**				
6	**LABORATORIO DE PLANTA**				
7	**TABLERO ELÉCTRICO**				
8	**OBRA CIVIL y OTRAS OBRAS**				
9	**TABLERO GENERAL DE PLANTA** **VARIADORES** **AUTOMATISMO** **TOPKAPI**				
10	**BOMBEO DE LODOS**				
11	**SALIDA DE PLANTA**				

aysa	**OBRAS REALIZADAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO WILDE** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual Año 2025** IAT1-O-S-TRA-EB 01 / exPL IA Nº 19

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
OBRAS CIVILES	Construcción de pasarelas para cámara repartidora.	100%	
	Se comenzó con la restauración del viejo pañol y ex taller eléctrico. Se acondicionara para la gerencia de transporte.	95%	Terminar la obra
OBRAS ELECTROMECÁNICAS	Remplazo de 12 Equipos Limpia rejas de Sala 4ta.(Ejecución de R.C./ O.C. /Datos Tec. /Adjudicación /construcción de Rejas)	100%	Debido a los tiempos transcurridos y de haberse vencido la OC, se gestiona la baja de la misma. Solo hubo la entrega parcial de la OC se entregaron dos equipos completos para la sala 4ª.
	Remplazo de 12 Equipos Limpia rejas de Sala 4ta. (Recepción, instalación y puesta en marcha de las rejas)	15%	Debido a los tiempos transcurridos y de haberse vencido la OC de decide dar de baja a la OC.
	Cambio de Interruptores de Arranque para 4 Motores de Sala 4ta	0%	Se realiza la gestión para la adquisición de los interruptores para las electrobombas principales, en Diciembre se aprueba el pliego, estamos a la espera del concurso privado y la OC.
			Reparacion por fisura del canal N° 5 sala 4a.
	Cambio de cañerias y mangeras en sistema hidraulico de valvulas en camara de medicion de caudal sala 4a.	25%	Devido a la falta de insumos se reprogama para el 2026
	Cambio de transfomadores en baño de aceite por encapsulados en resina de epoxi de reja sala 4a.	100%	
	Renovacion de cañeria y valvulas de refrigeracion de salas 3a y 4a.	20%	Devido a la falta de insumos se reprograma para el 2026, cambio de Tablero principal de baja tension de sala 3a.
	Cambio de Exitatriz dinamica por estatica de las electrobombas N° 2 y 3 de sala 4a. Por TV.	100%	
	Cambio de protecciones de electrobomba N° 3 y 4 de sala 3a.	100%	
INSTALACIONES			

aysa	**OBRAS REALIZADAS EN LA** **ESTACION DE BOMBEO BOCA-BARRACAS** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-S-TRA-EB 02** | **exPL IA N° 15**

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Comentarios - Perspectivas para el Año 2026
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS	Cambio de protecciones en interruptores de arranque ubicados en sala de media tensión.	85%	Debido a la aceptacion de presupuesto 2025 se pudo avanzar con la obra electromecanica, se estima que en los primeros messes de 2026 se finalaza la obra
	Modificacion y montaje de compuerta vinculante de la Obra Complementaria 9 (OC9)	100%	
	Automatizacion del sistema de Rejas, cintra transportadora y compactador de RSU	100%	
INSTALACIONES			

	OBRAS REALIZADAS EN LAS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS NORTE, SUR y OESTE Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZONA EBC CENTRO			
OBRAS CIVILES			
ZC-17 Cildañez	Construccion de vestuario de caballeros	100%	FINALIZADO
ZC-17 Cildañez	Construccion de baños para el personal operativo	100%	FINALIZADO
ZC-17 Cildañez	Restauración e ampliación de comedor	100%	FINALIZADO
ZC-72 San blas	Construccion del muro perimetral	0%	Se solicito en el PI2025, luego se desestimo, por lo tanto se solicitara a la DAL, al mismo tiempo empezaron los trabajos para la construccion de rejas perimetrales.
ZC-72 San blas	Construccion e instalacion de reja perimetrales (con mano de obra y materiales propios)	25%	Seguir adelante con el proyecto
OBRAS ELECTROMECANICAS			
ZC-23 Puerto II	Reparacion integral del tablero de potencia y comando	100%	
ZC-23 Puerto II	Renovacion de la buloneria en los 4 tanques antiariete	75%	Solicitado en el PI2026. A la espera de OC para la reparacion integral de sistema antiariete.
ZC-16 LUGANO I-V	Construccion de reja recolectora de residuos y reparacion del equipo en gral.	30%	Se desestima por baja de la ebc (vinculada al margen izquierdo)
ZC-15 LUGANO I-II	Instalacion de multi smart	100%	
ZC-21 PLANETARIO	Renovacion del tablero de comando, potencia y comunicacion	100%	
ZC-22 PUERTO I	Renovacion de cañeria de impulsion	100%	
ZC-25 CHILAVERT II	Renovacion de impulsores y volutas en la totalidad de las electrobombas	100%	
ZC-25 CHILAVERT II	Renovacion del aparejo de izaje del canasto y de su instalacion electrica	100%	
INSTALACIONES			
	Limpieza de tablero: Frecuencia Trimestral según R-EBC-003	80%	
(***ZC-15 LUGANO I – II, ZC-16 LUGANO I – V, ZC-17 CILDAÑEZ, ZC-18 SOLDATI, ZC-19 LA QUEMA*** *estas ebc a partir del mes de julio fueron vinculadas al margen izquierdo*), ZC-20 FATIMA, ZC-21 PLANETARIO, ZC-22 PUERTO I, ZC-23 PUERTO II, ZC-24 PUERTO III, ZC-28 AEROPARQUE, ZC-13 CHILAVERT, ZC-25 CHILAVERT II, ZC-45 V. BALLESTER, ZC-64 TUPUNGATO, ZC-36 VILLA OLIMPICA, ZC-72 SAN BLAS.			
	Boyas: Frecuencia Mensual según R-EBC-003	100%	
(***ZC-15 LUGANO I – II, ZC-16 LUGANO I – V, ZC-17 CILDAÑEZ, ZC-18 SOLDATI, ZC-19 LA QUEMA*** *estas ebc a partir del mes de julio fueron vinculadas al margen izquierdo*), ZC-20 FATIMA, ZC-21 PLANETARIO, ZC-22 PUERTO I, ZC-23 PUERTO II, ZC-24 PUERTO III, ZC-28 AEROPARQUE, ZC-13 CHILAVERT, ZC-25 CHILAVERT II, ZC-45 V. BALLESTER, ZC-64 TUPUNGATO, ZC-36 VILLA OLIMPICA, ZC-72 SAN BLAS.			
	Limpieza de canastos y Rejas: Frecuencias Mensual según R-EBC-003	90%	
(***ZC-15 LUGANO I – II, ZC-16 LUGANO I – V, ZC-17 CILDAÑEZ, ZC-18 SOLDATI, ZC-19 LA QUEMA*** estas ebc a partir del mes de julio fueron vinculadas al margen izquierdo), ZC-20 FATIMA, ZC-21 PLANETARIO, ZC-22 PUERTO I, ZC-23 PUERTO II, ZC-24 PUERTO III, ZC-28 AEROPARQUE, ZC-13 CHILAVERT, ZC-25 CHILAVERT II, ZC-45 V. BALLESTER, ZC-64 TUPUNGATO, ZC-36 VILLA OLIMPICA, ZC-72 SAN BLAS, ZC-35 NEBA.			
	Limpieza de cámara de Válvulas: Frecuencias Mensual según R-EBC-003	80%	
(***ZC-15 LUGANO I – II, ZC-16 LUGANO I – V, ZC-17 CILDAÑEZ, ZC-18 SOLDATI, ZC-19 LA QUEMA*** estas ebc a partir del mes de julio fueron vinculadas al margen izquierdo), ZC-20 FATIMA, ZC-21 PLANETARIO, ZC-22 PUERTO I, ZC-23 PUERTO II, ZC-24 PUERTO III, ZC-28 AEROPARQUE, ZC-13 CHILAVERT, ZC-25 CHILAVERT II, ZC-45 V. BALLESTER, ZC-64 TUPUNGATO, ZC-36 VILLA OLIMPICA, ZC-72 SAN BLAS, ZC-35 NEBA.			
	Mantenimiento de Rejas: Cantidad-Frecuencias Mensual según R-EBC-003	90%	

	OBRAS REALIZADAS EN LAS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS NORTE, SUR y OESTE Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZC-16 LUGANO I-V hasta julio que fue vinculada al M. Izquierdo _ ZC-36 - VILLA OLIMPICA			
	Mantenimiento de Cinta Transportadora Cantidad-Frecuencias Mensual	75%	
ZC-69 - VILLA OLIMPICA			
Control de funcionamiento: Frecuencia Diaria	ZC-15 LUGANO I – II, ZC-16 LUGANO I – V, ZC-17 CILDAÑEZ, ZC-18 SOLDATI, ZC-19 LA QUEMA, ZC-20 FATIMA, ZC-21 PLANETARIO, ZC-22 PUERTO I, ZC-23 PUERTO II, ZC-24 PUERTO III, ZC-28 AEROPARQUE, ZC-13 CHILAVERT, ZC-25 CHILAVERT II, ZC-45 V. BALLESTER, ZC-64 TUPUNGATO, ZC-36 VILLA OLIMPICA, ZC-72 SAN BLAS, ZC-35 NEBA.	99%	

	OBRAS REALIZADAS EN LAS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS NORTE, SUR y OESTE Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZO			
C SUR E	Construcción de nuevo edificio.	100%	Obra finalizada Julio 2025
TE AVE	Instalacion de compuerta general de ingreso Ø 1200mm	90%	Instalar actuador de cierre automatico quedando al 100% / Queda pendiente para el año 2026 por razones operativas.
	Limpieza de tablero: Frecuencia Mensual	99%	
	ZS-01 - ISLA MACIEL, ZS-02 - DOCK SUD, ZS-03 - DOCK SUD, ZS-07 – ARGARAÑAZ, ZS-08 – ROCA, ZS-09 – WILDE, ZS-11 - TRES SARGENTOS, ZS-12 - WILDE ESTE, ZS-13 ALBERDI, ZS-33 – DEFENSA, ZS-34 - SANTO DOMINGO, ZS-36 - LAS FLORES, ZS-41 - LOMAS ESTE, ZS-15 - DON BOSCO NORTE, ZS-16 - DON BOSCO SUR, ZS-17 – FALUCHO, ZS-23 - VILLA ALCIRA, ZS-24 - VILLA CRAMER, ZS-28 - FALUCHO ESTE, ZS-37 - ESTE AVELLANEDA, ZS-82 - MONTE CHINGOLO, ZS-83 - VILLA DOMINICO,ZS-90 - RAMAL AVELLANEDA, ZS-91 - RIO ATUEL, ZS-93 – PINTO, ZS-95 - VILLA GONNET, ZS-96 - AVELLANEDA OESTE, ZS-92 SARMIENTO.		
	Boyas: Frecuencia Quincenal	99%	
	ZS-01 - ISLA MACIEL, ZS-02 - DOCK SUD, ZS-03 - DOCK SUD, ZS-07 – ARGARAÑAZ, ZS-08 – ROCA, ZS-09 – WILDE, ZS-11 - TRES SARGENTOS, ZS-12 - WILDE ESTE, ZS-13 ALBERDI, ZS-33 – DEFENSA, ZS-34 - SANTO DOMINGO, ZS-36 - LAS FLORES, ZS-41 - LOMAS ESTE, ZS-15 - DON BOSCO NORTE, ZS-16 - DON BOSCO SUR, ZS-17 – FALUCHO, ZS-23 - VILLA ALCIRA, ZS-24 - VILLA CRAMER, ZS-28 - FALUCHO ESTE, ZS-37 - ESTE AVELLANEDA, ZS-82 - MONTE CHINGOLO, ZS-83 - VILLA DOMINICO,ZS-90 - RAMAL AVELLANEDA, ZS-91 - RIO ATUEL, ZS-93 – PINTO, ZS-95 - VILLA GONNET, ZS-96 - AVELLANEDA OESTE, ZS-92 SARMIENTO.		
	Limpieza de canastos y Rejas: Frecuencias Quincenal	99%	
	ZS-01 - ISLA MACIEL, ZS-02 - DOCK SUD, ZS-03 - DOCK SUD, ZS-07 – ARGARAÑAZ, ZS-08 – ROCA, ZS-09 – WILDE, ZS-11 - TRES SARGENTOS, ZS-12 - WILDE ESTE, ZS-13 ALBERDI, ZS-33 – DEFENSA, ZS-34 - SANTO DOMINGO, ZS-36 - LAS FLORES, ZS-41 - LOMAS ESTE, ZS-15 - DON BOSCO NORTE, ZS-16 - DON BOSCO SUR, ZS-17 – FALUCHO, ZS-23 - VILLA ALCIRA, ZS-24 - VILLA CRAMER, ZS-28 - FALUCHO ESTE, ZS-37 - ESTE AVELLANEDA, ZS-82 - MONTE CHINGOLO, ZS-83 - VILLA DOMINICO,ZS-90 - RAMAL AVELLANEDA, ZS-91 - RIO ATUEL, ZS-93 – PINTO, ZS-95 - VILLA GONNET, ZS-96 - AVELLANEDA OESTE, ZS-92 SARMIENTO.		
	Limpieza de cámara de Válvulas: Frecuencias Mensual	99%	
	ZS-01 - ISLA MACIEL, ZS-02 - DOCK SUD, ZS-03 - DOCK SUD, ZS-07 – ARGARAÑAZ, ZS-08 – ROCA, ZS-09 – WILDE, ZS-11 - TRES SARGENTOS, ZS-12 - WILDE ESTE, ZS-13 ALBERDI, ZS-33 – DEFENSA, ZS-34 - SANTO DOMINGO, ZS-36 - LAS FLORES, ZS-41 - LOMAS ESTE, ZS-15 - DON BOSCO NORTE, ZS-16 - DON BOSCO SUR, ZS-17 – FALUCHO, ZS-23 - VILLA ALCIRA, ZS-24 - VILLA CRAMER, ZS-28 - FALUCHO ESTE, ZS-37 - ESTE AVELLANEDA, ZS-82 - MONTE CHINGOLO, ZS-83 - VILLA DOMINICO,ZS-90 - RAMAL AVELLANEDA, ZS-91 - RIO ATUEL, ZS-93 – PINTO, ZS-95 - VILLA GONNET, ZS-96 - AVELLANEDA OESTE, ZS-92 SARMIENTO.		
	Mantenimiento de Rejas: Cantidad-Frecuencias Mensual	99%	
	ZS-17 Falucho, ZS-37 Avellaneda Este, ZS-90 Ramal Avellaneda.		
	Mantenimiento de Cinta Transportadora Cantidad-Frecuencias Mensual	99%	
	ZS-17 Falucho, ZS-37 Avellaneda Este, ZS-90 Ramal Avellaneda.		
Control de funcionamiento: Frecuencia Diari	ZS-01 - ISLA MACIEL, ZS-02 - DOCK SUD, ZS-03 - DOCK SUD, ZS-07 – ARGARAÑAZ, ZS-08 – ROCA, ZS-09 – WILDE, ZS-11 - TRES SARGENTOS, ZS-12 - WILDE ESTE, ZS-33 – DEFENSA, ZS-34 - SANTO DOMINGO, ZS-36 - LAS FLORES, ZS-41 - LOMAS ESTE, ZS-13 – ALBERDI, ZS-14 – CALCHAQUÍ, ZS-15 - DON BOSCO NORTE, ZS-16 - DON BOSCO SUR, ZS-17 – FALUCHO, ZS-18 – FERROVIARIO, ZS-19 - LOS ALAMOS, ZS-20 – NAVAL, ZS-21 – SOCORRO, ZS-22 - SOLANO LA FLORIDA, ZS-23 - VILLA ALCIRA, ZS-24 - VILLA CRAMER, ZS-25 – EZPELETA, ZS-28 - FALUCHO ESTE, ZS-37 - ESTE AVELLANEDA, ZS-64 - QUILMES NORTE, ZS-65 - QUILMES SUR, ZS-80 - PASCO ESTE, ZS-82 - MONTE CHINGOLO, ZS-83 - VILLA DOMINICO, ZS-87 - LAS PIEDRAS, ZS-90 - RAMAL AVELLANEDA, ZS-91 - RIO ATUEL, ZS-93 – PINTO, ZS-95 - VILLA GONNET, ZS-96 - AVELLANEDA OESTE.	99%	

	OBRAS REALIZADAS EN LAS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS NORTE, SUR y OESTE Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2025
ZONA L.GUILLON			
OBRAS CIVILES			
ZG-07 LLAVALLOL	Renovación integral de la EBC (revamping).	50%	Obra nuevamente en ejecución. Construcción de sala de rejas y cámara humeda.
OBRAS ELECTROMECANICAS			
ZG-07 LLAVALLOL	Renovación integral de la EBC (revamping).	40%	Obra nuevamente en ejecución, renovación de cañerias y compuerta de ingreso y canales 1 y 2, renovación de electrobombas, instalación de rejas
INSTALACIONES			
	Limpieza de tablero: Frecuencia trimestral	90%	
ZG-01 DIAMANTE, ZG-02 FRAY LAGOS, ZG-03 ITAPIRU, ZG-04 PINEYRO, ZG-06 LAS COLONIAS, ZG-07 LLAVALLOL, ZG-08 OBRANOR, ZG-09 ALTE.BROWN, ZG-10 COCA COLA, ZG-11 LA UNION, ZG-12 SPEGAZZINI, ZG-13 LUIS GUILLO, ZG-14 SAN JAVIER, ZG-15 ALMAFUERTE, ZG-16 ALTOS 2, , ZG-20 TURDERA II, ZG-21 CONSTANZO, ZG-22 ADROGUE II, ZG-23 MANZANA 70, ZG-24 CALZADA II, ZG-25BALCARSE SUR, ZG-27 5 ESQUINAS, ZG-28 MAGDALENA, ZG-29 PARQUE AMERICANO, ZG-31 MONTECARLO -ZG-32 ADROGUE SUR 1			
	Boyas: Frecuencia mensual	90%	
ZG-01 DIAMANTE, ZG-02 FRAY LAGOS, ZG-03 ITAPIRU, ZG-04 PINEYRO, ZG-06 LAS COLONIAS, ZG-07 LLAVALLOL, ZG-08 OBRANOR, ZG-09 ALTE.BROWN, ZG-10 COCA COLA, ZG-11 LA UNION, ZG-12 SPEGAZZINI, ZG-13 LUIS GUILLO, ZG-14 SAN JAVIER, ZG-15 ALMAFUERTE, ZG-16 ALTOS 2, , ZG-20 TURDERA II, ZG-21 CONSTANZO, ZG-22 ADROGUE II, ZG-23 MANZANA 70, ZG-24 CALZADA II, ZG-25 BALCARSE SUR, ZG-27 5 ESQUINAS, ZG-28 MAGDALENA, ZG-29 PARQUE AMERICANO, ZG-31 MONTECARLO -ZG-32 ADROGUE SUR 1			
	Limpieza de canastos y Rejas: Frecuencias mensual	90%	
ZG-01 DIAMANTE, ZG-02 FRAY LAGOS, ZG-03 ITAPIRU, ZG-04 PINEYRO, ZG-06 LAS COLONIAS, ZG-07 LLAVALLOL, ZG-08 OBRANOR, ZG-09 ALTE.BROWN, ZG-10 COCA COLA, ZG-11 LA UNION, ZG-12 SPEGAZZINI, ZG-13 LUIS GUILLO, ZG-14 SAN JAVIER, ZG-15 ALMAFUERTE,			

	OBRAS REALIZADAS EN LAS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS NORTE, SUR y OESTE Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZON			
olano L	Construccion de nuevo recinto para la instalacion de un según transformador y garita de seguridad.	100%	
olano L	Instalacion de un segundo transformador de 13,2 Kv / 380 V e Instalacion de nuevas celdas de M.T y B.T	100%	
	Limpieza de tablero: Frecuencia trimestral	90%	
	ZV-14 CALCHAQUI, ZV-18 FERROVIARIO, ZV-19 LOS ALAMOS, ZV-20 NAVAL, ZV-21 SOCORRO, ZV-22 SOLANO LA FLORIDA, ZV-25 EZPELETA, ZV-62 SAN JORGE, ZV-64 RAMAL QUILMES NORTE, ZV-65 RAMAL QUILMES SUR, ZV-71 RIVADAVIA, ZV-73 PLANIFICADO, ZV-74 EL MOLINO, ZV-75 VILLEGAS, ZV-76 HERNANDARIAS, ZV-77 DEFENSA Y JUSTICIA, ZV-78 SENZABELLO, ZV-79 MONTEVERDE, ZV-80 PASCO ESTE, ZV-87 LAS PIEDRAS NORTE, ZV-91 RIO ATUEL.		
	Boyas: Frecuencia mensual	90%	
	ZV-14 CALCHAQUI, ZV-18 FERROVIARIO, ZV-19 LOS ALAMOS, ZV-20 NAVAL, ZV-21 SOCORRO, ZV-22 SOLANO LA FLORIDA, ZV-25 EZPELETA, ZV-62 SAN JORGE, ZV-64 RAMAL QUILMES NORTE, ZV-65 RAMAL QUILMES SUR, ZV-71 RIVADAVIA, ZV-73 PLANIFICADO, ZV-74 EL MOLINO, ZV-75 VILLEGAS, ZV-76 HERNANDARIAS, ZV-77 DEFENSA Y JUSTICIA, ZV-78 SENZABELLO, ZV-79 MONTEVERDE, ZV-80 PASCO ESTE, ZV-87 LAS PIEDRAS NORTE, ZV-91 RIO ATUEL.		
	Limpieza de canastos y Rejas: Frecuencias mensual	90%	
	ZV-14 CALCHAQUI, ZV-18 FERROVIARIO, ZV-19 LOS ALAMOS, ZV-20 NAVAL, ZV-21 SOCORRO, ZV-22 SOLANO LA FLORIDA, ZV-25 EZPELETA, ZV-62 SAN JORGE, ZV-64 RAMAL QUILMES NORTE, ZV-71 RIVADAVIA, ZV-73 PLANIFICADO, ZV-74 EL MOLINO, ZV-75 VILLEGAS, ZV-76 HERNANDARIAS, ZV-77 DEFENSA Y JUSTICIA, ZV-78 SENZABELLO, ZV-79 MONTEVERDE, ZV-80 PASCO ESTE, ZV-87 LAS PIEDRAS NORTE, ZV-91 RIO ATUEL.		
	Limpieza de cámara de Válvulas: Frecuencias Mensual	90%	
	ZV-14 CALCHAQUI, ZV-18 FERROVIARIO, ZV-19 LOS ALAMOS, ZV-20 NAVAL, ZV-21 SOCORRO, ZV-22 SOLANO LA FLORIDA, ZV-25 EZPELETA, ZV-62 SAN JORGE, ZV-64 RAMAL QUILMES NORTE, ZV-65 RAMAL QUILMES SUR, ZV-71 RIVADAVIA, ZV-73 PLANIFICADO, ZV-74 EL MOLINO, ZV-75 VILLEGAS, ZV-76 HERNANDARIAS, ZV-77 DEFENSA Y JUSTICIA, ZV-78 SENZABELLO, ZV-79 MONTEVERDE, ZV-80 PASCO ESTE, ZV-87 LAS PIEDRAS NORTE, ZV-91 RIO ATUEL.		
	Mantenimiento de Rejas: Cantidad-Frecuencias Mensual	90%	
	ZV-65 RAMAL QUILMES SUR		
	Mantenimiento de Cinta Transportadora Cantidad-Frecuencias Mensual	90%	
	ZV-65 RAMAL QUILMES SUR		
Control de funcionamiento:	ZV-14 CALCHAQUI, ZV-18 FERROVIARIO, ZV-19 LOS ALAMOS, ZV-20 NAVAL, ZV-21 SOCORRO, ZV-22 SOLANO LA FLORIDA, ZV-25 EZPELETA, ZV-62 SAN JORGE, ZV-64 RAMAL QUILMES NORTE, ZV-65 RAMAL QUILMES SUR, ZV-71 RIVADAVIA, ZV-73 PLANIFICADO, ZV-74 EL MOLINO, ZV-75 VILLEGAS, ZV-76 HERNANDARIAS, ZV-77 DEFENSA Y JUSTICIA, ZV-78 SENZABELLO, ZV-79 MONTEVERDE, ZV-80 PASCO ESTE, ZV-87 LAS PIEDRAS NORTE, ZV-91 RIO ATUEL.	85%	

	OBRAS REALIZADAS EN LAS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS NORTE, SUR y OESTE Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZONA EBC LAFERRERE			
OBRAS CIVILES			
ZF-04 San Alberto	Renovación e inodoros y codos en cámara húmeda	0%	Obra reprogramada para el año 2026
ZF-11 Morón	Recambio de tapas en mal estado	100%	(Ejecutado.las acciones prevista fueron relizadas y finalizadas durante el año 2025)
ZF-15 Tuyuti	Paredón perimetral	100%	La Construcion del paredon fue ejecutado en año 2025
ZF-16 Ibañes	Paredón perimetral	100%	La Construcion del paredon fue ejecutado en año 2025
OBRAS ELECTROMECANICAS			
ZF-01 Alas	Remplazo de cañería impulsión, retenciones, válvulas esclusas y asiento de electro bombas	100%	(Ejecutado.las acciones prevista fueron relizadas y finalizadas durante el año 2025)
ZF-06 El Bajo	Renovacion de impulsores, inserto, aro de la electro bomba 3356/735	100%	Se realiza en 2025 (Se realizo la renovacion impulsores, inserto, aro de la electro bomba 3356/735 por el personal)
ZF-05 EVITA	Renovacion de impulsores, inserto, aro de la electro bomba 3356/735	100%	Se realiza en 2025 (Se realizo la renovacion impulsores, inserto, aro de la electro bomba 3356/735 por el personal)
Control de funcionamiento: Frecuencia 2 veces por semana	EBC ZF-01 ALAS, EBC ZF-02 MUNICIPAL,EBC ZF-03 SARMIENTO, EBC ZF-04 SAN ALBERTO, EBC ZF-05 EVITA,EBC ZF-06 EL BAJO, EBC ZF-07 ALGARROBO, EBC ZF-08 VENEZUELA, EBC ZF-09 LA CANDELA, EBC ZF-10 LAFERRERE CENTRO, EBC ZF-11 LOS CEDROS, EBC ZF-12 MORON, EBC ZF-13 CASTELAR SUR, EBC 14 MORON, EBC ZF-15 TUYUTÍ, EBC ZF-16 IBAÑEZ.	80%	
INSTALACIONES			
	Limpieza de tablero: Frecuencia Trimestrall	75%	
EBC ZF-01 ALAS, EBC ZF-02 MUNICIPAL,EBC ZF-03 SARMIENTO, EBC ZF-04 SAN ALBERTO, EBC ZF-05 EVITA,EBC ZF-06 EL BAJO, EBC ZF-07 ALGARROBO, EBC ZF-08 VENEZUELA, EBC ZF-09 LA CANDELA, EBC ZF-10 LAFERRERE CENTRO, EBC ZF-11 LOS CEDROS, EBC ZF-12 MORON, EBC ZF-13 CASTELAR SUR, EBC 14 MORON, EBC ZF-15 TUYUTÍ, EBC ZF-16 IBAÑEZ.			
	Boyas: Frecuencia Semanal	80%	
EBC ZF-01 ALAS, EBC ZF-02 MUNICIPAL,EBC ZF-03 SARMIENTO, EBC ZF-04 SAN ALBERTO, EBC ZF-05 EVITA,EBC ZF-06 EL BAJO, EBC ZF-07 ALGARROBO, EBC ZF-08 VENEZUELA, EBC ZF-09 LA CANDELA, EBC ZF-10 LAFERRERE CENTRO, EBC ZF-11 LOS CEDROS, EBC ZF-12 MORON, EBC ZF-13 CASTELAR SUR, EBC 14 MORON, EBC ZF-15 TUYUTÍ, EBC ZF-16 IBAÑEZ.			
	Limpieza de canastos y Rejas: Frecuencias Quincenal	70%	
EBC ZF-01 ALAS, EBC ZF-02 MUNICIPAL,EBC ZF-03 SARMIENTO, EBC ZF-04 SAN ALBERTO, EBC ZF-05 EVITA,EBC ZF-06 EL BAJO, EBC ZF-07 ALGARROBO, EBC ZF-08 VENEZUELA, EBC ZF-09 LA CANDELA, EBC ZF-10 LAFERRERE CENTRO, EBC ZF-11 LOS CEDROS, EBC ZF-12 MORON, EBC ZF-13 CASTELAR SUR, EBC 14 MORON, EBC ZF-15 TUYUTÍ, EBC ZF-16 IBAÑEZ.			
	Limpieza de cámara de Válvulas: Frecuencias Mensual	75%	
EBC ZF-01 ALAS, EBC ZF-02 MUNICIPAL,EBC ZF-03 SARMIENTO, EBC ZF-04 SAN ALBERTO, EBC ZF-05 EVITA,EBC ZF-06 EL BAJO, EBC ZF-07 ALGARROBO, EBC ZF-08 VENEZUELA, EBC ZF-09 LA CANDELA, EBC ZF-10 LAFERRERE CENTRO, EBC ZF-11 LOS CEDROS, EBC ZF-12 MORON, EBC ZF-13 CASTELAR SUR, EBC 14 MORON, EBC ZF-15 TUYUTÍ, EBC ZF-16 IBAÑEZ.			
	Mantenimiento de Rejas: Cantidad-Frecuencias 3 Semanal	90%	
EBC ZF-06 EL BAJO, EBC ZF-15 TUYUTÍ, EBC ZF-16 IBAÑEZ.			
	Mantenimiento de Cinta Transportadora Cantidad-3 Semanal	90%	
EBC ZF-06 EL BAJO, EBC ZF-15 TUYUTÍ, EBC ZF-16 IBAÑEZ.			
	Otros: Pintura, corte de pasto, etc /Quincenal	80%	
EBC ZF-01 ALAS, EBC ZF-02 MUNICIPAL,EBC ZF-03 SARMIENTO, EBC ZF-04 SAN ALBERTO, EBC ZF-05 EVITA,EBC ZF-06 EL BAJO, EBC ZF-07 ALGARROBO, EBC ZF-08 VENEZUELA, EBC ZF-09 LA CANDELA, EBC ZF-10 LAFERRERE CENTRO, EBC ZF-11 LOS CEDROS, EBC ZF-12 MORON, EBC ZF-13 CASTELAR SUR, EBC 14 MORON, EBC ZF-15 TUYUTÍ, EBC ZF-16 IBAÑEZ.			

	OBRAS REALIZADAS EN LAS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS NORTE, SUR y OESTE Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZONA EBC OESTE			
OBRAS CIVILES			
BASE EBC OESTE- MERLO	Construcción de nuevo edificio.	21%	No hubo avance ya que no salió el proyecto de ampliación. La base operativa de EBCO se traslada a EBC Mendelsohn.
OBRAS ELECTROMECANICAS			
ZO-14 DOLORES	Instalación de nuevo tablero eléctrico	50%	Tablero en fabricación en TV
	Monitoreo remoto (TopKapi)	0%	Se cargará el programa y comunicación una vez instalado

	OBRAS REALIZADAS EN LAS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS NORTE, SUR y OESTE Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZONA EBC V.TESEI			
OBRAS CIVILES			
BASE EBC TESEI	Adecuacion de sectores para retiro de Contenedores	75%	Se adapto comedor, oficinas y pañol, falta ampliacion de pañol , colocacion de aberturas a comedor, modificaciones a vestuario principal. El proyecto seguira en ejecución en 2026.
OBRAS ELECTROMECANICAS			
ZT-08 De la Vega	Intalacion de interruptor y cableado de entrada para potencia de 90 KW	100%	
	Cambio de soportes y guias de electrobombas.	100%	
ZT-12 JUAN XXIII	Cambio de cañeria de impilsion de lineas 1 y 2 con pasamuros	100%	
ZT-14 Loma Hermosa	Cambio de tramo de cañeria de Impulsion y reparacion de Valvulas de lineas 1 y 2	100%	
ZT-26 CEDEM	Cambio de Impulsores a electrobombas 1 y 2	100%	
ZT-46 SAN MARTIN	Reparacion de puente de Grua en sector electrobombas	100%	
	Adecuacion de Tablero principal	20%	
	Configuracion de los variadores con PLC	60%	El proyecto seguira en ejecución en 2026.
ZT-30 LOMA HERMOSA 2	Configuracion de los variadores con PLC	40%	El proyecto seguira en ejecución en 2026.
	Revision y puesta en funcionamiento de caudalimetro	90%	El proyecto seguira en ejecución en 2026.
ZT-34 NUEVA ITUZAINGO	Configuracion de los variadores con PLC	60%	El proyecto seguira en ejecución en 2026.
	Revision y puesta en funcionamiento de caudalimetro	90%	El proyecto seguira en ejecución en 2026.
ZT-38 WILLIAN MORRIS	Reparacion y puesta en servicio de UPS 110 V	100%	
	Instalacion de variador de velocidad en linea 2	25%	El proyecto seguira en ejecución en 2026.
	Revision y puesta en funcionamiento de caudalimetro	90%	El proyecto seguira en ejecución en 2026.
INSTALACIONES			
	Limpieza de canastos y Rejas: Frecuencias Semanal		
ZT-07 CASEROS, ZT-08 DE LA VEGA, ZT-09 17 DE AGOSTO, ZT-10 PALOMAR, ZT-11 LA CAUTIVA, ZT-12 JUAN XXIII, ZT-14 LOMA HERMOSA,ZT-26 CEDEM, ZT-27 CHURRUCA, ZT-29 WILLIAN MORRIS, ZT-30 LOMA HERMOSA II, ZT-31 HURLINGHAM, ZT-33 HIPODROMO 1, ZT-34 NUEVA ITUZAINGO, ZT-37 VILLA TESEI, ZT-38 WILLIAN MORRIS 2, ZT-46 SAN MARTIN, ZT-54 HIPODROMO 2, ZT-67 DERQUI		50%	AL NO CONTAR CON HIDROGRUAS O PERSONAL SE CANCELO EN VARIAS OCACIONES.
	Regulacion de Boyas: Frecuencia mensual		
ZT-07 CASEROS, ZT-08 DE LA VEGA, ZT-09 17 DE AGOSTO, ZT-10 PALOMAR, ZT-11 LA CAUTIVA, ZT-12 JUAN XXIII, ZT-14 LOMA HERMOSA,ZT-26 CEDEM, ZT-27 CHURRUCA, ZT-29 WILLIAN MORRIS, ZT-30 LOMA HERMOSA II, ZT-31 HURLINGHAM, ZT-33 HIPODROMO 1, ZT-34 NUEVA ITUZAINGO, ZT-37 VILLA TESEI, ZT-38 WILLIAN MORRIS 2, ZT-46 SAN MARTIN, ZT-54 HIPODROMO 2, ZT-67 DERQUI		100%	
	Limpieza de tableros :frecuencia Bimestral		
ZT-07 CASEROS, ZT-08 DE LA VEGA, ZT-09 17 DE AGOSTO, ZT-10 PALOMAR, ZT-11 LA CAUTIVA, ZT-12 JUAN XXIII, ZT-14 LOMA HERMOSA,ZT-26 CEDEM, ZT-27 CHURRUCA, ZT-29 WILLIAN MORRIS, ZT-30 LOMA HERMOSA II, ZT-31 HURLINGHAM, ZT-33 HIPODROMO 1, ZT-34 NUEVA ITUZAINGO, ZT-37 VILLA TESEI, ZT-38 WILLIAN MORRIS 2, ZT-46 SAN MARTIN, ZT-54 HIPODROMO 2, ZT-67 DERQUI		70%	SE CANCELO EN VARIAS OCACIONES POR FALTA DE PERSONAL
	Mantenimiento de Rejas: Cantidad-Frecuencias Mensual		
ZT-29 WILLIAN MORRIS, ZT-30 LOMA HERMOSA II, ZT-31 HURLINGHAM,, ZT-34 NUEVA ITUZAINGO, ZT-37 VILLA TESEI, ZT-38 WILLIAN MORRIS 2, ZT-46 SAN MARTIN,		90%	SE CANCELO EN VARIAS OCACIONES POR FALTA DE PERSONAL
	Limpieza de camaras humeda y camara de valvulas		

	ZT-07 CASEROS, ZT-08 DE LA VEGA, ZT-09 17 DE AGOSTO, ZT-10 PALOMAR, ZT-11 LA CAUTIVA, ZT-12 JUAN XXIII, ZT-14 LOMA HERMOSA,ZT-26 CEDEM, ZT-27 CHURRUCA, ZT-29 WILLIAN MORRIS, ZT-30 LOMA HERMOSA II, ZT-31 HURLINGHAM, ZT-33 HIPODROMO 1, ZT-34 NUEVA ITUZAINGO, ZT-37 VILLA TESEI, ZT-38 WILLIAN MORRIS 2, ZT-46 SAN MARTIN, ZT-54 HIPODROMO 2, ZT-67 DERQUI	30%	AL NO CONTAR CON CAMION DESOBSTRUCTOR O PERSONAL SE CANCELO EN VARIAS OCACIONES.
Control de funcionamiento: Frecuencia Diaria	ZT-07 CASEROS, ZT-08 DE LA VEGA, ZT-09 17 DE AGOSTO, ZT-10 PALOMAR, ZT-11 LA CAUTIVA, ZT-12 JUAN XXIII, ZT-14 LOMA HERMOSA,ZT-26 CEDEM, ZT-27 CHURRUCA, ZT-29 WILLIAN MORRIS, ZT-30 LOMA HERMOSA II, ZT-31 HURLINGHAM, ZT-33 HIPODROMO 1, ZT-34 NUEVA ITUZAINGO, ZT-37 VILLA TESEI, ZT-38 WILLIAN MORRIS 2, ZT-46 SAN MARTIN, ZT-54 HIPODROMO 2, ZT-67 DERQUI	100%	

	OBRAS REALIZADAS EN LAS **DEPARTAMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS NORTE, SUR y OESTE** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03** / **exPL IA 16**

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZONA NORTE			
OBRAS CIVILES			
ZN-16 TOMKINSON 1	Revamping: Renovación integral de la EBC. (DAL). Se realizo apuntalamiento de techo de sala de tablero	20%	Se realizo relevamiento por parte de la DAL. Queda pendiente realizar el pliego de proyecto y la obra.
ZN-25 VICENTE LOPEZ	Revamping: Renovación integral de la EBC. (DAL)	15%	Se realizo relevamiento por parte de la DAL. Queda pendiente realizar el pliego de proyecto y la obra de revamping. No hubo avances por la situacion economica y de conocimiento de la empresa.
ZN-52 LAS TUNAS	Acondicionamiento de Sub-base (DAL) Se traslado fichero a ZN-53 Colector 1	30%	Proyecto dado de baja
ZN-53 COLECTOR 1	Reparaciones edilicias en gral (Dal)	20%	Se realizaron reparaciones edilicias en las instalaciones existentes el resto no se llevara a cabo por proyecto dado de baja
BASE EBC-NORTE	Reparación de calle interna de la base operativa (DAL)	15%	Se realizo relevamiento por parte de la DAL. No hubo avances por la situacion economica de la empresa. Obra en stand by
OBRAS ELECTROMECÁNICAS			
ZN-07 EB7	Reparacion/cambio de 3 cañeria de impulsion de camara humeda (proveedor externo)	33%	Realizar el cambio de la impulsion n°3 y4 con mano de obra EBC Norte
ZN-25 VICENTE LOPEZ	Colocacion de rejas y tablero de sistema de retencion de solido	50%	Resta colocacion de la misma con Personal De EBC Norte
	Revamping: Renovación integral de la EBC. (DAL)	15%	Se realizo relevamiento por parte de la DAL. Queda pendiente realizar el pliego de proyecto y la obra de revamping. No hubo avances.
ZN-53 COLECTOR 1	Contratación de reparación para actuador del sistema de rejas para retención de sólidos.	25%	Se efectuo Solicitud para PI 2026
	Cambio de valvula de DN 800	15%	En el corriente no se realizo la instalacion por razones operativas. Se programa colocación de la Valvula para el 2026
ZN-12 BAJO SAN ISIDRO			
	Renovacion de cañeria n°3 en camara humeda	100%	Tarea programada de EBC Norte, se adquirio bridas y cañeria
ZN-16 TOMKINSON 1	Revamping: Renovación integral de la EBC. (DAL) Realizada por EBC norte	70%	No se finalizo el trabajo por razones operativas. Fabricación e instalación de canastos y guias se traslado para el 2026
Según plan de mantenimiento	**Limpieza de tablero**	81%	
Según plan de mantenimiento	**Limpieza de sensores de nivel**	81%	
Según plan de mantenimiento	**Limpieza de canastos y Rejas**	80%	
Según plan de mantenimiento	**Limpieza de cámara de Válvulas**	85%	
Control de funcionamiento: Frecuencia Diaria	Todas las EBC´s de la zona de EBC-NORTE	82%	

	OBRAS REALIZADAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS CENTRO, NORTE, SUR Y OESTE NUEVA AREA Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16-17-18-19

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZONA NORTE			
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECÁNICAS			
INSTALACIONES			
ZN-49 FLENI	**Limpieza de tablero**	81%	La variacion del % se deben a que estas son tareas diarias programadas, Mantenimiento Preventivo y muchas veces se ven afectados por falta de vehiculos , personal o por las emergencias del dia a dia a las cuales se les da prioridad.
	Limpieza de sensores de nivel	81%	La variacion del % se deben a que estas son tareas diarias programadas, Mantenimiento Preventivo y muchas veces se ven afectados por falta de vehiculos , personal o por las emergencias del dia a dia a las cuales se les da prioridad.
	Limpieza de canastos y Rejas	80%	
	Limpieza de cámara de Válvulas	85%	
Control de funcionamiento: Frecuencia Diaria	**ZN-49 FLENI**	100%	

	OBRAS REALIZADAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS CENTRO, NORTE, SUR Y OESTE NUEVAS AREAS Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03 / exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZONA PILAR			
OBRAS CIVILES			
ZP - 1 E.B. Agustoni	Construccion y montaje de tablero de transferencia para grupo electrogeno	100%	Trabajo Finalizado.
ZP - 42 E.B. U.SAL.	Construccion y montaje de cerco perimetral	75%	Cerco construido, resta montaje debido a la falta de insumos (materiales de construccion) Año 2025 sin cambios.
OBRAS ELECTROMECANICAS			
ZP - 1 E.B. Agustoni	Renovación de cañerías y válvulas, dentro de cámara húmeda.	50%	Tarea a ralizar por EBC Pilar.
ZP - E.B. 21 SHABRAICA	Renovación de cañerías y válvulas, asiento de electrobomba, barras guías, y soporte superior dentro de cámara húmeda, para instalación de electrobomba Flygh.(a cargo de EBC Pilar)	10%	Tarea a ralizar por EBC Pilar.
ZP - E.B. 26 HIGHLAND	Instalacion de aparejo electrico de una tonelada (a cargo de EBC Pilar)	75%	Tarea a ralizar por EBC Pilar.
ZP - E.B. 30 LA MONTURA	Instalacion de aparejo electrico de una tonelada (a cargo de EBC Pilar)	10%	Tarea a ralizar por EBC Pilar.
ZP - E.B. 39 ALTOS DE CAMPO GRANDE	Renovación de cañerías y válvulas, asiento de electrobomba, barras guías, y soporte superior dentro de cámara húmeda, para instalación de electrobomba de mayor dimensión.(a cargo de EBC Pilar)	10%	Tarea a ralizar por EBC Pilar.
ZP - E.B. 40 LOS CAHORROS	Renovación de cañerías y válvulas, asiento de electrobomba, barras guías, y soporte superior dentro de cámara húmeda, para instalación de electrobomba de mayor dimensión.(a cargo de EBC Pilar)	10%	Tarea a ralizar por EBC Pilar.
ZP - E.B. 42 E.B. U.SAL.	Reparacion/cambio de cañeria de 1 impulsion, y valvula esclusa y de retencion (a cargo de EBC Pilar)	50%	Tarea a ralizar por EBC Pilar.
ZP - E.B. 49 VERDI 57	Renovación de cañerías y válvulas, asiento de electrobomba, barras guías, y soporte superior dentro de cámara húmeda, para instalación de electrobomba Flygh.(a cargo de EBC Pilar)	10%	Tarea a ralizar por EBC Pilar.
INSTALACIONES			
Según plan de mantenimiento	**Limpieza de tablero**	90%	
Según plan de mantenimiento	**Limpieza de sensores de nivel**	90%	
Según plan de mantenimiento	**Limpieza de canastos y Rejas**	90%	
Según plan de mantenimiento	**Limpieza de Camara de Aspiracion**	40%	**Camion en taller desde marzo 2023 - estamos trabajando con un camion Muleto. En tiempos determinados cuando hay disponibilidad desde Flota.**
Según plan de mantenimiento	**Limpieza de cámara de Válvulas**	90%	
Control de funcionamiento: Frecuencia Diaria	Todas las ebc de todas las zonas	80%	

	OBRAS REALIZADAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS CENTRO, NORTE, SUR Y OESTE NUEVAS AREAS Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03 / exPL IA 16-17-18-19

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2025
ZONA LAFERRERE			
OBRAS CIVILES			
INSTALACIONES			
	Limpieza de tablero: Frecuencia Mensual		
	Boyas: Frecuencia Quincenal		
	Limpieza de canastos y Rejas: Frecuencias Quincenal		
	Limpieza de cámara de Válvulas: Frecuencias Mensual		
	Mantenimiento de Rejas: Cantidad-Frecuencias Mensual		
	Mantenimiento de Cinta Transportadora Cantidad-Frecuencias Mensual		
Control de funcionamiento:			

	OBRAS REALIZADAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS CENTRO, NORTE, SUR Y OESTE NUEVAS AREAS Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
ZONA OESTE			
OBRAS CIVILES			
ZO-22 LOS BERROS EX ZC-54	Proyecto de Revamping Civil e Instalaciones	100%	La EBC fue recepcionada en Marzo del 2025 segun lo previsto
ZO-17-GABOTO	Cerramiento perimetral	20%	Continuan las gestiones con la DAL para su instalación se prevé que para el 2026 esté realizado.
BASE EBC-ZO	Trabajos Edilicios de acondicionamiento de las EBC (todas) y base operativa solicitados a SOL (Pintura, Hormigón en playas de trabajo, luminarias, aberturas, reparación de grupos eléctrógenos, cerramientos perimetrales, etc)	80%	El proyecto seguirá en ejecución en 2026 dado que son trabajos en paralelo para varias EBCs
OBRAS ELECTROMECANICAS			
ZO-22 LOS BERROS EX ZC-54	Proyecto de Revamping Civil e Instalaciones	90%	Restan trabajos de reparación de rejas automaticas
ZO N°17 GABOTO	Fabricacion de estructura para aparejo, (falta colocar)	70%	Trabajo reprogramado para este año por baja de personal por PRV y disminución de flota de vehiculos.
	Colocacion de estructura para polipasto	20%	Trabajo reprogramado para este año por baja de personal por PRV y disminución de flota de vehiculos.
ZO-03 ARGENTINA	Reparación integral de reja.	70%	Se realizaron trabajos de reparación en los equipos. La readecuación total está sujeto a la aprobación del PI 2026
ZO-07 CIPOLLETTI	Reparación integral de reja de desbaste.	0%	Sujeto a la aprobación del PI 2026
ZO-02 BARKER	Reparación integral de reja.	0%	Sujeto a la aprobación del PI 2026
INSTALACIONES			
Según plan de mantenimiento	Limpieza de tablero	85%	
Según plan de mantenimiento	Limpieza de sensores de nivel	78%	
Según plan de mantenimiento	Limpieza de canastos y Rejas	73%	
Según plan de mantenimiento	Limpieza de cámara de Válvulas	85%	
Control de funcionamiento: Frecuencia Diaria	Todas las ebc Según programacion mensual	97%	

	OBRAS REALIZADAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS CENTRO, NORTE, SUR Y OESTE NUEVAS AREAS Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
		29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03	exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2025
ZONA CENTRO			
OBRAS CIVILES			
OBRAS ELECTROMECANICAS			
INSTALACIONES			
Control de funcionamiento: Frecuencia Diaria			

	OBRAS REALIZADAS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZONAS CENTRO, NORTE, SUR Y OESTE NUEVAS AREAS Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 29 ex PL 16 17 18 IAT1-O-S-TRA-EB 03 / exPL IA 16

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	6Perspectivas para el Año 2026
ZONA LUIS GUILLON			
OBRAS CIVILES			
ZG-18 RUCCI	Renovación integral de la EBC (revamping).	40%	Obra totalmente en pausa
OBRAS ELECTROMECANICAS			
ZG-18 RUCCI	Renovación integral de la EBC (revamping).	40%	Obra totalmente en pausa
INSTALACIONES			
	Limpieza de tablero: Frecuencia Trimestral	90%	
ZG-26 SANTA ELENA, ZG18 RUCCI, ZG-19 LA YAYA, ZG-26 AMERICA UNIDA, ZG-29 PARQUE AMERICANO			
	Boyas: Frecuencia Mensual	95%	
ZG-26 SANTA ELENA, ZG18 RUCCI, ZG-19 LA YAYA, ZG-26 AMERICA UNIDA, ZG-29 PARQUE AMERICANO			
	Limpieza de canastos y Rejas: Frecuencias Mensual	90%	
ZG-26 SANTA ELENA, ZG18 RUCCI, ZG-19 LA YAYA, ZG-26 AMERICA UNIDA, ZG-29 PARQUE AMERICANO			
	Limpieza de cámara de Válvulas: Frecuencias Mensual	95%	
ZG-26 SANTA ELENA, ZG18 RUCCI, ZG-19 LA YAYA, ZG-26 AMERICA UNIDA, ZG-29 PARQUE AMERICANO			
	Mantenimiento de Rejas: Cantidad-Frecuencias Mensual		
	Mantenimiento de Cinta Transportadora Cantidad-Frecuencias Mensual		
Control de funcionamiento: Frecuencia Diaria	ZG-26 SANTA ELENA, ZG18 RUCCI, ZG-19 LA YAYA, ZG-26 AMERICA UNIDA, ZG-29 PARQUE AMERICANO	65%	

aysa	**OBRAS REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO BERAZATEGUI** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-S-TRA-EB 01**

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Comentarios / Perspectivas para el Año 2026
OBRAS CIVILES	La recepción provisoria de la planta fue realizada en el mes de Dic-2015. Las obras que se están ejecutando corresponden a las incluidas en las tareas de la UTE. Pendiente la firma de la recepción definitiva.		
	Colocación de muro perimetral y portones de acceso	**96%**	Sin avance durante el 2025 por el Proveedor a cargo de la DAL.
	Construcción de nuevo Emisario sub fluvial	**10%**	Obra Emisario Suspendida
	Construccion de nueva Estacion de Bombeo de Salida	**20%**	Obra Estacion de Bombeo de Salida Suspendida
	Contrucción del nuevo pañol.	**100%**	
			Adquisicion e instalacion de Puente Grua 10Tn solicitado en el PI2026
			Reparacion Integral Canal Central.
			Reparacion de baños y vestuarios de Planta
OBRAS ELECTROMECÁNICAS	Iluminación exterior de Planta	**85%**	A la fecha continuamos con faltantes de insumos.
	Construcción y montaje de reductores (repuestos originales de SEW) con sistema de refrigeración aire/aceite.	**75%**	Reparacion Integral de Reductores Para Tornillos de Arquimedes Sala de Maquinas
	Reparación del puente grúa del sector cámara By-Pass.	**85%**	El Puente Grúa no fue reparado en su totalidad durante el 2025, por parte del sector PG de talleres Varela. A la espera de finalizacion del trabajo
	Restauracion de 12 Puentes Barredores	**40%**	**Restauracion de 4 Puentes Barredores (Requiere aprobacion del PI2026)**
	Provisión e instalación de tapas y contratapas en distintos sectores de la planta	**80%**	El 20% restante de las tapas tiene dañado el hormigon donde va el marco y contramarco , se analizara la Direccion de Ingenieria el remplazo durante la obra de reparacion del Hormigon.
			Cambio/reparacion de iluminacion de las 4 Islas de Desarenado.
			Reparacion de 4 Tamices
			Reparacion Compuertas Hidraulicas By Pass.
INSTALACIONES	Readecuación de tableros y sistema de automatismo de las rejas automáticas de 20mm.	**80%**	Instalar 2 Equipos nuevos de circulacion y enfriamiento de aceite a los Reductores de Tornillos de Arquimedes.

	OBRAS REALIZADAS EN LA	**Informe Anual**	
	PLANTA DEPURADORA LANUS	**Año 2025**	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	**IAT1-O-S-PRO-PDL 01**	**exPL IA Nº 21**

Descripción		Tareas Realizadas	AVANCE %	Perspectivas para el Año 2026
PRETRATAMIENTO	Fosa de Gruesos			
	Estacion de bombeo de liquidos crudos			
	Rejas finas			
	Desarenado/Desengrasado			
	Desarenado/Desengrasado			
	Tratamiento de arenas			
TRATAMIENTO BIOLOGICO Y SECUNDARIO	Reactores biologicos - Equipartidora			
		Reparación de 3 aireadores y dos agitadores	100%	
TRATAMIENTO DE BARROS	Bombas de lodos espesados	Se realizó la reparación (fabricación de codo + brida) de la bomba de lodos excedentes A	100%	
	Espesador			
	Almacenadores de lodos espesados	Se realiaron tareas de limpieza de arena depositada en el fondo almacenador ALMA 501 B.	100%	
	Bombas de lodos a Decantadoras			
	Espesadores de lodos			
	Deshidratacion	Repación del tambor de la decantadora Centrifuga A, en los talleres de a empresa GEA	80%	Se recibió el tambor balanceado en las pruebas la máquina presentó fallas electricas. GEA se encuentra trabajando para corregirlo.
		instalación 3° centrífuga.	10%	Se espera poner la unidad en servicio.
DEPOSITOS, OFICINAS Y PARQUES	General	Reemplazo de bomba Wilo de agua industrial + purga de tanque cisterna.	100%	
	Laboratorio de Planta			

OBRAS REALIZADAS
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES ESCOBAR
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025
Planilla IA Nº 21

ITEM	DESCRIPCIÓN		TAREAS REALIZADAS	AVANCE (%)	COMENTARIOS	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2026
1	**Pretatamiento**	**Rejas**	Provisión e instalación de rejas automáticas	90%	Si bien las rejas están instaladas, su funcionamiento es inestable. El contratista concurre semanalmente a demanda de la PDE cuando estas presentan problemas o dejan de funcionar.	El contratista debe lograr que las rejas funcionen correctamente, y no presenten inestabilidad al funcionamiento. Deben trabajar en forma semi-automaticas.
		Estacion de bombeo de liquidos crudos	Se instaló una tercera bomba en modo achique.		El caudal se ha incrementado hasta los 9.000 m^3/d aproximadamente. Se han realizado 2.000 conexiones nuevas en la ciudad.	La bomba de achique (Flygt 3102) actual será reemplazada por otra de mayor caudal (Flygt 3153)
2	**Tratamiento biologico: Tanque Imhoff**		Se remplazó el colector eléctrico trifásico			
3	**Lecho Percolador**		No se registraron obras ni mejoras, solo se ejecutaron tareas de mantenimiento			
4	**Clarificador secundario**		Se remplazó el colector eléctrico trifásico.	100%	Se reemplazo para cumplir con lo solicitado por H&S, el nuevo tiene conexión a tierra.	
5	**Deshidratación**	**Playas de Secado de Lodos**	Reconstrucción de Playas de Secado desde la N°1 a N°6	90%	El proveedor dio por terminada la obra.	
6	**Laboratorio de Planta**		Se repararon las cortinas de madera.	100%		
7	**General**	**General de Planta**	Se comenzó a reparar el Portón de Ingreso.	15%	En enero del 2025 se desactivó. Se lo va a transformar en corredizo dado que las columnas de hormigón están fisuradas y cedieron. Actualmente se utiliza el de Almafuerte 1170	Contar nuevamente con el portón de ingreso a la brevedad.
		Mantenimiento	No se registraron obras ni mejoras.			

OBRAS REALIZADAS
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES FERRARI

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025

Planilla IA Nº 21

ITEM	DESCRIPCIÓN		TAREAS REALIZADAS	AVANCE (%)	COMENTARIOS	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2026
1	Pretratamiento:	Fosa de gruesos	Solo se realizaron trabajos de mejora preventiva y correctiva con personal de planta. Se reemplazaron Barandas, se reemplazaron cadenas de rejas.	100%		
			Se realizaron modificaciones en compuerta de ingreso por personal de planta y T.V, para colocacion de actuador, trabajo finalizado actuador en servicio.	100%	Adecuación de puente grua, finalizado por personal de planta, adquisicion de aparejo electrico por PI 2025, finalizado colocacion por personal de planta.(OC 79931)	PI 2026 Remplazo de codos de carga de bombas de elevación.
		Estación de bombeo de líquidos crudos	PREVENTIVA:Se verifica consumo electrico de bomba de elevacion N°1-2-3-4-5.	90%	Avance se encuentra bajo .PI 2025 CP 64661	Instalar 2 caudalimetros para completar 5 de 5 .PI 2025.
			CORRECTIVA: Se realiza reparacion de cañeria de bombas de elevacion por fisura de la misma.	90%		
		Tratamiento de grasas	No se registraron obras, si se realizó sistema de extracción , se colocó compactadora. Se realizó mejora y disminución de lixiviados.	100%	Adecuación e instalación de extraccion de grasas. Realizado por personal de planta debido a caida del PI 2025	
			Fabricacion y colocación de reja manual de extracción (trabajo finalizado por personal de planta.	100%	Adecuación e instalación de extraccion de grasas. Realizado por personal de planta debido a caida del PI 2025	
			Se adecuo sector barandas, reparaciones y modificaciones, trabajo finalixzado por personal de planta .	100%		
2	Tratamiento biológico: Reactores Biológicos Orbitales		PREVENTIVO:Se realizaron trabajos por personal de planta cambio de kit propela y limpieza de filtros.	100%	OC 75219 adecuación y construcción de escaleras en general de planta, cumplida en un 70%	concretar la finalización del 30% restante PI2025, se paso a PI 2026.
			CORRECTIVO: se realizo trabajo de reparacion integral bajo la (OC 78912 , trabajo realizado por Servicio Total).	100%		
3	Clarificadores secundarios	Estación de bombeo	PREVENTIVO: Control de consumo electrico.	100%	Gestion de recambio de pisos por prfv.	PI 2025, CP 64889 - RC 100137
			CORRECTIVO:Cambio de impulsor de liquido.	50%		
		Clarificadores secundarios	CORRECTIVO: Se realiza cambio de rueda conducida de puente barredor A ya que la misma se encontraba con vulcanizado despegado.	100%	Gestion de reparacion integral de pantallas y vertederos para 2026	PI 2026 Gestion de reparacion integral de pantallas y vertederos
			PREVENTIVO:Se verifica consumo electrico de motor de puente barredor.	100%		
4	Deshidratación	Decantadoras centrifugas	Instalación de Nuevos equipos de deshidratación.	79%	Inicio de obra 25/08/2025. (OC 79087 % de Avance Adic. OC FERRARI avance de un 95,00%)	Concretar la instalación de equipos nuevos. Son tornillos prensa (OC 71512 B).
		Espesadores de lodos	Incorporacion de valvula para drenaje	100%	adecuación y construcción de escalera	PI 2026 Remplazo de codos de carga de bombas de elevación.
		Bombas de lodos espesados	PREVENTIVOS:Se realiza desarme para limpieza y lubricacion por obstruccion de estopa.		Inicio de obra 25/08/2025. (OC 79087 % de Avance Adic. OC FERRARI avance de un 95,00%)	Concretar la instalación de equipos nuevos. Sistema de bombeo (OC 71512 B) .
			CORRECTIVO: Se realiza cambio de rotor y estator por desgaste de bomba de lodos N°1.	80%		
		Almacenadores de lodos espesados	PREVENTIVO: limpieza y consumo electrico de agitadores.	100%	Asociadas a la OC 71512.Inicio de obra 25/08/2025. (OC	Concretar la instalación de equipos nuevos. Sistema de bombeo (OC 71512 B) . Se gestiono

	OBRAS REALIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES FERRARI Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025					Informe Anual Año 2025 Planilla IA Nº 21
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**TAREAS REALIZADAS**	**AVANCE (%)**	**COMENTARIOS**	**PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2026**
		Almacenadores de lodos espesados	CORRECTIVO: Cambio de agitador N°1 de almacenador B por quemado de bobinado electrico.	79%	79087 % de Avance Adic. OC FERRARI avance de un 95,00%)	Sistema de bombeo (OC 71512 B). Se gestiono para PI2026 cambio de valvula de purga.
		Bombas de lodos a Decantadoras	PREVENTIVAS: Cambio y control de nivel de aceite de motoreductor de bomba de lodos N°2.	100%	Asociadas a la OC 71512.Inicio de obra 25/08/2025. (OC 79087 % de Avance Adic. OC FERRARI avance de un 95,00%)	Concretar la instalación de equipos nuevos. Sistema de bombeo (OC 71512 B).
			CORRECTIVO: : Se realiza cambio de rotor y estator por desgaste de bomba de lodos N°2.	79%		
5	**Laboratorio de Planta**		CORRECTIVO:Se instalo lavadora para instrumentos de laboratorio.	100%	Se gestiona adquisicion de equipamiento y adecuación de mesada de trabajos para insumos peligrosos	Se gestiona continuidad de la adquisisión por PI 2026
			PREVENTIVO: Cambio y control de aceite de bomba de vacio.	100%		
6	**General**	**General de planta**	Gestion de actuadores de compuertas de tren desarenado en proceso , trabajos realizado por personal de planta y T.V.	50%	Mecanizado de actuadores por T.V TOTAL,4, realizado 2.	PI 2025 colocacion de actuadores sumado a la adquisicion de nuevo actuador para nueva compuerta de ingreso Cumplido un 30.(6727154: Mecanizado de tuerca para actuador de Pta. Ferrari

OBRAS REALIZADAS
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES GARIN
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025
Planilla IA Nº 21

ITEM	DESCRIPCIÓN		TAREAS REALIZADAS	AVANCE (%)	COMENTARIOS	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2026
1	Pretatamiento	Fosa de gruesos	Provisión e instalación de rejas automáticas	90%	Se colocaron las Rejas en el sector pero aún resta terminar con la instalación y con la programación del equipo.	Se espera respuesta de contratista para terminar la conexión del equipo (no las hubo durante 2025)
		Estacion de bombeo de liquidos crudos	Se instalaron las bombas de elevación (Flygt 3102) en cámara húmeda, 2 bombas con sus respectivos variadores de velocidad.	100%	Durante el mes de mayo se instalaron y desde entonces funcionan bien.	
2	Tratamiento biologico: Reactor Biologico tipo Carrusel		Se reemplazaron los 2 FlowJet por 2 Equipos Tornado (Agistación + Aireación)	90%	Restan hacer modificaciones en el tablero eléctrico y en la estructura de acero que los soporta. Se debe reubica el sensor de oxígeno disuelto.	Durante el primer trimestre se espera el final de la instalación.
3	Clarificador secundario		No se realizaron obras en este sector			Se proyecta instalar 1 bomba Flygt 3102 montadas en el carro de traslación. Con Variador de velocidad y Válvula para ajustar el caudal según demanda
4	Deshidratacion		No se realizaron obras en este sector			
5	Laboratorio de Planta		No se realizaron obras en este sector			
6	General	Vestuario	Se cambió el Vestuario	100%	Se renovó el contenedor completo. Tarea llevada a cabo por la DAL.	
		General de planta	Se instalaron los caudalímetros que estaban proyectados	100%	Estos trabajos fueron realizados por personal subcontratado por Meditecna	

OBRAS REALIZADAS
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES CATONAS
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025
Planilla IA Nº 21

ITEM	DESCRIPCIÓN		TAREAS REALIZADAS	AVANCE (%)	COMENTARIOS	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2026
1	Pretatamiento:	Fosa de gruesos	No se registraron obras ni mejoras, solo se ejecutaron tareas de mantenimiento			
		Estacion de bombeo de liquidos crudos	No se registraron obras ni mejoras, solo se ejecutaron tareas de mantenimiento.			Modificación de riel para instalación de aparejo eléctrico para extracción de bombas de elevación
			Cambio de unidad exterior de equipo aire acondicionado para refrigeración de sala de tableros TS1.	100%	Se cambio por medio de DAL la unidad exterior del AC, para refrigeración de los tableros.	
			Cambio e instalación de variador de velocidad en Bomba de Elevación N°1	100%	Se cambio e instalo variador nuevo por falla en el antiguo. El variador antiguo se reparó por TV.	
		Tratamiento de grasas y arenas	Cambio e instalación de variador de velocidad en soplante Repicky N°2	100%	Se cambio e instalo variador nuevo por falla en el antiguo. El variador antiguo se envio a reparar a TV, aún no fue entregado.	
			Se envio proyecto de inversión por la construcción de drenajes y lixiviados	10%	Se licito proyecto y aprobo OC 80164	Ejecutar OC 80164
2	Tratamiento biologico: Reactores Biologicos orbitales		Se repararon 7 equipos aireadores tornados bajo las OC 78215 Y 78912	100%	La OC 78912 fue ejecutada por proveedor exterior, y la OC 78215 fue por la adquisición de repuestos a fin de reparar los equipos con personal de mantenimiento	
3	Clarificadores secundarios	Estacion de bombeo	Se envio proyecto de inversión por la instalación de caudalimetro de retornos.	10%	El proyecto se encuentra en licitación CP 64661	Aprobación y ejecución de OC
		Clarificadores secundarios	Nivelación de vertederos	60%	No se pudo finalizar con la nivelación de vertederos debido a que en los clarificadores N°2 Y N°3, la goma de sello entre el hormigón y el vertedero se encuentra dañada. Se incluyo en el PI 2026 el cambio de las mismas.	Aprobación y ejecución de item del PI 2026
			Instalación de pistas de clarificadores.	100%	Se finalizaron los trabajos de instalación de pistas en los clarificadores N°2 Y N°3.	
			Se envio proyecto de inversión por la reparación de la carpeta del sedimentador N°1	10%	El proyecto se encuentra en compras central, a la espera de aprobación de pliego para licitarse.	Aprobación y ejecución de OC
4	Deshidratacion	Filtros prensa	Instalacion de Nuevos equipos de deshidratacion.	75%	La OC 71512 se encuentra avanzada, los equipos y materiales se encuentran en planta; esta en plena ejecución de instalación. Asi mismo la OC 79087 se encuentra avanzada en un 95%	Finalizar obra y colocar equipos en servicio
		Filtro de banda	Mantenimiento completo de equipos.	100%	Se realizó mantenimiento completo a los 2 filtros de banda, la cual incluyo: mantenimiento de bandas filtrantes, transmisición (cadena, corona y piñones), rodillo de zona DS, rascadores inferiores y superiores, y palpadores de corrección de banda	
		Espesadores de lodos	No se registraron obras ni mejoras, solo se ejecutaron tareas de mantenimiento			
		Bombas de lodos espesados	Instalación de una tercera bomba de lodos.	35%	No se finalizo la instalación de la tercer bomba debido a falta de materiales, se esta gestionando los mismo en los depósitos de la DPYE	Finalizar instalación completa
			Reparación de bombas de lodos espesados. O 78120 repuestos	100%	Se repararón bombas de cavidad progresiva con personal de mantenimiento. Se cambiaron sellos, eje cardanico, rotor, estator y muelle de sujeción.	
		Almacenadores de lodos espesados	No se registraron obras ni mejoras, solo se ejecutaron tareas de mantenimiento			
		Bombas de agua	No se registraron obras ni mejoras, solo se ejecutaron tareas de mantenimiento			
		Bombas de lodos a Decantadoras	No se registraron obras ni mejoras, solo se ejecutaron tareas de mantenimiento			
5	Laboratorio de Planta		Reparación de filtraciones de agua	100%	Se realizó pintura de techo con membrana liquida para reparación del filtraciones de agua en el sector.	

OBRAS REALIZADAS
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES CATONAS
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025
Planilla IA Nº 21

ITEM	DESCRIPCIÓN		TAREAS REALIZADAS	AVANCE (%)	COMENTARIOS	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2026
6	General	General de planta	Obra de Ampliacion de Planta. Cambio de tipo de Proceso. OC 70209	10%	La obra se encuentra paralizada, en gestión de recisión de contrato por la dirección de transforanción de obras.	
		General de planta	Se envio proyecto de inversión por la contrucción de 3 freatimetros	10%	Se licito proyecto, se encuentra pendiente la aprobación de la OC.	Aprobación y ejecución de OC
		General de planta	Instalación de red corporativa. Zona industrial	100%	Se realizó instalación de rack y swich para comunicación de top-kapy. Se instalaron 2 pc nuevas para Funcionamiento y para Deshidratacióin, y 2 pc para el rack con UPS rackeable	
		General de planta	Instalación de red corporativa. Zona administrativa	100%	Se realizó instalación de rack y swich para comunicación de edificio adminisitrativo, e instalación 2 pc para el rack con UPS rackeable	

OBRAS REALIZADAS

EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES FIORITO

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

Planilla IA Nº 21

ITEM	DESCRIPCIÓN		TAREAS REALIZADAS	AVANCE (%)	COMENTARIOS	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2026
1	Pretatamiento	Fosa de gruesos				Se espera para el 2026 que las redes secundarias estén terminadas y las conexiones se realicen, aumentando el caudal al 50% del caudal nominal de planta.
		Estacion de bombeo de liquidos crudos				
		Tratamiento de grasas				
2	Tratamiento primario	Sedimentadores primarios				
3	Tratamiento biológico.	Tanques de aireación.				
4	Clarificadores secundarios	Estación de bombeo				
		Clarificadores secundarios				
5	Deshidratación	Decantadoras Centrífugas	Reparacion HMI de ambas decanter	100%		Se espera el mantenimiento integral de ambas decanter
		Espesadores de lodos				
		Bombas de lodos espesados				
		Almacenadores de lodos espesados	Se vacio y limpio la segunda mitad del almacenador	100%		
		Bombas de lodos a Decantadoras				
6	Laboratorio de Planta					
7	General	General de planta	Instalacion de agua de reuso	50%		
			se repara tanque de agua industrial	100%		
		Mantenimiento	Mantenimiento integral de sopladores	100%		

aysa	**OBRAS REALIZADAS EN LA** **PLANTA DEPURADORA BELLA VISTA** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**		**Informe Anual** **Año 2025** **IAT1-O-S-PRO-PDBV 01** | **exPL IA Nº 23**

Descripción	Tareas Realizadas	AVANCE %	Comentarios	Perspectivas para el Año 2025
PRETRATAMIENTO				
Reemplazo de cintas transportadoras finas y gruesas	Se realizó el RC y se obtuvo la OC76280	90%	Se realizó extensión de fecha de entrega	Poder contar con los equipos e instalarlos en su respectivo lugar, dedido a que en 2024 no se adquirieron.
ELEVACION				
Adquisición de los dados de bronce de las válvulas de los desarenadores	Se realizó RC 406332 para la fabricación de los repuestos.	15%	C está a la espera de aprobación, se reitera p	Poder tener la OC y los repuestos para la puesta en funcionamiento automatica
TRATAMIENTO BIOLOGICO				
CLARIFICACION				
recambio de rodamientos y verificación de pista de conexión elécrica	Se comenzó con el pivote central del clarificador N°3, reemplazo de rodamientos y verificación de pista de conexión de 380v	33%	En el 2026 se realizará el mismo trabajo en los Clarificadores N°1 y N°2	
LINEA DE BARROS				
Reparar variadores de velocidad de las centrífugas	Se realiza solicitud de RC para la mismas	100%	Se repararon ambos variadores quedando los equipos en funcionamiento normal	Emisión de la OC
Reparar bomba de lodos N°2 de EB13 y N°2 EB12	Se emite la OC 77837 para la N°2 EB13	50%	En espera de aprobación de la OC.	Emisión de la OC para la N°2 EB12
INSTALACION ELECTRICA				
DEPOSITOS, OFICINAS Y PARQUES	DAL realizó relevamiento y planimetría del sector	30%	No se recibieron novedades por parte de la DAL para el avance del trabajo.	

1.3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 / exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
NA70237	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MARTÍN SMA-DMA009A	El objetivo de la obra es implementar una DMA y renovar las cañerías distribuidoras en distrito San Martín, como parte de los planes de sectorización y de mejora y mantenimiento, lo que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y falta de optimización y ponerla a disposición del sistema de la EE Villa Devoto. En particular, la obra permitiría recuperar 1948 m3/d, equivalentes a abastecer a 4328 habitantes (a dotación de diseño: 450 l/hab.día). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de HF y AC reduciéndose su proporción existente en la concesión, y continúa el plan de mejora iniciado con las obras de Villa Progreso. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 12.267 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 5.023 m con sus correspondientes accesorios	06/12/2023	-	100,0%	0,0%	Obra en análisis de continuidad.
NA70084	RED PRIMARIA DE AGUA MAQUINISTA SAVIO 1 NA70084 RED PRIMARIA DE AGUA MATHEU	El objetivo de las obras es la ejecución de redes primarias de agua que permitirán el abastecimiento de la zona denominada "Matheu" en el partido de Escobar. Las obras comprenden el tendido de las siguientes Cañerías y Accesorios: - 576 metros de cañería de PVC Clase 10 DN 225 mm - 579 metros de cañería de PVC Clase 10 DN 315 mm El objetivo de las obras es la ejecución de redes primarias de agua que permitirán el abastecimiento de la zona denominada "Maquinista Savio 1" en el partido de Escobar. Las obras comprenden el tendido de las siguientes Cañerías y Accesorios: - 736 metros de cañería de PVC Clase 10 DN 315 mm - 87 metros de cañería de FD K7 DN 400 mm - 794 metros de cañería de PVC Clase 10 DN 355 mm - Instalación de 7 valvulas de aire, 8 cámaras de desagüe y 2 empalmes.	01/11/2023	26/12/2023	100,0%	16,0%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SA70321	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA AI VR GONNET - EE QUILMES - AVE - DMA025	El objetivo de la Obra es Implementar áreas hidráulicas sectorizadas para las válvulas reguladoras y la renovación de cañerías distribuidoras en el área de Avellaneda, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá un mayor control del abastecimiento en la zona y recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla a disposición del sistema y hacer seguimiento y control de parámetros hidráulicos. En particular la obra permitiría recuperar 2.640 m³/d, equivalente a abastecer 5800 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d) y sectorizar el área de influencia de la válvula Reguladora Gonnet del sistema EB Quilmes. Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC y HF, reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 20.697 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 110 mm, longitud aproximada 65 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 856 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 6.085 m con sus correspondientes accesorios Total: 27.703 mts	17/10/2023	-	100,0%	0,0%	Obra en análisis de curso de acción.
VC70022	RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 2 – DRO	El objetivo es la ampliación de la red cloacal sobre distintas calles dentro del radio servido que carecen del servicio. Características Físicas de la Obra: Distrito La Matanza Norte: □ Instalación en zanja de 1.293 m de cañería cloacal de DN 200 mm de Poli cloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. □ Ejecución de Conexiones Cortas. Cantidad (49) □ Ejecución de Conexiones Largas. Cantidad (6) Distrito La Matanza Sur: □ Instalación en zanja de 1.691 m de cañería cloacal de DN 200 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. □ Ejecución de Conexiones Cortas. Cantidad (45) □ Ejecución de Conexiones Largas. Cantidad (5) □ Ejecución de Conexiones Domiciliares, con corte y retiro de conexiones existentes. □ Cortas. Cantidad (44) Distrito Merlo: □ Instalación en zanja de 549 m de cañería cloacal de DN 200 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. □ Ejecución de Conexiones Cortas. Cantidad (29) □ Ejecución de Conexiones Largas. Cantidad (17) Distrito Tres de Febrero: □ Instalación en zanja de 2.251 m de cañería cloacal de DN 200 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. □ Ejecución de Conexiones Cortas. Cantidad (114) □ Ejecución de Conexiones Largas. Cantidad (20) Ejecución de Conexiones domiciliares, con corte y retiro de conexiones existentes. □ Cortas. Cantidad (6) □ Largas. Cantidad (5) Distrito Moreno: □ Instalación en zanja de 4.249 m de cañería cloacal de DN 200 mm de Policloruro de Vinilo pared	11/09/2023	29/08/2024	100,0%	20,8%	Obra en análisis de continuidad.
VA70050	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 2 - DRSE-FLV-QUI	El presente concurso tiene por objeto contratar la ejecución de las obras que permitan efectuar los cierres de malla correspondientes. Las obras se realizarán mediante la renovación y/o instalación de cañerías de PVC en zanja. Las obras se encuentran distribuidas entre los Distritos Florencio Varela y Quilmes, correspondientes a la Dirección Regional Sudeste. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PVC, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 4.470 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por calzada de cañería de PVC, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 152 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PVC, PN10, DN 110 mm, longitud aproximada 1.081 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PVC, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 405 m con sus correspondientes accesorios.	14/08/2023	-	100,0%	0,0%	Obra en análisis de continuidad.
NC70221	RED PRIMARIA CLOACAL BARRIO VILLA LA CAVA	El presente concurso tiene por objeto la ejecución de la obra de desagüe cloacal Red Primaria Cloacal Barrio Villa La Cava, en el Partido de San Isidro. La obra a ejecutar consiste en: * Construcción de 5 mts de cañería cloacal DN 200mm. PVC SN8, 65 metros de cañería DN 315mm PVC SN8, 130 mts de cañería DN 315 mm PVC SN32, 787 mts de cañería DN 400mm SN32 en profundidades variables, limitada por las restricciones que impone el diseño hidraulico de las conducciones a gravedad y las interferencias presentes en el lugar. * Construcción de 13 bocas de registro (BR). * Ejecución de empalme con cañeria existente DN500 mm. en Posadas y Av. Rolon.	07/07/2023	02/01/2024	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
SC70127	RED SECUNDARIA CLAOCAL VÉTERE 1	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Red Secundaria Cloacal Vetere 1", ubicada en el Partido de Lomas de Zamora. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red secundaria *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●34.062m de DN200mm de Rigidez Nominal SN8 de pared compacta ●213m de DN315mm de Rigidez Nominal SN8 de pared compacta ●499m de DN315mm de Rigidez Nominal SN32 de pared compacta *Construcción de 309 bocas de registro y 66 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 2.188 cortas y 1.017 largas. *Ejecución de 1 cruce de pluvial. *Ejecución de 6 empalmes en DN200 a BR proyectadas pertenecientes a la Red Primaria Cloacal Colector Banfield-Centenario. Red primaria *Instalación de 777m de cañería colectora cloacal de PVC DN400mm y Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. *Ejecución de 8 bocas de registro. *Ejecución de 1 empalme en DN400 a BR proyectada perteneciente a la Red Primaria Cloacal Colector Banfield-Centenario. *Ejecución de 2 cruces de pluvial.	26/06/2023	11/10/2023	100,0%	28,2%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2027.

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
SA70303	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VR GONNET - EE QUILMES - AVE-DMA026	El objetivo de la obra consiste en Implementar áreas hidráulicas sectorizadas para las válvulas reguladoras y la renovación de cañerías distribuidoras en el área de Avellaneda, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá un mayor control del abastecimiento en la zona y recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla a disposición del sistema y hacer seguimiento y control de parámetros hidráulicos. En particular la obra permitiría recuperar 2.640 m³/d, equivalente a abastecer 5.900 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d) y sectorizar el área de influencia de la válvula Reguladora Gonnet del sistema EB Quilmes. Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC y HF, reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 20.545 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 1.034 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 3.916 m con sus correspondientes accesorios	23/06/2023	20/10/2025	100,0%	9,7%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2027.
CC70025	RED PRIMARIA CLOACAL COLECTORES BARRIO 21-24	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de dos colectores cloacales y una red secundaria, para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes del Barrio 21-24, ubicado en los barrios de Pompeya y Barracas en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red Secundaria *Instalación de cañerías de PVC de rigidez nonimal SN8: ● 258m de DN200mm . ● 430m de DN315mm. *Ejecución de 9 bocas de registro *Ejecución de 45 conexiones domiciliarias cortas. Construcción en Zanja *Instalación de cañerías de PRFV de rigidez nonimal 10.000 PN6: ● 463m de DN500mm. ● 22m de DN600mm. ● 117m de DN700mm. ● 246m de DN800mm. *Ejecución de 12 bocas de registro. *Ejecución de 1 cruce ferroviario con DN700mm y 2 cruces de pluviales. *Ejecución de 1 empalme con boca de registro existente Colector de la Obra Complementaria N°7 DN800. Construcción en Tunel *Instalación de 290m de cañería de hormigón armado H-50 de DN700mm (PIPE JACKING). *Ejecución de 4 pozos de acceso y posterior ejecución de bocas de registro.	20/03/2023	31/07/2023	100,0%	33,0%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
CA70052	RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 ETAPA 3	La obra tiene como objetivo la ejecución de la Etapa 3 (cañerías cabeceras perimetral de distribución) de las obras a cargo de AYSA S.A contempladas en el convenio firmado con el IVC, para reforzar, renovar y ampliar la red de distribución de agua potable en el asentamiento denominado Villa 21-24, ubicado en el predio delimitado por Av. Amancio Alcorta, FFCC Belgrano Sur, Zavaleta, Av. Iriarte, Lamadrid, Agustín Magaldí, Alvarado, Luna, Osvaldo Cruz, e Iguazú de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Longitud de cañerías instalada: * Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 710 m con sus correspondientes accesorios. * Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 1.270 m con sus correspondientes accesorios.	30/03/2023	20/06/2023	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
NA70234	RENOVACIÓN VICENTE LÓPEZ - RENOVACIÓN MALLA 66 Y 69 A 73 - SECTORIZACIÓN VLO-DMA003	La obra tiene como objeto renovar cañerías distribuidoras en el área de Florida del distrito Vicente López, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla en disposición del Sistema Estación Elevadora Saavedra. En particular la obra permitiría recuperar 1000 m3/d, equivalente a abastecer 2200 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de HF sometidas reiteradas veces a los procesos de incrustación y grafitización provocando su deterioro estructural lo cual no hace posible su rehabilitación. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 12.894 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 379 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 1241 m con sus correspondientes accesorios	20/03/2023	04/07/2023	100,0%	14,5%	Obra en análisis de continuidad.
NA70251	RED SECUNDARIA DE AGUA CORREDOR DE LAS VÍAS ETAPA 1	Red Secundaria de Agua - Corredor de las Vías Etapa 1, tendrá su abastecimiento desde el Centro de Mezcla Muñiz. Población (año 2042) = 2.000 habitantes, es parte de la expansión Bella Vista IV	23/01/2023	29/03/2023	100,0%	67,1%	Obra en análisis de continuidad.
OA70241	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA - SECTORIZACIÓN VR CASEROS (TRE-DMA 006, 007, 008, 009 Y 010)	El objetivo de la Obra es Implementar áreas hidráulicas sectorizadas para las válvulas reguladoras y la renovación de cañerías distribuidoras en el área de Caseros, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá un mayor control del abastecimiento en la zona y recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla a disposición del sistema y hacer seguimiento y control de parámetros hidráulicos. En particular la obra permitiría recuperar 1.514 m³/d, equivalente a abastecer 3.364 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d) y sectorizar el área de influencia de la válvula Reguladora de Caseros. Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC, reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 12.308 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 315 mm, longitud aproximada 482 m con sus correspondientes accesorios.	20/03/2023	21/06/2023	100,0%	46,9%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SA70307	RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO FINEXCOR	El presente concurso tiene por objeto ejecutar las obras necesarias para abastecer y reforzar los conductos de agua en el Barrio Finexcor, Partido de Quilmes. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería de impulsión de agua: ●1.943 m de cañería de PRFV DN 400 mm Rigidez 10.000 N/m2. ●15 metros de cañería de PVC DN 315 mm Clase 10. ●30 metros de cañería de PVC DN 225 mm Clase 10. ●75 metros de cañería de PVC DN 110 mm Clase 10. ●15 metros de cañería de PVC DN 90 mm Clase 10. *Ejecución de cámaras: 3 para desagüe,4 para válvula de aire,3 para válvula mariposa y 3 para medición . *Instalación de válvulas: 17 esclusas de distintos diámetros, 3 mariposa y 4 de aire. *Ejecución de empalmes: 3 con retiro de tapón de cañería a ejecutar y 9 con corte de cañería existente e instalación de ramal. *Ejecución de 2 cruces de arroyo.	09/01/2023	-	100,0%	0,0%	Obra en análisis de curso de acción.
NC70170	RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE CUENCA 2	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de la colectora secundaria cloacal del sector Don Torcuato Este - Cuenca 2 y el colector DN400 del sector Don Torcuato Este – Cuenca 1, a ejecutarse en el partido de Tigre. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red secundaria (Cuenca 2): *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●10.481m de DN200mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta ●95m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta ●1.055m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta *Construcción de 109 bocas de registro y 16 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 875 cortas y 538 largas. *Ejecución de 2 cruces de pluvial. Red primaria (Cuenca 1): *Instalación de 187m de cañería colectora cloacal de PVC de DN400mm y Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. *Ejecución de 1 boca de registro. *Ejecución de 1 empalme a boca de registro existente con DN 400 mm y de 1 cruce de pluvial.	16/01/2023	20/03/2023	100,0%	85,1%	Obra en análisis de curso de acción.
NA70238	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MARTÍN SMA-DMA005	Objetivo de la Obra: Implementar una DMA y renovar las cañerías distribuidoras en el área de Villa Lynch del distrito San Martín, como parte de los planes de sectorización y de mejora y mantenimiento, lo que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y falta de optimización y ponerla a disposición del sistema de la EE Villa Devoto. En particular, la obra permitiría recuperar 2250 m3/d, equivalentes a abastecer a 5000 habitantes (a dotación de diseño: 450 l/hab.día). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC reduciéndose su proporción existente en la concesión, y continúa el plan de mejora iniciado con las obras de Villa Progreso Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 8.809 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 4.641 m con sus correspondientes accesorios	05/12/2022	22/02/2023	100,0%	93,7%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.

aysa	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 | exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
NC70182	RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 CUENCA 2	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la Red Secundaria Cloacal Bella vista 1 – Cuenca2", ubicada en el Partido de San Miguel. Cuenca 2A: *Instalación de cañerías de PVC : ● 3.985m de DN200mm y 110m de DN315mm de rigidez nonimal SN8. ● 87m de DN200mm de rigidez nonimal SN32. *Ejecución de 36 bocas de registro. *Ejecución de 21 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 247 cortas y 202 largas. *Ejecución de 1 empalme a BR perteneciente a la "RCP Colector Las Catonas" DN200mm. *Ejecución de 1 empalme a BR perteneciente a la "RCS Mariló Resto 3" DN315mm. Cuenca 2B *Instalación de cañerías de PVC : ● 11.308m de DN200mm y 115m de DN315 de rigidez nonimal SN8. ● 256m de DN315mm de rigidez nonimal SN32. *Ejecución de 114 bocas de registro. *Ejecución de 31 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 733 cortas y 635 largas. *Ejecución de 1 cruce pluvial.	09/01/2023	20/03/2023	100,0%	89,5%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
NC70192	RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ZONA C	El presente concurso tiene por objeto contratar la ejecución de la obra Red Secundaria Cloacal de la zona Don Torcuato Zona C, para la instalación y puesta en servicio del sistema de recolección de aguas servidas en dicha zona, ubicada en el Partido de Tigre. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red Secundaria: * Instalacion de cañería cloacal de PVC: ●33.636m de DN200mm y Rigidez Nominal SN8.●1.675m de DN315mm y Rigidez Nominal SN8.●809m de DN315mm y Rigidez Nominal SN32. *Ejecución de 255 bocas de registro y 94 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 3.014 cortas y 1.678 largas. *Ejecución de 2 cruces de Ruta Provincial 202. *Ejecución de 5 empalmes con BR proyectadas. Red Primaria: * Instalación 440m de cañería cloacal de PVC de DN400mm y Rigidez Nominal SN32. *Ejecución de 7 bocas de registro *Ejecución de 1 cruce de zanja no revestida. *Ejecución de 1 empalme con Boca de Registro Existente Colector Basualdo (NC477).	15/09/2022	20/01/2023	100,0%	27,7%	Obra en análisis de curso de acción.
NA70048	RED PRIMARIA DE AGUA DON TORCUATO A Y B	El objetivo de la obra es ejecutar la Red Primaria de Agua don Torcuato A y B, para la distribución, abastecimiento y expansión del servicio de agua potable en la zona de Don Torcuato. Partido de Tigre. Instalación de: • 337m de cañería de PVC PN10, DN 315 • 1488m de cañería de PVC PN10, DN 355 • 720 m de cañería de PRFV Rigidez 10000 PN10, DN 400 • 796 m de cañería de PRFV Rigidez 10000 PN10, DN 500	12/09/2022	11/01/2023	100,0%	33,1%	Obra en análisis de curso de acción.
CC70026	RED SECUNDARIA Y PRIMARIA CLOACAL BARRIO 1-11-14	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de una red secundaria y dos colectores cloacales, para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes del Barrio 1-11-14, ubicado en la zona sur del barrio de Flores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red Secundaria: *Instalación de cañerías de PVC de rigidez nonimal SN8: ● 2.284m de DN200mm . ● 681m de DN315mm. *Instalación de cañería de PVC de rigidez nonimal SN32: ●93m de DN315mm. *Ejecución de 44 bocas de registro. *Ejecución de 2 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de 437 conexiones domiciliarias cortas. Red Primaria: *Instalación de cañería de PVC de rigidez nonimal SN32: ●331m de DN400mm. *Instalación de cañerías de PRFV de rigidez nonimal 10.000 PN6: ● 183m de DN500mm. ● 885m de DN600mm. ● 207m de DN700mm. *Ejecución de 20 bocas de registro. *Ejecución de 2 empalmes con boca de registro existente.	22/08/2022	16/01/2023	100,0%	79,0%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SA70239	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANÚS ESTE 2 (LAN-DMA029)	Objetivo de la Obra: El objetivo de la obra es renovar cañerías distribuidoras en el área de Lanús Este del distrito Lanús, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas. La obra permitiría recuperar 3600 m3/d, equivalente a abastecer 8.000 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC, Acero y HF reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: •Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 21.373 m con sus correspondientes accesorios. •Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 13.818 m con sus correspondientes accesorios. Cantidad de Conexiones domiciliarias: o Cortas: 2292 o Largas: 1655	25/07/2022	05/09/2022	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
NC70009	RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA III	Las obras están destinadas a evacuar los líquidos cloacales generados en las zonas de Ing. Maschwitz – Cuenca III, en el Partido de Escobar. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●17.963m de DN200mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta ●164m de DN225mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta ●2.465m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta *Construcción de 164 bocas de registro y 72 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 739 cortas y 567 largas. *Ejecución de 1 cruce de arroyo. *Ejecución de 1 empalme a Cámara de acceso existente "RPC Colector Ing. Maschwitz 1" NC70006	25/07/2022	14/12/2022	100,0%	89,8%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
NC70010	RED SECUNDARIA CLOACAL MASCHWITZ CUENCA IV	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria y primaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Ing. Maschwitz – Cuenca IV", ubicada en el Partido de Escobar. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red SecundariaCañerías de PVC:●10.589m de DN200mm - Rigidez Nominal SN8 pared compacta.●151 m de DN225mm - Rigidez Nominal SN32 pared compacta.●1.107 de DN315 - Rigidez Nominal SN32 pared compacta. *Ejecución de 98 bocas de registro y 33 de acceso y ventilación. *Conexiones domiciliarias: 502 cortas y 475 largas. *Ejecución de 1 Cruce de Arroyo Maschwitz de DN200mm.Red Primaria●812 m de cañería de PVC de DN400mm y Rigidez Nominal SN32 pared compacta. *Ejecución de 6 bocas de registro. *Ejecución de 1 Cruce de Ruta de DN400mm y 1 Cruce Acueducto Tigre de DN400mm. *Ejecución de 1 empalme con boca de registro existente.	01/08/2022	09/11/2022	100,0%	75,4%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SA70283	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE ADROGUÉ CENTRO 3 (ALM - DMA005) ALMIRANTE BROWN - DRSO	El objetivo de la Obra es Renovar cañerías distribuidoras en el área de Adrogue del distrito Almirante Brown, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla en disposición del sistema de la elevadora Quilmes. En particular la obra permitiría recuperar 783 m3/d, equivalente a abastecer 1740 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de HF y Acero sometidas a los procesos de incrustación y grafitización provocando su deterioro estructural lo cual no hace posible su rehabilitación. Longitud de cañerías instalada: - Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 6.267 m con sus correspondientes accesorios. - Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 3.743 m con sus correspondientes accesorios Total: 10.010 mts	01/08/2022	09/11/2022	100,0%	18,5%	Obra en análisis de curso de acción.
SC70088	RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN OESTE	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Villa Edén Oeste", ubicada en el Partido de Lanús. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de 8.702m de cañería colectora cloacal de PVC DN200mm Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta. *Construcción de 60 bocas de registro y 44 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 877 cortas y 308 largas. *Ejecución de 7 empalmes con Boca de Registro del Colector Edén DN 500.	18/07/2022	12/12/2022	100,0%	46,2%	Obra en análisis de curso de acción.

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
SA70138	REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO OBRERO	El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria de agua del área denominada Barrio Obrero, ubicado en el Partido de Lomas de Zamora DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería de PVC clase 10: ●6.646m de DN90mm. ●1.328m de DN225mm. ●566m de DN315mm. *Ejecución de cámaras: 4 para toma para motobomba; 7 hidrantes; 1 de aire y 1 de medicion. *Ejecución de 19 empalmes a cañería existente. *Ejecución de 37 válvulas esclusas y 1 de aire. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 473 cortas y 303 largas. *Ejecución de 1 cruce de ferrocarril y 2 pluviales.	06/06/2022	17/10/2022	100,0%	73,1%	Obra en análisis de curso de acción.
NC70157	RED SECUNDARIA CLOACAL - PUEBLO NUEVO 1 ESTE ÁREA 3	El objetivo de las obras es la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Red Secundaria Cloacal - Pueblo Nuevo 1 Este Área 3", ubicada en el Partido de Tigre. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●9.542m de DN200mm y Rigidez Nominal SN8 de pared compacta. ●105m de DN225mm y Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. ●147m de DN315mm y Rigidez Nominal SN8 de pared compacta. *Ejecución de 83 bocas de registro y 24 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 342 cortas y 161 largas. *Ejecución de 1 cruce de ruta y 1 empalme con Boca de Registro Existente Colector Las Tunas.	21/06/2022	22/02/2023	100,0%	84,9%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
NC70200	RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Villa de Mayo 2", en el Partido de Malvinas Argentinas. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●12.797m de DN200mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta / ●138m de DN225mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta / ●1.120m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta / ●506m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta *Construcción de 158 bocas de registro y 44 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.561 cortas y 876 largas. *Ejecución de 2 cruces de pluvial. *Ejecución de 1 empalme a BR del proyecto NC70199 "RSC Villa de Mayo 1 – Resto"	27/05/2022	28/11/2022	100,0%	57,3%	Obra en análisis de curso de acción.
CA70049	RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 21-24	La obra tiene como objetivo la ejecución de las Etapa 1 (cañería primaria de refuerzo) y Etapa 2 (cañerías cabeceras perimetral de distribución) de las obras a cargo de AYSA S.A contempladas en el convenio firmado con el IVC, para reforzar, renovar y ampliar la red de distribución de agua potable en el asentamiento denominado Villa 21-24, ubicado en el predio delimitado por Av. Amancio Alcorta, FFCC Belgrano Sur, Zavaleta, Av. Iriarte, Lamadrid, Agustín Magaldí, Alvarado, Luna, Osvaldo Cruz, e Iguazú de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Longitud de cañerías instalada: RENGLÓN 1: REFUERZO * Conducto de Fundición Dúctil K7 - Instalación por calzada de cañería DN 500 mm- FD/K7, longitud aproximada de 1.161 m. RENGLÓN 2: RENOVACIÓN * Instalación por vereda de cañería de PVC/160 mm, clase 10, longitud aproximada de 352m. * Instalación por vereda de cañería de PVC/225 mm, clase 10, longitud aproximada de 2.271m. * Ejecución de Conexiones domiciliarias Cortas: 525	13/06/2022	09/06/2023	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
OC70227	RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍUEZ ETAPA 2 - CUENCA II	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Red Secundaria Cloacal Colector Martín Rodríguez Etapa 2 – Cuenca II", ubicada en el Partido de Ituzaingó. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Instalación de cañerías de PVC: ● 23.906m de DN200mm Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta. ●119m de DN225mm Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta. ●468m de DN315mm Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta. ●1.020 de DN 315mm Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta. *Ejecución de 234 bocas de registro y 55 de acceso y ventilación. *Instalación de conexiones domiciliarias: 1.343 cortas y 863 largas. *Ejecución de 1 Cruce Conducto Pluvial MODELO 7. *Ejecución de 13 empalmes con Bocas de Registros Existentes.	04/04/2022	19/09/2022	100,0%	72,0%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
OA70220	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA AREA DE INFLUENCIA VÍNCULO MORÓN-MATANZA-LMN-DMA002	El objetivo de la Obra es Renovar cañerías distribuidoras en el área de Ramos Mejía del distrito Matanza Norte, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas. La obra permitiría recuperar 5900 m3/d, equivalente a abastecer 13.000 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: •Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 25.740 m con sus correspondientes accesorios. •Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 1.100 m con sus correspondientes accesorios. •Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 11.660 m con sus correspondientes accesorios. Cantidad de Conexiones domiciliarias: Cortas: 3544 / Largas: 2643	24/05/2022	02/01/2023	100,0%	35,4%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2027.
OA70200	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA RAMOS MEJÍA ETAPA II LMN-DMA006" LA MATANZA NORTE - DRO	El objetivo de la obra es renovar cañerías distribuidoras en el área de Ramos Mejía del distrito Matanza Norte, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas. La obra permitiría recuperar 3600 m3/d, equivalente a abastecer 8.000 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC reduciéndose su proporción existente en la concesión.	21/03/2022	05/10/2022	100,0%	83,5%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
NC70149	RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE ÁREA 2	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Red Secundaria Cloacal 20 de Julio Oeste Área 2", ubicada en el Partido de Tigre. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●13.271m de DN200mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta ●1.258m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta ●224m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta *Construcción de 136 bocas de registro y 28 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 855 cortas y 673 largas. *Ejecución de 1 empalme con boca de registro existente del Colector Basualdo. *Ejecución de 1 cruce curso urbano revestido. *Se deberá considerar la Higiene y Seguridad y las Facilidades para la Inspección.	17/01/2022	30/05/2022	100,0%	88,5%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SC70183	RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 1 - LONGCHAMPS	El presente concurso tiene por objeto contratar la ejecución de la obra Red Secundaria cloacal de la zona Esperanza Oeste 1, para la instalación y puesta en servicio del sistema de recolección de aguas servidas en dicha zona perteneciente a la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Red Primaria: *Instalación de cañería de PVC rigidez nominal SN32 : 74m de DN400mm. *Ejecución de 1 boca de registro. *Ejecución de 1 cruce de pluvial y ruta provincial. *Ejecución de 1 empalme con boca de registro proyectada. *Ejecución de 657m de cañería en tunel DN400mm. Red Secundaria: *Instalación de cañería de PVC rigidez nominal SN32 : 1.446m de DN225mm y 373m de DN315mm *Instalación de cañería de PVC rigidez nominal SN 8 : 27.140m de DN200mm. *Ejecución de 224 bocas de registro y 88 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias : 1.527 cortas y 1.081 largas. *Ejecución de 240m de cañería en tunel DN315mm.	02/12/2021	03/01/2022	100,0%	92,8%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SC70126	RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 2	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Red Secundaria Cloacal Albertina 2", ubicada en el Partido de Lomas de Zamora. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●21.686m DN 200 mm y de rigidez nominal SN8 de pared compacta ●471m DN 315 mm y de rigidez nominal SN8 de pared compacta ●71m DN 315 mm y de rigidez nominal SN32 de pared compacta *Instalación de 230 bocas de registro y 45 de acceso y ventilación. *Instalación de conexiones domiciliarias: 1.418 cortas y 759 largas. *Ejecución de 7 empalmes con bocas de registro existentes.	13/12/2021	25/02/2022	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
NC526	RED SECUNDARIA CLOACAL RECONQUISTA RESTO - ZONAS 8, 9, 11 Y 12	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Reconquista Resto – Zonas 8, 9, 11 y 12", ubicada en el Partido de Tigre. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañerías de PVC: 22.986m de DN200mm Rigidez Nominal SN8; 468m de DN225mm Rigidez Nominal SN32 y 645m de DN315mm Rigidez Nominal SN32. *Ejecución de 223 Bocas de Registro y 75 Bocas de Acceso y Ventilación. *Ejecución de Conexiones Domiciliarias: 1.402 cortas y 826 largas. *Ejecución de 14 Empalmes con boca de registro existente. *Ejecución de 1 cruce pluvial.	15/11/2021	21/03/2022	100,0%	84,8%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
NA70188	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA MUÑIZ - SECTOR 4	El objetivo de la obra es renovar cañerías distribuidoras en el área de Muñiz del distrito San Miguel, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla en disposición del sistema Muñiz. En la actualidad el sector de Muñiz tiene una dotación de 900 l/h/d, la obra permitiría recuperar 4500 m3/d, equivalente a abastecer 10.000 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: •Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 17.175 m con sus correspondientes accesorios. •Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 9.524 m con sus correspondientes accesorios. •Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 315 mm, longitud aproximada 448 m con sus correspondientes accesorios. •Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 355 mm, longitud aproximada 621 m con sus correspondientes accesorios.	12/10/2021	24/01/2022	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
SC70124	RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "CEMENTERIO", ubicada en el Partido de Lomas de Zamora. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red secundaria: *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC y rigidez nominal SN8 : 23.017m de DN200mm y 105m de DN315. *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC y rigidez nominal SN32: 166m de DN225mm y 1.334m de DN315. *Construcción de 220 bocas de registro y 52 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.655 cortas y 593 largas. *Ejecución de 1 cruce de arroyo y 2 pluviales. Red primaria: *Instalación de 215m de cañería colectora cloacal de PRFV de DN500mm y rigidez nominal R10000 PN6. *Construcción de 4 bocas de registro. *Ejecución de 1 cruce de arroyo. *Ejecución de 1 empalme a la RSC Fiorito 3 con DN500.	30/08/2021	03/11/2021	100,0%	75,7%	Obra en análisis de curso de acción.
OA70182	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN JUSTO	El objetivo de la obra es la renovación de cañerías distribuidoras en el área del Centro de San Justo del distrito Matanza Norte, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla en disposición del sistema de la elevadora Matanza. En particular la obra permitiría recuperar 7900 m3/d, equivalente a abastecer 17550 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 23.350 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 110 mm, longitud aproximada 4.250 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 4.950 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 7.500 m con sus correspondientes accesorios	01/09/2021	07/04/2022	100,0%	76,3%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SA70199	RENOVACIÓN CENTRO DE LOMAS MALLAS 148 Y 149	Renovación de cañerías distribuidoras en el área de Centro de Lomas del distrito Lomas de Zamora, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas. En particular la obra permitiría recuperar 1591 m3/d, equivalente a abastecer 3540 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de HF sometidas a los procesos de incrustación y grafitización provocando su deterioro estructural lo cual no hace posible su rehabilitación. Longitud de cañerias instalada: - Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 9.960 m con sus correspondientes accesorios. - Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 5.000 m con sus correspondientes accesorios. - Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 4.300 m con sus correspondientes accesorios.	25/08/2021	28/10/2021	100,0%	54,2%	Obra en análisis de curso de acción.
SA70209	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CENTRO DE LOMAS" - MALLAS 111 Y 112	El objetivo de la obra es renovar cañerías distribuidoras en el área de Centro de Lomas del distrito Lomas de Zamora, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas. En particular la obra permitiría recuperar 2239 m3/d, equivalente a abastecer 5000 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC, reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 14.350 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 4.300 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 1.850 m con sus correspondientes accesorios.	19/07/2021	07/09/2021	100,0%	59,2%	Obra en análisis de curso de acción.
SC70125	RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 3	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "FIORITO 3", Partido de Lomas de Zamora. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red Secundaria *Instalación de cañerías de PVC: 23.678m de DN200 y Rigidez Nominal SN8; 975m de DN225 y Rigidez Nominal SN32mm y 627m de DN315mm y Rigidez Nominal SN32. *Ejecución de 239 bocas de registro y 58 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1391 cortas y 408 largas. *Ejecución de cruces:3 de pluvial y 1 de ruta. Red Primaria *Instalación de 191m de cañería de PVC DN400mm y Rigidez Nominal SN32. *Instalación de cañerías de PRFV PN6: 485m de DN500mm y 3m de DN600. *Ejecución de 8 bocas de registro. *Ejecución de 1 cruce de arroyo. *Ejecución de 1 empalme con DN600mm al Colector Fiorito de DN1500mm.	05/04/2021	12/07/2021	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
NA70176	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA BALLESTER	Renovación de cañerías distribuidoras en el área de Villa Ballester del distrito San Martin, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla en disposición del sistema de la elevadora Villa Adelina. En particular la obra permitiría recuperar 1875 m3/d, equivalente a abastecer 5300 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de HF sometidas a los procesos de incrustación y grafitización provocando su deterioro estructural lo cual no hace posible su rehabilitación. Longitud de cañeria instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 11.800 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 12.650 m con sus correspondientes accesorios.	17/05/2021	05/07/2021	100,0%	92,5%	Obra en análisis de continuidad.

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
NC70191	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CHECHELA	El presente concurso tiene por objeto la ejecución de la red secundaria cloacal en el barrio La Chechela, para la instalación y puesta en servicio del sistema de recolección de aguas servidas en dicha zona, ubicada en el Partido de Escobar. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red secundaria: *instalación de cañerías de PVC ● 6.942m de DN200mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta. ● 185m de DN225mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta. ● 311m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta. *Construcción de 58 bocas de registro y 31 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 787 cortas y 316 largas. *Ejecución de 1 cruce de pluvial. Red Primaria: *Instalación de cañerías ●198m de cañerías de PVC de DN400mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta. ●655m de cañerías de PRFV de DN500mm de Rigidez Nominal R10000 PN 6 *Construcción de 10 bocas de registro. *Ejecución de 2 cruces pluviales.	24/01/2022	09/05/2022	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
NC70031	AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE - 3° MÓDULO	El presente concurso tiene por objeto la realización de la Ampliación de la Planta Depuradora Norte-Módulo3, ubicada en el Partido de San Fernando. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Realización del Proyecto Ejecutivo en función de la verificación del proceso propuesto y de la verificación del diseño funcional de la totalidad del proyecto. *Realización de la Ingeniería de Detalle constructiva de toda la obra civil, mecánica y eléctrica y del sistema de alarma, control y automatismo de la planta. *Ejecución de las obras civiles. *Provisión electromecánica (incluye Transporte y Almacenamiento). *Supervisión y Montaje Electromecánico en el lugar de la obra. *Pruebas - pre operacionales. *Puesta en marcha de la obra incluyendo la capacitación del personal necesario hasta la recepción provisoria de la misma. *Aseguramiento de un período de garantía de funcionamientode (1) año posterior a la puesta en régimen y recepción provisoria, con operación a cargo de AySA S.A. y supervisión del Contratista. *Período de asistencia técnica de (1) año a partir de la recepción del proceso, al cabo del cual se otorgará la recepción definitiva. *Relevamiento y verificación de los terrenos, la totalidad de los trabajos detallados en los planos, especificaciones y partidas que integran la documentación del concurso.	-	-	0,0%	0,0%	Obra en análisis de continuidad.
NC70214	PLANTA NORTE - COGENERACIÓN DE ENERGÍA EN MÓDULOS 1 Y 2	Incorporar un sistema compacto de co-generación para los Módulos 1 y 2 de Planta Norte para producción de energía eléctrica y térmica que será utilizada para cubrir parte de los requerimientos de la planta. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS La obra civil incluye: limpieza y preparación del terreno, construcción de pavimentos y veredas, instalación de agua industrial, instalación contra incendio e instalación pluvial, base para módulo de lavado de gases y módulo de cogeneración, obras asociadas a redes y cañerías para equipamiento. La obra electromecánica incluye: módulo de lavado de biogás, módulo de cogeneración, cañería a intercambiador de calor, cañería de biogás, bomba de impulsión de agua, válvulas y juntas de desarme asociadas, montaje de equipos y puesta en marcha. La obra eléctrica incluye: ampliación TGBT Local 26, TSBT asociado a módulo de cogeneración, TSBT asociado a módulo de lavado de gases, cables, acccionamientos de baja tensión, canalizaciones eléctricas, sistemas de iluminación, sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas, montajes asociados.	01/12/2023	20/09/2024	100,0%	0,1%	Obra en análisis de curso de acción.
SC70287	PUESTA EN VALOR DE PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL MÓDULO I	La presente Licitación Pública Nacional tiene por objeto contratar la realización de las obras de puesta en valor del antiguo Módulo I de la Planta El Jagüel, en el Partido de Esteban Echeverría, y proyectar la ampliación de su capacidad. Los trabajos a realizar comprenden: el Proyecto Ejecutivo, la Ingeniería de Detalle, la construcción, el montaje y la puesta en marcha de las obras civiles y electromecánicas necesarias de la obra, incluyendo:-La realización del Proyecto Ejecutivo en función de la verificación del proceso propuesto y verificación del diseño funcional de la totalidad del proyecto incluyendo las características hidráulicas, funcionales y operativas del mismo sobre la base de los lineamientos de las Especificaciones Técnicas, Datos Garantizados, los planos anexos, documentación requerida y aceptación de las garantías de proceso requeridas.-Ejecución de las Obras civiles necesarias.-Provisión Electromecánica (incluye Transporte y almacenamiento en Obra).-Supervisión y Montaje Electromecánico en el lugar de la obra.-Instalación de servicios necesarios.-Pruebas pre-operacionales.-La puesta en marcha de la obra incluyendo la capacitación del personal necesario para el continuo funcionamiento de los equipos hasta la recepción provisoria de la misma.	08/04/2024	10/03/2025	78,0%	11,4%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2027.
CA70053	RENOVACIÓN DE TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN. MONTAJE DE VARIADOR DE VELOCIDAD. NUEVA SALA DE MANIOBRAS – EE FLORESTA	La presente Licitacion Pública Nacional tiene por objeto contratar la realización de las obras de una nueva cámara de alimentación de energía eléctrica, que será operarada por AySA, y una nueva sala de Media Tensión, la provisión e instalación de los equipos y su puesta en marcha, las mismas se realizarán en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Obra Eléctrica: Deberán proveerse y montarse los siguientes elementos: celdas primarias y secundarias en sala de media tensión, alfombra Dieléctrica, autotransformadores secos de arranque, transformadores de servicio auxiliar, instalación de variadores de velocidad, protecciones eléctricas, puesta a tierra de la nueva sala de maniobra y nueva sala de MT, tableros de iluminación y de servicios auxiliares de BT, pupitre de comando, ampliación pilar existente de BT, cableados y canalizaciones y accesorios de sala de maniobra y de media tensión. Obra Civil: se debera considerar: los trabajos generales de limpieza, preparación del terreno y demoliciones, pavimentos y veredas, instalación contra incendio, obra civil para Instalación eléctrica, movimientos de suelo, hormigón, mampostería, tratamiento arquitectónico, revoques, contrapisos y carpetas, cubiertas, cielorrasos, carpintería metálica e instalaciones sanitarias.	26/06/2023	21/11/2023	100,0%	51,3%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2027.
OC70209	AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LAS CATONAS	El presente documento tiene por objeto contratar la realización de la ampliación de la Planta Depuradora Las Catonas para alcanzar una capacidad total de tratamiento de 500.000 habitantes equivalentes, ubicada en el Partido de Moreno. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Las Obras comprenden la ejecución de la Cámara Subterránea; Obra Civil, Eléctrica y Electromecánica, y los Sistemas de Automatismo, Control y Comunicación para la Perforación y Explotación del Acuífero Puelche. *Obra civil: Trabajos Preliminares: realización de la limpieza y preparación del terreno; movimiento de suelos; demolición de estructuras fuera de servicio; parquización; pavimentos y veredas; instalación de agua industrial, sanitaria general, contra incendio, pluvial y eléctrica; hormigón; ensayo de estanqueidad; trabajos misceláneos; pintura de protección interior; mortero de terminación; mamposteria; instalacion de red de puviales; tratamiento arquitectónico; contra pisos y carpetas; cubierta; pinturas; carpintería metálica; revoques; demolición para vertederos; revestimiento térmico exterior; pisos y revestimientos; cielorrasos; gabinete para tanques de propano; zapatas; pavimento de HormigónH-30; barandas metálicas en escalera; instalaciones de acondicionamiento térmico; mobiliario de oficinas y comedor; estructuras de Hormigón H-35; prueba hidráulica del conducto; artefactos y equipamiento de laboratorio. *Obra Electromecánica: Deberán proveerse y montarse los elementos para: cámara de llegada y medición de caudal; fosa de gruesos; rejas automáticas gruesas y finas; estación elevadora; cámara de drenajes 1; desarenador-desengrasador; tratamiento de arenas y grasas; cámara de distribución a decantadores primarios; decantadores primarios; cámara recolectora de decantadores primarios; cámara de reparto a reactores biologicos; reactores biologicos; sala de soplantes; cámara de salida de reactores biologicos; cámara de reparto 3 y 4; clarificadores grandes (diametro 43); clarificadores existentes (diametro 34); cámara de rebombeo de lodos; fosa de espumas; canaleta parshall de salida; cámaras de lodos primarios; espesador de lodos primarios; flotador de lodos biológicos; tanque de lodos mixtos; digestor; calentamiento del lodo; mezcla del digestor; excedente de biogas; almacenadores de lodos digeridos; deshidratación; almacenamiento y evacuación de lodos deshidratados y unidad de elevacion de drenajes. *Obra Eléctrica: Deberán proveeerse y montarse los elementos para: tablero de distribución de media tensión-TDMT; tablero de media tensión-SETs; transformador de potencia de servicios auxiliares; tablero general de baja tensión-SET1B; tablero general de baja tensión-SET2; tablero general de baja tensión-SET3; conjunto cargador + banco de baterías; tableros seccionales; cables de media y baja tensión; cables	14/08/2023	14/08/2023	83,0%	0,0%	Obra en análisis de curso de acción.
SA70285	RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO ITATÍ	El objetivo de las obras es la ejecución de la red primaria para el abastecimiento, distribución y expansión del servicio de agua, en el Barrio Villa Itatí, en la localidad de Quilmes. El abastecimiento a esta red estará dado por la RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA – ETAPA 1 (SA70204).	21/06/2023	20/02/2024	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
VC70019	RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2 - DRSE	El objetivo es la ampliacion de la red cloacal sobre distintas calles dentro del radio servido que carecen del servicio. Características Físicas de la Obra: Partido de Florencio Varela Instalación en zanja de: - 2.536 m de cañería cloacal de DN 160 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. - 1.575 m de cañería cloacal de DN 200 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. Construcción de 45 bocas de registro (BR). Construcción de 28 bocas de Bocas de Acceso y Ventilación (BAV). Ejecución de conexiones 252 cortas. Ejecución de conexiones 72 largas. Ejecución de 15 empalmes de red a construir sobre red existente. Ejecución de 5 Bocas de Registro encaballadas. Acondicionamiento Integral de 5 Boca de Registro. Partido de Lanus: Instalación en zanja de: - 1.058 m de cañería cloacal de DN 160 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. - 942 m de cañería cloacal de DN 200 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. Construcción de 25 bocas de registro (BR). Construcción de 7 bocas de Bocas de Acceso y Ventilación (BAV). Ejecución de 104 conexiones cortas. Ejecución de 7 conexiones largas. Ejecución de conexiones domiciliares, con corte y retiro de conexiones existentes. En las calles Coronel Santiago entre Chaco y Formosa y Formosa entre Coronel Santiago y Dr. Arturo Melo Conexiones domiciliares 11 cortas. Conexiones domiciliares 12 Largas. Ejecución de 6 empalmes de red a construir sobre red existente.	14/08/2023	-	100,0%	0,0%	Obra en análisis de continuidad.
VC70023	TAREAS Y ADECUACIONES SOBRE ESTACIONES DE BOMBEO EJECUTADAS POR LA DIPAC Y OTROS	El objetivo es dar solución a los constantes inconvenientes que se presentan con la puesta en marcha de EBC que son ejecutadas por terceros (DIPAC y otros)	22/05/2023	20/07/2023	100,0%	36,2%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2027.
SA70301	OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE EN POI LA LATA	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de la perforación y las obras complementarias asociadas a la perforación en hipopuelche en Planta de Ósmosis Inversa La Lata, ubicada en el Partido de Estebán Echeverría. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Obra Electromecánica: comprende la provisión y montaje de: *Equipamiento de pozo: Bomba sumergible de pozo; Manguera de elevación 8"; Terminales para manguera 8" con abrazaderas; Codo 90° DN200A °C°; Caño DN200A° C° y Codo 90° DN100 A° C°; Caño DN100 A° C°; Tee reducción DN200 x DN100; Tapa roscada DN100; Válavulas esclusas DN100mm y 200mm de accionamiento manual; Válvula de retención DN200; Válvula de aire de triple efecto DN50; Junta de desarme autoportante DN200; Manómetro; Sistema toma muestras; Caudalimetro Electromagnético DN200; Conductímetro; Marco y tapa de acero inoxidable 1x1m. *Cañería de conexión de pozo: Caño DN200 A° C°; Codo 90° DN200 A° C°; Tee DN200 A° C°; Tapa abulonada DN200 A° C°; Conexión en carga, incluyendo válvula esclusa DN200 accionamiento manual. *Planta de Cloro la Lata: Conductímetro; Toma en carga cañería PRFV DN600; Marco y tapa de acero inoxidable 1x1m; Panel para instalación de instrumentos en Acero Inoxidable, incluyendo interconexiones y sistemas de regulación hidráulica; Bacha de acero inoxidable y Cañerías de PVCPN 10DN 1"; incluyendo accesorios, válvulas y piezas especiales. Obra Civil: Trabajos preliminares de limpieza y preparación del terreno; Excavaciones y rellenos para cámara; Veredas, contrapisos y carpetas; Instalaciones Eléctricas: Excavaciones y rellenos; Hormigón de limpieza H-25 para trincheras y cámaras; Tapas para cámaras eléctricas; Casetas para tableros eléctricos; Fundación; Contrapiso de hormigón sobre suelo natural compactado; Carpeta de terminación de Hº rodillada, c/brinder y agregado de fibra de polipropileno y endurecedor no metálico, y juntas de dilatación; Mampostería de ladrillos cerámicos huecos; Losa con carpeta de nivelación e impermebilización; Pintura de Revoque interior y exterior; Portones doble hoja. Estructuras de hormigón armado: Hormigón Pobre de Limpieza o Nivelación H25-H15; Tabiques; Losas y Plateas. Trabajos Misceláneos en Metal: Montaje de Marcos y Tapas y escalera mural. Obra Eléctrica: provisión y montaje de:Tablero General de Baja Tensión; Tableros Pozo Hipopuelche; Cables de Baja Tensión; Canalizaciones Eléctricas BT; Sistema de Iluminación; Tomas de Energía.	01/03/2023	20/03/2023	100,0%	94,4%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
OA70235	RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS PONTEVEDRA IV ETAPA 1	El presente concurso tiene por objeto la contratación de los trabajos para la instalación correspondiente a cañerías de interconexion es de pozos y/o refuerzos de instalaciones existentes, incluyendo la provisión de materiales y mano de obra, equipos, herramientas y supervisión necesarias, ubicado en el Partido de Merlo. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Cañería PRFV: 469m de DN400mm PN10 - Rigidez 10.000. *Cañerías de PVC Clase 10: 2.262m de DN160mm; 594m de DN225mm; 3.479m de DN315; 416m de DN355mm. *Instalacion de cámaras: 1 para válvula mariposa de DN400mm; 7 para cámara de desagüe de DN150mm; 6 para Toma para Motobomba de DN150mm; 6 para válvula de aire de DN80mm y 6 de DN100mm. *Instalación de válvulas: 1 válvula mariposa de DN400mm; 17 esclusas de diferentes DN; 7 para cámara de desagüe de DN150mm; 6 para Motobomba de DN150mm y 12 para válvula de aire de diferentes DN.*Ejecución de 6 empalmes con retiro de tapón de cañería existente. *Ejecución de 1 Cruce Ruta Provincial N° 21 - Calle Monte Dinero - DN 160 mm.	12/12/2022	23/05/2023	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
SC495	EMISARIO PLANTA BERAZATEGUI	El presente concurso tiene por objeto presentar las bases para la ejecución de la ingeniería de detalle y construcción de: ●La cámara de carga/chimenea de equilibrio y el emisario subacuático cuyo objeto será asegurar la disposición adecuada de los efluentes tratados en la Planta de Pretratamiento Berazategui, en el Río de la Plata, asegurando la calidad ambiental del cuerpo receptor de acuerdo a los niveles de calidad establecidos para el mismo. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: *Realizar las mediciones topográficas y batimétricas, los estudios meteoro-fluviales, geotécnicos e hidrogeológicos que sirvan como sustento para la realización de la ingeniería de detalle y justificación del método constructivo adoptado. *Ejecución de análisis y estudios de presencia de contaminantes en los suelos a excavar que permitan determinar las condiciones, eventual tratamiento y lugares de disposición final de los mismos. *Elaboración de Plan de Gestión Ambiental. *Elaboración del Estudio de Dragado comprendiendo la modelación de plumas de turbidez generadas por dragado durante la construcción del emisario, formulación de medidas de mitigación para disminuir el impacto ambiental y sobre la operación de las tomas de agua de AySA, y establecimiento de un plan de monitoreo/alerta durante las operaciones. *Llevar a cabo el proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle y la construcción del Emisario, sobre la base del diseño funcional elaborado por AySA, que consta de: - Tramo Transporte: Tres conducciones en material plástico (PEAD) de diámetro interno (DI) 2600 mm, instaladas en zanja dragadas con las siguientes longitudes: a) Conducto 1: 5100 m b) Conducto 2: 5900 m c) Conducto 3: 6700 m - Tramo Difusión: Tres conducciones en material plástico (PEAD) de sección variable (DI 2600 mm / DI 1800 mm) para la instalación de difusores construido en zanja dragada. Las longitudes del tramo difusión para cada conducto son: a) Conducto 1: 350 m (DI 2600 mm); 450 m (DI 1800 mm) b) Conducto 2: 350 m (DI 2600 mm); 450 m (DI 1800 mm) c) Conducto 3: 350 m (DI 2600 mm); 450 m (DI 1800 mm)	15/11/2022	29/12/2022	79,3%	7,7%	Obra en análisis de curso de acción.
SC498	ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI	El presente concurso tiene por objeto presentar las bases para la ejecución de la ingeniería de detalle y construcción de: ●La Estación de Bombeo de salida de la Planta de Tratamiento DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: *Para el caso de la estación de bombeo se proveerán e instalarán DIEZ (10) electrobombas serán del tipo centrífugas semiaxial de flujo mixto vertical para instalar en cámara seca aptas para servicio pesado de líquido cloacal, capaz de manipular sólidos de hasta 250 mm. Cada bomba tendrá una capacidad de 4,2 m3/seg, una altura manométrica total de 14,00m. trabajando a su velocidad nominal o reducida a los efectos de obtener mayor rendimiento. El caudal pico se fija en 33 m3/seg y este punto de funcionamiento deberá ser cubierto con 8 bombas como máximo. *La Obra Civil de la Estación de bombeo de salida comprende: -Las obras hidráulicas que contienen: el conducto de llegada, las cámaras de aquietamiento y aspiración, y el conducto de descarga. -Edificio técnico que incluye: sala de bombas y sala de motores, salas eléctricas, sala de comando, sala de carga y descarga.	30/06/2022	20/01/2023	79,0%	35,4%	Obra en análisis de curso de acción.

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
SC70220	RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTE GRANDE 3 ETAPA 2	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción del colector denominado "Monte Grande 3 Etapa 2", para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las redes secundarias denominadas "Monte Grande 4, Santa Catalina 5, Solares Ramallo, Santa Catalina B y Santa Catalina C"03/03/2022 descargando sus efluentes en el Colector Monte Grande 3 Etapa 1. Las obras se desarrollarán en el Partido de Esteban Echeverría. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de 2.350m de cañería colectora cloacal de PRFV DN600mm rigidez 10.000 PN6. *Construcción de 26 bocas de registro. *Ejecucion de 243m de cañería en túnel de PRFV DN600mm rigidez 10.000 PN6. *Ejecución de 1 empalme con boca de registro existente.	07/11/2022	20/07/2023	100,0%	27,1%	Obra en análisis de curso de acción.
VC70018	PUESTA EN VALOR DE PLANTA BATALLÓN Y READECUACIÓN DE ENTRADA PLANTA CENTRO	El presente concurso tiene por objeto contratar la realizacion de las obras de readecuacion y puesta en valor de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales denominada Batallón 601 y la obra de recepción de efluentes de la Planta José C. Paz Centro. Los trabajos se llevarán a cabo en los Partidos de Malvinas Argentinas y José C. Paz. Deberán llevarse a cabo las siguientes obras: *Obra Civil En Planta Batallón: trabajos preliminares de limpieza y preparación del terreno; movimiento de suelos para instalación de obrador y trabajos complementarios. Obras de rehabilitación de unidades en: reactor de lodos activados; clarificador; cámara de lodos; deshidratación de lodos. En Planta Centro José C. Paz: trabajos preliminares, movimiento de suelos; pavimento y hormigonado para nuevo pozo. *Obra Mecánica En Planta Batallón: deberán proveerse 1 aparejo eléctrico y 1 contenedor plástico para cámara afluente; difusores para el reactor de lodos; bombas de recirculación faltantes en clarificador; válvulas de purga automática en clarificadores; sistema de deshidratación de lodos; sistema de preparación y dosificación de polímero; reparación del canasto de retención de sólidos y montaje sistema de izaje de la cámara afluente; instalación de contenedor plástico para cámara afluente; inspección y eventuales reparaciones estructurales o reemplazos de bombas de líquido cloacales y de la cámara de carga de afluente; provisión y montaje de pulsador de emergencia en bombeo; inspección, reeemplazo y reparaciones del sistema de aireación; puesta a punto y acondicionamiento o reemplazo del puente barredor del clarificador, la bomba recirculación en clarificación, sopladores y válvulas del sistema; montaje de bombas de recirculación faltantes en clarificador y de válvulas de purga automática; instalación de sistema de deshidratación de lodos y de preparación y dosificación de polímero. En Planta Centro José C. Paz: provisión y montaje de canastos e izaje en pozo húmedo de entrada, de cañerías de interconexión y de válvulas de cierre; montaje y desmontaje de equipamiento electromecánico e instrumentación. *Obra Eléctrica: En Planta Batallón: revisión y reconstrucción de tablero; revisión e instalación de puesta a tierra, pararrayos y luminarias.En Planta Centro José C. Paz: recableado de equipamiento electromecánico e instrumentación. *Instrumentación y Control de Planta Batallón Provisión e instalación de indicación de suministro eléctrico, medición de nivel cámara de bombeo, caudalímetro electromagnético de entrada y en línea de purga, medición de oxígeno disuelto, medición de MES en licor de mezcla, detector de nivel (bajo y alto), transmisor de nivel en digestor de lodos, caudalímetro de salida de planta, indicación de funcionamiento de soplantes, indicador de funcionamiento y de sobrecarga de puente barredor sedimentador, PLC para	05/09/2022	03/10/2022	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
SA70130	RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LANÚS OESTE - ETAPA 1	La obra tiene como objetivo transportar caudal proveniente de la Estación Elevadora Lanús para mejorar los índices de servicios en el sistema de distribución de agua potable en la zona de Lanús Oeste. En especial la zona aledaña al Distrito Lomas de Zamora con presiones inferiores a los 4mca. El presente Tramo permitirá dar inicio a un Refuerzo que –en su conjunto- aporta solución a problemas estructurales en el transporte y distribución de agua del Distrito Lanús. En lo particular, el tramo 1 tiene como objetivo materializar el conducto de salida desde la EE Lanús y aportar caudal a un sector de la red sectorizada en macrosectores. Longitud de cañerías instalada: Instalación por calzada de cañería de Fundición Dúctil K7 DN 900mm, longitud aproximada de 2.086 m.	19/09/2022	20/09/2023	100,0%	21,2%	Obra en análisis de curso de acción.
SC70322	REVAMPING Y AMPLIACIÓN PLANTA FLORENCIO VARELA	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de Revamping y Ampliación de la Planta Depuradora Florencio Varela ubicada en la localidad de Santa Rosa, partido de Florencio Varela. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS * Obra Civil: Trabajos preliminares: limpieza y preparación del terreno. Reparaciones. Excavación. Rellenos para conductos y veredas. Instalaciones contra incendio y eléctrica. Salas para tableros eléctricos. Cámara de carga. Movimiento de suelos.nHormigón y trabajos misceláneos en metal. Cámara de drenaje y tanques de almacenamiento de lodos. Canal de rejas. Almacenador de lodo. Reactor Biológico. Cámara de empalme a salida de planta. Cámara de salida de planta modular by pass. Platea para planta modula.Edificio de espesamiento y deshidratación de lodos. Mampostería.Tratamiento arquitectónico. Revoques, contrapisos, carpetas, cubiertas, pisos, revestimiento, cielorrasos, pinturas y carpintería metálica. Obra Electromécanica: Deberán proveerse y montarse los elementos para: Estación elevadora de entrada existente.Cámara de carga. Tratamiento de arenas,cámara de tamizado. Sistema modular para tratamiento de líquidos. Cámara de salida de planta modular y by pass. Reactor Biológico. Clarificador. Cámara de recirculación y de purga de lodos. Cámara de empalme a salida de planta.Tanques de almacenamiento de lodos, cámara de drenajes, almacenamiento y deshidratación de lodos. * Obra Eléctrica: Deberán proveeerse y montarse los elementos para: pilar de energía, tablero de entrada de energía, tablero general de baja tensión, tableros seccionales, tableros para conexión de equipos, cables de baja tensión, cables de señales para sensores e instrumentos, canalizaciones eléctricas, sistemas de iluminación, tomas de energía, sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.	16/08/2022	20/10/2022	100,0%	49,9%	Obra en análisis de continuidad.
NC70195	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DARRAGUEIRA	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de la Estación de Bombeo Cloacal Darragueira, que estará ubicada en un predio situado en la esquina de Darragueira y Gral Pico de la localidad de Villa de Mayo, en el Partido de Malvinas Argentinas. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ObraCivil: Comprende de: trabajos preliminares, limpieza y preparación del terreno, muro perimetral, excavaciones y rellenos para conductos, y pavimentos y veredas. Instalaciones en general, sanitarias, contraincendio y pluvial. Obra Civil para instalación eléctrica, excavaciones para cámaras, cañeros eléctricos y trincheras, rellenos para cámaras, hormigón de limpieza H-25 para trincheras y cámaras, losetas premoldeadas, excavación y relleno, Contrapiso de hormigón, carpeta de terminación, mampostería, losa, pintura y revoque de interior y exterior. Cámara de ingreso de aspiración y de válvulas: movimientos de suelo, hórmigon de limpieza, relleno y estructura H-15 yH-35. Platea, tabiques y losas, pinturas, trabajos misceláneos en metal, montaje de marcos y tapas. Vigilancia, vestuarios, office, sala de tableros, cámara para empresa de energía y espacio para grupo electrógeno. Instalciones sanitarios, Sistema hipoclorito de sodio y pozo de agua: mampostería, revoques, cubiertas, pintura y marco y tapa de acero inoxidable para bomba de agua subterranea. ObraMecánica: debrán proveerse y montarse los elementos para: cañeria de llegada por gravedad, junta de unión de amplia tolerancia PVC, válvula Esclusa DN400mm, Sistema de retención de sólidos gruesos, electrobombas sumergibles y repuestos, reducción de acero al carbono de 200mm, cañerías, válvula de retencion a bola, esclusas, pieza especial tipo Y, Tanque Anti ariete del tipo AARA, cañerías de acero al carbono, Aparejo eléctrico de elevación de 1000Kg. marcos y tapas de acero electrobomba sumergible de pozo, bomba dosificadora de Hipoclorito de sodio. Obra Eléctrica: deberan proveerse y montarse los elementos para: Pilar de energía, tableros, cables de baja tensión, Sistema de iluminación, tomas de energía, Sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.	04/07/2022	22/08/2022	100,0%	6,4%	Obra en análisis de curso de acción.
NC70183	RED PRIMARIA DE AGUA LAS CATONAS	El objetivo de las obras es la construcción de la Red Primaria Cloacal a desarrollarse en los Partidos de San Miguel y Moreno con el objeto de disponer de la infraestructura necesaria para la recolección de aguas cloacales de la población actual situada en la zona de influencia del proyecto considerado, y de la población futura a asentarse en dicha zona. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Construcción en zanja: *Instalación de cañerías de PRFV Rigidez 10.000 PN 6: ●240m de DN800mm ●968m de DN900mm ●434m de DN1000mm *Ejecución de 8 bocas de registro. *Ejecución de 2 cruces de pluviales. Construcción en túnel: *Instalación de cañerías de hormigón armado premoldeado (Apto Pipe jacking): ●2.188m de DN900mm ●2.563m de DN1000mm ●478m de DN2000mm *Ejecución de 25 pozos de acceso y posterior ejecución de bocas de registro. *Construcción de 6 cámaras especiales. *Ejecución de 1 cruce de arroyo. *Deberá considerarse la Movilización y Desmovilización General.	18/07/2022	22/02/2023	100,0%	28,2%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2027.
SC70043	RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EZEIZA TRAMO EZEIZA	El presente concurso tiene por objeto la contratación de la construcción de un colector cloacal destinado a evacuar los efluentes cloacales provenientes de las redes de las zonas aledañas, denominado "Primarias Ezeiza Tramo Ezeiza", ubicado en el partido de Esteban Echeverría. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Construcción en Túnel ●5.041m de cañería de hormigón armado premoldeado (PIPE JACKING) de DN1300mm *Ejecución de 34 pozos de acceso y posterior ejecución de bocas de registro. *Ejecución de 1 empalme a Boca de Registro de Colector "Primarias Ezeiza Tramo Esteban Echeverría" DN1300mm.	21/06/2022	-	100,0%	0,0%	Obra en análisis de continuidad.

	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025
aysa		01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 / exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
OC70263	PLANTA DEPURADORA LAFERRERE - 150.000 HABITANTES	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de construcción y puesta en marcha del primer módulo de la Planta Depuradora La ferrere para el tratamiento del efluente de una población equivalente a 150.000 habitantes e incluye obras, equipos e instalaciones complementarias para las ampliaciones futuras. Las tareas se llevarán a cabo en la localidad de Virrey del Pino, en el Partido de La Matanza. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *La realización del Proyecto Ejecutivo en función de la verificación del proceso propuesto y verificación del diseño funcional de la totalidad del proyecto incluyendo las características hidráulicas, funcionales y operativas del mismo sobre la base de los lineamientos de las Especificaciones Técnicas, Datos Garantizados, los planos anexos, documentación requerida y aceptación de las garantías de proceso requeridas. *Ejecución de las Obras Civiles necesarias. *Provisión, montaje y supervisión electromecánica, incluyendo transporte y almacenamiento en obra. *Instalación de servicios necesarios y pruebas pre-operacionales. *La puesta en marcha de la obra incluyendo la capacitación del personal necesario para el continuo funcionamiento de los equipos hasta la recepción provisoria de la misma. *El aseguramiento de un período de garantía de funcionamiento de seis meses posterior a la puesta en régimen y recepción provisoria, con operación a cargo de AySA S.A. y supervisión del Contratista, al cabo del cual y previa verificación, se hará la recepción del proceso. *Un período de asistencia técnica de seis meses a partir de la recepción del proceso, al cabo del cual se otorgará la recepción definitiva.	01/08/2022	24/11/2022	100,0%	18,7%	Obra en análisis de curso de acción.
NC70202	READECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO RUSSO	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de readecuación y puesta en valor de la Planta de tratamiento de líquidos cloacales denominadas Campo Russo, en el Partido de Malvinas Argentinas. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Obra Civil: Trabajos preliminares: limpieza y preparación del terreno; movimiento de suelos e instalación de obrador; trabajos complementarios. Obras de rehabilitación de unidades: modificaciones en piping de reactores y clarificadores; reactor de lodos activados; clarificador; cámara de lodos; deshidratación de lodos. *Obra Mecánica: Deberán proveerse y montarse los elementos para: aparejo eléctrico para cámara de carga; contenedor plástico y bombas adicionales para cámara afluente; difusores para el reactor de lodos; bomba de recirculación faltante en clarificador; válvulas de purga automática en clarificadores; sistema de deshidratación de lodos; instalación del sistema de preparación y dosificación de polímero; pulsador de emergencia en bombeo; reparación del canasto de retención de sólidos y montaje sistema aparejo en la cámara afluente; rehabilitación de bombas existentes y montaje de nuevas bombas de líquido cloacal en cámara de carga; inspección, reparación y reemplazo de estructuras de la cámara de carga de afluente, sistema de aireación, sopladores, válvulas del sistema, bomba de recirculación en clarificación y puente barredor del clarificador; desmontaje de bombas de líquido clarificado. *Obra Eléctrica: Deberán proveerse y montarse los elementos para: luminarias LED y localizada; instalación de pararrayos y puesta a tierra; revisión y reconstrucción de tablero.	02/03/2022	20/07/2022	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
SC70319	REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO LAVALLOL	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de Revamping de la Estación de Bombeo Llavallol, ubicada en la localidad de Llavallol, Partido de Lomas de Zamora. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS *Obra electromecánica: provisión y montaje completo de: juntas de amplia tolerancia y de desarme autoportante; compuertas murales de acero inoxidable; pasamuros de acero inoxidable; electrobombas de velocidad fija y repuestos; reducción de acero al carbono de 500/350 mm para caudalímetro y sus accesorios; detectores de nivel hidrostatico y a flotante; cañerías de acero al carbono; ramales T; válvulas esclusa; tanque antiariete tipo Balón; transmisor de presión; sistemas de achique de sala de bombas y cámara de tanque antiariete; equipos compactador de residuos sólidos, de neutralizacion de olores y de rejas completo para instalar en canal; codo y curva bridada de empalme para cañería de impulsión; tornillo transportador de residuos; caudalímetro electromagnético; válvulas de retención a bola; marcos y tapas de acero inoxidable estancas desmontables; escalera de acceso a tanque antiariete con guardahombre; ampliación de acero al carbono para impulsión de electrobomba. Desmontaje de: electrobombas sumergibles y electrobomba de achique; cañerías de acero de impulsión y colectora; rejas de limpieza manual; compuertas murales; marcos y tapas de acero al carbono. *Obra civil: incluye toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y supervisión para llevar a cabo los siguientes trabajos: limpieza, nivelación y preparación del terreno; excavaciones y rellenos; desmonte de estructura de marcos y tapas; demolición de pavimentos; demolición parcial de losa para instalación de rejas automáticas; demolición y construcción de apoyos para bombas; vaciado y limpieza de cámara existente; revestimiento epoxi en cámara de aspiración; obras del conducto de salida; bloque de anclaje; cámara de válvulas, tanque antiariete y caudalímetro; pavimentos, veredas y contrapisos; edificios con: sala de Tableros, sala de Vigilancia, baño con vestuario y Office; muro perimetral con su correspondientes portón de acceso de malla metálica romboidal; obras civiles para Instalación Eléctrica. *Obra eléctrica: provisión y montaje del pilar de energía; tableros de entrada, general de BT, seccionales y para conexión de equipos; cables de BT y para señales de sensores e instrumentos; canalizaciones eléctricas; sistemas de iluminación, de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas; tomas de energía.	17/02/2022	21/03/2022	100,0%	83,6%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SA70203	RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO VILLA JARDÍN - ETAPA III	La obra tiene por objeto la ejecución de las cañerías de refuerzos Villa Jardín III y 10 de enero - Acuba, que complementa a los refuerzos Villa Jardín Etapa I y Etapa II y el Refuerzo Lanús Oeste, con la función primaria de transportar caudal proveniente de la Estación Elevadora Lanús para mejorar los índices de servicio en el sistema de distribución de agua potable en la zona de Lanús Oeste. Longitud de cañerías instalada: * Cañería de DN 500 mm FD K7, con una longitud aproximada de 3.696 m. El refuerzo constará de 3.696 metros * Cañería de DN 225 mm PEAD PN10, con una longitud aproximada de 803 m.	03/01/2022	10/05/2022	100,0%	18,3%	Obra en análisis de curso de acción.
NA70189	RED PRIMARIA Y REFUERZOS DE AGUA MALVINAS ARGENTINAS	El presente concurso tiene por objeto ejecutar las obras necesarias para abastecer y reforzar los conductos de agua en la zona de Grand Bourg, en el Partido de Malvinas Argentinas. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañerías de PRFV: 298m de DN600mm, 699m de DN500mm y 2.885 de DN400mm. *Instalación de cañerías de PVC clase 10: 1.341m de DN315mm, 2.790m de DN225mm y 1.157 de DN160mm. *Ejecución de cámaras: 11 para desagüe, 12 para válvula de aire, 3 para Toma para moto bomba, 3 para válvula mariposa, 1 para cámara de inspección, 4 para medición y provisión de 1 T para cámara de inspección. *Ejecución de 1 empalme con retiro de tapón de cañería existente y 27 con corte de cañería de tapón de cañería existente e instalación de ramal. *Instalación de válvulas: 46 esclusas, 3 mariposas y 12 de aire completa. *Ejecución de 2 cruces de arroyo.	23/11/2021	21/06/2022	100,0%	48,5%	Obra en análisis de continuidad.
SA70205	RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO AVELLANEDA - ETAPA 2	El presente concurso tiene por objeto contratar la ejecución de las obras de Red Primaria para reforzar el abastecimiento de agua potable a las zonas de Villa Domínico y Wilde, en el Partido de Avellaneda. La Etapa 2 del proyecto consiste en la construcción de la red primaria, desde el empalme con la Etapa 1 (proyecto SA70204 Refuerzo Avellaneda – Etapa 1), en el Partido de Quilmes. Asimismo, el proyecto incluye la instalación de un sistema de regulación, compuesto por tres válvulas reguladoras de presión. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Cañería de Impulsión: *Instalación de cañerías de PRFV PN 10: 2.972m de DN600mm, 1.599m de DN500mm y 1.175m de DN400mm. *Ejecución de cámaras: 16 para cámara de desagüe, 17 para válvula de aire, 3 para válvula mariposa y 7 T para cámara de inspección. *Ejecución de empalmes: 1 con retiro de tapón de cañería existente y 3 con corte de cañería e instalación de ramal. *Instalación de válvulas: 35 válvulas esclusas, 3 válvulas mariposas y 17 válvulas de aire todas de diferentes diametros. *Ejecución de 8 cruces de pluvial y 2 cruces de ruta. *Se deberá considerar la Higiene, Seguridad y Las Facilidades para la Inspección - Movilidad. Obra Civil y Electromecánica: Consiste en la Provisión, transporte y montaje de equipos electromecánicos. Incluyendo su puesta en funcionamiento y ensayos correspondientes. - La obra civil incluyendo las excavaciones, rellenos, construcción de estructuras, veredas y pavimentos y obras complementarias. - También deberán proveerse y montarse la totalidad de las instalaciones de fuerza motriz, iluminación, señalización, comunicación, y dispositivos necesarios para el funcionamiento de todas las instalaciones. Obra Eléctrica: Esta constituida por: Pilar de Energía, Tablero eléctrico de CA y CC, PLC, Sistema de comunicación por 3G y Puesta a tierra de seguridad.	15/11/2021	01/04/2022	100,0%	82,4%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.

aysa	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 | exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
SC70101	RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR EDÉN	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red primaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las zonas denominadas "Balcarce Norte, Villa Edén Oeste y Caraza 1 Resto", del Partido de Lanús. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS : Construcción en zanja: *Instalación de cañería: 1453m de PRFV DN500mm - Rigidez nominal 10.000 PN6. *Ejecución de 17 bocas de registro. Construcción en túnel: *Instalación de cañería: 2063m de hormigón armado premoldeado DN600mm (Apto Pipe Jacking). *Ejecución de 19 pozos de acceso y posterior ejecución de bocas de registro. *Ejecución de 1 BR encaballada sobre conducto de Hormigón existente DN1500mm del Colector ACUBA.	27/10/2021	09/05/2023	100,0%	27,7%	Obra en análisis de curso de acción.
SA70217	RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO 9 DE ABRIL ETAPA 1	El Objetivo de la obra es la ejecución de un sistema de cañerías primarias reguladas mediante válvulas reguladoras que permitan una eficiente distribución de los nuevos caudales disponible en el centro de mezcla "9 de Abril", debido su repotenciación. Con el conjunto de estas obras de repotenciación del centro de mezcla y cañerías primarias, se tiene previsto duplicar la capacidad de producción y mejorar el nivel de servicio de presiones de su zona de cobertura de 9 de Abril. El proyecto contempla la ejecución de: o Instalación por calzada de cañería de Fundición Dúctil K7 junta Espiga-Enchufe DN 600 mm, longitud aproximada de 2.370 m. o Instalación por calzada de cañería de Policloruro de Vinilo (PVC) PN10 DN 400 mm, longitud aproximada de 483 m. o Una Cámaras para válvula reguladora de Presión DN 250 mm o Una Cámaras para válvula reguladora de Presión DN 400 mm	17/08/2021	20/12/2021	100,0%	79,9%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
NC70187	READECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PLANTA CHAMPAGNAT	El presente pliego tiene por objeto contratar la realización de las obras de readecuación y puesta en valor de la Planta Depuradora Champagnat, ubicada en el Partido de Pilar.	26/07/2021	10/08/2021	100,0%	94,0%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SA70256	RED PRIMDARIA DE AGUA REFUERZO BATERÍA LAVALLOL	El Objetivo de la obra es la de incrementar la oferta de agua del Centro de Mezcla Lavallol mediante la derivación de 4 pozos de buena calidad de la Batería Burzaco a la Batería Lavallol y la activación de pozos que están inactivos por presentar su alta concentración de Nitratos, permitiendo obtener una mezcla de agua con concentraciones dentro de norma (<45mg/l). Esta obra permitirá aumentar la oferta de agua para la zona de Malvinas Argentinas (Almirante Brown), donde se habilitarán 3 módulos del Barrio del Canario. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 400 mm, longitud aproximada 2.660 m con sus correspondientes accesorios.	22/06/2021	20/09/2021	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
SC70283	REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RUCCI	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de revamping de la estación de bombeo Rucci, en el Partido de Presidente Peron. Esta obra permitirá evacuar los líquidos cloacales provenientes de los colectores del municipio los cuales convergen a la Estación de Bombeo Cloacal principal denominada "EBC Rucci" la cual impulsa los efluentes a la planta depuradora de líquidos cloacales Guernica, en el partido de Presidente Perón. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Obra Civil incluye: demolición; limpieza; y preparación del terreno; excavaciones y rellenos; pavimentos, cordones y veredas; estructuras de hormigón armado, H-25 y H-15; plateas, losas, tabiques y losetas premoldeadas; cámaras eléctrica; trabajos misceláneos en metal; montaje de marcos y tapas; barandas, pasarelas y escaleras; carpintería metálica mamposteria; contrapisos y carpetas; cubiertas; cielorrasos; pisos y revestimientos; pintura e instalaciones de acondicionamiento térmico; instalaciones sanitarias y mobiliarios de oficina. Obra Mecánica: deberán proveerse y montarse los elementos para juntas de unión de amplia tolerancia; válvulas esclusas y de retención a bola; sistema de retención de solidos; electrobombas sumergibles; cañerías de acero; ramal T; tanque antiarete; sistema de achique; puente grúa de elvación de 1500 kg; marcos y tapas de acero inoxidable. Obra Eléctrica: deberán proveerse y montarse los elementos para pilar de energía; tablero general de baja tensión, sistemas de iluminación; sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.	01/06/2021	20/01/2022	100,0%	15,6%	Obra en análisis de continuidad.
OA70203	BOMBEO DE SALIDA VIRREY DEL PINO	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de construcción, montaje y conexión de la Estación de Bombeo de Salida de la Planta Potabilizadora Virrey del Pino, ubicada en el Partido de La Matanza. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Obra Electromecánica Estación de bombeo: se instalarán cuatro bombas (tres en funcionamiento y una en reserva), tipo turbina vertical sumergida y motor en superficie, para presurizar las redes de distribución con el agua almacenada en la cisterna. Se instalará un monorriel para el montaje y mantenimiento de las bombas. Sistema de dosificación de hipoclorito: se instalarán dos bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio (una en funcionamiento y una en reserva), y dos tanques de hipoclorito. Caudalímetro de ingreso: se instalará un caudalímetro en la cañería de ingreso a la cisterna de entrada. Cámara para caudalímetro en salida: se construirá una cámara en la calle, para alojar el caudalímetro de salida de planta. *Obra Civil Los trabajos comprenden: limpieza y preparación del terreno. Excavaciones y rellenos para los suelos y para el conducto DN800.Rotura, refacción, contrapisos de hormigón y carpetas de terminación para pavimentos y veredas. Todas las estructuras de hormigón armado: hormigón de limpieza H-25,hormigón de nivelación H-15, tabiques, losas, plateas, zapatas, vigas, columnas, losetas premoldeadas de hormigón para edificios. Trabajos misceláneos en metal: montaje de marcos y tapas,escalera mural, estructura para monorriel.Albañilería: mamposterías,contrapisos, cubiertas,pinturas, revoques. Carpintería y herrería.Instalaciones contra incendio y pluvial general. Ingreso de 3 conductos en cisterna existente. Hormigón de segunda etapa para apoyo de bombas.Tabiques divisorios de bombas.Estructura de madera y cubierta de PRFV para tanques de hipoclorito. Cubierta metálica desmontable para sala de bombas. *Obra Eléctrica La obra eléctrica asegurará la recepción, gestión y distribución de la energía eléctrica (sistemas de potencia y servicios auxiliares) y sus sistemas asociados (automatismos, control y comunicaciones) para la operación de las bombas pertenecientes al bombeo de salida en conjunto con el resto del establecimiento.	15/03/2021	15/07/2021	100,0%	77,0%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SC70242	RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR LARTIGAU	El objetivo de la obra es aliviar el funcionamiento del Colector existente DN350 de la calle Lartigau, el cual descarga las subcuencas 006A40-6A, 006A41-1A, 006A41-1C, 006A41-1D, 006A41-1E, 006A41-2A Y 006A41-2C y tiene su capacidad de transporte saturada provocando desbordes en la vía pública. Características Físicas de la Obra: Instalación en zanja de: * 278 m de conducto cloacal de DN 355 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 32 * 1.193 m de conducto cloacal de DN 400 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 32.	03/03/2021	09/01/2023	100,0%	25,0%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
SA70221	OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN PLANTA GLEW	El presente proyecto tiene como objeto la realización de una perforación al Acuífero Hipopuelche y sus obras complementarias a ejecutarse dentro del predio correspondiente a la "Planta de Tratamiento por Ósmosis Inversa Glew", en el Partido de Almirante Brown. Descripción de los trabajos: *La provisión y el montaje de la obra electromecánica para el equipamiento del pozo, la cañería de conexión al pozo y para la cámara de válvula de salida. *La obra civil comprenderá la ejecución de los trabajos preliminares; movimientos de suelo; excavaciones y rellenos para cámaras y conducto DN200mm; rotura y refacción de pavimentos; estructuras de hormigón armado; trabajos misceláneos en metal y el ingreso al conducto DN200mm en cisterna existente. *La provisión y el montaje de la obra eléctrica. *La provisión, montaje y puesta en marcha del sistema de automatismos, control y comunicaciones. *Ejecución de la perforación de explotación y las obras complementarias. *Deberá considerarse la Higiene , la Seguridad y la Ingeniería de detalle.	14/12/2020	20/07/2021	100,0%	11,1%	Obra en análisis de curso de acción.
SA70234	OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LAVALLOL	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de la perforación y las obras complementarias asociadas a la perforación en hipopuelche en Centro de Mezcla Llavallol, que permitirán el funcionamiento y control de la bomba de la perforación, que aportará 200 m3/h de agua a la cisterna existente. Las especificaciones referentes a la realización de la perforación, se encuentran en el anexo "Perforación de explotación hipopuelche", adjunta al presente pliego.	30/11/2020	22/02/2021	100,0%	44,6%	Obra en análisis de curso de acción.
NA70187	PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN HIPOPUELCHE MUÑIZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	El objeto es la realización de perforaciones de explotación hipopuelche y obras complementarias en Centro de Mezcla Muñiz, que permitirán el funcionamiento y control de la bomba de la perforación, aportando 50m3/h de agua a la cisterna existente.	09/11/2020	22/02/2021	100,0%	99,7%	Obra en análisis de curso de acción.

aysa	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 | exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
NA70177	CISTERNA MALVINAS ARGENTINA, PERFORACIÓN HIPOPUELCHE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de construcción de una cisterna de agua de 2.000 m3 para su utilización como centro de mezcla, junto con su rebombeo, una perforación al acuífero hipopuelche, sus servicios auxiliares y obras complementarias. Descripción de los trabajos: Obra Electromecánica: Deberán proveerse y montarse los elementos para: estación de bombeo; bomba de turbina vértical; sistema de monitoreo de vibraciones en bomba; junta de desarme autoportante DN400mm; válvula mariposa DN400mm; válvula de retención DN400mm; Caño DN600mm; válvula de aire triple efecto DN100mm; manómetro; puente grúa, válvula de alivio de presión DN250mm; bomba sumergible de achique. Equipamiento pozo: bomba sumergible de pozo; manguera de elevación y terminales con abrazadera; caño DN200mm y DN100mm; te reducción DN200mm; tapa roscada DN100mm; válvula esclusa de DN200mm y DN100mm de accionamiento manual; junta de desarme autoportante DN200mm; marco y tapa de acero inoxidable; caudalímetro electromagnético DN200mm. Sistema de desifenfección: bomba dosificadora de hipoclorito de sodio; tanques de hipoclorito de sodio y sensores para tanque; filtros; cañerías de PVC; mangueras apta para hipoclorito de sodio; válvulas esféricas de PVC. Cisterna: sensor de nivel; monoriel; aparejo manual; válvula de retención DN250mm; marcos y tapas de acero inoxidable; juego de recatas para compuertas stop log. Instalaciones en general; sala de tableros de calidad. Obra Civil: Trabajos preliminares: Limpieza y preparación del terreno; demolición de edificios existentes; remoción de alambrado y árboles; excavaciones y rellenos para: cisterna; cámaras para pozo hipopuelche; excavaciones para: fundaciones; cañeros; trincheras y cámaras eléctricas. Estructuras de hormigón armado pobre de limpieza o nivelación para H-35, H-25 y H-15. Trabajos misceláneos en metal. Carpinteria y herrería. Estructuras métalicas. Albañilería; mampostería; revoques; contrapisos, y carpetas. Revoques; cielorasos y terminaciones bajo cubierta. Acabados de pisos y revestimientos de pintura. Instalaciones sanitarias; pluviales y contra incendio. Obra Eléctrica: Deberán proveeerse y montarse los elementos para: Tablero eléctrico general de potencia de BT y tablero seccional metálico. Alimentación con cables de BT y de señales para sensores e instrumentos. Sistemas de Iluminación. Tomas de energía fuerza motriz; sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.	10/09/2021	18/03/2022	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
SA851	ESTABLECIMIENTO GRAL. BELGRANO - AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN	La ejecución de las obras de ampliación de la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano para cubrir un caudal adicional diario de agua tratada de 1.000.000 m3, en el Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires. El objetivo es elevar la producción de agua de la Planta del máximo actual de 1.950.000 m3/día a un máximo de 2.950.000 m3/día (cfr. arts. 1.1, 1.2 del "PCPTyETE").	22/09/2022	20/06/2018	83,1%	31,3%	Obra en análisis de curso de acción.
SA852	PLANTA GENERAL BELGRANO - NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA CRUDA - 1° ETAPA	El presente concurso tiene por objeto contratar la ejecución de la primera etapa de la Estación Elevadora de Agua Cruda que, a futuro y una vez completadas todas sus etapas, alimentará la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano. Las obras se ejecutarán en el Partido de Quilmes. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Obra electromecánica: provisión y montaje completode: bombas centrífugas; bastidor de apoyo del motor; montaje de la electrobomba; sistema de lubricación; puentes Grúa; polipasto con carro eléctrico monoriel; cañerías y piezas especiales; caudalímetro electromagnético; juntas de desarme autoportante; recatas y compuertas apilables tipo STOPLOG; sistema de ventilación; tapas metálicas desmontables ubicadas en sala de motores; tapas metálicas desmontables estancas sobre cámara de caudalímetro a cota 23,00 OSN; medidor de nivel hidrostático; venteo cámaras; sistema descebador de sifón; tamices. *Obracivil: incluye toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y supervisión para llevar a cabo los siguientes trabajos: relleno compactado hasta cota+17,00OSN; cámara de derivación (encaballada); conducto de cámara de derivación a cámara de enlace; cámara de enlace; conducto de cámara de enlace a cámara de aspiración; salas de variadores y recinto de transformador es con pisotécnico, sala de motores, sala de equipos de lubricación, sala de carga y descarga de equipos; cámara de aspiración; recintos de columna de elevación, sala de bombas, sala de caudalímetro y sifón hidraúlico; canal colector y conducto derivador de caudales a cámara partidora; pavimentos y veredas; instalación contra incendios y parquización. *Obraeléctrica: provisión y montaje de la estación elevadora, cables, tableros seccionales servicios auxiliares, canalizaciones, sistema de iluminación, tomacorrientes, sistema de puesta a tierra y descarga contra descargas atmosféricas. *Provisión y montaje de los sistemas de automatismo, control, networking, comunicaciones, vínculos, interconexiones, cableados.	03/10/2017	01/03/2023	100,0%	52,3%	Obra en análisis de curso de acción.
SA853	RÍO SUBTERRÁNEO A LOMAS	Las obras del Río Subterráneo están destinada al transporte de agua potable proveniente del nuevo modulo de la Planta Gral. Belgrano, que permitirá aumentar la capacidad actual en 1.000.000 m³/día. Estas obras beneficiarán a una población aproximada de 2.500.000 habitantes. El Río Subterráneo tiene una longitud total aproximada de 23 Km. y se divide en dos tramos, vinculados por dos Estaciones Elevadoras que permitirán la distribución de dicha producción facilitando la expansión y mejora de los servicios de abastecimiento de agua potable, en los Partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverria y Ezeiza. Como así también permitirá sumar agua superficial a la producción de agua subterránea, y contar con un volumen extra de agua potable, destinado a incrementar y mejorar el servicio en el Partido de La Matanza. La primer parte del sistema se compone de la siguiente manera: Río Subterráneo Tramo 1: vinculará la Planta Belgrano con la Estación Elevadora EE1, atravesando los partidos de Quilmes y Lomas de Zamora. Consta de un conducto en túnel construido con tunelera de escudo con dovelas de 13.541 metros de longitud y 3900 mm de diámetro interno, el cual se ha previsto construir en dos tramos con dos tuneleras partiendo desde un punto intermedio y en direcciones opuestas. La llegada de una tunelera se prevé en la planta potabilizadora Gral. Belgrano y la de la otra en la cámara de enlace a la EE1 respectivamente. Estación Elevadora EE1: ubicada en la localidad de Temperley, Partido de Lomas de Zamora. A la altura de la intersección de las calles José Neglia y Av. Eva Perón. Impulsará los caudales provenientes de la Planta Belgrano, a través del Tramo 1, a los centros de demanda, mediante dos Líneas de Impulsión, encargadas de abastecer de agua potable los distintos centros de consumo, denominadas Ramal Glew y Ramal Temperley, teniendo la estación de bombeo una capacidad de impulsión máxima de 17.000m³/h. La obra electromecánica incluye el montaje de 6 equipos completos de bombeo de velocidad variable y 6 variadores de velocidad, cuya instalación también se prevé en la presente obra. Se proyectan 2 equipos en uso y 1 en reserva por cada impulsión.	01/11/2017	31/05/2018	100,0%	74,0%	Obra en ejecución a finalizar durante el año 2026.
RC004	SISTEMA RIACHUELO LOTE 2: PLANTA DE PRETRATAMIENTO, ESTACIÓN ELEVADORA DE ENTRADA, ESTACIÓN DE BOMBEO DE SALIDA - PLANTA DE TRATAMIENTO	Las obras comprenden la construcción de una Estación Elevadora de Entrada (EEE), una Planta de Pretratamiento (PPT) y una Estación de Bombeo de Salida (EBS) al Emisario Riachuelo. Los líquidos cloacales conducidos por el Desvío Colector Baja Costanera (incluido en RC002) llegan a la EEE, donde son elevados a una cota tal que permite que en la PPT la totalidad del proceso se desarrolle mediante un escurrimiento por gravedad. La PPT incluye una etapa tamizado y una de separación de arenas y flotantes, de forma tal que el efluente pretratado pueda ser difundido en las aguas del Río de la Plata sin inconvenientes, materializando un tratamiento por dilución. La EBS bombea los efluentes pretratados hacia una cámara de carga, dándole a los líquidos la altura necesaria para posibilitar su escurrimiento por el emisario subfluvial y su difusión en las aguas del río, en el extremo del mismo. La cámara de carga y el emisario pertenecen a la obra RC005.	15/06/2015	10/11/2016	100,0%	100,0%	Obra finalizada. Puesta en servicio durante año 2026.
NC70220	RED SECUNDARIA CLOACAL RÍO 2, 3 Y 4	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de las redes secundarias y colectores asociados para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las zonas denominadas "Río 2, Río 3 y Río 4".Las obras se desarrollarán en el Partido de San Fernando. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red secundaria: *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●7.517m de DN200mm de Rigidez Nominal SN8 de pared compacta ●285m de DN225mm de Rigidez Nominal SN32 de pared compacta ●317m de DN315mm de Rigidez Nominal SN8 de pared compacta ●1.521m de DN315mm de Rigidez Nominal SN32 de pared compacta *Construcción de 92 bocas de registro y 34 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 285 cortas y 163 largas. Red primaria *Instalación de 27m de cañería colectora cloacal de PVC de DN400mm y Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. *Ejecución de 1 boca de registro. *Ejecución de 1 cruce de ferrocarril. *Ejecución de 64m de cañería en túnel DN400.	07/12/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
NC70038	RED SECUNDARIA CLOACAL GOLF	El objetivo de las obras es la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Red Secundaria Golf", ubicada en el Partido de Tigre.	05/12/2023	22/01/2024	100,0%	5,0%	Obra rescindida.

aysa	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 | exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
NC70218	RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN LOS REMEROS - TRAMO 1	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la impulsión Los Remeros – Tramo 1 para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la futura Estación de Bombeo Cloacal 2 – Sistema Los Remeros (NC70066). La misma descargará sus efluentes en el Colector Los Remeros – Tramo 1 (NC70211). Las obras se desarrollarán en el Partido de Tigre. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de 2.237m de cañería cloacal de Fundición Dúctil (K9 acerrojado) DN1000mm. *Ejecución de cámaras: 6 para inspección, 4 para válvulas de aire triple función y 4 para desagüe. *Instalación de válvulas de distintos diámetros: 8 esclusas y 4 de aire triple función. *Ejecución de empalmes: 1 con junta de amplia tolerancia y 1 a boca de descarga proyectada. *Ejecución de 2 cruces de arroyo sin revestir y 1 cruce de ruta y arroyo revestido.	01/12/2023	-	84,5%	0,0%	Obra rescindida.
VA70048	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRN ETAPA 2	El objetivo de la obra consiste en ejecutar cierres de mallas de la red secundaria de agua mediante la instalación en zanja de cañerías de PVC en los Distritos Escobar, Tigre y San Fernando, correspondientes a la Dirección Regional Norte, dándole así mejor funcionamiento e incorporando usuarios al servicio. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 5.983 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 110 mm, longitud aproximada 840 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 400 m con sus correspondientes accesorios.	11/09/2023	15/11/2023	100,0%	1,6%	Obra rescindida.
CA70051	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRCF ETAPA 2	El objetivo de la obra es ejecutar cierres de mallas de la red secundaria de agua mediante la instalación de cañerías de PEAD por tecnología trenchless en los Distritos Belgrano, Caballito, Centro-Constitución, Devoto y Flores, correspondientes a la Dirección Regional Capital Federal dándole así mejor funcionamiento e incorporando usuarios al servicio. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda o calzada de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 4.528 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda o calzada de cañería de PEAD, PN10, DN 200 mm, longitud aproximada 418 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda o calzada de cañería de PEAD, PN10, DN 250 mm, longitud aproximada 270 m con sus correspondientes accesorios.	18/09/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
SC70208	RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 ESTE	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Burzaco 2 Este", ubicada en el Partido de Almirante Brown. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de 2.022m de cañería de PVC DN200mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta. *Ejecución de 15 bocas de registro y 9 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 124 cortas y 63 largas. *Instalación de 1 empalme con Boca de Registro Existente de DN200mm.	14/08/2023	07/11/2023	100,0%	18,5%	Obra rescindida.
SC70076	RED SECUNDARIA CLOACAL SOLANO SUR	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Solano Sur", ubicada en el Partido de Quilmes Descripcion de los trabajos: Red Secundaria: *Instalación de cañerías de PVC : ●19.142m de DN200mm y 906m de DN315mm rigidez nonimal SN8. ●166m de DN225mm y 321m de DN315mm rigidez nonimal SN32. *Ejecución de 200 bocas de registro. *Ejecución de 66 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.605 cortas y 765 largas.Red Primaria *Instalación de cañerías de PVC : ● 348m de DN400mm rigidez nonimal SN32.*Instalación de cañerías de PRFV : ● 266m de DN500mm rigidez nonimal 10.000 PN6. *Ejecución de 9 bocas de registro. *Ejecución de 1 cruce de arroyo natural no revestido y via muerta de FFCC.	14/08/2023	06/11/2023	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
NC70203	RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN DON TORCUATO ESTE	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red primaria cloacal "Impulsión DonTorcuato Este",ubicadaen el Partido de Tigre. Tramo a presión: *Instalación de 816m de cañería colectora cloacal de PVC DN225mm y Clase 10. *Construcción de cámaras: 4 de acceso e inspección y 1 para desagüe. *Ejecución de 1 empalme a cañería de salida de EBC Barrio San Fermín. Tramo a gravedad: *Instalación de 11m de cañería colectora cloacal de PVC DN 315 mm y Rigidez Nominal SN8 de pared compacta. *Construcción de 1 boca de descarga. *Ejecución de 1 empalme con BR existente.	03/07/2023	12/12/2023	100,0%	25,4%	Obra rescindida.
SC70227	RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 3	El presente concurso tiene por objeto la contratación de la construcción de la Red Secundaria Cloacal de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Ezeiza Sur 3", ubicada en el partido de Ezeiza. Descripcion de los trabajos: *Instalación de cañerías de PVC: ●15.240m de DN200mm de rigidez nominal SN8.●413m de DN225mm de rigidez nominal SN32. *Ejecución de 166 bocas de registro. *Ejecución de 62 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 673 cortas y 386 largas. *Ejecución de 6 empalmes a boca de registro pertenecientes al colector Primarias Ezeiza DN 1300 mm. *Ejecución de 1 empalme a boca de registro perteneciente a la RSC Ezeiza Sur 4 (SC70228) DN 200 mm.	27/02/2023	04/10/2023	100,0%	31,0%	Obra rescindida.
NC70179	RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA 3 - CUENCA 4	El presente concurso tiene por objeto contratar la ejecución de la Red Secundari aCloacal Santa María 3 – Cuenca 4, ubicada en el Partido de San Miguel. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●13.476m de DN200mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta ●305m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta *Construcción de 124 bocas de registro y 46 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 952 cortas y 775 largas. *Ejecución de 2 empalmes sobre BR perteneciente al Colector Primario Las Catonas.	23/02/2023	31/07/2023	100,0%	21,3%	Obra rescindida.
OA70167	RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 – ETAPA 1	El presente concurso tiene por objeto contratar la ejecución de las obras de red secundaria para la distribución, abastecimiento y expansión del servicio de agua potable en la zona de Hurlingham 1 - Etapa 1, ubicada en el partido de Hurlingham. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Cañerías de PVC Clase 10 ●9.691m de DN90mm. ●1.910m de DN110mm. ●812m de DN160mm. ●1.275m de DN225mm. ●105m de DN315mm. ●223m de DN355mm.Cañerías de PRFV ●33m de DN600mm rigidez 10.000 PN10. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 923 cortas y 516 largas. *Ejecución de cámaras: 10 para toma para motobomba, 9 hidrantes y 1 de macromedición. *Ejecución de 1 empalme a tapon existente. *Ejecución de válvulas: 73 esclusas y 10 para toma para motobomba . *Ejecución de 4 cruces pluviales.	16/01/2023	26/04/2023	100,0%	62,5%	Obra rescindida.
NC70177	RED SECUNDARIA CLOACAL SAN MARÍA 3 - CUENCA 2	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Santa María 3 – Cuenca 2", ubicada en el Partido de San Miguel. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Construcción en Zanja: ●12.958m de DN200mm - Rigidez Nominal SN8 pared compacta. ●490m de DN225mm - Rigidez Nominal SN32 pared compacta. ●165m de DN315mm - Rigidez Nominal SN8 pared compacta. ●501m de DN315mm - Rigidez Nominal SN32 pared compacta. *Ejecución de 127 bocas de registro y 53 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 975 cortas y 754 largas. Construcción en Tunel: ●72m de DN225mm. *Ejecución de 6 empalmes a BR de Colector Principal Las Catonas. *Ejecución de 2 cruces especiales.	09/01/2023	26/04/2023	100,0%	85,9%	Obra rescindida.

aysa	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 | exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
NC70181	RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la Red Secundaria Bella Vista1 – Cuenca 1, ubicada en el Partido de San Miguel. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Cañerías de PVC: *20.413m de DN200mm - Rigidez Nominal SN8 de pared compacta. *295m de DN225 mm - Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. *698m de DN 315 mm - Rigidez Nominal SN8 de pared compacta. *Ejecución de180 bocas de registro y 89 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.306 cortas y 1.089 largas. *Ejecución de 5 empalmes con boca de registro.	09/01/2023	14/04/2023	100,0%	40,6%	Obra rescindida.
SC70324	RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA IA	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Numancia IA", ubicada en el Partido de Presidente Perón. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red Secundaria: *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●15.405m de DN200mm de Rigidez Nominal SN8 de pared compacta ●667m de DN315mm de Rigidez Nominal SN32 de pared compacta *Construcción de 125 bocas de registro y 59 de acceso y ventilación *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.030 cortas y 742 largas Red Primaria: * Construcción en zanja ●Instalación de 1.419m de cañería PRFV DN500mm y rigidez nominal 10.000 PN6 * Construcción de 15 bocas de registro. * Construcción en túnel ●Instalación de 522m de cañería de Hormigón Armado Premoldeado calidad H-50 (Apto PIPE JACKING) DN500mm * Construcción de 6 pozos de acceso y posterior ejecución de bocas de registro. * Ejecución de 1 empalme con Boca de Registro existente frente a EBC Rucci.	07/11/2022	10/07/2023	100,0%	41,8%	Obra rescindida.
OA70224	INTERCONEXIÓN DE POZOS MORENO I	El presente concurso tiene como objeto la construcción de la interconexión de pozos en el Partido de Moreno, con el fin de mejorar la calidad de agua existente mediante la conducción hasta el centro de mezcla ubicado en Lincoln entre Necochea y Entre Ríos, dentro del mismo partido. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañerías de PRFV Rigidez 10000 PN10: ●84 m DN 600 mm. ●366 m DN 500 mm. ●774 m DN 400 mm. *Instalación de cañerías de PVC Clase 10: ●737 mDN 355 mm. ●1.634 mDN 315 mm. ●3.257 mDN 225 mm. ●2.078 mDN 160 mm. *Ejecución de cámaras: 8 para desagüe, 30 para válvula de aire, 20 para toma para motobomba, 3 para válvulas mariposa y 2 de inspección, video o cloración . *Instalación de válvulas: 75 esclusas de distintos diámetros, 3 mariposa y 30 de aire. *Instalación de 2 T para cámara de inspección. *Empalmes: 20 con corte de cañería e instalación de empalme de tres vías y 1 con retiro de tapón de cañería existente. *Ejecución de cruces: 1 de ferrocarril , 3 de ruta y 3 de pluvial.	17/10/2022	28/06/2023	100,0%	40,2%	Obra rescindida.
NC70178	RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA 3 - CUENCA 3	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Santa María 3 – Cuenca 3", ubicada en el Partido de San Miguel. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red Secundaria: *Cañerías de PVC: *17.127m de DN200mm Rigidez Nominal SN8 Pared Compacta. *919m de DN315mm Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta. *Ejecución de 151 bocas de registro y 62 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1315 cortas y 890 largas. *Ejecución de 3 empalmes a BR de Colector Principal Las Catonas de DN200mm. Red Primaria: *Instalación de 117m de cañeria de PVC de DN400mm Rigidez Nominal SN32 Pared Compacta. *Instalación de 1 empalme a BR de Colector Principal Las Catonas DN400. *Ejecución de 1 Cruce especial DN400mm.	17/10/2022	16/03/2023	100,0%	51,9%	Obra rescindida.
NA70235	RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA SAN MIGUEL – SECTOR V - DRN	El objetivo de la Obra es la Renovación de cañerías distribuidoras en el área de Muñiz del distrito San Miguel, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla en disposición del sistema Muñiz. En la actualidad el sector de Muñiz tiene una dotación de 900 l/h/d, la obra permitiría recuperar 5000 m3/d, equivalente a abastecer 11.300 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 25.805 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 110 mm, longitud aproximada 903 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 4.362 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 3.309 m con sus correspondientes accesorios Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 315 mm, longitud aproximada 518m con sus correspondientes accesorios Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 355 mm, longitud aproximada 579 m con sus correspondientes accesorios	26/09/2022	27/03/2023	100,0%	35,6%	Obra rescindida.
NC70176	RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARÍA 3 – CUENCA 1	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la Red Secundaria Santa María 3 – Cuenca 1, ubicada en el Partido de San Miguel. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Cañerías de PVC ●18.058m de DN200mm - Rigidez Nominal SN8 pared compacta. ●1.912m de DN315mm - Rigidez Nominal SN8 pared compacta. *Ejecución de 210 bocas de registro y 80 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.210 cortas y 1.207 largas. *Ejecución de 2 empalmes a BR de Colector Principal Las Catonas.	05/09/2022	14/02/2023	100,0%	58,3%	Obra rescindida.
SC70087	RED SECUNDARIA CLOACAL BALCARCE NORTE	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Balcarce Norte", ubicada en el Partido de Lanús. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red Secundaria: Cañerías de PVC Rigidez Nominal SN8 de pared compacta *20.035m de DN200mm. *573m de DN315mm. *Ejecución de 180 bocas de registro y 57 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1789 cortas y 698 largas. *Ejecución de un cruce pluvial de DN1200mm y 3 empalmes con Boca de Registro Colector Eden DN500mm. Colector: * Instalación de 585m DN400mm - Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. *Ejecución de 5 bocas de registro. *Ejecución de 1 empalme con Boca de Registro Colector Eden DN500mm.	22/08/2022	27/12/2022	100,0%	63,0%	Obra rescindida.
NC70199	RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Villa de Mayo 1 – Resto", en el Partido de Malvinas Argentinas. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red secundaria: *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●7.974m de DN200mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta / ●247m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta *Construcción de 69 bocas de registro y 34 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 920 cortas y 480 largas. *Ejecución de 1 cruce de pluvial. Red primaria: *Instalación de 101m de cañería colectora cloacal de PVC DN400mm y Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta. *Construcción de 1 boca de registro. *Ejecución de 1 cruce de pluvial. *Construcción de 82m de cañería en túnel DN400mm.	01/08/2022	27/09/2022	100,0%	78,9%	Obra rescindida.
NC70206	RED SECUNDARIA CLOACAL LÓPEZ CÁMELO RESTO	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Lopez Camelo Sur Resto", ubicada en el Partido de Tigre. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Cañerías de PVC: ●6.084m de DN200mm - Rigidez Nominal SN8 pared compacta. ●19m de DN315mm - Rigidez Nominal SN8 pared compacta. ●91m de DN315 - Rigidez Nominal SN32 pared compacta. *Ejecución de 60 bocas de registro y 5 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 40 cortas y 17 largas *Ejecución de 1 cruce de arroyo DN315mm y 3 empalmes con Boca de Registro Exixtente.	08/08/2022	16/12/2022	100,0%	48,9%	Obra rescindida.

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
SC70048	RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 3° ETAPA	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Santa Catalina 3° Etapa", ubicada en el Partido de Esteban Echeverría. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red Secundaria: *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●23.559m de DN200mm y Rigidez Nominal SN8 de pared compacta. ●129m de DN225mm y Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. ●918m de DN315mm y Rigidez Nominal SN8 de pared compacta. ●225m de DN315mm y Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. *Ejecución de 233 bocas de registro y 137 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.833 cortas y 1.453 largas. Red Primaria: ●344m de cañería colectora cloacal de PVC rigidez nominal SN32 de pared compacta. ●1.066m de cañería colectora cloacal de PRFV rigidez Nominal 10.000 PN6. *Ejecución de 17 bocas de registro. *Ejecución de 1 empalme a Boca de Registro Existente .	01/08/2022	25/11/2022	100,0%	50,7%	Obra rescindida.
OA70219	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CASEROS	El objetivo de la Obra es renovar cañerías distribuidoras en el área de Caseros del distrito Tres de Febrero, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas. En particular la obra permitiría recuperar 5600 m3/d, equivalente a abastecer 12.400 habitantes (a dotación de diseño 450l/h/d). Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de AC reduciéndose su proporción existente en la concesión. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 12.755 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 2.482m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 7.7608 m con sus correspondientes accesorios.	05/07/2022	22/02/2023	100,0%	38,0%	Obra rescindida.
SC452	RSC LAS PIEDRAS SUR - CUENCA B	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Las Piedras Sur – Cuenca B", ubicada en el Partido de Quilmes. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●11.336m de DN200mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta ●92m de DN225mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta ●106m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta ●417m de DN315mm de Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta *Construcción de 123 bocas de registro y 43 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 796 cortas y 480 largas. *Ejecución de 3 cruces de pluviales. *Ejecución de empalmes: ●1 con BR existente perteneciente a Colector Este Ramal Sur (SC422) ●1 con BR existente perteneciente a Colector Q4 (SC086)	11/07/2022	06/09/2022	100,0%	71,8%	Obra rescindida.
SC70205	RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 1° ETAPA	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red secundaria para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Sarmiento", en el Partido de Avellaneda. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ● 19.434m de DN200mm de Rigidez Nominal SN8 de pared compacta. ● 617m de DN225mm de Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. ● 398m de DN315mm de Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. *Construcción de 177 bocas de registro y 43 de acceso y ventilación. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 1.594 cortas y 775 largas. *Ejecución de 3 cruces de pluviales. *Ejecución de empalmes: 4 con bocas de registro existentes de RSC Gral. Pinto y 1 con boca de registro de Colector existente. *Construcción de 1 BR encaballada.	14/02/2022	07/03/2022	100,0%	46,7%	Obra rescindida.
NA70218	RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 3	El objetivo de las obras es la ejecución de la red secundaria de agua para el área denominada Talar Sur – Zona 3, ubicada en el Partido de Tigre. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería de PVC Clase 10: ●10.670m de DN90mm. ●2.178m de DN110mm. ●624m de DN160mm. ●853m de DN225mm. ●726m de DN250mm. ●20m de DN315mm. *Ejecución de cámaras: 11 para tomas para motobombas, 10 para hidrantes y 1 para macromedición. *Instalación de 100 válvulas esclusas de diferentes diámetros. *Ejecución de 1 empalme a cañería existente y 1 cruce de arroyo. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 844 cortas y 562 largas.	13/12/2021	28/03/2022	100,0%	73,2%	Obra rescindida.
SC70089	RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACIÓN A ING. SOURDEAUX I – ETAPA 1	El presente concurso tiene por objeto la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada "Caraza 1 Resto", ubicada en el Partido de Lanús. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS * Instalación de cañería de PVC : 13.012m de DN200mm de rigidez nominal SN8. * Ejecución de 110 bocas de registro y 58 bocas de acceso y ventilación. * Ejecución de conexiones domiciliarias : 1.328 cortas y 258 largas. * Ejecución de 15 empalmes con boca de registro al Colector Edén DN500mm.	08/11/2021	16/02/2022	100,0%	59,7%	Obra rescindida.
NA70173	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA SAN ISIDRO	El objetivo de la obra es implementar áreas hidráulicas sectorizadas del resto de la red mediante la renovación de cañerías distribuidoras en el área de San Isidro, como parte de un plan de mejora y mantenimiento que permitirá recuperar agua que a la fecha se pierde por roturas y ponerla a disposición del sistema y hacer seguimiento y control de parámetros hidráulicos. Esta renovación también permite la remoción de cañerías antiguas de HF sometidas a los procesos de incrustación y grafitización provocando su deterioro estructural lo cual no hace posible su rehabilitación. Longitud de cañerías instalada: * Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 14.250 m con sus correspondientes accesorios. * Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 110 mm, longitud aproximada 1.400 m con sus correspondientes accesorios. * Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 9.200 m con sus correspondientes accesorios. * Instalación por vereda de cañería de PEAD, PN10, DN 225 mm, longitud aproximada 250 m con sus correspondientes accesorios.	19/07/2021	21/03/2022	100,0%	83,9%	Obra rescindida.
NC70233	RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN QUIRNO COSTA	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la impulsión cloacal Quirno Costa, obra destinada a la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la Nueva Estación de Bombeo Cloacal Quirno Costa (Proyecto NC70234), ubicada en el Partido de San Fernando. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *242m de cañería de PRFV DN 400mm - Rigidez 10.000 PN10. *7m de cañería PRFV de DN600mm - Rigidez 10.000 PN6. *Ejecución de 1 Cámara de Acceso e Inspección. *Ejecución de 1 Boca de Descarga y Vertedero *Ejecución de 1 empalme con junta de amplia toleracia de DN400mm. *Ejecución de 1 empalme a BR existente de Colector Ribereño.	-	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.

aysa	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 | exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
NC70234	NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL QUIRNO COSTA	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de la Nueva Estación de Bombeo Cloacal Quirno Costa, en el Partido de San Fernando. Esta obra permitirá evacuar los líquidos cloacales provenientes de la Red Secundaria Cloacal Río2, 3 y 4 (Proyecto NC70220) y de los Radios Servidos Sector Norte-Subc. EBC-Z10 y Sector Sur-Subc. EBC-Z10. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Obra Civil: incluye trabajos preliminares, movimientos de suelo, rellenos, pavimentos, estructuras de hormigón armado, revestimiento de protección, trabajos miscelaneos en metal, carpintería y herrería, albañilería, acabados, instalaciones, parquización. *Obra Mecánica: deberán proveeerse y montarse los siguientes elementos: cañería de By-Pass; Pasamuro; Electrobombas sumergibles; Juntas de desarme auto portante; Junta de union de amplia tolerancia; Equipo de rejas; Tornillo transportador; Equipo compactador de residuos solidos; Válvulas esclusas; Te de reducción; Caudalímetro Electromagnético, Tanque anti arete tipo AARA; Cañería de desagüe del manifold; Curva de acero al carbono; Cañería y reducción de Acero al Carbono; Bridaciega; Válvulas de Retención a bola; Transmisor de nivel hidrostaticos; Detectores de nivel a flotante; Sistema de achique cámara de válvulas; Sistema de achique cámara de ingreso; Aparejo eléctrico de elevación de 1000Kg; Marco y Tapa de acero inoxidable; Conducto de Ventilación de PVC; Recata para compuerta apilable de acero inoxidable; Compuertas metálicas tipo Stop Log; Repuesto de Electrobombas; Sistema de control de olores y Transmisor de presión. *Obra Eléctrica: deberán proveerse y montarse los elementos para: Pilar de Energía; Tableros; Cables de Baja Tensión; Canalizaciones Eléctricas; Sistemas de Iluminación; Tomas de Energía y Sistema de Puesta a Tierra y Protección contra Descargas Atmosféricas.	07/12/2023	20/12/2023	100,0%	11,6%	Obra rescindida.
VA70054	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 DRN ETAPA 2	El objetivo de la Obra consiste en ejecutar cierres de mallas de la red secundaria de agua mediante la instalación en zanja de cañerías de PVC en los Distritos Vicente López, San Isidro y San Martín, correspondientes a la Dirección Regional Norte, dándole así mejor funcionamiento e incorporando usuarios al servicio. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 13.676 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 110 mm, longitud aproximada 180 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 200 m con sus correspondientes accesorios	06/12/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
NC70223	RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN GOLF	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red primaria cloacal "Impulsión Golf", ubicada en el Partido de Tigre.	05/12/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
SC469	RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN SOLANO SUR	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red primaria cloacal "Impulsión Solano Sur" de la estación de bombeo homónima, ubicada en el Partido de Quilmes. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Cañerías: *761m de cañería de PVC de DN315mm clase 10. *20m de cañería de PRFV de DN 500mm - rigidez 10.000 PN6. *Ejecución de cámaras: 3 para cámara de acceso e inspección, 1 para cámara de desagüe y 1 para cámara para válvula de aire. *Ejecución de 1 boca de descarga. *Instalación de 2 válvulas esclusas 1 para cámaras de desagüe y otra para cámaras de válvula de aire y 1 válvula de aire triple función. *Instalación de cámaras: 3 de acceso e inspección 1 de desagüe y 1 válvula de aire triple función. *Ejecución de 2 empalmes y 1 cruce de ruta provincial.	23/10/2023	-	98,9%	0,0%	Obra rescindida.
SC468	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SOLANO SUR	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de la Estación de Bombeo Cloacal Solano Sur, en la localidad de Solano del Partido de Quilmes. Esta obra permitirá evacuar los líquidos cloacales provenientes de Solano y zonas adyacentes. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Obra Civil: comprede LA limpieza y preparación del terreno Excavaciones y rellenos para: conductos, cámaras, edificios, cañeros, trincheras y cámaras eléctricas y cerco perimetral. Pavimentos, cordones y veredas. Estructuras de hormigón armado: H-25,H-35,H-15, plateas de fundación, pilotines, vigas, losetas premoldeadas, capa de comprensión para losetas, cámaras eléctricas, tapas premoldeadas para cámaras eléctricas, tabiques, losas. Revestimientos de protección. Trabajos misceláneos en metal: montaje de marcos, tapas, recatas, barandas, escaleras, carpintería, herrería, estructuras metálicas. Albañilería: mampostería, contrapisos, cubierta, cielorrasos y terminaciones bajo cubierta. Acabados: pisos, revestimientos y pintura. Instalaciones sanitarias, pluviales y contra incendios. Parquización. Obra mecánica: Deberán proveerse y montarse los elementos para: cañería de llegada por gravedad, pasamuros, electrobombas sumergibles, juntas de desarme auto portante y de unión de amplia tolerancia, sistema de retención de sólidos gruesos, manifoldcolector, válvulas esclusas, de reducción, caudalímetro electromagnético, tanque antiariete, cañerías de desagüe del manifold, curvas de acero al carbono, reducciones de acero al carbono, válvulas de retención a bola, codos, juntas de unión, transmisor de nivel hidrostático, detectores de nivel a flotante con caño camisa, sistemas de achique de cámara, aparejo eléctrico de elevación, tapas de acero inoxidable, conducto de ventilación, compuerta para cámara de lavado, rejilla, repuesto de electrobombas, transmisor de presión. Obra Eléctrica: Deberán proveeerse y montarse los elementos para: Pilar de entrada tarifa 2. Tablero eléctrico general de potencia de BT. Tablero seccional metálico. Cables unipolares. Canalizaciones por cañero subterráneo, cañería a la vista y bandeja. Iluminación interior, exterior y de emergencia. Tomas corriente. Sistemas de puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cables de señales para sensores e instrumentos digitales y analógicos.	22/08/2023	21/11/2023	100,0%	18,6%	Obra rescindida.
NC70216	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GOLF	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras en la Estación de Bombeo Cloacal Golf, que estará ubicada en un predio situado en un terreno de la esquina de Boulogne Sur Mer y vías del Ferrocarril Mitre de la localidad de Gral. Pacheco, en el Partido de Tigre. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: *Obra Civil: limpieza y preparación del terreno. Muro perimetral. Bloque de anclaje. Revestimientos de protección. Excavaciones y rellenos para conductos (según zanja típica). Pavimentos y veredas. Instalación sanitaria general, contra incendio y pluvial general. Obra civil para la instalación eléctrica: Cámara de ingreso, de aspiración, de válvula. Tanque anti ariete y caudalímetro. Trabajos misceláneos en metal. Vigilancia, vestuarios, sala de tableros y grupo electrógeno: excavación, rellenos, hormigón, maposterías, revoques, marmolerías, contrapisos, carpetas, cubiertas, pisos, revestimientos, cielorrasos, pinturas, carpintería metálica. Instalaciones de acondicionamiento térmico y sanitarias. Mobiliario de oficinas. *Obra Electromecánica: Provisión y montaje de: cañerías, juntas de unión de amplia tolerancia, válvulas esclusas, pasamuros, sistemas de retención de sólidos, electrobombas sumergibles y respuestos, redución de acero al carbono, transmisor de nivel hidrostático, curvas, válvulas de retención a bola, juntas de desarme autoportante, ramales T de distintos diámetros, tanque antiariete, caudalímetro electromagnético, brida ciega de acero al carbono, sistemas de achique, aparejo eléctrico, marcos y tapas de acero inoxidable, conducto de ventilación, rejillas. *Obra Eléctrica: Provisión y montaje de: pilar de energía Tarifa 2. Tableros de entrada, general de baja tensión, seccionales, para conexión de equipos. Cables de BT y para señales de sensores e instrumentos. Sistemas de iluminación.Tomas de energía. Sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.	11/12/2023	08/01/2024	100,0%	5,1%	Obra rescindida.
NA70259	RED PRIMARIA DE AGUA ALIMENTACIÓN A BARRIOS QUESADA, PACHECO Y LINDEROS	El objetivo es abastecer mediante agua proveniente de planta Juan Manuel de Rosas los barrios Quesada Pacheco y Linderos, en el partido de Malvinas Argentinas. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Instalación de cañerías de FD K7: *201 metros de DN 600 mm *240 metros de DN 400 mm Instalación de cañerías de PVC Clase 10: *137 metros de DN 355 mm *1728 metros de DN 315 mm *210 metros de DN 225 mm Ejecución de cámaras: 1 para inspección, 1 para motobomba, 6 para desagüe, 8 para v. de aire, 2 para v. mariposa Instalación de 26 válvulas esclusa de distintos diámetros. Ejecución de un empalme con retiro de tapón Ejecución de 2 cruces especiales (1 de ruta y 1 de arroyo)	27/11/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
OA70215	CENTRO DE MEZCLA MORENO I	El presente proyecto tiene como finalidad la realizacion de un centro de mezcla de agua subterranea con agua superficial en la actual Cisterna Lincoln ubicada en el Partido de Moreno. Este centro de mezcla tiene como objetivo asegurar la demanda futura de agua del radio servido actual y de nuevas areas a incorporar, y mejorar la calidad del servicio, regularizando parametros como nitratos y otros contaminantes, de manera de cumplir con el Marco Regulatorio de AySA. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Obra Electromecanica: Se deberá proveer y montar los elementos para: Nuevo ingreso de Agua de Pozos. Estación de Bombeo. Sistema de desinfección. Cisterna. Cámara de Bypass y de Caudalímetro. Sistema Antiarete. Sala de Tableros de Calidad. Equipamiento de Pozo Hipopuelche. Conexión de Pozo y de Futuro Hipopuelche e Instalaciones en General. Desmontaje de equipamiento electromecánico actual. Instalación en General. Obra Civil: Comprende de: Excavaciones y rellenos. Instalación de conductos. Demolición parcial de tabiques y construcción de tabiques en cisterna existente. Cisterna nueva. Puente grúa. Cámara de caudalímetro. Cámara de válvula. Cámara de Bypass. Cámara de caudalímetro para Bypass. Cámara de Hipopuelche. Sistema de hipoclorito de sodio. Sistema antiariete. Pavimentos, veredas y contrapisos. Edificios con: Edificio técnico - administrativo. Edificio de bombeo. Sala MT y sala para empresa de energía y Edificio eléctrico con salas para transformadores. Sala de TGBT y sala de baterías. Obras civiles para instalación eléctrica. Bloques de anclaje. Instalación sanitaria y pluvial. Obra Electrica: Se deberá proveer y montar los elementos para: Tablero de Entrada de MT. Tablero General de Baja Tensión. Tableros Seccionales. Sistema de Medición Comercial (SMEC) + Calidad de Energía. Transformador de Potencia. Pozo Hipopuelche. Edificio de Bombeo. Cables de Media y Baja Tensión. Cables de señales para sensores e instrumentos. Canalizaciones Eléctricas MTyBT. Sistema de Iluminación. TomasdeEnergía - Fuerza Motriz. Sistema de Puesta a Tierra y Proteccion Contra Descargas Atmosféricas	03/07/2023	20/07/2023	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
NA70243	CÁMARA REGULADORA GRAND BOURG III	El presente con curso tiene por objeto la instalación de un sistema de regulación, el cual incluye válvula reguladora, equipamiento complementario y ejecución de cámara, en una derivación del proyecto VA70012 Red Primaria de Agua Impulsión Grand Bourg. La cámara deberá implantarse en la calle Paso de Uspallata, esquina Cangallo, Partido de Malvinas Argentinas.	23/10/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
SC70273	IMPULSIÓN CLOACAL LA HERRADURA	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la impulsión denominada “La Herradura” para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la futura Estación de Bombeo Cloacal La Herradura, ubicada en el Partido de Lomas de Zamora. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería colectora cloacal de PVC: ●Para la impulsión 2.025m de DN315mm de Rigidez Nominal SN32 de pared compacta ●Para el colector 5m de DN400mm de Rigidez Nominal SN32 de pared compacta *Ejecución de cámaras: 9 para acceso e inspección, 3 para válvula de aire triple función, 5 para desagüe. *Ejecución de 1 boca de descarga. *Instalación de 8 válvulas esclusas de DN100mm. *Instalación de 3 válvulas de aire de triple función. *Ejecución de cruces: 1 ferroviario, 1 de arroyo, 1 de pluvial. *Ejecución de 1 empalme con BR existente de Colector Cementerio DN800mm.	21/06/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
VC70021	RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 2-DRSE	El objetivo es la ampliación de la red cloacal sobre distintas calles dentro del radio servido que carece del servicio. Características Físicas de la Obra: Partido de Avellaneda: Instalación en zanja de: - 268 m de cañería cloacal de DN 160 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. - 691 m de cañería cloacal de DN 200 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. Ejecución de conexiones cortas. Cantidad (49) Ejecución de conexiones largas. Cantidad (12) Partido de Quilmes: Instalación en zanja de: - 979 m de cañería cloacal de DN 160 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. - 3.175 m de cañería cloacal de DN 200 mm de Policloruro de Vinilo pared compacta Rigidez Nominal SN 8. Ejecución de conexiones cortas. Cantidad (47) Ejecución de conexiones largas. Cantidad (1)	22/08/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
OC70299	RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR 25 DE MAYO	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción del colector denominado “Colector 25 de Mayo” para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de las redes secundarias de los Barrios La Perla, Altos de La Torre, 25 de Mayo y Lomas de Moreno, ubicados en el Partido de Moreno. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de 1.675m de cañería colectora cloacal de PRFV DN700 Rigidez 10.000 N/m2. *Construcción de 8 bocas de registro. *Ejecución de 6 empalmes con Boca de Registro Existente. *Ejecución de 1 cruce de arroyo.	21/06/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
SA70308	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO ETAPA 2	El objetivo de la obra es la ejecución de los cierres de mallas de la red secundaria de agua mediante la instalación en zanja de cañerías de PVC en el distrito de Lomas de Zamora, dándole así mejor funcionamiento e incorporando usuarios al servicio. Longitud de cañerías instalada: Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 90 mm, longitud aproximada 6.815 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 110 mm, longitud aproximada 458 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 160 mm, longitud aproximada 1.098 m con sus correspondientes accesorios. Instalación por vereda o calzada de cañería de PVC, PN10, DN 200 mm, longitud aproximada 240 m con sus correspondientes accesorios.	29/05/2023	29/05/2023	100,0%	33,9%	Obra rescindida.
NC70212	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DON TORCUATO ESTE	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de la Estación de Bombeo Cloacal Don Torcuato Este, ubicada en un predio en el acceso al futuro Barrio San Fermín del Partido de Tigre. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS *Obra Civil: excavaciones y rellenos; obras del conducto de llegada y salida; cámara de ingreso; cámara de aspiración; cámara de válvulas; cámara de caudalímetro; sala para bomba de agua subterránea; sala para sistema de hipoclorito; bloques de anclaje; puente Grúa para retiro de bombas, para izaje de canasto y para izaje de válvulas; pavimentos, veredas y contrapisos; edificios con Sala de Tableros, Sala de Vigilancia, Baño con vestuario y Office; muro perimetral con su correspondientes portón de acceso de malla metálica romboidal; obras civiles para Instalación Eléctrica. *Obra Electromecánica: provisión y montaje de cañería de llegada; juntas de unión de amplia tolerancia; válvulas esclusas; pasa muro; sistema de retención de sólidos gruesos; 3 electrobombas sumergibles y sus repuestos; marcos y tapas de acero inoxidable desmontables; transmisor de nivel hidrostático; detector de nivel de flotante; cañerías de acero al carbono DN150; pasa muro DN150 y DN200 de acero al carbono; curvas de 90° y 45° de acero al carbono; válvulas de retención a bola; juntas de desarme autoportante DN150 y DN300; ramal TDN 200 de acero al carbono con salidas a 90° y 45°; 1 tanque anti ariete tipo AARA; transmisor de presión; 1 caudalímetro electromagnético; reducción de acero al carbono de 200 a 150mm; brida ciega de acero al carbono DN200; sistema de achique cámara de ingreso, de válvulas y de caudalímetro; 1 puente grúa; cañería para colectora de acero al carbono; conducto de ventilación de PVC; rejilla para lavado de canasto; tanque de almacenamiento de hipoclorito de sodio; bomba dosificadora de hipoclorito de sodio; 1 automático para tanque de agua incluyendo todos sus accesorios; 1 termotanque eléctrico de 30 lts. *Obra Eléctrica: provisión y montaje de pilar de energía tarifa 2; tableros de entrada de energía, general de baja tensión, seccionales, para conexión de equipos; cables de baja tensión y de señales para sensores e instrumentos; canalizaciones eléctricas; tomas de energía; sistemas de iluminación y de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas. *Ingeniería, provisión y montaje, programación y puesta en marcha de los sistemas de automatismo y control, comunicaciones y networking	10/05/2023	20/07/2023	100,0%	60,6%	Obra rescindida.

	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 | exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
SC70280	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA	El presente concurso tiene por objeto la realización de las obras de la Estación de Bombeo La Herradura,en la localidad de Fiorito del Partido de Lomas de Zamora. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS *Obra electromecánica: provisión y montaje completo de: cañerías de llegada; juntas de unión de amplia tolerancia y de desarme autoportante; válvulas esclusas y de retención a bola; pasa muros de acero al carbono; sistema de retención de sólidos; electrobombas sumergibles y repuestos; reducción de acero al carbono; transmisor de presión y de nivel hidrostático; detectores de nivel aflotante con caño camisa; curvas de acero al carbono de 90° y 45°; ramal T consalida a 90° y 45°; tanque antiariete tipo AARA; caudalímetro electromagnético; brida ciega de acero al carbono; sistemas de achique para cámaras de ingreso, de válvulas y de caudalímetro; aparejo eléctrico de elevación; marcos y tapas de acero inoxidable estancas desmontables para electrobomba, para acceso de cámara de válvula de ingreso, para camisa flotantes y controlador de nivel hidrostático, paracanasto, para acceso y válvula de cámara caudalímetro; conducto de ventilación; rejilla para lavado de canasto. *Obra civil: incluye toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y supervisión para llevar a cabo los siguientes trabajos: generales de limpieza, preparación del terreno y demolición de postes eléctricos existentes en el predio; muro perimetral; excavaciones y rellenos para conductos según zanja típica; pavimentos, veredas y carpeta de terminación; instalaciones sanitarias en general, contraincendio, pluvial general y eléctrica. Excavaciones, rellenos, trabajos misceláneos en metal y estructuras de hormigón para cámaras de ingreso, de aspiración, de válvulas y caudalímetro. Para sala de vigilancia, de vestuario y tableros: excavaciones, rellenos, mamposterías, tratamiento arquitéctonico, revoques, marmolería, contrapisos y carpetas, cubiertas, pisos y revestimientos, cielorrasos, pintura, carpintería metálica, aireacondicionado, instalaciones sanitarias y mobiliario de oficina. *Obra eléctrica: provisión y montaje del pilar de energía Tarifa2; tableros de entrada, de bornera de conexión GE, general de BT y seccionales; cables de BT y para señales de sensores e instrumentos; canalizaciones eléctricas; sistemas de iluminación, depuesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas; tomas de energía-fuerza motriz. El desmontaje del tendido aéreo de alimentación en baja tensión para planta PROMEBA.	03/04/2023	20/04/2023	100,0%	28,8%	Obra rescindida.
VC70020	OBRAS ESPECIALES ASOCIADOAS A C+T LOTE 2	El presente concurso tiene por objeto la ejecución de la Red primaria cloacal Estación Claypole Sur y Red Primaria Cloacal Burzaco 2O este en el Partido de Almirante Brown; Red Primaria Cloacal Barrio Pasco en el Partido de Quilmes, Red Primaria Cloacal Internacional Norte en el Partido de Lanús y Tramos sobre Ruta Provincial Obrero Sur resto en el Partido de Avellaneda. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Red Primaria Cloacal Estación Claypole Sur: *Instalación de cañerías de PVC :● 1.543m de DN200mm y 75m de DN315mm de rigidez nominal SN8.● 1.332m de DN315mm de rigidez nominal SN32.● 414m de DN400mm de rigidez nominal SN32. *Ejecución de 44 bocas de registro. *Ejecución de 10 bocas de acceso y ventilación. *Ejecución de 112 conexiones domiciliarias cortas. *Ejecución de 1 cruce de ruta provincial. *Ejecución de 1 empalme con BR existente DN400mm. Red Primaria Cloacal Burzaco 2 Oeste: *Instalación de cañerías de PVC :● 370m de DN200mm de rigidez nominal SN8.● 473m de DN315mm de rigidez nominal SN32. *Ejecución de 11 bocas de registro. *Ejecución de 1 boca de acceso y ventilación. *Ejecución de 25 conexiones domiciliarias cortas. *Ejecución de 1 cruce ferroviario. *Ejecución de 1 empalme con BR existente DN315mm. Red Primaria Cloacal Barrio Pasco: *Instalación de cañerías de PVC :● 1.389m de DN315mm de rigidez nominal SN8. *Ejecución de 19 bocas de registro. *Ejecución de conexiones domiciliarias: 76 cortas y 25 largas. *Ejecución de 2 empalmes con BR existente DN315mm. Red Primaria Cloacal Internacional Norte *Instalación de cañerías de PVC :● 363m de DN200mm de rigidez nominal SN8.● 391m de DN315mm y 281m de DN400mm de rigidez nominal SN32. *Instalación de cañerías de PRFV :●463m de DN500mm de rigidez 10000 PN6.	20/03/2023	20/09/2023	98,1%	7,8%	Obra rescindida.
NA70182	RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO - ZONA III, IV, V Y VI	El presente concurso tiene por objeto la interconexión de pozos existentes en el área de San Miguel Centro, que hoy están conectados con la red de agua existente para, a través de cañerías primarias, conducir el agua al Centro de Mezcla y Distribución Muñiz, ubicada en el Partido de San Miguel. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería para impulsión de de agua: ●500m de PRFV Rigidez 10000 PN10 DN500mm. ●1.653m de PRFV Rigidez 10000 PN10 DN400mm. ●2.872m de cañería de PVC Clase 10 DN315mm. ●1.200m de cañería de PVC Clase 10 DN250mm. ●946m de cañería de PVC Clase 10 DN225mm. ●1.808m de cañería de PVC Clase 10 DN160mm. *Ejecución de cámaras: 4 para desagüe, 24 para válvulas de aire, 16 para toma para motobomba, 2 para válulas mariposa y 2 para inspección. *Instalación de válvulas de distintos diámetros: 60 esclusas, 2 mariposa y 24 de aire. *Ejecución de empalmes: 2 con retiro de tapón de cañería existente, 2 con corte de cañeria e instalación de ramal y 12 con corte de cañería e instalación de empalme de tres vías. *Provisión de 2 T para cámara de inspección. *Ejecución de cruces: 1 ferroviario y 1 de ruta.	22/03/2023	30/05/2023	100,0%	45,9%	Obra rescindida.
OA688	CENTRO DE MEZCLA 2 DE ABRIL Y UDAONDO	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de construcción de una cisterna de agua de 4.200m3 para su utilización como centro de mezcla, junto con su rebombeo y sus servicios auxiliares, en el Partido de Ituzaingó. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS *Obra electromecánica: provisión y montaje completo de la Estación de bombeo; Sistema de Desinfección; Cisterna; Cámaras de Caudalímetros y Válvulas Reguladoras; Sistema Antiariete; Sala de Tableros de Calidad. *Obra civil: Excavaciones y rellenos; Instalación de conductos; Demolición y retiro de alambrado perimetral; Cisterna; Puente grúa; Cámara de caudalimetro y válvulas; Edificios: Sala de vigilancia, Edificiotécnico-administrativo, Edificio de bombeo, Sala MT y Sala para empresa de energía, Edificio eléctrico con salas para transformadores, Sala de TGBT y Sala de baterías; Sistema Hipoclorito; Cámara para sistema antiariete; Pavimentos, veredas y contrapisos; Obras civiles para instalación eléctrica; Bloques de anclaje. Instalaciones contra incendios, sanitaria y pluvial. *Obra eléctrica: provisión y montaje de Tablero de Entrada de MT - Cámara AySA; Sistema de Medición Comercial (SMEC) + Calidad de Energía; Transformador de Potencia; Tablero General de Baja Tensión, Seccionales y para Conexión de Equipos; TS: Edificio de Bombeo; Cables de MT, BT, de Señales para Sensores e Instrumentos; Canalizaciones Eléctricas MT y BT; Sistema de Iluminación, de Puesta a Tierra y Protección Contra Descargas Atmosféricas; Tomas de Energía; Grupo Electrógeno Fijo.	27/02/2023	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
NA70225	RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN Y PRIMARIAS BARRIO MONTERREY	El presente concurso tiene por objeto la contratación de los trabajos para la instalación correspondiente a cañerías de interconexiones de pozos y/o refuerzos de instalaciones existentes, incluyendo la provisión de materiales y mano de obra, equipos, herramientas y supervisión necesarias. Todos las obras se desarrollarán en el Partido de Pilar. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería de agua: ●174m de cañería de PRFV PN 10 RIGIDEZ 10.000 DN400mm. ●3.718m de cañería de PVC Clase 10 DN225mm. ●1.875m de cañería de PVC Clase 10 DN315mm. ●818m de cañería de PVC Clase 10 DN355mm. *Ejecución de cámaras: 8 para toma para motobomba, 19 para válvula de aire, 6 para desagüe, 3 para macromedición y 1 para cloración. *Instalación de válvulas de distintos diámetros: 52 esclusas y 19 de aire. *Empalmes: 6 con retiro de tapón de cañería existente y 2 con corte e instalación de ramal. *Ejecución de 1 cruce de arroyo.	09/03/2023	24/04/2023	100,0%	51,2%	Obra rescindida.
OA70223	RED PRIMARIA DE AGUA MORENO 1	El presente concurso tiene por objeto la contratación de los trabajos para la instalación correspondiente a las cañerías de la red primaria de agua Moreno 1, ubicada en el Partido de Moreno Descripcion de los trabajos: *Instalación de cañerías de PVC clase 10 : ● 2.198m de DN355mm. ● 5.332m de DN315mm. ● 4.360m de DN225mm. ● 12m de DN160mm. *Instalación de cañerías de PRFV Rigidez 10000 PN10 : ● 84m de DN900mm. ● 1.155m de DN800mm. ● 1.440m de DN700mm. ● 1.265m de DN600mm. ● 2.462m de DN500mm. ● 1.704m de DN400mm. *Ejecución de cámaras: 37 dedesagüe; 76 de aire; 39 para toma de motobomba; 9 para macromedición; 13 para válvula mariposa y 16 para cámara de inspección. *Ejecución de 35 empalmes con corte de cañería y 1 con retiro de tapón de cañería existente. *Ejecución de 222 válvulas esclusas; 13 mariposas y 76 de aire. *Ejecución de cruces: 1 cruce ferroviario; 5 de ruta; 6 pluviales y 1 de arroyo.	21/03/2023	14/06/2023	96,9%	19,3%	Obra rescindida.

aysa	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025 01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 | exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
NC70213	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BELLA VISTA 1	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras de la Estación de Bombeo Cloacal Bella Vista1, ubicada en el Partido de San Miguel. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Obra Civil: trabajos preliminares, limpieza y preparación del terreno; Excavaciones y rellenos; Obras del conducto de llegada y salida; Cámara de ingreso; Cámara de aspiración; Cámara de válvulas; Cámara de caudalímetro; Sala para bomba de agua subterránea; Sala para sistema de hipoclorito; Bloques de anclaje; Monorrieles para retiro de bombas, para izaje de canasto y para izaje de válvulas; Pavimentos, veredas y contrapisos; Edificios con: Sala de Tableros, Sala de Vigilancia, Baño con vestuario y Office y espacio reservado para grupo electrógeno; Sala para bombeo de agua subterránea, sala para sistema de hipoclorito, local para acopio de materiales; Muro perimetral con su correspondientes portón de acceso de malla metálica romboidal; Obras civiles para Instalación Eléctrica. Obra Mecánica: Provisión y Montaje de: Cañeria de llegada por gravedad; Junta de unión de amplia tolerancia PVC; Válvula Esclusa DN300mm; Pasa muro DN300mm; Sistema de retención de sólidos gruesos; Electrobombas sumergibles y repuestos; Reducción de acero al carbono de 150mm/100mm; Cañería de acero al carbono DN150mm; Pasamuro DN150mm de acero al carbono; Curva90° de acero al carbono DN150mm; Válvulas de Retención a bola; Junta de desarme auto portante DN150mm; Válvulas esclusas de cuerpo corto; RamalT; Tanque antiarete; Cañerías de acero al carbono; Brida ciega; Sistema de achique cámara de ingreso; Aparejo eléctrico de elevación de 1000Kg; Marco y tapa de acero al carbono; Cañería para colectora de acer a lcarbono DN300mm; Conducto de Ventilación de PVCDN315mm; Junta de desarme autoportante; Automatico para tanque de agua incluyendo todos sus accesorios; Termotanque electrico; Bomba dosificadora de Hipoclorito de sodio de 1,5l/h de capacidad máxima. Obra Eléctrica: Provisión y Montaje de: Pilar de energía; Tableros en general; Cables de baja tensión; Cables de señales para sensores e instrumentos; Canalizaciones eléctricas; Sistemas de iluminación; Tomas de energía; Sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.	01/02/2023	10/07/2023	100,0%	37,8%	Obra rescindida.
VA70022	RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO EL CRUCE -TRAMOS 1, 2 Y 3	El objetivo de la obra Red Primaria Refuerzo El Cruce Tramos 1,2 y 3, será reforzar el abastecimiento de agua potable a las zonas de Florencio Varela. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañerías de PRFV de rigidez nonimal 10.000 PN10:● 1.941m de DN1200mm.● 141m de DN1000mm.● 4.527m de DN700mm. *Ejecución de cámaras: 20 de desagüe, 22 de aire, 9 para válvula mariposa, 9 de inspección y 2 de caudalímetro. *Ejecución de empalmes: 4 con corte de cañería e instalación de ramal, 1 con retiro de tapón de cañería existente y 1 a instalaciones existentes. *Ejecución de 51 válvulas esclusas, 9 mariposas, 22 de aire y 2 caudalímetro electromagnético. *Ejecución de 3 cruces de ruta, 3 pluviales y 2 de cloaca máxima.	29/08/2022	-	95,4%	0,0%	Obra rescindida.
SC70105	RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR LA SALADITA	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red primaria cloacal "Colector La Saladita", ubicada en el Partido de Avellaneda. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería de PVC : 864m de DN315mm rigidez nominal SN32 de pared compacta. *Ejecución de 11 bocas de registro.	23/06/2022	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
SC70332	RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN LA SALADITA	El presente concurso tiene por objeto contratar la construcción de la red primaria cloacal "Impulsión La Saladita", ubicada en el Partido de Avellaneda. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Tramo a Presión: *Instalación de 883m de cañerías de PVC Clase 10 de DN250mm. *Ejecución de cámaras: ●1 de desagüe. ●4 de acceso e inspección. *Ejecución de 1 boca de descarga. *Instalación de 1 válvula esclusa. *Ejecución de 1 empalme con junta de amplia tolerancia. Tramo a Gravedad: *Instalación de 256m de cañerías de PVC de DN400mm y Rigidez Nominal SN32 de pared compacta. *Ejecución de 1 boca de registro. *Reacondicionamiento de cámara de la 1° Cloaca Máxima.	23/06/2022	-	100,0%	0,0%	Obra rescindida.
NA70016	RED PRIMARIA DE AGUA DON TORCUATO - ETAPA 1	El presente concurso tiene por objeto contratar la ejecución de la obra Red Primaria de Agua Don Torcuto Etapa 1, para la distribución, abastecimiento y expansión del servicio de agua potable en la zona de DonTorcuato y Talar de Pacheco, en el Partido de Tigre. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañerías de PVC clase 10: - 970m de DN355mm - 1.255m de DN315mm - 24m de DN225mm *Ejecución de cámaras: 2 de desagüe, 6 para válvula de aire y 4 para toma para motobomba. *Ejecución de 1 empalme con retiro de tapón de cañería existente. *Instalación de válvulas y cámaras: 20 esclusas de diferentes diametros, 6 de aire completa y 12 cámaras de diferentes diametros. *Ejecución de 1 empalme y 2 cruces de pluvial.	06/06/2022	20/10/2022	100,0%	52,7%	Obra rescindida.
SC70104	ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL B° LA SALADITA	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras para la construcción de la Estación de Bombeo Cloacal Bº La Saladita, en la localidad de Sarandí perteneciente al Partido de Avellaneda. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS *Obra electromecánica: provisión y montaje completo de: 2 electrobombas sumergibles; 2 válvulas de retención DN250 de tipo a bola; 6 válvulas esclusas de cuerpo corto y diferentes DN; 6 juntas de desarme autoportante; 2 juntas de amplia tolerancia; cañerías y piezas especiales; 1 tanque antiariete tipo AAPA; 1 caudalímetro electromagnético; 1 sistema de retención de sólidos; 1 rejilla de lavado de canasto; cañería de ventilación; 1 transmisor de presión; cañería de drenaje de la impulsión; 3 aparejos eléctricos para izaje, descenso y translación del canasto, electrobombas y válvulas para una capacidad mínima de 1000 Kg; 1 sistema de achique; cañería de llegada por gravedad; 11 marcos y tapas de acero inoxidable estancas desmontables; 1 pasarela acceso a tanque antiariete; 4 detectores de nivel a flotante tipo Pera Flygt. Desmontaje de: 2 electrobombas sumergibles y todos sus elementos y accesorios; y cañerías de acero de impulsión y colectora incluyendo válvulas esclusas, de retención, juntas de desarme y accesorios. *Obra civil: las obras comprenden: excavaciones y rellenos; demolición parcial de la Estación de bombeo existente; obras del conducto de llegada y del conducto de salida; cámara de ingreso, aspiración y válvulas; cámara de caudalímetro; bocas de registro; monorrieles para retiro de bombas, para izaje de canasto y para izaje de válvulas; pavimentos, veredas y contrapisos; edificios con: Sala de Tableros, Sala de Vigilancia, Baño y duchas y espacio reservado para grupo electrógeno; muro perimetral con su correspondientes fundaciones y portones de acceso de malla metálica romboidal; obras civiles para instalación eléctrica; bloques de anclaje; instalaciones contra incendios; instalación sanitaria y pluvial. *Obra eléctrica: provisión y montaje del pilar de energía; tableros de entrada, general de BT, seccionales y para conexión de equipos; cables de BT y para señales de sensores e instrumentos; canalizaciones eléctricas; sistemas de iluminación, de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas; tomas de energía -fuerza motriz.	23/05/2022	20/07/2022	100,0%	24,4%	Obra rescindida.
NA70193	RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS GRAND BOURG	El presente concurso tiene como objeto la construcción de la interconexión de pozos con el fin de mejorar la calidad de agua existente mediante la conducción hasta el centro de mezcla ubicado en Combate de San Lorenzo y Cangallo, ubicado en el Partido de Malvinas Argentinas DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañerías de PVC clase 10. ●1.973m de DN225. *Instalación de cañerías de PRFV Rigidez 10000 PN10. ● 2.145m de DN450mm. ● 827m de DN500mm *Instalación de cámaras: 7 para desagüe, 12 para válvula de aire, 4 para toma para motobomba, 2 para válvula mariposa y 1 para cámara de inspección. *Instalación de válvulas: 4 esclusas, 12 para cámara de válvula de aire, 7 para camara de desagüe, 4 para toma para motobomba, 2 válvulas mariposas y 12 válvulas de aire completa. *Ejecución de 2 empalmes, 1 provisión de T para cámara de inspección y 2 cruces de arroyo	14/02/2022	20/05/2022	100,0%	65,2%	Obra rescindida.
NA70180	RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXIÓN DE POZOS SAN MIGUEL CENTRO - ZONA I Y II	El presente concurso tiene por objeto la interconexión de pozos existentes en el área de San Miguel Centro, que hoy están conectados con la red de agua existente para, a través de cañerías primarias, conducir el agua al Centro de Mezcla y Distribución Muñiz. La zona de obra se ubica en el Partido de San Miguel. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS *Instalación de cañería de impulsión de agua de Fundición Dútcil K7 ●703m DN 400 mm *Instalación de cañería de impulsión de agua de PVC Clase 10 ●390m DN 355 mm ●683m DN 315 mm. ●1.941m DN 225 mm. ●2.457m DN 160 mm. *Ejecución de cámaras: 5 para desagüe, 20 para válvula de aire, 17 para toma para motobomba y 1 para válvula mariposa. *Instalación de válvulas de distintos diámetros: 52 esclusas, 1 mariposa y 20 de aire. *Empalmes: 2 con retiro de tapón de cañería existente, 7 con retiro de tapón de empalme de tresvías existente y 3 con corte de cañería e instalación de empalme de tres vías. *Ejecución de cruces: 2 de ferrocarril y 2 de ruta.	30/08/2021	20/10/2021	100,0%	83,2%	Obra rescindida.

	OBRAS EJECUTADAS POR VIA CONTRACTUAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025
aysa		01.3.31 ex PL 23 IAT1-O-X CONTRATO-2025 / exPL IA Nº 23

N° de P3	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras		Avance al 31/12/25		Perspectivas para el Año 2026
			Prevista	Real	Previsto	Real	
SC70274	ESTACIÓNDE BOMBEO CLOACAL MONTES DE OCA	El presente concurso tiene por objeto contratar la realización de las obras para la construcción de una estación de bombeo cloacal denominada "Estación de Bombeo Cloacal Montes de Oca", con el fin de evacuar la mayoría de los vuelcos de las redes secundarias de la zona de los Barrios Alianza, Villa Tranquila e Isla Maciel, en el Partido de Avellaneda. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Obra Civil: Trabajos preliminares: limpieza y preparación del terreno, muro perimetral; excavaciones y rellenos. Pavimentos y veredas; Instalación sanitaria general, instalación contra incendio, instalación pluvial general; hormigón; trabajos misceláneos en metal; sala de rejas; hormigón de relleno H-15, hormigón de limpieza H-35 y hormigón de estructuras H-35; mamposteía; tratamientos arquitectónicos, revoques, contrapisos y carpetas, revestimiento y carpintería metálica; marmolería; instalaciones de acondicionamiento térmico; mobiliario de oficina. Obra Mecánica: Deberán proveerse y montarse los siguientes elementos para: cañería de llegada por gravedad; sistema de achique cámara de ingreso; equipo de rejas completo; junta de unión de amplia tolerancia; pasa muro DN600mm; válvula esclusa DN600mm; electrobombas sumergibles y repuestos; cañerías de acero al carbono; válvulas de retención abola; juntas de desarme autoportante; aparejo eléctrico de elevación de 1000Kg; tanque antiarete; ramal Treducción 90°; reducción de acero al carbono; marcos y tapas de acero inoxidble; sistema de control de olores. Obra Eléctrica: Deberán proveerse y montarse los siguientes elementos para: pilar de energía; tableros eléctricos; cables y canalizaciones de baja tensión; sistemas de iluminación; tomas de energía - fuerza motriz; sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.	19/07/2021	04/10/2021	100,0%	22,8%	Obra rescindida.

aysa		**OBRAS EN EJECUCION / EJECUTADAS** **POR CONVENIO (MODALIDAD AGUA+TRABAJO)** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual 2025** **3.33-IAT1-O-A (A+T)**

N° de P3	Estado al 31.12.2025	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras	Porcentaje Avance (%) al 31/12/2025	Perspectivas para el Año 2026
				Real	Real	
SA70281	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA B° FINEXCOR M 1	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 4475 Conexiones Proyectadas 768	14/02/2023	46%	GESTION DE OPCT
SA70282	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA B° FINEXCOR M 2	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 3720 Conexiones Proyectadas 675	22/02/2023	52%	GESTION DE OPCT
SA70284	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL FORTIN / CIERRES DE MALLA FALTANTES	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 4320 Conexiones Proyectadas 293	08/05/2023	22%	GESTION DE OPCT
SA70309	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA ITATÍ NEXO MONTEVIDEO	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 352 Conexiones Proyectadas 72	06/09/2023	100%	Habilitada
NA70202	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M1	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 3985 Conexiones Proyectadas 572	19/04/2021	65%	A TRASPASAR-Depende-NA70195
NA70203	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M2	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 4520 Conexiones Proyectadas 612	18/08/2021	12%	A TRASPASAR-Depende-NA70195
NA70204	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA VILLA HIDALGO M3	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 4945 Conexiones Proyectadas 580	21/08/2023	17%	A TRASPASAR-Depende-NA70195
NA70233	Cerrada sin finalizar	TRABAJOS ESPECIALES B° VILLA HIDALGO - B° COSTA ESPERANZA - B° 8 DE MAYO	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1350 Conexiones Proyectadas 454	02/12/2022	30%	A TRASPASAR
NA70232	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA RANA	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 5890 Conexiones Proyectadas 1402	31/07/2023	17%	A TRASPASAR
NA70265	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M3	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 4355 Conexiones Proyectadas 475	09/10/2023	46%	A TRASPASAR
NA70161	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA EL ARCO MOD 3	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 3525 Conexiones Proyectadas 472	06/02/2023	64%	TRASPASADA
NA70158	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA DON TORCUATO ESTE 2	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 13520 Conexiones Proyectadas 1616	29/11/2021	94%	TRASPASADA-Depende-NA70048/NA70162
NA70215	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN JORGE SUR	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 4380 Conexiones Proyectadas 561	17/07/2023	48%	TRASPASADA-Depende- NA70198
NA70159	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR 2 - ETAPA 2 - MODULO I	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 6825 Conexiones Proyectadas 766	17/04/2023	66%	TRASPASADA-Depende-NA70048
NA70213	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR 2 - ETAPA 2 - MODULO II	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 5045 Conexiones Proyectadas 473	16/05/2023	100%	PES-Dep - NA70048
NA70052	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA DE AGUA B° EL PRADO M2, ANDALUCIA, EL ALGE II Y LA VICTORIA	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 6210 Conexiones Proyectadas 800	16/05/2023	67%	A TRASPASAR
OA931	Finalizada sin servicio	CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M1	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1157 Conexiones Proyectadas 209	28/8/2023	100%	TRANSFERIDA

aysa		**OBRAS EN EJECUCION / EJECUTADAS** **POR CONVENIO (MODALIDAD AGUA+TRABAJO)** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual 2025** **3.33-IAT1-O-A (A+T)**

N° de P3	Estado al 31.12.2025	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras	Porcentaje Avance (%) al 31/12/2025	Perspectivas para el Año 2026
				Real	Real	
NA70241	Finalizada sin servicio	FINALIZACION B° LA CHECHELA - SAN MIGUEL M1	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 5505 Conexiones Proyectadas 497	14/11/2022	100%	En Servicio

OBRAS EN EJECUCION / EJECUTADAS
POR CONVENIO (MODALIDAD CLOACA+TRABAJO)
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual 2025

3.34-IAT1-O-S (C+T)

N° de P3	Estado al 31.12.2025	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras Real	Porcentaje Avance al 31/12/2025 Real	Perspectivas para el Año 2026
SC70360	En ejecución	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M4	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 3962 Conexiones Proyectadas 568	24/2/2023	100%	En servicio
SC70371	En ejecución	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M5	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 2409 Conexiones Proyectadas 285	18/9/2023	100%	En servicio
SC70168	En ejecución	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M6	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1861 Conexiones Proyectadas 239	9/10/2023	100%	En servicio
NC70219	En ejecución	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CAVA ESTE SECTOR QUINTA DEL NIÑO	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1815 Conexiones Proyectadas 528	29/5/2023	100%	En servicio
NC70197	En ejecución	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LARRALDE M1	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 2134 Conexiones Proyectadas 129	14/2/2023	90%	A TRASPASAR
OC70291	En ejecución	RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA 2A M2	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 840 Conexiones Proyectadas 129	30/9/2024	84%	P.E.S
SC70339	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M6	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1646 Conexiones Proyectadas 141	2/5/2022	90%	A TRASPASAR
SC70350	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL OBRERO SUR RESTO M3	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 2411 Conexiones Proyectadas 204	11/9/2023	44%	A TRASPASAR
SC70253	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL TIERRA VERDE	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1524 Conexiones Proyectadas 258	21/2/2024	0%	POSIBLE GESTION OPCT
SC70385	Cerrada sin finalizar	RSC DANUBIO AZUL + SAN LORENZO	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1153 Conexiones Proyectadas 256	21/2/2024	0%	POSIBLE GESTION OPCT

OBRAS EN EJECUCION / EJECUTADAS
POR CONVENIO (MODALIDAD CLOACA+TRABAJO)
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual 2025

3.34-IAT1-O-S (C+T)

N° de P3	Estado al 31.12.2025	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras Real	Porcentaje Avance al 31/12/2025 Real	Perspectivas para el Año 2026
SC70330	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2 ETAPA M4	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1767 Conexiones Proyectadas 198	16/1/2023	78%	TRASPASADA-HAB.
SC70355	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SANTA CATALINA 2 M7	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1360 Conexiones Proyectadas 120	17/7/2023	67%	TRASPASADA-HAB.
SC70362	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SANTA CATALINA ETAPA 2 M8	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 2752 Conexiones Proyectadas 256	4/9/2023	45%	TRASPASADA
SC70375	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SANTA CATALINA ETAPA 2 M9	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 2141 Conexiones Proyectadas 227	26/2/2024	0%	A TRASPASAR-Dep SC70362
OC70266	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS POPULARES LA MATANZA ETAPA 1 AROZARENA-TUYUTI	RED SECUNDARIA CLOACAL	21/6/2021	29%	TRASPASADA
OC70284	Cerrada sin finalizar	RSC BARRIO GRAL SAN MARTÍN	RED SECUNDARIA CLOACAL	12/12/2022	5%	A TRASPASAR
OC70308	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CASTILLO 3 M3	RED SECUNDARIA CLOACAL	30/6/2023	90%	TRASPASADA-HAB.
OC70309	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CASTILLO 3 M4	RED SECUNDARIA CLOACAL	3/7/2023	92%	TRASPASADA-HAB.
SC70285	Cerrada sin finalizar	RSC INTERNACIONAL NORTE TERMINACION M1	RED SECUNDARIA CLOACAL	30/8/2021	98%	A TRASPASAR-Depende de VC70020
SC70364	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL PASCO M3	RED SECUNDARIA CLOACAL	23/8/2023	9%	TRASPASADA
NC70215	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA JOVEN M4	RED SECUNDARIA CLOACAL	26/12/2023	0%	POSIBLE GESTION OPCT

OBRAS EN EJECUCION / EJECUTADAS
POR CONVENIO (MODALIDAD CLOACA+TRABAJO)
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025


Informe Anual 2025


3.34-IAT1-O-S (C+T)

N° de P3	Estado al 31.12.2025	Denominación de la Obra	Descripción	Fecha Inicio Obras Real	Porcentaje Avance al 31/12/2025 Real	Perspectivas para el Año 2026
NC70239	Cerrada sin finalizar	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DON TORCUATO ESTE CUENCA 1 M1	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 4445 Conexiones Proyectadas 667	17/7/2024	0%	A TRASPASAR-Depende de Proyecto de colector DN315
SC70356	Finalizada sin servicio	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BROWN 1 M1	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 2437 Conexiones Proyectadas 284	11/10/2022	96%	En servicio
OC70306	Finalizada sin servicio	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CASTILLO 3 M1	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1676 Conexiones Proyectadas 195	17/5/2023	100%	Finalizada sin servicio
OC70094	Finalizada sin servicio	RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA 2A M1	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 1670 Conexiones Proyectadas 181	7/6/2021	100%	En servicio
OC70301	Finalizada sin servicio	RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO MERCADO	SECUNDARIA Material Cañería PVC Mts Cañería Proyectada 380 Conexiones Proyectadas 80	24/8/2023	100%	En servicio





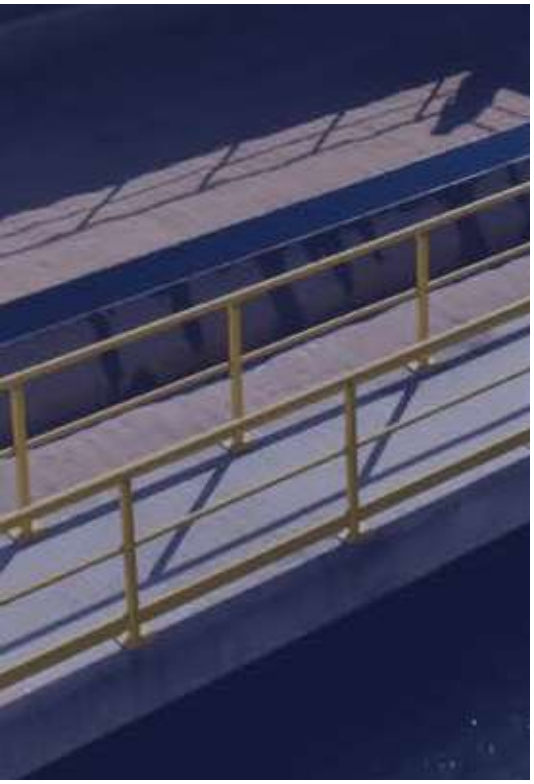

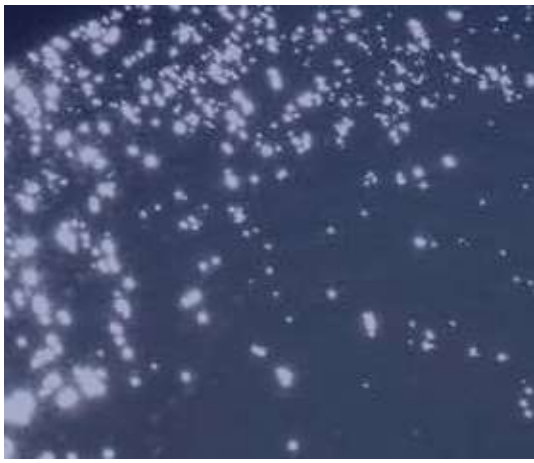INFORME ANUAL 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 1.2

aysa

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1

1 Obras Ejecutadas

TOMO 1.2

2 Mejora y Mantenimiento de Redes

3 Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos

4 Elementos Principales de la Red – Inventario

5 Certificación de Normas

6 Diagnósticos y Estudios

7 Estudios Ambientales

8 Gestión de Laboratorio

9 Desarrollo de la Comunidad

10 Plan de Prevención y Emergencias (PPE)

TOMO 2

11 Cobertura del Servicio de Agua Potable

12 Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable

13 Cartografía Expansión Agua Potable

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3

14 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales

15 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento

16 Instalaciones faltantes en la Red de Desagües Cloacales

17 Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

TOMO 4

18 Cartografía Agua Potable – Rehabilitación y Renovación

TOMO 5

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES (Planos Unificados)

19 - Rehabilitación Hidráulica.

20 - Rehabilitación Estructural.

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6

TOMO 6:

21 Aspectos Comerciales

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

21.2 Aspectos vinculados con la medición

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

21.4 Aspectos vinculados con la recaudación

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

21.6 Información adicional

22 Aspectos Económico-Financieros

22.1 a 22.5 Formatos vinculados a los Estados Contables de AySA (Tomo Apartado "Formatos Contables 2025").

22.6 Indicadores

22.7 Balance Económico Social

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1:

1 OBRAS EJECUTADAS

1.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.1.A	A) Obras en Plantas Potabilizadoras, Estaciones Elevadoras, Pozos de Agua, Rebombeos, y Plantas Tratamiento Agua Subterránea. Nuevas Áreas - Obras de Agua Potable.
	01.1.B	B) Ríos Subterráneos.
	01.1.C	C) Automatismo y Comunicaciones.
	01.1.D	D) Energía.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 02	01.1.01-IAT1-O-PRO-PS 01	PSS - Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 03	01.1.02-IAT1-O-PRO-PS 02	Pozos de Rebombeo de Agua Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 07	01.1.10-IAT1-O-A-PRO-PSM 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General San Martín.
PL IA N° 08	01.1.11-IAT1-O-A-PRO-PMB 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General Manuel Belgrano.
PL IA N° 09	01.1.13-IAT1-O-A-PRO-PJMR 01	Obras en el Establecimiento Juan Manuel de Rosas.
	01.1.21-IAT1-O-A-PRO-POI 01	Plantas Potabilizadoras de Osmosis Inversa (POI).
	01.1.23-IAT1-O-A-PRO-PII 02	Plantas Potabilizadoras de Intercambio Iónico (PII).
	01.1.24-IAT1-O-A-PRO-PAD 03	Plantas Potabilizadoras de Adsorción (PAD).
PL IA N° 11	01.1.30-IAT1-O-A-TRA-EE	Obras en Estaciones Elevadoras Paitoví, Centro, Caballito, Floresta, Devoto, Saavedra, Villa Adelina, Tres de Febrero, Morón, Matanza, Lanús y Quilmes.

1.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.2	Obras en Plantas Depuradoras, Estaciones de Bombeo, etc. Nuevas Areas - Obras de Saneamiento.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 19	01.2.20-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste.
	01.2.20A-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste II.
PL IA N° 20	01.2.21-IAT1-O-S-PRO-PDN 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Norte.
PL IA N° 21	01.2.22-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 01	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel.
	01.2.22A-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 02	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel II.
PL IA N° 21bis	01.2.23-IAT1-O-S-PRO-PDH 01	Obras en el Planta de Depuración Hurlingham.
PL IA N° 22	01.2.24-IAT1-O-S-PRO-PDBU 01	Obras en el Planta de Depuración Barrio Uno.
PL IA N° 22bis	01.2.25-IAT1-O-S-PRO-PDSC 01	Obras en el Planta de Depuración Santa Catalina.
	01.2.25.01-NA-IAT1-O-S-PRO-PDC 01	Obras en el Planta de Depuración Las Catonas.
	01.2.25.02-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFe 01	Obras en el Planta de Depuración Ferrari.
	01.2.25.03-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFV 01	Obras en el Planta de Depuración Florencio Varela.
	01.2.25.04-NA-IAT1-O-S-PRO-PDG 01	Obras en el Planta de Depuración Garín.
	01.2.25.05-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMN 01	Obras en el Planta de Depuración Merlo Norte.
	01.2.25.06-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMS 01	Obras en el Planta de Depuración Maquinista Savio.
	01.2.25.07-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPP 01	Obras en el Planta de Depuración Guernica (Pte. Perón).
	01.2.25.08-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPR 01	Obras en el Planta de Depuración Paso del Rey.
	01.2.25.09-NA-IAT1-O-S-PRO-PDBV 01	Obras en el Planta de Depuración Bella Vista.
	01.2.25.10-NA-IAT1-O-S-PRO-PDCH 01	Obras en el Planta de Depuración Champagnat
	01.2.25.11-NA-IAT1-O-S-PRO-PDESC 01	Obras en el Planta de Depuración Escobar
PL IA N° 14	01.2.26-IAT1-O-S-TRA-EB 01	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Wilde.
PL IA N° 15	01.2.27-IAT1-O-S-TRA-EB 02	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Boca-Barracas.
	01.2.28-IAT1-O-S-TRA-EB 03	Obras en Estaciones de Bombeo Centro, Norte y Sur.
	01.2.29-IAT1-O-S-TRA-EB 00	Obras en Planta Berazategui.
PL IA N° 13	01.2.30-IAT1-O-S-TRA-PLC 01	Obras en Grandes Conducciones Pluviocloacales.

1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 23	01.3.31-IAT1-O-X CONTRATO	Obras ejecutadas por vía contractual.
	01.3.33-IAT1-O-A (A+T)	Listado de Obras por convenio (A+T).
	01.3.34-IAT1-O-S (C+T)	Listado de Obras por convenio (C+T).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.2:

2 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 25	35-IAT1-O-A-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes de agua.
PL IA N° 26	36-IAT1-O-A-MyM 02	Redes de agua. Elementos de maniobra intervenidos.
PL IA N° 27	37-IAT1-O-A-MyM 03	Medidores colocados y/o intervenidos.
PL IA N° 28	38-IAT1-O-A-MyM 04	Conexiones domiciliarias de agua potable.
PL IA N° 29	39-IAT1-O-S-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes cloacales.
PL IA N° 30	40-IAT1-O-S-MyM 02	Conexiones domiciliarias de cloacas.

3 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos.
	03.2-IAT1-O-X-MyM-T 01	Mantenimiento de Grandes Equipos y Electrobombas.

4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED - INVENTARIO

4.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 31 A	42-IAT1-I-A-RED 01	Redes de Agua - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 31 B	43-IAT1-I-A-RED 02	Redes de Agua - Porcentaje por Material de cañería instalada.
	44-IAT1-I-A-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Agua.

4.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 32 A	45-IAT1-I-S-RED 01	Redes de Cloacas - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 32 B	46-IAT1-I-S-RED 02	Redes de Cloacas - Porcentajes por Material de cañería instalada.
	47-IAT1-I-S-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Desagües Cloacales.

5. CERTIFICACIÓN DE NORMAS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Laboratorios Central y de Plantas. Certificación ISO, IRAM, etc.

6 DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Diagnósticos y Estudios.

7 ESTUDIOS AMBIENTALES

Código Anterior	Código Actual	Título
		7.1 Estudios Ambientales.
		7.2 Control del Recurso.

8 GESTION DE LABORATORIO

Código Anterior	Código Actual	Título
		Gestión de Laboratorio.

9 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Código Anterior	Código Actual	Título
		Texto descriptivo de las tareas de AySA para el Desarrollo de la Comunidad.
		9.1 Anexos
		9.2 Planos

10 PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE)

Código Anterior	Código Actual	Título
		PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 2:

11. Cobertura del servicio de Agua Potable

11.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

11.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 33	48-IAT2-C-A-TRA 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Area Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A	49-IAT2-C-A-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A (Nuevas Áreas)	49-IAT2-C-A-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 34B	50-IAT2-C-A-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio de Agua Potable.
ex PL IA N° 35	51-IAT2-C-A-TRA 04	Expansión de redes de distribución de agua potable. Obras habilitadas en el año (por Partido).

12. Instalaciones Faltantes en la Red de Agua Potable

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 36	52-IAT2-C-A-RED 01	Red de Agua. Cierre de mallas faltantes (por Región y Partido).

13. Cartografía Expansión Agua

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IEADRC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IEASFE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Fernando.
	IEASIS-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Isidro.
	IEASMA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Martín.
	IEATIG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tigre.
	IEAVIC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Vicente López.
	IEAESC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Escobar.
	IEAJCP-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - José C. Paz.
	IEAMAR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Malvinas Argentinas.
	IEASMG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Miguel.
	IEAPIL-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IEAMAT-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - La Matanza.
	IEAHUR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Hurlingham.
	IEAITU-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ituzaingó.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Morón.
	IEATRE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tres de Febrero.
	IEAMER-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Merlo.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IEAALM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Almirante Brown.
	IEAEST-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Esteban Echeverría.
	IEAEZE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ezeiza.
	IEALOM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lomas de Zamora.
	IEAPPE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IEAAVE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Avellaneda.
	IEALAN-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lanús.
	IEAQLM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Quilmes.
	IEAFVA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3:

14. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales

14.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

14.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 38A	54-IAT3-C-S-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas.
	54-IAT3-C-S-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 38B	55-IAT3-C-S-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población beneficiada con obras o con servicio en trámite de habilitación.
ex PL IA N° 39	56-IAT3-C-S-TRA 04	Expansión de redes colectoras de desagües cloacales. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

15. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales según Sistema de Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 40	57-IAT3-C-S-PRO 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Area servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 41	58-IAT3-C-S-PRO 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario.
	61-IAT3-C-S-PRO 04	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 42	59-IAT3-C-S-PRO 03	Expansión de redes colectoras de Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

16. Instalaciones Faltantes en la Red de Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 43	60-IAT3-C-S-RED 01	Red de Cloacas. Colectoras faltantes (por Región y Partido).

17. Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IETDRC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IETSFE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Fernando.
	IETSIS-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Isidro.
	IETSMA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Martín.
	IETTIG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tigre.
	IETVIC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Vicente López.
	IETESC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Escobar.
	IETJCP-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - José C. Paz.
	IETMAR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Malvinas Argentinas.
	IEATMG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Miguel.
	IEATPIL-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IETMAT-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - La Matanza.
	IETCHUR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Hurlingham.
	IETITU-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ituzaingo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Morón.
	IETTRE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tres de Febrero.
	IETMER-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Merlo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IETALM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Almirante Brown.
	IETEST-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Esteban Echeverría.
	IETEZE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ezeiza.
	IETLOM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lomas de Zamora.
	IETPPE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IETAVE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Avellaneda.
	IETLAN-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lanús.
	IETQLM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Quilmes.
	IETFVA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 4:

18. CARTOGRAFÍA AGUA POTABLE (Planos de Rehabilitación y Renovación de Redes)

18.1 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRADRCF-2025	* Región Capital Federal.

18.2 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRASFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRASIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRASMA-2025	* Partido San Martín.
	IRATIG-2025	* Partido Tigre.
	IRAVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRAESC-2025	* Partido Escobar.
	IRAJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRAMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRASMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRAPIL-2025	* Partido Pilar.

18.3 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRAITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRAMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRAMOR-2025	* Partido Morón.
	IRATRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRAMER-2025	* Partido Merlo.
	IRAMOR-2025	* Partido Moreno.

18.4 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRAEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRAEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRALOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRAPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

18.5 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRALAN-2025	* Partido Lanús.
	IRAQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRAFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 5:

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES UNIFICADA (Rehabilitación Hidráulica y Estructural):

19. Rehabilitación Hidráulica.
20. Rehabilitación Estructural.

19/20.1 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCDRCF-2025	* Región Capital Federal.

19/20.2 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCSFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRCSIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRCSMA-2025	* Partido San Martín.
	IRCTIG-2025	* Partido Tigre.
	IRCVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRCESC-2025	* Partido Escobar.
	IRCJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRCMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRCSMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRCPIL-2025	* Partido Pilar.

19/20.3 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRCITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRCMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRCMOR-2025	* Partido Morón.
	IRCTRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRCMER-2025	* Partido Merlo.
	IRCMOR-2025	* Partido Moreno.

19/20.4 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRCEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRCEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRCLOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRCPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

19/20.5 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRCLAN-2025	* Partido Lanús.
	IRCQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRCFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6:

21 ASPECTOS COMERCIALES

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

Código Anterior	Código Actual	Título
300		Ingresos Año 2025.
301		Anexo de Ventas Año 2025 (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
302		Evolución de los Ingresos.
303		Emisión General y art. 34 Año 2025 - Grupos bimetrales - Ciclos completos de facturación.
304		Facturación a Consorcios del último ciclo completo de facturación. Todas las frecuencias.
305		Facturación Emisión Genereal. Ultimo ciclo completo de facturación bimestral.
307		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Capital Federal.
308		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Gran Buenos Aires.
309		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Capital Federal.
310		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Gran Buenos Aires.
311		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Capital Federal.
312		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Gran Buenos Aires.
313		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 08 - Capital Federal.
314		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - Residencial.
315		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - Residencial.
316		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - Residencial.
317		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - No Residencial.
318		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - No Residencial.
319		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - No Residencial.
320		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral - Factura Media.

21.2 Aspectos vinculados con la medición

Código Anterior	Código Actual	Título
330		Medidores cambiados e instalados en el Año 2025.
331		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 01 (Agua). Consumo del último año - Bimestralizado.
332		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 05 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
333		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
334		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 01 (Agua). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
335		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 05 (Agua y cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
336		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de Servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
337		Pérdida de Cuota Fija por mes, en cantidades de instalaciones y en Tarifa Básica Bimestral (TBB).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
306		Detalle de Unidades Funcionales.
350		Evolución del número de usuarios. Unidades funcionales.

21.4 Aspectos vinculados a la recaudación

Código Anterior	Código Actual	Título
360		Total Recaudado.
361		Ritmo de recaudación .
362		Evolución de la Recaudación y Evolución de la Recaudación por Categoría de Usuarios.

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
321		Cuentas a cobrar vencidas y a vencer al 31/12/2025 por Región, tipo de cliente, régimen y categoría de cliente.
322		Conciliación de créditos por servicios (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
370		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (por antigüedad).
371		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (con vencimientos operados por Año Contractual).
372		Impago vencido por rango de deuda al 31/12/25. Emisión por todo concepto, desagregado por Región y Grandes Usuarios.
373		Cuentas a cobrar a vencer y vencidas al 31/12/25, por Distrito y antigüedad de la deuda. Gráfico.
374		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25 por distrito, por situación comprobante y antigüedad de la deuda.
376		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25, correspondientes a ciertos Clientes fiscales. Detalle de las cuentas a cobrar originales más recargos extracontables teóricos estimados.
379		Deuda Vencida al 31/12/2025 más recargos extracontables teóricos estimados.

21.6 Información Adicional

Código Anterior	Código Actual	Título
323		Consumos de la previsión para deudores de dudoso cobro y ajustes de facturación del año 2025.
324		Cargo por corte de servicio - Intervenciones realizadas e imporetes de facturación devengados durante el año 2025.
375		Convenios de pagos.
377		Cargo por titularidad no informada año 2025.
380		Estimación de otras quitas y condonaciones de deuda extracontables otorgadas durante el Año 2025.
381		Recargos e intereses por demora de pago devengados durante el año 2025.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

22 ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS - TARIFA SOCIAL

22.1 a 22.5

Presentado en Tomo separado denominado "FORMATOS CONTABLES 2025".

22.6 Indicadores

Código Anterior	Código Actual	Título
850-851		Indicadores.
852		Benchmarking.

22.7 Balance económico social

Código Anterior	Código Actual	Título
900		Programa de tarifa social - Total.
901		Programa de tarifa social - Usuarios Residenciales.
902		Programa de tarifa social - Casos Sociales.
903		Programa de tarifa social - Instituciones sin fines de lucro.
904		Programa de tarifa social - Detalle de Usuarios Residenciales.
905		Programa de tarifa social - Detalle de Casos Sociales.
906		Programa de tarifa social - Detalle de Instituciones sin fines de lucro.
910		Plan Agua más Trabajo.
920		Programa de Barrios Carenciados - Modelo Participativo de Gestión (MPG).
930		Resumen de Expansión de Agua por Plan.
940		Resumen de Expansión de Desagües Cloacales por Plan.
950		Balance Económico Social.
970		Total de Usuarios con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
971		Total de Usuarios RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
972		Total de Usuarios NO RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
973		Total de Usuarios BALDÍOS con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.

2. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO

DE LA RED DE AGUA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

35-IAT1-O-A-MyM 01 | **ex PL IA Nº 25**

Distritos	Longitud de Cañerías Rehabilitadas (Km)					Longitud de Cañerías Renovadas (Km)					Longitud de Cañerías nuevas incorporadas como Refuerzo (Km)					Longitud Total de Trabajos de MyM (Km)	
				Total					Total					Total			
	D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	En el Año 2025	Acumulado desde el 22/03/2006	D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	En el Año 2025	Acumulado desde el 22/03/2006	D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	En el Año 2025	Acumulado desde el 22/03/2006	En el Año 2025	Acumulado desde el 22/03/2006
Caballito	2,595			2,595	27,174	0,111			0,111	18,890					1,106	2,706	47,170
Centro- Constitución	6,957			6,957	28,440	0,516	0,302		0,818	4,748	0,413			0,413	4,245	8,187	37,432
BELGRANO					44,156	0,202	0,008		0,210	25,711					12,658	0,210	82,525
DEVOTO					34,933	0,915	0,008		0,923	16,702					5,208	0,923	56,843
Constituyentes					79,089	1,117	0,016		1,133	42,413					17,866	1,133	139,368
Flores	3,685			3,685	56,558	0,460			0,460	28,750	0,154			0,154	23,133	4,299	108,441
Capital Federal	**13,237**			**13,237**	**191,262**	**2,203**	**0,318**		**2,521**	**94,800**	**0,567**			**0,567**	**46,350**	**16,325**	**332,411**
SAN FERNANDO	0,180			0,180	3,154	0,155			0,155	20,181	0,740			0,740	11,583	1,075	34,918
TIGRE	2,845			2,845	24,413	0,608			0,608	2,967	5,947			5,947	86,594	9,400	113,974
San Fernando-Tigre	3,025			3,025	27,567	0,763			0,763	23,148	6,687			6,687	98,177	10,475	148,892
San Isidro	1,678			1,678	50,163	0,365			0,365	21,014	0,818			0,818	18,108	2,861	89,285
San Martín	1,085			1,085	19,298	1,271	0,006		1,277	26,400	0,137	0,677		0,814	43,422	3,176	89,120
Vicente López	0,370			0,370	45,358	0,331			0,331	18,900	0,293			0,293	5,673	0,994	69,931
Región Norte	**6,158**			**6,158**	**142,386**	**2,730**	**0,006**		**2,736**	**89,462**	**7,936**	**0,677**		**8,613**	**165,380**	**17,507**	**397,228**
La Matanza					2,509	27,846	0,012		27,858	279,470					6,941	27,858	288,920
HURLINGHAM					0,000	0,072			0,072	5,030					5,155	0,072	10,185
ITUZAINGO					0,000		0,006		0,006	0,187					12,828	0,006	13,015
MORON	0,756			0,756	31,425	0,279			0,279	112,802					7,915	1,035	152,142
Morón	0,756			0,756	31,425	0,351	0,006		0,357	118,019					25,898	1,113	175,342
Tres de Febrero	1,015			1,015	20,874	21,933	0,006		21,939	132,511					6,331	22,954	159,716
Región Oeste	**1,771**			**1,771**	**54,808**	**50,130**	**0,024**		**50,154**	**530,001**					**39,169**	**51,925**	**623,978**
Avellaneda	1,900			1,900	42,552	18,717	0,018		18,735	140,113	1,000	0,364		1,364	39,918	21,999	222,583
Lanús		0,095		0,095	28,140	37,713			37,713	225,548	0,800			0,800	22,310	38,608	275,998
Quilmes	3,098			3,098	27,461	47,365	0,016		47,381	256,252	1,164	0,625		1,790	3,463	52,269	287,176
Región Sudeste	**4,998**	**0,095**		**5,093**	**98,153**	**103,795**	**0,034**		**103,829**	**621,913**	**2,964**	**0,989**		**3,953**	**65,690**	**112,875**	**785,757**
ALMTE. BROWN	0,310			0,310	4,050	0,930	0,039		0,969	73,749	3,786	2,420		6,206	69,084	7,484	146,882
ESTEBAN ECHEVERRIA					0,000	0,110	0,081		0,191	39,657	0,022			0,022	71,474	0,213	111,131
EZEIZA					0,000	0,006	0,010		0,016	8,755	5,460			5,460	30,767	5,476	39,522
Alte. Brown-E. Echeverría	0,310			0,310	4,050	1,046	0,130		1,176	122,160	9,267	2,420		11,687	171,324	13,173	297,535
Lomas de Zamora	0,440			0,440	19,973	14,313	0,002		14,315	92,162	0,188			0,188	42,868	14,943	155,003
Región Sudoeste	**0,750**			**0,750**	**24,023**	**15,359**	**0,132**		**15,490**	**214,322**	**9,455**	**2,420**		**11,875**	**214,193**	**28,116**	**452,538**
Red Secundaria	**26,914**	**0,095**		**27,009**	**510,631**	**174,217**	**0,513**		**174,730**	**1.550,499**	**20,922**	**4,086**		**25,008**	**530,781**	**226,747**	**2.591,911**
Red Primaria					**0,898**	**0,006**		**36,948**	**36,954**	**65,711**		**5,244**		**5,244**	**81,725**	**42,197**	**148,333**
Total Concesión	**26,914**	**0,095**		**27,009**	**511,529**	**174,223**	**0,513**	**36,948**	**211,684**	**1.616,209**	**20,922**	**9,329**		**30,252**	**612,506**	**268,944**	**2.740,244**

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO

DE LA RED DE AGUA (NUEVAS ÁREAS)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

35-IAT1-O-A-MyM 01 | **ex PL IA Nº 25**

Distritos	Longitud de Cañerías Rehabilitadas (Km)					Longitud de Cañerías Renovadas (Km)					Longitud de Cañerías nuevas incorporadas como Refuerzo (Km)					Longitud Total de Trabajos de MyM (Km)	
	D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	Total		D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	Total		D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	Total			
				En el Año 2025	Acumulado desde el 22/03/2006				En el Año 2025	Acumulado desde el 22/03/2006				En el Año 2025	Acumulado desde el 22/03/2006	En el Año 2025	Acumulado desde el 22/03/2006
SAN MIGUEL					0,000	0,080			0,080	3,344					12,054	0,080	15,398
JOSE C PAZ					0,000					3,330					4,209		7,539
MALVINAS ARGENTINAS					0,000	0,030			0,030	0,836					0,250	0,030	1,086
San Miguel-Paz-Malvinas Arg.					**0,000**	**0,110**			**0,110**	**7,510**					**16,513**	**0,110**	**24,023**
Escobar					0,050	0,077			0,077	1,352	0,406			0,406	16,037	0,483	17,439
Pilar					0,000	0,715	0,066		0,781	4,463	4,555	0,100		4,655	17,495	5,436	21,958
Total Región Norte					**0,050**	**0,902**	**0,066**		**0,968**	**13,325**	**4,961**	**0,100**		**5,061**	**50,044**	**6,029**	**63,419**
Merlo					0,000	0,609	0,012		0,621	10,962					12,317	0,621	23,279
Moreno					0,000	0,699	0,520		1,219	6,490	0,017			0,017	9,016	1,236	15,506
Total Región Oeste					**0,000**	**1,308**	**0,532**		**1,840**	**17,452**	**0,017**			**0,017**	**21,333**	**1,857**	**38,785**
Florencio Varela					0,000	0,417	0,091		0,508	5,150	4,725	6,404		11,129	59,634	11,637	64,784
Total Región Sudeste					**0,000**	**0,417**	**0,091**		**0,508**	**5,150**	**4,725**	**6,404**		**11,129**	**59,634**	**11,637**	**64,784**
Presidente Perón					0,000	0,157	0,003		0,160	0,938	3,524			3,524	15,547	3,684	16,485
Total Región Sudoeste					**0,000**	**0,157**	**0,003**		**0,160**	**0,938**	**3,524**			**3,524**	**15,547**	**3,684**	**16,485**
Red Secundaria					**0,050**	**2,784**	**0,692**		**3,476**	**36,865**	**13,228**	**6,504**		**19,732**	**146,559**	**23,207**	**183,474**
Red Primaria							**0,022**		**0,022**	**0,022**						**0,022**	**0,022**
Total Nuevas Áreas					**0,050**	**2,784**	**0,714**		**3,498**	**36,887**	**13,228**	**6,504**		**19,732**	**146,559**	**23,229**	**183,496**

	REDES DE AGUA ELEMENTOS DE MANIOBRA INTERVENIDOS Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		36-IAT1-O-A-MyM 02	ex PL IA Nº 26

DISTRITO	VALVULAS						HIDRANTES					
	Total existentes al 21/03/2006	Instalados 2006-2024	Instaladas en Año 2025	Total resultante al 31/12/2025	Renovadas en Año 2025	Renovadas desde el 22/03/2006	Total existentes al 21/03/2006	Instalados 2006-2024	Instalados en Año 2025	Total resultante al 31/12/2025	Renovados en Año 2025	Renovados desde el 22/03/2006
Caballito	5847	54		5901	37	549	4592	17		4609	119	879
Centro- Constitución	8292	322	11	8625	90	1351	4605	88		4693	128	1836
BELGRANO	6127	266		6393	57	1020	4431	63		4494	102	1453
DEVOTO	4085	46		4131	15	312	2955	21		2976	52	925
Constituyentes	10212	312		10524	72	1332	7386	84		7470	154	2378
Flores	6706	269	4	6979	61	622	3843	88	2	3933	84	1188
Capital Federal	31057	957	15	32029	260	3854	20426	277	2	20705	485	6281
SAN FERNANDO	0	43	17	60	16	33	715	17	6	738	2	15
TIGRE	0	261	36	297	22	25	967	96	22	1085	1	5
San Fernando-Tigre	0	304	53	357	38	58	1682	113	28	1823	3	20
San Isidro	5164	198	7	5369	24	202	1990	81	3	2074	10	44
San Martín	4004	348	5	4357	56	346	1601	186	1	1788		35
Vicente López	5020	155	9	5184	16	322	1207	37	7	1251	14	39
Región Norte	14188	1005	74	15267	134	928	6480	417	39	6936	27	138
La Matanza	7442	2090	2	9534	189	1238	3174	382		3556	87	343
HURLINGHAM	498	77		575		9	241	3		244		1
ITUZAINGO	243	96	1	340		6	127	7		134	1	2
MORON	3718	387		4105	6	809	1342	186		1528		157
Morón	4459	560	1	5020	6	824	1710	196		1906	1	160
Tres de Febrero	2954	188	1	3143	105	903	1084	31		1115	49	324
Región Oeste	14855	2838	4	17697	300	2965	5968	609		6577	137	827
Avellaneda	3394	566	15	3975	133	1060	1624	201	9	1834	60	392
Lanús	4000	610	18	4628	189	1021	2421	356	9	2786	135	500
Quilmes	5041	890	68	5999	405	1645	1746	377	4	2127	125	523
Región Sudeste	12435	2066	101	14602	727	3726	5791	934	22	6747	320	1415
ALMTE. BROWN	2316	689	26	3031	18	381	1120	221	9	1350	13	167
ESTEBAN ECHEVERRIA	1249	455	4	1708	3	236	405	140	2	547	6	106
EZEIZA	214	126	24	364	1	40	106	14	4	124	2	31
Alte. Brown-E. Echeverría	3779	1270	54	5103	22	657	1631	375	15	2021	21	304
Lomas de Zamora	5386	766	3	6155	83	633	2823	187	2	3012	38	339
Región Sudoeste	9165	2036	57	11258	105	1290	4454	562	17	5033	59	643
Red Secundaria	81700	8902	251	90853	1526	12763	43119	2799	80	45998	1028	9304
Red Primaria	8190	932	17	9139	14	236	44	11	3	58	1	5
Total Concesión	89890	9834	268	99992	1540	12999	43163	2810	83	46056	1029	9309

	REDES DE AGUA ELEMENTOS DE MANIOBRA INTERVENIDOS (NUEVAS AREAS) Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual Año 2025	
aysa		36-IAT1-O-A-MyM 02-Nuevas Areas	ex PL IA Nº 26

DISTRITO	VALVULAS						HIDRANTES					
	Total existentes al 21/03/2006	Instalados 2006-2024	Instaladas en Año 2025	Total resultante al 31/12/2025	Renovadas en Año 2025	Renovadas desde el 22/03/2006	Total existentes al 21/03/2006	Instalados 2006-2024	Instalados en Año 2025	Total resultante al 31/12/2025	Renovados en Año 2025	Renovados desde el 22/03/2006
SAN MIGUEL		60	6	66	23	72	0	37	2	39		2
JOSE C PAZ		13		13		39	0	5		5		6
MALVINAS ARGENTINAS		3	4	7	5	9	0	2	1	3		2
San Miguel-Paz-Malvinas Arg.		**76**	**10**	**86**	**28**	**120**	**0**	**44**	**3**	**47**		**10**
Escobar		157	7	164	14	140	0	66	5	71	8	45
Pilar		154	42	196	43	73	0	27	8	35	14	23
Total Región Norte		**387**	**59**	**446**	**85**	**333**	**0**	**137**	**16**	**153**	**22**	**78**
Merlo		117		117	29	412	0	60	2	62	1	26
Moreno		100	1	101	27	386	0	30	2	32		6
Total Región Oeste		**217**	**1**	**218**	**56**	**798**	**0**	**90**	**4**	**94**	**1**	**32**
Florencio Varela		396	112	508	20	150	0	108	15	123	2	19
Total Región Sudeste		**396**	**112**	**508**	**20**	**150**	**0**	**108**	**15**	**123**	**2**	**19**
Presidente Perón		85	18	103		70	0	22	7	29	3	53
Total Región Sudoeste		**85**	**18**	**103**		**70**	**0**	**22**	**7**	**29**	**3**	**53**
Red Secundaria		**1085**	**190**	**1275**	**161**	**1351**	**0**	**357**	**42**	**399**	**28**	**182**
Red Primaria		**49**		**49**		**8**		**2**		**2**		
Total Nuevas Áreas		**1134**	**190**	**1324**	**161**	**1359**	**0**	**359**	**42**	**401**	**28**	**182**

REDES DE AGUA

MEDIDORES COLOCADOS Y/O INTERVENIDOS

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

IAT1-O-A-MyM 03 | **Ex PL N° 27**

DISTRITO	MEDIDORES																	
	Existentes al 31/12/2024 dentro del Radio Servido			Instalación Nuevos					Parque de medidores al 31/12/2025			Renovados / Rehabilitados (1)				Intervenidos (2)			
					Año 2025 (01/01 al 31/12)														
	Residenciales	No Residenciales	Total	Acumulados al Año Anterior (N-1)	Residenciales	No Residenciales	Total	Total Nuevos al 31/12/2025	Ajustes sobre existentes	Total Año 2025 (01/01 al 31/12)	Nuevo Universo resultante	Acumulados al Año Anterior (N-1)	Ejecutadas en el período 01/01 al 31/12/2025	Total al 31/12/2025	Porcentajes existentes al 31/12/2025	Acumulados al Año Anterior (N-1)	Realizadas en el período 01/01 al 31/12/2025	Total Intervenciones al 31/12/2025	Seguimiento sobre el universo al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3]=[1+2]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5+6]	[8]=[4+7]	[9]	[10]=[7-9]	[11]=[3+10]	[12]	[13]	(14) = [12+13]	[15]=[14/3]	[16]	[17]	[18]=[16+17]	[19]=[18/3]
Caballito	10.478	13.289	**23.767**	9.854	193	116	309	10.163	-100	209	23.976	24.113	1.639	25.752	108,35%	63.849	4.317	68.166	286,81%
Centro + Constitución	12.442	19.139	**31.581**	14.221	78	246	324	14.545	-87	237	31.818	31.978	1.643	33.621	106,46%	81.178	5.727	86.905	275,18%
Constituyentes (Devoto + Belgrano)	87.790	17.381	**105.171**	33.094	18.140	849	18.989	52.083	-336	18.653	123.824	57.083	4.235	61.318	58,30%	286.332	22.303	308.635	293,46%
Flores	26.287	10.802	**37.089**	4.450	113	194	307	4.757	-53	254	37.343	34.768	3.448	38.216	103,04%	120.883	6.722	127.605	344,05%
Capital Federal	**136.997**	**60.611**	**197.608**	**61.619**	**18.524**	**1.405**	**19.929**	**81.548**	**-576**	**19.353**	**216.961**	**147.942**	**10.965**	**158.907**	**80,42%**	**552.242**	**39.069**	**591.311**	**299,23%**
Pdo. San Fernando	9.184	2.855	**12.039**	5.837	402	46	448	6.285	-28	420	12.459	10.849	1.301	12.150	100,92%	26.927	2.243	29.170	242,30%
Pdo. Tigre	11.662	3.074	**14.736**	13.427	237	96	333	13.760	-42	291	15.027	4.730	625	5.355	36,34%	19.686	2.705	22.391	151,95%
San Fernando + Tigre	20.846	5.929	**26.775**	19.264	639	142	781	20.045	-70	711	27.486	15.579	1.926	17.505	65,38%	46.613	4.948	51.561	192,57%
San Isidro	60.849	6.106	**66.955**	42.728	288	49	337	43.065	-75	262	67.217	31.821	2.855	34.676	51,79%	106.577	12.101	118.678	177,25%
San Martín	24.954	10.925	**35.879**	26.734	31.793	306	32.099	58.833	-79	32.020	67.899	18.359	4.562	22.921	63,88%	58.136	12.231	70.367	196,12%
Vicente López	55.143	7.273	**62.416**	17.702	297	31	328	18.030	-55	273	62.689	38.561	3.755	42.316	67,80%	166.902	11.284	178.186	285,48%
Total Región Norte	**161.792**	**30.233**	**192.025**	**106.428**	**33.017**	**528**	**33.545**	**139.973**	**-279**	**33.266**	**225.291**	**104.320**	**13.098**	**117.418**	**61,15%**	**378.228**	**40.564**	**418.792**	**218,09%**
La Matanza Norte	59.228	10.093	**69.321**	21.644	80	61	141	21.785	-12	129	69.450	35.543	4.871	40.414	58,30%	184.263	12.502	196.765	283,85%
La Matanza Sur	19.839	2.411	**22.250**	6.118	24	14	38	6.156	-2	36	22.286	12.797	4.682	17.479	78,56%	61.365	4.011	65.376	293,82%
La Matanza Oeste	17	83	**100**	102	0	5	5	107	0	5	105	0	5	0	0,00%	108	19	127	127,00%
Pdo. Morón	30.319	5.415	**35.734**	24.944	52	30	82	25.026	-9	73	35.807	7.715	4.887	12.602	35,27%	64.110	6.448	70.558	197,45%
Pdo. Hurlingham	108	481	**589**	549	4	12	16	565	0	16	605	81	47	128	21,73%	954	109	1.063	180,48%
Pdo. Ituzaingó	736	435	**1.171**	1.167	12	13	25	1.192	0	25	1.196	63	53	116	9,91%	1.525	215	1.740	148,59%
Morón (3)	31.163	6.331	**37.494**	26.660	68	55	123	26.783	-9	114	37.608	7.859	4.987	12.846	34,26%	66.589	6.772	73.361	195,66%
Tres de Febrero	17.858	6.664	**24.522**	8.701	39	54	93	8.794	-3	90	24.612	11.570	903	12.473	50,86%	63.544	4.430	67.974	277,20%
Total Región Oeste	**128.105**	**25.582**	**153.687**	**63.225**	**211**	**189**	**400**	**63.625**	**-26**	**374**	**154.061**	**67.774**	**15.448**	**83.222**	**54,15%**	**375.869**	**27.734**	**403.603**	**262,61%**
Pdo. Alte. Brown	11.283	2.167	**13.450**	5.029	25	17	42	5.071	-9	33	13.483	6.328	473	6.801	50,57%	33.715	2.432	36.147	268,75%
Pdo. E. Echeverría	3.180	1.434	**4.614**	1.003	7	25	32	1.035	-2	30	4.644	3.819	131	3.950	85,61%	13.262	836	14.098	305,55%
Pdo. Ezeiza	807	409	**1.216**	490	6	10	16	506	-1	15	1.231	483	18	501	41,20%	2.760	222	2.982	245,23%
Alte. Brown + E. Echeverría + Ezeiza	15.270	4.010	**19.280**	6.522	38	52	90	6.612	-12	78	19.358	10.630	622	11.252	58,36%	49.737	3.490	53.227	276,07%
Avellaneda	19.152	8.159	**27.311**	16.522	63	62	125	16.647	-26	99	27.410	13.681	1.266	14.947	54,73%	52.750	4.950	57.700	211,27%
Lanús	16.800	8.392	**25.192**	13.073	268	63	331	13.404	-27	304	25.496	16.628	992	17.620	69,94%	54.924	4.589	59.513	236,24%
Lomas de Zamora	16.372	6.658	**23.030**	9.822	108	42	150	9.972	-30	120	23.150	12.212	971	13.183	57,24%	55.895	4.179	60.074	260,85%
Quilmes	23.501	6.636	**30.137**	19.127	131	61	192	19.319	-42	150	30.287	17.051	1.991	19.042	63,18%	55.913	5.460	61.373	203,65%
Total Región Sur	**91.095**	**33.855**	**124.950**	**65.066**	**608**	**280**	**888**	**65.954**	**-137**	**751**	**125.701**	**70.202**	**5.842**	**76.044**	**60,86%**	**269.219**	**22.668**	**291.887**	**233,60%**
Total Concesión (4)	**517.989**	**150.281**	**668.270**	**296.338**	**52.360**	**2.402**	**54.762**	**351.100**	**-1.018**	**53.744**	**722.014**	**390.238**	**45.353**	**435.591**	**65,18%**	**1.575.558**	**130.035**	**1.705.593**	**255,23%**

(1) Recambios de medidores efectuados.

(2) Son casos que fueron testeados y/o que recibieron mantenimiento liviano.

(3) Distrito Morón incluye a los Partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

(4) No incluye nuevas áreas (Escobar, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, Presidente Perón, Merlo, Moreno y Florencio Varela).

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO
DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025

38-IAT1-O-A-MyM 04 | **ex PL IA Nº 28**

DISTRITO	Renovadas // Rehabilitadas		Intervenidas	
	Trabajos realizados en 2025	Acumulado al 31/12/2025	Intervenciones realizadas en 2025	Acumulado al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3]	[4]
Caballito	802	22.007	33.531	412.610
Centro- Constitución	1.582	33.899	30.730	437.140
Belgrano	1.330	25.120	37.439	392.898
Devoto	720	15.028	31.875	346.027
Constituyentes	2.050	40.148	69.314	738.925
Flores	1.361	17.966	37.596	472.991
Capital Federal	**5.795**	**114.020**	**171.171**	**2.061.666**
Pdo. San Fernando	526	14.889	3.573	167.378
Pdo. Tigre	499	12.596	6.290	242.707
San Fernando-Tigre	1.025	27.485	9.863	410.085
San Isidro	815	16.440	7.245	299.892
San Martín	1.298	33.579	7.418	404.667
Vicente López	1.067	19.552	6.015	296.513
Total Región Norte	**4.205**	**97.056**	**30.541**	**1.411.157**
La Matanza	3.896	31.082	41.032	745.025
Pdo. Morón	452	13.180	13.489	1.559.057
Pdo. Hurlingham	161	1.367	2.199	34.315
Pdo. Ituzaingó	83	879	1.993	29.162
Morón	696	15.426	17.681	1.622.534
Tres de Febrero	3.380	16.824	13.717	256.568
Total Región Oeste	**7.972**	**63.332**	**72.430**	**2.624.127**
Avellaneda	3.050	46.888	5.198	137.986
Lanús	1.284	31.749	6.051	168.422
Quilmes	6.991	58.774	6.746	200.707
Total Región Sudeste	**11.325**	**137.411**	**17.995**	**507.115**
Pdo. Alte Brown	816	15.169	11.145	147.142
Pdo. E. Echeverría	568	11.480	7.673	119.304
Pdo Ezeiza	149	2.897	3.242	52.195
Alte. Brown-E. Echeverría	1.533	29.546	22.060	318.641
Lomas de Zamora	3.153	33.437	17.306	288.711
Total Región Sudoeste	**4.686**	**62.983**	**39.366**	**607.352**
Total Concesión	**33.983**	**474.802**	**331.503**	**7.211.417**

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO
DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA - NUEVAS JURISDICCIONES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025

38-IAT1-O-A-MyM 04 | **ex PL IA Nº 28**

DISTRITO	Renovadas // Rehabilitadas		Intervenidas	
	Trabajos realizados en 2025	Acumulado al 31/12/2025	Intervenciones realizadas en 2025	Acumulado al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3]	[4]
San Miguel		*9909*	*2358*	*84809*
José C. Paz		*586*	*399*	*10557*
Malvinas Argentinas		*1297*	*954*	*17848*
San Miguel-JCPaz-M.Arg.	883	12.675	3.711	113.214
Escobar	395	8.212	1.578	68.831
Pilar	386	4.978	4.704	120.325
Total Región Norte	**1.664**	**25.865**	**9.993**	**302.370**
Merlo	827	12.771	6.289	85.744
Moreno	622	9.052	7.196	92.788
Total Región Oeste	**1.449**	**21.823**	**13.485**	**178.532**
Florencio Varela	1.699	11.915	4.189	42.008
Total Región Sudeste	**1.699**	**11.915**	**4.189**	**42.008**
Pres. Perón	413	6.594	2.002	24.461
Total Región Sudoeste	**413**	**6.594**	**2.002**	**24.461**
Total Nuevas Áreas	**5.225**	**57.548**	**29.669**	**520.810**

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO

DE LA RED CLOACAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

39-IAT1-O-S-MyM 01 | **ex PL IA Nº 29**

Distritos	Rehabilitación Hidráulica						Rehabilitación Estructural/Renovación												Total Cañerías Rehabilitadas + Renovadas en el Año 2025
	Longitud de Cañerías Rastreadas (km) (1)						Longitud de Cañerías Rehabilitadas (Km) (1)						Longitud de Cañerías Renovadas (Km) (1)						
	D° < =150 MM	D° 151 a 300 MM	D° > 300 MM	En el año 2025	Acumulado al 2024	Acumulado al 2025	D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	En el año 2025	Acumulado al 2024	Acumulado al 2025	D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	En el año 2025	Acumulado al 2024	Acumulado al 2025	
Caballito	6,260	140,642	0,390	147,292	1.641,245	1.788,537					0,000	0,000	7,280	0,230		7,511	111,992	119,503	7,511
Centro- Constitución	14,580	171,613		186,193	1.829,321	2.015,514					0,554	0,554	3,348	1,134		4,483	233,371	237,854	4,483
BELGRANO	111,255	4,845		116,100	1.856,426	1.972,526					0,000	0,000	5,310	0,204		5,514	150,008	155,522	5,514
DEVOTO	28,060	2,470		30,530	1.026,964	1.057,494					0,000	0,000	6,715	1,212		7,927	77,214	85,141	7,927
Constituyentes	139,315	7,315		146,630	2.883,390	3.030,020					0,000	0,000	12,025	1,416		13,440	227,222	240,662	13,440
Flores	143,700	2,030	0,260	145,990	3.394,187	3.540,177					0,000	0,000	9,374	0,201		9,576	194,621	204,197	9,576
Capital Federal	**303,855**	**321,600**	**0,650**	**626,105**	**9.748,143**	**10.374,248**					**0,554**	**0,554**	**32,027**	**2,982**		**35,009**	**767,206**	**802,215**	**35,009**
SAN FERNANDO	30,925	42,240		73,165	495,934	569,099					2,187	2,187	0,802	0,621		1,423	9,869	11,292	1,423
TIGRE	30,055	23,105		53,160	363,313	416,473					0,000	0,000	1,496			1,496	3,825	5,321	1,496
San Fernando-Tigre	60,980	65,345		126,325	859,247	985,572					2,187	2,187	2,298	0,621		2,919	13,694	16,613	2,919
San Isidro	43,605	11,045		54,650	1.104,261	1.158,911					4,898	4,898	4,307	0,228		4,535	43,762	48,297	4,535
San Martín	82,570	3,940		86,510	1.681,763	1.768,273					2,524	2,524	10,088	0,207		10,295	40,707	51,002	10,295
Vicente López	67,757	25,480	0,860	94,097	2.158,639	2.252,736					6,430	6,430	6,290	0,523		6,813	99,705	106,518	6,813
Región Norte	**254,912**	**105,810**	**0,860**	**361,582**	**5.803,910**	**6.165,492**					**16,039**	**16,039**	**22,983**	**1,580**		**24,563**	**197,868**	**222,431**	**24,563**
La Matanza	325,518	76,613		402,131	5.808,131	6.210,262					0,000	0,000	10,058	0,814		10,872	317,539	328,411	10,872
HURLINGHAM		14,416		14,416	59,676	74,092					0,000	0,000	0,249			0,249	19,861	20,110	0,249
ITUZAINGO		13,263		13,263	56,748	70,011					0,000	0,000	0,487			0,487	22,989	23,476	0,487
MORON	107,512	10,668		118,180	1.836,290	1.954,470					0,000	0,000	2,052	0,110		2,162	96,433	98,595	2,162
Morón	107,512	38,347		145,859	1.952,714	2.098,573					0,000	0,000	2,787	0,110		2,898	139,283	142,181	2,898
Tres de Febrero	159,312	33,274	1,376	193,962	2.966,481	3.160,443					0,000	0,000	3,472	0,110		3,582	116,504	120,086	3,582
Región Oeste	**592,342**	**148,234**	**1,376**	**741,952**	**10.727,326**	**11.469,278**					**0,000**	**0,000**	**16,317**	**1,035**		**17,351**	**573,326**	**590,677**	**17,351**
Avellaneda	24,560	72,720	2,330	99,610	1.802,820	1.902,430					0,000	0,000	6,758	0,879		7,637	83,337	90,974	7,637
Lanús	44,740	67,155	1,385	113,280	1.688,868	1.802,148					0,127	0,127	2,953	0,395		3,349	44,651	48,000	3,349
Quilmes	40,020	64,340	3,800	108,160	2.362,765	2.470,925					0,657	0,657	7,958	0,362		8,319	88,001	96,320	8,319
Región Sudeste	**109,320**	**204,215**	**7,515**	**321,050**	**5.854,453**	**6.175,503**					**0,784**	**0,784**	**17,669**	**1,636**		**19,305**	**215,989**	**235,294**	**19,305**
ALMTE. BROWN	43,938	27,302	0,465	71,705	782,001	853,706					0,000	0,000	1,552	2,433		3,985	39,919	43,904	3,985
ESTEBAN ECHEVERRIA	11,275	4,289		15,564	388,297	403,861					0,000	0,000	1,806	0,258		2,064	27,581	29,645	2,064
EZEIZA		14,630		14,630	120,968	135,598					0,000	0,000	0,092	2,003		2,095	13,787	15,882	2,095
Alte. Brown-E. Echeverría	55,213	46,221	0,465	101,899	1.291,266	1.393,165					0,000	0,000	3,449	4,694		8,143	81,287	89,430	8,143
Lomas de Zamora	108,320	53,098		161,418	1.398,796	1.560,214					0,000	0,000	3,477	1,987		5,464	70,368	75,832	5,464
Región Sudoeste	**163,533**	**99,319**	**0,465**	**263,317**	**2.690,1**	**2.953,4**					**0,000**	**0,000**	**6,926**	**6,681**		**13,607**	**151,655**	**165,262**	**13,607**
Red Secundaria	**1.423,962**	**879,178**	**10,866**	**2.314,006**	**34.823,9**	**37.137,9**					**17,377**	**17,377**	**95,921**	**13,913**		**109,835**	**1.906,044**	**2.015,879**	**109,835**
Red Primaria	**0,380**	**2,406**	**37,185**	**39,971**	**349,5**	**389,5**					**45,887**	**45,887**		**0,087**	**3,048**	**3,135**	**113,264**	**116,399**	**3,135**
Total Concesión	**1.424,342**	**881,584**	**48,051**	**2.353,977**	**35.173,4**	**37.527,4**					**63,264**	**63,264**	**95,921**	**14,000**	**3,048**	**112,970**	**2.019,308**	**2.132,278**	**112,970**

(1) La longitud de red rehabilitada/renovada se calcula según el concepto definido en la resolución 118 del ETOSS (distancia entre bocas de registro).

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO

DE LA RED CLOACAL (NUEVAS ÁREAS)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

39-IAT1-O-S-MyM 01 (Nuevas Áreas) | **ex PL IA Nº 29**

Distritos	Rehabilitación Hidráulica						Rehabilitación Estructural/Renovación												Total Cañerías Rehabilitadas + Renovadas en el Año 2025
	Longitud de Cañerías Rastreadas (km) (1)						Longitud de Cañerías Rehabilitadas (Km) (1)						Longitud de Cañerías Renovadas (Km) (1)						
	D° < =150 MM	D° 151 a 300 MM	D° > 300 MM	En el año 2025	Acumulado al 2024	Acumulado al 2025	D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	En el año 2025	Acumulado al 2024	Acumulado al 2025	D° < 250 MM	D° 250 a 500 MM	D° > 500 MM	En el año 2025	Acumulado al 2024	Acumulado al 2025	
SAN MIGUEL	47,525	1,405		48,930	365,120	414,050					0,000	0,000	11,911			11,911	10,144	22,055	11,911
JOSE C PAZ					0	0					0	0					0	0	
MALVINAS ARGENTINAS					0	0					0	0					0	0	
San Miguel-Paz-Malvinas A	**47,525**	**1,405**		**48,930**	**365,120**	**414,050**					**0,000**	**0,000**	**11,911**			**11,911**	**10,144**	**22,055**	**11,911**
Escobar	32,805	19,055		51,860	216,937	268,797					0,000	0,000	0,879			0,879	0,000	0,879	0,879
Pilar		46,485		46,485	229,142	275,627					0,000	0,000	3,656	0,267		3,923	5,641	9,564	3,923
Total Región Norte	**80,33**	**66,945**		**147,275**	**811,199**	**958,474**					**0,000**	**0,000**	**16,447**	**0,267**		**16,714**	**15,785**	**32,499**	**16,714**
Merlo	15,375	33,060	1,875	50,310	571,925	622,235					0,000	0,000	1,159			1,159	22,938	24,097	1,159
Moreno	36,692	54,165		90,857	529,634	620,491					0,000	0,000	1,286	0,685		1,971	26,441	28,412	1,971
Total Región Oeste	**52,067**	**87,225**	**1,875**	**141,167**	**1.101,559**	**1.242,726**					**0,000**	**0,000**	**2,445**	**0,685**		**3,130**	**49,379**	**52,509**	**3,130**
Florencio Varela*	34,090	86,175	0,580	120,845	580,144	700,989					0,802	0,802	4,378	0,106		4,484	21,698	26,182	4,484
Total Región Sudeste	**34,090**	**86,175**	**0,580**	**120,845**	**580,144**	**700,989**					**0,802**	**0,802**	**4,378**	**0,106**		**4,484**	**21,698**	**26,182**	**4,484**
Presidente Perón		0,975		0,975	16,967	17,942					0,000	0,000	0,096			0,096	6,174	6,270	0,096
Total Región Sudoeste		**0,975**		**0,975**	**16,967**	**17,942**					**0,000**	**0,000**	**0,096**			**0,096**	**6,174**	**6,270**	**0,096**
Red Secundaria	**166,487**	**241,320**	**2,455**	**410,262**	**2.509,869**	**2.920,131**					**0,802**	**0,802**	**23,366**	**1,058**		**24,424**	**93,036**	**117,460**	**24,424**
Red Primaria		**10,680**		**10,680**	**69,384**	**80,064**					**0,000**	**0,000**	**0,115**			**0,115**	**4,642**	**4,757**	**0,115**
Total Nuevas Áreas	**166,487**	**252,000**	**2,455**	**420,942**	**2.579,253**	**3.000,195**					**0,802**	**0,802**	**23,481**	**1,058**		**24,539**	**97,678**	**122,217**	**24,539**

(1) La longitud de red rehabilitada/renovada se calcula según el concepto definido en la resolución 118 del ETOSS (distancia entre bocas de registro).

aysa

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO
DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025

40-IAT1-O-S-MyM 02 | **ex PL IA Nº 30**

DISTRITO	Renovadas // Rehabilitadas		Intervenidas	
	Trabajos realizados en Año 2025	Acumulado al 31/12/2025	Intervenciones realizadas en Año 2025	Acumulado al 31/12/2025
	[1]	[2] *	[3]	[4] *
Caballito	156	2.707	5.425	150.432
Centro- Constitución	31	1.712	6298	235.113
Belgrano	140	4.329	5.977	166.631
Devoto	97	4.240	3.837	120.295
Constituyentes	237	8.569	9.814	286.926
Flores	91	2.625	7.898	262.524
Capital Federal	**515**	**15.613**	**29.435**	**934.995**
Pdo. San Fernando	46	1.238	229	46.016
Pdo. Tigre	48	1.270	389	28.895
San Fernando-Tigre**	94	2.508	618	74.911
San Isidro	112	2.669	657	72.540
San Martín	157	3.173	425	115.234
Vicente López	215	4.227	777	180.221
Total Región Norte	**578**	**12.577**	**2.477**	**442.906**
La Matanza	472	10.710	18.056	379.581
Pdo. Morón	221	2.763	4.186	111.030
Pdo. Hurlingham	75	197	649	7.172
Pdo. Ituzaingó	28	190	787	8.913
Morón	324	3.150	5.622	127.115
Tres de Febrero	118	2.814	6.974	184.844
Total Región Oeste	**578**	**16.674**	**66.688**	**691.540**
Avellaneda	92	2.313	5.570	105.413
Lanús	41	825	4.638	70.443
Quilmes	105	1.986	6.974	129.570
Total Región Sudeste	**238**	**5.124**	**17.182**	**305.426**
Pdo. Alte Brown	45	2.014	2.289	39.531
Pdo. E. Echeverría	32	924	1.966	29.059
Pdo Ezeiza	11	376	801	13.026
Alte. Brown-E. Echeverría	88	3.314	5.056	81.616
Lomas de Zamora	42	1.970	3.169	79.480
Total Región Sudoeste	**130**	**5.284**	**8.225**	**161.096**
Total Concesión	**2.039**	**50.386**	**124.007**	**2.535.963**

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO OPERATIVO
DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS - NUEVAS JURISDICCIONES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025

40-IAT1-O-S-MyM 02-Nuevas Áreas | **ex PL IA Nº 30**

DISTRITO	Renovadas // Rehabilitadas		Intervenidas	
	Trabajos realizados en 2025	Acumulado al 31/12/2025	Intervenciones realizadas en 2025	Acumulado al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3]	[4]
San Miguel		*1320*	*341*	*20333*
José C. Paz		*2*	*0*	*23*
Malvinas Argentinas		*0*	*0*	*18*
San Miguel-JCPaz-M.Arg.	102	1.424	341	20.374
Escobar	31	556	99	9.218
Pilar	29	379	166	12.710
Total Región Norte	**162**	**2.359**	**606**	**42.302**
Merlo	28	412	1.794	26.386
Moreno	73	1.042	1.865	28.256
Total Región Oeste	**101**	**1.454**	**3.659**	**54.642**
Florencio Varela	40	493	2.906	22.326
Total Región Sudeste	**40**	**493**	**2.906**	**22.326**
Pres. Perón	5	196	487	5.203
Total Región Sudoeste	**5**	**196**	**487**	**5.203**
Total Nuevas Áreas	**308**	**4.502**	**7.658**	**124.473**

3. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

3. Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos

3.1 Disponibilidad de Grandes Equipos en Plantas de Agua y Saneamiento

Los trabajos de mantenimiento y reparación han permitido disponer del 96,08 % de los 254 "Equipos Críticos" (Agua y Saneamiento con potencias mayores a 200 kW)

Indicadores de Disponibilidad y Confiabilidad de Grandes Equipos de Agua y Saneamiento - Año 2024		
Mes	**Disponibilidad**	**Confiabilidad**
Enero	96,23%	84,64 %
Febrero	96,38 %	80,80%
Marzo	96,52 %	80,92%
Abril	96,66 %	81,06 %
Mayo	96,76 %	81,23 %
Junio	96,86 %	81,27 %
Julio	97,00 %	81,40 %
Agosto	97,04 %	81,43 %
Septiembre	97,04 %	81,43 %
Octubre	96,97 %	81,33 %
Noviembre	97,04 %	81,35 %
Diciembre	97,09 %	81,38 %
Promedio Anual	**96,08 %**	**81,19 %**

Criterios de Aceptación:

- Disponibilidad: ≥ 92 %
- Confiabilidad: ≥ 78%

3.2. Reparación de Electrobombas de Agua Pozos Semisurgentes

En el transcurso del año 2025, la Dirección de Mantenimiento y Talleres se ha encargado de los trabajos de reparación de equipos (entre 5 y 100 kW) para agua potable, según se muestra a continuación:

Reparación de Electrobombas de Pozo Profundo Año 2025		
Mes	Cant. Ingresadas	Cant. Reparadas
Enero	26	17
Febrero	38	17
Marzo	43	18
Abril	11	29
Mayo	18	19
Junio	17	18
Julio	48	11
Agosto	39	45
Septiembre	15	68
Octubre	37	33
Noviembre	37	40
Diciembre	28	29
Total	**357**	**344**

3.3. Reparación de Electrobombas Cloacales

En el transcurso del año 2025, la Dirección de Mantenimiento y Talleres se ha encargado de los trabajos de reparación de equipos (entre 5 y 200 kW) para líquidos cloacales, según se muestra a continuación:

Reparación de Electrobombas Estaciones de Bombeo Cloacal Año 2025		
Mes	Cant. Ingresadas	Cant. Reparadas
Enero	14	11
Febrero	23	6
Marzo	16	22
Abril	19	25
Mayo	5	22
Junio	41	17
Julio	25	16
Agosto	55	25
Septiembre	26	32
Octubre	16	27
Noviembre	29	15
Diciembre	22	15
Total	**291**	**233**

aysa	MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS Y ELECTROBOMBAS Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2025	Informe Anual 2025 03.2 IAT1-O-X-MyM-T 01 | DMyT

DESCRIPCION	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2025
PLANTA SAN MARTIN (Agua Cruda)			
Bomba N° 4 Horizontal Act: 2323	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Motor N° 4 Act: 2322	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
Bomba N° 7 Act: 11030	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
Motor N° 7 Act: 12822	Mantenimiento Correctivo (2).	100	
Bomba N° 7 Act: 11030	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Motor N° 7 Act: 12822	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
PLANTA SAN MARTIN (Impelentes)			
Motor N° 3 Act 2445	Mantenimiento Correctivo (2).	100	
Bomba N°4 Act: 2452	Mantenimiento Preventivo (1).	80	Fecha estimada. Enero 2026
Motor N°4 Act: 2451	Mantenimiento Preventivo (2).	80	Fecha estimada. Enero 2026
Bomba Nº10 Act: 2486	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Bomba Nº10 Act: 2486	Mantenimiento Preventivo (1).	50	Fecha estimada. Abril 2026
PLANTA M. BELGRANO (Agua Cruda)			
Bomba N°3 Act: 3659	Mantenimiento Preventivo (1).	50	Fecha estimada. Febrero 2026
Bomba N°5 Act: 3663	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Motor N°6 Act: 3668	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
BERNAL IV			
Bomba N°2 Act: 30513	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Motor N°2 Act: 30521	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
Bomba N°3 Act: 30514	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
PLANTA J. M. Rosas R9			
Bomba N°7 Act: 10047	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
E.E. 3 DE FEBRERO			
Bomba N°3 Act: 5052	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Bomba N°3 Act: 5052	Mantenimiento Correctivo (1).	80	Fecha estimada. Enero 2026
E.E. MORON			
Bomba N°4 Act: 5058	Mantenimiento Preventivo Programado (1).	100	
Bomba N°6 Act: 5056	Mantenimiento Preventivo Programado (1).	100	
Bomba N°6 Act: 5052	Mantenimietno correctivo (1)	100	
E.E. QUILMES			
Bomba N°2 Act: 5085	Mantenimiento Preventivo Programado (1).	100	
Bomba N°3 Act: 5087	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
E.E. LANUS			
Bomba N°4 Act: 5018	Mantenimiento Preventivo Programado (1).	100	
Motor N°4 Act: 5017	Mantenimiento Preventivo Programado (2).	100	
Bomba N°6 Act: 5022	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Bomba N°6 Act: 5022	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
E.E. MATANZA			
Motor N°5 Act: 5040	Mantenimiento preventivo (2).	100	
E.E. SAAVEDRA			
Motor N°1 Act: 5098	Mantenimiento Correctivo (2)	100	
Motor N°2 Act: 5108	Mantenimiento Preventivo (2).	80	Fecha estimada. Marzo 2026
Motor N°5 Act: 5100	Mantenimiento Preventivo (2)	100	
E.E. FLORESTA			
Bomba N° 2 Act: 47617	Instalacion bomba Ruhrpumpen VCT 38WX	100	
Bomba N° 2 Act: 47617	Mantenimiento Correctivo (1).	80	Fecha estimada. Mayo 2026
BombaN° 5 Act: 45192	Instalacion bomba Ruhrpumpen VCT 38WX	100	
BombaN° 5 Act: 45193	Instalacion motor WEG MGP 500D	100	
E.E. VILLA ADELINA			
Motor N° 1 Act: 5137	Mantenimiento Preventivo (2)	100	
Motor N° 4 Act: 5139	Mantenimiento correctivo (2)	80	Fecha estimada. Abril 2026
Bomba N°5 Act: 5040	Mantenimiento Preventivo (1)	100	
Motor N° 6 Act: 5141	Mantenimiento Preventivo (2)	100	
E.E. Caballito			
Motor N° 1 Act: 45061	Instalacion de motor WEG MGP560 (2)	100	
E.E. CONSTITUCION			
Motor N° 4 Act: 4936	Mantenimiento Preventivo (2)	100	Fecha estimada Abril 2026
E.E. DEVOTO			
Bomba N° 3 Act: 4937	Mantenimiento Preventivo Programado (1).	100	
Motor N° 3 Act: 4907	Mantenimiento Preventivo (2)	100	
REBOMBEO TEMPERLEY			
Bomba N° 2 Act: 13333	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
E.E. VILLA ADELINA I			
Motor N° 5 Horizontal Act: 13490	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
Bomba N° 6 Horizontal Act: 13501	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
Bomba N° 6 Vertical Act: 13311	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
E.E. VILLA ADELINA II			
Motor N° 2 Horizontal Act: 13310	Mantenimiento Correctivo (2).	100	
REBOMBEO C.D MATANZA			

	MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS Y ELECTROBOMBAS Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2025	Informe Anual 2025	
aysa		03.2 IAT1-O-X-MyM-T 01	DMyT

DESCRIPCION	TAREAS REALIZADAS	AVANCE %	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2025
Bomba N° 2 Act: 13350	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
REBOMBEO BENQUEZ			
Motor N° 1 Act: 7441	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
REBOMBEO MUÑIZ			
Bomba N°1 Act: 27900	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Motor N°1 Act: 27942	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
Bomba N°1 Act: 27900	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
REBOMBEO LA GUARIDA			
Bomba N° 3 Act: 35562	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
REBOMBEO CRUCE VARELA			
Bomba N°2 Act: 27947	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
REBOMBEO SARMIENTO			
Bomba N°1 Act: 27219	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
Bomba N°1 Act: 27219	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
Bomba N°2 Act: 27221	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Bomba N°4 Act: 7244	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Motor N°4 Act: 32869	Mantenimiento Preventivo Planificado (2).	100	
REBOMBEO 9 DE ABRIL OSMOSIS			
	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
PLANTA WILDE (Sala III)			
Bomba N°3 Act: 5630	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
PLANTA WILDE (Sala IV)			
Bomba N°1 Act: 5640	Mantenimiento Preventivo Programdo (1).	100	
Bomba N°2 Act: 5642	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Bomba N°3 Act:13251	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Bomba N°3 Act:13251	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
Bomba N°3 Act:13251	Mantenimiento Correctivo (1).	50	Fecha estimada. Febrero 2026
Bomba N°5 Act:5636	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
E.B. BOCA-BARRACAS			
Bomba N°2 Act: 5649	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Motor N°4 Act: 5654	Mantenimiento Preventivo Programado (2).	100	
PLANTA NORTE			
Bomba N°3 Act: 11606	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
Motor N°3 Act: 27380	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
Motor N°3 Act: 27380	Mantenimiento Correctivo (2).	100	
Motor N°4 Act: 11605	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
PLANTA SUDOESTE Mod 1			
Bomba N°2 Act: 28104	Mantenimiento Preventivo Programado (1).	60	Fecha estimada. Marzo 2026
PLANTA SUDOESTE Mod 2			
Bomba N°2 Act: 15338	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
MERLO NORTE			
Bomba N°2 Act: 29864	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Bomba N°4 Act: 45399	Instalacion Electrobomba FLYGT 30Kw Modelo 3202.180	100	
Bomba N°6 Act: 29863	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
Motor N°6 Act: 42273	Mantenimiento Correctivo (2).	100	
Bomba N°7 Act: 29866	Mantenimiento Preventivo (1).	50	Fecha estimada. Junio 2026
BERAZATEGUI			
Motor N°1 Act: 10436	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
Reductor N°2 Act: 10415	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Tornillo Nº5 Act: 10435	Mantenimiento Correctivo (1).	100	
Reductor N°5 Act: 45864	Mantenimiento Preventivo (1).	100	
Motor N°6 Act: 10421	Mantenimiento Preventivo (2).	100	
Tornillo Nº7 Act: 10449	Mantenimiento Preventivo Programado (1).	30	Fecha estimada. Junio 2026
Reductor N°5 Act: 45780	Mantenimiento Preventivo (1).	100	

Mantenimiento Integral (1)	**Cambio de Impulsor, Rodamientos, Bujes, Transmisión. Arenado y Pintado.**
Mantenimiento Integral (2)	**Cambio de Rodamientos, Medición de Tolerancias, Lavado y Secado. Ensayos Eléctricos.**

4. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED – INVENTARIO

4.1.AGUA POTABLE

REDES DE AGUA

LONGITUD CARTOGRAFICA POR DIAMETROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Informe Anual

Año 2025

4.1.42-IAT1-I-A-RED (| **ex PL IA Nº 31A**

Distrito	Longitud (km) de cañerías de agua según diámetro (mm)																	Ríos Subterráneos	Total por Jurisdicción (km)
	Red Distribuidora							Distrib. y Maestras				Cañerías Maestras							
	Indefinido	≤75	>75 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤200	>200 ≤250	SUBTOTAL	>250 ≤300	>300 ≤400	>400 ≤450	SUBTOTAL	>450 ≤600	>600 ≤800	>800 ≤1000	>1000 ≤1500	>1500 ≤2100	SUBTOTAL		
Caballito	0,138	5,441	289,155	471,261	46,793	38,749	**851,537**	33,044	51,497	10,258	**61,755**	9,566	2,696	10,829	42,626		**65,716**	**13,270**	**992,278**
Centro- Constitución	0,863	27,586	272,451	507,548	60,319	61,693	**930,460**	41,768	69,303	9,493	**78,796**	37,242	23,120	25,795	17,638	3,133	**106,928**	**10,199**	**1.126,382**
BELGRANO	0,079	15,452	200,685	499,303	79,911	65,028	**860,457**	32,209	43,082	1,678	**44,760**	21,150	9,670	3,238	57,120	1,290	**92,468**	**18,386**	**1.016,071**
DEVOTO	0,293	35,995	99,790	394,466	29,758	32,046	**592,346**	14,848	18,509	0,791	**19,301**	9,884	13,446	13,492	15,201		**52,021**	**6,213**	**669,881**
Constituyentes	0,371	51,446	300,475	893,768	109,669	97,074	**1.452,803**	47,057	61,591	2,469	**64,061**	31,034	23,116	16,730	72,321	1,290	**144,489**	**24,599**	**1.685,952**
Flores	0,783	50,745	287,799	474,879	64,954	77,132	**956,292**	46,170	69,928	4,063	**73,991**	30,897	23,011	16,611	3,760		**74,279**	**8,683**	**1.113,245**
Capital Federal	**2,155**	**135,218**	**1.149,879**	**2.347,457**	**281,734**	**274,648**	**4.191,091**	**168,040**	**252,319**	**26,284**	**278,603**	**108,739**	**71,943**	**69,965**	**136,344**	**4,422**	**391,412**	**56,751**	**4.917,857**
SAN FERNANDO	0,035	167,731	66,828	44,323	30,639	13,074	322,631	6,636	22,219	3,725	25,944	11,956	0,256	1,803	2,857		16,872		365,446
TIGRE	0,132	215,389	361,198	111,076	158,835	62,612	909,242	41,932	76,385	1,464	77,849	11,839	21,849	15,289	20,805		69,782		1.056,873
San Fernando-Tigre	0,166	383,120	428,027	155,399	189,474	75,687	**1.231,873**	48,568	98,604	5,189	**103,793**	23,794	22,105	17,092	23,662		**86,653**		**1.422,319**
San Isidro	0,252	418,739	192,940	100,448	91,097	18,140	**821,616**	16,902	34,717	0,559	**35,276**	18,071	8,094	4,526	10,240		**40,931**		**897,823**
San Martín	1,176	483,210	152,297	102,290	93,172	34,054	**866,200**	24,430	43,501		**43,501**	14,705	4,087	3,378	8,780		**30,950**		**940,651**
Vicente López	0,612	339,563	140,206	81,659	54,802	32,685	**649,526**	16,277	43,465	2,061	**45,525**	8,502	7,264	13,345	7,698		**36,808**	**5,392**	**737,252**
Región Norte	**2,206**	**1.624,633**	**913,469**	**439,796**	**428,546**	**160,566**	**3.569,215**	**106,177**	**220,286**	**7,808**	**228,094**	**65,073**	**41,549**	**38,340**	**50,380**		**195,343**	**5,392**	**3.998,045**
La Matanza	0,857	1.708,741	594,494	345,941	319,021	173,591	3.142,645	93,042	190,571		**190,571**	64,345	36,003	38,905	9,995		**149,249**	**1,724**	**3.484,189**
HURLINGHAM	0,015	176,095	378,207	68,278	151,933	38,670	813,197	12,760	24,589	2,088	26,677	17,908	4,285	10,456	4,768		37,417	4,564	881,855
ITUZAINGO		15,852	144,590	28,689	45,947	10,817	245,894	7,505	17,947	0,014	17,961	10,295	4,510	0,002	0,000		14,808		278,663
MORON	0,026	35,704	70,594	9,263	35,750	12,005	163,341	6,339	10,819	0,145	10,964	3,711	6,280	0,000	0,000		9,990		184,294
Morón	0,041	227,651	593,391	106,229	233,629	61,491	1.222,432	26,604	53,354	2,247	**55,601**	31,914	15,075	10,458	4,768		**62,215**	**4,564**	**1.344,811**
Tres de Febrero	0,043	286,894	164,773	81,624	102,043	39,836	675,214	21,593	37,961	0,674	**38,635**	20,261	5,339	2,480	0,299		**28,380**	**5,475**	**747,703**
Región Oeste	**0,941**	**2.223,286**	**1.352,658**	**533,794**	**654,694**	**274,918**	**5.040,290**	**141,238**	**281,886**	**2,921**	**284,806**	**116,520**	**56,418**	**51,844**	**15,063**		**239,844**	**11,763**	**5.576,704**
Avellaneda	1,071	254,283	269,227	88,818	111,144	37,607	**762,151**	16,031	48,097	3,514	**51,612**	24,261	8,562	3,825	0,604		**37,251**	**10,963**	**861,976**
Lanús	1,040	432,425	297,621	92,464	121,427	41,917	**986,893**	28,946	45,402	4,822	**50,223**	29,756	12,038	15,373	4,614		**61,781**	**0,274**	**1.099,172**
Quilmes	2,595	808,757	289,028	136,182	158,817	75,804	**1.471,183**	37,479	94,640	15,469	**110,109**	22,095	10,452	11,823	4,749		**49,119**	**7,042**	**1.637,453**
Región Sudeste	**4,707**	**1.495,465**	**855,876**	**317,464**	**391,389**	**155,327**	**3.220,227**	**82,456**	**188,139**	**23,805**	**211,943**	**76,111**	**31,052**	**31,020**	**9,968**		**148,151**	**18,280**	**3.598,601**
ALTE. BROWN		224,202	291,568	39,616	187,002	49,465	**791,853**	35,687	67,213	1,363	**68,576**	33,065	15,341	4,977	5,712		**59,096**		**919,524**
ESTEBAN ECHEVERRIA	0,051	348,045	76,023	42,344	85,263	70,338	**622,064**	33,337	61,427	2,700	**64,127**	21,298	2,254	0,000	0,000		**23,551**		**709,741**
EZEIZA	0,120	101,243	169,457	32,941	63,667	30,297	**397,725**	12,842	43,243		**43,243**	20,480	3,504	0,000	0,000		**23,984**		**464,952**
Alte. Brown-E. Echeverría	0,170	673,490	537,049	114,901	335,932	150,100	**1.811,641**	81,866	171,883	4,063	**175,946**	74,843	21,098	4,977	5,712		**106,631**		**2.094,218**
Lomas de Zamora	0,242	610,452	527,063	165,160	214,225	54,175	**1.571,317**	50,118	94,794	8,533	**103,328**	36,244	7,625	16,523	1,113		**61,504**		**1.736,149**
Región Sudoeste	**0,412**	**1.283,942**	**1.064,112**	**280,061**	**550,157**	**204,275**	**3.382,958**	**131,983**	**266,677**	**12,596**	**279,273**	**111,087**	**28,724**	**21,500**	**6,825**		**168,135**		**3.830,367**
Total Concesión	**10,421**	**6.762,542**	**5.335,994**	**3.918,572**	**2.306,519**	**1.069,734**	**19.403,782**	**629,894**	**1.209,307**	**73,413**	**1.282,720**	**477,530**	**229,685**	**212,669**	**218,579**	**4,422**	**1.142,885**	**92,186**	**21.921,573**

REDES DE AGUA - NUEVAS ÁREAS

LONGITUD CARTOGRAFICA POR DIAMETROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Informe Anual

Año 2025

42-IAT1-I-A-RED 01 | **ex PL IA Nº 31A**

Distrito	Longitud (km) de cañerías de agua según diámetro (mm)																	Ríos Subterráneos	Total por Jurisdicción (km)
	Red Distribuidora							Distrib. y Maestras				Cañerías Maestras							
	Indefinido	≤75	>75 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤200	>200 ≤250	SUBTOTAL	>250 ≤300	>300 ≤400	>400 ≤450	SUBTOTAL	>450 ≤600	>600 ≤800	>800 ≤1000	>1000 ≤1500	>1500 ≤2100	SUBTOTAL		
SAN MIGUEL		204,218	30,990	19,705	27,709	13,696	**296,319**	4,571	7,646	2,115	**14,331**	8,059	0,395				**8,454**		**319,104**
JOSE C PAZ		34,391	3,899	1,684	16,503	1,690	**58,168**	6,942	0,522	0,198	**7,662**	0,217	0,000				**0,217**		**66,046**
MALVINAS ARGENTINAS		51,284	3,782	4,547	13,132	5,855	**78,599**	2,057	0,468	0,984	**3,509**	2,706	5,840				**8,546**		**90,654**
San Miguel-J.C.Paz-Malvinas		289,894	38,671	25,936	57,344	21,241	**433,086**	13,570	8,636	3,296	**25,502**	10,982	6,234				**17,216**		**475,804**
Escobar	0,079	100,945	79,491	39,208	49,349	18,473	**287,544**	7,572	3,453	0,019	**11,044**	2,715	7,211		30,867		**40,793**		**339,380**
Pilar	0,058	364,827	35,361	83,405	157,897	3,742	**645,290**	2,752	1,377	0,143	**4,272**	0,000	0,000						**649,562**
Región Norte	**0,137**	**755,666**	**153,522**	**148,549**	**264,590**	**43,456**	**1.365,919**	**23,894**	**13,466**	**3,458**	**40,818**	**13,697**	**13,445**		**30,867**		**58,009**		**1.464,745**
Merlo	0,019	449,349	34,653	40,912	40,631	28,743	594,307	12,575	15,031	0,530	28,137	5,903	0,043				5,945		628,389
Moreno	0,092	417,201	28,795	56,703	42,711	21,055	**566,556**	6,062	11,291	4,093	**21,445**	1,004	0,000				**1,004**		**589,006**
Región Oeste	**0,111**	**866,549**	**63,449**	**97,616**	**83,342**	**49,797**	**1.160,863**	**18,637**	**26,322**	**4,623**	**49,582**	**6,907**	**0,043**				**6,950**		**1.217,395**
Florencio Varela	34,399	584,497	88,116	116,499	118,013	48,783	990,308	39,148	26,082	3,035	68,264	20,147	0,000				20,147		1.078,720
Región Sudeste	**34,399**	**584,497**	**88,116**	**116,499**	**118,013**	**48,783**	**990,308**	**39,148**	**26,082**	**3,035**	**68,264**	**20,147**	**0,000**				**20,147**		**1.078,720**
Presidente Peron		129,877	12,247	14,672	12,969	13,092	**182,857**	1,287	4,680	0,000	**5,967**	0,000	0,000						**188,824**
Región Sudoeste		**129,877**	**12,247**	**14,672**	**12,969**	**13,092**	**182,857**	**1,287**	**4,680**	**0,000**	**5,967**	**0,000**	**0,000**						**188,824**
Total	**34,646**	**2.336,589**	**317,334**	**377,336**	**478,915**	**155,128**	**3.699,947**	**82,965**	**70,550**	**11,116**	**164,631**	**40,751**	**13,488**		**30,867**		**85,105**		**3.949,684**

4.2.SANEAMIENTO

REDES DE AGUA

LONGITUD CARTOGRAFICA POR MATERIAL DE CAÑERIA INSTALADA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Informe Anual

Año 2025

43-IAT1-I-A-RED 02 | **ex PL IA Nº 31B**

Jurisdicción	LONGITUD (Km)																						Total por Distrito
	Indefinido	HF - Hierro Fundido	A - Acero	AC - Asbesto Cemento	HA - Hormigón Armado	PVC - PVC	HC - Hormigón Centrifugado	FD - Fundición Dúctil	Pb - Plomo	AG - Acero Galvanizado	PEAD	PRFV	HS - Hormigón Simple	FC - Fibrocemento	HPr - Hormigón Pretensado	H - Hierro	Cu - Cobre	HrC - Hormigón revestido cerámico	HrM - Hormigón revestido mampostería	Lad - Ladrillo	MV - Material Vítreo	No Normalizado	Ríos Subterráneos	
Caballito	0,242	917,990	0,007	0,862		30,966		4,319			21,769	0,754			2,098							0,000	13,270	992,278
Centro- Constitución	1,662	1.010,826	0,452	3,674	3,103	60,621		14,000			18,928	2,833	0,010	0,076								0,000	10,199	1.126,382
BELGRANO	1,079	878,405	3,083	1,788	1,209	45,921	0,038	5,642			42,841	2,462	0,081	0,045	13,732	0,017						1,341	18,386	1.016,071
DEVOTO	0,333	635,125		4,101	0,005	11,748		1,926	0,215		10,002	0,041	0,172									0,000	6,213	669,881
Constituyentes	1,412	1.513,531	3,083	5,889	1,214	57,669	0,038	7,569	0,215		52,843	2,503	0,252	0,045	13,732	0,017						1,341	24,599	1.685,951
Flores	1,313	934,600	0,107	18,532		73,113		8,108			29,832	11,815	0,044		27,098							0,000	8,683	1.113,245
Capital Federal	4,628	4.376,946	3,650	28,957	4,317	222,369	0,038	33,995	0,215		123,372	17,904	0,306	0,122	42,929	0,017						1,341	56,751	4.917,857
SAN FERNANDO	0,409	137,069	0,947	44,451	2,857	161,325		0,074			16,389				1,926							0,000		365,446
TIGRE	0,418	82,181	0,711	47,660		774,145		49,072			81,437	12,427			8,822							0,000		1.056,873
San Fernando-Tigre	0,826	219,250	1,658	92,111	2,857	935,470		49,146			97,826	12,427			10,748							0,000		1.422,319
San Isidro	0,618	270,433	6,121	289,585	4,029	266,561	0,134	5,096			41,754	1,036	3,902	0,641	7,271	0,643						0,000		897,823
San Martín	13,455	54,684	1,968	323,036		426,183		6,309			99,793	3,459	0,112		11,637							0,016		940,651
Vicente López	9,934	407,151	3,585	207,631		71,487		3,539			8,913	0,027	2,524		16,842						0,227	0,000	5,392	737,252
Región Norte	24,833	951,517	13,332	912,363	6,886	1.699,701	0,134	64,091			248,286	16,949	6,538	0,641	46,497	0,643					0,227	0,016	5,392	3.998,045
La Matanza	18,120	65,853	0,440	903,674		2.235,338	0,188	40,221		3,285	119,131	70,392			25,796	0,024					0,012	0,054	1,724	3.484,253
HURLINGHAM	0,050			4,317		166,313		6,900			1,680	5,034										0,000		184,294
ITUZAINGO		0,012		12,091		224,899		7,158			29,080	5,423										0,000		278,662
MORON	0,200	74,867	0,085	151,321		530,466		15,920			90,499	12,287			1,188							0,458	4,564	881,855
Morón	0,250	74,879	0,085	167,729		921,678		29,978			121,260	22,743			1,188							0,458	4,564	1.344,812
Tres de Febrero	4,572	31,868	0,044	218,398		334,676		7,773	0,073		133,074	10,619			0,632							0,499	5,475	747,703
Región Oeste	22,942	172,600	0,569	1.289,801		3.491,692	0,188	77,972	0,073	3,285	373,465	103,754			27,617	0,024					0,012	1,011	11,763	5.576,768
Avellaneda	17,866	241,664	68,938	107,465	0,037	228,032		4,767		0,268	177,251	3,941	0,059	0,338	0,429							0,000	10,963	862,018
Lanús	11,219	207,768	46,385	350,481	0,031	233,562		6,257	0,113	1,003	231,364	6,456			4,174							0,086	0,274	1.099,172
Quilmes	35,452	105,113	6,843	634,913		479,582	0,054	14,890			324,245	27,726	0,053	1,540								0,000	7,042	1.637,453
Región Sudeste	64,536	554,545	122,166	1.092,859	0,068	941,177	0,054	25,914	0,113	1,270	732,861	38,123	0,112	1,878	4,603							0,086	18,279	3.598,643
ALTE. BROWN	12,299	60,864	12,368	71,826		641,712		22,474			67,448	18,498			12,036							0,000		919,524
ESTEBAN ECHEVERRIA	1,660	5,199		46,831		617,855		1,632		1,432	13,595	21,430										0,108		709,741
EZEIZA	0,383	1,160		9,457		417,511		15,415		0,668	4,740	15,619										0,000		464,952
Alte. Brown-E. Echeverria	14,342	67,223	12,368	128,113		1.677,078		39,521		2,100	85,783	55,546			12,036							0,108		2.094,218
Lomas de Zamora	49,443	202,882	6,519	263,273		881,939		25,051		0,048	283,666	14,656		1,766	6,898	0,010						0,000		1.736,149
Región Sudoeste	63,785	270,105	18,887	391,386		2.559,016		64,572		2,148	369,449	70,202		1,766	18,934	0,010						0,108		3.830,366
Total Concesión	180,724	6.325,713	158,603	3.715,365	11,271	8.913,955	0,414	266,544	0,401	6,703	1.847,432	246,933	6,956	4,407	140,579	0,694					0,239	2,562	92,186	21.921,678

aysa

REDES DE AGUA - NUEVAS ÁREAS

LONGITUD CARTOGRAFICA POR MATERIAL DE CAÑERIA INSTALADA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Informe Anual

Año 2024

3-IAT1-I-A-RED 02-N | **ex PL IA Nº 31B**

Jurisdicción	LONGITUD (Km)																							Total por Distrito
	Indefinido	HF - Hierro Fundido	A - Acero	AC - Asbesto Cemento	HA - Hormigón Armado	PVC - PVC	HC - Hormigón Centrifugado	FD - Fundición Dúctil	Pb - Plomo	AG - Acero Galvanizado	PEAD	PRFV	HS - Hormigón Simple	FC - Fibrocemento	HPr - Hormigón Pretensado	H - Hierro	Cu - Cobre	HrC - Hormigón revestido cerámico	HrM - Hormigón revestido mampostería	Lad - Ladrillo	MV - Material Vítreo	No Normalizado	Ríos Subterráneos	
SAN MIGUEL	0,346		0,485	133,400		174,248					0,200	10,424												319,104
JOSE C PAZ				0,876		64,756						0,414												66,046
MALVINAS ARGENTINAS						79,565		5,880			1,333	3,877												90,654
San Miguel-J.C.Paz-Malv	0,346		0,485	134,276		318,568		5,880			1,533	14,715												475,804
Escobar	0,160		0,228	39,687		256,158		39,877			3,271													339,380
Pilar	32,490	0,024	0,178	196,240		369,335					51,273	0,021												649,562
Región Norte	32,996	0,024	0,891	370,203		944,062		45,757			56,076	14,736												1.464,745
Merlo	0,029			72,235		534,377					15,768	5,980												628,389
Moreno	0,206	0,034	0,008	115,539		468,454		3,298			0,841	0,022		0,605										589,006
Región Oeste	0,235	0,034	0,008	187,774		1.002,831		3,298			16,609	6,002		0,605										1.217,395
Florencio Varela	40,373	0,543		44,905		930,348		0,049			47,307	15,195												1.078,719
Región Sudeste	40,373	0,543		44,905		930,348		0,049			47,307	15,195												1.078,719
Presidente Peron	0,058					188,689					0,077													188,824
Región Sudoeste	0,058					188,689					0,077													188,824
Total Concesión	73,661	0,602	0,899	602,882		3.065,930		49,104			120,069	35,932		0,605										3.949,684

CONEXIONES DE AGUA

UNIVERSO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Conexiones al 21/03/2006 + Instaladas por Densificación y Expansión a partir del 22/03/2006

Informe Anual

Año 2025

44-IAT1-I-A-RED 03

DISTRITO	CONEXIONES DE AGUA						
		PERIODO: 22/03/2006 AL 31/12/2025					
	Existentes al **21/03/2006** dentro Radio Servido	Nuevas por DENSIFICACION dentro del Radio Servido 2006-2024	Nuevas por DENSIFICACION dentro del Radio Servido AÑO 2025	Instaladas nuevas por EXPANSION DEL SERVICIO 2006 - 2024	Instaladas nuevas por EXPANSION DEL SERVICIO AÑO 2025	Total de Conexiones instaladas por AySA - 2006-2025	Nuevo Universo resultante al **31/12/25**
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[2+3+4+5]	[7]=[1+6]
Caballito	**107.997**	1.623	77	0	0	1.700	**109.697**
Centro- Constitución	**94.795**	1.669	62	0	0	1.731	**96.526**
Belgrano	***86.943***	*3.426*	*171*	*0*	*0*	*3.597*	***90.540***
Devoto	***88.274***	*2.634*	*219*	*0*	*0*	*2.853*	***91.127***
Constituyentes	**175.217**	6.367	390	0	0	6.450	**181.667**
Flores	**99.151**	3.194	60	0	0	3.254	**102.405**
Capital Federal	**477.160**	**12.853**	**589**	0	0	**13.135**	**490.295**
Pdo. San Fernando	***27.771***	*1.741*	*1*	*943*	*167*	*2.852*	***30.623***
Pdo. Tigre	***44.132***	*2.158*	*2*	*26.222*	*397*	*28.779*	***72.911***
San Fernando-Tigre	71.903	3.899	3	27.165	564	31.631	**103.534**
San Isidro	**62.912**	3.167	4	915	0	4.086	**66.998**
San Martín	**88.284**	3.193	0	15.021	0	18.214	**106.498**
Vicente López	**65.873**	3.307	0	97	3	3.407	**69.280**
Total Región Norte	**288.972**	**13.566**	**7**	**43.198**	**567**	**57.338**	**346.310**
La Matanza	**150.915**	5.731	91	148.101	24	153.947	**304.862**
Pdo. Morón	***67.890***	*3.381*	*62*	*17.690*	*1*	*21.134*	***89.024***
Pdo. Hurlingham	***9.016***	*293*	*5*	*6.919*	*0*	*7.217*	***16.233***
Pdo. Ituzaingó	***5.128***	*399*	*18*	*20.006*	*0*	*20.423*	***25.551***
Morón	**82.034**	4.073	85	44.615	1	48.774	**130.808**
Tres de Febrero	**62.156**	2.455	48	14.928	0	17.431	**79.587**
Total Región Oeste	**295.105**	**12.259**	**224**	**207.644**	**25**	**220.152**	**515.257**
Avellaneda	**67.141**	4.638	48	5.080	43	9.809	**76.950**
Lanús	**109.435**	5.780	44	3.582	6	9.412	**118.847**
Quilmes	**148.485**	7.328	58	9.907	108	17.401	**165.886**
Total Región Sudeste	**325.061**	**17.746**	**150**	**18.569**	**157**	**36.622**	**361.683**
Pdo. Alte Brown	***46.958***	*2.607*	*35*	*21.723*	*2.585*	*26.950*	***73.908***
Pdo. E. Echeverría	***39.602***	*2.577*	*35*	*25.179*	*0*	*27.791*	***67.393***
Pdo Ezeiza	***11.198***	*1.296*	*20*	*28.932*	*0*	*30.248*	***41.446***
Alte. Brown-E. Echeverría	**97.758**	6.480	90	75.834	2.585	84.989	**182.747**
Lomas de Zamora	**129.736**	6.258	87	30.028	21	36.394	**166.130**
Total Región Sudoeste	**227.494**	**12.738**	**177**	**105.862**	**2.606**	**121.383**	**348.877**
Total Concesión	**1.613.792**	**69.162**	**1.147**	**375.273**	**3.355**	**448.630**	**2.062.422**

CONEXIONES DE AGUA

UNIVERSO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Conexiones al inicio + Instaladas por Densificación y Expansión - Nuevas Jurisdicciones

Informe Anual

Año 2025

44-IAT1-I-A-RED 03

DISTRITO	CONEXIONES DE AGUA						
		PERIODO: 22/03/2006 AL 31/12/2025					
	Existentes al momento de la incorporación del Partido	Nuevas por DENSIFICACION dentro del Radio Servido - Inicio a 2024	Nuevas por DENSIFICACION dentro del Radio Servido AÑO 2025	Instaladas nuevas por EXPANSION DEL SERVICIO - Inicio - 2025	Instaladas nuevas por EXPANSION DEL SERVICIO - AÑO 2025	Total de Conexiones instaladas por AySA	Nuevo Universo resultante al **31/12/25**
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[2+3+4+5]	[7]=[1+6]
San Miguel	***34.100***	*495*	*0*	*2.203*	*0*	*2.698*	***36.798***
José C. Paz	***3.607***	*13*	*0*	*0*	*0*	*13*	***3.620***
Malvinas Argentinas	***5.890***	*5*	*0*	*72*	*0*	*77*	***5.967***
San Miguel-JCPaz-M.Arg.	**43.597**	513	0	2.275	0	2.788	**46.385**
Escobar	**13.612**	535	0	10.550	4.767	15.852	**29.464**
Pilar	**32.000**	1.026	1	2.758	8	3.793	**35.793**
Total Región Norte	**89.209**	**2.074**	**1**	**15.583**	**4.775**	**22.433**	**111.642**
Merlo*	**64.460**	1.506	20	821	0	2.347	**66.807**
Moreno*	**48.648**	1.808	44	268	0	2.120	**50.768**
Total Región Oeste	**113.108**	**3.314**	**64**	**1.089**	**0**	**4.467**	**117.575**
Florencio Varela	**85.704**	1.119	30	10.084	407	11.640	**97.344**
Total Región Sudeste	**85.704**	**1.119**	**30**	**10.084**	**407**	**11.640**	**97.344**
Presidente Perón	**11.536**	204	9	3.752	0	3.965	**15.501**
Total Región Sudoeste	**11.536**	**204**	**9**	**3.752**	**0**	**3.965**	**15.501**
Total Nuevas Áreas	**299.557**	**6.711**	**104**	**30.508**	**5.182**	**42.505**	**342.062**

REDES DE DESAGÜES CLOACALES

LONGITUD CARTOGRAFICA POR DIAMETROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Informe Anual

Año 2025

04.2.45-IAT1-I-S-RED 01 | **ex PL IA Nº 32A**

Distrito	Longitud (km) de cañerías de desagües cloacales según diámetro (mm)																
	Red Colectora						Grandes Conductos									Modelos	Total por Distrito
	Indefinido	≤100	>100 ≤200	>200 ≤300	>300 ≤400	SUBTOTAL	>400 ≤ 500	>500 ≤600	>600 ≤800	>800 ≤1100	>1100 ≤1400	>1400 ≤1600	>1600 ≤1800	> 1800	SUBTOTAL		
Caballito	0,601	0,576	442,987	57,416	20,992	**522,572**	14,162	8,926	2,639	3,453	5,136	1,797	1,347	6,287	**43,747**	**23,703**	**590,021**
Centro-Constitución	0,725	3,810	339,907	177,354	32,456	**554,252**	25,861	7,097	7,886	8,819	7,169	2,666	1,257	32,963	**93,716**	**77,975**	**725,944**
Belgrano	**0,704**	**0,522**	**557,628**	**43,684**	**17,716**	**620,253**	**11,763**	**12,493**	**8,100**	**12,593**	**2,248**	**6,648**	**2,291**	**3,156**	**59,293**	**0,333**	**679,879**
Devoto	**0,205**	**2,295**	**472,535**	**33,641**	**11,841**	**520,517**	**8,134**	**1,405**	**0,869**	**14,149**	**6,498**	**0,576**	**0,000**	**1,356**	**32,987**	**2,176**	**555,681**
Constituyentes	0,908	2,817	1.030,163	77,325	29,557	**1.140,770**	19,897	13,898	8,970	26,742	8,746	7,224	2,291	4,513	**92,280**	**2,510**	**1.235,560**
Flores	3,961	6,436	702,346	51,349	18,319	**782,411**	14,223	8,837	5,442	10,598	7,614	4,475	1,404	7,903	**60,496**	**0,691**	**843,597**
CAPITAL FEDERAL	**6,195**	**13,638**	**2.515,405**	**363,444**	**101,323**	**3.000,004**	**74,142**	**38,757**	**24,937**	**49,612**	**28,664**	**16,162**	**6,299**	**51,666**	**290,240**	**104,878**	**3.395,122**
Pdo. San Fernando	**0,312**	**2,898**	**282,167**	**14,052**	**6,303**	**305,732**	**3,102**	**0,000**	**3,987**	**2,140**	**5,581**	**0,000**	**0,000**	**1,947**	**16,757**	**1,195**	**323,684**
Pdo. Tigre	**0,649**	**4,830**	**654,837**	**31,123**	**14,379**	**705,818**	**10,539**	**5,029**	**11,615**	**11,900**	**5,280**	**2,514**	**0,000**	**0,000**	**46,878**		**752,696**
Dto. San Fernando-Tigre	0,960	7,729	937,004	45,176	20,682	**1.011,551**	13,641	5,029	15,602	14,040	10,861	2,514	0,000	1,947	**63,635**	**1,195**	**1.076,380**
San Isidro	2,655	2,341	710,427	33,832	12,543	**761,798**	7,756	3,369	0,346	3,102	5,638	0,000	0,000	0,000	**20,211**	**5,039**	**787,048**
San Martín	2,459	0,219	680,067	30,396	10,769	**723,909**	5,781	2,798	2,531	2,756	4,419	0,000	0,000	0,000	**18,285**	**2,325**	**744,520**
Vicente López	2,446	0,912	524,694	31,873	11,674	**571,599**	7,454	4,692	8,227	7,545	0,000	0,663	0,000	0,000	**28,581**	**5,339**	**605,520**
NORTE	**8,520**	**11,201**	**2.852,192**	**141,276**	**55,668**	**3.068,857**	**34,632**	**15,888**	**26,707**	**27,443**	**20,918**	**3,177**	**0,000**	**1,947**	**130,713**	**13,898**	**3.213,467**
Pdo. La Matanza	1,105	0,082	1.584,920	107,990	34,032	**1.728,128**	24,116	10,682	13,134	12,553	15,485	1,262	0,354	0,000	**77,586**	**19,178**	**1.824,892**
Pdo. Hurlingham	**1,388**	**1,353**	**324,547**	**18,668**	**2,990**	**348,947**	**1,055**	**1,605**	**9,632**	**4,074**	**8,873**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**25,239**		**374,186**
Pdo. Ituzaingó	**0,090**	**0,186**	**305,788**	**20,616**	**3,862**	**330,543**	**3,252**	**0,082**	**4,890**	**6,425**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**14,649**		**345,191**
Pdo. Morón	**0,076**	**2,419**	**768,573**	**50,008**	**14,711**	**835,786**	**11,197**	**3,441**	**4,950**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**19,587**	**4,654**	**860,027**
Dto. Morón	1,555	3,959	1.398,908	89,292	21,563	**1.515,276**	15,504	5,128	19,472	10,499	8,873	0,000	0,000	0,000	**59,475**	**4,654**	**1.579,404**
Tres de Febrero	0,746	0,000	593,199	40,570	14,785	**649,299**	5,530	2,769	4,495	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	**13,495**	**6,504**	**669,298**
OESTE	**3,405**	**4,040**	**3.577,026**	**237,852**	**70,380**	**3.892,704**	**45,150**	**18,578**	**37,100**	**23,052**	**24,358**	**1,964**	**0,354**	**0,000**	**150,556**	**30,335**	**4.073,595**
Avellaneda	2,887	2,650	597,741	45,374	12,081	**660,733**	3,784	3,164	1,488	5,837	6,423	0,000	0,910	27,763	**49,367**	**0,017**	**710,117**
Lanús	0,372	1,288	708,588	38,585	14,749	**763,583**	4,247	1,958	4,224	4,525	2,116	0,178	0,114	8,922	**26,284**	**3,650**	**793,517**
Quilmes	0,455	0,838	1.090,784	47,962	26,117	**1.166,156**	17,247	6,325	13,820	9,163	8,248	0,000	0,000	40,510	**95,313**	**0,303**	**1.261,771**
SUDESTE	**3,715**	**4,776**	**2.397,113**	**131,921**	**52,946**	**2.590,471**	**25,278**	**11,446**	**19,532**	**19,525**	**16,787**	**0,178**	**1,023**	**77,195**	**170,965**	**3,969**	**2.765,405**
Pdo. Alte. Brown	**0,746**	**0,059**	**616,041**	**29,907**	**10,007**	**656,759**	**8,551**	**0,714**	**2,466**	**7,793**	**3,594**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**23,117**		**679,876**
Pdo. Esteban Echeverría	**0,072**	**0,502**	**542,906**	**35,978**	**10,189**	**589,647**	**8,836**	**5,752**	**11,686**	**3,383**	**13,322**	**2,532**	**0,000**	**0,000**	**45,512**	**2,239**	**637,398**
Pdo. Ezeiza	**0,118**	**3,154**	**216,918**	**26,905**	**6,919**	**254,013**	**4,867**	**1,430**	**1,406**	**0,000**	**0,015**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**7,718**		**261,731**
Dto. Alte. Brown-E.Echeverría	0,936	3,714	1.375,865	92,789	27,115	**1.500,419**	22,253	7,896	15,558	11,177	16,931	2,532	0,000	0,000	**76,347**	**2,239**	**1.579,005**
Lomas de Zamora	0,968	0,646	742,949	49,075	9,307	**802,945**	13,265	8,524	2,216	5,488	6,867	2,405	0,000	0,000	**38,765**	**4,256**	**845,966**
SUDOESTE	**1,904**	**4,360**	**2.118,814**	**141,864**	**36,422**	**2.303,364**	**35,518**	**16,420**	**17,774**	**16,665**	**23,798**	**4,937**	**0,000**	**0,000**	**115,112**	**6,495**	**2.424,970**
TOTAL AySA	**23,738**	**38,016**	**13.460,549**	**1.016,358**	**316,738**	**14.855,399**	**214,721**	**101,090**	**126,049**	**136,296**	**114,525**	**26,418**	**7,677**	**130,808**	**857,585**	**159,575**	**15.872,559**

REDES DE DESAGÜES CLOACALES - NUEVAS ÁREAS

LONGITUD CARTOGRAFICA POR DIAMETROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Informe Anual

Año 2025

45-IAT1-I-S-RED 01 | **ex PL IA Nº 32A**

Distrito	Longitud (km) de cañerías de desagües cloacales según diámetro (mm)															Modelos	Total por Distrito
	Red Colectora						Grandes Conductos										
	Indefinido	≤100	>100 ≤200	>200 ≤300	>300 ≤400	SUBTOTAL	>400 ≤ 500	>500 ≤600	>600 ≤800	>800 ≤1100	>1100 ≤1400	>1400 ≤1600	>1600 ≤1800	> 1800	SUBTOTAL		
SAN MIGUEL	**0,278**	**0,000**	**518,647**	**19,054**	**9,428**	**547,407**	**4,935**	**4,764**	**6,320**	**4,778**	**0,000**				**20,797**		**568,204**
JOSE C PAZ																	
MALVINAS ARGENTINAS			**0,188**			**0,188**											**0,188**
San Miguel-J.C.Paz-Malvinas	0,278	0,000	518,835	19,054	9,428	**547,595**	4,935	4,764	6,320	4,778	0,000				**20,797**		**568,392**
Escobar	0,065	1,368	142,021	9,327	5,322	**158,103**	0,387	1,173	0,000	0,000	0,000				**1,560**		**159,663**
Pilar	19,340	14,394	374,858	29,073	14,449	**452,543**	1,452	0,000	0,075	0,000	0,000				**1,527**		**454,070**
NORTE	**19,683**	**15,762**	**1.035,714**	**57,455**	**29,199**	**1.158,241**	**6,774**	**5,937**	**6,395**	**4,778**	**0,000**				**23,883**		**1.182,125**
Merlo	167,694	0,382	466,261	24,421	17,423	**676,180**	13,101	5,286	10,846	2,397	0,000				**31,630**		**707,810**
Moreno	3,630	0,129	571,775	28,819	13,240	**617,593**	11,632	3,067	8,788	4,442	6,534	0,376			**34,838**		**652,431**
OESTE	**171,323**	**0,511**	**1.038,036**	**53,240**	**30,663**	**1.293,773**	**24,733**	**8,353**	**19,634**	**6,838**	**6,534**	**0,376**			**66,468**		**1.360,241**
Florencio Varela	0,224	0,000	564,358	23,944	12,677	**601,531**	4,303	0,832	3,846	0,000	0,000				**8,982**		**610,513**
SUDESTE	**0,224**	**0,000**	**564,358**	**23,944**	**12,677**	**601,531**	**4,303**	**0,832**	**3,846**	**0,000**	**0,000**				**8,982**		**610,513**
Presidente Peron	0,108	0,152	156,007	4,415	6,001	**166,684**	0,432	0,888	0,998	0,000	0,000				**2,317**		**169,001**
SUDOESTE	**0,108**	**0,152**	**156,007**	**4,415**	**6,001**	**166,684**	**0,432**	**0,888**	**0,998**	**0,000**	**0,000**				**2,317**		**169,001**
TOTAL	**191,338**	**16,426**	**2.794,115**	**139,054**	**78,540**	**3.220,229**	**36,242**	**16,010**	**30,872**	**11,616**	**6,534**	**0,376**			**101,650**		**3.321,880**

aysa

REDES CLOACALES

LONGITUD CARTOGRAFICA POR MATERIALES DE CAÑERIA INSTALADA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Informe Anual

Año 2025

46-IAT1-I-S-RED 02 | **ex PL IA Nº 32B**

Jurisdicción	LONGITUD KM																						Total por Distrito
	Indefinido	HF - Hierro Fundido	AC - Asbesto Cemento	HA - Hormigón Armado	PVC	HC - Hormigón Centrifugado	FD - Fundición Dúctil	PEAD	PRFV	H - Hierro	MV - Material Vítreo	HS - Hormigón Simple	FC - Fibrocemento	HPr - Hormigón Pretensado	HrC - Hormigón revestido cerámico	A - Acero	HrM - Hormigón revestido mampostería	Lad - Ladrillo	AG - Acero Galvanizado	Cu - Cobre	No Normalizado - Otros	Pb - Plomo	Modelos	
Caballito	2,937	19,322	0,063	1,320	11,554	2,739			1,074		495,400	26,775						0,524			4,611		23,703	590,022
Centro- Constitución	4,576	47,484	27,110	15,239	61,213	0,118	2,618	1,657	2,632	0,860	419,050	51,347	0,081	0,314				0,053			13,616		77,975	725,943
BELGRANO	2,323	14,240	0,020	6,808	37,880	0,381	0,646	0,037	1,623	0,072	586,460	27,704				0,062					1,289		0,333	679,879
DEVOTO	0,324	3,810		3,637	10,074				0,041		103,182	431,660									0,776		2,176	555,681
Constituyentes	2,647	18,051	0,020	10,445	47,954	0,381	0,646	0,037	1,665	0,072	689,642	459,363				0,062					2,066		2,510	1.235,559
Flores	12,378	12,968	18,780	15,896	68,520	1,871		6,182	2,786	2,839	647,035	53,294			0,174						0,183		0,691	843,597
Capital Federal	22,538	97,825	45,973	42,900	189,240	5,108	3,265	7,876	8,156	3,772	2.251,127	590,779	0,081	0,314	0,174	0,062		0,578			20,476		104,878	3.395,122
SAN FERNANDO	4,311	0,804	1,164	4,287	228,051		0,179	2,356	8,393		53,628	12,641		6,675							0,000		1,195	323,683
TIGRE	5,546	0,738	0,288	3,262	638,655		10,021	3,805	21,169	4,806	60,441	1,772				0,187					2,008			752,696
San Fernando-Tigre	9,857	1,543	1,452	7,548	866,706		10,201	6,161	29,561	4,806	114,069	14,413		6,675		0,187					2,008		1,195	1.076,380
San Isidro	9,082	3,251	9,890	6,951	524,821	7,186		4,499	11,932	34,469	126,278	32,705	0,735	9,970	0,224						0,016		5,039	787,048
San Martín	6,738	0,106	0,112	0,507	394,967	1,158	0,321	2,881	5,647			329,758									0,000		2,325	744,519
Vicente López	9,582		0,165	11,506	49,181		0,496	0,228	7,797	0,004	123,222	345,844	0,517	51,583		0,025					0,030		5,339	605,520
Región Norte	35,259	4,900	11,618	26,513	1.835,675	8,345	11,018	13,768	54,936	39,279	363,569	722,719	1,252	68,227	0,224	0,213					2,053		13,898	3.213,466
La Matanza	14,725	2,969	74,208	7,147	768,354		0,046	1,685	35,086		8,103	891,003		2,390							0,000		19,178	1.824,892
MORON	0,051		4,675		346,672		4,435	2,829	15,200			0,286				0,038					0,000			374,186
HURLINGHAM	0,523			6,881	329,418		0,052	3,850	4,469												0,000			345,191
ITUZAINGO	8,529	0,266	3,735	3,883	479,542	0,021	0,685	5,266	3,663			349,785									0,000		4,654	860,027
Morón	9,103	0,266	8,410	10,763	1.155,632	0,021	5,171	11,944	23,331			350,071				0,038					0,000		4,654	1.579,404
Tres de Febrero	7,471		39,701		232,018	0,187	4,495	0,289	6,288			372,347									0,000		6,504	669,298
Región Oeste	31,299	3,235	122,319	17,911	2.156,003	0,208	9,712	13,917	64,704		8,103	1.613,421		2,390		0,038					0,000		30,335	4.073,594
Avellaneda	14,291	22,332	2,080	3,499	424,874	3,980	3,087	1,093	8,961		133,865	90,004	2,033								0,000		0,017	710,117
Lanús	2,591	0,614	2,731	0,932	586,531	31,499		5,748	6,407		69,955	82,859									0,000		3,650	793,517
Quilmes	32,061	12,670	5,853	13,096	648,787	234,601	2,398	3,404	17,124	1,305	30,768	258,699	0,331			0,373					0,000		0,303	1.261,771
Región Sudeste	48,942	35,617	10,664	17,528	1.660,193	270,079	5,485	10,245	32,491	1,305	234,589	431,561	2,364			0,373					0,000		3,969	2.765,405
ALMTE BROWN	4,539				579,280	48,832		0,146	15,445		0,409	31,224									0,000			679,876
ESTEBAN ECHEVERRIA	6,155	1,433	0,235	6,074	562,160	1,071		3,169	17,344			36,346	1,083						0,091		0,000		2,239	637,398
EZEIZA	4,446	0,027		0,015	241,246	9,811		6,135	0,051												0,000			261,731
Alte. Brown-E. Echeverría	15,140	1,460	0,235	6,089	1.382,686	59,714		9,449	32,840		0,409	67,570	1,083						0,091		0,000		2,239	1.579,005
Lomas de Zamora	13,659	0,394	1,321	5,058	549,633	64,289	0,398	1,958	8,335	0,160	2,565	168,511	25,429								0,000		4,256	845,966
Región Sudoeste	28,799	1,854	1,556	11,147	1.932,319	124,004	0,398	11,407	41,176	0,160	2,974	236,081	26,512						0,091		0,000		6,495	2.424,970
Total Concesión	166,837	143,430	192,130	115,999	7.773,430	407,744	29,876	57,214	201,464	44,515	2.860,362	3.594,561	30,210	70,931	0,398	0,686		0,578	0,091		22,529		159,575	15.872,558

aysa

REDES CLOACALES - NUEVAS ÁREAS

LONGITUD CARTOGRAFICA POR MATERIALES DE CAÑERIA INSTALADA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Informe Anual

Año 2025

1.2.46-IAT1-I-S-RED 02-I | **ex PL IA Nº 32B**

Jurisdicción	LONGITUD KM																						Total por Distrito
	Indefinido	HF - Hierro Fundido	AC - Asbesto Cemento	HA - Hormigón Armado	PVC	HC - Hormigón Centrifugado	FD - Fundición Dúctil	PEAD	PRFV	H - Hierro	MV - Material Vítreo	HS - Hormigón Simple	FC - Fibrocemento	HPr - Hormigón Pretensado	HrC - Hormigón revestido cerámico	A - Acero	HrM - Hormigón revestido mampostería	Lad - Ladrillo	AG - Acero Galvanizado	Cu - Cobre	N - No Normalizado	Pb - Plomo	Modelos	
SAN MIGUEL	0,765				378,880			0,233	5,029												183,297			568,204
JOSE C PAZ																					0,000			
MALVINAS ARGENTINAS																					0,188			0,188
San Miguel-J.C.Paz-Malvinas	0,765				378,880			0,233	5,029												183,485			568,392
Escobar	0,435			0,398	110,637		0,065	1,279	0,478												46,371			159,662
Pilar	47,174				403,967			2,760	0,108	0,061											0,000			454,070
Región Norte	48,375			0,398	893,483		0,065	4,272	5,616	0,061											229,856			1.182,125
Merlo	181,524				300,237				16,984												209,066			707,810
Moreno	10,623			0,885	478,323		1,163	0,010	21,677												139,749			652,431
Región Oeste	192,146			0,885	778,560		1,163	0,010	38,661												348,815			1.360,241
Florencio Varela	221,579				275,670			0,049	0,011		0,222	109,290									3,685	0,007		610,513
Región Sudeste	221,579				275,670			0,049	0,011		0,222	109,290									3,685	0,007		610,513
Presidente Peron	0,333				167,420			0,013	1,235												0,000			169,001
Región Sudoeste	0,333				167,420			0,013	1,235												0,000			169,001
Total Concesión	462,433			1,283	2.115,133		1,229	4,344	45,523	0,061	0,222	109,290									582,356	0,007		3.321,879

CONEXIONES DE CLOACAS

UNIVERSO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Conexiones al 21/03/2006 + Instaladas por Densificación y Expansión a partir del 22/03/2006

Informe Anual

Año 2025

47-IAT1-I-S-RED 03

DISTRITO	CONEXIONES DE CLOACAS						
		PERIODO: 22/03/2006 AL 31/12/2025					
	Existentes al 21/03/2006 dentro Radio Servido	Nuevas por DENSIFICACION dentro del Radio Servido - 2006-2024	Nuevas por DENSIFICACION dentro del Radio Servido AÑO 2025	Instaladas nuevas por EXPANSION DEL SERVICIO - 2006 - 2024	Instaladas nuevas por EXPANSION DEL SERVICIO - AÑO 2025	Total de Conexiones instaladas por AySA - 2006-2025	Nuevo Universo resultante al 31/12/25
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[2+3+4+5]	[7]=[1+6]
Caballito	**93.099**	1.249	50	0	0	1.299	**94.398**
Centro- Constitución	**85.883**	959	26	0	0	985	**86.868**
Belgrano	***62.890***	*2.293*	*79*	*0*	*0*	*2.372*	***65.262***
Devoto	***64.701***	*1.029*	*55*	*0*	*0*	*1.084*	***65.785***
Constituyentes	**127.591**	3.322	134	0	0	3.456	**131.047**
Flores	**76.192**	1.368	35	0	0	1.403	**77.595**
Capital Federal	**382.765**	**6.898**	**245**	0	0	**7.143**	**389.908**
Pdo. San Fernando	***19.990***	*952*	***5***	*7.764*	*12*	*8.733*	***28.723***
Pdo. Tigre	***11.638***	*965*	***5***	*47.390*	*4.148*	*52.508*	***64.146***
San Fernando-Tigre	**31.628**	1.917	10	55.154	4.160	61.241	**92.869**
San Isidro	**45.758**	2.850	3	23.193	1	26.047	**71.805**
San Martín	**49.231**	2.376	0	22.861	0	25.237	**74.468**
Vicente López	**62.248**	1.981	1	123	3	2.108	**64.356**
Total Región Norte	**188.865**	**9.124**	**14**	**101.331**	**4.164**	**114.633**	**303.498**
La Matanza	**124.591**	4.272	94	55.870	628	60.864	**185.455**
Pdo. Morón	***45.016***	*2.022*	*79*	*51.088*	*0*	*53.189*	***98.205***
Pdo. Hurlingham	***81***	*283*	*23*	*33.541*	*0*	*33.847*	***33.928***
Pdo. Ituzaingó	***1***	*421*	*25*	*31.455*	*1*	*31.902*	***31.903***
Morón	**45.098**	2.726	127	116.084	1	118.938	**164.036**
Tres de Febrero	**55.730**	2.104	63	19.735	224	22.126	**77.856**
Total Región Oeste	**225.419**	**9.102**	**284**	**191.689**	**853**	**201.928**	**427.347**
Avellaneda	**39.367**	5.576	64	15.192	399	21.231	**60.598**
Lanús	**34.991**	5.524	21	33.018	3.089	41.652	**76.643**
Quilmes	**107.231**	17.315	58	39.306	0	56.679	**163.910**
Total Región Sudeste	**181.589**	**28.415**	**143**	**87.516**	**3.488**	**119.562**	**301.151**
Pdo. Alte Brown	***7.181***	*1.125*	*25*	*49.798*	*2.618*	*53.566*	***60.747***
Pdo. E. Echeverría	***11.136***	*1.166*	*51*	*46.073*	*194*	*47.484*	***58.620***
Pdo Ezeiza	***10.352***	*580*	*24*	*12.824*	*516*	*13.944*	***24.296***
Alte. Brown-E. Echeverría	**28.669**	2.871	100	108.695	3.328	114.994	**143.663**
Lomas de Zamora	**33.014**	1.917	49	44.561	0	46.527	**79.541**
Total Región Sudoeste	**61.683**	**4.788**	**149**	**153.256**	**3.328**	**161.521**	**223.204**
Total Concesión	**1.040.321**	**58.327**	**835**	**533.792**	**11.833**	**604.787**	**1.645.108**

aysa	**CONEXIONES DE CLOACAS** **UNIVERSO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** **Conexiones al inicio + Instaladas por Densificación y Expansión - Nuevas Jurisdicciones**	**Informe Anual** **Año 2025** **47-IAT1-I-S-RED 03**

DISTRITO	CONEXIONES DE CLOACAS						
		PERIODO: 22/03/2006 AL 31/12/2025					
	Existentes al momento de la incorporación del Partido	Nuevas por DENSIFICACION dentro del Radio Servido - Inicio a 2024	Nuevas por DENSIFICACION dentro del Radio Servido AÑO 2025	Instaladas nuevas por EXPANSION DEL SERVICIO - Inicio - 2024	Instaladas nuevas por EXPANSION DEL SERVICIO - AÑO 2025	Total de Conexiones instaladas por AySA	Nuevo Universo resultante al 31/12/25
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[2+3+4+5]	[7]=[1+6]
San Miguel	***48.365***	*561*	*0*	*4.523*	*1.203*	*6.287*	***54.652***
José C. Paz	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Malvinas Argentinas	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
San Miguel-JCPaz-M.Arg.	**48.365**	561	0	4.523	1.203	6.287	**54.652**
Escobar	**7.039**	213	0	2.486	244	2.943	**9.982**
Pilar	**14.393**	314	0	13	17	344	**14.737**
Total Región Norte	**69.797**	**1.088**	**0**	**7.022**	**1.464**	**9.574**	**79.371**
Merlo	**41.212**	318	23	4.130	0	4.471	**45.683**
Moreno	**32.571**	344	29	6.518	2.019	8.910	**41.481**
Total Región Oeste	**73.783**	**662**	**52**	**10.648**	**2.019**	**13.381**	**87.164**
Florencio Varela	**77.000**	707	22	5.722	5	6.456	**83.456**
Total Región Sudeste	**77.000**	**707**	**22**	**5.722**	**5**	**6.456**	**83.456**
Presidente Perón	**6.846**	178	6	6.906	49	7.139	**13.985**
Total Región Sudoeste	**6.846**	**178**	**6**	**6.906**	**49**	**7.139**	**13.985**
Total Nuevas Áreas	**227.426**	**2.635**	**80**	**30.298**	**3.537**	**36.550**	**263.976**

5. CERTIFICACION DE NORMAS

Informe de Sistemas de Gestión

2025

Dirección de Medio Ambiente y Calidad
Gerencia de Sistemas de Gestión
Departamento de Métodos y Procedimientos Técnicos

Contenido

Presentación 2

1. Introducción 3

2. Cierre del Período 3

Auditoría y Seguimiento 5

1. Introducción 6

2. Novedades 6

3. Resultados Globales 6

3.1. Auditoría Externa 6

3.2. Índice de Madurez 8

Certificaciones 10

1. Introducción 11

1.1. Normas Certificadas 11

1.2. Resultados Globales 12

1.3. Novedades 13

1.4. Trayectoria en Gestión 14

1.5. Certificaciones Vigentes 15

1.6. Alcances Certificados 15





Capítulo 1

Presentación

Sistemas de Gestión

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito consolidar y analizar el desempeño del Sistema de Gestión Integral de AySA durante el ciclo de certificación vigente (2023-2025).

Para ello se:

- Evalúan los resultados de las auditorías externas bajo la norma ISO 9001, identificando fortalezas y áreas de mejora.
- Determina el nivel de madurez de los procesos utilizando los lineamientos de la norma ISO 9004, para trazar el rumbo hacia el éxito sostenido.
- Centralizan los estatus de las certificaciones ISO vigentes en materia de Medio Ambiente (14001), Seguridad y Salud (45001), Inocuidad Alimentaria (22000), Gestión de Activos (55001), Gestión técnica de Laboratorios (17025) y Eficiencia Energética (50001).

Esto permite disponer de una visión integral con datos objetivos que contribuye a tomar decisiones más eficaces ante los cambios estructurales y de gestión que está atravesando la empresa.

2. Cierre del Período

El año 2025 fue un año signado por la continuidad del proceso de transformación operativa de AySA de cara a la futura concesión. Esto generó la redefinición de procesos, actividades, objetivos, entre otros. En este sentido, desde la coordinación del Sistema de Gestión se hizo hincapié en las problemáticas comunes, las interfaces y los riesgos asociados. Para ello se establecieron acciones tendientes a abordar diversas variables en el marco de cada eje estratégico definido con el propósito de implementar mejores prácticas y hacer un uso más eficiente.

Para determinar el cumplimiento y evolución de nuestro Sistema de Gestión Integral, se llevaron a cabo:


- Auditorías externas a cargo de IRAM (Combinada ISO 9001/50001)
- Comités temáticos
- Análisis del índice de madurez de los procesos

Estas tres estrategias permitieron analizar diversas variables que contribuyeron a tomar decisiones más efectivas y determinar planes de acción para el ejercicio del 2025-2026:

- Discontinuar la certificación ISO 14001/ISO 45001 para el proceso de Saneamiento y Control de Calidad (Laboratorio Central). Asimismo, se debe mencionar que, se mantienen las buenas prácticas obtenidas en la implementación de dichas normas.
- Auditar los procesos con cambios críticos aumentando la muestra, haciendo foco en las interfaces
- Analizar la madurez de los procesos determinando la línea de base para el ejercicio 2026. El resultado obtenido 51,4% a nivel empresa, tomando como guía la ISO 9004.
- Abordar en cada comité temático las problemáticas y oportunidades surgidas en el proceso de transformación operativa, las debilidades estructurales halladas en las auditorias estableciendo acciones surgidas del análisis de madurez.



En función de lo expuesto se puede determinar que:

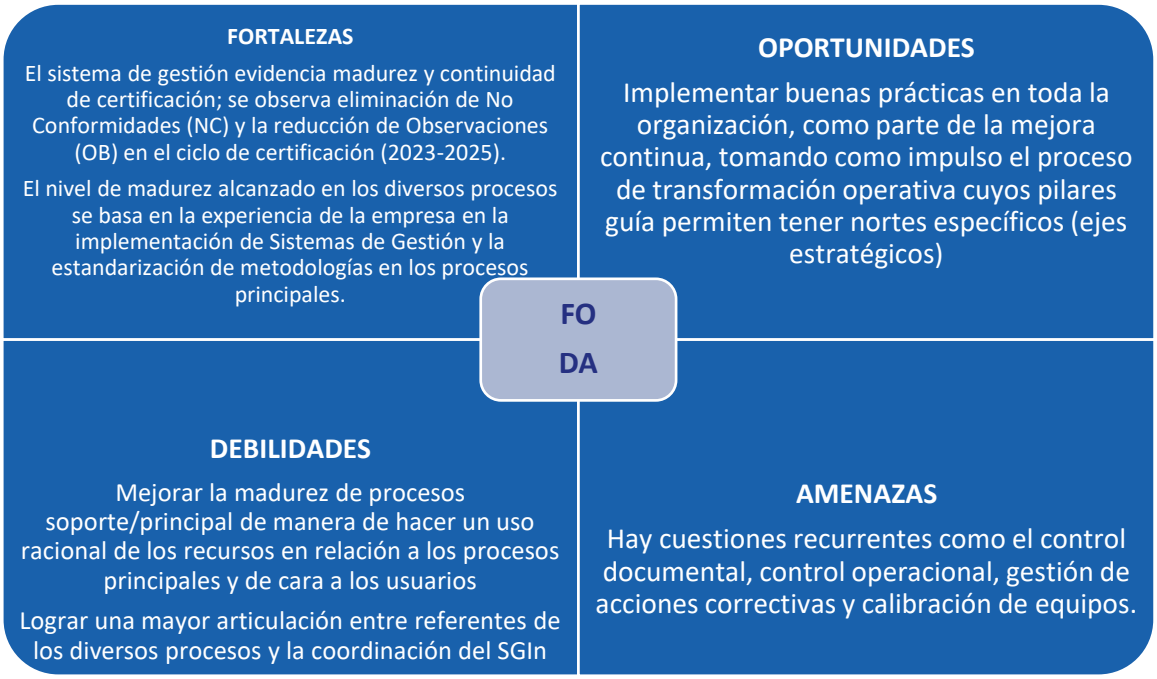

Por este motivo se determinaron las siguientes acciones a implementar/continuar en el ejercicio del 2026:

- **Comités:** abordaje en comités temáticos en los cuales se trabajan problemáticas detectadas, actividades de seguimiento (documental, AMFE, etc). Asimismo, un comité prioritario será el de Mantenimiento: Programa de calibraciones, índice de criticidad, especificaciones técnicas.
- **Información Documentada:** Análisis de unificación de registros y revisión de estructuras, abordaje en comités temáticos para estandarización. Conformar planificación de cambios y comunicación al personal
- **Capacitación:** Implementar el desarrollo de referentes de SGE y llevar a cabo un plan de capacitación intensivo para personal de AySA (con foco en segmentos)
- **Objetivos e Indicadores:** Implementar capacitación de objetivos. Mejorar el seguimiento de Objetivos, definición de umbrales de acción.
- **Análisis de Riesgos:** Actualizar AMFE de acuerdo al contexto; integrar acciones y realizar seguimiento en comités temáticos. Conformar planificación de cambios detallada.



Capítulo 2

Auditoría y Seguimiento

Sistema de Gestión

1. Introducción

Este capítulo tiene como cometido exponer los resultados del seguimiento y análisis del Sistema de Gestión Integral de AySA. La información revisada para este análisis surge de los resultados de auditorías internas y externas, los comités temáticos y el trabajo de coordinación general que realiza la Gerencia:

- **Auditorías:** la función principal de las auditorías es proporcionar una evaluación independiente y objetiva sobre la eficacia, eficiencia y cumplimiento de los procesos de la empresa, identificando riesgos, detectando áreas de mejora y asegurando la conformidad con normas y regulaciones.
- **Comités:** conformados por referentes de cada dirección que se encuentra alcanzada por la temática del comité. En cada uno se trabajan riesgos, oportunidades, interfaces, problemáticas, buenas prácticas, entre otros.

Esto permite proponer nuevas metodologías de análisis para implementar mejores prácticas que contribuyan a facilitar la identificación, análisis y optimización de los procesos operativos, con el fin de aumentar la eficacia, reducir costos de la "no Calidad" y mejorar la calidad del servicio.

2. Novedades

En el marco del Plan de Transformación Operativa de la Empresa y sus ejes estratégicos asociados, se han logrado abordar mejoras en los siguientes aspectos:

- **Auditoría Interna/Externa:** con el propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles, se ha logrado establecer una auditoría combinada de calidad (ISO 9001) y eficiencia energética (ISO 50001). Asimismo, se encuentra previsto para el 2026 realizar la misma de manera integrada con un solo equipo auditor y combinada con la de gestión de activos (ISO 55001).
- **Índice de Madurez:** se ha trabajado bajo la gestión por proyectos para definir una metodología de análisis de los procesos de la empresa y establecer una línea de base del estado de cada uno en relación a la madurez como sistema, según las directrices de la Norma ISO 9004 para que las organizaciones logren un éxito sostenido. El beneficio es alinear los objetivos operativos con la estrategia organizacional, promoviendo una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante las dinámicas del mercado y las expectativas de los usuarios.

3. Resultados Globales


3.1. Auditoría Externa

El objetivo de la coordinación del Sistema de Gestión es que la Auditoría externa sea una muestra representativa del proceso con énfasis en la calidad y la continuidad del servicio, considerando la interacción entre las distintas áreas involucradas con el fin de hacer más eficiente la interacción entre los procesos.

En el trascurso del ciclo de certificación (2023-2025) se evidencia madurez y continuidad del Sistema de Gestión Integral. El abordaje de los hallazgos por medio de diversas estrategias, como la implementación de acciones correctivas eficaces y otras acciones realizadas en los comités temáticos, ha permitido una disminución sensible de los desvíos.

Tabla 1 – Tipo y cantidad de hallazgos por año

Año	Fortalezas (FO)	Oportunidades de mejora (OM)	Observaciones (OB)	No conformidades (NC)	Total
2023	9	13	6	3	**31**
2024	4	7	10	0	**21**
2025	3	5	7	0	**15**
Total	**16**	**25**	**23**	**3**	**67**

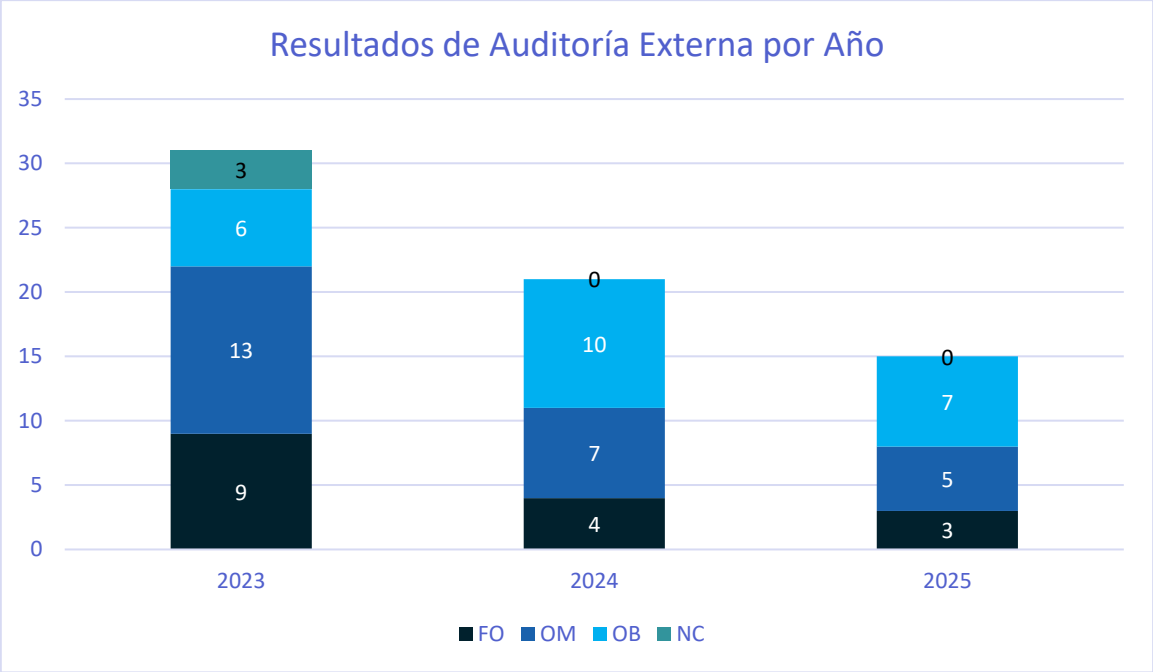

Ahora bien, en el trienio mencionado se han detectado desvíos recurrentes en ciertos requisitos, para los cuales se establecieron acciones concretas:

Tema	Requisito	23	24	25	Riesgo principal	Propuesta de mejora
Recursos – Seguimiento de las Mediciones	7.1.5 / 7.1.5.2	x	x	x	Decisiones sobre datos no confiables; incumplimiento regulatorio	Comité de Mantenimiento: Programa de calibraciones, índice de criticidad, especificaciones técnicas.
Información documentada	7.5	x	x	x	Uso de versiones obsoletas o que no acompañen cambios surgidos del rediseño de procesos por contexto de la empresa	Seguimiento Documental. Abordaje en comités temáticos. Análisis de unificación de registros y revisión de estructuras.
Control operacional	8.1		x	x	Controles planificados no ejecutados o sin evidencia	Revisión de documentación / Seguimiento de planificación / Comunicación al personal
No Conformidad y Acción Correctiva	10.2	x		x	Reincidencia de desvíos y análisis de causa superficial	Implementar el desarrollo de referentes de SGE y llevar a cabo un plan de capacitación intensivo para personal de AySA (con foco en segmentos)
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	6.2 / 9.1.3	x	x	x	Objetivos sin análisis pertinentes de los desvíos / No se toman acciones ante desvíos	Implementar capacitación de objetivos. Mejorar el seguimiento de Objetivos, definición de umbrales de acción.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades - Planificación	6.1 / 6.3	x		x	Riesgos no tratados; cambios incompletos	Actualizar AMFE de acuerdo al contexto; integrar acciones y realizar seguimiento en comités temáticos. Conformar planificación de cambios detallada.

En función de ello, se puede establecer la siguiente categorización para el estado de cada capítulo de la estructura de alto nivel de manera de evidenciar la robustez de nuestro Sistema de Gestión Integral:

Capítulo	Estado	Acción
4 -Contexto de organización	Fortaleza	Mantener mapeo de partes interesadas; trazabilidad de requisitos regulatorios al plan anual.
5 -Liderazgo	Fortaleza	Mantener sponsor visible; revisar misión, visión, política y valores en función del Plan de transformación Operativa. Reforzar comunicación interna.
6 - Planificación	En mejora	Plan de Capacitación Integral en el eje calidad para el diseño, seguimiento y abordaje de objetivos. Plan de acción y no conformidad. Realizar seguimiento de matrices en comités.
7 -Apoyo	Foco	Plan de capacitación en Loyal DMS y gestión de documentos. Comité de Mantenimiento.
8 -Operación	Foco	Fortalecer control operacional y condiciones controladas. Gestionar de manera adecuada eventos.
9 -Evaluación del desempeño	Foco	Estandarizar análisis y evaluación de tendencias en el seguimiento de objetivos para verificar eficacia de procesos.
10- Mejora	En mejora	Plan de Capacitación Integral en el eje calidad para el tratamiento de hallazgos. Integral el índice de madurez por proceso para el análisis global del sistema.

3.2. Índice de Madurez

En el ejercicio del 2025 se ha elaborado la metodología de análisis del índice de madurez de los procesos de la empresa. Se evaluaron los procesos principales de AySA utilizando como guía la Norma ISO 9004 que proporciona directrices para que las organizaciones logren un éxito sostenido.

En cada proceso se evaluó a todas las Direcciones y las interfaces existentes dentro del proceso. Para ello se analizaron los siguientes ejes:

Sección 1 — Gestión de los Procesos

1. Planificación de los procesos
2. Responsabilidad y autoridad relativa a los procesos
3. Evaluación y tratamiento del riesgo y la oportunidad de los procesos
4. Gestión y control de los procesos

Sección 2 — Gestión de los Recursos

1. Personas
2. Infraestructura y ambiente de trabajo
3. Gestión del Conocimiento
4. Tecnología
5. Medio Ambiente
6. Recursos Externos

Sección 3 — Seguimiento y Mejora

1. Objetivos de la Calidad e Indicadores de desempeño
2. Análisis de datos y evaluación de la información
3. Mejora

Esto ha permitido establecer una línea de base para poder integrar en el análisis de las próximas auditorías y acciones a desarrollar en el 2026.

Resultados Generales




Dirección de Medio Ambiente y Calidad - Gerencia de Sistemas de Gestión-Dpto. MyP

Se debe tener en cuenta que, el análisis se realiza en relación a la ISO 9004, ya que nuestro Sistema de Gestión Integral de la Calidad está ampliamente consolidado. Esta metodología permite establecer prioridades y focos de atención para priorizar acciones de mejora en relación a la excelencia. Asimismo, se debe señalar que, este análisis se ha llevado a cabo en el proceso de transformación operativa que la empresa se encuentra transitando.

Además, la metodología diseñada utiliza otras herramientas del Sistema de Gestión para disponer de una correlación más efectiva permitiendo la toma de decisiones complejas con mayor certidumbre.

Relación Análisis de Contexto - IM

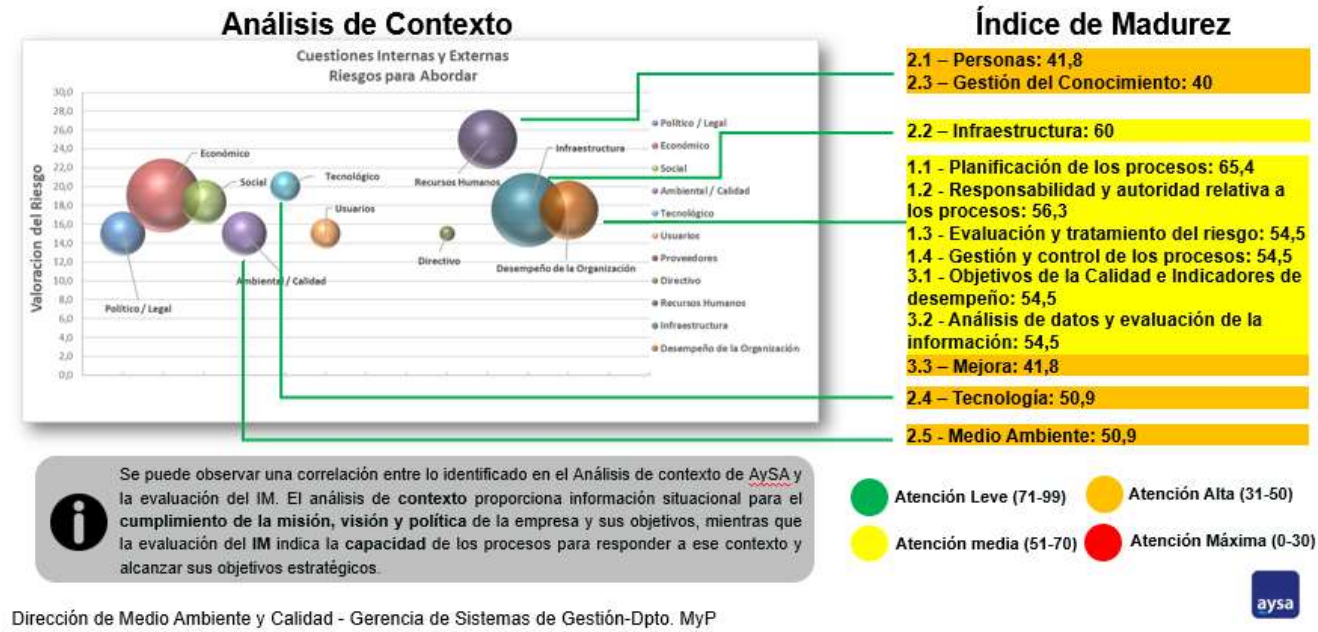

Dirección de Medio Ambiente y Calidad - Gerencia de Sistemas de Gestión-Dpto. MyP



Capítulo 3

Certificaciones

Sistemas de Gestión

1. Introducción

Los Sistemas de gestión implementados en AySA tienen como correlato certificaciones otorgadas por un organismo externo. Cada uno tiene una norma ISO especifica con requisitos que cumplimentar.

¿Qué es certificar?
La certificación es el proceso llevado a cabo por una entidad reconocida e independiente de la Empresa, como por ejemplo el organismo certificador IRAM, para manifestar la conformidad de los productos/servicios y procesos de la empresa respecto a los requisitos de una Norma determinada, en este caso la ISO 9001.


1.1. Normas Certificadas

Las Normas ISO certificadas en la empresa se detallan a continuación:

Norma	Certificable	Objeto
ISO 9001:2015	✓	Sistemas de Gestión de la Calidad. Se certifican procesos
ISO 14001:2015	✓	Sistemas de Gestión Medioambiental. Se certifican sitios
ISO 45001:2018	✓	Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Personal. Se certifican sitios
ISO/IEC 17025	✓	Competencia Técnica para Laboratorios de Calibración y de Ensayos. Se acreditan técnicas de ensayo o de calibración
ISO 22000:2018	✓	Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria
ISO 55001	✓	Sistema de Gestión de Activos
ISO 50001	✓	Sistema de gestión de energía, cuyo propósito es el de permitirle una mejora continua de la eficiencia y seguridad energética
IRAM 13:2013	-	Aplica a las Unidades de Auditoría Interna de la Administración Pública Nacional



1.2. Resultados Globales

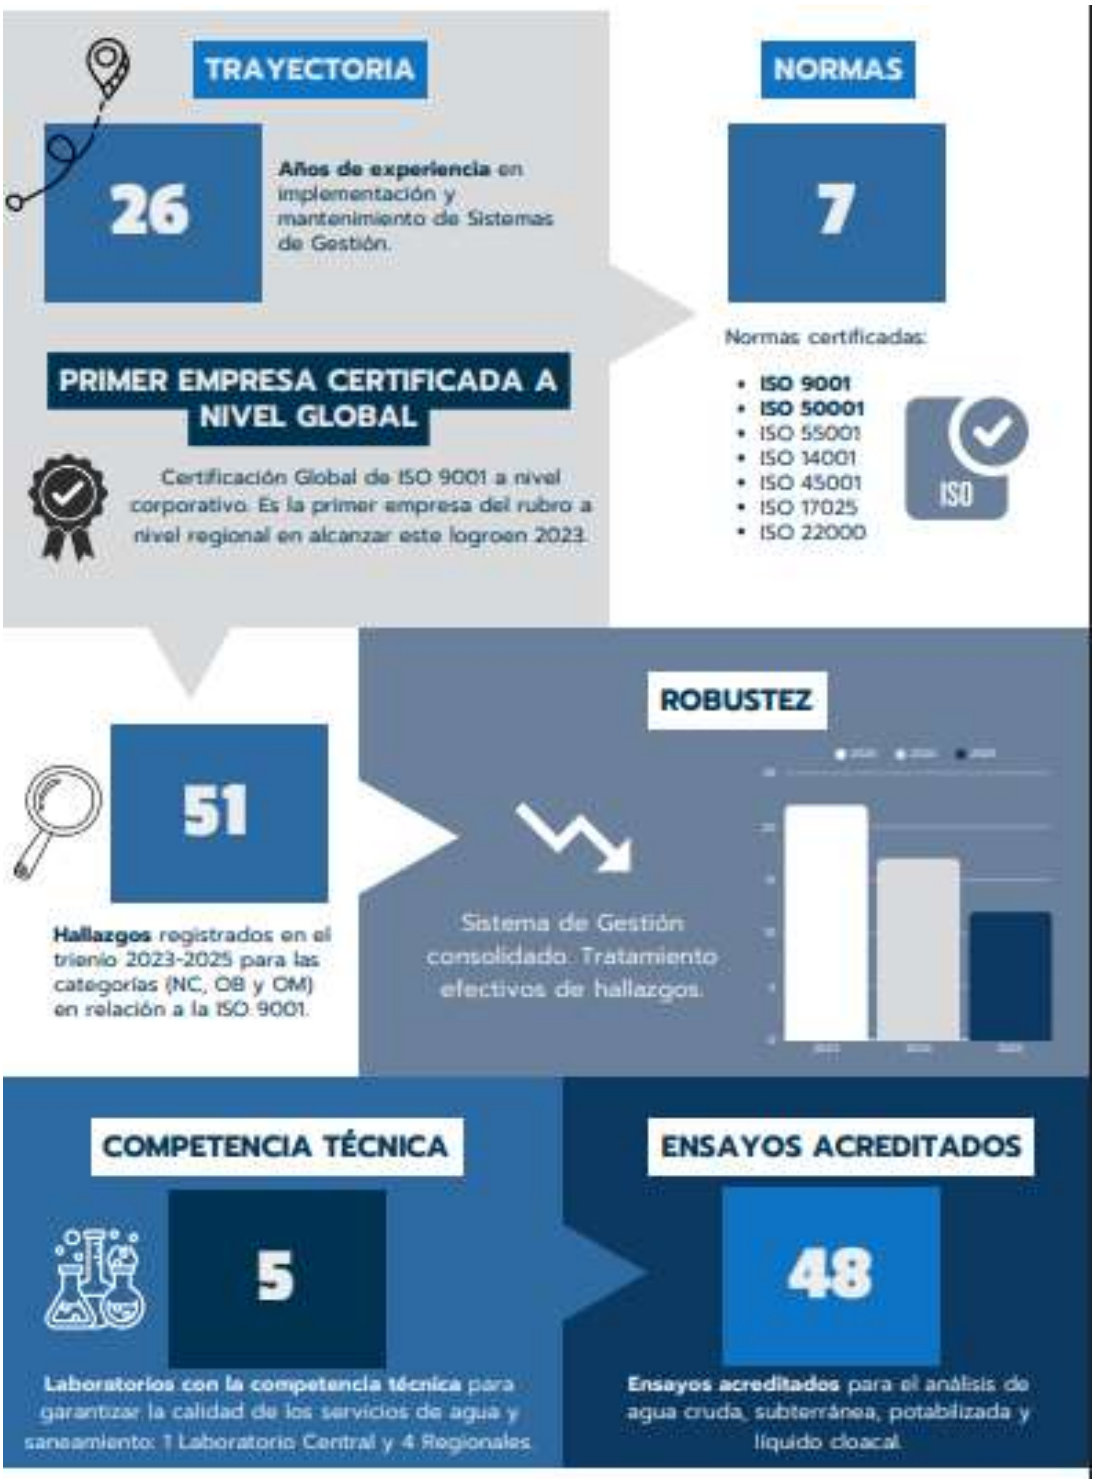

1.3. Novedades


En función del Plan de Optimización Operativa de AySA, se ha continuado trabajando en el fortalecimiento, integración e implementación de mejores prácticas de gestión y sustentabilidad. Asimismo, para hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles, se ha trabajado en los siguientes aspectos:

- **ISO 9001:** se ha recibido la auditoría externa de IRAM, entre oct-25 y nov.25 y se ha logrado mantener la certificación (2° Seguimiento) del Sistema de Gestión Integral. Esto fortalece el trabajo en equipo involucrando al personal hacia una misma dirección estratégica. Además, se ha realizado la auditoria combinada con la ISO 50001 de eficiencia energética de manera de reducir costos y optimizando recursos.
- **ISO 50001:** se ha recibido la auditoría externa de IRAM de Recertificación y se ha logrado mantener la misma. Esta certificación ayuda a gestionar y mejorar el desempeño energético y a reducir el impacto ambiental.
- **ISO 14001/45001:** se solicitó al ente certificador IRAM la baja de las certificaciones correspondientes al proceso de Saneamiento, Control de Calidad (Laboratorio Central) y Perforaciones como parte de la redefinición de estrategias y procesos. Se debe señalar que se continúan con las buenas practicas implementadas. Para el proceso de agua se han unificado los certificados por sitios en uno solo por cada norma y se ha superado de manera positiva la auditoria externa que corresponde a la recertificación.
- **ISO 55001:** se ha recibido la auditoria externa y se ha procedido a la recertificación de la gestión de activos. En relación a esta certificación, se encuentra previsto en el 2026 realizar la auditoría de manera combinada con la de calidad (ISO 9001) y de eficiencia energética (ISO 50001) alineándose con el mismo ente certificador (IRAM). Por otro lado, se está trabajando en el comité de mantenimiento para sistematizar todos los procesos de relacionados de manera de optimizar los recursos que se emplean para reducir los costos operativos y estandarizar metodologías para mantenimiento: Preventivo, Predictivo y Correctivo.
- **ISO 17025:** se ha recibido la auditoría externa de IRAM y se ha logrado mantener la acreditación de los ensayos. Corresponde al 4° Seguimiento.
- **ISO 22000:** se ha recibido la auditoría externa de IRAM y se ha logrado mantener la certificación (1° Seguimiento).



1.4. Trayectoria en Gestión

AySA tiene una amplia trayectoria en la implementación de Sistemas de Gestión. La metodología aplicada para llevar adelante estas actividades, desde el año 2012, es la de comités temáticos, integrados por referentes de las Direcciones involucradas en el proceso que se encuentra alcanzado por el comité. La planificación y coordinación se encuentra a cargo de la Gerencia de Sistemas de Gestión perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente y Calidad.

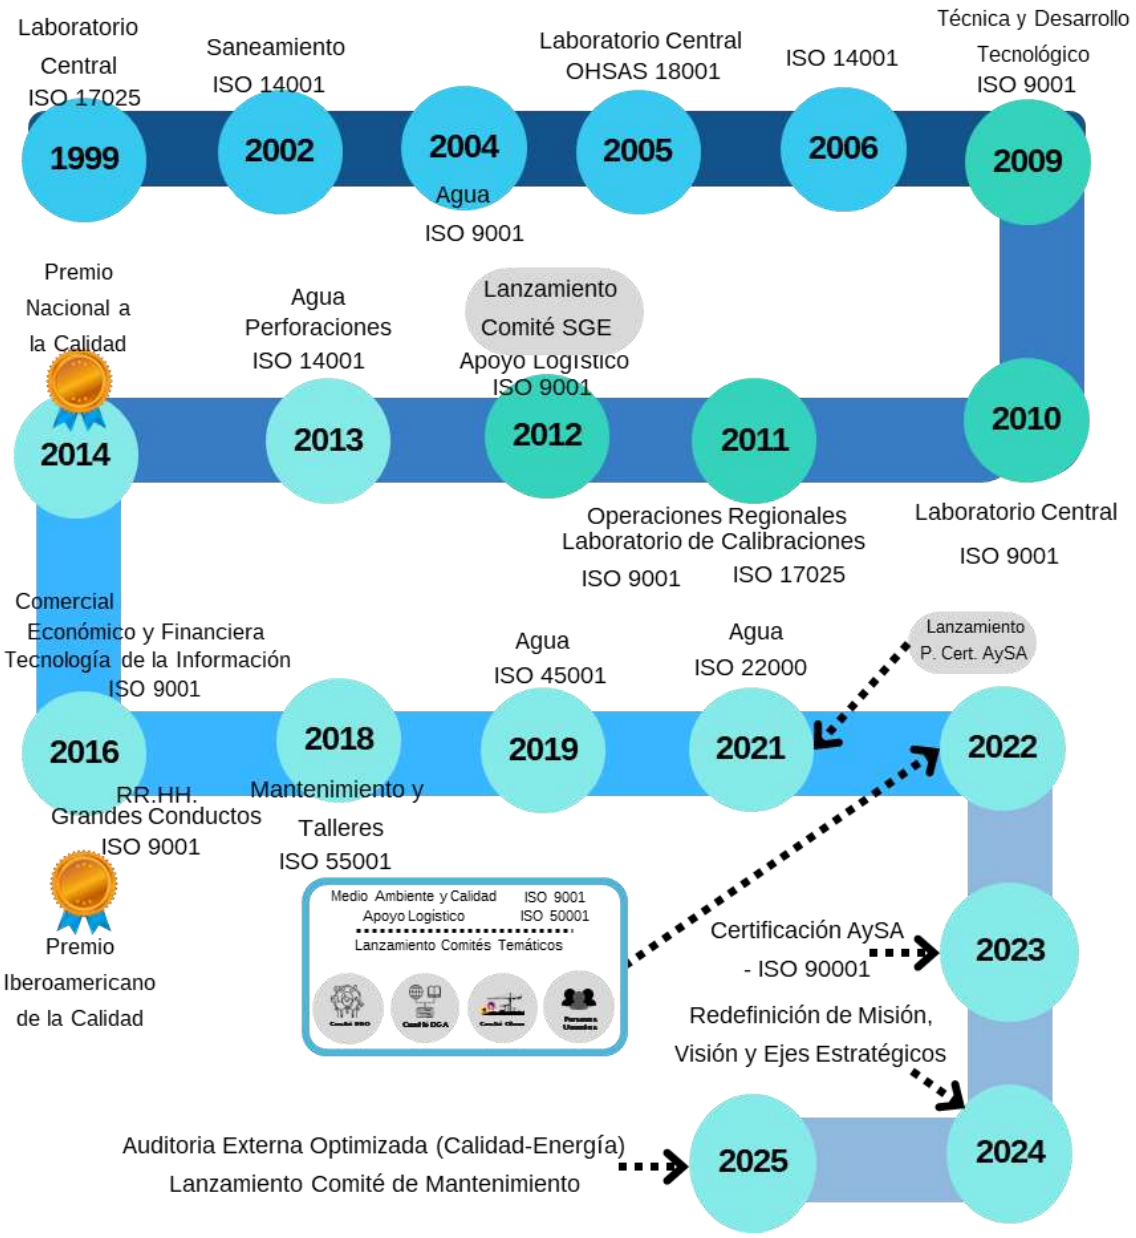

1.5. Certificaciones Vigentes

Las certificaciones vigentes alcanzan diversos procesos/sitios de la empresa, según el siguiente detalle:



1.6. Alcances Certificados

En este apartado se detalla la información relacionada a cada certificado vigente en relación a cada norma. Los certificados oficiales y vigentes se encuentran disponibles en la web oficial de AySA, sección “Nuestras Certificaciones”.



1.6.1. Gestión de la Calidad – ISO 9001

<table>
<tr><td colspan="2">AySA – 2° Seguimiento N° de Certificado: 15506</td></tr>
<tr><td colspan="2">Alcance Certificado:
• Captación y Potabilización de Agua Cruda, Transporte, Distribución y Comercialización del agua potable en el área de concesión.
• Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición y Comercialización de desagües cloacales en el área de concesión.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Resultados Destacados:
</td><td>Se destaca la implementación de la norma ISO 9004 (autoevaluación) para los procesos de gestión, para la obtención del IM “Índice de Madurez”, con el fin de evaluar los procesos en base al desempeño y la planificación de acciones en consecuencia.</td></tr>
<tr><td>Se considera una importantísima fortaleza, para Saneamiento, la puesta en marcha del “Sistema RIACHUELO”, se incluye a la Planta Dock Sud y el Emisario al Río de la Planta.</td></tr>
<tr><td>Se destaca en sector Grandes Usuarios de la Dirección Comercial, la implementación de sistemas cruzados en el control y trazabilidad aplicado a la recaudación de los pagos realizados por los diferentes usuarios minimizando así, los riesgos de errores humanos que se pudieran cometer en el proceso.</td></tr>
</table>

1.6.2. Gestión Ambiental – ISO 14001

<table>
<tr><td>Dirección de Agua - N° de Certificado: 523</td></tr>
<tr><td>Alcance Certificado: Recertificación
• Potabilización de Agua Superficial
• Planta potabilizadora SAN MARTÍN: Potabilización de agua superficial desde la torre toma Nº 3 ubicada en el Río de la Plata hasta las salidas Norte y Sur del río Subterráneo. Elevación del agua potabilizada de las Estaciones Elevadoras Impelentes Principales y Ribereño desde la reserva hasta el conducto de salida.
• Planta potabilizadora MANUEL BELGRANO: Potabilización de agua superficial desde la torre toma ubicada en el Río de la Plata hasta la cámara de enlace con el río subterráneo. Elevación del agua potabilizada de la Estación Elevadora Bernal I desde la reserva hasta el conducto de salida. Elevación del agua potabilizada de las Estaciones Elevadoras Bernal II y Bernal III desde el río subterráneo hasta el conducto de salida.
• Planta potabilizadora JUAN MANUEL DE ROSAS: Potabilización de agua superficial desde la torre toma ubicada en el Río Paraná de las Palmas hasta la reserva. Elevación de agua potabilizada de la Estación Elevadora de Salida desde la reserva hasta el conducto de salida.
• Control Centralizado: Operación y monitoreo del sistema de distribución de agua potabilizada en base a parámetros de producción y demanda del servicio. Mantenimiento de puntos de medición de caudal y presión ubicados en el sistema de distribución de agua potabilizada.
• Estaciones Elevadoras: Elevación de agua potabilizada desde la cámara de aspiración hasta el conducto de salida. Estación Elevadora 3 de Febrero/Estación Elevadora Caballito /Estación Elevadora Centro /Estación Elevadora Constitución /Estación Elevadora Devoto /Estación Elevadora Floresta /Estación Elevadora Lanús /Estación Elevadora Quilmes /Estación Elevadora Villa Adelina /Estación Elevadora Saavedra /Estación Elevadora Morón /Estación Elevadora La Matanza.
• Potabilización de Agua Subterránea: Captación y desinfección de agua subterránea desde el acuífero puelche hasta el conducto de salida. Pozos de Agua Adrogué /Pozos de Agua Florencio Varela /Pozos de Matanza Oeste /Pozos de Agua Merlo-Moreno /Pozos de Agua Norte (Rebombeo de agua potabilizada desde el ingreso hasta el</td></tr>
</table>

conducto de salida)./Pozos de Agua Oeste (Rebombeo de agua potabilizada desde el ingreso hasta el conducto de salida) /Pozos de Agua San Miguel (Rebombeo de agua potabilizada desde el ingreso hasta el conducto de salida). • **PLANTAS DE TRATAMIENTO: Tratamiento y desinfección de agua subterránea desde la entrada de la planta hasta el conducto de salida. Planta de tratamiento Barrio Uno /Planta de tratamiento La Celia /Planta de tratamiento Virrey del Pino /Planta de tratamiento 9 de Abril /Planta de tratamiento Santa Catalina /Planta de tratamiento Ituzaingó /Planta de tratamiento La Morita /Planta de tratamiento Spegazzini.** • **REBOMBEO: Rebombeo de agua potabilizada desde el ingreso hasta el conducto de salida. Rebombeo Norte /Rebombeo Oeste /Rebombeo SE /Rebombeo SO.**	
Resultados Destacados:	
	FO 1 – 7.1 Recursos Se considera una fortaleza la decisión estratégica y los recursos provistos para la recertificación del sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para la Dirección de agua de AYSA, a pesar del contexto actual de restricción presupuestaria, lo que reafirma el compromiso asumido.
	FO 2 – 4.4 Sistema de gestión MA y SST Se considera una fortaleza la incorporación al alcance del SG y de la certificación el sitio “Planta de tratamiento MERLO – Procrear”, que abastece de agua a la zona de influencia y que cumple con los requisitos establecidos

1.6.3. Gestión de Seguridad e Higiene – ISO 45001

Dirección de Agua	N° de Certificado: **29**
Alcance Certificado: Recertificación	
• **Potabilización de Agua Superficial** • **Planta potabilizadora SAN MARTÍN: Potabilización de agua superficial desde la torre toma Nº 3 ubicada en el Río de la Plata hasta las salidas Norte y Sur del río Subterráneo. Elevación del agua potabilizada de las Estaciones Elevadoras Impelentes Principales y Ribereño desde la reserva hasta el conducto de salida.** • **Planta potabilizadora MANUEL BELGRANO: Potabilización de agua superficial desde la torre toma ubicada en el Río de la Plata hasta la cámara de enlace con el río subterráneo. Elevación del agua potabilizada de la Estación Elevadora Bernal I desde la reserva hasta el conducto de salida. Elevación del agua potabilizada de las Estaciones Elevadoras Bernal II y Bernal III desde el río subterráneo hasta el conducto de salida.** • **Planta potabilizadora JUAN MANUEL DE ROSAS: Potabilización de agua superficial desde la torre toma ubicada en el Río Paraná de las Palmas hasta la reserva. Elevación de agua potabilizada de la Estación Elevadora de Salida desde la reserva hasta el conducto de salida.** • **Control Centralizado: Operación y monitoreo del sistema de distribución de agua potabilizada en base a parámetros de producción y demanda del servicio. Mantenimiento de puntos de medición de caudal y presión ubicados en el sistema de distribución de agua potabilizada.** • **Estaciones Elevadoras: Elevación de agua potabilizada desde la cámara de aspiración hasta el conducto de salida. Estación Elevadora 3 de Febrero/Estación Elevadora**	

Caballito /Estación Elevadora Centro /Estación Elevadora Constitución /Estación Elevadora Devoto /Estación Elevadora Floresta /Estación Elevadora Lanús /Estación Elevadora Quilmes /Estación Elevadora Villa Adelina /Estación Elevadora Saavedra /Estación Elevadora Morón /Estación Elevadora La Matanza. • **Potabilización de Agua Subterránea: Captación y desinfección de agua subterránea desde el acuífero puelche hasta el conducto de salida. Pozos de Agua Adrogué /Pozos de Agua Florencio Varela /Pozos de Matanza Oeste /Pozos de Agua Merlo-Moreno /Pozos de Agua Norte (Rebombeo de agua potabilizada desde el ingreso hasta el conducto de salida)./Pozos de Agua Oeste (Rebombeo de agua potabilizada desde el ingreso hasta el conducto de salida) /Pozos de Agua San Miguel (Rebombeo de agua potabilizada desde el ingreso hasta el conducto de salida).** • **PLANTAS DE TRATAMIENTO: Tratamiento y desinfección de agua subterránea desde la entrada de la planta hasta el conducto de salida. Planta de tratamiento Barrio Uno /Planta de tratamiento La Celia /Planta de tratamiento Virrey del Pino /Planta de tratamiento 9 de Abril /Planta de tratamiento Santa Catalina /Planta de tratamiento Ituzaingó /Planta de tratamiento La Morita /Planta de tratamiento Spegazzini.** • **REBOMBEO: Rebombeo de agua potabilizada desde el ingreso hasta el conducto de salida. Rebombeo Norte /Rebombeo Oeste /Rebombeo SE /Rebombeo SO.**	
Resultados Destacados:	
	FO 1 – 7.1 Recursos Se considera una fortaleza la decisión estratégica y los recursos provistos para la recertificación del sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para la Dirección de agua de AYSA, a pesar del contexto actual de restricción presupuestaria, lo que reafirma el compromiso asumido.
	FO 2 – 4.4 Sistema de gestión MA y SST Se considera una fortaleza la incorporación al alcance del SG y de la certificación el sitio “Planta de tratamiento MERLO – Procrear”, que abastece de agua a la zona de influencia y que cumple con los requisitos establecidos
	FO 3 - 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño Se considera una fortaleza el seguimiento y medición documentado a través de los Informes de HyS, que posee información muy completa y actualizada para la toma de acciones en base a los resultados obtenidos.

1.6.4. Gestión Energética – ISO 50001

Gcia. De Energía - Dirección de Apoyo Logístico	N° de Certificado: **45**
Alcance Certificado: Recertificación	
• **Proceso de recolección, transporte y tratamiento de efluentes. Potabilización, transporte y distribución de agua.** • **Áreas administrativas, comerciales y taller de mantenimiento de grandes equipos.**	
Resultados Destacados:	
	FO1-9.1.1 **Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y del SGEn** Se destaca como fortaleza la metodología utilizada para la medición, seguimiento, análisis y evaluación de los aspectos relacionados con el desempeño energético.

1.6.5. Gestión de Activos – ISO 55001

Dirección de Mantenimiento y Talleres	N° de Certificado: **CSG-21076**
Alcance Certificado: Recertificación	
• **Planificación, los Mantenimiento Preventivos, Predictivos y las acciones Correctivas emergentes de las grandes bombas con sus motores y lo Puentes Grúa asociados que se encuentran en las respectivas salas de la Dirección de Aguas y de la Dirección de Saneamiento de AySA y que atiende desde su Establecimiento Varela.** • **Adicionalmente la DMyT interactúa con Direcciones de AySA a cargo de otras actividades del ciclo de vida de los activos físicos a través de Acuerdos de Servicio.**	
Resultados Destacados:	
	**APN°1 - Madurez y evolución del Sistema de Gestión de Activos** El Sistema de Gestión de Activos demuestra una evolución sostenida a lo largo del tiempo, reflejando una mejora progresiva en su madurez y desempeño. Este avance es resultado del compromiso coordinado de los distintos niveles de la organización, orientado a la mejora continua, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la excelencia operativa.
	APN°2 - Compromiso y liderazgo de la Dirección Se evidencia un alto nivel de compromiso y liderazgo por parte de la Dirección de Mantenimiento y Talleres (DMyT) en la implementación y evolución del Sistema de Gestión de Activos. La conducción participa activamente en la definición de lineamientos estratégicos, el seguimiento de indicadores y la provisión de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
	APN°3 - Integración progresiva de los sistemas de gestión Se destaca como una fortaleza la integración gradual de los sistemas de gestión bajo los lineamientos de las normas ISO 9001 e ISO 55001. Esta integración favorece la alineación de procesos, la consolidación de prácticas comunes, el uso eficiente de los recursos y una visión organizacional integrada orientada a la mejora continua y al desempeño sostenible.
	APN°4 - Mejora sostenida de los indicadores de gestión Se observa una mejora constante en los principales indicadores de

	gestión, con avances en disponibilidad, confiabilidad, satisfacción de usuarios internos, reducción de retrabajos, desempeño predictivo, cobertura termográfica y seguimiento presupuestario. Estos resultados reflejan un alto nivel de profesionalismo y un fuerte compromiso con la mejora continua.

1.6.6. Inocuidad Alimentarias – ISO 22000

Dirección de Agua	N° de Certificado: **FS6/7/8**
Alcance Certificado: Seguimiento n°1	
• **Planta potabilizadora SAN MARTÍN: Captación de agua superficial desde la torre toma Nº 3 ubicada en el Río de la Plata (34°32'37.8"S 58°25'05.7"W), su potabilización y elevación en la estación elevadora Impelentes Principales hasta las salidas Norte, Centro y Sur del río subterráneo en la planta San Martín ubicada en Av. de los Ombúes 209, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Envasado de agua potabilizada en sachet en la planta San Martín, proveniente de la estación elevadora Impelentes Principales, como sistema alternativo de provisión de agua potable eventual por demanda de las direcciones regionales y eventos definidos por institucionales o por requerimiento de autoridades nacionales o provinciales.** • **Planta potabilizadora MANUEL BELGRANO: desde la captación de agua superficial desde la torre toma ubicada en el Río de la Plata (34°40'57.83"S, 58°15'13.68"O), su potabilización y elevación en la Estación Elevadora Bernal I y Bernal IV hasta el conducto de salida en la planta Manuel Belgrano ubicada en Caseros 641, Bernal, provincia de Buenos Aires, República Argentina.** • **Planta potabilizadora JUAN MANUEL DE ROSAS: desde la captación de agua superficial desde la torre toma ubicada en el Río Paraná de las Palmas (34°14'40"S, 58°44'29"W), su potabilización y elevación en la estación elevadora de salida en la planta Juan Manuel de Rosas ubicada en ruta provincial 26 y Brasil, Dique Luján, provincia de Buenos Aires, República Argentina.**	
Resultados Destacados:	
	No cuenta con resultados destacados. - - -

1.6.7. Ensayos Acreditados – ISO/IEC 17025

Dirección de Medio Ambiente y Calidad	N° de Certificado: **FS6/7/8**
Alcance Certificado: 4° Mantenimiento	
Resultados Destacados:	
	F N° 1 - El personal entrevistado conoce sus tareas y responsabilidades respondiendo con seguridad y claridad en las entrevistas realizadas. El personal entrevistado está altamente comprometido con el Sistema de Gestión de la Calidad implementado. En el área de Microbiología, se resalta el programa de capacitación y entrenamiento continuo de todo el personal técnico que permiten llevar a cabo las actividades de ensayo uniformemente entre las distintas sedes, en las cuales se destaca la competencia técnica de todos los analistas en todos los aspectos de los métodos evaluados y los conocimientos y amplia experiencia de sus supervisores. El nivel de conocimientos y de desempeño del personal. La actividad de capacitación del Dpto. Planificación la Gerencia de H y S. R-LAB-ENS-007 Ver. 02 Cálculo de incertidumbre y E-LAB-ENS-002 Ver. 00 Guía para la estimación de la incertidumbre de la medición.
	-

Producto /Material	
• Agua potabilizada de toma superficial • Agua potabilizada de toma subterránea • Agua cruda de toma superficial • Agua cruda de toma subterránea • Agua en el sistema de distribución.	
Ensayo	
(1) Determinación de conductividad	(6) Sulfatos Por Cromatografía Iónica
(2) Determinancio de Residuo Conductimétrico	(7) Cloruros Por Cromatografía Iónica
(3) Determinación de pH	(9) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Tetracloruro de carbon
(4) Turbiedad Por Cromatografía Iónica	(10) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: 1,4-Diclorobenceno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas

(5) Nitratos Por Cromatografía Iónica	(11) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: 1,2-Dicloroetano Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas
(12) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Tetracloroeteno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas	(14) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Tolueno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas
(13) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: 1,2-Diclorobenceno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas	(15) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Benceno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas
(16) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Etilbenceno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas	(21) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: o- Xileno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas
(17) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: 1,1Dicloroeteno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas	(22) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: m+p xileno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas
(18) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: 1,1,1,Tricloroetano Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas	(23) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: monoclorobenceno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas
(19) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Estireno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas	(24) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: 1,3 Diclorobenceno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas
(20) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: 1,1,2,2-Tetracloroetano Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas	(25) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Tricloroetileno Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas
(26) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Cloroformo Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas	(28) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Dibromoclorometano Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas

(27) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Diclorobromometano Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas		(29) Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa: Bromoformo Cromatógrafo Gaseoso con Detector de Masas			
Laboratorio	**LC**	**LRN**	**LRO**	**LRSO**	**LRSE**
	✓	-	-	-	-

Producto /Material
• **Agua potabilizada de toma superficial** • **Agua potabilizada de toma subterránea** • **Agua cruda de toma superficial** • **Agua cruda de toma subterránea** • **Agua en el sistema de distribución.** • **Líquido residual industrial** • **Líquido residual cloacal**
Ensayo

(31) Determinación de Sustancias Fenólicas (Suspendido)	(32) Determinación de Cianuros totales con digestión UV baja por análisis de flujo segmentado				
Laboratorio	**LC**	**LRN**	**LRO**	**LRSO**	**LRSE**
	✓	-	-	-	-

Producto /Material
• **Agua potabilizada de toma superficial** • **Agua potabilizada de toma subterránea** • **Agua cruda de toma subterránea** • **Agua en el sistema de distribución.** • **Agua de reservorios, bajada de tanque.**
Ensayo

(33) Determinación de Coliformes totales por el método de membrana filtrante empleando medios cromogénicos	-

(34) Determinación de Echerichia coli por el método de membrana filtrante empleando medios cromogénicos	-				
Laboratorio	**LC**	**LRN**	**LRO**	**LRSO**	**LRSE**
		**33/34**	**33/34**	**33/34**	**33/34**

Producto /Material					
• **Agua potabilizada de toma superficial** • **Agua potabilizada de toma subterránea** • **Agua cruda de toma subterránea** • **Agua en el sistema de distribución.**					
Ensayo					
(36) Determinación de elementos traza en agua por espectrometría de plasma inductivamente acoplado y espectrometría de masas Plomo	(39) Determinación de elementos traza en agua por espectrometría de plasma inductivamente acoplado y espectrometría de masas Manganeso				
(37) Determinación de elementos traza en agua por espectrometría de plasma inductivamente acoplado y espectrometría de masas Arsénico	(40) Determinación de elementos traza en agua por espectrometría de plasma inductivamente acoplado y espectrometría de masas Aluminio				
(38) Determinación de elementos traza en agua por espectrometría de plasma inductivamente acoplado y espectrometría de masas Cromo	(41) Determinación de elementos traza en agua por espectrometría de plasma inductivamente acoplado y espectrometría de masas Uranio				
Laboratorio	**LC**	**LRN**	**LRO**	**LRSO**	**LRSE**
		**-**	**-**	**-**	**-**

Producto /Material
• **Agua potabilizada de toma superficial** • **Agua potabilizada de toma subterránea** • **Agua cruda de toma superficial** • **Agua cruda de toma subterránea** • **Agua en el sistema de distribución.** • **Líquido residual industrial** • **Líquido residual cloacal** • **Agua de reservorios, bajada de tanque.**
Ensayo

(42) Determinación de Arsénico totales por Espectrometría de Emisión-Plasma Inductivo de Argón (ICP-OES)		(43)Determinación de Plomo totales por Espectrometría de Emisión-Plasma Inductivo de Argón (ICP-OES)			
Laboratorio	**LC**	**LRN**	**LRO**	**LRSO**	**LRSE**
	✓	✓	-	-	-



www.aysa.com.ar

6. DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS

INDICE

GERENCIA DE DIAGNOSTICO, ESTUDIO HIDRAULICO Y MODELOS 2

1 AREA RIOS SUBTERRÁNEOS 3

1.1 Introducción 3
1.2 Descripción del sistema de Ríos Subterráneos 3
1.3 Tareas ejecutadas durante el año 2025 5
1.3.1 Programa de Diagnóstico y Rehabilitación de los ríos subterráneos. 5
1.3.2 Programa de Rehabilitación y Readecuación de accesos 6

2 AREA INSPECCIÓN VIDEO SONAR 8

2.1 Inspección con el Sistema Sonar 8
2.2 Diagnóstico de cañerías de menor diámetro – Longitud inspeccionada [m] 10

3 AREA ESTUDIOS HIDRAULICOS 11

3.1 Estudio hidráulico sobre la Línea San Fernando 11
3.2 Estudio hidráulico sobre la Línea San Martín 13
3.3 Estudio hidráulico sobre la línea Superí 14
3.4 Estudio hidráulico Sistema Bernal I – Bernal IV 15
3.5 Estudio Hidráulico sobre la Línea EE centro – EE Constitución 16
3.6 Estudio de medición en el Radio Antiguo 16

4 AREA MODELOS 18

4.1 Modelos Matemáticos 18
4.1.1 Modelos de redes de distribución de agua potable 18
4.1.2 Modelos de los ríos subterráneos. 20
4.1.3 Redes de desagües cloacales 20
4.1.4 Modelos de dispersión atmosférica 21
4.1.5 Modelos del río de la plata 22
4.1.6 Modelos fluviales de cursos de agua relacionados con AySA (Matanza-Riachuelo, Luján, Reconquista, Paraná y otros) 23
4.1.7 Modelos hidráulicos 3d, modelación cfd (computational fluid dynamics), modelos sph (smoothed-particle hydrodynamics) 24

GERENCIA DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS HIDRAULICO Y MODELOS

La Gerencia de Diagnóstico, Estudios Hidráulicos y Modelos desarrolla tareas de gabinete que contemplan estudios hidráulicos y modelos en tanto como tareas de campo incluyen la inspección y el diagnóstico de grandes cañerías de transporte.

La Gerencia tiene a su cargo el plan de Diagnóstico y Mantenimiento del Sistema de Ríos Subterráneos compuesto por tareas diferenciadas, pero a su vez complementarias, enmarcadas dentro de una serie de programas encargados de mejorar la operatividad del sistema, disminuir la vulnerabilidad y diagnosticar su estado año a año.

Asimismo, la Gerencia contribuye al Diagnóstico de Redes Cloacales y Pluviocloacales (Radio Antiguo), implementando técnicas de video inspección y tecnologías acústicas (sistema Sonar), interactuando con la Dirección de Grandes Conductos y la Dirección de Operaciones Regionales.

En referencia a las tareas de gabinete, la Gerencia desarrolla modelos matemáticos que permiten aproximar mediante algoritmos apropiados el comportamiento de sistemas reales. Estos modelos resultan en herramientas de diagnóstico, mejora de sistemas existentes, optimización de consumos de energía y agua, diseño de obras nuevas, predicción de calidad de agua y/o funcionamiento de las redes en tiempo real.

Otra de las tareas de gabinete es la realización de estudios hidráulicos en cañerías de transporte, particularmente en las salidas de la Estaciones Elevadoras, con el objetivo principal de determinar el funcionamiento hidráulico de la cañería, verificar la pérdida de carga y velocidad, suministrando herramientas e información para optimizar la operación del sistema de transporte.

1 AREA RIOS SUBTERRÁNEOS

1.1 Introducción


La Gerencia de Diagnóstico, Estudios Hidráulicos y Modelos tiene a su cargo el plan de Diagnóstico y Mantenimiento del Sistema de Ríos Subterráneos, compuesto por tareas diferenciadas pero a su vez complementarias.

Estas tareas se encuentran enmarcadas dentro de una serie de programas encargados de mejorar la operatividad del sistema, disminuir su vulnerabilidad y diagnosticar el sistema año a año.

A continuación, se enumeran los programas a los que se hace referencia en los párrafos anteriores:

- Programa de Diagnóstico y Rehabilitación de los Ríos Subterráneos
- Programa de Rehabilitación y Readecuación de Accesos.
- Plan de Gestión de Tecnologías y Equipamiento.

El diagnóstico integral del sistema de Ríos Subterráneos se realiza con la utilización de dos equipos de alta tecnología denominados ROV, sigla que significa:" Vehículo de Operación Remota".

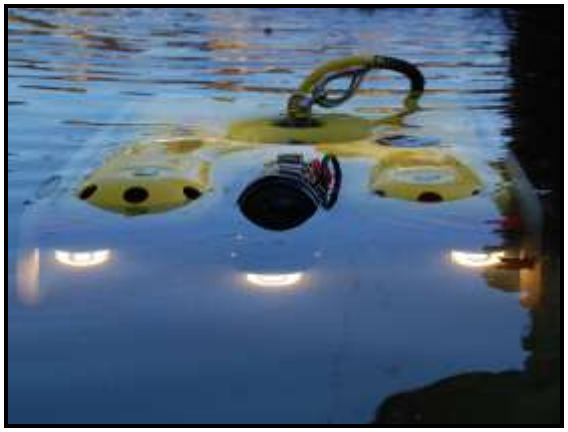



A su vez se lleva adelante el mantenimiento del sistema, esto significa coordinar y ejecutar las rehabilitaciones y readecuaciones de los puntos de acceso al mismo (cámaras), proyectar y coordinar la construcción de nuevos ingresos y planificar las intervenciones en los conductos para la reparación de fallas encontradas durante las inspecciones que comprometan estructuralmente al conducto.

1.2 Descripción del sistema de Ríos Subterráneos


Características

El sistema de ríos subterráneos está constituido por conductos de sección circular, construidos, en su mayoría, en hormigón simple con diámetros internos que varían desde 2.60m a 4.60m, recorriendo una distancia total de casi 90 Km de longitud, con una pendiente cercana al 1:10.000 en sentido preferencial Este - Oeste.

En la misma dirección, la topografía de Buenos Aires asciende desde cota 15 OSN (3m sobre el nivel del mar) hasta cota 38 OSN (26 msnm), lo que da como resultado que en

determinados sectores periféricos estos conductos se encuentren en profundidades de hasta 35 metros.

Actualmente el sistema cuenta con (59) cámaras de acceso, algunas de ellas equipadas con elementos de maniobra (compuertas) que hoy por hoy se encuentran fuera de servicio.

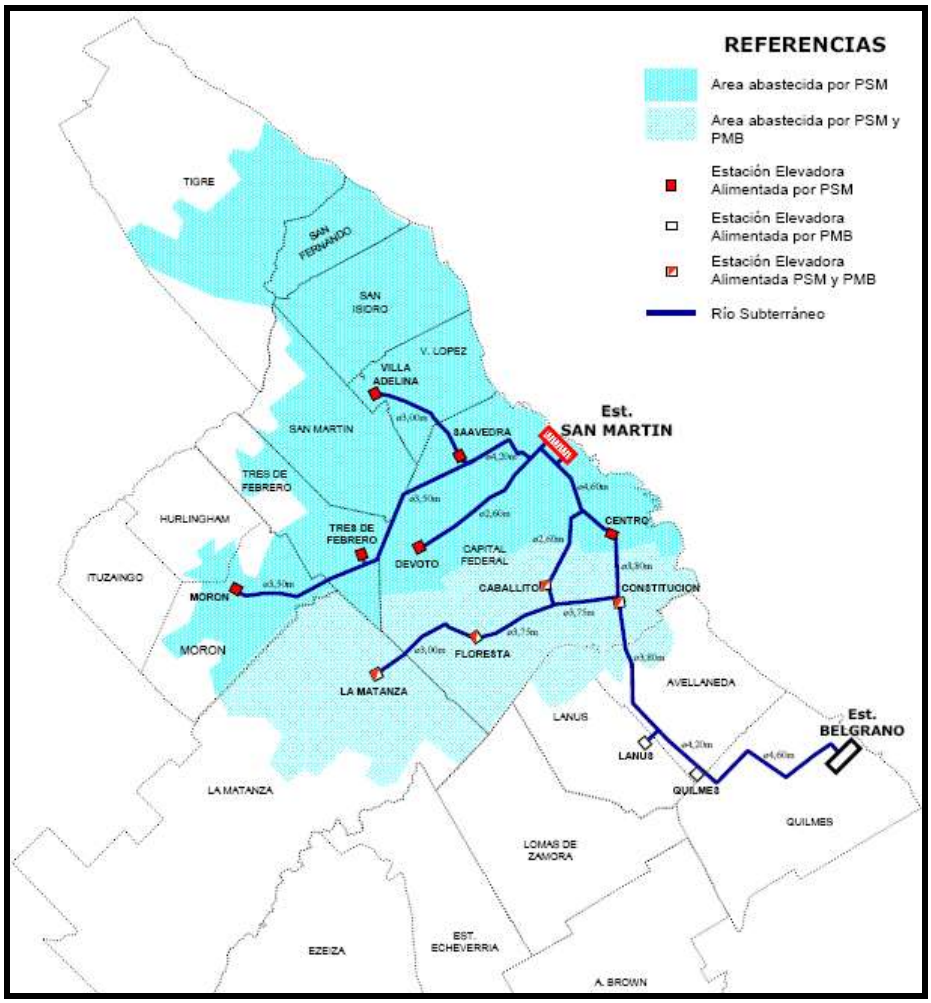

Funcionamiento

El sistema fluye por gravedad a sección llena, sin elementos de regulación del flujo, y sólo es condicionado por el nivel piezométrico de las reservas y la demanda de las estaciones elevadoras. En consecuencia, a lo anterior, la inhabilitación de algún sector del sistema está condicionada por la detención de las estaciones elevadoras del tramo involucrado y por el nivel piezométrico de las reservas de las plantas potabilizadoras (regulación de la producción de los establecimientos Gral. San Martín y Gral. Belgrano).

Este tipo de funcionamiento dificulta y determina cualquier intervención en el sistema (mantenimiento, inspección, etc.) ya que afecta directamente al servicio, haciéndose inadmisible la inhabilitación de los tramos por períodos de tiempo prolongados.

Es necesario destacar que la profundidad de ejecución de los mismos, su funcionamiento y su paso por plena ciudad hacen muy compleja su intervención, motivo por el cual es sumamente importante mantener un monitoreo constante del estado del sistema.

A partir de esto es necesario contar con un estudio completo del sistema de Ríos Subterráneos, para lo cual se llevan adelante los programas de “Diagnóstico y Rehabilitación de los RS” y de “Rehabilitación y Readecuación de Accesos”,

concentrando el equipamiento, los recursos y los registros de todo lo concerniente al sistema de Ríos Subterráneos.

1.3 Tareas ejecutadas durante el año 2025

Gran parte de las tareas se han desarrollado bajo los lineamientos de los siguientes programas del plan estratégico del área:

Programa	*Objetivo*
Programa de Diagnóstico y Rehabilitación de los Ríos Subterráneos.	Profundizar el conocimiento del estado estructural del sistema y reducir los riesgos de grandes problemáticas.
Programa de Rehabilitación y Readecuación de Accesos.	Disminuir la vulnerabilidad del sistema, flexibilizar su operación en puntos estratégicos e incrementar la longitud de inspección.
Programa de Gestión de tecnologías y Equipamiento.	Adquirir equipos con el fin de Incrementar la longitud de inspección y optimizar los tiempos de ejecución.

1.3.1 Programa de Diagnóstico y Rehabilitación de los ríos subterráneos.

- ***Diagnóstico del sistema de Ríos Subterráneos***

Tramo	Longitud total del tramo	Total inspeccionado	Inspeccionado 2025
Planta San Martin Saavedra	5929 m	100 %	500 m
Saavedra - Villa Adelina	7674 m	100 %	1106 m
Barrancas - Devoto	7609 m	90.12 %	1500 m
Saavedra - Morón	15305 m	97.81 %	5250 m
Planta San Martin S- Paitovi	8835 m	98.54 %	-
Botánico - Caballito	6074 m	100 %	-
Paitovi - Floresta	8648 m	90.14 %	500 m
Floresta - Matanza	6747 m	88.93 %	-
Planta Manuel Belgrano - Lanús	11941 m	43.99 %	-
Lanús - Paitovi	8890 m	100 %	-
Tramo Frente a PSM	714 m	100 %	-
TOTAL	**88366 m**	**89.39 %**	**8856 m**

Longitud Total del Sistema: **88.366 m**

Longitud Inspeccionable del Sistema: **84.822 m (96.05 %)**


Longitud Inspeccionada al menos una vez: **78.994 m (89.39 %)**

Longitud Inspeccionada 2025: **8.856 m (10 %)**

Detección de infiltraciones

Con el fin de tener una trazabilidad del estado de los tramos e identificar los de mayor criticidad se generó el Índice de infiltración, el cual se establece a partir del cociente entre la cantidad de infiltraciones detectadas en cada tramo y su longitud.

Entre los años 2008 – 2025 se detectaron 744 infiltraciones distribuidas en mayor o menor medida en cada uno de los tramos.

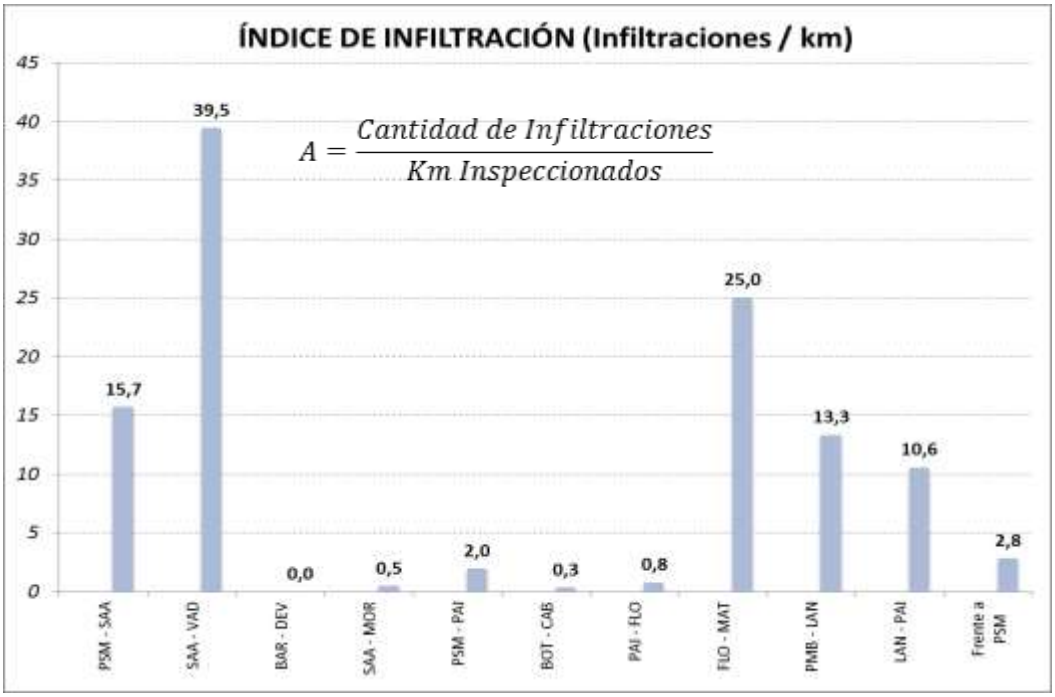

Las infiltraciones son categorizadas dependiendo de sus características y su ubicación en el conducto, de acuerdo al instructivo **I-DMR-001**.

1.3.2 Programa de Rehabilitación y Readecuación de accesos

Debido a que las cámaras de acceso al sistema de ríos subterráneos fueron construidas en épocas en donde la forma y protocolos para realizar tareas en espacios confinados eran distintos, se generan dificultades de diversa índole al momento de realizar las inspecciones del sistema.

Asimismo, de acuerdo a ingresos precedentes realizados por personal interviniente en las tareas de diagnóstico y mantenimiento, se ha observado un avanzado deterioro en distintos elementos de las cámaras que imposibilitan realizar las inspecciones a través de estos puntos, mas allá de las dificultes expuestas en el párrafo anterior.

Durante el año 2025 se ha trabajado en la rehabilitación de tres cámaras de acceso al sistema.

Cámara de Acceso N°52: Cambio de la estructura de izaje para el descenso de equipos e instalación de puntos de anclaje. Estado de avance a diciembre 35%.

Cámara de Acceso N°33: Cambio de la escalera de acceso a la cámara e instalación de puntos de anclaje y ménsulas. Estado de avance a diciembre 35%.

Cámara de Acceso N°28: Cambio de la estructura de izaje para el descenso de personas y equipos, instalación de puntos de anclaje, instalación de ménsulas y cambio de barandas. Estado de avance a diciembre 35%. En las imágenes siguientes se muestran las piezas a instalar durante su proceso de fabricación en taller.









En adición a lo que está en ejecución, durante el año 2025 se ha trabajado en los pliegos para la rehabilitación / readecuación de varias cámaras de acceso al sistema previsto para el año 2026.

Los trabajos de rehabilitación / readecuación de cámaras, contempla la fabricación e instalación de estructuras necesarias para la realización de los operativos de inspección de forma segura.

2 AREA INSPECCIÓN VIDEO SONAR

El área Video Sonar es el sector de la Gerencia que se encarga de realizar inspecciones de conductos tanto de agua como cloaca, abarcando la totalidad de los diámetros.

Las grandes conducciones de cloaca son inspeccionadas con el Sistema Sonar, el cual brinda imágenes de la sección del conducto, detectando roturas y sedimentos.

Para el caso de conducciones de menor diámetro (agua y cloaca) se utilizan las video cámaras, éstos son equipos comandados desde el punto de acceso que nos brindan una imagen del conducto, detectando infiltraciones, roturas, estado de las conexiones, etc.


En ambos casos el sector utiliza las imágenes obtenidas de las inspecciones para realizar el estudio de diagnóstico de las cañerías.

Durante el año 2025 el área desarrollo, entre otras, las siguientes tareas:

- Se realizaron tareas de relevamiento e inspección con el sistema Sonar del Ramal San Martín de la Tercera Cloaca Máxima.
- Se realizaron tareas de relevamiento e inspección con el sistema Sonar del Colector Costanero.
- Se realizaron tareas de relevamiento del Ramal Morón de la Tercera Cloaca Máxima.
- Se realizaron tareas de relevamiento e inspección con el sistema de video de la Red cloacal secundaria a pedido de las Direcciones Regionales.

2.1 Inspección con el Sistema Sonar

Las inspecciones del Sistema Sonar son dirigidas a grandes conductos de cloacas, específicamente a las denominadas Cloacas Máximas y sus conexiones intermedias. En estas inspecciones se verifica tanto el estado estructural como el nivel de sedimentación del conducto.

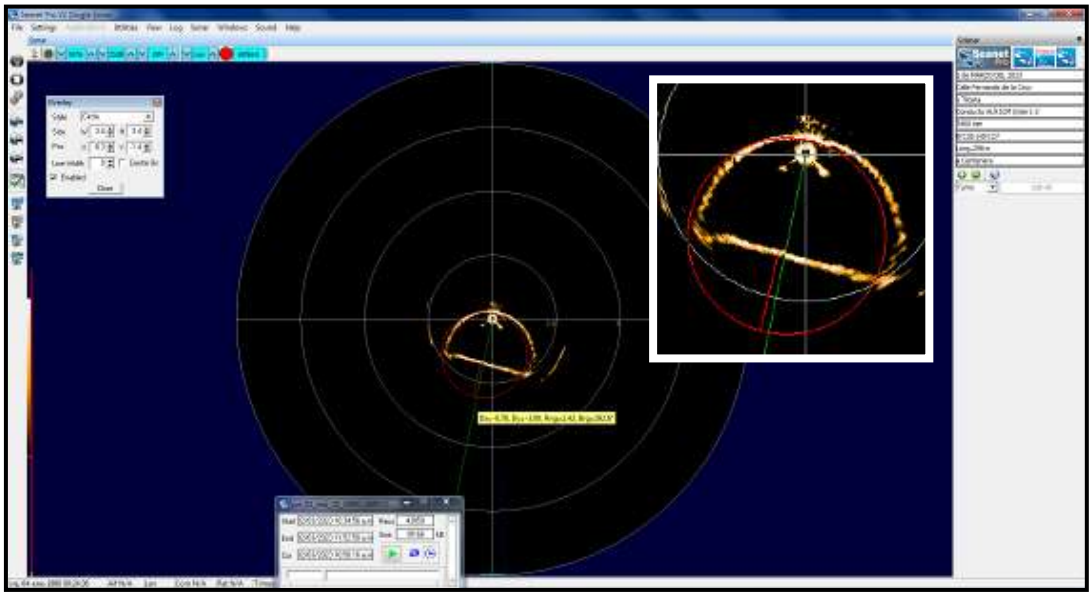

La figura anterior muestra la sección de un conducto con un nivel de sedimento cercano a la mitad de su sección.

A continuación se realiza un resumen de lo inspeccionado a lo largo del año 2025.

Conducto: Ramal San Martín - Tercera Cloaca Máxima

Fecha	Tramo	Sección (mm)	Longitud Inspeccionada (m)
10/02/2025	Bolivia y Diagonal Campos	1300	200
12/02/2025	Saavedra y San Martín	1300	400
13/02/2025	Av. San Martín y Ladines	1300	390
21/02/2025	Av. San Martín y Bordahebere	1300	500
20/03/2025	Av. San Martín y Nogoya	1300	492

Longitud inspeccionada: **1.982 m**

Conducto: Colector Costanero

Fecha	Tramo	Sección (mm)	Longitud Inspeccionada (m)
20/01/2025	Av. Libertador y Cnel. Díaz	2800	116
23/01/2025	Av. Libertador y P. Lucena	2800	200
07/02/2025	Av. Libertador y Billinghurst	2800	195
18/02/2025	Av. Libertador y Ocampo	2800	120
19/02/2025	Av. Libertador y Chile	2800	220
26/03/2025	Av. F.Alcorta y Austria	2800	50
26/03/2025	Tagle y F.alcorta	2800	95


Longitud inspeccionada: **996 m**



Adicionalmente se realizaron varias tareas de relevamiento y busqueda de información en otros conductos similares, ramal Morón Tercera Cloaca Máxima y Colector Costanero.

2.2 Diagnóstico de cañerías de menor diámetro – Longitud inspeccionada [m]

MES	DRC [m]	DRN [m]	DRO [m]	DRS [m]
ENERO	300	180	0	0
FEBRERO	130	0	120	880
MARZO	236	150	0	120
ABRIL	220	0	0	330
MAYO	180	115	0	130
JUNIO	84	120	0	0
JULIO	60	84	0	360
AGOSTO	70	90	0	210
SETIEMBRE	250	0	37	0
OCTUBRE	445	0	0	150
NOVIEMBRE	395	0	0	180
DICIEMBRE	250	0	0	350
TOTAL	**2.490**	**739**	**157**	**2.710**

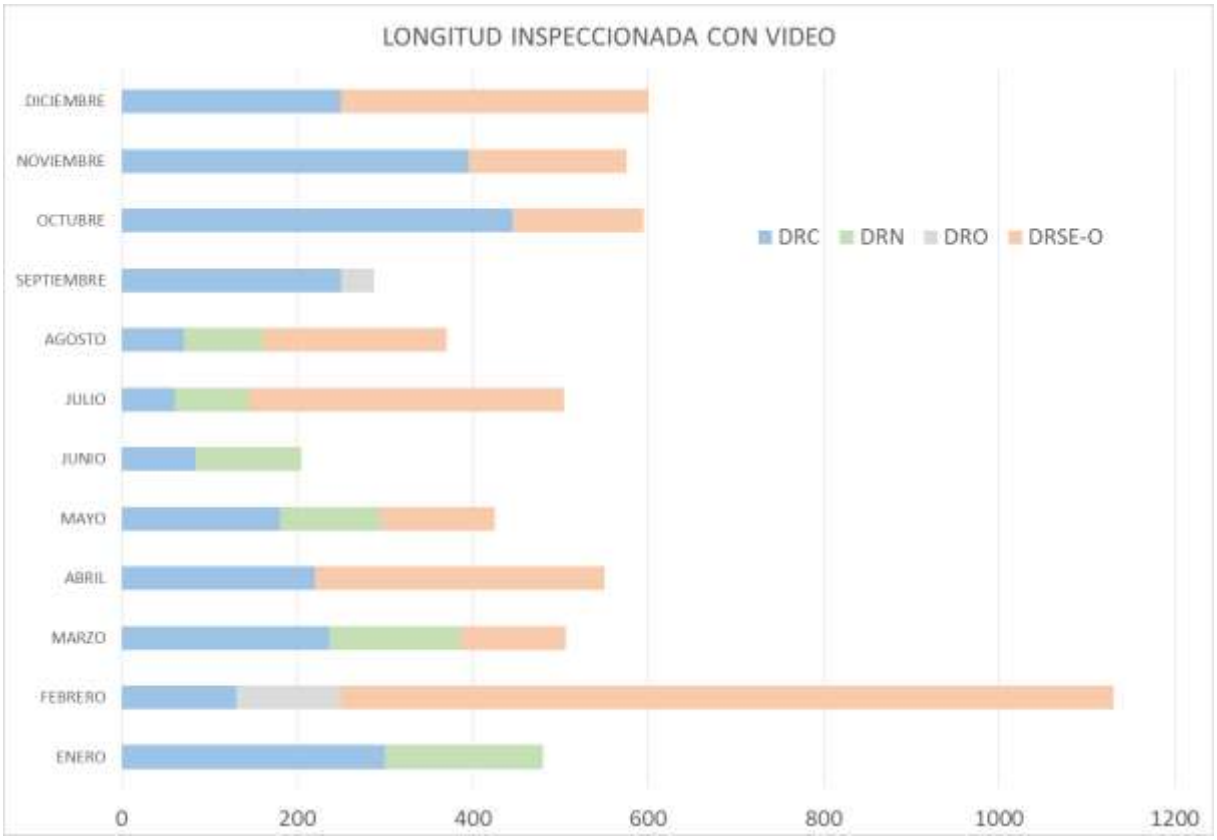

3 AREA ESTUDIOS HIDRAULICOS


Durante el año 2025 se realizaron varios estudios hidráulicos en cañerías de transporte, particularmente en las salidas de la Estaciones Elevadoras Villa Adelina, Devoto y Saavedra, suministrando herramientas e información para la optimizar la operación del sistema.

El objetivo principal fue determinar el funcionamiento hidráulico de la cañería, verificando la pérdida de carga y velocidades. Para ello se trazó la línea piezométrica real obtenida de mediciones puntuales sobre la cañería (válvulas de aire) y se la comparó con la línea piezométrica teórica.

3.1 Estudio hidráulico sobre la Línea San Fernando

La línea San Fernando refiere a la salida VA6 de la Estación Elevadora Villa Adelina, con una longitud aproximada de 14 km.

En primera instancia se realizó el relevamiento de las cámaras de medición y válvulas de aire para la posterior instalación de registradores de presión en puntos representativos. En total se instalaron 11 equipos, midiendo en forma continua y simultánea durante un período de 7 días corridos.

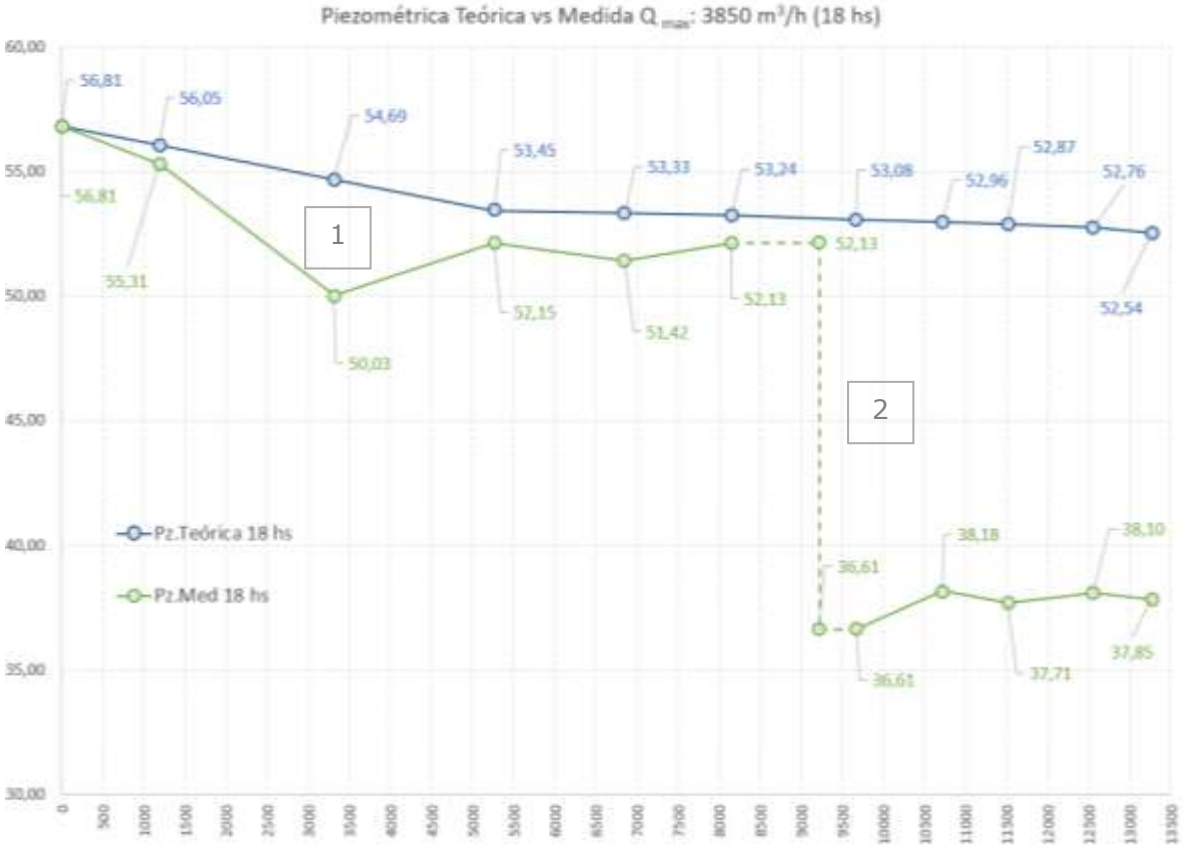


La piezométrica obtenida disparó dos acciones, la primera fue determinar la causa de la pérdida de carga en la progresiva 3300 para lo cual se realizó una nueva campaña de medición acotada al tramo en estudio y la densificación de los puntos de medición. Concluyendo que la pérdida de carga se debe a la vinculación existente a la zona baja de Boulogne (Villa Hidalgo).


La segunda acción surgió del salto de presión (Δ 16 m) localizado en la progresiva 9300. Este salto es a causa del pasaje del caudal a través del By-Pass ubicado en Sucre y Acevedo de un diámetro mucho menor al de la cañería f 300 mm, provocando la pérdida de carga detectada durante la campaña de medición.

Durante el mes de diciembre modificó el funcionamiento de la cañería, realizando la apertura de la válvula de ϕ 1100 mm ubicada en Av. Sucre y Acevedo y cerrando el By-Pass. Al mismo tiempo se realizó un nuevo cierre sobre la válvula ubicada en French y M. Rodríguez, modificando de esta manera la configuración y optimizando su funcionamiento.

Configuración previa a la maniobra

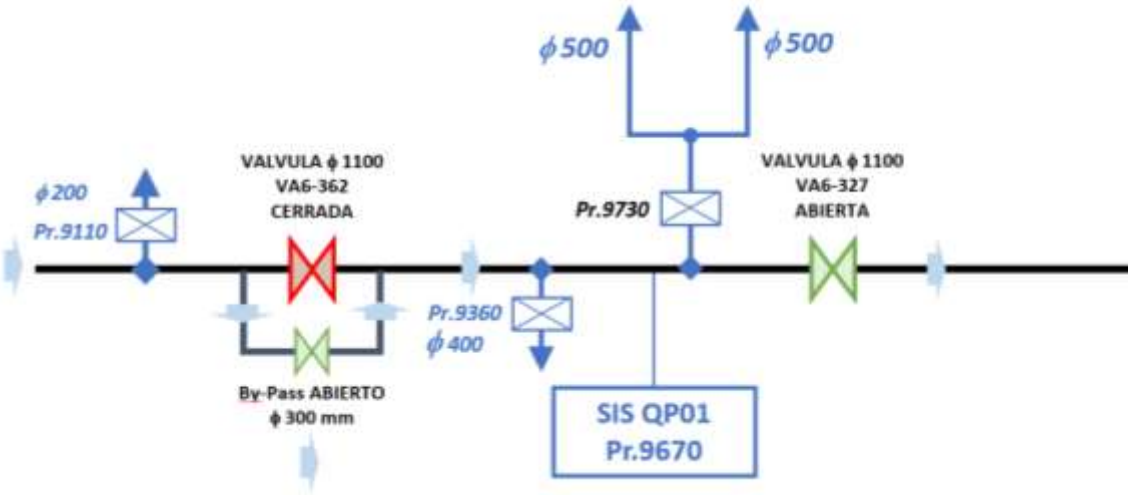

Configuración posterior a la maniobra

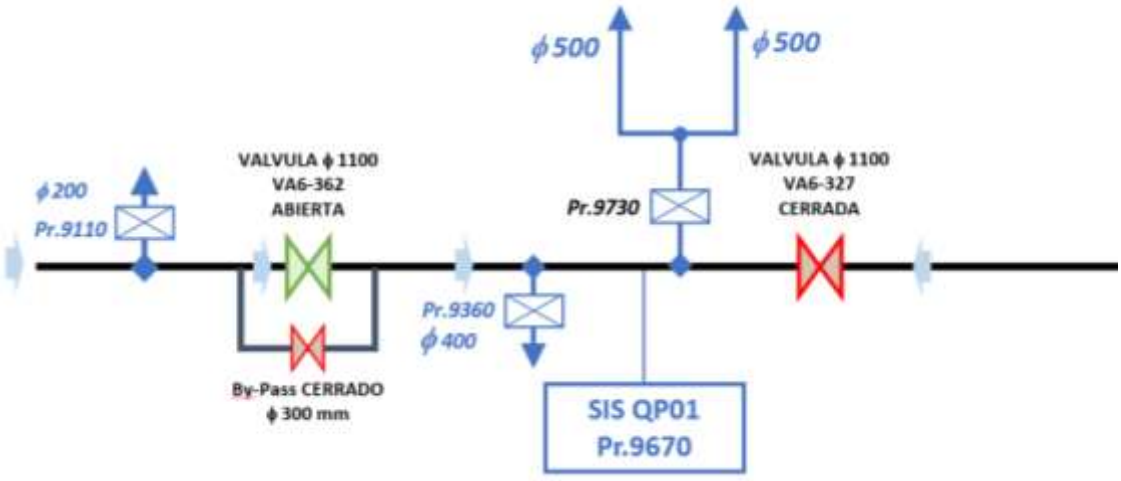

3.2 Estudio hidráulico sobre la Línea San Martín


La línea San Martín refiere a la salida VA2 de la Estación Elevadora Villa Adelina vinculada al refuerzo San Martín de la Estación Elevadora Devoto, con una longitud aproximada de 12 km.


En primera instancia se realizó el relevamiento de las válvulas de aire para la posterior instalación de registradores de presión en puntos representativos. En total se instalaron 6 equipos, midiendo en forma continua y simultánea durante un período de 7 días corridos.

Del trazado de la línea piezométrica se determinó que las salidas de las estaciones elevadoras no se encuentran vinculadas debido al cierre de la válvula ubicada en Lamadrid y Quintana.

Durante el mes de agosto se realizó la restitución del sistema, abriendo la válvula ubicada en Lamadrid y Quintana quedando vinculadas nuevamente las salidas de las estaciones elevadoras.


Como resultado de la maniobra la presión en la cañería disminuyó 10 m.c.a. en comparación a la situación anterior sin registrarse incrementos significativos de reclamos en la zona. Asimismo se redujo el consumo energético.

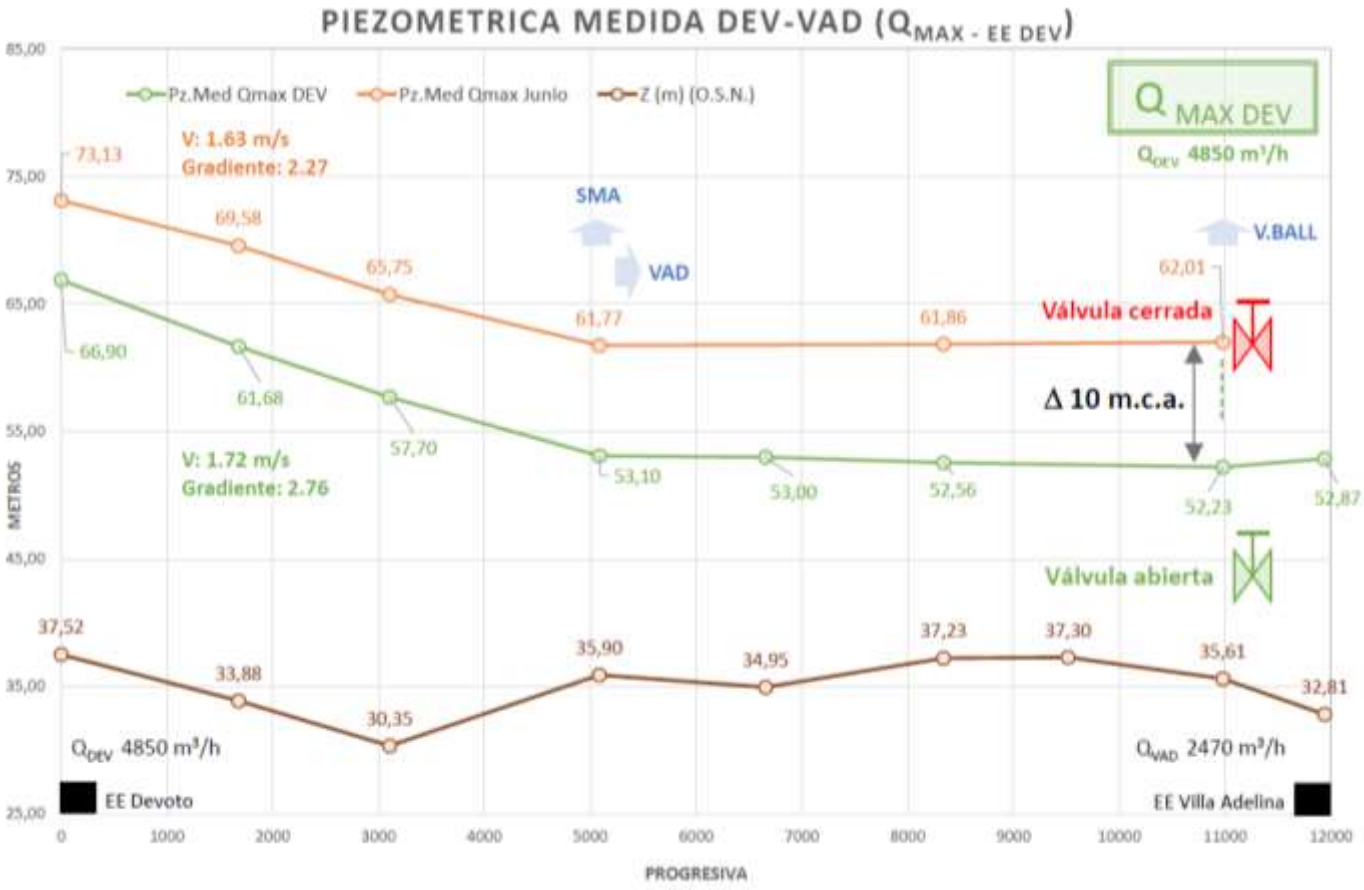

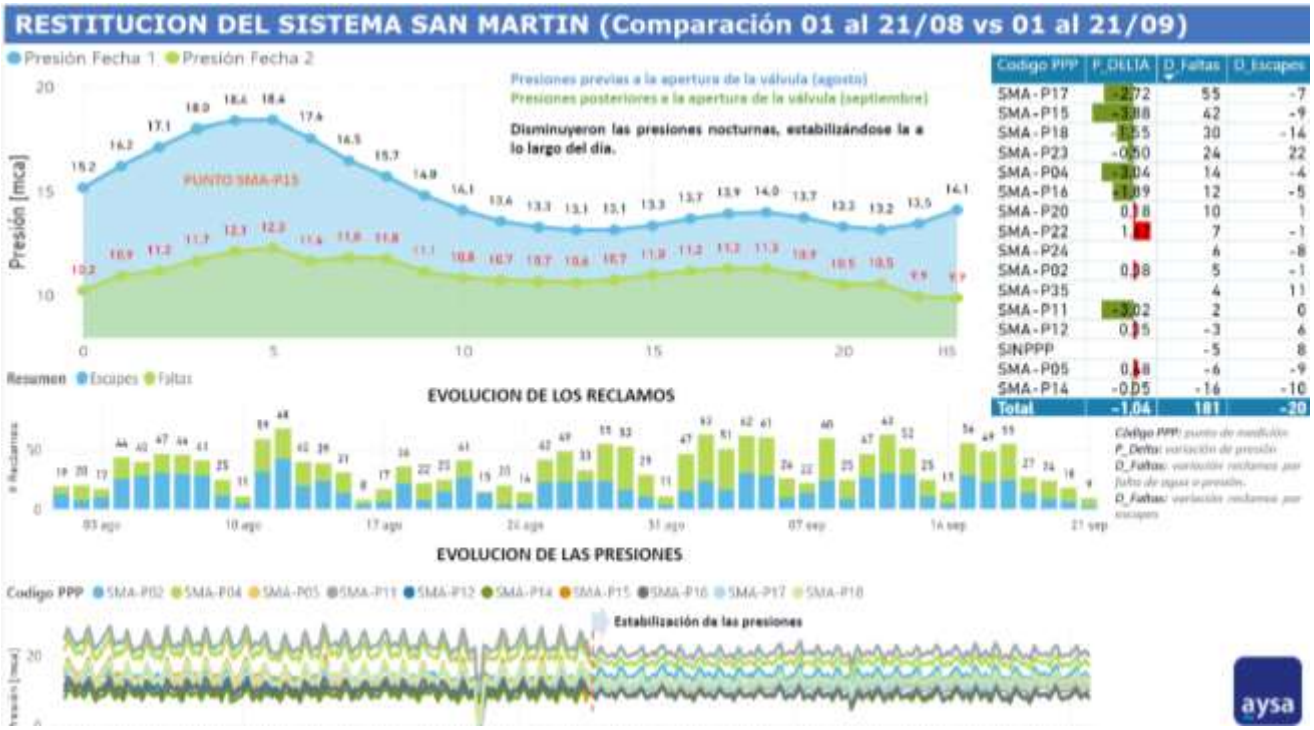

3.3 Estudio hidráulico sobre la línea Superí

La línea Superí refiere a la salida sobre la calle Nuñez de la Estación Elevadora Saavedra y su posterior vinculación a la línea que se desarrolla por la calle Superí, con una longitud aproximada de 5.60 km.

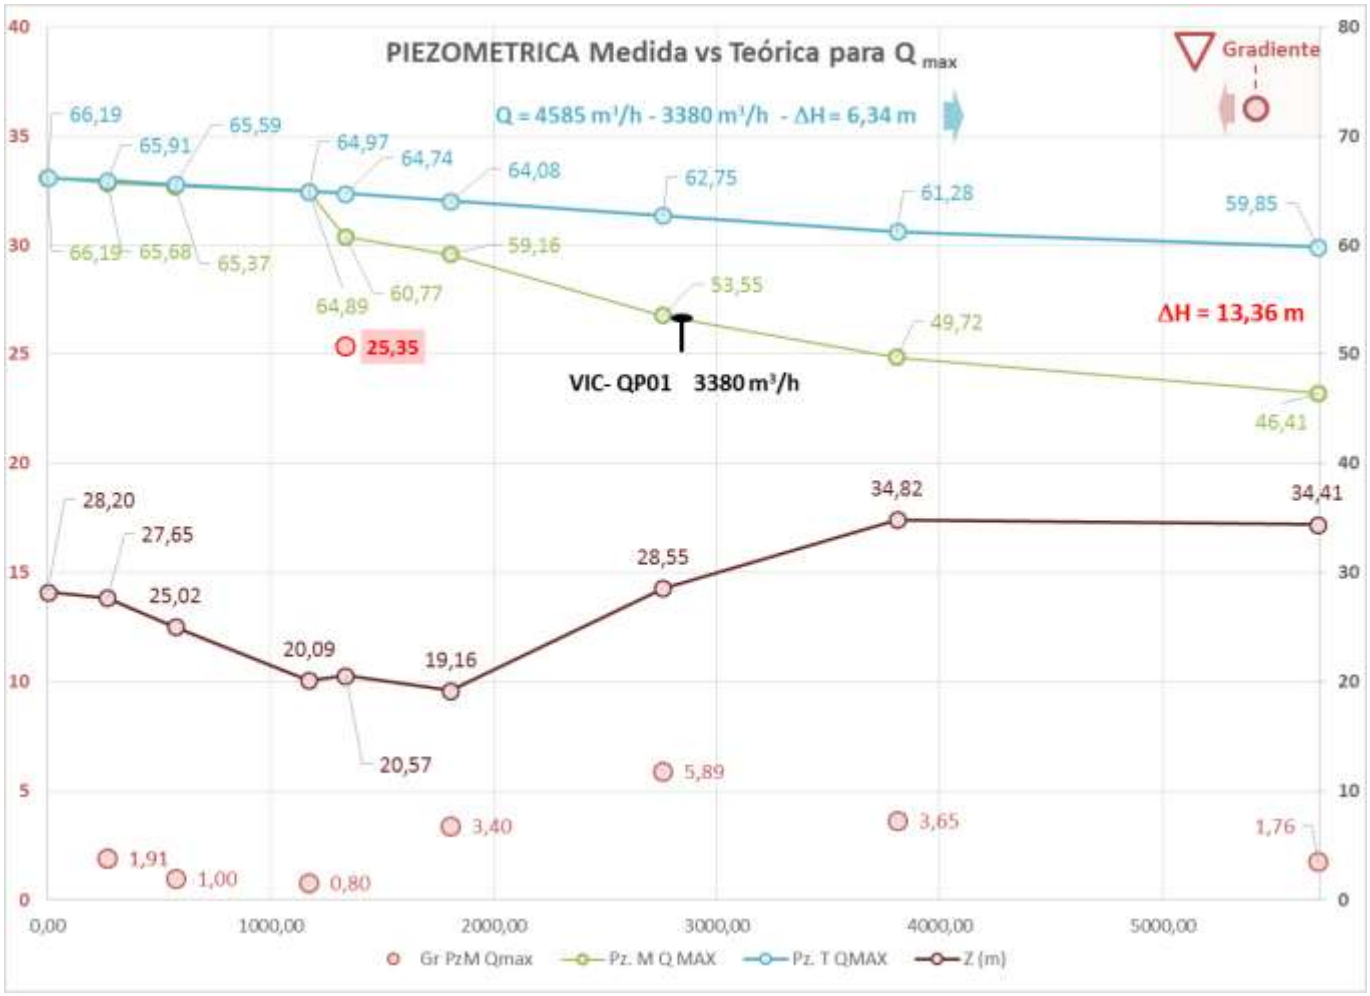

Al igual que en los estudios anteriores, inicialmente se realizó el relevamiento de las válvulas de aire para la posterior instalación de registradores de presión en puntos representativos. En total se instalaron 8 equipos, midiendo en forma continua y simultánea durante un período de 7 días corridos.

Del trazado de la línea piezométrica se determinaron dos puntos en donde la pérdida de carga es muy superior a la calculada de forma teórica. EL primero es en la vinculación de la cañería nueva con la existente (Intersección de las calles Nuñez y Superí). El segundo punto se da en el cruce de la Av. General Paz.

Actualmente está en ejecución el relevamiento de los artefactos instalados en la cañería para descartar un mal funcionamiento (válvulas de cierre, válvulas de desagüe, etc.).

3.4 Estudio hidráulico Sistema Bernal I – Bernal IV

Durante los meses de junio y julio se realizó el estudio de funcionamiento de la cañería que abastece al B° La Colonia (4 km).

En total se determinaron 11 puntos donde se realizaron mediciones de forma continua y simultánea durante un período de 7 días corridos.

EL gráfico siguiente muestra tres puntos con singularidades en donde el gradiente medido (pérdida de carga/km) es superior al resto de las mediciones. Estos se encuentran siendo evaluados por la DRS.



3.5 Estudio Hidráulico sobre la Línea EE centro – EE Constitución

Durante el último trimestre del 2025 se realizó el relevamiento de la línea que vincula la Estación Elevadora Constitución y la Estación elevadora Centro, determinando los puntos representativos en donde se instalaran los equipos registradores de presión.

3.6 Estudio de medición en el Radio Antiguo


Durante el año 2025 se realizó un estudio de determinación del caudal volcado en tiempo seco al Doble Conducto, Triple Conducto y Arroyo Ugarteche, sistema pluvial del radio antiguo. Para ello se realizaron las siguientes tareas:

- Se determinaron las áreas de aporte de las cámaras reguladoras identificando cuales vuelcan su caudal a cada uno de los.

- Se realizó una campaña de medición en 4 de los nueve puntos de aforo, determinando el caudal total vertido al A° Ugarteche y de forma parcial el caudal vertido al Triple Conducto, teniendo en cuenta que en los puntos donde no se instalaron equipos de medición se calculó un caudal teórico de acuerdo al área de aporte del punto de aforo.

- Se determinó de forma teórica el caudal aportado por el área de influencia del Doble Conducto.

- Se analizó la influencia de la marea en cada uno de los puntos de aforo a partir de los datos obtenidos de la Estación Hidrométrica Buenos Aires – Primer Espigón (Administración General de Puertos).

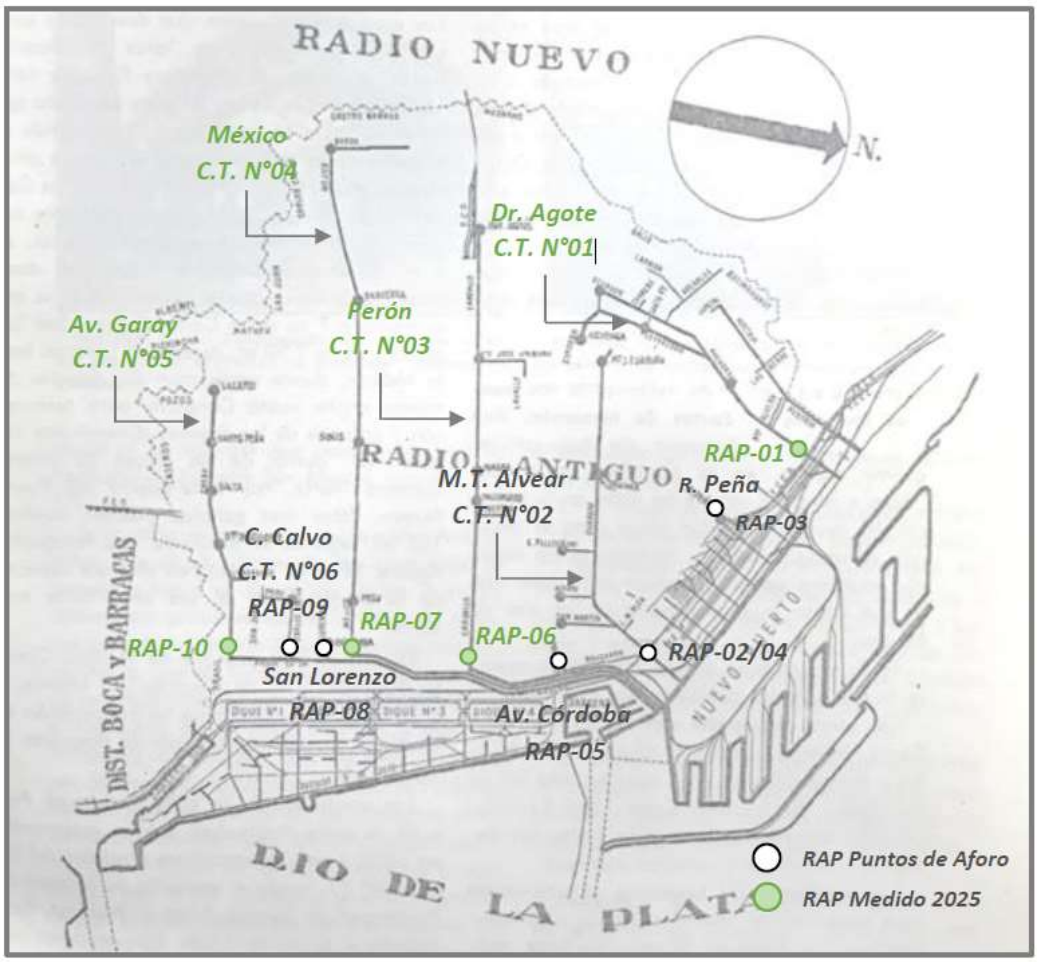

La imagen siguiente muestra el área de aporte de los conductos en estudio siendo:

Área Ugarteche 3.51 km^2

Área Doble Conducto 3.77 km^2

Área Triple Conducto: 10.62 km^2



4 AREA MODELOS

4.1 Modelos Matemáticos

Los modelos matemáticos permiten aproximar mediante algoritmos apropiados el comportamiento de sistemas reales. Estos modelos tienen gran utilidad como herramientas de estudio de diagnóstico, mejora de sistemas existentes, optimización de consumos de energía y agua, diseño de obras nuevas, predicción de calidad de agua y/o funcionamiento de las redes en tiempo real.

Los modelos disponibles en AySA son los siguientes:

- Modelos de redes de distribución de agua potable
- Modelos de los Ríos Subterráneos.
- Modelos de redes de desagües cloacales.
- Modelos de dispersión atmosférica
- Modelos del Río de la Plata.
- Modelos fluviales de cursos de agua relacionados con AySA (Matanza-Riachuelo, Luján, Reconquista, Paraná, y otros).
- Modelos hidráulicos 3D, modelación CFD (*Computational Fluid Dynamics*), modelos SPH (*Smoothed-Particle Hydrodynamics*).
- Modelos para el pronóstico de calidad de agua en tiempo real (redes neuronales, modelos mecanicistas).
- Modelos de Inteligencia Artificial para optimización y otros propósitos

4.1.1 Modelos de redes de distribución de agua potable

Se cuenta con modelos de las redes de agua implementados en el software WaterGEMS y también en software Epanet. Estos modelos fueron calibrados y actualizados, siguiendo procedimientos certificados en el sistema ISO 9001.

En este modelo, si bien incluye todos los rangos de diámetros, el alcance de la calibración se limita hasta cierto rango en base a la ubicación y densidad de los sitios de medición. De todas maneras, las redes finas no calibradas en detalle aseguran una distribución realista de los consumos y representación de la interconectividad, dando la oportunidad de calibrarlas posteriormente.

Estos modelos fueron aplicados en numerosas ocasiones a estudios de diagnóstico, factibilidades hidráulicas y programas de puesta en marcha de nuevas obras.

Actualmente se continúa trabajando para implementar todos los modelos de agua en período extendido, es decir, que permiten simular las presiones y caudales en forma variable a lo largo del día, para efectuar con los mismos, diversos estudios como los de calidad del agua entre otros. Se está implementando en el modelo el modulo energético para calcular el consumo de energía en las estaciones elevadoras en forma conjunta.

Paulatinamente, se va generando una copia de respaldo de estos modelos en software Epanet, de distribución libre.

También se dispone del software Hammer, que se acopla al WaterGEMS, y permite resolver problemas de golpe de ariete y transitorios hidráulicos (por ejemplo, cierre brusco de válvulas o parada intempestiva de bombas por corte de suministro eléctrico). Para este propósito, se cuenta también con algunos modelos de desarrollo propio.

Estado de los modelos de red de agua al año 2025 – RADIO AYSA 2015

Modelo Capital Federal: Se continuo con el desarrolló un nuevo modelo calibrado. Se elaboraron estudios de factibilidad de nuevos abastecimientos importantes en Capital Federal y su impacto en el radio servido. Se incorporaron al modelo los nuevos variadores de velocidad en la EE Caballito. Se realizó un estudio del troncal Saavedra – Superí hasta el límite de la DRCF con Vicente López.

Modelo Distrito Norte: Se realizaron estudios piezométricos de los acueductos R4 y R5, para analizar tramos de pérdida de carga importante y posibles causas de dicha pérdida de carga. Lo mismo se realizó en los troncales Adelina – San Fernando y Adelina – Devoto. Toda esta información se volcó en el modelo matemático de la DRN.

Modelo Distrito Oeste: Se realizó un estudio de funcionamiento de las reguladoras del sistema Morón y como ajustar las consignas para reducir la energía de la EE Morón, teniendo en cuenta las ampliaciones de Barrio Paz y el funcionamiento de la VR Palomar. Se realizaron estudios piezométricos en algunas líneas para ajustar el modelo.

Modelo Distrito Sudeste: Se realizaron estudios en Florencio Varela, en la zona de distribución de la cisterna El Cruce. Se realizaron mediciones en las salidas de dicho sistema de distribución.

Modelo Distrito Sudoeste: Durante 2025 se volvieron a analizar esquemas estacionales de operación de estaciones elevadoras y válvulas reguladoras de este distrito, para ajuste de modelo Epanet.

Estudios realizados:

Durante 2025 se avanzó en los siguientes estudios de modelación:

- Se prestó colaboración en la elaboración del nuevo Plan Director de Agua Potable de las regiones Norte y Oeste. Incluyendo balances de caudales, modelación hidráulica de conductos troncales, definición de estaciones de bombeo, evaluación técnica-económica de alternativas, etc.

- También se analizaron algunos proyectos incluidos en el Plan Director de Región Sur.

- Se realizaron modelizaciones de apoyo, para la elaboración de estudios piezométricos en líneas troncales primarias de las regiones Norte, CABA, Sur, etc.

- Se analizaron factibilidades de expansión del servicio, como por ejemplo la de Barrio Paz en Morón y la colocación de un rebombeo en línea, para reducir la presión de salida de la EE Morón, Costa Urbana en Capital Federal, etc.

- Se colabora en la revisión de los criterios de diseño para proyectos de acueductos y redes de agua.

- Se realiza un estudio técnico-económico comparativo de Sistemas de Alta y Baja presión.

- Se realizan distintos estudios de diagnóstico, como por ejemplo Salida EEVAD San Fernando, DN300 Montañeses, DN250 refuerzo Ciudadela, pérdidas de carga en grandes conductos, Acueductos R4 y R5 (PJMR), primarias Bernal I, etc.

- Se presta colaboración en distintas maniobras, como por ejemplo la apertura de Válvula en Sucre y Acevedo + Nuevo Cierre en French y Martin Rodríguez (SFD).

- Se trabajó en numerosas factibilidades de agua potable, entre ellas Costa Urbana, River Plate, Plaza Logística, AZ Buildings, Barrio Ciudad Bolivia y emprendimiento Nuevo Quilmes 2.

- Se realiza la modelación para distintos proyectos, entre ellos la Cisterna el Cruce y mejora de pozos de Florencio Varela, optimización zona de cobertura VR Caseros, Estación Elevadora Lomas + Impulsión Temperley, Conexión 9 de Abril – Hipopuelches, etc.

Estado de los modelos de red de agua al año 2025 – NUEVOS PARTIDOS

Se cuenta con modelos WaterGEMS de Pilar, Escobar, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, San Miguel, y Florencio Varela. Se prevé seguir calibrando y explotando estos modelos. Se estuvo trabajando en especial en Florencio Varela.

4.1.2 Modelos de los ríos subterráneos.

Se cuenta con distintos modelos del sistema de Ríos Subterráneos.

El más completo y abarcativo es un modelo en período extendido implementado en WaterGEMS cuyo dominio abarca no sólo los ríos subterráneos y la aspiración de las estaciones elevadoras, sino también los componentes principales de Planta San Martin y Manuel Belgrano: los conductos de toma al río de la plata, las bombas de agua cruda, cámara de carga y reservas.

Este modelo fue calibrado en base a series de tiempo medidas de: caudal bombeado en las elevadoras, caudales de salida de planta, niveles en las reservas, estado encendido/apagado de cada bomba, y nivel del Río de la Plata.

También se cuenta con otras versiones del modelo que incorporan, además de los ríos existentes, futuros ríos subterráneos y futuras estaciones elevadoras.

4.1.3 Redes de desagües cloacales

Se cuenta con un modelo implementado en el software SWMM del sistema cloacal troncal de la Concesión (450 km de red) que incluye las cloacas máximas, redes troncales, estaciones de bombeo principales (como Wilde, Boca Barracas, etc.), planta Berazategui y emisario subfluvial, Planta Depuradora Norte, Planta Depuradora "El Jagüel" y Planta Depuradora "Sudoeste".

Se cuenta con un modelo detallado de los desagües del Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. El Radio Antiguo es un sistema combinado (desagüe pluvial y cloacal escurren por un mismo conducto), hasta llegar a las cámaras reguladoras donde por medio de bateas que funcionan como vertederos, se realiza la separación del líquido pluvial (hacia el sistema de desagües pluviales con disposición final en el Río de La Plata), del líquido cloacal que a través de los conductos Interceptoras Cloacales es conducido al sistema cloacal de AySA (1° Cloaca Máxima). Se modelaron las Interceptoras y Cámaras Reguladoras de todo el Radio Antiguo, y los conductos pluviales a los cuales desbordan. Queda pendiente una calibración del sistema; para esto es necesario contar con mediciones horarias de nivel y caudal en los conductos Interceptoras Cloacales.

La versión actual del modelo incorpora también abarca todos los componentes del denominado "Sistema Riachuelo": Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Bajo Costanero, Obras complementarias, Planta de pretratamiento, estación elevadora de entrada, estación de bombeo de salida y nuevo emisario. En años anteriores, este modelo fue utilizado para el diseño de las obras del Sistema Riachuelo, y durante el presente año fue utilizado para diagramar las maniobras de puesta en marcha.


Tras poner en marcha el Sist. Riachuelo, se está encarando una recalibración del modelo en base a las condiciones actuales de caudal y nivel.

También se trabaja con el modelo Allievi, desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia, para realizar estudios específicos de régimen impermanente. Allievi es un software para el cálculo y simulación de transitorios hidráulicos en sistemas a presión y a superficie libre.

Estudios realizados:

Durante el año 2025 se realizaron estudios hidráulicos para la puesta en marcha del sistema Riachuelo. Para cada una de las etapas de incorporación paulatina de caudal, se analizó como deberían operar las obras complementarias, las válvulas reguladoras, la cantidad de bombas en la estación de entrada, la cantidad de desarenadores, y opcionalmente el Enlace Hidráulico. Asimismo, para cada una de estas etapas se estudió la hidráulica (caudales, velocidades y niveles) tanto en las obras nuevas, como su impacto en las cloacas máximas existentes.

A posterior, y con el sistema ya operativo, se realizó un estudio diagnóstico de la capacidad de las Cloacas Máximas preexistentes bajo esta nueva configuración. Esto constituye un dato valioso tanto para la operación como para la elaboración de nuevas versiones del PD de Saneamiento.

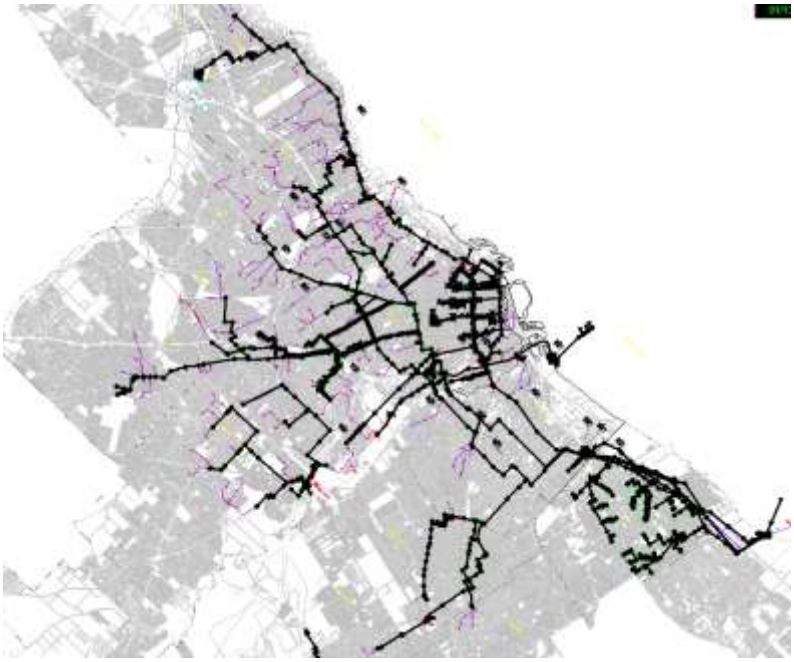

También se analizó la hidráulica de la derivación del Colector Costanero al CMI a través de la OC9, y el funcionamiento de las rejas de EB Boca Barracas.

Asimismo, se estudió preliminarmente la posibilidad de captar caudales de conductos pluviales de tiempo seco con vuelco al Río de la Plata (A° Medrano, Ugarteche, Doble y Triple Conducto, etc.).

Finalmente, se analizaron distintas factibilidades cloacales, entre ellas Dock Sud, curtiembres ACUMAR, barrio Ciudad Bolivia, etc.

4.1.4 Modelos de dispersión atmosférica

Se cuenta con un modelo de dispersión atmosférica (Aermod View), el cual calcula la pluma de dispersión para distintas alturas z del observador, en base a un registro meteorológico detallado y la topografía de la zona.

Se cuenta además con un modelo simplificado de planilla de cálculo basado en el modelo gaussiano de dispersión de gases. Este permite variar las condiciones

meteorológicas (clase de estabilidad según las categorías definidas), la intensidad del viento y la temperatura.

4.1.5 Modelos del río de la plata

Se cuenta con el software Delft3D Flexible Mesh implementado para los modelos del Río de la Plata.

Este modelo tiene la ventaja de poder trabajar con una malla no estructurada, la cual permite una resolución espacial variable, disminuyendo localmente el tamaño de malla solo donde se requiera mayor detalle, y evitando así no incrementar los tiempos de cálculo.

Delft3D es un sistema de modelado para investigar la hidrodinámica, el transporte de sedimentos, la morfología y la calidad del agua en lagos, ríos, aguas costeras y estuarios.

Estudios realizados:

Durante 2025 se destacan las siguientes novedades:

- Durante la primera parte del año, se mantuvo operativo el modelo de pronóstico diario del RDLP, para pronóstico hidrodinámico e impacto de amonio en las tomas.

- A raíz de un evento notorio de contaminación en el Arroyo Sarandí (agua roja), se realizó un diagnóstico en tiempo real sobre la posible afectación al agua captada en Planta Manuel Belgrano.

- Se modela y analiza, de manera preliminar, la calidad de agua en una hipotética futura toma de PSM, a 500 m de la actual.

- Se realizan modelaciones de la pluma del A° Medrano y su potencial impacto en la toma de PSM.

- Tras la puesta en marcha del Sistema Riachuelo, se realiza el primer informe de desempeño ambiental del emisario subfluvial, que vuelca el efluente tratado en el Río de la Plata. El estudio será presentado ante el Ente Regulador, e incluye modelaciones hidrodinámicas, modelación de calidad de agua, muestreos y análisis de datos de laboratorio.



Simulación pluma emisario (estadística E. Coli), y resultados muestreos laboratorio

4.1.6 Modelos fluviales de cursos de agua relacionados con AySA (Matanza-Riachuelo, Luján, Reconquista, Paraná y otros)

El objetivo de estos modelos es simular el comportamiento de los principales ríos relacionados con el servicio de AySA, como ser el Paraná, el Delta del Paraná, Matanza-Riachuelo, Reconquista, Luján. También se incluyen arroyos urbanos contaminados como el Medrano, Sarandí, Santo Domingo, etc.

RÍOS MATANZA-RIACHUELO, LUJÁN Y RECONQUISTA

Estos ríos, de gran influencia en el área de concesión de AySA (especialmente por su aporte de cargas contaminantes), se encuentran modelados combinando el modelo hidrológico libre HEC-HMS, el cual permite determinar los hidrogramas afluentes en base a las lluvias, y el modelo libre HEC-RAS, que es un modelo hidrodinámico y de calidad de agua.

RÍO PARANÁ

El río Paraná es el principal afluente que alimenta al Río de La Plata, fuente principal del recurso superficial de AySA, de donde se desprende la importancia de su modelación y estudio.


Este río recibe indirectamente el aporte del río Bermejo, que descarga al río Paraguay y es el principal suministro de sedimentos de la cuenca del Río de La Plata. Este volumen de sedimentos afecta directamente la turbiedad del agua captada y consiguientemente al proceso de tratamiento realizado por AySA en sus plantas potabilizadoras.

Se cuenta con un modelo del río Paraná modelado desde Yacyretá hasta el Delta del Tigre, implementado en HEC-RAS (software libre). Este modelo se encuentra calibrado en base a datos de nivel en Rosario, curva corta caudal en esa ciudad y datos relacionados con tiempo de transito de turbiedad Rosario – Buenos Aires.

Estudios realizados:

Durante 2025 se destaca las siguientes novedades:

- Se actualizan algunos modelos hidrológicos y fluviales.
- Se presta colaboración externa en la revisión de artículos científicos en temas de modelación fluvial y de calidad de agua (RIBAGUA)
- A raíz del proyecto de revamping y/o construcción de plantas depuradoras con vuelcos a cauces internos, comienza la recopilación de información para realizar las modelaciones hidrológicas, hidráulicas y de calidad de agua de los arroyos correspondientes.
- Se realiza la modelación bidimensional de inundación en planta Laferrere. Tanto para definir el relleno en el predio como para mitigar el impacto en los barrios aledaños.

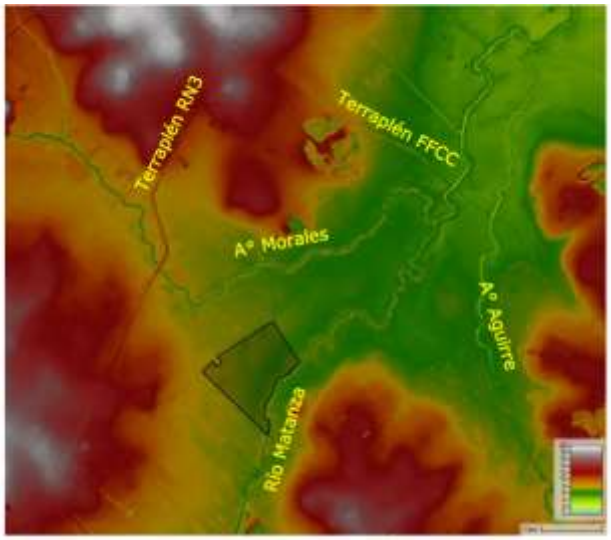

Modelo Digital de Terreno (MDT) cuenca Matanza-Riachuelo



Resultado simulación 2D inundación

4.1.7 Modelos hidráulicos 3d, modelación cfd (computational fluid dynamics), modelos sph (smoothed-particle hydrodynamics)

Los flujos de Procesos están sometidos a la conservación de la masa, de la cantidad de movimiento y a la energía involucrada en la operación analizada. La expresión matemática de los principios de conservación forma un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que, resueltas en forma simultánea, para las condiciones del proceso (condiciones de contorno), muestran la configuración del flujo en un momento dado (contando desde las condiciones iniciales dadas en la simulación).

El método CFD permite obtener distribución de velocidades en el espacio ocupado por el flujo, conocer la energía que implica este movimiento, estimar la fuerza del flujo sobre las estructuras, detectar fenómenos vorticiales implicados, vibraciones inducidas, etc.

Los principios de conservación se expresan matemáticamente, como un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que, resueltas en forma simultánea para las condiciones del proceso (condiciones de contorno), muestran la configuración del flujo en un momento dado, en todo el espacio ocupado por el proceso en estudio. Los modelos CFD resuelven simultáneamente, en forma numérica, las ecuaciones de conservación de la masa, de conservación de cantidad de movimiento o Navier-Stokes en 3 dimensiones y de conservación de la energía.


La gerencia también trabaja con modelos SPH (Smoothed Particle-Hydrodynamics, o "hidrodinámica de partículas suavizadas") que son método numérico sin malla (mesh-free) y Lagrangiano utilizado para modelar mecánicas de medios continuos a través de la interacción de partículas de fluido y sólido.

Se implementaron también los modelos autorregresivo ARMA y GARCH para la modelación de caudales de servicio y su variabilidad. Por otro lado, se asistió a la Dirección de Medio Ambiente en la implementación de modelos de emisión de gases con efecto invernadero.

Estudios realizados:


En 2025 se destacan las siguientes novedades:

- Se realizó la modelación 3D de la torre toma de Planta Manuel Belgrano, para la obra de recambio de rejas.

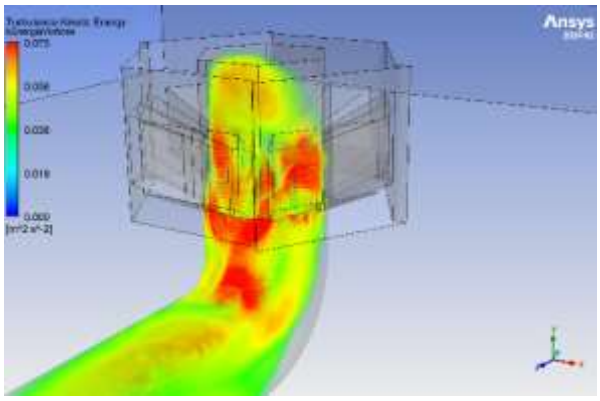

Torre toma PMB: energía cinética vorticial

- Se prestó colaboración en los estudios del sistema de ventilación para eliminación de sulfhídrico en Planta Berazategui.
- Se trabajó en la implementación de OpenFoam (software libre) como segunda plataforma CFD.
- Se trabajó en la aplicación de modelos autorregresivos para la predicción de caudales en válvulas reguladoras y estaciones de bombeo.
- Se realizó una modelación SPH de la cámara de derivación del Colector Costanero al CMI (OC9), para diagnóstico de funcionamiento de las rejas de Boca Barracas.

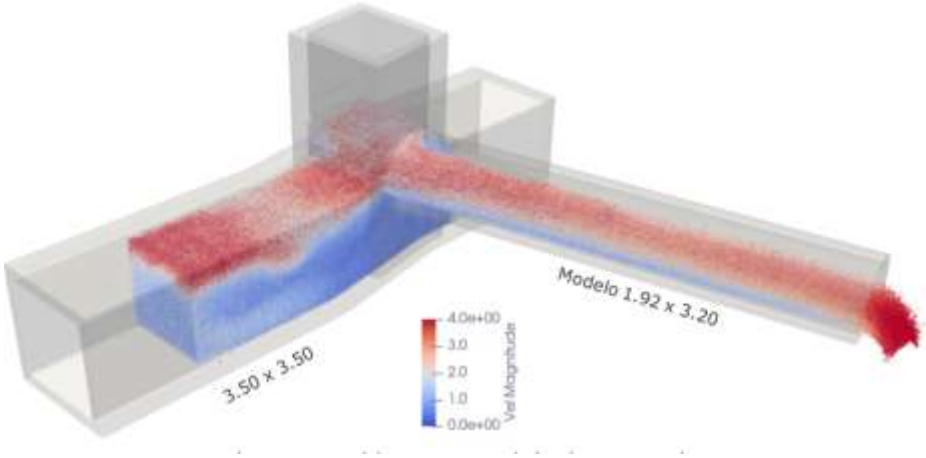

Cámara OC9. Campo escalar de velocidades

7. ESTUDIOS AMBIENTALES

7.1 - Informe de Gestión Ambiental 2025

Dirección de Medio Ambiente y Calidad

Capítulo 7.1 - Informe de Gestión Ambiental

1 Resumen Ejecutivo 3

2 Introducción 4

3 Contexto 4

3.1 Cambio climático 4

3.2 Ejes Estratégicos 5

3.3 Normativa 5

4 Gestión Ambiental Corporativa 6

4.1 Gestión de riesgos 6

4.2 Huella de Carbono 6

4.3 Monitoreo Ambiental 10

4.4 Economía Circular 16

4.5 Gestión de Residuos 19

4.6 Línea de Base Ambiental 21

4.7 Gestión Ambiental de las Obras 21

5 Conclusiones 23

CAPÍTULO 7.1. - INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

1 Resumen Ejecutivo

Durante el período analizado, la empresa consolidó un conjunto de acciones estratégicas orientadas a fortalecer la gestión ambiental de AySA en línea con los ejes corporativos de sustentabilidad, eficiencia operativa y responsabilidad social. Las principales líneas de trabajo se centraron en la gestión de riesgos ambientales, el desarrollo del inventario de Huella de Carbono, la ampliación de la red de monitoreo ambiental y la implementación de iniciativas de economía circular de alto impacto.

En materia climática, se avanzó en la consolidación metodológica de la Huella de Carbono Corporativa, incorporando mejoras en la modelización de procesos críticos, nuevos factores de emisión propios y las primeras categorías de Alcance 3. Se fortaleció la trazabilidad del inventario y se delinearon pasos para su futura certificación bajo normas IRAM/ISO, con el objetivo de integrar la variable GEI en la toma de decisiones energéticas y operativas de la compañía.

Respecto del monitoreo ambiental, se redefinieron los puntos y analíticas de los cuerpos superficiales y subterráneos, se avanzó en la caracterización del recurso hídrico y se completaron campañas estratégicas que servirán como línea de base para evaluar riesgos, impactos y tendencias asociadas al cambio climático. Asimismo, se avanzó en la selección de equipamiento para la medición de variables atmosféricas, incluyendo la gestión de olores y ruidos.

Finalmente, la estrategia de economía circular mostró avances significativos: el Centro de Compostaje procesó 230 toneladas de lodo y reduciendo emisiones asociadas al transporte y disposición. Se desarrollaron proyectos de agua regenerada, subproductos para construcción (Biobricks), edificios sustentables y un fortalecimiento del sistema de gestión de residuos que incluyó el reciclado de RAEE y campañas internas de concientización.

2 Introducción

La misión de la Dirección de Medio Ambiente y Calidad consiste en **"asegurar el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de calidad de AySA, realizando el seguimiento de los procesos y productos en todas las etapas de la prestación del servicio; identificar riesgos y oportunidades de mejora; y evaluar la factibilidad de implementar buenas prácticas que impacten en la Calidad y el Ambiente, promoviendo su adopción de manera sistemática"**.

En línea con esta misión, se orientó el accionar a dos ejes estratégicos principales:

- **Integrar y fortalecer la Gestión Corporativa de AySA S.A.**, promoviendo metodologías sistemáticas, sostenibles en el tiempo y consensuadas entre todas las áreas involucradas. Este eje incluye el fortalecimiento del seguimiento de la calidad del agua y de los efluentes en cada etapa del proceso de prestación del servicio.
- **Definir, implementar y consolidar la Gestión Ambiental de AySA S.A.**, mediante el desarrollo de metodologías corporativas y planes de acción estructurados, considerando el enfoque de ciclo de vida de la prestación del servicio y promoviendo una mejora continua de los desempeños ambientales.

El presente informe tiene como propósito describir los fundamentos, avances y articulación interna de las diferentes actividades y proyectos ambientales, destacando su contribución a la mejora integral de la gestión corporativa de AySA.

3 Contexto

3.1 Cambio climático

El cambio climático se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas de agua y saneamiento para planificar el futuro de la prestación del servicio, agregando un mayor nivel de complejidad.

Los efectos del cambio climático pueden afectar la prestación de los servicios de agua y saneamiento, impactando en la disponibilidad del agua debido a fenómenos como sequías, inundaciones y cambios en los patrones de precipitación. Estos eventos extremos pueden afectar la calidad del agua al alterar su composición y aumentar la concentración de contaminantes.

Desde su creación AySA está comprometida con brindar un servicio de agua potable y saneamiento de calidad, sustentable y eficiente, que contribuya al bienestar de la población y al cuidado del medioambiente, para lograr este objetivo con calidad, de una manera sustentable y ambientalmente responsable, es necesario un cambio de paradigma.

3.2 Ejes Estratégicos

Con el propósito de garantizar un servicio de excelencia, AySA ha definido **siete ejes estratégicos** que orientan las acciones de la empresa. Estos lineamientos buscan consolidar un modelo operativo que maximice el valor corporativo mediante la mejora de la eficiencia, la optimización en la gestión de recursos, la convergencia operativa y la adecuada priorización de inversiones. En conjunto, los ejes estratégicos proporcionan foco y dirección para establecer prioridades, alinear esfuerzos institucionales y evitar la dispersión de recursos en iniciativas aisladas. Cada eje se complementa con **sub-ejes temáticos** que precisan los ámbitos de actuación.

En este marco, la labor de la Dirección de Medio Ambiente y Calidad (DMAyC) se inscribe en el **Eje 7: Gestión de Calidad Sustentable**, orientado a promover la sustentabilidad mediante la adopción de prácticas y políticas socioambientales y de buen gobierno corporativo. Principalmente, la gestión ambiental se articula a través de los sub-ejes **7.3** y **7.4**, cuyos lineamientos se describen a continuación:

- **7.3 – Seguimiento Ambiental:** Su objetivo es mejorar el desempeño ambiental de la compañía mediante la minimización de los impactos asociados a la operación, el fortalecimiento de la gestión de residuos y la reducción de la huella de carbono.
- **7.4 – Economía Circular:** Este sub-eje promueve la valorización de los procesos vinculados a la depuración, fomentando la reutilización del agua tratada, la autosuficiencia energética y la valorización de residuos, en el marco de una gestión integral del ciclo del agua.

Las iniciativas descriptas en el presente informe corresponden a **proyectos y acciones específicas** impulsados o articuladas por la DMAyC para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos.

3.3 Normativa

Asimismo, es de importancia resaltar que todos los planes, acciones y estrategias mencionados se encuentran dentro del cumplimiento de los requisitos legales y normativas

aplicables tanto a la empresa en general como a la organización en temas de calidad y medio ambiente.


4 Gestión Ambiental Corporativa

4.1 Gestión de riesgos

Objetivo: Establecer una metodología corporativa documentada para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales en los procesos de AySA con el objetivo de gestionarlos e implementar planes de acción.

Acciones

- Consolidación de los impactos ambientales
- Evaluación del índice de riesgo
- Elaboración del mapa de riesgos de la compañía.

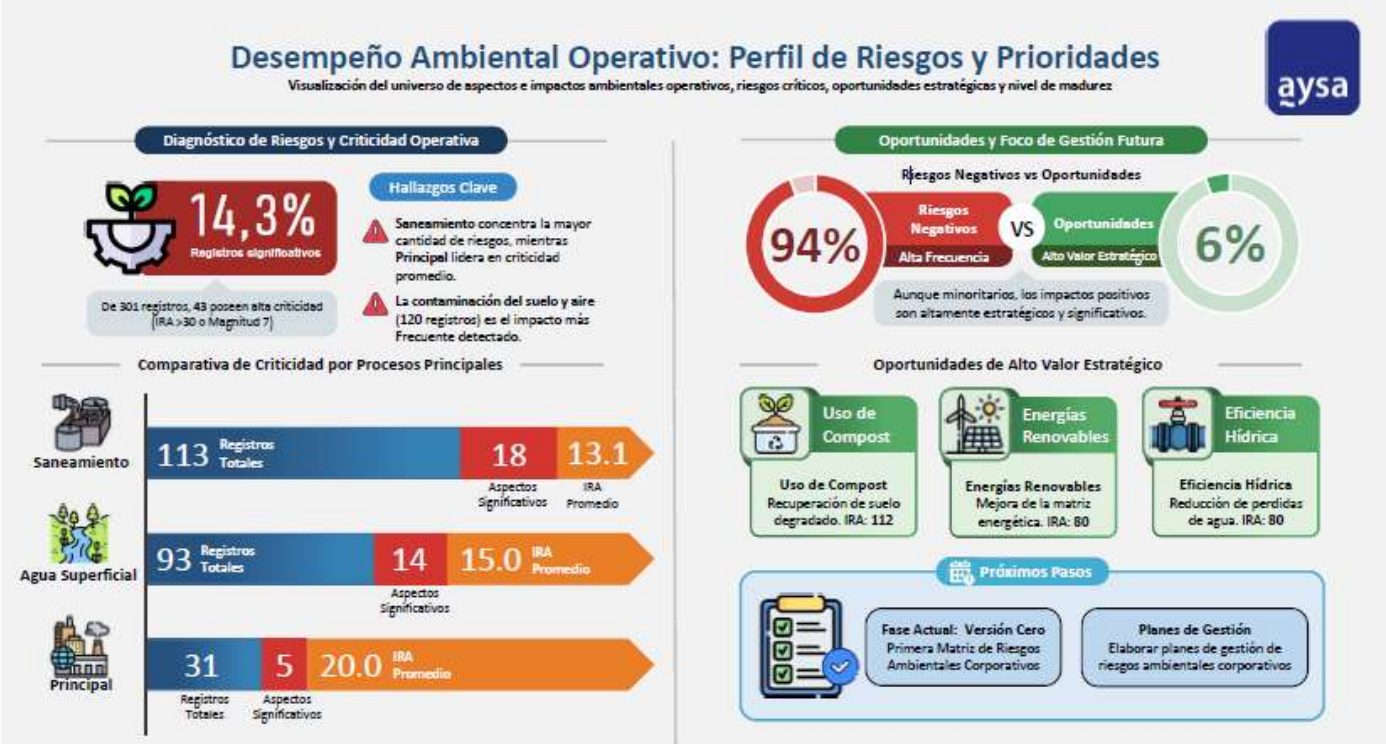

4.2 Huella de Carbono

La Huella de Carbono Corporativa (HCC) se consolidó como el indicador ambiental que permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de AySA a nivel corporativo, desagregadas por alcance, tipo de gas y etapa del servicio de agua y saneamiento.

El inventario se elabora anualmente aplicando las Directrices del IPCC para inventarios de GEI, el estándar Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) y la norma ISO 14064-1, garantizando trazabilidad, comparabilidad y consistencia metodológica en el tiempo.

Estimación de la Huella de Carbono

Objetivo

- Anticiparnos a las tendencias regulatorias de los mercados de carbono que podrían impactar en el funcionamiento de la empresa.
- Optimizar la metodología de estimación de la huella de carbono implementando mejoras y ajustes metodológicos de manera continua.
- Incorporar emisiones indirectas derivadas de la cadena de valor (Alcance 3), ampliando progresivamente el alcance del inventario.
- Identificar y proponer acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a partir del análisis de resultados.
- Consolidar la Huella de Carbono Corporativa como herramienta de gestión que dé soporte a la toma de decisiones ambientales, energéticas y de economía circular.

Acciones

- **Diseño metodológico e institucional**
    - Definición del alcance organizacional y operativo del inventario de GEI, incorporando todos los establecimientos de la concesión.
    - Adopción como marco de cálculo del GHG Protocol, la norma ISO 14064-1 y las Directrices del IPCC para inventarios de GEI, asegurando alineamiento con las mejores prácticas internacionales.
- **Mejora metodológica y ajuste de supuestos**
    - Partir de una experiencia piloto y avanzar hacia la cobertura de todos los establecimientos operativos de AySA.
    - Adecuación de la modelización de la Planta de Pretratamiento Berazategui (PBZ) y otras instalaciones, ajustando los supuestos de descarga y de generación de N_2O a las condiciones reales del cuerpo receptor, corrigiendo sobreestimaciones históricas.

- Incorporación de factores de emisión propios para el consumo de energía eléctrica y otros insumos relevantes, reduciendo la dependencia de valores tabulados genéricos.
- Aplicación sistemática del Método 1 del IPCC para el tratamiento de incertidumbres asociadas a los datos de actividad y factores de emisión.

- **Integración de nuevas fuentes y Alcance 3**
  - Inicio de la incorporación de emisiones de Alcance 3, priorizando aquellas asociadas al transporte de insumos críticos, la logística de biosólidos y servicios tercerizados relevantes.
  - Integración de consumos de combustibles de flota, grupos electrógenos y embarcaciones, fortaleciendo la cobertura de las emisiones directas e indirectas vinculadas a la operación.
  - Definición de criterios de clasificación de las emisiones asociadas al compostaje de biosólidos, diferenciando procesos internos (Alcance 1) de tratamientos realizados por terceros (Alcance 3).

- **Distribución de las emisiones**

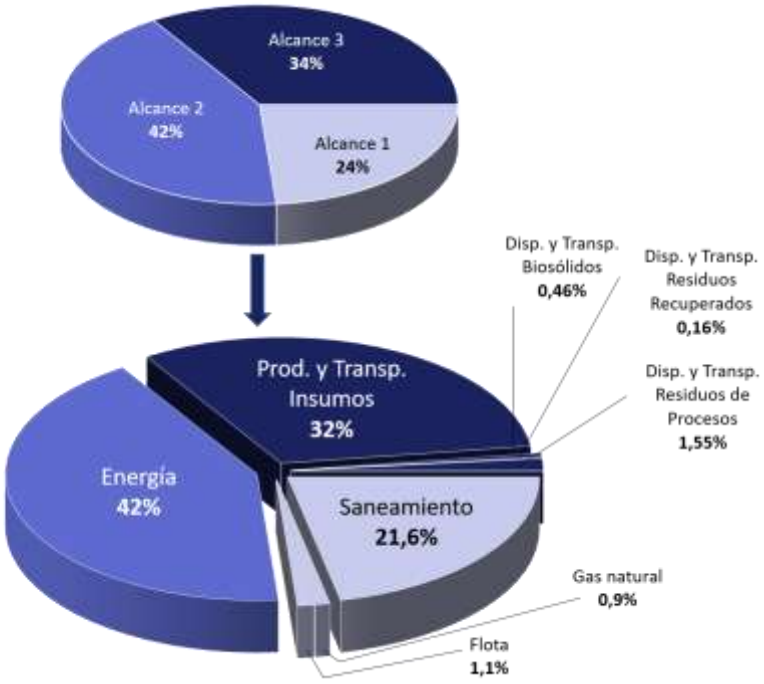


Figura 2: Distribución de las emisiones



Figura 3: Resultados clave

Pasos a seguir

- Profundizar el desarrollo de factores de emisión propios para procesos de tratamiento de efluentes, digestión anaerobia, compostaje y otras operaciones críticas, a partir de campañas de medición y estudios específicos.
- Implementar campañas de medición directa de GEI en puntos clave (digestores, emisiones fugitivas, pilas de compostaje, entre otros) para validar los modelos teóricos y reducir la incertidumbre del inventario.
- Ampliar progresivamente el Alcance 3 incorporando nuevas categorías relevantes para el perfil de emisiones de AySA (por ejemplo, viajes corporativos, desplazamientos del personal y otros servicios tercerizados), priorizando aquellas con mejor calidad de datos y mayor contribución potencial.
- Utilizar los resultados del inventario como insumo sistemático para identificar, priorizar y monitorear iniciativas de mitigación (eficiencia energética, movilidad sostenible, optimización logística, valorización de subproductos, entre otras).
- Avanzar hacia la certificación externa del inventario bajo normas IRAM/ISO, fortaleciendo la trazabilidad del proceso, la robustez de la metodología y del reporte frente a organismos de financiamiento, entes reguladores e inversores.

4.3 Monitoreo Ambiental

Objetivo

- Desarrollar una base de información integral para mapear los riesgos ambientales que afectan el área de cobertura de la empresa.
- Evaluar la evolución del comportamiento del recurso hídrico, detectando la potencial afectación del servicio por acciones de terceros
- Identificar los efectos del cambio climático sobre el recurso ambiental estratégico y su impacto en la prestación del servicio.
- Elaborar estrategias de mitigación de los riesgos identificados.

El proyecto de Monitoreo Ambiental se encuentra conformado por diferentes sub-proyectos:



Figura 4: Planes de trabajo de Monitoreo Ambiental

Control del Recurso Hídrico Superficial

Objetivo

- Adecuación de las analíticas en función del análisis histórico.
- Definición de puntos de muestreo
- Evaluar el comportamiento del recurso superficial en el área de concesión
- Cuantificar el impacto de los vuelcos de las instalaciones sobre el cuerpo receptor.
- Generar mapas de riesgo identificando zonas críticas de acción.
- Definir el plan de control de vuelco de emisarios sobre cuerpo receptor

Acciones

En el transcurso del corriente año se realizó una exhaustiva revisión de la información histórica disponible. A partir de dicho análisis, se definieron puntos de muestreo considerando los vuelcos de las instalaciones y se establecieron las analíticas asociadas en función de las características de calidad de cada descarga.

Si bien este tipo de monitoreos no constituye una exigencia regulatoria específica, se consideró oportuno mantener su implementación como parte de las buenas prácticas de gestión ambiental y del compromiso con la mejora continua. En este marco, se estableció la conveniencia de evaluar los aportes de pluviales sobre el Río de la Plata, a fin de contar con información técnica que permita fortalecer el seguimiento y conocimiento de las condiciones ambientales asociadas a la operación.

Las campañas quedaron conformadas de la siguiente manera:

- Cuenca Matanza Riachuelo (CMR)
    - Area de estudio: abarca los cursos superficiales que discurren en la CMR y actuán como cuerpo receptor de las instalaciones de la compañía. Cada establecimiento cuenta con un punto aguas arriba y uno aguas debajo de la descarga. Asimismo, se incluye un punto blanco aguas arriba fuera de la influencia de la primer descarga.
    - Cantidad de puntos: 19
    - Frecuencia: trimestral
- Ríos Reconquista - Luján
    - Area de estudio: abarca los cursos superficiales que discurren en las cuencas de los Río Reconquista y el Río Lujan y que actuán como cuerpo receptor de las instalaciones de la compañía. Cada establecimiento cuenta con un punto aguas arriba y uno aguas debajo de la descarga. Asimismo, se incluye un punto blanco aguas arriba fuera de la influencia de la primer descarga.
    - Cantidad de puntos: 21
    - Frecuencia: trimestral: trimestral
- Pluviales que descargan a la costa del Rio de la Plata
- Area de estudio: Tramo inferior de la cuenca del río Luján y las principales descargas al Río de la Plata, entre Tigre y Berazategui.
- Cantidad de puntos: 24

- Frecuencia: Trimestral

Pasos a seguir

- Ejecución de los planes de muestreo.
- Elaboración de informe a partir de los datos obtenidos y su interpretación en base a la información histórica

➢ Red de Monitoreo

La Red de Monitoreo de Calidad de Agua de la Cuenca del Plata, creada a fines de 2014, se compone de un sistema de monitoreo y alerta temprana conformado por estaciones que reportan en tiempo real las condiciones de calidad, meteorológicas y de nivel de río de toda la cuenca del Rio Paraná. Las mismas se encuentran ubicadas en puntos estratégicos y recolectan datos que permite evaluar tendencias, predecir impactos sobre la calidad del agua de captación y brindar herramientas para la toma de decisiones de los operadores ubicados en toda la cuenca. Al día de la fecha se llevan instaladas un total de 10 estaciones, que en su total informan más de 160 mediciones continuas con una frecuencia de 15 minutos entre ellas.

Como parte de este proyecto AySA implementó el Control Centralizado del Recurso, que funciona en la planta Gral. San Martín. Con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales con conocimientos en calidad de agua, meteorología, imágenes satelitales, biología e hidrología, este centro de control tiene como función principal la vigilancia de las condiciones hidrometeorológicas y de calidad. Con esta información emite un parte diario que contiene el resumen del estado de situación de las condiciones de calidad de las plantas, pronóstico de marea, calidad y meteorológico para las 72 horas posteriores, así como también alertas apoyadas tanto en los datos recolectados por la red como en modelos matemáticos.

Estos registros a largo plazo permiten definir tendencias, recolección de datos, establecimiento de una línea de base que permite determinar, entre otras cosas:

- Qué información sobre el cambio climático es apropiada y de interés regional
- Qué cambios están produciéndose y cuáles son lo suficientemente significativos como para definir acciones requeridas para adaptarse.
- Cómo estos cambios afectan las diferentes condiciones hídricas (calidad del agua y niveles de rio), impactando así en el normal funcionamiento de los procesos de los operadores de servicios sanitarios.

Cabe destacar que se cuenta con una serie de indicadores y alertas para medir la efectividad del sistema.

Este conocimiento continuo es fundamental como parte del trabajo de adaptación climática. Mayor conocimiento sobre las variables del cambio climático, cómo funcionan los sistemas, junto con sus condiciones subyacentes y vulnerabilidades, proporciona información valiosa de contexto para evaluar futuros riesgos y oportunidades para implementar otras acciones de adaptación.

Control del Recurso Hídrico Subterráneo

Objetivo

- Establecer una red de monitoreo del recurso subterráneo.
- Generar la base de información para la caracterización ambiental del recurso dentro del área de concesión con énfasis en la prestación del servicio.
- Generar mapas de riesgo y evaluación de explotación del recurso subterráneo.
- Predecir el impacto de cambio climático sobre el recurso subterráneo y la influencia del fenómeno ENOS (Evento Niño Oscilación Sur).
- Cumplimento de requisitos de monitoreo del recurso en el contexto de centros de compostaje industriales.

➢ Perforaciones de monitoreo

Acciones

- Relevamiento de perforaciones para el monitoreo del recurso subsuperficial.
- Generación de fichas de identificación y estado de las perforaciones.
- Medición de nivel freático en las perforaciones presentes en el área de concesión.
- Análisis de necesidad de ampliación de perforaciones.
- Selección de software para el análisis y modelado de las variables medidas.

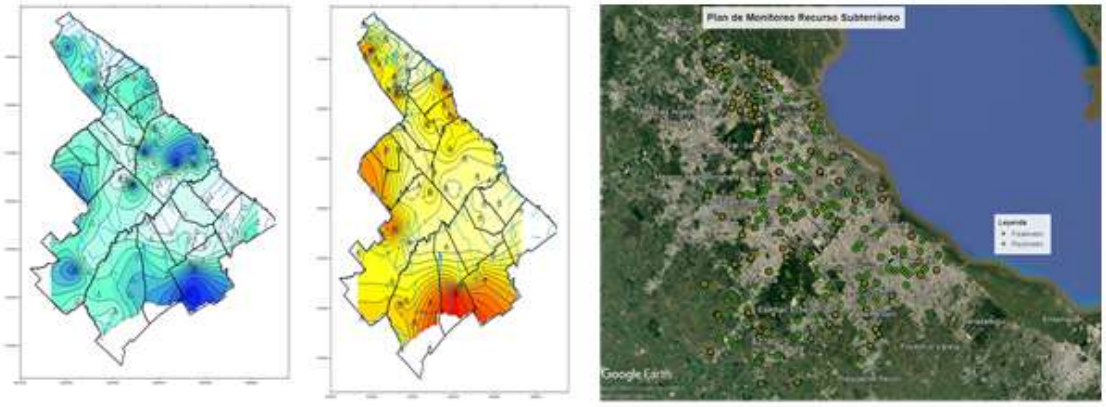


Figura 5: Acciones del Plan de Monitoreo del Recurso Subterráneo

Pasos a seguir

- Finalización de fichas de identificación y estado de las perforaciones.
- Confección de mapas de riesgo en función del recurso hídrico subterráneo.
- Ejecución de las perforaciones necesarias.
- Ejecución del plan de monitoreo del recurso subterráneo
- Generación de informes de calidad y desempeño en la gestión del recurso hídrico subterráneo.
- Modelización del comportamiento del recurso en función de los niveles de explotación y del impacto del cambio climático.

➢ Control de calidad de recurso subterráneo

Objetivo

- Establecer un programa de monitoreo del recurso hídrico subterráneo con el fin de identificar las zonas críticas y evaluar el comportamiento del recurso en función de la explotación.
- Definir el programa de monitoreo del recurso subterráneo en el contexto de establecimientos de depuración de efluentes y en las plantas industriales de compostaje.

Acciones

- Definición de analíticas para evaluación de performance ambiental de establecimientos de depuración de efluentes.

Pasos a seguir

- Implementación del plan de monitoreo en contexto de establecimientos del sistema de tratamiento de efluentes.
- Ejecución del monitoreo de recurso en centro de compostaje y posterior elaboración de informe de desempeño.

Monitoreo de Calidad de aire

Objetivo

- Establecer un plan de monitoreo de variables atmosféricas orientado a la planificación y la gestión ambiental como sustento para la toma decisiones.
- Definición de los establecimientos y los parámetros a monitorear
- Incorporación del equipamiento para el seguimiento de las variables atmosféricas.
- Establecer un sistema de respuesta frente a reclamos por olores y ruidos molestos.

Acciones

- Se identificaron los establecimientos de interés y las principales variables a monitorear.
- Se seleccionaron los equipos necesarios para llevar adelante el monitoreo de las variables de interés.
- Se confeccionaron las órdenes de compra para la adquisición del equipamiento seleccionada. A la fecha de recibieron el 40% de los mencionados equipos.

Pasos a seguir

- Ejecución de los planes de muestreo y elaboración de informes de desempeño.

4.4 Economía Circular

Es un modelo de diseño, producción y consumo que hace posible que los recursos sigan generando valor a través del tiempo, reduciendo al mínimo los residuos de los procesos productivos y su impacto en los ecosistemas.

Objetivo

Diseñar un modelo de economía circular para las instalaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales de AySA, transformando los residuos del proceso en recursos que puedan recuperarse y reutilizarse aplicando la mejor estrategia en función de cada planta.

Centro de Compostaje

Objetivo

Implementar un Centro de Compostaje para optimizar la gestión de los lodos crudos mediante la obtención de biosólido Clase A

- Reducción total de transporte de lodos generando un ahorro asociado a al traslado y disposición.
- Reducción de las emisiones de GEI asociadas a la gestión de barros cloacales.
- Eliminación de la dependencia de disposición final en sitios de terceros.
- Mejora del suelo mediante producción interna de compost estructural.
- Reducción de los costos asociados a las tareas de parquización y mantenimiento de espacios verdes.

Acciones



Figura 6: Esquema de trabajo del Centro de Compostaje

Se procesaron 230Tn de barros. Se está realizando la línea de base del recurso subterráneo, en función de lo estipulado por normativa.

Se presentó la propuesta constructiva y operativa para la implementación de un segundo centro de compostaje para la gestión de los barros cloacales en la zona norte del área de concesión.

Edificios sustentables

Objetivo

Elaborar un manual de Arquitectura Sustentable definiendo el estándar ambiental para los edificios de la empresa.

Acciones

- Análisis y evaluación de legislación nacional e internacional
- Redacción y formato de uso de manual de arquitectura sustentable



Figura 7: Manual de Edificios Sustentables

Pasos a seguir

- Colaborar con la Dirección de Ingeniería -DI- (proyectos nuevos) y la Dirección de Apoyo Logístico -DAL- (mantenimiento de instalaciones) en el desarrollo de proyectos.
- Implementar las medidas planteadas en el manual en las obras a ejecutar, sean estas nuevas o reacondicionamiento de instalaciones existente.

Subproductos / Biobricks

Objetivo

Recuperación de arenas de pretratamiento de plantas depuradoras para fabricación de materiales constructivos.

Acciones

Puesta en marcha en el predio de Establecimiento Wilde para la producción de baldosas y adoquines, apto para su uso como material no portante, garantizando calidad, durabilidad y viabilidad en términos de producción. Se utilizaron 10Tn de arenas.



Figura 8: Elaboración de Biobricks

Pasos a seguir

- Escalar la producción de la fábrica
- Evaluar aplicabilidad de arenas de otros establecimientos
- Fabricación de adoquines tipo Green-blocks para la utilización en obras internas.

4.5 Gestión de Residuos

Objetivo

- Gestionar los Residuos de AySA estableciendo un circuito sistemático desde su identificación, separación, acopio y disposición final.
- Establecer campañas de concientización y Programas de reciclado y de reutilización

Residuos Sólidos Urbanos e Industriales

Acciones

- Se continúa con el programa de disposición segregada de material reciclable, 53 sectores están incorporados.
- Durante el año se sumo al proyecto de disposición de papel para reciclado, el sector de despapelizado con un proyecto de digitalización de documentación.
- Se incorporaron como generadores eventuales los siguientes sectores:
    - Edificio Paitovi: retiro de material en desuso de imprenta y sistemas.
    - Edificio Cordoba Archivo central: 515 cajas de archivo.
    - Edificio Cordoba Telecominicaciones: retiro de equipamiento en desuso.
- Establecimiento Wilde- DAL: Se realizaron trabajos de limpieza de la sala segunda dentro del establecimiento mediante el retiro de bidones plasticos en desuso.
- El Establecimiento Fiorito cuenta con instalaciones adecuadas donde llegan los residuos provenientes de la recolección, sea esta diferenciada o no, para su clasificación y enfardado según el tipo de material y su posterior donación.
- La disposición final es la última etapa en el manejo de Residuos Sólidos Urbanos e Industriales y comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los mismos. Actualmente el mayor receptor de nuestros reciclables es la Fundación Garrahan “Programa de Reciclado y Medio Ambiente”.



Figura 10: Cantidades de residuos gestionadas 2025



Reciclamos **1.678,5 mts** de lona publicitaria y **4.821,5 mts** arpillera plástica.
Materas confeccionadas en cooperativas y unidades productivas fomentando el trabajo local. Una forma creativa de gestionar los residuos e implementar **economía circular**.

Figura 11: Proyecto 2023 de reutilización de lona y arpillera plástica

Se dispusieron en total acumulado **7.835 Kg** de RAEE



Figura 10: Disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Pasos a seguir

- Sostenimiento del convenio con la Fundación Garrahan.
- Puesta en marcha del Proyecto de maderas plásticas a partir de plástico reciclado.
- Relevamiento de islas de reciclaje para la optimización de la gestión y el cálculo de indicadores.
- Capacitación para los espacios que cuenten con islas de reciclaje.
- Ampliación del proyecto en los sitios restantes.

Residuos Peligrosos

Se continuó con los relevamientos de los sitios declarados como generadores de residuos peligros de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente (Ley 24051).

4.6 Línea de Base Ambiental

Matriz	Objetivos	Acciones	Pasos a seguir
Suelo	• Establecer la línea de base de la matriz suelo en los predios afectados a obras. • Generar una base sólida de información para proporcionar a las contratistas	• Elaboración de línea de base matriz suelo del predio PD Escobar. • Elaboración de propuesta de trabajo para la ejecución de la línea de base para los predios PD Merlo Norte y PD Paso del Rey	• Elaboración de procedimiento de trabajo para la elaboración de líneas de base. • Ejecución de los operativos de muestreo y elaboración de estudio de línea de base los predios PD Merlo Norte y PD Paso del Rey.
Agua	• Establecer la línea de base de los cuerpos receptores donde volcarán las futuras instalaciones. • Generación de información histórica como herramienta frente a posibles reclamos.	• Selección de los establecimientos a monitorear. • Definición de área de estudio, puntos de muestreo, frecuencia y analítica asociada.	• Elaboración de línea de base del cuerpo receptor. • Incorporación de los puntos de muestreo a los planes de monitoreo del recurso hídrico superficial.
Bentos	• Caracterizar la comunidad bentónica en el área de influencia de vuelco de las instalaciones proyectadas. • Evaluación del impacto en la fauna bentónica a partir de la puesta en marcha de las instalaciones.	• Selección de los establecimientos a monitorear. • Definición de área de estudio, puntos de muestreo, frecuencia y analítica asociada.	• Ejecución del plan de muestreos • Establecimiento de la línea de base de las comunidades bentónicas.

4.7 Gestión Ambiental de las Obras

AySA elabora Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) sobre obras programadas de diversa complejidad y magnitud que se desarrollan en su área de concesión, con la finalidad de obtener la licencia ambiental por parte de la autoridad competente según jurisdicción.

Adicionalmente genera documentación requerida por los organismos de crédito. Los estudios incluyen proyectos correspondientes a nuevas plantas de tratamiento de efluentes, estaciones de bombeo de líquidos cloacales, plantas de potabilización, estaciones elevadoras y redes primarias, dando cumplimiento a la resolución 492/19 de la Provincia de Bs As.
En lo que respecta a la información presentada en la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los fines de dar cumplimiento a la Ley 123, normativa que establece el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos, obras o actividades que requieren el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), este procedimiento técnico-administrativo implica, primero, la categorización de la actividad y luego el otorgamiento del CAA.

En el año 2025 se realizaron 70 presentaciones ante la APRA para su categorización, de los cuales se obtuvieron 68 CAA. La situación de las dos presentaciones restantes es trámite en curso.

Tanto en la elaboración de los EsIA y actualizaciones presentadas al Ministerio de Ambiente de la Pcia. de Buenos Aires; las presentaciones en la APRA de CABA y las Fichas de Evaluación Preliminar Ambiental y Social (FEPAS) para obras financiadas por Organismos Internacionales de Crédito (OIC), interviene un grupo interdisciplinario con amplia experiencia en la materia, que cuenta con la colaboración de técnicos y especialistas de varias áreas de la empresa.

Asimismo, durante el período enero-noviembre 2025 se realizaron 118 relevamientos de campo en los cuales se detectaron y comunicaron a las Inspecciones de Obras 81 desvíos ambientales. A su vez, se lograron cerrar 69 desvíos ambientales detectados en períodos anteriores.

También en este período se procesaron 59 Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) que corresponden a 52 obras distintas y se elaboraron y comunicaron 95 "Informes de Estado de Situación Ambiental a la Suspensión de Obra". Este formato, incorporado en noviembre/diciembre 2024, se utilizó como insumo para la transformación de las Obras de la Compañía, así como para la comunicación de las mismas a los OIC.

5 Conclusiones

La gestión ambiental del período refleja un avance sostenido hacia un modelo corporativo más eficiente, trazable y alineado con las mejores prácticas internacionales. La consolidación de metodologías, la ampliación del monitoreo y la integración de indicadores ambientales permiten fortalecer la capacidad de AySA para anticipar riesgos, mejorar la toma de decisiones y asegurar la calidad del servicio en un contexto de creciente variabilidad climática.

Las iniciativas de economía circular y valorización de residuos demostraron impactos concretos en términos económicos, operativos y ambientales, constituyéndose como ejes estratégicos para reducir costos, minimizar emisiones y disminuir la dependencia de terceros para la disposición final.

Del mismo modo, la progresiva incorporación de fuentes de GEI en el inventario corporativo y la mejora de los supuestos metodológicos representan un paso fundamental para desplegar planes de mitigación robustos.

Se identifican como desafíos prioritarios para el próximo período: profundizar la medición directa de GEI en instalaciones críticas, completar la red de monitoreo subterráneo, ampliar la capacidad operativa del Centro de Compostaje, estandarizar los procedimientos de línea de base ambiental y fortalecer los mecanismos de respuesta ante eventos atmosféricos. La continuidad de estos proyectos permitirá consolidar un sistema de gestión ambiental integral que aporte valor a la calidad del servicio, a la seguridad operacional y al cumplimiento normativo.

Control del Recurso

La misión del área de Control de Recurso es promover y desarrollar herramientas para el estudio, control y emisión de alertas sobre el recurso natural, gestionando las acciones de monitoreo en el agua cruda superficial, como así también coordinar el apoyo operativo en instalaciones de agua realizadas en todo el ámbito de aplicación de la Empresa.

Este proceso prevé la coordinación y ejecución de las diferentes actividades:

1. **Monitorear, estudiar y diagnosticar el agua cruda superficial, mediante:.**

- Emisión diaria de un parte predictivo de Calidad en las plantas, de Marea y Meteorológico. Emisión de Alertas y Seguimiento de eventos. Seguimiento datos de calidad, niveles y caudales.
- Plan anual de monitoreo de la fuente de provisión de agua superficial (zona de incumbencia de las Tomas de Agua: Transectas - floraciones algales – eventos extraordinarios).
- Plan anual de monitoreo Línea de base ambiental en la zona de implantación del futuro emisario Berazategui y monitoreo regulatorio en sistemas de emisario Riachuelo con volcamiento al Río de la Plata.

2. **Diagnóstico Mantenimiento de Instalaciones emplazadas en el Río**

- Plan de mantenimiento preventivo del equipamiento existente en las Torres Tomas de las Plantas Potabilizadoras (Balizas – Estaciones Meteorológicas).
- Relevamiento del sistema de marcación (boyado fondeado) en la traza del Emisario Riachuelo.
- Planes de mantenimiento y limpieza de las instalaciones: Torres Tomas Planta San Martín - Planta Belgrano – Planta Juan Manuel de Rosas

Durante el año 2025 se realizaron un total de 64 muestreos de calidad y 52 tareas operativas, referidos a diversos proyectos o necesidades.



Se detallan las actividades más relevantes:

- se realizó el informe final "Estudio De Línea De Base Del Proyecto De Instalación Del Futuro Emisario Riachuelo" donde se recopilaron y analizaron aprox 140,000 determinaciones recolecatadas en los 14 años que se realizó el estudio línea de base, sobre agua y sedimentos. Ademas de los seis muestreos realizados para evaluar el bentos.

- debido a la puesta en marcha de la planta Dock Sud y su emisario comenzaron a realizarse tareas de control del vuelco en el Rio de la Plata. A mediados de año, al lanzarse el nuevo plan regulatorio, estas tareas pasaron a tener cumplimiento trimestral obligatorio.

- Se reanudaron los trabajos de matenimiento de los equipamientos instalados en las Torres Tomas (balizas, estaciones meteorológicas, limpiezas TT). Ademas se comenzaron a definir las actividades de mantenimiento del boyado del emiario Riachuelo, el plan de recambio de rejas en la toma de PMB y una nueva configuraion de barreras de contención de hidrocarburos para la toma de PJMR.

1. MONITOREAR, ESTUDIAR Y DIAGNOSTICAR EL AGUA CRUDA SUPERFICIAL

- **DIAGNÓSTICO Y MONITOREO DE LA CALIDAD ENTORNO TORRES TOMAS:**

Se ejecutaron según plan de muestreo anual los monitoreos en la zona de entorno de las Torres Tomas de PSM, PMB y PJMR. El objetivo de este estudio es tener un diagnostico de la zona donde se encuentran instaladas las tomas, el grado de aporte costero que reciben, como este se interrelaciona con variables hidrometeorológicas y su evolucion a lo largo del tiempo.

Durante el 2025 se realizaron 11 transectas de PSM, 10 de PMB y 12 transectas de PJMR. A continuación se presentan los puntos de muestreo definidos en cada una de ellas:





- **MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE CALIDAD EN EVENTOS DE FLORACIONES ALGALES.**

Dentro del esquema de monitoreo de calidad del Río de la Plata, durante los meses de Enero a Febrero y Septiembre a Diciembre se realizan muestreos preventivos para evaluar la concentración algal aguas arriba de las tomas. Durante el 2025 se realizaron 22 relevamientos con este objetivo.

- **DIAGNÓSTICO CALIDAD ZONA IMPLANTACIÓN FUTUROS EMISARIOS/LÍNEA DE BASE.**

El objetivo de este proyecto, iniciado en el año 2010, es caracterizar la calidad en las zonas de implantación de los Futuros Emisarios Berazategui y Riachuelo en diferentes condiciones hidrológicas y estacionales para poder, una vez que se encuentren en operación, medir y evaluar sus impactos.


Linea de base calidad de agua y sedimentos en la zona de implantación del Emisario Riachuelo:

A principios del año 2025 se realizó el informe final "Estudio De Línea De Base Del Proyecto De Instalación Del Futuro Emisario Riachuelo" donde se recopilaron y analizaron aprox 140,000 determinaciones recolecatadas en los 14 años que se realizó el estudio línea de base, sobre agua y sedimentos.


Ademas de analizar las seis campañas realizadas para el análisis de bentos en la zona del influencia del emisario.

Los resultados recolectados hasta este momento, coinciden con las descripciones anteriores, modificadas especialmente por la proximidad a la costa y las influencias del emisario actual.


A continuación presentan algunas gráficas utilizadas en el informe final del Emisario Riachuelo.

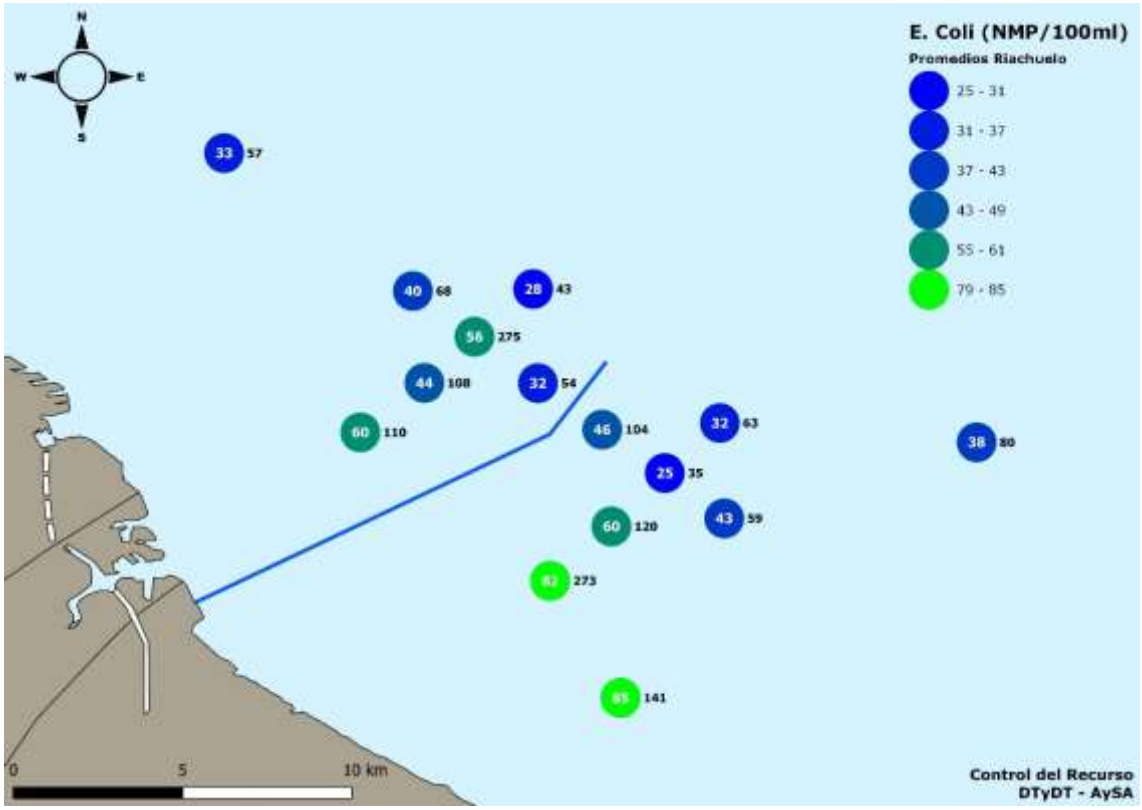


Promedio y desvío estándar de la concentración de E. coli en todos los sitios de monitoreo de agua.

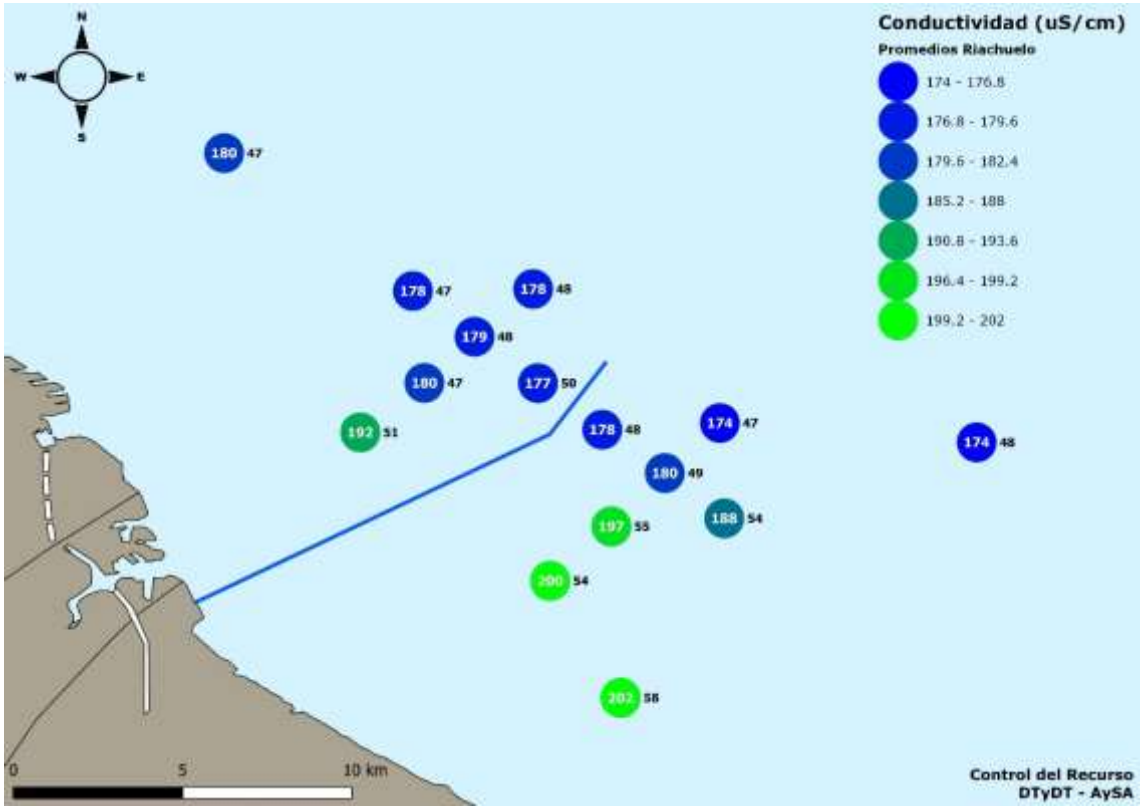

Promedio de conductividad y desvío estándar para todos los puntos de monitoreo y todas las campañas.

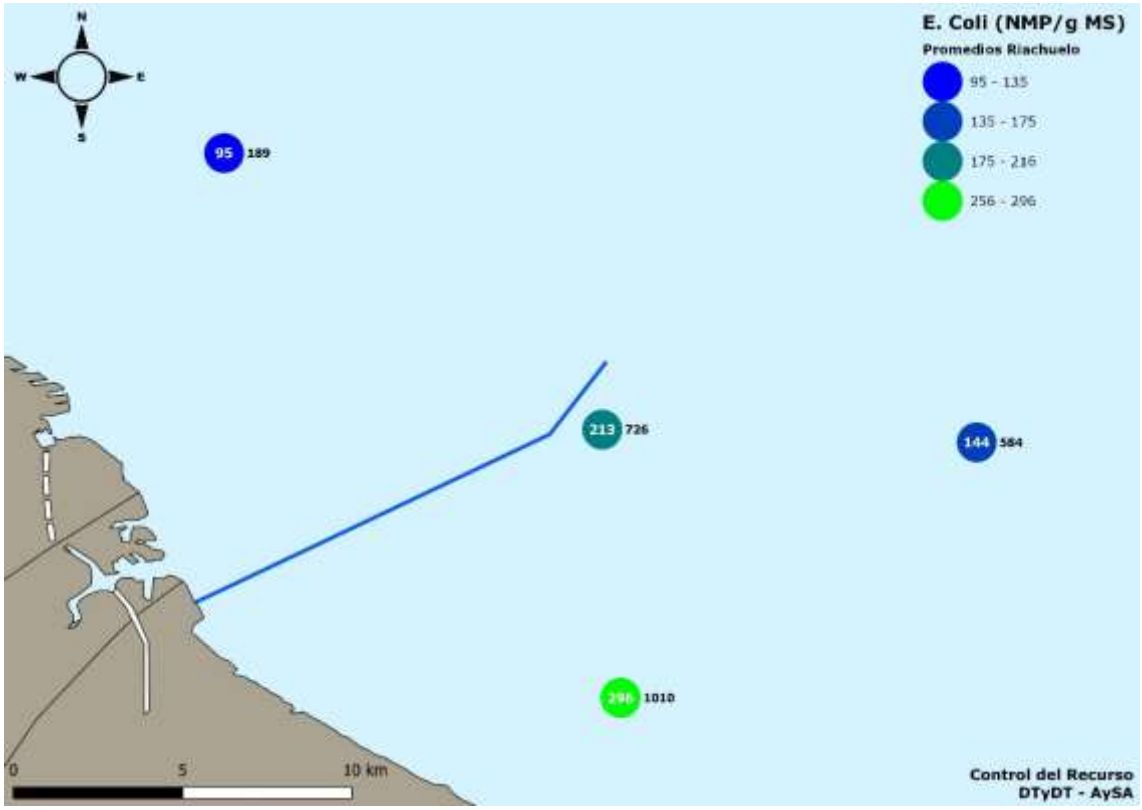

Promedio y desvío estándar de la concentración de E. coli en todos los sitios de monitoreo sedimentos.

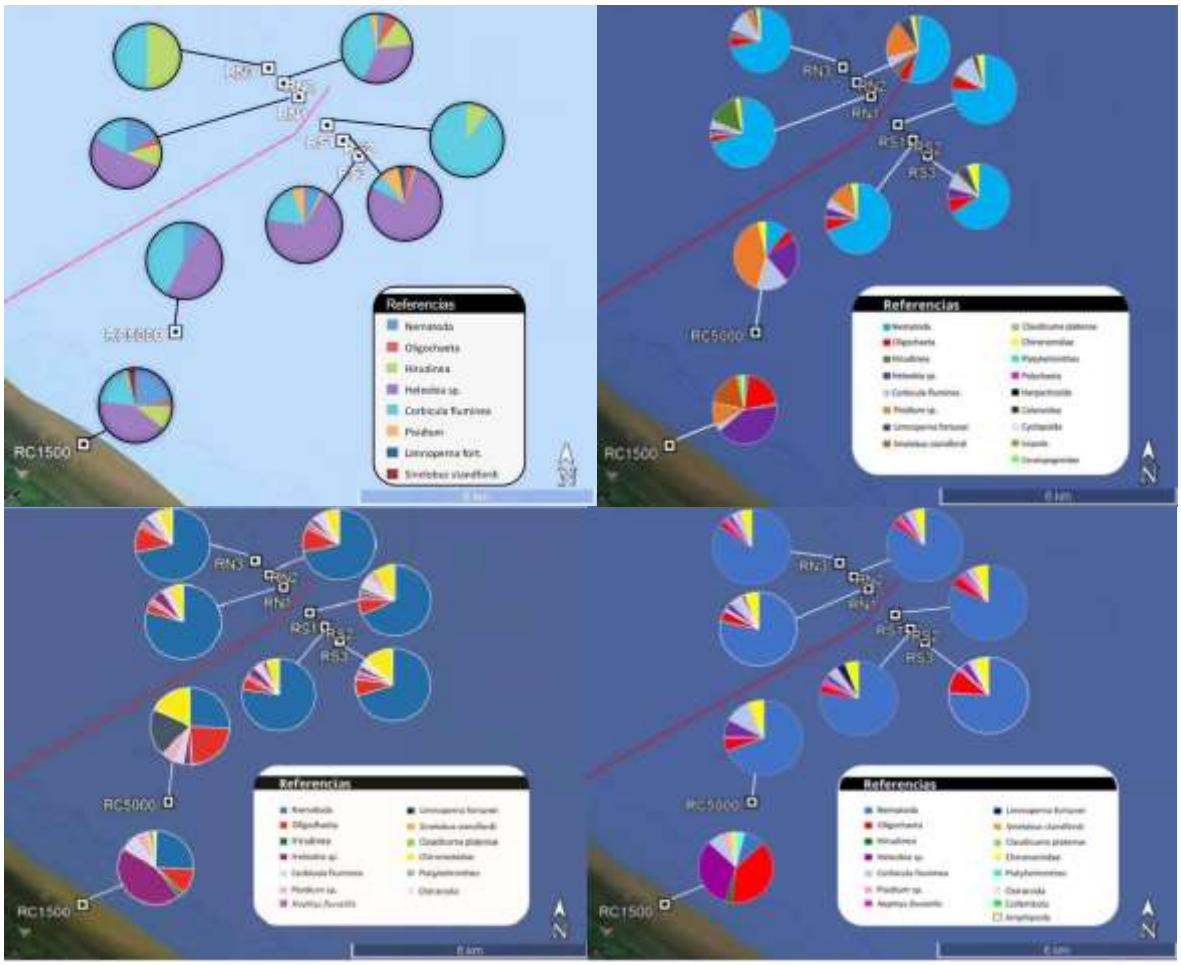

Distribución de los taxa de invertebrados bentónicos en los puntos de muestreo del emisario Riachuelo correspondientes a las campañas (1, 3, 4 y 5) Pre Sudestada, entre los años 2022 – 2024



Variación de los índices Riqueza, Diversidad, Equidad y Densidad a lo largo de las diferentes campañas Pre y Post Sudestada (2022 – 2024)

Control Emisario Riachuelo:

A mediados del 2025 se puso en funcionamiento Planta Dock Sud y por ende comenzó el vuelco del Emisario Riachuelo.

A razón de lo mencionado se realizó un primer relevamienento en Junio, tanto de calidad de agua como a través de vuelos con dron.

En este primer monitoreo, no se detectaron cambios evidenciables en la calidad del agua producto del vuelco; los valores obtenidos tanto aguas abajo como aguas arriba fueron similares entre si y se corresponden con lo observado en general en diferentes áreas de Rio de la Plata y Paraná de las Palmas. Además , mediante el relevamiento aéreo, no se detectaron rastros visibles de una pluma asociada al Emisario.

En el mes de Julio fue publicado el nuevo marco regulatorio, donde se incluyó el control de los emisarios como norma de complimiento.

Si bien el mismo entra en vigencia a partir del año 2026, se realizaron dos relevamientos del Emisario Riachuelo, en los meses de Septiembre y Noviembre.

- **DRAGADO TERMINAL YPF BUQUE GASÍFERO (PUERTO DE ESCOBAR)**

Durante Febrero, previo recibir aviso por nota SISEME, se dió comienzo del dragado de la terminal gasífera de YPF.

En base a esto se definió realizar un muestreo con el objetivo de evaluar, tanto en la zona de dragado como en la zona cercana a la toma de agua de PJMR, el grado de resuspensión de sedimentos debido a las tareas, no hallándose un impacto considerable.

Las tareas de dragado finalizaron sin afectación de la calidad de ingreso a la PJMR.

- **EVENTO CONTAMINACIÓN EN ARROYO SARANDÍ**

En febrero, a raíz de la noticia de la aparición de coloración roja en el Arroyo Sarandí el se dió aviso a la Dirección. Se definió no realizar muestreos adicionales ya que ese mismo día se había realizado un muestreo en la zona, además de corroborar el nulo aporte esperado a la Toma de Planta Manuel Belgrano según los modelos matemáticos.

Se dio respuesta a nota SISEME con pedido de información sobre el evento.

- **MUESTREO EXTRAORDINARIO POR EVENTO DE HIDROCARBUROS EN PJMR**

En Mayo se detectó un ingreso de hidrocarburos a la planta generando la necesidad de un relevamiento en el predio de la toma y el monitoreo con la embarcación Tritón desde San Fernando hasta el Canal Santa María.

- **MUESTREO POR PRESENCIA DE OLOR EN CRUDA PMB**

En Marzo , debido a la presencia de Olor en el agua cruda de PMB, se realizó un muestreo extraordinario en las inmediaciones de la TT. Se monitorearon los principales aportes costeros (Sarandí y Sto. Domingo) y puntos de la Transecta PMB.

- **RELEVAMIENTO DESCARGAS PLUVIALES CABA**

Durante Julio, se realizó un relevamiento con la embarcación Tritón de las diferentes descargas pluviales costeras al RDLP. Las descargas relevadas fueron: Doble y Triple conducto, Medrano, Maldonado, Ugarteche, White, Vega. Se organizó junto a personal del LC muestreo del Radio Antiguo (Doble y Triple conducto).

2. CONTROL CENTRALIZADO DEL RECURSO


Durante el 2025 se realizaron las siguientes actividades:

- **PRONÓSTICOS DE CALIDAD E HIDROMETEOROLÓGICOS**

Se continuó utilizando Sharepoint como método para la distribución de partes.

Los partes emitidos diariamente presentan un 78.2% de acierto anual, valor ligeramente superior al % general acumulado (76.2%).

Este reporte permite a las plantas potabilizadoras una mayor previsibilidad en los cambios de calidad y por ende en la dosificación de insumos, además de una mejor gestión de los pedidos de entrega de insumos a proveedores.

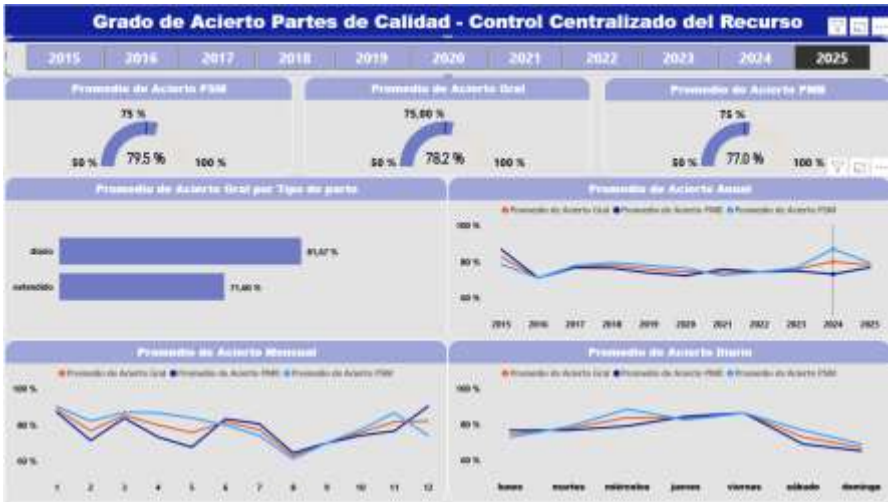

En Julio se realizó una reunión junto a la Jefatura de Planta San Martin. Jefatura de Laboratorio PSM, Gcia de Establecimientos (de la Dirección de Agua), donde:

Se evaluaron diversos factores referentes a los partes y alertas emitidos por CCR (formato, texto, destinatarios, método de envío, etc.).

Se acordaron mejoras a futuro en cuanto a los informes de Transecta (formato de los informes, utilización del sharepoint).

- **ALERTAS**

Luego de la reunión de Julio, se continúa el envio de las alertas definidas:

- Alerta por precipitaciones acumuladas intensas.
- Alerta por vientos intensos.
- Alerta por bajantes y crecientes extraordinarias en el Rio de la Plata.
- Alertas por altos valores de amonio en plantas.
- Alertas por incrementos extraordinarios de Turbiedad en la cuenca.

- **REPORTES PROGRAMADOS**

Se continuó con el envio de reportes programados como ser:

- Reportes diarios de temperaturas y precipitaciones.
- Reportes semanales y mensuales de precipitaciones acumuladas.
- Reportes semanales de estado de transmisión de variables de la Red de Monitoreo.
- Reportes diarios de valores de calidad.
- Reportes semanales de caudales en la cuenca alta y tendencias.
- Reportes semanales de Turbiedad, cuando se está dentro del rango de alerta.

3. DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EMPLAZADAS EN EL RÍO


- **LIMPIEZA DE REJAS EN TOMAS DE AGUA.**

Durante el año 2025, se realizaron 4 operativos de limpieza de rejas en la torre Toma n° 3 de PSM y un operativo de limpieza de la Toma de Planta Manuel Belgrano.



Este operativo permite disminuir el taponamiento de las rejas y así reducir la perdida de carga (coeficiente k) y el costo energético asociado al bombeo.

A continuación, se muestra un ejemplo del impacto en los valores pre y pos limpieza de rejas.

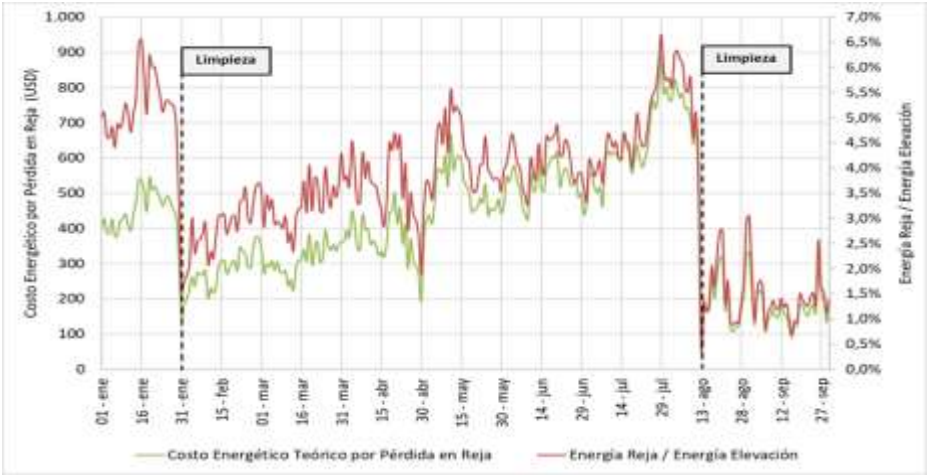

- **ESTACIONES METEOROLÓGICAS.**

Se el continuó tanto con el mantenimiento programado como con el control de los datos provenientes de las estaciones.

Se finalizó la construcción de los soportes para paneles solares para instalar en la toma PMB, luego de un evento de fuertes vientos, que provoco la rotura de los paneles solares y caída de transmisión de la misma desde fines de 2023.

En Junio se realizó, junto a personal de PMB la instalación de los soportes, paneles solares y baterías del sistema. Se dejó el sistema energizado y en funcionamiento.

Luego de una nueva intervención por parte de personal de Comunicaciones, se pudo reestablecer el normal funcionamiento de la EM.

Se adquirieron 4 EM nuevas, dos para recambio y dos para ser instaladas en puntos a definir por la DMAyC.

- **MANTENIMIENTO DEL BALIZADO DE LAS TOMAS DE AGUA.**

Se continuo ejecutando el cronograma de mantenimiento programado sobre las balizas. Se cumplió parcialmente el plan de mantenimiento, debido principalmente a la falta de insumos para el armado de las balizas a reponer/reparar.

- **RECAMBIO REJAS EN TT PMB:**

Durante el 2025, luego de la última limpieza de rejas subacuática y ante el estado de deterioro de las misma, la Direccion de Ingeniería y Direccion de Agua tomo la decisión de realizar el reemplazo del sistema para que sean extraíbles, similar al que se realiza en TT de PSM.

La Direccion General autorizó el proyecto y se seleccionó a la Empresa Tandanor como la responsable de la obra. Actualmente, se generó la OC para dar comienzo a las tareas una vez presentada la documentaciones necesarias para su inicio durante el 2026.

- **BALIZADO EMISARIO RIACHUELO:**

Una vez finalizada las obras del Sistema Riachuelo y a partir de la puesta en marcha de la Planta en Dock Sud, a pedido de la Direccion de Saneamiento se realizó una reunión donde se definio al sector como responsable del mantenimiento del Boyado fondeado para limitar la navegación en la zona de difusión en el Rio de la Plata y cumplir con los requisitos actuales de Prefectura Naval y Servicio de Hidrografía Naval.

Para ello se realizaron las gestiones con ambas autoridades para adecuar lo instalado a las necesidades reglamentarias vigentes.

A su vez, se realizó una reunion con el proveedor que realizó los trabajos de fondeo originales, con el obejtivo de obtener presupuesto de los servicios de recolocación y mantenimiento. Este se incorporó al presupuesto 2026 de la DS.

- **COLOCACION DE BARRERAS DE CONTENCION DE HIDROCARBUROS EN TOMA PJMR:**

Luego del evento de ingreso de Hidrocarburos en PJMR y ante la falta del servicio de colocación de barreras de contención de HC en dicha toma, la direccion toma la decisión dedefinir un sistema de contención fijo y con mayor durabilidad que lo métodos tradicionales de barreras flotantes.

Para ello se realiza una reunion junto a la Direccion de Agua, la Gerencia de Establecimientos y un potencial proveedro con el objetivo de obtener asesoramiento y definir una nueva solución.

Actualmente la empresa proveedora presentó diseño y presupuesto del nuevo sistema, el cual se encontraría en la etapa de análisis y evaluación entre los referente para el 2026.

4. COMISIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS

El Departamente Control del Recurso coordina la Comisión de Insumos Químicos, un equipo de trabajo interdisciplinario, conformado por referentes de todas las direcciones que participan directa o indirectamente en el uso, recepción, control de calidad, compra y/o administración de insumos químicos productivos.

- **REUNIONES:**

A lo largo del 2025 se celebraron nueve reuniones ocho de ellas virtuales y una presencial en Planta San Martín.

- **CONTROLES CRUZADOS:**

En enero 2025 todos los laboratorios retomaron los controles cruzados de cal viva, que habían sido suspendidos en enero 2024. Los mismos se realizaron con frecuencia mensual, alternando entre muestras de entregas de los 3 proveedores con ordenes de compra vigentes.

Por otra parte, en abril 2025 se retomaron los controles cruzados de sulfato de aluminio y policloruro de aluminio. Si bien todos los laboratorios realizan los controles cruzados de PAC, se acordó que el laboratorio de PJMR dejara de realizar los análisis de sulfato de aluminio de manera rutinaria ya que no utilizan este insumo.

- **GESTIÓN DOCUMENTAL:**

Se continuó con el envío del reporte mensual con el estado de situación de la totalidad de documentos de la comisión, para la Gerencia de Apoyo Operativo (GAO, Dirección de Ingeniería), a la Gerencia de Establecimientos (GE, DA), a la Gerencia de Producción de Agua Subterránea (GPAS, DA), Dir. de Compras y Almacenes y Dirección de Saneamiento.

En el transcurso del año, como parte de la gestión de mantenimiento del sistema de gestión, se publicaron los siguientes documentos (nuevas versiones de documentos ya existentes):

- Version 10 de D-CIQ-001 Estructura Documental Comisión Insumos Químicos
- Version 05 del procedimiento específico E-CIQ-IQ-001 Recepción, Control de Calidad y Gestión Administrativa del Sulfato de Aluminio.
- Version 02 del procedimiento específico E-CIQ-IQ-004 Recepción, Control de Calidad y Gestión Administrativa de Carbón Activado en Polvo.
- Version 05 del procedimiento específico E-CIQ-IQ-009 Recepción, Control de Calidad y Gestión Administrativa de Policloruro de Aluminio (PAC)
- Versión 06 del procedimiento específico E-CIQ-IQ-001 Recepción, Control de Calidad y Gestión Administrativa del Sulfato de Aluminio.
- Versión 01 de la especificación técnica ET-CIQ-002 Especificación Técnica para el Cloro
- Versión 03 de la especificación técnica ET-CIQ-001 Especificación Técnica para el Sulfato de Aluminio
- Versión 01 de la especificación técnica ET-CIQ-003 Especificación Técnica para Polielectrolito
- Versión 01 de la especificación técnica ET-CIQ-009 Especificación Técnica para el Policloruro de Aluminio (PAC)
- Versión 02 del instructivo I-CIQ-IQ-004 Método AySA para el control de calidad de Sulfato de Aluminio

- Versión 04 del registro R-CIQ-IQ-006 Formulario de recepción de vehículos de transporte de carbón activado en polvo
- Versión 04 del registro R-CIQ-IQ-012 Parte diario de recepción de Sulfato de aluminio
- Versión 04 del registro R-CIQ-IQ-015 Parte diario de recepción de Carbón Activado en polvo
- Versión 04 del registro R-CIQ-IQ-019 Parte diario de recepción de Cloruro de sodio
- Versión 02 del registro R-CIQ-IQ-028 Parte Diario de Recepción de Cloro Líquido en Cisternas
- Versión 05 del registro R-CIQ-IQ-009 Formulario de recepción de vehículos de transporte de cloruro de sodio
- Versión 05 del registro R-CIQ-IQ-013 Parte diario de recepción de Cloro Líquido en Cilindros

Por otro lado, crearon y publicaron 3 nuevos documentos, asociados al proceso de auditoría a proveedores:

- "Listado de auditores para auditorías a proveedores de IQ" en respuesta a la OM-AYSA-CIQ-2024-02 (D-CIQ-IQ-006 v00)
- "Informe de Auditoría a Proveedores de IQ" (R-CIQ-IQ-039 v00)
- "Auditoría a Proveedores de Insumos Químicos Productivos" (E-CIQ-IQ-016 v00)

- **AUDITORIAS:**

En mayo, la coordinación de la CIQ fue auditada de manera virtual por parte de la Dirección de Auditoría Interna de AySA. No se comunicaron hallazgos.

- **AUDITORÍAS A PROVEEDORES**

Se cumplió con el cronograma de auditorías a proveedores, realizando auditorías a 11 proveedores de 8 insumos químicos productivos. Los equipos auditores se conformaron entre referentes de diferentes Direcciones del comité.

En suma, se han detectado un total de 10 oportunidades de mejora y dos no conformidades, cuyo tratamiento se relevará en las auditorías del 2026. Se realizó el seguimiento de hallazgos de años anteriores, quedando una oportunidad de mejora como pendiente de resolución. Los informes de auditoría fueron entregados en tiempo y forma.

8. GESTION DEL LABORATORIO

INFORME ANUAL 2025

Gestión de Laboratorios

INDICE


1 Dirección de Medio Ambiente y Calidad 3
1.1 Gestión del Laboratorio Central 3
2 Dirección de Agua 6
2.1 Gestión de Laboratorio Planta San Martín 6
2.2 Gestión de Laboratorio Planta Manuel Belgrano 12
2.3 Gestión de Laboratorio Planta Juan Manuel de Rosas 23
2.4 Control de Procesos 26
3 Dirección de Saneamiento 28
3.1 Gestión de Laboratorio de Planta Norte 28
3.2 Gestión de Laboratorio de Planta Sudoeste 29
3.3 Gestión de Laboratorio de Plantas El Jagüel/Barrio I 29
3.4 Gestión de Laboratorio de Planta Hurlingham 31
3.5 Gestión de Laboratorio de Planta Fiorito 32
3.6 Gestión de laboratorio Planta Lanús 33
3.7 Gestión de laboratorio de Planta Santa Catalina 34
3.8 Gestión de Laboratorio de Planta Depuradora Bella Vista 35
3.9 Gestión de laboratorio de Planta Escobar 36
3.10 Gestión de laboratorio de Planta Garín 38
3.11 Gestión de laboratorio Planta Ferrari 39
3.12 Gestión de laboratorio Planta Catonas 41

1 Dirección de Medio Ambiente y Calidad

1.1 Gestión del Laboratorio Central

En continuidad con la gestión iniciada en 2024, se profundizó la revisión de los planes de muestreo de agua, efluentes y estudios especiales. Como resultado, este año se registró una reducción promedio del **31% en el número de muestras ingresadas** (donde solo el 1,7% correspondió a muestras regulatorias) y un **17% en las determinaciones realizadas**. A pesar de la baja en el volumen físico, la complejidad de las muestras ingresadas ha incrementado la demanda analítica por unidad, respecto del periodo anterior.

Evolución de la Producción		
Período	**Muestras**	**Determinaciones**
2021	66.284	966.921
2022	71.846	1.113.401
2023	72.703	1.171.151
2024	69.185	805.347
2025	**47.941**	**667.411**

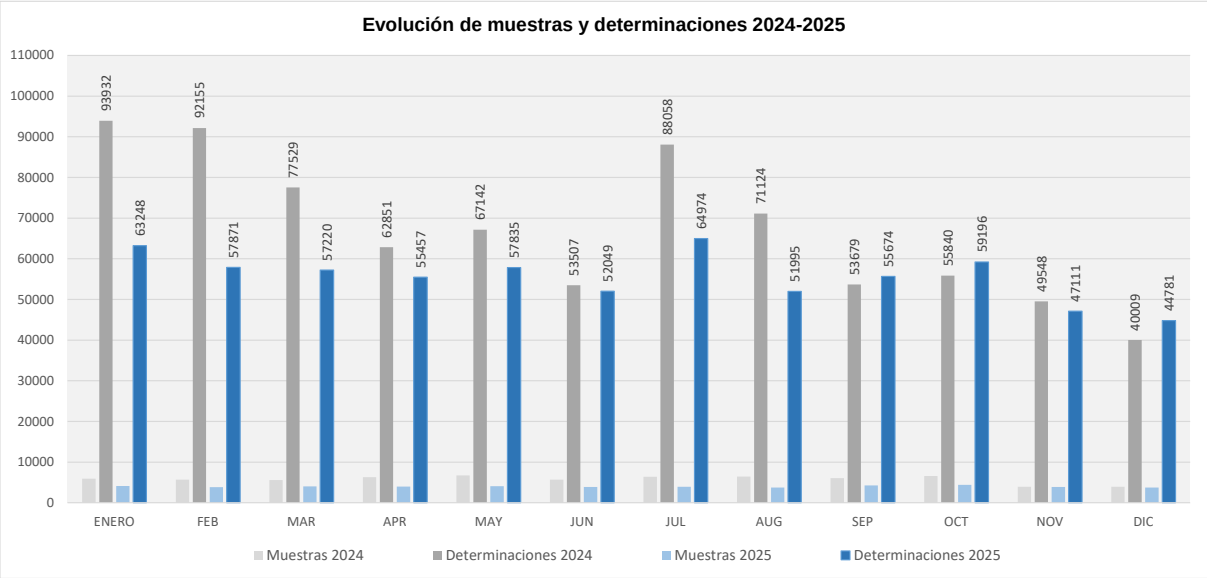

Gestión de Recursos Humanos

Para mitigar la reducción de dotación derivada del plan de retiro voluntario, se incorporaron tres recursos internos y cinco externos bajo modalidad de contrato. Si bien el personal contratado cuenta con alta calificación, el período necesario de especialización técnica, sumado a la salida de servicio de equipos críticos, (principalmente de cromatografía) y las restricciones presupuestarias de principios de año, generó cuellos de botella que afectaron los tiempos de entrega de resultados.

Unidad de Negocios

En línea con los objetivos corporativos de sostenibilidad, a mediados de año se estableció la creación de una Unidad de Negocios. Esta reestructuración administrativa busca optimizar la adquisición de insumos, repuestos y equipos posicionando al laboratorio como un referente técnico competitivo en el mercado industrial. A la fecha de este análisis se están evaluando nuevas estrategias de marketing y difusión de servicios que ayuden a captar clientes externos estratégicos, todo ello garantizando el desempeño técnico y el estricto cumplimiento del marco regulatorio vigente.

Desarrollos Técnicos y Adaptación Analítica

- **Cromatografía Gaseosa:** Se migraron las determinaciones de Hidrocarburos Totales, Trihalometanos (THMs) y Clorofenoles a sistemas alternativos (Shimadzu y HPLC-UV con extracción SPE), asegurando la trazabilidad de los resultados.

- **Hidrocarburos (GRO/DRO) y BTEX:** Se desarrollaron nuevos métodos de extracción por *head-space* y espectrometría de masas, validados exitosamente mediante ejercicios interlaboratorios internacionales (LGC).

- **Innovación Sustentable:** Se implementó la técnica **FT-IR** para Grasas y Aceites, reemplazando el método gravimétrico. Esta mejora incrementa la precisión, reduce los tiempos de respuesta y minimiza el uso de solventes, alineándose al nuevo Marco Regulatorio (DNU-2025-805).

- **Biología Molecular**: Diseño de técnicas de **PCR** para la remoción de parásitos (37% de avance) y detección de *Salmonella spp*.

- **Biología Ambiental:** Aislamiento y cultivo de algas autóctonas (*Cyclotella* y *Aulacoseira*) para la calibración de equipos y mejora de procesos de potabilización.

Procesamiento de datos biológicos (software PRIMER) para evaluar el impacto ambiental del Sistema Riachuelo (50% de avance).

Mejoras Operativas e Infraestructura

- **Descentralización:** Se iniciaron las obras en la Planta Bernal para el traslado del Laboratorio Regional Sudeste (LRSE), buscando ampliar la capacidad analítica fuera de la sede central.
- **Sistemas:** Se optimizó la interfaz entre el programa **Plug** y el sistema **LIMS**, mejorando la carga y gestión de datos.
- **Equipamiento:** Se renovó el gabinete de bioseguridad para la reactivación del cepario y se adecuó una nueva sala de extracción para ensayos de Bentos y Helmintos, cumpliendo con los estándares de seguridad vigentes.

Calidad

- **Transformación Digital:** Se automatizó la migración de resultados al sistema Business Object para todas las causas de extracción con frecuencia menor a la mensual, optimizando la disponibilidad de información.

Se integró la **firma digital** en informes externos, otorgando validez jurídica y agilidad comercial.

- **Readecuación Normativa:** En respuesta a las actualizaciones del marco regulatorio, se llevó a cabo una revisión integral de las analíticas asociadas a los planes de muestreo. Esta labor incluyó la normalización de la nomenclatura de parámetros, el ajuste de los valores de referencia y la redefinición de los componentes ante anomalías bacteriológicas.

Extensión y Asistencia Técnica

- **Capacitación Especializada:** Se dictó en el Laboratorio Central el taller teórico-práctico sobre **especiación de arsénico**, organizado por COFES. Asimismo, como parte del lanzamiento de la nueva unidad de negocios, se ejecutó un programa de **Análisis Sensorial** diseñado específicamente para el cliente externo Redes y Servicios.
- **Diagnóstico de Incrustaciones en Toberas:** A solicitud de la Dirección de Agua, se realizó la caracterización físico-química de incrustaciones en el proceso de potabilización. El análisis reveló una alta prevalencia de compuestos de **silicio y calcio**, permitiendo identificar las formaciones minerales que afectan la eficiencia del sistema.
- **Análisis de Obstrucciones en Ósmosis Inversa:** Se caracterizó mediante la técnica **FTIR con módulo ATR** un hidrogel causante de obstrucciones. Los hallazgos fueron validados por el equipo técnico del proveedor en España, confirmando la estructura identificada en el estudio local.

- **Optimización de Lechos Filtrantes:** En coordinación con la Dirección de Agua y Control de Proceso, se analizaron soluciones de lavado y arenas de filtro. Este estudio constituye la base para desarrollar un método de **recuperación de arenas**, orientado a maximizar la vida útil de los materiales y reducir costos operativos.

- **Apoyo al Sistema de Emisarios:** A pedido de la Dirección de Saneamiento, se evaluó la granulometría y materia orgánica de los sólidos retenidos en el nuevo emisario. Los resultados asistieron en la **homologación del diseño y operación** de la infraestructura previo a su traspaso formal a AySA.

- **Eficiencia en Intercambio Iónico:** Se midió el grado de agotamiento de las resinas utilizadas en el tratamiento de agua subterránea (Planta 9 de Abril). Estos datos permiten definir con precisión los **ciclos de recambio**, optimizando el rendimiento de las unidades de tratamiento.

2 Dirección de Agua

2.1 Gestión de Laboratorio Planta San Martín

2.1.1 Estudios Especiales

Estudio Especial N° 327: Remoción Bacteriología

Se realizó este estudio durante todo el año con una periodicidad mensual, enviando las muestras al LC para su posterior análisis.

Estudio especial n° 182: parásitos y fagos

Se realizó durante todo el año con periodicidad trimestral, enviando las muestras al LC para su posterior análisis.

Estudio especial n° 285: fitoplancton y THM

Se realizó a demanda según el monitoreo realizado por el Laboratorio de Optimización de Procesos, y consultando disponibilidad de recursos del LC para enviar las muestras.

Estudio especial n° 223: agua en sachet

Se realizó este estudio a demanda, enviando las muestras al LC de cada lote producido en al Ensachetadora.

2.1.2 Equipamiento

Este año los equipos ingresados fueron los siguientes:

- Dispensador repetitivo digital (micropipeta): 2 unidades
- Zorra eléctrica
- Hidrolavadora profesional

2.1.3 Mejoras

Optimización de Dosis de Coagulante mediante Ensayos con Equipo de Medición de Cargas (LCA)

Durante 2025 se continúa con la optimización de dosis de coagulante mediante el equipo de medición de cargas de mesada, que junto con otras mejoras realizadas con obras en planta en la etapa de coagulación permitió un **ahorro acumulado de 2,8 millones de USD entre mayo y diciembre de 2022**, y un **ahorro acumulado de 6,6 millones de USD durante todo 2023** respecto a dosis de años anteriores, previo a la implementación de esta herramienta (2019 a 2021). El desarrollo sobre esta temática se llevó a cabo en la Revisión por la Dirección de Agua 2024.

Durante 2025, el Laboratorio de Optimización de Procesos desarrolló una metodología rápida, para poder determinar una dosis para neutralización de cargas en muestras de agua cruda en aproximadamente 5 minutos. Luego de probar el ensayo, se capacitó a los Químicos/as de Guardia, y se incorporó dicha determinación dentro de los ensayos de rutina realizados por el Laboratorio de Guardia.

Ensayos de Dispersión de Coagulante

Uno de los factores necesarios para que la dosificación del coagulante sea eficiente es que se realice una mezcla intensa en el punto de dosificación, de manera tal de que el coagulante reaccione con el agua cruda en cuestión de segundos. Esto se debe a que las reacciones químicas y fisicoquímicas que ocurren entre el coagulante y el agua cruda se llevan a cabo en un corto período de tiempo (alrededor de 30 segundos a 1 minuto, según distintas fuentes), lo cual está ampliamente estudiado y desarrollado[1].

Aprovechando la existencia de dispersores en el Sector A1 y A2, el ensayo consta en evaluar la neutralización de cargas en condiciones de planta constantes con dispersor y dosificando a pelo de agua, para indirectamente cuantificar un impacto en dosis. El ensayo se resume en el siguiente esquema.

[1] Para citar algunas de las fuentes más conocidas: American Water Works Association. (2010). Water Treatment Plant Design (4ta ed.). McGraw-Hill. / American Water Works Association. (2011). Water Quality and Treatment - A Handbook on Drinking Water (6ta ed.). McGraw-Hill. /, A., & Mills, K. M. (1982). Rapid-mix design for mechanisms of alum coagulation. AWWA Journal Amirtharajah, 74(4), 210-216 / Arboleda Valencia, J. (2000). Teoría y Práctica de la Purificación del Agua. CEPIS. / AWWA. (2010). Operational Control of Coagulation and Filtration Processes - Manual of Water Supply Practices - M37 (3era ed.). / de Vargas, L. (2006). Capítulo 2. Mezcladores. En CEPIS, Tratamiento de agua para consumo humano. Plantas de filtración rápida. Manual II: Diseño de plantas de tecnología apropiada (págs. 47-87)

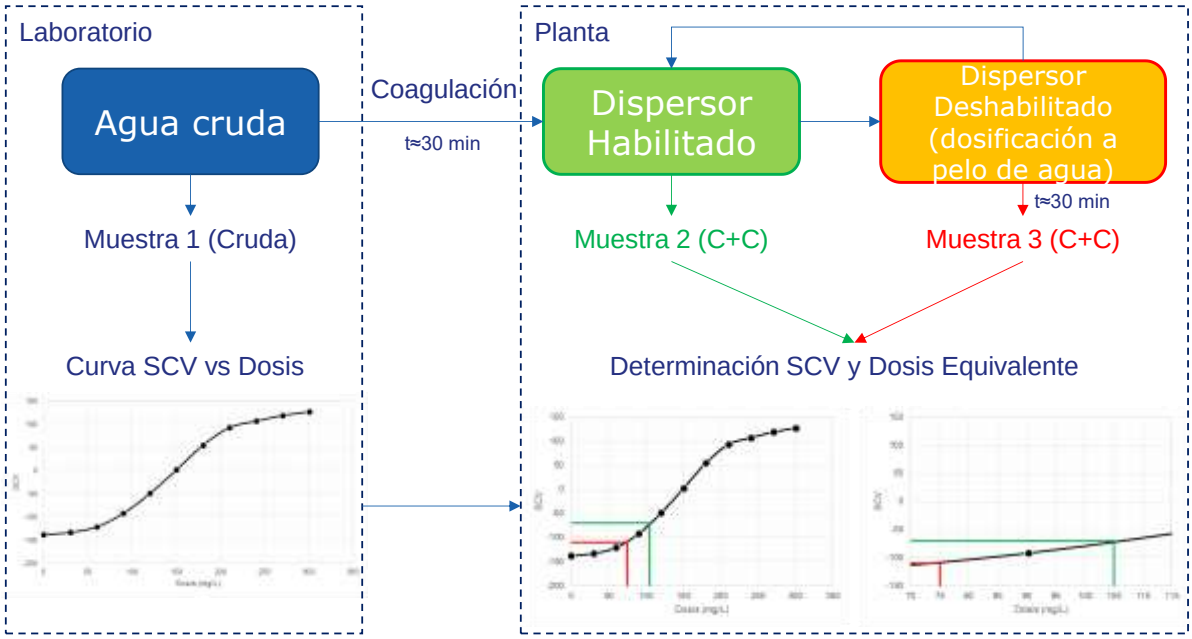


Figura 1. Esquema del diseño de ensayo para evaluar el efecto del dispersor en la dosificación de coagulante

El ensayo consta inicialmente en evaluar si las condiciones de agua cruda se mantienen estables. De ser así, se coordina con la División Producción para que no se modifique el caudal de agua cruda del sector a ensayar. También se mantienen constantes las dosis de coagulante y floculante. Luego, durante una ventana corta de tiempo (de aproximadamente 1 hora), se realiza el ensayo. De esta forma, se mantienen las condiciones de calidad de agua cruda, hidráulica y dosis constantes, evaluando únicamente el impacto de utilizar o no el dispersor.

Las pruebas se fueron realizando durante 2024 para evaluar distintas condiciones de agua y de planta en distintas épocas del año, resultando en diferencias de dosis equivalentes con y sin dispersor de entre 10 y 40 mg/L, validando el impacto positivo que logra la mezcla adecuada para que la coagulación se realice de manera eficiente. El desarrollo sobre esta temática se llevó a cabo en la Revisión por la Dirección de Agua 2024.

Durante 2025 se continuó con los ensayos, para evaluar el impacto de la obra de Dispersor de Cámara 6 (Sector B).

Cultivo de Algas y Daphnia magna

Se continúa con el proyecto en conjunto con personal de la Oficina Técnica de la Gerencia de Establecimientos, contemplando los siguientes temas.

Cultivador de algas

La División Mantenimiento construyó un armario acondicionado para poder cultivar distintos tipos de algas, ya sea para realizar ensayos con las especies presentes en el agua cruda, o para cultivar las algas que se utilizan para alimentar a la *Daphnia magna*. Este armario consta de 3 estantes, cada uno de ellos con luces LED para la fotosíntesis de los microorganismos, además de orificios para permitir el ingreso de la cañería para la aeración. El mismo fue realizado a medida según el diseño propuesto por la Oficina Técnica de la Gerencia de Establecimientos, y se ubica en lo que originalmente fue el primer Laboratorio de Guardia.



Figura 2. Cultivador de algas ubicado en LPSM (en la imagen se está utilizando el tercer estante para cultivo, con luz artificial y aeración).

Uno de los propósitos es cultivar algas, para poder correlacionar la densidad algal (determinada por recuento al microscopio) con las mediciones de concentración de pigmento que realiza por fluorometría el equipo continuo instalado en la caseta de muestreo de agua cruda. Avances sobre este tema permitieron obtener como primera aproximación regresiones a partir de los datos que se observan en el gráfico a continuación.

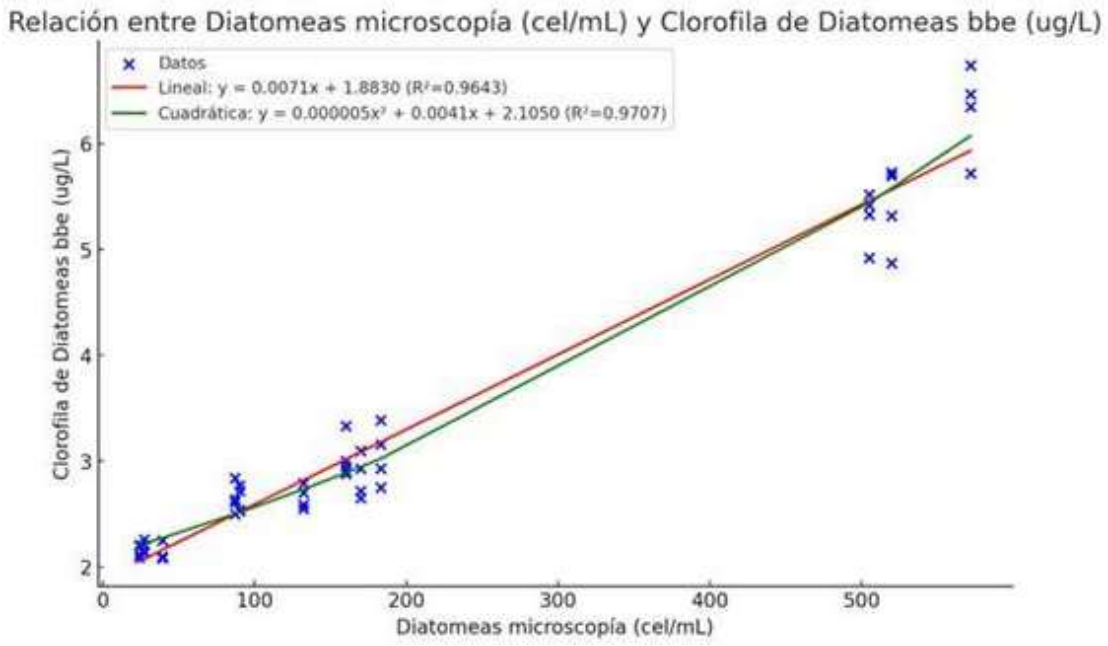


***Gráfico 1**. Ajuste entre recuento de microalgas procedentes de cultivo vs Clorofila de Diatomeas medidas con Fluorómetro*

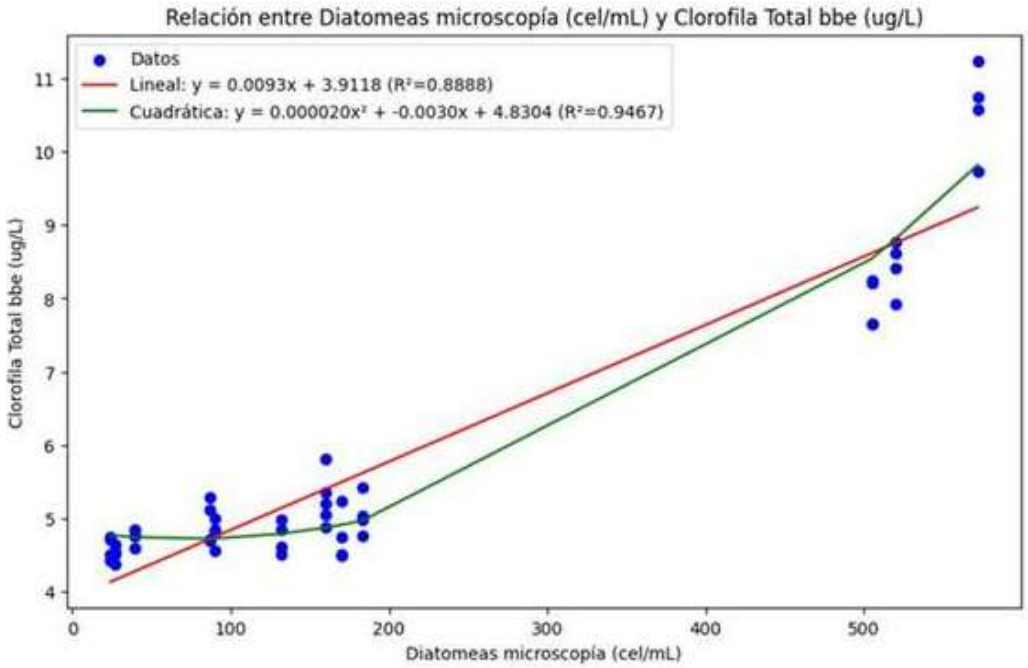


Gráfico 2. Ajuste entre recuento de microalgas procedentes de cultivo vs Clorofila total medida con Fluorómetro

El objetivo de estos estudios es llegar a correlacionar de manera satisfactoria la concentración de pigmento con la densidad algal de las especies presentes en la matriz de agua cruda que recibe PSM, para poder traducir la lectura continua de pigmento (µg/L) a densidad algal (células/mL), que es el parámetro a partir del cual se toman acciones operativas, detalladas en el procedimiento “E-PSM-CA-022 - Acciones ante Crecimientos Extraordinarios de Algas”.

Cultivo de *Daphnia magna* para realización de ensayos

Se está llevando a cabo la implementación de un estudio con *Daphnia magna*, en coordinación con personas del Oficina Técnica de la Gerencia de Establecimientos. Actualmente se está cultivando dicha especie, para luego evaluar posibles ensayos a realizar. Para el cultivo se requiere luz artificial, aeración y condiciones controladas de temperatura en un ambiente de poca perturbación, para evitar el estrés de los organismos. Con el objetivo de definir un espacio dedicado para este proyecto, se reacondicionó una campana de extracción que se encontraba sin funcionar ubicada en lo que originalmente fue el primer Laboratorio de Guardia.



Figura 3. Cultivos de Daphnia magna llevados a cabo en LPSM.

Otras Mejoras Operativas

- Mejora de diseño de los embudos de coagulante en las Cámaras 9 (Sector A2) y 10 (Sector A1). Se continúa trabajando en conjunto con Mantenimiento PSM para realizar mejoras en el diseño de los embudos de coagulante de ambos dispersores, para facilitar tareas de limpieza y cambio de líneas, entre otras cuestiones.
- Diseño de la pantalla de la Planta de Agua de Cal. Están pendientes modificaciones adicionales, y el diseño de la sección de Alcalinización en el sinóptico de Calidad (cuando se finalice la otra pantalla), para que el Químico/a de Guardia pueda controlar la dosificación desde la pantalla principal que utiliza el Laboratorio.

2.2 Gestión de Laboratorio Planta Manuel Belgrano

2.2.1 Estudios Especiales

Calidad de agua

Generalidades

La calidad del agua del Río de La Plata ingresada a PMB presentó propiedades similares a las de 2024, caracterizándose por turbiedades y alcalinidades medias a bajas durante todo el año, a excepción de los meses de abril y mayo que se registró un aumento de la turbiedad. Hacia el mes de junio, se produjo un incremento de materia orgánica, alcanzándose el mayor valor mensual de UV 254 desde el cambio de membrana. En cuanto al amonio, se mantuvo un nivel estable durante todo el año, con picos bien marcados en los meses de mayo y septiembre.

En lo que respecta a cianobacterias y algas obturadoras de filtros, se registraron recuentos moderados a bajos de la especie Aulacoseira sp. Entre septiembre y diciembre, y de Microcystis sp. en niveles bajos hacia los últimos días de diciembre.

Por último, se registró un evento de olor en agua cruda, el día 25 de marzo. La caracterización de las muestras extraídas dio como resultado olor a aceituna, asociado al compuesto químico Diciclopentadieno (DCPD).

Desvíos de PCC y PPRO

En el transcurso del año existieron cuatro desvíos en el PCC-AGU-SUP-006, todos ellos ocasionados por concentraciones altas de amonio. El evento de amonio de mayor relevancia fue el del día 18 de mayo.

Respecto de los desvíos en los PPRO, se destaca el desvío en el PPRO-AGU-SUP-005 por olor en agua cruda el día 25 de marzo.

Evento de amonio del 18 de mayo

Desde el día 17 por la tarde, comenzaron a registrarse valores elevados de amonio en agua cruda. Durante las primeras horas del evento se pudieron sostener los niveles de cloro en salidas, con cloración a tope de capacidad más agregado de hipoclorito de sodio. Pero a la madrugada, el tanque de hipoclorito para dosificación en zona Norte quedó vacío, no pudiendo sostenerse los valores de cloro en Río Subterráneo. En Bernal IV fue solo un breve lapso de tiempo, en el que se llegó a un mínimo de 0,56 mg/l.

HORA	NH_4^+ AGUA CRUDA	HORA	NH_4^+ AGUA CRUDA
19:00	3,44	**06:00**	2,35
20:00	3,21	**07:00**	2,28
21:00	3,14	**08:00**	2,48
22:00	2,48	**09:00**	2,60
23:00	2,95	**10:00**	2,00
00:00	2,29	**11:00**	1,49
01:00	2,41	**12:00**	1,00
02:00	2,55	**13:00**	0,79
03:00	2,36	**15:00**	0,87
04:00	2,39	**17:00**	0,95
05:00	2,30	**19:00**	0,97

Tabla 1 – Valores de amonio en agua cruda. Evento del 18 de mayo de 2025

Por último, debe mencionarse que el ajuste de la dosis de cloro fue efectuado en forma correcta. El faltante de hipoclorito en la zona Norte se trató de un factor externo determinante. En cuanto a las reposiciones del producto, se había efectuado una entrega por la noche del día 17, y se programó otra para el 18 a primera hora. La alta demanda de cloro provocó que no pudiera sostenerse el stock durante la madrugada, hasta la llegada de la entrega de la mañana. El total recibido en las entregas fue de 51,33 toneladas de acuerdo a lo reportado por la báscula de PMB, repartidas a Norte y Sur.

Se extrajeron cuatro muestras bacteriológicas adicionales. Todas arrojaron conformidad.

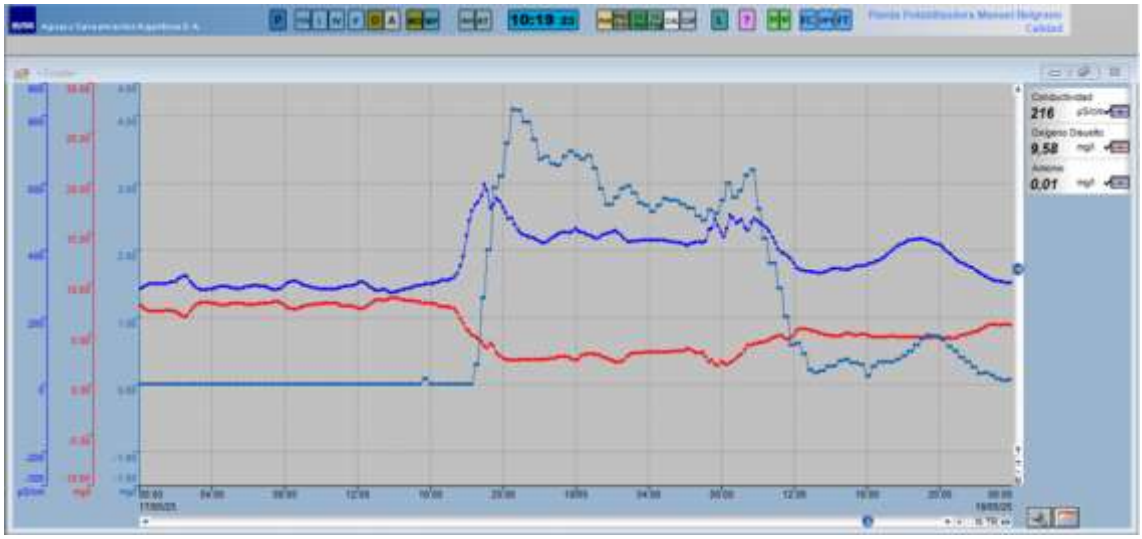


Gráfico 1 – Calidad de agua cruda entre el 17 y el 19 de mayo

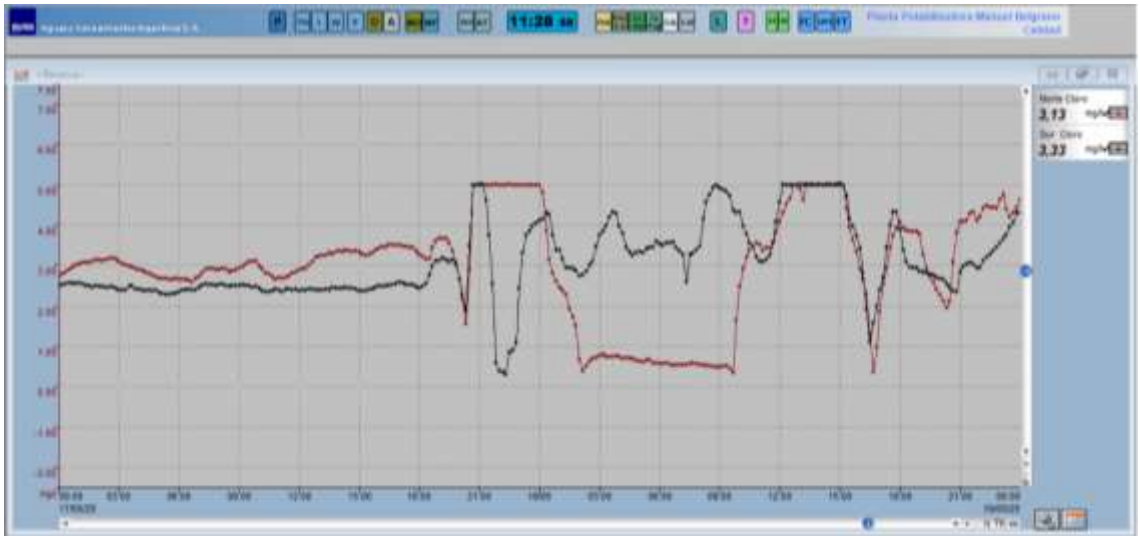


Gráfico 2 – Concentración de cloro activo en reservas

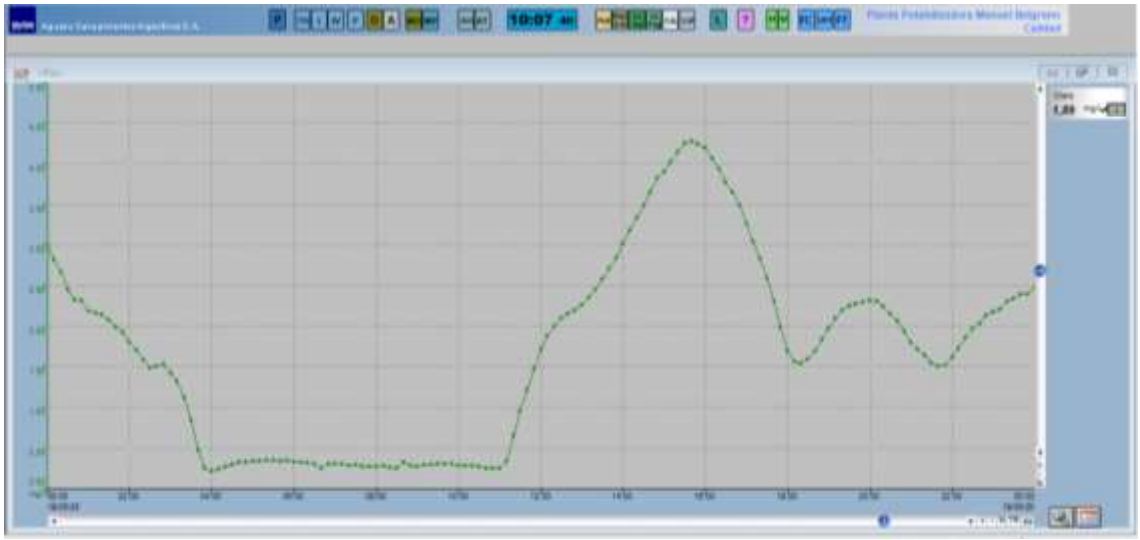


Gráfico 3 – Concentración de cloro activo en Río Subterráneo

Desvío del PPRO-AGU-SUP-005 del 25 de marzo

Durante la rutina diaria en el Laboratorio de Planta, el operador comenzó a percibir olor en el gabinete de ingreso de agua cruda. Al realizar la determinación, se pudo caracterizar como olor a aceituna, asociado al componente químico Diciclopentadieno (DCPD). El olor permaneció en agua cruda entre las 12:00 y las 12:40 aproximadamente.

Desde el LPMB se realizó lo habitual para estos casos: se coordinó con el Laboratorio Central la activación del Estudio Especial 387. Se extrajo una muestra de agua cruda a las 12:30 y una muestra de Río Subterráneo a las 16:00. Dada la escasa permanencia del olor en el agua cruda, no se extrajeron más muestras.

La caracterización de la muestra de Río Subterráneo dio como resultado “objetable” con “sabor leve a aceituna”.

Por último, debe mencionarse que se desconocen las causas de la aparición de esta condición.

Turbiedad

La turbiedad del agua cruda mantuvo la tendencia de los años anteriores, con un incremento en los meses de abril y mayo, y valores medios el resto del año. Durante el año 2025 no se registraron eventos de alta turbiedad, por el contrario el parámetro permaneció fundamentalmente en valores medios a bajos con un promedio anual de 77 NTU.

En el Gráfico 4 se muestran los promedios mensuales de 2025 comparado con los cuatro años anteriores.

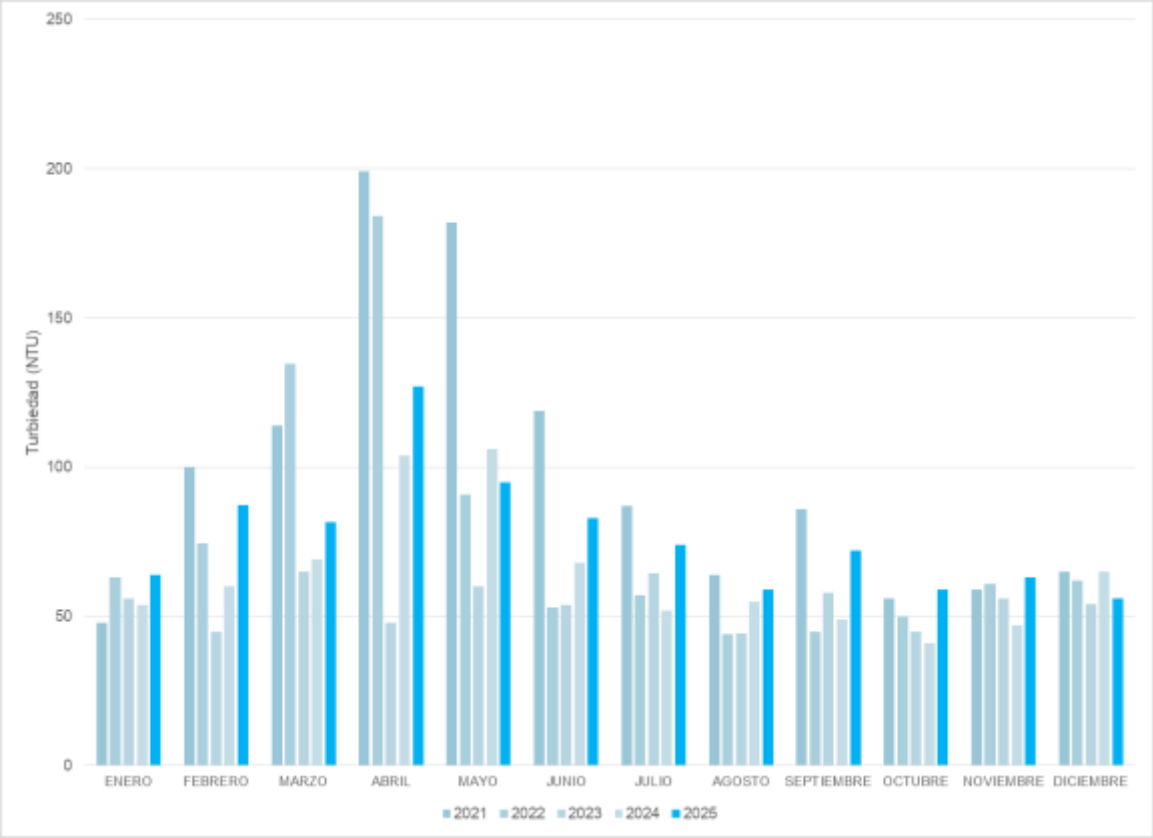


Gráfico 4 – Promedio mensual de turbiedad en agua cruda 2021-2025

Materia orgánica

La carga orgánica del agua cruda en el 2025 presentó un marcado incremento en el mes de junio, siendo el valor medio mensual más elevado desde el cambio de membranas en 2019. Esta condición fue determinante para el bajo cumplimiento de los objetivos de turbiedades.

En el gráfico 5 se muestra la comparación de la medición de UV con los cuatro años anteriores.

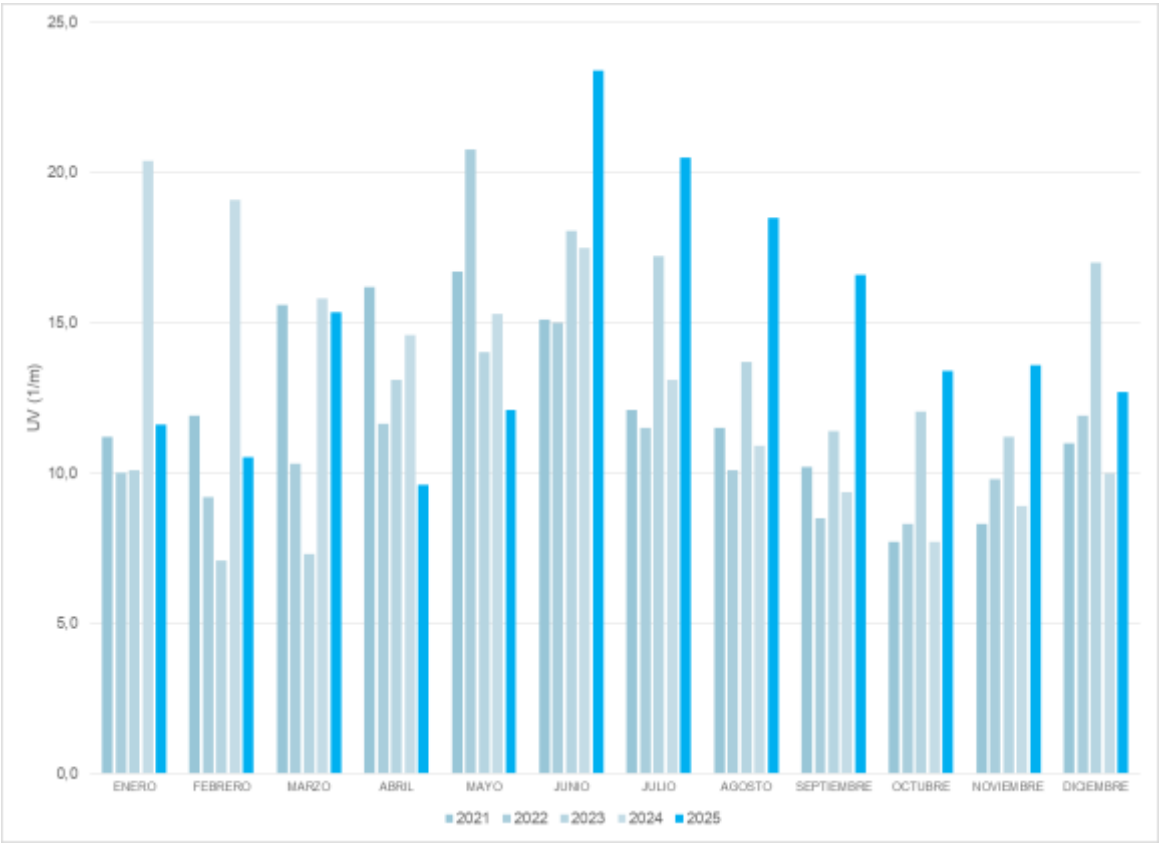


Gráfico 5 – Evolución de la medición de UV para el período 2021-2025

Red neuronal para predicción de dosis

Durante 2025 se continuó con la utilización del desarrollo comenzado en 2019 por el área de Instrumentación de la División Mantenimiento, de la aplicación de una red de inteligencia artificial para predicción de las dosis del ensayo de coagulación (Jar Test). Esta herramienta le permite al operador, mediante la sola carga de los parámetros de calidad de agua cruda, obtener una curva ficticia de remoción de turbiedad y una “dosis óptima” de coagulante. Resulta especialmente práctica para momentos de cambios bruscos en la calidad de agua cruda, donde se debe tomar una decisión de modificar dosis en forma rápida y no se cuenta con tiempo para realizar el ensayo real.

La metodología actual consiste en una simulación acompañando a cada Jar Test de rutina del Laboratorio de Guardia (a las 7, 15 y 23 hs), reuniendo así tres datos diarios de predicción de dosis. Cada dos meses, la red se vuelve a entrenar, con el objetivo de actualizar la base de datos de entrada y continuar ajustando el error.

En el Gráfico 6 se muestran las dosis medias de planta, de JT y de la red neuronal, para el año 2025.

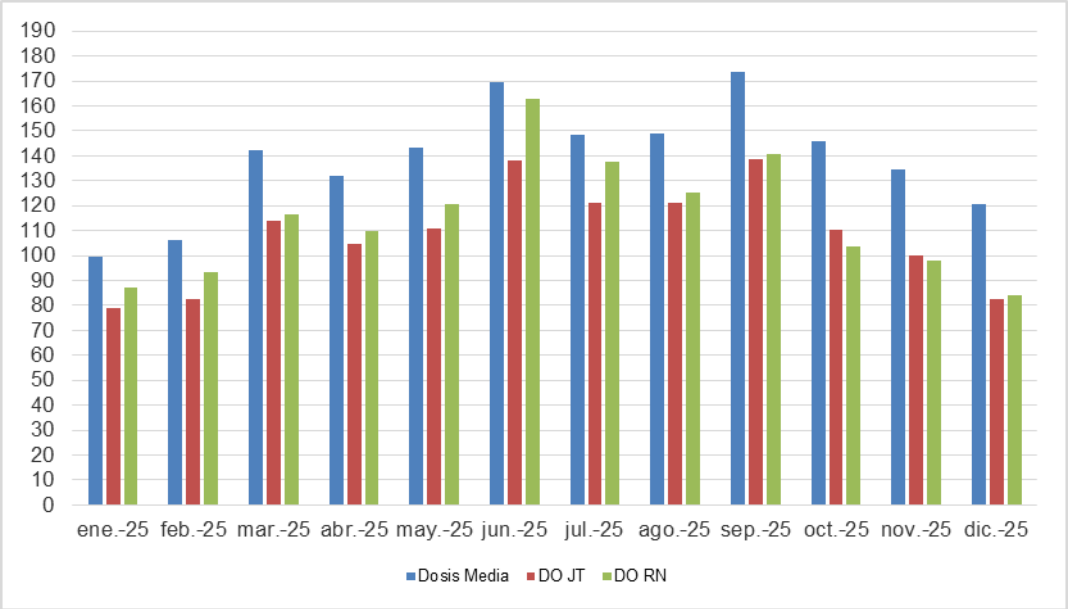


Gráfico 6 – Dosis medías de planta, óptima de Jar Test y óptima de red neuronal, promedio mensual

En 2025 se comenzó con un desarrollo de otra red neuronal, en este caso para la dosificación de coagulante a la zona Sur. Para su entrenamiento se utilizaron datos empíricos históricos desde 2021 hasta la actualidad y fueron seleccionados aquellos cuyos resultados cumplían el objetivo de turbiedad de la Dirección de Agua. De esta forma la red simula intrínsecamente la hidráulica real de la Planta y entrega una dosis para lograr el rango de turbiedad especificado.

Esta red busca llevar la calidad del agua decantada y filtrada al límite de operación, persiguiendo el ahorro económico en coagulante. Por otra parte, ofrece al operador de turno una herramienta que le permite anticiparse a los efectos de un cambio en la calidad del agua cruda.

La red fue utilizada durante los meses de agosto y noviembre. Se analizó la eficacia de la misma considerando:

- Corrida eficaz: la dosis obtenida fue aplicada en Planta Sur y la turbiedad en agua decantada 2 horas más tarde se mantuvo entre 4 y 6 NTU
- Corrida no eficaz: la dosis obtenida fue aplicada en Planta Sur y la turbiedad en agua decantada 2 horas no cumplió las con las consignas de operación
- Corrida incierta: la red no pudo ser aplicada por motivos externos

Cantidad de corridas totales	314
Cantidad de corridas eficaces	159
Cantidad de corridas inciertas	85
Cantidad de corridas no eficaces (tb>6NTU)	51
Cantidad de corridas no eficaces (tb<4NTU)	19
Cantidad de corridas no eficaces totales	70

Eficacia	**69%**

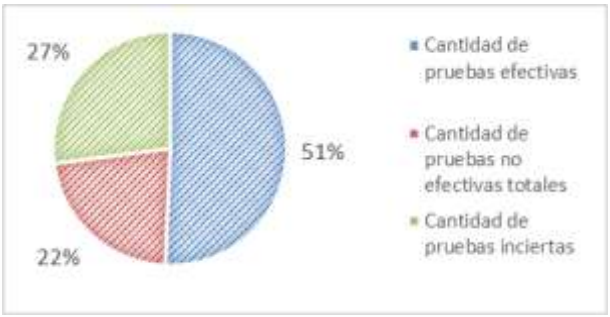


Tabla 2 – Gráfico 7 – Resultados de la aplicación de la red neuronal en zona Sur

Durante el período de uso se observó un alto nivel de eficacia (alrededor del 70%), no solo en los cambios de dosis solicitados por la red sino también en los resultados obtenidos en agua decantada. Si bien, se evidencian ciertos desvíos en momentos específicos, estos poseen causas atribuibles y se espera que los mismos sean minimizados en el tiempo a medida que la red neuronal vaya retroalimentándose de información.

Esta nueva herramienta, de uso rutinario al día de hoy, posee un gran potencial de desarrollo con grandes beneficios. El objetivo a futuro es el control automático de la dosificación de coagulante mediante un lazo de control cerrado.

2.2.2 Equipamiento

En el año 2025 se recibieron los siguientes bienes:

Equipo - Marca - Modelo	Activo Máximo	N° de Serie	Fecha de ingreso
Multiparamétrico Hach HQ4300	48323	252544300073	15/11/2025
Multiparamétrico Hach HQ4300	48324	252544300074	15/11/2025
Baño ultrasónico Faithful FSF 020S	48479	20230701-03	16/12/2025
Baño ultrasónico Faithful FSF 020S	48480	20220613-03	16/12/2025
Juego de pesas patrón Dolz Clase F1	-	AB9237	29/12/2025
Estufa de secado ORL-SE D75K	-	D75K	29/12/2025

Tabla 3 – Ingreso de activos Laboratorio de PMB en 2025

2.2.3 Mejoras

Objetivos

Con respecto a los objetivos de calidad de PMB, los principales problemas se dieron para alcanzar los de turbiedad de agua, tanto decantada como de consumo. Ambos estuvieron lejos de cumplirse. Tampoco fue alcanzado el objetivo anual de pH.

Turbiedad

La principal causa atribuible a los desvíos de turbiedad fue la baja remoción de los filtros de zona norte. Casi un 80% de los desvíos obedecen a este problema. El resto tiene que ver con causas asociadas a cal (arrastre de lechada de cal, saturador con alta turbiedad o alta densidad de la lechada), errores de ajuste de dosis y otras causas puntuales.

Se denota una desmejora significativa, al igual que en 2024, en los meses de baja temperatura (mayo-agosto), asociada al brusco incremento en la carga de materia orgánica del agua cruda.



Gráfico 8 – Cumplimiento del objetivo de turbiedad de salida en %

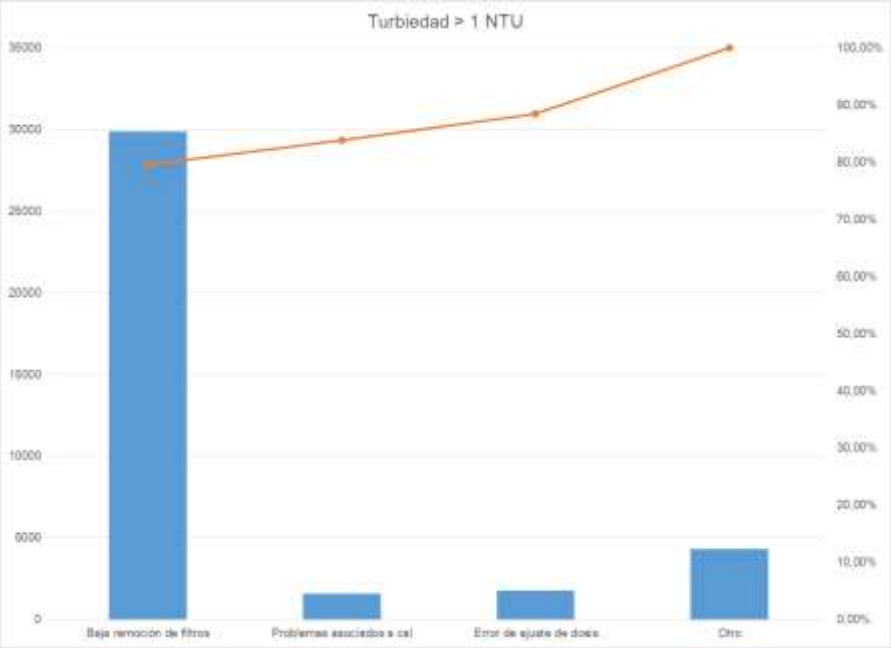


Gráfico 9 – Diagrama de Pareto de los desvíos de turbiedad

pH

Los mayores desvíos de pH se debieron a ajustes tardíos en la dosificación de cal y a una capacidad de alcalización insuficiente en condiciones de altas dosis de cloro aplicadas durante ingreso de amonio en el agua cruda. En referencia a este indicador, en el mes de mayo se vieron los mayores inconvenientes, justamente por la elevada concentración de amonio presente en cruda.

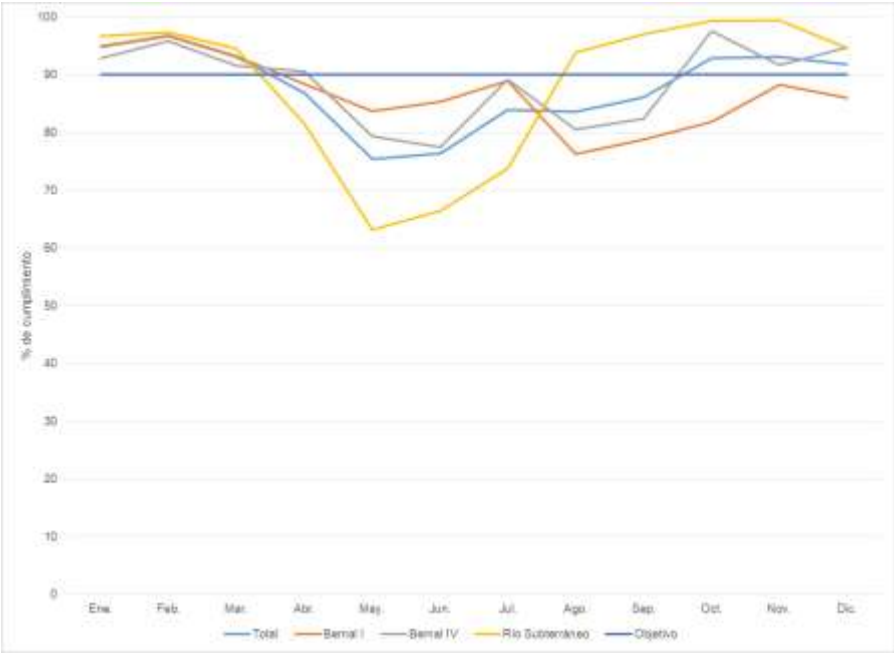


Gráfico 10 – Cumplimiento del objetivo de pH de salida en %

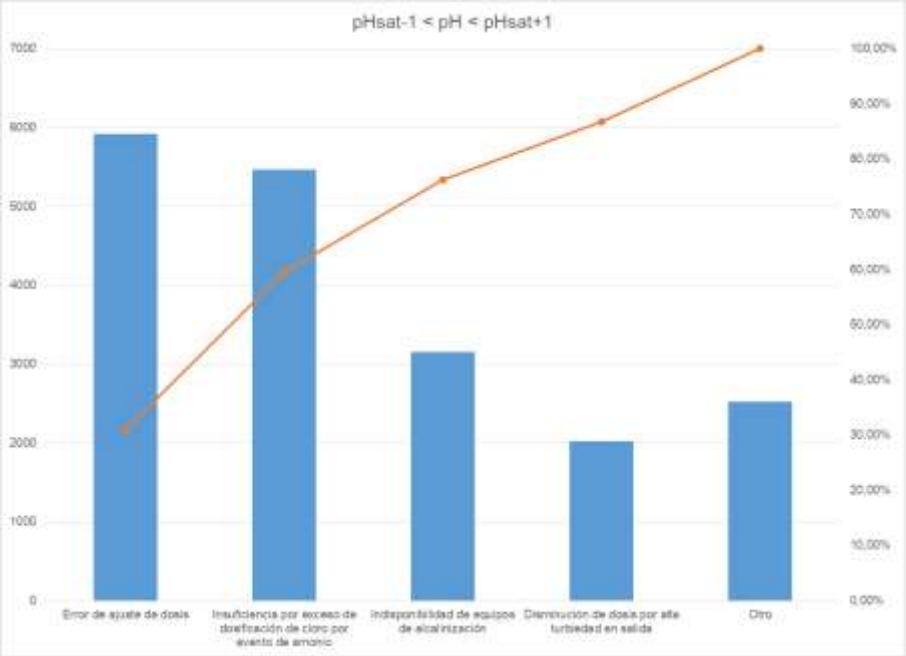


Gráfico 11 – Diagrama de Pareto de los desvíos de pH

Cloro activo

El incumplimiento del límite mínimo de cloro activo tiene dos picos bien definidos, en los meses de mayo y septiembre. Esto es coincidente con la carga de amonio de agua cruda, cuyos valores medios mensuales en esos dos meses mencionados fueron los más elevados de 2025.

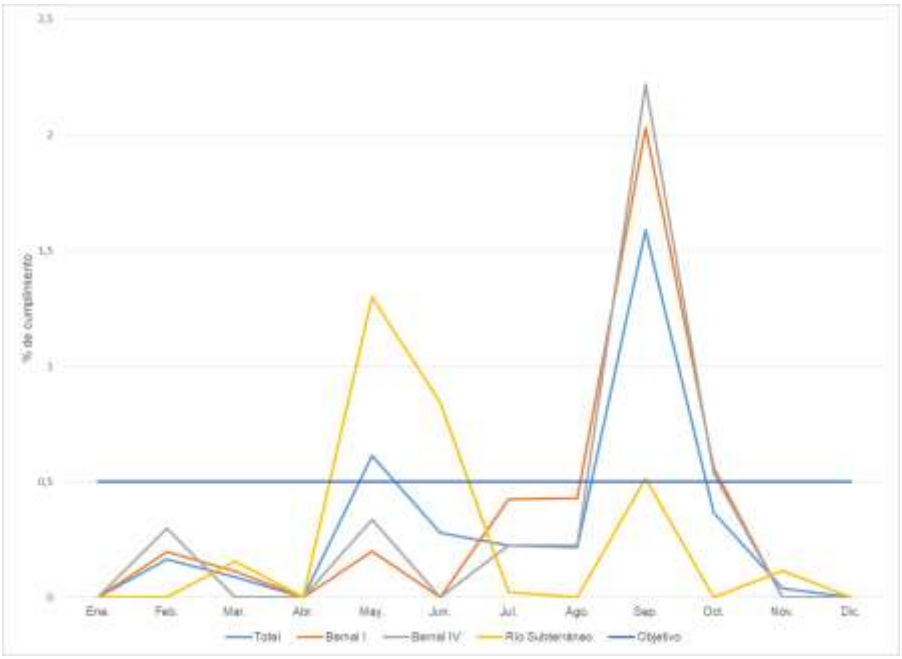


Gráfico 12 – Cumplimiento del objetivo de cloro de salida en %

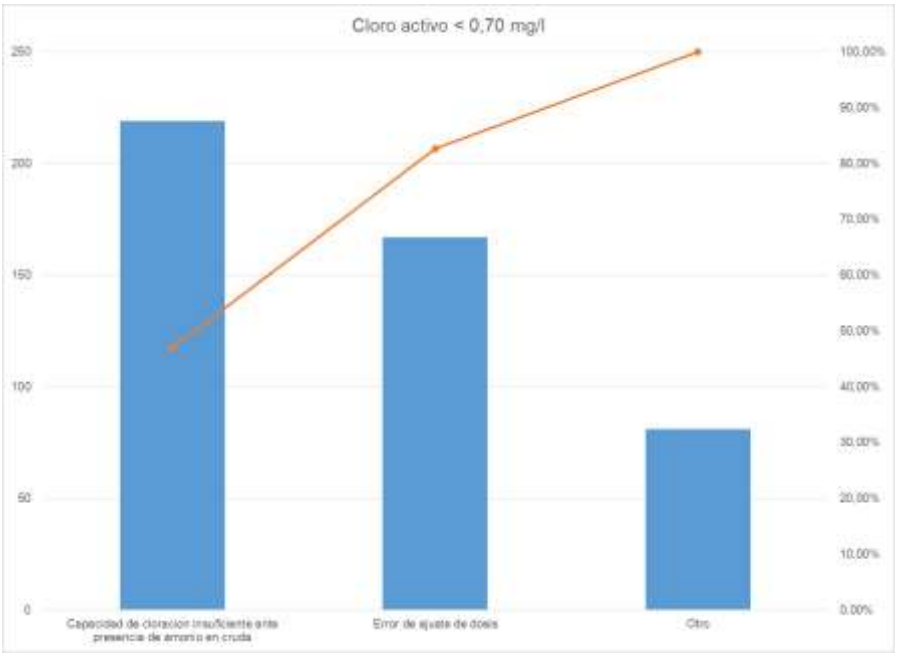


Gráfico 13 – Diagrama de Pareto de los desvíos de cloro activo

Turbiedad de agua decantada

El objetivo se mantuvo lejos de la meta dada la baja retención en los filtros de zona norte, pues era necesario lograr turbiedades bajas en agua decantada para el cumplimiento de marco regulatorio en el parámetro de turbiedad de salida a consumo. Un 58% de los desvíos tienen que ver con esta causa, mientras que un 31% se vincula a dosificación imprecisa de coagulante.

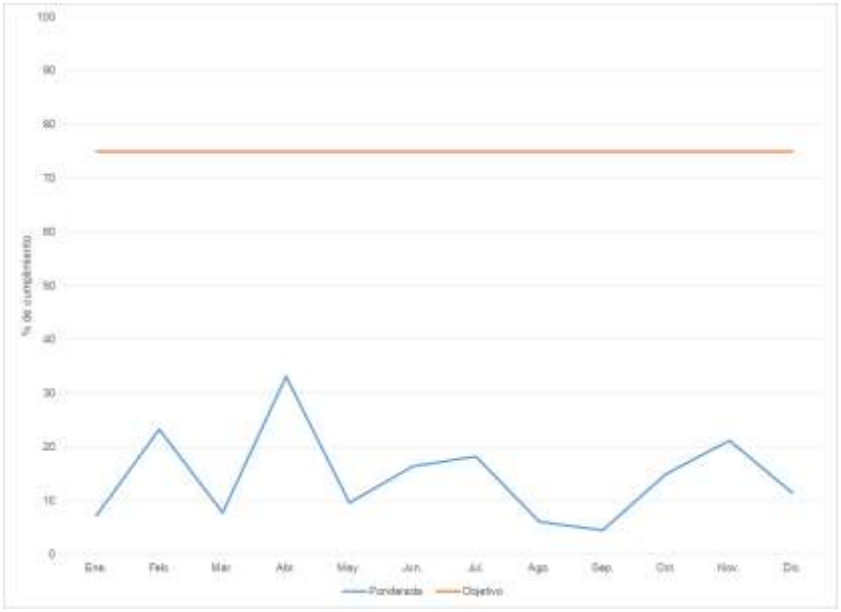


Gráfico 14 – Cumplimiento del objetivo de turbiedad ponderada de agua decantada en %

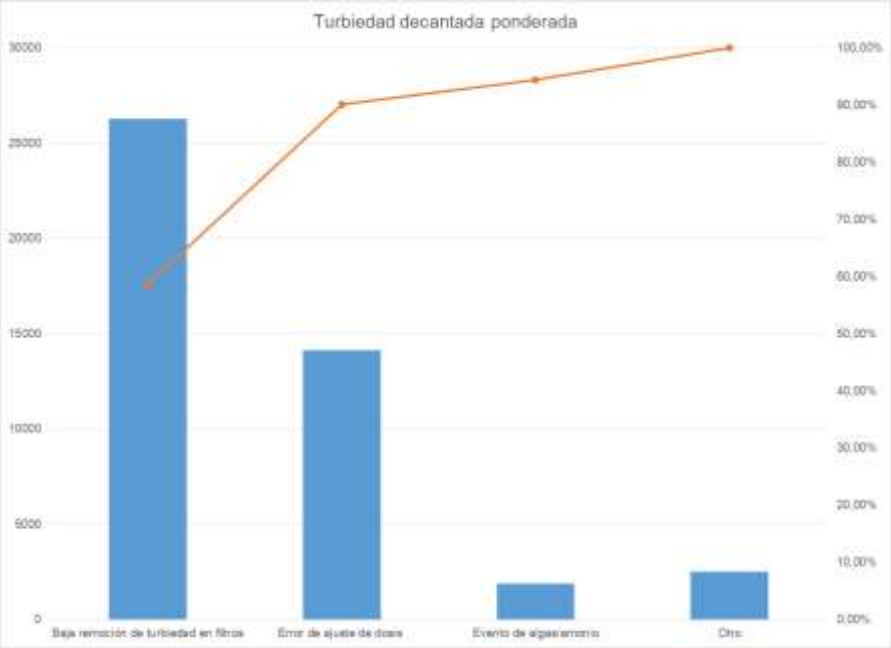


Gráfico 15 – Diagrama de Pareto de los desvíos de turbiedad de agua decantada

2.3 Gestión de Laboratorio Planta Juan Manuel de Rosas

A continuación, se describen los principales avances alcanzados durante el año 2025 en el Sector Calidad de la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas, integrado por el Laboratorio de Insumos Químicos (LIQ), el Laboratorio de Optimización de Procesos (LOP) y el Laboratorio de Guardia (LG).


2.3.1 Estudios Especiales

A continuación, se listan los estudios especiales realizados:

- Estudio especial Drenajes de PJMR (purga de decantadores y 704, control interno de Aluminio, Hierro y Manganeso): Se realizó durante todo el año con periodicidad semanal, enviando las muestras al LC para su posterior análisis.

- Estudio especial n° 182 (parásitos y fagos): Se realizó durante todo el año con periodicidad trimestral, enviando las muestras al LC para su posterior análisis.

- Estudio especial n° 285 (algas): Durante todo el año se realizaron muestreos puntuales que fueron remitidos al Laboratorio Central (LC) para seguimiento del fitoplancton presente en el agua cruda ingresada a proceso. Paralelamente se llevaron recuentos en planta dado que contamos con equipamiento y personal capacitado. Se adjunta lo relevado en PJMR durante 2025 en el agua ingresada a proceso.

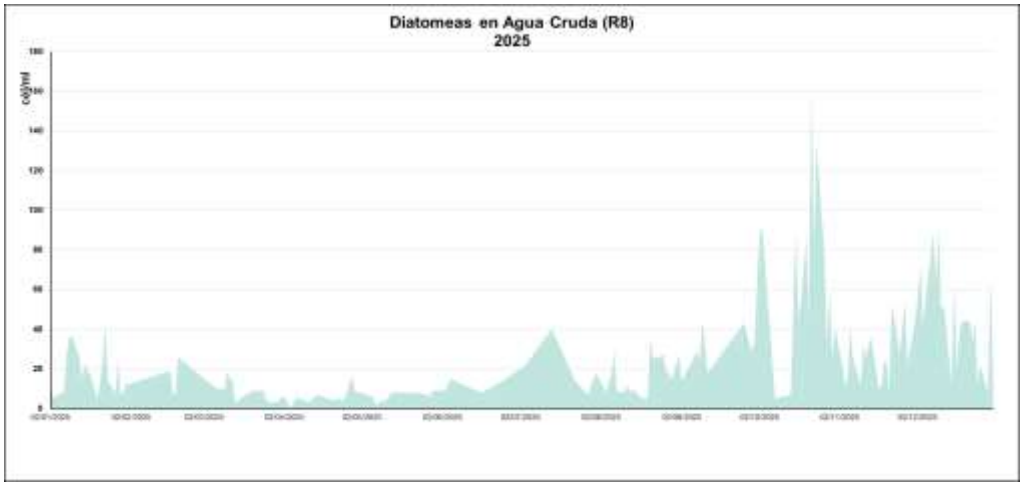

- Estudio especial n° 327 (remoción bacteriológica): Se realizó durante todo el año con periodicidad mensual, enviando las muestras al LC para su posterior análisis.

2.3.2 Equipamiento

Durante el transcurso del año se recibieron los siguientes equipos, los cuales permitirán optimizar los trabajos del sector:

- 4 (cuatro) sondas de pH marca HACH modelo Intellical™ PHC301
- 1 (una) sonda de oxígeno disuelto marca HACH modelo Intellical™ LDO10105
- 1 (una) sonda de oxígeno disuelto marca HACH modelo Intellical™ LDO10101
- 1 (una) sonda de conductividad marca HACH modelo CDC40101

Implementación de nuevos ensayos

A raíz del estudio presentado en la Revisión por la Dirección 2024 “CHITOSAN ® vs PAC - Análisis comparativo de coagulantes en PJMR”, donde se detectó la falta de datos de calidad de agua y el efecto del vuelco de drenajes de planta, durante este año 2025 se inició el relevamiento de la calidad de agua del Río Luján en diferentes puntos de muestreo donde, con fuerza propia, se monitorearon los siguientes parámetros:

- Oxígeno disuelto
- Conductividad
- pH
- Turbiedad
- Aluminio
- Temperatura

El estudio busca mantener el monitoreo para conocer el impacto de los efluentes de planta en el mencionado cuerpo de agua. Se planifica continuarlo durante los próximos años para lograr un perfil de parámetros que cuente con un significativo volumen de datos y evidencie el comportamiento del cuerpo de agua.



2.3.3 Mejoras

- Limpieza de la cuba de la Torre Neutralizadora A: el martes 7 de enero se realizó por primera vez la limpieza de la torre neutralizadora para remover incrustaciones de carbonatos en los anillos Pall. La operación se efectuó mediante el agregado de una solución de ácido clorhídrico, seguida de dos lavados con agua. El efluente generado fue dispuesto en el drenaje industrial de la Planta. Finalizado el proceso, se cargó una nueva solución de hidróxido de sodio y se efectuaron los controles de calidad correspondientes. La torre quedó nuevamente operativa, con el operativo liderado por la Supervisión de LIQ y apoyo de asistencia operativa, mantenimiento y seguridad e higiene.




- Puesta a punto de la planta de tratamiento de efluentes: El día 11 de enero se realizó una limpieza profunda de la planta cloacal 703 a cargo de personal del LIQ. También, se está trabajando para reparar el sistema de dosificación de cloro de la misma.



- Durante el año 2025 se llevó a cabo un seguimiento de la altura de lodos en los decantadores de planta. El objetivo fue definir los límites de altura y la duración operativa de los mismos (en días). Se estableció un valor de alerta de 3,50 metros, el cual, considerando la calidad del agua en los meses de seguimiento, correspondía a un período operativo de entre 30 y 35 días antes de alcanzar dicho valor, para ciertas condiciones de turbiedad del agua cruda. Adicionalmente, en colaboración con el sector de Producción, se evaluó la posibilidad de extender los días de operación mediante la extracción de lodos con una bomba sumergible, transfiriendo los lodos de los decantadores operativos hacia las tolvas de aquellos en desuso. Esta prueba se inició el 23 de Septiembre con el decantador 2, continuó en el decantador 3 y, posteriormente, en el decantador 6. Este último demostró el mejor desempeño en términos de sitios de extracción, días de extracción y seguimiento. Mediante esta prueba, se logró duplicar la cantidad de días operativos, alcanzando un promedio de 65 días. Esto evidencia que, ante una eventual problemática con los barredores de fondos, se puede contar con un margen de uso de dos meses adicionales gracias a la metodología empleada.

Se adjuntan gráficos que evidencian el desempeño en el decantador 6.

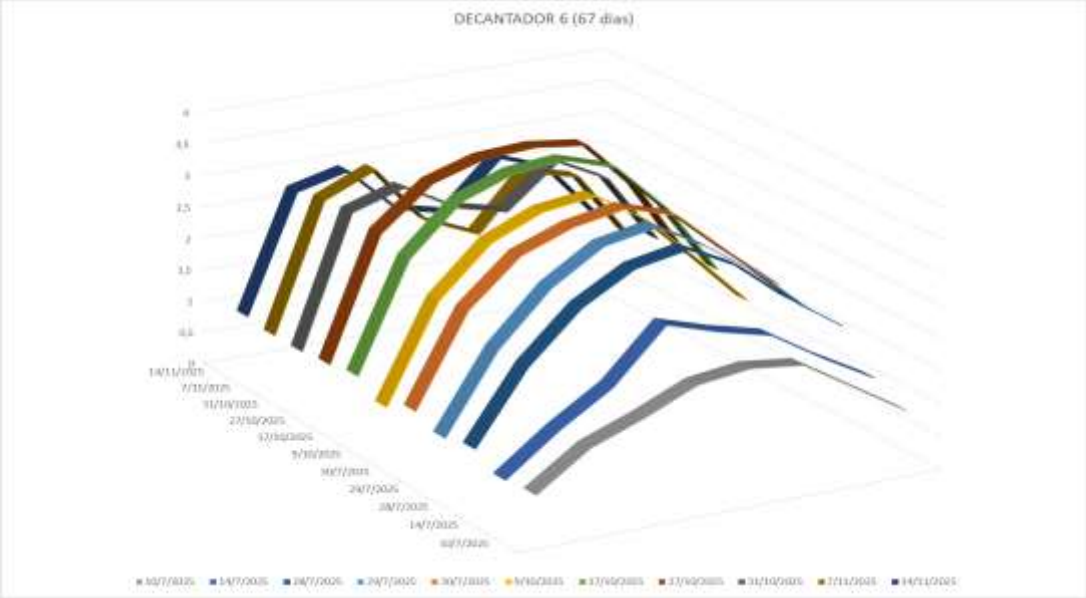

2.4 Control de Procesos

2.4.1 Estudios Especiales

Evaluación de mezcla de coagulantes

Se llevaron a cabo ensayos de laboratorio para evaluar el comportamiento de mezclas de los coagulantes PAC y cloruro férrico, como un pretratamiento a ser usado en forma estacional al proceso convencional, aplicado en las plantas potabilizadoras superficiales, teniendo en cuenta la variación del agua cruda.

Los primeros resultados indicaron una mayor remoción de materia orgánica en el agua decantada de los ensayos de jarras utilizando cloruro férrico y PAC frente al PAC únicamente, a una misma dosis global.

A su vez, se hicieron estudios intercambiando el orden de dosificación de los productos, inicialmente PAC y luego cloruro férrico, evidenciándose una mayor remoción de turbiedad manteniendo las condiciones de mezcla y tiempos.

Degradación de calidad de hipoclorito de sodio en stock.

Las estaciones elevadoras cuentan con tanques de almacenamiento de hipoclorito de sodio, y se dosifica según necesidad al río subterráneo. Si bien se controla el insumo al momento de su recepción, durante su almacenamiento puede degradarse. La temperatura, la luz, el pH y la presencia de impurezas afectan significativamente la estabilidad de las soluciones.

Luego de un muestreo realizado de todos los tanques en servicio, se realizaron modificaciones operativas para disminuir la degradación del producto. Seguidamente se planificó otro muestreo de tanques previamente seleccionados con la finalidad de tener datos representativos en el tiempo.

Con los resultados del estudio y su posterior análisis, se estima una velocidad de degradación del hipoclorito de sodio y se calcula la concentración de cloro activo mínimo que debe tener cada sala, teniendo en cuenta los caudales de cada sector, capacidad de bomba dosificadora instalada y dosis necesarias. Estos cálculos indican que las estaciones elevadoras de mayor caudal precisan un recambio de hipoclorito más frecuente para mantener una alta concentración de cloro activo y complementar la desinfección.

De esta manera, se realizan propuestas al sector operativo para unificar criterios de frecuencia de reposición de insumo por tanque.

Análisis de la estabilidad del hipoclorito de sodio.

Con la detección de valores de clorato de sodio fuera de especificación técnica del insumo hipoclorito de sodio en solución, se observa que esta condición se repite en forma estacional en época estival. Esto se atribuye principalmente a la inestabilidad del producto a medida que aumenta la temperatura.

La detección impulsó la realización de ensayos interlaboratorio, para confirmar los datos obtenidos y así poder buscar las posibles causas del desvío. Se evidenciaron diferencias metodológicas, y además, se estudió la concentración a diferentes tiempos de almacenamiento, condiciones de luz y temperatura controladas.

Por otro lado, se tiene en cuenta la incorporación de cloratos en el agua de red, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija un valor máximo de referencia. Indica que esta concentración es asignada como orientativa, ya que el uso de hipoclorito puede dar a que se exceda este valor y se establece que nunca debe ser una razón para comprometer una desinfección apropiada.

Teniendo en cuenta los resultados de análisis de laboratorio, condiciones de dosificación y resultados históricos, se trabaja en la revisión del límite de cloratos máximo de la especificación técnica.

Se busca un valor que se adapte a las condiciones de las metodologías empleadas y que tenga en cuenta la estacionalidad. A su vez, se verifica el cumplimiento de las guías de la OMS en el agua potable si se dosificara el insumo con estas concentraciones para desinfección.

Estudio de tenor de cloro en pozos y puntos de red con comportamientos anómalos

Para hacer un control del proceso de desinfección del agua de pozo, se realizan mediciones periódicas en puntos seleccionados en la red de distribución analizando cloro residual libre (CRL).

Ante aumentos de reclamos por cloro, se plantea la disminución de los niveles de CRL en las consignas operativas, teniendo en cuenta la aparición histórica de anomalías bacteriológicas por zona.

Durante el estudio con datos relevados de las mediciones de cloro en boca de pozo y puntos de red, se identificaron zonas con comportamientos anómalos: los valores en el punto de control no acompañan las mediciones realizadas en el pozo.

Los casos en los cuales hay aparición de CRL bajo en los puntos de control y altos valores en pozo, se toman como críticos. Esto expone la necesidad de analizar causas de esta disparidad y evaluar la representatividad de los puntos en red.

3 Dirección de Saneamiento

3.1 Gestión de Laboratorio de Planta Norte

3.1.1 Consideraciones generales

El Sector de Laboratorio de Planta Depuradora Norte está situado dentro de la misma perteneciente a la empresa AySA S.A sita en calle Pasteur 5030, San Fernando.

Cuenta con perfiles de muestreos y ensayos de acuerdo a las necesidades del proceso y jefatura de planta, como así también una metodología para la entrega de los informes del servicio brindado.

Mensualmente, se extraen un total aproximado de 1600 muestras entre puntuales y compuestas de las cuales resultan 1800 análisis.

3.1.2 Equipamiento

En la actualidad el laboratorio cuenta con el equipamiento necesario para realizar los análisis diarios y así poder cumplir con la rutina de ensayos y muestreo.

Se proyecta incorporar durante el periodo 2026, los siguientes equipos de urgencia

Las determinaciones que se realizan en forma rutinaria en el Laboratorio son las siguientes:

- Materia en suspensión.
- Sólidos volátiles y fijos.
- Demanda biológica de oxigeno
- Demanda química de oxigeno.
- Sólidos sedimentables a los 10', 30', y 2hs
- Turbiedad
- Mediciones puntuales de:
    1. Temperatura
    2. pH
    3. Potencial REDOX
- Oxígeno Consumido
- TAC
- AGV
- Determinación de residuos total (corriente de lodos)
- Determinación de materia orgánica e Inorgánica (corriente de Lodos)
- Determinaciones de materias secas de biosólidos (corriente de lodos)
- Índice volumétrico de lodos (lodos biológicos)
- Nivel de altura de barro.
- Monitoreo microscópico de actividad biológica y caracterización de bioindicadores.
- Nivel de estabilización de Barros
- Fosfato
- Amonio

Para realizar dichas determinaciones se cuenta con el siguiente equipamiento:

- Balanza analítica
- Termobalanza
- Turbidímetro de mesada
- Espectrofotómetro.
- Termorreactor
- Mufla
- Estufa de secado.
- pHmetro Multiparamétrico
- Oxímetro de mesada
- Juez de lodos
- Oxímetro de campo
- Incubadora

- Centrífuga de mesada
- Manta calefactora, entre otros.
- Microscopio óptico.
- Micro pipetas

3.2 Gestión de Laboratorio de Planta Sudoeste

3.2.1 Consideraciones generales

El laboratorio de planta depuradora Sudoeste sigue un plan de muestreo que abarca tanto el líquido afluente y efluente, así como también distintos puntos intermedios del proceso de ambos módulos. A su vez, se realiza el muestreo de los lodos primarios y biológicos que se impulsan a la planta de tratamiento de barros, los puntos intermedios del proceso, el barro deshidratado, los drenajes y arenas.

Su función principal es la de verificar el cumplimiento del marco regulatorio y además brindar los datos necesarios para el seguimiento y control de las distintas etapas de los procesos efectuados en los distintos módulos de PDSO.

El laboratorio trabaja bajo procedimientos, registros y documentos estandarizados en el sistema de gestión integrado, a fin de generar datos confiables y trazables. Todos los equipos de laboratorio, están sometidos a un régimen de verificación y calibración, a fin de garantizar los datos obtenidos.

3.2.2 Mejoras

Durante el 2025 se continuó con la optimización del plan de muestreo de los módulos I, II y III.

Se continuó trabajando en conjunto con la Facultad de Agronomía de la UBA en el proyecto de investigación a escala piloto sobre microalgas para el tratamiento de aguas residuales y producción de biofertilizantes, realizando muestreo (DBO/MES) y análisis de la biomasa producida en los distintos reactores.

Personal del laboratorio colabora con la atención de visitas de planta. Acompañan en la recorrida de planta, aportan datos de procesos, explican el funcionamiento de diferentes unidades de tratamiento, etc.

Se continúó con el seguimiento de la dosificación de cloruro férrico en la etapa de tratamiento secundario del módulo I. Se determinaron las franjas horarias donde el efluente requiere dosificación a fines de optimizar el consumo de este coagulante.

Se continuó con la gestión e informes de los Precursores Químicos de AySA, para corroborar la gestión y trazabilidad de los insumos asociados al SEDRONAR.

Se prestó colaboración a la realización de ensayos de TAC y AGV de otras plantas depuradoras.

3.3 Gestión de Laboratorio de Plantas El Jagüel/Barrio I

3.3.1 Consideraciones generales

El Sector de Laboratorio de Planta Depuradora El Jagüel esta situado dentro de la Planta Depuradora El Jagüel perteneciente a la empresa AySA S.A sita en calle Newton 2750, partido de Esteban Echeverría.

De acuerdo a los lineamientos de la ISO 9001, ISO 14001 y 45001, el laboratorio de planta El Jagüel lleva a cabo un plan de control de equipos e insumos como así también de medidas de seguridad e higiene y de gestión de los residuos que allí se generan para poder brindar un servicio acorde a las necesidades de la Planta Depuradora El Jagüel – Barrio I.

El laboratorio cuenta con un plan de muestreo, el cual fue actualizado en 2025 modificando las cantidades mínimas de determinaciones de ensayos de los puntos de control: afluente y efluente (cantidades determinadas por la gerencia de plantas). Estableciendo de esta manera una cantidad de valores mínima y necesaria tanto para asegurar el control del cumplimiento con el marco legal como para optimizar la utilización de los recursos.

También se añadieron dos puntos de control nuevos, se agregó “salida de pretratamiento” en PDJ Ampliación y “lodos a playa de secado” en PDBU.

En el mes de octubre se modificó el punto de extracción de la muestra “afluente”, se colocó un tomamuestras automático en la cámara de ingreso a planta (la cual se limpió anteriormente) y se comenzó a informar este nuevo punto de control en el mes de noviembre.

Se comenzó a realizar en el laboratorio de planta la determinación de TAC/AGV necesaria para el control del proceso del digestor anaeróbico.

3.3.2 Equipamiento

Las siguientes determinaciones se realizan en el Laboratorio de Planta El Jagüel, esquematizadas bajo un programa de ensayos:

- Determinación de materia en suspensión (MES)
- Determinación de sólidos totales (ST/RTE), sólidos volátiles y fijos de barros (SSV/SSF)
- Determinaciones de porcentaje de sequedad del barro deshidratado en centrífugas y playas.
- Determinación de materia en suspensión (MES). Porcentaje de volátiles y fijos.
- Determinación de sólidos totales (ST, RTE) en lodos. Porcentaje de volátiles y fijos.
- Determinación de Demanda Química de Oxígeno (DQO)
- Determinación de Sólidos Sedimentables a los 10’ y 2 h (SS10´ y SS2h)
- Mediciones electrométricas: Temperatura – pH – Oxígeno disuelto.
- Determinación de Turbiedad.
- Determinación de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
- Determinación de TAC y AGV en el lodo digerido

Para realizar dichas determinaciones, el laboratorio cuenta con los siguientes equipos y materiales:

- Balanza analítica marca Sartorius
- Balanza analítica Ohaus
- Termobalanza marca Precisa
- Centrífuga de mesada
- Turbidímetro de mesada marca HACH
- Multiparamétrico de campo marca WTW
- Espectrofotómetro marca MERCK
- Termorreactor marca MERCK
- Estufa de secado y mufla
- Equipo de filtración
- Oxímetro de mesada marca WTW
- Incubadoras marca WTW e Ingelab
- Material de vidrio y plástico.
- EPP

3.4 Gestión de Laboratorio de Planta Hurlingham

3.4.1 Consideraciones generales

La rutina de trabajo del personal de laboratorio se rige según el Plan de Muestreo que contempla las siguientes muestras:

- Muestras Líquidas
  - ✓ Afluente (puntual y compuesta)
  - ✓ Licor Mezcla “Cámaras de aireación” (puntual)
  - ✓ Recirculación (puntual)
  - ✓ Efluente (puntual y compuesta)
  - ✓ Solución de polímero (puntual)

- Muestras Sólidas
  - ✓ Arenas “Desarenador” (puntual)
  - ✓ Rolloffs (puntual)

- Mediciones en campo
  - ✓ Oxígeno disuelto (puntual)
  - ✓ Altura de manto de lodos

3.4.2 Equipamiento

El Laboratorio cuenta con los equipos necesarios para realizar los análisis diarios

- Espectrofotómetro
- Balanza analítica
- Balanza termogravimétrica
- Bomba de vacío
- Microscopio
- Estufa de secado
- Mufla
- Incubadora
- Heladera
- Conductímetro
- Oxímetro
- Baño termostatizado
- Lavadora automática
- Turbidímetro
- Campana de extracción de gases
- Termo reactor
- Equipo multiparamétrico para medir pH, temperatura, potencial redox, entre otros.

A espera de equipamientos pedidos para la implementación de nuevos ensayos como por ejemplo el de Alcalinidad total (TAC), para el que se requiere una centrífuga.

3.4.3 Mejoras

Durante el año 2025, uno de los principales desafíos que enfrentamos en el laboratorio fue ***la puesta en marcha del MÓDULO II***. Este proceso implicó una cuidadosa selección de los puntos y ensayos más relevantes para su operación efectiva.

En marzo de 2025, se habían identificado *cinco puntos clave de muestreo*: Afluente, Entrada a clarificadores primarios, Lodo primario, Lodo espesado y Arenas.

En diciembre de 2025, este número aumentó a *once puntos*, sumando los siguientes puntos adicionales: Reactores biológicos, Recirculación, Lodo de almacenador, Polímero, Biosólidos y Efluente.

La incorporación de estos nuevos puntos de muestreo demandó múltiples intervenciones en cuanto a infraestructura y seguridad, especialmente debido a que la obra civil original no contaba con los accesos adecuados para realizar los muestreos. Las unidades carecían de canillas, escaleras o barandas, lo que representaba un riesgo para los analistas. Para resolver esta situación, en colaboración con los equipos de mantenimiento y seguridad e higiene, se implementaron las medidas necesarias para garantizar condiciones de trabajo seguras.

En cuanto a la automatización, se pusieron en marcha dos *muestreadores automáticos* en los puntos: Afluente y Entrada Clarificador, los cuales requieren limpiezas periódicas (mensuales o quincenales) debido a las características del líquido muestreado.

Ademas:

- Finalizamos la implementación e incorporación del registro de resultados en sistema LIMS.
- Calibración interna de espectrofotómetros mediante el uso de test comercial “Photocheck”
- Implementación de órdenes de trabajo en sistema Máximo para toda tarea adicional al plan de muestreo, renovación de soluciones, limpiezas de filtro para ensayo de MES, mantenimiento de muestreadores y mesadas, entre otras.

3.5 Gestión de Laboratorio de Planta Fiorito

3.5.1 Consideraciones generales

La función principal del laboratorio es la de verificar el cumplimiento del marco regulatorio y además brindar los datos necesarios para el seguimiento y control de las distintas etapas del proceso.

Sigue un plan de muestreo que abarca el análisis del afluente y efluente de planta (diariamente), salida de sedimentador 1° y piletas de aireación (dos veces por semana) y un control a la línea de lodos (una vez por semana).

En el laboratorio se realizan ensayos de Jar Test para analizar la coagulación del polielectrolito utilizado en el sector Deshidratación, con el objetivo de determinar las dosis óptimas del mismo.

Se trabaja bajo procedimientos, registros y documentos estandarizados, a fines de generar datos confiables y trazables.

Todos los equipos están sometidos a un régimen de verificación y calibración, a fin de garantizar los datos obtenidos, realizando un seguimiento a través de cartas de control, utilizando registros de verificación y gráficos de control digitales.

Periódicamente se realiza un control del stock de insumos de laboratorio, logrando mediante este inventario, un seguimiento de las cantidades disponibles, y una gestión eficaz a la hora de la reducción de algún material crítico.

Durante 2025 se gestionó e implementó el sistema LIMS, con el objetivo de optimizar la gestión de datos de laboratorio.

Ensayos que realiza el Laboratorio

Línea liquida:

- Solidos sedimentables
- Materia en suspensión (MES). Solidos fijos y volátiles
- PH, temperatura y oxígeno disuelto
- Demanda biológica de oxígeno (DBO)
- Demanda química de oxigeno (DQO)
- Turbiedad
- Profundidad del manto de lodos

Línea de barros:

- Residuo total por evaporación (RTE)
- Determinación de Sequedad (%SEQ)
- Materia fija y volátil
- PH, temperatura

3.5.2 Equipamiento

En la actualidad el laboratorio se encuentra cubierto casi en su totalidad las necesidades de equipamiento dadas las gestiones que se realizaron durante el periodo correspondiente en esta materia.

El laboratorio cuenta con:

- Heladera e incubadoras
- Campana de extracción
- Agitador magnético y plancha calefactora
- Medidores portátiles de PH, temperatura y oxígeno disuelto.
- Termoreactor y espectrofotómetro
- Balanza termo gravimétrica
- Mesa anti vibratoria
- Balanza analítica
- Estufa de secado
- Turbidímetro
- Microscopio
- Destilador
- Mufla.
- Juez de lodos
- Pipetas, buretas, conos Imhoff, matraces, probetas, frascos Winkler, vasos de precipitado, etc. (material plástico y de vidrio diverso)
- Tomamuestras automáticos

3.6 Gestión de laboratorio Planta Lanús

3.6.1 Consideraciones generales

El laboratorio de Planta Depuradora Lanús, durante el ciclo 2025, continuó con su programa habitual de muestreo y análisis de afluente, efluente y distintos puntos intermedios del proceso.

Ensayos que realiza el Laboratorio

El Laboratorio de PDL realiza las siguientes determinaciones:

- DBO_5
- DQO
- MES
- Potencial Redox
- Oxígeno disuelto
- pH
- Temperatura
- Sólidos sedimentables
- Turbiedad
- Sequedad de lodos

3.6.2 Equipamiento

Para llevar a cabo los ensayos mencionados anteriormente el laboratorio cuenta con el siguiente equipamiento:

- Medidor de pH WTW 3310
- Termoreactor Merck TR 620
- Espectrofotómetro Merck Prove 300
- Estufa de secado San Jor SE60SA
- Mufla ORL IV/P
- Balanza Analítica Ohaus PA224
- Turbidímetro Hach TL 2300
- Oxímetro WTW Inolab 7310
- Incubadora Ingelab I-291 P

3.7 Gestión de laboratorio de Planta Santa Catalina

3.7.1 Consideraciones generales

El laboratorio de Planta Depuradora Santa Catalina, durante el ciclo 2025, continuó con su programa habitual de muestreo y análisis de afluente, efluente y distintos puntos intermedios del proceso.

Los Sistemas de Gestión implementados exigen que el equipamiento sea controlado y calibrado con frecuencia, lo cual permite asegurar la calidad de los resultados obtenidos.

Ensayos que realiza el Laboratorio

El Laboratorio de PDSC realiza las siguientes determinaciones:

- DBO_5
- DQO

- MES
- Oxígeno disuelto
- PH
- Temperatura
- Sólidos sedimentables
- Turbiedad
- Sequedad de lodos

3.7.2 Equipamiento

Para llevar a cabo los ensayos mencionados anteriormente el laboratorio cuenta con el siguiente equipamiento:

- Espectrofotómetro Pharo 300
- Termo reactor
- Balanza analítica
- Bomba de vacío
- Medidor multiparamétrico para medir pH, temperatura, oxigeno disuelto
- Turbidímetro
- Estufa de secado
- Incubadora
- Heladera

3.8 Planta Depuradora Bella Vista

3.8.1 Equipamiento

- **EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO**:

  Horno Mufla O.R.L III - Estufa calefactora San Jorge SL60SDB - Estufa calefactora IONOMEX - Incubadora Ingelab I-291 P – Heladera Briket EXHM3200 BKLSCI - Balanza Analítica OHAUS Pioneer PX224 – Termo Balanza OHAUS MB27 - Balanza Analítica OHAUS AR2140 – Turbidímetro HACH TL 2300 – Campana extractora – (2) Multiparametrico WTW - 3630 – Espectrofotómetro MERCK Spectroquant Prove300 – Oxímetro HACH HQ30D – (2) Multiparametrico HACH HQ 4100 – TermoReactor HACH DRB200 - Bomba de vacío – Microscopio Boeco MB700 - Equipo de Jar Test Velp scientifica - TermoReactor HACH DRB200 - 3 (tres) Muestreadores de campo.

- **EQUIPAMIENTO ON-LINE**

  Detector de gases MSA "Altair 5x Multigas" - Detector de gases MSA "Altair PRO HCN" – 11 (once) sensores de nivel Vega Vegason 61 - 8 (ocho) manometros Nuova fima EN837-1 - 2 (dos) manometros IFM Electronic PG2798 – manometro Genebre G3820 – 2 (dos) medidores de manto HACH - sensores de oxigeno GLI Internacional PRO-P3 (Z1-Z2-Z3) – 3 (tres) sensores de turbiedad Hach sc200 - 2 (dos) sensor de P.Redox GLI Internacional PRO-P3 – 6 (seis) caudalimetros Krohne conaut IFC 050W.

3.8.2 Control de Calidad

- Se agregaron o se realizaron modificaciones sobre los siguientes procedimientos:
    - Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
    - Determinaciones de laboratorio (General)
    - Control de válvulas de aireación
    - Base de datos – RC/OC – Procesos

- **Plan CIC:** el laboratorio central analizó mensualmente las características fisicoquímicas y bacteriológicas de los afluentes y efluentes de la planta como así también las líneas de barro y arenas. El cumplimiento de estos parámetros analizados es el 100%.

- **Curvas espectrofotométricas:** Se calibro el espectro fotómetro U.V visible, para adaptar la lectura de los viales HACH en el espectrofotómetro Merck, la tarea se realizó en los espectros de Bella Vista, Escobar y Las Catonas.

- **Balance de Masa**.

- Los equipos de laboratorio son verificados internamente. Se establece una frecuencia de verificación, para la confiabilidad de los datos obtenidos en cada ensayo. También se implementa carta de control medias para patrones.

- Se incorporan indicadores de procesos (Laboratorio/deshidratación)

- **Análisis estadístico de datos:** se evaluó la estabilidad metrológica de todos los instrumentos utilizados para la cuantificación y/o cualificación de los analitos para el control operacional de la planta, con el que se logró demostrar la estabilidad metrológica de la mayoría de los equipos y pasar la frecuencia de calibración externa de un año a dos años disminuyendo los costos asociados.

- **Actualización de la técnica de DBO:** Desde laboratorio se actualizo la técnica de DBO realizándola de la manera en la que se registra en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2017 última actualización disponible por la biblioteca de AySA.

- **Capacitación interlaboratorios**: Se capacito en la utilización del espectrofotómetro U.V visible prove 300, a los laboratorios de Las Catonas y Escobar.

- **Modernización del sistema de carga de datos:** Se empleó el nuevo sistema informático LIMS el cual transmite la información cargada de manera inmediata a toda la empresa.

- **Planta C. Russo:** Se realizó un plan de muestro para planta Russo con la finalidad de cuantificar y cualificar los analitos característicos del tratamiento de esta nueva planta.

3.9 Gestión de laboratorio de Planta Escobar

3.9.1 Consideraciones generales

El Sector de Laboratorio de Planta Depuradora Escobar está situado dentro de la misma, perteneciente a la empresa AySA S.A., sito en calle Almafuerte 1170, de Belén de Escobar.

Cuenta con perfiles de muestreos y ensayos de acuerdo a las necesidades del proceso y jefatura de planta, como así también una metodología para la entrega de los informes del servicio brindado.

En promedio, mensualmente, se extraen un total de 300 muestras (puntuales y compuestas) de las cuales resultan un promedio de 1000 análisis.

Ensayos que realiza el Laboratorio

En el Laboratorio de PDE se realizan los siguientes ensayos a las siguientes unidades:

- Entrada de Planta,
- Pretratamiento (Foso de Gruesos),
- Salida de Tanque Imhoff,
- Salida de Lecho Percolador,
- Salida de Planta (Clarificador)

Donde se realizan las siguientes determinaciones:

1: Control de pH

2: Sólidos Sedimentables a los 10min y a las 2Hs

3: Turbiedad

4: Materia en Suspensión (MES)

5: Demanda Química de Oxígeno (DQO)

6: Demanda Biológica de Oxígeno (DBO_5) siembra y lectura

8: Control de temperatura

9: Control de potencial Redox

11: Determinación de Oxígeno Disuelto

12: Determinación de Conductividad

Al Clarificador:

13: Medición del Manto de Lodo

Al Lecho Percolador, además de los ensayos antedichos se le realiza:

14: Observación al Microscopio para identificación y conteo de organismos Eucariotas

A la Purga del Tanque Imhoff y a las Playas de Secado:

15: Determinación del Residuo Total (RTE)

16: Determinación de Materia Inorgánica (MI)

17: Determinación de Materia Orgánica (MO)

18: Determinación Porcentaje de Sequedad (%SEQ)

3.9.2 Equipamiento

Los equipos con los que cuenta el Laboratorio para la realización de los antedichos Controles son:

- Incubadora
- Balanza Analítica
- Mufla
- Estufa de secado
- Balanza de precisión
- Termobalanza
- Espectrofotómetro
- Heladera exhibidora
- 2 Multiparamétricos, modelo 3630 IDS
- PHmetro Portátil
- Oxímetro Portátil
- Termorreactor
- Turbidímetro
- 2 Multiparamétricos, modelo HQ2200
- Microscopio Óptico
- Juez de Lodos

3.10 Gestión de laboratorio de Planta Garín

3.10.1 Consideraciones generales

El Sector de Laboratorio de Planta Depuradora Garín está situado dentro de la Planta Depuradora Escobar.

Cuenta con perfiles de muestreos y ensayos de acuerdo a las necesidades del proceso y jefatura de planta, como así también una metodología para la entrega de los informes del servicio brindado.

En promedio, mensualmente, se extraen un total de 100 muestras (puntuales y compuestas) de las cuales resultan un promedio de 700 análisis.

Ensayos que realiza el Laboratorio

En el Laboratorio de PDE se realizan los siguientes ensayos, para la Planta Garín:

A las siguientes unidades de tratamiento:

- Entrada de Planta (Foso de Gruesos),
- Zanja de Oxidación,
- Recirculación,
- Clarificador, y
- Salida de Planta

A los que se les realizan los siguientes controles:

1: Control de pH
2: Sólidos Sedimentables a los 10min y a las 2Hs
3: Turbiedad
4: Materia en Suspensión (MES)
5: Demanda Química de Oxígeno (DQO)
6: Demanda Biológica de Oxígeno (DBO_5) siembra y lectura
8: Control de temperatura
9: Control de potencial Redox
11: Determinación de Oxígeno Disuelto
12: Determinación de Conductividad

Al Clarificador:

13: Medición del Manto de Lodo

l Licor Mezcla de la Zanja de Oxidación, además de los ensayos antedichos se le realiza:

17: Observación al Microscopio para identificación y conteo de organismos Eucariotas
18: Sólidos Sedimentables a los 30min
19: Concentración (MES)
20: Índice Volumétrico de Lodos (IVL)

A la Purga del Espesador y a las Playas de Secado:

21: Determinación del Residuo Total (RTE)
22: Determinación de Materia Inorgánica (MI)
23: Determinación de Materia Orgánica (MO)
24: Determinación Porcentaje de Sequedad (%SEQ)

3.10.2 Equipamiento

Los equipos con los que cuenta el Laboratorio de PDE para la realización de los Controles mencionados para PDG son:

- Incubadora
- Balanza Analítica
- Mufla
- Estufa de secado
- Balanza de precisión
- Termobalanza
- Espectrofotómetro
- Heladera exhibidora
- Multiparamétrico, modelo 3630 IDS
- PHmetro Portátil
- Oxímetro Portátil
- Termorreactor
- Turbidímetro
- 2 Multiparamétricos, modelo HQ2200,
- Microscopio Óptico
- Juez de Lodos

3.11 Gestión de laboratorio Planta Ferrari

3.11.1 Consideraciones generales

Durante este año se encuentran implementados el plan anual de trabajo, la frecuencia de muestreo, la planilla de ensayos diarios, planilla de ODT, el sistema LIMS y la gestión de materiales, instrumentos y reactivos incluidos en el SEDRONAR. Asimismo, se dio inicio a la extracción y envío de muestras al laboratorio central para la realización del CIC y se avanza en la confección y estandarización de los procedimientos de laboratorio.

Ensayos que realiza el Laboratorio

1) PH
2) Temperatura
3) Sedimentación 10” / 30” / 2 hrs
4) DBO
5) DQO
6) Conductividad
7) Turbiedad

8) Potencial Redox
9) Oxígeno Disuelto
10) Índice volumétrico de lodos
11) Altura manto de lodos de clarificadores
12) Porcentaje de Sequedad de barros de filtro de bandas
13) Solidos Totales
14) Registro de lodos purgados de recirculación

3.11.2 Equipamiento

	Marca	*Modelo*
Toma muestras automático	HACH	AS950 AWRS
Toma muestras automático	HACH	AS950 AWRS
Horno mufla	ORL	III
Horno mufla	ORL	III
Incubadora	INGELAB	I-291P
Incubadora	INGELAB	I-291P
Multiparamétrico	WTW	multi 3630 IDS
Multiparamétrico	WTW	multi 3630 IDS
Multiparamétrico	WTW	multi 3630 IDS
Multiparamétrico	WTW	multi 3630 IDS
Phmetro	WTW	PH 3309
Phmetro	WTW	PH 3309
Turbidímetro portátil	Merck	1100T
Turbidímetro portátil	Merck	1100T
Estufa de secado	SanJor	SL60SDB
Estufa de secado	SanJor	SL60SDB
Analizador de humedad	Ohaus	MB27
Medidor Multiparamétrico	HACH	HQ30D
Turbidímetro	HACH	TL2300
Bomba de vacío	Dosivac	DVL 150
Bomba de vacío	Dosivac	DVL 150
Balanza analítica	Ohaus	PX224
Balanza analítica	Ohaus	PX224
Espectrofotómetro	Merck	Prove 300
Espectrofotómetro	Merck	Prove 300
Espectrofotómetro	Merck	Prove 300
Termoreactor	Merck	Spectroquant 620
Termoreactor	HACH	DBR200

Centrifuga de mesada	Biokan	SLC 04A
Baño termostático	Peetlab	HWS24
TSS portátil	HACH	LXV320
Agitador portátil	Argolab	M3-D
Agitador portátil	Argolab	M3-D
Agitador portátil	Argolab	M3-D
Autoclave automático	BioSmartest	BST 1008
Floculador portátil	VELP	FP4
Agitador	VELP	ZX3
Purificador de agua	Merck	RIOs 5
Deposito almacenamiento de agua	Merck	TankPE030
Microscopio	BOECO	BM-700
Heladera	Briket	EXH-M3200
Heladera	Briket	EXH-M3200
Termómetro infrarrojo	Ebro	Tfi260
Balanza	G&A	Pal-20
Balanza	G&A	Pal-20
Pesa para balanza analítica	Dolz Hnos.SRL	E2 50gr
Pesa para balanza analítica	Dolz Hnos.SRL	E2 100gr
Pesa para balanza analítica	Dolz Hnos.SRL	E2 200gr
Lavadora automática	SMEG	GW4060

3.12 Gestión de laboratorio Planta Catonas

3.12.1 Consideraciones generales

En el laboratorio de Planta Depuradora Las Catonas, durante el ciclo 2025, se continuó trabajando en la mejora del sistema de gestión de calidad.

Se continuó con los seguimientos de equipos a través de cartas de control, utilizando registros de verificación y gráficos de control digitales.

Se finalizó la implementación de LIMS: actualmente todos los datos de cargan en LIMS PROD diariamente.

El plan anual de calibración de equipos propuesto para el año 2025, pudo completarse satisfactoriamente. Se realizó con las órdenes de compra 78134 y 78137. Se encuentra pendiente la ejecución de la OC 79874 que incluye la calibración de los espectrofotómetros, a ejecutarse fin de diciembre

La rutina de muestreo y ensayos para la planta de Jose C Paz, se reanudó en enero de 2025 y se realiza una vez por semana.

Ensayos que realiza el Laboratorio

El Laboratorio realizó las siguientes determinaciones:

- DBO_5
- DQO
- MES
- Temperatura
- Potencial Redox
- Oxígeno disuelto
- pH
- Sólidos sedimentables (10', 30', 2 hs.)
- Turbiedad
- Materia seca
- Sólidos totales
- Materia orgánica e inorgánica

A partir de mayo se incluyó en la rutina el ensayo de DQO para efluente y afluente, debido a que se recibieron los viales con la ejecución de la OC 78396. Además, se realizó en PD Fiorito junto al departamento de apoyo profesional las curvas de calibración del espectrofotómetro para poder utilizar los viales de DQO HACH.

Durante el 2025 se realizaron un promedio de 955 ensayos de laboratorio mensuales.

3.12.2 Equipamiento

El equipamiento que se utilizó en el laboratorio para llevar a cabo las determinaciones es el siguiente:

- Medidor de pH WTW 3310
- Estufa de secado San Jor SL60SDB
- Multiparamétrico WTW Multi 3630 IDS
- Mufla ORL- ORL III
- Balanza analítica Ohaus PX224
- Incubadora Ingelab I-291P
- Turbidímetro de mesada Hach TL2300
- Bomba de vacío Dosivac DVL 150
- Analizador de humedad Ohaus MB27
- Multiparamétrico Hach HQ30D
- Microscopio Boeco modelo BM700
- Espectrofotómetro Merck Prove 300
- Termoreactor Hach DBR200

Por otra parte, el laboratorio cuenta con los siguientes equipos, los cuales se encuentran momentáneamente en stand by o bien poseen una función complementaria al desarrollo de las tareas diarias,

- Purificador de agua Merck RIOs SMART 8 / RIOs Essential
- Multiparametrico Hach HQ1130.

9. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Informe de Gestión 2025 – Dirección Desarrollo de la Comunidad

1. INTRODUCCIÓN

El rol de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad (DDC) durante el período 2025, se consolidó en transformar el riesgo social en un sistema de gestión documentado, certificado y previsible que le permita articular con distintos actores y partes interesadas, tanto internas como externas, en beneficio de la comunidad y de la empresa.

Sus funciones principales son:

1. Relacionamiento con la COMUNIDAD para el diseño y ejecución de estrategias de vinculación, según las necesidades de cada segmento de usuarios y no usuarios;

2. Relaciones institucionales con las PARTES INTERESADAS, (Organismos de control, Organismos de gobierno en sus distintos niveles, Autoridades de Cuenca, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresas de servicios públicos, empresas privadas e Instituciones académicas);

3. Gestión del CONFLICTO SOCIAL generado por demandas espontáneas y/o legales vinculadas a los servicios;

Principales logros del ejercicio:

- La gestión de cierre de los Planes A+T/C+T y Conectar-T, sin que se generara ningún tipo de conflicto social;
- El cierre de cartera de los préstamos de los organismos internacionales de crédito (FONPLATA y BANCO MUNDIAL) alcanzando las metas de ejecución técnica y sociales;
- Puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de UREM en sus tres dimensiones, socio demográfica, técnica y comercial;
- Relanzamiento del Plan de Gestión Social de Obras para todas las modalidades y tipos de obra;
- Diseño e inicio de implementación del Plan de Fortalecimiento del Vínculo con la Comunidad-T.I.N.I;
- Certificación ISO 9001 del proceso de Gestión Integral de UREM-GIU, en el marco del Proceso de Gestión de Usuarios, sin No conformidades ni Observaciones;
- Transformación de la estructura organizativa para adaptación a los nuevos requerimientos y lineamientos corporativos;
- Posicionamiento de la DDC, dentro y fuera de la empresa, como referente de UREM, como así también responsable de la definición de los criterios de intervención;
- Implementación de una modalidad de trabajo transversal con participación de todas las áreas involucradas de la empresa.

Ejes Estratégicos AySA:

La DDC con sus procesos, aporta en 6 de los 7 objetivos estratégicos de la empresa. En el **ANEXO I-AySA Objetivos estratégicos-Aporte DDC**, se detallan los aportes de la Dirección para cada uno de los ellos.

2. RESULTADOS OPERATIVOS

Los procesos bajo responsabilidad de la DDC, durante 2025 fueron:

- La **GIU-Gestión Integral de UREM.** Consiste en el abordaje integral de los barrios vulnerables con el objetivo de mejorar la situación de los servicios, a través de la regularización catastral, técnica y comercial, sin perder de vista la dimensión social.

- La **GSO-Gestión Social de Obras**. Consiste en facilitar el proceso de ejecución de la obra en todo su ciclo y generar un relacionamiento con la comunidad, promoviendo la apropiación y uso sostenible de los servicios y facilitar la incorporación correcta de los usuarios.

- La **Gestión del conflicto social**. Consiste en la asistencia a barrios vulnerables sin servicio o servicio deficiente, que requiere la asistencia, a través de alguno de los sistemas alternativos de provisión de agua (camiones cisternas, sachets, tanques comunitarios) y/o saneamiento.

- **Plan de Fortalecimiento del Vínculo con la Comunidad.** Consiste en el diagnóstico de situación de áreas determinadas (principalmente periféricas) y la generación e implementación de estrategias que mejoren la calidad de datos disponibles, la incorporación de usuarios y el valor del servicio. Se diseñó bajo cuatro premisas **(Transformación, Integración, Normalización e Innovación – T.I.N.I)**. Dio lugar a la elaboración del plan y armado de un diagnóstico de caso: "Situación de José C. Paz", municipio con los más altos índices de incobrabilidad.

- **Planes A+T / C+T / Conectar-T**. Modalidad de ejecución de obras que durante el 2025 se puso el foco en la finalización de las obras y proyectos y cierre de los convenios y Planes.

Se adjunta, en el ANEXO II_ **Tabla Resumen_Resultados 2025**, de los cinco procesos (KPIs, Indicadores, Evolución, Criticidad, Proyección)

3. ARTICULACION CON PARTES INTERESADAS

Durante el 2025 y para el desarrollo de los planes a cargo de la DDC, se fortaleció la articulación **con organismos de control, gubernamentales, usuarios, organizaciones y otros grupos de interés**:

- **ERAS:** mesa de trabajo para planteo de problemáticas y adaptación de la GIU;
- **APLA:** intercambio de información, principalmente por obras de A+T y C+T y de áreas vulnerables (UREM).
- **ACUMAR:** coordinación de acciones en las UREM ubicadas en la CMR
- **MUNICIPIOS de la Concesión**: firma de convenios de colaboración y articulación para actividades en territorio.
- **DEFENSORIAS** (General de la Nación / del Pueblo): articulación a partir de pedidos de información y reclamos en UREM.
- **ORGANIZACIONES SOCIALES:** movimientos y organizaciones que reclaman por los servicios de agua y Saneamiento (Foro Hídrico de LZ, LA, Fundación TEMAS, Movida ambiental Vicente López, Fundación Che Pibe, CCC, Proyecto Riachuelo Urbana, etc)
- **UBA -** Facultad de ciencias Sociales – Trabajo Social: Centro de prácticas académicas, con la participación de tres alumnos.
  Facultad de Ingeniería Civil – Cátedra de Gestión Socio Ambiental: participación y exposición sobre ¨La Importancia e impacto de la Gestión Social en las obras" en el Marco del Seminario de Participación Ciudadana
- **ORGANIZACIONES BARRIALES**: articulación para operativos comerciales, técnicos y de concientización.

- **FEMSA – SUMANDO:** alianza para la ejecución de un proyecto conjunto, en Villa 21-24.
- **FUNDACIÓN PROVIVIENDA SOCIAL:** propuesta de trabajo de campo en el marco del plan TINI con fines de regularización comercial. Caso B° Ejército de los Andes.

4. PRIORIDADES Y PERSPECTIVAS 2026:

- **"Confiabilizacion del Agua Potable entregada en UREM" (Control y Monitoreo de Agua entregada)**
- Este proyecto consiste en intervenciones técnicas (sondeos, anulación de válvulas, colocación de válvulas, mediciones puntuales e instalación de medidores para medición permanente) en UREM, con el propósito de ratificar/rectificar el agua entregada en cada uno de estos barrios, mediante mediciones puntuales, que permitan proponer acciones de mejora en la infraestructura existente, optimizando el uso del recurso. Este proyecto de inversión se enmarca en el eje de Regularización Técnica del Plan de Gestión Integral de UREM.

- **Alianza estratégica con la empresa FEMSA** para generar, en conjunto, soluciones integrales y sustentables para la reducción de pérdidas de agua potable en el BARRIO 21-24 y los seis conjuntos habitacionales circundantes, a través del diseño y puesta en marcha de distintas iniciativas, con participación de la comunidad, que impacten en las dimensiones técnica, ambiental y social.

- Diseño e implementación de **índices de impacto de gestión**, para los diferentes procesos. Durante el 2025 trabajamos en la identificación de las problemáticas, obtención, registro y análisis de datos crudos; entendimiento y normalización de los procesos, avanzando hacia la construcción de índices que permitan medir el impacto real de los procesos que se llevan adelante en el área.

ANEXO a continuación "Resultados Operativos del Año".


ANEXO - Resultados operativos del año:

PROCESOS	UNIVERSO	EJES DE TRABAJO	KPIs / Reportes	% CUMPLIMIENTO	PROCESO CRÍTICO	NIVEL DE RELEVANCIA	PERSPECTIVA 2026
GIU - GESTIÓN INTEGRAL DE UREM	1350 BARRIOS	1. Relevamientos 2. Regularización Catastral 3. Gestión Técnica 4. Regularización Comercial 5. Gestión de Usuarios	Tablero de objetivos y metas Monitoreo medición Monitoreo indicadores comerciales Proyecto de Inversión CABA	94/76	SI	***	Gestión integral de 100 nuevas UREM y monitoreo de las 59 a finalizar del 2025. Finalización Proyecto de Inversión CABA y nuevo Proyecto de Inversión.
GSO - GESTIÓN SOCIAL DE OBRAS	TODAS LAS OBRAS DE LA CONCESIÓN	1. Análisis de Contexto 2. Formación 3. Relacionamiento con la comunidad 4. Gestión de Reclamos y Consultas	Tablero de Objetivos y Metas	80/90	SI	***	Gestión social de 116 obras (en todos sus estados)
GESTIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL	A DEMANDA	1. Relacionamiento con la Comunidad 2. Articulación con PI externas 3. Articulación con PI internas	25 barrios con servicios alternativos; 8 barrios con conflicto legal; 2 demandas legales de cooperativas; 26 demandas laborales de cooperativistas;	100% en gestión	SI	***	Seguimiento de la asistencia vigente y atención de nuevas demandas
TINI - PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO CON LA COMUNIDAD	27 MUNICIPIOS	1. Calidad de datos 2. Percepción de valor de los servicios 3. Satisfacción y Confianza	Informe de grado de avance	Fase inicial de implementación	SI	***	Firma de convenios e implementación en 7 municipios
OBRAS DE EXPANSIÓN	11 OBRAS EN EJECUCIÓN	Plan A+T/C+T con financiamiento de FONPLATA	ANEXO IX: Tablero de seguimiento ANEXO X: Tabla de obras transferidas	100% ejecutados. 146 Proyectos cerrados.	SI	*	30 convenios en gestión de cierre. 5 obras pendientes de transferencia. 29 obras pendientes de traspaso.
VINCULACIÓN DE HOGARES A LAS REDES AySA EXISTENTES	8 PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Programa Conectar-T con financiamiento del BANCO MUNDIAL	ANEXO IX: Tablero de seguimiento	100% ejecutado con cierre de cartera del préstamo	SI	*	4 convenios en gestión de cierre

Nivel de criticidad: * BAJO ** MEDIO *** ALTO.

10. PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE)

Informe anual
Plan de prevención y emergencias

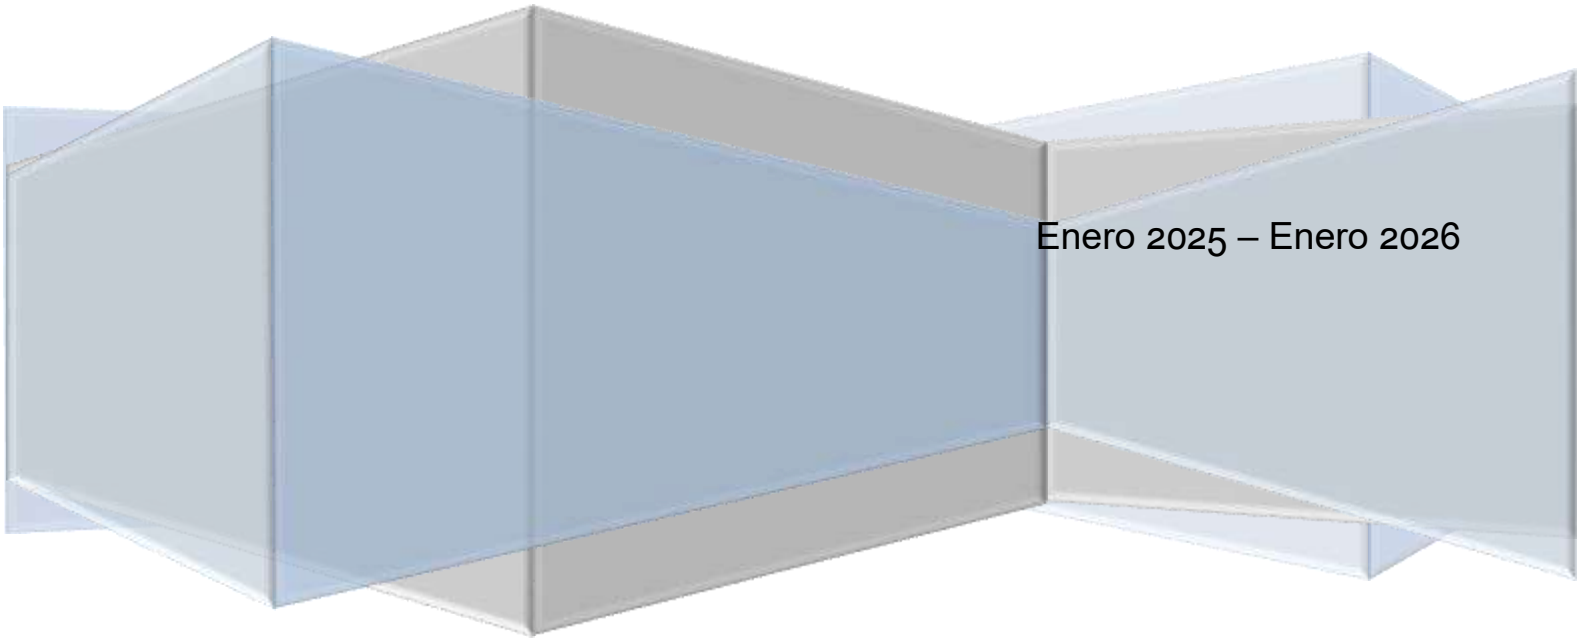

Enero 2025 – Enero 2026

Contenido

1 Resumen ejecutivo 2
2 Metodología de análisis 2
2.1 Grupos operativos 3
2.1.1 Eslabón 1: Grupo de Trabajo 3
2.1.2 Eslabón 2: Proceso a gestionar 3
2.1.3 Eslabón 3: Identificación y análisis de peligros 4
2.1.4 Eslabón 4: Gestión de los riesgos operativos 4
2.1.5 Eslabón 5: Verificación 5
2.1.6 Información ante emergencias 5
2.2 Grupos de apoyo 5
2.2.1 Información ante emergencias 6
2.2.2 Registro de eventos para procesos de apoyo 6
2.2.3 Auditorías 7
4 Capacitaciones 9
5 Reuniones con direcciones 9
6 Estado sobre la documentación de respaldo del PPE 10
7 Gestión de riesgos 11
7.1 Gestión de riesgos DA 11
7.2 Gestión de riesgos DS 11
7.3 Gestión de riesgos DOR 11
7.4 Gestión de riesgos DGC 12
7.5 Gestión de riesgos para el Proceso Integral de Agua y para Saneamiento 12
7.5.1 Agua 12
7.5.2 Saneamiento 12
8 Informes y eventos 13
9 Auditoría interna AySA 14
10 Sistema PPE 15
10.1 Guardias 15
10.2 Documentos 15
11 App PPE 15
12 Reporte de eventos y novedades 15
13 Análisis y conclusiones 16

1 Resumen ejecutivo

El Plan de Prevención y Emergencias (PPE) es un conjunto de decisiones cuya finalidad es prevenir y/o mitigar situaciones anómalas que puedan afectar la **calidad/continuidad** de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Con respecto a la **documentación de respaldo del PPE**, se logró un **porcentaje de actualización** del **85**% dado que varias direcciones se encuentran reestructurando sus procedimientos y matrices de análisis de riesgos operativos. Se destaca que las matrices de saneamiento se encuentran en un proceso de revisión, por un lado para simplificar el análisis de riesgos y por otro lado para incorporar los nuevos sitios; y la DOR que se encuentra unificando sus AMFEs en uno solo bajo el nombre “Gestión de reclamos técnicos”.

A lo largo del año, en el marco de **Comité de procesos operativos**, se actualizaron las matrices de riesgos de los procesos integrales de agua y saneamiento, las cuales contemplan los riesgos más significativos para empresa, que surgen de la interacción de todas las direcciones involucradas en los mismos.

Desde la coordinación del PPE se participó en reuniones con diversas direcciones y en otros comités tales como: **Comité de Presiones y Comité de Mantenimiento.**

Durante el periodo 2025 se produjeron diversos **eventos** tales como:

- **Hidrocarburos en Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas (Mayo 2025)**
- **Filtración de hidrocarburos en instalaciones de AySA - Altos niveles de explosividad (Octubre 2025)**

En cuanto al **sistema de guardias y documentos**, a lo largo del año se fueron atendiendo las cuestiones que impactan directamente en los usuarios del mismo. Luego de la reducción de cantidades de guardias alcanzada en 2024, durante el 2025 las cantidades de “G” se mantuvieron estables.

Además, se comenzó a trabajar en una APP la cual mejorará aquellos aspectos que los usuarios del sistema consideran necesarios.

Durante todo el 2025, se continuó con el envío mensual de novedades y eventos cargados en el sistema a Presidencia y Dirección General, para verificar las diversas situaciones que ocurren durante las Guardias Técnicas Operativas Pasivas (GTOP).

2 Metodología de análisis

El Plan de Prevención y Emergencias (PPE) es un conjunto de decisiones para llevar adelante la gestión de los riesgos operativos con la finalidad de prevenir y/o mitigar

situaciones anómalas que puedan afectar la calidad/continuidad de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

El PPE se basa en la metodología HACCP (Hazard Analisys Critical Control Points) complementándose con las Normas ISO 9001:2015 e ISO 31000**.**

Contempla 5 eslabones (Etapas que contienen los requisitos HACCP), la información/documentación de respaldo ante emergencias, el análisis de eventos y el resultado de las auditorías de las áreas correspondientes.

2.1 Grupos operativos

Las áreas operativas son:

- Dirección de Agua (DA)
- Dirección de Saneamiento (DS)
- Dirección de Operaciones Regionales (DOR)
- Dirección de Grandes Conductos (DGC)

La documentación que corresponde a las áreas operativas consta de:

2.1.1 Eslabón 1: Grupo de Trabajo

Consiste en listar los integrantes del equipo HACCP. Este equipo debe ser interdisciplinario y que conozca a fondo el proceso a gestionar para poder realizar un análisis del mismo en cuanto a la identificación de peligros (agentes biológicos, químicos, físicos o radiológicos con la capacidad daños), determinar PCC, sistema de vigilancia de los PCC, acciones ante desvíos y verificar el sistema HACCP.

Esta información se plasma en el **R-PPE-012 ”**Grupo de trabajo de análisis de riesgos”

2.1.2 Eslabón 2: Proceso a gestionar

Compuesto por:

a) **Descripción del proceso.** El objetivo es conocer en forma minuciosa cómo es el sistema y sus componentes.
b) **Exigencias generales reglamentadas para no perjudicar la salud del consumidor ni el medio ambiente**. El objetivo es caracterizar los productos respecto de las exigencias sanitarias y normativas e identificar los aspectos más relevantes relacionados con los usos esperados o buscados.
c) **Un diagrama** que muestra las distintas etapas del proceso en cuestión. Un buen diagrama de flujo conceptual facilita mucho la identificación de peligros y controles.

Se utiliza el **R-PPE-011** “Descripción del Proceso” para incorporar la información mencionada anteriormente.

2.1.3 Eslabón 3: Identificación y análisis de peligros

Los peligros son identificados por el equipo HACCP. Como mínimo deben tener en cuenta los parámetros reglamentarios (normas) que responden a la definición de riesgo (efecto que puede detectarse cuando un peligro se concreta)

Para realizar la jerarquización de los riesgos, es decir, evaluar su criticidad, se debe analizar:

i) **Efecto del fallo (S)**: considera las consecuencias locales y generales sobre la salud y continuidad del servicio.
ii) **Probabilidad de ocurrencia de la causa (O)**: tiene en cuenta la frecuencia con que se puede poner en evidencia el peligro y los riesgos asociados, en función de la causa de éstos.
iii) **Detección/ corrección (D):** asociado a la posibilidad de evidenciar y corregir el desvío.

Luego, se realiza el cálculo del Número de prioridad de riesgo (**NPR**):

NPR= SXOXD

Posteriormente, deben definirse los Puntos Críticos de Control (PCC) que son las etapas u operaciones que se deben dominar (controlar), para eliminar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de un peligro y los efectos relacionados. Estos PCC deben nombrarse y numerarse para su seguimiento. Para corroborar si una etapa es un PCC para el peligro en cuestión, se utiliza un árbol de decisión.

Este eslabón se encuentra plasmado en la Tabla de riesgos por proceso **R-SGE-009** “Matriz de Análisis de Riesgos”.

2.1.4 Eslabón 4: Gestión de los riesgos operativos

En el mismo se debe definir:

a) Los **límites críticos** ya que si se exceden o no se llega a ellos (límite mínimo - límite máximo), se puede comprometer el nivel de servicio.
b) Un **sistema de vigilancia** para verificar que el nivel de los parámetros en los PCC se encuentra dentro de los límites de trabajo.
c) **Acciones inmediatas** cuando la vigilancia de un PCC indica una pérdida de control de los valores definidos en ese punto.

Este eslabón consta de un listado de los parámetros de los PCC que se monitorean junto con el sitio en el cual se registran. De esta forma, puede identificarse fácilmente donde queda asentado el control de los mismos. Además, este eslabón también queda plasmado en el **R-SGE-009** “Matriz de Análisis de Riesgos”.

2.1.5 Eslabón 5: Verificación

Consta de un registro con actualización trimestral, por parte del sitio en cuestión, para poder verificar el control que se le realiza al PCC. El documento base para el control de los PCC es el **R-PPE-013** "Planilla de control de PCC"

Además, como parte de la verificación, se realizan *debriefings* con el objetivo de analizar las acciones realizadas ante la aparición de una emergencia, evaluar la eficacia de las mismas y proponer acciones de mejora. Se utiliza el **R-PPE-004** "Informe general sobre eventos". Este informe se confecciona a consideración de la coordinación del PPE.

Por último, mediante las auditorías internas puede corroborarse la actualización y el cumplimiento de lo detallado en el marco del PPE. Se puede utilizar un *check list* como guía **R-PPE-005** "Auditoría Interna del PPE".

Todos los eslabones, con excepción del 5 que es subido por el PPE, deben actualizarse anualmente.

2.1.6 Información ante emergencias

Consiste en una planilla Excel con solapas con la siguiente información mínima:

Listado de proveedores externos críticos: el cual contiene los proveedores externos necesarios a convocar cuando ocurre una emergencia.

Listado de vehículos críticos: con los vehículos críticos que deben estar disponibles cuando se necesitan.

Listado de equipos críticos: con los equipos críticos necesarios a utilizar cuando ocurre una emergencia.

Listados de teléfonos importantes: el cual contiene teléfonos de sociedades civiles, fuerzas de seguridad y organismos oficiales críticos.

***OLE*:** el cual consta de un diagrama que refleja el flujo de comunicación y responsable/s con sus nombres, apellidos, cargo y número telefónico. (Solo para las áreas operativas)

Stock de seguridad: el cual consta de la cantidad de insumos/ materiales críticos que se deben tener ante la aparición de una emergencia.

Esta documentación se debe plasmar en el **R-PPE-009** "Información ante emergencias - Operación". Es importante aclarar que dichos registros permiten, de ser necesario, incorporar información adicional requerida por el área en cuestión.

2.2 Grupos de apoyo

Los grupos de apoyo que aplican la documentación del PPE, comprenden las direcciones de:

- Recursos Humanos
- Medicina laboral
- Higiene y seguridad
- Apoyo Logístico (DAL)
- Tecnología de la Información (DTI)
- Control Centralizado de Saneamiento
- Gestión de Redes de Saneamiento
- Laboratorio Central
- Video-sonar
- Tableros de Calidad
- Gestión Operativa GTEC
- Control del Recurso - Barco Lab. Orion

La documentación para los sectores de apoyo está compuesta por:

2.2.1 Información ante emergencias

Las áreas de apoyo poseen un documento con la siguiente información:

Listado de proveedores externos críticos: el cual contiene los proveedores externos necesarios a convocar cuando ocurre una emergencia.

Listado de vehículos críticos: con los vehículos críticos que deben estar disponibles cuando se necesitan.

Listado de equipos críticos: con los equipos críticos necesarios a utilizar cuando ocurre una emergencia.

Listados de teléfonos importantes: el cual contiene teléfonos de sociedades civiles, fuerzas de seguridad y organismos oficiales críticos.

***OLE*:** el cual consta de un diagrama que refleja el flujo de comunicación y responsable/s con sus nombres, apellidos, cargo y número telefónico. (Solo para las áreas operativas)

Stock de seguridad: el cual consta de la cantidad de insumos/ materiales críticos que se deben tener ante la aparición de una emergencia.

Esta documentación se debe plasmar en el **R-PPE-010** “Información ante emergencias - Apoyo”

2.2.2 Registro de eventos para procesos de apoyo

El **R-PPE-004** “Informe general sobre eventos” es confeccionado por el área de coordinación del PPE, a partir de la información que envían los sectores que intervinieron en el evento y a partir de la información registrada en el nuevo sistema de GTOP.

2.2.3 Auditorías

Para realizar auditorías a los sectores de apoyo, existe un check list, útil para las auditorías internas **R-PPE-005** “Auditoría Interna del PPE”, el cual permite verificar la actualización y el cumplimiento de lo detallado en el marco del Plan. La actualización de los documentos también son controlados desde la coordinación del PPE.

3 Participación en Comités

3.1 Comité de Mantenimiento y Comité de Presiones

El **Comité de Mantenimiento** tiene la finalidad unificar metodologías de trabajo de mantenimiento de infraestructura de AySA; y el **Comité de Presiones,** el fin de gestionar las presiones del servicio de agua teniendo en cuenta el uso eficiente de energía y la menor pérdida de agua. Desde la coordinación del PPE se asistió a ambos con el fin de prestar colaboración desde la vista de calidad y continuidad integral y, a su vez, tomar herramientas e información para completar los análisis de riesgos.

3.2 Comité de Procesos Operativos

En junio del 2023 se alcanzó la Certificación Integral de AySA en cuanto a la norma ISO 9001:2015, con el fin de lograr una mejora sustancial en todo aspecto y, principalmente, alcanzar una gestión con enfoque en procesos, permitiendo aumentar la capacidad de obtener los resultados previstos.
Durante el 2024, se terminaron de confeccionar las matrices de riesgos de los procesos integrales de agua y saneamiento, contemplando los riesgos más significativos que surgen de la interacción de todas las direcciones involucradas en los mismos. Desde la coordinación del PPE se prestó colaboración para que las mismas se alineen con todos los principios establecidos en el marco del PPE, considerando la visión total del proceso tanto de agua como de saneamiento.

AySA enmarca sus actividades identificando 3 tipos de procesos y las direcciones/áreas que forman parte de estos:

- *Principales*: contempla las actividades que se realizan para llevar a cabo la prestación de los servicios de Agua y Saneamiento.
- *Soporte*: son las actividades de apoyo para la operación de los servicios.
- *Mejora:* son aquellas acciones que persiguen la mejora del Sistema de Gestión Integrado de AySA identificando buenas prácticas de gestión, analizando resultados y definiendo próximos pasos para lograr la mejora continua.



Imagen 1 Diagrama de AySA

En el 2025 se lanzó el **Comité de Procesos Operativos**, el cual consta de distintas reuniones en las que se revisan/actualizan los procesos integrales de agua y saneamiento y los riesgos asociados a los mismos.

Para el proceso completo de ***Agua*** (que contempla los procesos: Producción, Transporte y Distribución) los riesgos más representativos del proceso durante el 2025 fueron:

- ***Riesgo n°6: Parada de EEA/rebombeo por corte de energía total o parcial externo o interno.*** En cuanto a las acciones: se asume y se implementa Plan Verano

- ***Riesgo n°13: Presiones anormales en la red por rotura de cañería/problemas estructurales de las cañerías/parada de instalaciones/maniobras en la red/roturas/cambios en régimen de bombeo/corte de energía.*** Las acciones se encuentran definidas en el marco del Comité de presiones.

- ***Riesgo n°25: (PJMR) y 26 (PTA): Parada de planta por corte de energía total debido a cuestiones externas.*** Este riesgo se asume y se aplica el plan de contingencia PC-GEN-001 "Plan de Contingencia ante cortes de servicio causados por falta de suministro de Energía Eléctrica"

- ***Riesgo n°16: Turbiedad fuera de los valores regulados por sobrecarga hidraúlica (PSM), problema estructural (PMB) etc.*** Las acciones preventivas que aplican en este caso son: Obras de Mejora y Mantenimiento

- ***Riesgo n°24: Sobrecarga en la red/Rotura de cañerías por incremento de demanda (consumos/factibilidades)- que conlleva aumento de presión***. Las acciones se encuentran definidas en el marco del Comité de presiones.

Para el proceso completo de ***Saneamiento*** que contempla los procesos: Recolección, Transporte y Tratamiento, los más representativos del proceso para el 2025 fueron:

- ***Riesgo n°: 12: Hidrocarburos en red por filtraciones de red/establecimientos/ vuelcos clandestinos.*** Este riesgo se asume y se aplican procedimientos de control de calidad.

- ***Riesgo n°: 11: Desvíos en vuelcos- fuera de régimen por unidades de proceso fuera de servicio (por falta de mantenimiento-ampliación de capacidad).*** Este riesgo se asume y se implementan Proyectos de plantas en revamping. Informe anual - Plan de Acción deTransición de la Compañía

- ***Riesgo n°: 8 Ingreso de presunta sustancia contaminante o líquido cloacal anormal a causa de líquido cloacal no domiciliario.*** Se asume debido a que ante la ingreso de contaminante se acciona el instructivo o Plan de contingencia correspondiente.

A su vez dentro del marco de este comité se están elaborando dos manuales, uno para el proceso integral de agua y otro para el de saneamiento.

4 Capacitaciones

Durante el mes de octubre se realizaron capacitaciones sobre los AMFEs para la Dirección de Saneamiento. Las mismas fueron aplicadas para la actualización de las matrices de Transporte, Tratamiento y la integral de saneamiento.

Por otro lado, se realizó una capacitación para los jefes de calidad de DOR con el fin de optimizar el análisis de riesgos del proceso.

5 Reuniones con direcciones

Durante el 2025 se realizaron 4 reuniones relevantes con los siguientes sectores:

- Coordinación de SGI de Saneamiento: cuyo fin fue brindar lineamientos para optimizar las matrices, específicamente la de tratamiento de efluentes, ya que actualmente resulta demasiado extensa y no contempla los riesgos de todos los sitios.
- Dirección de Grandes Conductos: con la finalidad de mejorar la sinergia entre las áreas. Desde la coordinación del PPE se realizaron 3 propuestas sobre la confección de las matrices y sobre el método de trabajo con respecto al registro de acciones fuera del horario laboral, las cuales no fueron aceptadas. Desde la DGC se comprometieron en mejorar las matrices, con un foco más operativo, y en registrar novedades y eventos, en el sistema PPE.
- Dirección de Operaciones Regionales: con el propósito de realizar un solo diagrama de proceso DOR y unificar las tres matrices de riesgos (Gestión de

usuarios, Gestión de redes secundarias y Gestión de calidad) en una sola bajo el nombre: “Gestión de reclamos técnicos”.

- Gerencia de Energía: para poder identificar oportunidades preventivas de mejora energética en las instalaciones de AySA contribuyendo a la capacidad de respuesta ante emergencias sin comprometer la calidad y la continuidad del servicio. Estas cuestiones se volcaron dentro del formato de la ficha de proyectos.

6 Estado sobre la documentación de respaldo del PPE

Como resultado de los talleres y el soporte brindado desde el área de coordinación del PPE, se logró una actualización del **85**% del total de los documentos (tanto operativos como de grupos de apoyo)
Esta diferencia del **10%** en comparación al año anterior (**95%)** se debe principalmente a que varios documentos se encuentran en proceso de actualización/revisión.
Dicho porcentaje no considera a las nuevas plantas de saneamiento dado que todavía se encuentran en proceso de puesta a punto. Dichos establecimientos se encuentran planificando los cambios del sistema de gestión para incorporar paulatinamente la documentación asociada al PPE. Además, las matrices de saneamiento se encuentran en un proceso de revisión, por un lado para simplificar el análisis de riesgos, y por otro lado, para incorporar los nuevos sitios. Por otro lado, la DOR se encuentra reestructurando las matrices de riesgos (Gestión del usuario, Gestión de redes secundarias, Gestión de calidad) con el objetivo de unificarlas en una sola matriz, bajo el nombre “Gestión de Reclamos Técnicos”.
La DGC envió la actualización de las matrices de: Operación y Mantenimiento de Cañerías Agua y Mantenimiento Cloaca, Impulsiones y Rastreo.
Cabe destacar que la DA no envió la actualización anual de sus matrices.

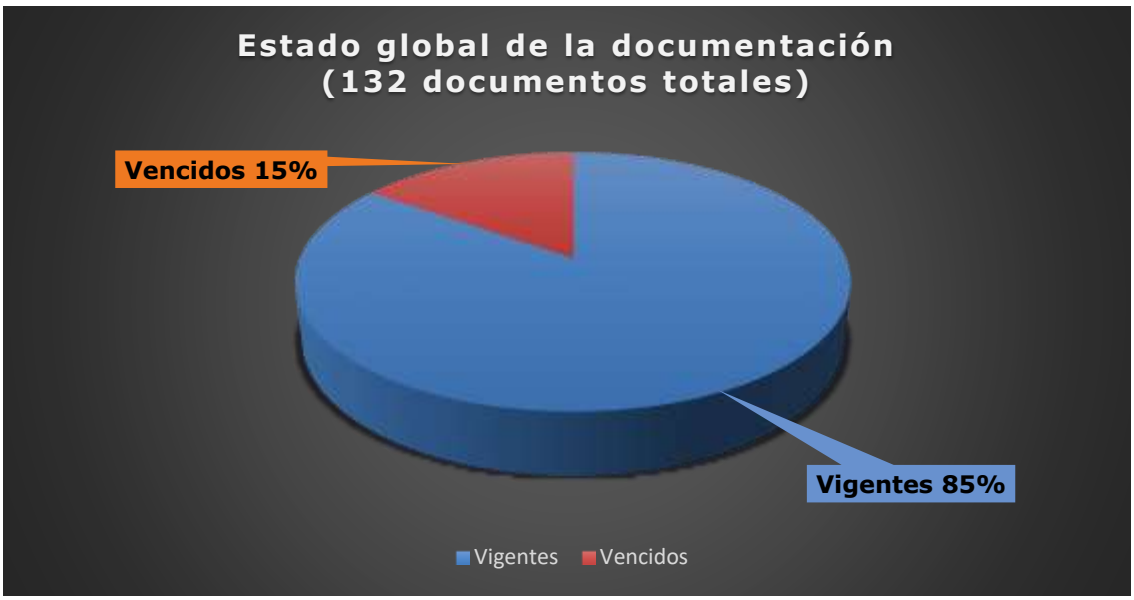


Gráfico 1. Documentos totales del PPE

7 Gestión de riesgos

El objetivo e indicador del proceso “Gestión de los Riesgos Operativos” consiste en evaluar si existieron cambios en la gestión de riesgos de la empresa para el año en cuestión.

Para cumplir con el mismo se propuso como plan de acción, la realización de:

- talleres (mencionados anteriormente)
- seguimiento sistemático a través de reuniones y mails
- seguimiento de la actualización de las matrices ante eventos y a través de resultados de auditorías
- definiciones y acciones asociadas establecidas para el abordaje de riesgos.

Para el indicador de seguimiento, primero se obtiene una medición por cada uno de los procesos (AMFE´s) y luego una medición para cada una de las direcciones y por último, para la totalidad de la empresa.

Si durante el año de análisis se incorporaron nuevos riesgos, éstos ingresaron en el cálculo si su NPR inicial fue igual o mayor al NPR umbral del proceso. También se consideraron aquellos riesgos que fueron reevaluados dado un cambio en **S, O y/o D.**

Por otro lado, se calculó la medición para el proceso integral de Agua y para el de Saneamiento. Esta medición contempla los principales riesgos para ambos procesos

7.1 Gestión de riesgos DA

Los procesos contemplados en la DA para evaluar la gestión de riesgos son:

- Potabilización de Agua Superficial
- Potabilización de Agua Subterránea
- Elevación y Monitoreo

7.2 Gestión de riesgos DS

Los procesos contemplados en la DS para evaluar la gestión de riesgos son:

- Tratamiento de efluentes
- Transporte de efluentes
- Control Centralizado y Redes

7.3 Gestión de riesgos DOR

Los procesos contemplados en la DOR para evaluar la gestión de riesgos son:

- Gestión del usuario

- Gestión de Calidad
- Gestión de Redes Secundarias

7.4 Gestión de riesgos DGC

Los procesos contemplados en la DGC para evaluar la gestión de riesgos son:

- Suministro alternativo
- Operación y mantenimiento de cañerías de agua
- Mantenimiento Cloacal, impulsiones y rastreo

7.5 Gestión de riesgos para el Proceso Integral de Agua y para Saneamiento

7.5.1 Agua

NPR inicial 2025: 414
NPR inicial 2026: 484

Se puede observar un incremento del **16%** con respecto al 2025.

7.5.2 Saneamiento

NPR inicial 2025: 309
NPR inicial 2026: 309

No hubo cambios con respecto al año anterior.

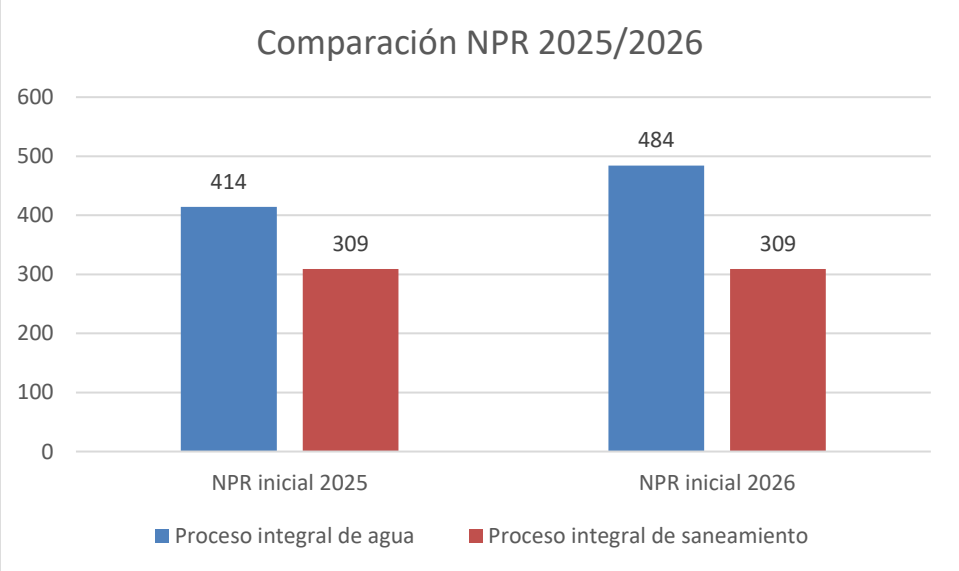


Gráfico 2: Gestión de Riesgos para Proceso Integral de Agua y Saneamiento

Nota: considerar que estos valores no considera el agregado de riesgos en el periodo

8 Informes y eventos

Durante el periodo **2025** se registraron los siguientes **eventos**:

- **Hidrocarburos en Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas (Mayo 2025)**

✓ El ingreso de hidrocarburos (HC) al sistema fue detectado el **18 de mayo de 2025** en la Planta Juan Manuel de Rosas (PJMR), tras fuertes tormentas e inundaciones en la región.
✓ Se detuvo preventivamente la producción, pero **no se interrumpió el suministro de agua potable**.
✓ Las muestras de agua cruda mostraron hasta **1,8 mg/l de HC**, mientras que en agua tratada y en la red **no se detectaron trazas**.
✓ Se aplicaron medidas de contingencia: purgas en acueductos, dosificación de carbón activado en polvo y maniobras hidráulicas para estabilizar el sistema.
✓ El monitoreo en laboratorio y en campo (incluyendo barco Tritón) no evidenció presencia de HC ni alteraciones significativas en parámetros de calidad.
✓ Ensayos de ecotoxicidad con *Daphnia magna* confirmaron **ausencia de toxicidad aguda**.
✓ El evento se cerró oficialmente el **22 de mayo de 2025**, sin afectación a la salud pública y con calidad del servicio asegurada.

Conclusiones principales:

✓ El sistema de monitoreo de hidrocarburos presentó **fallas de fiabilidad por problemas energéticos**, lo que generó dudas iniciales en las lecturas.
✓ El análisis AMFE ajustó el riesgo de “contaminación con sustancia desconocida” de **improbable (1)** a **ocasional (3)**, aumentando la prioridad de tratamiento preventivo.
✓ Se levantó una **No Conformidad (NCI-AYSA-DGT-2025-01)** y se definieron acciones correctivas:

- **Instalación de respaldo energético** en Toma Escobar.
- **Actualización del Plan de Contingencias para sabor y olor.**
- **Revisión de procedimientos operativos (E-PJR-CA-021 y D-PJR-CA-007).**
- **Actualización del AMFE de Producción de Agua Superficial.**
- Algunas acciones ya fueron **cumplidas** (revisión de procedimientos y actualización del AMFE), mientras que otras están en **ejecución** (respaldo energético y plan de contingencias).

- **Filtración de hidrocarburos en instalaciones de AySA - Altos niveles de explosividad (Octubre 2025)**

✓ El **14 de octubre de 2025** se detectaron olores químicos y niveles elevados de explosividad (hasta **97 % LEL**) en bocas de registro cloacales y pluviales cercanas a la Estación de Servicio Shell, en Av. Almirante Brown y 20 de Septiembre.

- ✓ Bomberos, Defensa Civil, Policía Ambiental, APRA y Acumar intervinieron junto con AySA. Se extrajeron aproximadamente **400 litros de líquido contaminado con hidrocarburos** y se realizaron obturaciones preventivas en conexiones cloacales.
- ✓ Se registraron valores extremos de hidrocarburos en muestras de agua y suelo: en algunos puntos **>1000 mg/l**, confirmando contaminación significativa.
- ✓ Se desalojaron domicilios linderos por riesgo de explosividad y se valló la zona para evitar exposición de terceros.
- ✓ Se ejecutaron maniobras de aislamiento hidráulico, cementado de colectoras y recambio de tramos de DN200.
- ✓ El **19 de octubre** los parámetros de explosividad comenzaron a descender, y hacia diciembre se midieron valores de **LEL = 0 %** en los puntos críticos.
- ✓ El **9 de diciembre** se completaron las tareas hidráulicas y el **10 de diciembre** GCBA finalizó relleno y compactación.
- ✓ El evento fue cerrado oficialmente el **23 de enero de 2026**, tras confirmarse ausencia de atmósferas inflamables y cumplimiento de las órdenes judiciales de reconexión cloacal.

Conclusiones principales:

- ✓ El evento representó un **riesgo severo de explosividad** en la red cloacal y pluvial, con valores muy por encima de los límites admisibles.
- ✓ La coordinación interinstitucional (Bomberos, Fiscalía UFEMA, GCBA, AySA, APRA, Acumar) fue clave para contener la emergencia y evitar daños mayores.
- ✓ Se evidenció la necesidad de **protocolos más robustos de respuesta ante filtraciones de hidrocarburos**, incluyendo:

- Monitoreo continuo de explosividad en BR y cámaras domiciliarias.
- Aislamiento hidráulico inmediato de tramos afectados.
- Gestión judicial y administrativa para garantizar reconexión segura de servicios.
- El incidente derivó en **acciones legales y ambientales** con seguimiento judicial, reflejando la gravedad del impacto potencial en la salud pública y el entorno.
- Finalmente, la emergencia fue **contenida eficazmente**, aunque el caso subrayó la vulnerabilidad de las redes cloacales frente a contaminaciones externas de hidrocarburos.

9 Auditoría interna AySA

Durante la auditoría interna de AySA 2024 se obtuvieron 2 hallazgos:

- **OM-AYSA-MAyC-2024-01**: Se recomienda revisar el objetivo de “capacitar en PPE” y reemplazarlo por objetivos en términos del resultado esperado de dicha capacitación (que se registren los eventos y que se registren bien).Por ejemplo, cantidad/% de eventos registrados, % de registros que no son eventos.

Se respondió con la **AM-AYSA-MAyC-2024-002** (ya cumplida) en la cual se detalla que se realizará un seguimiento de los eventos y recategorización de los mismos.

- **AI-AYSA-MAyC-2024-01-0:1** Se observan eventos registrados en el sistema PPE que están pendientes de vieja data. Evidencias: el 20% de los eventos (66/340) registrados desde Dic’21 a la fecha están abiertos; ejemplo, evento 215 del 02.01.22, estaría resuelto pero faltó cerrar en sistema. Visto en PPE.

Se respondió con la **AC-AYSA-MAyC-2024-003** en la cual se detalla que se realiza un seguimiento de los eventos y re categorización de los mismos.
En Octubre del 2025 se verificó la eficacia. La misma consistió en que no haya más de 2 eventos abiertos mayores a 2 meses desde la creación (1 mes de base + 15 días desde la consulta) salvo que los mismos aún estén en “curso”.

10 Sistema PPE

10.1 Guardias

Con el fin de lograr una base estable, se continuaron recibiendo propuestas/ sugerencias de los usuarios del sistema para realizar uno nuevo, con mayor practicidad que el actual.

Por otro lado, luego de la reducción de cantidades de guardias alcanzada en 2024, durante el 2025 las cantidades de “G” se mantuvieron estables.

10.2 Documentos

En cuanto a la base documental, toda la **documentación de respaldo** se encuentra en el sistema, en la solapa “**Documentación**” y toda actualización debe enviarse a la coordinación del PPE para que sea publicada.
Aún se encuentra en proceso un nuevo ambiente Sharepoint, en donde cada responsable de carga documental subirá su documentación correspondiente, y la misma será aprobada por el autorizador definido, para que luego se publique desde la Coordinación del PPE.
Cuando dicho ambiente se encuentre listo, se comenzará a realizar las capacitaciones correspondientes acerca del mismo.

11 App PPE

Desde la DTI y Gerencia de Tecnología se presentó una propuesta de App a la cual se le realizaron varias sugerencias para poder comenzar con las pruebas pilotos. Aún se está a la espera de la versión de la App con las correcciones necesarias y solicitadas.

12 Reporte de eventos y novedades

Durante el 2025, se continuo con el envió a presidencia de reportes mensuales del registro de eventos y novedades en el sistema PPE para verificar las diversas situaciones que ocurren durante las Guardias Técnicas Operativas Pasivas (GTOP) y la forma en que se asientan por parte de todos los sectores de guardia. El reporte consiste en una variedad de gráficos que detallan las causas de lo acontecido, responsabilidades (externas/internas), tipologías, etc. La información se compila en un excel con todos los datos de cada evento y novedad.

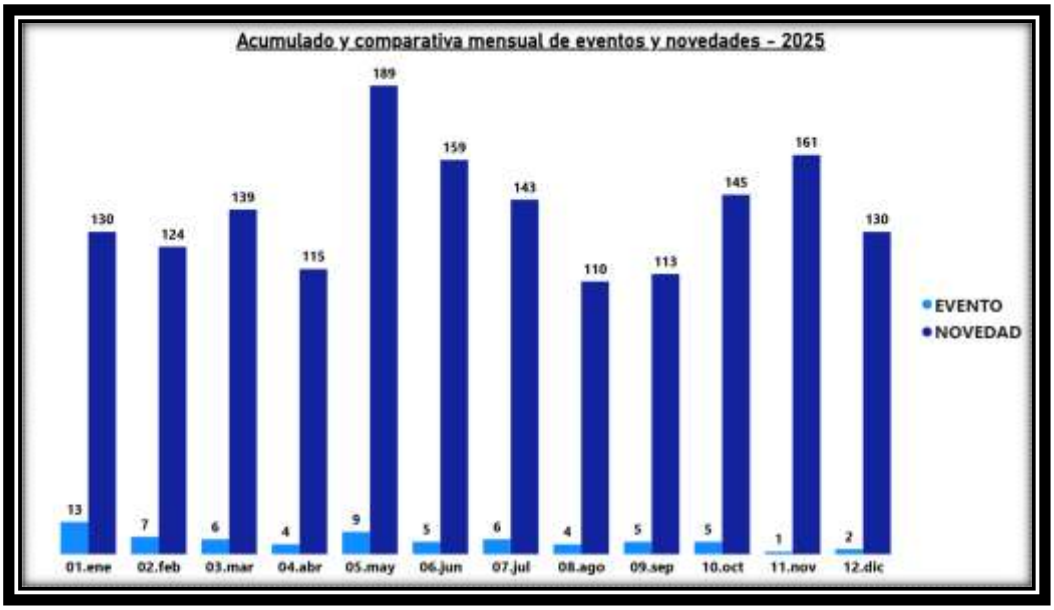


Gráfico 3: Cantidad de eventos y novedades registrados en el sistema PPE durante cada mes del 2025

13 Análisis y conclusiones

En cuanto al **proceso operativo integral de Saneamiento, no hubo cambios** en la gestión de riesgos dado que los mismos son asumidos y no se cerraron acciones de manera anual. Por otro lado, se incorporaron 5 riesgos.

En cuanto al **proceso operativo integral de Agua, hubo un incremento** del **16%** dado que se modificaron variables de los riesgos, principalmente la ocurrencias “O”. Se eliminaron 3 riesgos y se incorporaron 14. No se cerraron acciones de manera anual.

Con respecto a la **documentación de respaldo**, se destaca que la información subida se encuentra bajo un mismo criterio y es representativa. A futuro se avanzará en la carga de los documentos de las nuevas plantas depuradoras.


Se espera que para el 2026 se continúen con los talleres de difusión del PPE y avanzar con la creación de un nuevo sistema y APP, los cuales mejorarán la practicidad para todos los usuarios del mismo. Además, desde el departamento PPE se tiene la idea de coordinar y ejecutar simulacros con plantas depuradoras complementándolos con las visiones de las normas: 14k, 45k y 9k. Por otro lado, se estará iniciando simulacros bajo propia iniciativa de PPE, donde se plantearán situaciones específicas para trabajar en determinados sitios.


En cuanto al reporte de eventos y novedades, el análisis consolidado de la actividad 2025 evidencia una superioridad de novedades sobre eventos, con picos de incidencia en los meses de mayo, junio y noviembre, y una concentración semanal en las semanas 3 y 4. Las principales causas se vinculan a fallas eléctricas externas, reclamos de agua y anomalías en calidad de agua (principalmente en los valores arrojados por los ensayos del Laboratorio Central), mientras que por tipología se destacan los procesos de

continuidad en transporte y producción de agua. A su vez, la responsabilidad interna tuvo preponderancia en la mayoría de los casos, salvo con algunas categorías específicas donde la responsabilidad externa adquiere mayor peso, como en fallas eléctricas y casos de vandalismo. En complemento, la tipificación de la causa “Otros”, nos aporta mayor claridad sobre las situaciones registradas, permitiendo diferenciar entre informes/avisos/autorizaciones, aperturas de by pass, roturas de cañerías sin reclamos y otras intervenciones.





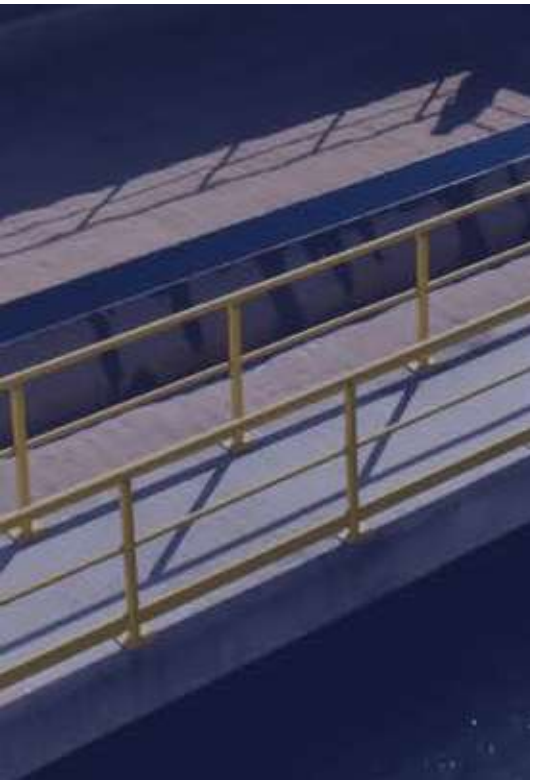

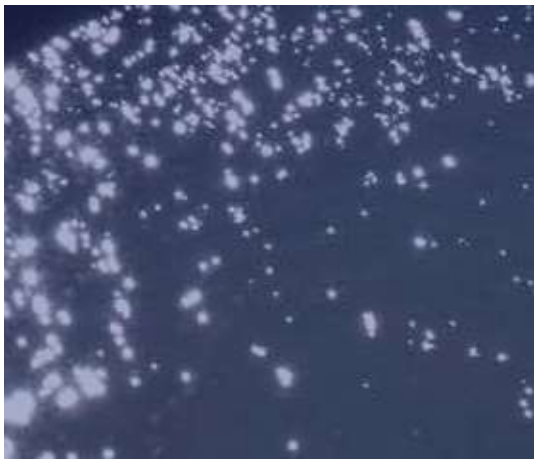INFORME ANUAL 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 2

aysa

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1

1 Obras Ejecutadas

TOMO 1.2

2 Mejora y Mantenimiento de Redes

3 Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos

4 Elementos Principales de la Red – Inventario

5 Certificación de Normas

6 Diagnósticos y Estudios

7 Estudios Ambientales

8 Gestión de Laboratorio

9 Desarrollo de la Comunidad

10 Plan de Prevención y Emergencias (PPE)

TOMO 2

11 Cobertura del Servicio de Agua Potable

12 Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable

13 Cartografía Expansión Agua Potable

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3

14 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales

15 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento

16 Instalaciones faltantes en la Red de Desagües Cloacales

17 Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

TOMO 4

18 Cartografía Agua Potable – Rehabilitación y Renovación

TOMO 5

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES (Planos Unificados)

19 - Rehabilitación Hidráulica.

20 - Rehabilitación Estructural.

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6

TOMO 6:

21 Aspectos Comerciales

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

21.2 Aspectos vinculados con la medición

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

21.4 Aspectos vinculados con la recaudación

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

21.6 Información adicional

22 Aspectos Económico-Financieros

22.1 a 22.5 Formatos vinculados a los Estados Contables de AySA (Tomo Apartado "Formatos Contables 2025").

22.6 Indicadores

22.7 Balance Económico Social

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1:

1 OBRAS EJECUTADAS

1.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.1.A	A) Obras en Plantas Potabilizadoras, Estaciones Elevadoras, Pozos de Agua, Rebombeos, y Plantas Tratamiento Agua Subterránea. Nuevas Áreas - Obras de Agua Potable.
	01.1.B	B) Ríos Subterráneos.
	01.1.C	C) Automatismo y Comunicaciones.
	01.1.D	D) Energía.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 02	01.1.01-IAT1-O-PRO-PS 01	PSS - Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 03	01.1.02-IAT1-O-PRO-PS 02	Pozos de Rebombeo de Agua Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 07	01.1.10-IAT1-O-A-PRO-PSM 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General San Martín.
PL IA N° 08	01.1.11-IAT1-O-A-PRO-PMB 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General Manuel Belgrano.
PL IA N° 09	01.1.13-IAT1-O-A-PRO-PJMR 01	Obras en el Establecimiento Juan Manuel de Rosas.
	01.1.21-IAT1-O-A-PRO-POI 01	Plantas Potabilizadoras de Osmosis Inversa (POI).
	01.1.23-IAT1-O-A-PRO-PII 02	Plantas Potabilizadoras de Intercambio Iónico (PII).
	01.1.24-IAT1-O-A-PRO-PAD 03	Plantas Potabilizadoras de Adsorción (PAD).
PL IA N° 11	01.1.30-IAT1-O-A-TRA-EE	Obras en Estaciones Elevadoras Paitoví, Centro, Caballito, Floresta, Devoto, Saavedra, Villa Adelina, Tres de Febrero, Morón, Matanza, Lanús y Quilmes.

1.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.2	Obras en Plantas Depuradoras, Estaciones de Bombeo, etc. Nuevas Areas - Obras de Saneamiento.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 19	01.2.20-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste.
	01.2.20A-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste II.
PL IA N° 20	01.2.21-IAT1-O-S-PRO-PDN 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Norte.
PL IA N° 21	01.2.22-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 01	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel.
	01.2.22A-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 02	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel II.
PL IA N° 21bis	01.2.23-IAT1-O-S-PRO-PDH 01	Obras en el Planta de Depuración Hurlingham.
PL IA N° 22	01.2.24-IAT1-O-S-PRO-PDBU 01	Obras en el Planta de Depuración Barrio Uno.
PL IA N° 22bis	01.2.25-IAT1-O-S-PRO-PDSC 01	Obras en el Planta de Depuración Santa Catalina.
	01.2.25.01-NA-IAT1-O-S-PRO-PDC 01	Obras en el Planta de Depuración Las Catonas.
	01.2.25.02-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFe 01	Obras en el Planta de Depuración Ferrari.
	01.2.25.03-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFV 01	Obras en el Planta de Depuración Florencio Varela.
	01.2.25.04-NA-IAT1-O-S-PRO-PDG 01	Obras en el Planta de Depuración Garín.
	01.2.25.05-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMN 01	Obras en el Planta de Depuración Merlo Norte.
	01.2.25.06-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMS 01	Obras en el Planta de Depuración Maquinista Savio.
	01.2.25.07-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPP 01	Obras en el Planta de Depuración Guernica (Pte. Perón).
	01.2.25.08-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPR 01	Obras en el Planta de Depuración Paso del Rey.
	01.2.25.09-NA-IAT1-O-S-PRO-PDBV 01	Obras en el Planta de Depuración Bella Vista.
	01.2.25.10-NA-IAT1-O-S-PRO-PDCH 01	Obras en el Planta de Depuración Champagnat
	01.2.25.11-NA-IAT1-O-S-PRO-PDESC 01	Obras en el Planta de Depuración Escobar
PL IA N° 14	01.2.26-IAT1-O-S-TRA-EB 01	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Wilde.
PL IA N° 15	01.2.27-IAT1-O-S-TRA-EB 02	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Boca-Barracas.
	01.2.28-IAT1-O-S-TRA-EB 03	Obras en Estaciones de Bombeo Centro, Norte y Sur.
	01.2.29-IAT1-O-S-TRA-EB 00	Obras en Planta Berazategui.
PL IA N° 13	01.2.30-IAT1-O-S-TRA-PLC 01	Obras en Grandes Conducciones Pluviocloacales.

1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 23	01.3.31-IAT1-O-X CONTRATO	Obras ejecutadas por vía contractual.
	01.3.33-IAT1-O-A (A+T)	Listado de Obras por convenio (A+T).
	01.3.34-IAT1-O-S (C+T)	Listado de Obras por convenio (C+T).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.2:

2 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 25	35-IAT1-O-A-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes de agua.
PL IA N° 26	36-IAT1-O-A-MyM 02	Redes de agua. Elementos de maniobra intervenidos.
PL IA N° 27	37-IAT1-O-A-MyM 03	Medidores colocados y/o intervenidos.
PL IA N° 28	38-IAT1-O-A-MyM 04	Conexiones domiciliarias de agua potable.
PL IA N° 29	39-IAT1-O-S-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes cloacales.
PL IA N° 30	40-IAT1-O-S-MyM 02	Conexiones domiciliarias de cloacas.

3 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos.
	03.2-IAT1-O-X-MyM-T 01	Mantenimiento de Grandes Equipos y Electrobombas.

4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED - INVENTARIO

4.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 31 A	42-IAT1-I-A-RED 01	Redes de Agua - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 31 B	43-IAT1-I-A-RED 02	Redes de Agua - Porcentaje por Material de cañería instalada.
	44-IAT1-I-A-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Agua.

4.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 32 A	45-IAT1-I-S-RED 01	Redes de Cloacas - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 32 B	46-IAT1-I-S-RED 02	Redes de Cloacas - Porcentajes por Material de cañería instalada.
	47-IAT1-I-S-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Desagües Cloacales.

5. CERTIFICACIÓN DE NORMAS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Laboratorios Central y de Plantas. Certificación ISO, IRAM, etc.

6 DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Diagnósticos y Estudios.

7 ESTUDIOS AMBIENTALES

Código Anterior	Código Actual	Título
		7.1 Estudios Ambientales.
		7.2 Control del Recurso.

8 GESTION DE LABORATORIO

Código Anterior	Código Actual	Título
		Gestión de Laboratorio.

9 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Código Anterior	Código Actual	Título
		Texto descriptivo de las tareas de AySA para el Desarrollo de la Comunidad.
		9.1 Anexos
		9.2 Planos

10 PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE)

Código Anterior	Código Actual	Título
		PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 2:

11. Cobertura del servicio de Agua Potable

11.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

11.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 33	48-IAT2-C-A-TRA 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Area Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A	49-IAT2-C-A-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A (Nuevas Áreas)	49-IAT2-C-A-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 34B	50-IAT2-C-A-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio de Agua Potable.
ex PL IA N° 35	51-IAT2-C-A-TRA 04	Expansión de redes de distribución de agua potable. Obras habilitadas en el año (por Partido).

12. Instalaciones Faltantes en la Red de Agua Potable

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 36	52-IAT2-C-A-RED 01	Red de Agua. Cierre de mallas faltantes (por Región y Partido).

13. Cartografía Expansión Agua

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IEADRC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IEASFE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Fernando.
	IEASIS-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Isidro.
	IEASMA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Martín.
	IEATIG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tigre.
	IEAVIC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Vicente López.
	IEAESC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Escobar.
	IEAJCP-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - José C. Paz.
	IEAMAR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Malvinas Argentinas.
	IEASMG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Miguel.
	IEAPIL-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IEAMAT-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - La Matanza.
	IEAHUR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Hurlingham.
	IEAITU-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ituzaingó.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Morón.
	IEATRE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tres de Febrero.
	IEAMER-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Merlo.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IEAALM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Almirante Brown.
	IEAEST-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Esteban Echeverría.
	IEAEZE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ezeiza.
	IEALOM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lomas de Zamora.
	IEAPPE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IEAAVE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Avellaneda.
	IEALAN-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lanús.
	IEAQLM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Quilmes.
	IEAFVA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3:

14. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales

14.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

14.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 38A	54-IAT3-C-S-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas.
	54-IAT3-C-S-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 38B	55-IAT3-C-S-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población beneficiada con obras o con servicio en trámite de habilitación.
ex PL IA N° 39	56-IAT3-C-S-TRA 04	Expansión de redes colectoras de desagües cloacales. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

15. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales según Sistema de Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 40	57-IAT3-C-S-PRO 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Area servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 41	58-IAT3-C-S-PRO 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario.
	61-IAT3-C-S-PRO 04	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 42	59-IAT3-C-S-PRO 03	Expansión de redes colectoras de Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

16. Instalaciones Faltantes en la Red de Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 43	60-IAT3-C-S-RED 01	Red de Cloacas. Colectoras faltantes (por Región y Partido).

17. Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IETDRC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IETSFE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Fernando.
	IETSIS-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Isidro.
	IETSMA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Martín.
	IETTIG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tigre.
	IETVIC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Vicente López.
	IETESC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Escobar.
	IETJCP-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - José C. Paz.
	IETMAR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Malvinas Argentinas.
	IEATMG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Miguel.
	IEATPIL-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IETMAT-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - La Matanza.
	IETCHUR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Hurlingham.
	IETITU-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ituzaingo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Morón.
	IETTRE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tres de Febrero.
	IETMER-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Merlo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IETALM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Almirante Brown.
	IETEST-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Esteban Echeverría.
	IETEZE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ezeiza.
	IETLOM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lomas de Zamora.
	IETPPE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IETAVE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Avellaneda.
	IETLAN-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lanús.
	IETQLM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Quilmes.
	IETFVA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 4:

18. CARTOGRAFÍA AGUA POTABLE (Planos de Rehabilitación y Renovación de Redes)

18.1 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRADRCF-2025	* Región Capital Federal.

18.2 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRASFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRASIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRASMA-2025	* Partido San Martín.
	IRATIG-2025	* Partido Tigre.
	IRAVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRAESC-2025	* Partido Escobar.
	IRAJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRAMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRASMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRAPIL-2025	* Partido Pilar.

18.3 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRAITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRAMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRAMOR-2025	* Partido Morón.
	IRATRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRAMER-2025	* Partido Merlo.
	IRAMOR-2025	* Partido Moreno.

18.4 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRAEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRAEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRALOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRAPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

18.5 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRALAN-2025	* Partido Lanús.
	IRAQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRAFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 5:

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES UNIFICADA (Rehabilitación Hidráulica y Estructural):

19. Rehabilitación Hidráulica.
20. Rehabilitación Estructural.

19/20.1 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCDRCF-2025	* Región Capital Federal.

19/20.2 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCSFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRCSIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRCSMA-2025	* Partido San Martín.
	IRCTIG-2025	* Partido Tigre.
	IRCVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRCESC-2025	* Partido Escobar.
	IRCJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRCMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRCSMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRCPIL-2025	* Partido Pilar.

19/20.3 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRCITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRCMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRCMOR-2025	* Partido Morón.
	IRCTRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRCMER-2025	* Partido Merlo.
	IRCMOR-2025	* Partido Moreno.

19/20.4 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRCEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRCEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRCLOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRCPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

19/20.5 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRCLAN-2025	* Partido Lanús.
	IRCQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRCFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6:

21 ASPECTOS COMERCIALES

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

Código Anterior	Código Actual	Título
300		Ingresos Año 2025.
301		Anexo de Ventas Año 2025 (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
302		Evolución de los Ingresos.
303		Emisión General y art. 34 Año 2025 - Grupos bimetrales - Ciclos completos de facturación.
304		Facturación a Consorcios del último ciclo completo de facturación. Todas las frecuencias.
305		Facturación Emisión Genereal. Ultimo ciclo completo de facturación bimestral.
307		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Capital Federal.
308		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Gran Buenos Aires.
309		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Capital Federal.
310		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Gran Buenos Aires.
311		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Capital Federal.
312		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Gran Buenos Aires.
313		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 08 - Capital Federal.
314		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - Residencial.
315		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - Residencial.
316		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - Residencial.
317		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - No Residencial.
318		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - No Residencial.
319		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - No Residencial.
320		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral - Factura Media.

21.2 Aspectos vinculados con la medición

Código Anterior	Código Actual	Título
330		Medidores cambiados e instalados en el Año 2025.
331		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 01 (Agua). Consumo del último año - Bimestralizado.
332		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 05 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
333		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
334		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 01 (Agua). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
335		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 05 (Agua y cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
336		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de Servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
337		Pérdida de Cuota Fija por mes, en cantidades de instalaciones y en Tarifa Básica Bimestral (TBB).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
306		Detalle de Unidades Funcionales.
350		Evolución del número de usuarios. Unidades funcionales.

21.4 Aspectos vinculados a la recaudación

Código Anterior	Código Actual	Título
360		Total Recaudado.
361		Ritmo de recaudación .
362		Evolución de la Recaudación y Evolución de la Recaudación por Categoría de Usuarios.

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
321		Cuentas a cobrar vencidas y a vencer al 31/12/2025 por Región, tipo de cliente, régimen y categoría de cliente.
322		Conciliación de créditos por servicios (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
370		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (por antigüedad).
371		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (con vencimientos operados por Año Contractual).
372		Impago vencido por rango de deuda al 31/12/25. Emisión por todo concepto, desagregado por Región y Grandes Usuarios.
373		Cuentas a cobrar a vencer y vencidas al 31/12/25, por Distrito y antigüedad de la deuda. Gráfico.
374		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25 por distrito, por situación comprobante y antigüedad de la deuda.
376		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25, correspondientes a ciertos Clientes fiscales. Detalle de las cuentas a cobrar originales más recargos extracontables teóricos estimados.
379		Deuda Vencida al 31/12/2025 más recargos extracontables teóricos estimados.

21.6 Información Adicional

Código Anterior	Código Actual	Título
323		Consumos de la previsión para deudores de dudoso cobro y ajustes de facturación del año 2025.
324		Cargo por corte de servicio - Intervenciones realizadas e imporetes de facturación devengados durante el año 2025.
375		Convenios de pagos.
377		Cargo por titularidad no informada año 2025.
380		Estimación de otras quitas y condonaciones de deuda extracontables otorgadas durante el Año 2025.
381		Recargos e intereses por demora de pago devengados durante el año 2025.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

22 ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS - TARIFA SOCIAL

22.1 a 22.5

Presentado en Tomo separado denominado "FORMATOS CONTABLES 2025".

22.6 Indicadores

Código Anterior	Código Actual	Título
850-851		Indicadores.
852		Benchmarking.

22.7 Balance económico social

Código Anterior	Código Actual	Título
900		Programa de tarifa social - Total.
901		Programa de tarifa social - Usuarios Residenciales.
902		Programa de tarifa social - Casos Sociales.
903		Programa de tarifa social - Instituciones sin fines de lucro.
904		Programa de tarifa social - Detalle de Usuarios Residenciales.
905		Programa de tarifa social - Detalle de Casos Sociales.
906		Programa de tarifa social - Detalle de Instituciones sin fines de lucro.
910		Plan Agua más Trabajo.
920		Programa de Barrios Carenciados - Modelo Participativo de Gestión (MPG).
930		Resumen de Expansión de Agua por Plan.
940		Resumen de Expansión de Desagües Cloacales por Plan.
950		Balance Económico Social.
970		Total de Usuarios con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
971		Total de Usuarios RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
972		Total de Usuarios NO RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
973		Total de Usuarios BALDÍOS con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.

11. COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

11. COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

11.1. Revisión detallada de las superficies y poblaciones:

11.1.1. Consideraciones Generales

El SISTEMA DE REDES EN DESPLIEGUE GIS es la herramienta donde se gestiona y describen las redes de agua y saneamiento de AySA, como así también las áreas hidráulicas y/u operativas relacionadas (mallas, subcuencas, áreas de expansión, radios servidos, entre otras). También se registran los trabajos realizados sobre la red (renovaciones, rehabilitaciones, rastreos, instalaciones, intervenciones en general, etc.).

Con este sistema se puede acceder y utilizar la información catastral de base que se actualiza en la compañía. Dentro de esta información catastral se encuentran los límites de las parcelas y el código de servicio de las mismas, además de la información censal.

A partir de la información actualizada (redes, áreas operativas y catastrales) se elaboran las planillas y los planos del informe anual, cuyos soportes pertenecen a los formatos del mismo.

Esta tarea es desarrollada por AySA en forma continua, requiriendo constantes actualizaciones y eventuales ajustes sobre las localizaciones geográficas de los elementos representados, produciéndose modificaciones de las áreas de cobertura influidas por estos elementos, emitiéndose un reporte de "MOI" (modificación de objetos informados) cuando se trate de áreas informadas en años anteriores.

11.1.2. Metodología de cálculo de población

Todos los sistemas geográficos de la empresa, incluido SISTEMA DE REDES EN DESPLIEGUE GIS, calculan la población de las áreas a partir de su intersección con los radios censales.

De esta forma el sistema realiza la relación entre el porcentaje de intersección de las áreas con servicio respecto a la población (informada en el Censo 2022-INDEC) de dicho radio.

11.1.3. Metodología de cálculo de población relacionada a cañerías faltantes dentro del radio servido

Hasta el Informe Anual 2009, la población sin servicio se calculaba a partir de cada cañería faltante como el producto de la cantidad de cuadras abarcadas por la cañería multiplicada por un factor único definido por partido. De esta manera todas las cañerías faltantes descontaban población, aunque se tratara de una zona totalmente servida.

La metodología implementada a partir del Informe Anual 2010 utiliza las parcelas y sus códigos de servicio (indicando servicio de agua y/o cloaca) para identificar las áreas asociadas a las cañerías faltantes que deben descontar población, ya que no tiene el servicio correspondiente. Este método genera una mejor estimación y permite que al momento de ejecución de la cañería faltante se incorpore la población que ha sido inicialmente descontada, obteniendo un balance de población más representativo.

11.1.4. Metodología de estimación de la población con cobertura del servicio

A partir de la información actualizada de cañerías faltantes se identifican los tramos cuyas parcelas frentistas ubicadas en un rango de 15 metros tienen código de servicio de Cloaca o sin servicio en las faltantes de agua, y códigos servicio de Agua o sin servicio en las faltantes de cloaca. Se identifican como cañerías faltantes que descuentan población y se genera un área que incluye todas las parcelas que cumplen con estas definiciones.

El área final resultante para cada cañería faltante que descuenta población es utilizada para calcular la población servida y la superficie con la metodología vista en el punto 11.1.2.

11.1.5. Coeficientes de Proyección Intercensal (CI):

Los coeficientes son explicitados en las planillas correspondientes. La aplicación del coeficiente de proyección intercensal "CI" calculado en base al valor subyacente de población de los partidos informados en base al Censo 2022, adaptando las proyecciones a las jurisdicciones y radios con servicio de AYSA.
El acceso web a las proyecciones publicadas por el INDEC es el siguiente:
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119

Realizados los cálculos de cobertura, expansión y MOI, en su expresión de población determinada en base al Censo 2022, los mismos son proyectados al año del informe con la aplicación del "CI" para cada partido y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el presente Informe Anual 2025 se utilizan los resultados del Censo 2022, y conforme a lo indicado por el ERAS en su Nota NO-2026-00001876-ERAS-ERAS, se presentan por única vez una serie de empalme de resultados entre los Censos 2010 y 2022, en el formato "49.1 - IAT2-C-A-TRA 02-2025-EMPALME AGUA" para observar los resultados sobre el servicio de Agua Potable, y en el formato 54.1-IAT3-C-S-TRA 02-2025-EMPALME CLOACAS para el caso del servicio de Desagües Cloacales.

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSION DEL SERVICIO

AREA SERVIDA CON AGUA POTABLE

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

48-IAT2-C-A-TRA 01 | **ex PL IA Nº 33**

Partido	DATOS DE AREAS (Km2)													
	Superficie Total del Partido	Situación Inicial		Año Anterior			Año Actual							
							Areas incorporadas en el período							
		Área Servida al 21/03/2006	Porcentaje de Cobertura al 21/03/2006	Área Servida 2024	MOI 2025	Area resultante al 31/12/2024	AySA	Cierre de Mallas	OPCT, MPG, A+T	Total	Area Servida Incorporada desde 22/03/2006	Total Area Servida al 31/12/2025	Porcentaje de Cobertura al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3] = [2/1]	[4]	[5]	[6]=[4+5]	[7]	[8]	[9]	[10]=[7+8+9]	[11]=[(6-2)+10]	[12]=[2+11]	[13]=[12/1]
Capital Federal	206,51	205,31	99,42%	206,51		206,51					1,20	206,51	100,00%
SAN FERNANDO	23,71	20,71	87,35%	21,45		21,45					0,74	21,45	90,47%
TIGRE	152,72	39,79	26,05%	80,83	11,569	92,40					52,61	92,40	60,50%
San Fernando-Tigre	176,43	60,50	34,29%	102,28	11,569	113,85					53,35	113,85	64,53%
San Isidro	52,46	49,72	94,78%	50,52		50,52					0,80	50,52	96,30%
San Martín	56,55	43,90	77,63%	46,83		46,83					2,93	46,83	82,81%
Vicente López	34,70	32,48	93,60%	34,02		34,02					1,54	34,02	98,04%
Región Norte	320,14	186,60	58,29%	233,65	11,569	245,22					58,62	245,22	76,60%
La Matanza	332,66	84,09	25,28%	159,74	-0,022	159,72	0,058			0,058	75,69	159,78	48,03%
HURLINGHAM	35,48	5,06	14,26%	7,73		7,73					2,67	7,73	21,79%
ITUZAINGO	38,55	2,62	6,80%	8,87		8,87	0,023			0,023	6,27	8,89	23,07%
MORON	55,20	42,53	77,05%	49,08		49,08					6,55	49,08	88,91%
Morón	129,23	50,21	38,85%	65,68		65,68	0,023			0,023	15,49	65,70	50,84%
Tres de Febrero	46,47	30,29	65,18%	35,86		35,86					5,57	35,86	77,17%
Región Oeste	508,36	164,59	32,38%	261,28	-0,022	261,26	0,081			0,081	96,75	261,34	51,41%
Avellaneda	56,08	35,21	62,79%	38,53		38,53					3,32	38,53	68,71%
Lanús	49,96	47,34	94,76%	49,21		49,21					1,87	49,21	98,50%
Quilmes	92,65	62,02	66,94%	67,18		67,18					5,16	67,18	72,51%
Región Sudeste	198,69	144,57	72,76%	154,92		154,92					10,35	154,92	77,97%
ALMTE. BROWN	129,01	29,25	22,67%	38,86		38,86			1,233	1,233	10,84	40,09	31,08%
ESTEBAN ECHEVERRIA	121,79	18,58	15,26%	38,58		38,58					20,00	38,58	31,68%
EZEIZA	238,34	3,36	1,41%	20,96		20,96					17,60	20,96	8,79%
Alte. Brown-E. Echeverría	489,14	51,19	10,47%	98,40		98,40			1,233	1,233	48,44	99,63	20,37%
Lomas de Zamora	88,54	60,22	68,01%	70,74	0,016	70,76		0,005		0,005	10,54	70,76	79,92%
Región Sudoeste	577,68	111,41	19,29%	169,14	0,016	169,16		0,005	1,233	1,238	58,98	170,39	29,50%
Total Concesión	1.811,38	812,48	44,85%	1.025,50	11,563	1.037,06	0,081	0,005	1,233	1,319	225,90	1.038,38	57,33%

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSION DEL SERVICIO

AREA SERVIDA CON AGUA POTABLE (NUEVAS ÁREAS)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

48-IAT2-C-A-TRA 01 (Nuevas Areas) | **ex PL IA Nº 33**

Partido	DATOS DE AREAS (Km2)												
	Superficie Total del Partido	Situación Inicial		Año Anterior			Año Actual						
							Areas incorporadas en el período				Area Servida Incorporada desde el origen	Total Area Servida al 31/12/2025	Porcentaje de Cobertura al 31/12/2025
		Área Servida original	Porcentaje de Cobertura original	Área Servida 2024	MOI 2025	Area resultante al 31/12/2024	AySA	Cierre de Mallas	OPCT, MPG, A+T	Total			
	[1]	[2]	[3] = [2/1]	[4]	[5]	[6]=[4+5]	[7]	[8]	[9]	[10]=[7+8+9]	[11]=[(6-2)+10]	[12]=[2+11]	[13]=[12/1]
SAN MIGUEL	82,25	18,72	22,76%	16,54		16,54					**-2,18**	**16,54**	**20,11%**
JOSE C PAZ	50,09	2,59	5,17%	2,57		2,57					**-0,02**	**2,57**	**5,13%**
MALVINAS ARGENTINAS	62,90	5,10	8,11%	5,12		5,12					**0,02**	**5,12**	**8,14%**
San Miguel-Paz-Malvinas A	195,23	26,41	13,53%	24,23		24,23					**-2,18**	**24,23**	**12,41%**
Escobar	300,30	6,48	2,16%	12,92		12,92	0,463		0,444	0,907	**7,35**	**13,83**	**4,60%**
Pilar	386,37	36,33	9,40%	39,41		39,41	1,380		0,200	1,580	**4,660**	**40,99**	**10,61%**
Región Norte	881,89	69,22	7,85%	76,56		76,56	1,843		0,645	2,487	**9,83**	**79,05**	**8,96%**
Merlo	173,55	36,31	20,92%	29,46		29,46					**-6,85**	**29,46**	**16,98%**
Moreno	185,79	31,92	17,18%	29,79		29,79					**-2,13**	**29,79**	**16,03%**
Región Oeste	359,34	68,23	18,99%	59,25		59,25					**-8,98**	**59,25**	**16,49%**
Florencio Varela	190,06	40,30	21,20%	45,84		45,84	0,291		0,071	0,362	**5,90**	**46,20**	**24,31%**
Región Sudeste	190,06	40,30	21,20%	45,84		45,84	0,291		0,071	0,362	**5,90**	**46,20**	**24,31%**
Presidente Perón	120,84	6,88	5,69%	8,42		8,42					**1,540**	**8,42**	**6,97%**
Región Sudoeste	120,84	6,88	5,69%	8,42		8,42					**1,540**	**8,42**	**6,97%**
Total Concesión	1.552,13	184,63	11,90%	190,07		190,07	2,133		0,716	2,849	**8,289**	**192,92**	**12,43%**

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

POBLACIÓN SERVIDA CON AGUA POTABLE

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

49-IAT2-C-A-TRA 02 | **ex PL IA Nº34A**

Partido	DATOS DE POBLACIÓN											
	Valores de Población según Censo 2022								Expansión del Servicio - Población proyectada al 2025 (*)			
	Población del Partido	Población en el área de Servicio de 2006	Porcentaje de Cobertura al 21/03/2006	Población con Servicio 2024	MOI 2025	Población del Área de Expansión 2006-2024	Población Area Expansión Año 2025	Población con Servicio 2025	Coeficiente de proyección Intercensal	Población del Partido	Población con Servicio	Porcentaje de Cobertura al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3] = [2/1]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8] = [4+5+7]	CI	[9]	[10] = [8*CI]	[11] = [10/9]
Capital Federal	**3.101.599**	**3.101.599**	**100,00%**	**3.101.599**		**0**		**3.101.599**	**1,000**	**3.101.599**	**3.101.599**	**100%**
SAN FERNANDO	168.882	165.681	98,10%	168.138		2.457		168.138	1,001	168.972	168.228	99,56%
TIGRE	439.067	258.987	58,99%	341.700	16.755	82.713		358.455	1,003	440.431	359.568	81,64%
San Fernando-Tigre	**607.949**	**424.668**	69,85%	**509.838**	**16.755**	**85.170**		**526.593**	N/A	609.403	527.796	86,61%
San Isidro	**295.978**	**293.922**	99,31%	**294.117**		**195**		**294.117**	1,000	296.010	294.149	99,37%
San Martín	**444.503**	**398.735**	89,70%	**435.052**		**36.317**		**435.052**	1,001	445.013	435.551	97,87%
Vicente López	**280.541**	**277.456**	98,90%	**278.171**		**715**		**278.171**	1,001	280.684	278.313	99,16%
Región Norte	**1.628.971**	**1.394.781**	**85,62%**	**1.517.178**	**16.755**	**122.397**		**1.533.933**	**N/A**	**1.631.110**	**1.535.809**	**94,16%**
La Matanza	**1.838.401**	**819.109**	44,56%	**1.550.229**	**-392**	**731.120**	**1.038**	**1.550.875**	1,002	1.841.381	1.553.389	84,36%
HURLINGHAM	186.221	41.100	22,07%	68.340		27.240		68.340	1,000	186.287	68.364	36,70%
ITUZAINGO	178.598	14.948	8,37%	70.340		55.392	130	70.470	1,001	178.741	70.526	39,46%
MORON	326.810	250.856	76,76%	310.623		59.767		310.623	1,000	326.866	310.676	95,05%
Morón	**691.629**	**306.904**	44,37%	**449.303**		**142.399**	**130**	**449.433**	N/A	691.893	449.566	64,98%
Tres de Febrero	**362.319**	**277.374**	76,56%	**327.919**		**50.545**		**327.919**	1,001	362.683	328.248	90,51%
Región Oeste	**2.892.349**	**1.403.387**	**48,52%**	**2.327.451**	**-392**	**924.064**	**1.168**	**2.328.227**	**N/A**	**2.895.956**	**2.331.203**	**80,50%**
Avellaneda	**366.117**	**335.908**	91,75%	**346.953**		**11.045**		**346.953**	1,001	366.488	347.305	94,77%
Lanús	**460.081**	**449.681**	97,74%	**455.888**		**6.207**		**455.888**	1,000	460.081	455.888	99,09%
Quilmes	**631.774**	**527.231**	83,45%	**557.172**		**29.941**		**557.172**	1,001	632.591	557.893	88,19%
Región Sudeste	**1.457.972**	**1.312.820**	**90,04%**	**1.360.013**		**47.193**		**1.360.013**	**N/A**	**1.459.161**	**1.361.086**	**93,28%**
ALMTE. BROWN	583.209	194.801	33,40%	262.768		67.967	5.199	267.967	1,001	583.578	268.136	45,95%
ESTEBAN ECHEVERRIA	337.880	62.916	18,62%	194.561		131.645		194.561	1,002	338.563	194.954	57,58%
EZEIZA	198.620	15.594	7,85%	108.865		93.271		108.865	1,004	199.366	109.274	54,81%
Alte. Brown-E. Echeverría	**1.119.709**	**273.311**	24,41%	**566.194**		**292.883**	**5.199**	**571.393**	N/A	1.121.507	572.364	51,04%
Lomas de Zamora	**685.644**	**508.921**	74,23%	**633.335**	**89**	**124.414**	**38**	**633.462**	1,002	686.951	634.669	92,39%
Región Sudoeste	**1.805.353**	**782.232**	**43,33%**	**1.199.529**	**89**	**417.297**	**5.237**	**1.204.855**	**N/A**	**1.808.457**	**1.207.034**	**66,74%**
Total Concesión	**10.886.244**	**7.994.819**	**73,44%**	**9.505.770**	**16.452**	**1.510.951**	**6.405**	**9.528.627**	**N/A**	**10.896.283**	**9.536.730**	**87,52%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

POBLACIÓN SERVIDA CON AGUA POTABLE

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

49-IAT2-C-A-TRA 02 (Nuevas Áreas) | **ex PL IA Nº34A**

Partido	DATOS DE POBLACIÓN (NUEVAS ÁREAS)											
	Valores de Población según Censo 2022								Expansión del Servicio - Población proyectada al 2025 (*)			
	Población del Partido	Población en el área de Servicio de 2006	Porcentaje de Cobertura al 21/03/2006	Población con Servicio 2024	MOI 2025	Población del Área de Expansión 2006-2024	Población Area Expansión Año 2025	Población con Servicio 2025	Coeficiente de proyección Intercensal	Población del Partido	Población con Servicio	Porcentaje de Cobertura al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3] = [2/1]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8] = [4+5+7]	CI	[9]	[10] = [8*CI]	[11] = [10/9]
SAN MIGUEL	327.650	127.204	38,82%	134.082		6.878		134.082	1,003	328.639	134.487	40,92%
JOSE C PAZ	326.527	22.795	6,98%	23.484		689		23.484	1,004	327.722	23.570	7,19%
MALVINAS ARGENTINAS	349.401	37.485	10,73%	38.842		1.357		38.842	1,001	349.824	38.889	11,12%
San Miguel-Paz-Malvinas Arg.	1.003.578	187.484	18,68%	196.408		8.924		196.408	1,001	1.006.186	196.946	19,57%
Escobar	256.071	32.123	12,54%	55.977		23.854	2.640	58.617	1,003	256.910	58.809	22,89%
Pilar	393.614	106.345	27,02%	112.072		5.727	1.454	113.526	1,005	395.551	114.085	28,84%
Región Norte	**1.653.263**	**325.952**	**19,72%**	**364.457**		**38.505**	**4.094**	**368.551**	**N/A**	**1.658.647**	**369.840**	**22,30%**
Merlo	581.484	226.035	38,87%	226.455		420		226.455	1,001	582.184	226.728	38,94%
Moreno	575.758	186.448	32,38%	187.345		897		187.345	1,001	576.571	187.609	32,54%
Región Oeste	**1.157.242**	**412.483**	**35,64%**	**413.800**		**1.317**		**413.800**	**N/A**	**1.158.755**	**414.337**	**35,76%**
Florencio Varela	488.103	304.403	62,36%	345.395		40.992	2.074	347.469	1,003	489.456	348.432	71,19%
Región Sudeste	**488.103**	**304.403**	**62,36%**	**345.395**		**40.992**	**2.074**	**347.469**	**N/A**	**489.456**	**348.432**	**71,19%**
Presidente Perón	101.994	43.830	42,97%	56.435		12.605		56.435	1,004	102.439	56.681	55,33%
Región Sudoeste	**101.994**	**43.830**	**42,97%**	**56.435**		**12.605**		**56.435**	**N/A**	**102.439**	**56.681**	**55,33%**
Total Concesión	**3.400.602**	**1.086.668**	**31,96%**	**1.180.087**		**93.419**	**6.168**	**1.186.255**	**N/A**	**3.409.297**	**1.189.290**	**34,88%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

EMPALME DE SERIES: RADIOS SERVIDOS CON AGUA POTABLE

Informe Anual

Año 2025

49.1-IAT2-C-S-TRA 02-2025-EMPALME

Partido	Población de las áreas Total, Servida y de Expansión SEGÚN CENSO 2010 (INDEC "*Informe 38* ").							Población de las áreas Total, Servida y de Expansión SEGÚN CENSO 2022 (INDEC "*estimaciones_departamentos_2022_2035* " - adaptación AYSA)						
	Población Total del Partido (INDEC informe 38). Año 2010.	Población Censo 2010 dentro del Radio de Servicio Año 2006.	Población Censo 2010 dentro del Area de Expansión 2006-2024.	Coeficiente de Crecimiento Intercensal (2010-2024) *	Población dentro del Area de Servicio 2024. Censo 2010 actualizado al año 2024.	Población Total del Partido. Censo 2010 actualizado al año 2024.	% Cobertura Actualizada	Población Total del Partido (Censo 2022). Año 2022.	Población Censo 2022 dentro del Radio de Servicio Año 2006.	Población Censo 2022 dentro del Area de Expansión 2006-2024.	Coeficiente de Crecimiento Intercensal (2022-2024) **	Población dentro del Area de Servicio 2024. Censo 2022 actualizado al año 2024.	Población Total del Partido. Censo 2022 actualizado al año 2024.	% Cobertura Actualizada
Capital Federal	**3.028.481**	**3.028.481**	0	**1,019**	**3.085.483**	**3.085.483**	**100,00%**	**3.101.599**	**3.101.599**	0	**1,000**	**3.101.599**	**3.101.599**	**100,00%**
Pdo. San Fernando	164.452	153.024	1.546	1,086	167.919	178.654	93,99%	168.882	165.681	2.457	1,000	168.196	168.940	99,56%
Pdo. Tigre	376.515	189.480	62.799	1,311	330.641	493.467	67,00%	439.067	258.987	82.713	1,002	342.390	439.953	77,82%
San Fernando-Tigre	540.967	342.504	64.345	**N/A**	498.560	672.121	74,18%	607.948	424.668	85.170	**N/A**	510.586	608.893	83,85%
San Isidro	295.894	287.524	279	0,984	283.311	291.276	97,27%	295.978	293.922	195	1,000	294.135	295.996	99,37%
San Martín	418.017	362.067	30.026	1,023	401.253	427.783	93,80%	444.503	398.735	36.317	1,001	435.375	444.833	97,87%
Vicente López	272.389	270.288	573	0,977	264.710	266.203	99,44%	280.541	277.456	715	1,000	278.261	280.632	99,16%
Norte	**1.527.267**	**1.262.383**	**95.223**	**N/A**	**1.447.834**	**1.657.383**	**87,36%**	**1.628.970**	**1.394.781**	**122.397**	**N/A**	**1.518.357**	**1.630.354**	**93,13%**
La Matanza	1.777.530	897.391	689.900	1,387	2.201.045	2.464.843	89,30%	1.838.401	819.109	731.120	1,001	1.551.860	1.840.335	84,32%
Pdo. Hurlingham	182.604	39.617	27.123	1,094	73.007	199.750	36,55%	186.221	41.100	27.240	1,000	68.356	186.263	36,70%
Pdo. Ituzaingó	169.038	14.700	47.219	0,976	60.445	165.014	36,63%	178.598	14.948	55.392	1,001	70.376	178.691	39,38%
Pdo. Morón	324.279	244.469	55.885	1,082	324.943	350.826	92,62%	326.810	250.856	59.767	1,000	310.657	326.846	95,05%
Morón	675.921	298.786	130.227	**N/A**	458.394	715.590	64,06%	691.629	306.904	142.399	**N/A**	449.389	691.800	64,96%
Tres de Febrero	343.338	264.246	49.154	1,003	314.274	344.296	91,28%	362.319	277.374	50.545	1,001	328.132	362.554	90,51%
Oeste	**2.796.789**	**1.460.423**	**869.281**	**N/A**	**2.973.713**	**3.524.729**	**84,37%**	**2.892.349**	**1.403.387**	**924.064**	**N/A**	**2.329.381**	**2.894.689**	**80,47%**
Avellaneda	345.752	318.130	8.900	1,043	341.058	360.583	94,59%	366.117	335.908	11.045	1,001	347.180	366.357	94,77%
Lanús	463.555	451.607	5.778	0,998	456.407	462.564	98,67%	460.081	449.681	6.207	1,000	455.888	460.081	99,09%
Quilmes	586.462	498.601	18.278	1,182	611.021	693.277	88,14%	631.774	527.231	29.941	1,001	557.639	632.303	88,19%
Sudeste	**1.395.769**	**1.268.338**	**32.956**	**N/A**	**1.408.486**	**1.516.424**	**92,88%**	**1.457.972**	**1.312.820**	**47.193**	**N/A**	**1.360.707**	**1.458.741**	**93,28%**
Pdo. Alte Brown	557.025	183.108	58.693	1,099	265.855	612.438	43,41%	583.209	194.801	67.967	1,000	262.876	583.449	45,06%
Pdo. E. Echeverría	300.785	96.390	91.194	1,316	246.875	395.856	62,36%	337.880	62.916	131.645	1,001	194.817	338.325	57,58%
Pdo Ezeiza	163.287	13.033	71.012	1,465	123.128	239.220	51,47%	198.620	15.594	93.271	1,002	109.131	199.105	54,81%
Alte. Brown-E. Echeverrí	1.021.097	292.531	220.899	**N/A**	635.859	1.247.514	50,97%	1.119.709	273.311	292.883	**N/A**	566.824	1.120.879	50,57%
Lomas de Zamora	621.440	470.769	95.267	1,058	598.624	657.218	91,08%	685.644	508.921	124.414	1,001	634.116	686.490	92,37%
Sudoeste	**1.642.537**	**763.300**	**316.166**	**N/A**	**1.234.483**	**1.904.732**	**64,81%**	**1.805.353**	**782.232**	**417.297**	**N/A**	**1.200.941**	**1.807.369**	**66,45%**
Partidos de la Conc	**10.390.843**	**7.782.925**	**1.313.626**	**N/A**	**10.149.999**	**11.688.751**	**86,84%**	**10.886.243**	**7.994.819**	**1.510.951**	**N/A**	**9.510.985**	**10.892.752**	**87,31%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

EMPALME DE SERIES: RADIOS SERVIDOS CON AGUA POTABLE

Informe Anual

Año 2025

49.1-IAT2-C-S-TRA 02-2025-EMPALME-NA

Nuevos Partidos	Población de las áreas Total, Servida y de Expansión SEGÚN CENSO 2010 (INDEC "*Informe 38* ").							Población de las áreas Total, Servida y de Expansión SEGÚN CENSO 2022 (INDEC "*estimaciones_departamentos_2022_2035* ")						
	Población Total del Partido (INDEC informe 38). Año 2010.	Población Censo 2010 dentro del Radio de Servicio Año 2018.	Población Censo 2010 dentro del Area de Expansión 2018-2024	Coeficiente de Crecimiento Intercensal (2010-2024) *	Población dentro del Area de Servicio 2024. Censo 2010 actualizado al año 2024.	Población Total del Partido. Censo 2010 actualizado al año 2024.	% Cobertura Actualizada	Población Total del Partido (Censo 2022). Año 2022.	Población Censo 2022 dentro del Radio de Servicio Año 2018.	Población Censo 2022 dentro del Area de Expansión 2018-2024.	Coeficiente de Crecimiento Intercensal (2022-2024) **	Población dentro del Area de Servicio 2024. Censo 2022 actualizado al año 2024.	Población Total del Partido. Censo 2022 actualizado al año 2024.	% Cobertura Actualizada
Pdo. San Miguel	278.019	111.049	6.873	1,127	132.892	313.312	42,42%	327.650	127.204	6.878	1,002	134.345	328.294	40,92%
Pdo. José C. Paz	267.275	25.398	608	1,204	31.303	321.710	9,73%	326.527	22.795	689	1,002	23.540	327.304	7,19%
Pdo. Malvinas Argentinas	324.358	43.644	1.290	1,149	51.641	372.771	13,85%	349.401	37.485	1.357	1,001	38.873	349.677	11,12%
San Miguel-Paz-Malvinas	869.652	180.091	8.771	N/A	215.835	1.007.793	21,42%	1.003.578	187.484	8.924	N/A	196.758	1.005.275	19,57%
Escobar	215.256	28.133	19.547	1,253	59.738	269.692	22,15%	256.071	32.123	23.854	1,002	56.096	256.615	21,86%
Pilar	299.549	81.783	4.315	1,357	116.867	406.599	28,74%	393.614	106.345	5.727	1,003	112.431	394.875	28,47%
Región Norte	**1.384.457**	**290.007**	**32.633**	**N/A**	**392.440**	**1.684.084**	**23,30%**	**1.653.263**	**325.952**	**38.505**	**N/A**	**365.285**	**1.656.765**	**22,05%**
Merlo	531.609	214.884	402	1,192	256.565	633.540	40,50%	581.484	226.035	420	1,001	226.632	581.940	38,94%
Moreno	454.416	167.385	858	1,263	212.530	574.034	37,02%	575.758	186.448	897	1,001	187.517	576.287	32,54%
Región Oeste	**986.025**	**382.269**	**1.260**	**N/A**	**469.095**	**1.207.574**	**38,85%**	**1.157.242**	**412.483**	**1.317**	**N/A**	**414.150**	**1.158.227**	**35,76%**
Florencio Varela	426.738	278.701	33.176	1,288	401.824	549.812	73,08%	488.103	304.403	40.992	1,002	346.017	488.982	70,76%
Región Sudeste	**426.738**	**278.701**	**33.176**	**N/A**	**401.824**	**549.812**	**73,08%**	**488.103**	**304.403**	**40.992**	**N/A**	**346.017**	**488.982**	**70,76%**
Presidente Perón	81.166	40.820	8.851	1,415	70.296	114.868	61,20%	101.994	43.830	12.605	1,003	56.596	102.284	55,33%
Región Sudoeste	**81.166**	**40.820**	**8.851**	**N/A**	**70.296**	**114.868**	**61,20%**	**101.994**	**43.830**	**12.605**	**N/A**	**56.596**	**102.284**	**55,33%**
Total Nuevos Partidos	**2.878.386**	**991.797**	**75.920**	**N/A**	**1.333.655**	**3.556.338**	**37,50%**	**3.400.602**	**1.086.668**	**93.419**	**N/A**	**1.182.047**	**3.406.258**	**34,70%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

	EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT2-C-A-TRA 04	exPL IA Nº 35

Región Norte

SAN FERNANDO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

TIGRE

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						

	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

SAN ISIDRO

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025**				**Observaciones**
		Numero Habilitacion	**Fecha Habilitacion**	**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)**	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

SAN MARTIN

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025**				**Observaciones**
		Numero Habilitacion	**Fecha Habilitacion**	**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)**	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

VICENTE LOPEZ

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT2-C-A-TRA 04	exPL IA Nº 35

Región Norte

SAN MIGUEL

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

JOSE C PAZ

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					

Obras por terceros solicitadas						

MALVINAS ARGENTINAS

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

ESCOBAR

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo	NA70079 – Red Secundaria de Agua San	964	29/07/2025	0,367017371	1.648	
	Subtotal			**0,367017371**	**1.648**	
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	Expansión NA70093 – Red Primaria de Ag	907	17/07/2025	0,056898355	36	
	Expansión NA701999 – Red Secundaria d	967	29/07/2025	0,406079595	520	
	Subtotal			**0,46297795**	**556**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	DESARROLLO BOERO	971	31/07/2025	0,077041402	436	
	Subtotal			**0,077041402**	**436**	
	Totales			**0,907036722**	**2.640**	
Obras por terceros solicitadas						

PILAR

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	EMPRENDIMIENTO ALTOS DE PILAR	950	13/06/2025	0,273094235	175	
	EMPRENDIMIENTO CAMPUS VISTA	978	02/05/2025	0,019019525	10	
	EMPRENDIMIENTO EL CASCO	974	01/08/2025	0,070958613	41	
	EMPRENDIMIENTO LAS LUCIÉRNAGAS	952	25/06/2025	0,174377535	91	
	HAB. 948_ EMPRENDIMIENTO AZURRA	948	06/06/2025	0,760450504	736	
	Mejora y mantenimiento 2025 HAB. 1008	1008	01/01/2025	0,081633068	267	
	Subtotal			**1,37953348**	**1.320**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	HAB. 934 - LOS NARCISOS 712	934	27/05/2025	0,011771115	23	
	OLIDEN 8925, BARRIO LOS CARDOS	915	04/04/2025	0,188695606	111	
	Subtotal			**0,200466721**	**134**	
	Totales			**1,580000201**	**1.454**	
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT2-C-A-TRA 04	exPL IA Nº 35

Región Oeste

HURLINGHAM

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

ITUZAINGO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	B° SICUREZZA - ODT N° I - 2025 - 79802	1061	10/09/2025	0,022991394	130	
	Subtotal			**0,022991394**	**130**	
MPG´S						

	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**0,022991394**	**130**	
Obras por terceros solicitadas						

MORON

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025**				**Observaciones**
		Numero Habilitacion	**Fecha Habilitacion**	**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)**	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

LA MATANZA

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025**				**Observaciones**
		Numero Habilitacion	**Fecha Habilitacion**	**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)**	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	P_S-P3-CALLE RAMÍREZ (HAB N°1060)	1060	25/06/2025	0,0583334	1.038	
	Subtotal			**0,0583334**	**1.038**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**0,0583334**	**1.038**	

Obras por terceros solicitadas						

TRES DE FEBRERO

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025**				**Observaciones**
		Numero Habilitacion	**Fecha Habilitacion**	**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)**	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT2-C-A-TRA 04	exPL IA Nº 35

Región Oeste

MERLO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

MORENO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					

Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT2-C-A-TRA 04	exPL IA Nº 35

Región Sudeste

AVELLANEDA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

LANUS

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						

	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

QUILMES

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025**				**Observaciones**
		Numero Habilitacion	**Fecha Habilitacion**	**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)**	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
		IAT2-C-A-TRA 04	exPL IA Nº 35

Región Sudeste

FLORENCIO VARELA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	Instalación RSA Barrio La Huella	720	07/08/2025	0,100434607	64	
	SA70351-Inst. RSA-Etapa 4- B° Las Alicias	724	29/10/2025	0,190452155	1.908	
	Subtotal			**0,290886762**	**1.972**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	Inst RSA Av Hudson y Av Carboni (Villa Va	728	12/11/2025	0,071153307	102	
	Subtotal			**0,071153307**	**102**	
	Totales			**0,36204007**	**2.074**	
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
		IAT2-C-A-TRA 04	exPL IA Nº 35

Región Sudoeste

ALMTE BROWN

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo	A+T–Longchamps Centro M2 - SA705	1968	04/08/2025	0,237184933	905	
	A+T - Longchamps Este M2 SA767	1955	28/02/2025	0,264884321	1.198	
	Longchamps Este M3 SA768	1954	26/02/2025	0,276525998	1.455	
	Subtotal			**0,778595253**	**3.558**	
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	DRSO-OPCT - B° Lindo 1 y 2	1961	12/06/2025	0,164622592	282	
	OPCT – Longchamps Centro M1-SA704	1981	12/12/2025	0,289935483	1.359	
	Subtotal			**0,454558075**	**1.641**	
	Totales			**1,233153328**	**5.199**	
Obras por terceros solicitadas						

ESTEBAN ECHEVERRIA

	Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025	

Identificación de la Obra		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	Observaciones
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

EZEIZA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

LOMAS DE ZAMORA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion	AySA-REN MALLA 115 Y 116-SA70220-RE	1969	02/09/2025	0,004757896	38	

	Subtotal			**0,004757896**	**38**	
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**0,004757896**	**38**	
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT2-C-A-TRA 04	exPL IA Nº 35

Región Sudoeste

PRESIDENTE PERON

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el año 2025				Observaciones
		Numero Habilitacion	Fecha Habilitacion	Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
Agua + Trabajo						
	Subtotal					
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

12. INSTALACIONES FALTANTES EN LA RED DE AGUA POTABLE

	RED DE AGUA	Informe Anual	
aysa	CIERRE DE MALLAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT2-C-A-RED 01	ex PL IA N° 36

Capital Federal

Distrito: CAPITAL FEDERAL

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
10001	ESCALADA AV	5300		7,5						
10002	PAZ GRAL AV	12100		3,5						
10003	PERGAMINO	4000		2,2						
10004	RIESTRA NORBERTO DE LA AV	1800		2						
10005				2						
10006	27 DE FEBRERO AV	0		20						
10007	ZUVIRIA	1900		0,8						
10008	COREA	1700		0,8						
10009	SANTIAGO DE COMPOSTELA	3700		3						
10010	RIESTRA NORBERTO DE LA AV	2800		2						
10011				1						
10012	CHILAVERT MARTINIANO CNEL	2600		1						
10013	VARELA	2400		1						
10014	GORDILLO TIMOTEO	3900		1						
10015	ASTURIAS AV	2700		3						
10016	CASTAÑARES AV	3900		1						
10017	CASTAÑON	2700		1						
10018	ITAQUI	2600		2						
10019	ROCA CNEL AV	5800		1						
10020	MATANZA	3700		3						
10021	RAULIES	1900		2,5						
10022	ZAMUDIO	5800		1						
10023	BOLIVIA	5900		1						
10024	ZEBALLOS ESTANISLAO S	5600		2						
10025	CASTILLO RAMON S PRES AV	900		4						
10026	SUIPACHA	1400		0,8						
10027	CABOTO	1200		0,5						
10028				1						
10029				1						
10030	CABOTO	100		1						
10031	CABOTO	100		0,8						
10032	CABOTO	900		0,5						
10033	CABOTO	1100		0,5						
10034	SANTA CRUZ	200		1						
10035	PEPIRI	0		1						
10036	USPALLATA	3300		1,3						
10037	LOS PATOS	3300		1,3						
10039	VILLARINO	2600		0,8						
10040	PERDRIEL	1800		0,8						
10041	ALVARADO	2800		0,8						
10042	ISABEL LA CATOLICA	400		2						
10043	ISABEL LA CATOLICA	900		0,5						
10044	DE JOVELLANOS GASPAR MELCHOR	900		1						
10045	AZARA	900		1						
10046	ARAOZ DE LAMADRID G GRAL	1200		1,5						
10047	BERON DE ASTRADA	1800		1,5						
10048	CALLE 10	0		2						
10049	CALLE 5	0		3						
10050	CASTILLO RAMON S PRES AV	500		2,5						
10051	CORONADO MARTIN	3300		2						
10052	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	0		2						
10053	MADERO EDUARDO AV	600		3						
10054	MADERO EDUARDO AV	800		2						
10055	CRUZ OSVALDO AV	1900		2,1						
10056	D'ESPOSITO ARNALDO	100		2						
10057	GENA	500		2						
10058	HUERGO ING AV	1400		0,5						
10059	CABOTO	800		0,5						
10060	IGUAZU	1100		4						
10061	MIRAVE	3100		3						
10062	SALVIGNY	1700		2						
10063	CALLE 14	0		1						
10064	SARMIENTO AV	2600		3						
10065	YERBAL	1400		3						
10066	DEL LIBERTADOR AV	3800		2						
10067	AMBROSETTI JUAN B	600		1						
10068	MITRE BARTOLOME	2800		2						

10069	JUSTO JUAN B AV	1200		4						
10070	MITRE EMILIO	1000		4						
10071	REPUBLICA	500		2						
10072	PERON EVA AV	1400		4						
10073	BAUNESS	800		1,5						
10074	DE LOS CONSTITUYENTES AV	2700		4						
10075	TRONADOR	600		1						
10076	BALBIN RICARDO DR AV	4400		1						
10077	PLAZA	4800		0,8						
10078	UDAONDO GUILLERMO AV	1400		1						
10079	HUSARES	2300		2,6						
10080	JURAMENTO	600		2,5						
12288	DELLEPIANE LUIS JOSE TTE GRAL AV	5400		0,51						
12289	LAFUENTE AV	1800		1						
12290				1,3						
12291	PAZ GRAL AV	16800		0,34						
	TOTAL DE CUADRAS:			**166,05**						

Región Norte

Distrito: SAN FERNANDO

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
10537	CASARES CARLOS	2500		3						
10538	RIO LUJAN	0		0,8						
10539	LAS HERAS	0		1,5						
10540	RIO LUJAN	100		1						
10541	RIVADAVIA	200		4						
10542	SERVETTO V	300		1,8						
10543	JUNIN	500		1,5						
10544	MARZI DE	400		0,8						
10545	SAUCE	400		0,8						
10546	SAUCE	1200		0,5						
10547	ABRA NUEVA	1100		0,7						
10548	LA PLATA	1200		1						
10549	SERVETTO V	1200		1						
10550	VIEYTES HIPOLITO	1200		0,5						
10551	MARTIN FIERRO	2200		1						
10552	MIGUENS	2300		1,5						
10553	MIGUENS	2400		1						
10555	MIGUENS	2600		1						
10556	MARTIN ALTE	400		1						
10557	ARIAS GRAL	3100		5						
10558	GUIDO SPANO	300		1,5						
10560	AMBROSONI	300		1						
10564	RODRIGUEZ PEÑA	3100		1						
10565	PEREZ MAXIMO	900		1						
10566	GILARDI GILARDO	3500		0,5						
10567	DESVIO VIAS FCGBM	1500		1						
10569	ALEM LEANDRO N	0		1						
10571	GONZALEZ PJE	2200		1						
10572	GONZALEZ PJE	2500		1						
10573	ENTRE RIOS	100		1						
10574	UNCAL PASCUALA DEL	100		1						
10576	ALVEAR	2600		0,5						
10578	CHARLIN	200		4						
10579	LAS HERAS	3600		1						
10580	PINTO GRAL	2500		2						
10581	PINTO GRAL	2300		1						
10583	ENTRE RIOS	700		0,5						
10585	SARMIENTO	1900		1						
10586	BESARES CNEL	900		0,8						
10587	CALLAO	1200		0,5						
10588	CHACABUCO	2400		1						
10589	DIAZ SGTO	1300		1						
10590	URQUIZA	2400		1						
10591	DIAZ SGTO	1500		0,8						
10592				1						
10593	DIAZ SGTO	1900		1						
10594	ARNOLDI ADOLFO INT AV	1800		1						
10595	FRAY LUIS BELTRAN	2200		1						
10596	BERUTI F	2400		1						
10598	FRAY LUIS BELTRAN	2500		1						
10599	LOS PINOS	2600		0,5						
10602	FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO	2700		3						
10603	AMBROSONI	2700		4						
10604				2						
10605				1						
10606	BERUTI F	3100		1						
10607	JUNCAL	3300		2						
10608	RODRIGUEZ MARTIN	3400		2						
10609	FRENCH	2500		3						
10610	ESTRADA	2700		1,8						
10611				1						
10612	CHARLIN	800		1						
10613	CHARLIN	700		1						
10614				3						
10617	SARMIENTO	2500		1						
10618	MADERO	2500		1						
10621	25 DE MAYO	2600		1						

10625	MADERO	2300		1						
10626	FRENCH	1200		1						
10627	FRENCH	1300		1						
10628	FRENCH	1400		1						
10629	FRENCH	1500		1						
10630	FRENCH	1600		1						
10634	BERUTI F	1600		1						
10635	AVELLANEDA NICOLAS AV	1900		1						
10636	AVELLANEDA NICOLAS AV	2000		1						
10637	AVELLANEDA NICOLAS AV	2100		1						
10638	AVELLANEDA NICOLAS AV	2200		1						
10639	ARNOLDI ADOLFO INT AV	1900		1						
10640	ARNOLDI ADOLFO INT AV	2400		1						
10641	ARNOLDI ADOLFO INT AV	2300		1						
10642	ARNOLDI ADOLFO INT AV	2200		1						
10643	PASTEUR	2200		1						
10644				2						
10645				1						
10646				1						
10647				1						
10648				1						
10649				1						
10650				1						
10651	MENDOZA	3400		0,5						
10652	MALVINAS ARGENTINAS	2100		1						
10653	BERUTI F	3400		0,5						
10654	DIAZ SGTO	3500		0,5						
10655	DIAZ SGTO	3500		0,5						
10656				1						
10657				1						
10658	URCOLA	3500		0,25						
10659	URCOLA	3600		1						
10660	MENDOZA	3500		0,5						
10661	MENDOZA	3600		0,5						
10662	GARCIA MANSILLA ALTE	3000		1						
10663	GARCIA MANSILLA ALTE	3100		1						
10666	PAZ	600		1						
10667	MIGUENS	2300		1						
10668	LAS HERAS	2500		1						
10670	BERUTI F	0		1						
10672	MATHEU	2300		1						
10673	BLANCO ENCALADA MANUEL	2300		1						
10674	TUPAC AMARU	2100		1						
10675	FADER FERNANDO	2400		1						
10676	ITUZAINGO	400		1						
10677	ITUZAINGO	200		1						
10678	ITUZAINGO	100		1						
10679	ITUZAINGO	0		1,5						
10680	RIO LUJAN	400		1						
10681	MARZI DE	700		1						
10682	GUIDO SPANO	2800		1						
10683	ITUZAINGO	1900		1						
10688	QUIRNO COSTA	3000		3,5						
10689	LIBERTAD	2900		1						
10690	PASTEUR	2100		1						
12235	FRENCH	1100		0,7						
12236	FRENCH	1100		0,7						
12237	FRENCH	1200		0,7						
12238	DIAZ SGTO	1400		1						
	TOTAL DE CUADRAS:			**149,15**						

Distrito: TIGRE

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
10081	MARTI JOSE	600		1						
10082	MARTI JOSE	700		1						
10083	VALLE ARISTOBULO DEL (RM-T)	1000		1						
10084	VALLE ARISTOBULO DEL (RM-T)	900		1						
10085	ROMERO (RM-T)	1300		0,5						
10086	ROMERO (RM-T)	1300		2						
10088	JUNCAL (T)	1600		1						
10089	JUNCAL (T)	1500		1						
10090	ALBARELLOS (T)	1000		0,25						
10091	BOLO BOLAÑOS	1200		1						
10092	ALBARELLOS (T)	1700		1						
10093	MENDOZA (T)	1700		1						

10094	LA RIOJA (T)	1300		0,5						
10095	LA RIOJA (T)	1500		1						
10096	LA RIOJA (T)	1500		0,5						
10097	SANTA RITA	1300		1						
10098	SANTA ROSA	0		1						
10099	SANTA ROSA	0		1						
10100	CABRAL SGTO (T)	1500		1						
10101	ANDRADE OLEGARIO V (T)	300		1						
10102	ANDRADE OLEGARIO V (T)	200		1						
10103	CABRAL SGTO (T)	2500		1						
10104	CABRAL SGTO (T)	2400		1						
10105	SAENZ PEÑA (T)	700		1						
10106	NEWTON	0		0,2						
10108	SANTA FE (T)	0		0,4						
10109	VILELA CNEL (T)	200		1						
10110	VILELA CNEL (T)	100		1						
10111	VILELA CNEL (T)	0		1						
10112	JUSTO JUAN B (RM)	900		1						
10113	JUSTO JUAN B (RM)	1000		1						
10114	INGENIEROS JOSE (RM)	1300		0,5						
10115	INGENIEROS JOSE (RM)	1400		0,5						
10116	INGENIEROS JOSE (RM)	1500		1						
10117	SEGUROLA	2100		2						
10118	CORONADO MARTIN (RM-T)	2100		2						
10119	MARTINEZ DE IRALA	900		1						
10120	MARTINEZ DE IRALA	1000		1						
10121	CARRIEGO	1900		1						
10122	WHITE ING	1900		1						
10123	WHITE ING	1800		1						
10124	CASTIGLIONI R	700		1						
10125	WASHINGTON (RM)	2400		1						
10126	CHUBUT (RM)	1600		6						
10127	PARANA	1900		1						
10128	IGUAZU	1100		1						
10129	MATHEU	2000		1						
10130	WHITE ING	2200		3,5						
10131	5 DE ABRIL	1200		2						
10132	INGENIEROS JOSE (RM)	1200		2						
10133	JUSTO JUAN B (RM)	800		1						
10134	WHITE ING	4000		1						
10135	SEGUROLA	2000		1,5						
10136	SEGUROLA	1800		1,5						
10137	LA PAZ (RM)	3000		1,5						
10140	QUINTEROS	0		1,2						
10141	RECONQUISTA (T)	0		1,5						
10142	LA FLORIDA	1300		0,8						
10143	GUEMES MARTIN DE GRAL	2000		0,5						
10145	CHILE (T)	1800		1						
10146	PUEYRREDON (T)	400		0,5						
10147	ALBERDI JUAN BAUTISTA (T)	400		1						
10148	ANDALUCIA	300		1						
10149	ANCHORENA JUAN	600		1						
10150	SAN JUAN (T)	1100		2,5						
10151	CALLAO (RM)	200		3						
10152	GALARZA J M	1700		3						
10153	ANDALUCIA	700		6						
10154	LOPEZ LUCIO V	2100		1						
10155	LOPEZ LUCIO V	2000		0,5						
10156	GARCIA LUIS DR	2000		1						
10157	CASTIGLIONI R	400		3						
10158	WHITE ING	4200		0,8						
10159	PASTEUR LUIS (T)	700		0,8						
10160	VICCO MTRO	700		0,7						
10161	DARIO RUBEN (T)	600		0,5						
10162	MONTES DE OCA (T)	1200		1,5						
10163	MATHEU	4100		3						
10164	ALBERDI JUAN BAUTISTA (T)	700		0,6						
10165	LARRALDE CRISOLOGO AV (RP 24)	2200		2						
12243	EL POLLO (T)	100		1,4						
12263	WILLIAMS (RM-T)	1800		1,5						
	TOTAL DE CUADRAS:			**105,65**						

Distrito: SAN ISIDRO

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
10691	UDAONDO GDOR	900		2						

10692	NEUQUEN	100		1						
10693	PAMPA	600		0,5						
10694	FLORES LUIS DE	2300		1						
10695	AMERICA	2400		2,2						
10696	SAN JOSE	2400		2,2						
10697	MAZZA JUAN AGUSTIN	2300		1						
10698	CORRIENTES	3000		0,6						
10699	CORRIENTES	2900		1						
10700	CORRIENTES	2800		1						
10701	RIO DE JANEIRO	2300		0,75						
10702	RIO DE JANEIRO	2400		0,75						
10703	CARACAS	1700		1						
10704	CALVO CARLOS	1500		0,8						
10705	MOSCONI GRAL	3700		1						
10706	PIÑERO	1200		0,5						
10708	SEGUROLA SATURNINO	500		1,5						
10709	BERMEJO	1800		2						
10710	CAZON MARIA B DE	300		0,7						
10711	CERVANTES	1100		1						
10712	MARIN PLACIDO	1000		1						
10713	BETBEDER ALTE	1200		2						
10714				1						
10715	TELLECHEA MARIQUITA	2000		1						
10716	CERRITO	1200		1						
10717	LOS OLIVOS	100		1						
10718	GURRUCHAGA	1000		1						
10719	CAMINO REAL MORON SAN FERNANDO	1000		3,5						
10720	IPIRANGA	1800		3						
10722	ASAMBLEA	1300		0,5						
10723	JUNIN	2800		1						
10724	ROLON AVELINO AV	2100		1						
10725	SAENZ ANTONIO AV	2100		0,3						
10726	ROLON AVELINO AV	2400		4,5						
10727	SOLDADO DE MALVINAS	1300		0,7						
10728	LOS JAZMINES	1300		0,7						
10729	WERNICKE ROBERTO	1100		1						
10730	RIVERA	300		1						
10733	PARAMARIBO	800		1						
10734	EZPELETA MARIANO	3200		1						
10736	SANTO DOMINGO	800		0,8						
10737	GARCIA MEROU	800		0,8						
10738	MEJICO	800		0,8						
10739	COCHABAMBA	3200		1						
10740	CORDOBA	2200		3,5						
10741	JUNCAL	2100		0,4						
10742	TALCAHUANO	1600		2						
10743	VELEZ SARSFIELD	2300		1						
10744	CARACAS	2300		1						
10745	PUERTO RICO	2300		1						
10746	SANTO DOMINGO	2300		1						
10747	PUERTO RICO	2100		0,8						
10748	PUEYRREDON PRILIDIANO	2800		1						
10750	PUEYRREDON PRILIDIANO	3000		1,2						
10751	YAPEYU	3100		1						
10752	GARCIA MEROU	2600		1						
10753	YAPEYU	3000		1						
10755	POSADAS GERVASIO ANTONIO	2500		0,5						
10756	ALTO PERU	1900		1						
10757	UDAONDO GDOR	2300		2						
10758	ESNAOLA JUAN PEDRO	2500		1						
10759	VALLE IBERLUCEA DEL	2200		1						
10760	GARCIA MANUELA MTRA	2900		1						
10761	VALLE IBERLUCEA DEL	2100		1						
10762	USPALLATA	2400		1						
10763	GARAY JUAN DE	1500		1						
10765	ALVEAR GRAL	1400		1,5						
10766	MADERO EDUARDO	1900		1						
10768	QUINTANA PRES	1800		1						
10769	QUINTANA PRES	2600		0,8						
10770	DIAZ DE SOLIS JUAN	2700		2						
10771	BALCARCE	2800		1						
10772	RETRETA DEL DESIERTO	1400		1						
10773	RIVERA INDARTE	1100		1						
10774	PAZ JOSE C	500		1						
10775	ALMAFUERTE	1300		1						
10777	CAMINO DE LA RIBERA	400		2						
10778	CORONADO MARTIN	1300		0,5						
10780	CAMINO DE LA RIBERA	100		1						

10781	AGUIRRE VICTORIA	0		1						
10782	PUEYRREDON PRILIDIANO	1000		1						
10783	TUCUMAN DIAG	1100		0,8						
10784	JUNCAL	1500		3						
10785	ASUNCION	1800		2						
10786	FLEMING ALEXANDER SIR AV	2000		1						
10787	TALCAHUANO	2000		1						
10788	CUYO	1600		0,5						
10789	LIBERTAD	1800		0,7						
10790	EZPELETA MARIANO	1700		1						
10791	CARACAS	1200		1						
10792	CARACAS	2500		1						
10793	ALTO PERU	1500		1,7						
10794	ALTO PERU	1400		1,7						
10795	ELFLEIN ADA	2000		1						
10796	ELFLEIN ADA	1800		2						
10797	ROLON ANDRES AV	2500		1,5						
10798	ROLON ANDRES AV	2400		1						
10799	ROLON ANDRES AV	2300		1						
10800	ROLON ANDRES AV	2300		1						
10801	ROLON ANDRES AV	2200		1						
10802	ROLON ANDRES AV	2100		1						
10803	ROLON ANDRES AV	2000		1						
10804	ROLON ANDRES AV	1900		1						
10805	COPELLO SANTIAGO LUIS CARDENAL	2400		2						
10806	COPELLO SANTIAGO LUIS CARDENAL	2300		1						
10807	COPELLO SANTIAGO LUIS CARDENAL	2200		1						
10808	COPELLO SANTIAGO LUIS CARDENAL	2100		1						
10809	COPELLO SANTIAGO LUIS CARDENAL	2100		1						
10811	COPELLO SANTIAGO LUIS CARDENAL	1900		1						
10812	COPELLO SANTIAGO LUIS CARDENAL	1800		1						
10813	FRENCH	2400		1						
10814	FRENCH	2300		1						
10816	LA SALLE JUAN BAUTISTA DE	2100		1,5						
10817	LA SALLE JUAN BAUTISTA DE	1900		3						
10819	ALVEAR GRAL	1400		2						
10820	ALVEAR GRAL	1300		2						
10821	SAN ISIDRO LABRADOR	1200		1,1						
10822	SAN ISIDRO LABRADOR	1400		1,1						
10823	QUINTANA PRES	2500		0,9						
10824	FONDO DE LA LEGUA AV	800		1						
10825	FONDO DE LA LEGUA AV	900		1						
10826	FONDO DE LA LEGUA AV	1100		2						
10827	FONDO DE LA LEGUA AV	1300		2						
10829	CASTILLO JOSE M CNEL	500		1,1						
10830	CASTILLO JOSE M CNEL	500		1,1						
10831	CASTILLO JOSE M CNEL	700		1,1						
10832	WERNICKE ROBERTO	800		0,7						
10833	MATHEU	1800		1						
10834	MATHEU	1900		1						
10835	LINIERS	2300		1,5						
10836	CHICLANA	400		2						
10838	TAGORE RABINDRANATH	2600		1,2						
10839	HABANA	2300		0,5						
10840	UCRANIA	1100		0,5						
10841	AYACUCHO	500		1						
10842	IBAÑEZ	2000		1						
10843	WASHINGTON	600		0,7						
10845	MITRE AV	1100		1,3						
10846	MITRE AV	700		7						
10847	MARTIN Y OMAR	1100		1						
10848	GUERRICO ALTE	800		1						
10849	ANDREA DE MONS	600		0,7						
10850	BECCAR VARELA ADRIAN	700		0,8						
10851	MARTIN Y OMAR	800		1						
10852	GABOTO	100		1						
10853	DE LA RIBERA SOR CAMILA ROLON AV	200		1						
10854	GARIBALDI	200		1						
10855	CURIE	2500		1,3						
10856	URUGUAY	1800		15						
10857	ONELLI CLEMENTE	2500		2						
10858	NEWBERY JORGE	2500		5,3						
10859	NEWBERY JORGE	2500		2						
10861	FORMOSA	2500		0,5						
10863	ACEVEDO PADRE	700		0,5						
10864	FORMOSA	2300		1						
10865	FLORES LUIS DE	2500		2						
10866	GRANADEROS PJE	900		1,2						

10867	JUSTO JUAN B	1400		0,7						
10868	FLORES LUIS DE	1700		0,5						
10869	PAMPA	1700		0,5						
10870	NEUQUEN	1300		3,6						
10871	AMERICA	1600		1						
10872	CLARK JUAN	1700		2						
10874	LINIERS	1500		0,8						
10876	NEUQUEN	1100		3,2						
10877	O'HIGGINS	1100		2,2						
10878	MISIONES	0		2						
10879	LINIERS	800		2						
10880	O'HIGGINS	900		2						
10881	OBARRIO MANUEL	700		1						
10882	GARDEL CARLOS	2400		1						
10883	ABRIATA PABLO A	2500		1						
10884	BOEDO	600		1						
10885	MAZZA JUAN AGUSTIN	100		1						
10886	HORNOS GRAL	2400		1						
10887	PUEYRREDON PRILIDIANO	1000		1						
10888	CASTRO BARROS	1300		1						
10889	MANZONE	900		1						
10890	DIAZ JACINTO	800		1						
10891	TOMKINSON INT	1200		1						
10892	TERRERO OBISPO	2200		1						
10893	MOSCONI GRAL	3700		1						
10894	EZPELETA MARIANO	2600		1						
10895	NEUQUEN	2500		1,5						
12241	CORRIENTES	3300		1,1						
12264	CURIE	1700		2						
	TOTAL DE CUADRAS:			**249,9**						

Distrito: SAN MARTIN

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
10366	66-PAZ JOSE C	1900		1						
10367	39-OLIVEIRA CESAR	2700		1						
10368	39-OLIVEIRA CESAR	2600		1						
10369	62-VIDAL AGUSTIN R PROF	1800		1						
10370	23-4 DE FEBRERO	2700		0,8						
10371	50-MAIPU	1900		1						
10372	64-3 DE FEBRERO	1800		1						
10373	62-VIDAL AGUSTIN R PROF	1900		0,5						
10374	42-PERDRIEL	3100		1						
10375	MUNICIPAL PJE	1500		0,8						
10376	42-PERDRIEL	3500		2,5						
10377	42-PERDRIEL	3700		1						
10378	52-BELGRANO	4900		1						
10379	P 46-FERNANDEZ A	4900		1						
10381	62-VIDAL AGUSTIN R PROF	5200		2						
10382	A 64-PERON JUAN DOMINGO	5100		1						
10383	117-SUIPACHA	2700		2						
10384	72-POMBO DIEGO	4100		2						
10385	66-PAZ JOSE C	4000		1						
10386	66-PAZ JOSE C	3900		1						
10387	82-ALVEAR INT	3600		1						
10388				1,5						
10389	92-GONZALEZ J V	1700		1,5						
10390	39-SILVA M	3800		3						
10391	88-ALVAREZ AGUSTIN	1700		1,5						
10393	D 78-SANTA ROSALIA	1300		1						
10394	81-MISIONES	4000		1						
10395	91-AZOPARDO	4100		0,5						
10397	103-26 DE JULIO	4900		2						
10399	105-PUEYRREDON	4900		1,8						
10400	D 132-INGENIEROS JOSE	2900		1						
10401	94-OMBU	5000		2						
10402	108-CHACABUCO	5400		1						
10403	194-BELTRAN LUIS FRAY	1100		2						
10404	27-LAMAS ANDRES	7900		1,5						
10405	29-ESTRADA	7900		1,5						
10406	192-FERNANDEZ	1200		2,5						
10409	CALLE ENTRE 35 Y 39	6900		3						
10410	39-CHARLONE	6900		3						
10411	CALLE ENTRE 39 Y 41	6900		3						
10413	174-WASHINGTON	1900		1,5						
10414	154-ASAMBLEA	1400		1						

10415	31-QUINTANA PRES	6200		0,8						
10416	47-COMBET	6000		1						
10417	144-CABRAL SGTO	1900	AG-SMA-Inst.cñ.	1,5			0,104		AG-SMA-Inst.cñ.	
10418	43-SARMIENTO	6200		0,8						
10419	180-SAN JOSE	2200	AG-SMA-Inst.cñ.	1			0,118		AG-SMA-Inst.cñ.	
10420	172-ROLDAN	2600		1,2						
10421	176-ZEBALLOS ESTANISLAO	1700		0,35						
10422	178-ROCA	1700		0,8						
10423	180-SAN JOSE	1700		0,5						
10424	160-SOLIS	3100	AG-SMA-Inst.cñ.	0,5			0,067		AG-SMA-Inst.cñ.	
10425	D 69-CHILAVERT	6400		0,5						
10428	93-SAN JOSE DE FLORES	6100		1						
10429	148-MAR DEL PLATA	3600		1						
10431	103-26 DE JULIO	5600		2						
10432	111-URQUIZA	5400	AG-SMA-Inst.cñ.	2			0,188		AG-SMA-Inst.cñ.	
10433	113-25 DE MAYO	5400	AG-SMA-Inst.cñ.	1			0,14		AG-SMA-Inst.cñ.	
10434	D 166-DIAG 166	5400		2,2						
10435				1						
10436	127-CALLE 127	6900		1						
10437	176-CORRIENTES	6100		0,7						
10439	190-OBARRIO MANUEL	2200		1						
10441	35-MENDOZA	3600		1						
10442	35-MENDOZA	3700		1						
10443	35-MENDOZA	3800		1						
10444	35-MENDOZA	3900		1						
10445	35-MENDOZA	4000		1						
10446	90-CALLE 90	1600		1						
10447	33-DORREGO	3600		1						
10448	88-ALVAREZ AGUSTIN	1500		1						
10454	27-LATORRE	6800	AG-SMA-Inst.cñ.	1			0,199		AG-SMA-Inst.cñ.	
10455	27-LATORRE	6700		1						
10459	162-RAWSON	1900		1						
10460	162-RAWSON	2000		1						
10461				1						
10462	180-SAN JOSE	2000	AG-SMA-Inst.cñ.	1			0,081		AG-SMA-Inst.cñ.	
10465	176-ZEBALLOS ESTANISLAO	2100		1						
10466	176-ZEBALLOS ESTANISLAO	2000		1						
10467	174-WASHINGTON	2100		1						
10468	174-WASHINGTON	2000		1						
10470	P 148-BETINOTTI	4700		1						
10471	P 148-BETINOTTI	4600		1						
10472	111-URQUIZA	6100		1						
10473	148-MAR DEL PLATA	4500		1						
10474	D 83-MITRE	6800		1						
10480	D 87-11 DE SEPTIEMBRE	6500		1						
10481	D 87-11 DE SEPTIEMBRE	6400		1						
10482	87-11 DE SEPTIEMBRE	6300		1						
10483	87-11 DE SEPTIEMBRE	6200		1						
10488	59-ECHAGUE	8000		1						
10489	119-ESPAÑA	6000		1						
10490	119-ESPAÑA	5900		1						
10491				1						
10492	119-ESPAÑA	5700		1						
10493	119-ESPAÑA	5600		1						
10494	119-ESPAÑA	5600		1						
10495	119-ESPAÑA	5500		1						
10496	119-ESPAÑA	5400		0,5						
10497	142-RECONQUISTA	5300		1						
10498	142-RECONQUISTA	5200		1						
10499	142-RECONQUISTA	5100		1						
10500	123-NAPOLES	5800		2						
10501	123-NAPOLES	5700		2						
10502				1						
10503				1						
10504				1						
10506	117-COLON	5500		1						
10507	117-COLON	5400		1						
10508	117-COLON	5400		1						
10509	117-COLON	5200		1						
10510	117-COLON	5100		1						
10511	124-COLON	5000		1						
10512	134-TREINTA Y TRES	4900	AG-SMA-Inst.cñ.	1			0,031		AG-SMA-Inst.cñ.	
10513	130-CUBA	4500		1						
10514	130-CUBA	4400		1						
10515	131-NAON	4500		1						
10516	131-NAON	4400		1						
10517	117-PICHINCHA	4600		1						
10520	116-BROWN ALTE	4800		1						

10521	66-PAZ JOSE C	5000		1						
10522	66-PAZ JOSE C	5100		1						
10523	121-SUIPACHA SEGUNDA	2600		1						
10524	A 64-PERON JUAN DOMINGO	5200		1						
10525				1						
10526	68-LIBERTAD	4200		1						
10527	A 101-BALBIN RICARDO DR	2700		1						
10530	42-PERDRIEL	3900		1						
10531	42-PERDRIEL	3800		1						
10532	42-PERDRIEL	3900		1						
10533	42-PERDRIEL	4000		1						
10534	76-HUE ADELINA	3400		1						
10535	121-SUIPACHA SEGUNDA	2500		1						
10536	P 91-RAVELLI BRUNO CJAL	900		0,8						
12275	99-MISTRAL GABRIELA	7000		1						
	TOTAL DE CUADRAS:			**156,55**						

Distrito: VICENTE LOPEZ

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
10166	CASTELLI JUAN JOSE	6400		1						
10167	INGENIEROS JOSE DR	6400		1						
10168	SASTRE MARCOS DR	3500		0,5						
10169	ARGERICH COSME DR	3500		0,5						
10170	MISIONES	2500		1						
10171	INDEPENDENCIA	2500		1						
10173	DRAGO LUIS MARIA	5600		1						
10174	SANTA FE	6100		1						
10175	MATHEU DOMINGO	2200		1						
10176	MORENO MARIANO DR	5300		0,5						
10177	ACHA MARIANO	4000		0,5						
10178	DERQUI SANTIAGO PRES	5000		0,8						
10179	SIVORI EDUARDO	5500		1						
10180	CALVO CARLOS	3000		1						
10181	ACHA MARIANO	3400		0,5						
10182	ALEM LEANDRO N	3300		1						
10183	RIVADAVIA BERNARDINO	3700		1						
10184	ALEM LEANDRO N	3600		1						
10185	ALEM LEANDRO N	3600		1						
10186	WHITE GUILLERMO	4600		2						
10189	CABRAL JUAN BAUTISTA SGTO	3700		2						
10190	ALBARELLOS	4100		0,8						
10191	SAENZ PEÑA ROQUE PRES	4400		2						
10192	AVALOS AMARO INT CNEL	2800		3						
10193	CABRAL JUAN BAUTISTA SGTO	2800		3						
10194	ALBERDI JUAN BAUTISTA	4000		1,2						
10195	QUERIDO NATALIO CJAL	1900		1						
10196	PRINGLES JUAN P CNEL	4900		3						
10197	BALCARCE GRAL	1700		1						
10198	BALCARCE GRAL	1500		2						
10199	POSADAS GERVASIO	1500		2						
10200	POSADAS GERVASIO	1300		3						
10201	FRANKLIN BENJAMIN	1500		2						
10202	MORRIS WILLIAMS C	1000		3						
10204	SANTA ROSA	5000		3						
10205	GUEMES MARTIN MIGUEL DE GRAL	4600		0,8						
10206	LAS HERAS JUAN GREGORIO DE GRAL	4600		0,5						
10207	ALVAREZ AGUSTIN	4700		0,5						
10208	FRENCH DOMINGO	300		1						
10209	ALSINA ADOLFO	5100		0,8						
10210	VENEZUELA	5100		1						
10211	PARERA BLAS	3700		2						
10212	INGENIEROS JOSE DR	3800		2						
10213	REPETTO NICOLAS DR	3600		0,8						
10214	PARERA BLAS	3400		2,5						
10215	JUSTO JUAN B	3000		1,2						
10216	AGUERO JULIAN SEGUNDO	2800		2						
10217	GUTIERREZ RICARDO	3600		3,5						
10218	MEDEIROS GERTRUDIS	2700		1						
10219	JUSTO JUAN B	1800		1						
10220	PARERA BLAS	700		1						
10221	ECHEVERRIA ESTEBAN	200		1,2						
10222	CAMPO ESTANISLAO DEL	200		0,8						
10223	IRIGOYEN BERNARDO DE	100		0,5						
10224	DARWIN CARLOS	100		1						
10225	FERREYRA ANDRES	3800		1						

10226	ALBERDI JUAN BAUTISTA	500		0,8						
10228	DIAZ DE SOLIS JUAN	1700		2,5						
10229	MAIPU AV	1900		1,5						
10230	ITALIA	1300		2,5						
10231	25 DE MAYO	1900		1						
10232	DIAZ DE SOLIS JUAN	1200		1						
10233	MORENO MARIANO DR	2400		1						
10234	ALBARELLOS	4400		2						
10235	CASTRO BARROS PEDRO I DE	3100		1						
10236	RIVADAVIA BERNARDINO	3100		1						
10237	SAN MARTIN JOSE DE GRAL AV	4800		1						
10238	NECOCHEA MARIANO	400		1						
10239	WHITE GUILLERMO	4900		1						
10241	GARCIA MANUEL PROF	4900		1						
10242	GARCIA MANUEL PROF	4800		0,7						
10243	GARCIA MANUEL PROF	4800		0,3						
10244	BERMUDEZ JUSTO GERMAN DE CAP	4600		1						
10245	BERMUDEZ JUSTO GERMAN DE CAP	4500		1						
10246	MITRE BARTOLOME AV	3900		1,5						
10247	MITRE BARTOLOME AV	3800		1						
10248	MITRE BARTOLOME AV	3700		1,5						
10249	MITRE BARTOLOME AV	3600		1,5						
10250	MITRE BARTOLOME AV	3600		1						
10251	ECHEVERRIA ESTEBAN	3700		1						
10252	ECHEVERRIA ESTEBAN	3500		2						
10254	ECHEVERRIA ESTEBAN	4200		2						
10255	ECHEVERRIA ESTEBAN	2800		2						
10256	ECHEVERRIA ESTEBAN	2500		3						
10258	PARERA BLAS	2700		2,5						
10259	RASTREADOR FOURNIER	2200		1						
10260	RASTREADOR FOURNIER	2100		1						
10261	RASTREADOR FOURNIER	2000		1						
10262	CRUZ BARTOLOME	1100		2						
10263	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE	5200		1						
10264	CONSTITUYENTES DE LOS AV	300		1						
10265	ALSINA ADOLFO	5200		1						
10266	VENEZUELA	5200		1						
10268	ALVAREZ AGUSTIN	5100		0,3						
10269	CONSTITUYENTES DE LOS AV	1200		3						
10270	SAN MARTIN JOSE DE GRAL AV	4900		1						
10271	SAN MARTIN JOSE DE GRAL AV	4900		1,5						
10272	SAN MARTIN JOSE DE GRAL AV	4800		1						
10273	BLANCO ENCALADA MANUEL	1800		1						
10274	BLANCO ENCALADA MANUEL	1700		1						
10275	BLANCO ENCALADA MANUEL	1500		2						
10279	LIBERTAD	5000		0,5						
10280	LIBERTAD	4900		1						
10281	LIBERTAD	4800		1						
10282				2						
10283				1						
10284				1						
10285	ADER BERNARDO AV	2700		1						
10286	DRAGO LUIS MARIA	6200		1						
10287	DRAGO LUIS MARIA	6200		1						
10289	PRIMERA JUNTA	2100		1						
10290	PRIMERA JUNTA	2200		1						
10291	PRIMERA JUNTA	2300		1						
10292	PRIMERA JUNTA	2400		1						
10293	PRIMERA JUNTA	2500		1						
10294	ACASSUSO DOMINGO DE	6600		1						
10295	ACASSUSO DOMINGO DE	6600		1						
10296	ACASSUSO DOMINGO DE	6700		3						
10297	MITRE BARTOLOME AV	3500		1						
10298	CABRAL JUAN BAUTISTA SGTO	3500		1						
10299	CABRAL JUAN BAUTISTA SGTO	3500		1						
10300	CARREGAL MAQ	3900		0,5						
10301	ECHEVERRIA ESTEBAN	4100		1						
10302	ECHEVERRIA ESTEBAN	4000		1						
10303	ECHEVERRIA ESTEBAN	3900		1						
10304	ECHEVERRIA ESTEBAN	3900		0,65						
10306	ECHEVERRIA ESTEBAN	3300		1						
10307	ECHEVERRIA ESTEBAN	3200		1						
10308	ECHEVERRIA ESTEBAN	3100		1						
10309	PARERA BLAS	3200		1						
10310	AGUERO JULIAN SEGUNDO	2600		0,5						
10311	AGUERO JULIAN SEGUNDO	2500		1						
10312	PARERA BLAS	4100		1						
10313	PARERA BLAS	3900		1						

10314	BEIRO FRANCISCO	3400		1						
10315	BEIRO FRANCISCO	3300		1						
10318	MENDEZ GERVASIO	3900		1						
10319	MENDEZ GERVASIO	4000		1						
10320	PARANA	5400		1						
10321	PARANA	5500		1						
10322	PARANA	5500		1						
10323	PARANA	5600		1						
10324	PARANA	5700		1						
10325	PARANA	5800		1						
10326	PARANA	5900		1						
10327	PARANA	6000		1						
10328	MITRE BARTOLOME AV	3000		1						
10329	MITRE BARTOLOME AV	3000		1						
10330	MITRE BARTOLOME AV	2900		1						
10331	MORENO MARIANO DR	5300		1						
10332	MORENO MARIANO DR	5100		1						
10333	MORENO MARIANO DR	5000		1						
10334	TRIUNVIRATO	3400		0,5						
10335	CERRITO	3400		0,5						
10336	LORETO VIRREY	3100		1						
10337	CURAPALIGUE	6400		1						
10338	CURAPALIGUE	6500		1						
10339	ADER BERNARDO AV	3100		1						
10340	ADER BERNARDO AV	2900		1						
10341	ADER BERNARDO AV	2900		1						
10342	ADER BERNARDO AV	3200		1						
10343	ADER BERNARDO AV	3200		1						
10344	ARGERICH COSME DR	3200		1						
10345	FRAY CAYETANO RODRIGUEZ	2500		1						
10348	INDEPENDENCIA	2500		1						
10349	BALCARCE GRAL	1800		1						
10350	CONSTITUYENTES DE LOS AV	500		1						
10351	CONSTITUYENTES DE LOS AV	400		1						
10352	HABANA	200		1						
10353	COCHABAMBA	500		1						
10354	COCHABAMBA	400		1						
10355	COCHABAMBA	300		1						
10356	ALVAREZ AGUSTIN	4900		1						
10357	CASEROS	2100		1						
10358	CHACABUCO	2100		1						
10359	JURAMENTO	6000		1						
10361	SAN JUAN B DE LA SALLE	4100		2,5						
10362	MANSO GUILLERMO	500		1						
10363	CONSTITUYENTES DE LOS AV	100		3						
10364	RIOJA	2200		1						
10365	OLAGUER Y FELIU A VIRREY	2300		2						
12261	DIAZ DE SOLIS JUAN	2400		2						
	TOTAL DE CUADRAS:			**223,15**						

aysa	**RED DE AGUA** **CIERRE DE MALLAS FALTANTES** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **20° Año de Concesión** IAT2-C-A-RED 01 | ex PL IA N° 36

DRN-NA

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS:									

Región Oeste

Distrito: LA MATANZA

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
10972	TEJEDOR CARLOS	700		1,72						
10973	ANGACO	4300		1,46						
10974	LARREA	4300		1						
10976	MI ESPERANZA	4200		1						
10977	EL CHOUI	0		1,14						
10978	LOS ANDES (LMN)	3600		2,08						
10979	EL SAUCO	0		2,4						
10980	GONZALEZ J N FRAY	0		2,41						
10981	EL ALPATACO	0		0,69						
10983	ESPAÑA	100		6,56						
10984	ESPAÑA	900		7,38						
10985	EL CHAJA	0		0,44						
10992	CROVARA E J INT AV (LMN)	4800		5,7						
11017	LA PEPERINA	3500		2						
11022	CAMINITO DE LAS TALAS	0		0,6						
11050	MAGNASCO (LMO)	7100		1						
11051	MATIAS	6300		0,75						
11052	NEWBERY JORGE (LMO)	5200		1,15						
11053	SCARLATTI DOMINGO	6100		0,8						
11055	BESARES	4400		1,1						
11056	ZEPPELIN (LMO)	4900		0,7						
11057	GARCIA MEROU M (LMO)	2700		2,1						
11059	FIGUEROA ALCORTA	1700		1,38						
11062	AFRICA	2500		2,68						
11064	SANTIAGO	6500		1,07						
11065	OMBU	3500		0,83						
11066	PAMPA	3100		1,36						
11068	BERNA	1600		1,86						
11070	SINCLAIR	5400		0,73						
	TOTAL DE CUADRAS:			**54,09**						

Distrito: MORON

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
10896	RUIZ ROBERTO	500		0,95						
10897	DIAZ AVELINO PJE	600		1,24						
10899	LLAVALLOL F GDOR	100		1,75						
10900	TUYUTI	700		1,06						
10901	SARMIENTO DOMINGO F PRES	0		1,23						
10902	AZUL	1300		0,9						
10903	BIANCO JOSE	2000		0,73						
10904	CANADA DE JUAN RUIZ AV (M)	1000		2,12						
10907	BIANCHI PJE	600		1,24						
10908	CANADA DE JUAN RUIZ AV (M)	1100		1,8						
10909	CESPEDES MARTINA	700		0,68						
10910	BARCELONA	1400		1,04						
10912	MOSCONI ENRIQUE GRAL	1100		1,14						
10916	PIEDRABUENA LUIS	1800		1						
10917	PIEDRABUENA LUIS	1600		1						
10918	VILLEGAS SERAPIO INT	1700		3						
10919	URQUIZA JUSTO J DE GRAL	800		0,5						
10920	GALAN JOSE M GRAL	800		0,5						
10921	MATIENZO BENJAMIN TTE AVIADOR	300		4						
10922	BERGAMINI JOSE P TTE GRAL	0		1						
10924	AGUADO ALEJANDRO	1400		0,72						
10925	SANTA TERESA	1300		1						
10928	ALVAREZ DONATO GRAL	0		0,95						
10929	ALVAREZ DONATO GRAL	1200		0,87						
10935	COLIHUE	500		0,82						
10939	GOMEZ JOSE VALENTIN DR	100		4,95						
10940	GORIA CAYO ELISEO INT	100		4,76						
10942	GUEMES LUIS DR (RN 7)	300		2,68						
10943	HUMAITA	600		1,75						
10944	IRIGOYEN BERNARDO DE DR	900		1,12						
10945	IRIGOYEN BERNARDO DE DR	300		0,57						

10949	MITRE BARTOLOME GRAL	1600		0,77						
10952	ORTIZ DE ROSAS J M GDOR	1700		1,1						
10957	RIVADAVIA AV	18500		0,96						
10960	VALLE JUAN JOSE GRAL	100		2,14						
10962	YRIGOYEN HIPOLITO PRES (RP 4)	1700		1,22						
10965	COSTA ABEL INT	1000		0,52						
10971	OZANAN	1700		2,05						
12246	GORIA CAYO ELISEO INT	1100		2,25						
12274	YRIGOYEN HIPOLITO PRES (RP 4)	1700		1,15						
	TOTAL DE CUADRAS:			**59,23**						

Distrito: TRES DE FEBRERO

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
11081	TEJEDOR CARLOS	4300		1,22						
11083	VICENZI DE	3900		1						
	TOTAL DE CUADRAS:			**2,22**						

DRO-NA

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS:									

Región Sudeste

Distrito: AVELLANEDA

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
11092	SAN JUAN	1800		0,88						
11095	LUCENA COMTE	100		5,29						
11096	MARTINICA	200		2,61						
11097	LUCENA COMTE	100		8						
11098	HEREDIA GRAL	1900		4,91						
11099	SUPISICHE	1000		1,3						
11100	VERTIZ	800		2,34						
11101	ALEM LEANDRO N	2100		1,23						
11102	HORNOS GRAL	100		0,92						
11105	LOMAS DE ZAMORA	1500		2,02						
11106	MORENO MARIANO	3400		1,23						
11107	YRIGOYEN HIPOLITO PRES AV	0		2,5						
11108	HELGUERA	6800		1,25						
11109	MORENO ISMAEL DR	1700		4,4						
11110	VILLEGAS GRAL	2100		1,8						
11111	SAN LUIS	800		1,2						
11112	DIAZ CNEL	1200		0,93						
11113	VARELA JUAN CRUZ	5600		0,3						
11116	CHACABUCO	700		0,53						
11117	PINZON MARTIN V	500		1,02						
11118	MALVINAS ARGENTINAS	6800		1,25						
12122	ALBERTI MANUEL	1200		0,19						
12124	VIEYTES	1400		1,1						
12126	EL CEIBO PJE	1200		0,92						
12127	VARELA JUAN CRUZ	6800		0,57						
12128	ZOLA EMILIO	5300		1,23						
12132	VARELA JUAN CRUZ	5800		0,84						
12133	VENEZUELA	6700		0,83						
12135	VARELA JUAN CRUZ	6800		0,76						
12136	VARELA JUAN CRUZ	5900		0,9						
12140	TOAY	5900		6,03						
12141	THIWISSEN P	5100		0,89						
12142	SUPISICHE	1200		0,9						
12143	SOREDA SALVADOR	3900		0,9						
12145	MORENO ISMAEL DR	1300		2,23						
12146	SARMIENTO	300		1,02						
12147	SAN ISIDRO	4500		1,2						
12148	SAN ISIDRO	4700		0,97						
12150	RONDEAU CNEL	900		1,35						
12151	RODO JOSE ENRIQUE	1500		0,86						
12153				1,8						
12154	RIVERO	600		0,9						
12155	RAPOSO MANUEL	6100		0,79						
12156	PITAGORAS	2400		0,8						
12157	PITAGORAS	2200		5,5						
12158	PITAGORAS	2200		2,48						
12159	PITAGORAS	2300		4,65						
12160	PIRAN GRAL	1600		2,02						
12161	PINO	5700		3,1						
12162	PILA	3200		0,96						
12163	PAYSANDU	500		0,81						
12165	OTERO GRAL	700		1,8						
12166	LOMAS DE ZAMORA	1700		0,72						
12167	ORTEGA	5500		1,8						
12168	OLIDEN GDOR	800		0,9						
12169	OBLIGADO PASTOR	0		2,6						
12170	OBARRIO MANUEL	400		1,18						
12171	NUÑEZ J M	1800		0,51						
12172	NICARAGUA	100		1,8						
12174	KENNEDY PJE	400		1,29						
12175	MITRE BARTOLOME PRES AV	4900		1,09						
12176	RONDEAU CNEL	500		0,91						
12177	PILA	3200		1,15						
12178	MIGLIO	1100		1,31						
12179	MERLO	4500		0,9						
12182	MARTIN FIERRO	1600		2,02						
12183	MANSILLA GRAL	2300		1,65						

12184	CASACUBERTA CNEL	2400		0,52						
12185	LUCENA COMTE	1000		0,76						
12186	LUCENA COMTE	3000		1,3						
12187	LOMAS DE ZAMORA	1100		1,8						
12189	LAFUENTE TTE CNEL	2900		0,88						
12190	TRES SARGENTOS	1200		4,21						
12191	LAFUENTE TTE CNEL	5800		1,5						
12192	SERNA J M DE LA	2600		0,74						
12193	LAFUENTE TTE CNEL	3100		0,72						
12194	JUSTO JUAN B	600		2,6						
12195	JUSTO JUAN B	400		0,9						
12196	IGUAZU	800		0,78						
12198	HIROSHIMA	1000		0,9						
12199	HEREDIA GRAL	6800		1,7						
12200	HEREDIA GRAL	1100		1,14						
12201	HEREDIA GRAL	4800		0,96						
12203	GOYENA PEDRO	5700		1,35						
12205	GUIFRA TTE CNEL	1100		0,77						
12206	FERRE GRAL	1000		2,01						
12207	ESTIBAU CNEL	200		0,6						
12208				2,02						
12209	DEBENEDETTI AGUSTIN	2800		1,86						
12210	CORDERO ALTE	6600		3,21						
12212	CENTENARIO URUGUAYO	1900		0,8						
12215	CANGALLO	2500		0,73						
12216	CAMPICHUELO	5100		1,91						
12217	CAMPICHUELO	6700		0,83						
12218	CAMBACERES	200		1,35						
12220	BOLIVAR	4600		0,6						
12221	BOLIVAR	4700		0,6						
12222	BOLIVAR	4500		0,6						
12223	BASAVILBASO NICANOR DR	1400		1,56						
12225	AYOLAS	1400		1,34						
12227	ARREDONDO GRAL	6800		0,49						
12228	ANGULO J P	1500		1,03						
12229	ALTOLAGUIRRE	800		0,85						
12293	VARELA JUAN CRUZ	6000		2,55						
12294	VARELA JUAN CRUZ	6200		0,91						
12312	VENEZUELA	2300		0,7						
	TOTAL DE CUADRAS:			**165,12**						

Distrito: LANUS

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
11119	25 DE MAYO AV	2600		4,11						
11120	OLIDEN GDOR	3000		0,79						
11122	OLIDEN GDOR	1600		2,71						
11123	GUADALUPE	2200		1,23						
11125	OCAMPO MANUEL	2500		1,16						
11128	FORMOSA	2000		0,64						
11129	FLORIDA	1900		3,54						
11131	JUNCAL	5400		1,1						
11132	JUNCAL	5100		1,41						
11133	JUNCAL	5100		1,43						
11137	RIVADAVIA BERNARDINO PRES AV	1400		0,3						
11139	RODRIGUEZ MARTIN GDOR BLVD	4900		0,47						
11141	RODRIGUEZ MARTIN GDOR BLVD	3200		1,67						
11142	PINTO GRAL	3600		1,34						
11143	RODRIGUEZ MARTIN GDOR BLVD	2700		1,2						
11144	EL MORO PJE	2900		1,38						
11145	YERBAL	4700		1,44						
11146	HUMAHUACA	2900		2,12						
11150	PILCOMAYO	1000		0,83						
11152	REPUBLICA ARGENTINA	1300		0,69						
11154	CHORROARIN	700		0,24						
11160	SITIO DE MONTEVIDEO	3400		0,98						
11161	SITIO DE MONTEVIDEO	3600		0,93						
11162	TUCUMAN	3700		0,8						
11164	TUCUMAN	5100		1,78						
11168	MENDEZ CNEL	400		1,57						
11170	BLANCO ENCALADA MANUEL	5000		2,95						
11174	HUGO VICTOR	1400		0,63						
11175	HUGO VICTOR	1500		0,73						
11176	HUGO VICTOR	1600		0,8						
11177	ILLIA ARTURO	5100		2,45						
11178	PRINGLES CNEL	4900		0,53						

11179	PRINGLES CNEL	4200		1,3						
11180	PRINGLES CNEL	5100		0,5						
11181	POSADAS GERVASIO A DE	900		0,75						
11183	WEILD MARGARITA	3800		1,4						
11188	CORVALAN MANUEL	1200		2,08						
11190	CAVIA PEDRO F S DE	2800		1,38						
11191	CAVIA PEDRO F S DE	2700		0,34						
11192	CAVIA PEDRO F S DE	1400		1,23						
11193	BUERAS TTE CNEL	4900		0,98						
11197	ARENAL CONCEPCION PJE	700		1,09						
11198	DEHEZA GRAL	500		1,91						
11200	BOLAÑOS JOSE	2900		3,79						
11208	AYACUCHO	4800		0,96						
11211	ALVAR NUÑEZ	4900		0,58						
11214	9 DE JULIO AV	3400		2,2						
11216	PILCOMAYO	3300		3,38						
11217	FRANCO RAMON CMTE	4000		2,2						
11218	MURATURE CNEL	2900		3,56						
11220	PRADO COMTE	3600		1,92						
11221	PRADO COMTE	3500		0,51						
11222	PORCHIA ANTONIO	2900		1,23						
11226	ALBARIÑOS CNEL	4600		1,96						
11227	YATAY	100		2,6						
11228	BOLAÑOS JOSE	3100		1,2						
11230	RUCCI JOSE IGNACIO	2100		0,71						
11231	YATAY	2500		1,21						
11232	PITAGORAS	4900		1,29						
11233	PITAGORAS	5000		1,27						
11234				0,94						
11235	BLANCO ENCALADA MANUEL	5400		1,28						
12023	RIVADAVIA BERNARDINO PRES AV	1700		2,39						
12024	SITIO DE MONTEVIDEO	5100		1,12						
12027				3,56						
12028	YRIGOYEN HIPOLITO PRES AV	3200		3,04						
12029	YAPEYU	1300		1,14						
12030	YAPEYU	800		1,35						
12031	WEILD MARGARITA	4900		0,4						
12032	VILLANUEVA TTE CNEL PJE	1000		0,74						
12033	VERACRUZ	1500		1,15						
12034	VALLE ARISTOBULO DEL	3500		0,81						
12035	UCRANIA	3000		0,51						
12036	TUCUMAN	3700		0,8						
12037	DE LOS ITALIANOS BOULEVARD	1600		1,36						
12038	SUIPACHA	2700		1,09						
12040	SANCHEZ DE BUSTAMANTE TEODORO	300		0,2						
12041	SAN CARLOS	2000		2,25						
12043	SAN CARLOS	700		0,82						
12044	SAN CARLOS	1600		0,64						
12046	RUCCI JOSE IGNACIO	1000		1,68						
12047	RUCCI JOSE IGNACIO	1300		0,7						
12048	ROMA	2900		0,53						
12049	ROCHA DARDO	3300		0,36						
12052	PICO GRAL	1100		1,24						
12054	PERON EVA AV	3700		2,1						
12056	PERON EVA AV	4700		1,89						
12058	PEDERNERA JUAN ESTEBAN GRAL	600		4,72						
12060	PARERA BLAS	1500		0,88						
12062	PANAMA	3500		1,01						
12063	OYUELA JOSE M	2800		0,27						
12064	MONASTERIO	2000		1,04						
12065	MONASTERIO	900		2,72						
12066	MAURE CNEL	4700		0,96						
12067	MATANZA	1700		1,54						
12068	MATANZA	2300		3,66						
12070				2,43						
12071	MADARIAGA GRAL	2800		1,26						
12072	LYNCH CNEL AV	2300		2						
12073	LITUANIA	2600		1,7						
12074	LAS HIGUERITAS	300		1,01						
12075	ESTRADA JOSE MANUEL	5000		0,88						
12076	ITAPIRU	1400		2,1						
12077	GUARRACINO LORENZO ANTONIO DR	1100		0,31						
12078	HEROES DE MALVINAS	700		3,35						
12080	GUIDO GRAL	5100		0,92						
12081	GUIDO GRAL	5000		0,84						
12082	PINTO GRAL	3100		1,68						
12084	HERNANDARIAS GDOR	900		1,54						
12085	FRAY JULIAN LAGOS	1200		0,94						

12086	FRANCE ANATOLE	400		0,94						
12087	FERNANDEZ MORENO	3600		1,46						
12088	ECHEVERRIA ESTEBAN	2200		1,64						
12089	PERON EVA AV	5200		3,4						
12090	VALLE ARISTOBULO DEL	2900		1,17						
12091	CHUBUT	3300		2,34						
12093				1,4						
12094	CATAMARCA	300		0,64						
12096	CASTELLANOS JOAQUIN	3500		0,46						
12097	CALLAO	2900		2,8						
12099	CAAGUAZU	5000		0,79						
12102	BUERAS TTE CNEL	3900		0,6						
12103	BONORINO ESTEBAN PJE	200		0,52						
12104	BOLAÑOS JOSE	4400		1,01						
12105	BLANCO ENCALADA MANUEL	2000		1,51						
12106	BLANCO ENCALADA MANUEL	2800		0,31						
12107	BERON DE ASTRADA GENARO	4800		0,48						
12108	RIVADAVIA BERNARDINO PRES AV	1600		0,66						
12109	ARLT ROBERTO PJE	2900		1,22						
12111	ALVEAR CARLOS DE GRAL	4800		1,86						
12115	AGUILAR CNEL	2900		2,02						
12116	FRAY JOSE G M ACHAVAL	2800		0,74						
12247	KLOOSTERMAN DIRK HENRY	900		3						
12266	PIROVANO IGNACIO	1800		2,5						
12268	ALLENDE CNEL	2000		2,12						
12269	YAPEYU	700		0,88						
12270	SALCEDO MIGUEL	1400		1,23						
12283	MENDEZ CNEL	600		0,15						
	TOTAL DE CUADRAS:			**197,18**						

Distrito: QUILMES

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
11236				0,32						
11238	897-CALLE 897	3500		1,03						
11239	891-CALLE 891	3300		1,07						
11246	832-CALLE 832	1600		0,88						
11247	833-CALLE 833	1600		0,88						
11248	834-CALLE 834	1700		0,88						
11249	835-MENDELEVICH A	1700		0,88						
11250	888-QUINTANA RAMON	3700		1,25						
11252	162-CALLE 162	0		4,44						
11253	164-CALLE 164	1200		1,06						
11254	168-CALLE 168	700		1,2						
11255	169-CALLE 169	2000		1,01						
11256	171-CALLE 171	2000		0,78						
11257	181-CALLE 181	1000		0,85						
11258	190-CALLE 190	300		1,29						
11259	133-BRAGGIO CARLOS	2000		2,12						
11260	165-CALLE 165	2000		1,29						
11261	191-CALLE 191	1500		0,99						
11264	325-SOUTO MANUEL	4300		0,82						
11266	340 BIS-CALLE 340 BIS	3800		1,3						
11268	391-CALLE 391	1400		0,37						
11269	395-CALLE 395	2000		0,65						
11270	396-CALLE 396	2300		0,3						
11272	801-CALLE 801	1800		2,46						
11274	836-CALLE 836	1500		0,65						
11275	837-GARCIA J L CABO	1800		1,25						
11276	838-CALLE 838	1700		0,56						
11277	839-CALLE 839	600		0,44						
11278	839-CALLE 839	1100		1,57						
11284	874-CALLE 874	3800		2,03						
11286	878-CALLE 878	4400		0,42						
11287	882-CALLE 882	3800		2,14						
11288	886-CALLE 886	1200		0,44						
11289	887-CALLE 887	4000		0,68						
11290	887-CALLE 887	3500		0,77						
11291	887-CALLE 887	2800		1,29						
11292	887-CALLE 887	1100		0,44						
11294	831-CALLE 831	1600		0,36						
11295	RIBERENA LAS PIEDRAS AV	3800		4,07						
11296	RIBERENA LAS PIEDRAS AV	4400		2,36						
11298	CAMINO GRAL BELGRANO (RP 14)	4000		6,55						
11299	344-CASTRO P	3600		1,34						
11300	303-CATAMARCA	2000		2,85						

11301	367-CONDARCO (Q)	1100		2,1						
11302	314-CORRIENTES	4100		0,42						
11305	403-IGLESIAS EVARISTO	600		0,37						
11306	34-ECHEVERRIA	900		2,49						
11307	380-ELUSTONDO PEDRO (QO)	800		1,11						
11308	313-ENTRE RIOS	2200		0,51						
11309	333-ESQUIU	2900		1,04						
11310	320-AMOEDO FELIPE	3900		1,13						
11311	29-FRENCH	800	CM 11311 - SA70294 - Reno RSA QUI-DMA-0	0			0,213		CM 11311 - SA70294	
11313	324-IRALA	3800		2,25						
11314	311-ISLAS MALVINAS	3900		1,06						
11315	311-ISLAS MALVINAS	1700		2,37						
11317	151-ITUZAINGO	700		0,85						
11318	37-VARELA JUAN CRUZ	200	CM 11318	0			0,101		CM 11318	
11319	35-LUGONES LEOPOLDO	1300		2,21						
11320	122-ALEM LEANDRO N (B)	1500		0,28						
11321	122-ALEM LEANDRO N (B)	1200		2,77						
11322	134-LINIERS	1600		2						
11323	469 BIS-LAS MALVINAS	5100		4,33						
11326	67-MONROE (Q)	1200	CM 11326 - SA70294 - Reno RSA QUI-DMA-0	0			0,355		CM 11326 - SA70294	
11327	134-ANDREA M DE MONS	2000		0,97						
11329	115-MONTEVIDEO	1600		0,85						
11330	404-NAMUNCURA C	200		1,16						
11331	404-NAMUNCURA C	600		1,52						
11332	130-NTRA SEÑORA DE LA GUARDIA	300		0,92						
11335	405-PARAGUAY	600		0,81						
11336	INDIOS KILME PJE	1000		1,06						
11337	312-PELLEGRINI CARLOS	1700		2,13						
11338	319-PEREZ GALDOS BENITO	2400		2,11						
11339	888-QUINTANA RAMON	1000		1,46						
11340	888-QUINTANA RAMON	3800		0,6						
11341	888-QUINTANA RAMON	3300		2,12						
11342	888-QUINTANA RAMON	2900		2,52						
11343	456-RIO SALADO	4800		1,5						
11344	411-RIO GRANDE	1600		1,45						
11345	132-RODRIGUEZ PEÑA	1500		2,29						
11346	828-SAN MARTIN (S)	2700		4,74						
11347	ARROYO SAN FRANCISCO	3700		0,74						
11348	318-SAN MAURO CASTELVERDE	3900		1,75						
11349	309-SANCHEZ JOSE MARIA OF	3000		1,1						
11350	327-SARRATEA	3100		1,25						
11351	310-TUCUMAN	1700		1,66						
11352	73-SARDOU	1700		2,77						
11355	498-UNAMUNO M DE (E)	5000		0,83						
11356	498-UNAMUNO M DE (E)	5200		0,74						
11357	323-AYOLAS	3300		0,9						
11358	327-SARRATEA	1200		4,4						
11359	63-BELL ALLISON (Q)	1000		0,93						
11360	350-SCHWEITZER ALBERT (QO)	2900		2,16						
11361	251-CRAMER	100		2,11						
11362	237-PATRICIOS	0		1,39						
11363	250-URIBURU	0		1						
11365	22-GUIDO	600		6						
11366	149-YAPEYU	200		1,25						
11367	160-VICTORICA	100		2,38						
11370	390-CALLE 390	3900		0,9						
11372	336-GUTIERREZ (Q)	3700		0,9						
11373	866-CALLE 866	2700		0,9						
11374	870 BIS-CALLE 870 BIS	2800		0,9						
11376	801-CALLE 801	1800		2						
11377	892-PERON EVA	1000		0,71						
11379	CAMINO GRAL BELGRANO (RP 14)	4900		1,9						
11380	351-GRAN CANARIA (Q)	3700		0,9						
11381	464-GARCIA MARTIN (E)	3800		0,69						
11382	25-GARAY	1000		0,31						
11384	202-ADLER M R	100		1,38						
11385	36-AGRIGENTO SICILIA ITALIA	1300		1,96						
11386	36-AGRIGENTO SICILIA ITALIA	900		2,05						
11387	36-AGRIGENTO SICILIA ITALIA	100		0,65						
11388	36-AGRIGENTO SICILIA ITALIA	200	CM 11388	0			0,175		CM 11388	
11389	71-SYERRA RUFINO E AGRIM	1500		1,11						
11390	124-AMEGHINO	1600		0,55						
11391	235-ASCASUBI	100		0,69						
11394	858-MONTEVERDE GDOR AV (RP 4)	2800		1,11						
11395	MOSCONI GRAL AV	4300		4,89						
11396	YRIGOYEN HIPOLITO AV	5500		2,17						
11397	YRIGOYEN HIPOLITO AV	4700		1,08						
11398	HERNANDEZ JOSE AV	200		0,97						

11399	LOS QUILMES AV (RP 36)	0		2,18						
11400	LOS QUILMES AV (RP 36)	400		3,55						
11402	104-BERMEJO	1200		1,37						
11403	133-BOEDO	1700		2,25						
11404	401-BOLIVIA	0		4,05						
11405	383-BLANCO JOSE A	2200		0,76						
11406	RIBERENA LAS PIEDRAS AV	2600		1,47						
11408				0,96						
11409	RIBERENA LAS PIEDRAS AV	4000		1,65						
11410				1,66						
11411				2,68						
11412				1,75						
11413				1,75						
11414	310-TUCUMAN	1900		1,13						
11416	239-PUEYRREDON	0		0,11						
11417	829-CALLE 829	400		1,22						
11418	827-CALLE 827	700		1,01						
11419	827-CALLE 827	1200		0,65						
12015	388-HUISI DE SEQUI A	1700		2,13						
12016	833-CALLE 833	2000		1,42						
12017	803-CALLE 803	2000		1,58						
12018	891-CALLE 891	1200		2,38						
12019	861-CALLE 861	2700		1,48						
12020	388-HUISI DE SEQUI A	700		2,05						
12021	368-HUSARES (QO)	2400		1,83						
12309	404-MENDOZA	600		1						
	TOTAL DE CUADRAS:			**219,98**						

aysa	**RED DE AGUA** **CIERRE DE MALLAS FALTANTES** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **20° Año de Concesión** IAT2-C-A-RED 01 | ex PL IA N° 36

DRSE-NA

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS:									

	RED DE AGUA	Informe Anual	
aysa	CIERRE DE MALLAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT2-C-A-RED 01	ex PL IA N° 36

Región Sudoeste

Distrito: ALMTE BROWN

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
11429	OBISPO COLOMBRES JOSE EUSEBIO	1800		2						
11823	30 DE SETIEMBRE	800		7,6						
11825	COMBATE DE LOS POZOS	0		1						
11827	MONTE SANTIAGO	0		1						
11832	ROCHA DARDO	300		2,9						
11833	CERVANTES SAAVEDRA M DE	400		2,9						
11834	ILLIA A	0		0,9						
11835	DE KAY JORGE	1500		1						
11842	LA GACETA	0		1						
11843	30 DE SETIEMBRE	1700		4,08						
11844	30 DE SETIEMBRE	1300		1,39						
11856	ROSALES LEONARDO	3400		5,05						
11890	SANTA ANA	1100		4,4						
11917	CERVANTES SAAVEDRA M DE	1200		0,92						
11918	THORNE JUAN	1900		0,31						
11924	QUINTANA	1700		0,38						
11926	STACY ROBERTO	1900		1,12						
11927	NOTHER TOMAS	0		2,56						
11929	QUINTANA	900		1,47						
11930	SAN MIGUEL	700		1,06						
11931	CORDERO	900		0,65						
11933	LA TORCAZA	2000		1,17						
11939	TERRAZA FIDEL	200		3,39						
11940	MURATURE JOSE	500		1						
11942	CHAYTER DIEGO	300		1						
12298	EL HORNERO	700		4						
	TOTAL DE CUADRAS:			**54,25**						

Distrito: ESTEBAN ECHEVERRIA

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
11424	SANTAMARINA ENRIQUE AV	400		1,55						
11948	MORENO MARIANO	800		2						
11961	RUTA DE LA TRADICION (RP 4)	4900		1,14						
11968	LAGO NAHUEL HUAPI	1900		0,38						
11969	LAGO GUTIERREZ	1900		0,38						
11989	MAR DEL PLATA	8200		1,09						
11993	RUTA DE LA TRADICION (RP 4)	9200		1,72						
12003	MORENO MARIANO	600		0,5						
12005	CARDEZA EMILIO DR	600		1,6						
12006	MURTRA AMAT ALFONSO	200		2,2						
12007	FORD EVANGELIO G TTE	600		1						
12011	12 DE OCTUBRE	100		0,5						
12281	MURTRA AMAT ALFONSO	400		1,74						
12284	GANDULFO PEDRO	1000		0,6						
12314	DE LA NORIA AV	1000		1						
	TOTAL DE CUADRAS:			**17,4**						

Distrito: EZEIZA

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
12014	NECOCHEA	200		1,67						
	TOTAL DE CUADRAS:			**1,67**						

Distrito: LOMAS DE ZAMORA

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
11438	EL CHURRINCHE	4900		1,8						
11443	MALABIA	800		7,2						
11444	VERGARA VALENTIN	1500		9,2						
11446	SOLER MIGUEL ESTANISLAO	1500		0,9						
11448	DEL REY AV	700		1						

11452	SAN SALVADOR	1300		3,7						
11453	SAN SALVADOR	1300		4,6						
11457	FRIAS EUSTAQUIO GRAL	900		7,2						
11458	GOMEZ ALBERTO	600		2						
11459	NERVO AMADO	500		1,8						
11460	PERON JUAN DOMINGO PRES AV	200		2,8						
11461	COLOMBRES JOSE EUSEBIO	2300		1,8						
11463	PERON JUAN DOMINGO PRES AV	1000		0,45						
11464	DIAZ TEZANOS ENRIQUETA	1600		0,35						
11465	LARROQUE ALBERTO	2400		0,91						
11468	DARWIN CARLOS	500		2,31						
11469	DARWIN CARLOS	500		2,6						
11470	HORNOS GRAL	0		2,6						
11471	MORAZAN FRANCISCO DE	2400		4,6						
11472	CIPOLLETTI	2100		9,2						
11474	GUARDIA NACIONAL	800		1						
11478	CAAGUAZU	1100		1						
11480	OLIDEN VICENTE	2000		2						
11481	TORRE L DE LA	2700		0,9						
11482	SARMIENTO CAP	500		2						
11483	RODRIGUEZ MARTIN GRAL	400		1						
11484	BRAVO MARIO	0		1						
11485	PONCE ANIBAL	1100		2						
11486	NAMUNCURA CEFERINO	1000		2						
11487	FRANC GUIDY DE CID	1000		2						
11488	GORDILLO TIMOTEO	1000		1						
11489	ACERBONI ANA	1000		1						
11490	OLIVERO EDUARDO MAYOR	1100		3						
11491	VERNET	1100		3,5						
11492	MINETTO CELINA L DE	1200		1						
11493	MINETTO CELINA L DE	900		1						
11494	PALACIOS ALFREDO	1800		4						
11495	MISTRAL GABRIELA	1000		3						
11496	RODRIGUEZ MARTIN GRAL	1100		1						
11497	CESPEDES MARTINA	1800		3						
11498	BASCO JUAN M DR	1900		3						
11499	12 DE OCTUBRE	1500		10						
11500	PERON JUAN DOMINGO PRES AV	2400		2						
11501	BARBIERI VICENTE	1600		3						
11502	ALFARO ELOY	1600		1						
11503	ALFARO ELOY	1400		3						
11504	OLIVERO EDUARDO MAYOR	1500		2						
11505	ACERBONI ANA	1500		2						
11506	GORDILLO TIMOTEO	1500		1						
11507	TORRE L DE LA	1600		1,5						
11508	LAS TROPAS	1700		3						
11509	MISTRAL GABRIELA	1900		3						
11511	OLIVERO EDUARDO MAYOR	1900		3						
11512	OLIVOS	1700		3						
11513	FOURNIER	1700		3						
11514	SARMIENTO CAP	1700		1						
11515	RAWSON	1700		1						
11516	GUAMINI	100		1						
11517	CAMPOAMOR RAMON DE	100		1						
11518	PALMA RICARDO	100		3						
11519	PERON JUAN DOMINGO PRES AV	1900		2						
11520	ITURRIOZ TOMAS DR	700		1						
11521	VERDI JOSE	500		1						
11522	VERDI JOSE	700		2						
11523	PRANDO DAVID DR	700		3						
11524	BOERO FELIPE	700		3						
11525	BARBIERI VICENTE	1100		2						
11526	CHIMENTO MONS	1600		1						
11527	MADRID	1000		3						
11531	EL NOGAL	1000		1						
11532	ARMESTI	4900		1						
11537	CONDARCO	600		2,78						
11538	BENITEZ JOSE	100		2,4						
11539	ESPEJO GRAL	200		0,5						
11542	MARSELLA	1500		1,2						
11545	PUCCINI SANTIAGO	400		0,55						
11546	ROCHA DARDO	600		1,2						
11547	ROLDAN BELISARIO	400		1,2						
11548	ROLDAN BELISARIO	1000		2,24						
11550	EL MIRASOL	3300		1,2						
11551	SARRATEA	1400		1,2						
11553	ESTOCOLMO	800		1						
11554	PICHINCHA	1300		1,27						

11555	ALEM LEANDRO N	1800		32						
11556	GODOY CRUZ TOMAS	100		1						
11557	PERON JUAN DOMINGO PRES AV	800		4,11						
11559	NUÑEZ DE ARCE GASPAR	1200		1,22						
11560	PERON JUAN DOMINGO PRES AV	5000		0,67						
11561	CAMPANA	600		5,36						
11562	BARADERO	600		5,6						
11563	ARLT ROBERTO	2400		3						
11564	MILAN	2400		4,35						
11565	BRAVO MARIO	2400		2,66						
11566	CAMPANA	200		5,65						
11567	BARADERO	200		5,65						
11568	PILAR	200		5,65						
11569	MURATURE JOSE LUIS	2400		2,8						
11570	LARRAZABAL	2400		2,85						
11571	CONESA EMILIO GRAL	2400		2,85						
11572	DARWIN CARLOS	2400		2,7						
11574	MIRO GABRIEL	2000		1,4						
11575	QUESADA	1100		1						
11576	AUSTRALIA	1100		3						
11577	PEREZ GALDOS BENITO	1200		1,37						
11579	EJERCITO DE LOS ANDES	1100		3						
11580	MIRO GABRIEL	1300		3,5						
11582	MURATURE JOSE LUIS	1200		3						
11583	CONESA EMILIO GRAL	1200		1,5						
11584	DARWIN CARLOS	1200		1,5						
11585	MELO	400		1,75						
11589	BOULOGNE SUR MER	800		1,05						
11593	QUILMES	1800		2,51						
11594	SANTA CATALINA BLVD	300		1,24						
11598	FRIAS EUSTAQUIO GRAL	2300		1,18						
11599	RONDEAU	100		2,97						
11600	ANTARTIDA ARGENTINA AV	1500		1,65						
11603	PEÑA NESTOR DE LA	1300		1,2						
11604	SOLER MIGUEL ESTANISLAO	900		0,55						
11605	CHIMENTO MONS	900	AySA-REN MALLA 115 y 116-SA70220-RES. 1	0	1969	02/09/2025	0,429	21	AySA-REN MALLA 11	
11607	SUCRE ANTONIO J DE GRAL	1400		0,6						
11609	OLIDEN VICENTE	1100		3,7						
11610	MIRO GABRIEL	2000		0,9						
11617	GIBSON J	400		1						
11621	ÑANDUTI	2700		0,9						
11623	ROMA	1000		1,8						
11624	SANTA MARIA	1700		0,9						
11629	PEÑA NESTOR DE LA	1200		0,9						
11630	PRONZATO CARLOS DR	100		4,6						
11636	OLIVER LAUREANO	1800		0,9						
11637	OLIDEN VICENTE	2100		1,8						
11641	LOS PALOS BORRACHOS	2200		0,9						
11642	FERNANDEZ MORENO B	400		1,8						
11643	GARONA JUAN A	2400		0,9						
11648	MACHADO DE ASIS	400		0,9						
11652	SANTA LUCIA	400		0,9						
11653	SAN RAFAEL	1500		1,8						
11660	FERNANDEZ MANUEL A	1200		1,8						
11664	HUERGO JOSE MARIA	800		0,9						
11665	LOS ANDES	1800		0,9						
11670	ANCHORENA	900		2,7						
11671	ACHUPALLAS	1200		0,9						
11682	BARILARI	4100		0,9						
11683	ARANA GOIRI	5000		0,9						
11684	EUSKADI	5000		0,9						
11685	TILCARA	200		0,9						
11687	RODRIGUEZ PEÑA NICOLAS	0		0,9						
11689	WRIGHT F	300		2,7						
11692	BRUNO PADRE	1600		1,4						
11693	SAN LUIS	1100		0,9						
11694	ALVARADO RUDECINDO GRAL	1600		1,4						
11699	FERNANDEZ SIXTO	2300		3,7						
11706	MONACO	2300		3,2						
11707	BOQUERON	900		0,9						
11713	LOS ANDES	1400	AySA-REN MALLA 115 y 116-SA70220-RES. 1	0	1969	02/09/2025	0,429	21	AySA-REN MALLA 11	
11715	MONTEAGUDO BERNARDO DE	0		1,4						
11717	CASTRO FELIPE INT	1500		0,9						
11740	LA CALANDRIA	5100		3,01						
11741	EL HORNERO	5100		2,3						
11742	LA GOLONDRINA	4900		2,8						
11743	ACHERAL	300		1,8						
11744	ALIPPI ELIAS	100		1,67						

11746	LOS PARAISOS	0		3						
11759	ALONSO AMADO	2400		0,9						
11760	MOLDES	600		0,9						
11761	FRIEDRICHS	500		0,9						
11762	HUSARES	1000		0,9						
11767	SEVILLA	1900		0,9						
11771	RICCHIERI PABLO TTE GRAL	1000	AySA-REN MALLA 115 y 116-SA70220-RES. 1	0	1969	02/09/2025	0,429	21	AySA-REN MALLA 11	
11773	LOS ANDES	1100	AySA-REN MALLA 115 y 116-SA70220-RES. 1	0			0,133		AySA-REN MALLA 11	
11774	OLAZABAL	1100	AySA-REN MALLA 115 y 116-SA70220-RES. 1	0	1969	02/09/2025	0,429	21	AySA-REN MALLA 11	
11776	SAN CARLOS	600		1,2						
11777	HUERGO JOSE MARIA	600		0,9						
11779	LICHTENSTEIN BERNARDO	1400		0,9						
11782	FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO	300		1,8						
11783	GONZALEZ CHAVEZ	600		0,9						
11784	LOPEZ LUCIO V	800		0,9						
11785	TEJEDOR CARLOS	1000		0,9						
11786	LUXEMBURGO	3800		1						
11787	DINAMARCA	4900		0,9						
11789	GALLO	1500		2,8						
11792	BUENOS AIRES	900		0,9						
11793	TUNEZ	2700		0,9						
11795	CARRIEGO EVARISTO	2200		1,4						
11796	TERRADA	4900		0,9						
11797	TILCARA	700		0,9						
11798	CALCHAQUI	100		0,9						
11799	TILCARA	300		3,7						
11800	RICCHIERI PABLO TTE GRAL	1700		0,9						
11803	PINTOS	400		0,5						
11804	MALABIA	1300		1						
11807	EL CARDENAL	4700		1						
11808	CAAGUAZU	1000		1,4						
11812	ALIPPI ELIAS	300		1,8						
12230	AGUERO JOSE EUSEBIO	1400		2,63						
12233	SIRITO FRANCISCO	1100		1,23						
12234	SAN BASILIO	1000		2,4						
12240	MONACO	1800		7,36						
12265	RICCHIERI PABLO TTE GRAL	2100		1,25						
12296	QUILMES	1500		1						
12310	FALCON RAMON CNEL	1700		1						
	TOTAL DE CUADRAS:			**429,9**						


aysa	**RED DE AGUA** **CIERRE DE MALLAS FALTANTES** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe Anual** **20° Año de Concesión** IAT2-C-A-RED 01 | ex PL IA N° 36

DRSO-NA

N°	Calle	N°	Nombre Obra	N° de cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° de Habilitación	Fecha Habilitacion	Longitud (Km)	N° de Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS:									

13. CARTOGRAFIA EXPANSION AGUA

Planos Cobertura del Servicio de Agua Región Capital Federal

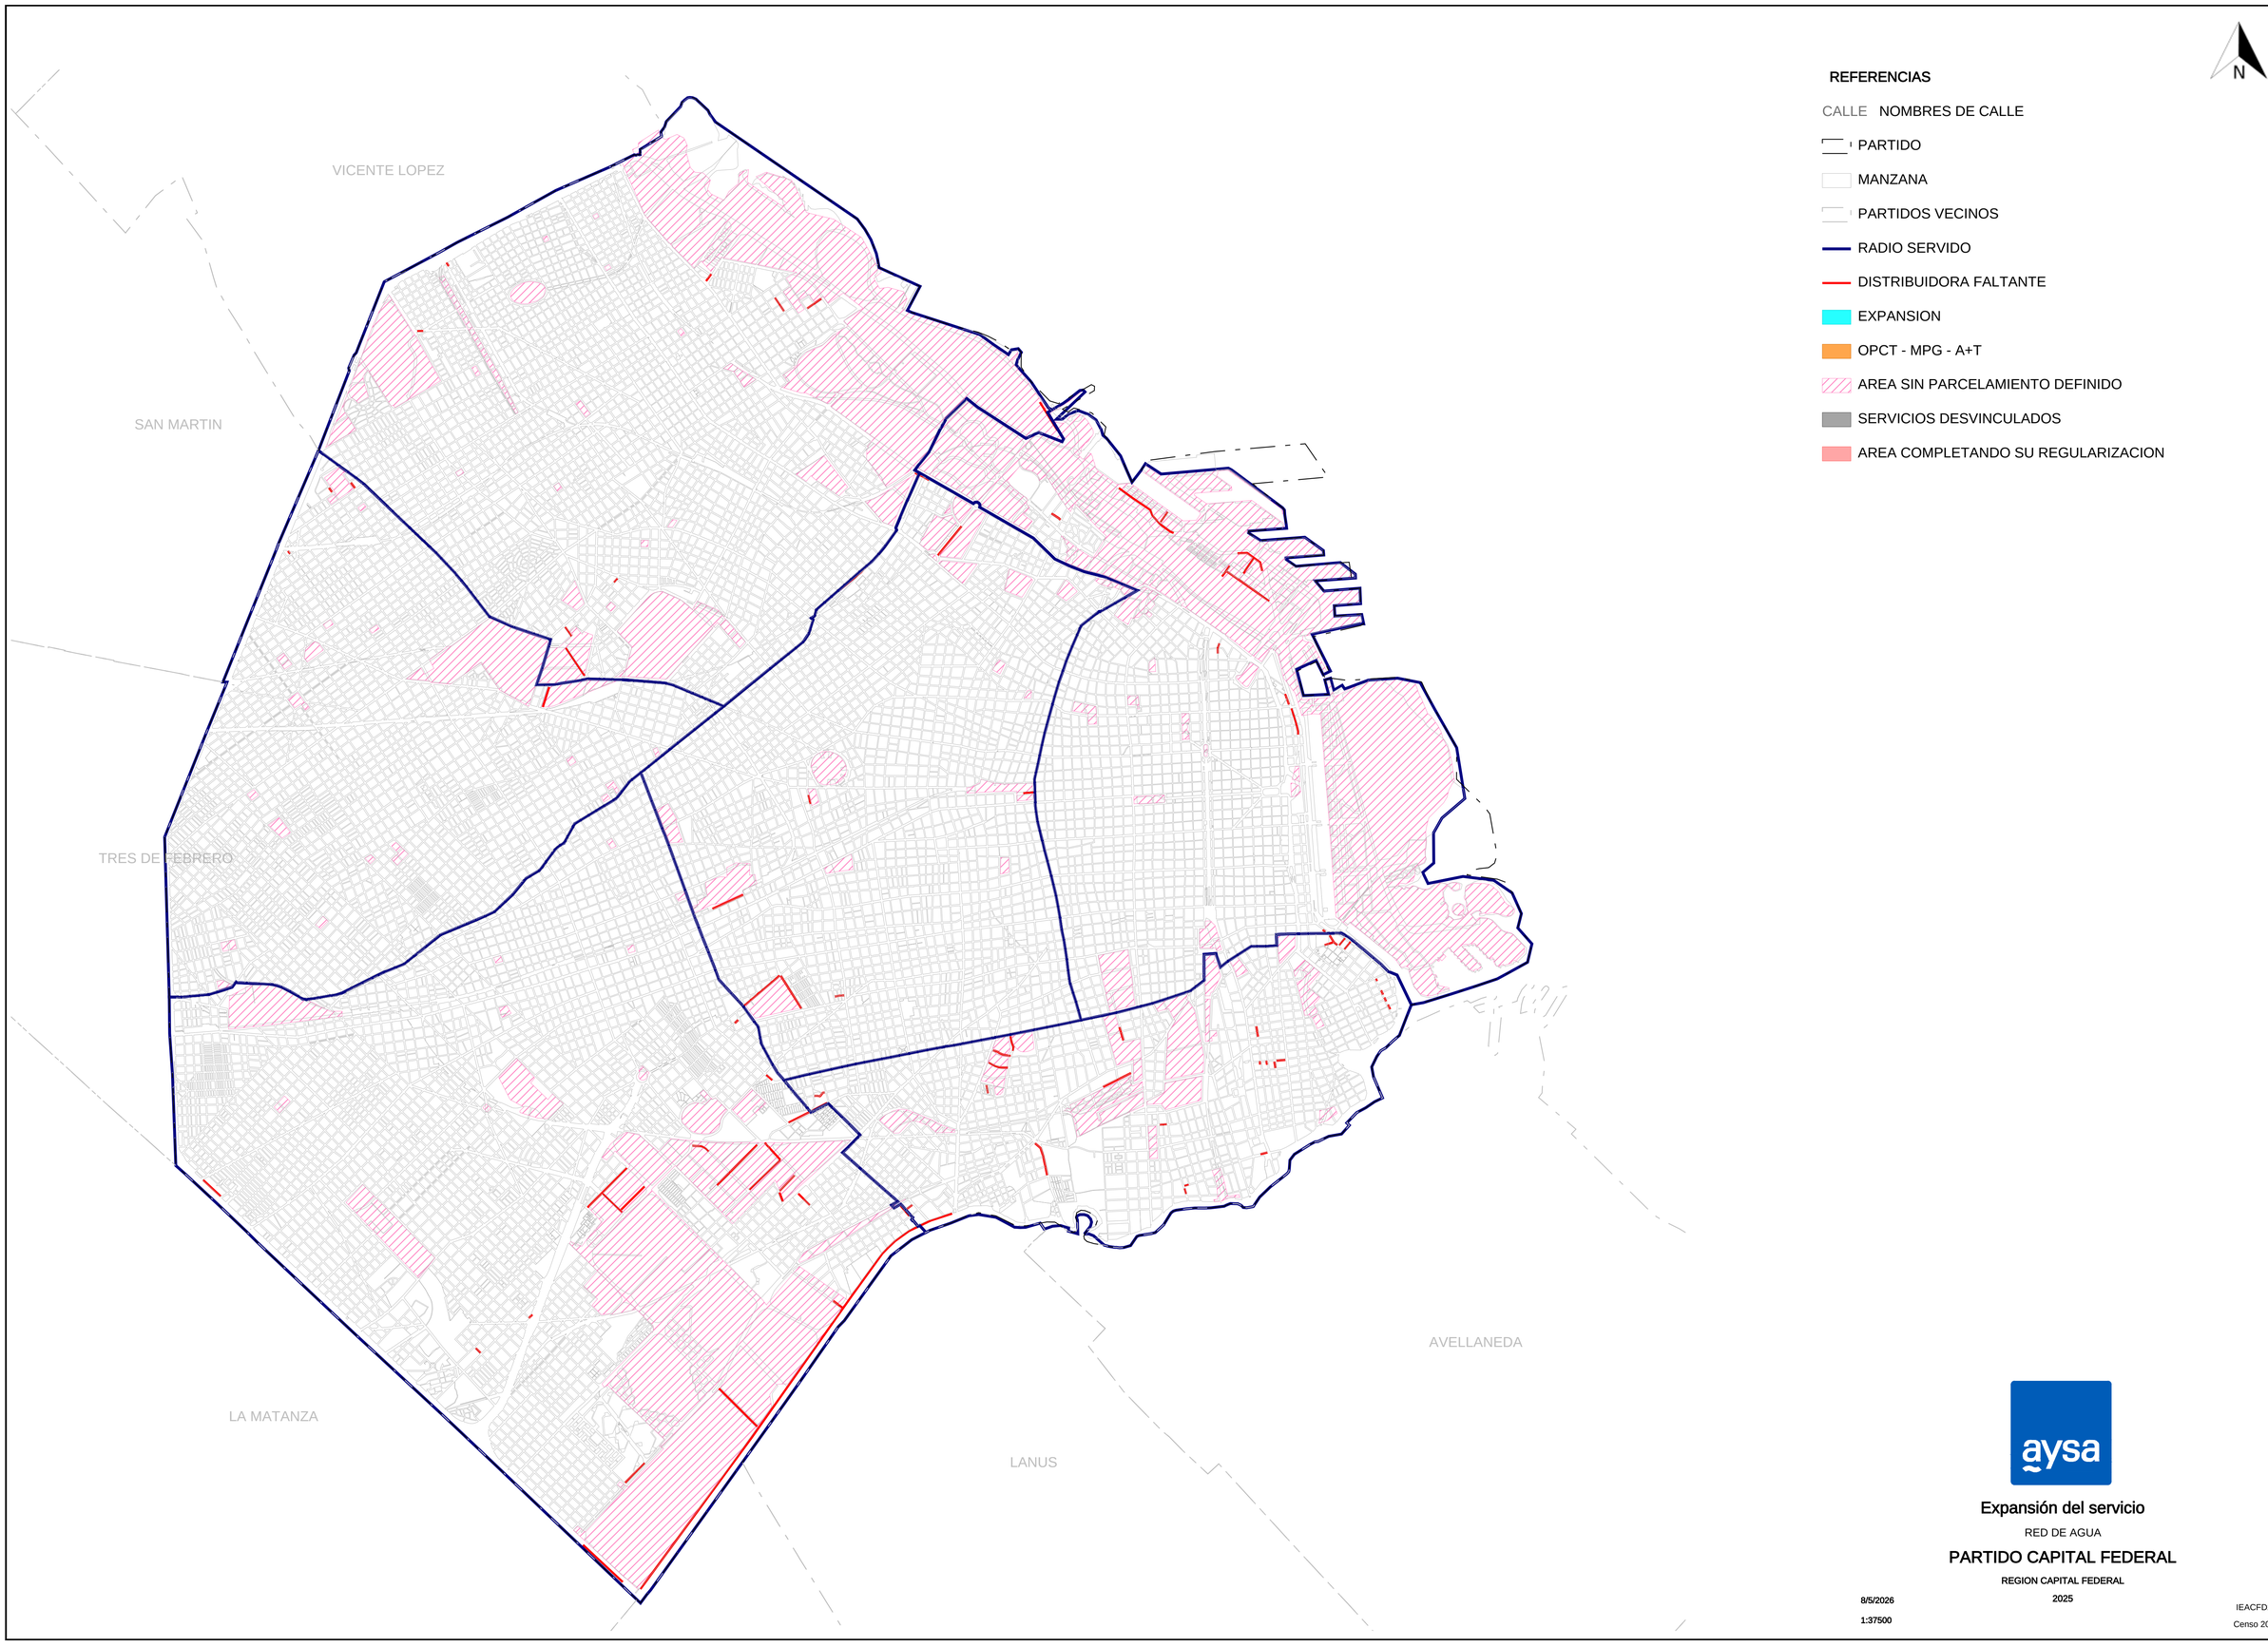

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO CAPITAL FEDERAL

REGION CAPITAL FEDERAL

2025

8/5/2026

1:37500

IEACFD20

Censo 2022

Planos Cobertura del Servicio de Agua Región Norte



N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	Expansión NA70093 – Red Primaria de Agua Maschwitz 2
E2	Expansión NA701999 – Red Secundaria de Agua San Lorenzo

OPCT - MPG - A+T

Identificador	Nombre
P1	NA70079 – Red Secundaria de Agua San Miguel M2
P2	DESARROLLO BOERO

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	Miraflores Country Club
D2	Campo Chico - Country Club

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO ESCOBAR

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:47500

IEAESC20

Censo 2022

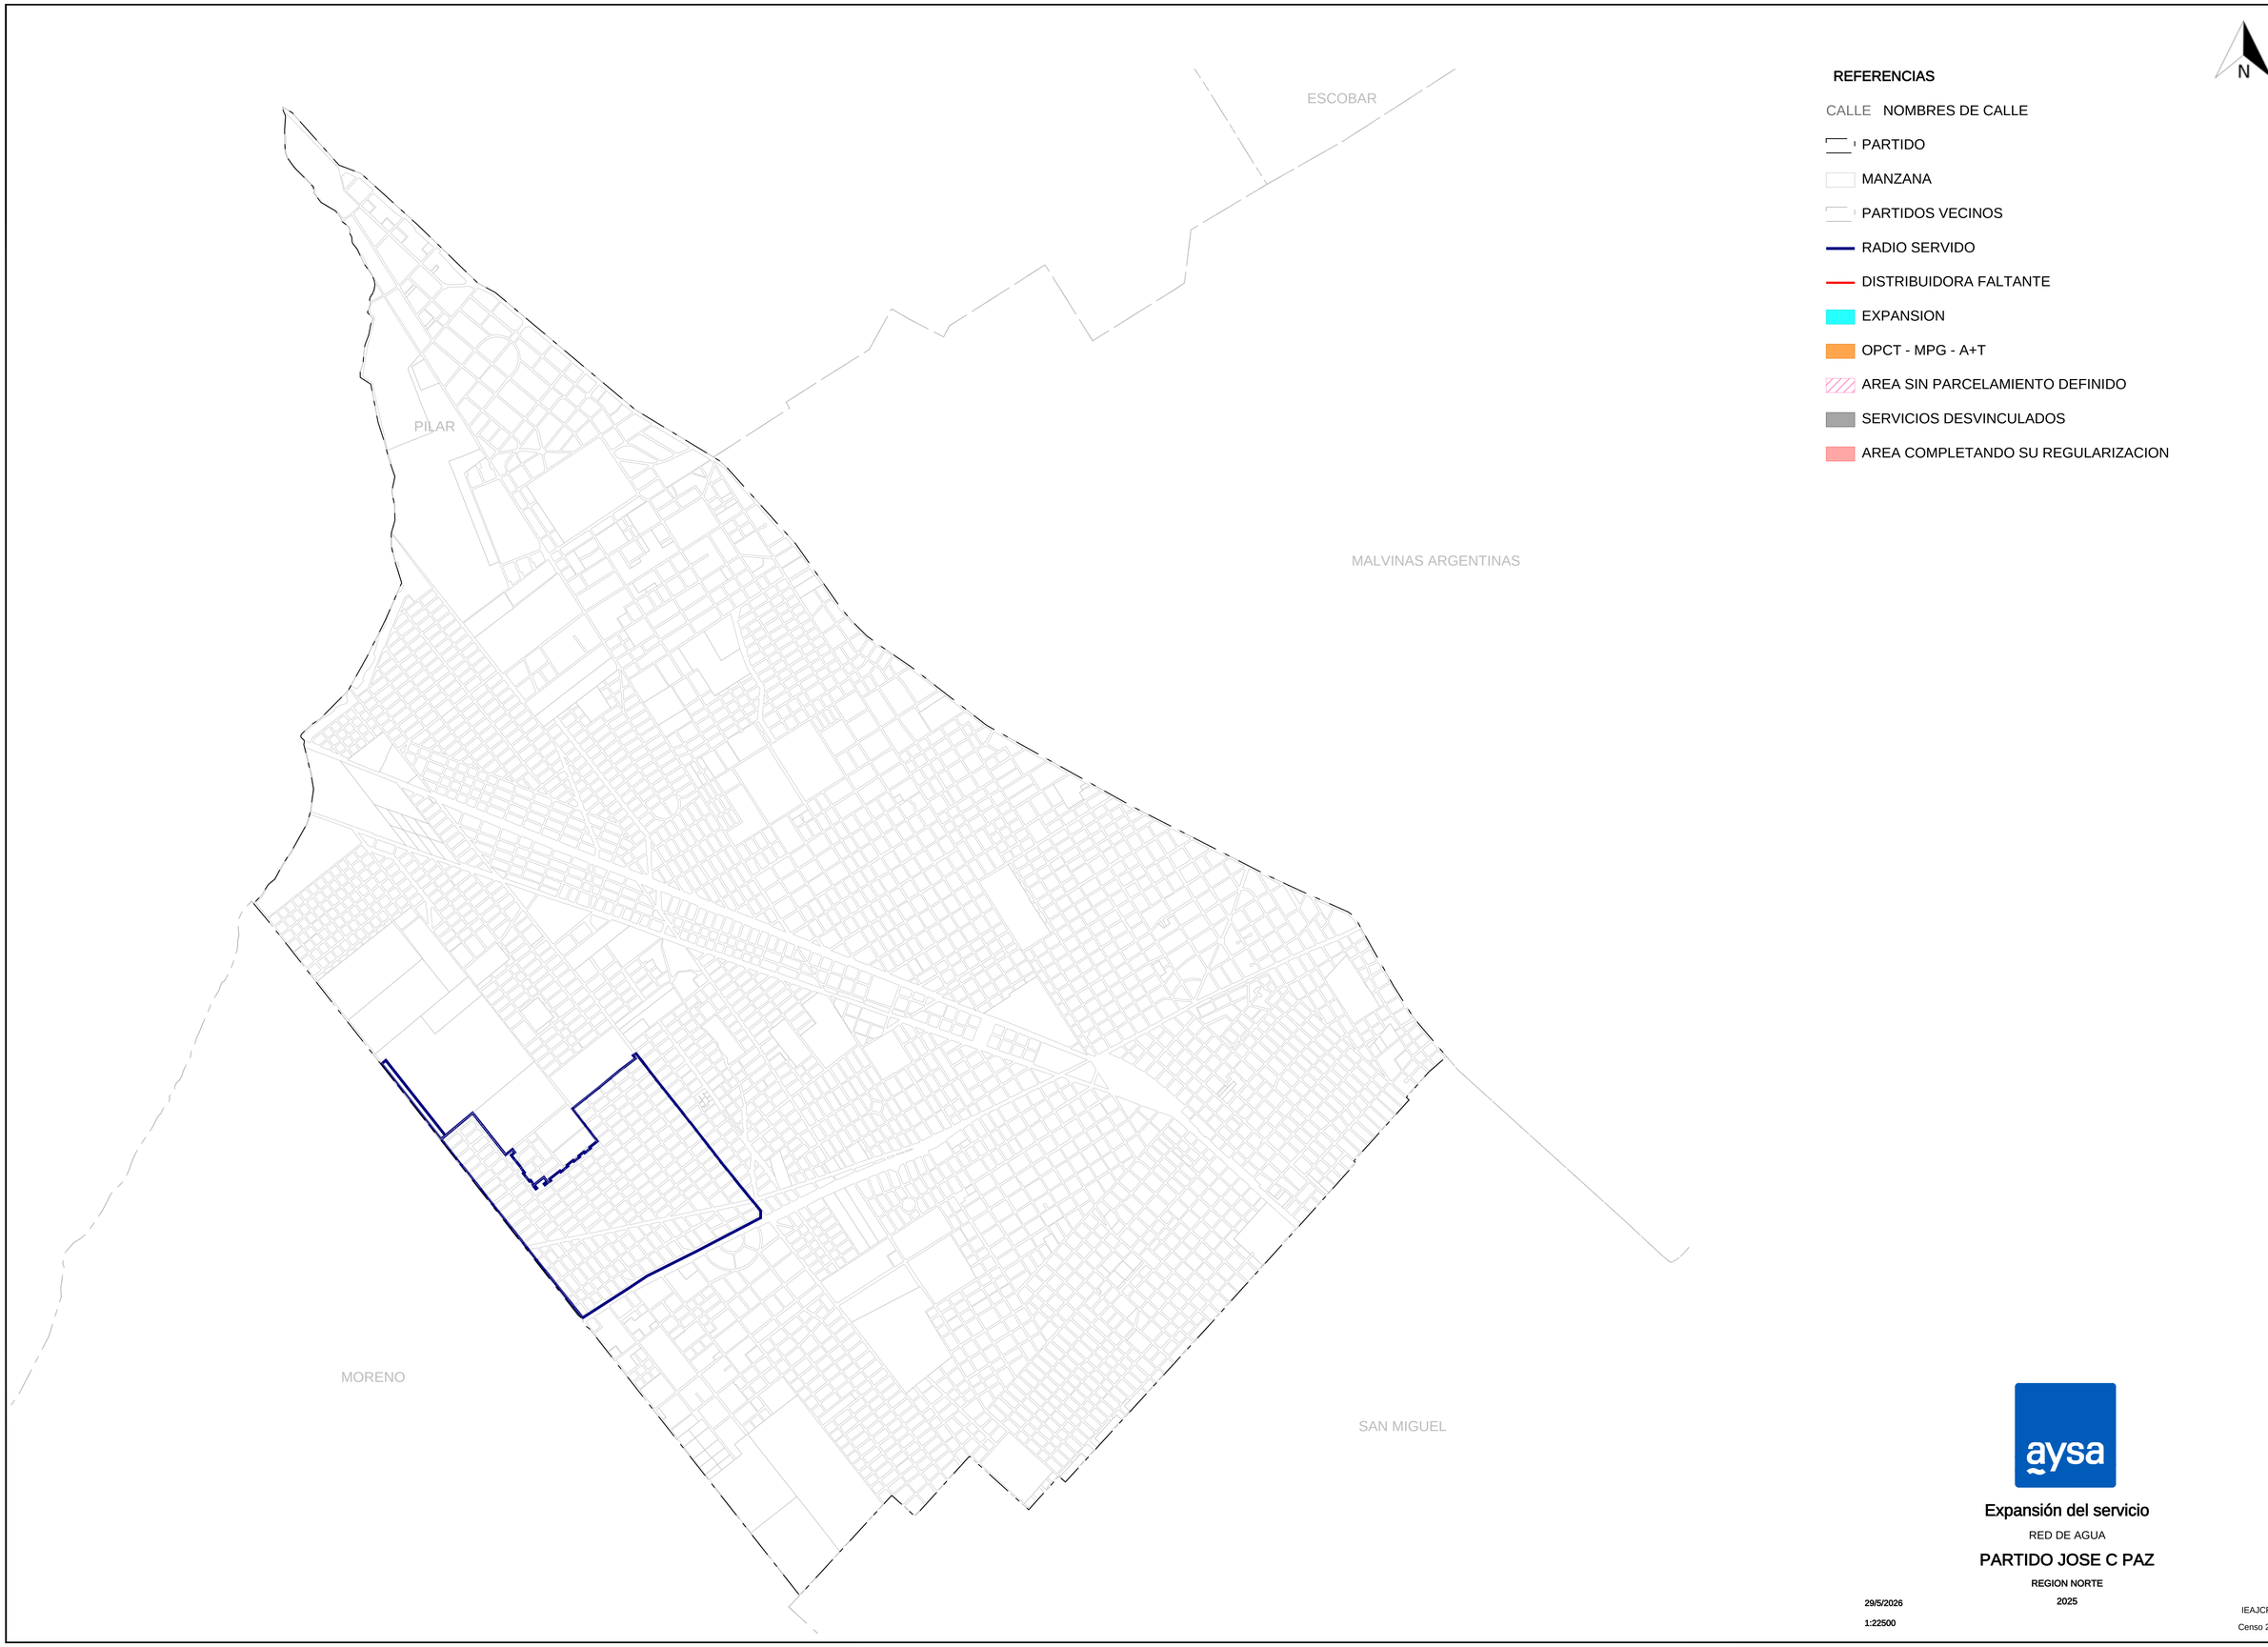

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO JOSE C PAZ

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:22500

IEAJCP20

Censo 2022

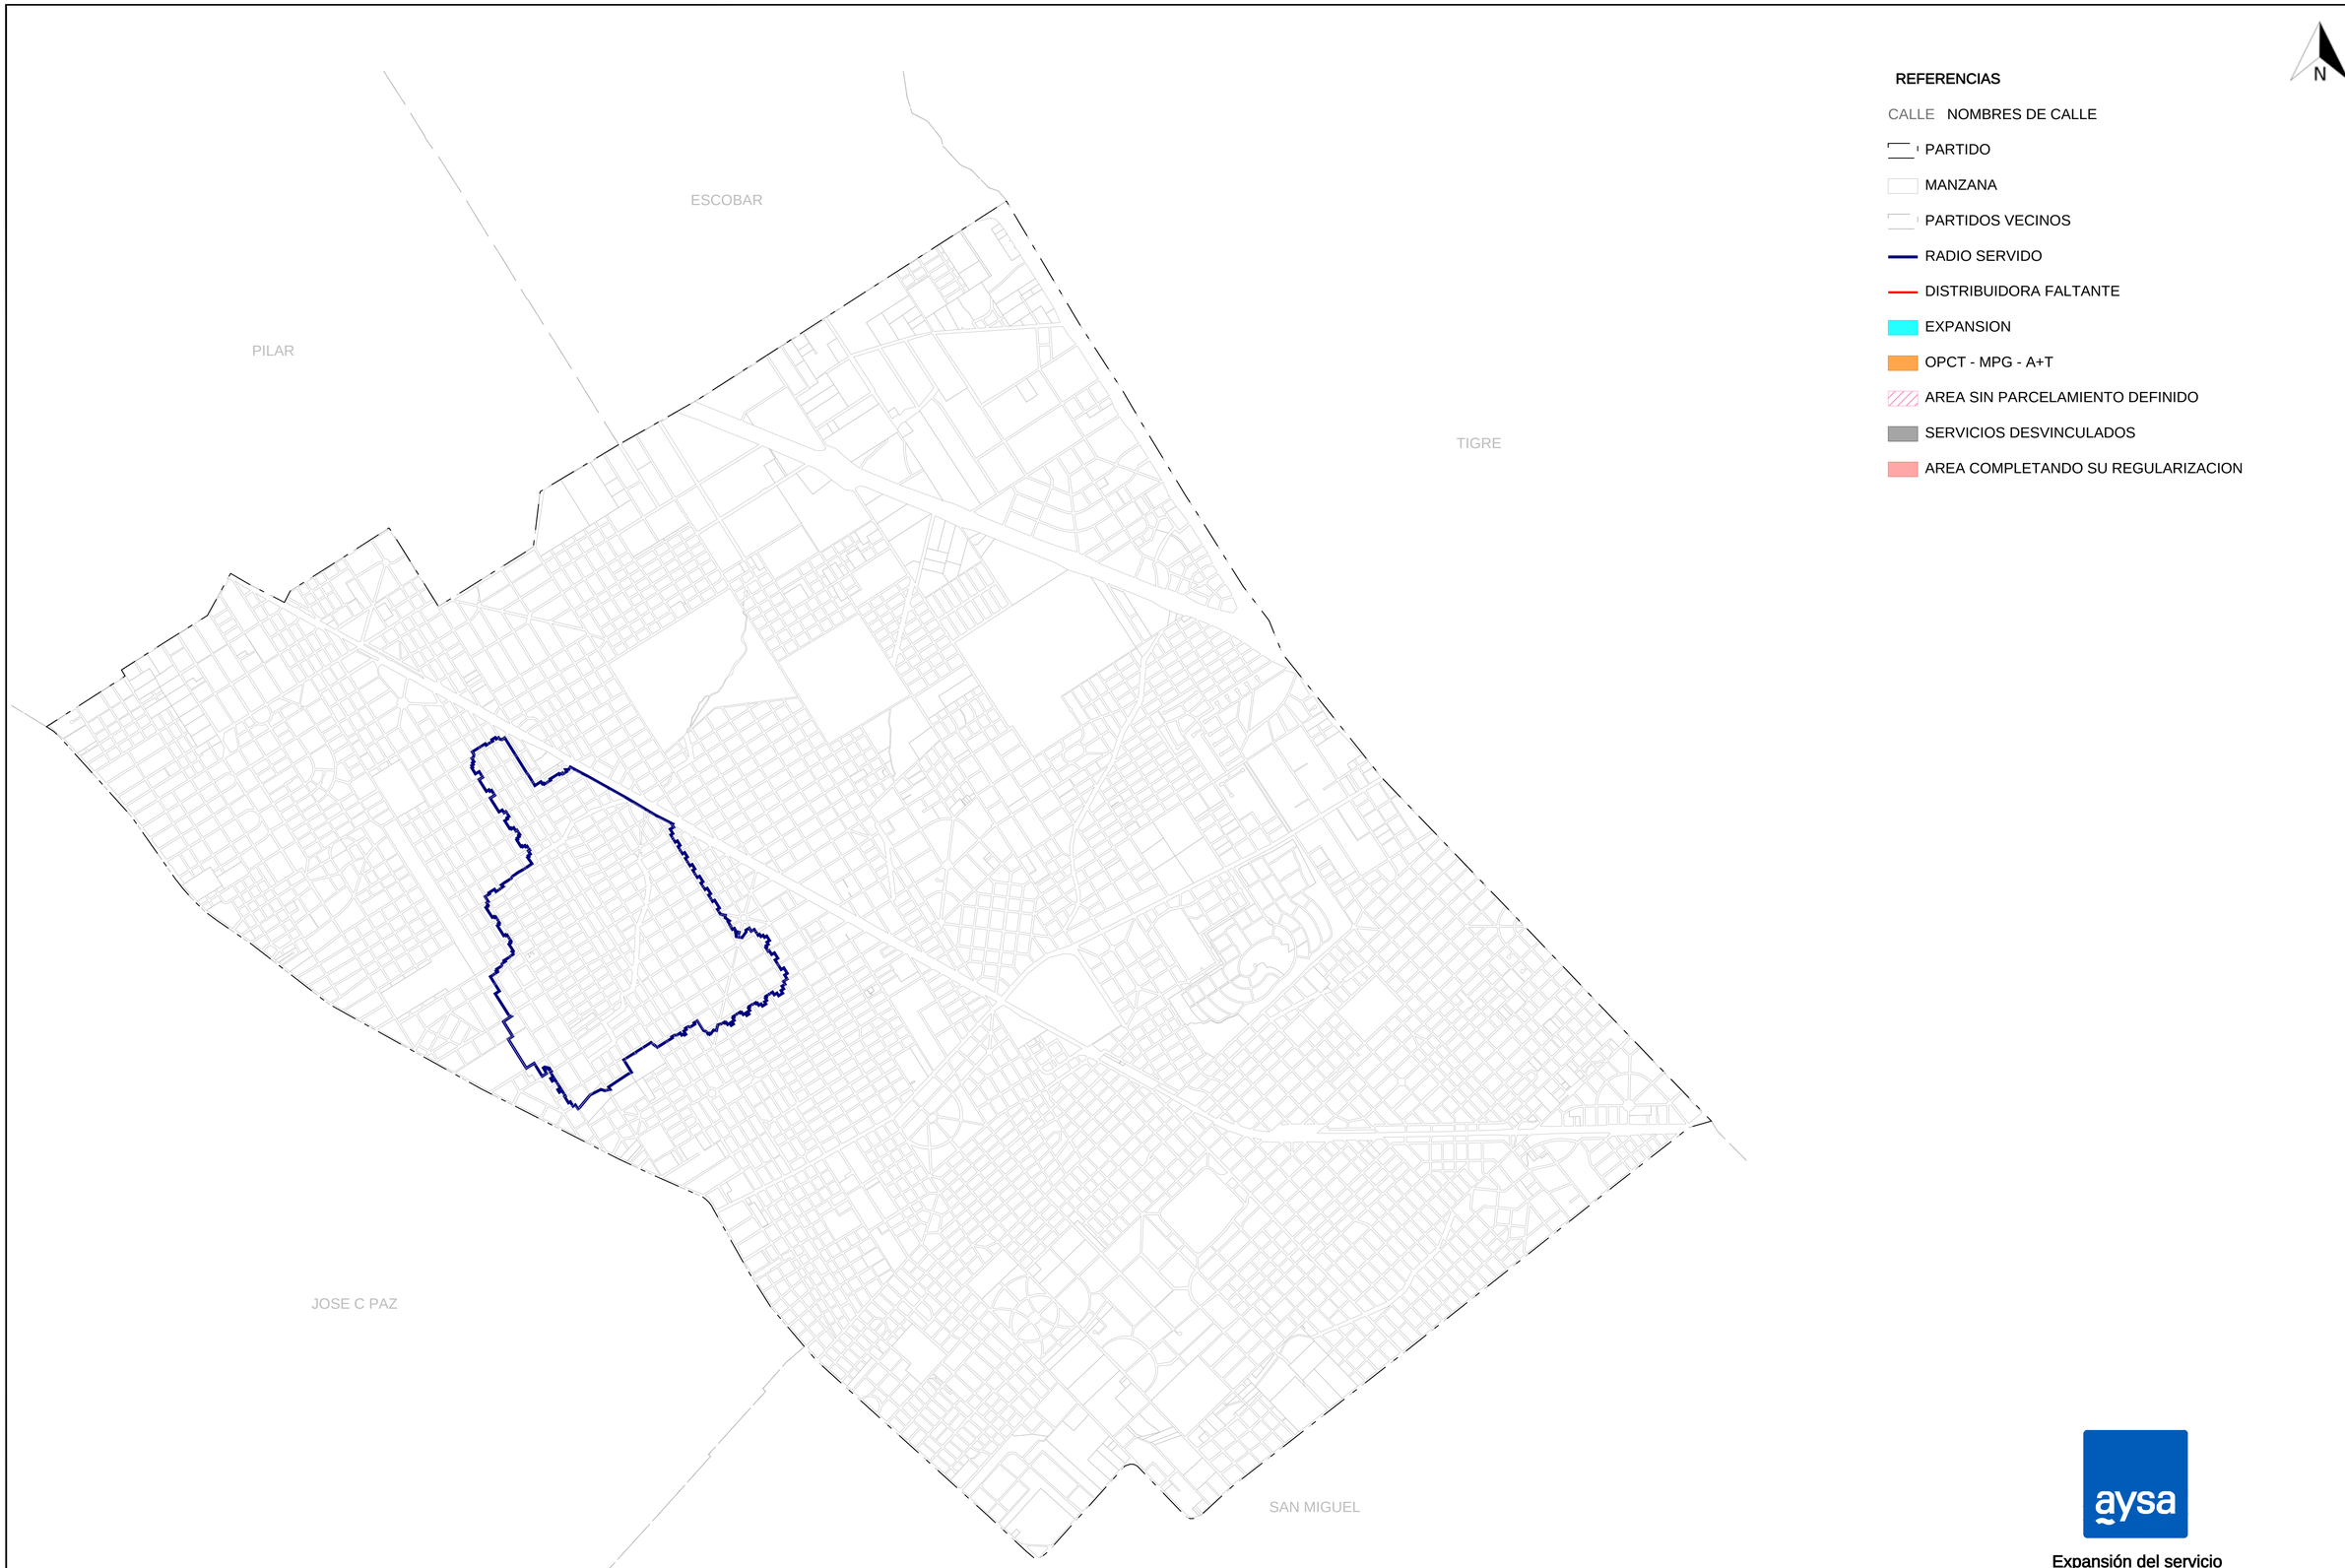

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO MALVINAS ARGENTINAS

REGION NORTE

2025

29/5/2026

1:22500

IEAMAR20

Censo 2022



N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	MyM Cierre de Malla 12 de Octubre y Rivadavia

OPCT - MPG - A+T

Identificador	Nombre
P1	OLIDEN 8925, BARRIO LOS CARDOS
P2	B.C. LAS LUCIÉRNAGAS
P3	B.C. ALTOS DE PILAR
P4	B.C. EL CASCO
P5	B.C. CAMPUS VISTA
P6	B.C. AZURRA
P7	LOS NARCISOS 712

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	San Ramiro
D2	San Eduardo
D3	San Alfonso
D4	Los Jazmines
D5	Casas del Este
D6	Santa Guadalupe
D7	Santa Guadalupe II/ Las Casuarinas de Pilar
D8	C.U.B.A. I
D9	C.U.B.A. II
D10	C.U.B.A. Fatima
D11	Pilara
D12	Estancias del Rio
D13	Estancias El Pueblo
D14	Estancias El Recuerdo
D15	Estancias La Paz
D16	Estancias La Pionera
D17	Estancias Champagnat
D18	Estancias La Argentina Golf
D19	Haras - La Caballeriza
D20	Haras - El Establo

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO PILAR

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:55000

IEAPIL20

Censo 2022

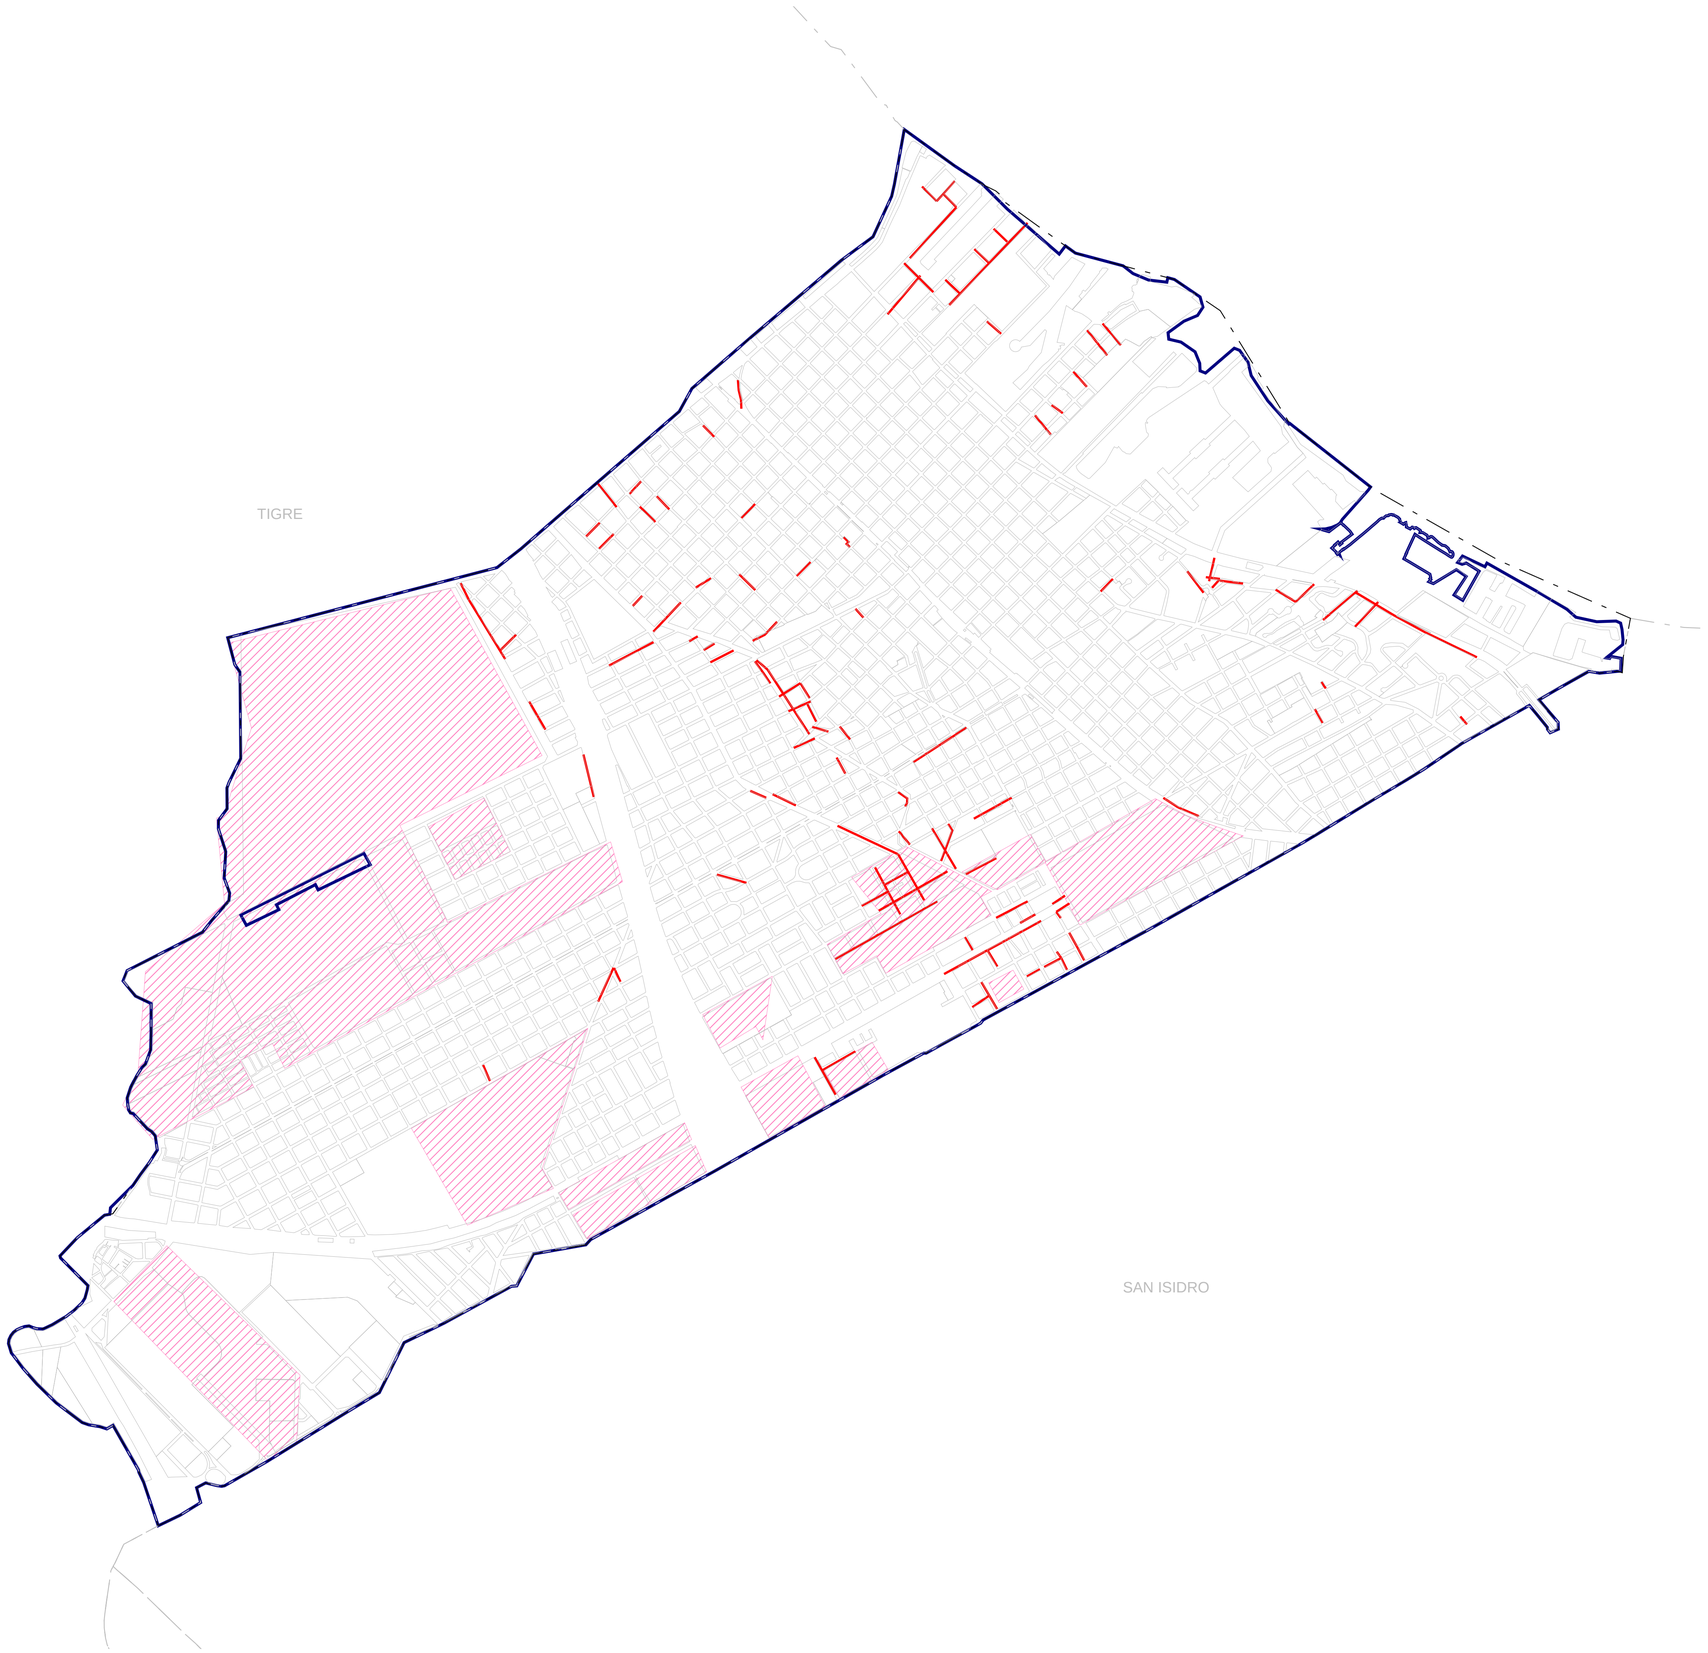

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO SAN FERNANDO

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:15000

IEASFE20

Censo 2022

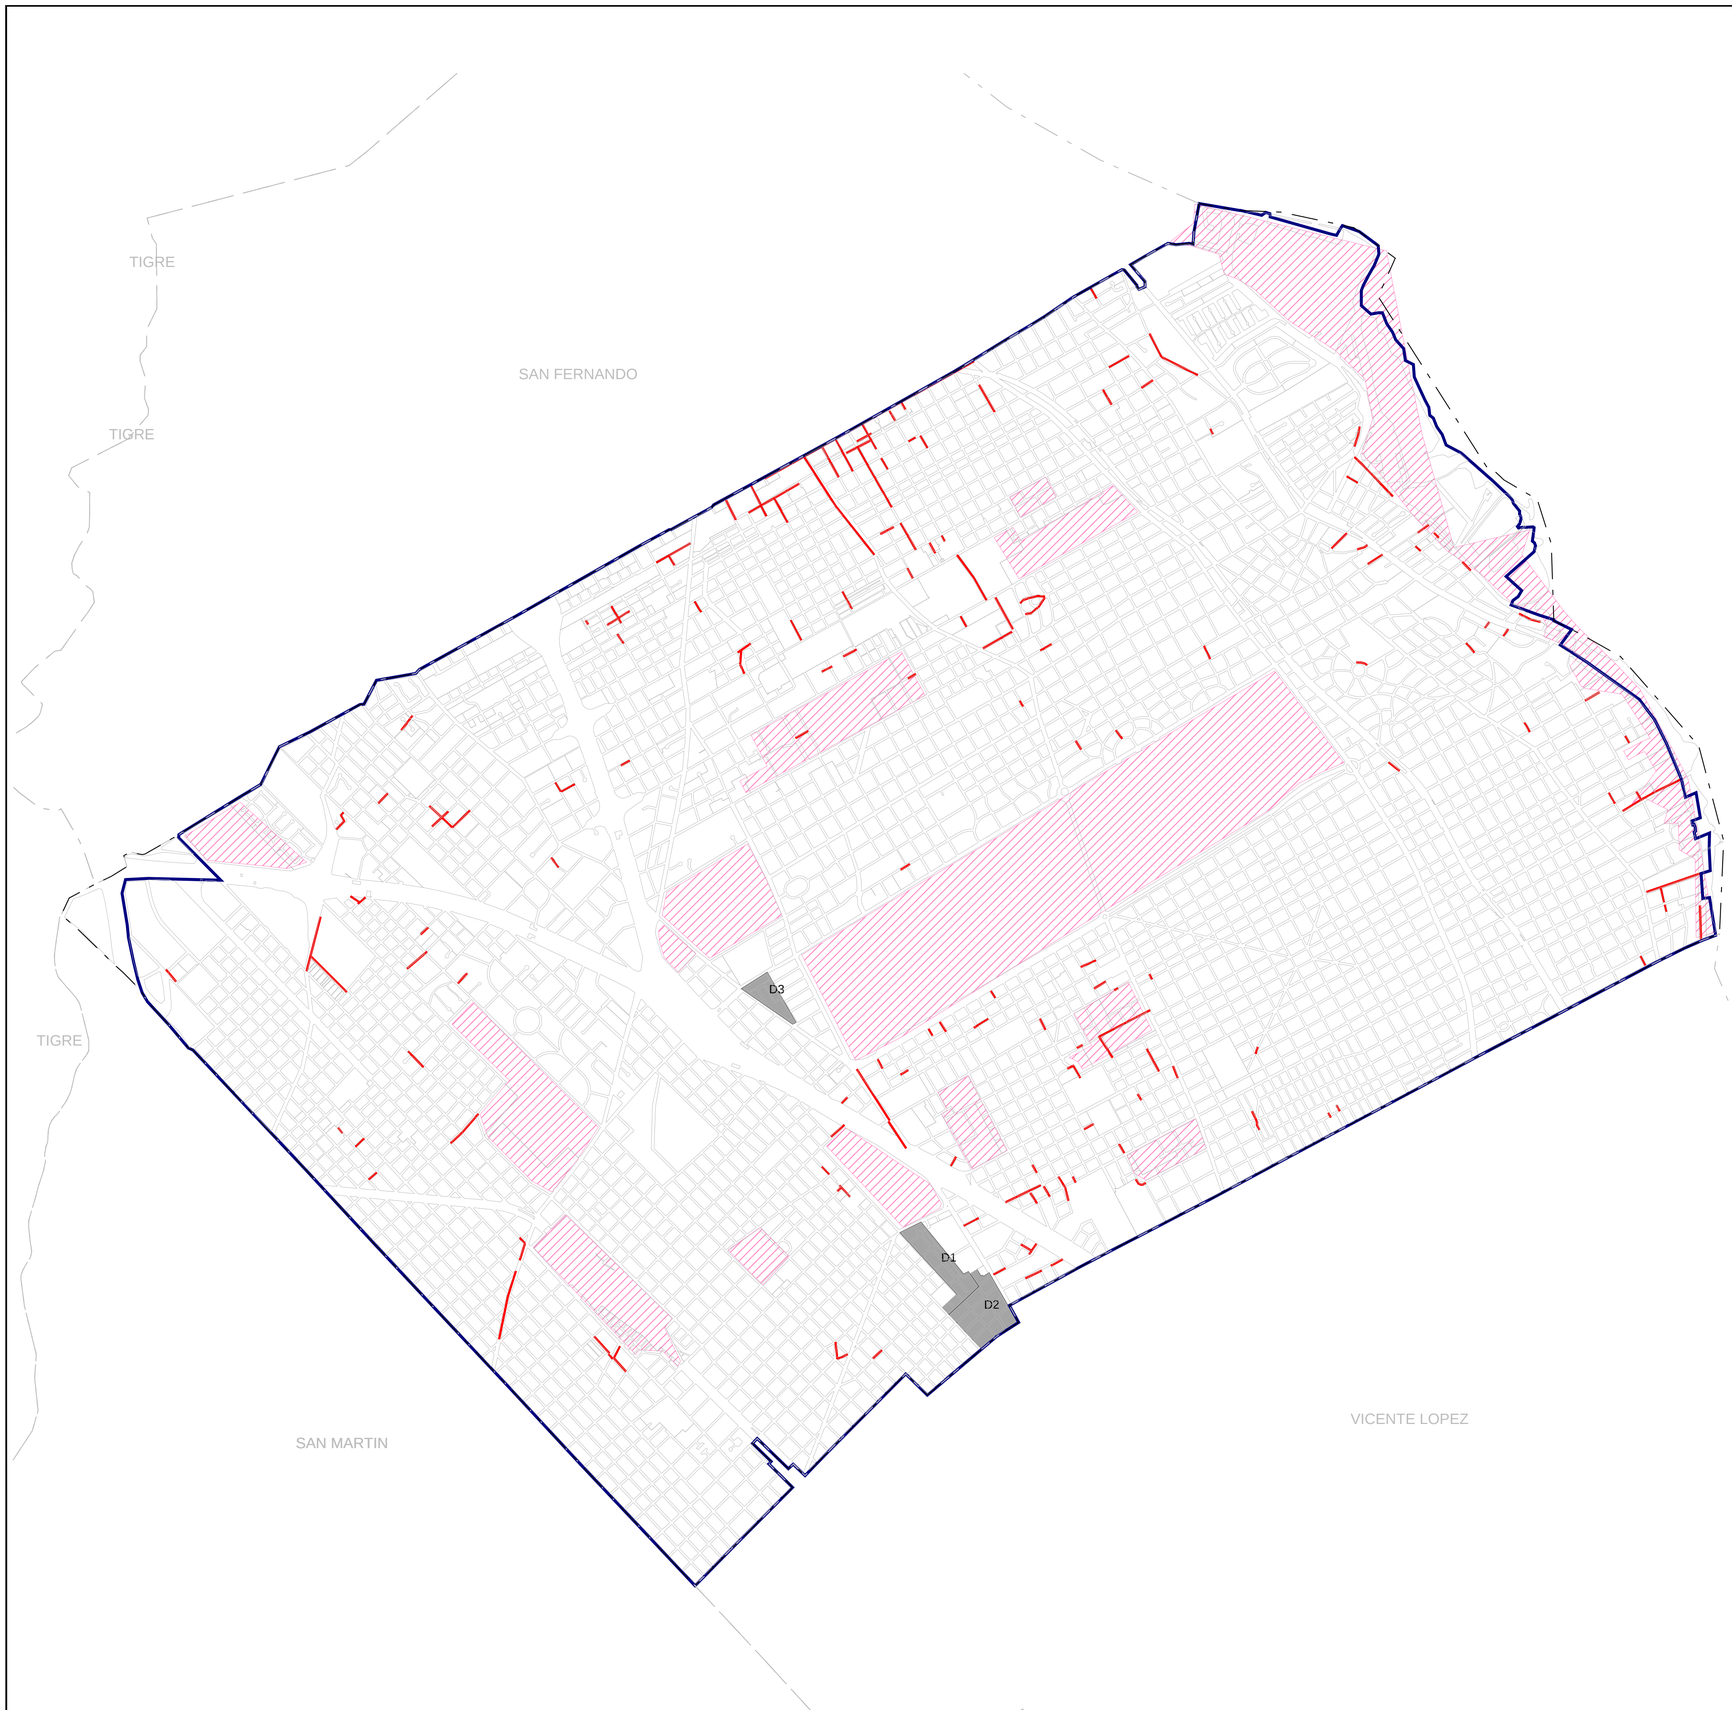

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	BARRIO ARCA
D2	BARRIO TANQUE
D3	BARRIO E. BLANCO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO SAN ISIDRO

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:20000

IEASIS20

Censo 2022

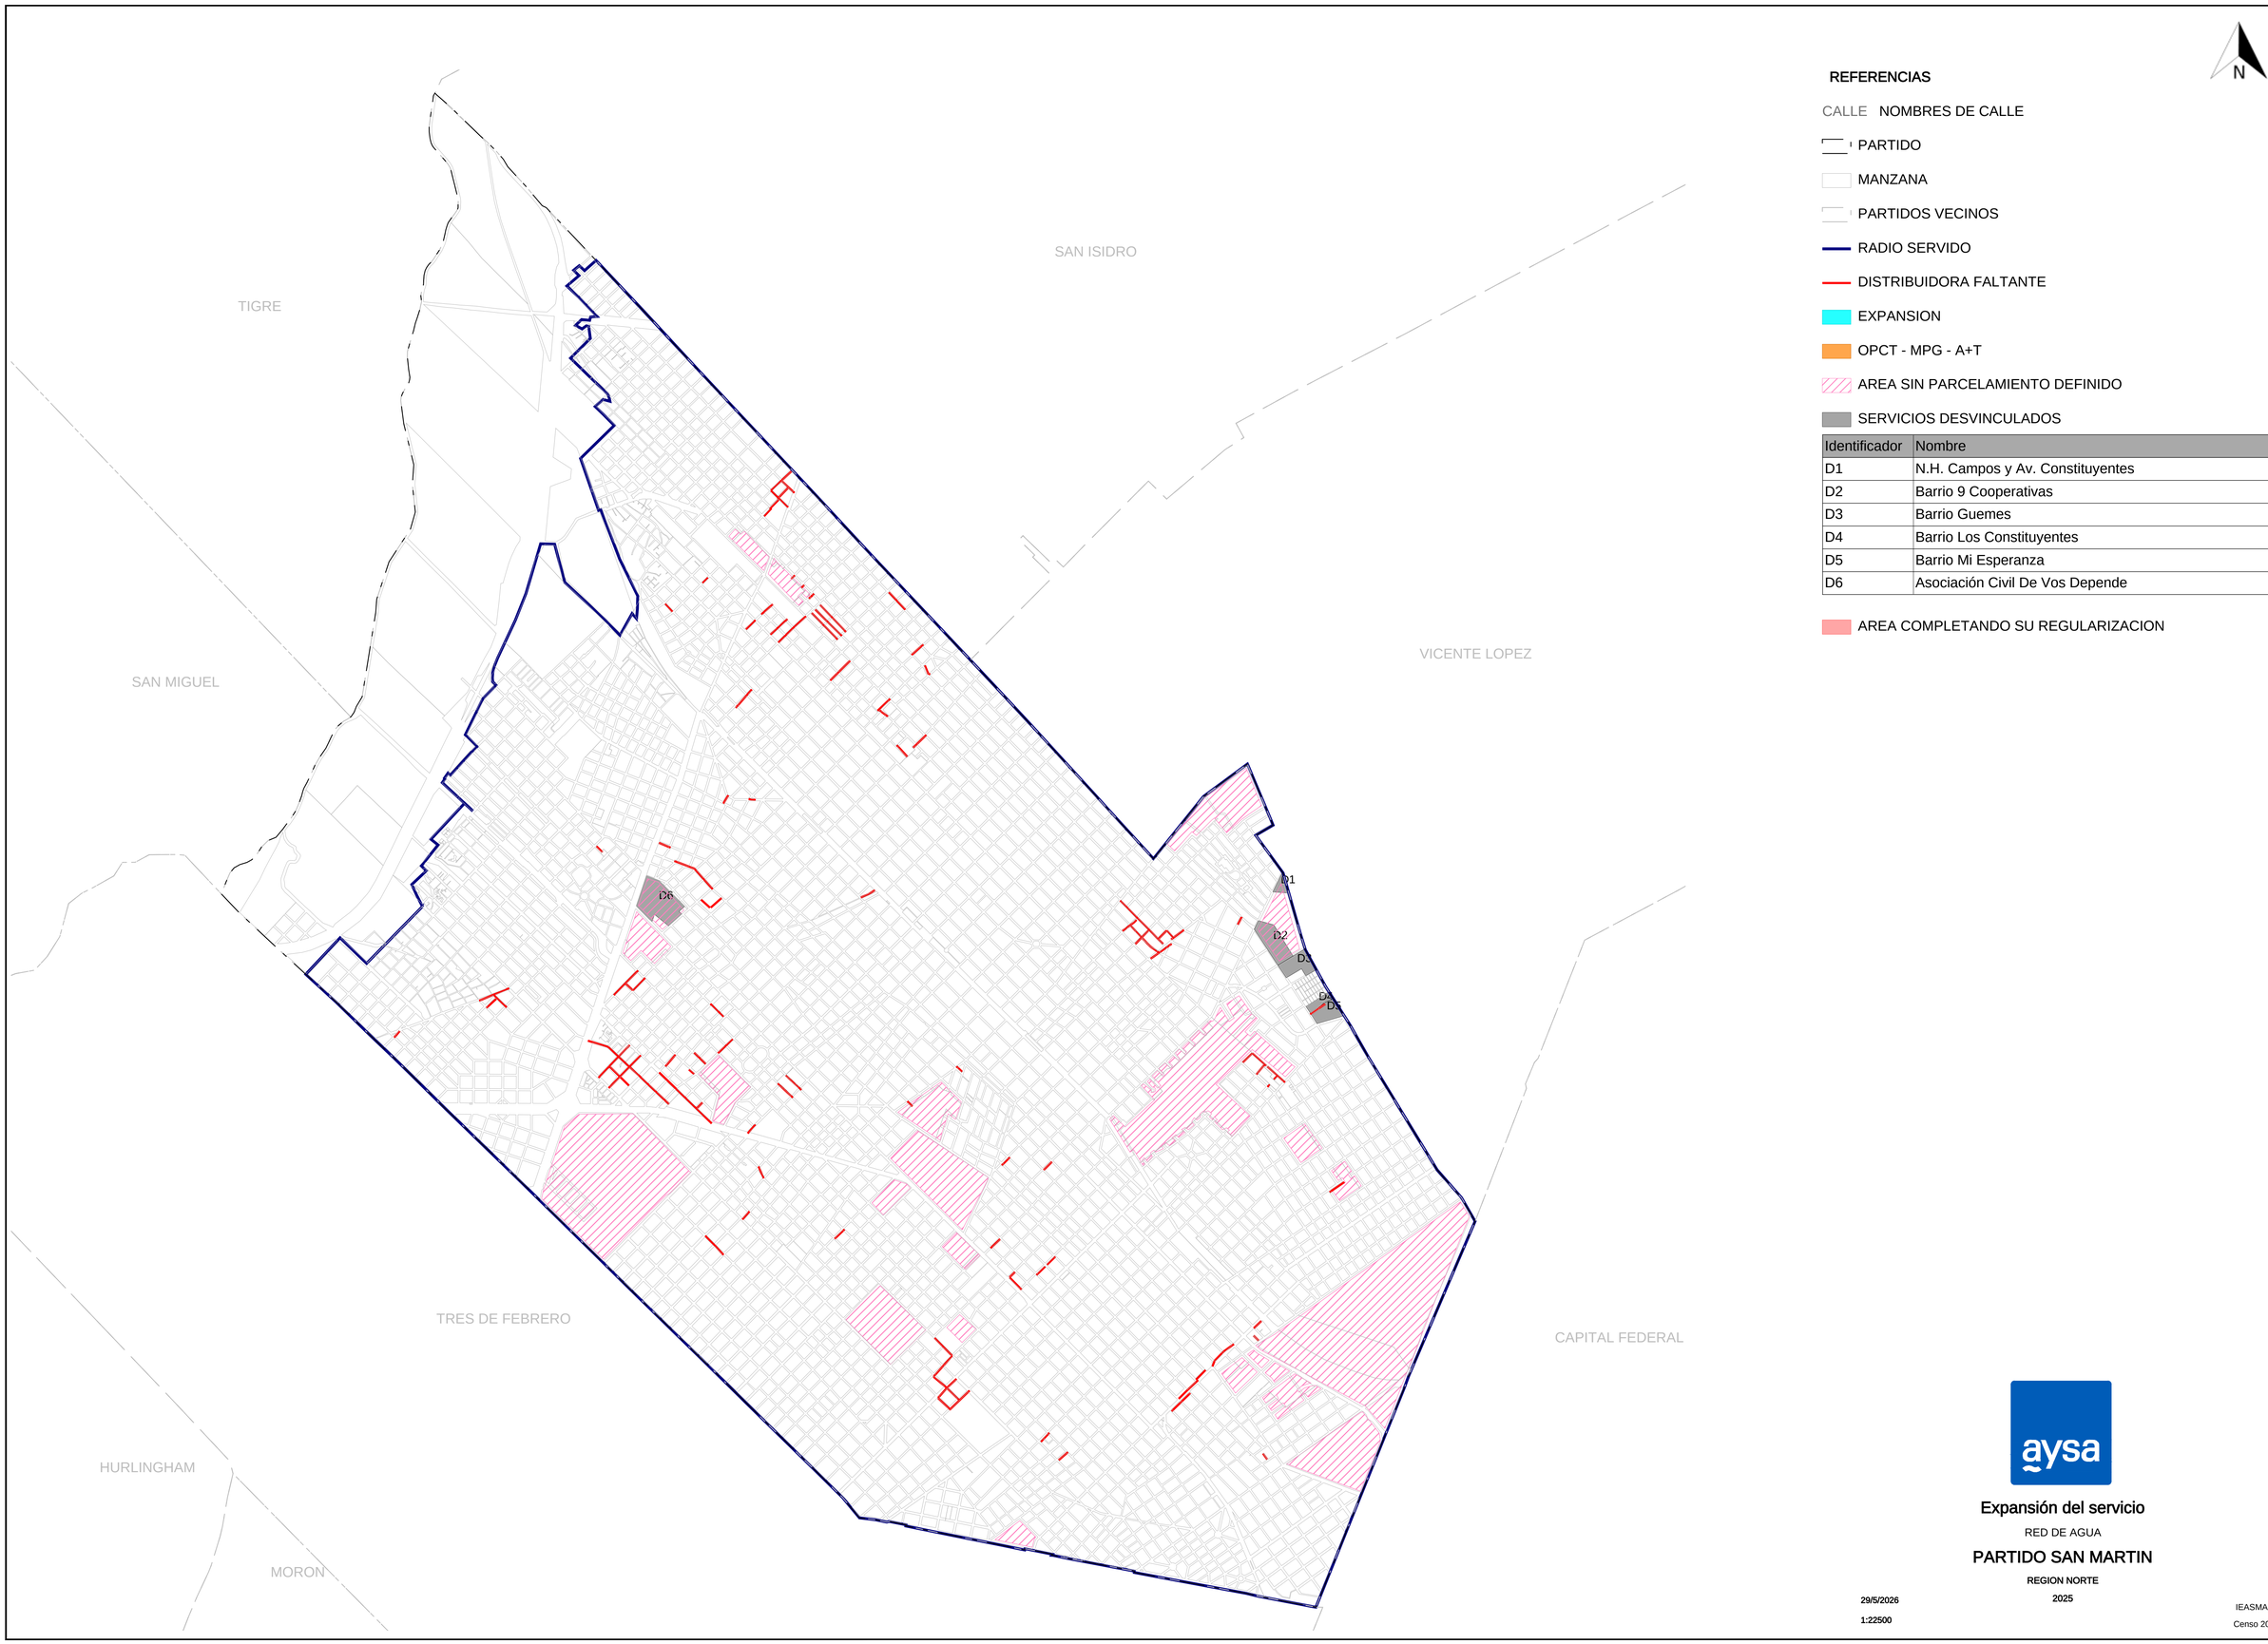

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	N.H. Campos y Av. Constituyentes
D2	Barrio 9 Cooperativas
D3	Barrio Guemes
D4	Barrio Los Constituyentes
D5	Barrio Mi Esperanza
D6	Asociación Civil De Vos Depende

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO SAN MARTIN

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:22500

IEASMA20

Censo 2022

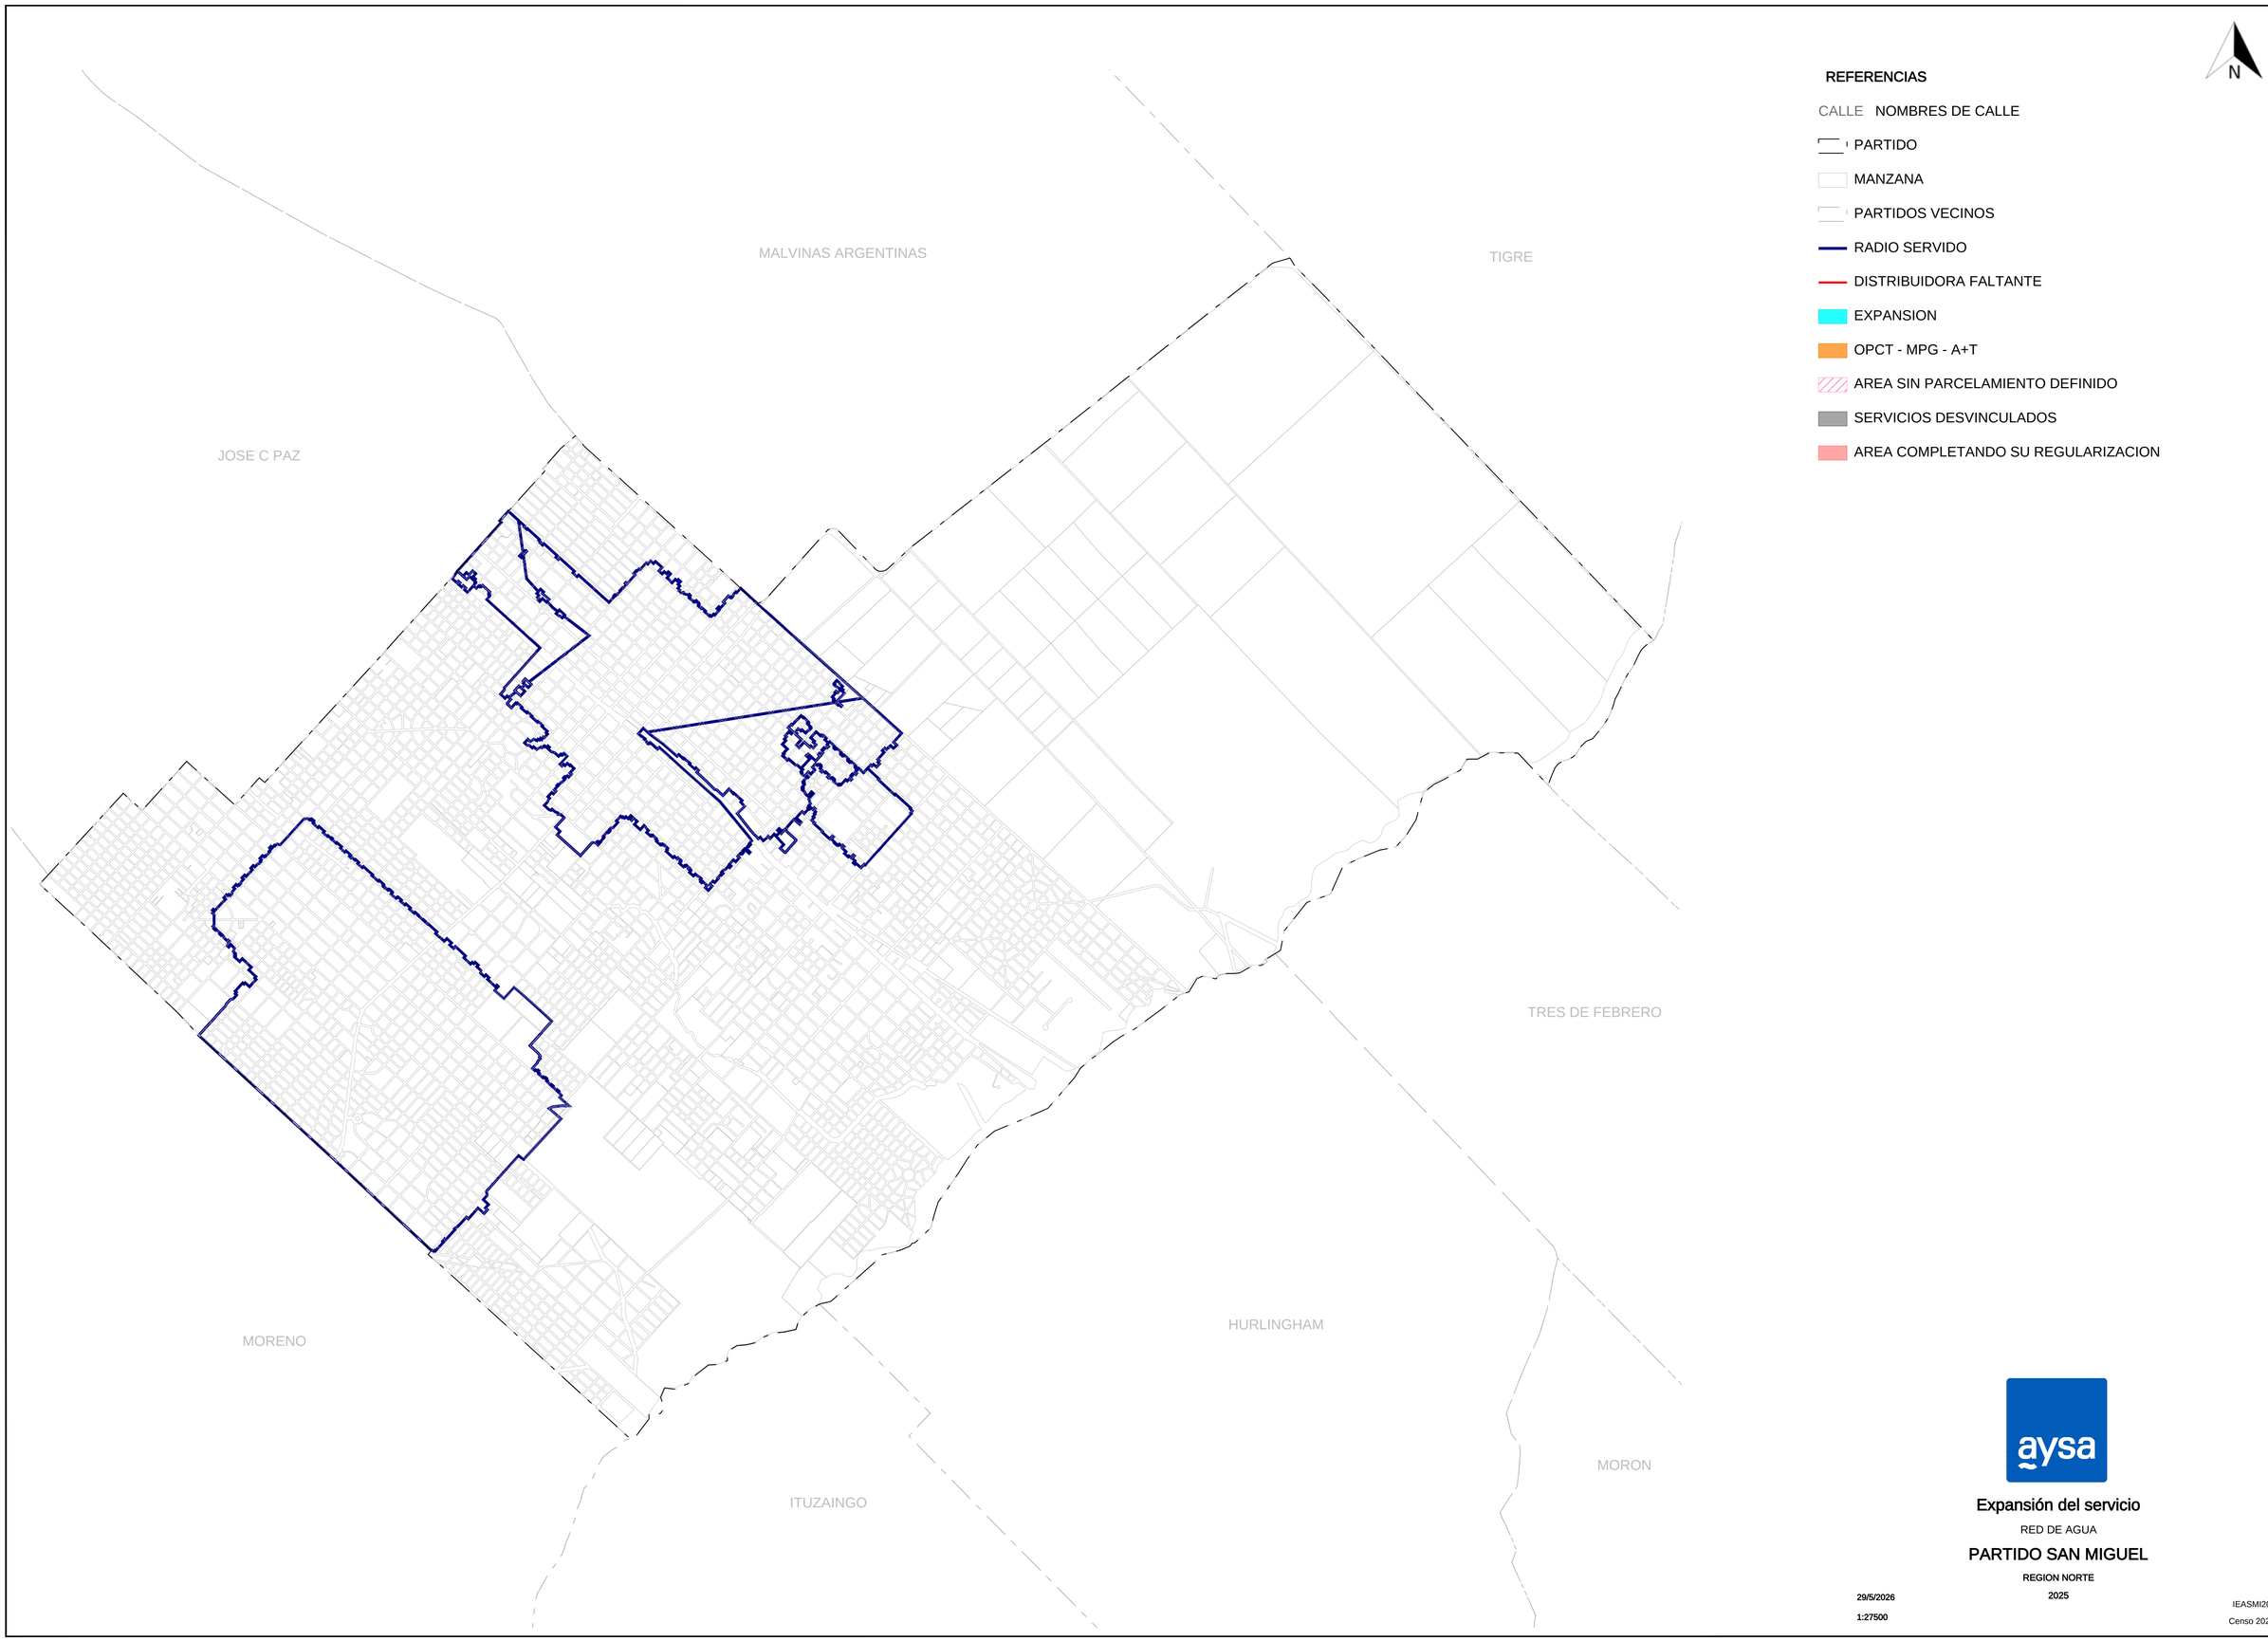

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO SAN MIGUEL

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:27500

IEASMI20

Censo 2022

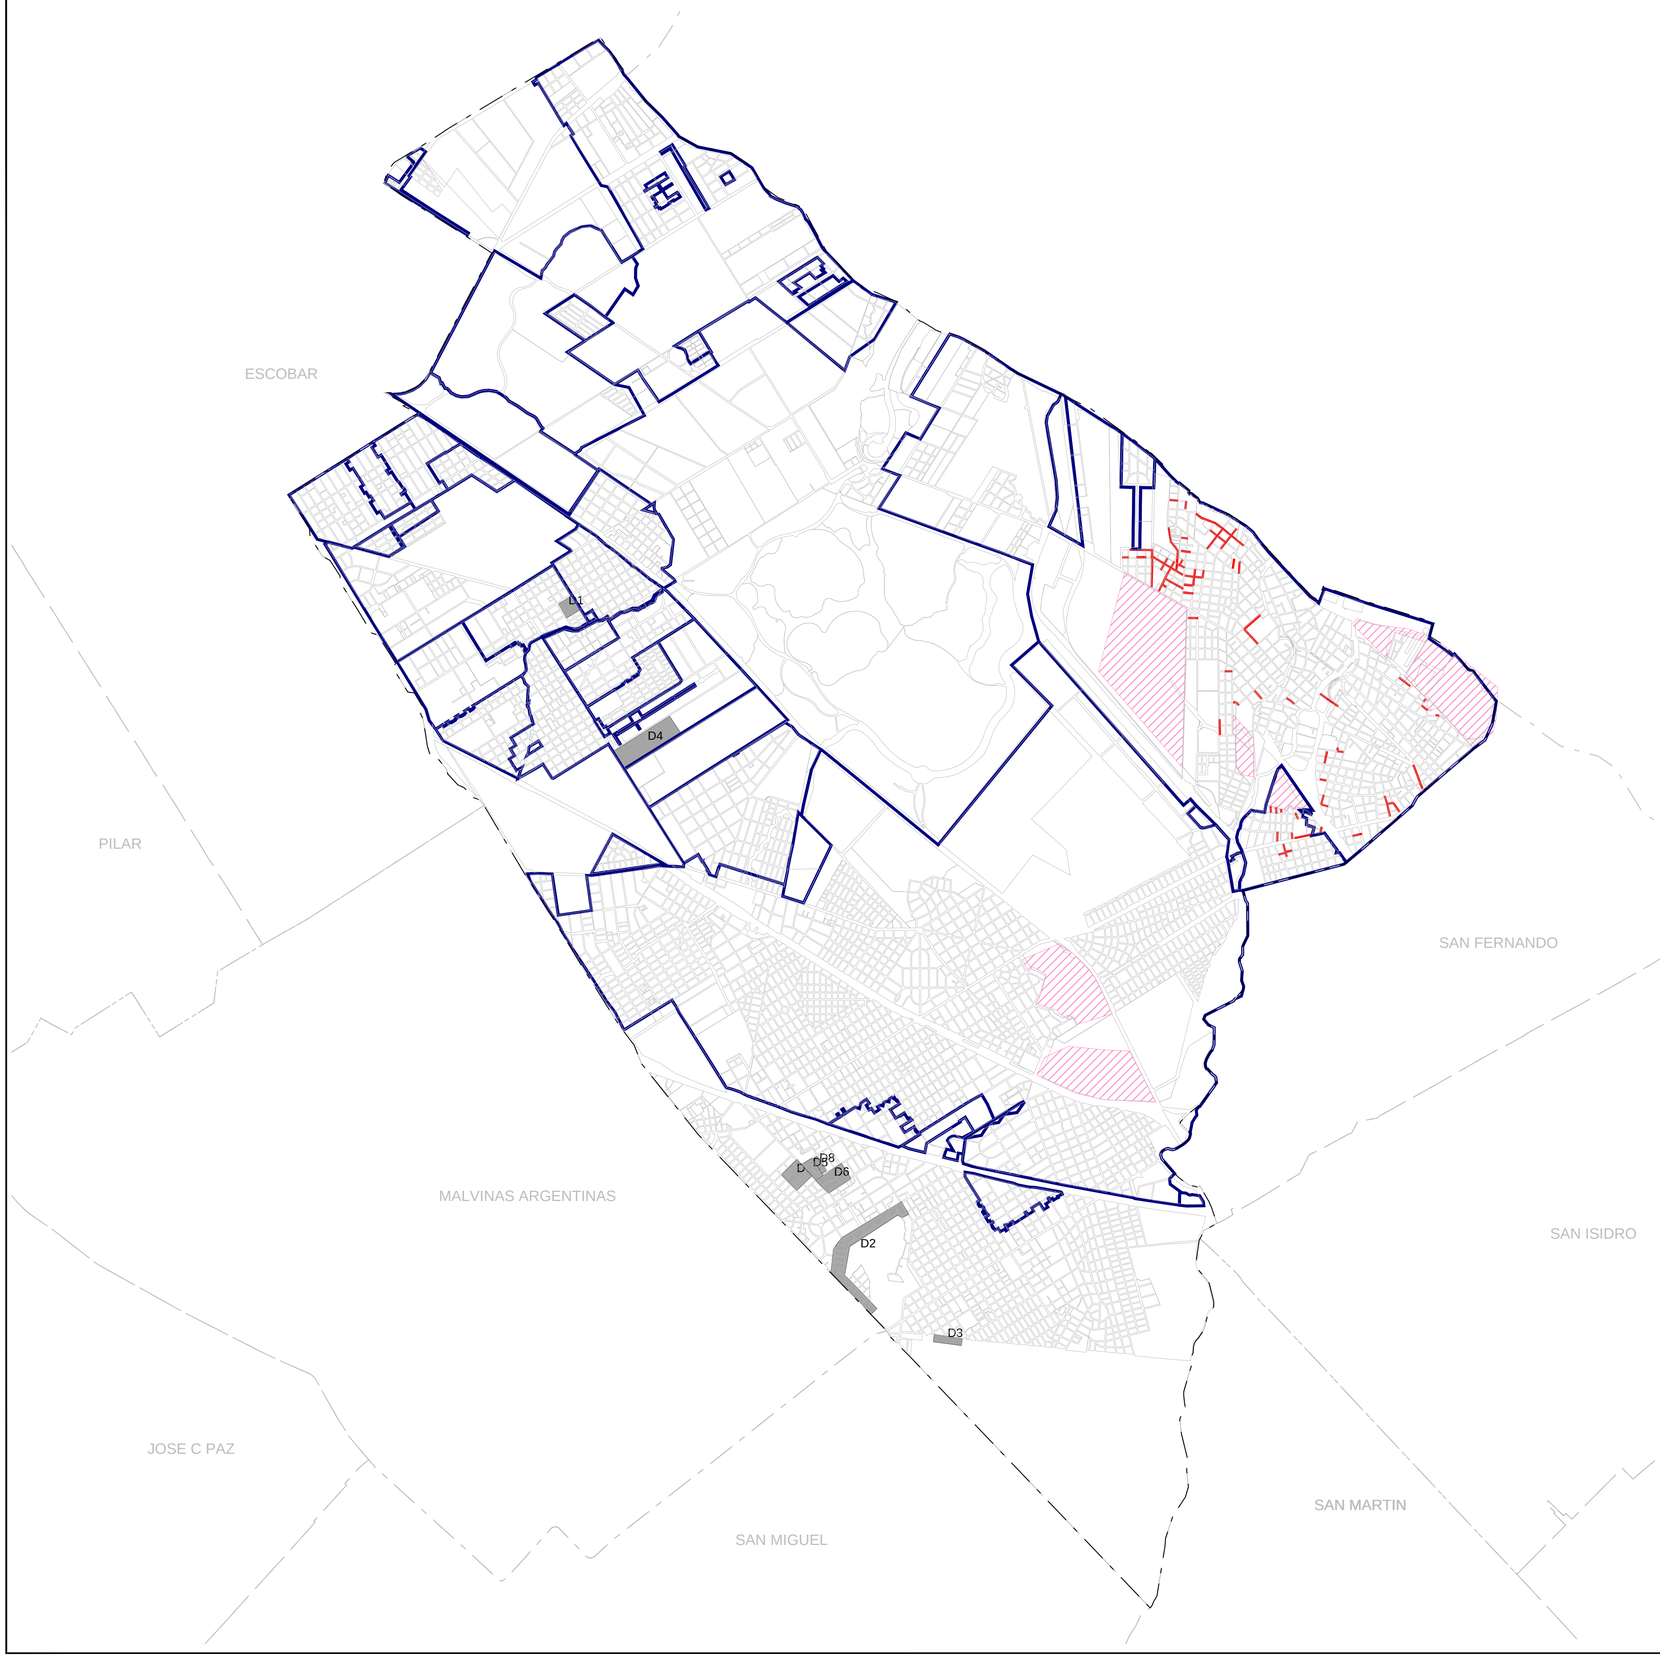

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	GRUPO HABIT. BENAVIDEZ
D2	BARRIO COPAGUA
D3	BARRIO SAN JORGE
D4	ALTOS DE PACHECO
D5	BARRIO S.F. DE ASIS
D6	BARRIO SAN PABLO
D7	BARRIO ALTE. BROWN
D8	BARRIO EL PALITO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO TIGRE

REGION NORTE

2025

29/5/2026

1:40000

IEATIG20

Censo 2022

SAN ISIDRO

SAN MARTIN

CAPITAL FEDERAL

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO VICENTE LOPEZ

REGION NORTE

2025

29/5/2026

1:17500

IEAVIC20

Censo 2022

Planos Cobertura del Servicio de Agua Región Oeste



N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	BARRIO TEXTIL
D2	BARRIO SAN MARTIN
D3	PROCASA III
D4	BARRIO CARDENAL STEPINAK
D5	RIMOLDI
D6	BARRIO CARTERO RAMIREZ
D7	BARRIO PARQUE QUIRNO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO HURLINGHAM

REGION OESTE


2025

5/5/2026

1:15000

IEAHUR20

Censo 2022

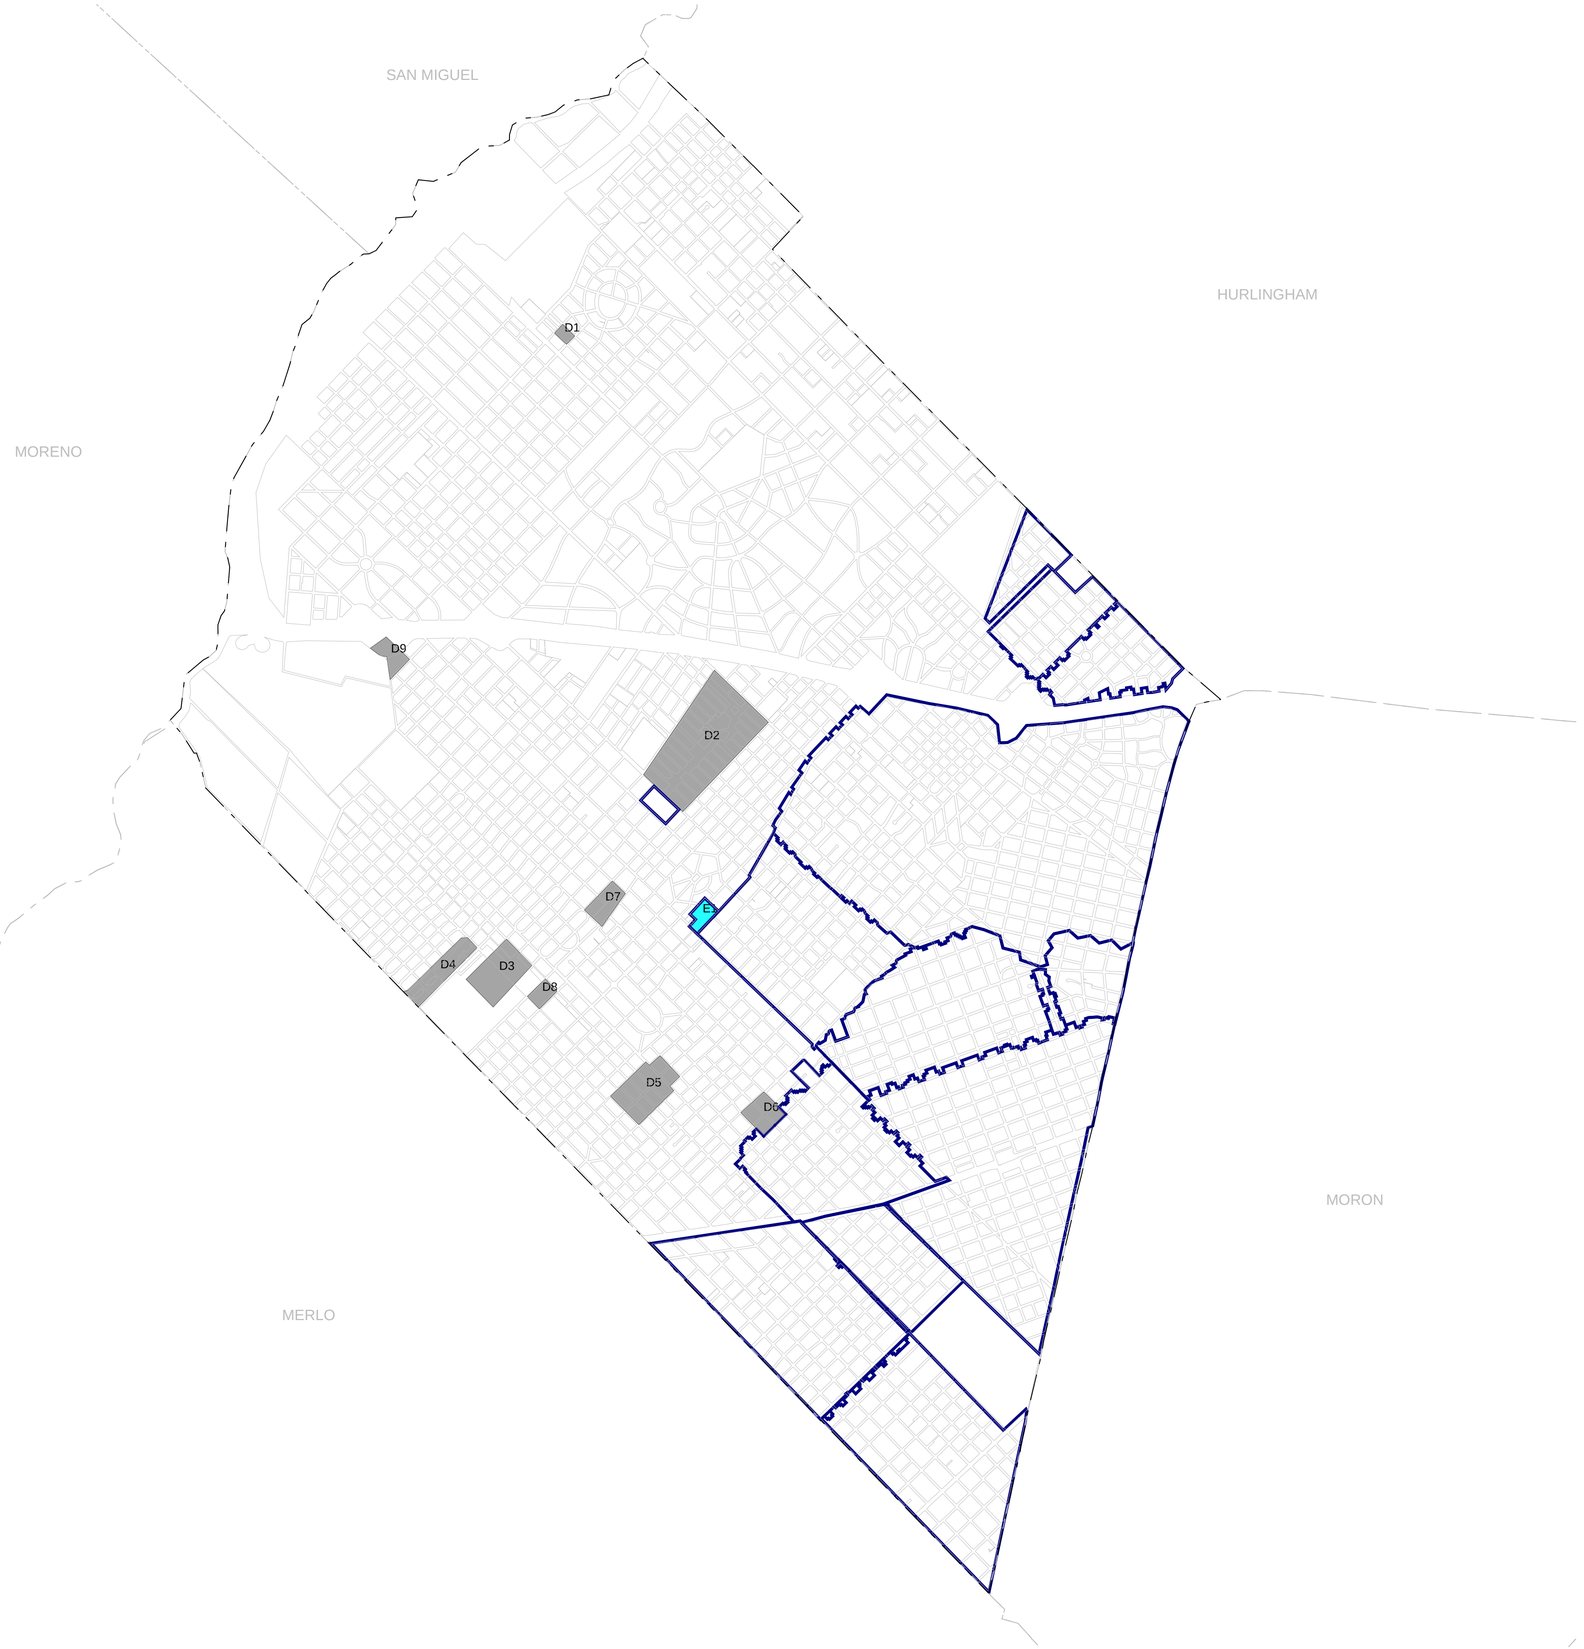

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	B° SICUREZZA - ODT N° I - 2025 - 79802

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	BARRIO MUNICIPAL UDAONDO
D2	COOPIC. BARRIO AERONAUTICO
D3	Barrio LA ESPERANZA
D4	Barrio FORTIN EL GALLO
D5	Barrio FERROVIARIO
D6	Barrio GASTRONOMICO
D7	BARRIO MARTILLAZO 1 y 2
D8	Barrio Municipal SAN ALBERTO
D9	BARRIO SINDICATO ARGENTINO DE TV

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO ITUZAINGO

REGION OESTE


2025

5/5/2026

1:20000

IEAITU20

Censo 2022

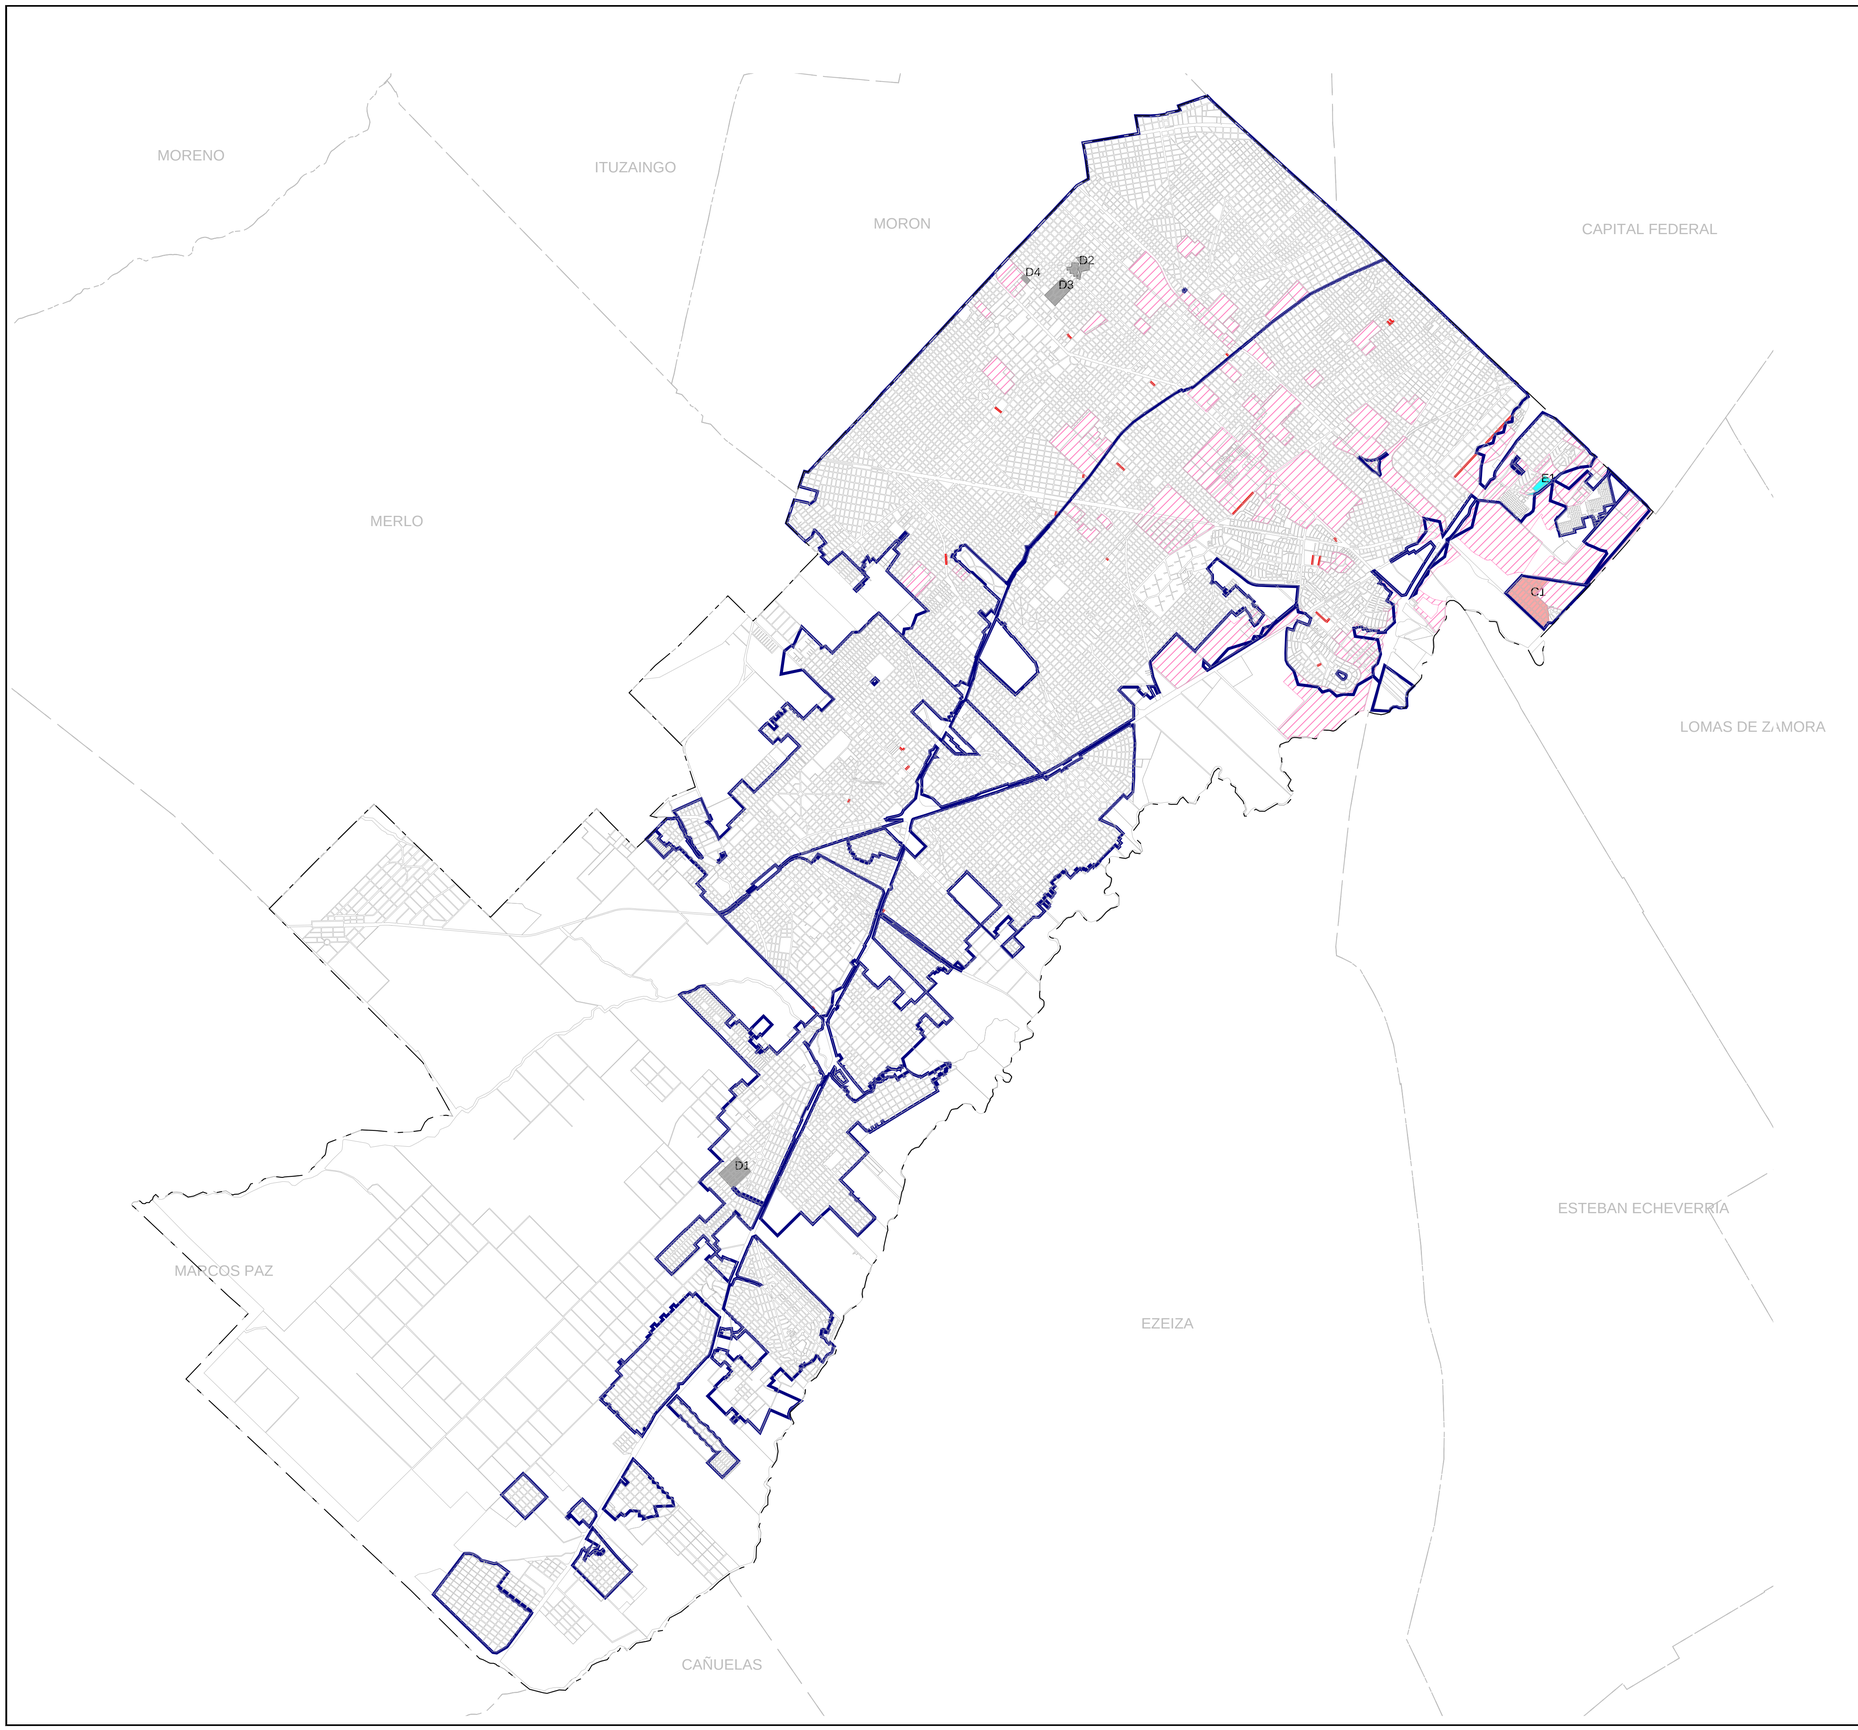

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	P_S-P3-CALLE RAMÍREZ (HAB N°1060)

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	ORO VERDE
D2	BARRIO MARINA
D3	COOP. STELLA MARIS
D4	COOP. MADRES DEL PUEBLO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

Identificador	Nombre
C1	1

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO LA MATANZA

REGION OESTE


2025

5/5/2026

1:57500

IEAMAT20

Censo 2022

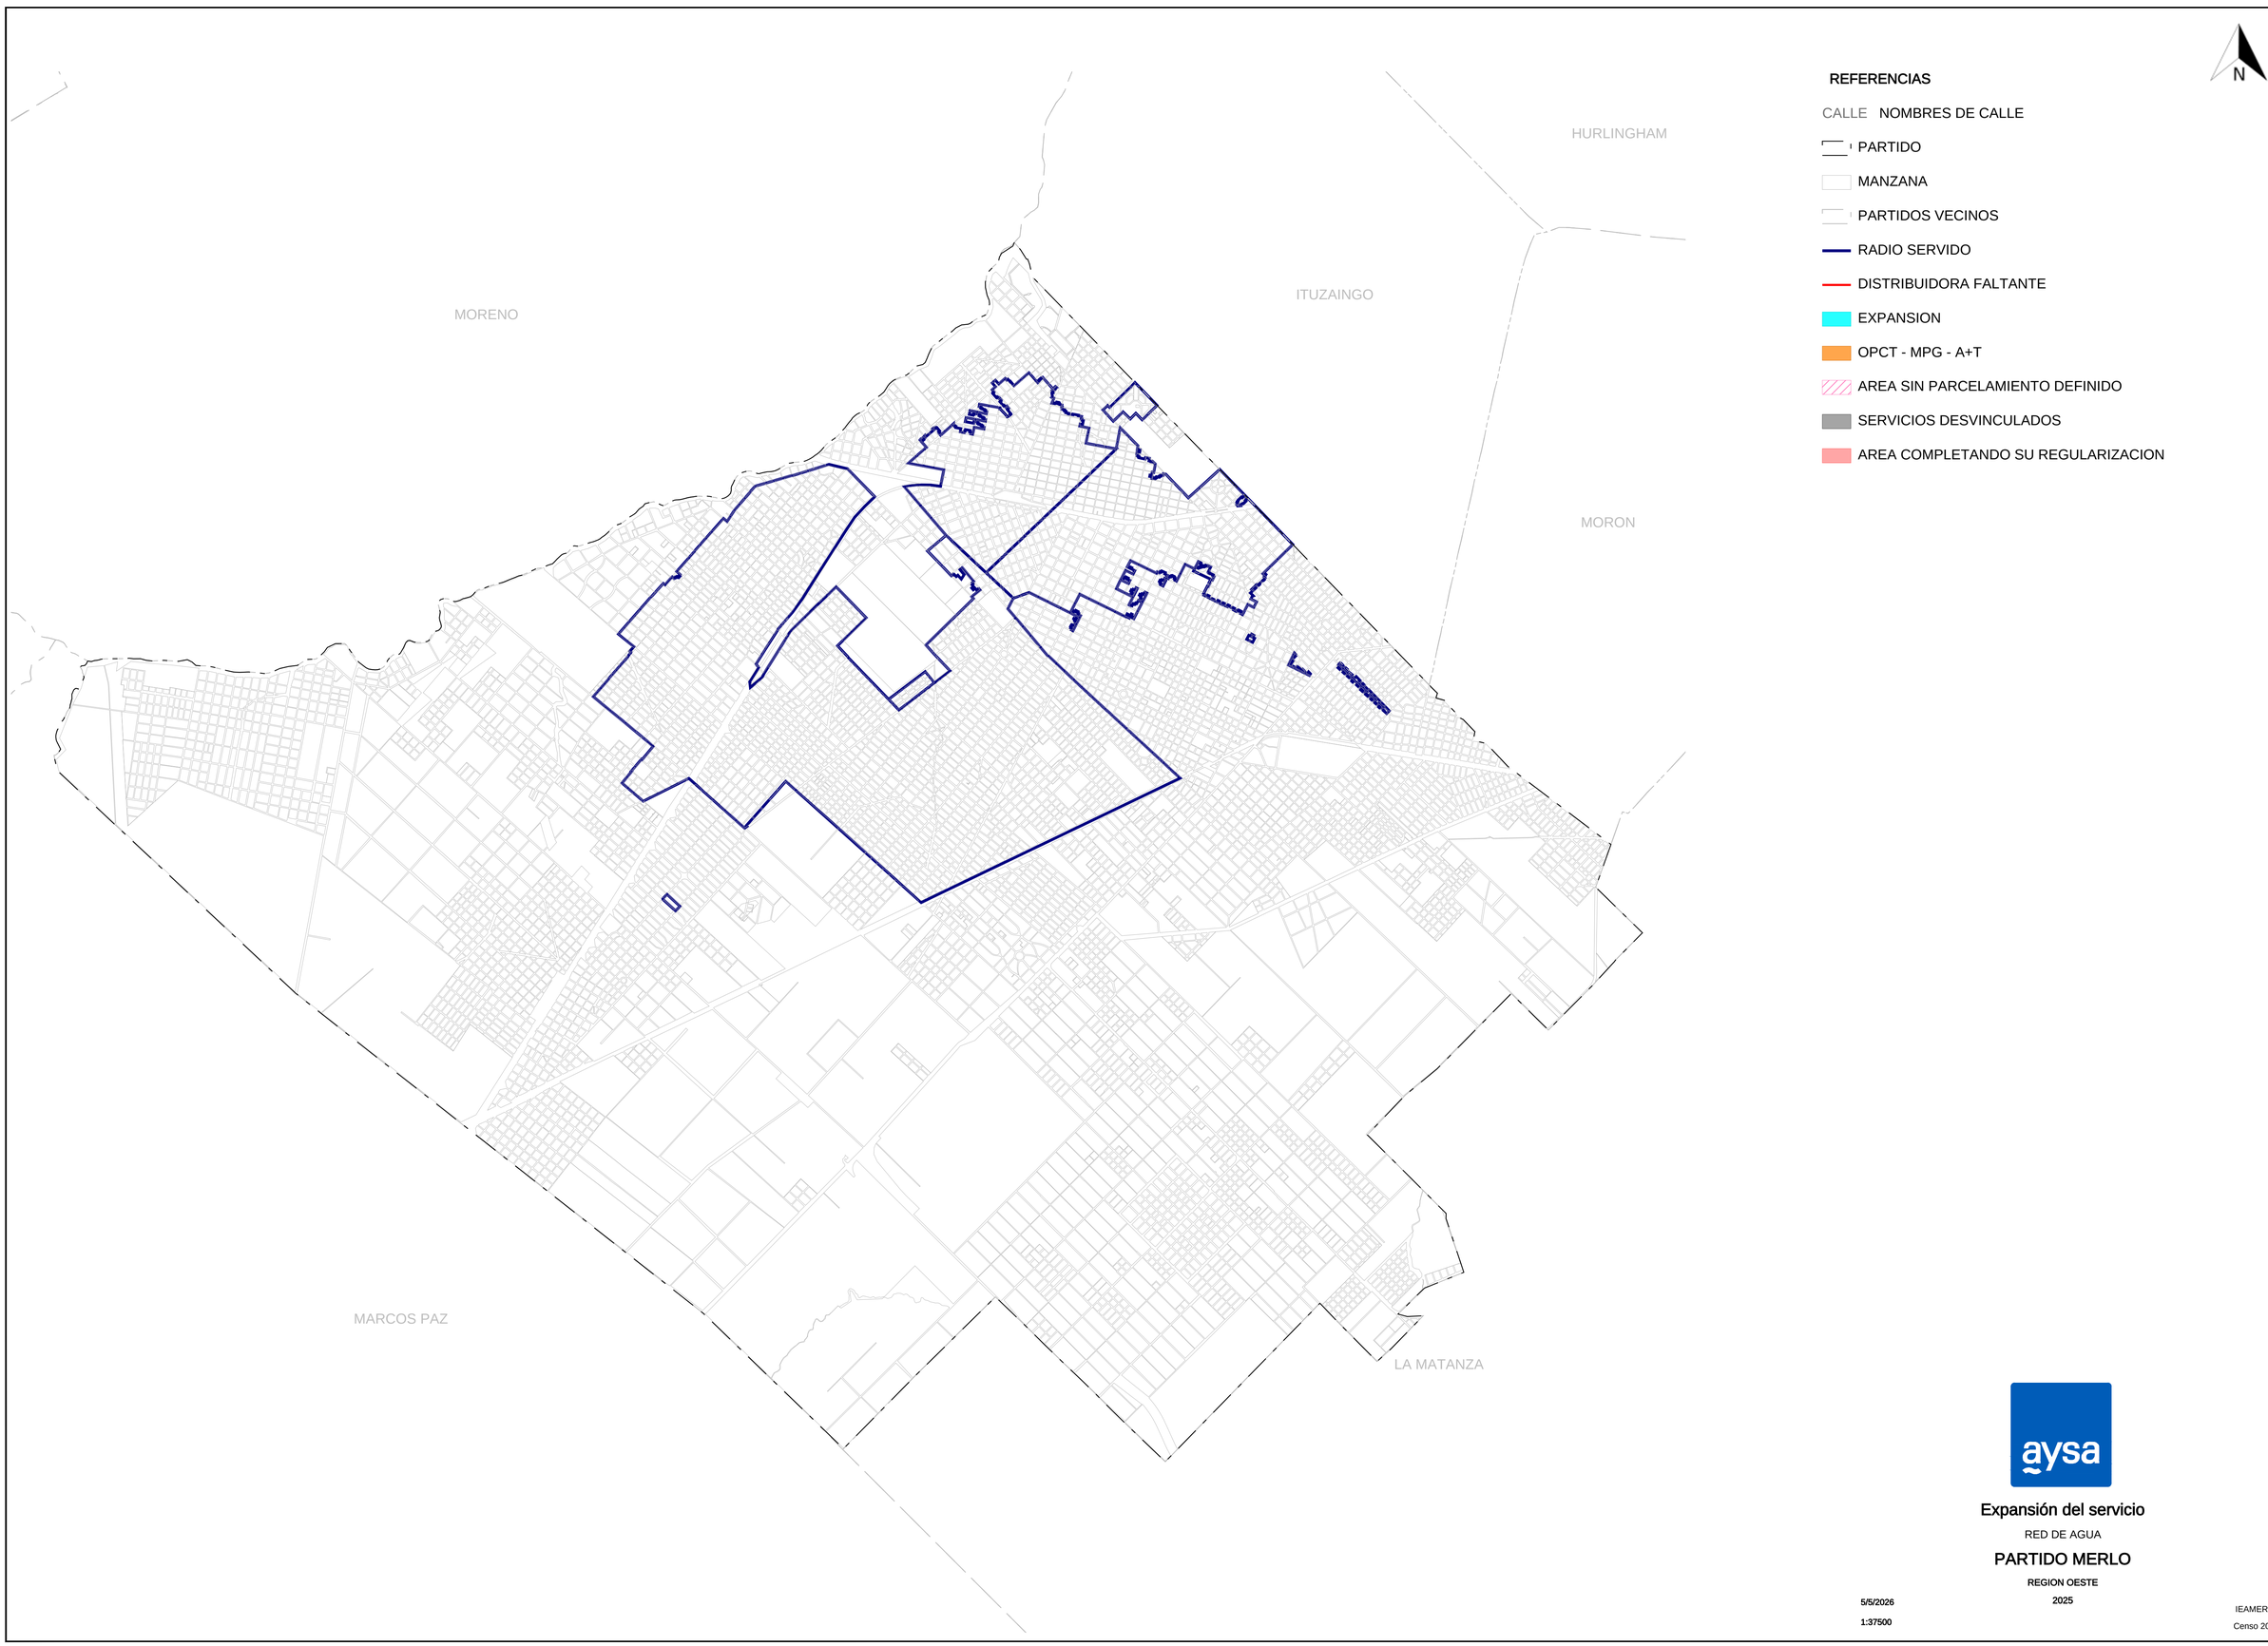

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO MERLO

REGION OESTE


2025

5/5/2026

1:37500

IEAMER20

Censo 2022

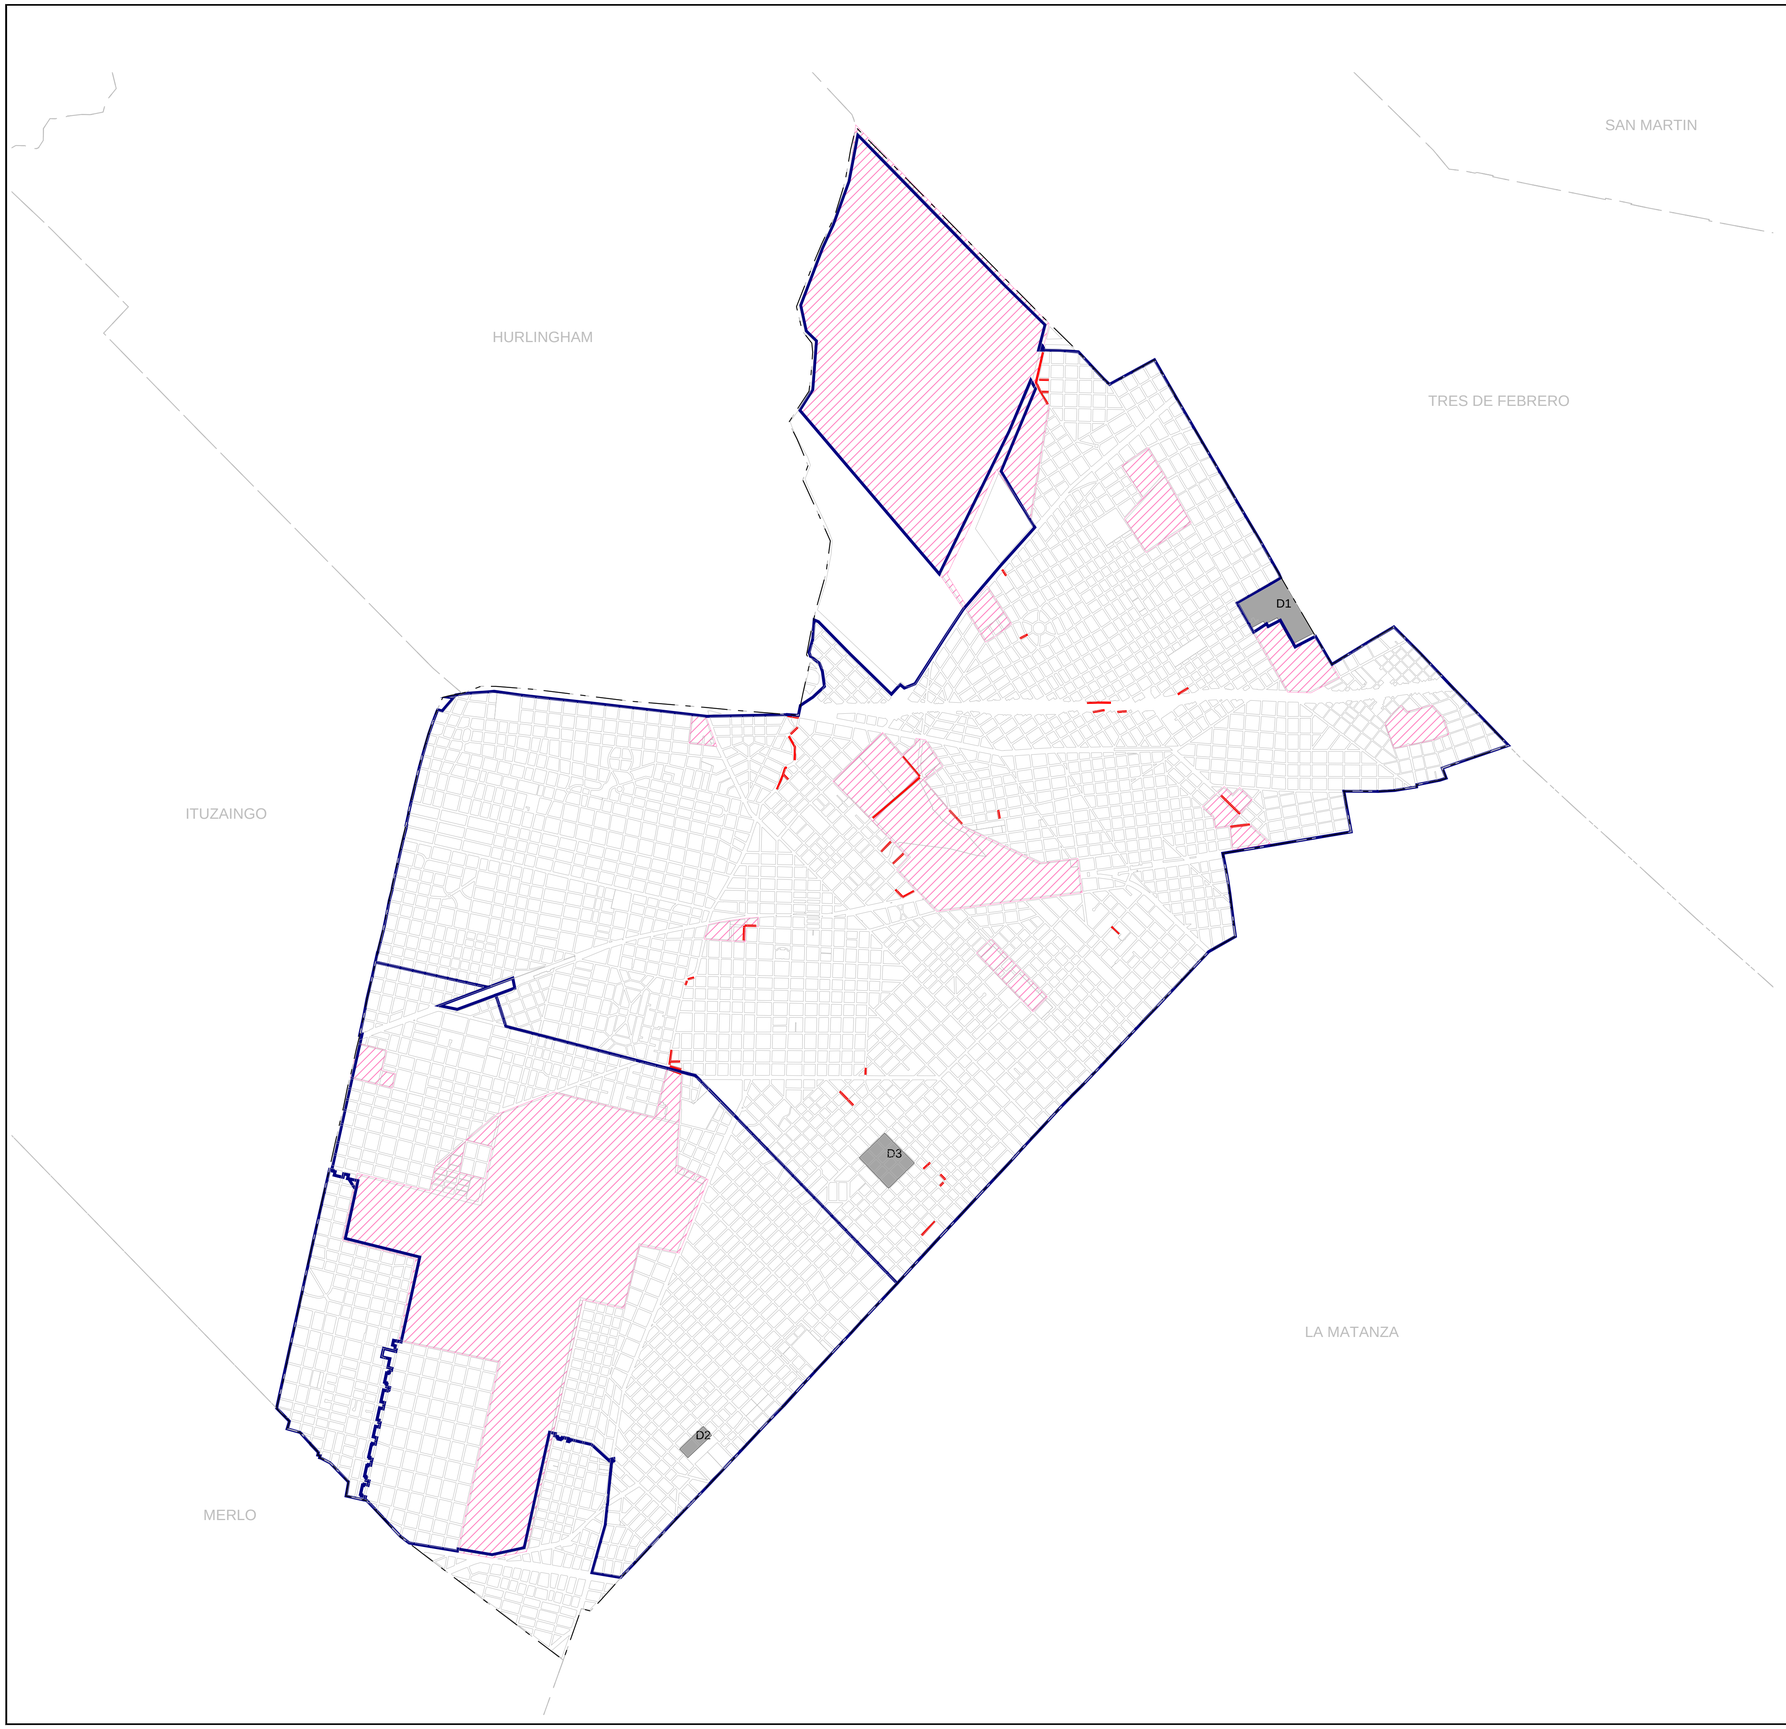

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	BARRIO SARMIENTO
D2	COOP. POPULAR
D3	ASOC. VECINAL BARRIO ADUANA

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO MORON

REGION OESTE


2025

5/5/2026

1:25000

IEAMOR20

Censo 2022

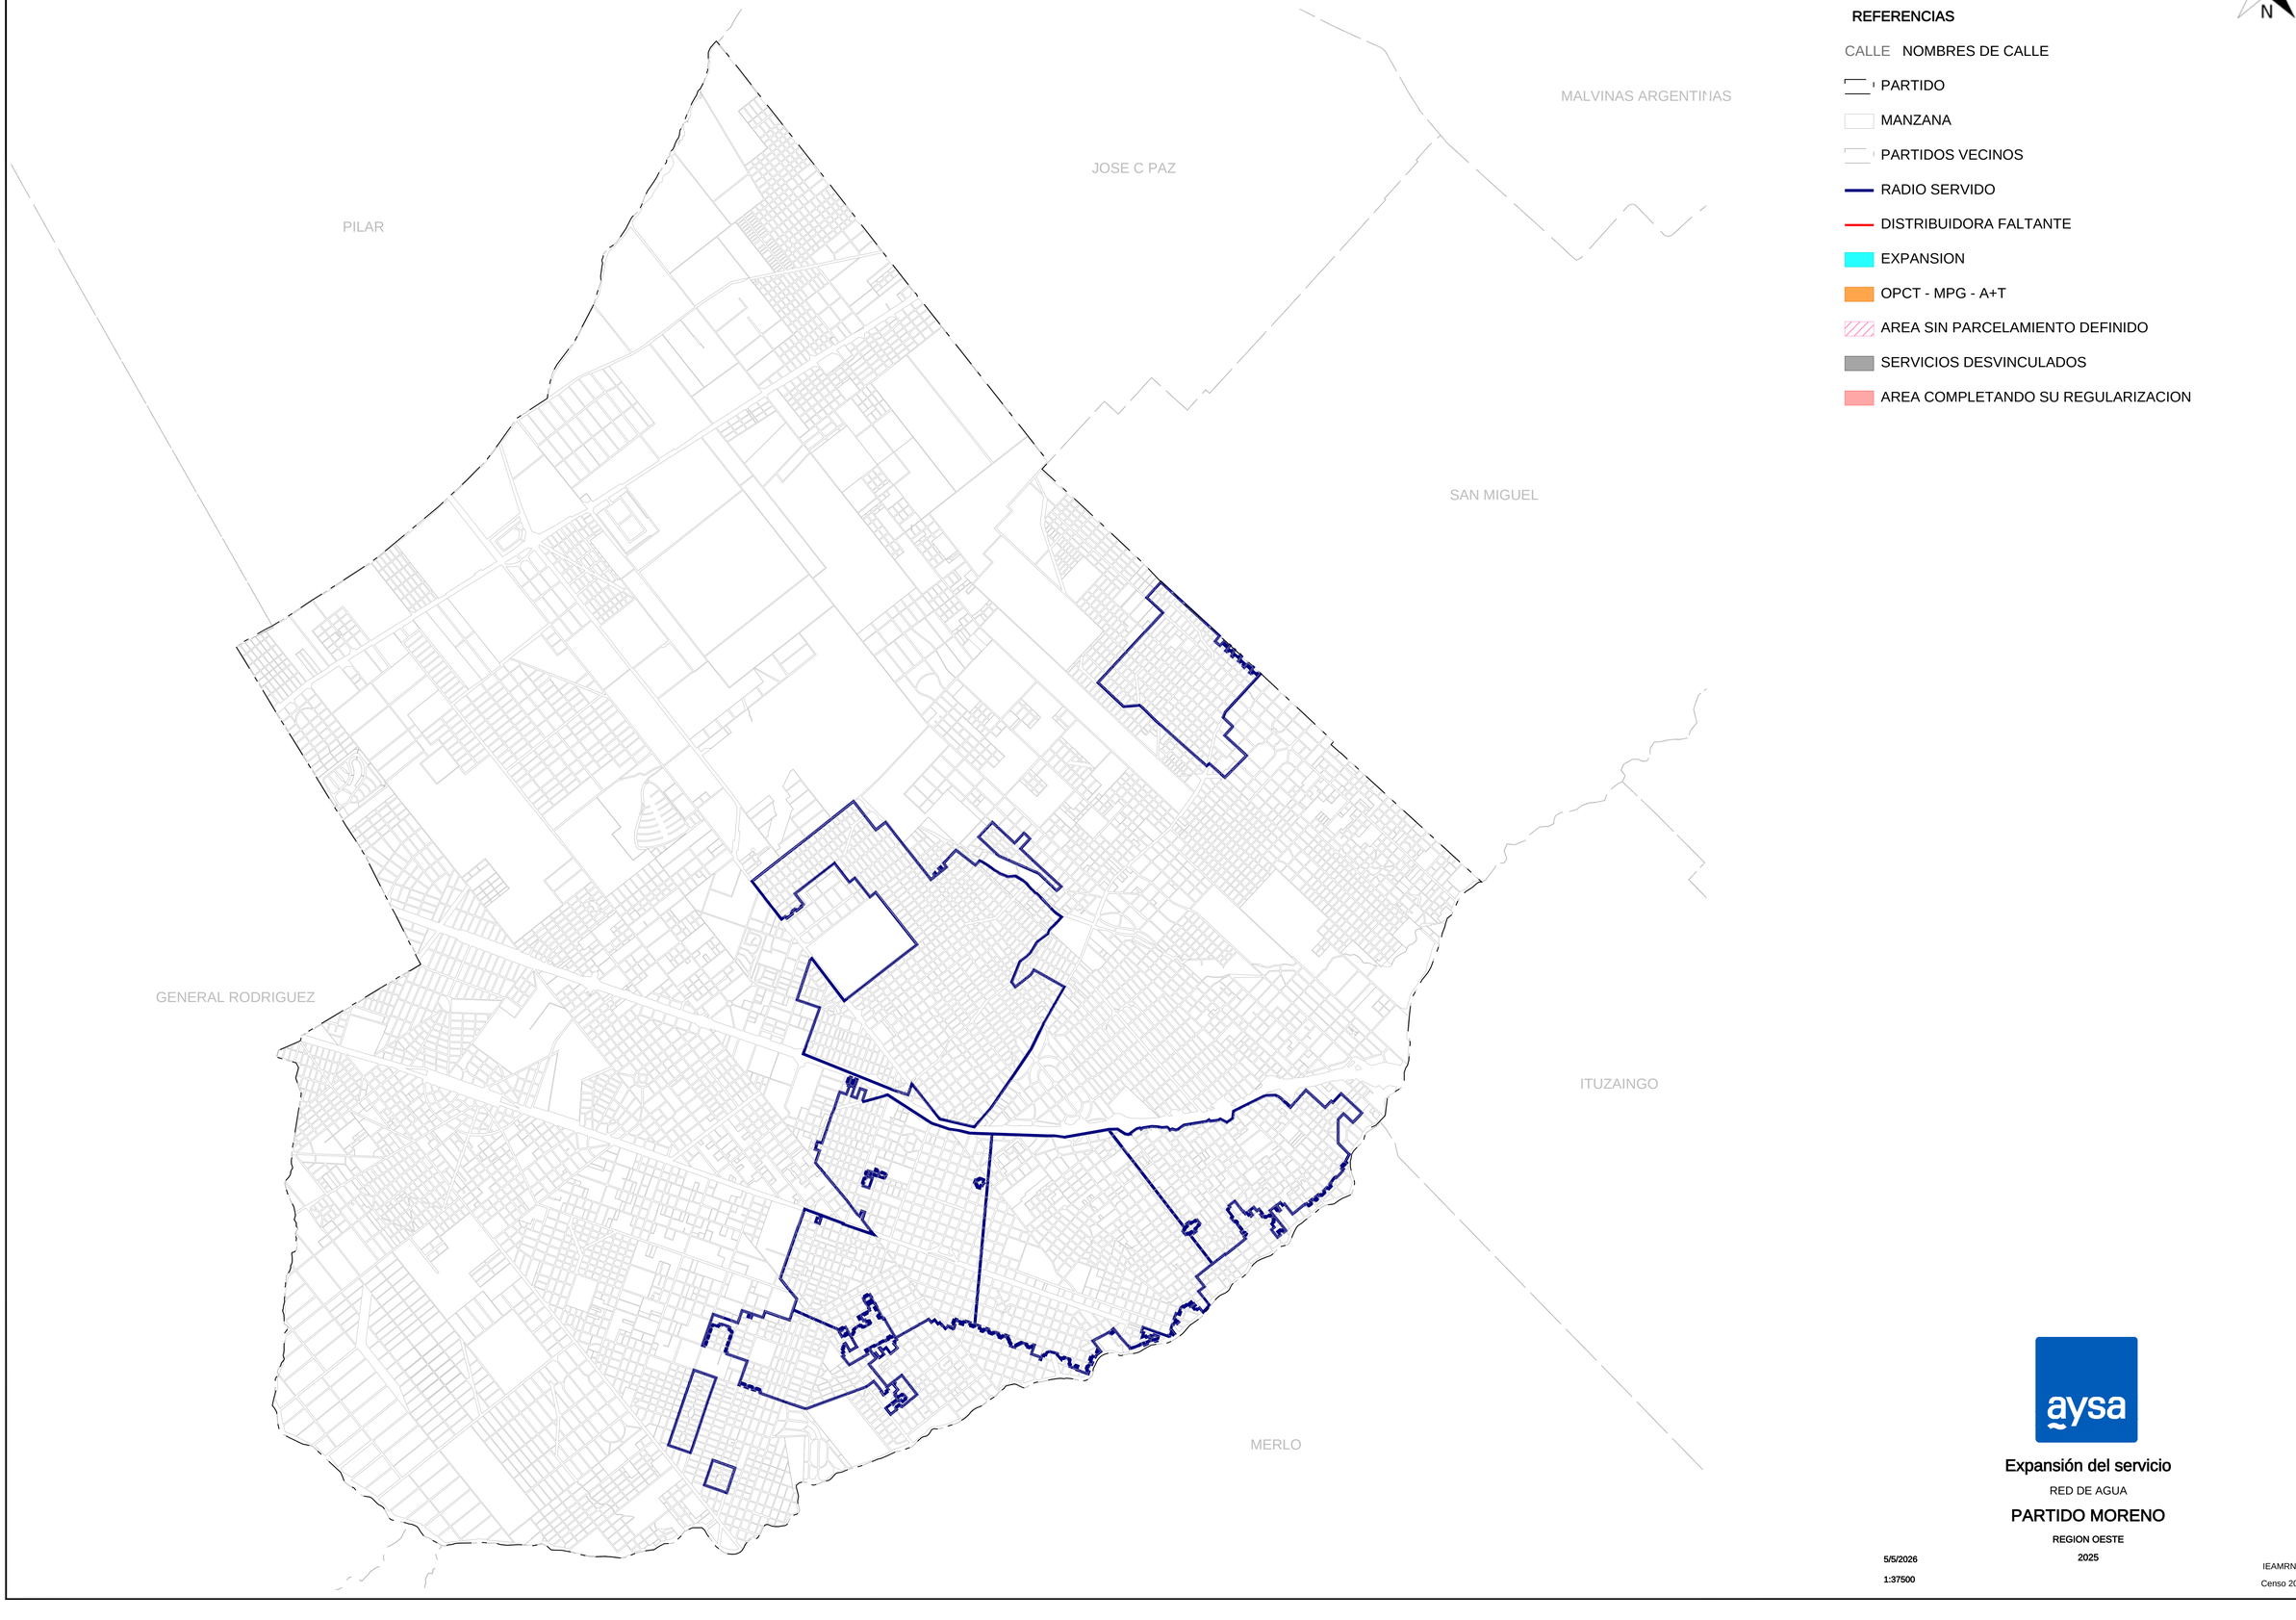

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO MORENO

REGION OESTE


2025

5/5/2026

1:37500

IEAMRN20

Censo 2022

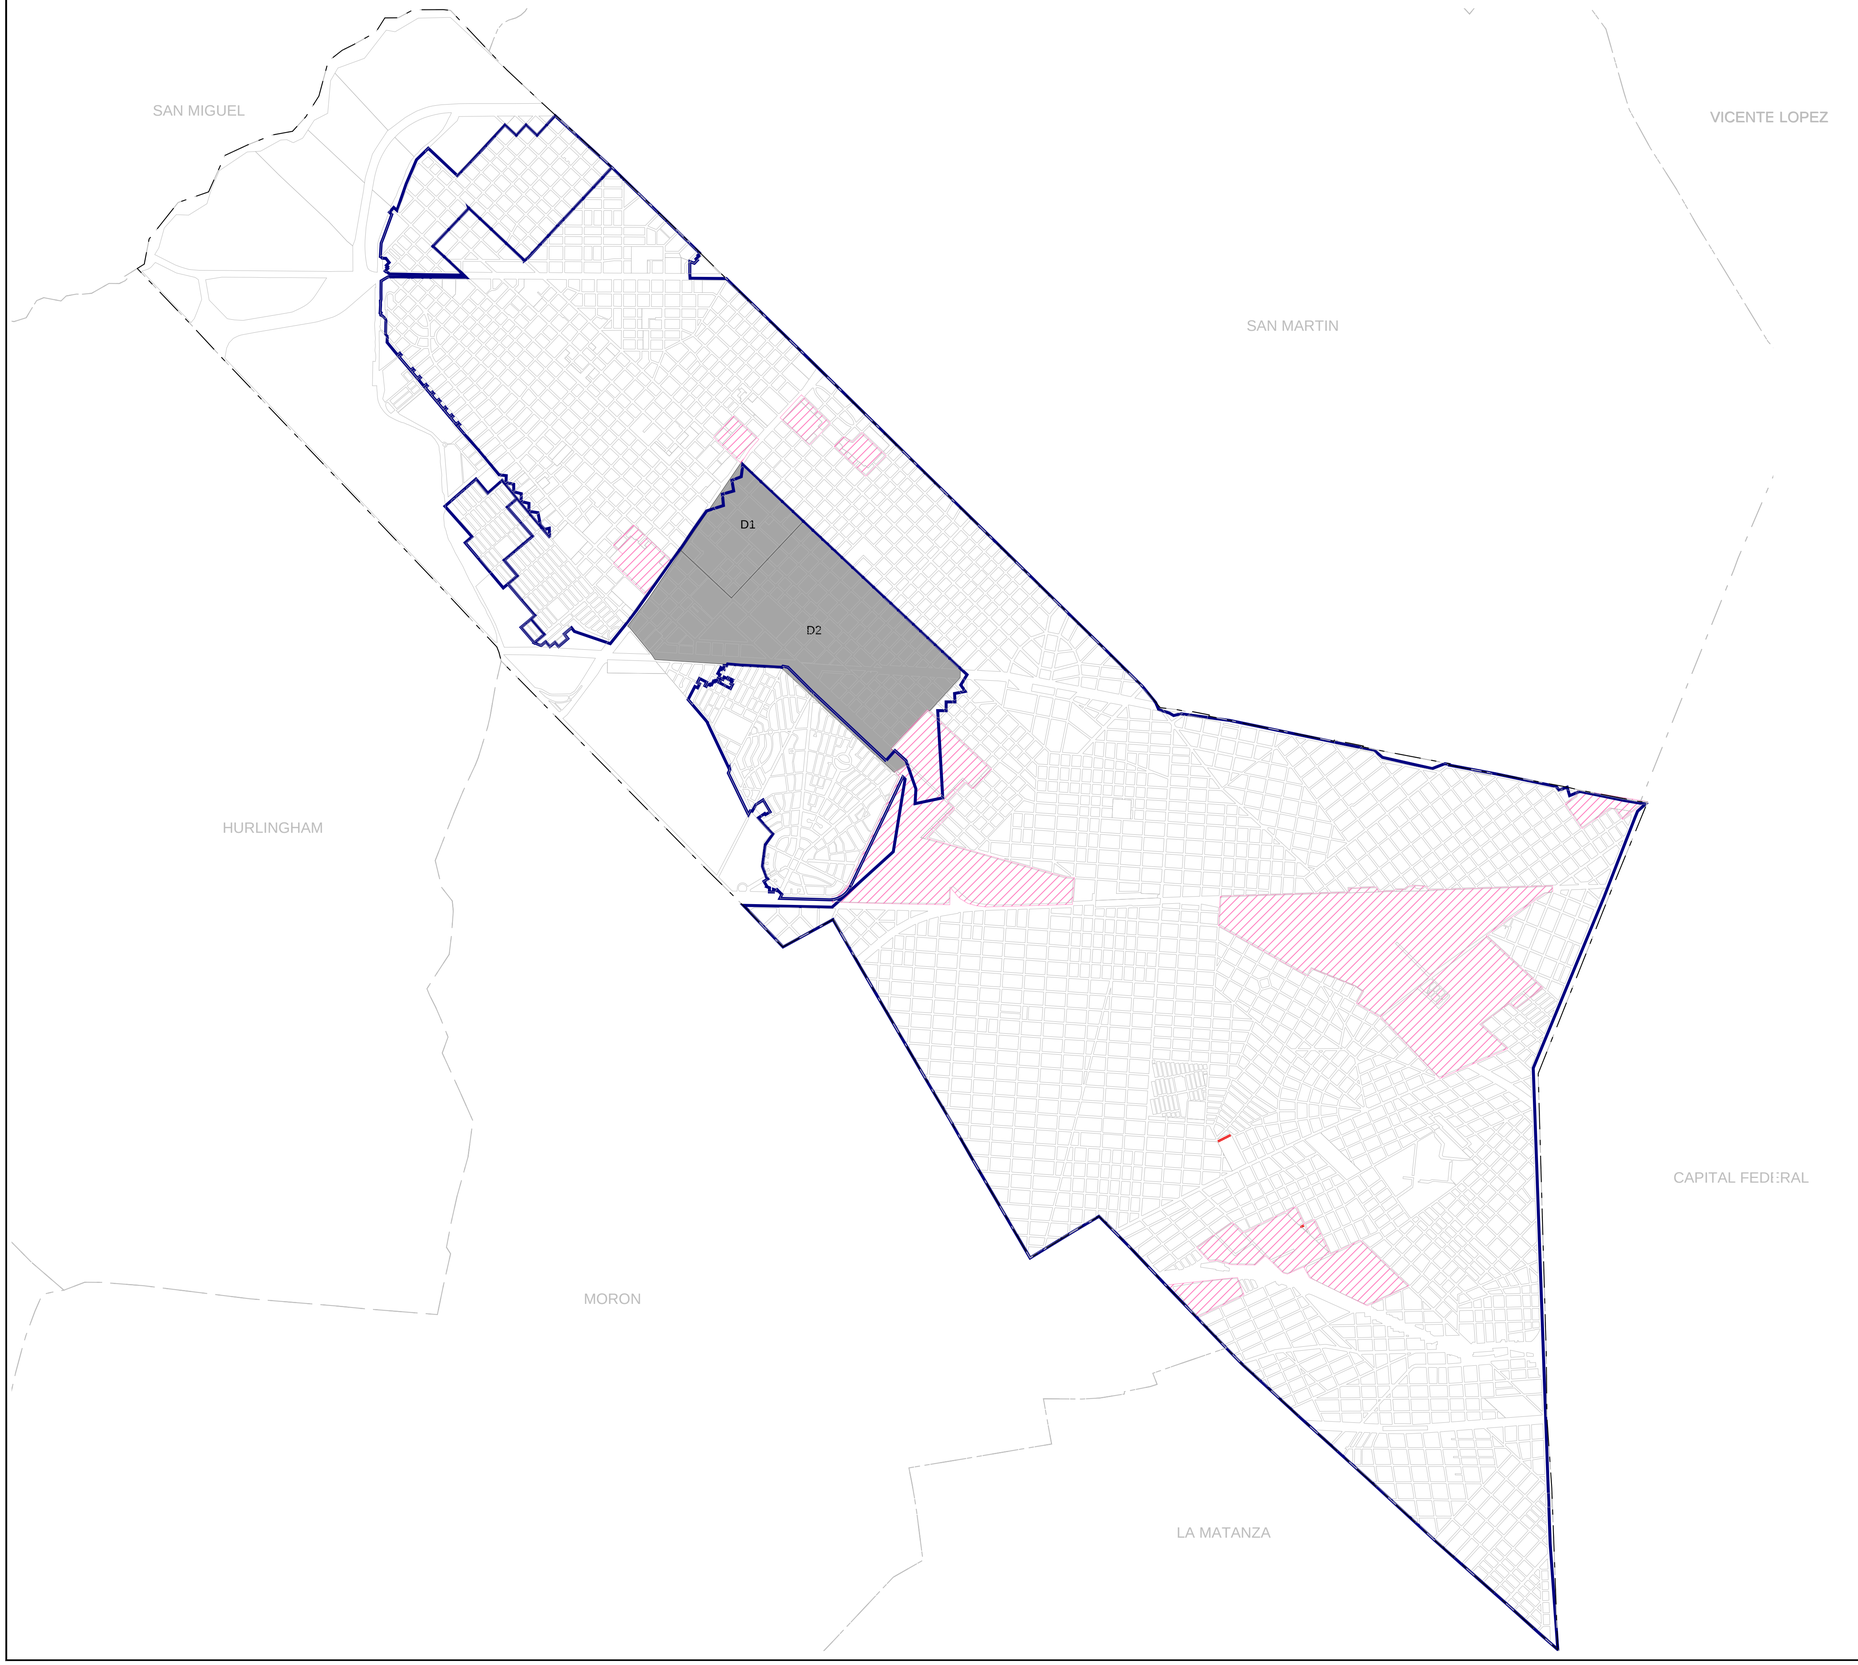

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	S/N
D2	COMACO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO TRES DE FEBRERO

REGION OESTE

2025


5/5/2026

1:22500

IEATRE20

Censo 2022

Planos Cobertura del Servicio de Agua Región Sudoeste

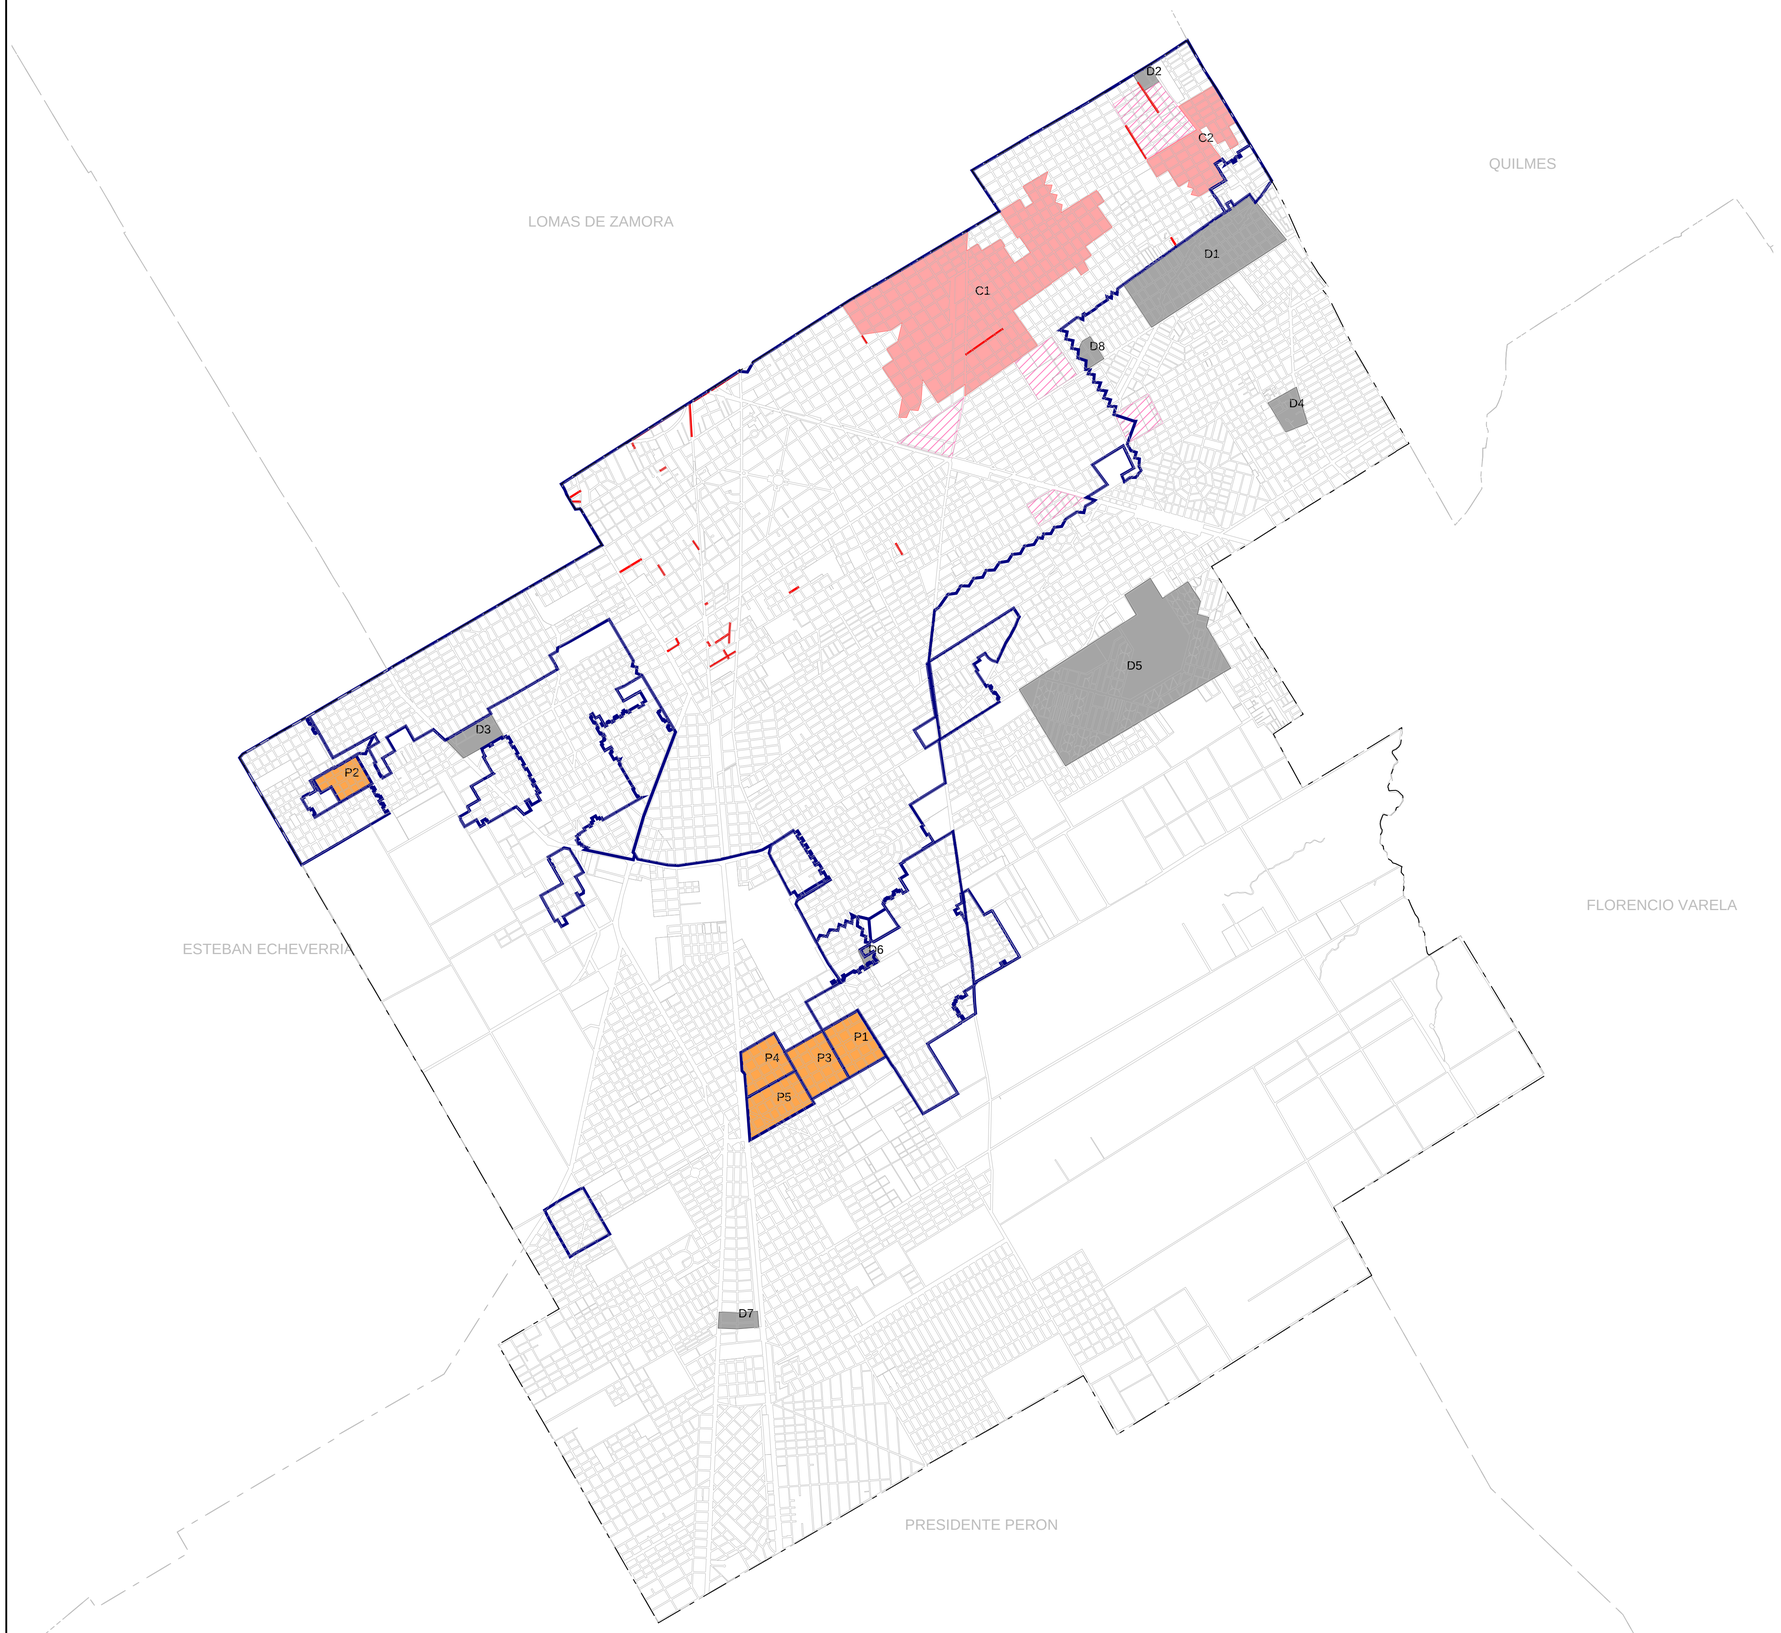

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

Identificador	Nombre
P1	A+T - Longchamps Este M2 SA767
P2	DRSO-OPCT - B° Lindo 1 y 2
P3	Longchamps Este M3 SA768
P4	A+T–Longchamps Centro M2 - SA705
P5	OPCT – Longchamps Centro M1-SA704

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	2 de abril
D2	Garay
D3	Empleados de Comercio
D4	San Francisco Solano
D5	Don Orione
D6	Corimayo
D7	U.P.C.N.
D8	San Javier

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

Identificador	Nombre
C1	<sin nombre>
C2	<sin nombre>

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO ALMTE BROWN

REGION SUDOESTE

2025

11/5/2026

1:32500

IEAALM20

Censo 2022



N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	Convenio Docente
D2	Sin datos

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO ESTEBAN ECHEVERRIA

REGION SUDOESTE

2025

11/5/2026

1:42500

IEAEST20

Censo 2022

MERLO

MARCOS PAZ

LA MATANZA

MARCOS PAZ

MARCOS PAZ

CAÑUELAS

LOMAS DE ZAMORA

ESTEBAN ECHEVERRIA

ALMTE BROWN

PRESIDENTE PERON

SAN VICENTE

SAN VICENTE

SAN VICENTE

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO EZEIZA

REGION SUDOESTE


2025

11/5/2026

1:55000

IEAEZE20

Censo 2022

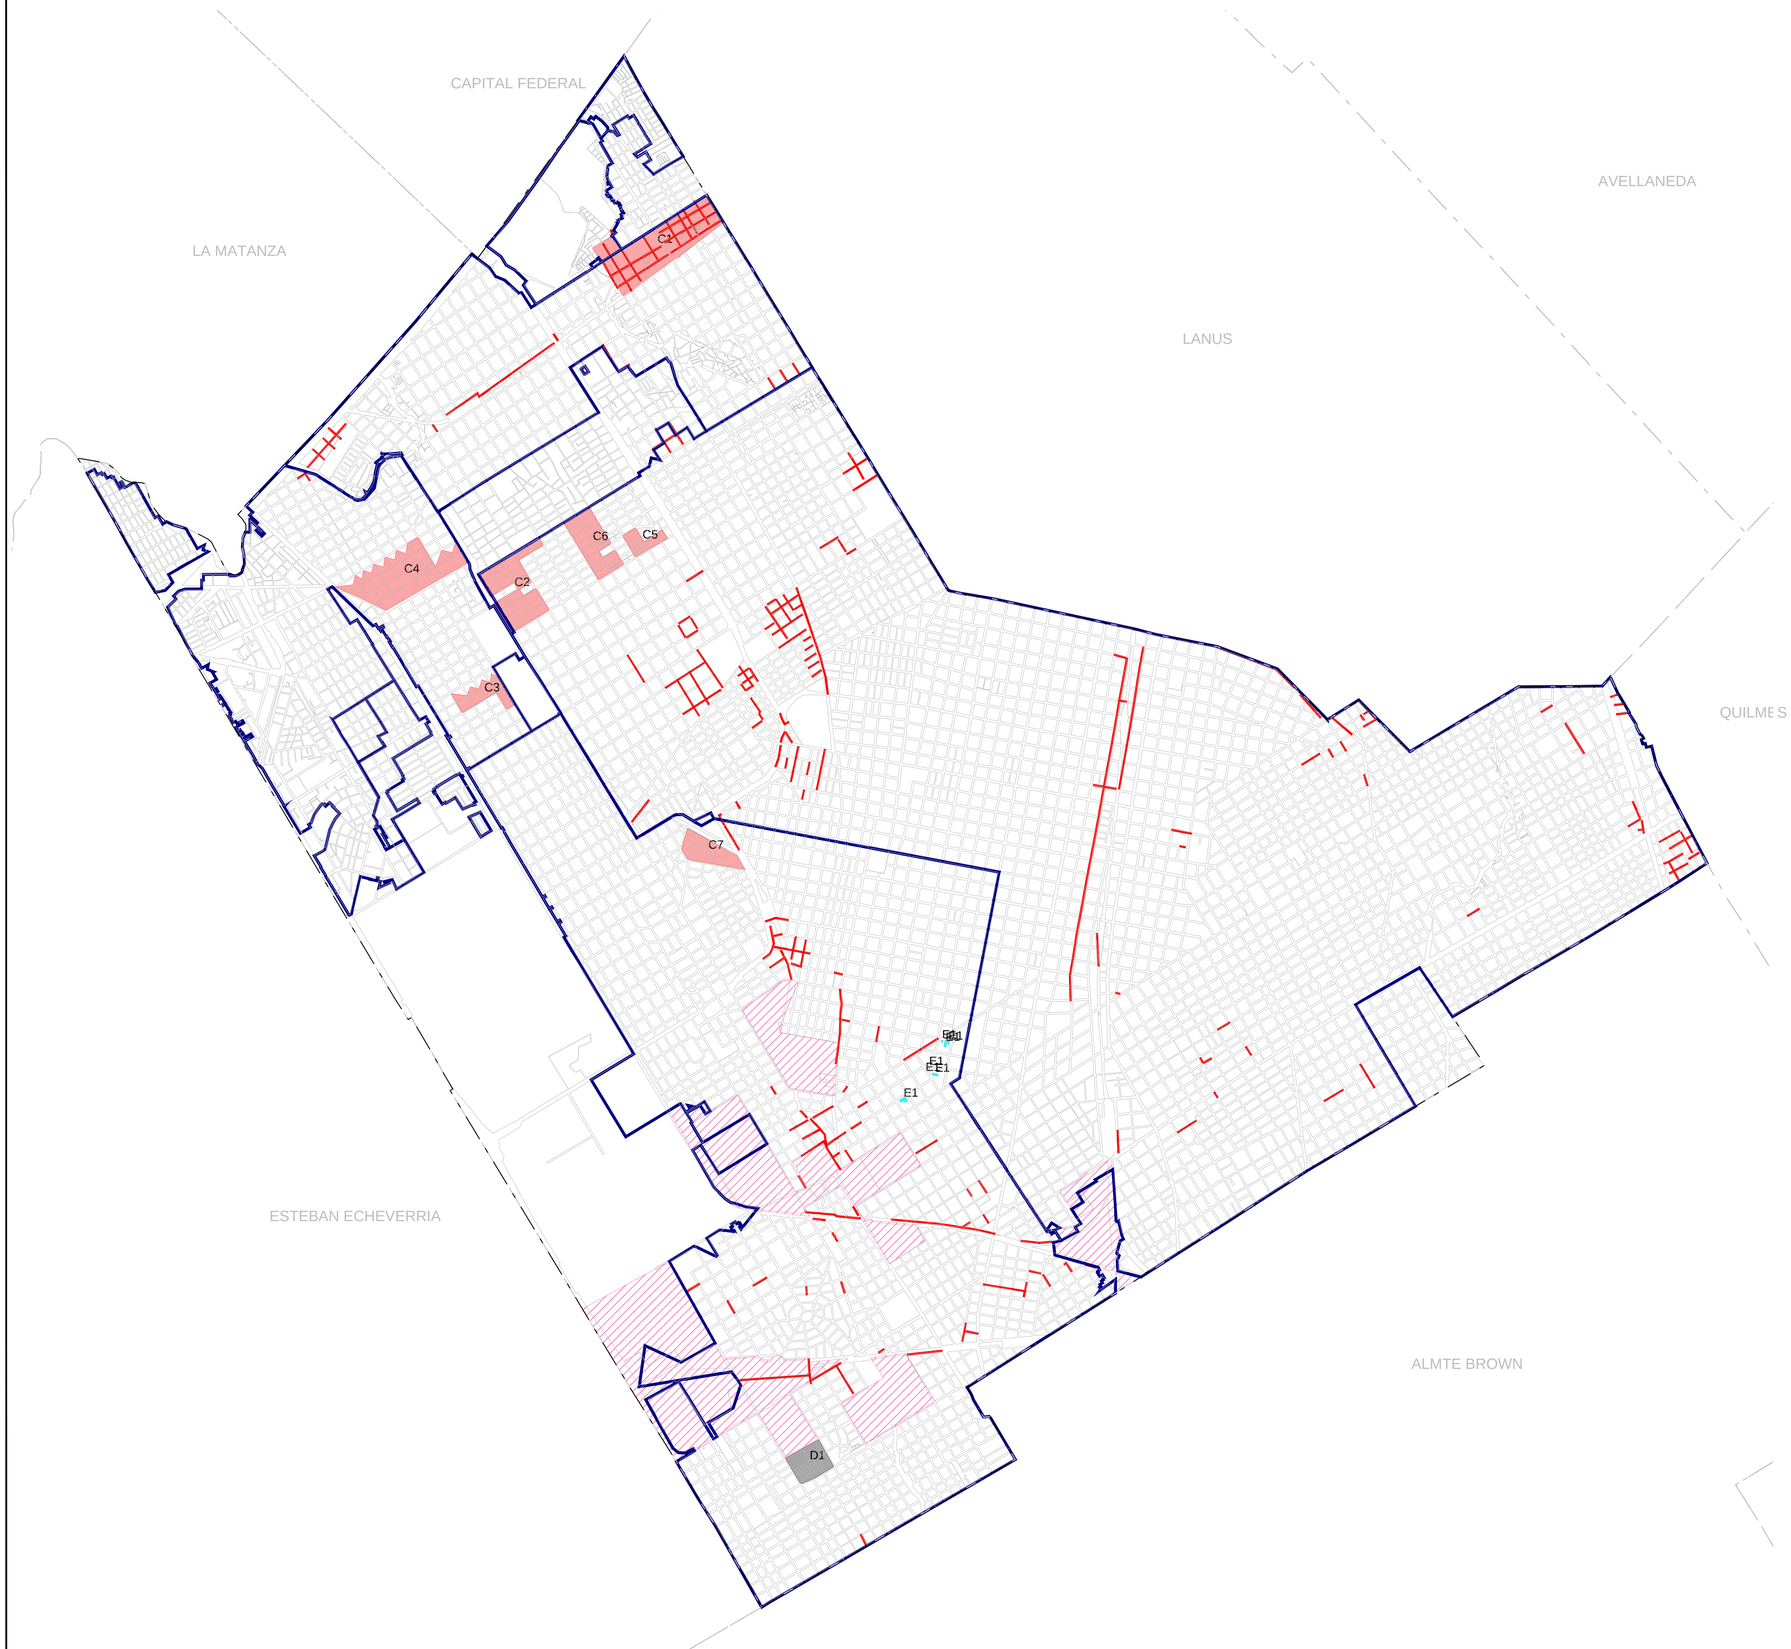

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	AySA-REN MALLA 115 Y 116-SA70220-RES. 1969

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	El Campanario

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

Identificador	Nombre
C1	<sin nombre>
C2	<sin nombre>
C3	<sin nombre>
C4	<sin nombre>
C5	<sin nombre>
C6	<sin nombre>
C7	<sin nombre>

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO LOMAS DE ZAMORA

REGION SUDOESTE

2025

11/5/2026

1:27500

IEALOM20

Censo 2022



aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO PRESIDENTE PERON

REGION SUDOESTE

2025


11/5/2026

1:35000

IEAPPE20

Censo 2022

Planos Cobertura del Servicio de Agua Región Sudeste

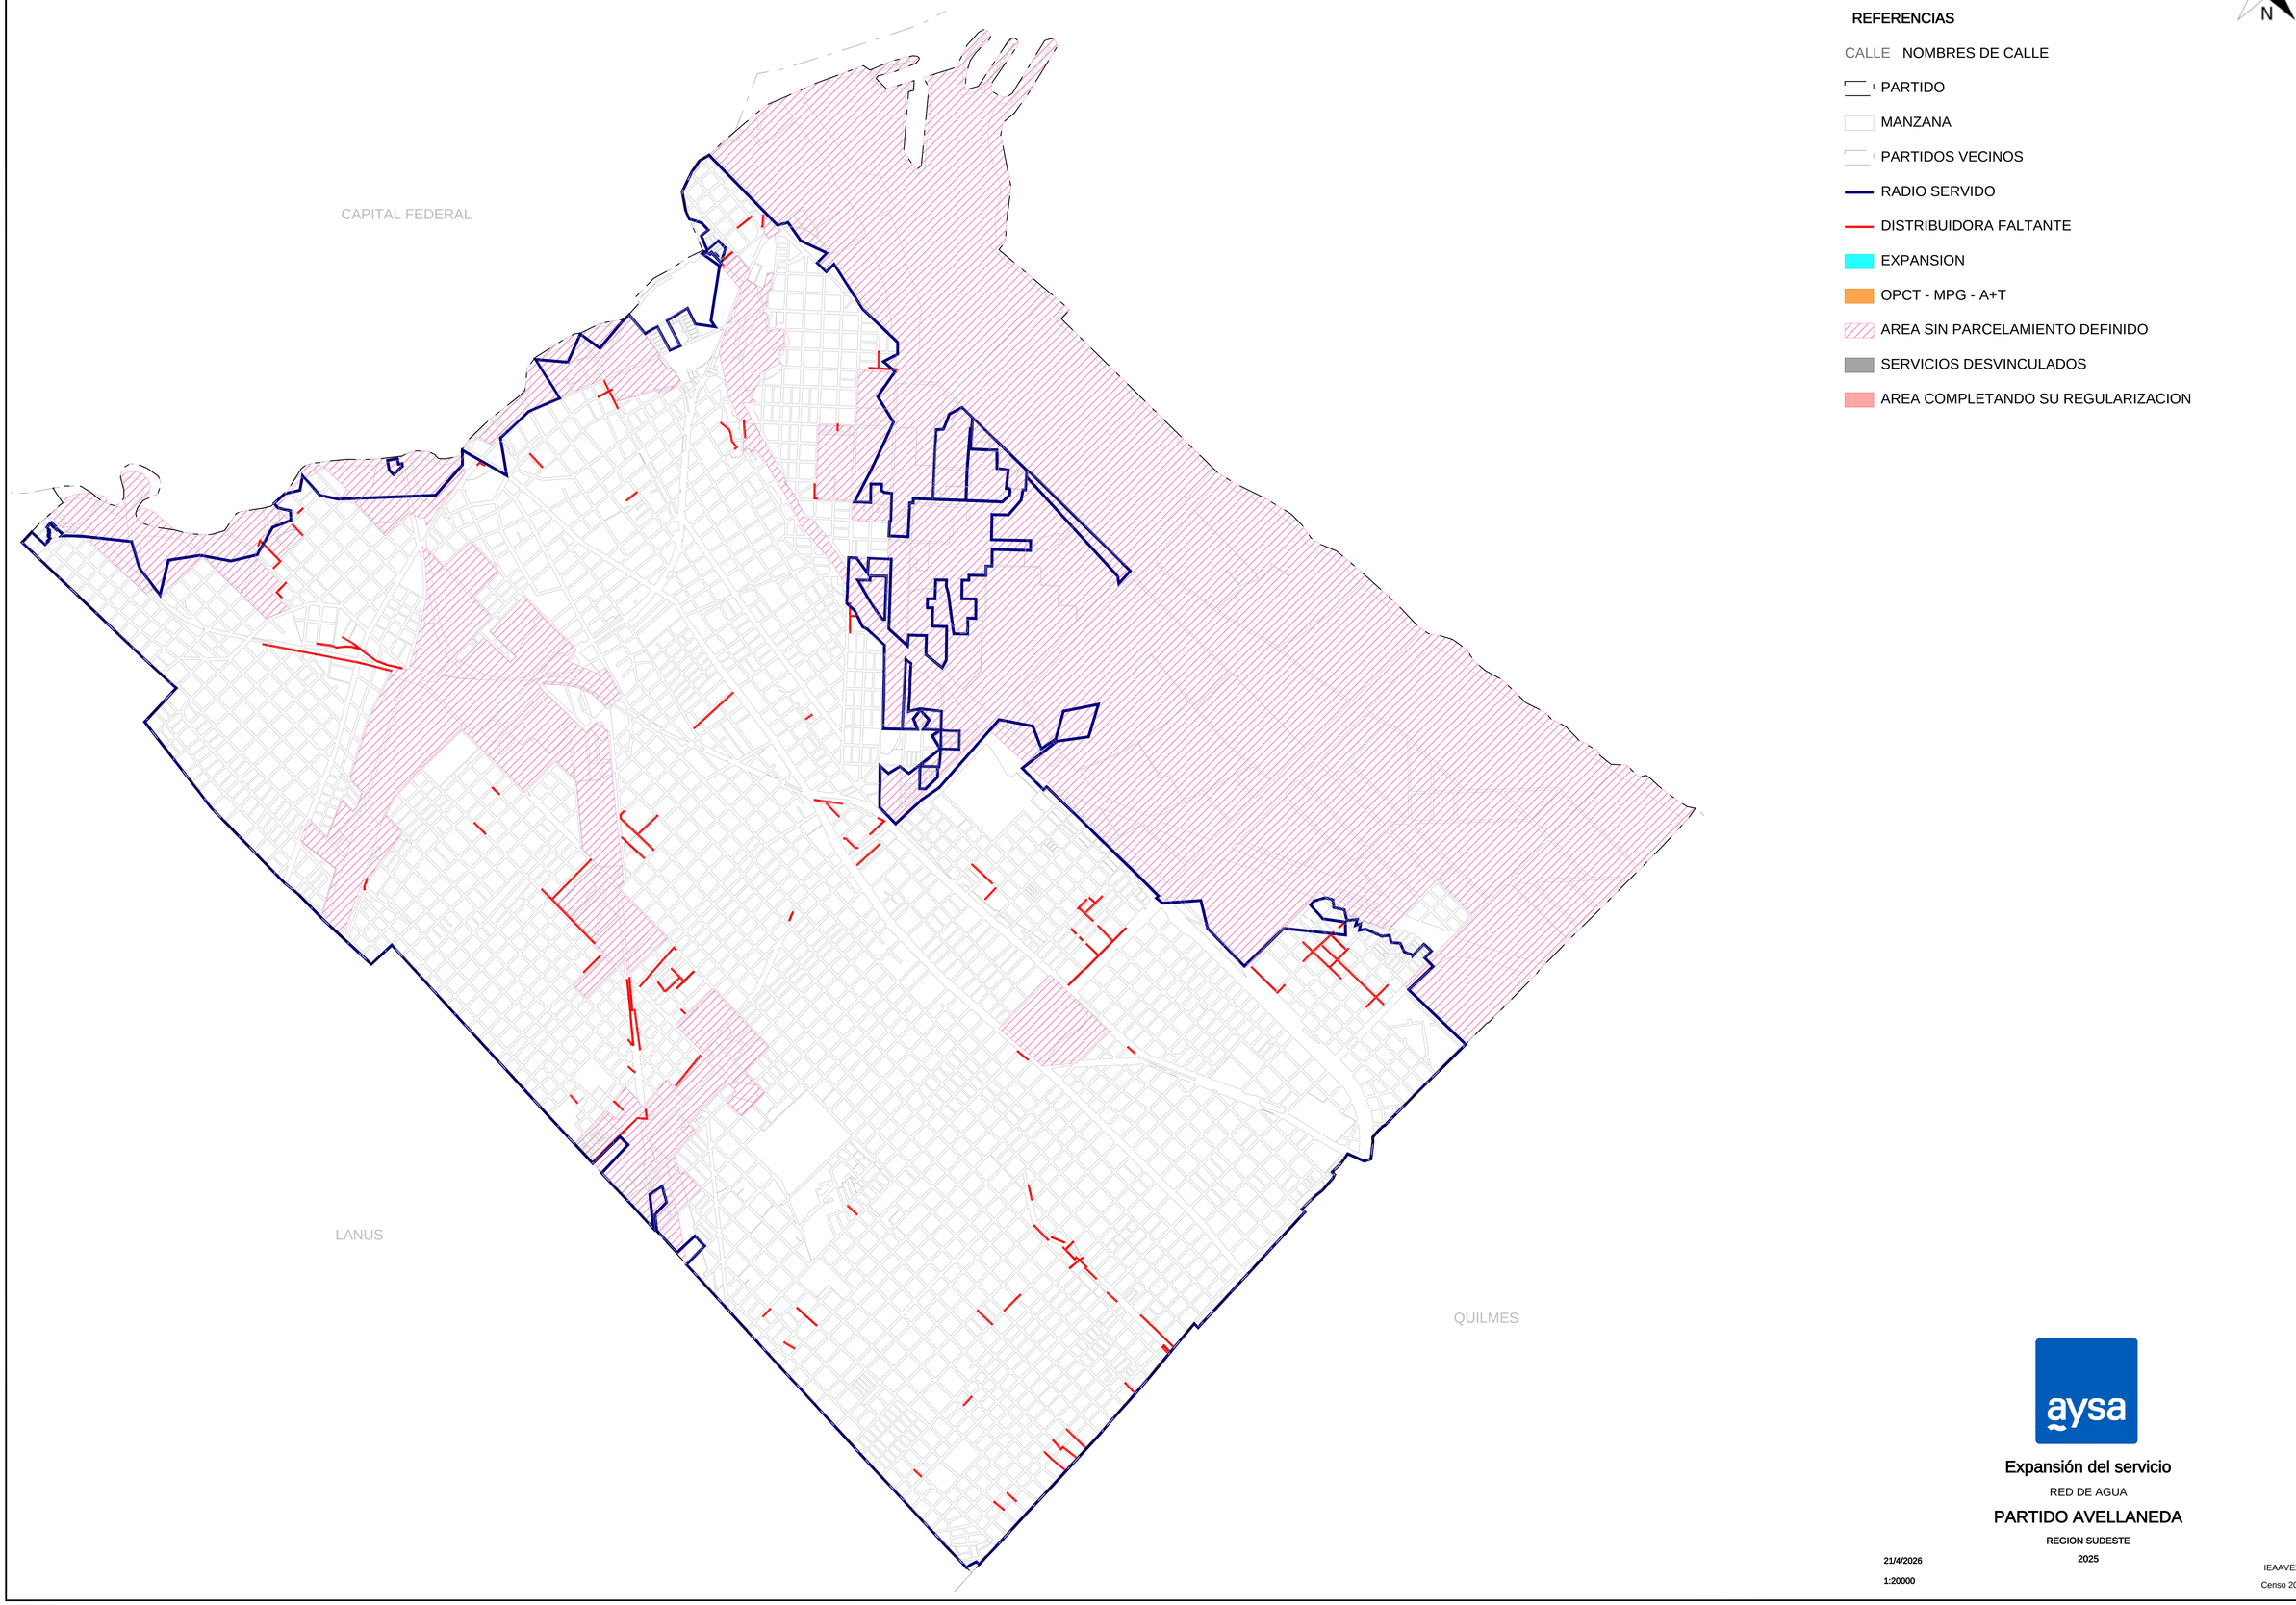

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO AVELLANEDA

REGION SUDESTE


2025

21/4/2026

1:20000

IEAAVE20

Censo 2022

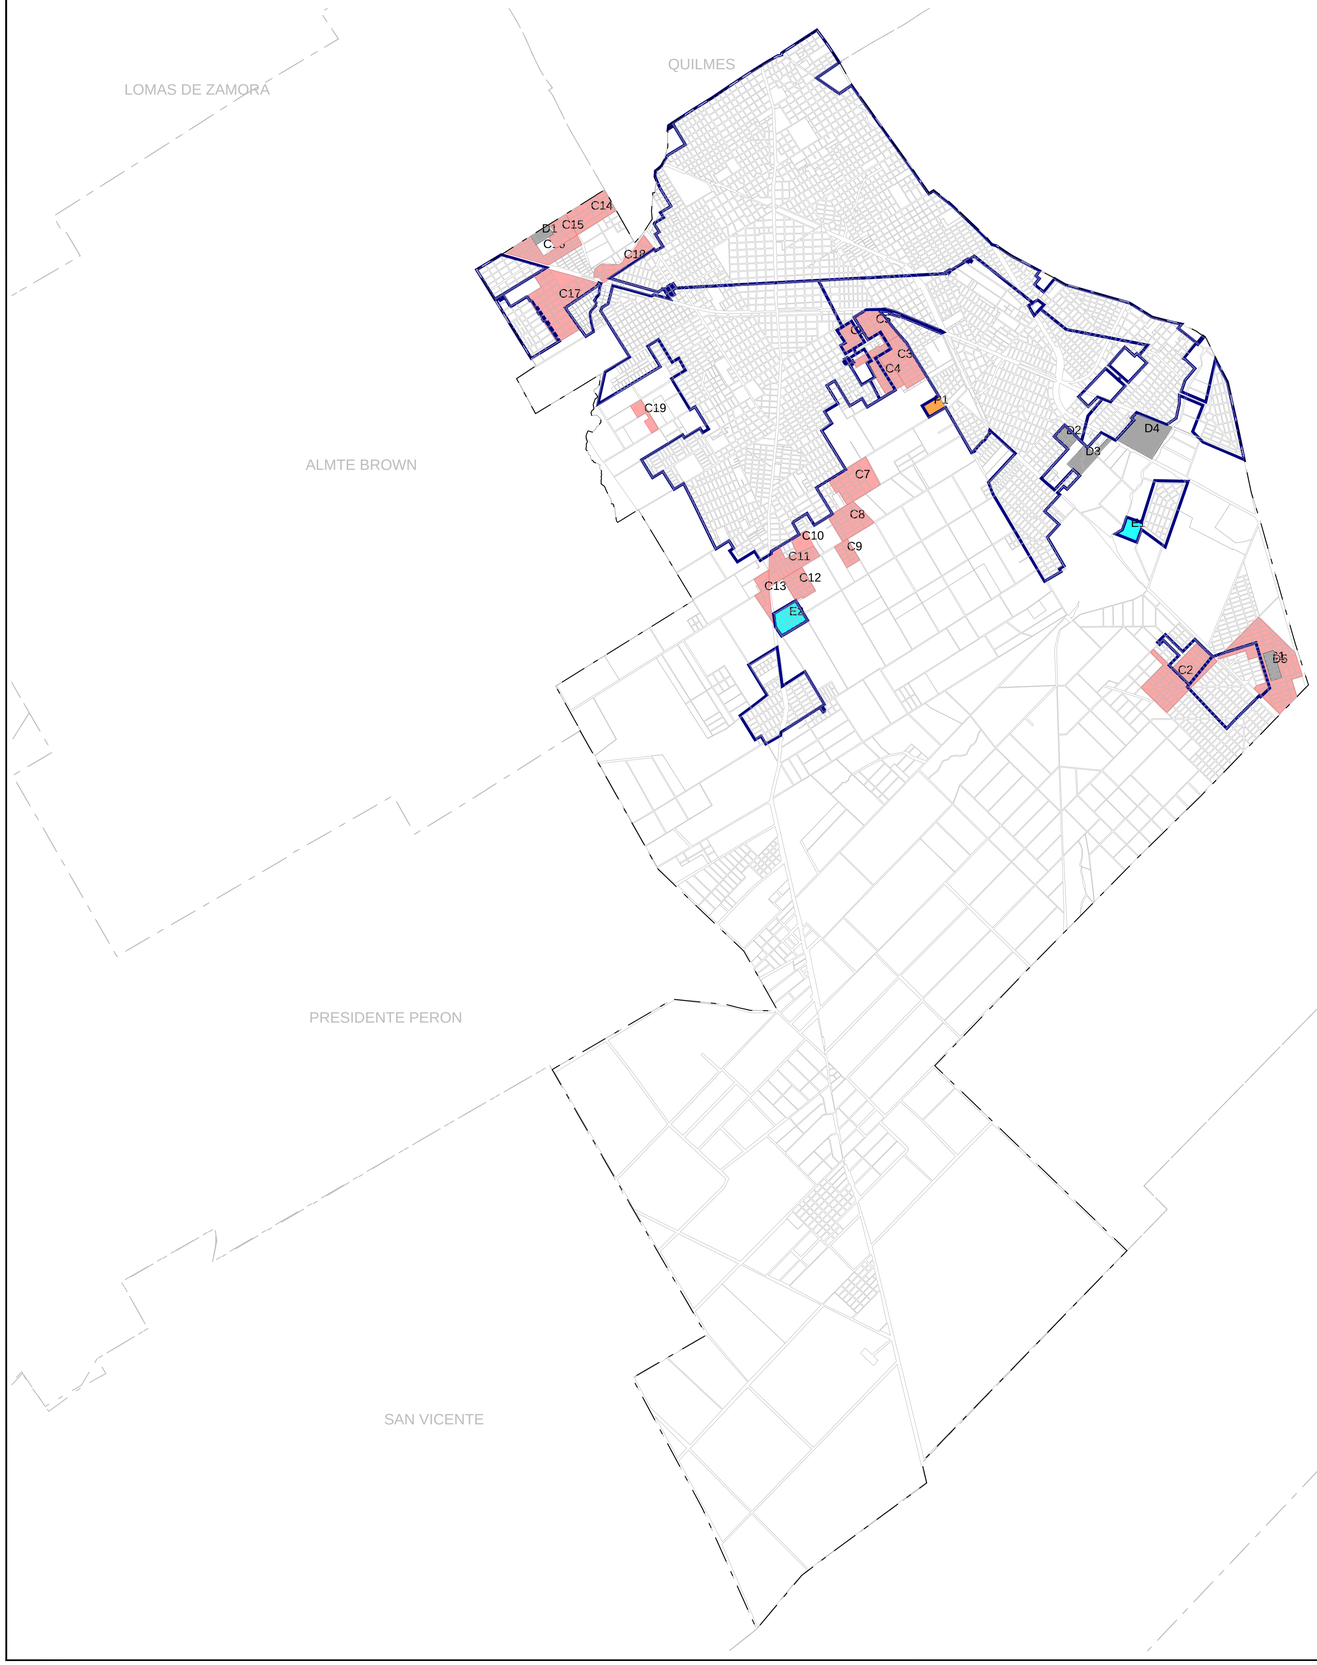

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	Instalación RSA Barrio La Huella
E2	SA70351-Inst. RSA-Etapa 4- B° Las Alicias (Regulación)

OPCT - MPG - A+T

Identificador	Nombre
P1	Inst RSA Av Hudson y Av Carboni (Villa Vatteone)

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	Barrio Malvinas II
D2	Barrio El Rocio
D3	Barrio Pepsi
D4	Barrio Santa Sofia
D5	Barrio El Parque

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

Identificador	Nombre
C1	A+T - Barrio El Parque M1,2,3y4
C2	A+T - Barrio Allan M1 y 3
C3	A+T - Barrio Gral San Martin M2 y 3
C4	A+T - Barrio Gral San Martin M1, 4 y 5
C5	A+T - Barrio Gral San Martin M1,4 y 5
C6	A+T - Barrio Gral San Martin M1,4y 5
C7	A+T - Barrio 5 de Enero
C8	A+T - Barrio Curva de Chavez Norte
C9	A+T - Barrio Curva de Chavez Sur
C10	OPCT - Barrio Los Pilares
C11	A+T - Barrio Los Pilares
C12	A+T - Barrio Sarmiento
C13	A+T - Barrio FIAT
C14	A+T - Barrio Don Jose M2
C15	A+T - Barrio Agustin Ramirez
C16	A+T - Barrio Don Jose Planificado
C17	A+T - Barrio Lujan
C18	A+T - Barrio KM 26700
C19	A+T - Barrio San Jorge - La Paloma

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO FLORENCIO VARELA

REGION SUDESTE


20/5/2026

2025

1:50000

IEAFVA20

Censo 2022

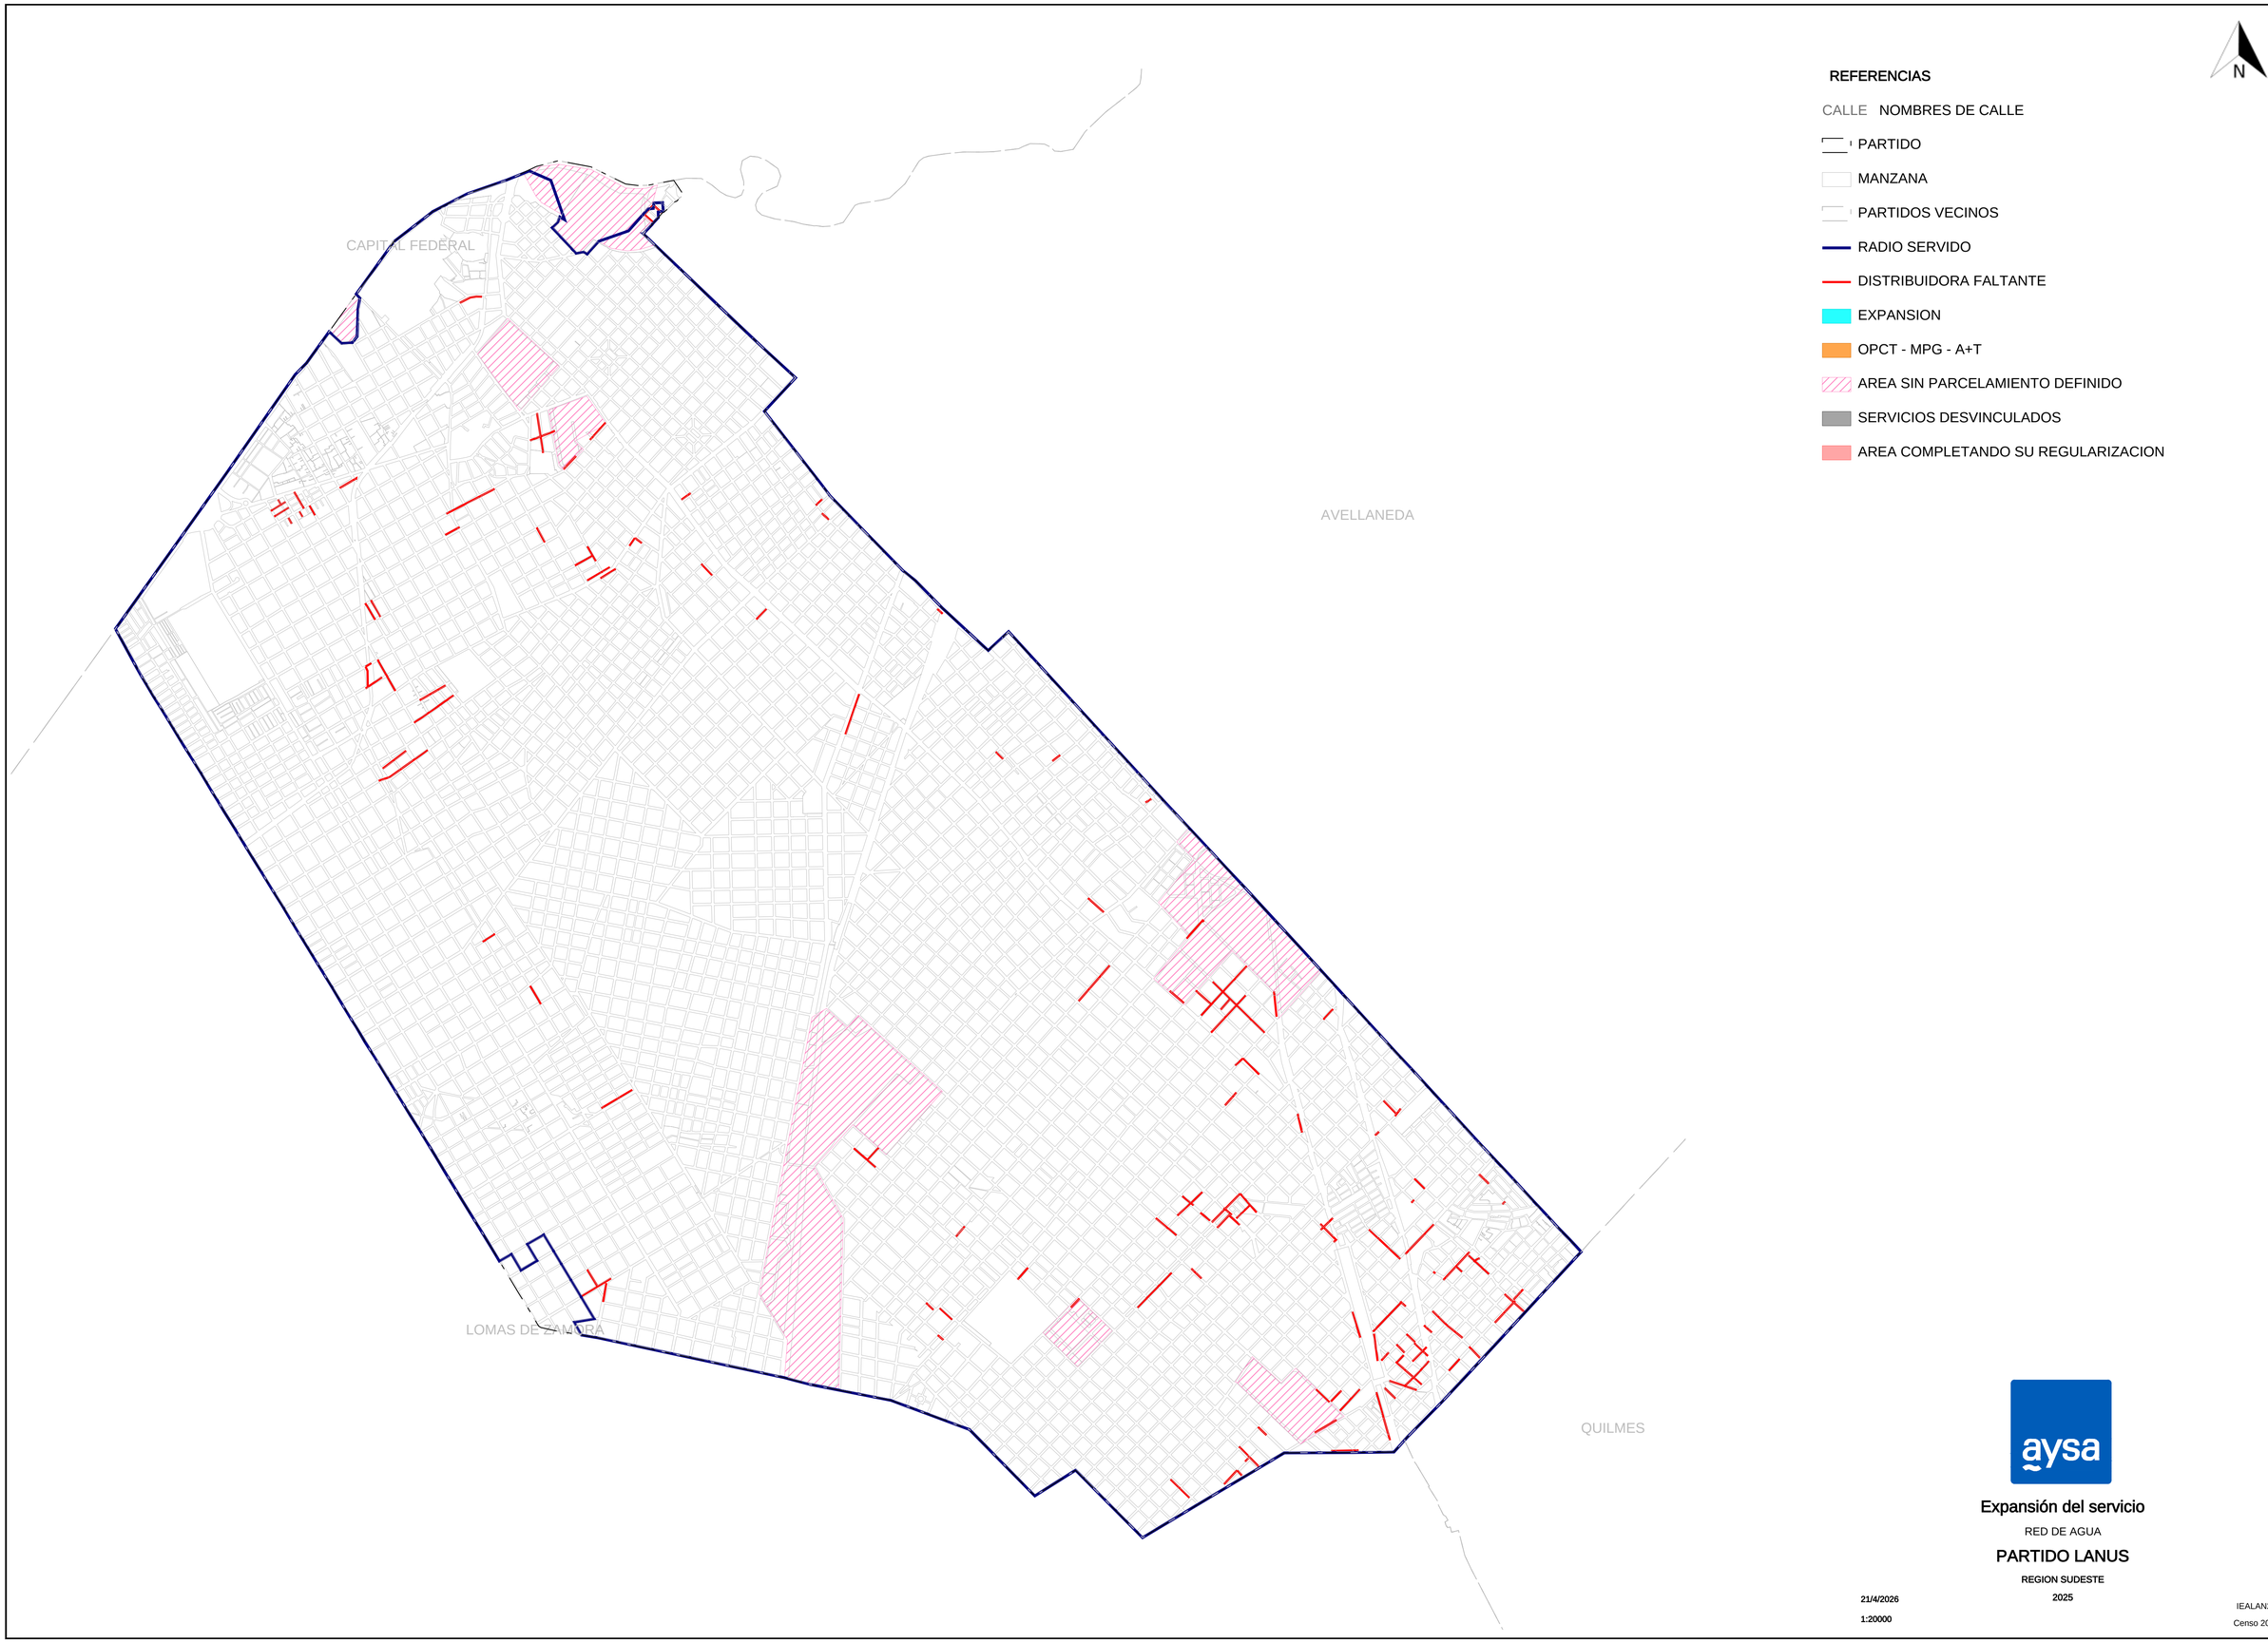

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO LANUS

REGION SUDESTE

2025

21/4/2026

1:20000

IEALAN20

Censo 2022



N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

RADIO SERVIDO

DISTRIBUIDORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - A+T

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	Barrio Papelero
D2	Barrio SUPE
D3	Barrio Covendiar 250

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del servicio

RED DE AGUA

PARTIDO QUILMES

REGION SUDESTE

2025

21/4/2026


1:25000


IEAQLM20

Censo 2022





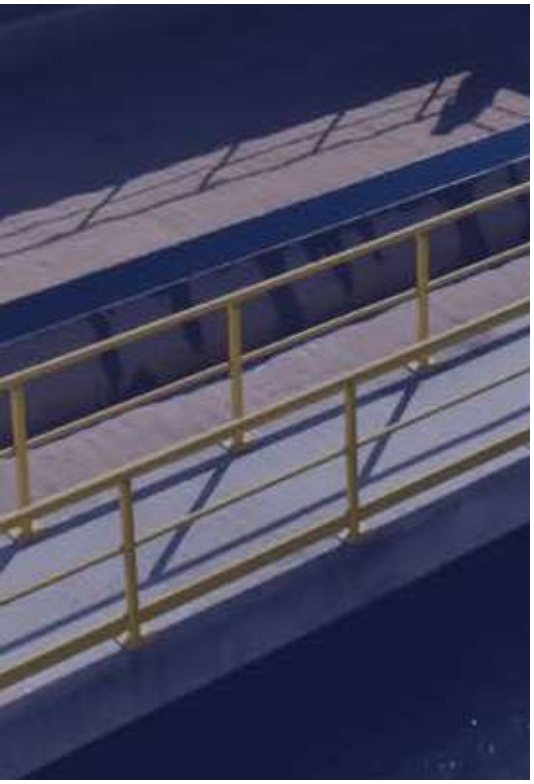

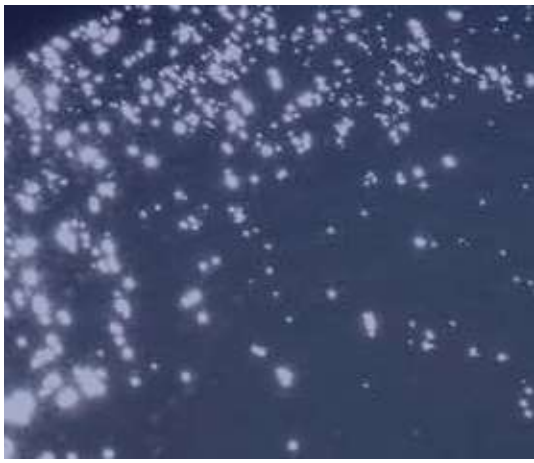INFORME ANUAL 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 3

aysa

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1

1 Obras Ejecutadas

TOMO 1.2

2 Mejora y Mantenimiento de Redes

3 Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos

4 Elementos Principales de la Red – Inventario

5 Certificación de Normas

6 Diagnósticos y Estudios

7 Estudios Ambientales

8 Gestión de Laboratorio

9 Desarrollo de la Comunidad

10 Plan de Prevención y Emergencias (PPE)

TOMO 2

11 Cobertura del Servicio de Agua Potable

12 Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable

13 Cartografía Expansión Agua Potable

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3

14 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales

15 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento

16 Instalaciones faltantes en la Red de Desagües Cloacales

17 Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

TOMO 4

18 Cartografía Agua Potable – Rehabilitación y Renovación

TOMO 5

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES (Planos Unificados)

19 - Rehabilitación Hidráulica.

20 - Rehabilitación Estructural.

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6

TOMO 6:

21 Aspectos Comerciales

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

21.2 Aspectos vinculados con la medición

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

21.4 Aspectos vinculados con la recaudación

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

21.6 Información adicional

22 Aspectos Económico-Financieros

22.1 a 22.5 Formatos vinculados a los Estados Contables de AySA (Tomo Apartado "Formatos Contables 2025").

22.6 Indicadores

22.7 Balance Económico Social

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1:

1 OBRAS EJECUTADAS

1.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.1.A	A) Obras en Plantas Potabilizadoras, Estaciones Elevadoras, Pozos de Agua, Rebombeos, y Plantas Tratamiento Agua Subterránea. Nuevas Áreas - Obras de Agua Potable.
	01.1.B	B) Ríos Subterráneos.
	01.1.C	C) Automatismo y Comunicaciones.
	01.1.D	D) Energía.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 02	01.1.01-IAT1-O-PRO-PS 01	PSS - Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 03	01.1.02-IAT1-O-PRO-PS 02	Pozos de Rebombeo de Agua Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 07	01.1.10-IAT1-O-A-PRO-PSM 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General San Martín.
PL IA N° 08	01.1.11-IAT1-O-A-PRO-PMB 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General Manuel Belgrano.
PL IA N° 09	01.1.13-IAT1-O-A-PRO-PJMR 01	Obras en el Establecimiento Juan Manuel de Rosas.
	01.1.21-IAT1-O-A-PRO-POI 01	Plantas Potabilizadoras de Osmosis Inversa (POI).
	01.1.23-IAT1-O-A-PRO-PII 02	Plantas Potabilizadoras de Intercambio Iónico (PII).
	01.1.24-IAT1-O-A-PRO-PAD 03	Plantas Potabilizadoras de Adsorción (PAD).
PL IA N° 11	01.1.30-IAT1-O-A-TRA-EE	Obras en Estaciones Elevadoras Paitoví, Centro, Caballito, Floresta, Devoto, Saavedra, Villa Adelina, Tres de Febrero, Morón, Matanza, Lanús y Quilmes.

1.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.2	Obras en Plantas Depuradoras, Estaciones de Bombeo, etc. Nuevas Areas - Obras de Saneamiento.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 19	01.2.20-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste.
	01.2.20A-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste II.
PL IA N° 20	01.2.21-IAT1-O-S-PRO-PDN 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Norte.
PL IA N° 21	01.2.22-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 01	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel.
	01.2.22A-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 02	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel II.
PL IA N° 21bis	01.2.23-IAT1-O-S-PRO-PDH 01	Obras en el Planta de Depuración Hurlingham.
PL IA N° 22	01.2.24-IAT1-O-S-PRO-PDBU 01	Obras en el Planta de Depuración Barrio Uno.
PL IA N° 22bis	01.2.25-IAT1-O-S-PRO-PDSC 01	Obras en el Planta de Depuración Santa Catalina.
	01.2.25.01-NA-IAT1-O-S-PRO-PDC 01	Obras en el Planta de Depuración Las Catonas.
	01.2.25.02-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFe 01	Obras en el Planta de Depuración Ferrari.
	01.2.25.03-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFV 01	Obras en el Planta de Depuración Florencio Varela.
	01.2.25.04-NA-IAT1-O-S-PRO-PDG 01	Obras en el Planta de Depuración Garín.
	01.2.25.05-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMN 01	Obras en el Planta de Depuración Merlo Norte.
	01.2.25.06-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMS 01	Obras en el Planta de Depuración Maquinista Savio.
	01.2.25.07-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPP 01	Obras en el Planta de Depuración Guernica (Pte. Perón).
	01.2.25.08-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPR 01	Obras en el Planta de Depuración Paso del Rey.
	01.2.25.09-NA-IAT1-O-S-PRO-PDBV 01	Obras en el Planta de Depuración Bella Vista.
	01.2.25.10-NA-IAT1-O-S-PRO-PDCH 01	Obras en el Planta de Depuración Champagnat
	01.2.25.11-NA-IAT1-O-S-PRO-PDESC 01	Obras en el Planta de Depuración Escobar
PL IA N° 14	01.2.26-IAT1-O-S-TRA-EB 01	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Wilde.
PL IA N° 15	01.2.27-IAT1-O-S-TRA-EB 02	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Boca-Barracas.
	01.2.28-IAT1-O-S-TRA-EB 03	Obras en Estaciones de Bombeo Centro, Norte y Sur.
	01.2.29-IAT1-O-S-TRA-EB 00	Obras en Planta Berazategui.
PL IA N° 13	01.2.30-IAT1-O-S-TRA-PLC 01	Obras en Grandes Conducciones Pluviocloacales.

1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 23	01.3.31-IAT1-O-X CONTRATO	Obras ejecutadas por vía contractual.
	01.3.33-IAT1-O-A (A+T)	Listado de Obras por convenio (A+T).
	01.3.34-IAT1-O-S (C+T)	Listado de Obras por convenio (C+T).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.2:

2 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 25	35-IAT1-O-A-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes de agua.
PL IA N° 26	36-IAT1-O-A-MyM 02	Redes de agua. Elementos de maniobra intervenidos.
PL IA N° 27	37-IAT1-O-A-MyM 03	Medidores colocados y/o intervenidos.
PL IA N° 28	38-IAT1-O-A-MyM 04	Conexiones domiciliarias de agua potable.
PL IA N° 29	39-IAT1-O-S-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes cloacales.
PL IA N° 30	40-IAT1-O-S-MyM 02	Conexiones domiciliarias de cloacas.

3 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos.
	03.2-IAT1-O-X-MyM-T 01	Mantenimiento de Grandes Equipos y Electrobombas.

4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED - INVENTARIO

4.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 31 A	42-IAT1-I-A-RED 01	Redes de Agua - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 31 B	43-IAT1-I-A-RED 02	Redes de Agua - Porcentaje por Material de cañería instalada.
	44-IAT1-I-A-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Agua.

4.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 32 A	45-IAT1-I-S-RED 01	Redes de Cloacas - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 32 B	46-IAT1-I-S-RED 02	Redes de Cloacas - Porcentajes por Material de cañería instalada.
	47-IAT1-I-S-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Desagües Cloacales.

5. CERTIFICACIÓN DE NORMAS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Laboratorios Central y de Plantas. Certificación ISO, IRAM, etc.

6 DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Diagnósticos y Estudios.

7 ESTUDIOS AMBIENTALES

Código Anterior	Código Actual	Título
		7.1 Estudios Ambientales.
		7.2 Control del Recurso.

8 GESTION DE LABORATORIO

Código Anterior	Código Actual	Título
		Gestión de Laboratorio.

9 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Código Anterior	Código Actual	Título
		Texto descriptivo de las tareas de AySA para el Desarrollo de la Comunidad.
		9.1 Anexos
		9.2 Planos

10 PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE)

Código Anterior	Código Actual	Título
		PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 2:

11. Cobertura del servicio de Agua Potable

11.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

11.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 33	48-IAT2-C-A-TRA 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Area Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A	49-IAT2-C-A-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A (Nuevas Áreas)	49-IAT2-C-A-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 34B	50-IAT2-C-A-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio de Agua Potable.
ex PL IA N° 35	51-IAT2-C-A-TRA 04	Expansión de redes de distribución de agua potable. Obras habilitadas en el año (por Partido).

12. Instalaciones Faltantes en la Red de Agua Potable

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 36	52-IAT2-C-A-RED 01	Red de Agua. Cierre de mallas faltantes (por Región y Partido).

13. Cartografía Expansión Agua

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IEADRC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IEASFE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Fernando.
	IEASIS-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Isidro.
	IEASMA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Martín.
	IEATIG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tigre.
	IEAVIC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Vicente López.
	IEAESC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Escobar.
	IEAJCP-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - José C. Paz.
	IEAMAR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Malvinas Argentinas.
	IEASMG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Miguel.
	IEAPIL-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IEAMAT-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - La Matanza.
	IEAHUR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Hurlingham.
	IEAITU-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ituzaingó.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Morón.
	IEATRE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tres de Febrero.
	IEAMER-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Merlo.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IEAALM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Almirante Brown.
	IEAEST-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Esteban Echeverría.
	IEAEZE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ezeiza.
	IEALOM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lomas de Zamora.
	IEAPPE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IEAAVE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Avellaneda.
	IEALAN-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lanús.
	IEAQLM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Quilmes.
	IEAFVA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3:

14. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales

14.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

14.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 38A	54-IAT3-C-S-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas.
	54-IAT3-C-S-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 38B	55-IAT3-C-S-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población beneficiada con obras o con servicio en trámite de habilitación.
ex PL IA N° 39	56-IAT3-C-S-TRA 04	Expansión de redes colectoras de desagües cloacales. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

15. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales según Sistema de Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 40	57-IAT3-C-S-PRO 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Area servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 41	58-IAT3-C-S-PRO 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario.
	61-IAT3-C-S-PRO 04	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 42	59-IAT3-C-S-PRO 03	Expansión de redes colectoras de Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

16. Instalaciones Faltantes en la Red de Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 43	60-IAT3-C-S-RED 01	Red de Cloacas. Colectoras faltantes (por Región y Partido).

17. Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IETDRC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IETSFE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Fernando.
	IETSIS-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Isidro.
	IETSMA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Martín.
	IETTIG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tigre.
	IETVIC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Vicente López.
	IETESC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Escobar.
	IETJCP-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - José C. Paz.
	IETMAR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Malvinas Argentinas.
	IEATMG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Miguel.
	IEATPIL-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IETMAT-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - La Matanza.
	IETCHUR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Hurlingham.
	IETITU-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ituzaingo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Morón.
	IETTRE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tres de Febrero.
	IETMER-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Merlo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IETALM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Almirante Brown.
	IETEST-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Esteban Echeverría.
	IETEZE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ezeiza.
	IETLOM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lomas de Zamora.
	IETPPE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IETAVE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Avellaneda.
	IETLAN-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lanús.
	IETQLM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Quilmes.
	IETFVA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 4:

18. CARTOGRAFÍA AGUA POTABLE (Planos de Rehabilitación y Renovación de Redes)

18.1 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRADRCF-2025	* Región Capital Federal.

18.2 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRASFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRASIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRASMA-2025	* Partido San Martín.
	IRATIG-2025	* Partido Tigre.
	IRAVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRAESC-2025	* Partido Escobar.
	IRAJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRAMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRASMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRAPIL-2025	* Partido Pilar.

18.3 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRAITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRAMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRAMOR-2025	* Partido Morón.
	IRATRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRAMER-2025	* Partido Merlo.
	IRAMOR-2025	* Partido Moreno.

18.4 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRAEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRAEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRALOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRAPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

18.5 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRALAN-2025	* Partido Lanús.
	IRAQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRAFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 5:

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES UNIFICADA (Rehabilitación Hidráulica y Estructural):

19. Rehabilitación Hidráulica.
20. Rehabilitación Estructural.

19/20.1 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCDRCF-2025	* Región Capital Federal.

19/20.2 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCSFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRCSIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRCSMA-2025	* Partido San Martín.
	IRCTIG-2025	* Partido Tigre.
	IRCVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRCESC-2025	* Partido Escobar.
	IRCJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRCMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRCSMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRCPIL-2025	* Partido Pilar.

19/20.3 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRCITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRCMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRCMOR-2025	* Partido Morón.
	IRCTRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRCMER-2025	* Partido Merlo.
	IRCMOR-2025	* Partido Moreno.

19/20.4 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRCEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRCEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRCLOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRCPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

19/20.5 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRCLAN-2025	* Partido Lanús.
	IRCQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRCFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6:

21 ASPECTOS COMERCIALES

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

Código Anterior	Código Actual	Título
300		Ingresos Año 2025.
301		Anexo de Ventas Año 2025 (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
302		Evolución de los Ingresos.
303		Emisión General y art. 34 Año 2025 - Grupos bimetrales - Ciclos completos de facturación.
304		Facturación a Consorcios del último ciclo completo de facturación. Todas las frecuencias.
305		Facturación Emisión Genereal. Ultimo ciclo completo de facturación bimestral.
307		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Capital Federal.
308		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Gran Buenos Aires.
309		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Capital Federal.
310		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Gran Buenos Aires.
311		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Capital Federal.
312		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Gran Buenos Aires.
313		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 08 - Capital Federal.
314		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - Residencial.
315		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - Residencial.
316		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - Residencial.
317		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - No Residencial.
318		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - No Residencial.
319		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - No Residencial.
320		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral - Factura Media.

21.2 Aspectos vinculados con la medición

Código Anterior	Código Actual	Título
330		Medidores cambiados e instalados en el Año 2025.
331		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 01 (Agua). Consumo del último año - Bimestralizado.
332		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 05 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
333		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
334		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 01 (Agua). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
335		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 05 (Agua y cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
336		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de Servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
337		Pérdida de Cuota Fija por mes, en cantidades de instalaciones y en Tarifa Básica Bimestral (TBB).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
306		Detalle de Unidades Funcionales.
350		Evolución del número de usuarios. Unidades funcionales.

21.4 Aspectos vinculados a la recaudación

Código Anterior	Código Actual	Título
360		Total Recaudado.
361		Ritmo de recaudación .
362		Evolución de la Recaudación y Evolución de la Recaudación por Categoría de Usuarios.

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
321		Cuentas a cobrar vencidas y a vencer al 31/12/2025 por Región, tipo de cliente, régimen y categoría de cliente.
322		Conciliación de créditos por servicios (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
370		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (por antigüedad).
371		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (con vencimientos operados por Año Contractual).
372		Impago vencido por rango de deuda al 31/12/25. Emisión por todo concepto, desagregado por Región y Grandes Usuarios.
373		Cuentas a cobrar a vencer y vencidas al 31/12/25, por Distrito y antigüedad de la deuda. Gráfico.
374		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25 por distrito, por situación comprobante y antigüedad de la deuda.
376		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25, correspondientes a ciertos Clientes fiscales. Detalle de las cuentas a cobrar originales más recargos extracontables teóricos estimados.
379		Deuda Vencida al 31/12/2025 más recargos extracontables teóricos estimados.

21.6 Información Adicional

Código Anterior	Código Actual	Título
323		Consumos de la previsión para deudores de dudoso cobro y ajustes de facturación del año 2025.
324		Cargo por corte de servicio - Intervenciones realizadas e imporetes de facturación devengados durante el año 2025.
375		Convenios de pagos.
377		Cargo por titularidad no informada año 2025.
380		Estimación de otras quitas y condonaciones de deuda extracontables otorgadas durante el Año 2025.
381		Recargos e intereses por demora de pago devengados durante el año 2025.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

22 ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS - TARIFA SOCIAL

22.1 a 22.5

Presentado en Tomo separado denominado "FORMATOS CONTABLES 2025".

22.6 Indicadores

Código Anterior	Código Actual	Título
850-851		Indicadores.
852		Benchmarking.

22.7 Balance económico social

Código Anterior	Código Actual	Título
900		Programa de tarifa social - Total.
901		Programa de tarifa social - Usuarios Residenciales.
902		Programa de tarifa social - Casos Sociales.
903		Programa de tarifa social - Instituciones sin fines de lucro.
904		Programa de tarifa social - Detalle de Usuarios Residenciales.
905		Programa de tarifa social - Detalle de Casos Sociales.
906		Programa de tarifa social - Detalle de Instituciones sin fines de lucro.
910		Plan Agua más Trabajo.
920		Programa de Barrios Carenciados - Modelo Participativo de Gestión (MPG).
930		Resumen de Expansión de Agua por Plan.
940		Resumen de Expansión de Desagües Cloacales por Plan.
950		Balance Económico Social.
970		Total de Usuarios con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
971		Total de Usuarios RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
972		Total de Usuarios NO RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
973		Total de Usuarios BALDÍOS con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.

14. COBERTURA DEL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES

14. COBERTURA DEL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES

14.1. Revisión detallada de las superficies y poblaciones:

14.1.1. Consideraciones Generales

El SISTEMA DE REDES EN DESPLIEGUE GIS es la herramienta donde se gestiona y describen las redes de agua y saneamiento de AySA, como así también las áreas hidráulicas y/u operativas relacionadas (mallas, subcuencas, áreas de expansión, radios servidos, entre otras). También se registran los trabajos realizados sobre la red (renovaciones, rehabilitaciones, rastreos, instalaciones, intervenciones en general, etc.).

Con este sistema se puede acceder y utilizar la información catastral de base que se actualiza en la compañía. Dentro de esta información catastral se encuentran los límites de las parcelas y el código de servicio de las mismas, además de la información censal.

A partir de la información actualizada (redes, áreas operativas y catastrales) se elaboran las planillas y los planos del informe anual, cuyos soportes pertenecen a los formatos del mismo.

Esta tarea es desarrollada por AySA en forma continua, requiriendo constantes actualizaciones y eventuales ajustes sobre las localizaciones geográficas de los elementos representados, produciéndose modificaciones de las áreas de cobertura influidas por estos elementos, emitiéndose un reporte de "MOI" (modificación de objetos informados) cuando se trate de áreas informadas en años anteriores.

14.1.2. Metodología de cálculo de población

Todos los sistemas geográficos de la empresa, incluido SISTEMA DE REDES EN DESPLIEGUE GIS, calculan la población de las áreas a partir de su intersección con los radios censales.

De esta forma el sistema realiza la relación entre el porcentaje de intersección de las áreas con servicio respecto a la población (informada en el Censo 2022-INDEC) de dicho radio.

14.1.3. Metodología de cálculo de población relacionada a cañerías faltantes dentro del radio servido

Hasta el Informe Anual 2009, la población sin servicio se calculaba a partir de cada cañería faltante como el producto de la cantidad de cuadras abarcadas por la cañería multiplicada por un factor único definido por partido. De esta manera todas las cañerías faltantes descontaban población, aunque se tratara de una zona totalmente servida.

La metodología implementada a partir del Informe Anual 2010 utiliza las parcelas y sus códigos de servicio (indicando servicio de agua y/o cloaca) para identificar las áreas asociadas a las cañerías faltantes que deben descontar población, ya que no tiene el servicio correspondiente. Este método genera

una mejor estimación y permite que al momento de ejecución de la cañería faltante se incorpore la población que ha sido inicialmente descontada, obteniendo un balance de población más representativo.

14.1.4. Metodología de estimación de la población con cobertura del servicio

A partir de la información actualizada de cañerías faltantes se identifican los tramos cuyas parcelas frentistas ubicadas en un rango de 15 metros tienen código de servicio de Cloaca o sin servicio en las faltantes de agua, y códigos servicio de Agua o sin servicio en las faltantes de cloaca. Se identifican como cañerías faltantes que descuentan población y se genera un área que incluye todas las parcelas que cumplen con estas definiciones.

El área final resultante para cada cañería faltante que descuenta población es utilizada para calcular la población servida y la superficie con la metodología vista en el punto 11.1.2.

14.1.5. Coeficientes de Proyección Intercensal (CI):

Los coeficientes son explicitados en las planillas correspondientes. La aplicación del coeficiente de proyección intercensal "CI" calculado en base al valor subyacente de población de los partidos informados en base al Censo 2022, adaptando las proyecciones a las jurisdicciones y radios con servicio de AYSA.
El acceso web a las proyecciones publicadas por el INDEC es el siguiente:
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119

Realizados los cálculos de cobertura, expansión y MOI, en su expresión de población determinada en base al Censo 2022, los mismos son proyectados al año del informe con la aplicación del "CI" para cada partido y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el presente Informe Anual 2025 se utilizan los resultados del Censo 2022, y conforme a lo indicado por el ERAS en su Nota NO-2026-00001876-ERAS-ERAS, se presentan por única vez una serie de empalme de resultados entre los Censos 2010 y 2022, en el formato "49.1 - IAT2-C-A-TRA 02-2025-EMPALME AGUA" para observar los resultados sobre el servicio de Agua Potable, y en el formato 54.1-IAT3-C-S-TRA 02-2025-EMPALME CLOACAS para el caso del Servicio de Desagües Cloacales.

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

POBLACIÓN CON SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

54-IAT3-C-S-TRA 02 | **ex PL IA Nº 38A**

Partido	DATOS DE POBLACIÓN											
	Valores de Población según Censo 2022								Expansión del Servicio - Población proyectada al 2025 (*)			
	Población del Partido	Población en el área de Servicio de 2006	Porcentaje de Cobertura al 21/03/2006	Población con Servicio 2024	MOI 2025	Población del Área de Expansión 2006-2024	Población Area Expansión Año 2025	Población con Servicio 2025	Coeficiente de proyección Intercensal	Población del Partido	Población con Servicio	Porcentaje de Cobertura al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3] = [2/1]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8] = [4+5+7]	CI	[9]	[10] = [8*CI]	[11] = [10/9]
Capital Federal	**3.101.599**	**3.101.599**	**100,00%**	**3.101.599**		**0**		**3.101.599**	**1,00000000**	**3.101.599**	**3.101.599**	**100,00%**
SAN FERNANDO	168.882	113.810	67,39%	153.568	0	39.758	384	153.952	1,001	168.972	154.034	91,16%
TIGRE	439.067	42.266	9,63%	218.245	0	175.979	4.885	223.130	1,003	440.431	223.823	50,82%
San Fernando-Tigre	**607.949**	**156.076**	**25,67%**	**371.813**	**0**	**215.737**	**5.269**	**377.082**	**1,001**	**609.403**	**377.857**	**62,00%**
San Isidro	**295.978**	**200.103**	**67,61%**	**282.215**		**82.112**		**282.215**	**1,000**	**296.010**	**282.246**	**95,35%**
San Martín	**444.503**	**213.979**	**48,14%**	**359.495**		**145.516**		**359.495**	**1,001**	**445.013**	**359.907**	**80,88%**
Vicente López	**280.541**	**277.696**	**98,99%**	**277.992**		**296**		**277.992**	**1,001**	**280.684**	**278.134**	**99,09%**
Región Norte	**1.628.971**	**847.854**	**52,05%**	**1.291.515**	**0**	**443.661**	**5.269**	**1.296.784**	**N/A**	**1.631.110**	**1.298.144**	**79,59%**
La Matanza	**1.838.401**	**658.572**	**35,82%**	**967.448**	**0**	**308.876**	**4.044**	**971.492**	**1,002**	**1.841.381**	**973.067**	**52,84%**
HURLINGHAM	186.221	4.233	2,27%	140.573		136.340		140.573	1,000	186.287	140.623	75,49%
ITUZAINGO	178.598	-783	-0,44%	90.490	0	91.273	148	90.638	1,001	178.741	90.711	50,75%
MORON	326.810	165.634	50,68%	326.214		160.580		326.214	1,000	326.866	326.269	99,82%
Morón	**691.629**	**169.084**	**24,45%**	**557.277**	**0**	**388.193**	**148**	**557.425**	**1,000**	**691.893**	**557.602**	**80,59%**
Tres de Febrero	**362.319**	**250.999**	**69,28%**	**325.223**	**-42**	**74.224**	**1.005**	**326.186**	**1,001**	**362.683**	**326.514**	**90,03%**
Región Oeste	**2.892.349**	**1.078.655**	**37,29%**	**1.849.948**	**-42**	**771.293**	**5.197**	**1.855.103**	**N/A**	**2.895.956**	**1.857.183**	**64,13%**
Avellaneda	**366.117**	**221.448**	**60,49%**	**291.084**	**-22**	**69.636**	**1.629**	**292.691**	**1,001**	**366.488**	**292.988**	**79,94%**
Lanús	**460.081**	**164.978**	**35,86%**	**323.197**	**0**	**158.219**	**12.267**	**335.464**	**1,000**	**460.081**	**335.464**	**72,91%**
Quilmes	**631.774**	**296.978**	**47,01%**	**480.399**		**183.421**		**480.399**	**1,001**	**632.591**	**481.021**	**76,04%**
Región Sudeste	**1.457.972**	**683.404**	**46,87%**	**1.094.680**	**-22**	**411.276**	**13.896**	**1.108.554**	**N/A**	**1.459.161**	**1.109.472**	**76,03%**
ALMTE. BROWN	583.209	41.913	7,19%	247.398	0	205.485	10.203	257.601	1,001	583.578	257.764	44,17%
ESTEBAN ECHEVERRIA	337.880	37.082	10,97%	200.581	27	163.499	566	201.174	1,002	338.563	201.581	59,54%
EZEIZA	198.620	5.695	2,87%	63.538	19	57.843	2.296	65.853	1,004	199.366	66.100	33,16%
Alte. Brown-E. Echeverría	**1.119.709**	**84.690**	**7,56%**	**511.517**	**46**	**426.827**	**13.065**	**524.628**	**1,001**	**1.121.507**	**525.445**	**46,85%**
Lomas de Zamora	**685.644**	**156.635**	**22,84%**	**341.322**		**184.687**		**341.322**	**1,002**	**686.951**	**341.973**	**49,78%**
Región Sudoeste	**1.805.353**	**241.325**	**13,37%**	**852.839**	**46**	**611.514**	**13.065**	**865.950**	**N/A**	**1.808.457**	**867.417**	**47,96%**
Total Concesión	**10.886.244**	**5.952.837**	**54,68%**	**8.190.581**	**-18**	**2.237.744**	**37.427**	**8.227.990**	**N/A**	**10.896.283**	**8.233.815**	**75,57%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

POBLACIÓN CON SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES (Nuevas Áreas)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

54-IAT3-C-S-TRA 02 (Nuevas) | **ex PL IA Nº 38A**

Partido	DATOS DE POBLACIÓN											
	Valores de Población según Censo 2022								Expansión del Servicio - Población proyectada al 2025 (*)			
	Población del Partido	Población con Servicio al Inicio	Porcentaje de Cobertura al Inicio	Población con Servicio 2024	MOI 2025	Población del Área de Expansión 2006-2024	Población Area Expansión Año 2025	Población con Servicio 2025	Coeficiente de proyección Intercensal	Población del Partido	Población con Servicio	Porcentaje de Cobertura al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3] = [2/1]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8] = [4+5+7]	CI	[9]	[10] = [8*CI]	[11] = [10/9]
SAN MIGUEL**	327.650	149.852	45,74%	166.292	0	16.440	6.518	172.810	1,003	328.639	173.332	52,74%
JOSE C PAZ	326.527	0	0,00%	0		0		0	1,004	327.722	0	0,00%
MALVINAS ARGENTINAS	349.401	0	0,00%	0		0		0	1,001	349.824	0	0,00%
San Miguel-Paz-Malvinas Arg.	**1.003.578**	**149.852**	**14,93%**	**166.292**	**0**	**16.440**	**6.518**	**172.810**	**N/A**	**1.006.186**	**173.332**	**17,23%**
Escobar	256.071	20.462	7,99%	31.459	0	10.997	236	31.695	1,003	256.910	31.799	12,38%
Pilar	393.614	71.683	18,21%	71.910	0	227	1.964	73.874	1,005	395.551	74.238	18,77%
Región Norte	**1.653.263**	**241.997**	**14,64%**	**269.661**	**0**	**27.664**	**8.718**	**278.379**	**N/A**	**1.658.647**	**279.368**	**16,84%**
Merlo	581.484	124.243	21,37%	140.317		16.074		140.317	1,001	582.184	140.486	24,13%
Moreno	575.758	163.317	28,37%	182.924	-1.856	19.607	8.263	189.331	1,001	576.571	189.598	32,88%
Región Oeste	**1.157.242**	**287.560**	**24,85%**	**323.241**	**-1.856**	**35.681**	**8.263**	**329.648**	**N/A**	**1.158.755**	**330.084**	**28,49%**
Florencio Varela	488.103	179.389	36,75%	205.341	0	25.952	106	205.447	1,003	489.456	206.017	42,09%
Región Sudeste	**488.103**	**179.389**	**36,75%**	**205.341**	**0**	**25.952**	**106**	**205.447**	**N/A**	**489.456**	**206.017**	**42,09%**
Presidente Perón	101.994	26.699	26,18%	49.715	0	23.016	531	50.246	1,004	102.439	50.465	49,26%
Región Sudoeste	**101.994**	**26.699**	**26,18%**	**49.715**	**0**	**23.016**	**531**	**50.246**	**N/A**	**102.439**	**50.465**	**49,26%**
Total Concesión	**3.400.602**	**735.645**	**21,63%**	**847.958**	**-1.856**	**112.313**	**17.618**	**863.720**	**N/A**	**3.409.297**	**865.934**	**25,40%**

EMPALME DE SERIES: RADIOS SERVIDOS CON DESAGÜES CLOACALES

Informe Anual

Año 2025

54.1-IAT3-C-S-TRA 02-2025-EMPALME

Partido	Población de las áreas Total, Servida y de Expansión SEGÚN CENSO 2010 (INDEC "*Informe 38* ").							Población de las áreas Total, Servida y de Expansión SEGÚN CENSO 2022 (INDEC "*estimaciones_departamentos_2022_2035* " - adaptación AYSA)						
	Población Total del Partido (INDEC informe 38). Año 2010.	Población Censo 2010 dentro del Radio de Servicio Año 2006.	Población Censo 2010 dentro del Area de Expansión 2006-2024.	Coeficiente de Crecimiento Intercensal (2010-2024) *	Población dentro del Area de Servicio 2024. Censo 2010 actualizado al año 2024.	Población Total del Partido. Censo 2010 actualizado al año 2024.	% Cobertura Actualizada	Población Total del Partido (Censo 2022). Año 2022.	Población Censo 2022 dentro del Radio de Servicio Año 2006.	Población Censo 2022 dentro del Area de Expansión 2006-2024.	Coeficiente de Crecimiento Intercensal (2022-2024) **	Población dentro del Area de Servicio 2024. Censo 2022 actualizado al año 2024.	Población Total del Partido. Censo 2022 actualizado al año 2024.	% Cobertura Actualizada
	13	14	15 =(SUMA1a4)	16 =5	17=(14+15)*16	18=13*16	19=17/18*100	20	21	22=(SUMA7a10)	23 =11	24=(21+22)*23	25=20*23	26=24/25*100
Capital Federal	**3.028.481**	**3.028.481**	0	**1,019**	**3.085.483**	**3.085.483**	**100,00%**	**3.101.599**	**3.101.599**	0	**1,000**	**3.101.599**	**3.101.599**	**100,00%**
Pdo. San Fernando	164.452	98.592	33.597	1,086	143.605	178.654	80,38%	168.882	113.810	39.758	1,000	153.621	168.940	90,93%
Pdo. Tigre	376.515	21.506	154.888	1,311	231.185	493.467	46,85%	439.067	42.266	175.979	1,002	218.686	439.953	49,71%
San Fernando-Tigre	540.967	120.098	188.485	**N/A**	374.790	672.121	55,76%	607.948	156.076	215.737	**N/A**	372.307	608.893	61,14%
San Isidro	295.894	195.120	81.803	0,984	272.601	291.276	93,59%	295.978	200.103	82.112	1,000	282.232	295.996	95,35%
San Martín	418.017	198.243	141.525	1,023	347.706	427.783	81,28%	444.503	213.979	145.516	1,001	359.762	444.833	80,88%
Vicente López	272.389	268.608	308	0,977	262.809	266.203	98,72%	280.541	277.696	296	1,000	278.082	280.632	99,09%
Norte	**1.527.267**	**782.069**	**412.121**	**N/A**	**1.257.906**	**1.657.383**	**75,90%**	**1.628.970**	**847.854**	**443.661**	**N/A**	**1.292.383**	**1.630.354**	**79,27%**
La Matanza	1.777.530	741.505	697.101	1,387	1.994.868	2.464.843	80,93%	1.838.401	658.572	308.876	1,001	968.466	1.840.335	52,62%
Pdo. Hurlingham	182.604	3.556	132.396	1,094	148.717	199.750	74,45%	186.221	4.233	136.340	1,000	140.605	186.263	75,49%
Pdo. Ituzaingó	169.038	115	88.366	0,976	86.375	165.014	52,34%	178.598	-783	91.273	1,001	90.537	178.691	50,67%
Pdo. Morón	324.279	159.966	157.654	1,082	343.622	350.826	97,95%	326.810	165.634	160.580	1,000	326.250	326.846	99,82%
Morón	675.921	163.637	378.416	**N/A**	578.714	715.590	80,87%	691.629	169.084	388.193	**N/A**	557.392	691.800	80,57%
Tres de Febrero	343.338	235.952	74.954	1,003	311.774	344.296	90,55%	362.319	250.999	74.224	1,001	325.434	362.554	89,76%
Oeste	**2.796.789**	**1.141.094**	**1.150.471**	**N/A**	**2.885.356**	**3.524.729**	**81,86%**	**2.892.349**	**1.078.655**	**771.293**	**N/A**	**1.851.291**	**2.894.689**	**63,95%**
Avellaneda	345.752	210.832	59.757	1,043	282.196	360.583	78,26%	366.117	221.448	69.636	1,001	291.275	366.357	79,51%
Lanús	463.555	156.893	161.963	0,998	318.174	462.564	68,78%	460.081	164.978	158.219	1,000	323.197	460.081	70,25%
Quilmes	586.462	283.914	163.015	1,182	528.330	693.277	76,21%	631.774	296.978	183.421	1,001	480.801	632.303	76,04%
Sudeste	**1.395.769**	**651.639**	**384.735**	**N/A**	**1.128.700**	**1.516.424**	**74,43%**	**1.457.972**	**683.404**	**411.276**	**N/A**	**1.095.273**	**1.458.741**	**75,08%**
Pdo. Alte Brown	557.025	38.410	200.373	1,099	262.537	612.438	42,87%	583.209	41.913	205.485	1,000	247.500	583.449	42,42%
Pdo. E. Echeverría	300.785	23.685	139.457	1,316	214.707	395.856	54,24%	337.880	37.082	163.499	1,001	200.845	338.325	59,36%
Pdo Ezeiza	163.287	3.967	38.900	1,465	62.801	239.220	26,25%	198.620	5.695	57.843	1,002	63.693	199.105	31,99%
Alte. Brown-E. Echeverrí	1.021.097	66.062	378.730	**N/A**	540.046	1.247.514	43,29%	1.119.709	84.690	426.827	**N/A**	512.038	1.120.879	45,68%
Lomas de Zamora	621.440	146.781	174.330	1,058	339.598	657.218	51,67%	685.644	156.635	184.687	1,001	341.743	686.490	49,78%
Sudoeste	**1.642.537**	**212.843**	**553.060**	**N/A**	**879.644**	**1.904.732**	**46,18%**	**1.805.353**	**241.325**	**611.514**	**N/A**	**853.781**	**1.807.369**	**47,24%**
Partidos de la Conc	**10.390.843**	**5.816.126**	**2.500.387**	**N/A**	**9.237.089**	**11.688.751**	**79,03%**	**10.886.243**	**5.952.837**	**2.237.744**	**N/A**	**8.194.328**	**10.892.752**	**75,23%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

EMPALME DE SERIES: RADIOS SERVIDOS CON DESAGÜES CLOACALES

Informe Anual

Año 2025

54.1-NA-IAT3-C-S-TRA 02-2025-EMPALME

Nuevos Partidos	Población de las áreas Total, Servida y de Expansión SEGÚN CENSO 2010 (INDEC "*Informe 38*").							Población de las áreas Total, Servida y de Expansión SEGÚN CENSO 2022 (INDEC "*estimaciones_departamentos_2022_2035*")						
	Población Total del Partido (INDEC informe 38). Año 2010.	Población Censo 2010 dentro del Radio de Servicio Año 2018.	Población Censo 2010 dentro del Area de Expansión 2018-2024	Coeficiente de Crecimiento Intercensal (2010-2024) *	Población dentro del Area de Servicio 2024. Censo 2010 actualizado al año 2024.	Población Total del Partido. Censo 2010 actualizado al año 2024.	% Cobertura Actualizada	Población Total del Partido (Censo 2022). Año 2022.	Población Censo 2022 dentro del Radio de Servicio Año 2018.	Población Censo 2022 dentro del Area de Expansión 2018-2024.	Coeficiente de Crecimiento Intercensal (2022-2024) **	Población dentro del Area de Servicio 2024. Censo 2022 actualizado al año 2024.	Población Total del Partido. Censo 2022 actualizado al año 2024.	% Cobertura Actualizada
Pdo. San Miguel**	278.019	170.615	13.756	1,127	159.308	313.312	50,85%	327.650	149.852	16.440	1,002	166.619	328.294	50,75%
Pdo. José C. Paz	267.275	0	0	1,204	0	321.710	0,00%	326.527	0	0	1,002	0	327.304	0,00%
Pdo. Malvinas Argentinas	324.358	0	0	1,149	0	372.771	0,00%	349.401	0	0	1,001	0	349.677	0,00%
San Miguel-Paz-Malvinas	869.652	127.607	13.756	N/A	159.308	1.007.793	15,81%	1.003.578	149.852	16.440	N/A	166.619	1.005.275	16,57%
Escobar	215.256	15.746	10.397	1,253	32.754	269.692	12,15%	256.071	20.462	10.997	1,002	31.526	256.615	12,29%
Pilar	299.549	50.387	210	1,357	68.679	406.599	16,89%	393.614	71.683	227	1,003	72.140	394.875	18,27%
Región Norte	**1.384.457**	**193.740**	**24.363**	**N/A**	**260.741**	**1.684.084**	**15,48%**	**1.653.263**	**241.997**	**27.664**	**N/A**	**270.285**	**1.656.765**	**16,31%**
Merlo	531.609	119.053	16.210	1,192	161.198	633.540	25,44%	581.484	124.243	16.074	1,001	140.427	581.940	24,13%
Moreno	454.416	135.343	20.114	1,263	196.379	574.034	34,21%	575.758	163.317	19.607	1,001	183.092	576.287	31,77%
Región Oeste	**986.025**	**254.396**	**36.324**	**N/A**	**357.577**	**1.207.574**	**29,61%**	**1.157.242**	**287.560**	**35.681**	**N/A**	**323.519**	**1.158.227**	**27,93%**
Florencio Varela	426.738	163.574	22.945	1,288	240.312	549.812	43,71%	488.103	179.389	25.952	1,002	205.711	488.982	42,07%
Región Sudeste	**426.738**	**163.574**	**22.945**	**N/A**	**240.312**	**549.812**	**43,71%**	**488.103**	**179.389**	**25.952**	**N/A**	**205.711**	**488.982**	**42,07%**
Presidente Perón	81.166	24.938	19.435	1,415	62.798	114.868	54,67%	101.994	26.699	23.016	1,003	49.856	102.284	48,74%
Región Sudoeste	**81.166**	**24.938**	**19.435**	**N/A**	**62.798**	**114.868**	**54,67%**	**101.994**	**26.699**	**23.016**	**N/A**	**49.856**	**102.284**	**48,74%**
Total Nuevos Partidos	**2.878.386**	**636.648**	**103.067**	**N/A**	**921.428**	**3.556.338**	**25,91%**	**3.400.602**	**735.645**	**112.313**	**N/A**	**849.371**	**3.406.258**	**24,94%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

** La población con servicio inicial en San Miguel fue incrementada en 43.008 habitantes por error de asignación de partidos (antes asignado a J. C. Paz).

	EXPANSION DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜE CLOACAL	Informe Anual	
aysa	OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-TRA 04	exPL IA Nº 39

Región Norte

SAN FERNANDO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
Cloaca + Trabajo						
	SUBTOTAL					
Instalación con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
MPG´S						
	SUBTOTAL					
OPCT	BLISS	955	25/06/2025	0,129977132	304	
	CORRALÓN DE HIGIENE URBANA	930	20/05/2025	0,017631505	37	
	Emprendimiento PUEBLO BUENA VISTA	961	10/07/2025	0,032647819	43	
	SUBTOTAL			0,180	384	
	TOTALES			0,180	384	

TIGRE

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
Cloaca + Trabajo						
	SUBTOTAL					
Instalación con zona de expansion	EMPRENDIMIENTO CLUB NAUTICO HA	956	01/07/2025	0,163928075	36	
	OPCT para el CLUB NEWMAN	966	22/07/2025	1,719231234	2115	
	SUBTOTAL			1,883	2151	
MPG´S						
	SUBTOTAL					
OPCT	BARRIO NEWMAN IV	916	26/06/2025	0,237042016	183	
	Barrio Newman Joven	965	22/07/2025	0,072567082	58	
	Plataforma Logistica Norlog	949	11/06/2025	1,680843056	2436	
	TIGRE NATURAL	958	04/07/2025	0,148913425	57	
	SUBTOTAL			2,139	2734	
	TOTALES			4,023	4885	

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
Cloaca + Trabajo						
	SUBTOTAL					
Instalación con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
MPG´S						
	SUBTOTAL					
OPCT						
	SUBTOTAL					
	TOTALES					

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
Cloaca + Trabajo						
	SUBTOTAL					
Instalación con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
MPG´S						
	SUBTOTAL					
OPCT						
	SUBTOTAL					
	TOTALES					

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
Cloaca + Trabajo						
	SUBTOTAL					
Instalación con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
MPG´S						
	SUBTOTAL					
OPCT						
	SUBTOTAL					
	TOTALES					

	EXPANSION DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜE CLOACAL	Informe Anual	
aysa	OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-TRA 04	exPL IA N° 39

Región Norte

Partido de: SAN MIGUEL

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion	HAB. 973_ EMPRENDIMIENTO PUEBLO	973	31/07/2025	1,574771572	1408	
	NC70172 – Red Secundaria Cloacal Barrio	975	07/08/2025	0,522732856	5110	
SUBTOTAL				**2,098**	**6518**	
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES				**2,098**	**6518**	

Partido de: JOSE C PAZ

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion						
SUBTOTAL						
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES						

Partido de: MALVINAS ARGENTINAS

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion						
SUBTOTAL						
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES						

Partido de: ESCOBAR

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						

SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion	Mejora y Mantenimiento 2020	962	15/07/2025	0,045247703	97	
SUBTOTAL				**0,045**	**97**	
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT	HABILITACIÓN OPCT DE CLOACA B° 72	988	01/01/2025	0,057653992	22	
SUBTOTAL				**0,058**	**22**	
TOTALES				**0,103**	**119**	

Partido de: PILAR

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion	EMPRENDIMIENTO ALMAHUE, DERQUI	989	01/01/2025	0,501969961	417	
	EMPRENDIMIENTO DISTRITO CAMPUS	976	08/08/2025	0,007169719	26	
	HAB.984_PIL:El Casco	984	07/11/2025	0,068778215	40	
	INSTITUTO TIERRA DE ENCUENTRO	971	26/05/2025	0,003382377	13	
	proyecto de OPCT - EMPRENDIMIENTO	947	04/06/2025	0,769666746	689	
	Red Primaria de Agua Refuerzo Aeropuerto	918	25/05/2025	0,04145779	18	
SUBTOTAL				**1,392**	**1203**	
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT	BARRIO LA POSTA DE PILAR	959	07/07/2025	0,39038894	125	
	EMPRENDIMIENTO CAMPUS VISTA	979	02/09/2025	0,795674656	429	
	La Josefina	936	27/05/2025	0,060998661	91	
	LAS LUCIÉRNAGAS	953	25/06/2025	0,242608139	115	
	LOS NARCISOS 712	933	27/05/2025	0,000467917	1	
SUBTOTAL				**1,490**	**761**	
TOTALES				**2,883**	**1964**	

	EXPANSION DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜE CLOACAL	Informe Anual	
aysa	OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-TRA 04	exPL IA N° 39

Región Oeste

LA MATANZA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo	V_OC70306 - CASTILLO 3 M1 (C+T) - HA	1065	25/11/2025	0,085687942	1748	
	V_OC70307-CASTILLO 3 M2 (C+T) HAB 1	1066	25/11/2025	0,077006457	1146	
	V_OC70308 - CASTILLO 3 M3 (C+T) HAH	1067	25/11/2025	0,064567551	572	
	V_OC70309 - CASTILLO 3 M4 (C+T) HAB	1068	25/11/2025	0,033688012	578	
SUBTOTAL				0,261	4044	
Instalación con zona de expansion						
SUBTOTAL						
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES				0,261	4044	

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion						
SUBTOTAL						
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES						

ITUZAINGO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion	B° SICUREZZA (THORNE Y RATTI) ODT	1064	03/10/2025	0,025944365	148	
SUBTOTAL				0,026	148	
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES				0,026	148	

Identificación de la Obra	Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
	Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
	N°	Fecha			

Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion						
SUBTOTAL						
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES						

TRES DE FEBRERO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo	V_OC70094 - B° LOMA HERMOSA 2A M1	1069	29/12/2025	0,071742337	806	
	V_OC70291 . B° LOMA HERMOSA 2A M2	1063	29/12/2025	0,012349547	157	
SUBTOTAL				**0,084**	**963**	
Instalación con zona de expansion						
SUBTOTAL						
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT	DE STEFANO	1062	10/09/2025	0,014774444	42	
SUBTOTAL				**0,015**	**42**	
TOTALES				**0,099**	**1005**	

Región Oeste

Partido de: MORENO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion	MARILÓ RESTO 1 (OC 70241)	1054	10/02/2025	0,982468115	8084	
SUBTOTAL				**0,982**	**8084**	
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT	Vinculación Cloacal B° Barrancas	1053	22/01/2025	0,045384946	179	
SUBTOTAL				**0,045**	**179**	
TOTALES				**1,028**	**8263**	

Partido de: MERLO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion						
SUBTOTAL						
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES						

	EXPANSION DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜE CLOACAL	Informe Anual	
aysa	OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-TRA 04	exPL IA Nº 39

Región Sudeste

AVELLANEDA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion	CM 10301-SC70325-RSC Programa de Ins	697	19/09/2025	0,000810904	4	
	CM 10302-SC70325-RSC Programa de Ins	696	19/09/2025	0,002278963	11	
	DRSE - Dto. Avellaneda CM 10306-SC703	698	19/09/2025	0,002878663	20	
SUBTOTAL				**0,006**	**35**	
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion	SC622 - Inst. RSC Obrero Norte M6 + Amp	726	27/10/2025	0,061661012	936	
	SC70205-RSC Sarmiento Etapa 1 - Zona 8	732	16/12/2025	0,113628777	392	
	SC70295-Instalación RSC B° Obrero Sur R	715	07/08/2025	0,026376752	266	
SUBTOTAL				**0,202**	**1594**	
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES				**0,208**	**1629**	

LANUS

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion	SC442 - Instalación RSC SIAM	731	18/11/2025	1,228490983	12267	
SUBTOTAL				**1,228**	**12267**	
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES				**1,228**	**12267**	

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion						
SUBTOTAL						
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES						

	EXPANSION DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜE CLOACAL	Informe Anual	
aysa	OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-TRA 04	exPL IA N° 39

Región Sudeste

Partido de: FLORENCIO VARELA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
Cloaca + Trabajo						
	SUBTOTAL					
Instalación con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
MPG´S						
	SUBTOTAL					
OPCT	Inst. RSC Av Hudson y Av Carboni (Villa Va	730	12/11/2025	0,077765032	106	
	SUBTOTAL			**0,078**	**106**	
	TOTALES			**0,078**	**106**	

	EXPANSION DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜE CLOACAL	Informe Anual	
aysa	OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-TRA 04	exPL IA N° 39

Región Sudoeste

ALMTE BROWN

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
Cloaca + Trabajo	Brown 1 M2-parcial-SC70341	1984	30/12/2025	0,04807963	450	
	Brown 1 M5-Parcial-SC70371	1967	30/07/2025	0,083863821	588	
	C+T – B° El Cerrito M1	1964	23/06/2025	0,114345357	940	
	C+T- BROWN 1 M3	1983	29/12/2025	0,07276201	850	
	C+T - BROWN 1 M6 - SC70168-RE1980	1980	04/12/2025	0,09948874	699	
	Red Secundaria Brow 1 M4	1976	31/10/2025	0,193288463	1926	
	SUBTOTAL			**0,612**	**5453**	
Instalación con zona de expansion	Esperanza Oeste 2 – Longchamps Cuenca	1963	24/06/2025	0,091320528	592	
	SUBTOTAL			**0,091**	**592**	
MPG´S	DIPAC-DON ORIONE VIEJO-RES 1972	1972	09/10/2025	0,363222577	3810	
	SUBTOTAL			**0,363**	**3810**	
OPCT	DRSO - Dto. Almirante Brown-OPCT - B° L	1962	12/06/2025	0,204712701	348	
	SUBTOTAL			**0,205**	**348**	
	TOTALES			**1,271**	**10203**	

ESTEBAN ECHEVERRIA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
Cloaca + Trabajo	C+T Santa Catalina 2 Etapa M4 - Parcial S	1970	03/10/2025	0,103832037	430	
	C+T Santa Catalina 2 Etapa M7 - Parcial S	1971	06/10/2025	0,023536258	136	
	SUBTOTAL			**0,127**	**566**	
Instalación con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
MPG´S						
	SUBTOTAL					
OPCT						
	SUBTOTAL					
	TOTALES			**0,127**	**566**	

EZEIZA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	SUBTOTAL					
Cloaca + Trabajo						
	SUBTOTAL					
Instalación con zona de expansion	RSC Ezeiza Sur 5	1978	28/11/2025	1,054360157	2291	
	SUBTOTAL			**1,054**	**2291**	
MPG´S						
	SUBTOTAL					
OPCT	OPCT- TESTIGOS DE JEHOVA- RES 19	1951	16/01/2025	0,193365999	5	

OPCT						
SUBTOTAL				**0,193**	**5**	
TOTALES				**1,248**	**2296**	

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025**				
		Habilitación		**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)**	**Observaciones**
		N°	**Fecha**			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion						
SUBTOTAL						
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES						

	EXPANSION DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜE CLOACAL	Informe Anual	
aysa	OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-TRA 04	exPL IA N° 39

Región Sudoeste

Partido de: PRESIDENTE PERON

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 2025				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (sin CI)	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
SUBTOTAL						
Cloaca + Trabajo						
SUBTOTAL						
Instalación con zona de expansion	Barrio San Pablo (Parcial)	1950	10/01/2025	0,068804192	531	
SUBTOTAL				**0,069**	**531**	
MPG´S						
SUBTOTAL						
OPCT						
SUBTOTAL						
TOTALES				**0,069**	**531**	

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

ÁREA DE SERVICIOS DE DESAGÜES CLOACALES POR SISTEMA DE TRATAMIENTO

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

57-IAT3-C-S-PRO 01 | **ex PL IA Nº 40**

Partido	DATOS DE AREAS (Km2)														
	Superficie del Partido	Depuración al Inicio		Tratamiento Sistema Río de la Plata				Tratamiento Sistema Matanza-Riachuelo				Tratamiento Sistema Reconquista			
		Área Servida al 21/03/2006	Porcentaje de Cobertura al 21/03/2006	Año Anterior	2025		Total Area con Servicio	Año Anterior	2025		Total Area con Servicio	Año Anterior	2025		Total Area con Servicio
				Área Servida 2024	MOI	Áreas Incorporadas en el período		Área Servida 2024	MOI	Áreas Incorporadas en el período		Área Servida 2024	MOI	Áreas Incorporadas en el período	
	[1]	[2]	[3] = (2/1)]	[4]	[5]	[6]	[7] = [4]+[5]+[6]	[8]	[9]	[10]	[11] = [8]+[9]+[10]	[12]	[13]	[14]	[15] = [12]+[13]+[14]
Capital Federal	**206,51**	**0,00**	**0,00%**	**206,51**			**206,51**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			**0,00**
SAN FERNANDO	23,71	11,06	46,65%	0,06			0,06	0,00			0,00	16,59		0,16	16,75
TIGRE	152,72	5,06	3,31%	0,00			0,00	0,00			0,00	39,20		3,79	42,67
San Fernando-Tigre	176,43	16,12	9,14%	0,06			0,06	0,00			0,00	55,79		3,95	59,43
San Isidro	52,46	3,79	7,22%	28,58			28,58	0,00			0,00	18,84			18,84
San Martín	56,55	0,00	0,00%	27,92			27,92	0,00			0,00	12,24			12,24
Vicente López	34,70	0,00	0,00%	34,12			34,12	0,00			0,00	0,00			0,00
Región Norte	**320,14**	**19,91**	**6,22%**	**90,68**			**90,68**	**0,00**			**0,00**	**86,87**		**3,64**	**90,51**
La Matanza	332,66	59,98	18,03%	9,34			9,34	85,53		0,26	85,79	0,00			0,00
HURLINGHAM	35,48	0,00	0,00%	2,87			2,87	0,00			0,00	14,25			14,25
ITUZAINGO	38,55	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00			0,00	16,73		0,03	16,76
MORON	55,20	0,00	0,00%	33,89			33,89	1,12			1,12	13,90			13,90
Morón	129,23	0,00	0,00%	36,76			36,76	1,12			1,12	44,88		0,03	44,91
Tres de Febrero	46,47	0,00	0,00%	27,00	-0,01	0,01	27,00	0,00			0,00	8,36		0,08	8,44
Región Oeste	**508,36**	**59,98**	**11,80%**	**73,10**	**-0,01**	**0,01**	**73,10**	**86,65**		**0,26**	**86,91**	**53,24**		**0,11**	**53,35**
Avellaneda	56,08	0,00	0,00%	31,85	-0,01	0,21	32,05	0,00			0,00	0,00			0,00
Lanús	49,96	0,00	0,00%	23,14		1,23	24,37	2,11			2,11	0,00			0,00
Quilmes	92,65	0,00	0,00%	58,29			58,29	0,00			0,00	0,00			0,00
Región Sudeste	**198,69**	**0,00**	**0,00%**	**113,28**	**-0,01**	**1,44**	**114,71**	**2,11**			**2,11**	**0,00**			**0,00**
ALMTE. BROWN	129,01	0,00	0,00%	31,02		1,07	32,09	0,03		0,20	0,23	0,00			0,00
ESTEBAN ECHEVERRIA	121,79	1,75	1,44%	4,68			4,68	32,31	0,01	0,13	32,44	0,00			0,00
EZEIZA	238,34	3,29	1,38%	0,00			0,00	15,33	0,16	1,25	16,74	0,00			0,00
Alte. Brown-E. Echeverría	489,14	5,04	1,03%	35,70		1,07	36,77	47,67	0,16	1,58	49,41	0,00			0,00
Lomas de Zamora	88,54	0,00	0,00%	41,99			41,99	2,25			2,25	0,00			0,00
Región Sudoeste	**577,68**	**5,04**	**0,87%**	**77,69**		**1,07**	**78,76**	**49,92**	**0,16**	**1,58**	**51,66**	**0,00**			**0,00**
Total Concesión	**1.811,38**	**84,93**	**4,69%**	**561,26**	**-0,02**	**2,52**	**563,76**	**138,68**	**0,16**	**1,84**	**140,69**	**140,11**		**4,06**	**143,86**

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

ÁREA DE SERVICIOS DE DESAGÜES CLOACALES POR SISTEMA DE TRATAMIENTO (Nuevas Áreas)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

57-IAT3-C-S-PRO 01 (Nuevas Á | **ex PL IA Nº 40**

Partido	DATOS DE AREAS (Km2)														
	Superficie del Partido	Depuración al Inicio		Tratamiento Sistema Reconquista				Tratamiento Sistema Nuevas Areas							
		Área Servida Original	Porcentaje de Cobertura Original	Año Anterior	2025		Total Area con Servicio	Año Anterior	2025		Total Area con Servicio				
				Área Servida 2024	MOI	Áreas Incorporadas en el período		Área Servida 2024	MOI	Áreas Incorporadas en el período					
	[1]	[2]	[3] = (2/1)]	[4]	[5]	[6]	[7] = [4]+[5]+[6]	[4]	[5]	[6]	[7] = [4]+[5]+[6]				
SAN MIGUEL	82,25	21,26	25,85%	0,00			0,00	24,26		2,10	26,36				
JOSE C PAZ	50,09	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00			0,00				
MALVINAS ARGENTINAS	62,90	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00			0,00				
San Miguel-Paz-Malvinas A	195,23	21,26	10,89%	0,00			0,00	24,26		2,10	26,36				
Escobar	300,30	3,83	1,28%	0,00			0,00	7,49		0,10	7,59				
Pilar	386,37	41,44	10,73%	0,02			0,02	41,65		2,88	44,53				
Región Norte	**881,89**	**66,53**	**7,54%**	**0,02**			**0,02**	**73,40**		**5,08**	**78,48**				
Merlo	173,55	19,76	11,39%	0,33			0,33	21,83			21,83				
Moreno	185,79	26,45	14,24%	0,00	-0,22	1,03	0,81	26,46			26,46				
Región Oeste	**359,34**	**46,21**	**12,86%**	**0,33**	**-0,22**	**1,03**	**1,14**	**48,29**			**48,29**				
Florencio Varela	190,06	21,28	11,20%	0,00			0,00	26,80		0,08	26,88				
Región Sudeste	**190,06**	**21,28**	**11,20%**	**0,00**			**0,00**	**26,80**		**0,08**	**26,88**				
Presidente Perón	120,84	6,15	5,09%	0,00			0,00	6,91		0,07	6,98				
Región Sudoeste	**120,84**	**6,15**	**5,09%**	**0,00**			**0,00**	**6,91**		**0,07**	**6,98**				
Total Concesión	**1.552,13**	**140,17**	**9,03%**	**0,35**	**-0,22**	**1,03**	**1,16**	**155,40**		**5,23**	**160,63**				

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

POBLACIÓN CON SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

58-IAT3-C-S-PRO 02 | **ex PL IA Nº 41**

Partido	Valores de Población según Censo 2022								Expansión del Servicio - Población proyectada al 2025 (*)			
	Población del Partido	Población con Servicio al Inicio	Porcentaje de Cobertura inicial	Población con Servicio 2024	MOI 2025	Población del Área de Expansión 2006-2024	Población Area Expansión Año 2025	Población con Servicio 2025	Coeficiente de proyeccion Intercensal	Población del Partido proyectada al 2025 (3*)	Población con Servicio proyectada al 2025	Porcentaje de Cobertura al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3] = [2/1]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8] = [4+5+7]	CI	[9]	[10] = [8*CI]	[11] = [10/9]
Capital Federal	**3.101.599**	**0**	**0,00%**	**0**		**0**	**0**	**0**	1	**3.101.599**	**0**	**0,00%**
SAN FERNANDO	168.882	112.244	60,71%	153.547		41.303	347	266.138	1,001	169.153	266.280	157,42%
TIGRE	439.067	35.934	5,74%	218.245		182.311	4.702	258.881	1,003	443.171	259.685	58,60%
San Fernando-Tigre	**607.949**	**148.178**	22,45%	**371.792**		**223.614**	**5.049**	**525.019**	N/A	**612.323**	**525.965**	85,90%
San Isidro	**295.978**	**44.140**	13,70%	**282.215**		**238.075**		**326.355**	1,000	**296.074**	326.390	110,24%
San Martín	**444.503**	**0**	0,00%	**359.495**		**359.495**		**359.495**	1,001	**446.034**	359.907	80,69%
Vicente López	**280.541**	**0**	0,00%	**0**		**0**		**0**	1,001	**280.970**	0	0,00%
Región Norte	**1.628.971**	**192.318**	**10,61%**	**1.013.502**		**821.184**	**5.049**	**1.210.869**	N/A	**1.635.402**	**1.212.263**	**74,13%**
La Matanza	**1.838.401**	**567.070**	35,32%	**967.379**		**400.309**	**4.044**	**1.538.493**	1,002	**1.847.354**	1.540.987	83,42%
HURLINGHAM	186.221		0,00%	140.573		140.573		140.573	1,000	186.418	140.623	75,43%
ITUZAINGO	178.598		0,00%	91.360		91.360	148	91.508	1,001	179.027	91.581	51,15%
MORON	326.810		0,00%	271.320		271.320		271.320	1,000	326.977	271.366	82,99%
Morón	**691.629**		0,00%	**503.253**		**503.253**	**148**	**503.401**	N/A	**692.422**	**503.570**	72,73%
Tres de Febrero	**362.319**		0,00%	**7.478**	**-42**	**7.478**	**1.005**	**8.483**	1,001	**363.412**	8.492	2,34%
Región Oeste	**2.892.349**	**567.070**	**22,45%**	**1.478.110**	**-42**	**911.040**	**5.197**	**2.050.377**	N/A	**2.903.188**	**2.053.048**	**70,72%**
Avellaneda	**366.117**		0,00%	**0**	**-35**	**0**	**1.629**	**1.629**	1,001	**367.232**	1.631	0,44%
Lanús	**460.081**		0,00%	**46.161**		**46.161**	**12.267**	**58.428**	1,000	**460.081**	58.428	12,70%
Quilmes	**631.774**		0,00%	**0**		**0**		**0**	1,001	**634.230**	0	0,00%
Región Sudeste	**1.457.972**	**0**	**0,00%**	**46.161**	**-35**	**46.161**	**13.896**	**60.057**	N/A	**1.461.542**	**60.059**	**4,11%**
ALMTE. BROWN	583.209		0,00%	1.702		1.702	10.203	11.905	1,001	584.315	11.913	2,04%
ESTEBAN ECHEVERRIA	337.880	14.845	3,55%	200.581	27	185.736	566	215.992	1,002	339.933	216.429	63,67%
EZEIZA	198.620	19.390	10,09%	63.538	19	44.148	2.296	85.224	1,004	200.866	85.544	42,59%
Alte. Brown-E. Echeverría	**1.119.709**	**34.235**	2,66%	**265.821**	**46**	**231.586**	**13.065**	**313.121**	N/A	**1.125.115**	**313.885**	27,90%
Lomas de Zamora	**685.644**		0,00%	**0**		**0**		**0**	1,002	**689.572**	0	0,00%
Región Sudoeste	**1.805.353**	**34.235**	**1,65%**	**265.821**	**46**	**231.586**	**13.065**	**313.121**	N/A	**1.814.687**	**313.885**	**17,30%**
Total Concesión	**10.886.244**	**793.623**	**7,86%**	**2.803.594**	**-31**	**2.009.971**	**37.207**	**3.634.424**	N/A	**10.916.417**	**3.639.255**	**33,34%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

POBLACIÓN CON SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES CON TRATAMIENTO SECUNDARIO (Nuevas Áreas)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

58-IAT3-C-S-PRO 02 (Nuevas Áre | **ex PL IA Nº 41**

Partido	Valores de Población según Censo 2022								Expansión del Servicio - Población proyectada al 2025 (*)			
	Población del Partido	Población con Servicio al Inicio	Porcentaje de Cobertura al Inicio	Población con Servicio 2024	MOI 2025	Población del Área de Expansión 2006-2024	Población Area Expansión Año 2025	Población con Servicio 2025	Coeficiente de proyeccion Intercensal	Población del Partido proyectada al 2025	Población con Servicio proyectada al 2025	Porcentaje de Cobertura al 31/12/2025
	[1]	[2]	[3] = [2/1]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8] = [4+5+7]	CI	[9]	[10] = [8*CI]	[11] = [10/9]
SAN MIGUEL	327.650	149.852	45,74%	166.292	0	16.440	6.518	129.802	1,003	328.639	173.332	52,74%
JOSE C PAZ	326.527	0	0,00%	0	0	0		0	1,004	327.722	0	0,00%
MALVINAS ARGENTINAS	349.401	0	0,00%	0	0	0		0	1,001	349.824	0	0,00%
San Miguel-Paz-Malvinas Arg.	**1.003.578**	149.852	14,93%	**166.292**	**0**	**16.440**	**6.518**	**172.810**	1,001	**1.006.186**	**173.332**	**17,23%**
Escobar	256.071	20.462	7,99%	31.459	0	10.997	236	31.695	1,003	256.910	31.799	12,38%
Pilar	393.614	71.683	18,21%	71.910	0	227	1.964	73.874	1,005	395.551	74.238	18,77%
Región Norte	**1.653.263**	**241.997**	**14,64%**	**269.661**	**0**	**27.664**	**8.718**	**278.379**	N/A	**1.658.647**	**279.368**	**16,84%**
Merlo	581.484	124.243	21,37%	140.317	0	16.074		140.317	1,001	582.184	140.486	24,13%
Moreno	575.758	163.317	28,37%	182.924	-1.856	19.607	8.263	189.331	1,001	576.571	189.598	32,88%
Región Oeste	**1.157.242**	**287.560**	**24,85%**	**323.241**	**-1.856**	**35.681**	**8.263**	**329.648**	N/A	**1.158.755**	**330.084**	**28,49%**
Florencio Varela	488.103	179.389	36,75%	205.341	0	25.952	106	205.447	1,003	489.456	206.017	42,09%
Región Sudeste	**488.103**	**179.389**	**36,75%**	**205.341**	**0**	**25.952**	**106**	**205.447**	N/A	**489.456**	**206.017**	**42,09%**
Presidente Perón	101.994	26.699	26,18%	49.715	0	23.016	531	50.246	1,004	102.439	50.465	49,26%
Región Sudoeste	**101.994**	**26.699**	**26,18%**	**49.715**	**0**	**23.016**	**531**	**50.246**	N/A	**102.439**	**50.465**	**49,26%**
Total Concesión	**3.400.602**	**735.645**	**21,63%**	**847.958**	**-1.856**	**112.313**	**17.618**	**863.720**	N/A	**3.409.297**	**865.934**	**25,40%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

	EXPANSION DE REDES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT3-C-S-PRO 03	exPL IA Nº 42

Región Norte
Partido de: SAN FERNANDO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	BLISS	955	25/06/2025	0,129977132	304	
	Emprendimiento PUEBLO BUENA VISTA	961	10/07/2025	0,032647819	43	
	Subtotal			**0,162624951**	**347**	
	Totales			**0,162624951**	**347**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: TIGRE

Identificación de la Obra	Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20			Observaciones
	Habilitación	Area Incorporada	Población Incorporada	

		N°	Fecha	Area Incorporada	s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	EMPRENDIMIENTO CLUB NAUTICO HAC	956	01/07/2025	0,163928075	36	
	OPCT para el CLUB NEWMAN	966	22/07/2025	1,719231234	2115	
	Subtotal			**1,883159309**	**2151**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	Barrio Newman Joven	965	22/07/2025	0,072567082	58	
	Plataforma Logistica Norlog	949	11/06/2025	1,680843056	2436	
	TIGRE NATURAL	958	04/07/2025	0,148913425	57	
	Subtotal			**1,902323563**	**2551**	
	Totales			**3,785482872**	**4702**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: SAN ISIDRO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						

	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: SAN MARTIN

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20**				**Observaciones**
		Habilitación		**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI**	
		N°	**Fecha**			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: VICENTE LOPEZ

Identificación de la Obra	**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20**			**Observaciones**
	Habilitación	**Area Incorporada**	**Población Incorporada**	

		Nº	Fecha	Área incorporada	s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT3-C-S-PRO 03	exPL IA Nº 42

Región Norte
Partido de: SAN MIGUEL

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	HAB. 973_ EMPRENDIMIENTO PUEBLO V	973	31/07/2025	1,574771572	1408	
	NC70172 – Red Secundaria Cloacal Barrio	975	07/08/2025	0,522732856	5110	
	Subtotal			**2,097504428**	**6518**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**2,097504428**	**6518**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: JOSE C PAZ

Identificación de la Obra	Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20			Observaciones
	Habilitación	Area Incorporada	Población Incorporada	

		N°	Fecha	Area Incorporada	s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: MALVINAS ARGENTINAS

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					

	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: ESCOBAR

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20**				**Observaciones**
		Habilitación		**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI**	
		N°	**Fecha**			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	Mejora y Mantenimiento 2020	962	15/07/2025	0,045247703	97	
	Subtotal			**0,045247703**	**97**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	HABILITACIÓN OPCT DE CLOACA B° 72 '	988	01/01/2025	0,057653992	22	
	Subtotal			**0,057653992**	**22**	
	Totales			**0,102901694**	**119**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: PILAR

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20**				**Observaciones**
		Habilitación		**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI**	
		N°	**Fecha**			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					

Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	EMPRENDIMIENTO ALMAHUE, DERQUI	989	01/01/2025	0,501969961	417	
	EMPRENDIMIENTO DISTRITO CAMPUS	976	08/08/2025	0,007169719	26	
	HAB.984_PIL:El Casco	984	07/11/2025	0,068778215	40	
	INSTITUTO TIERRA DE ENCUENTRO	971	26/05/2025	0,003382377	13	
	Red Primaria de Agua Refuerzo Aeropuerto	918	25/05/2025	0,04145779	18	
	Subtotal			**0,622758063**	**514**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	BARRIO LA POSTA DE PILAR	959	07/07/2025	0,39038894	125	
	EMPRENDIMIENTO CAMPUS VISTA	979	02/09/2025	0,795674656	429	
	La Josefina	936	27/05/2025	0,060998661	91	
	LAS LUCIÉRNAGAS	953	25/06/2025	0,242608139	115	
	LOS NARCISOS 712	933	27/05/2025	0,000467917	1	
	Subtotal			**1,490138313**	**761**	
	Totales			**2,112896375**	**1275**	
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT3-C-S-PRO 03	exPL IA Nº 42

Región Oeste
Partido de: LA MATANZA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo	V_OC70306 - CASTILLO 3 M1 (C+T) - HAI	1065	25/11/2025	0,085687942	1748	
	V_OC70307-CASTILLO 3 M2 (C+T) HAB 1	1066	25/11/2025	0,077006457	1146	
	V_OC70308 - CASTILLO 3 M3 (C+T) HAH	1067	25/11/2025	0,064567551	572	
	V_OC70309 - CASTILLO 3 M4 (C+T) HAB	1068	25/11/2025	0,033688012	578	
	Subtotal			**0,260949962**	**4044**	
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**0,260949962**	**4044**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: HURLINGHAM

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: ITUZAINGO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	B° SICUREZZA (THORNE Y RATTI) ODT I	1064	03/10/2025	0,025944365	148	
	Subtotal			**0,025944365**	**148**	
MPG´S						

	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**0,025944365**	**148**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: MORON

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20**				**Observaciones**
		Habilitación		**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI**	
		N°	**Fecha**			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: TRES DE FEBRERO

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20**				**Observaciones**
		Habilitación		**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI**	
		N°	**Fecha**			
Cierre de malla con zona de expansion						

	Subtotal					
Cloaca + Trabajo	V_OC70094 - B° LOMA HERMOSA 2A M1	1069	29/12/2025	0,071742337	806	
	V_OC70291 . B° LOMA HERMOSA 2A M2	1063	29/12/2025	0,012349547	157	
	Subtotal			**0,084091884**	**963**	
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	DE STEFANO	1062	10/09/2025	0,014774444	42	
	Subtotal			**0,014774444**	**42**	
	Totales			**0,098866328**	**1005**	
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT3-C-S-PRO 03	exPL IA Nº 42

Región Oeste
Partido de: MORENO

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	MARILÓ RESTO 1 (OC 70241)	1054	10/02/2025	0,982468115	8084	
	Subtotal			**0,982468115**	**8084**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	Vinculación Cloacal B° Barrancas	1053	22/01/2025	0,045384946	179	
	Subtotal			**0,045384946**	**179**	
	Totales			**1,027853061**	**8263**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: MERLO

Identificación de la Obra	Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20			Observaciones
	Habilitación	Area Incorporada	Población Incorporada	

		Nº	Fecha	Área incorporada	s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT3-C-S-PRO 03	exPL IA Nº 42

Región Sudeste
Partido de: AVELLANEDA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion	CM 10301-SC70325-RSC Programa de Ins	697	19/09/2025	0,000810904	4	
	CM 10302-SC70325-RSC Programa de Ins	696	19/09/2025	0,002278963	11	
	DRSE - Dto. Avellaneda CM 10306-SC703	698	19/09/2025	0,002878663	20	
	Subtotal			**0,00596853**	**35**	
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	SC622 - Inst. RSC Obrero Norte M6 + Amp	726	27/10/2025	0,061661012	936	
	SC70205-RSC Sarmiento Etapa 1 - Zona 8	732	16/12/2025	0,113628777	392	
	SC70295-Instalación RSC B° Obrero Sur R	715	07/08/2025	0,026376752	266	
	Subtotal			**0,201666542**	**1594**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**0,207635071**	**1629**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: LANUS

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	SC442 - Instalación RSC SIAM	731	18/11/2025	1,228490983	12267	
	Subtotal			**1,228490983**	**12267**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**1,228490983**	**12267**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: QUILMES

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						

	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT3-C-S-PRO 03	exPL IA Nº 42

Región Sudeste
Partido de: FLORENCIO VARELA

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	Inst. RSC Av Hudson y Av Carboni (Villa Va	730	12/11/2025	0,077765032	106	
	Subtotal			**0,077765032**	**106**	
	Totales			**0,077765032**	**106**	
Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT3-C-S-PRO 03	exPL IA Nº 42

Región Sudoeste
Partido de: ALMTE BROWN

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	Observaciones
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo	Brown 1 M2-parcial-SC70341	1984	30/12/2025	0,04807963	450	
	Brown 1 M5-Parcial-SC70371	1967	30/07/2025	0,083863821	588	
	C+T – B° El Cerrito M1	1964	23/06/2025	0,114345357	940	
	C+T- BROWN 1 M3	1983	29/12/2025	0,07276201	850	
	C+T - BROWN 1 M6 - SC70168-RE1980	1980	04/12/2025	0,09948874	699	
	Red Secundaria Brow 1 M4	1976	31/10/2025	0,193288463	1926	
	Subtotal			**0,611828022**	**5453**	
Instalación con zona de expansion	Esperanza Oeste 2 – Longchamps Cuenca	1963	24/06/2025	0,091320528	592	
	Subtotal			**0,091320528**	**592**	
MPG´S	DIPAC-DON ORIONE VIEJO-RES 1972	1972	09/10/2025	0,363222577	3810	
	Subtotal			**0,363222577**	**3810**	
OPCT	DRSO - Dto. Almirante Brown-OPCT - B° L	1962	12/06/2025	0,204712701	348	

	Subtotal			**0,204712701**	**348**	
	Totales			**1,271083828**	**10203**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: ESTEBAN ECHEVERRIA

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20**				**Observaciones**
		Habilitación		**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI**	
		N°	**Fecha**			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo	C+T Santa Catalina 2 Etapa M4 - Parcial S(	1970	03/10/2025	0,103832037	430	
	C+T Santa Catalina 2 Etapa M7 - Parcial S(	1971	06/10/2025	0,023536258	136	
	Subtotal			**0,127368296**	**566**	
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**0,127368296**	**566**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: EZEIZA

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20**				**Observaciones**
		Habilitación		**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI**	
		N°	**Fecha**			
Cierre de malla con zona de expansion						

	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	RSC Ezeiza Sur 5	1978	28/11/2025	1,054360157	2291	
	Subtotal			**1,054360157**	**2291**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT	OPCT- TESTIGOS DE JEHOVA- RES 195	1951	16/01/2025	0,193365999	5	
	Subtotal			**0,193365999**	**5**	
	Totales			**1,247726156**	**2296**	
Obras por terceros solicitadas						

Partido de: LOMAS DE ZAMORA

Identificación de la Obra		**Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20**				**Observaciones**
		Habilitación		**Area Incorporada**	**Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI**	
		N°	**Fecha**			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion						
	Subtotal					
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales					

Obras por terceros solicitadas						

	EXPANSION DE REDES CLOACALES CON TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO OBRAS HABILITADAS Y SOLICITADAS EN EL AÑO 2025 Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe Anual 20° Año de Concesión	
aysa		IAT3-C-S-PRO 03	exPL IA Nº 42

Región Sudoeste
Partido de: PRESIDENTE PERON

Identificación de la Obra		Obras Habilitadas y Solicitadas en el Año 20				Observaciones
		Habilitación		Area Incorporada	Población Incorporada s/ Censo 2022 (Inf 38) sin CI	
		N°	Fecha			
Cierre de malla con zona de expansion						
	Subtotal					
Cloaca + Trabajo						
	Subtotal					
Instalación con zona de expansion	Barrio San Pablo (Parcial)	1950	10/01/2025	0,068804192	531	
	Subtotal			**0,068804192**	**531**	
MPG´S						
	Subtotal					
OPCT						
	Subtotal					
	Totales			**0,068804192**	**531**	
Obras por terceros solicitadas						

	RED DE CLOACAS	Informe Anual	
aysa	COLECTORAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-RED 01	ex PL IA Nº 43

Capital Federal

Partido de: CAPITAL FEDERAL

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10001	DARWIN	1400		1						
10002	JUSTO JUAN B AV	1700		3						
10003	ATACALCO	1700		1						
10004	JUSTO JUAN B AV	1200		2						
10005	SARAZA	1300		1						
10006	ESTRADA	0		1						
10007	PICHEUTA	1600		1						
10008	BUTTELER PJE	0		2,5						
10009	HIDALGO	1100		0,5						
10010	CASTILLO CATULO	2700		1,5						
10011	RONDEAU	2700		1,5						
10012	DE LUCA ESTEBAN	2200		1						
10013	DEL LIBERTADOR AV	3200		1,9						
10014	JUSTO JUAN B AV	900		7,1						
10015	JUSTO JUAN B AV	1900		4,2						
10016	MITRE BARTOLOME	2800		2						
10017	REPUBLICA	500		3						
10018	SARMIENTO AV	2600		2						
10019	CHUTRO PEDRO PROF DR	3300		2,5						
10020	ACHALA	3500		1,5						
10021	MORENO PERITO AV	400		3						
10022	27 DE FEBRERO AV	5100		1						
10023	MORENO PERITO AV	1200		1,3						
10024	MANZI HOMERO	2900		1						
10025	MORENO PERITO AV	900		3						
10026	SALVIGNY	1700		0,8						
10027	DARQUIER JUAN	900		1						
10028	LANIN	0		1						
10029	SANTO DOMINGO	3400		1						
10030	NECOCHEA	100		1,6						
10031	GALVEZ MANUEL	200		1,5						
10032	ZONZA BRIANO PEDRO	100		2						
10033	VICTORICA MIGUEL C	100		1						
10034	BRAUN MENENDEZ EDUAR	300		2						
10035	PINEDO AV	800		2						
10036				3						
10037	ANTARTIDA ARGENTINA AV	2000		4						
10038				2						
10039	CALLE 5	0		3						
10040	ALCORTA AMANCIO AV	4000		2						
10041	AUSTRALIA	3000		2						
10042	D'ESPOSITO ARNALDO	100		2						
10043	GENA	500		2						
10044	HORNOS GRAL	1800		2						
10045	MIRAVE	3100		3						
10046	ISABEL LA CATOLICA	900		2						
10047	SALVIGNY	1700		2						
10048	27 DE FEBRERO AV	5100		2						
10049	PARIS	500		1,3						
10050	JUSTO JUAN B AV	8400		2,5						
10051	SASTRE MARCOS	6100		1						
10052	LOZANO PEDRO	5800		1						
10053	LASTRA AV	4300		1						
10054	GUTIERREZ RICARDO	3400		1						
10055	ASAMBLEA AV	1600		1						
10056	ASAMBLEA AV	1500		0,8						
10057	PAZ GRAL AV	12900		1						
10058	PAZ GRAL AV	10400		2						
10059	ROFFO ANGEL H DR	7000		1						
10060	ZELADA	4600		1,8						
10061	DIRECTORIO AV	4100		2						
10062	AMEGHINO FLORENTINO D	900		2						
10063	TANDIL	4300		1						
10064	OLIVERA AV	700		1,2						
10065	SAN JUAN BAUTISTA DE L	1500		1,2						
10066	MORENO PERITO AV	2800		4,5						
10067	VARELA	2400		2,5						
10068	LAFUENTE AV	2100		2,5						
10069	RIESTRA NORBERTO DE L	2800		4						
10070				4						
10071	PUMACAHUA	0		1						

10072	ARGENTINA AV	6200		2						
10073	DEL VALLE MARIA REMED	3700		5						
10074	ECHEANDIA	3200		3						
10075	LACARRA AV	1600		1,2						
10076	DELLEPIANE LUIS JOSE T	3900		1,2						
10077	FERNANDEZ MORENO BAL	1700		1						
10078	VARELA	1400		1,8						
10079	BALBASTRO	2600		4						
10080	MARTI JOSE	1300		0,8						
10081	MORENO PERITO AV	4000		2						
10082	CASTAÑON	3600		1						
10083	BERG CARLOS	3600		1						
10084	O'GORMAN	3600		0,5						
10085	CHARRUA	3700		0,5						
10086	27 DE FEBRERO AV	5300		4,5						
10087	PERGAMINO	4000		2,2						
10088	ESCALADA AV	5300		7,5						
10089	27 DE FEBRERO AV	6200		20						
10090	ECHEVERRIA	3100		1						
10091				1						
10092	LA CACHILA	8600		1						
10093	PICO	1500		1						
10094	VEDIA	1700		1						
10095	GRECIA	4800		0,5						
10096	CALZADILLA SANTIAGO	1400		2						
10097	USHUAIA PJE	1900		1						
10098	VERTIZ VIRREY AV	1900		1						
10099	BASAVILBASO LEOPOLDO	900		1						
10100	FIGUEROA ALCORTA PRES	6700		7						
10101	URTUBEY CLODOMIRO CO	2300		1						
10102	GUZMAN AV	0		2						
10103	CORRIENTES AV	6100		2						
10104	AIZPURUA	3700		3						
10105	USHUAIA PJE	1900		2						
11349	DELLEPIANE LUIS JOSE T	5400		0,75						
11350	LAFUENTE AV	1800		0,8						
11351				3,83						
11352	PAZ GRAL AV	16800		6,42						
11353				0,3						
				235,5						
	TOTAL DE CUADRAS :	**235,5**								

	RED DE CLOACAS	Informe Anual	
aysa	COLECTORAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-RED 01	ex PL IA Nº 43

Región Norte

Partido de: SAN FERNANDO

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10749				0,8						
10750				0,8						
10752	MURCHO	0		0,8						
10753	BERUTI F	700		0,9						
10754	BERUTI F	800		0,9						
10755	UNCAL PASCUALA DEL	700		1						
10756	ENTRE RIOS	800		1						
10757	QUIRNO COSTA	1900		0,5						
10758	URCOLA	800		1						
10759	PINTO GRAL	1700		0,9						
10760	CALLAO	900		0,9						
10761	BESARES CNEL	900		0,4						
10762	BESARES CNEL	1000		0,4						
10763	GARCIA MANSILLA ALTE	900		1						
10764	JUNIN	700		1						
10768	BROWN ALTE	500		1,2						
10769	CANE MIGUEL	400		0,9						
10770	BROWN ALTE	600		0,4						
10771	BROWN ALTE	800		0,6						
10772	GARCIA MANSILLA ALTE	1800		1,9						
10773	AVELLANEDA NICOLAS AV	1400		0,9						
10776				0,7						
10780	PAZ	600		0,9						
10781	SANTOS SAYAS DE LOS	2600		0,6						
10782	GUIDO SPANO	600		1,6						
10783	PRIMERA JUNTA	2800		0,3						
10784	GUIDO SPANO	500		0,3						
10785	PRADO	2800		0,6						
10786				0,6						
10789	IRIONDO SIMON DE	0		0,9						
10790	GARCIA MANSILLA ALTE	3100		1						
10791	PEREZ MAXIMO	400		0,9						
10792	MAIPU	1700		1						
10794	LIBERTADOR DEL GRAL AV	0		0,8						
10795	SARMIENTO	700		1						
10796	VIEYTES HIPOLITO	700		1						
10799	CANE MIGUEL	1300		1						
10800	PEREZ MAXIMO	500		0,6						
10801	CANE MIGUEL	5200		0,5						
10804	PEREZ GALDOS	1900		0,5						
10806				1						
10807	INGENIEROS JOSE	2200		0,9						
10808	DESVIO VIAS FCGBM	1500		1						
10809	SOBREMONTE AV	700		0,9						
10810				0,3						
10813	ARIAS GRAL	3100		1,5						
10814	QUIRNO COSTA	400		1						
10815	MARZI DE	700		1						
10816	PRIMERA JUNTA	2700		0,5						
10817	25 DE MAYO	500		1						
10818	25 DE MAYO	600		1						
10819	25 DE MAYO	700		1						
10820	ARIAS GRAL	800		1						
11331				1,05						
11343	SARMIENTO	1600		1						
				47,15						
	TOTAL DE CUADRAS :	**47,15**								

Partido de: TIGRE

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
11098	BRASIL (T)	0		1,2						
11099	BUENOS AIRES (T)	1200		1						
11101	BRASIL (T)	0		1						
11102	BRASIL (T)	100		1,2						
11103	CORDOBA (T)	1300		0,5						
11104	PIZARRO CNEL	1200		2						
11107	MORALES CNEL	1100		0,9						
11108	MORALES CNEL	1000		0,9						
11109	CHACABUCO (T)	200		0,5						

11110	CHACABUCO (T)	100		0,8					
11120	SAENZ PEÑA (T)	800		0,8					
11127	UBIETO RICARDO INT AV	700		2					
11128	AYACUCHO	800		0,8					
11129				0,6					
11130	MAIPU (T)	500		0,6					
11131	MASCHWITZ	300		0,6					
11132	MONTES DE OCA (T)	1000		2					
11133	GARCIA LUIS DR	1300		1					
11134	GARCIA LUIS DR	1500		1					
11135	VILELA CNEL (T)	0		1					
11136	VILELA CNEL (T)	100		1					
11137	VILELA CNEL (T)	200		1,5					
11138	BROWN ALTE (T)	600		1					
11139	EL POLLO (T)	1600		1					
11140	EL POLLO (T)	100		1					
11141	SALTA (T)	1300		1					
11143	MARTINEZ M V DE	0		1					
11144	SALDIAS	1100		1					
11145	SALDIAS	1100		1					
11320	HUDSON (T)	400		0,85					
11321	AVELLANEDA (T)	300		0,4					
				31,15					
	TOTAL DE CUADRAS :	**31,15**							

Partido de: SAN ISIDRO

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10862	PIÑERO	1200		0,9						
10864	RIVERA	300		1						
10865	SAENZ VALIENTE BENJAM	2800		1						
10866	JUNCAL	3000		1						
10867	LARUMBE MONS	3100		1,2						
10868	PANAMA	2400		1,6						
10869	DORREGO	2100		0,7						
10874	DORREGO	1800		1,4						
10875	TALCAHUANO	2400		1,2						
10876	JUNCAL	1500		0,7						
10877	JUNCAL	1500		0,8						
10878	JUNCAL	1600		1						
10879	JUNCAL	1900		0,4						
10915	MISIONES	1000		0,7						
10916	O'HIGGINS	800		0,9						
10917	O'HIGGINS	900		0,9						
10918	LINIERS	900		0,9						
10919	LINIERS	800		0,9						
10920	MARINSALTA	1000		0,3						
10921	LEMOS JOSE LEON SGTO	1700		0,6						
10923	HAEDO	1600		0,9						
10924	HAEDO	1700		0,9						
10925	PAZ GRAL	1600		0,9						
10926	RIOBAMBA	0		0,7						
10928	IBAÑEZ	2000		1,2						
10929	BOLIVAR	300		0,8						
10930	LA SALLE JUAN BAUTISTA	2200		1,5						
10931	LA SALLE JUAN BAUTISTA	2300		1,1						
10932	RAWSON	1900		1						
10939	MANZONE	900		1,5						
10941	LOPEZ VICENTE FIDEL	1400		0,9						
10942	MADERO EDUARDO	1900		0,7						
10943	GRANADA NICOLAS	900		1,2						
10944	FERNANDEZ ESPIRO	700		0,9						
10946	BECCAR COSME	0		1,3						
10947	ELORTONDO	800		1						
10948	ELORTONDO	900		0,7						
10949	ELORTONDO	900		0,9						
10950	DE LA RIBERA SOR CAMIL	500		0,8						
10951	MITRE AV	600		0,8						
10952	MITRE AV	700		0,8						
10953	MITRE AV	800		1						
10954	MADERO EDUARDO	1600		0,7						
10955	REPETTO DOMINGO	1500		0,8						
10956	PERDRIEL	1400		0,8						
10958	ROCA PRES	500		1						
10960	DIAZ JUAN JOSE	2100		1						
10961	AYACUCHO	600		1						
10962	RONDEAU	500		1						
10963	PAZ JOSE C	600		1						
10965	NECOCHEA	1800		1						
10966	CORRIENTES	1300		1						
10967	LIBERTADOR DEL AV	13200		1,2						

10968	CASARES CARLOS	2400		1					
10969	LAS HERAS	2800		0,7					
10970	GUTIERREZ RICARDO	2800		1					
10971	PARANA	800		2					
10972	PARANA	900		1					
10973	PARANA	1100		1					
10974	PIROVANO	300		1					
10975	NECOCHEA	1900		1					
10977	LIBERTADOR DEL AV	17800		1					
10978	BOLIVAR	400		1					
10979				0,9					
10980	PERDRIEL	1500		0,8					
10981	LOPEZ VICENTE FIDEL	1300		0,9					
10982	QUINTANA PRES	1900		0,7					
10983	PASTEUR	1400		1					
10984	PAZ GRAL	200		1					
10985	CHUBUT	600		1					
10986	GUIRALDES RICARDO	1100		1					
10987	RIVERA INDARTE	500		1					
10988	SANTANA MAESTRO	200		1					
10989	FRENCH	2300		1					
10992	CASARES CARLOS	2500		1					
10993	CORRIENTES	1400		1					
11311	BRASIL	1000		0,5					
11312	JUNCAL	600		0,7					
11338	GURRUCHAGA	2300		1,07					
				75,37					
	TOTAL DE CUADRAS :	**75,37**							

Partido de: SAN MARTIN

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10994	A 44-ILLIA A	2600		1,3						
10995	D 141-LACROZE	1000		1,1						
10996	D 141-LACROZE	900		1,6						
10997	RODRIGUEZ PEÑA	900		0,5						
11000	64-3 DE FEBRERO	1800		0,9						
11001	43-ROSARIO	3000		0,8						
11002	47-CHACO	3000		0,8						
11003	49-CATAMARCA	3000		0,8						
11004	51-CORRIENTES	3000		0,8						
11005	53-GUTIERREZ	3000		0,8						
11006	55-SAN JUAN	3000		0,8						
11007	57-SAN LUIS	3000		0,8						
11008	15-CALLE 15	3600		0,8						
11009	17-CALLE 17	3700		0,9						
11010	17-CALLE 17	3600		1,1						
11011	P 90-90 PJE	700		1,2						
11012	P 90-90 PJE	500		0,8						
11013	15-CALLE 15	3700		0,5						
11015	41-BAHIA BLANCA	3700		1,7						
11016	96-BERMEJO	1800		1						
11017	96-BERMEJO	1700		1						
11018	100-ENTRE RIOS	1200		0,9						
11019				0,9						
11020	75-CONGRESO	3700		2						
11021	88-JUJUY	3200		1						
11022	79-COLEGIO MILITAR	3700		2						
11024				1,5						
11025	D 82-LARRALDE CRISOLO(	3400		0,9						
11026	83-ARENALES	3600		0,9						
11027	D 86-ARISTIDES JULIO	3400		0,5						
11028	83-ARENALES	3800		0,9						
11031	D 84-IDOLO UNO	3500		2						
11032	D 82-LARRALDE CRISOLO(	3500		1,6						
11033	D 88-IGARZABAL	3500		1,6						
11034	D 88-IGARZABAL	3500		0,3						
11035	D 88-IGARZABAL	3600		0,5						
11036	D 85-POZOS	3600		0,6						
11037	A 101-BALBIN RICARDO DA	3000		0,6						
11043	A 64-PERON JUAN DOMIN(	5000		1						
11044	A 64-PERON JUAN DOMIN(	5100		1						
11045	121-SUIPACHA SEGUNDA	2500		1,4						
11046	62-VIDAL AGUSTIN R PROF	5100		1						
11047	62-VIDAL AGUSTIN R PROF	5300		2						
11048	D 141-LACROZE	2300		1,6						
11049	D 141-LACROZE	2300		0,5						
11050	D 141-LACROZE	2200		0,5						
11052	D 50-TORNQUIST	5900		0,9						
11053	25-ALCORTA AMANCIO	5800		2						
11054	25-ALCORTA AMANCIO	5700		0,8						

11055	25-ALCORTA AMANCIO	5500		1						
11056	25-ALCORTA AMANCIO	5100		1,8						
11057	25-ALCORTA AMANCIO	5000		1,6						
11058	25-ALCORTA AMANCIO	4800		1,6						
11059	144-CABRAL SGTO	1800		0,9						
11060	43-SARMIENTO	6100		1						
11061	69-ESMERALDA	5100		2						
11062	69-SAN MARTIN	5100		0,8						
11065	124-COLON	3100		1,3						
11067	75-ARTIGAS	5100		1,1						
11075	69-SAN MARTIN	6700		1,3						
11080	88-ALVAREZ AGUSTIN	1800		1						
11081	90-CALLE 90	1600		1						
11082	92-GONZALEZ J V	1700		1						
11083	39-SILVA M	3800		1						
11084	60-RIVADAVIA	3100		1						
11088	93-TUCUMAN	3000		1						
11089	35-MENDOZA	4000		1						
11090	35-MENDOZA	3900		1						
11091	35-MENDOZA	3800		1						
11092	35-MENDOZA	3700		1						
11093	35-MENDOZA	3600		1						
11094	88-ALVAREZ AGUSTIN	1700		1						
11095	92-GONZALEZ J V	1800		1						
11096	39-SILVA M	3900		1						
11097	73-ISLAS MALVINAS	2200		1						
11315				1,5						
11326	44-JUAREZ	3800								
11327	44-JUAREZ	3700								
				82,3						
	TOTAL DE CUADRAS :	**82,3**								

Partido de: VICENTE LOPEZ

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
11146	LIBERTADOR DEL AV	2000	Habilitación N°461	2			0,3183		Habilitación N°461	
11148	ALBARELLOS	4400		1						
11149	ALBARELLOS	4300		1						
11150	GARCIA MANUEL PROF	4900		1						
11151	RIVADAVIA BERNARDINO	3700		1						
11153	RAMSEYER EDUARDO	4000		2						
11154	RAMSEYER EDUARDO	3600		2						
11155	DARWIN CARLOS	100		1						
11157	BORGES FRANCISCO	100		1						
11158	PELLIZA MARIANO	400		1						
11159	CRUZ BARTOLOME	2700		2,5						
11160	ALBERDI JUAN BAUTISTA	200		1,5						
11161	DIAZ DE SOLIS JUAN	2500		3						
11162	ROSALES LEONARDO CON	2500		0,8						
11163	CAMACUA	400		2,1						
11167	ITALIA	400		2						
11168	ITALIA	500		1						
11169	MALAVER ANTONIO	400		1,2						
11172	DIAZ DE SOLIS JUAN	1700		2						
11173	ARENALES	400		1						
11174				1,2						
11175	SAN MARTIN JOSE DE GRA	400		1,2						
11176				1,3						
11177	DIAZ DE SOLIS JUAN	1200		1,5						
11178	ROCA JULIO ARGENTINO G	400		1,5						
11179	MELO CARLOS FRANCISC(	600		2						
11180	DIAZ DE SOLIS JUAN	800		1,2						
11181	GUEMES MARTIN MIGUEL I	600		1,8						
11182	ALFONSIN RAUL R PRES	700		1						
11183	LAS HERAS JUAN GREGOF	600		1,5						
11184	LAVALLE JUAN GRAL	600		1,5						
11185	ALFONSIN RAUL R PRES	300		4						
11186				1						
11187	PARANA	3100		2						
11188	PARERA BLAS	3700		2,5						
11189	JUSTO JUAN B	3000		1,2						
11190	ESPAÑA	2500		1						
11192	PARERA BLAS	2900		2,2						
11193	DORREGO MANUEL CNEL	3400		0,2						
11194	PARERA BLAS	2700		1						
11195	PARERA BLAS	3300		2						
11196	HAEDO MARTIN J	2600		0,5						
11197	AYACUCHO	100		0,5						
11199	ESPAÑA	100		0,5						
11200	BOGADO FELIX CNEL	1900		2,5						
11201	CROACIA PJE	1500		1,5						

11204	PARANA	4300		2						
11205	CABRAL JUAN BAUTISTA S	4200		1						
11206	BOUCHARD HIPOLITO ALF	4700		1						
11207	WHITE GUILLERMO	4400		4						
11208				2,5						
11209	GARCIA MANUEL PROF	4800		1						
11210				2,5						
11211	ECHEVERRIA ESTEBAN	3500		3						
11212	BERMUDEZ JUSTO GERMA	4200		1						
11213	ACHA MARIANO	3400		1						
11214	ALBARELLOS	4100		1						
11215	CABRAL JUAN BAUTISTA S	3000		1						
11216	SAENZ PEÑA ROQUE PRES	4400		2						
11217	AVALOS AMARO INT CNEL	2800		1						
11218	CABRAL JUAN BAUTISTA S	2800		1						
11219	ALBERDI JUAN BAUTISTA	4000		2						
11220	GUTIERREZ RICARDO	3900		1						
11221	AGUERO JULIAN SEGUNDO	2800		1						
11222	PARERA BLAS	1900		3						
11223	VANINI EDMUNDO PADRE	400		2						
11224	ECHEVERRIA ESTEBAN	300		1						
11225	ALSINA ADOLFO	3100		0,8						
11226	ANTARTIDA ARGENTINA	4000		2						
11227	VIAMONTE JUAN JOSE	5500		1						
11228	ARGERICH COSME DR	3500		1						
11229	ACASSUSO DOMINGO DE	6500		1						
11230	FORMOSA	6100		1						
11233	CALVO CARLOS	2000		1						
11234	PRINGLES JUAN P CNEL	4900		3,2						
11235	BALCARCE GRAL	1700		1						
11236	BALCARCE GRAL	1500		2						
11237	BERUTI ANTONIO LUIS	1200		4,6						
11238	ALVAREZ AGUSTIN	5200		1						
11239	ALSINA ADOLFO	5200		1						
11240	HABANA	400		3,2						
11241	VENEZUELA	5200		2,2						
11242	ALVAREZ AGUSTIN	4800		2,3						
11243	BLANCO ENCALADA MANU	500		1,2						
11244	PARANA	4500		1						
11245	PARANA	4200		1						
11247	WHITE GUILLERMO	4700		1						
11248	SIVORI EDUARDO	5000		1						
11249	PARERA BLAS	3900		1						
11250	REPETTO NICOLAS DR	3600		1						
11251	ECHEVERRIA ESTEBAN	3300		1						
11252	PARERA BLAS	3200		1						
11253	UZAL FRANCISCO CNEL	3200		1						
11254	LUGONES LEOPOLDO	3200		1						
11255	ECHEVERRIA ESTEBAN	2500		2						
11256	ADER BERNARDO AV	3200		1						
11257				2						
11258	RIVERA P I DE	6100		1						
11259	BERUTI ANTONIO LUIS	1800		1						
11260	BALCARCE GRAL	1800		1						
11261	BLANCO ENCALADA MANU	1800		0,7						
11262	LIBERTAD	5000		1						
11263	FLEMING ALEXANDER	2000		1						
11264	SANCHEZ DE THOMPSON I	900		1						
11265	BALCARCE GRAL	1300		1						
11266	POSADAS GERVASIO	1400		1						
11267	MORRIS WILLIAMS C	1000		2						
11268	BALCARCE GRAL	400		1						
11269	LAPRIDA FRANCISCO NAR	3100		1						
11270	JUSTO JUAN B	1800		1						
11271	LIBERTADOR DEL AV	300		1						
11272	AZCUENAGA MIGUEL DE	0		1						
11273	PARERA BLAS	700		1						
11274	INGENIEROS JOSE DR	4500		1						
11275	IRIGOYEN BERNARDO DE	3400		1						
11276	ALFONSIN RAUL R PRES	1300		7,2						
11277	WHITE GUILLERMO	4500		2,5						
11279	GARCIA MANUEL PROF	4800		0,7						
11280	ECHEVERRIA ESTEBAN	3200		1						
11281	INGENIEROS JOSE DR	3800		1						
11282	INGENIEROS JOSE DR	3800		1						
11283	REPETTO NICOLAS DR	3500		1						
11284	PARERA BLAS	3800		1						
11285	USPALLATA	700		1						
11286	LIBERTADOR DEL AV	0		0,5						
11287	LIBERTADOR DEL AV	0		0,5						
11288	LIBERTADOR DEL AV	300		1						
11289	LIBERTADOR DEL AV	300		1						

11290	ADER BERNARDO AV	3100		1						
11291	ADER BERNARDO AV	2900		1						
11292	ADER BERNARDO AV	2500		1						
11293				1						
11294				1						
11295	RIVERA P I DE	6000		1						
11296	RIVERA P I DE	5900		1						
11297	LIBERTAD	4900		1						
11298	BERUTI ANTONIO LUIS	1700		1						
11299	LIBERTAD	4800		1						
11300	BLANCO ENCALADA MANU	1700		0,3						
11301	BLANCO ENCALADA MANU	1500		1						
11302	AZURDUY JUANA	1000		1						
11303	HAEDO MARTIN J	5100		2						
11304	BERUTI ANTONIO LUIS	900		1						
11305	LOS POZOS	5100		1						
11306	LOS POZOS	4900		1						
11307	PARANA	2700		1						
11316	PRIMERA JUNTA	2500		1,1						
11317	AMBROSETTI JUAN BAUTIS	6400		0,7						
11319	PRIMERA JUNTA	2800		2,55						
11330	DRAGO LUIS MARIA	6000		2						
11339	DIAZ DE SOLIS JUAN	2200		1,09						
				211,74						
	TOTAL DE CUADRAS :	**211,74**								

	RED DE CLOACAS	Informe Anual	
aysa	COLECTORAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-RED 01	ex PL IA Nº 43

Región Norte

Partido de: SAN MIGUEL

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

Partido de: JOSE C PAZ

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

Partido de: MALVINAS ARGENTINAS

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

Partido de: ESCOBAR

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

Partido de: PILAR

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

	RED DE CLOACAS	Informe Anual	
aysa	COLECTORAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-RED 01	ex PL IA Nº 43

Región Oeste

Partido de: LA MATANZA

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10110	PAZ GRAL AV (LMN)	12700		0,9						
10118	SAN MARTIN GRAL AV (LM	1300		1,02						
10119	SAN MARTIN GRAL AV (LM	1600		0,89						
10121	OCAMPO	1700		1,34						
10128	RINCON	600		3,5						
10132	RINCON	400		1,47						
10137	EL URUNDEL	2200		0,67						
10145	EL SAUCO	0		2,16						
10147	EL CHAJA	0		0,94						
10156	PERDRIEL	0		1,27						
10164	WHITE ING	4500		0,59						
10165	ZAPIOLA	4500		0,6						
10167	PERON JUAN DOMINGO PF	4500		0,58						
10168	EL ALPATACO	0		0,7						
10169	EL ALPATACO	0		2,86						
10171	EL CORBATITA	200		0,97						
10172	LA GAVIOTA	0		0,4						
10174	EL JUNCO	0		1,5						
10175	EL BAGRE	0		0,6						
10208	GONZALEZ J N FRAY	0		1,07						
10211	EL SULUPE	1900		0,33						
				24,36						
	TOTAL DE CUADRAS :	**24,36**								

Partido de: MORON

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10224	CARRERE INT	500		1,2						
10225	CRAMER AMBROSIO	500		1,2						
10227	LOPEZ ESTANISLAO GRAL	1100		1,55						
				3,95						
	TOTAL DE CUADRAS :	**3,95**								

Partido de: TRES DE FEBRERO

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10258	ALVEAR MARCELO T DE (2	4300		0,96						
10260	CARHUE	4200		0,91						
10262	SAN EDUARDO	2000		1,45						
10263	REPUBLICA (D 20)	600		0,98						
10265	MIGUENS MARTIN	7800		1,45						
10271	ALVEAR MARCELO T DE (2	3900		0,96						
10272	ALVEAR MARCELO T DE (2	3800		0,96						
10273	ALVEAR MARCELO T DE (2	3700		0,96						
10278	REPUBLICA (D 20)	500		0,98						
				9,61						
	TOTAL DE CUADRAS :	**9,61**								

Partido de: HURLINGHAM

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

Partido de: ITUZAINGO

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

	RED DE CLOACAS	Informe Anual	
aysa	COLECTORAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-RED 01	ex PL IA Nº 43

Región Oeste

Partido de: MERLO

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

Partido de: MORENO

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

	RED DE CLOACAS	Informe Anual	
aysa	COLECTORAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-RED 01	ex PL IA Nº 43

Región Sudeste

Partido de: AVELLANEDA

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10280	ATACAMA	600		0,55						
10281	ROCA GRAL AV	200		0,84						
10285	BARADERO	6600		0,4						
10286	BARADERO	6100		0,77						
10287	BEGUERESTAIN	2000		0,74						
10290	BELGRANO MANUEL AV	1100		0,7						
10291	BELGRANO MANUEL AV	2400		1,2						
10294	BUSTAMANTE	0		0,47						
10299	CESPEDES CNEL	1400		0,66						
10300	CHAÑAR	1100		0,75						
10301	CHASCOMUS	1100	CM10301 SC70325 PROG. DE INST. DE COLECTO	0	697	19/09/2025	0,057	4	CM10301 SC70325 PROG. DE INST. DE CC	
10302	CORDERO ALTE	6800	CM10302 SC70325 PROG DE INST DE COLECTOR	0	696	19/09/2025	0,036	2	CM10302 SC70325 PROG DE INST DE COL	
10303	CORDERO ALTE	6000		1,15						
10306	DEBENEDETTI AGUSTIN	2800	CM10306 SC70325 PROG. DE INST. DE COLECTO	0	698	19/09/2025	0,111	6	CM10306 SC70325 PROG. DE INST. DE CC	
10309	DORREGO CNEL	2800		0,39						
10310	CAMPO ESTANISLAO DEL	400		0,94						
10311	FREIRE JOSE M	800		1,12						
10318	LARRALDE CRISOLOGO	5700		3						
10319	LINCOLN	400		1,44						
10322	BRAVO MARIO	1000		1,19						
10325	MERLINO	700		1,47						
10326	MERLO	6500		0,65						
10327	MITRE BARTOLOME PRES	6700		3						
10328	MORENO MARIANO	6600		4						
10329	O'HIGGINS GRAL	100		0,67						
10330	PAUNERO GRAL	0		1,19						
10331	PAYSANDU	600		2,14						
10332	PODESTA JOSE J	0		0,84						
10333	POSADAS	1200		2						
10336	RONDEAU CNEL	900		1,15						
10338	SAN MARTIN GRAL	2200		0,92						
10339	SAN NICOLAS	6300		1,2						
10342	TRES ARROYOS	6400		1,37						
10344	VILLEGAS GRAL	6000		1,85						
10347	MANSILLA GRAL	1300		0,94						
10349	LOLA MORA	0		1,63						
10350	TIERRA DEL FUEGO	400		1,29						
10351	DIAZ CNEL	1200		0,69						
10352	FIORITO CARLOS	700		3,3						
10353	GUIFRA TTE CNEL	1100		0,84						
10354	SAN LUIS	700		1,2						
10356	VARELA FLORENCIO	1300		0,95						
10358	CABILDO	900		0,4						
10359	CABILDO	800		1,5						
10360	LUCENA COMTE	100		1,57						
10361	ZEBALLOS ESTANISLAO	1800		2,73						
10364	COMBATIENTES DE MALVI	1100		0,88						
10366	ROCA GRAL AV	2600		1,12						
11332	LLORENTE CNEL	100		0,22						
				58,02						
	TOTAL DE CUADRAS :	**58,02**								

Partido de: LANUS

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10367	2 DE MAYO	3700		2,75						
10368	25 DE MAYO AV	400		1,46						
10369	25 DE MAYO AV	500		2,82						
10371	25 DE MAYO AV	800		1,57						
10372	25 DE MAYO AV	900		0,5						
10375	CANE MIGUEL	800		1						
10377	CASARES CARLOS GDOR	2600		1,5						
10378	CAVOUR CAMILO V	3700		1,38						
10379	CHICLANA FELICIANO	3200		0,66						
10380	SANTIAGO DEL ESTERO	1400		2,68						
10383	GAEBELER GUILLERMO	1300		1						
10384	GONZALEZ JOAQUIN V	1200		5,32						
10386	GUATEMALA	2000		2,15						
10388	YRIGOYEN HIPOLITO PRES	5200		1,34						
10389	YRIGOYEN HIPOLITO PRES	3100		1,07						

10390	HABANA	300		0,68						
10391	GONZALEZ JOAQUIN V	1400		1,38						
10392	JUNCAL	300		0,59						
10399	MARMOL JOSE	400		0,75						
10401	SANTIAGO CNEL	1500		0,75						
10402	MORENO JOSE MARIA	500		1,04						
10403	MORENO JOSE MARIA	800		2						
10406	SCALABRINI ORTIZ RAUL	400		1						
10408	PERON EVA AV	1700		0,51						
10412	QUINDIMIL FRANCISCO SD	4500		0,76						
10414	RIO DE JANEIRO	3200		1						
10415	QUITO	100		1,66						
10419	ROMA	2800		0,66						
10420	SANTIAGO DEL ESTERO	2800		1,54						
10422	SAN LORENZO	600		1,08						
10424	TEJEDOR CARLOS GDOR	800		1						
10425	TIMOTE CNEL	3300		1,23						
10427	VELEZ SARSFIELD DALMA	1100		1,57						
10428	VARELA FLORENCIO	1200		1,05						
10429	VARELA FLORENCIO	1100		1,36						
10430	VARELA FLORENCIO	1400		0,41						
10431	VIAMONTE JUAN JOSE GD	700		2						
10433	YRIGOYEN HIPOLITO PRES	3600		2						
10434	YRIGOYEN HIPOLITO PRES	3400		3						
10435	YRIGOYEN HIPOLITO PRES	3400		1						
10436	MARMOL JOSE	400		1,23						
10437	IRIGOYEN GDOR	400		0,88						
11366	25 DE MAYO AV	800								
				59,33						
	TOTAL DE CUADRAS :	**59,33**								

Partido de: QUILMES

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10438	LA PLATA AV	1400		2,03						
10439	LA PLATA AV	1700		4,09						
10440	LA PLATA AV	2800		1,67						
10441	329-LAVALLEJA	1800		0,3						
10442	329-LAVALLEJA	3000		0,86						
10444	357-BARANDA ANDRES (O	0		0,83						
10445	301-JUJUY	200		0,61						
10446	323-AYOLAS	2000		0,84						
10447	323-AYOLAS	500		0,66						
10450	165-CALLE 165	1000		1,17						
10453	63-BELL ALLISON (Q)	700		1,22						
10454	63-BELL ALLISON (O)	900		1,5						
10456	327-SARRATEA	3100		1,15						
10457	326-TRIUNVIRATO	500		1,1						
10458	326-TRIUNVIRATO	3200		1,27						
10460	310-TUCUMAN	1700		1,13						
10461	379-UNAMUNO M DE (QO)	2600		1,25						
10462				0,63						
10464	446-ZOLA EMILIO (E)	4700		0,44						
10466	328-BERUTI	1800		1,06						
10467	383-BLANCO JOSE A	500		0,44						
10468	383-BLANCO JOSE A	4300		1,68						
10469	473-BAHIA BLANCA	4900		0,78						
10471	63-BELL ALLISON (Q)	800		0,92						
10472	401-BOLIVIA	900		1,18						
10473	401-BOLIVIA	3000		1,09						
10474	58-SARMIENTO (Q)	0		1						
10475	19-BRANDSEN	600		1,22						
10476	19-BRANDSEN	700		1,13						
10477	406-SANTA CRUZ	700		1,1						
10478	CALCHAQUI AV (RP 36)	4300		0,73						
10479	CALCHAQUI AV (RP 36)	3000		0,8						
10480	CALCHAQUI AV (RP 36)	1600		0,95						
10481	CALCHAQUI AV (RP 36)	1700		0,15						
10482	CALCHAQUI AV (RP 36)	2600		0,12						
10483	CALCHAQUI AV (RP 36)	2900		0,4						
10484	CALCHAQUI AV (RP 36)	3100		0,8						
10486	CALCHAQUI AV (RP 36)	3900		2,2						
10487	ARGERICH COSME DR	4600		1,79						
10490	334-ANDRADE (Q)	1000		0,3						
10493	LAMADRID AV	3400		0,87						
10495	352-VALLE A DEL	0		0,75						
10496	358-ALVEAR TORCUATO D	1000		1,32						
10497	311-ISLAS MALVINAS	1700		0,75						
10498	378-JUSTO JUAN B (OO)	3000		1,82						
10501	22-GUIDO	600		2,08						
10502	351-GRAN CANARIA (Q)	3400		0,74						

10504	330-FORNABAIO VICTOR	3000		0,8						
10506	MOSCONI GRAL AV	3000		1,42						
10507	MOSCONI GRAL AV	3100		1						
10510	370-CURIE MADAME (OO)	2200		2,54						
10514	365-RODRIGUEZ MARTIN ((	100		1,2						
10515	141-PRINGLES (B)	400		2,3						
10516	60-PRINGLES (O)	1100		1,4						
10517	60-PRINGLES (Q)	900		1,69						
10518	485-CONDARCO (E)	4600		0,52						
10520	367-CONDARCO (O)	1100		2,03						
10521	221-CONSTITUCION	300		1,18						
10522	314-CORRIENTES	1600		0,48						
10523	215-LOMAS DE ZAMORA	100		1						
10524	62-LIBERTAD (O)	1200		1,13						
10525	385-MAIER G PROF	4800		0,81						
10526	350 BIS-GARCIA MARTIN ((	3400		1,34						
10528	67-MONROE (O)	1200		1,06						
10530	405-PARAGUAY	2000		2,12						
10531	312-PELLEGRINI CARLOS	1700		1,13						
10532	414-NICARAGUA	600		2,6						
10533	17-OLAVARRIA	600		0,85						
10534	307-OLIVIERI PEDRO INT	1700		1,8						
10535	154 BIS-ORIGONE	0		2,45						
10536	107-PAMPA	1000		0,81						
10538	5-PASO	0		1,11						
10539	106-PILCOMAYO	1400		1,25						
10540	106-PILCOMAYO	3400		0,96						
10541	469-QUINTANA MANUEL (E	3800		0,87						
10543	382-ROCCA A	4300		1,65						
10545	350-SCHWEITZER ALBERT	3400		1,18						
10547	330 BIS-CALLE 330 BIS	3000		0,91						
10548	333 BIS-CALLE 333 BIS	1000		0,3						
10549	379 BIS-CALLE 379 BIS	3700		0,44						
10550	383 BIS-CAPDEVILA	4400		1,38						
10552	318-SAN MAURO CASTELV	2000		0,44						
10554	255-CARABELAS	200		1,05						
10555	251-CRAMER	1000		0,55						
10556	157 BIS-CARBONETTI N	100		1,17						
10559	313-ENTRE RIOS	1700		0,48						
10560	380-ELUSTONDO PEDRO ((	3600		0,44						
10561	VARELA FLORENCIO AV	800		4,07						
10562	225-ESPORA TOMAS AV A(	100		1,79						
10563	341-CRAVIOTTO JOSE	3000		1,02						
10564	413-REPUBLICA DE CUBA	2200		0,78						
10565	468-CALLAO	4700		0,89						
10566	63-BELL ALLISON (O)	900		0,75						
10567	225-ESPORA TOMAS AV A(	100		1,5						
10568	6-SAAVEDRA	300		1,2						
10569	305-SAN JUAN	0		1,11						
10570	251-CRAMER	1000		0,75						
10571	490-ALBARRACIN PAULA	4600		0,9						
10572	331-LAPRIDA AV	600		1,93						
10574	CALCHAQUI AV (RP 36)	2800		0,77						
10575	CALCHAQUI AV (RP 36)	2900		0,63						
10576	469 BIS-LAS MALVINAS	5000		1,45						
11344	368-HUSARES (OO)	700		0,21						
				118,51						
	TOTAL DE CUADRAS :	**118,51**								

	RED DE CLOACAS	Informe Anual	
aysa	COLECTORAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-RED 01	ex PL IA Nº 43

Región Sudeste

Partido de: FLORENCIO VARELA

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

	RED DE CLOACAS	Informe Anual	
aysa	COLECTORAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-RED 01	ex PL IA Nº 43

Región Sudoeste

Partido de: ALMTE BROWN

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10577	30 DE SETIEMBRE	100		1,55						
10583	LA ROSA	300		0,9						
10586	PAZ JOSE MARIA GRAL	1000		0,85						
10591	SAN MIGUEL	700		0,9						
10592	BARCELLINI J E S DR	700		1						
10593	DE LA PEÑA JOSE	800		0,9						
10594	MONTE SANTIAGO	0		0,95						
10596	AVELLANEDA NICOLAS	0		1,2						
10598	FRIAS J A	500		0,65						
10604	QUINTANA	1900		0,8						
10605	RODRIGUEZ MARTIN	700		0,75						
10614	OBISPO COLOMBRES JOS	1700		2,03						
10617	30 DE SETIEMBRE	500		1,65						
10618	ESPORA TOMAS AV	200		0,8						
10620	ROCHA DARDO	200		0,85						
10621	QUINTANA	1700		1,5						
10622	PAZ JOSE MARIA GRAL	600		0,55						
10628	ESPORA TOMAS AV	1700		5						
10634	CANALE	0		0,7						
10635	SAN MARTIN AV	100		0,6						
10636	DE KAY JORGE	200		0,6						
10637	PERON PTE	700		1,1						
10640	AMENEDO	1200		0,7						
10642	THORNE JUAN	1000		1,05						
10644	YRIGOYEN HIPOLITO AV (F	12400		1,5						
10646	30 DE SETIEMBRE	0		1,55						
10647	FRIAS GRAL	100		3,3						
10648	OBISPO COLOMBRES JOS	1400		0,6						
11323	YRIGOYEN HIPOLITO AV (F	12300		0,9						
				35,43						
	TOTAL DE CUADRAS :	**35,43**								

Partido de: ESTEBAN ECHEVERRIA

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10653	ECHEVERRIA ESTEBAN	0		1,09						
10659	ALVEAR GRAL	300		1						
10660	CARDEZA EMILIO DR	500		1,2						
10664	ALBERDI JUAN BAUTISTA	200		1,35						
10665	ALSINA VALENTIN	300		1,3						
11369	NUESTRAS MALVINAS	1600								
				5,94						
	TOTAL DE CUADRAS :	**5,94**								

Partido de: EZEIZA

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10673				1,3						
10674	AVELLANEDA DR NICOLAS	1000		3						
10675	SAAVEDRA (EZ)	300		2						
10676	PAZ GRAL (EZ)	300		2						
10746	OBLIGADO RAFAEL	200		1,72						
10747	ITUZAINGO	200		1,1						
10748	PERON JUAN DOMINGO	0		1,1						
				12,22						
	TOTAL DE CUADRAS :	**12,22**								

Partido de: LOMAS DE ZAMORA

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
10685	CASTRO BARROS	1100		1,6						
10687	PALACIOS GRAL	1200		1,7						
10688	MELO	1200		1,1						
10689	SCHELL ALEJANDRO MON	1200		0,8						
10690	LEVALLE GRAL	100		3,5						
10691	LAMADRID	1200		2						
10692	FONROUGE	1200		2						
10693	COMAHUE	1300		1,3						
10694	24 DE MAYO	100		5,4						

10696	24 DE MAYO	600		1,7						
10702	CAPDEVILA GRAL	1100		1						
10706	RODRIGUEZ BRITO CARLO	700		0,9						
10707	COMAHUE	1800		0,75						
10708	FRENCH DOMINGO	1000		1,32						
10709	PIAGGIO A MONS	900		1						
10711	REPUBLICA DEL LIBANO	0		0,9						
10732	CAMPOS GRAL	1000		1						
10733	COLOMBRES JOSE EUSEB	1100		1						
10734	POSADAS GERVASIO A DE	200		2						
10735	PICUN LEUFU	1200		1						
10736	FRAY LUIS BELTRAN	300		1						
10737	SUCRE ANTONIO J DE GRA	100		1						
10738	SUCRE ANTONIO J DE GRA	300		4						
10739	ESTRADA JOSE MANUEL	400		2						
10740	PAYRO ROBERTO J	700		4						
11310	BROWN ALTE AV	3700		0,7						
				44,67						
	TOTAL DE CUADRAS :	**44,67**								

	RED DE CLOACAS	Informe Anual	
aysa	COLECTORAS FALTANTES	20° Año de Concesión	
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	IAT3-C-S-RED 01	ex PL IA Nº 43

Región Sudoeste

Partido de: PRESIDENTE PERON

N°	Calle	N° Calle	Nombre Obra	N° Cuadras	Con Habilitación				Sin Habilitación	Observaciones
					N° Habilitacion	Fecha	Logitud (Km)	N° Conexiones	Motivo	
	TOTAL DE CUADRAS :									

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

POBLACIÓN CON SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES POR SISTEMA DE TRATAMIENTO

Período: 01 de Enero al 31 de diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025

61-IAT3-C-S-PRO 04

Partido	Valores de Población según Censo 2022																			
	Población Total	Situación Inicial		Tratamiento Sistema Río de la Plata				Tratamiento Sistema Matanza-Riachuelo				Tratamiento Sistema Reconquista				Total de Población Servida con vuelco a los Sistemas de Tratamiento Actualizada al 2025 (*)			
		Población con Servicio	Porcentaje de Cobertura	Población con Servicio 2024	Poblacion Incorporada en 2025	Población con Servicios al 2025	Población con Servicios Actualizada al 2025 con CI (*)	Población con Servicio 2024	Poblacion Incorporada en 2025	Población con Servicios al 2025	Población con Servicios Actualizada al 2025 con CI (*)	Población con Servicio 2024	Poblacion Incorporada en 2025	Población con Servicios al 2025	Población con Servicios Actualizada al 2025 con CI (*)	Coeficiente de proyección Intercensal	Población del Partido Actualizada al 2025	Población con Servicios Actualizada al 2025 con CI (*)	Porcentaje de Cobertura
	[1]	[2]	[3] = (2/1)]	[4]	[5]	[6]=(4+5)	[7]=[6*CI]	[8]	[9]	[10]=(8+9)	[11]=[10*CI]	[12]	[13]	[14]=(12+13)	[15]=[14*CI]	CI	[16]	[17] = [7+11+15+MOI]	[18] = [17/16]
Capital Federal	**3.101.599**	**0**	**0,00%**	**3.101.599**		**3.101.599**	**3.101.599**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	1,000	**3.101.599**	**3.101.599**	**100,00%**
SAN FERNANDO	168.882	112.244	66,46%	0		0	0	0		0	0	153.547	384	153.931	153.931	1,001	168.972	153.931	91,10%
TIGRE	439.067	35.934	8,18%	0		0	0	0		0	0	218.245	5.251	223.496	223.496	1,003	440.431	223.496	50,74%
San Fernando-Tigre	607.949	148.178	24,37%	0		0	0	0		0	0	371.792	5.635	377.427	377.427	**N/A**	609.403	377.427	61,93%
San Isidro	295.978	44.140	14,91%	172.379		172.379	172.379	0		0	0	109.836		109.836	109.836	1,000	296.010	282.215	95,34%
San Martín	444.503		0,00%	240.675		240.675	240.675	0		0	0	118.820		118.820	118.820	1,001	445.013	359.495	80,78%
Vicente López	280.541		0,00%	277.992		277.992	277.992	0		0	0	0		0	0	1,001	280.684	277.992	99,04%
Región Norte	**1.628.971**	**192.318**	**11,81%**	**277.992**		**277.992**	**691.047**	**0**		**0**	**0**	**1.013.502**	**5.635**	**1.019.137**	**606.082**	**N/A**	**1.631.110**	**1.297.129**	**79,52%**
La Matanza	1.838.401	567.070	30,85%	69		69	69	967.379	4.044	971.423	971.423	0		0	0	1,002	1.841.381	971.492	52,76%
HURLINGHAM	186.221		0,00%	0		0	0	0		0	0	140.573		140.573	140.573	1,000	186.287	140.573	75,46%
ITUZAINGO	178.598		0,00%	0		0	0	0		0	0	91.360	148	91.508	91.508	1,001	178.741	91.508	51,20%
MORON	326.810		0,00%	54.024		54.024	54.024	5.568		5.568	5.568	265.752		265.752	265.752	1,000	326.866	325.344	99,53%
Morón	691.629		0,00%	54.024		54.024	54.024	5.568		5.568	5.568	497.685	148	497.833	497.833	**N/A**	691.893	557.425	80,57%
Tres de Febrero	362.319		0,00%	317.745	42	317.787	317.787	0		0	0	7.478	963	8.441	8.441	1,001	362.683	326.228	89,95%
Región Oeste	**2.892.349**	**567.070**	**19,61%**	**371.838**	**42**	**371.880**	**371.880**	**972.947**	**4.044**	**976.991**	**976.991**	**505.163**	**1.111**	**506.274**	**506.274**	**N/A**	**2.895.957**	**1.855.145**	**64,06%**
Avellaneda	366.117		0,00%	291.084	1.629	292.713	292.713	0		0	0	0		0	0	1,001	366.488	292.713	79,87%
Lanús	460.081		0,00%	283.462	12.267	295.729	295.729	46.161		46.161	46.161	0		0	0	1,000	460.081	341.890	74,31%
Quilmes	631.774		0,00%	480.399		480.399	480.399	0		0	0	0		0	0	1,001	632.591	480.399	75,94%
Región Sudeste	**1.457.972**	**0**	**0,00%**	**1.054.945**	**13.896**	**1.068.841**	**1.068.841**	**46.161**		**46.161**	**46.161**	**0**		**0**	**0**	**N/A**	**1.459.161**	**1.115.002**	**76,41%**
ALMTE. BROWN	583.209		0,00%	244.404	9.855	254.259	254.259	1.702	348	2.050	2.050	0		0	0	1,001	583.578	256.309	43,92%
ESTEBAN ECHEVERRIA	337.880	14.845	4,39%	0		0	0	200.581	566	201.147	201.147	0		0	0	1,002	338.563	201.147	59,41%
EZEIZA	198.620	19.390	9,76%	0		0	0	63.538	2.296	65.834	65.834	0		0	0	1,004	199.366	65.834	33,02%
Alte. Brown-E. Echeverría	1.119.709	34.235	3,06%	244.404	9.855	254.259	254.259	265.821	3.210	269.031	269.031	0		0	0	**N/A**	1.121.507	523.290	46,66%
Lomas de Zamora	685.644		0,00%	341.322		341.322	341.322	0		0	0	0		0	0	1,002	686.951	341.322	49,69%
Región Sudoeste	**1.805.353**	**34.235**	**1,90%**	**585.726**	**9.855**	**595.581**	**595.581**	**265.821**	**3.210**	**269.031**	**269.031**	**0**		**0**	**0**	**N/A**	**1.808.457**	**864.612**	**47,81%**
Total Concesión	**10.886.244**	**793.623**	**7,29%**	**5.392.100**	**23.793**	**5.415.893**	**5.828.948**	**1.284.929**	**7.254**	**1.292.183**	**1.292.183**	**1.518.665**	**6.746**	**1.525.411**	**1.112.356**	**N/A**	**10.896.283**	**8.233.487**	**75,56%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

NOTA: Dentro del Sistema Pluviocloacal del Radio Antiguo existen vuelcos a conductos pluviales por condiciones de sobrecarga, al Río de la Plata.

TRABAJOS DE MEJORA Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO

POBLACIÓN CON SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES POR SISTEMA DE TRATAMIENTO (Nuevas Áreas)

Período: 01 de Enero al 31 de diciembre del 2025

Informe Anual

Año 2025


61-IAT3-C-S-PRO 04 (Nuevas Áreas)

Partido	Valores de Población según Censo 2022															
	Población Total	Situación Inicial		Tratamiento Sistema Reconquista				Tratamiento Sistema Nuevas Áreas				Total de Población Servida con vuelco a los Sistemas de Tratamiento Actualizada al 2025 (*)			
		Población con Servicio	Porcentaje de Cobertura	Población con Servicio 2024	Poblacion Incorporada en 2025	Población con Servicios al 2025 (neta de MOI)	Población con Servicios Actualizada al 2025 con CI (*)	Población con Servicio 2024	Poblacion Incorporada en 2025	Población con Servicios al 2025	Población con Servicios Actualizada al 2025 con CI (*)	Coeficiente de proyección Intercensal	Población del Partido Actualizada al 2025	Población con Servicios Actualizada al 2025 con CI (*)	Porcentaje de Cobertura
	[1]	[2]	[3] = (2/1)]	[4]	[5]	[6]=(4+5)	[7]=[6*CI]	[8]	[9]	[10]=(8+9)	[11]=[10*CI]	CI	[12]=[1*CI]	[13] = [7+11]	[14] = [13/12]
SAN MIGUEL	327.650	149.852	45,74%	0		0	0	166.292	6.518	172.810	173.332	1,003	328.639	173.332	52,74%
JOSE C PAZ	326.527	0	0,00%	0		0	0	0		0	0	1,004	327.722	0	0,00%
MALVINAS ARGENTINAS	349.401	0	0,00%	0		0	0	0		0	0	1,001	349.824	0	0,00%
San Miguel-Paz-Malvinas	1.003.578	149.852	14,93%	0	0	0	0	166.292	6.518	172.810	173.332	N/A	1.006.186	173.332	17,23%
Escobar	256.071	20.462	7,99%	7.573		7.573	7.598	23.886	236	24.122	24.201	1,003	256.910	31.799	12,38%
Pilar	393.614	71.683	18,21%	70		70	70	71.840	1.964	73.804	74.167	1,005	395.551	74.238	18,77%
Región Norte	**1.653.263**	**241.997**	**14,64%**	**7.643**	**0**	**7.643**	**7.668**	**262.018**	**8.718**	**270.736**	**271.700**	**N/A**	**1.658.647**	**279.368**	**16,84%**
Merlo	581.484	124.243	21,37%	140.317		140.317	140.486	0		0	0	1,001	582.184	140.486	24,13%
Moreno	575.758	163.317	28,37%	182.924	8.263	189.331	189.598	0		0	0	1,001	576.571	189.598	32,88%
Región Oeste	**1.157.242**	**287.560**	**24,85%**	**323.241**	**8.263**	**329.648**	**330.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**N/A**	**1.158.755**	**330.084**	**28,49%**
Florencio Varela	488.103	179.389	36,75%	0		0	0	205.341	106	205.447	206.017	1,003	489.456	206.017	42,09%
Región Sudeste	**488.103**	**179.389**	**36,75%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.341**	**106**	**205.447**	**206.017**	**N/A**	**489.456**	**206.017**	**42,09%**
Presidente Perón	101.994	26.699	26,18%	0		0	0	49.715	531	50.246	50.465	1,004	102.439	50.465	49,26%
Región Sudoeste	**101.994**	**26.699**	**26,18%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.715**	**531**	**50.246**	**50.465**	**N/A**	**102.439**	**50.465**	**49,26%**
Total Concesión	**3.400.602**	**735.645**	**21,63%**	**330.884**	**8.263**	**337.291**	**337.752**	**517.074**	**9.355**	**526.429**	**528.182**	**N/A**	**3.409.297**	**865.934**	**25,40%**

* Coeficiente de Crecimiento Intercensal (CI) subyacentes de las proyecciones de población del INDEC, con adaptación realizada por AYSA.

17. CARTOGRAFIA EXPANSIÓN CLOACAL

Planos de Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales Región Capital Federal

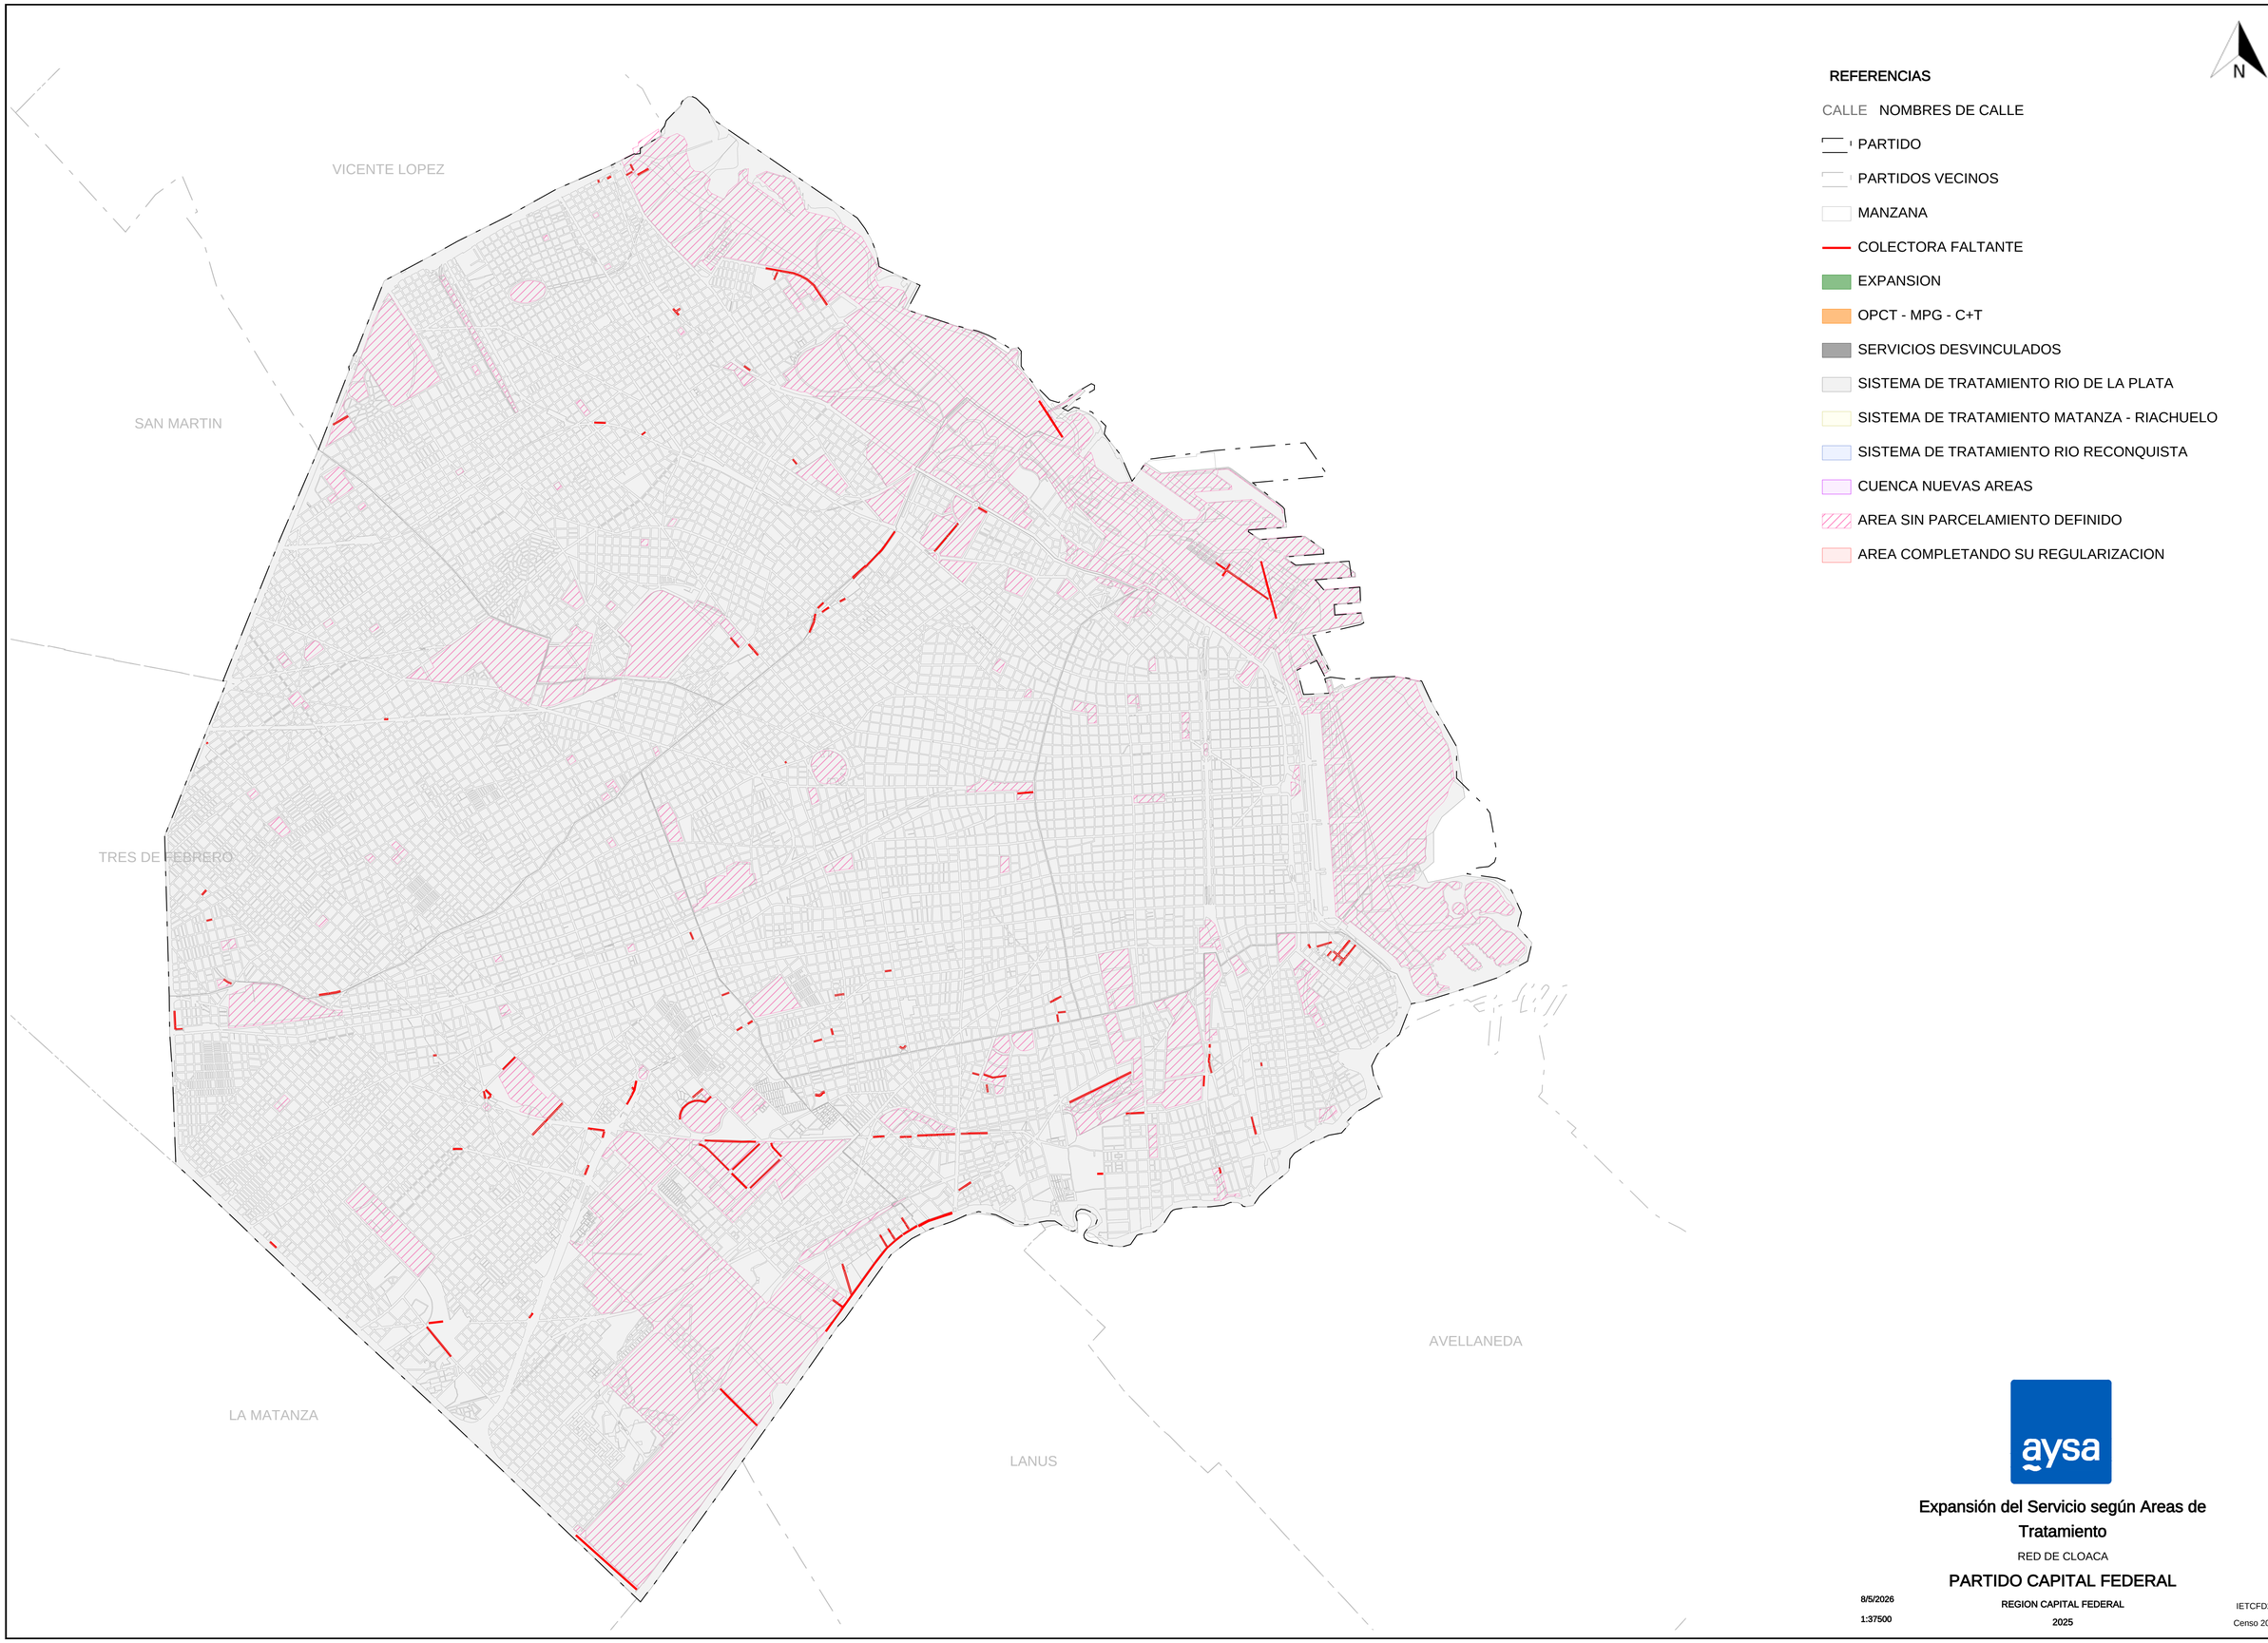

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO CAPITAL FEDERAL

8/5/2026

1:37500


REGION CAPITAL FEDERAL

2025

IETCFD20

Censo 2022

Planos de Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales Región Norte

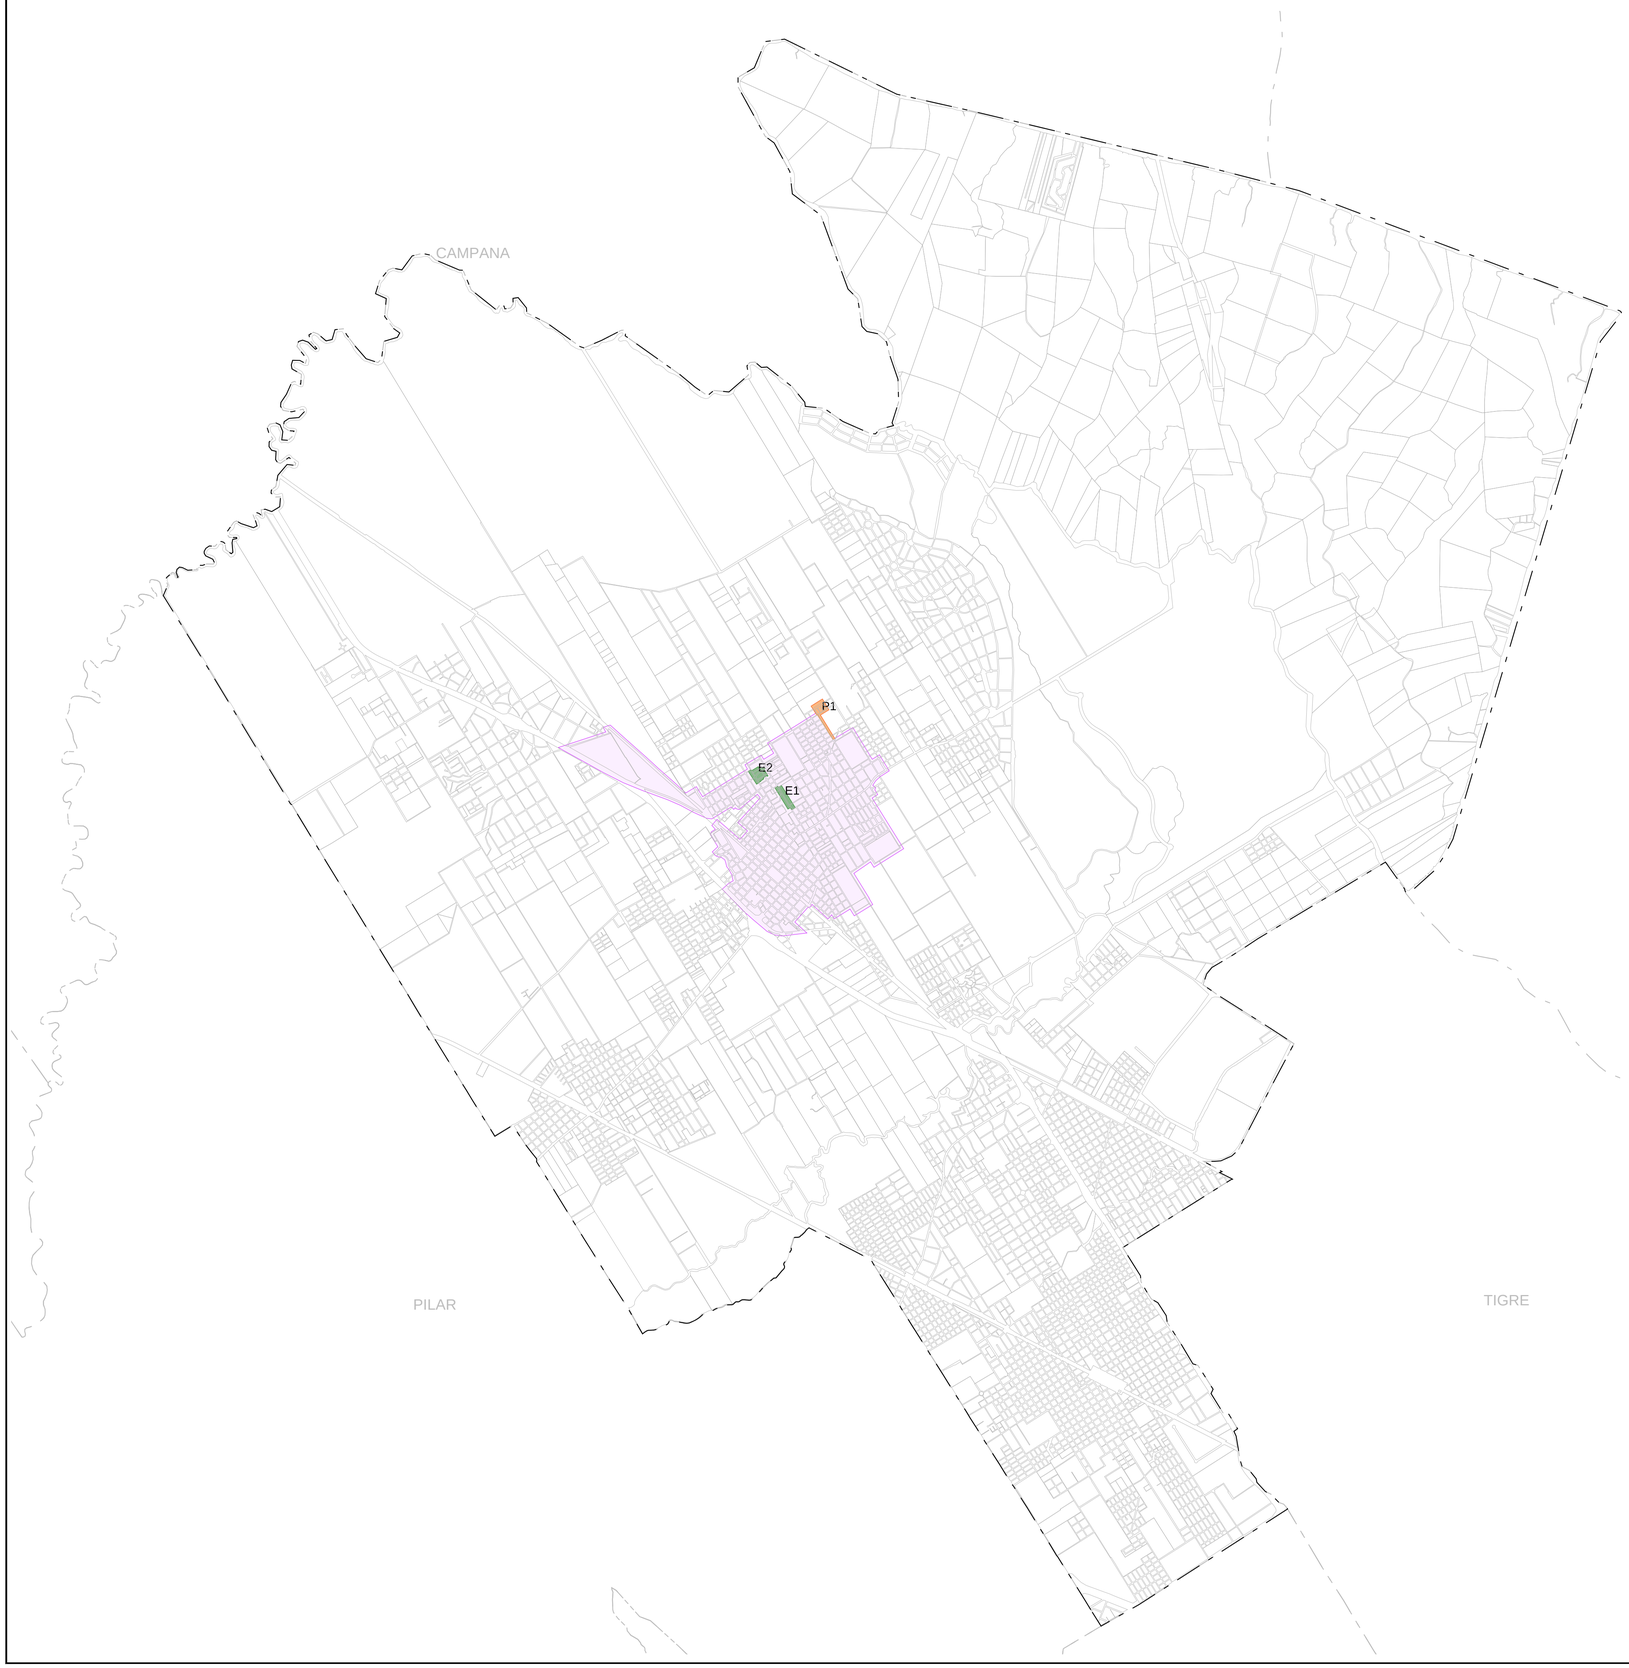

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	Mejora y Mantenimiento 2020
E2	Proyecto de Mejora y Mantenimiento 2021

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	HABILITACIÓN OPCT DE CLOACA B° 72 VIVIENDAS - ESCOBAR - RES. 988

SERVICIOS DESVINCULADOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO ESCOBAR

29/5/2026


1:47500

REGION NORTE

2025

IETESC20

Censo 2022

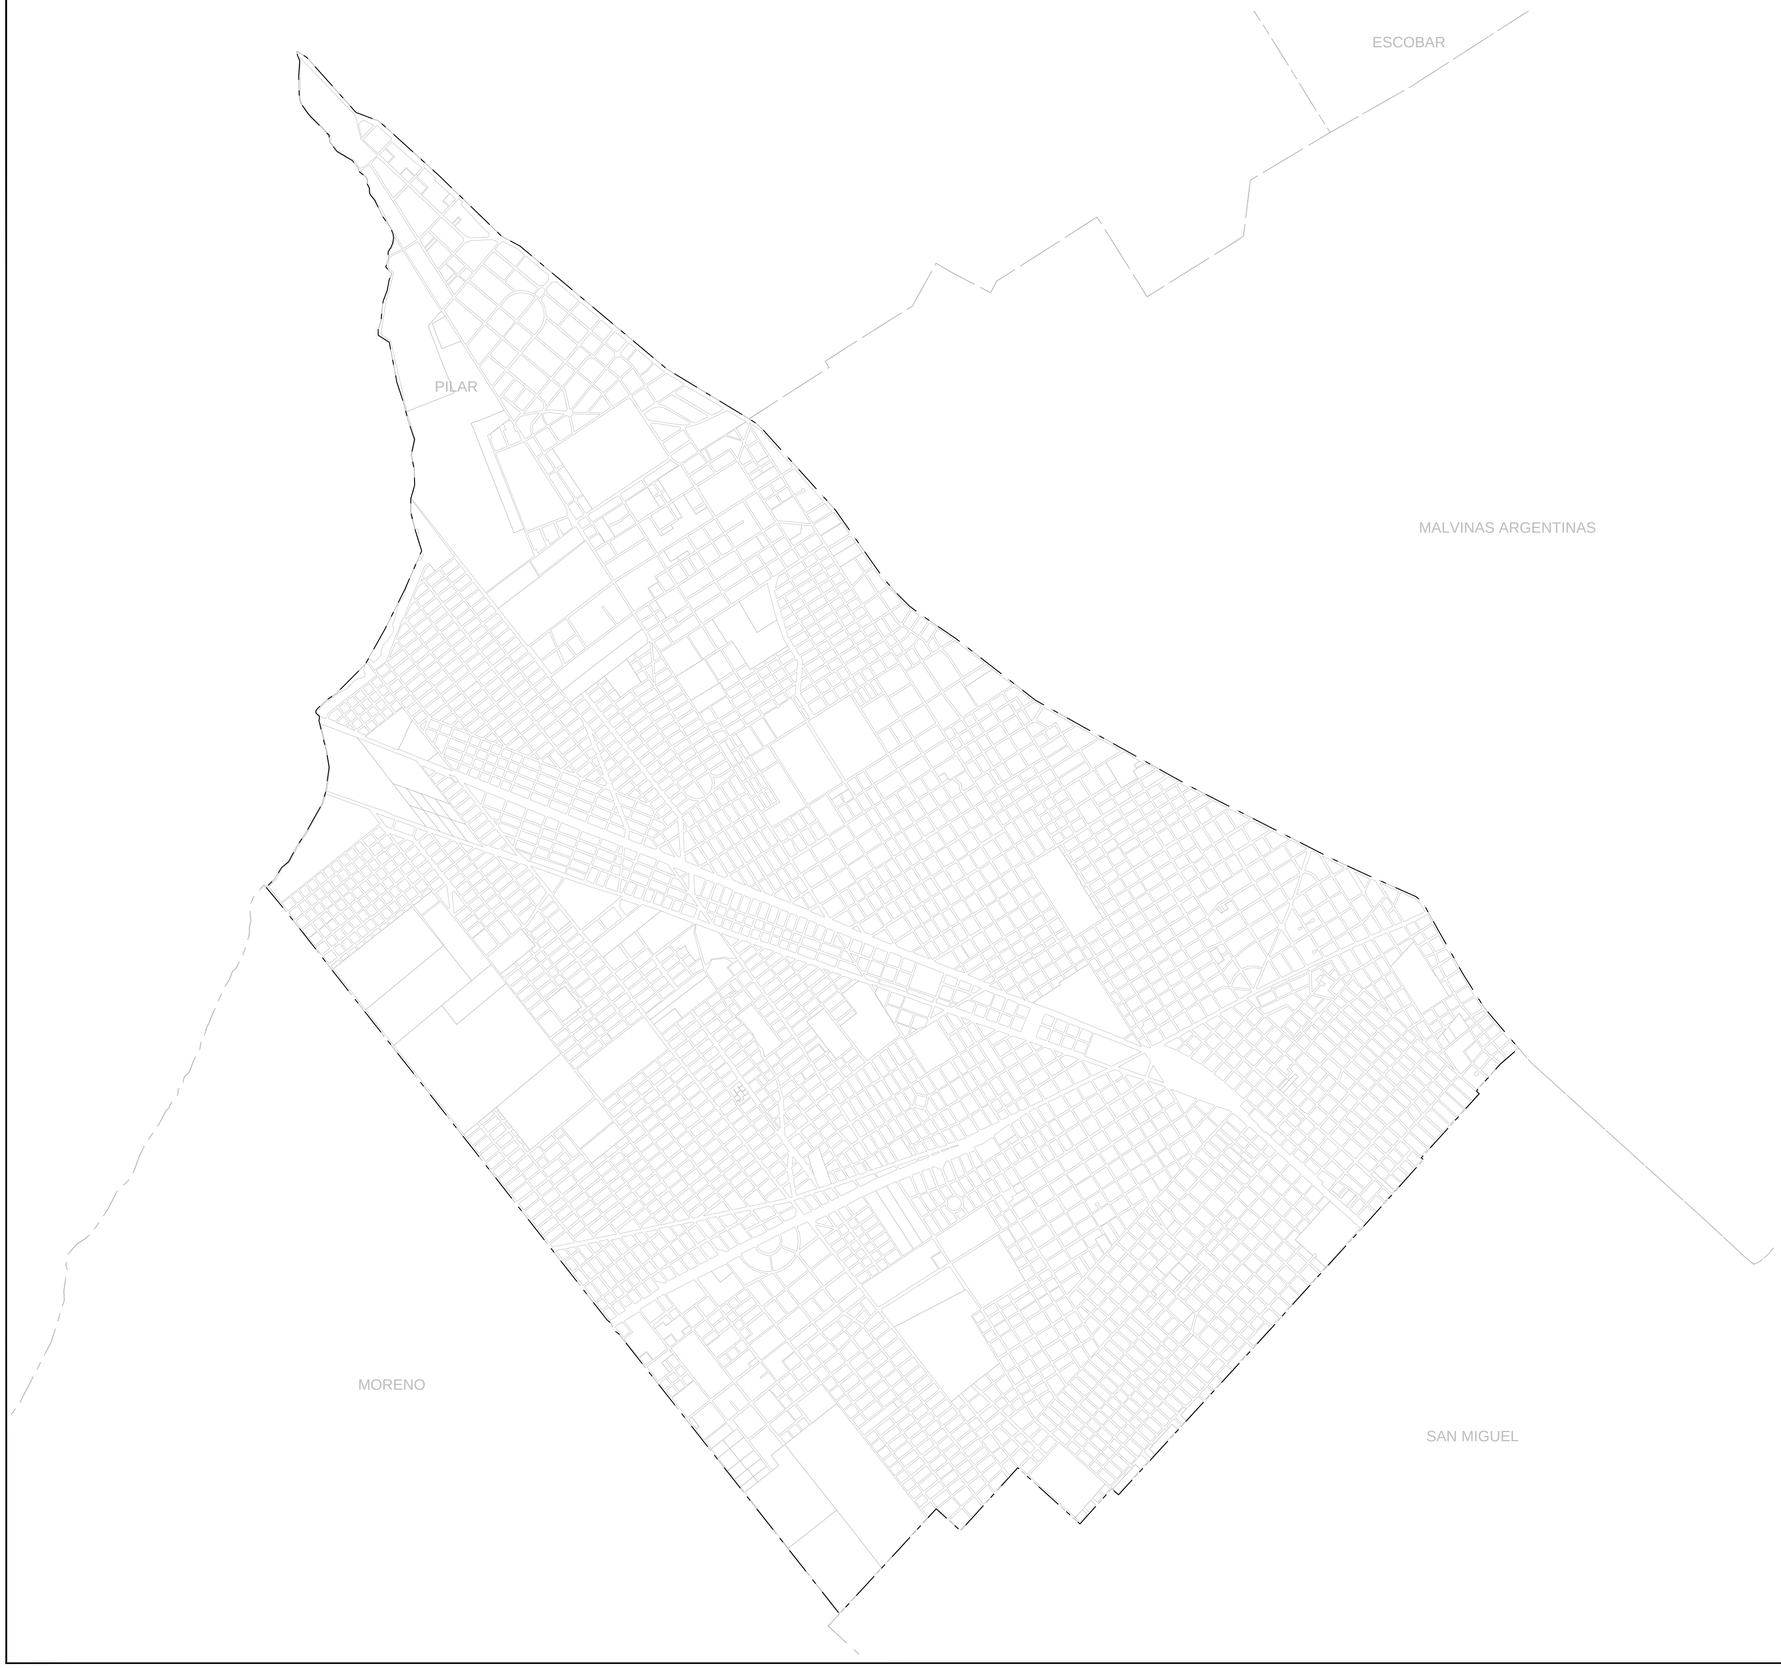

N

REFERENCIAS

- CALLE NOMBRES DE CALLE
- PARTIDO
- PARTIDOS VECINOS
- MANZANA
- COLECTORA FALTANTE
- EXPANSION
- OPCT - MPG - C+T
- SERVICIOS DESVINCULADOS
- SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA
- SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO
- SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA
- CUENCA NUEVAS AREAS
- AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO
- AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO JOSE C PAZ

29/5/2026


1:22500

REGION NORTE

2025

IETJCP20

Censo 2022

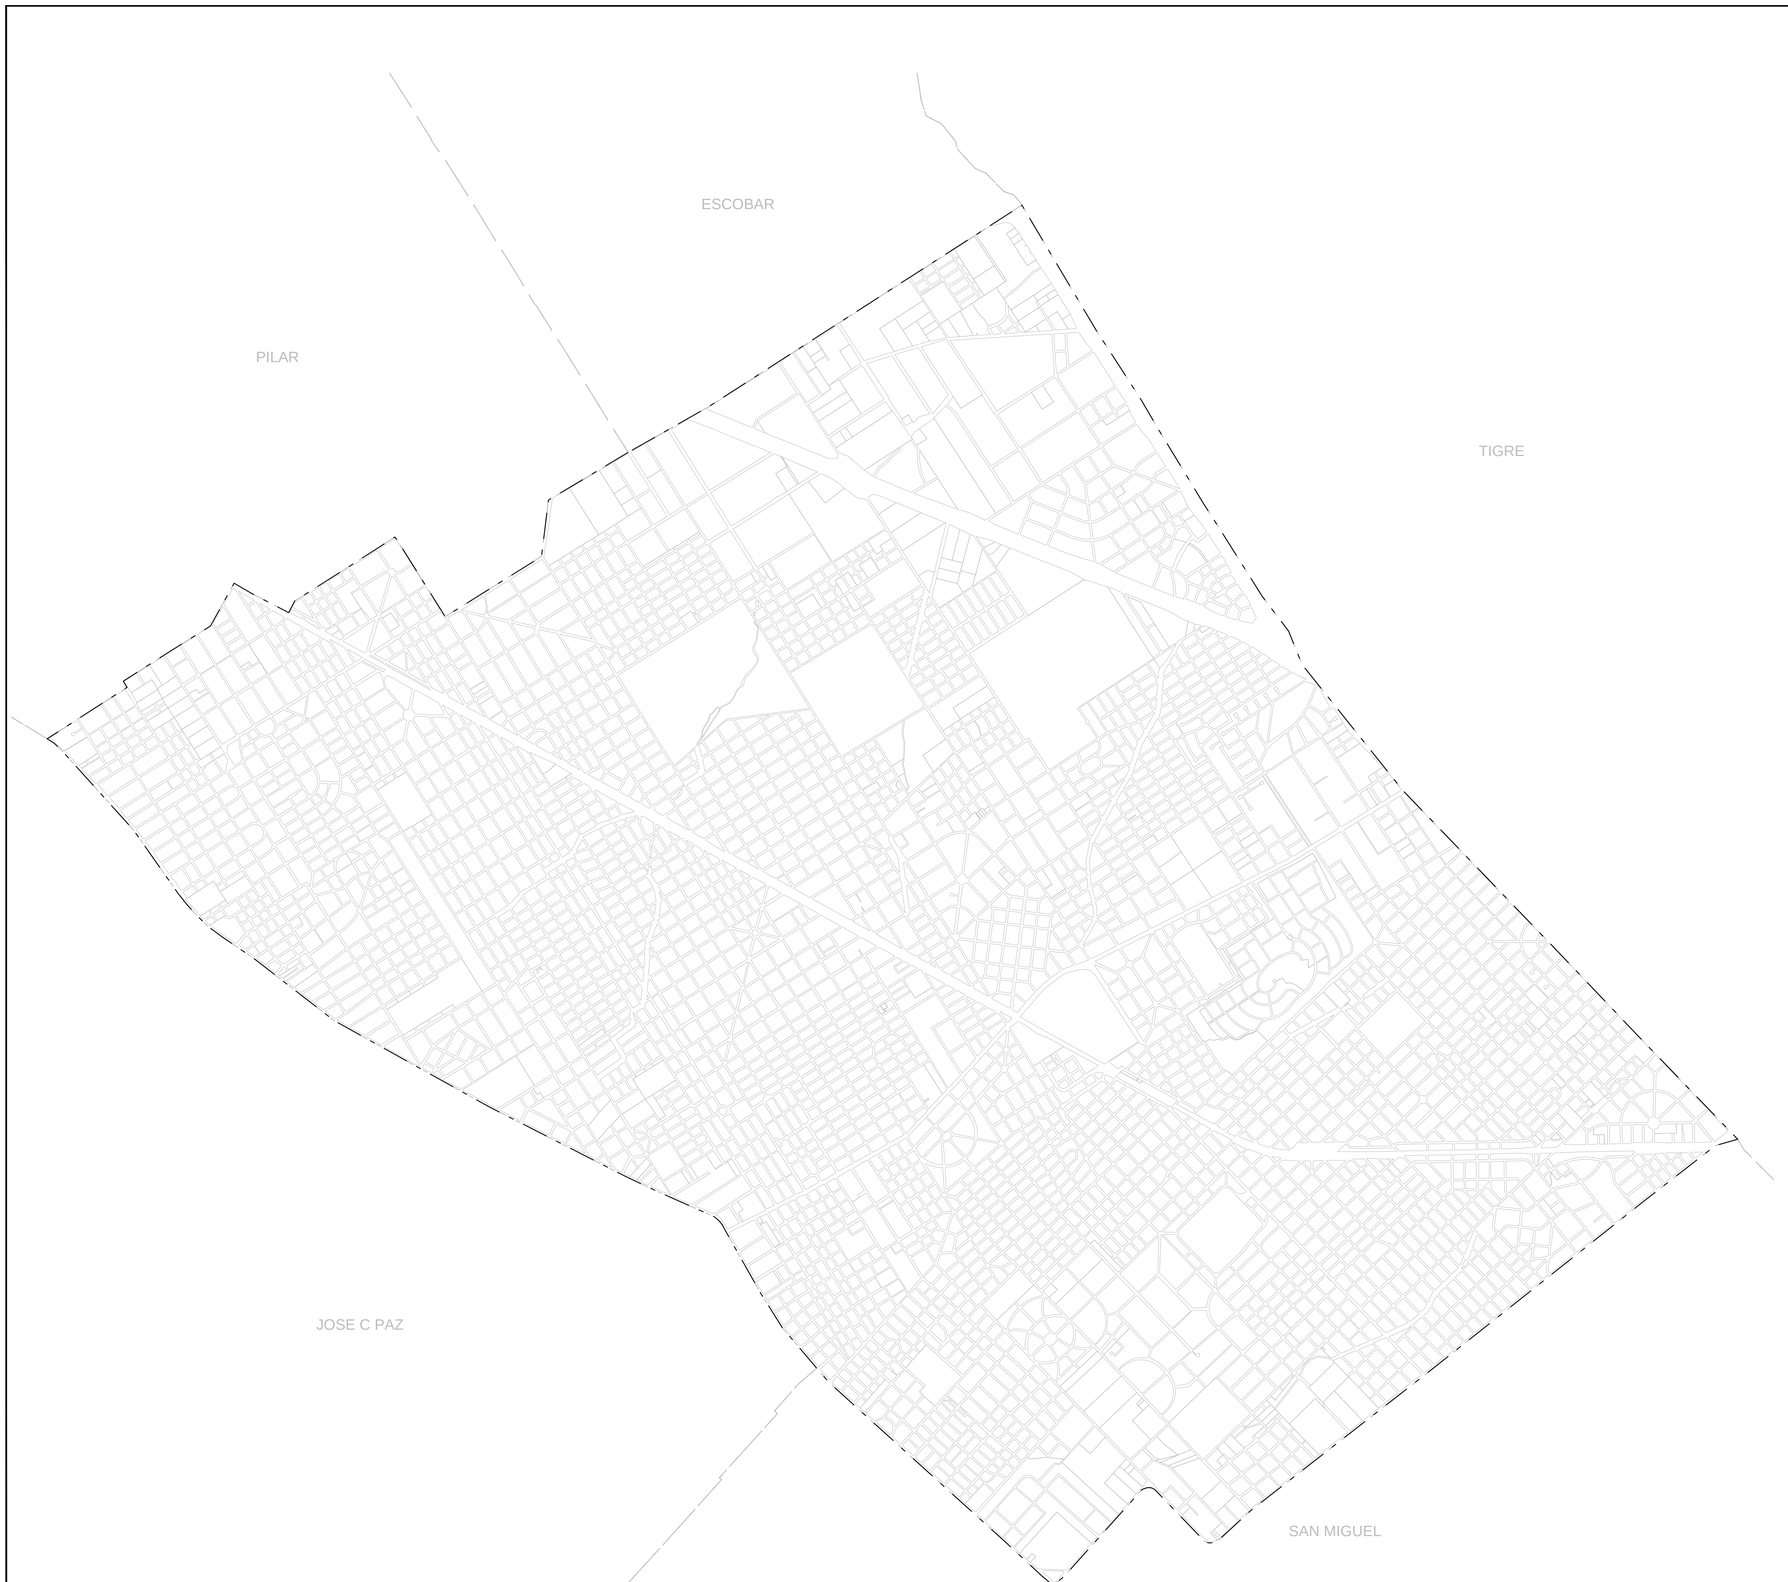

N

REFERENCIAS

- CALLE NOMBRES DE CALLE
- PARTIDO
- PARTIDOS VECINOS
- MANZANA
- COLECTORA FALTANTE
- EXPANSION
- OPCT - MPG - C+T
- SERVICIOS DESVINCULADOS
- SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA
- SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO
- SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA
- CUENCA NUEVAS AREAS
- AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO
- AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO MALVINAS ARGENTINAS

29/5/2026


1:22500

REGION NORTE

2025

IETMAR20

Censo 2022

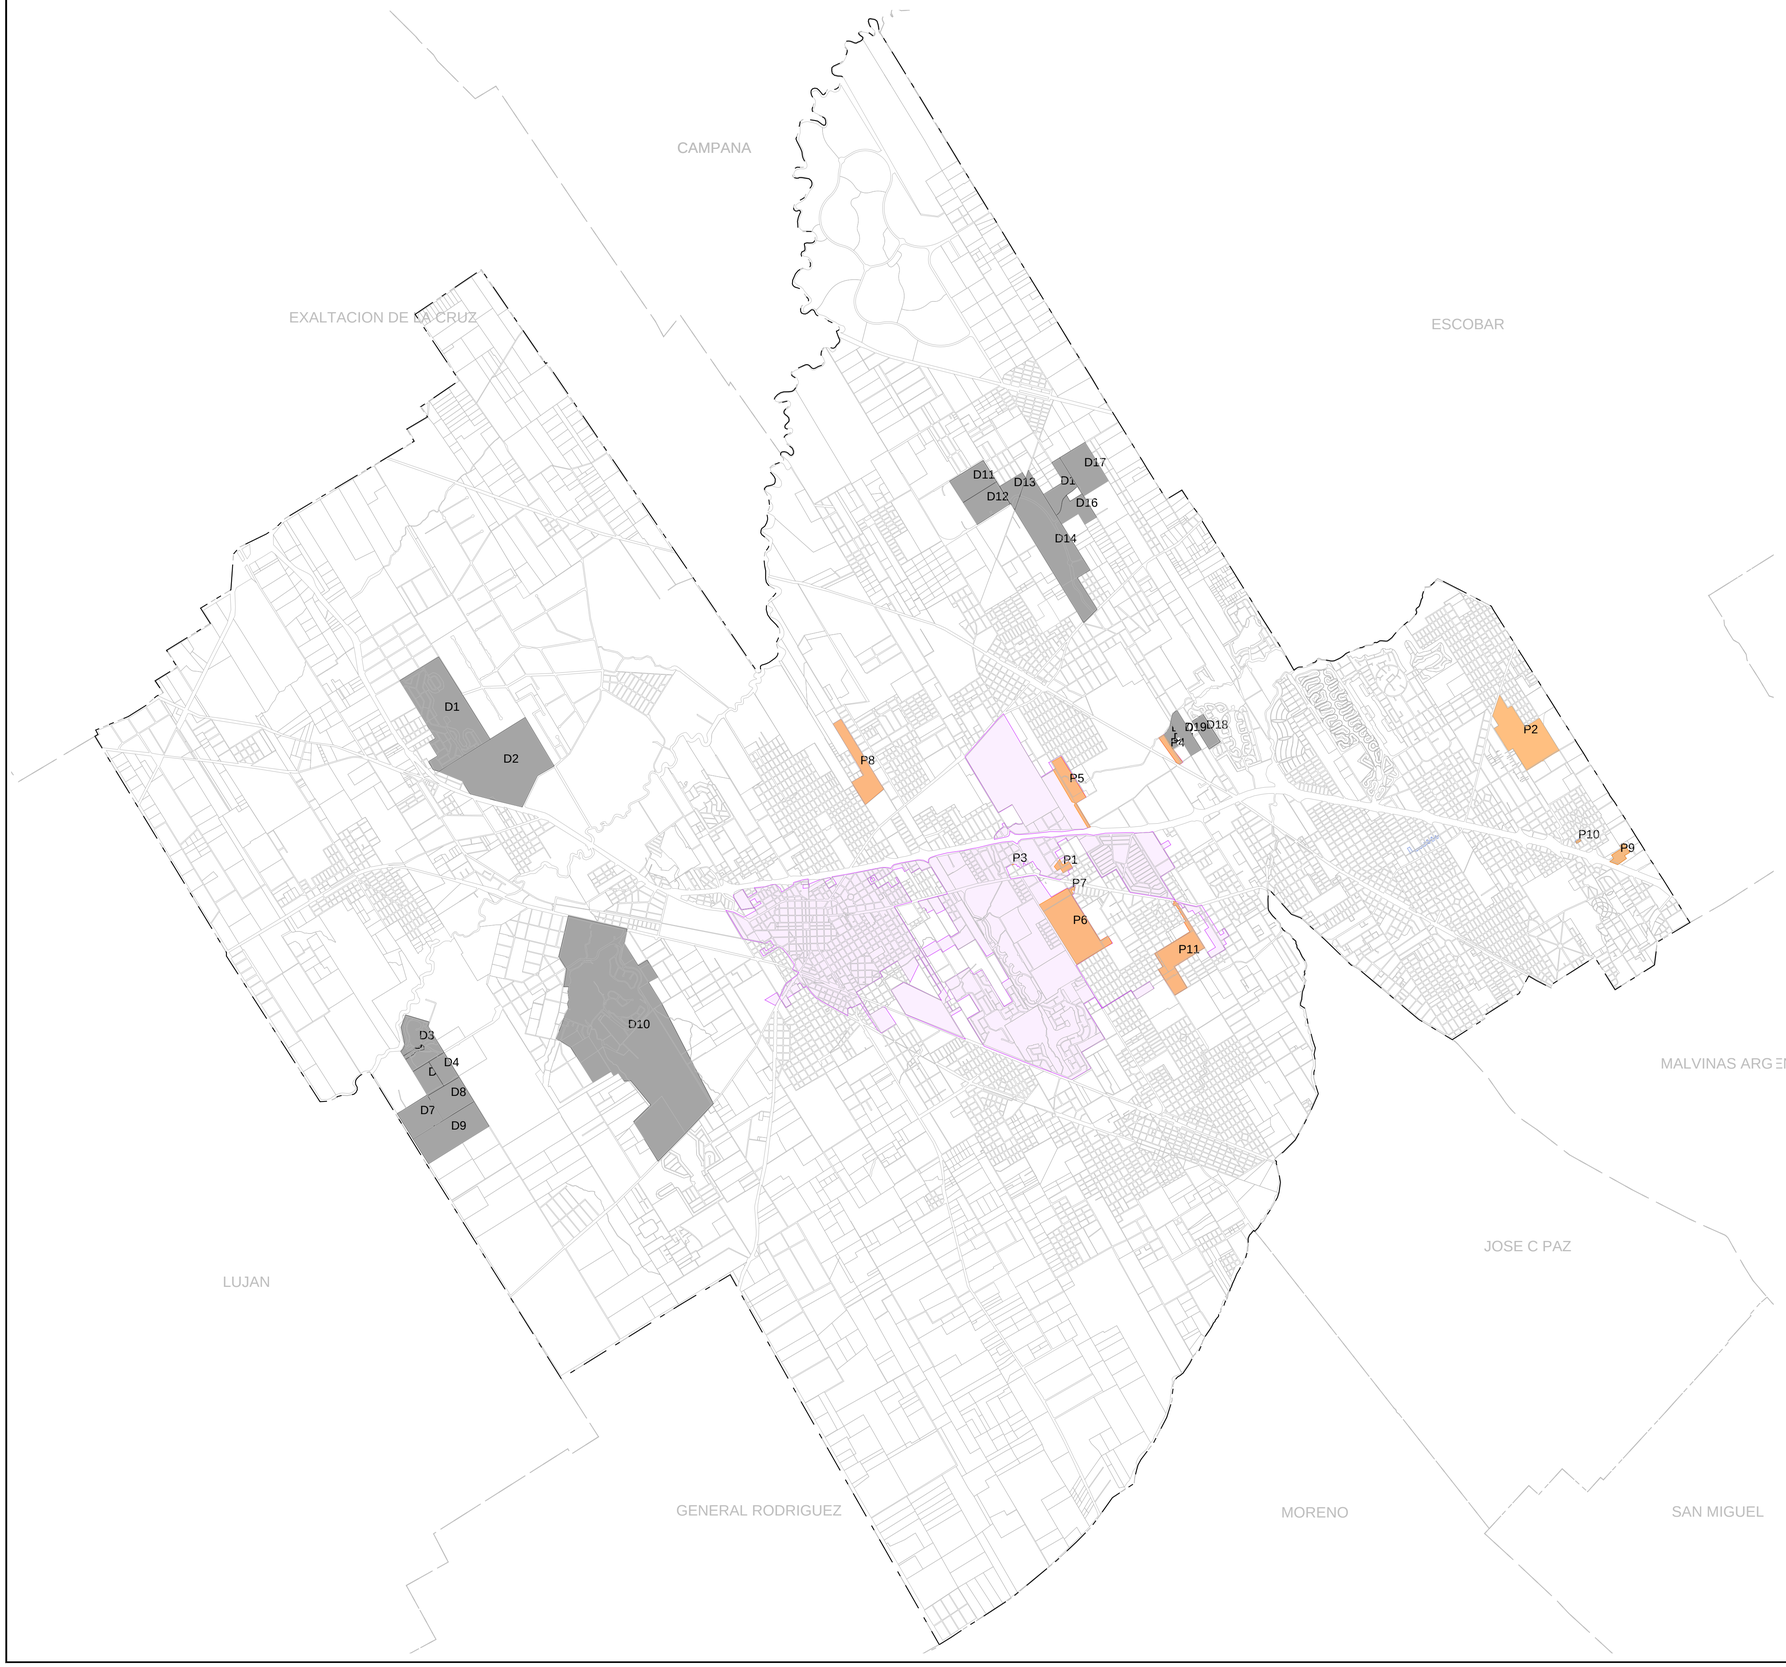

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	B.C. LA TOSCANA
P2	B.C. AZZURRA
P3	LOS NARCISOS 712
P4	La Josefina
P5	LAS LUCIÉRNAGAS
P6	EMPRENDIMIENTO CAMPUS VISTA
P7	B.C. DISTRITO CAMPUS
P8	BARRIO LA POSTA DE PILAR
P9	B.C. EL CASCO
P10	INSTITUTO TIERRA DE ENCUENTRO
P11	B.C. ALMAHUE

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	C.U.B.A. I y C.U.B.A. II
D2	C.U.B.A. Fatima
D3	Estancias del Rio
D4	Estancias El Recuerdo
D5	Estancias La Paz
D6	Estancias El Pueblo
D7	Estancias La Argentina Golf
D8	Estancias La Pionera
D9	Estancias Champagnat
D10	Pilara
D11	Santa Guadalupe
D12	Santa Guadalupe II/ Las Casuarinas de Pilar
D13	Casas del Este
D14	Los Jazmines
D15	San Eduardo
D16	San Alfonso
D17	San Ramiro
D18	Haras - El Establo
D19	Haras - La Caballeriza
D20	La Madrugada
D21	La Madrugada II

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO PILAR

29/5/2026


1:55000

REGION NORTE

2025

IETPIL20

Censo 2022

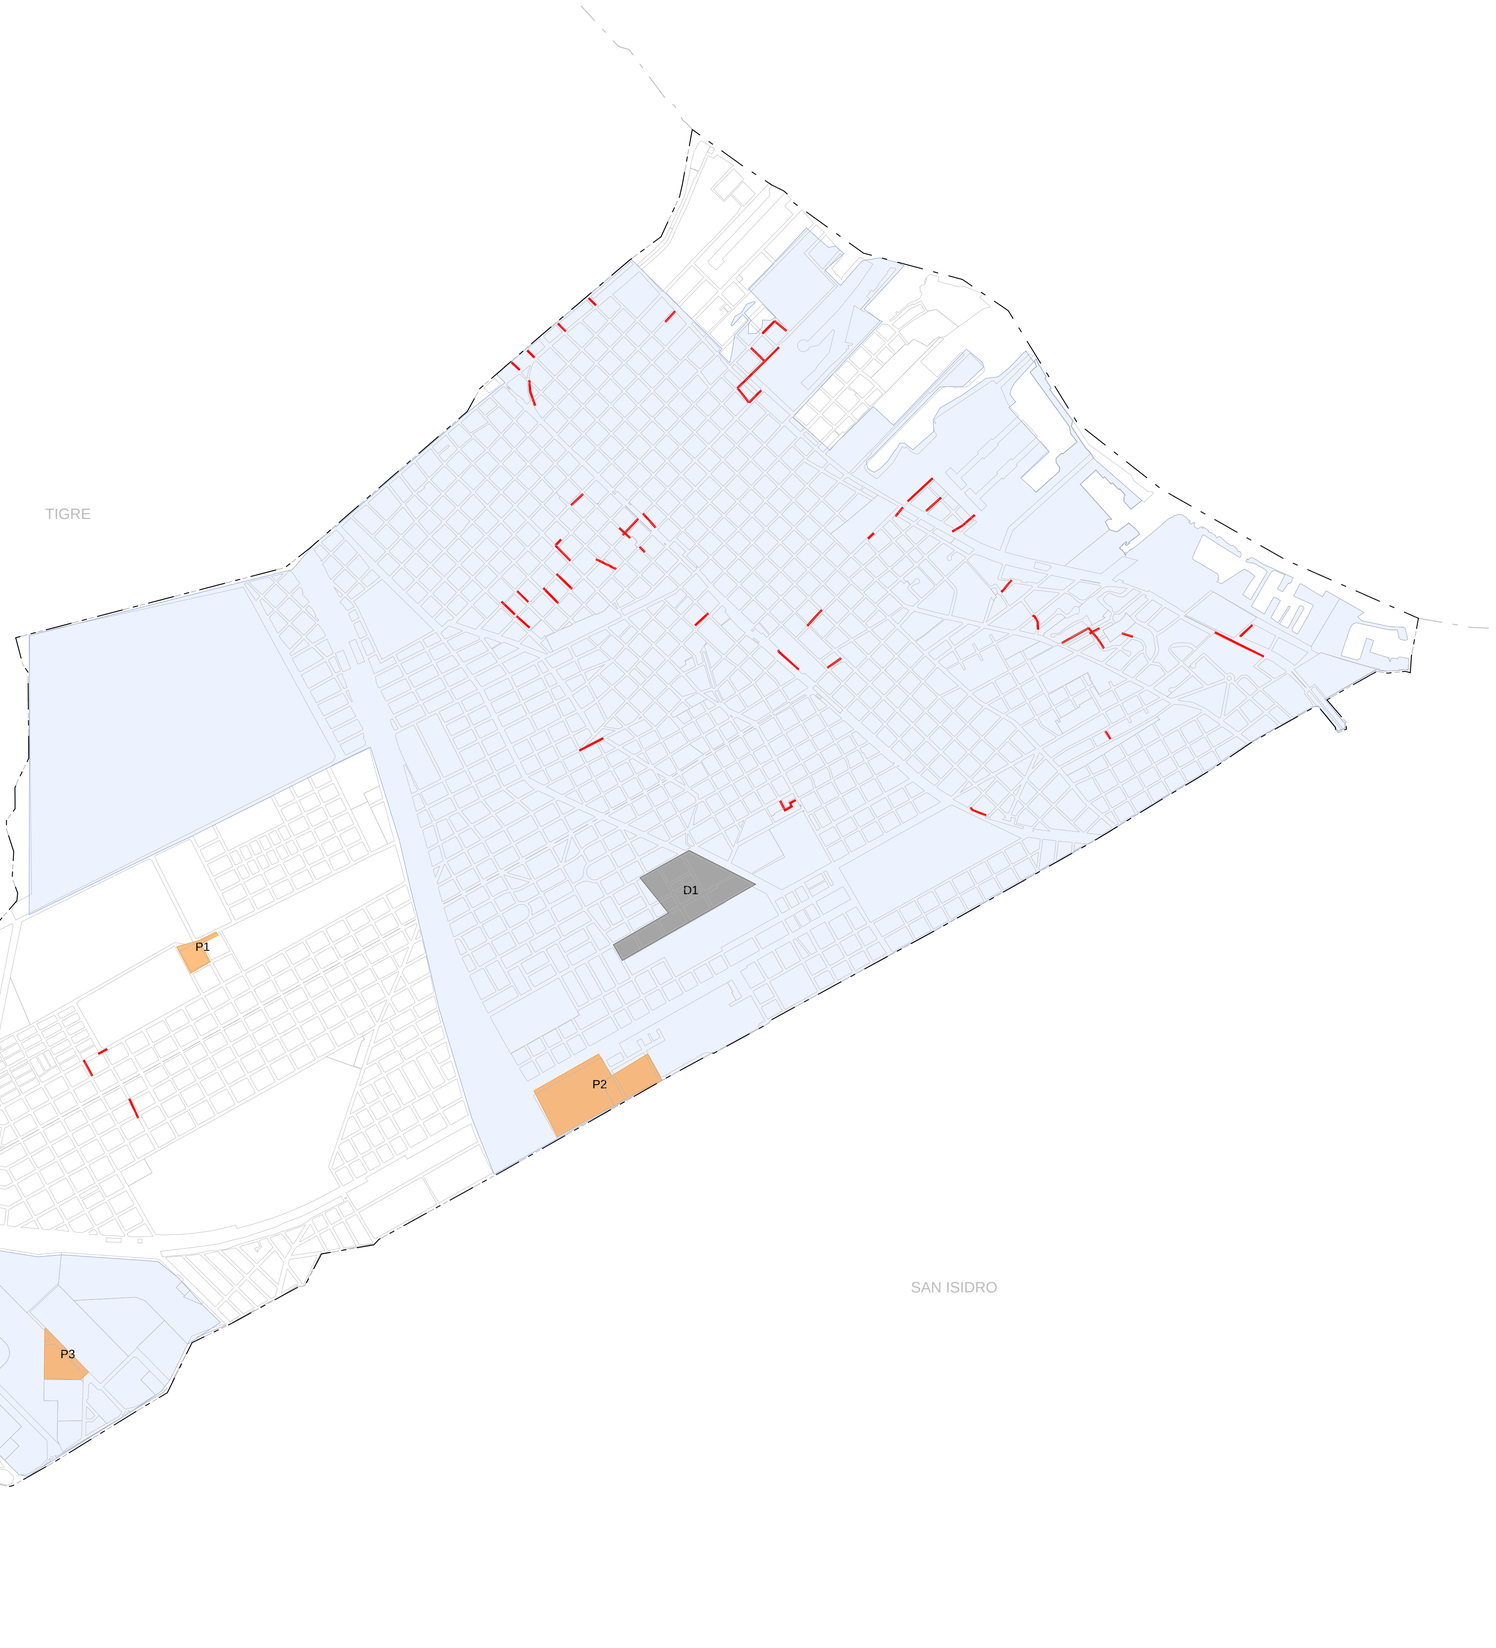

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	CORRALÓN DE HIGIENE URBANA
P2	BLISS
P3	Emprendimiento PUEBLO BUENA VISTA

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	1000 Viviendas

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO SAN FERNANDO

29/5/2026


1:15000

REGION NORTE

2025

IETSFE20

Censo 2022

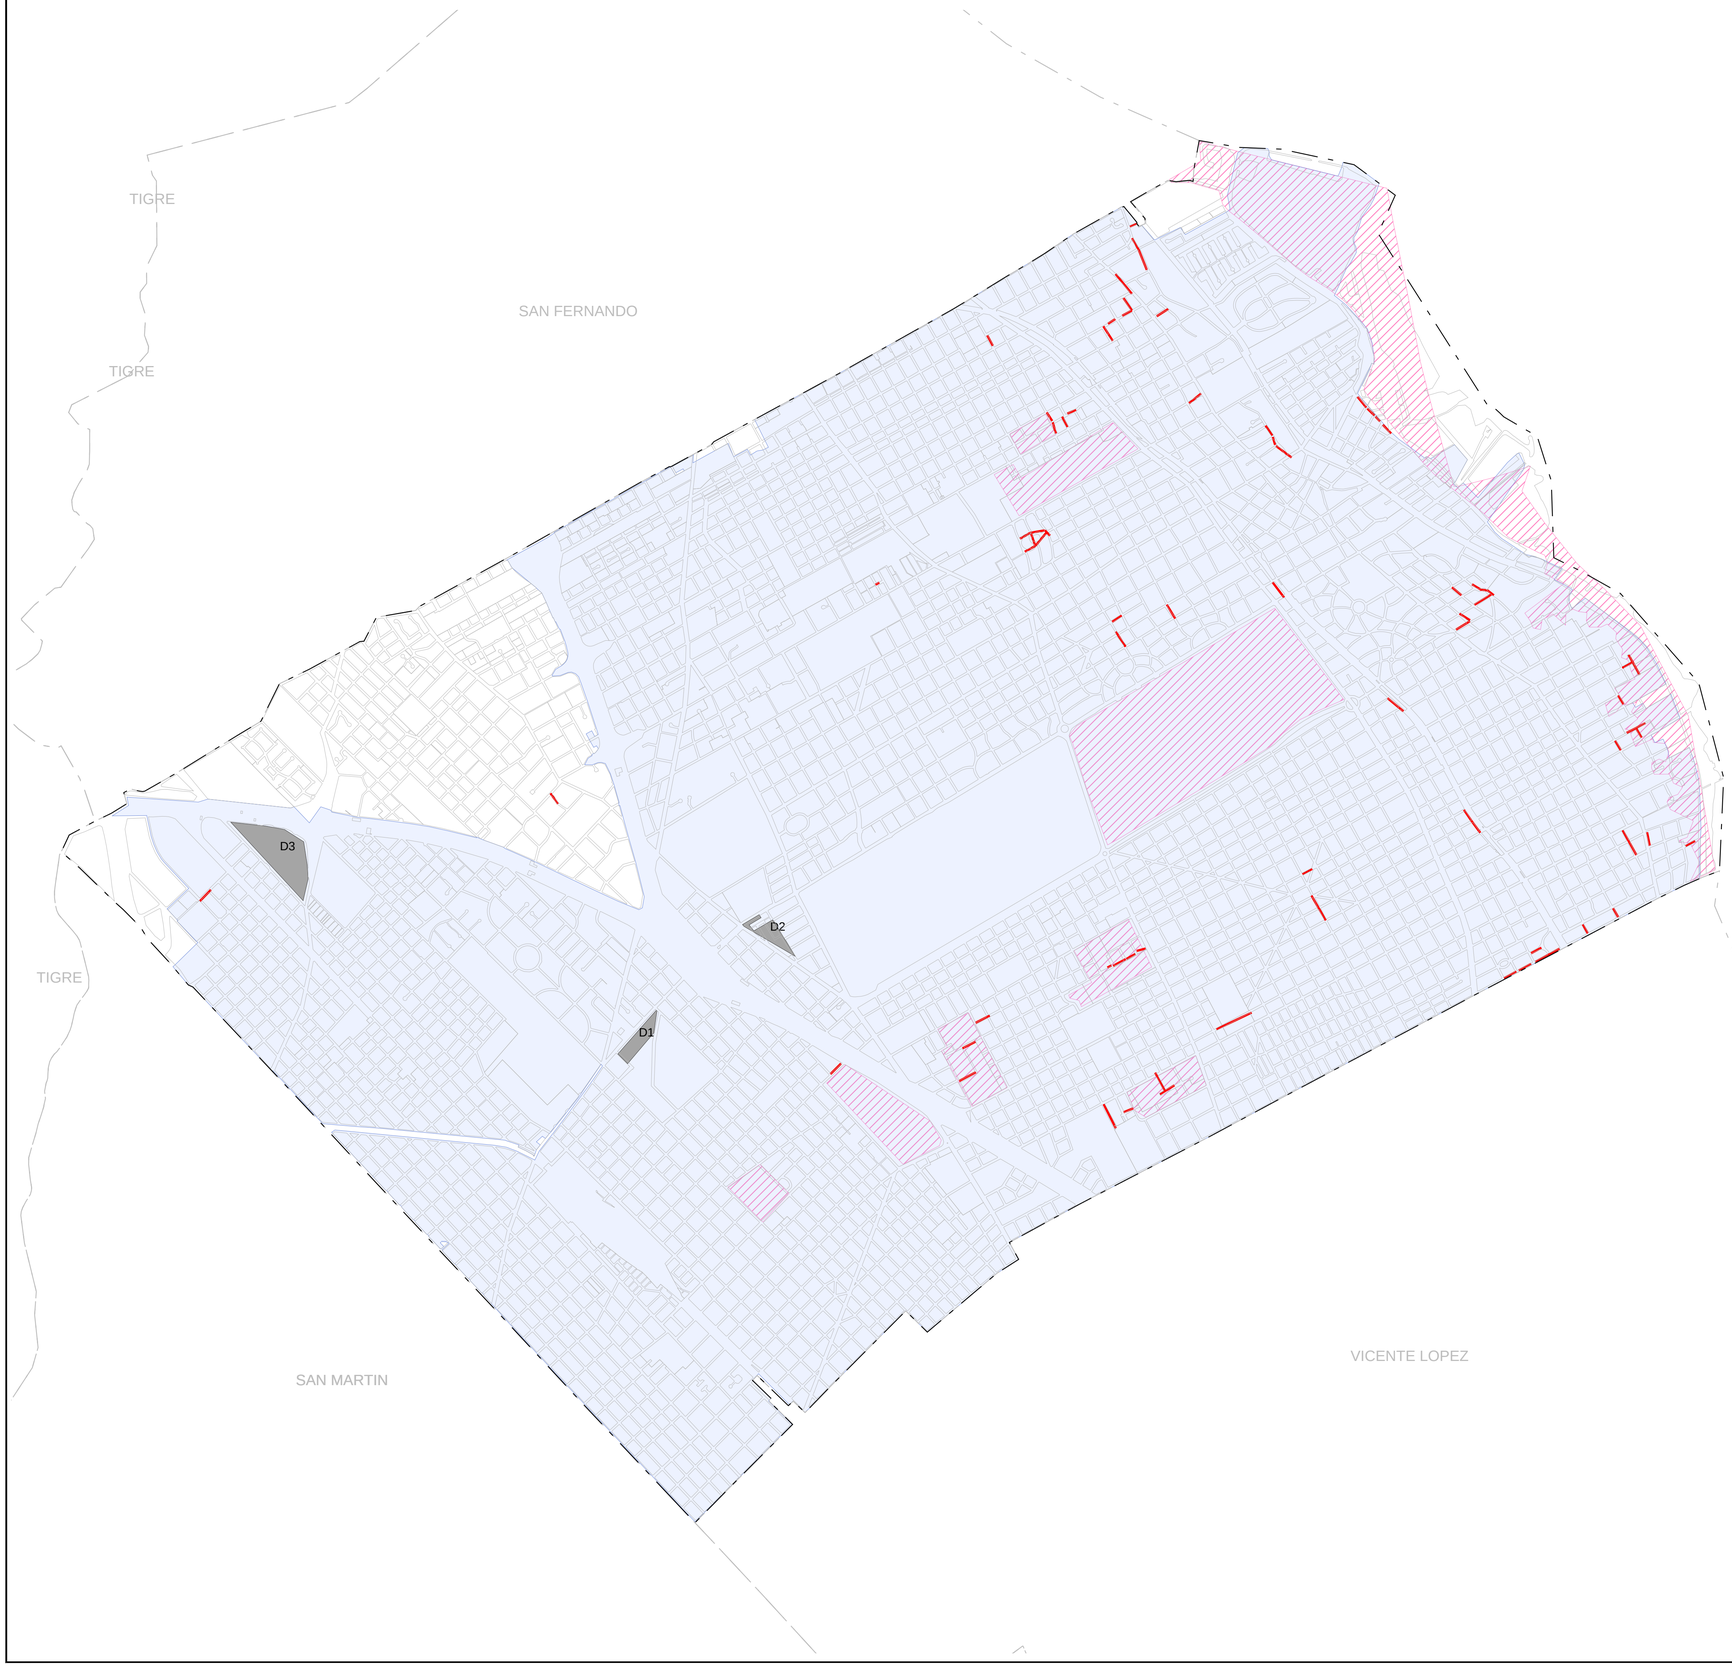

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	PREDIO MUNICIPAL
D2	BARRIO E. BLANCO
D3	BARRIO SAN ISIDRO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO SAN ISIDRO

29/5/2026


1:20000

REGION NORTE

2025

IETSIS20

Censo 2022

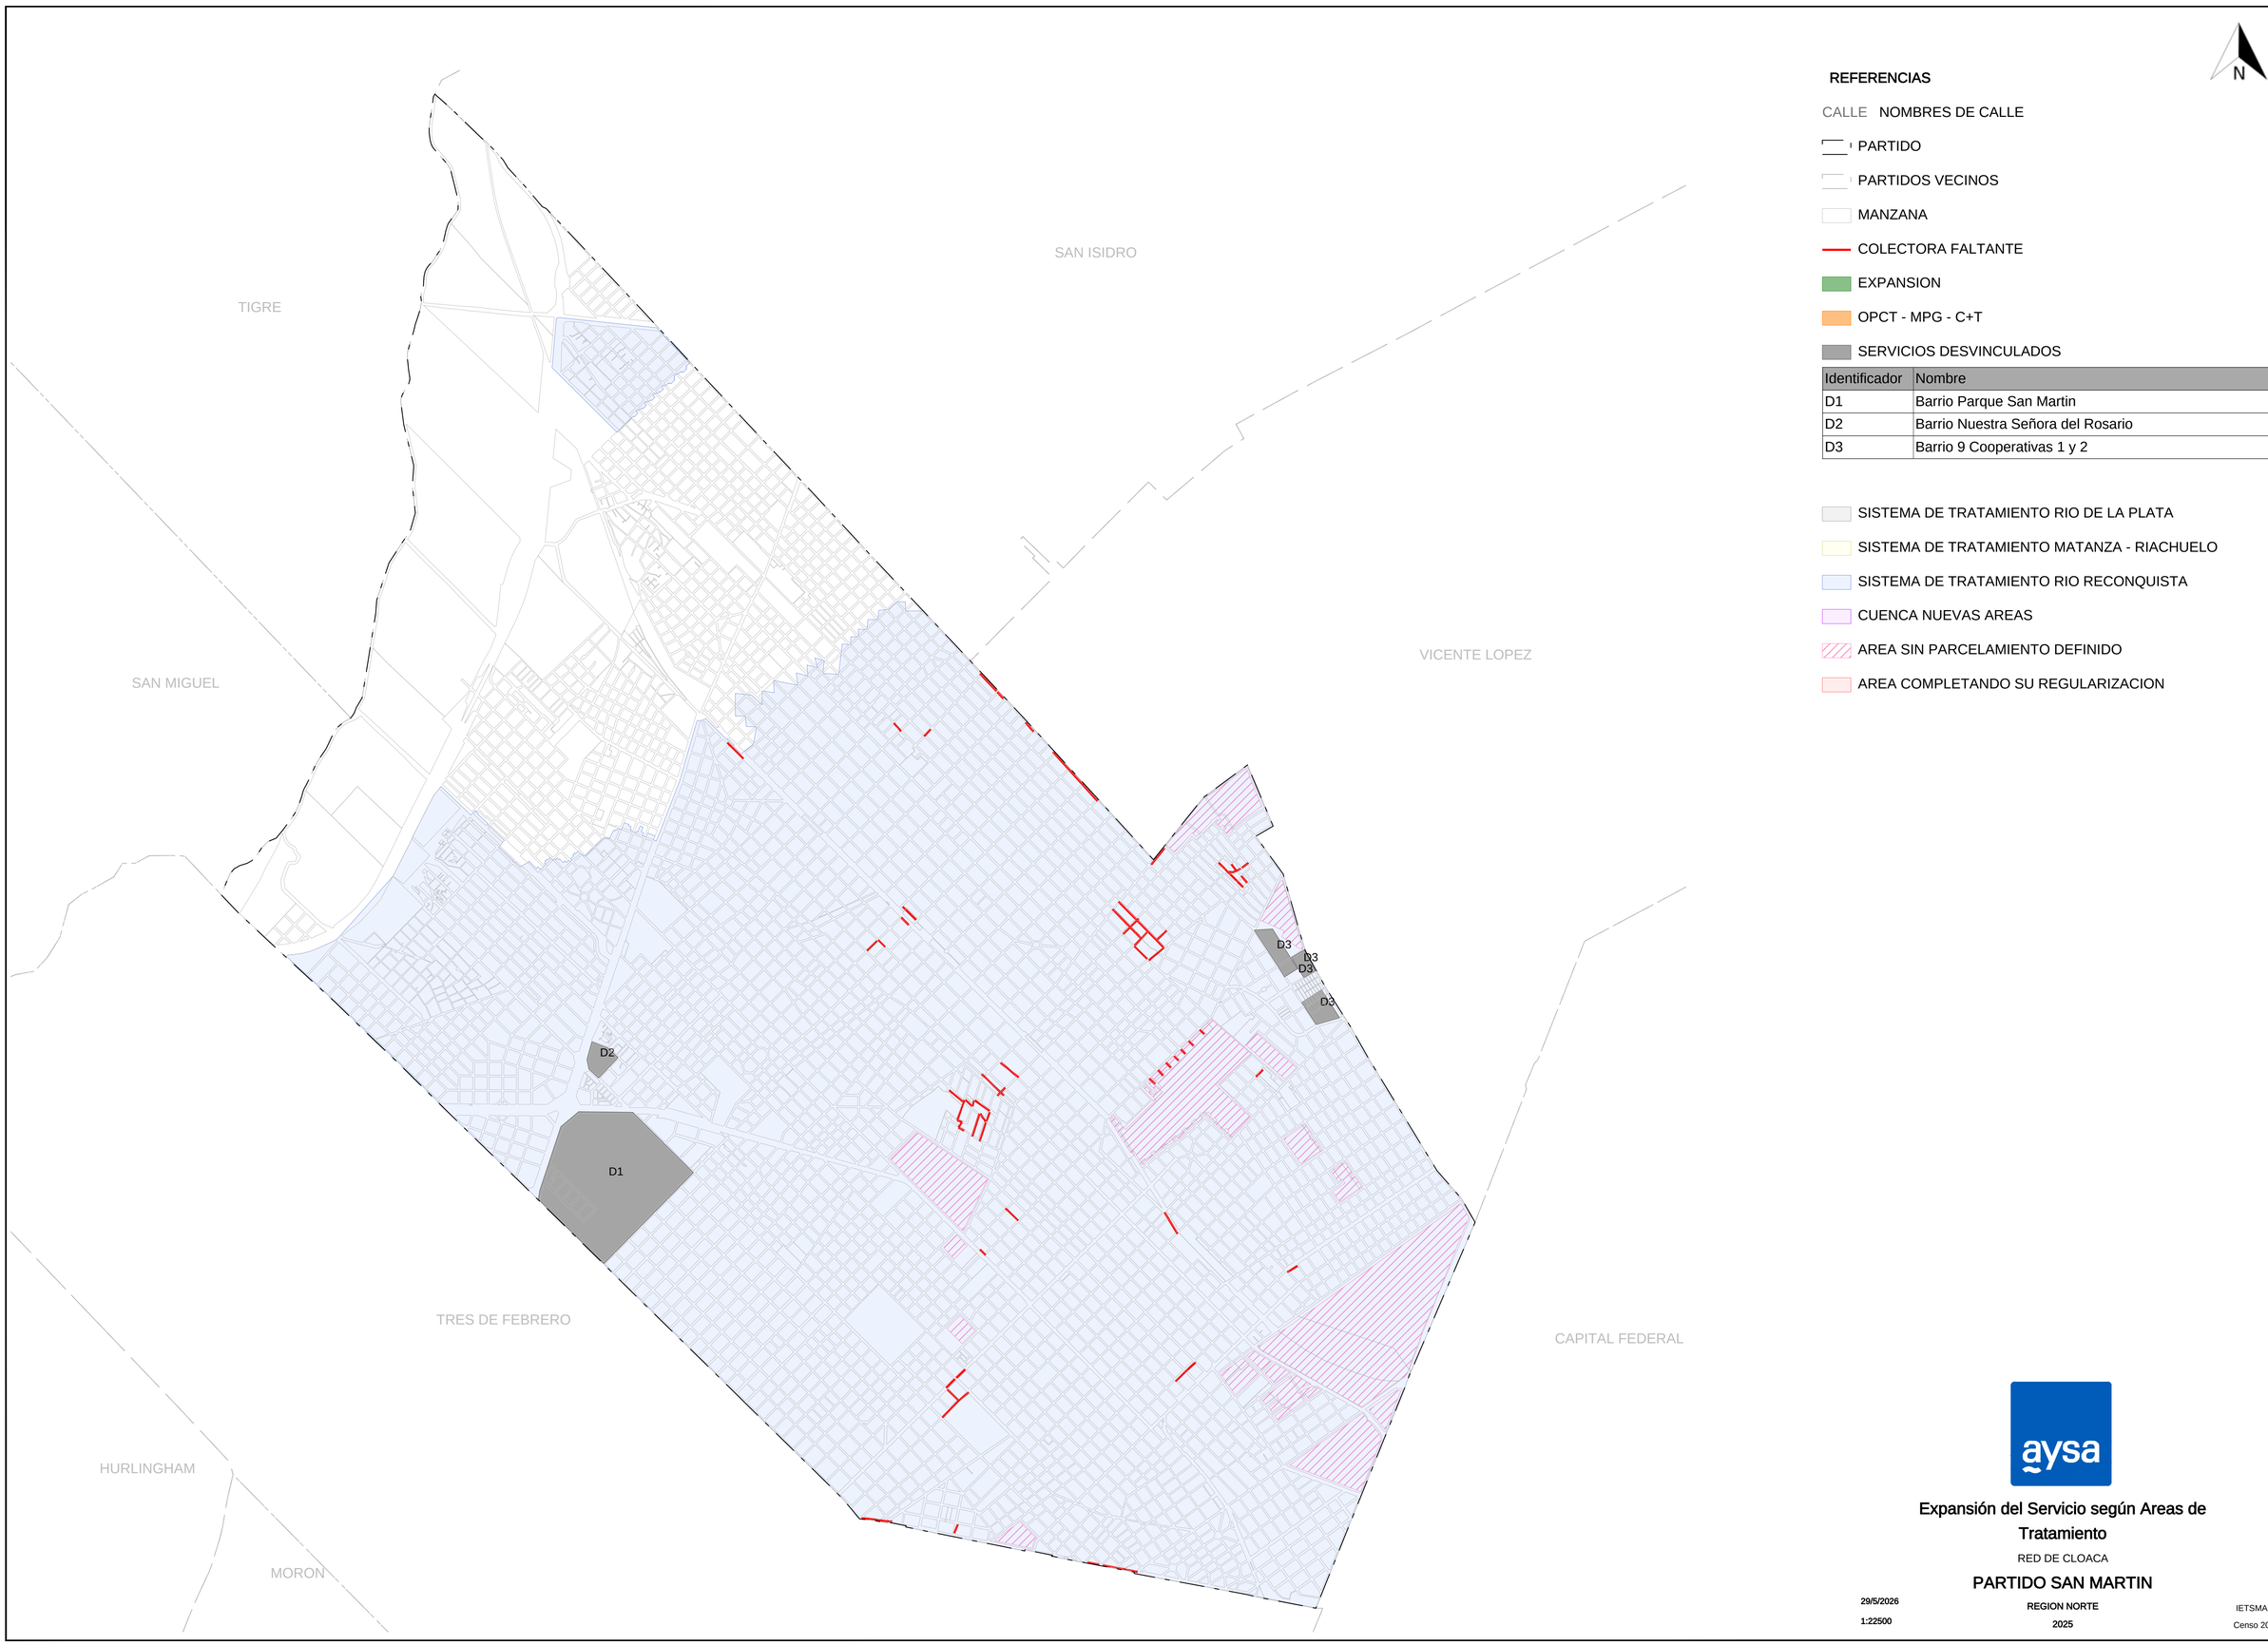

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	Barrio Parque San Martin
D2	Barrio Nuestra Señora del Rosario
D3	Barrio 9 Cooperativas 1 y 2

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO SAN MARTIN

29/5/2026


1:22500

REGION NORTE

2025

IETSMA20

Censo 2022

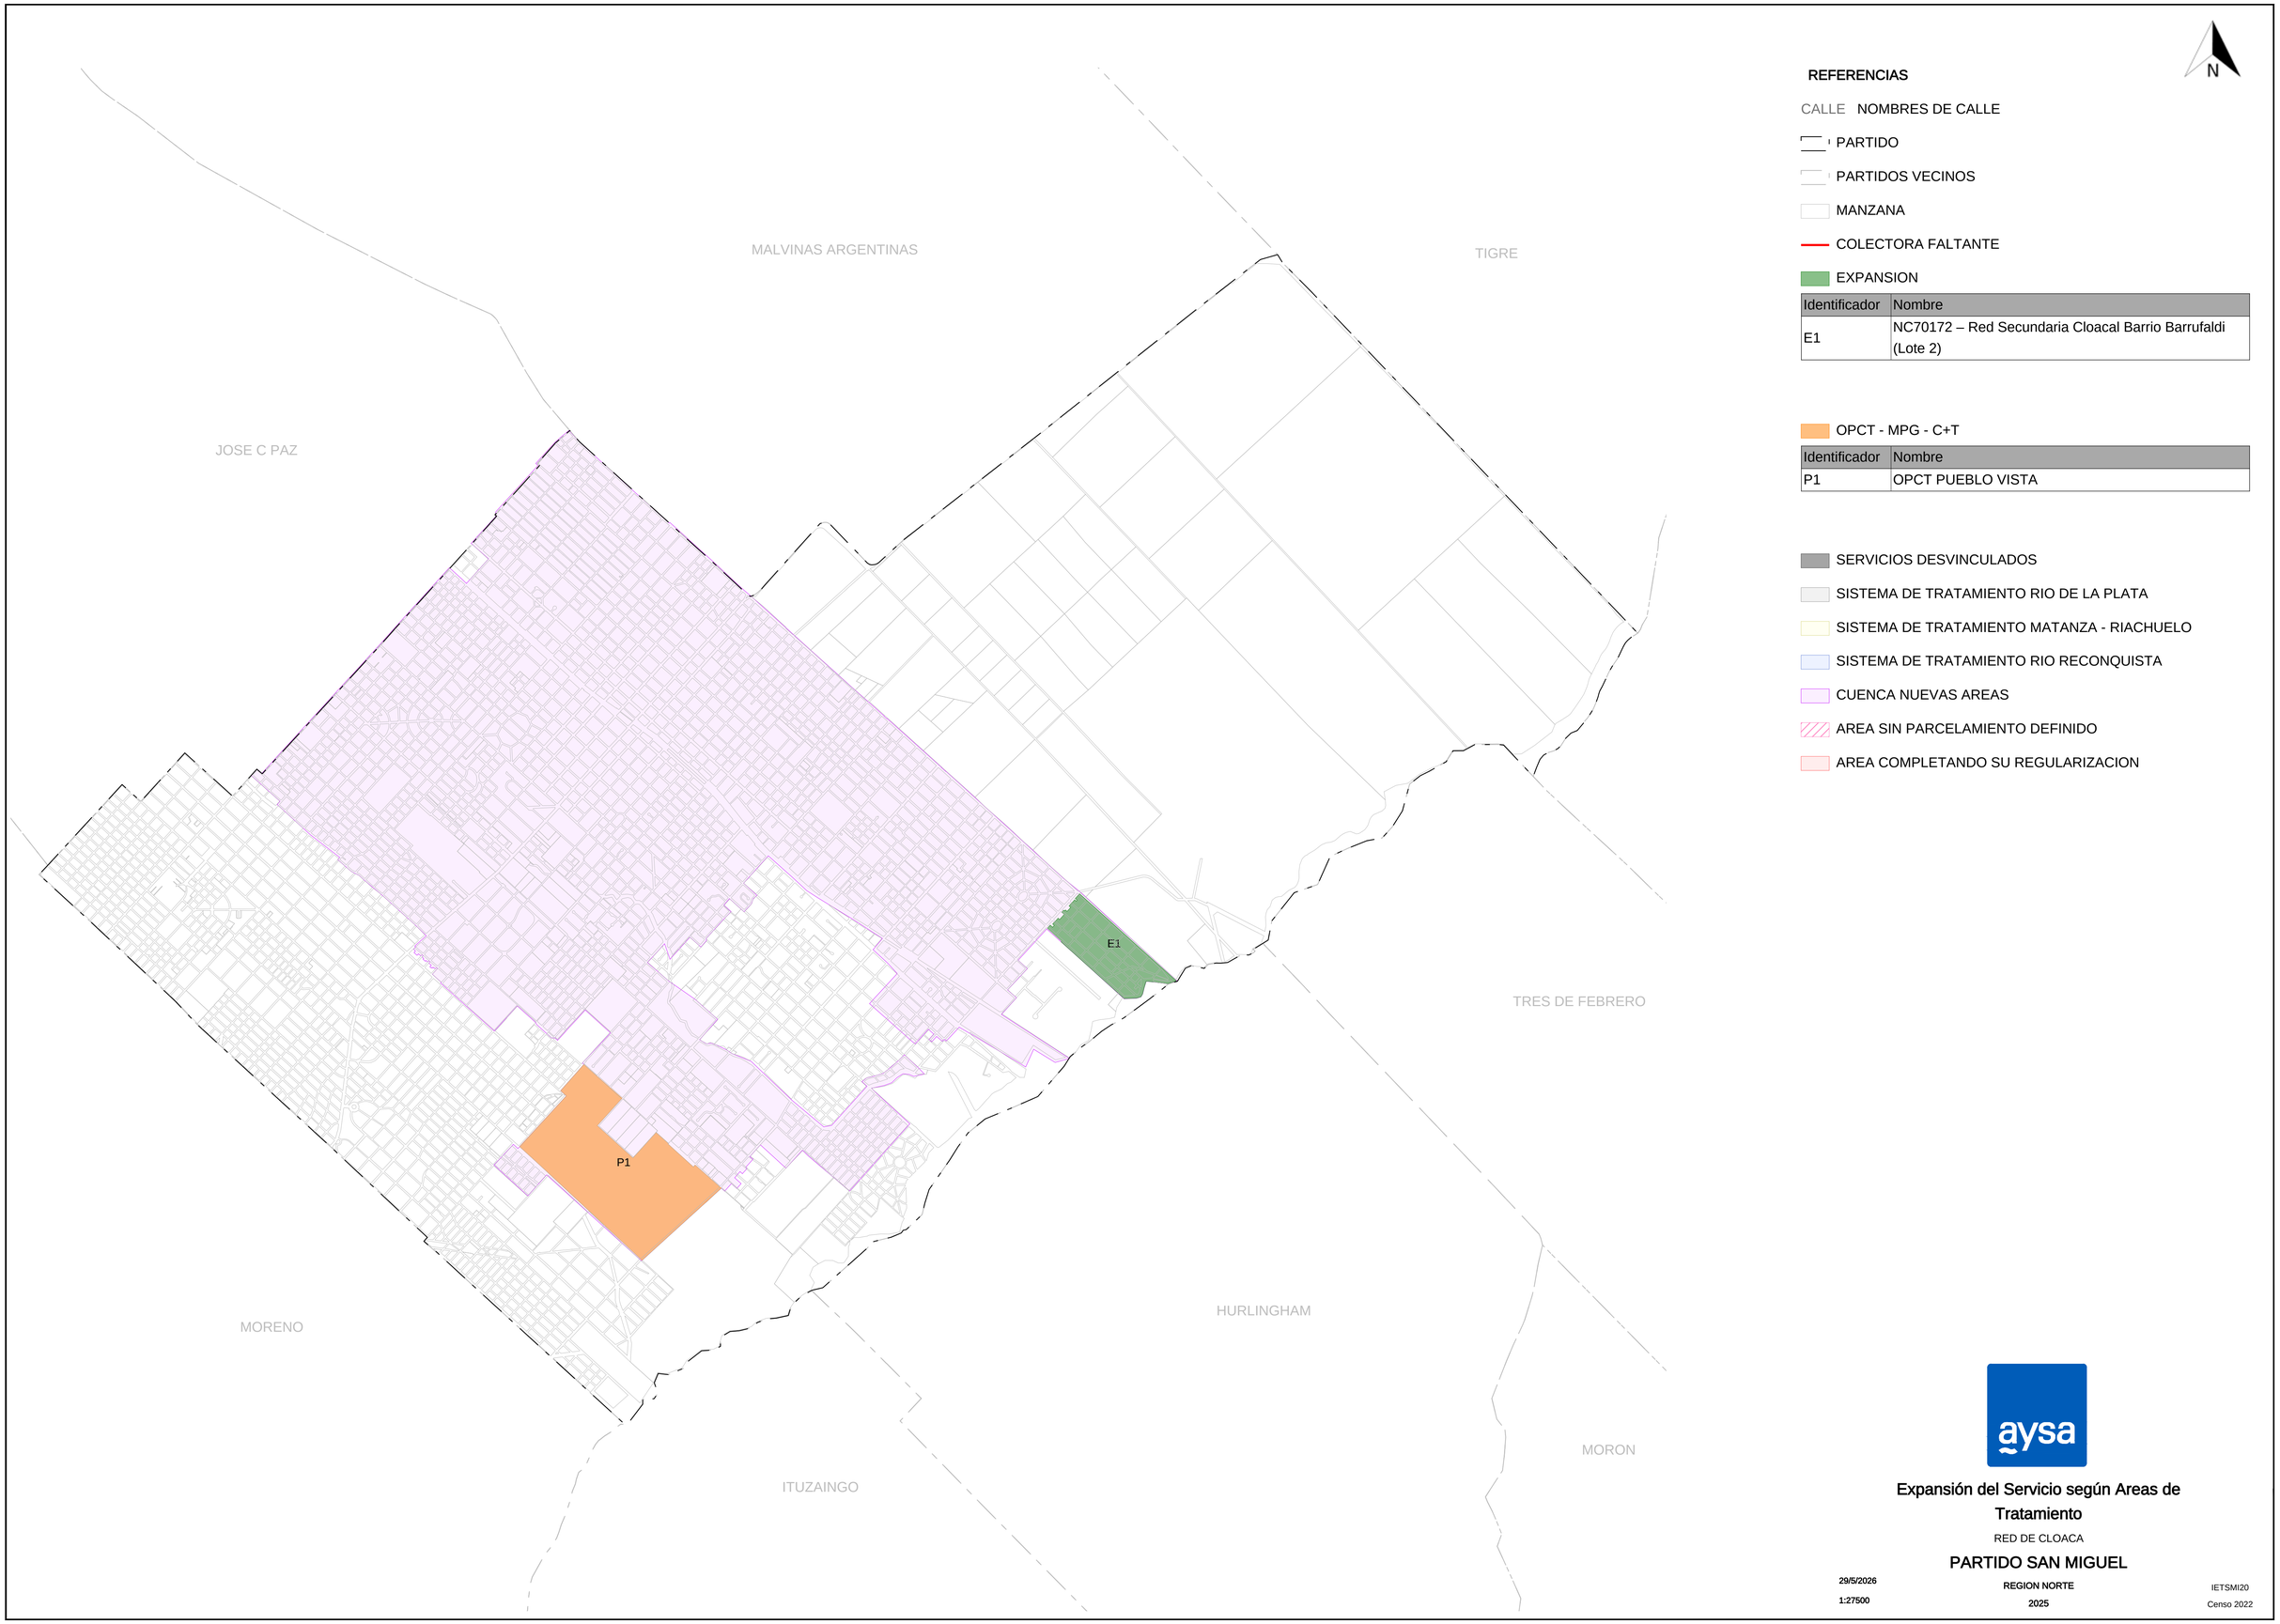

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	NC70172 – Red Secundaria Cloacal Barrio Barrufaldi (Lote 2)

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	OPCT PUEBLO VISTA

SERVICIOS DESVINCULADOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO SAN MIGUEL

29/5/2026


1:27500

REGION NORTE

2025

IETSMI20

Censo 2022

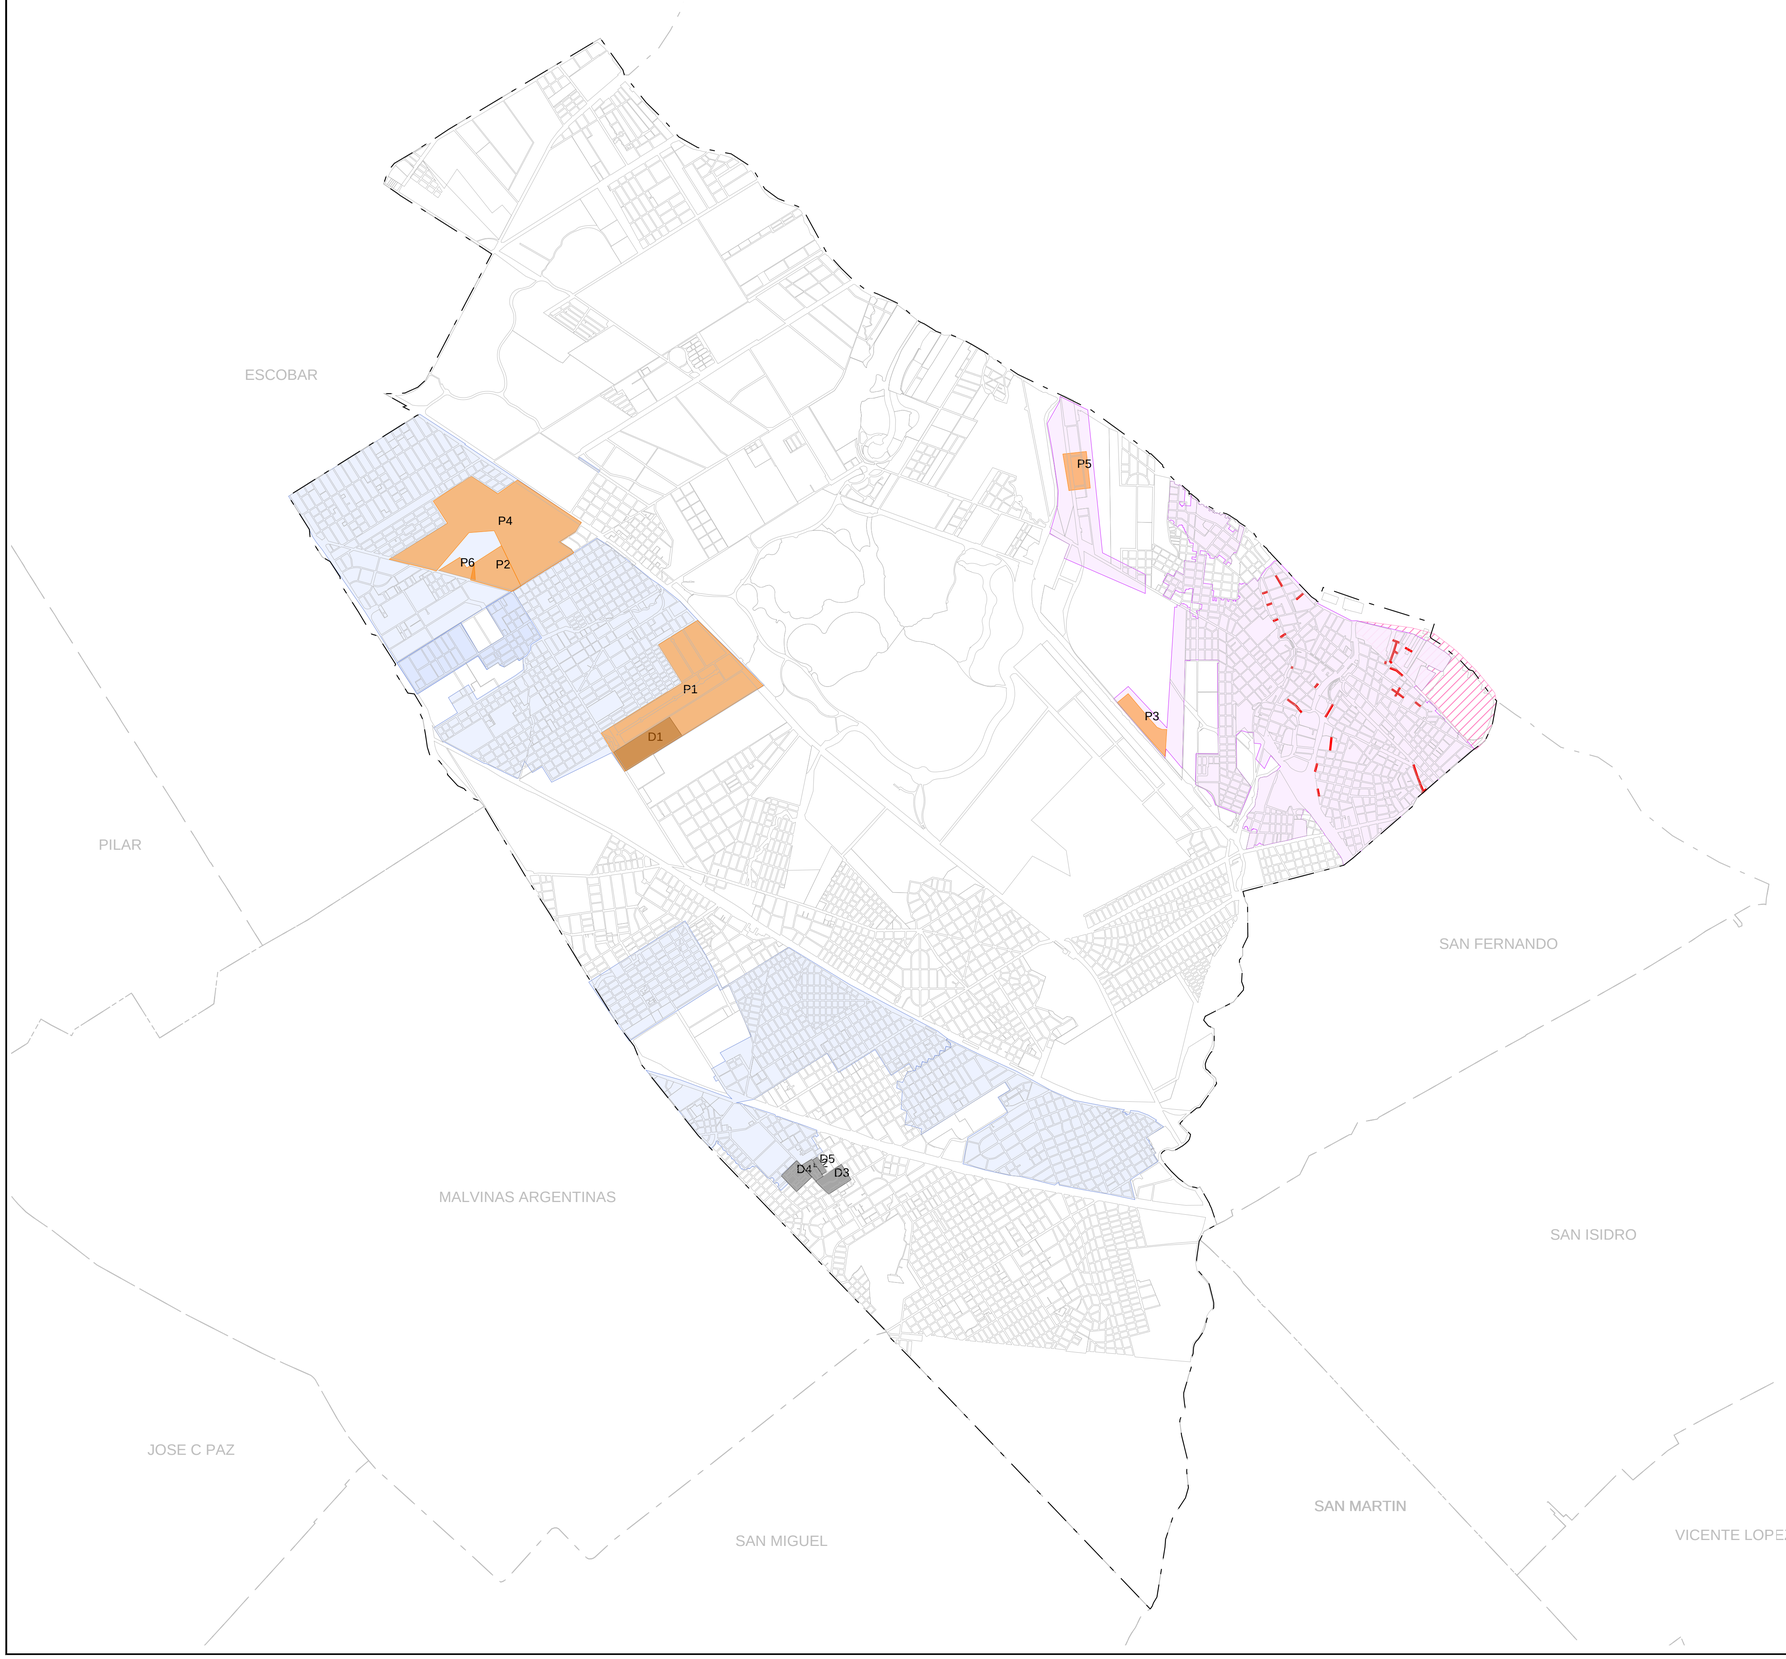

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	Plataforma Logistica Norlog
P2	BARRIO NEWMAN IV
P3	CLUB NAUTICO HACOAJ
P4	CLUB NEWMAN
P5	TIGRE NATURAL
P6	Barrio Newman Joven

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	ALTOS DE PACHECO
D2	BARRIO S.F. DE ASIS
D3	BARRIO SAN PABLO
D4	BARRIO ALTE. BROWN
D5	BARRIO EL PALITO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO TIGRE

29/5/2026

1:40000

REGION NORTE

2025

IETTIG20

Censo 2022



aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO VICENTE LOPEZ

29/5/2026

1:17500


REGION NORTE

2025

IETVIC20

Censo 2022

Planos de Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales Región Oeste

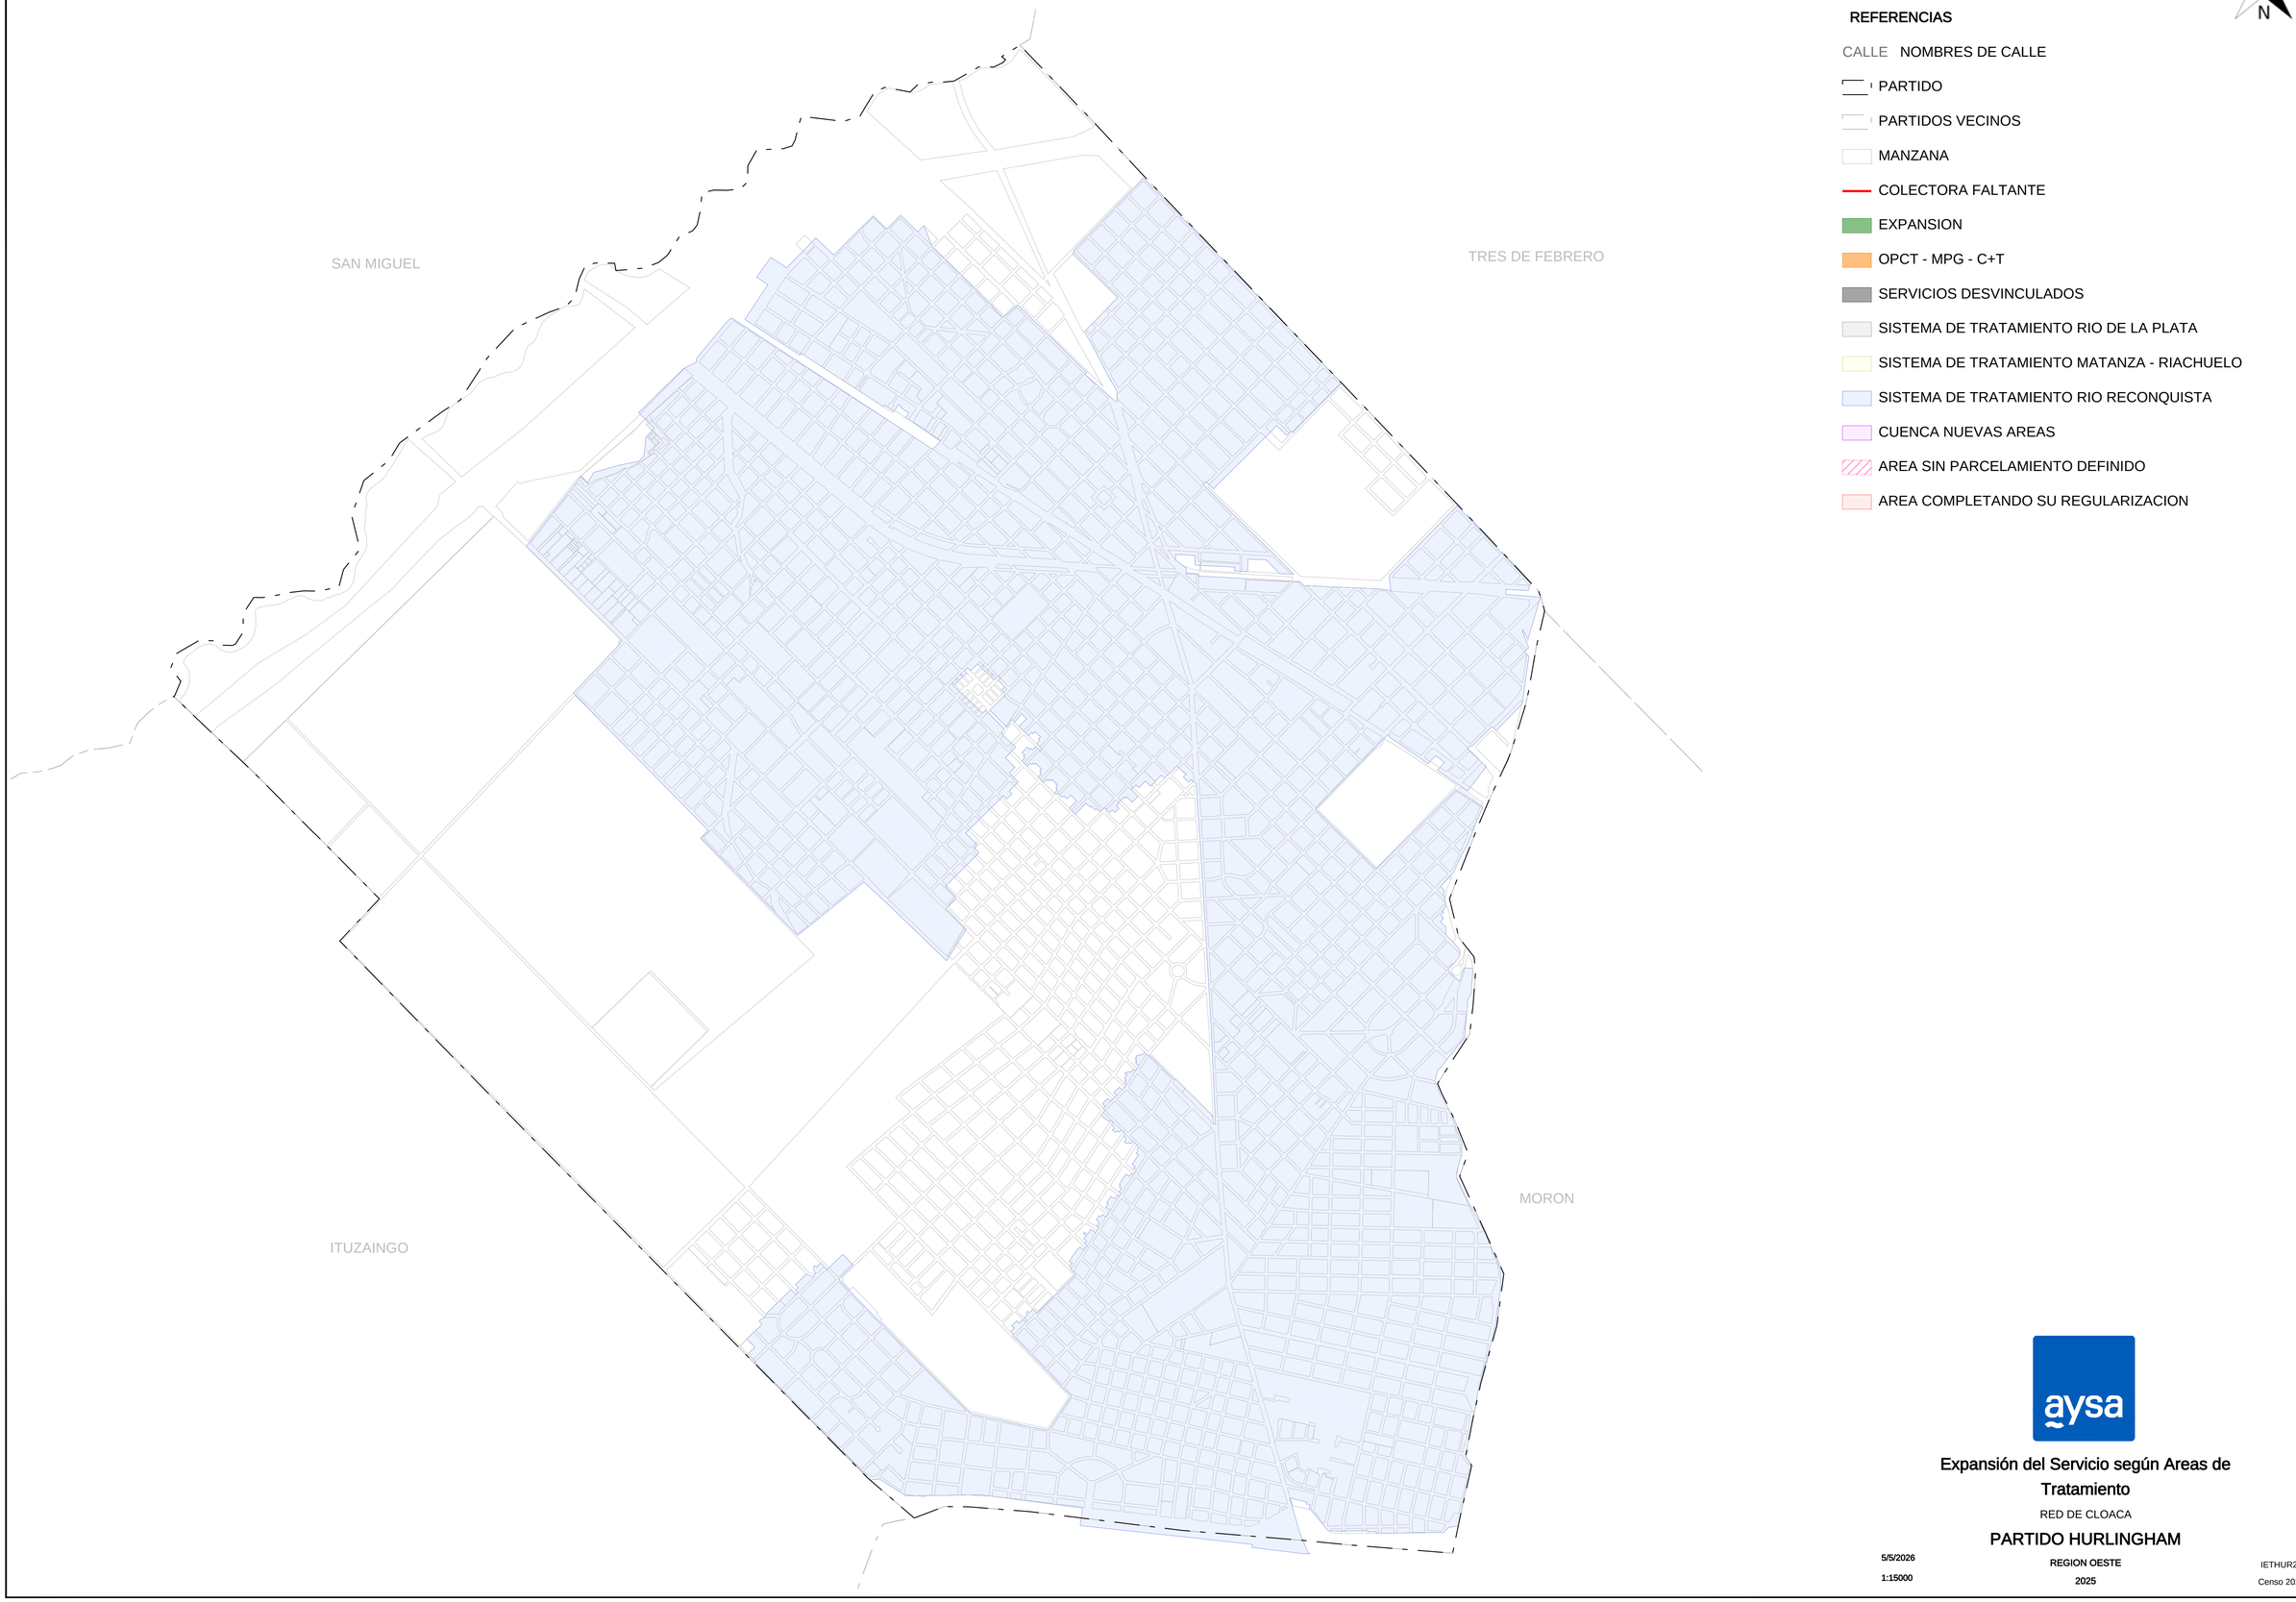

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO HURLINGHAM

5/5/2026


1:15000

REGION OESTE

2025

IETHUR20

Censo 2022

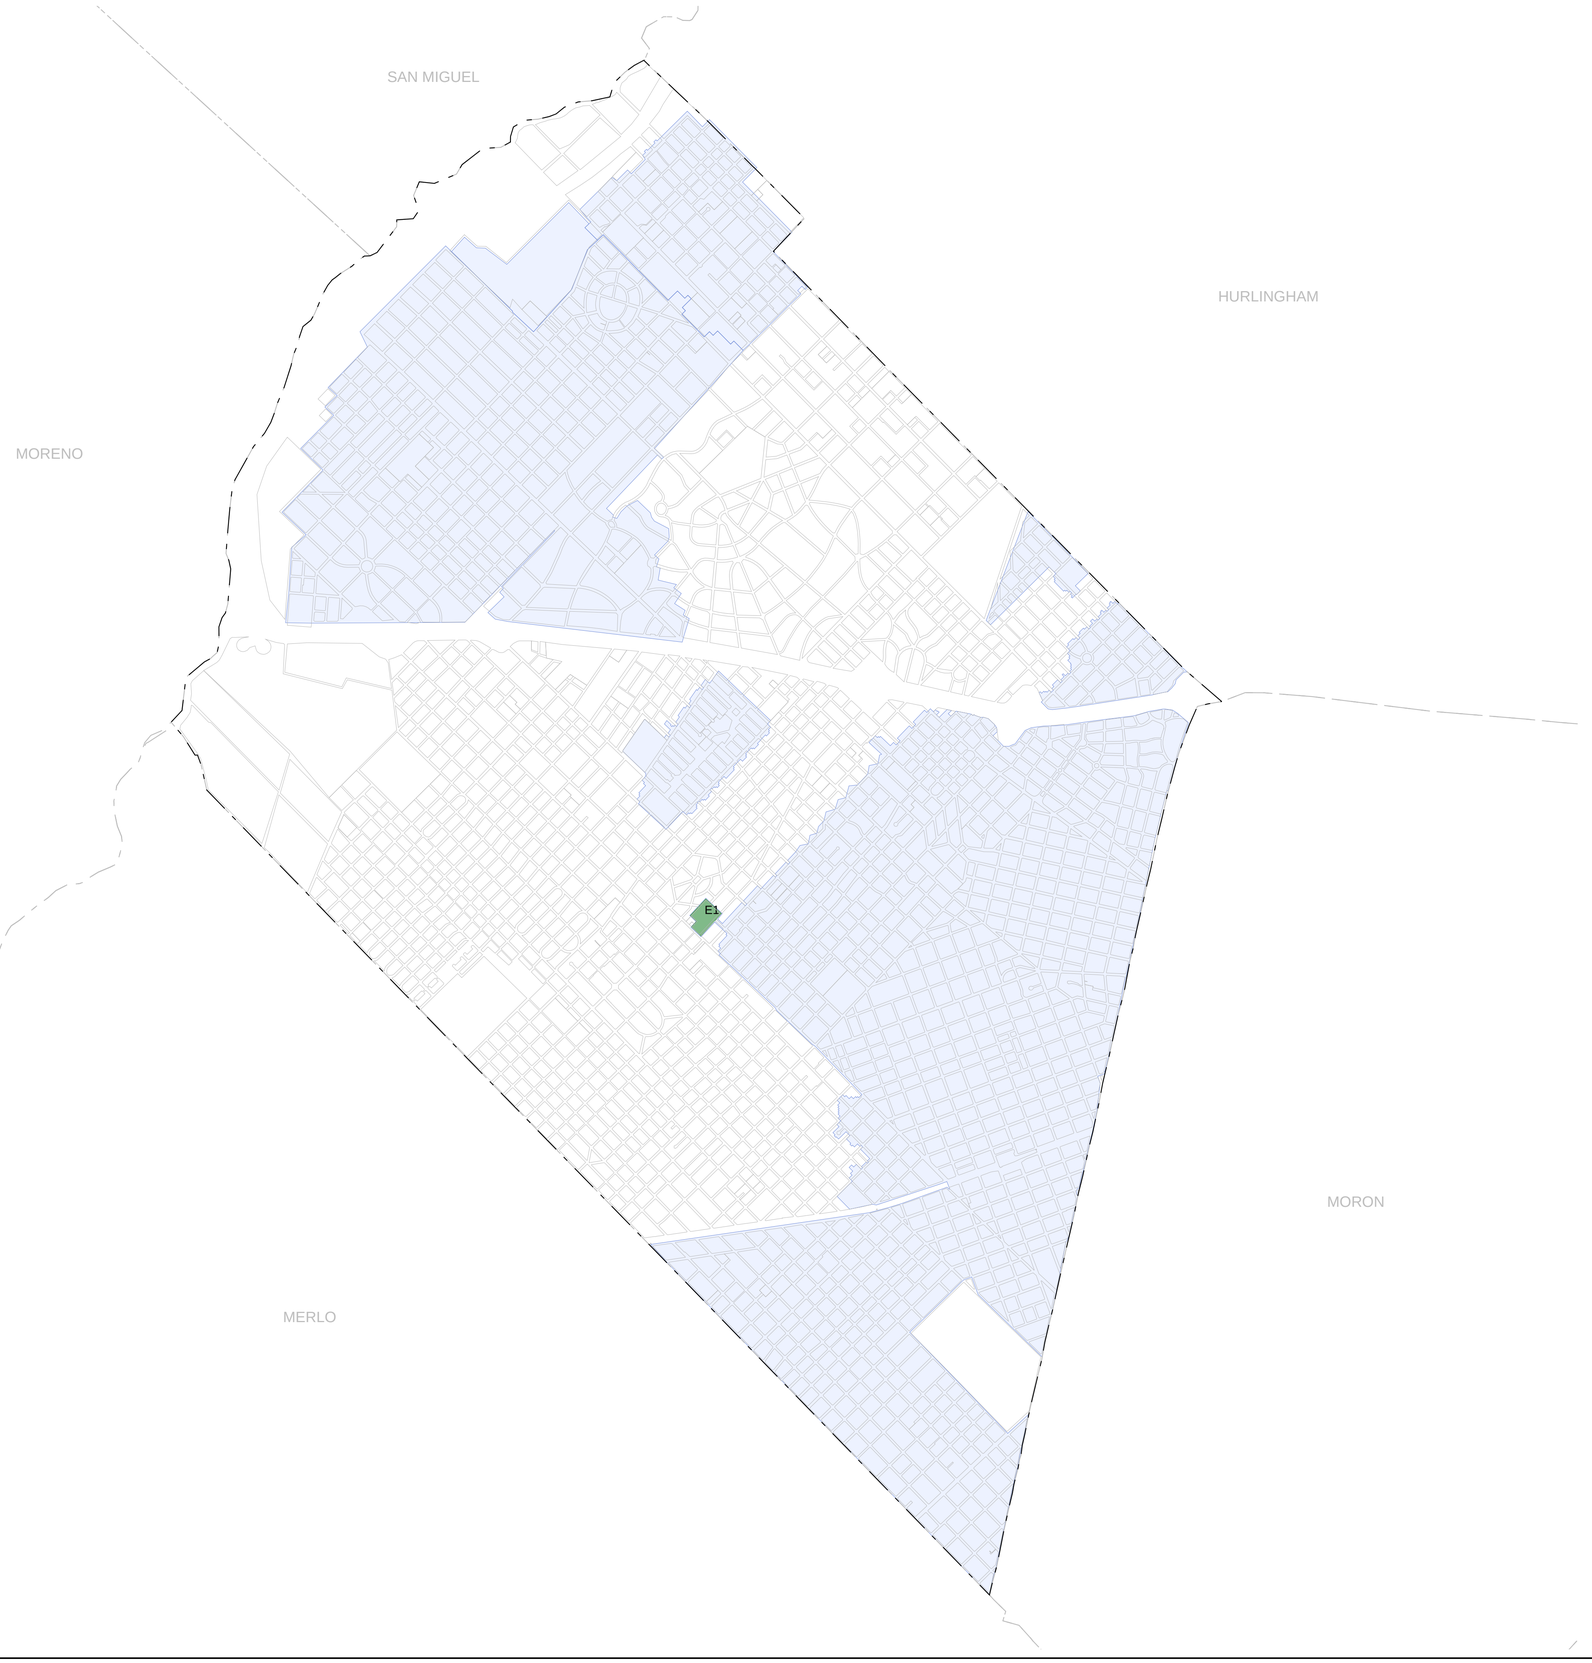

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	B° SICUREZZA (THORNE Y RATTI) ODT I-2025-79800

OPCT - MPG - C+T

SERVICIOS DESVINCULADOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO ITUZAINGO

5/5/2026


1:20000

REGION OESTE

2025

IETITU20

Censo 2022

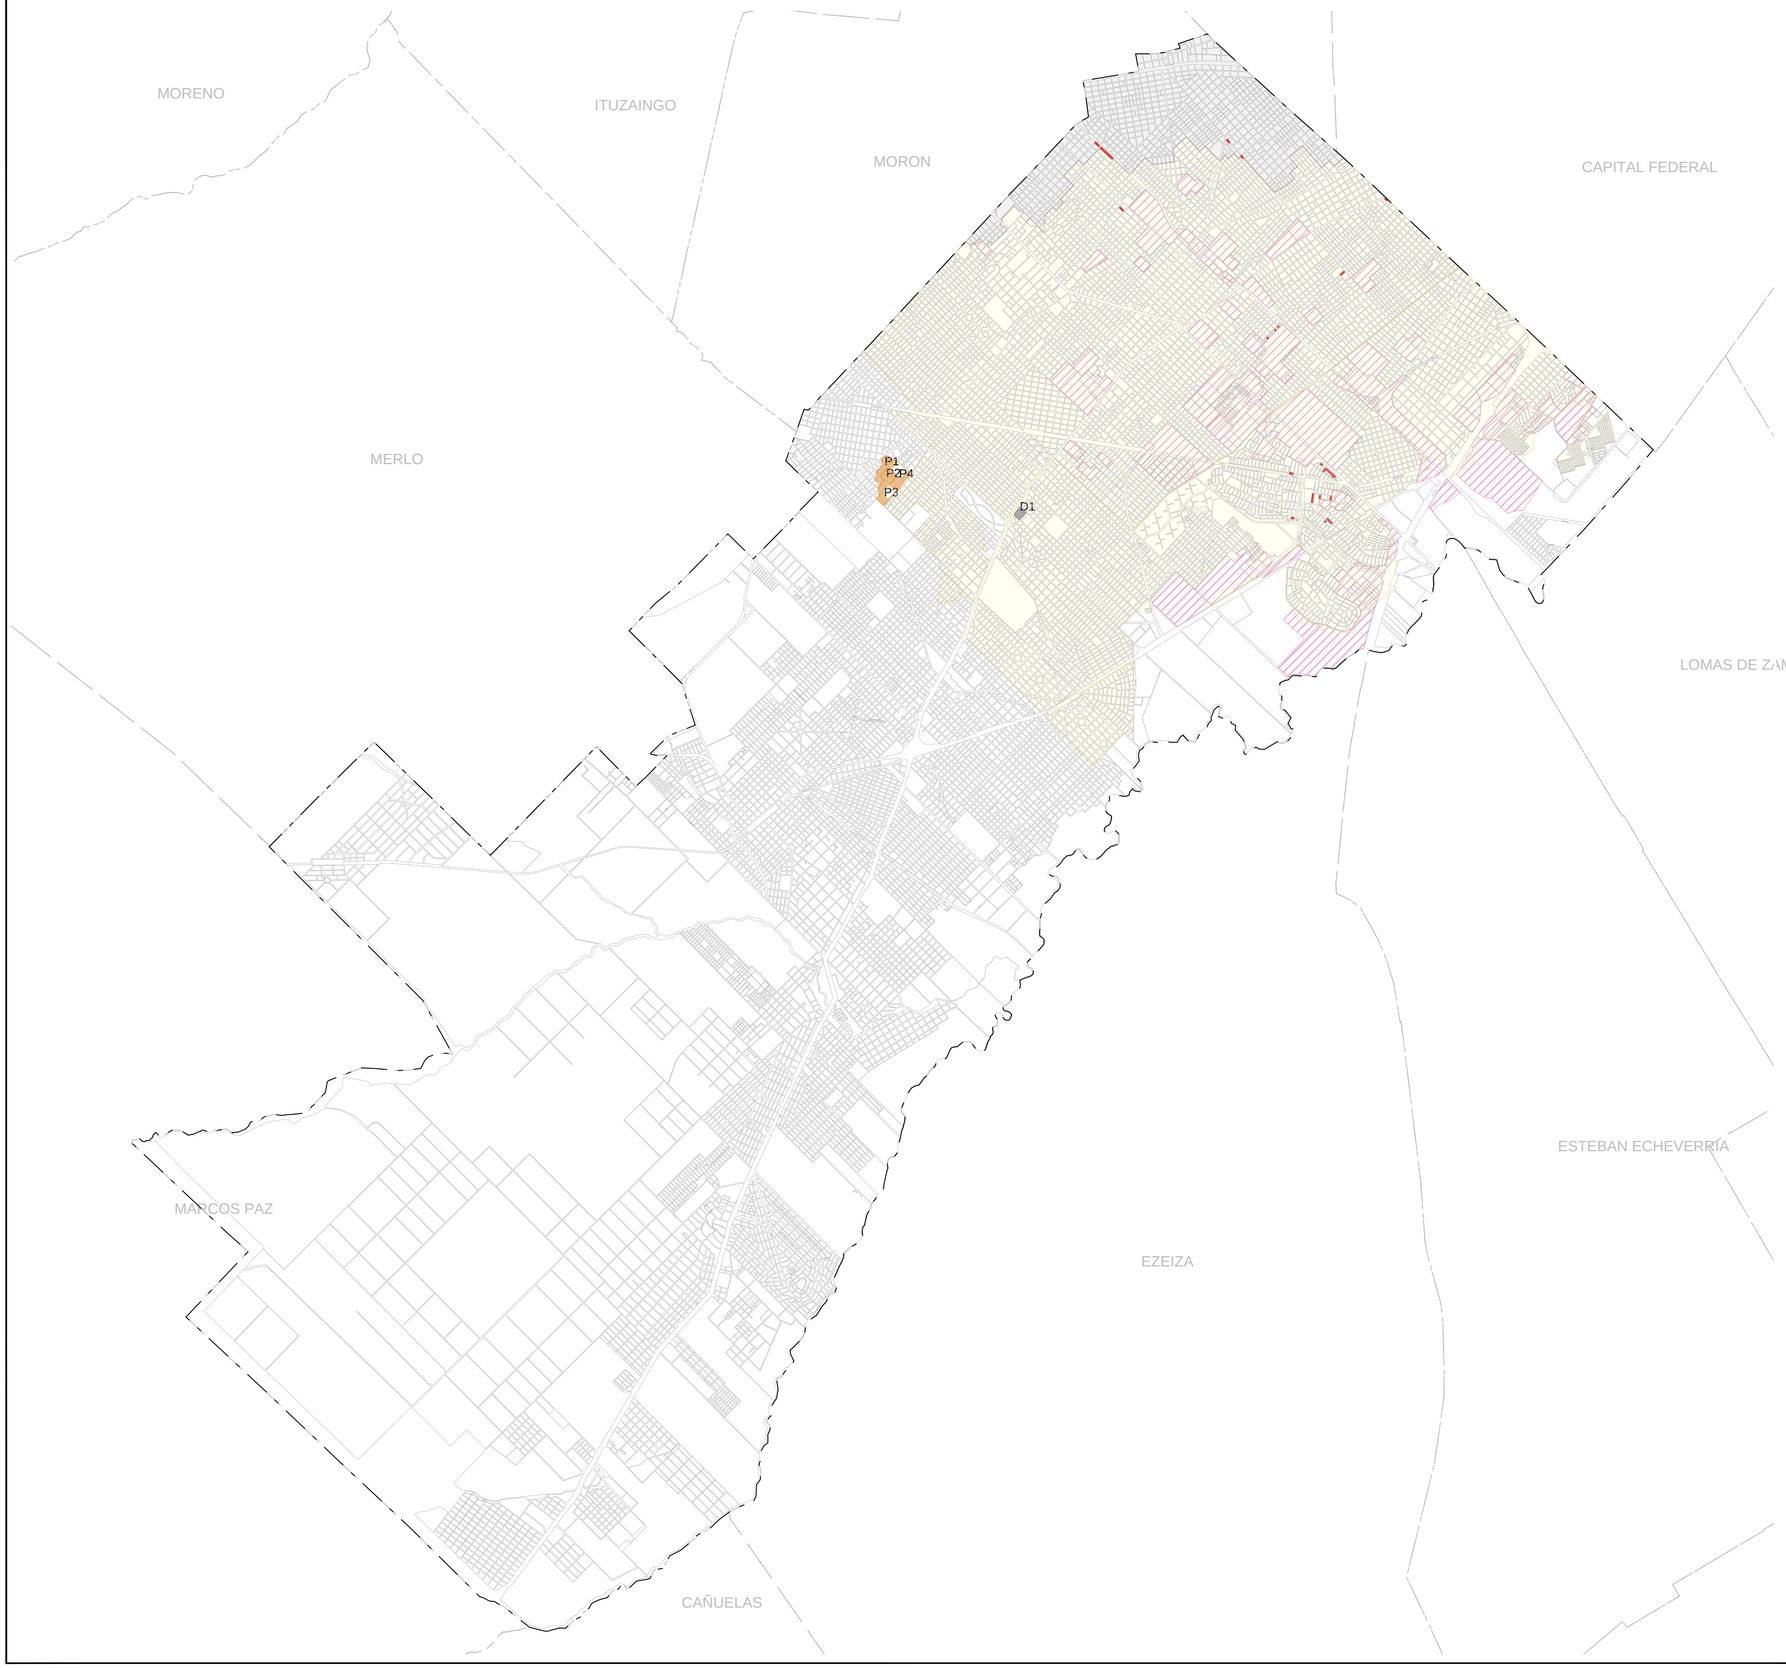

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	V_OC70306 - CASTILLO 3 M1 (C+T) - HAB1065 -DRO-HC
P2	V_OC70307-CASTILLO 3 M2 (C+T) HAB 1066-DRO HC
P3	V_OC70309 - CASTILLO 3 M4 (C+T) HAB 1068-DRO-HC
P4	V_OC70308 - CASTILLO 3 M3 (C+T) HAHB 1067-DRO-HC

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	ALTOS DE LAFERRERE

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO LA MATANZA

5/5/2026


1:57500

REGION OESTE

2025

IETMAT20

Censo 2022

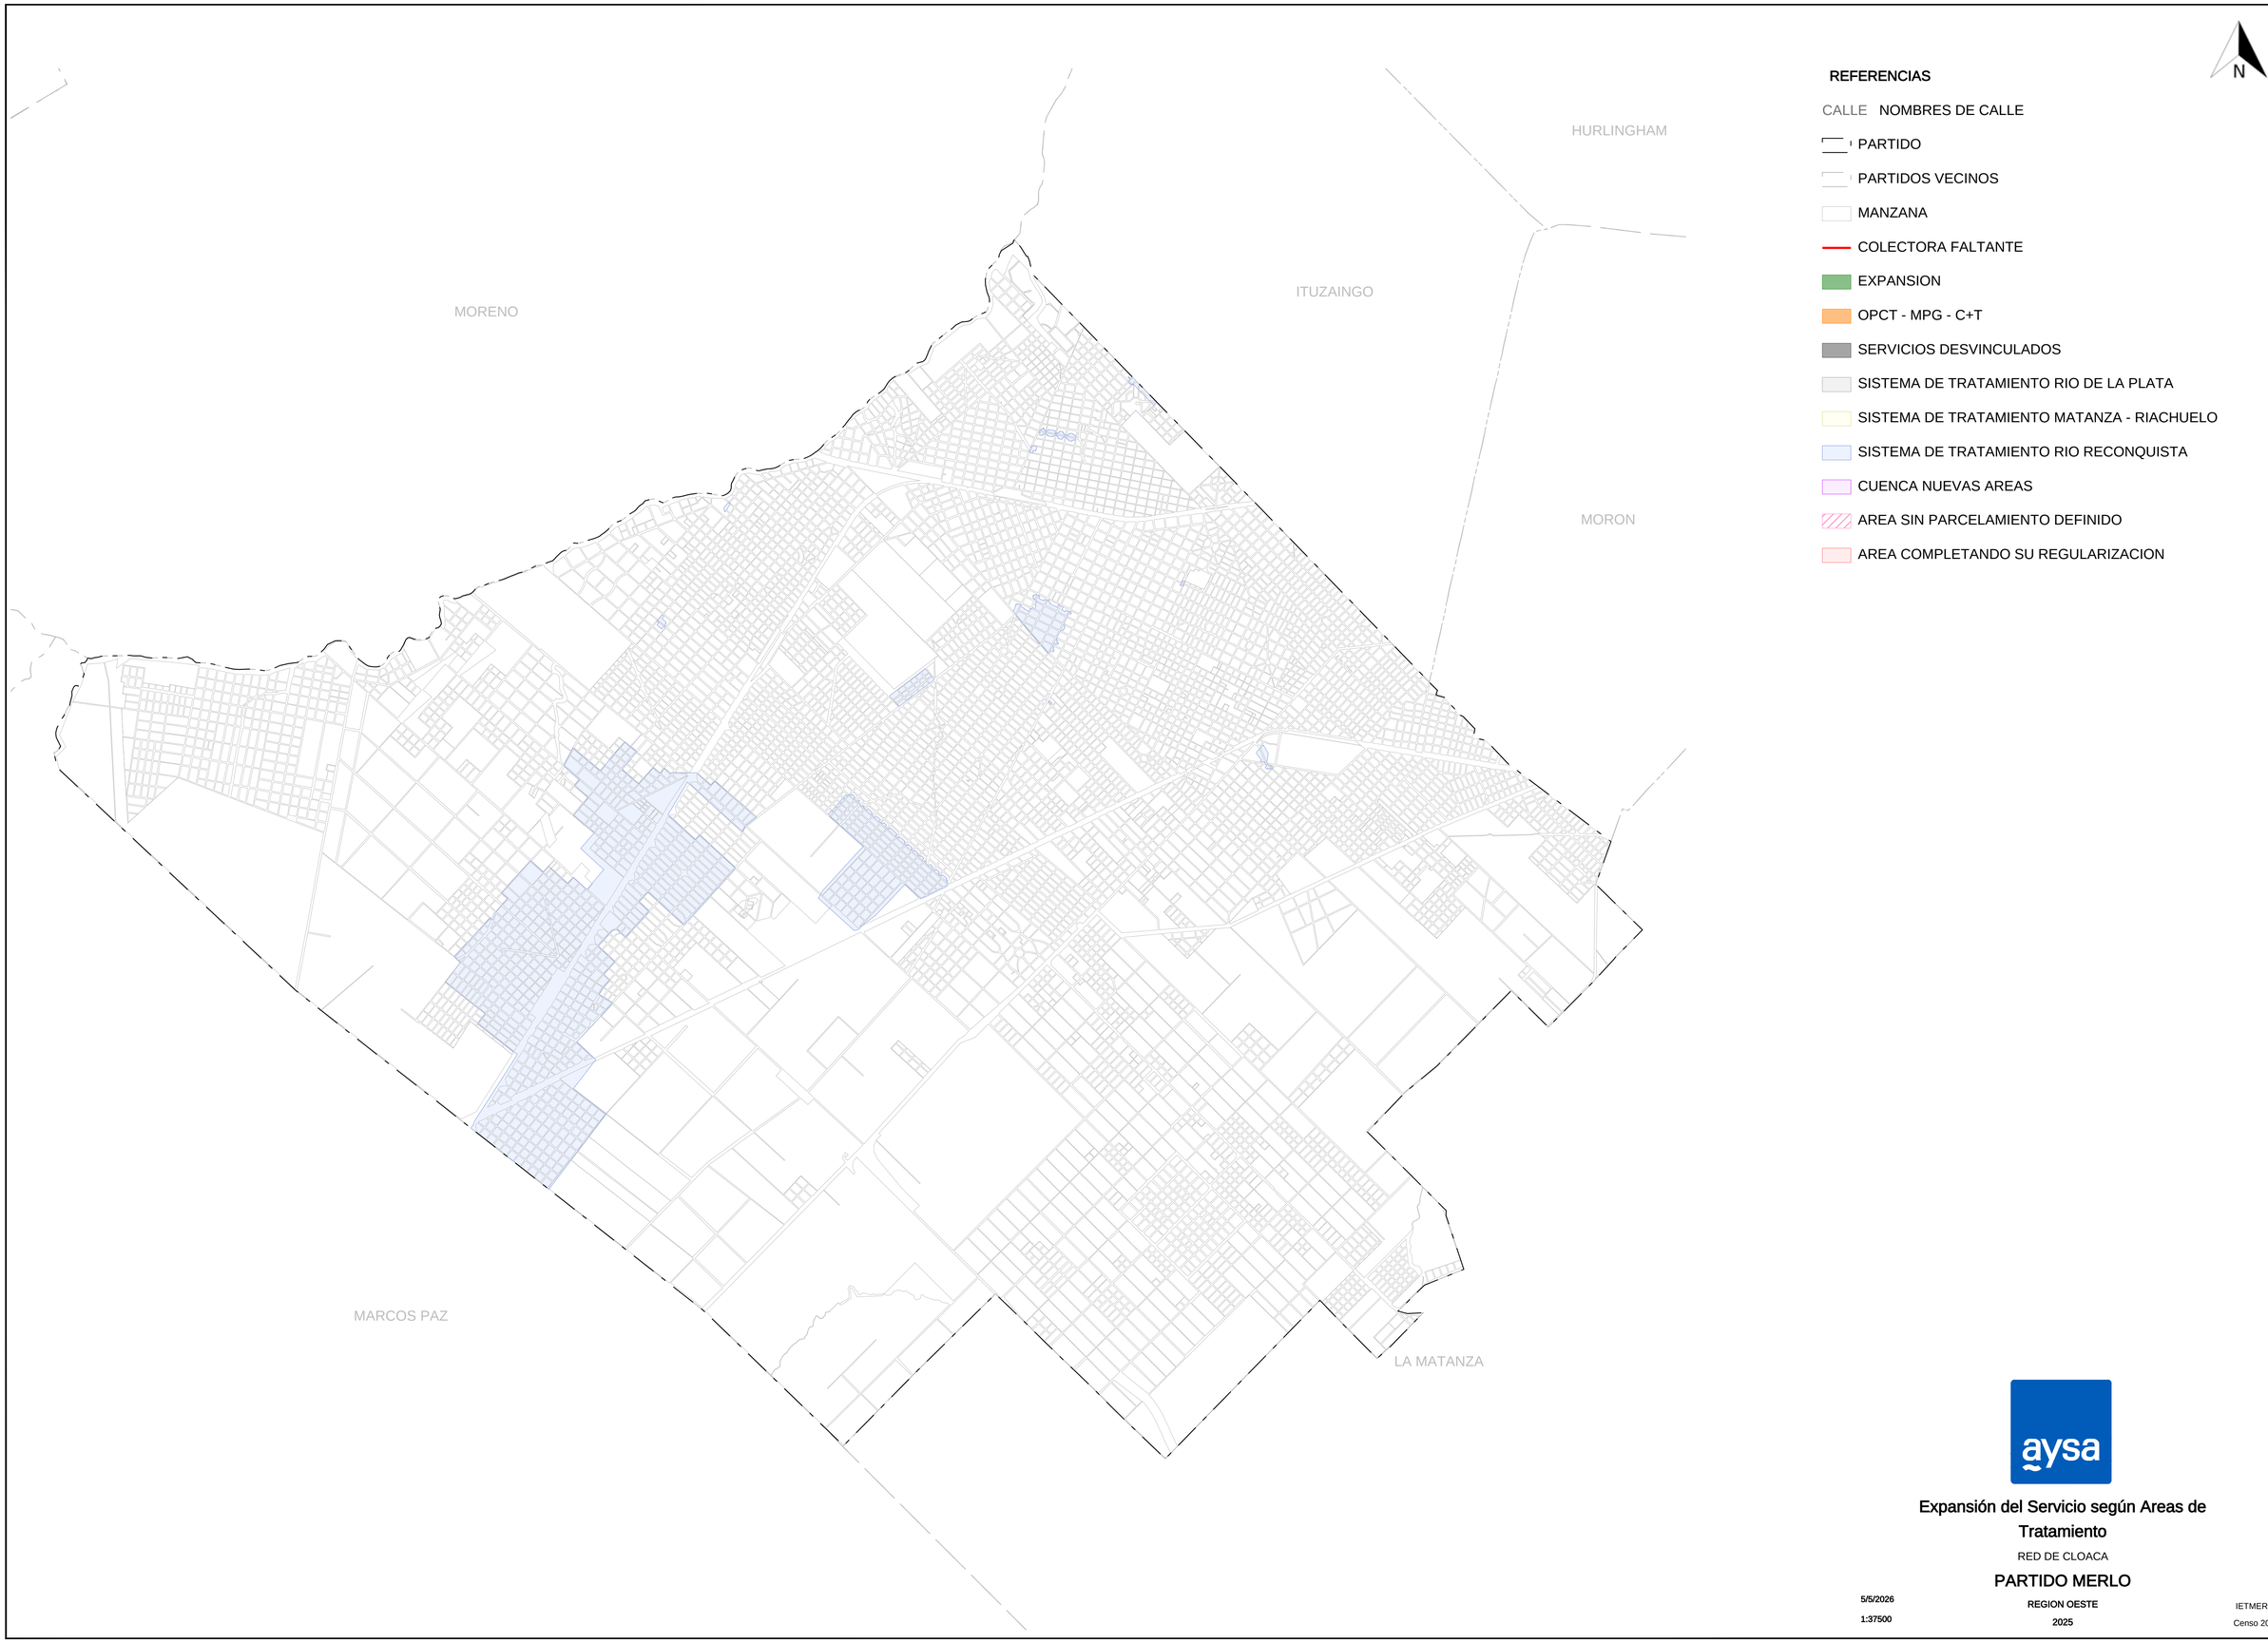

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO MERLO

5/5/2026


1:37500

REGION OESTE

2025

IETMER20

Censo 2022

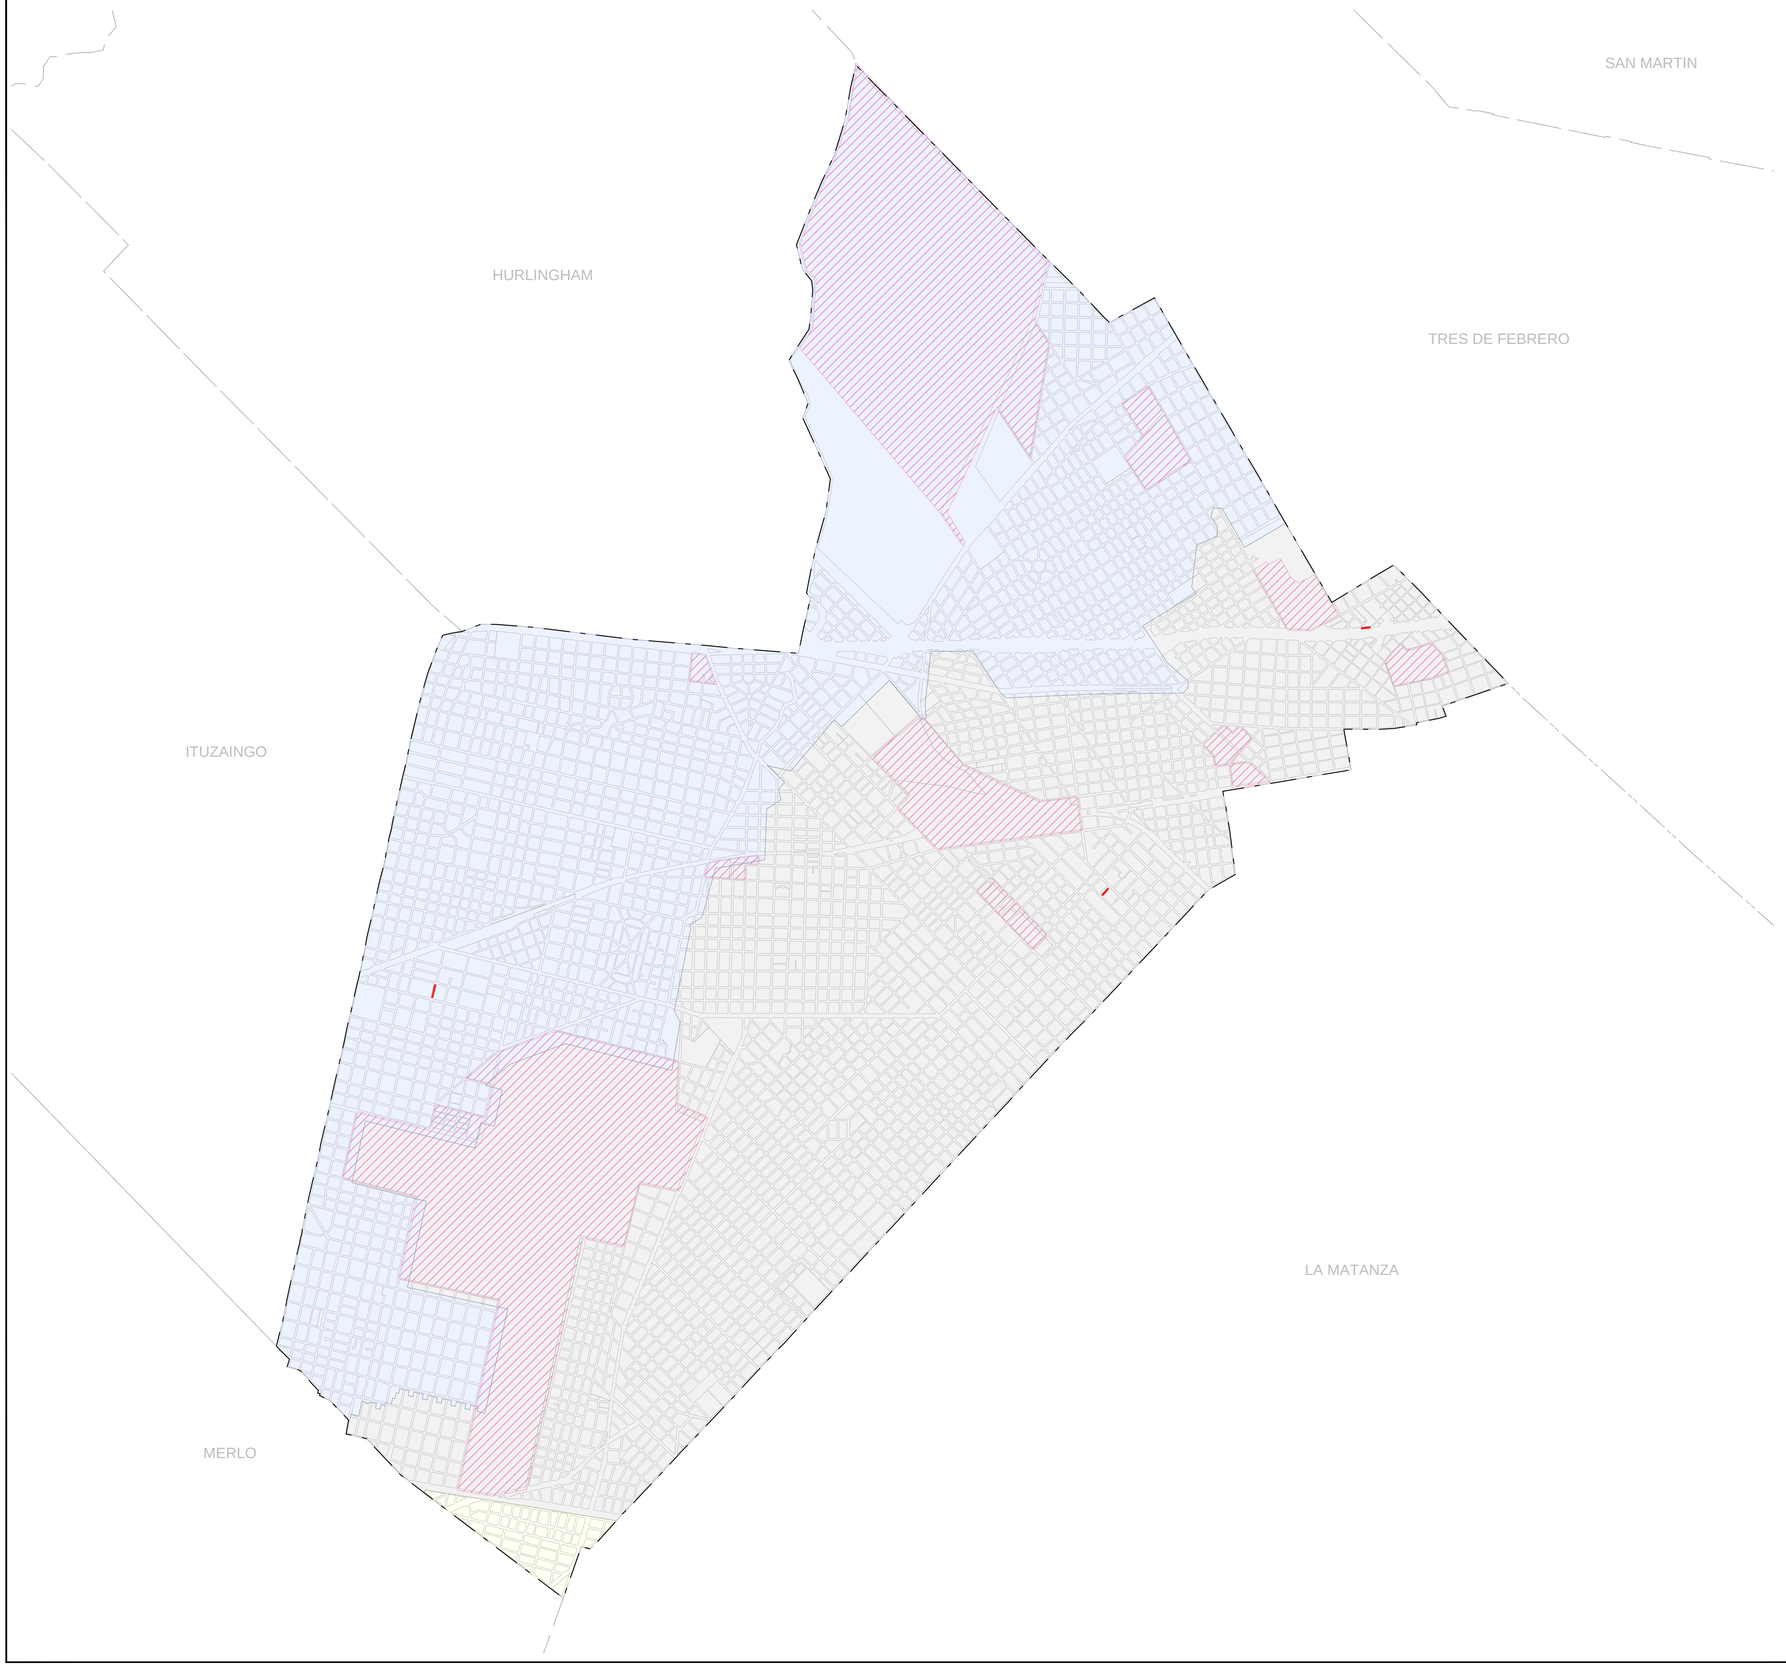

N

REFERENCIAS

- CALLE NOMBRES DE CALLE
- PARTIDO
- PARTIDOS VECINOS
- MANZANA
- COLECTORA FALTANTE
- EXPANSION
- OPCT - MPG - C+T
- SERVICIOS DESVINCULADOS
- SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA
- SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO
- SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA
- CUENCA NUEVAS AREAS
- AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO
- AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO MORON

5/5/2026


1:25000

REGION OESTE

2025

IETMOR20

Censo 2022

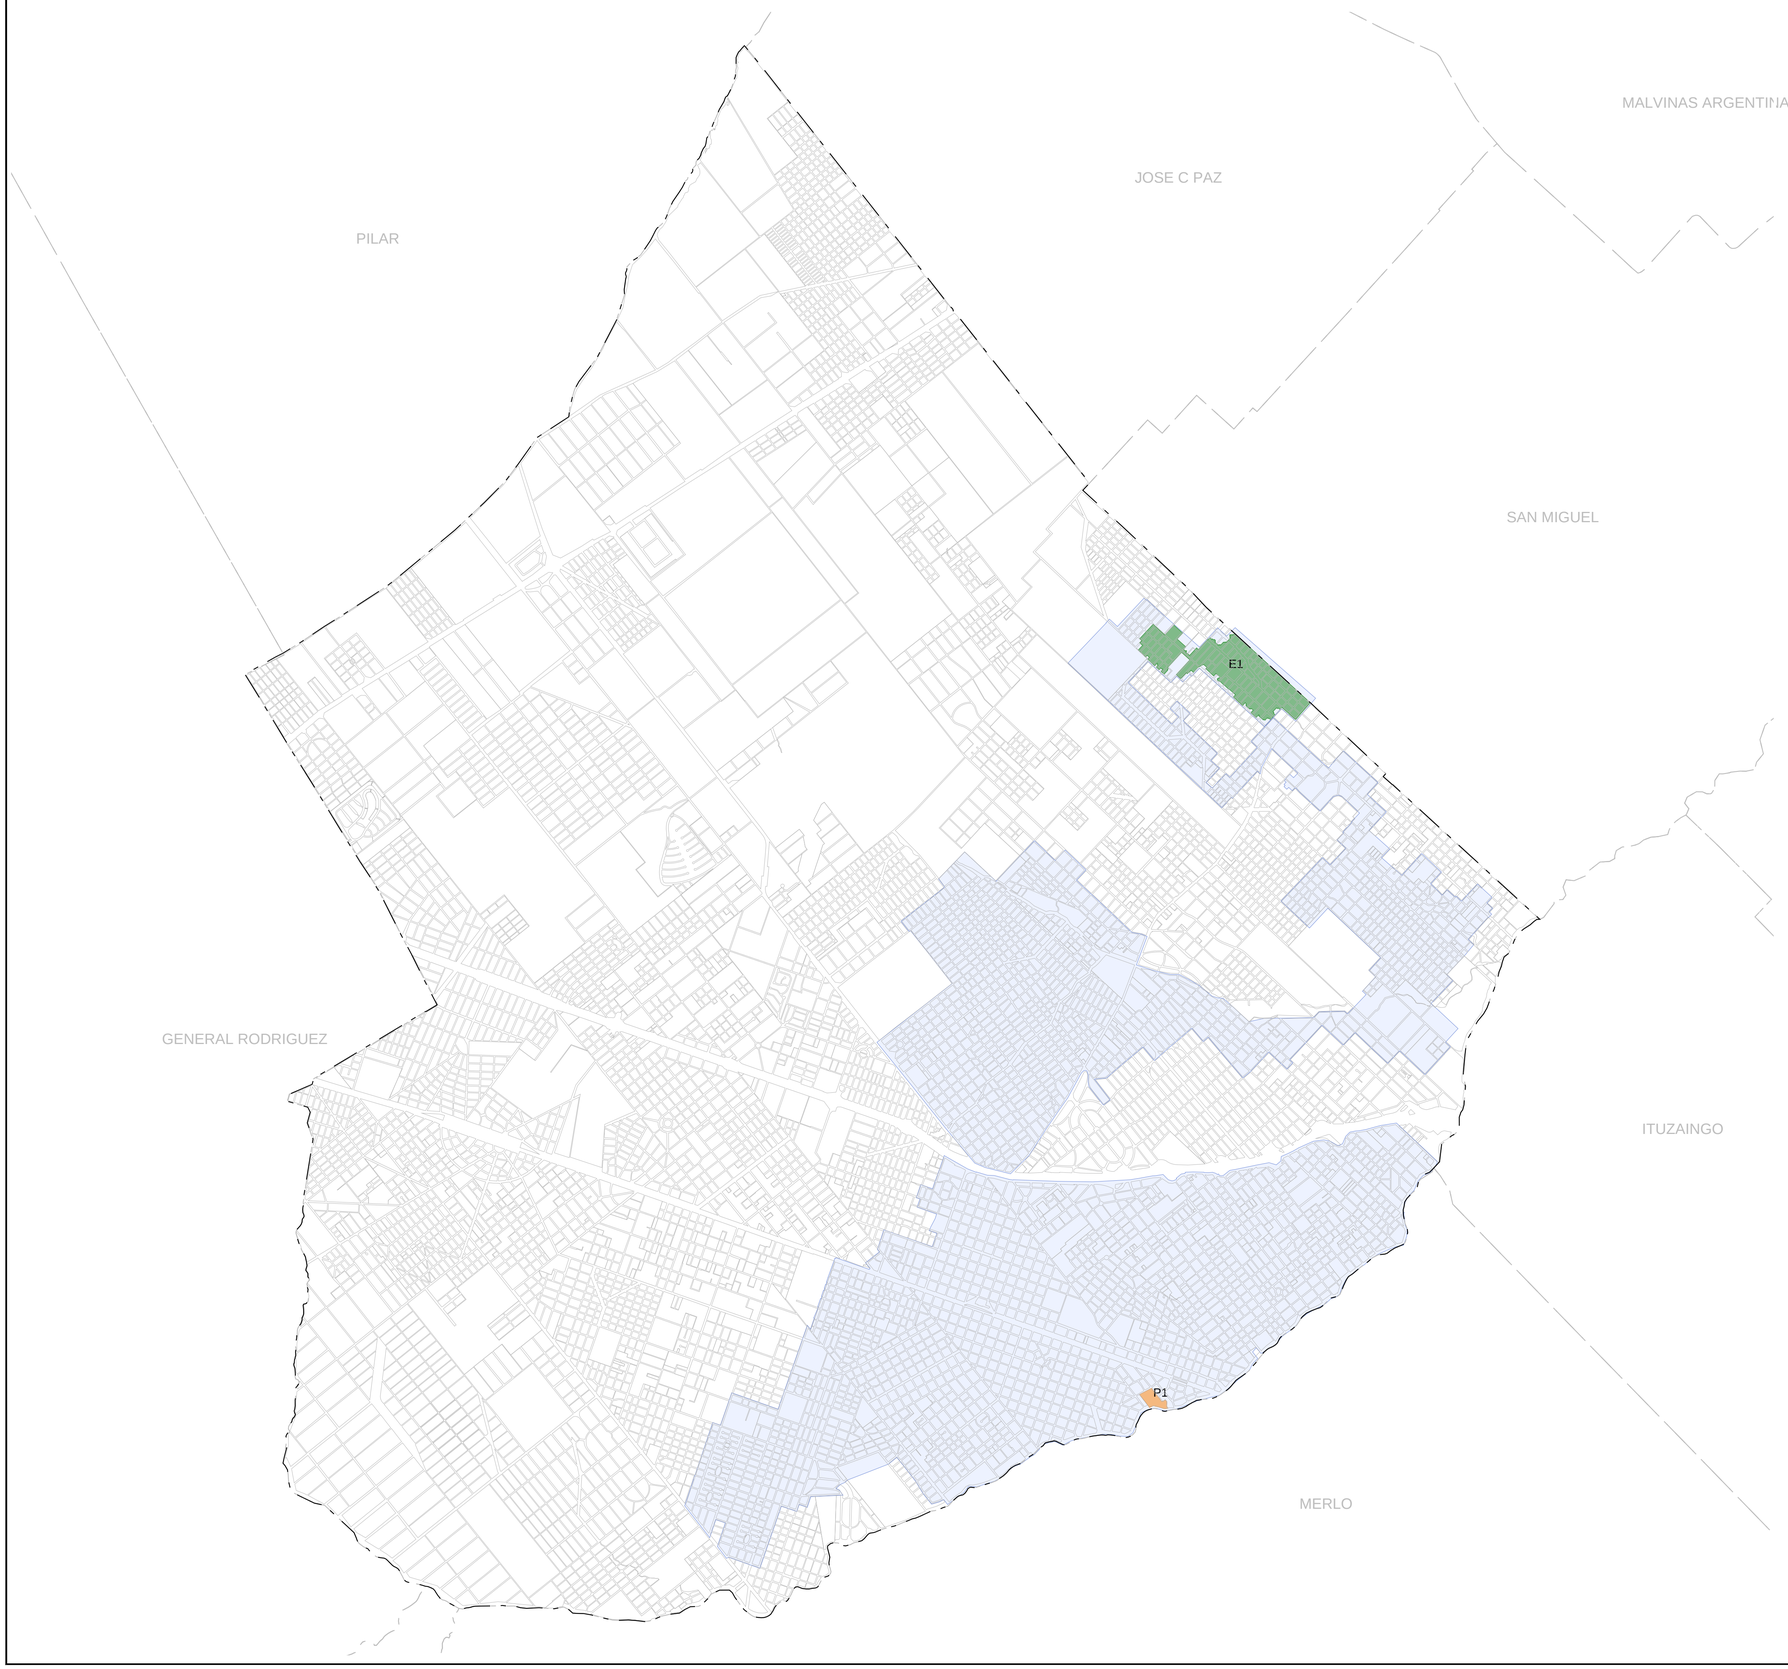

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	MARILÓ RESTO 1 (OC 70241)

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	Vinculación Cloacal B° Barrancas

SERVICIOS DESVINCULADOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO MORENO

5/5/2026


1:37500

REGION OESTE

2025

IETMRN20

Censo 2022

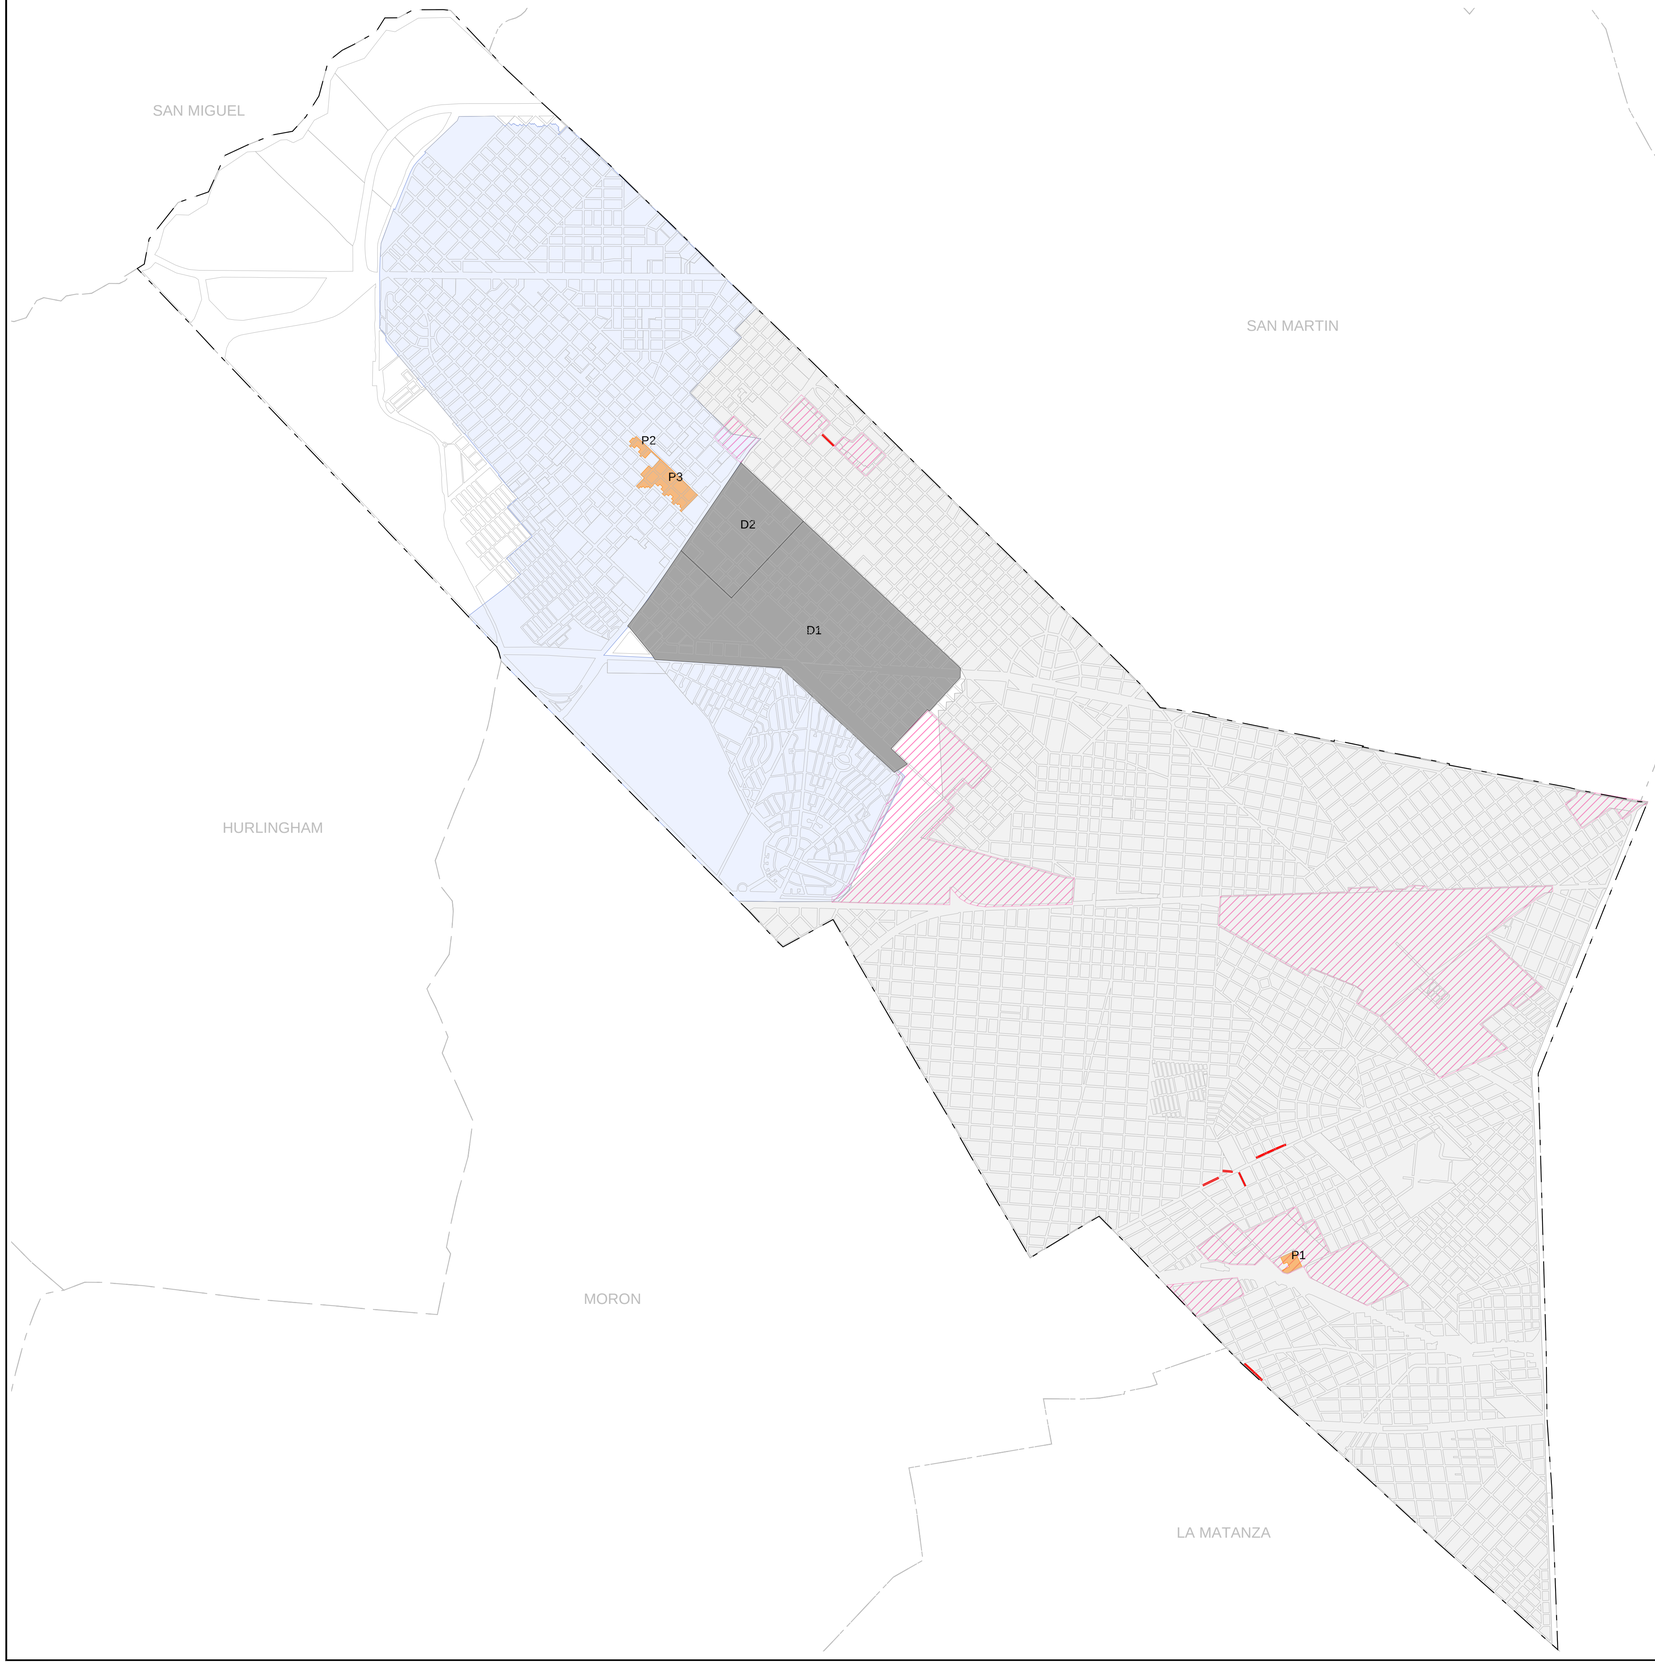

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	DE STEFANO
P2	V_OC70291 . B° LOMA HERMOSA 2A M2 (C+T) HAB1063-DRO-HC
P3	V_OC70094 - B° LOMA HERMOSA 2A M1 (C+T) HAB 1069-DRO-HC

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	COMACO
D2	S/N

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO TRES DE FEBRERO

5/5/2026

1:22500


REGION OESTE

2025

IETTRE20

Censo 2022

Planos de Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales Región Sudoeste

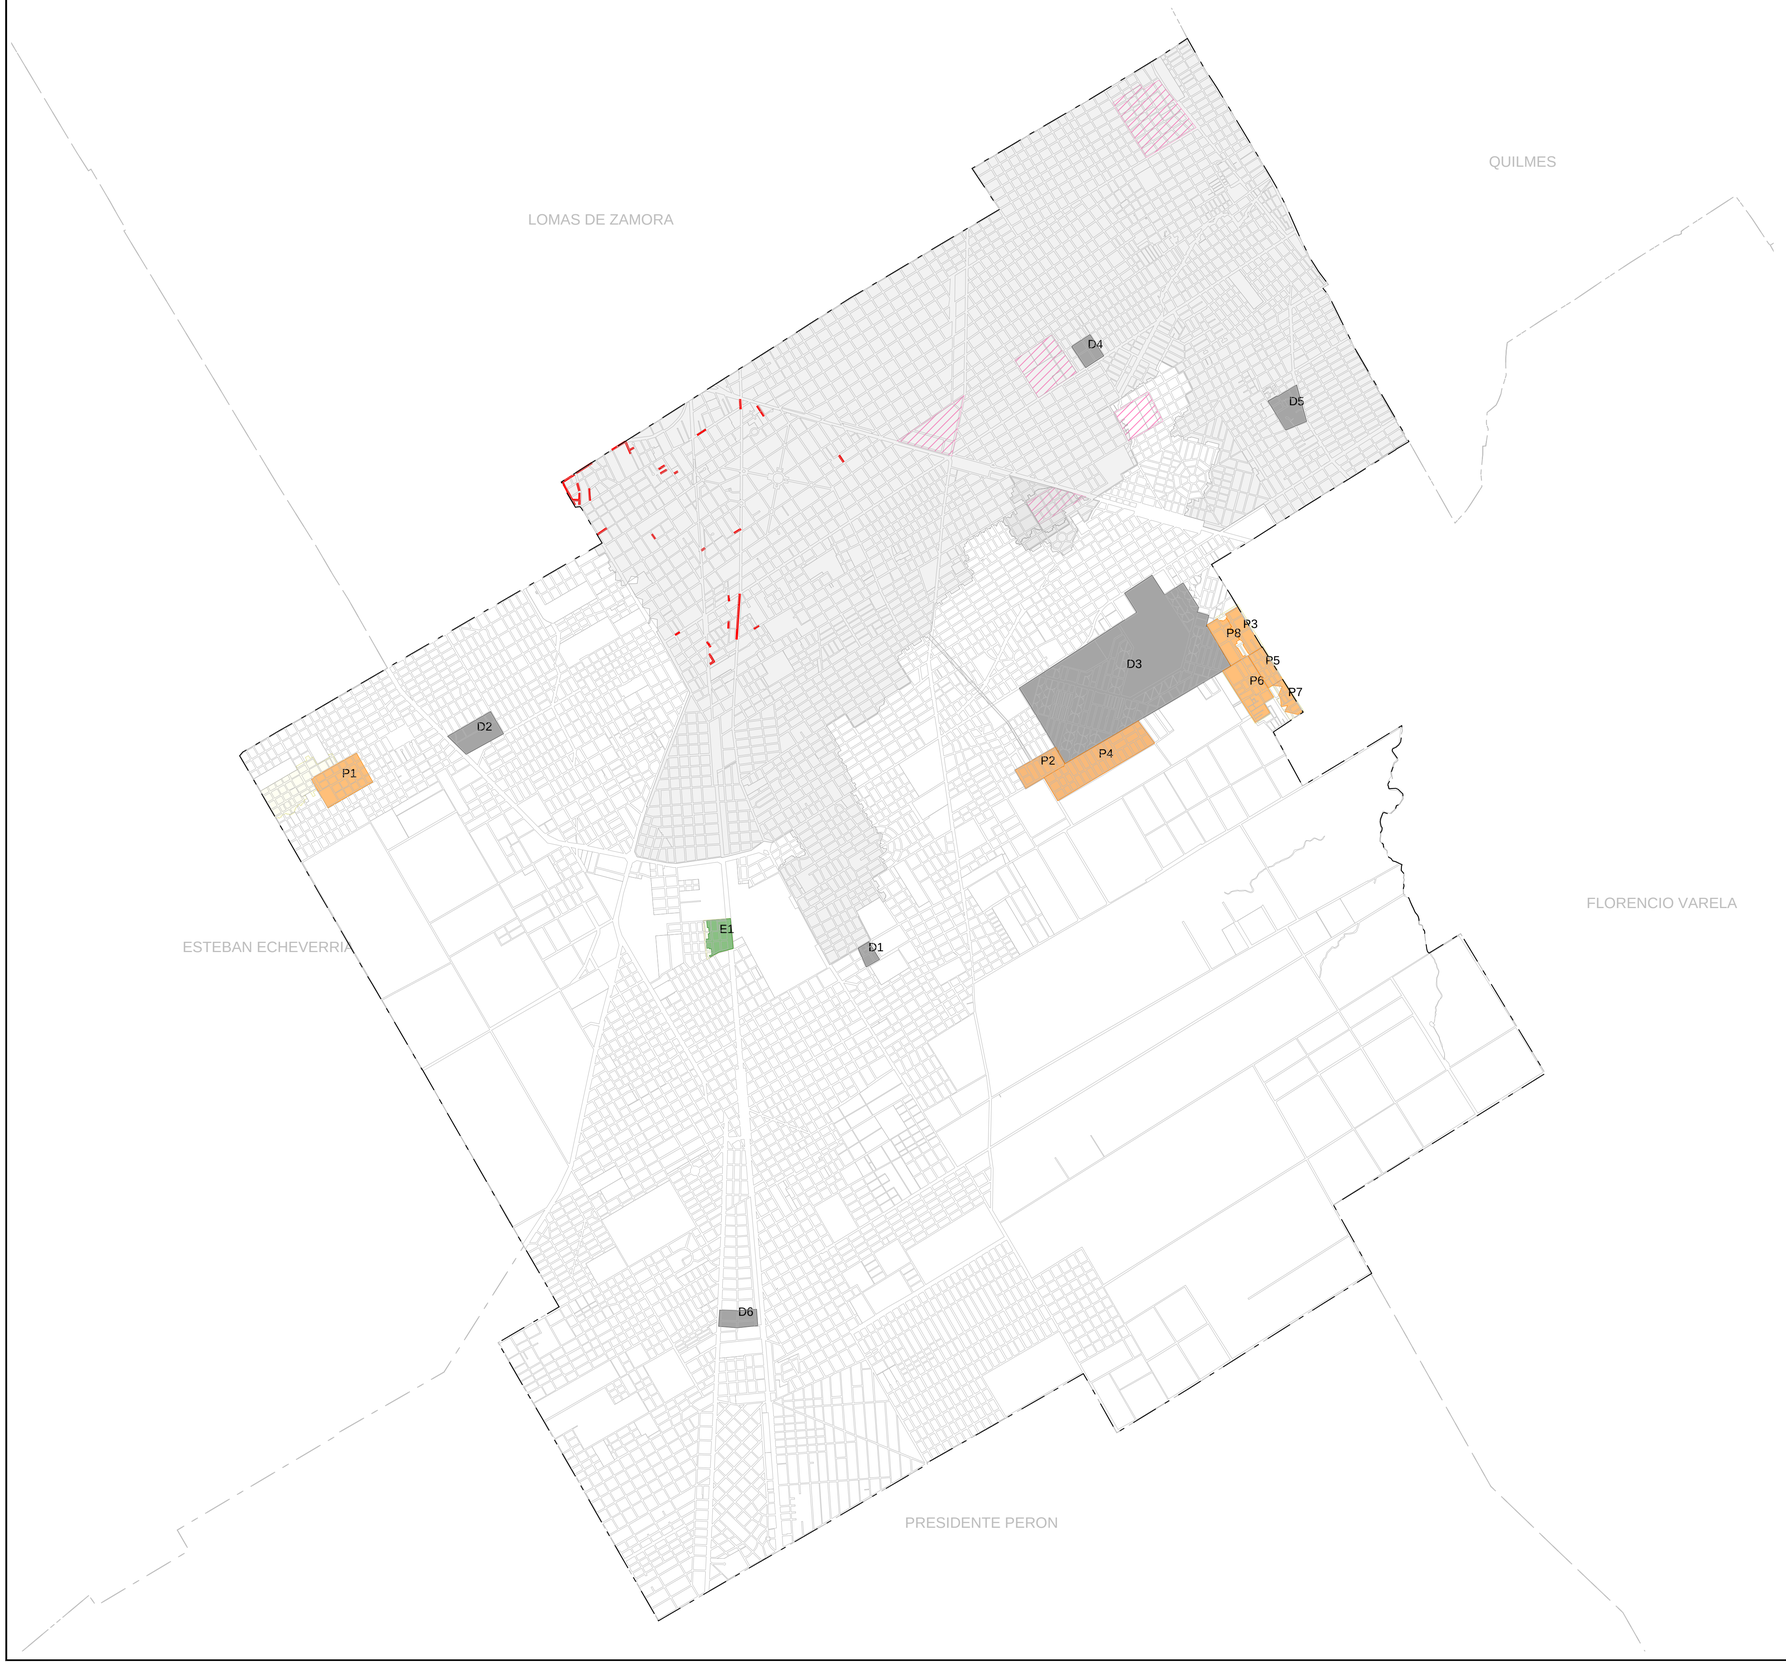

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	Esperanza Oeste 2 – Longchamps Cuenca 4 Sector 2 (Parcial

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	DRSO - Dto. Almirante Brown-OPCT - B° Lindo 1 y 2
P2	C+T – B° El Cerrito M1
P3	Brown 1 M5-Parcial-SC70371
P4	DIPAC-DON ORIONE VIEJO-RES 1972
P5	C+T- BROWN 1 M3
P6	Red Secundaria Brow 1 M4
P7	Brown 1 M2-parcial-SC70341
P8	C+T - BROWN 1 M6 - SC70168-RE1980

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	Corimayo
D2	Empleados de Comercio
D3	Don Orione
D4	San Javier
D5	San Francisco Solano
D6	U.P.C.N.

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO ALMTE BROWN

11/5/2026


1:32500

REGION SUDOESTE

2025

IETALM20

Censo 2022

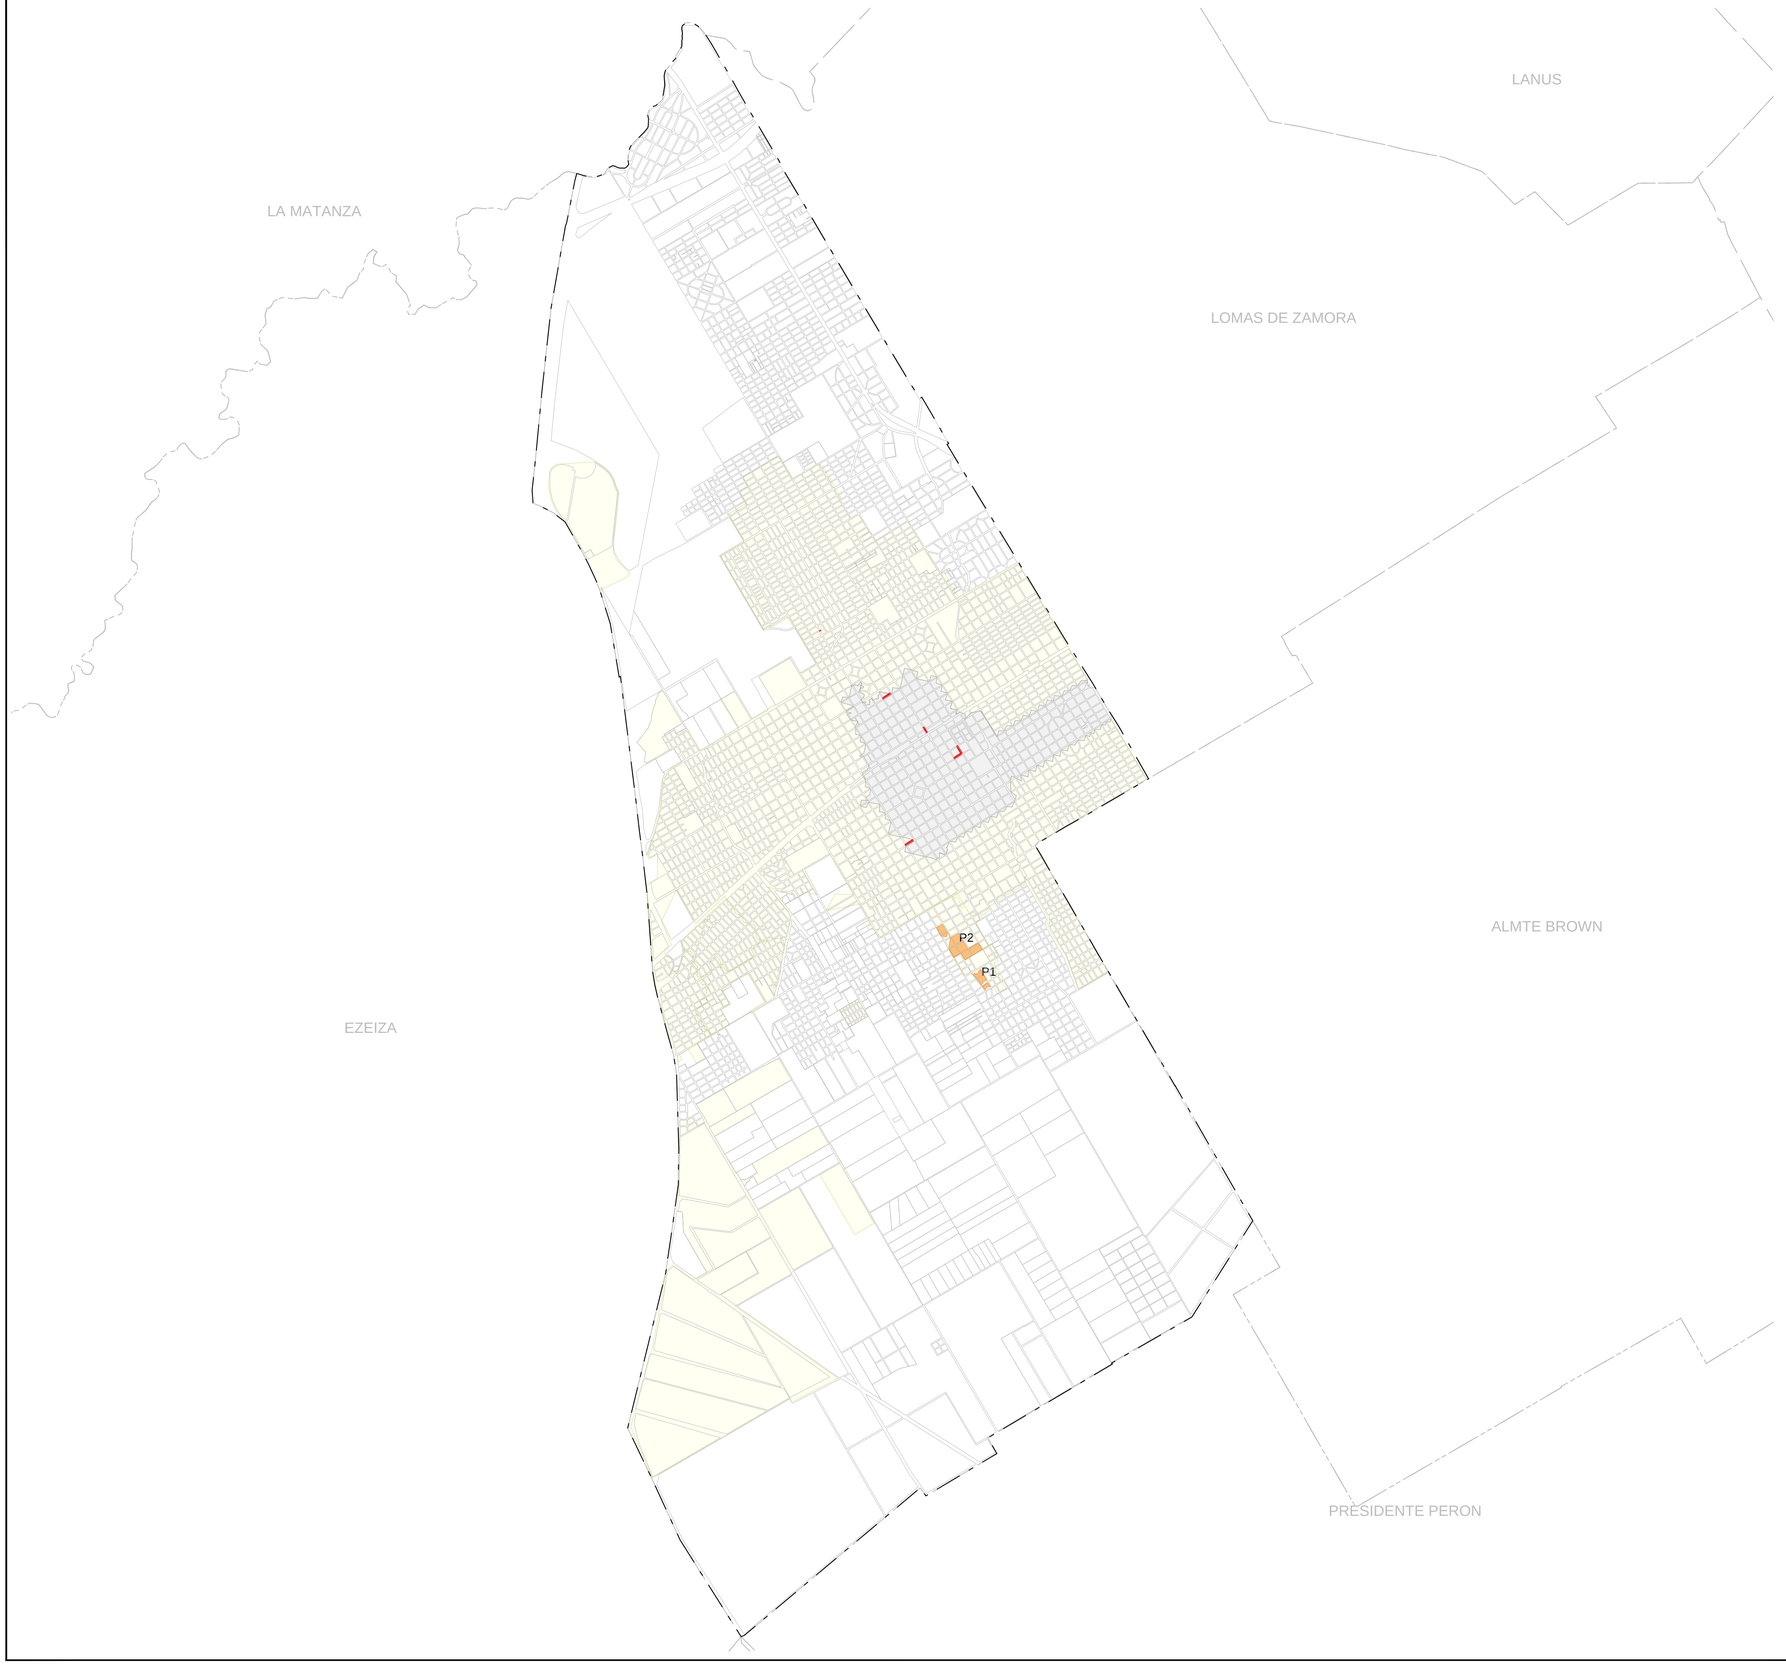

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	C+T Santa Catalina 2 Etapa M7 - Parcial SC70355
P2	C+T Santa Catalina 2 Etapa M4 - Parcial SC70330

SERVICIOS DESVINCULADOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO ESTEBAN ECHEVERRIA

11/5/2026


1:42500

REGION SUDOESTE

2025

IETEST20

Censo 2022

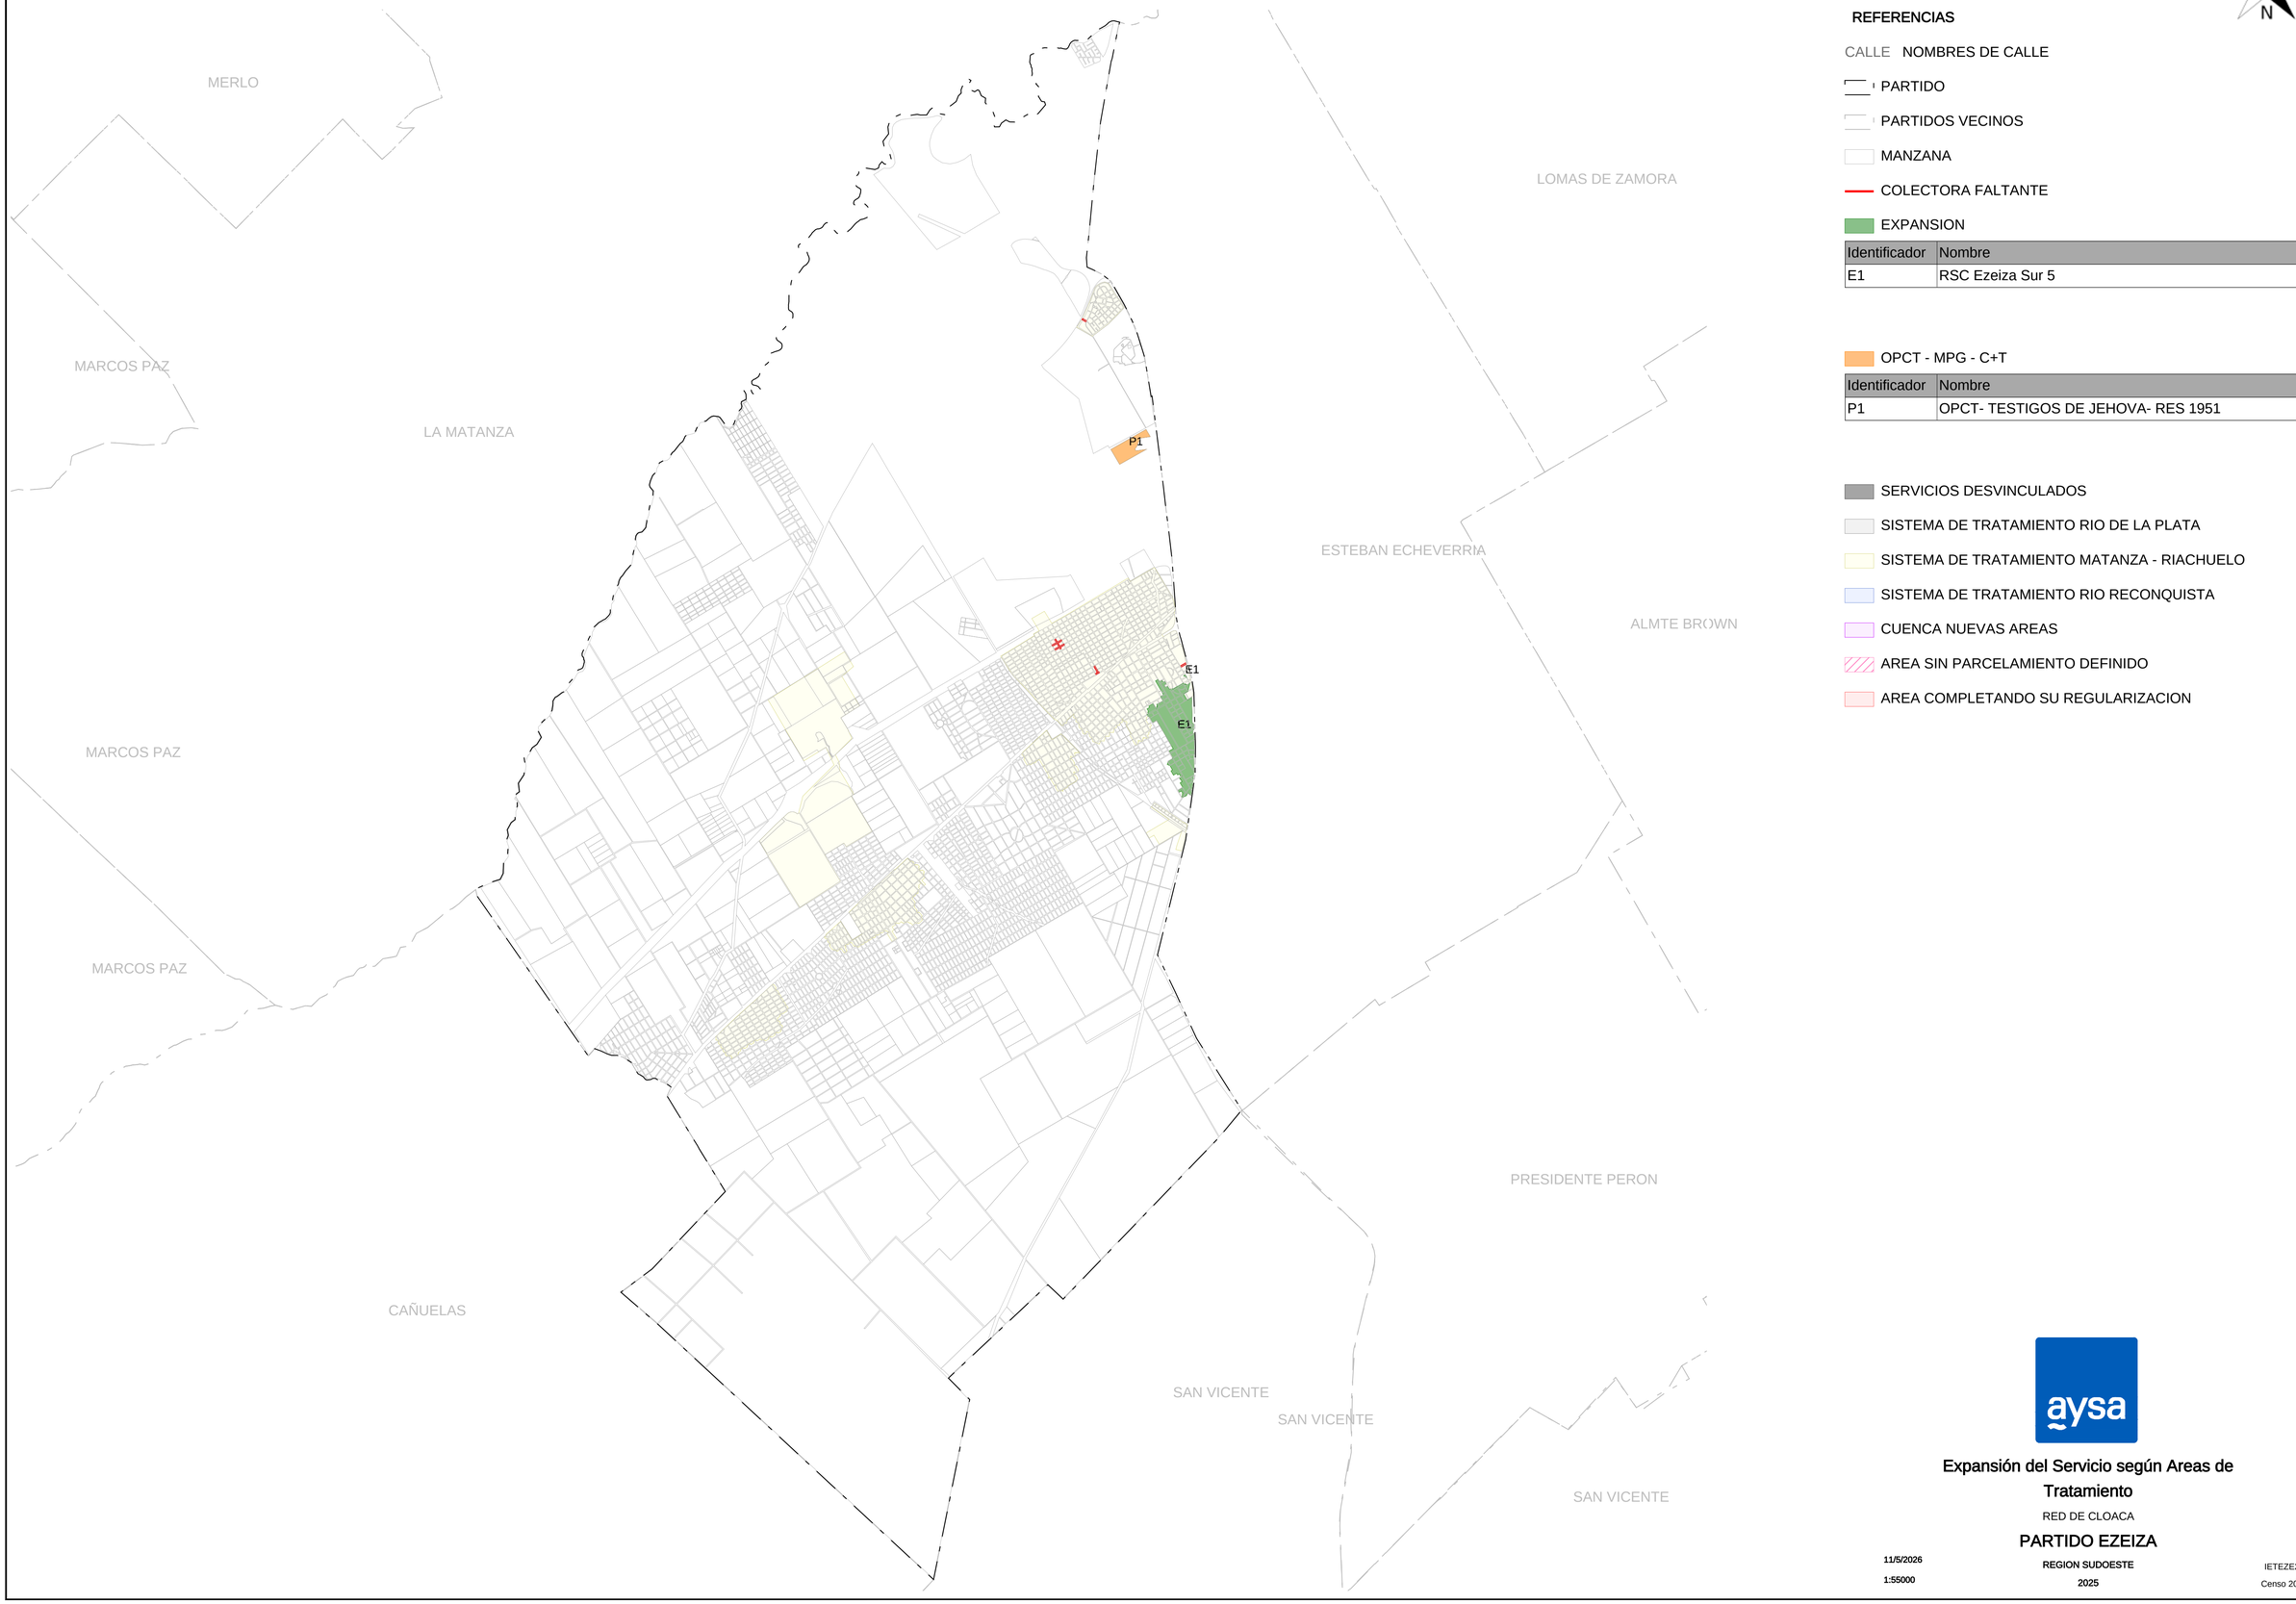

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	RSC Ezeiza Sur 5

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	OPCT- TESTIGOS DE JEHOVA- RES 1951

SERVICIOS DESVINCULADOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO EZEIZA

11/5/2026


1:55000

REGION SUDOESTE

2025

IETEZE20

Censo 2022

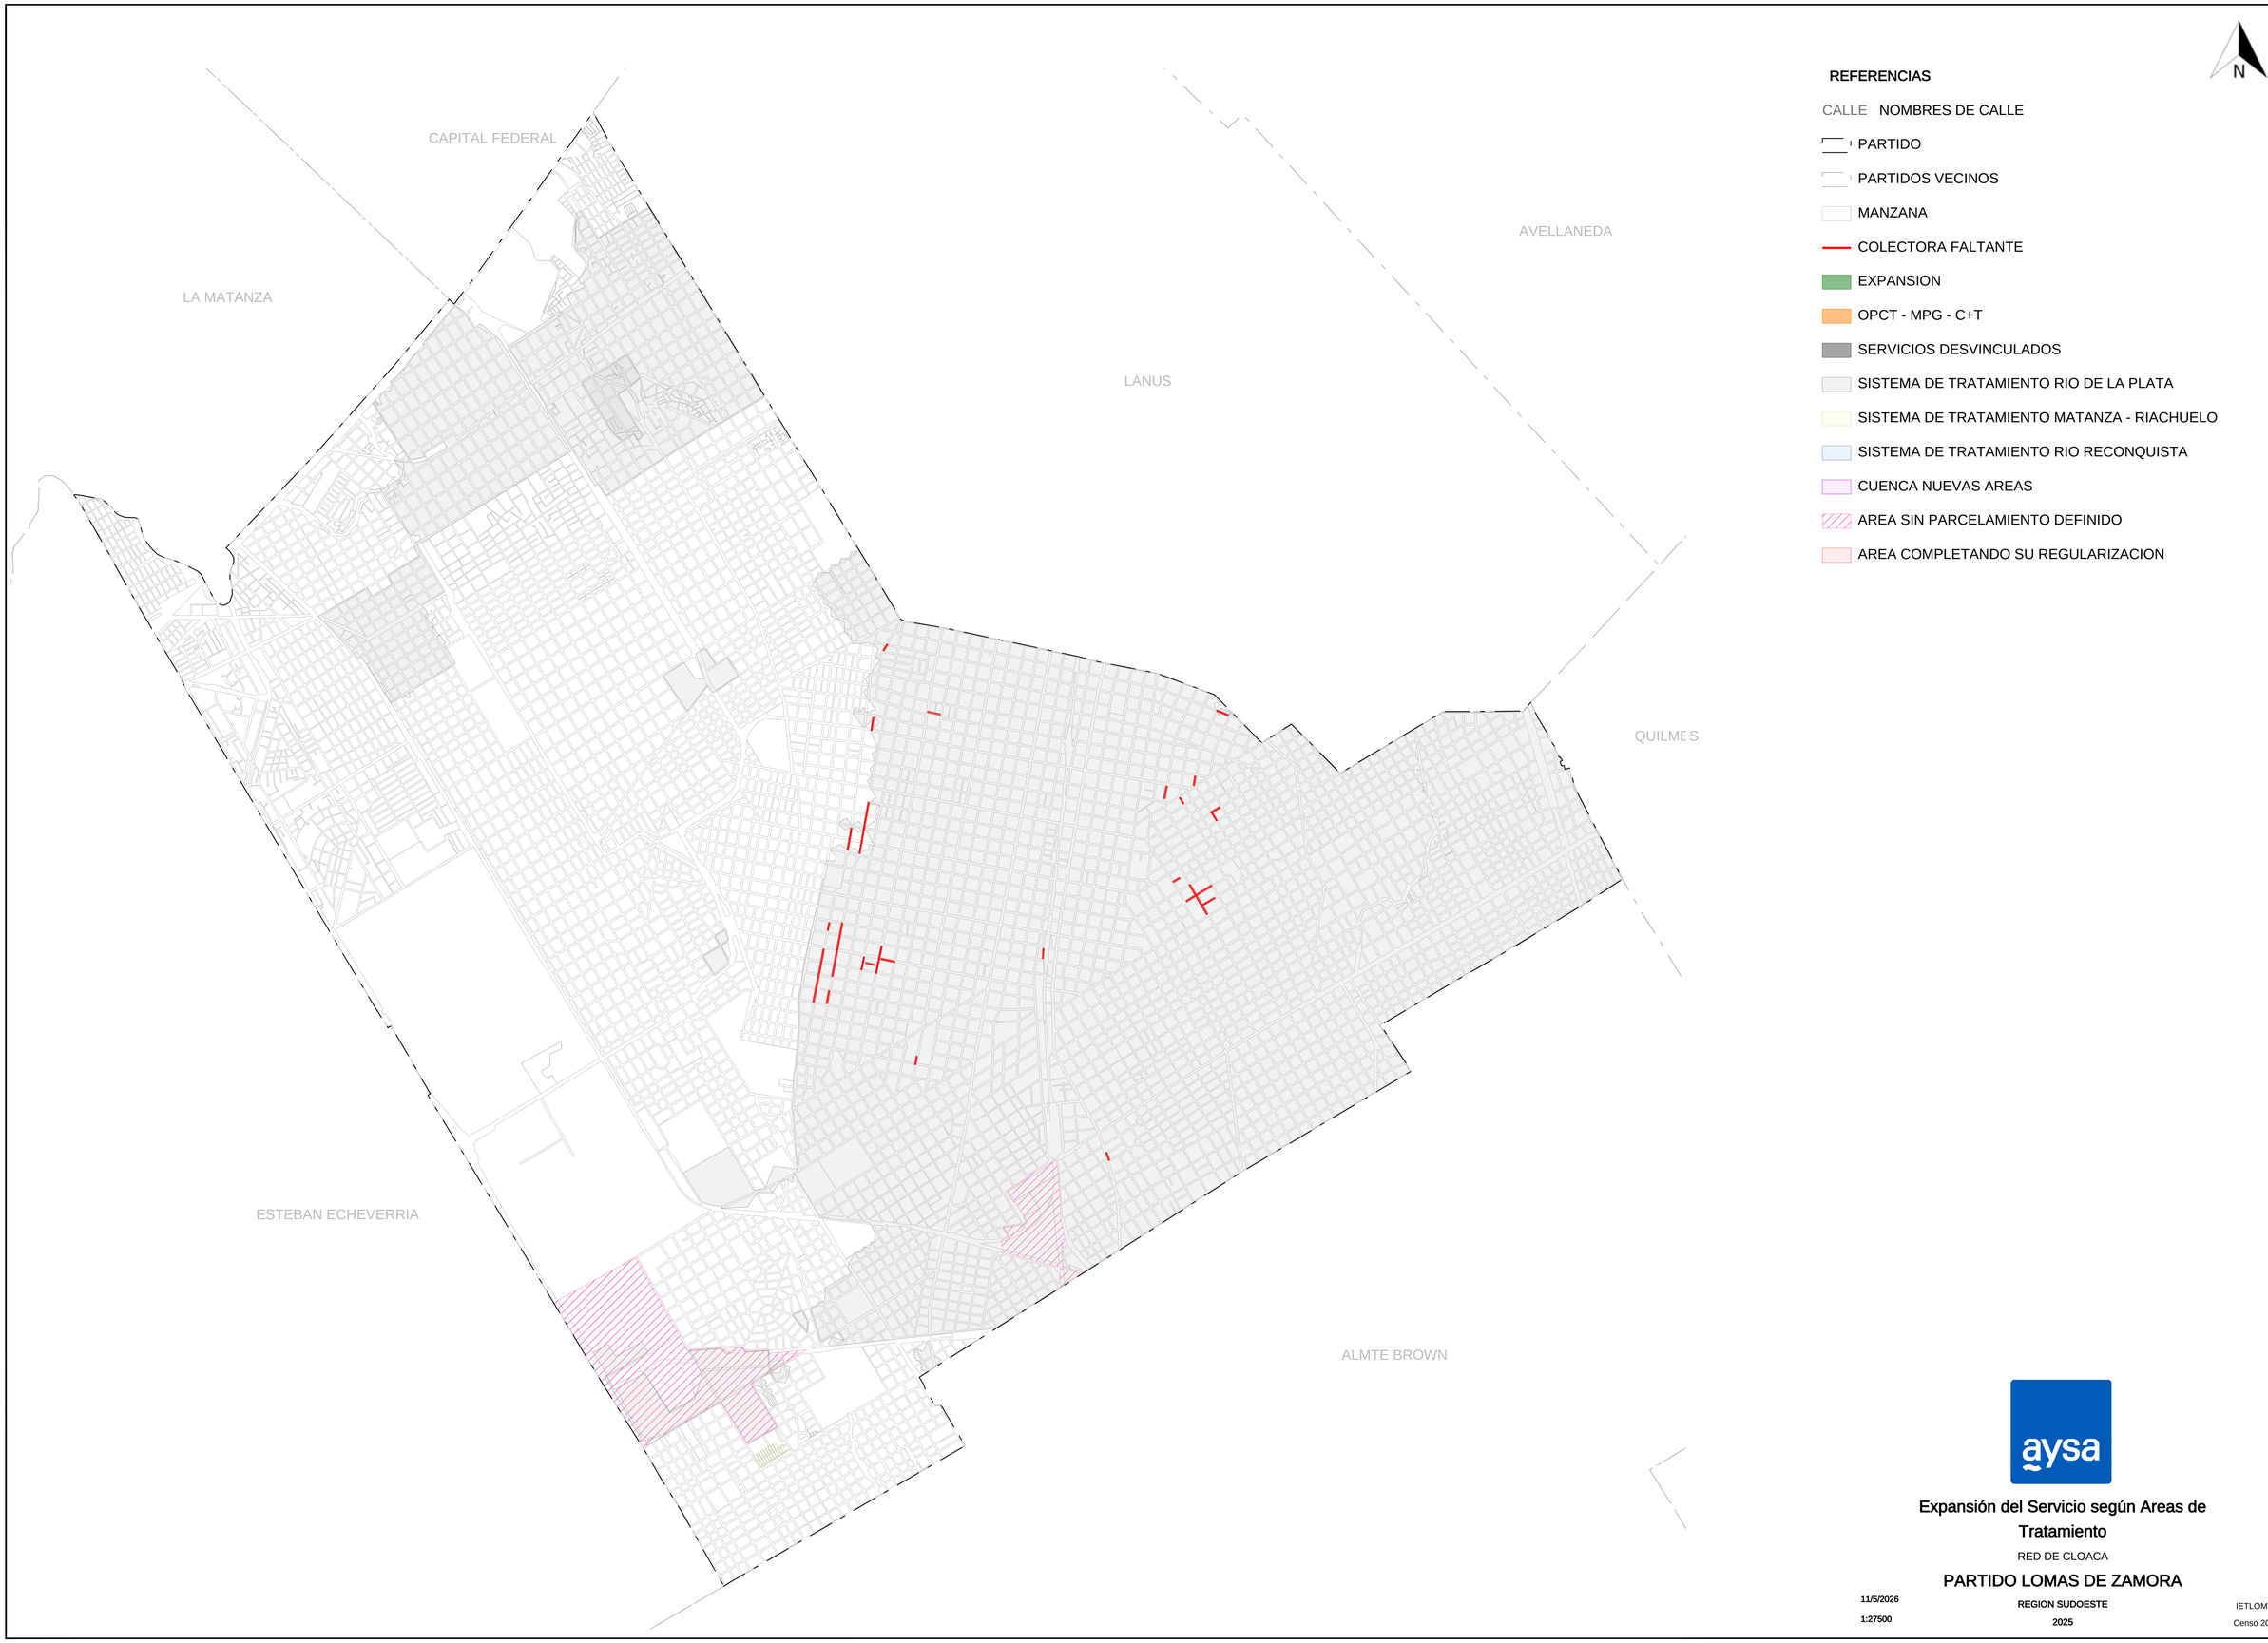

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO LOMAS DE ZAMORA

11/5/2026


1:27500

REGION SUDOESTE

2025

IETLOM20

Censo 2022

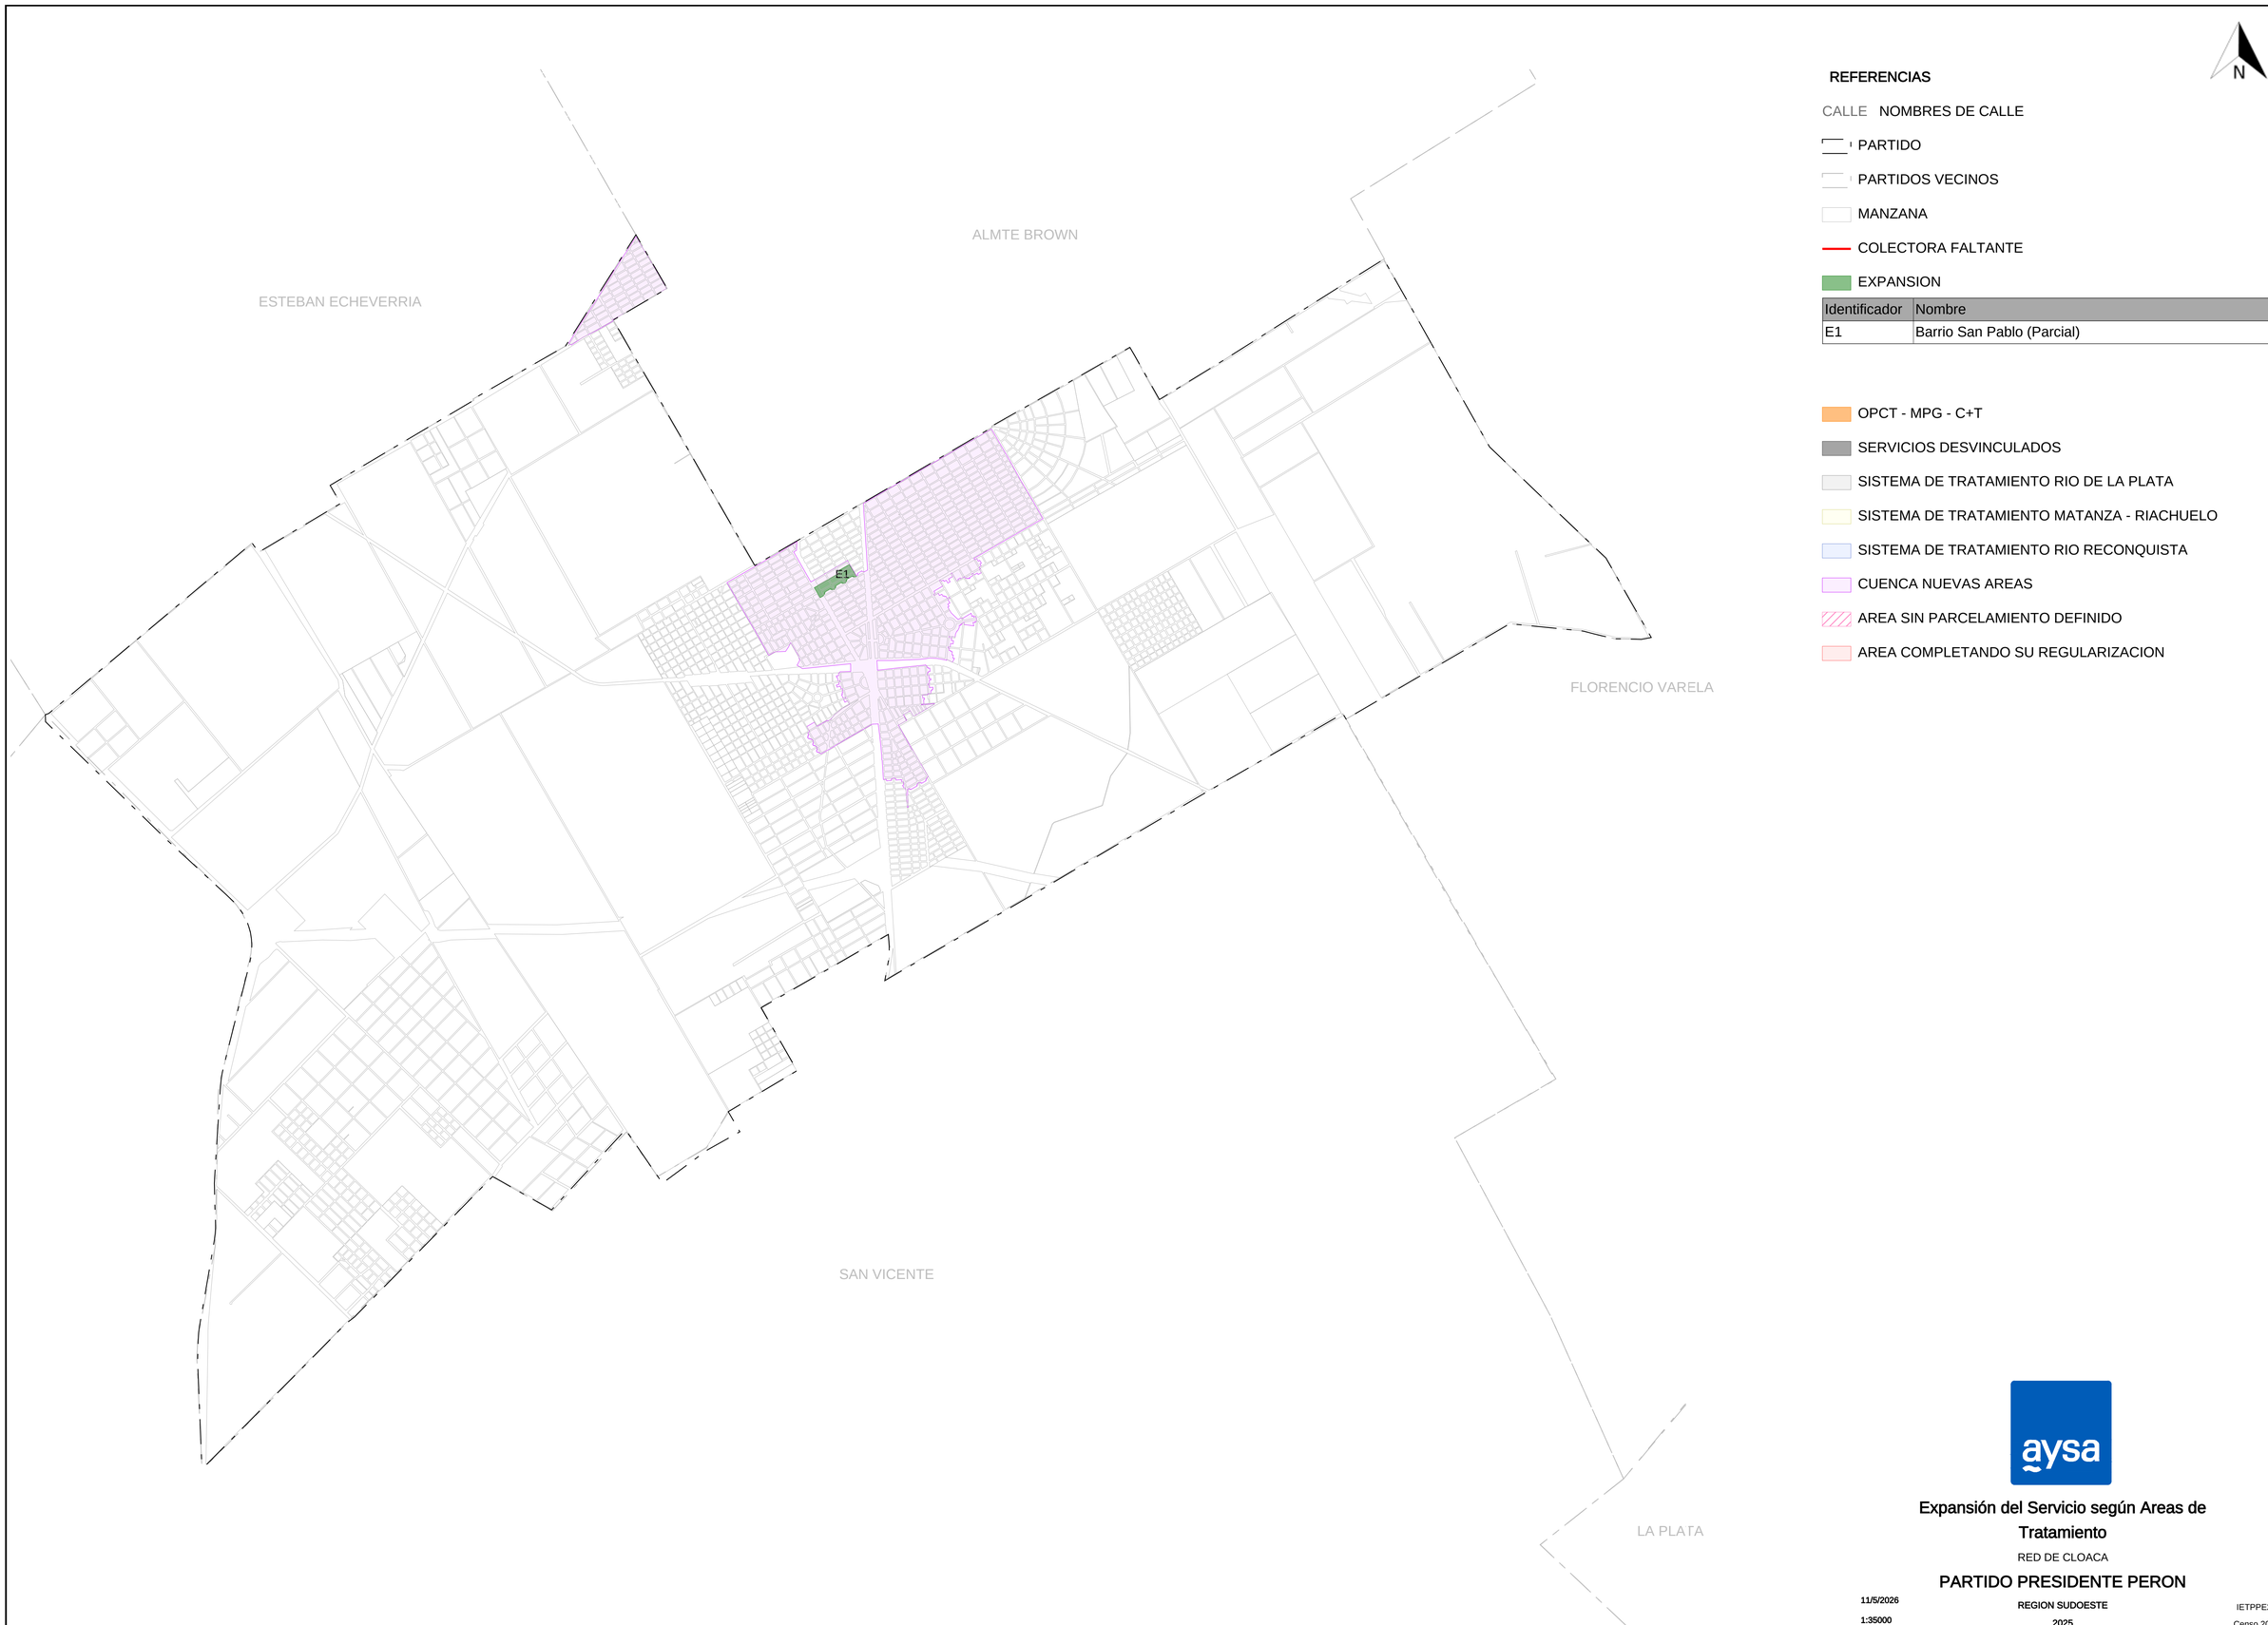

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	Barrio San Pablo (Parcial)

OPCT - MPG - C+T

SERVICIOS DESVINCULADOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO PRESIDENTE PERON

11/5/2026

1:35000


REGION SUDOESTE

2025

IETPPE20

Censo 2022

Planos de Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales Región Sudeste

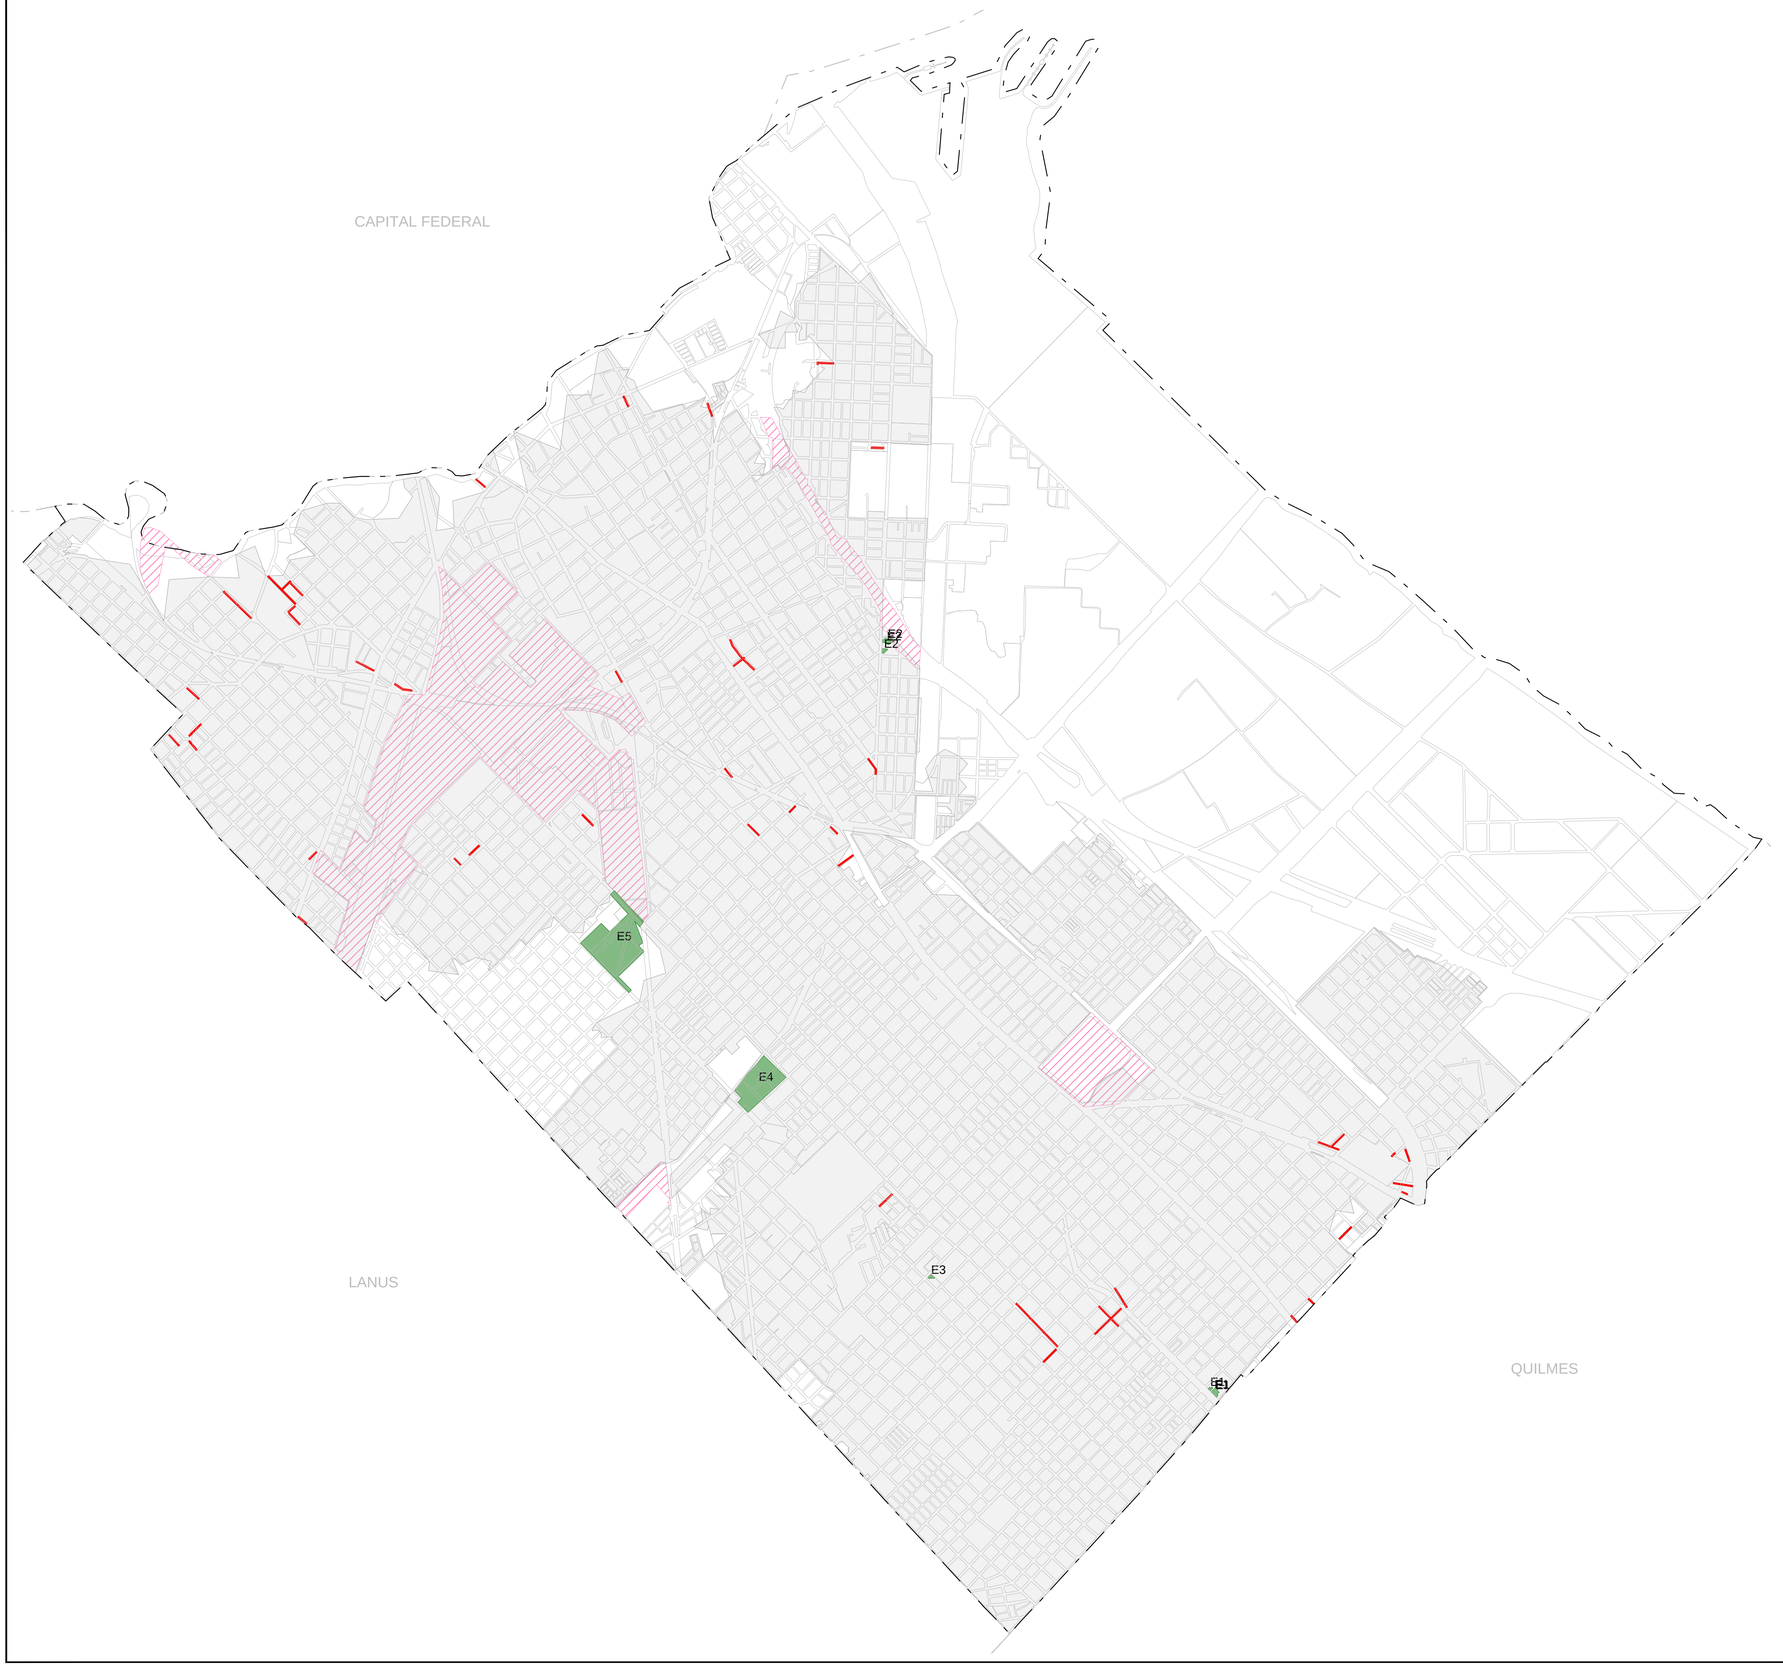

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	CM 10302-SC70325-RSC Programa de Instalación de cañerías y Colectoras Faltantes 2021-2023 Etapa 1
E2	DRSE - Dto. Avellaneda CM 10306-SC70325-RSC Programa de Instalación de cañerías y Colectoras - Faltantes 2021-2023 Etapa 1
E3	CM 10301-SC70325-RSC Programa de Instalación de cañerías y Colectoras Faltantes 2021-2023. Etapa 1
E4	SC622 - Inst. RSC Obrero Norte M6 + Ampliación
E5	SC70205-RSC Sarmiento Etapa 1 - Zona 8

OPCT - MPG - C+T

SERVICIOS DESVINCULADOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO AVELLANEDA

21/4/2026


1:20000

REGION SUDESTE

2025

IETAVE20

Censo 2022

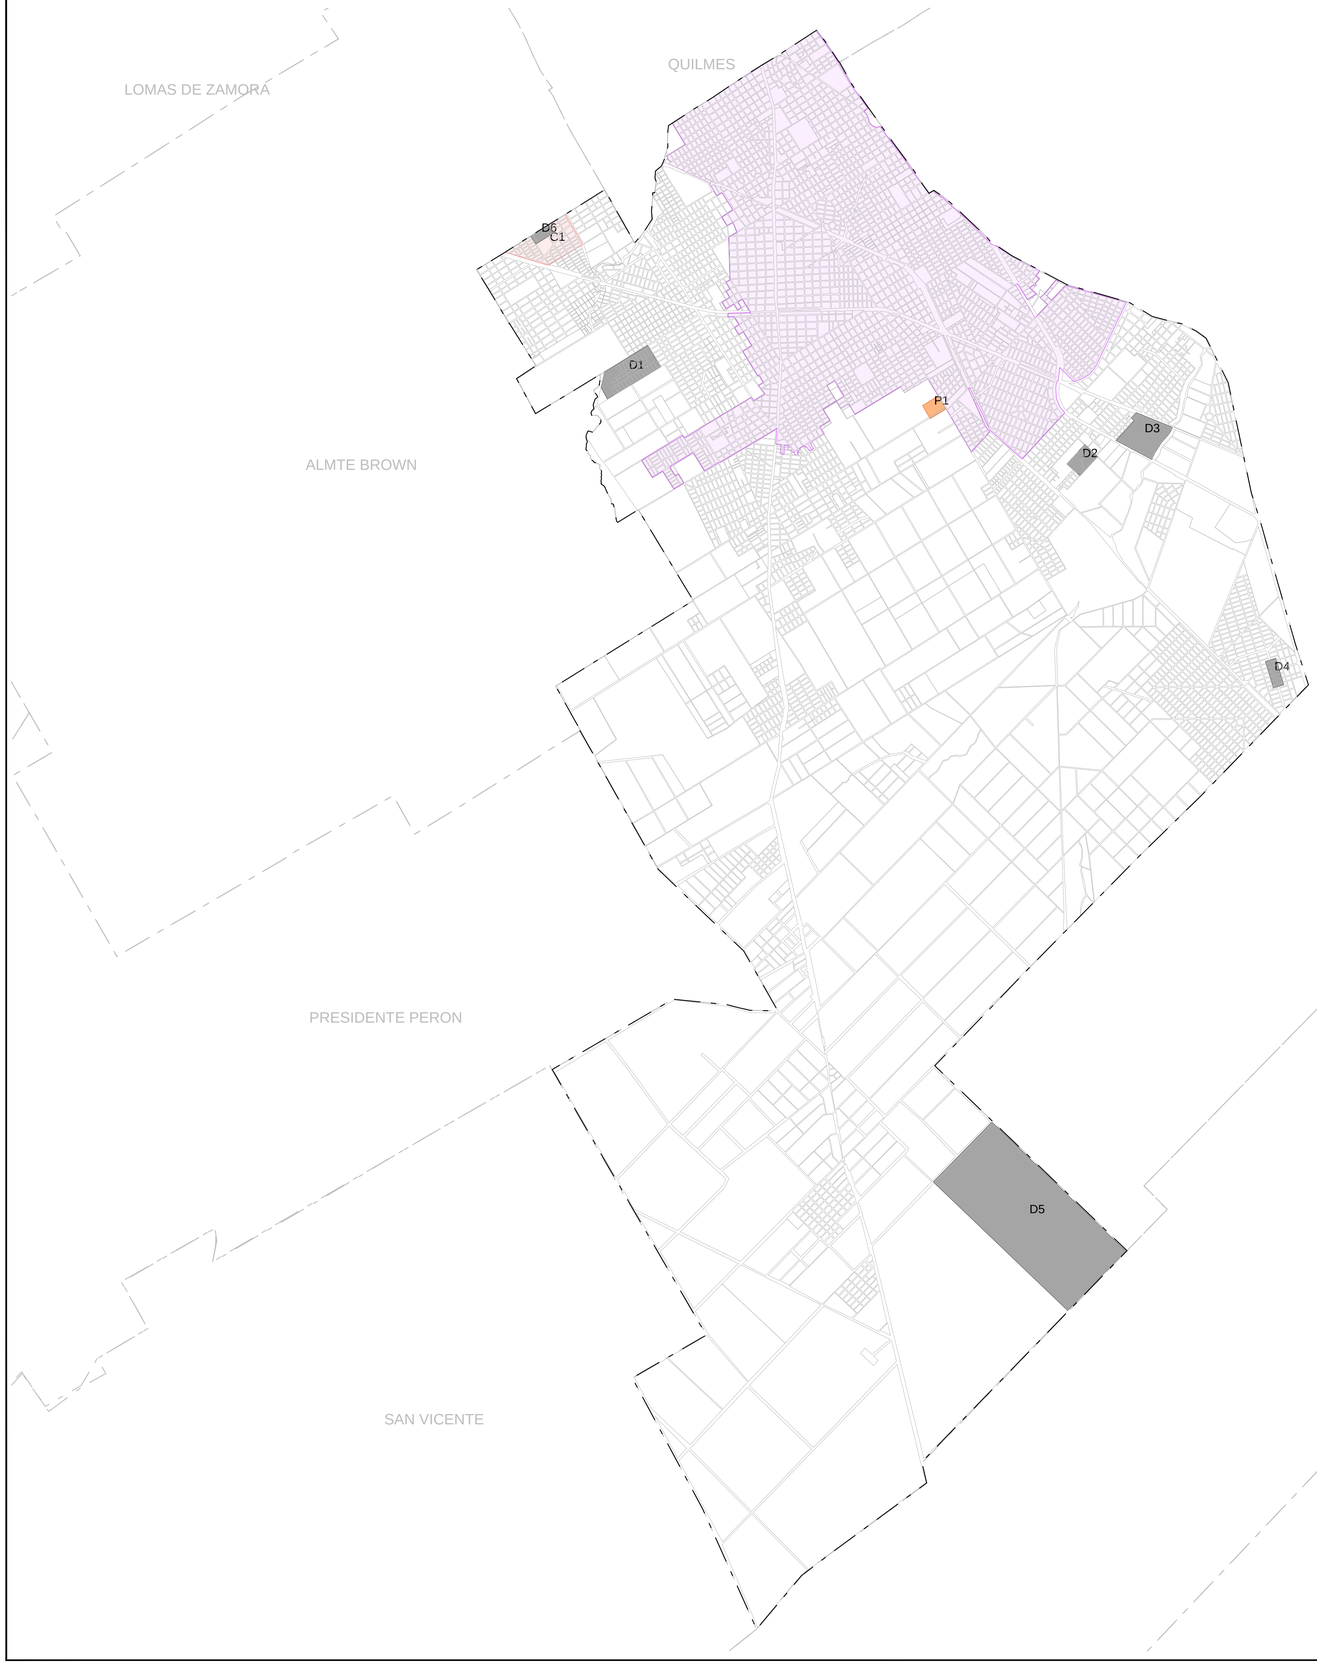

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

Identificador	Nombre
P1	Inst. RSC Av Hudson y Av Carboni (Villa Vatteone)

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	PFV Barrio San Jorge PYPSA
D2	Barrio Pepsi
D3	Barrio Las Margaritas
D4	Barrio Parque Odol
D5	Carcel de Florencio Varela
D6	Barrio Malvinas

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

Identificador	Nombre
C1	Barrio Don José Planificado

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO FLORENCIO VARELA

21/4/2026


1:50000

REGION SUDESTE

2025

IETFVA20

Censo 2022

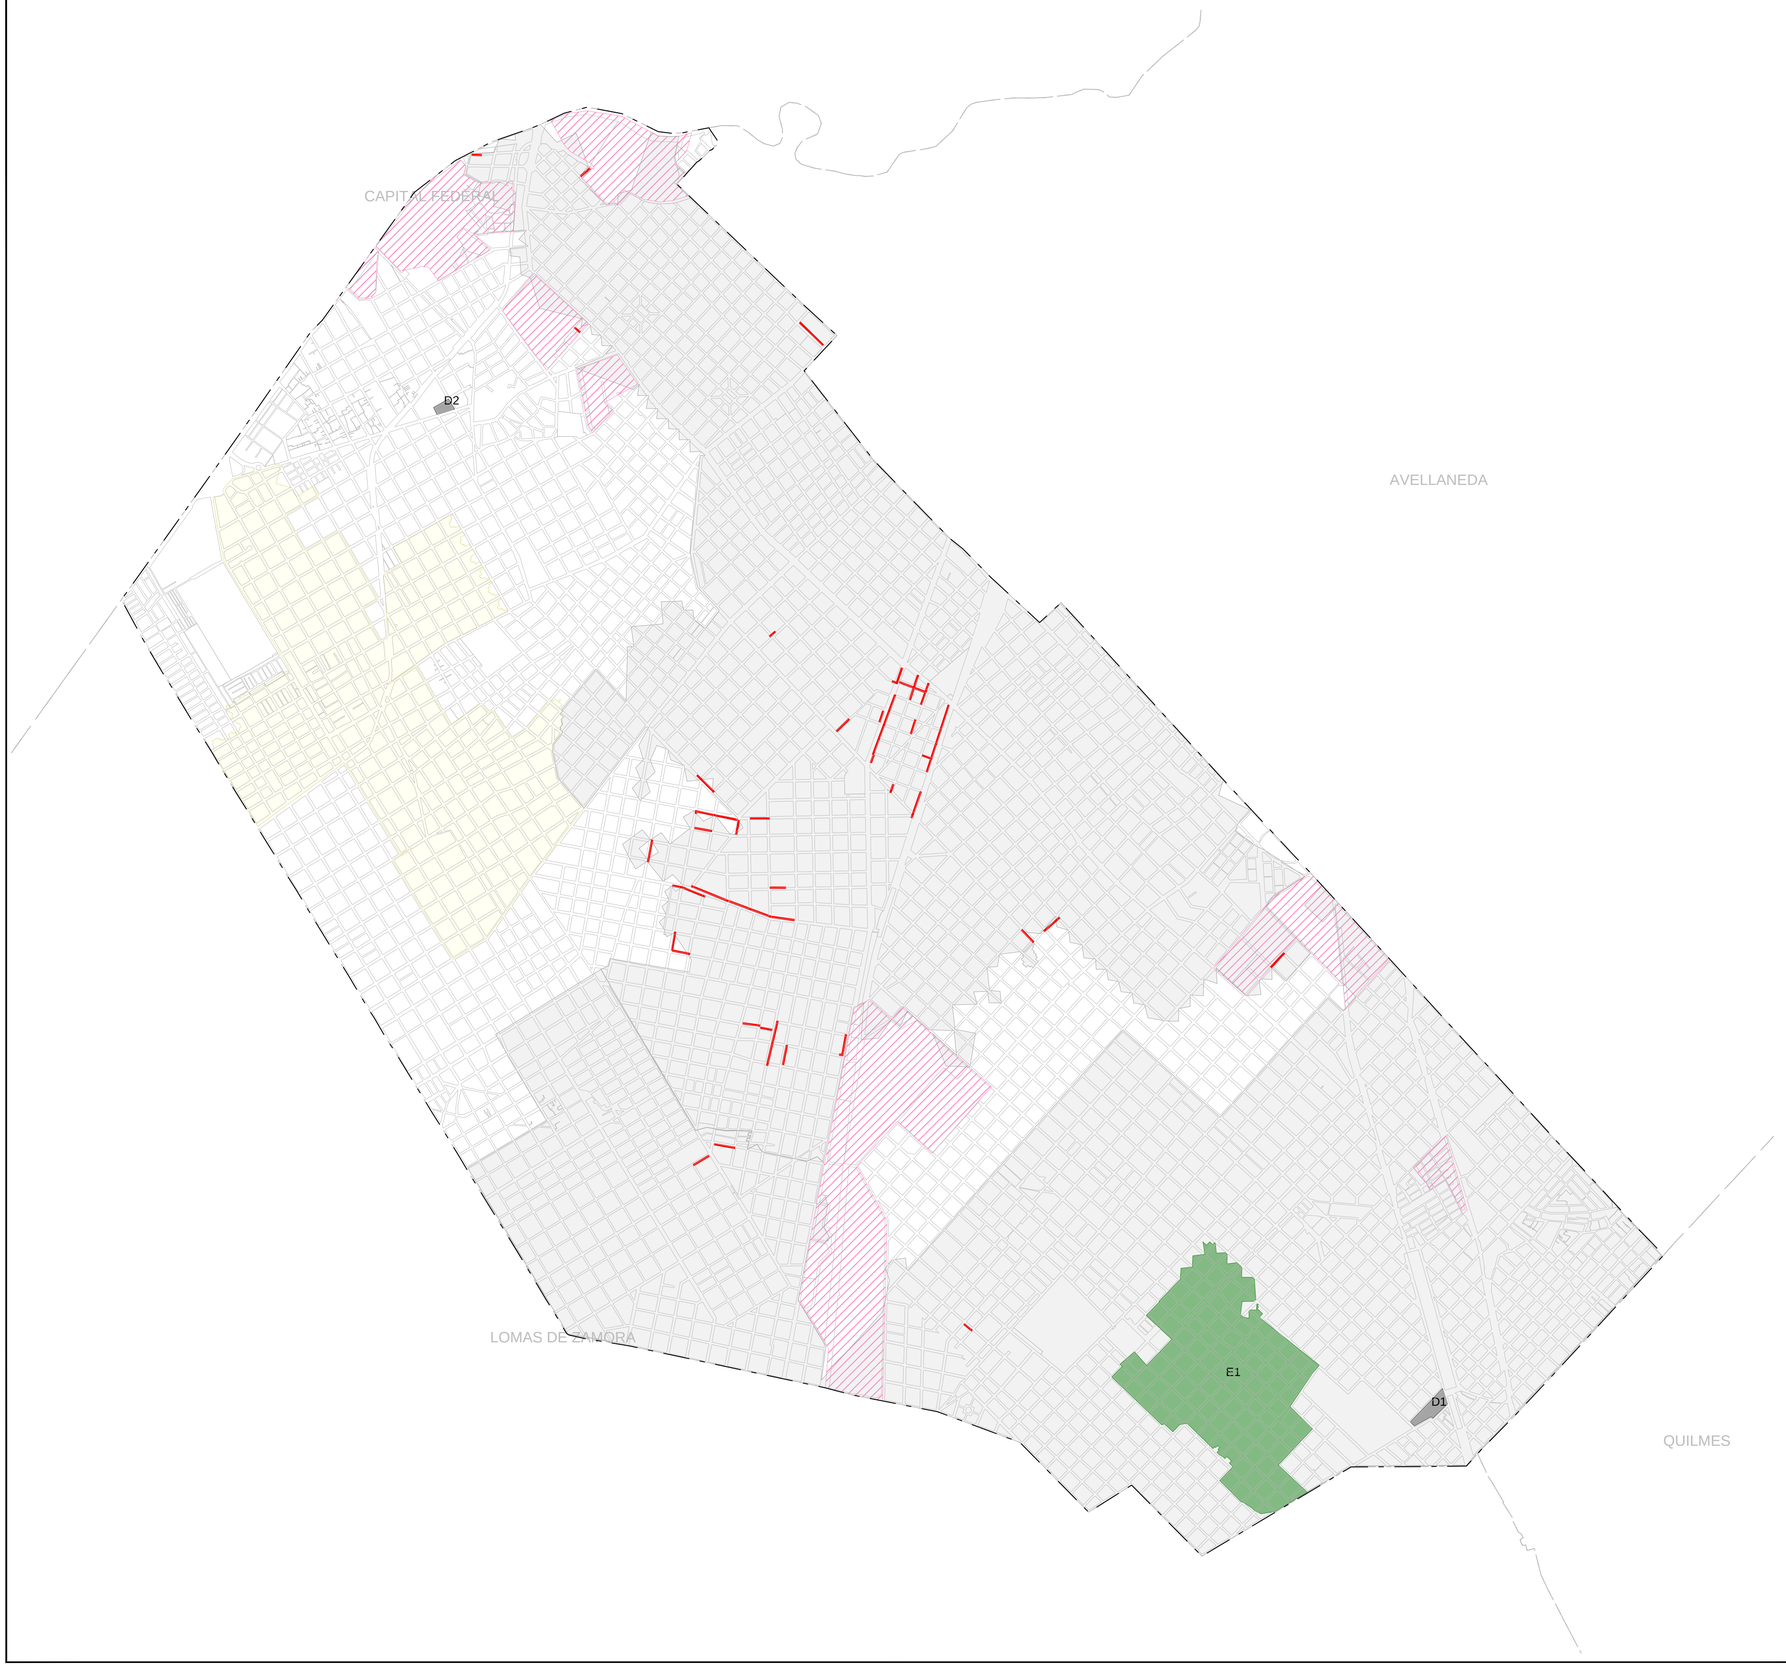

N

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

Identificador	Nombre
E1	SC442 - Instalación RSC SIAM

OPCT - MPG - C+T

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	Barrio Guadalupe
D2	El Triangulo Sala unidad N°9

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO LANUS

21/4/2026


1:20000

REGION SUDESTE

2025

IETLAN20

Censo 2022

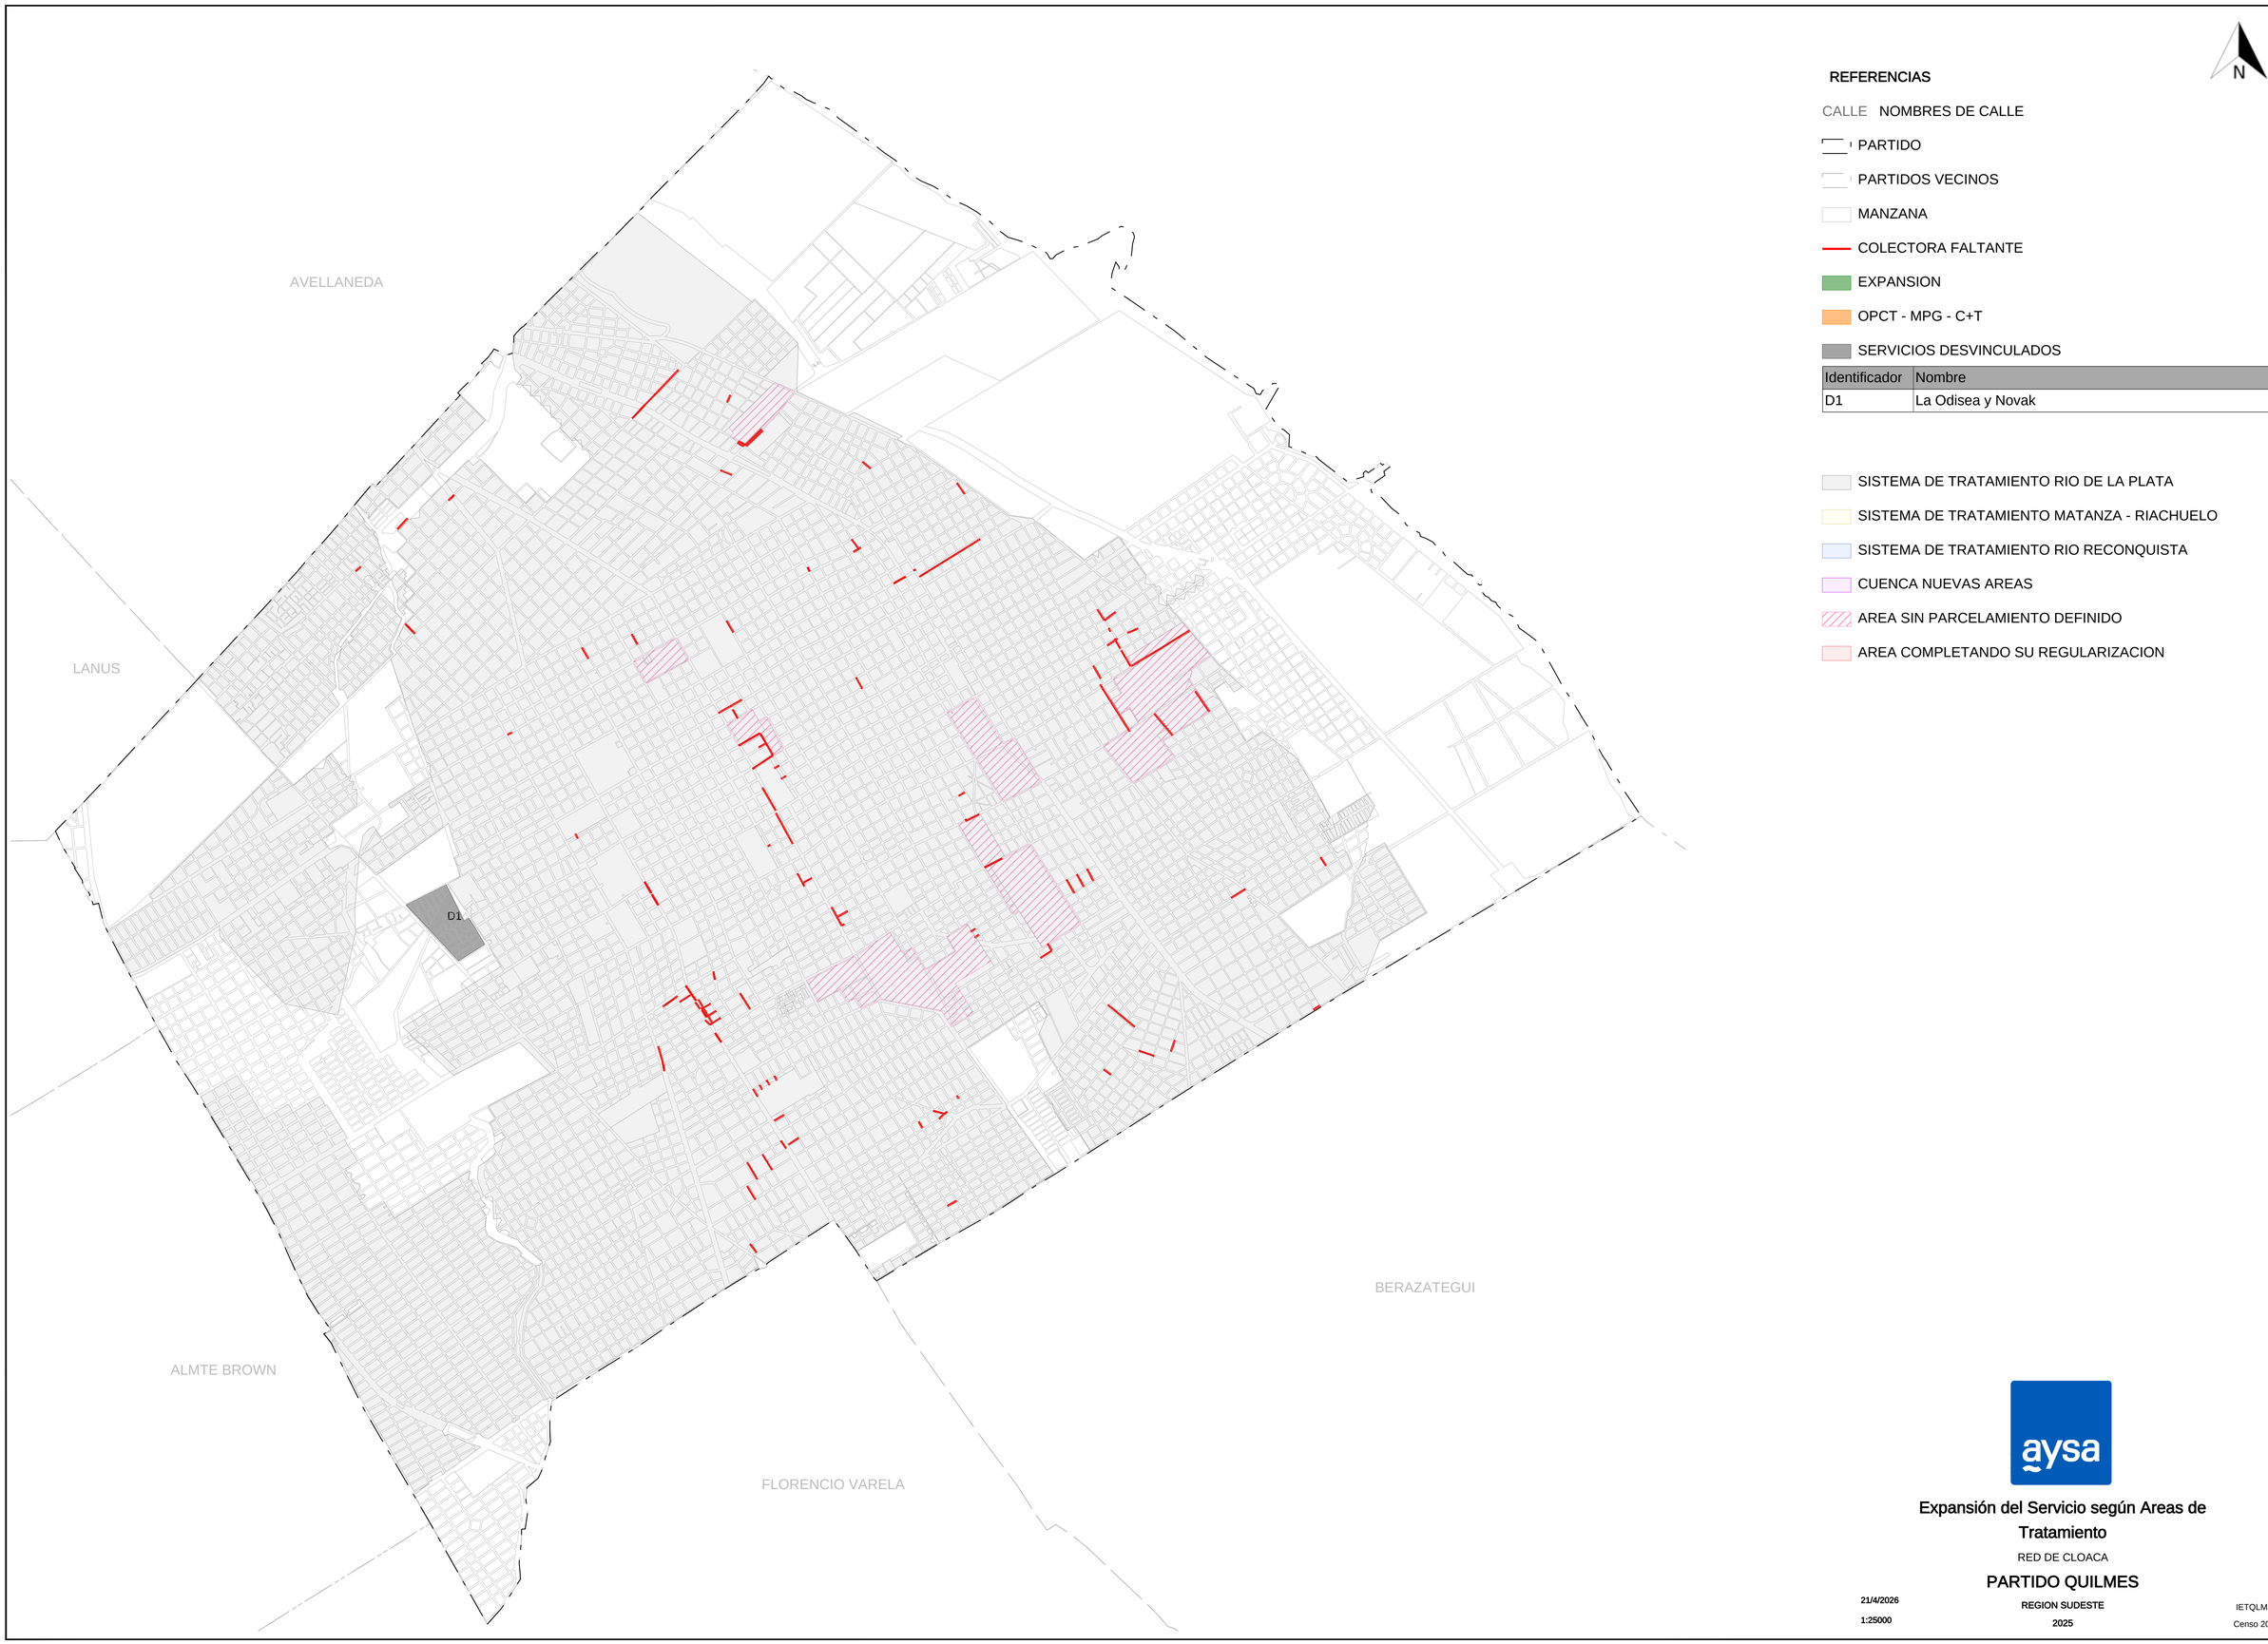

REFERENCIAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

PARTIDO

PARTIDOS VECINOS

MANZANA

COLECTORA FALTANTE

EXPANSION

OPCT - MPG - C+T

SERVICIOS DESVINCULADOS

Identificador	Nombre
D1	La Odisea y Novak

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO DE LA PLATA

SISTEMA DE TRATAMIENTO MATANZA - RIACHUELO

SISTEMA DE TRATAMIENTO RIO RECONQUISTA

CUENCA NUEVAS AREAS

AREA SIN PARCELAMIENTO DEFINIDO

AREA COMPLETANDO SU REGULARIZACION

aysa

Expansión del Servicio según Areas de Tratamiento

RED DE CLOACA

PARTIDO QUILMES

21/4/2026

1:25000

REGION SUDESTE


2025


IETQLM20

Censo 2022





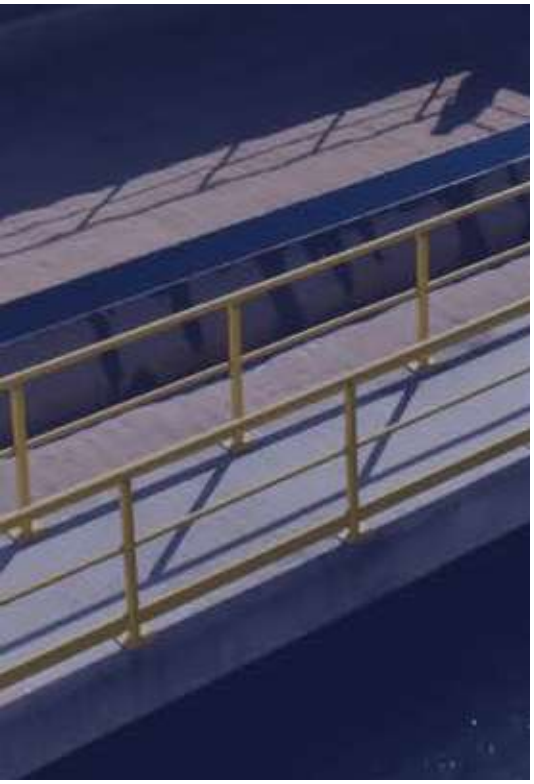

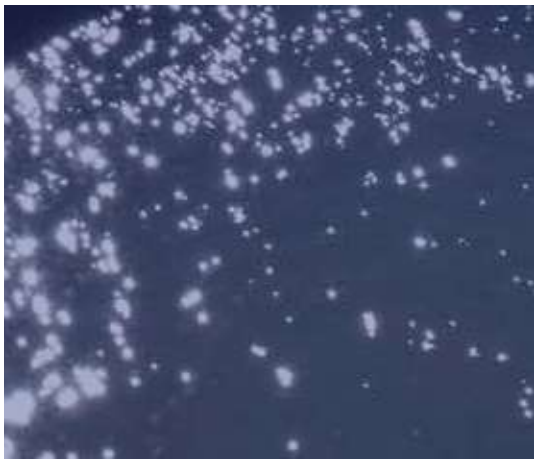INFORME ANUAL 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 4

aysa

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1

1 Obras Ejecutadas

TOMO 1.2

2 Mejora y Mantenimiento de Redes

3 Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos

4 Elementos Principales de la Red – Inventario

5 Certificación de Normas

6 Diagnósticos y Estudios

7 Estudios Ambientales

8 Gestión de Laboratorio

9 Desarrollo de la Comunidad

10 Plan de Prevención y Emergencias (PPE)

TOMO 2

11 Cobertura del Servicio de Agua Potable

12 Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable

13 Cartografía Expansión Agua Potable

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3

14 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales

15 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento

16 Instalaciones faltantes en la Red de Desagües Cloacales

17 Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

TOMO 4

18 Cartografía Agua Potable – Rehabilitación y Renovación

TOMO 5

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES (Planos Unificados)

19 - Rehabilitación Hidráulica.

20 - Rehabilitación Estructural.

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6

TOMO 6:

21 Aspectos Comerciales

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

21.2 Aspectos vinculados con la medición

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

21.4 Aspectos vinculados con la recaudación

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

21.6 Información adicional

22 Aspectos Económico-Financieros

22.1 a 22.5 Formatos vinculados a los Estados Contables de AySA (Tomo Apartado "Formatos Contables 2025").

22.6 Indicadores

22.7 Balance Económico Social

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1:

1 OBRAS EJECUTADAS

1.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.1.A	A) Obras en Plantas Potabilizadoras, Estaciones Elevadoras, Pozos de Agua, Rebombeos, y Plantas Tratamiento Agua Subterránea. Nuevas Áreas - Obras de Agua Potable.
	01.1.B	B) Ríos Subterráneos.
	01.1.C	C) Automatismo y Comunicaciones.
	01.1.D	D) Energía.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 02	01.1.01-IAT1-O-PRO-PS 01	PSS - Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 03	01.1.02-IAT1-O-PRO-PS 02	Pozos de Rebombeo de Agua Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 07	01.1.10-IAT1-O-A-PRO-PSM 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General San Martín.
PL IA N° 08	01.1.11-IAT1-O-A-PRO-PMB 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General Manuel Belgrano.
PL IA N° 09	01.1.13-IAT1-O-A-PRO-PJMR 01	Obras en el Establecimiento Juan Manuel de Rosas.
	01.1.21-IAT1-O-A-PRO-POI 01	Plantas Potabilizadoras de Osmosis Inversa (POI).
	01.1.23-IAT1-O-A-PRO-PII 02	Plantas Potabilizadoras de Intercambio Iónico (PII).
	01.1.24-IAT1-O-A-PRO-PAD 03	Plantas Potabilizadoras de Adsorción (PAD).
PL IA N° 11	01.1.30-IAT1-O-A-TRA-EE	Obras en Estaciones Elevadoras Paitoví, Centro, Caballito, Floresta, Devoto, Saavedra, Villa Adelina, Tres de Febrero, Morón, Matanza, Lanús y Quilmes.

1.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.2	Obras en Plantas Depuradoras, Estaciones de Bombeo, etc. Nuevas Areas - Obras de Saneamiento.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 19	01.2.20-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste.
	01.2.20A-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste II.
PL IA N° 20	01.2.21-IAT1-O-S-PRO-PDN 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Norte.
PL IA N° 21	01.2.22-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 01	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel.
	01.2.22A-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 02	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel II.
PL IA N° 21bis	01.2.23-IAT1-O-S-PRO-PDH 01	Obras en el Planta de Depuración Hurlingham.
PL IA N° 22	01.2.24-IAT1-O-S-PRO-PDBU 01	Obras en el Planta de Depuración Barrio Uno.
PL IA N° 22bis	01.2.25-IAT1-O-S-PRO-PDSC 01	Obras en el Planta de Depuración Santa Catalina.
	01.2.25.01-NA-IAT1-O-S-PRO-PDC 01	Obras en el Planta de Depuración Las Catonas.
	01.2.25.02-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFe 01	Obras en el Planta de Depuración Ferrari.
	01.2.25.03-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFV 01	Obras en el Planta de Depuración Florencio Varela.
	01.2.25.04-NA-IAT1-O-S-PRO-PDG 01	Obras en el Planta de Depuración Garín.
	01.2.25.05-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMN 01	Obras en el Planta de Depuración Merlo Norte.
	01.2.25.06-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMS 01	Obras en el Planta de Depuración Maquinista Savio.
	01.2.25.07-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPP 01	Obras en el Planta de Depuración Guernica (Pte. Perón).
	01.2.25.08-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPR 01	Obras en el Planta de Depuración Paso del Rey.
	01.2.25.09-NA-IAT1-O-S-PRO-PDBV 01	Obras en el Planta de Depuración Bella Vista.
	01.2.25.10-NA-IAT1-O-S-PRO-PDCH 01	Obras en el Planta de Depuración Champagnat
	01.2.25.11-NA-IAT1-O-S-PRO-PDESC 01	Obras en el Planta de Depuración Escobar
PL IA N° 14	01.2.26-IAT1-O-S-TRA-EB 01	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Wilde.
PL IA N° 15	01.2.27-IAT1-O-S-TRA-EB 02	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Boca-Barracas.
	01.2.28-IAT1-O-S-TRA-EB 03	Obras en Estaciones de Bombeo Centro, Norte y Sur.
	01.2.29-IAT1-O-S-TRA-EB 00	Obras en Planta Berazategui.
PL IA N° 13	01.2.30-IAT1-O-S-TRA-PLC 01	Obras en Grandes Conducciones Pluviocloacales.

1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 23	01.3.31-IAT1-O-X CONTRATO	Obras ejecutadas por vía contractual.
	01.3.33-IAT1-O-A (A+T)	Listado de Obras por convenio (A+T).
	01.3.34-IAT1-O-S (C+T)	Listado de Obras por convenio (C+T).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.2:

2 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 25	35-IAT1-O-A-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes de agua.
PL IA N° 26	36-IAT1-O-A-MyM 02	Redes de agua. Elementos de maniobra intervenidos.
PL IA N° 27	37-IAT1-O-A-MyM 03	Medidores colocados y/o intervenidos.
PL IA N° 28	38-IAT1-O-A-MyM 04	Conexiones domiciliarias de agua potable.
PL IA N° 29	39-IAT1-O-S-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes cloacales.
PL IA N° 30	40-IAT1-O-S-MyM 02	Conexiones domiciliarias de cloacas.

3 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos.
	03.2-IAT1-O-X-MyM-T 01	Mantenimiento de Grandes Equipos y Electrobombas.

4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED - INVENTARIO

4.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 31 A	42-IAT1-I-A-RED 01	Redes de Agua - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 31 B	43-IAT1-I-A-RED 02	Redes de Agua - Porcentaje por Material de cañería instalada.
	44-IAT1-I-A-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Agua.

4.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 32 A	45-IAT1-I-S-RED 01	Redes de Cloacas - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 32 B	46-IAT1-I-S-RED 02	Redes de Cloacas - Porcentajes por Material de cañería instalada.
	47-IAT1-I-S-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Desagües Cloacales.

5. CERTIFICACIÓN DE NORMAS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Laboratorios Central y de Plantas. Certificación ISO, IRAM, etc.

6 DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Diagnósticos y Estudios.

7 ESTUDIOS AMBIENTALES

Código Anterior	Código Actual	Título
		7.1 Estudios Ambientales.
		7.2 Control del Recurso.

8 GESTION DE LABORATORIO

Código Anterior	Código Actual	Título
		Gestión de Laboratorio.

9 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Código Anterior	Código Actual	Título
		Texto descriptivo de las tareas de AySA para el Desarrollo de la Comunidad.
		9.1 Anexos
		9.2 Planos

10 PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE)

Código Anterior	Código Actual	Título
		PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 2:

11. Cobertura del servicio de Agua Potable

11.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

11.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 33	48-IAT2-C-A-TRA 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Area Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A	49-IAT2-C-A-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A (Nuevas Áreas)	49-IAT2-C-A-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 34B	50-IAT2-C-A-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio de Agua Potable.
ex PL IA N° 35	51-IAT2-C-A-TRA 04	Expansión de redes de distribución de agua potable. Obras habilitadas en el año (por Partido).

12. Instalaciones Faltantes en la Red de Agua Potable

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 36	52-IAT2-C-A-RED 01	Red de Agua. Cierre de mallas faltantes (por Región y Partido).

13. Cartografía Expansión Agua

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IEADRC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IEASFE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Fernando.
	IEASIS-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Isidro.
	IEASMA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Martín.
	IEATIG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tigre.
	IEAVIC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Vicente López.
	IEAESC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Escobar.
	IEAJCP-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - José C. Paz.
	IEAMAR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Malvinas Argentinas.
	IEASMG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Miguel.
	IEAPIL-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IEAMAT-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - La Matanza.
	IEAHUR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Hurlingham.
	IEAITU-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ituzaingó.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Morón.
	IEATRE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tres de Febrero.
	IEAMER-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Merlo.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IEAALM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Almirante Brown.
	IEAEST-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Esteban Echeverría.
	IEAEZE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ezeiza.
	IEALOM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lomas de Zamora.
	IEAPPE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IEAAVE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Avellaneda.
	IEALAN-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lanús.
	IEAQLM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Quilmes.
	IEAFVA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3:

14. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales

14.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

14.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 38A	54-IAT3-C-S-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas.
	54-IAT3-C-S-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 38B	55-IAT3-C-S-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población beneficiada con obras o con servicio en trámite de habilitación.
ex PL IA N° 39	56-IAT3-C-S-TRA 04	Expansión de redes colectoras de desagües cloacales. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

15. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales según Sistema de Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 40	57-IAT3-C-S-PRO 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Area servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 41	58-IAT3-C-S-PRO 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario.
	61-IAT3-C-S-PRO 04	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 42	59-IAT3-C-S-PRO 03	Expansión de redes colectoras de Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

16. Instalaciones Faltantes en la Red de Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 43	60-IAT3-C-S-RED 01	Red de Cloacas. Colectoras faltantes (por Región y Partido).

17. Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IETDRC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IETSFE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Fernando.
	IETSIS-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Isidro.
	IETSMA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Martín.
	IETTIG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tigre.
	IETVIC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Vicente López.
	IETESC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Escobar.
	IETJCP-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - José C. Paz.
	IETMAR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Malvinas Argentinas.
	IEATMG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Miguel.
	IEATPIL-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IETMAT-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - La Matanza.
	IETCHUR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Hurlingham.
	IETITU-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ituzaingo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Morón.
	IETTRE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tres de Febrero.
	IETMER-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Merlo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IETALM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Almirante Brown.
	IETEST-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Esteban Echeverría.
	IETEZE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ezeiza.
	IETLOM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lomas de Zamora.
	IETPPE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IETAVE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Avellaneda.
	IETLAN-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lanús.
	IETQLM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Quilmes.
	IETFVA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 4:

18. CARTOGRAFÍA AGUA POTABLE (Planos de Rehabilitación y Renovación de Redes)

18.1 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRADRCF-2025	* Región Capital Federal.

18.2 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRASFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRASIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRASMA-2025	* Partido San Martín.
	IRATIG-2025	* Partido Tigre.
	IRAVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRAESC-2025	* Partido Escobar.
	IRAJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRAMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRASMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRAPIL-2025	* Partido Pilar.

18.3 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRAITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRAMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRAMOR-2025	* Partido Morón.
	IRATRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRAMER-2025	* Partido Merlo.
	IRAMOR-2025	* Partido Moreno.

18.4 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRAEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRAEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRALOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRAPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

18.5 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRALAN-2025	* Partido Lanús.
	IRAQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRAFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 5:

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES UNIFICADA (Rehabilitación Hidráulica y Estructural):

19. Rehabilitación Hidráulica.
20. Rehabilitación Estructural.

19/20.1 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCDRCF-2025	* Región Capital Federal.

19/20.2 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCSFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRCSIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRCSMA-2025	* Partido San Martín.
	IRCTIG-2025	* Partido Tigre.
	IRCVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRCESC-2025	* Partido Escobar.
	IRCJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRCMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRCSMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRCPIL-2025	* Partido Pilar.

19/20.3 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRCITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRCMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRCMOR-2025	* Partido Morón.
	IRCTRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRCMER-2025	* Partido Merlo.
	IRCMOR-2025	* Partido Moreno.

19/20.4 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRCEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRCEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRCLOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRCPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

19/20.5 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRCLAN-2025	* Partido Lanús.
	IRCQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRCFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6:

21 ASPECTOS COMERCIALES

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

Código Anterior	Código Actual	Título
300		Ingresos Año 2025.
301		Anexo de Ventas Año 2025 (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
302		Evolución de los Ingresos.
303		Emisión General y art. 34 Año 2025 - Grupos bimetrales - Ciclos completos de facturación.
304		Facturación a Consorcios del último ciclo completo de facturación. Todas las frecuencias.
305		Facturación Emisión Genereal. Ultimo ciclo completo de facturación bimestral.
307		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Capital Federal.
308		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Gran Buenos Aires.
309		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Capital Federal.
310		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Gran Buenos Aires.
311		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Capital Federal.
312		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Gran Buenos Aires.
313		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 08 - Capital Federal.
314		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - Residencial.
315		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - Residencial.
316		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - Residencial.
317		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - No Residencial.
318		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - No Residencial.
319		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - No Residencial.
320		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral - Factura Media.

21.2 Aspectos vinculados con la medición

Código Anterior	Código Actual	Título
330		Medidores cambiados e instalados en el Año 2025.
331		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 01 (Agua). Consumo del último año - Bimestralizado.
332		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 05 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
333		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
334		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 01 (Agua). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
335		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 05 (Agua y cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
336		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de Servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
337		Pérdida de Cuota Fija por mes, en cantidades de instalaciones y en Tarifa Básica Bimestral (TBB).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
306		Detalle de Unidades Funcionales.
350		Evolución del número de usuarios. Unidades funcionales.

21.4 Aspectos vinculados a la recaudación

Código Anterior	Código Actual	Título
360		Total Recaudado.
361		Ritmo de recaudación .
362		Evolución de la Recaudación y Evolución de la Recaudación por Categoría de Usuarios.

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
321		Cuentas a cobrar vencidas y a vencer al 31/12/2025 por Región, tipo de cliente, régimen y categoría de cliente.
322		Conciliación de créditos por servicios (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
370		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (por antigüedad).
371		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (con vencimientos operados por Año Contractual).
372		Impago vencido por rango de deuda al 31/12/25. Emisión por todo concepto, desagregado por Región y Grandes Usuarios.
373		Cuentas a cobrar a vencer y vencidas al 31/12/25, por Distrito y antigüedad de la deuda. Gráfico.
374		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25 por distrito, por situación comprobante y antigüedad de la deuda.
376		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25, correspondientes a ciertos Clientes fiscales. Detalle de las cuentas a cobrar originales más recargos extracontables teóricos estimados.
379		Deuda Vencida al 31/12/2025 más recargos extracontables teóricos estimados.

21.6 Información Adicional

Código Anterior	Código Actual	Título
323		Consumos de la previsión para deudores de dudoso cobro y ajustes de facturación del año 2025.
324		Cargo por corte de servicio - Intervenciones realizadas e imporetes de facturación devengados durante el año 2025.
375		Convenios de pagos.
377		Cargo por titularidad no informada año 2025.
380		Estimación de otras quitas y condonaciones de deuda extracontables otorgadas durante el Año 2025.
381		Recargos e intereses por demora de pago devengados durante el año 2025.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

22 ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS - TARIFA SOCIAL

22.1 a 22.5

Presentado en Tomo separado denominado "FORMATOS CONTABLES 2025".

22.6 Indicadores


Código Anterior	Código Actual	Título
850-851		Indicadores.
852		Benchmarking.

22.7 Balance económico social


Código Anterior	Código Actual	Título
900		Programa de tarifa social - Total.
901		Programa de tarifa social - Usuarios Residenciales.
902		Programa de tarifa social - Casos Sociales.
903		Programa de tarifa social - Instituciones sin fines de lucro.
904		Programa de tarifa social - Detalle de Usuarios Residenciales.
905		Programa de tarifa social - Detalle de Casos Sociales.
906		Programa de tarifa social - Detalle de Instituciones sin fines de lucro.
910		Plan Agua más Trabajo.
920		Programa de Barrios Carenciados - Modelo Participativo de Gestión (MPG).
930		Resumen de Expansión de Agua por Plan.
940		Resumen de Expansión de Desagües Cloacales por Plan.
950		Balance Económico Social.
970		Total de Usuarios con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
971		Total de Usuarios RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
972		Total de Usuarios NO RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
973		Total de Usuarios BALDÍOS con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.

18. CARTOGRAFIA AGUA (Planos de Rehabilitación y Renovación de Redes)

Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Capital Federal

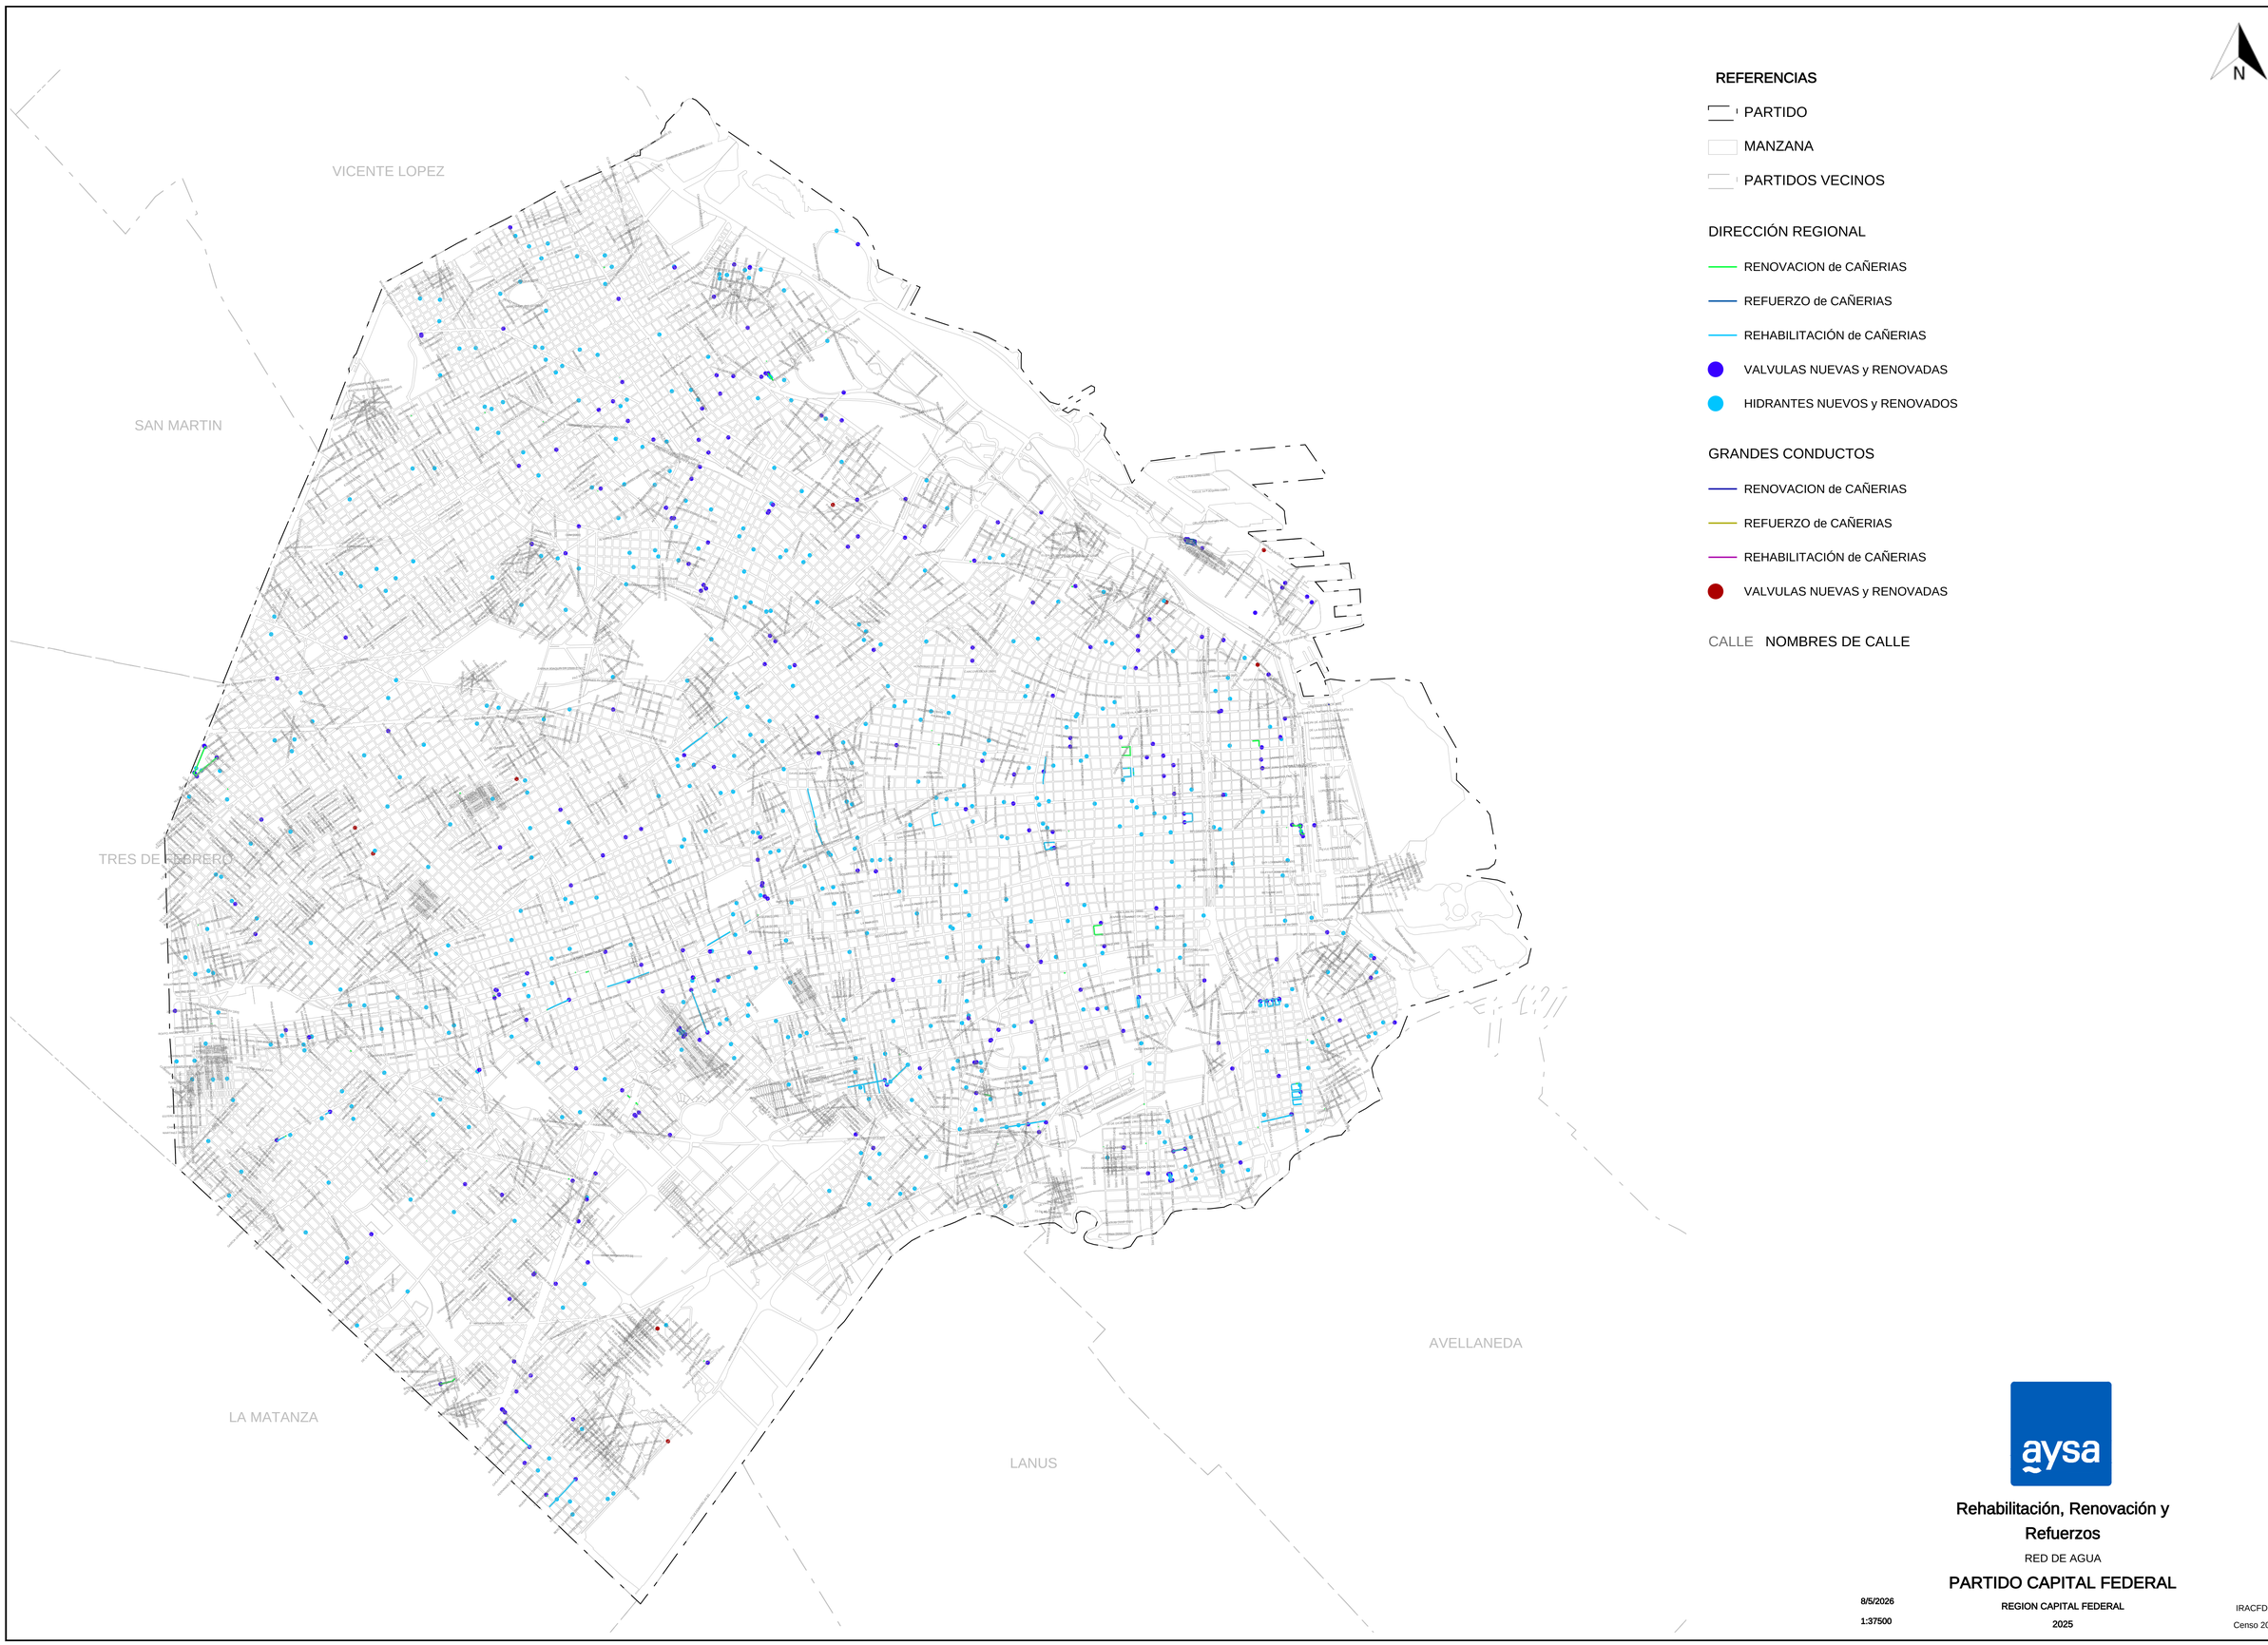
VICENTE LOPEZ
SAN MARTIN
TRES DE FEBRERO
LA MATANZA
LANUS
AVELLANEDA
N
REFERENCIAS
PARTIDO
MANZANA
PARTIDOS VECINOS
DIRECCIÓN REGIONAL
RENOVACION de CAÑERIAS
REFUERZO de CAÑERIAS
REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS
GRANDES CONDUCTOS
RENOVACION de CAÑERIAS
REFUERZO de CAÑERIAS
REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
CALLE NOMBRES DE CALLE
aysa
Rehabilitación, Renovación y Refuerzos
RED DE AGUA
PARTIDO CAPITAL FEDERAL
8/5/2026
1:37500
REGION CAPITAL FEDERAL
2025
IRACFD20
Censo 2022

Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Norte

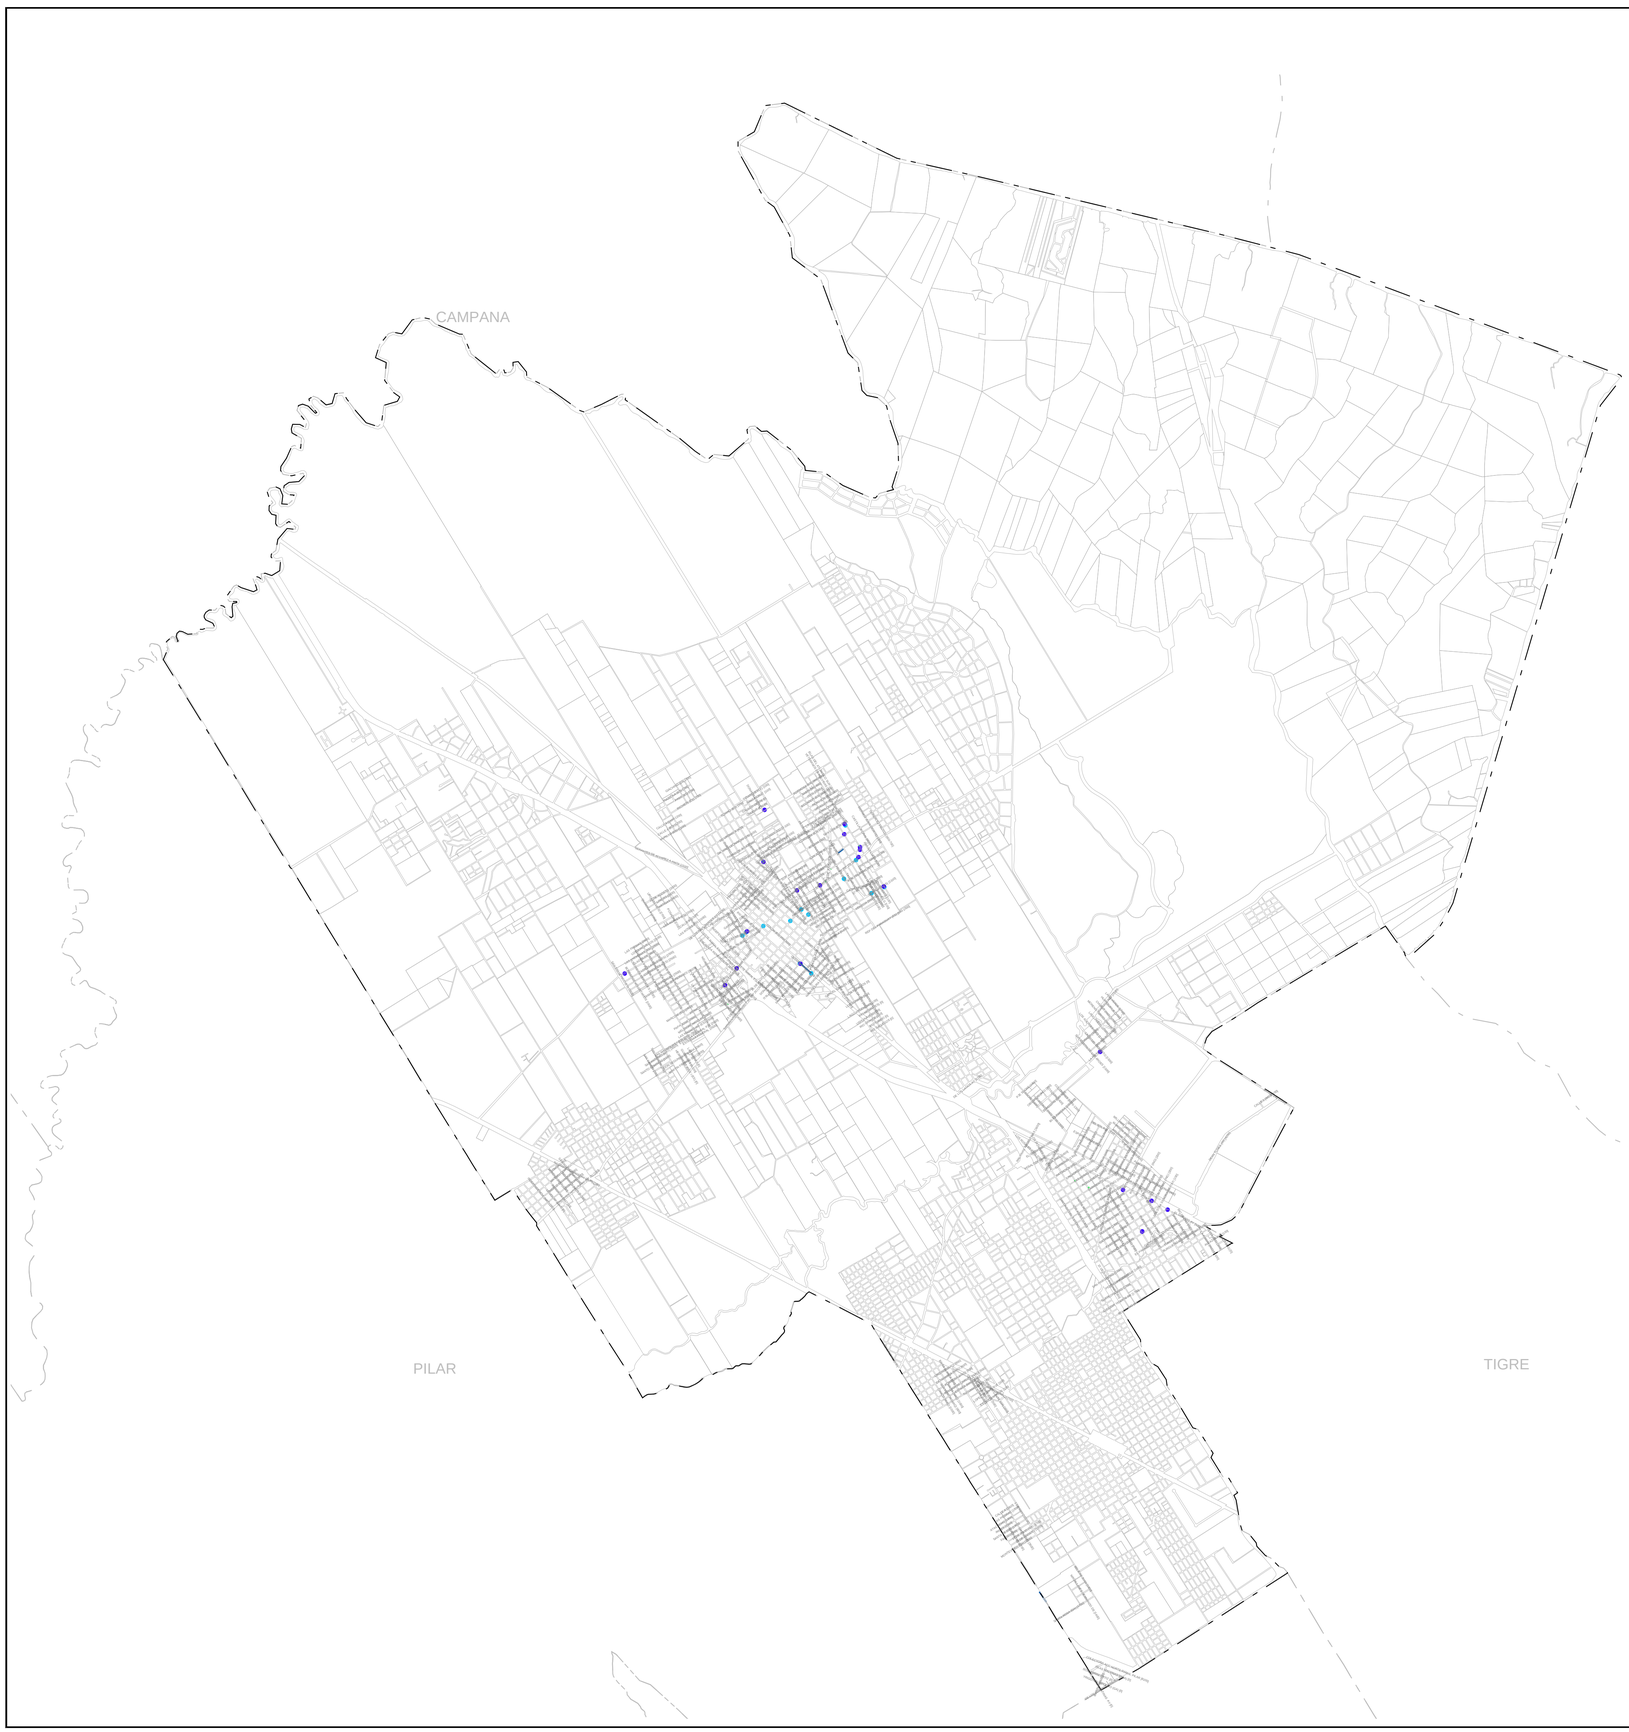

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO ESCOBAR

29/5/2026


1:47500

REGION NORTE

2025

IRAESC20

Censo 2022

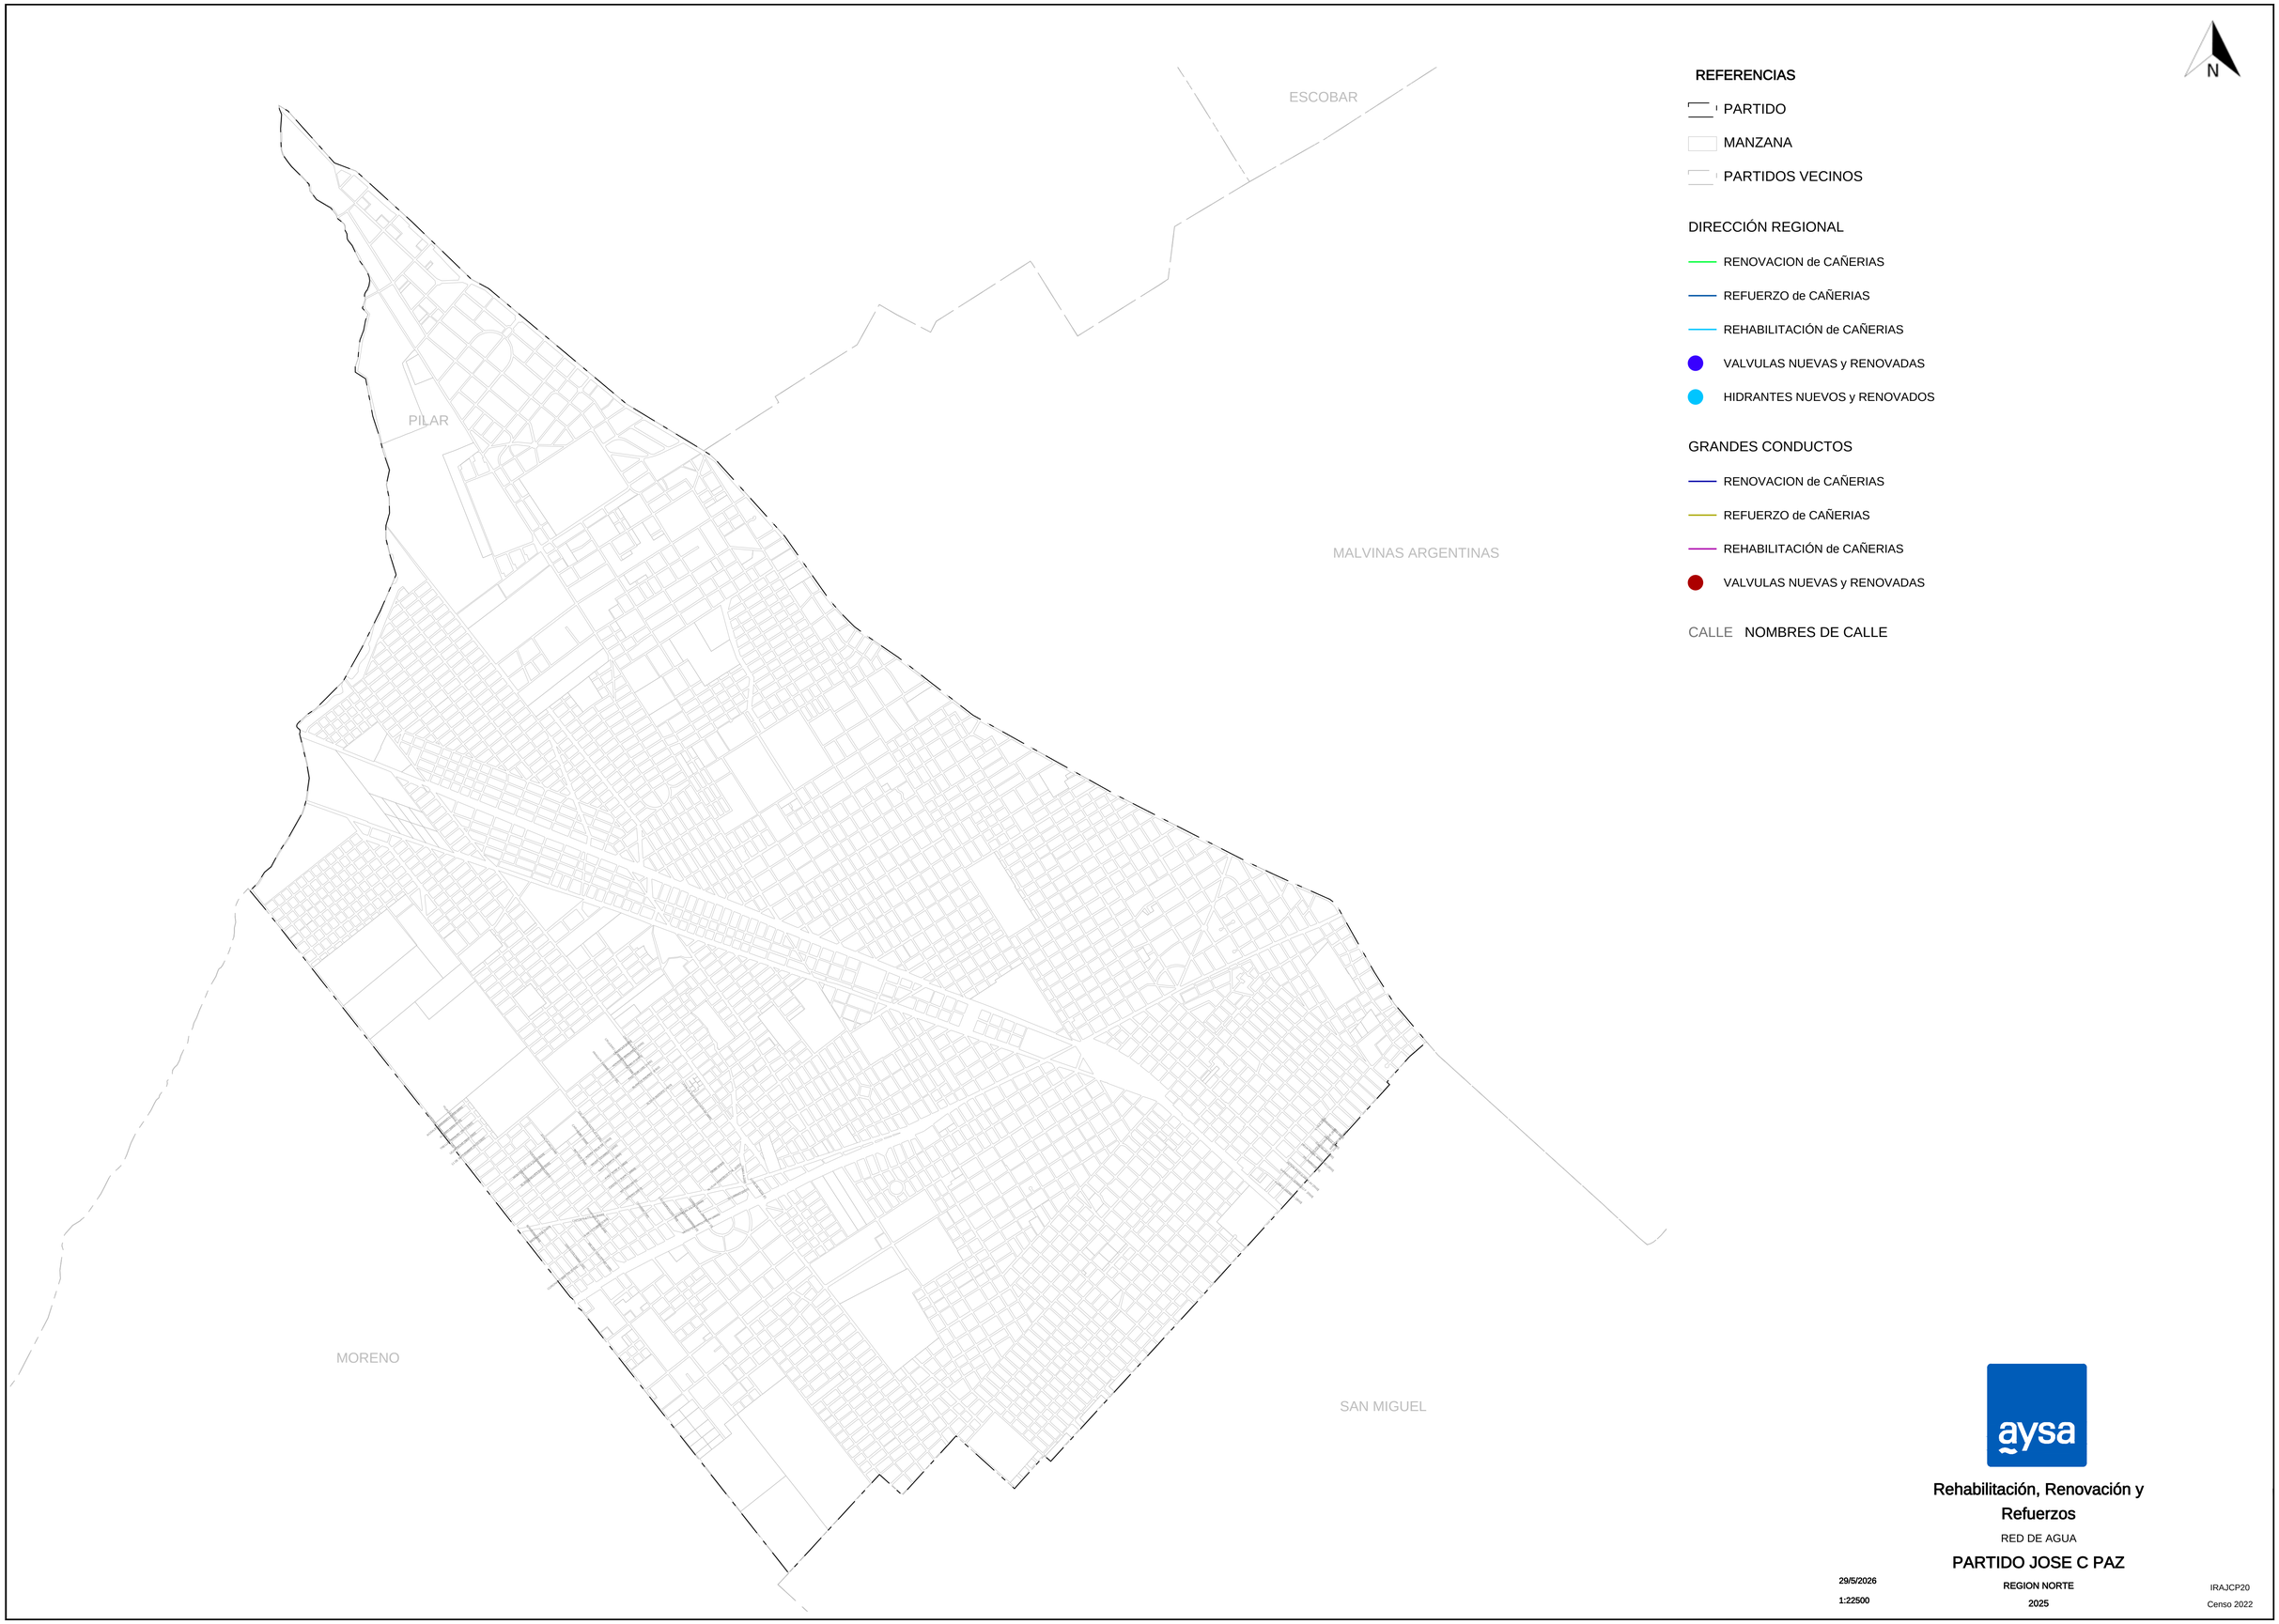

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
- HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO JOSE C PAZ

29/5/2026


1:22500

REGION NORTE

2025

IRAJCP20

Censo 2022

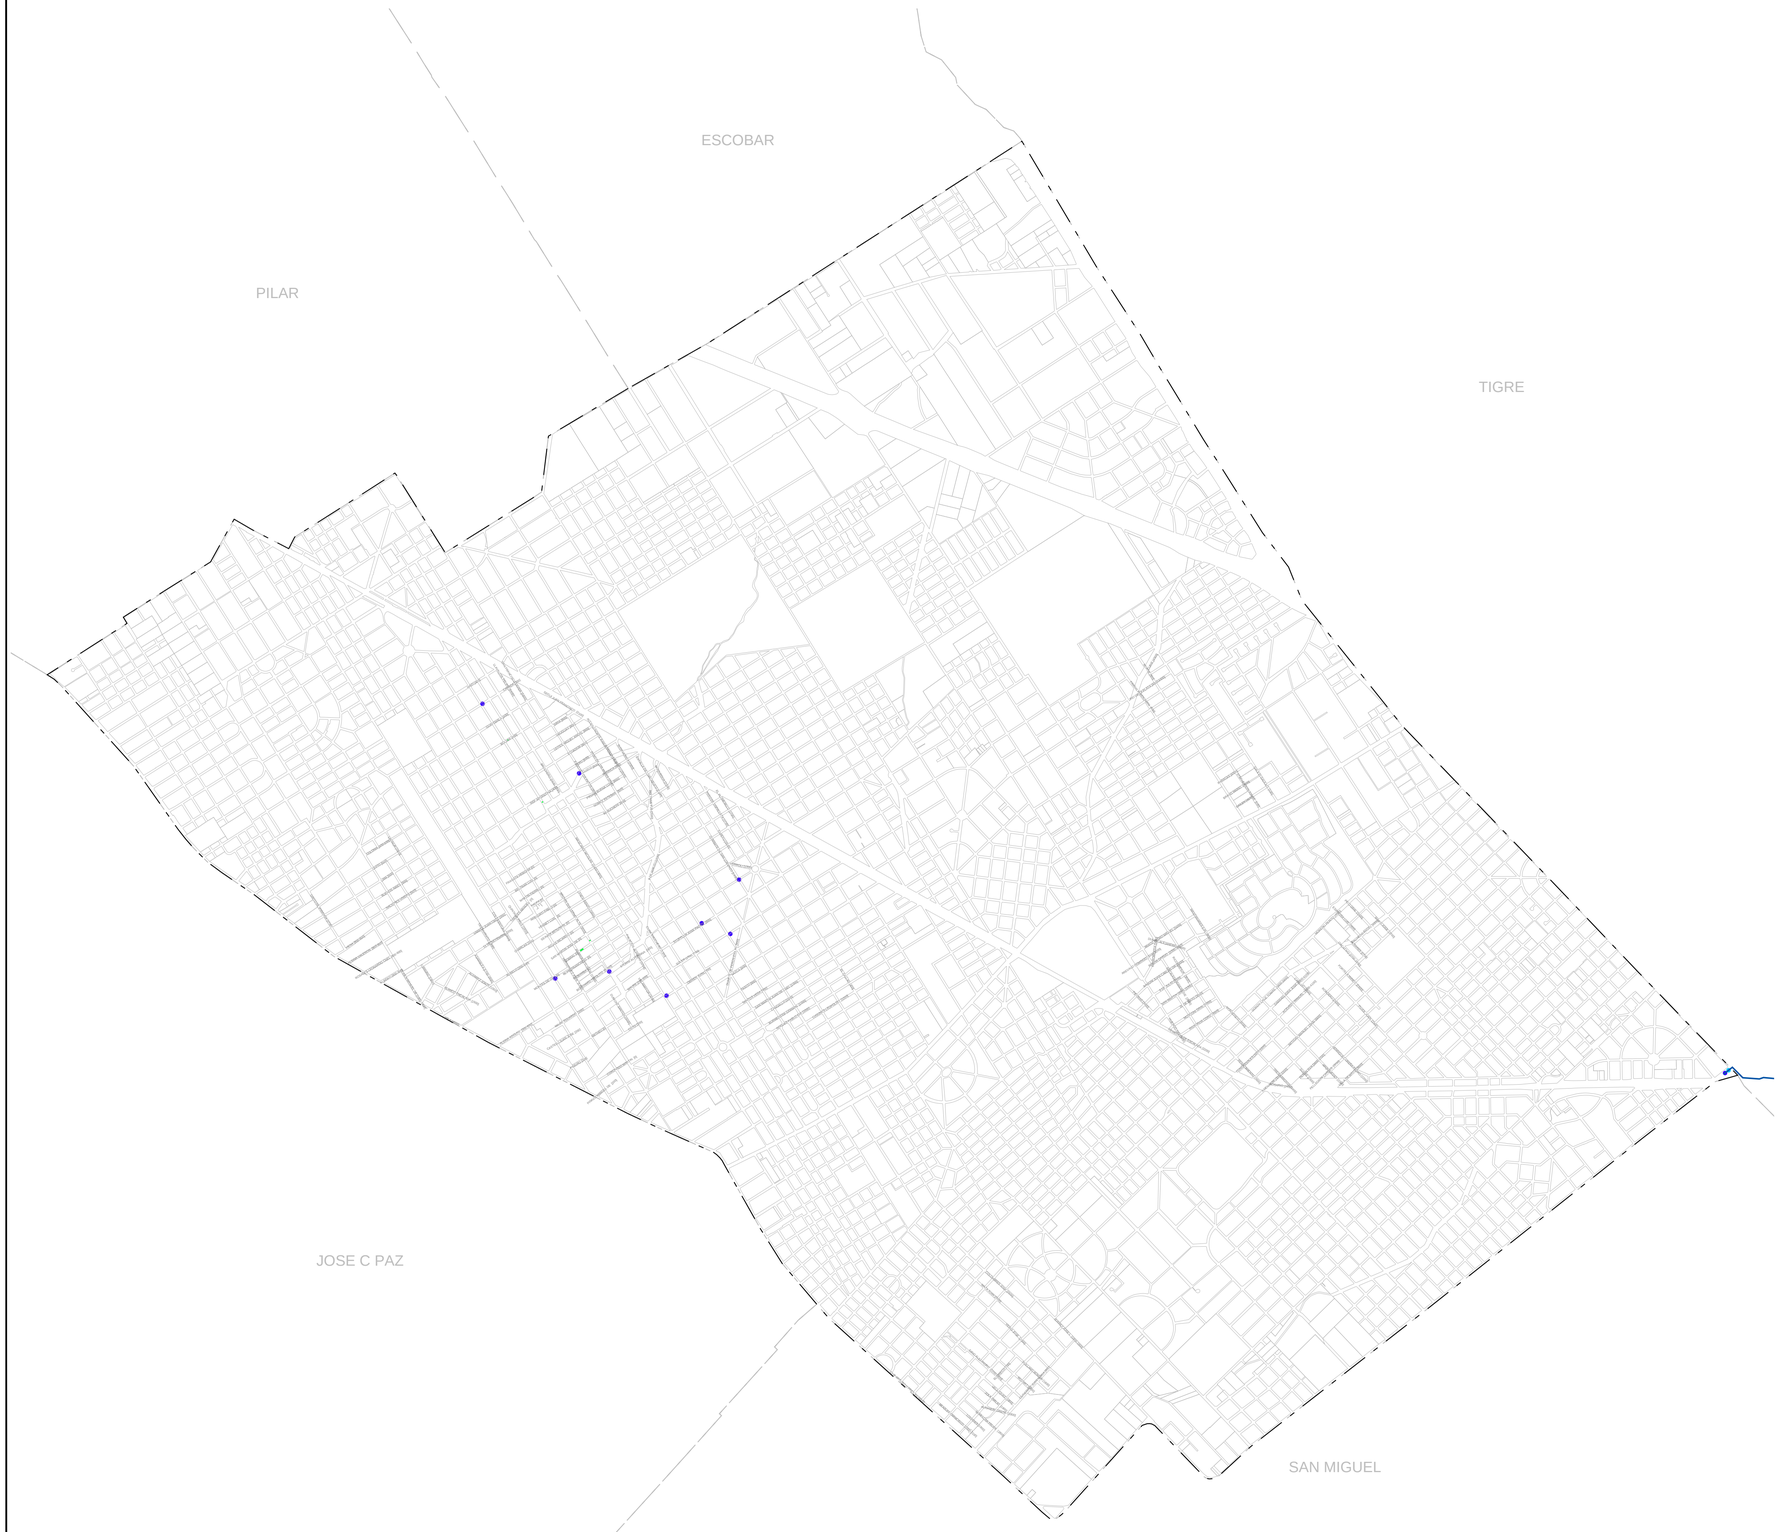

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO MALVINAS ARGENTINAS

29/5/2026


1:22500

REGION NORTE

2025

IRAMAR20

Censo 2022

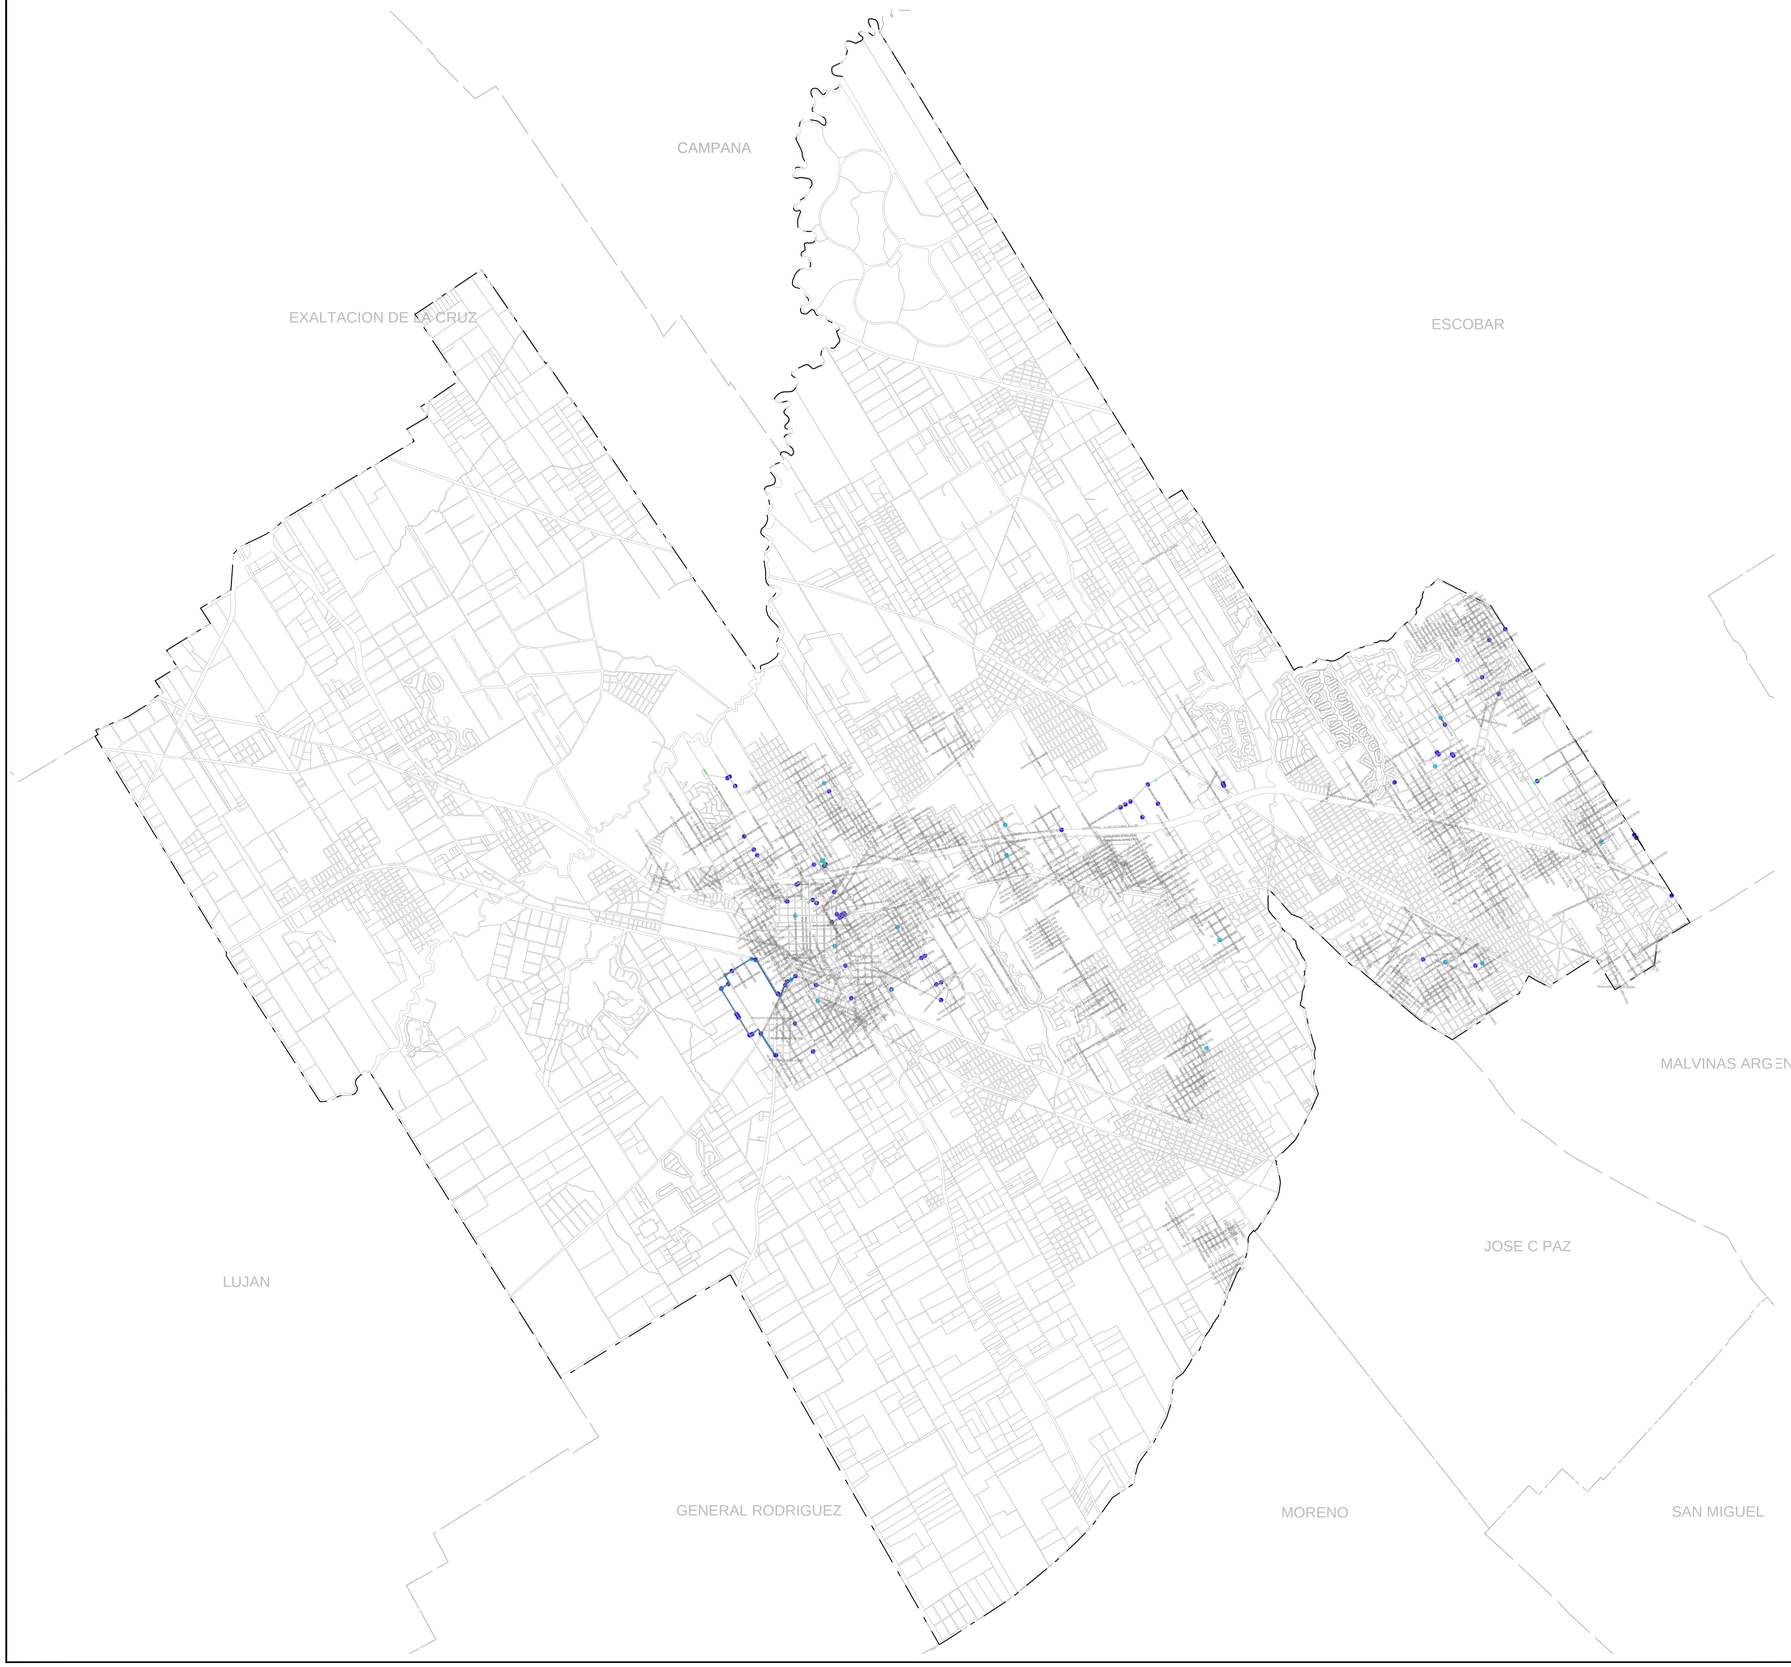

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
- HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO PILAR

29/5/2026

1:55000

REGION NORTE

2025

IRAPIL20

Censo 2022

N

TIGRE

SAN ISIDRO

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO SAN FERNANDO

29/5/2026


1:15000

REGION NORTE

2025

IRASFE20

Censo 2022

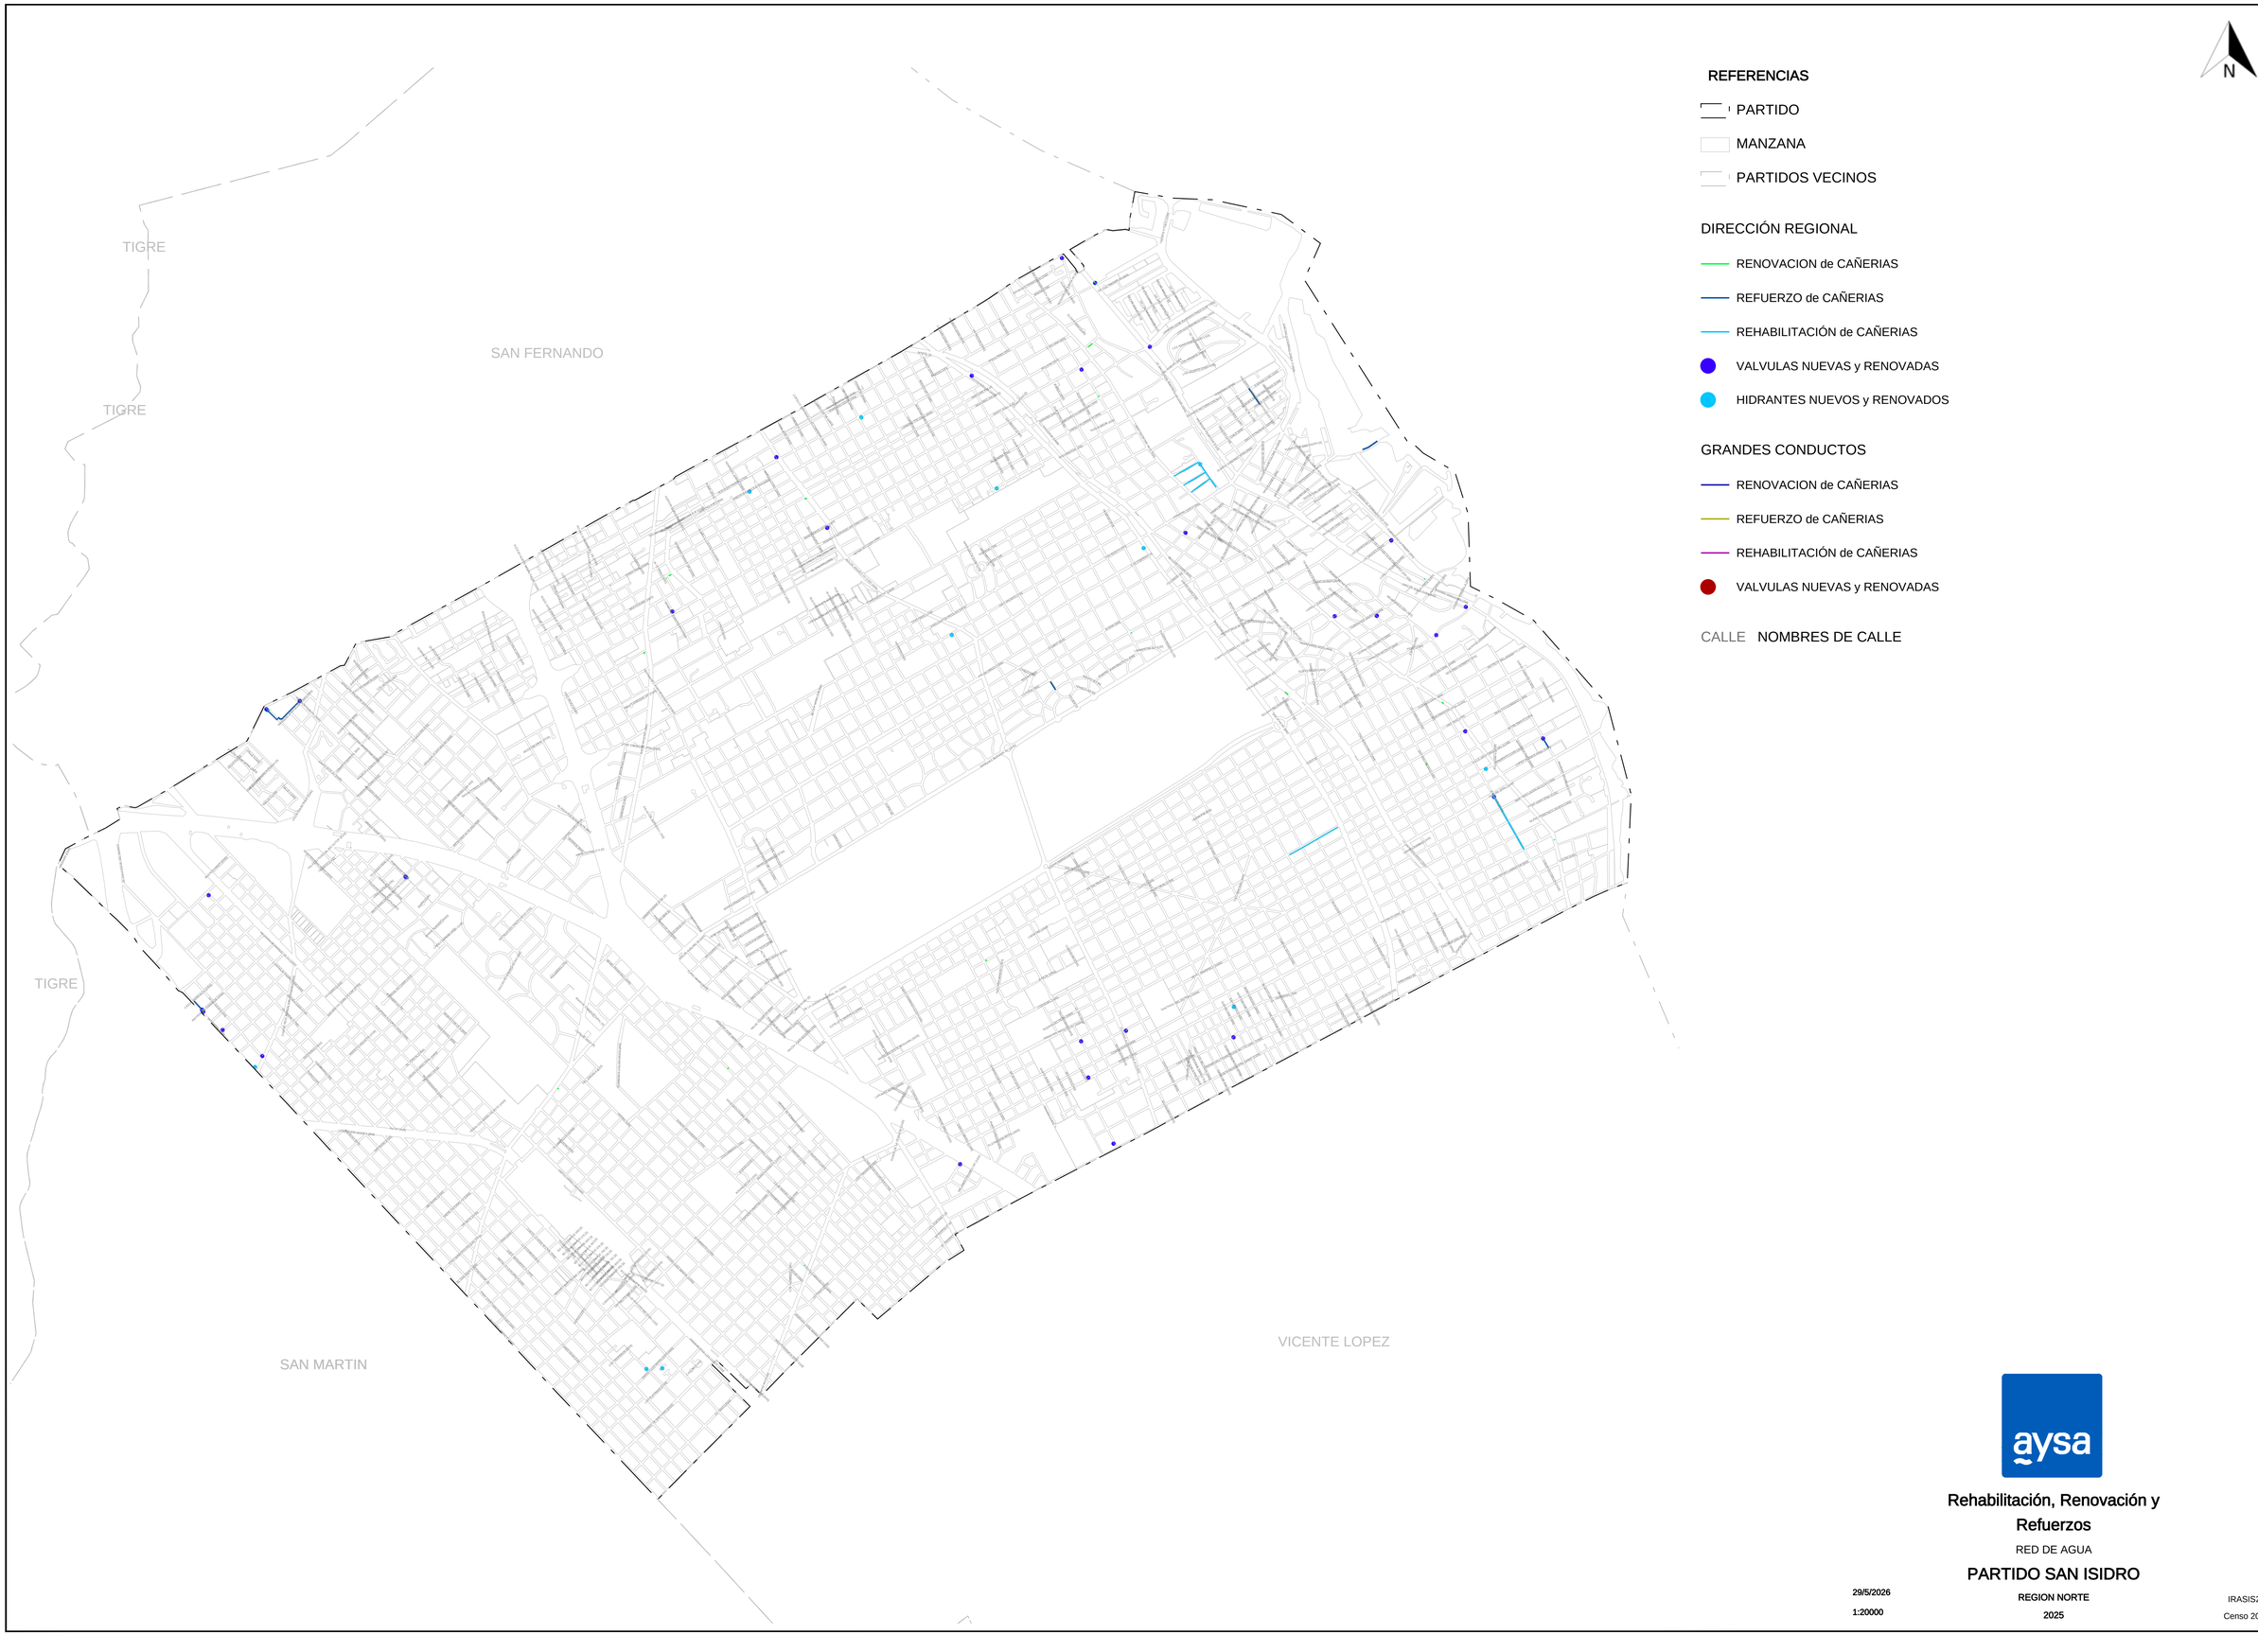
N
REFERENCIAS
PARTIDO
MANZANA
PARTIDOS VECINOS
DIRECCIÓN REGIONAL
RENOVACION de CAÑERIAS
REFUERZO de CAÑERIAS
REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS
GRANDES CONDUCTOS
RENOVACION de CAÑERIAS
REFUERZO de CAÑERIAS
REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
CALLE NOMBRES DE CALLE
TIGRE
SAN FERNANDO
TIGRE
TIGRE
SAN MARTIN
VICENTE LOPEZ
aysa
Rehabilitación, Renovación y Refuerzos
RED DE AGUA
PARTIDO SAN ISIDRO
29/5/2026
1:20000
REGION NORTE
2025
IRASIS20
Censo 2022

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

SAN ISIDRO

TIGRE

SAN MIGUEL

VICENTE LOPEZ

TRES DE FEBRERO

CAPITAL FEDERAL

HURLINGHAM

MORON

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO SAN MARTIN

29/5/2026


1:22500

REGION NORTE

2025

IRASMA20

Censo 2022

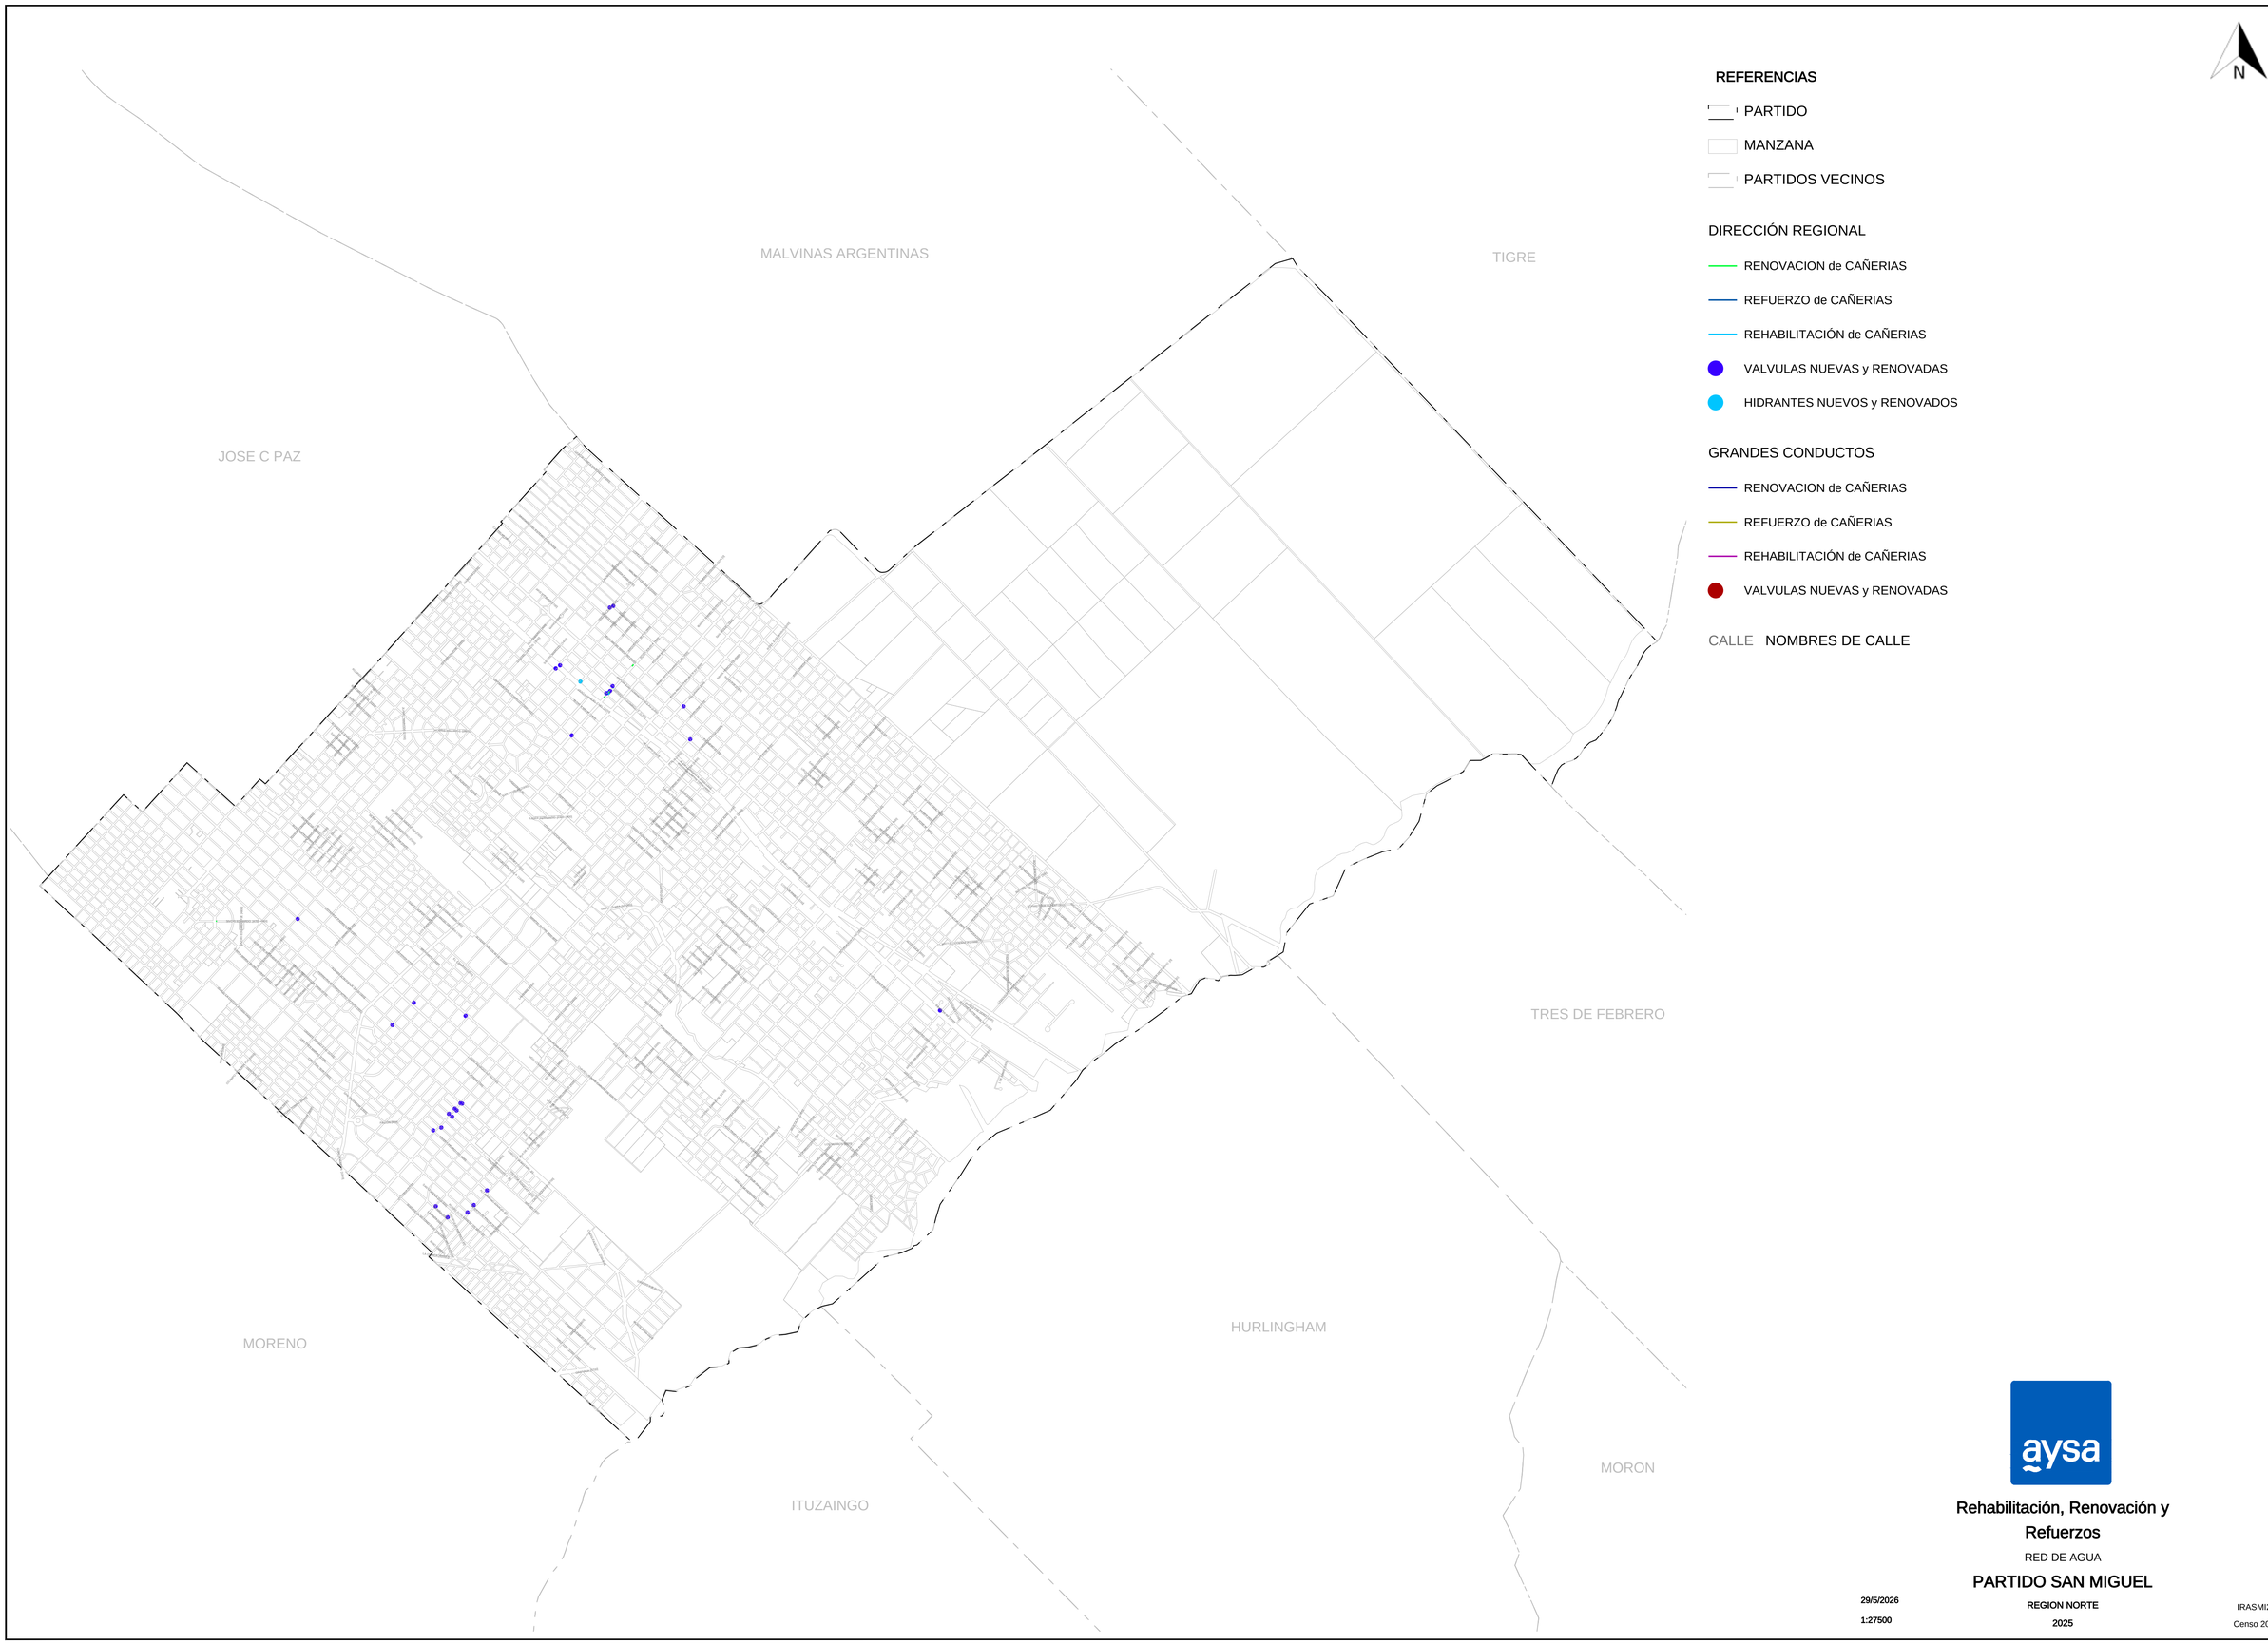

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO SAN MIGUEL

29/5/2026


1:27500

REGION NORTE

2025

IRASMI20

Censo 2022

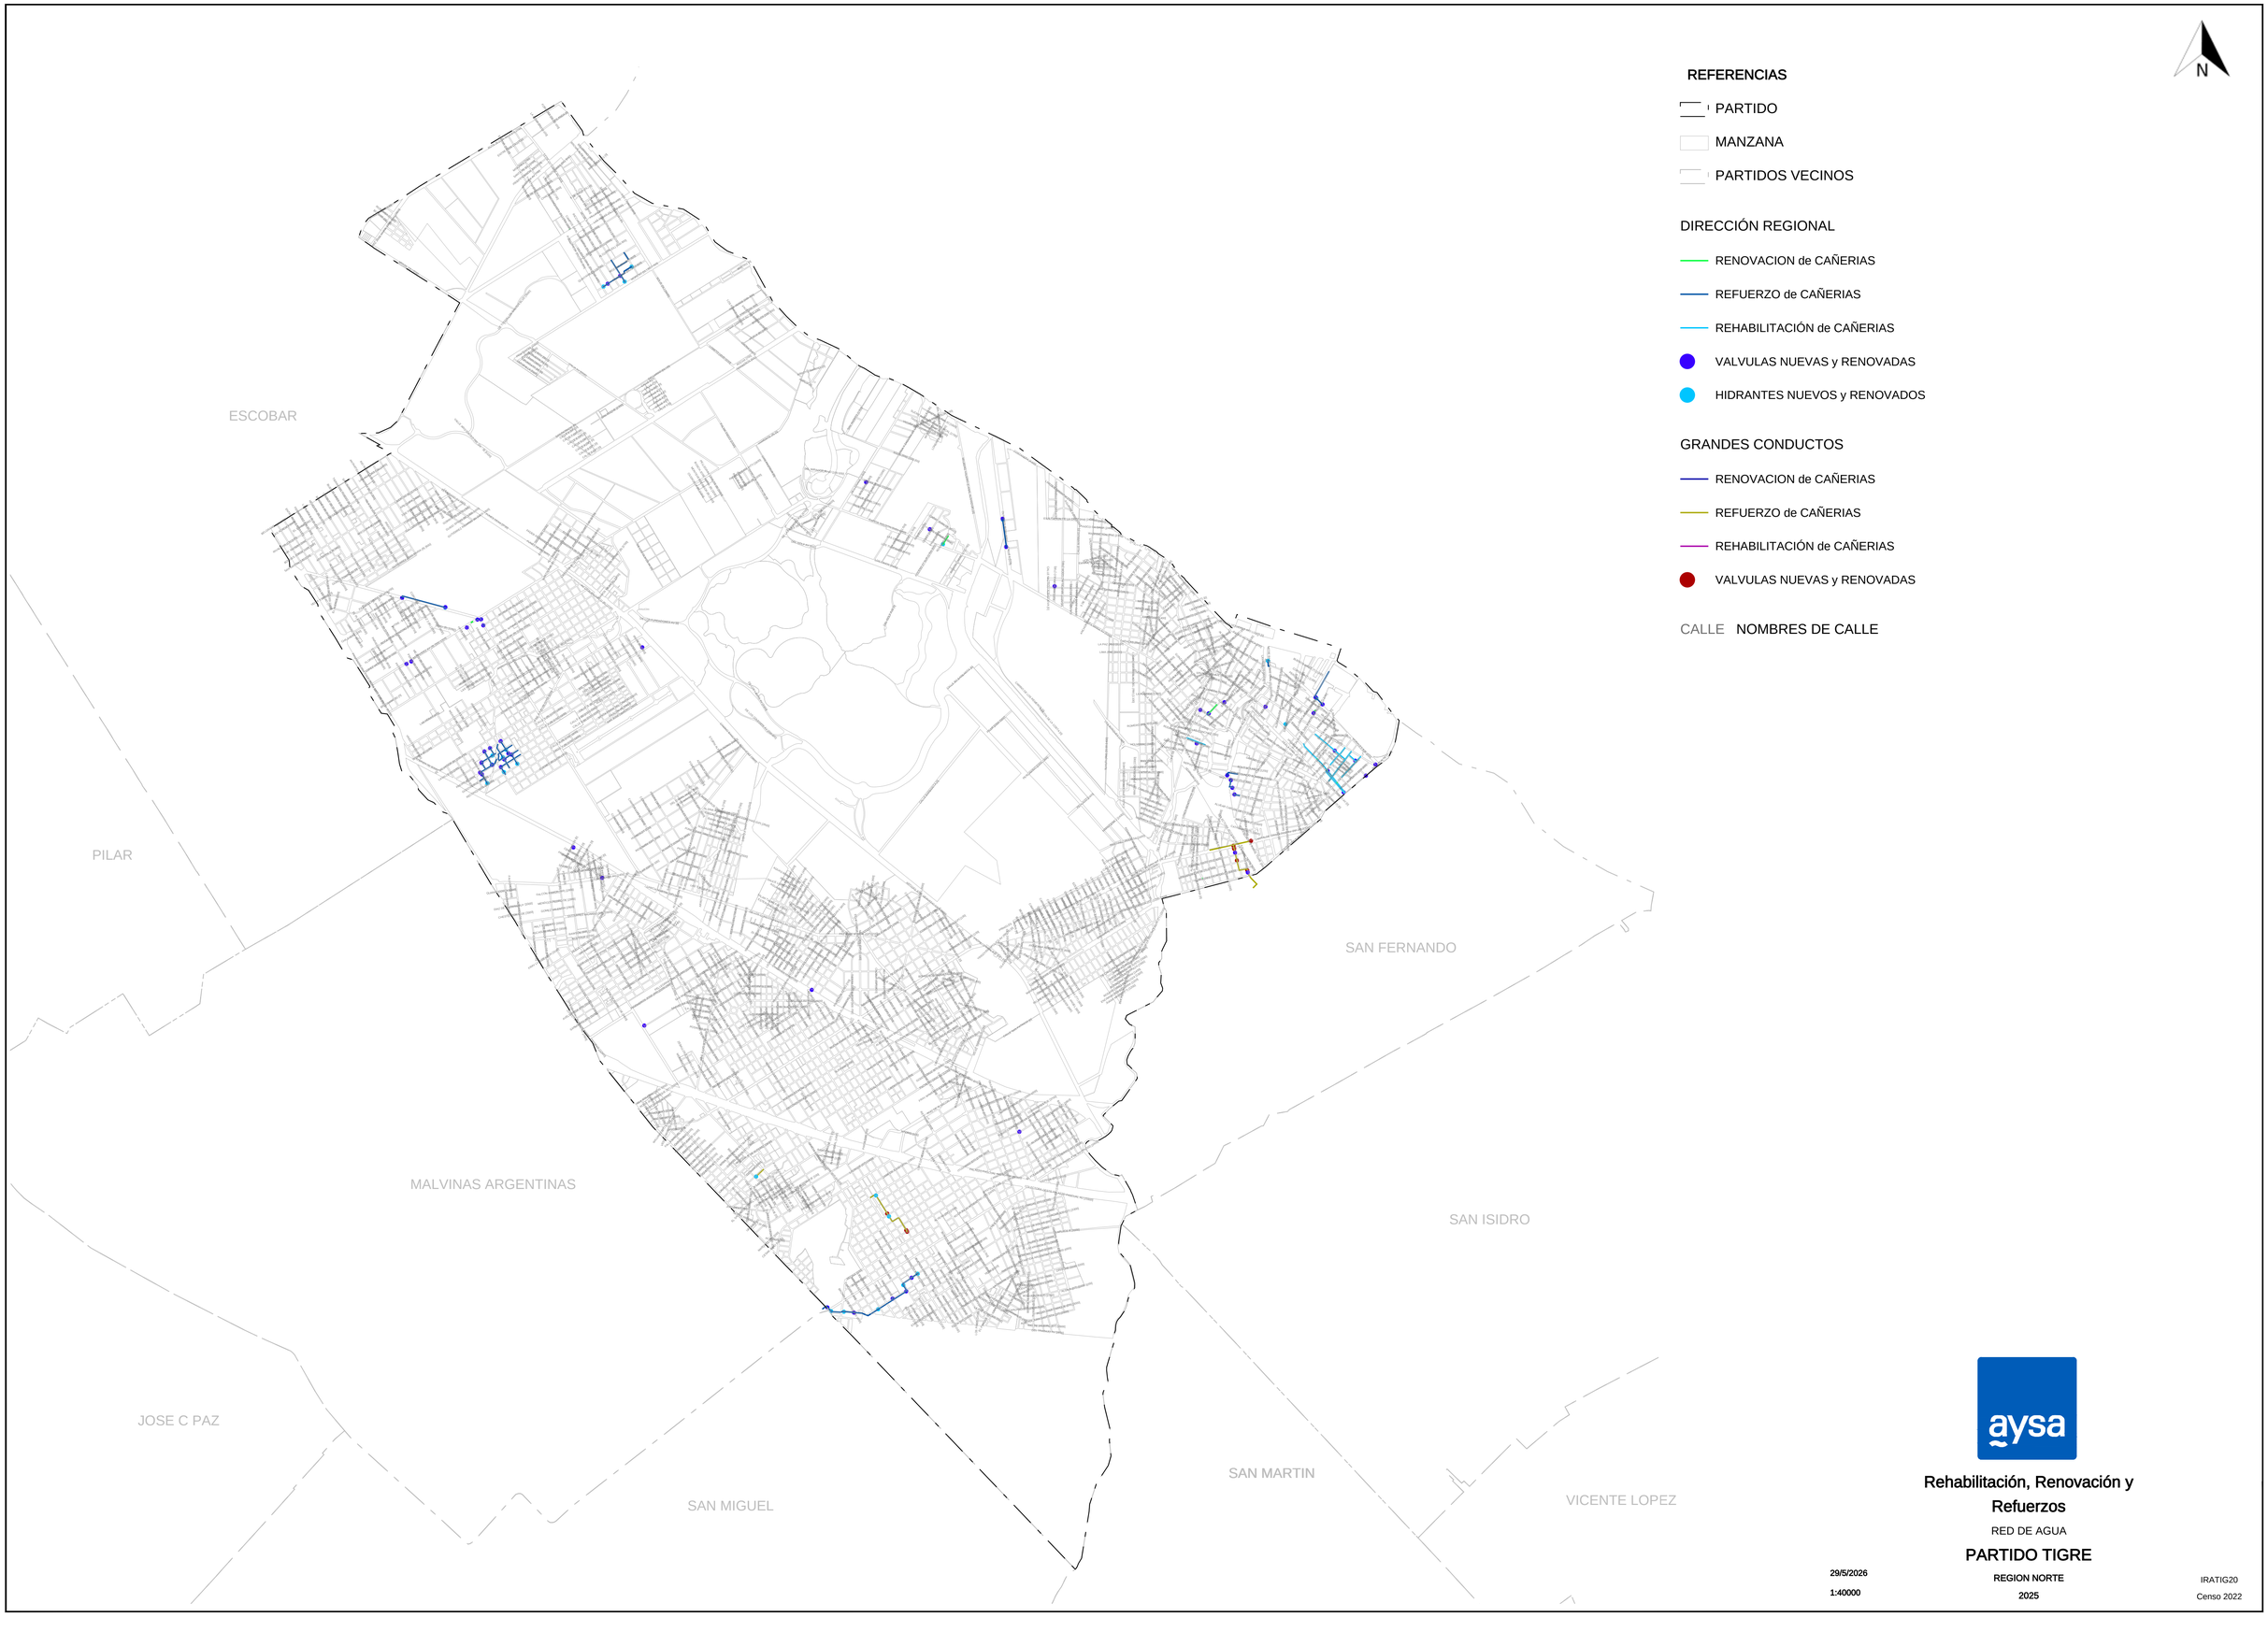

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
- HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO TIGRE

29/5/2026


1:40000

REGION NORTE

2025

IRATIG20

Censo 2022

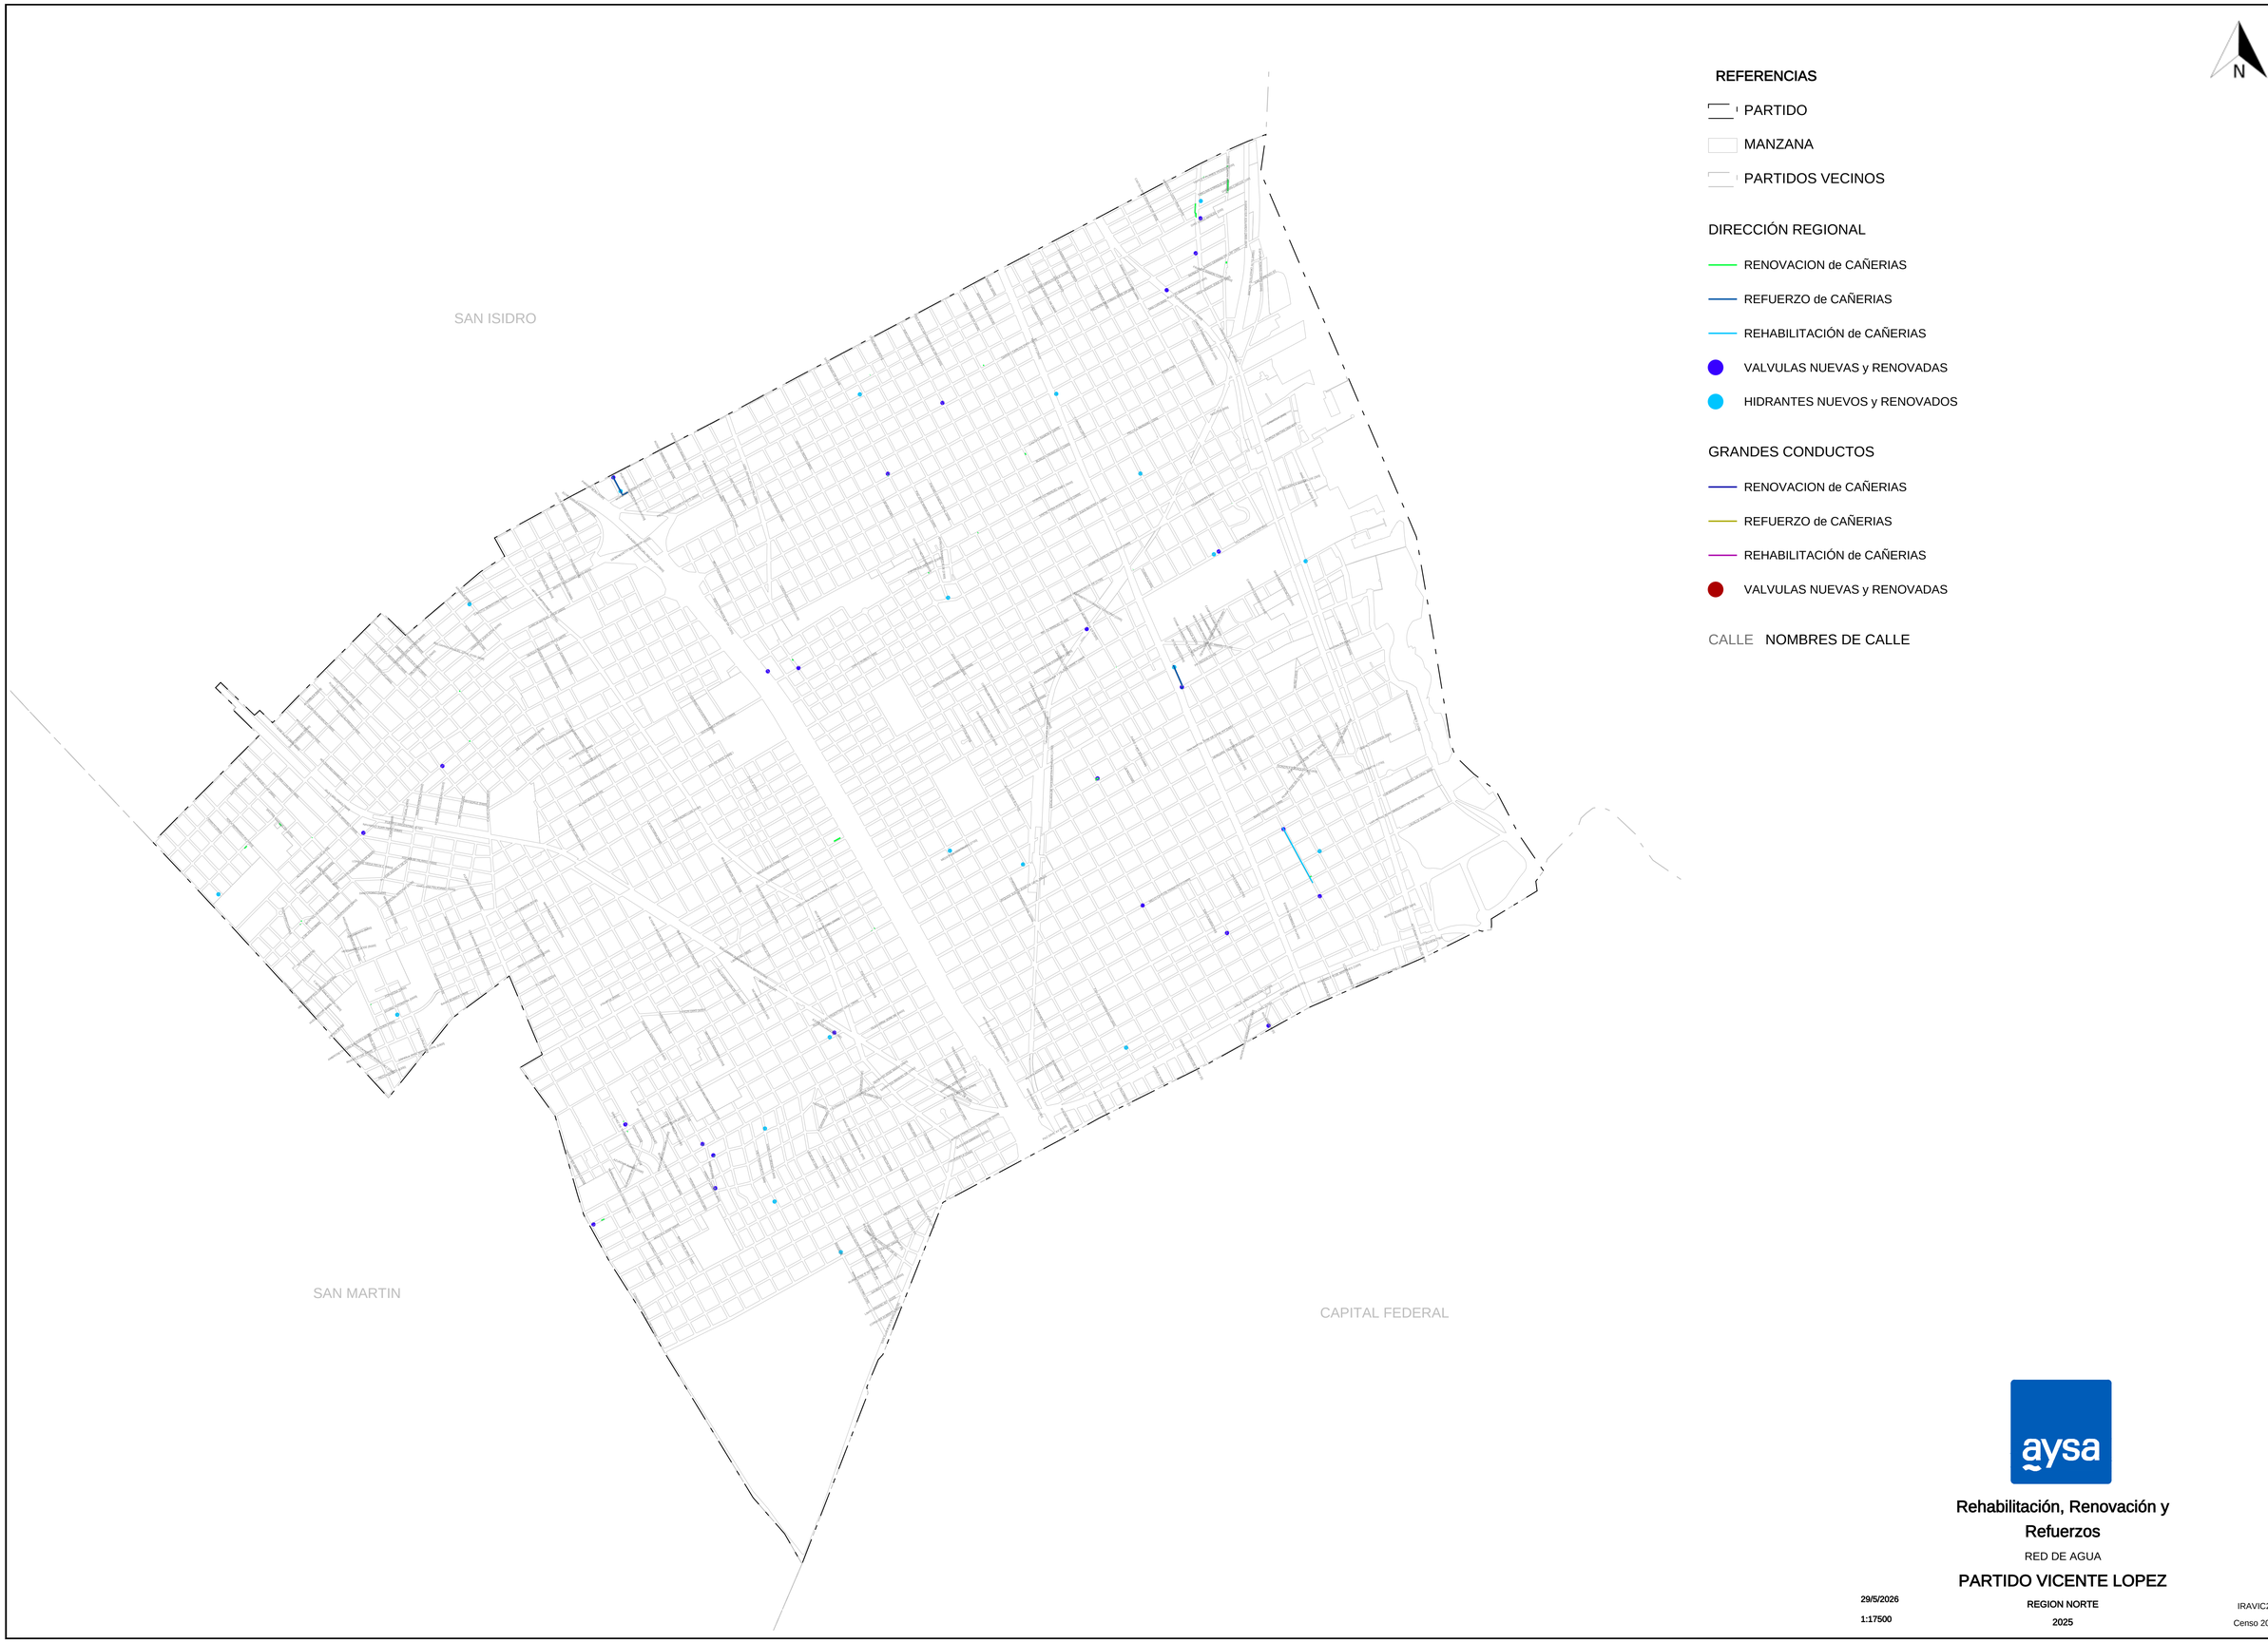

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO VICENTE LOPEZ

29/5/2026

1:17500


REGION NORTE

2025

IRAVIC20

Censo 2022

Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Oeste

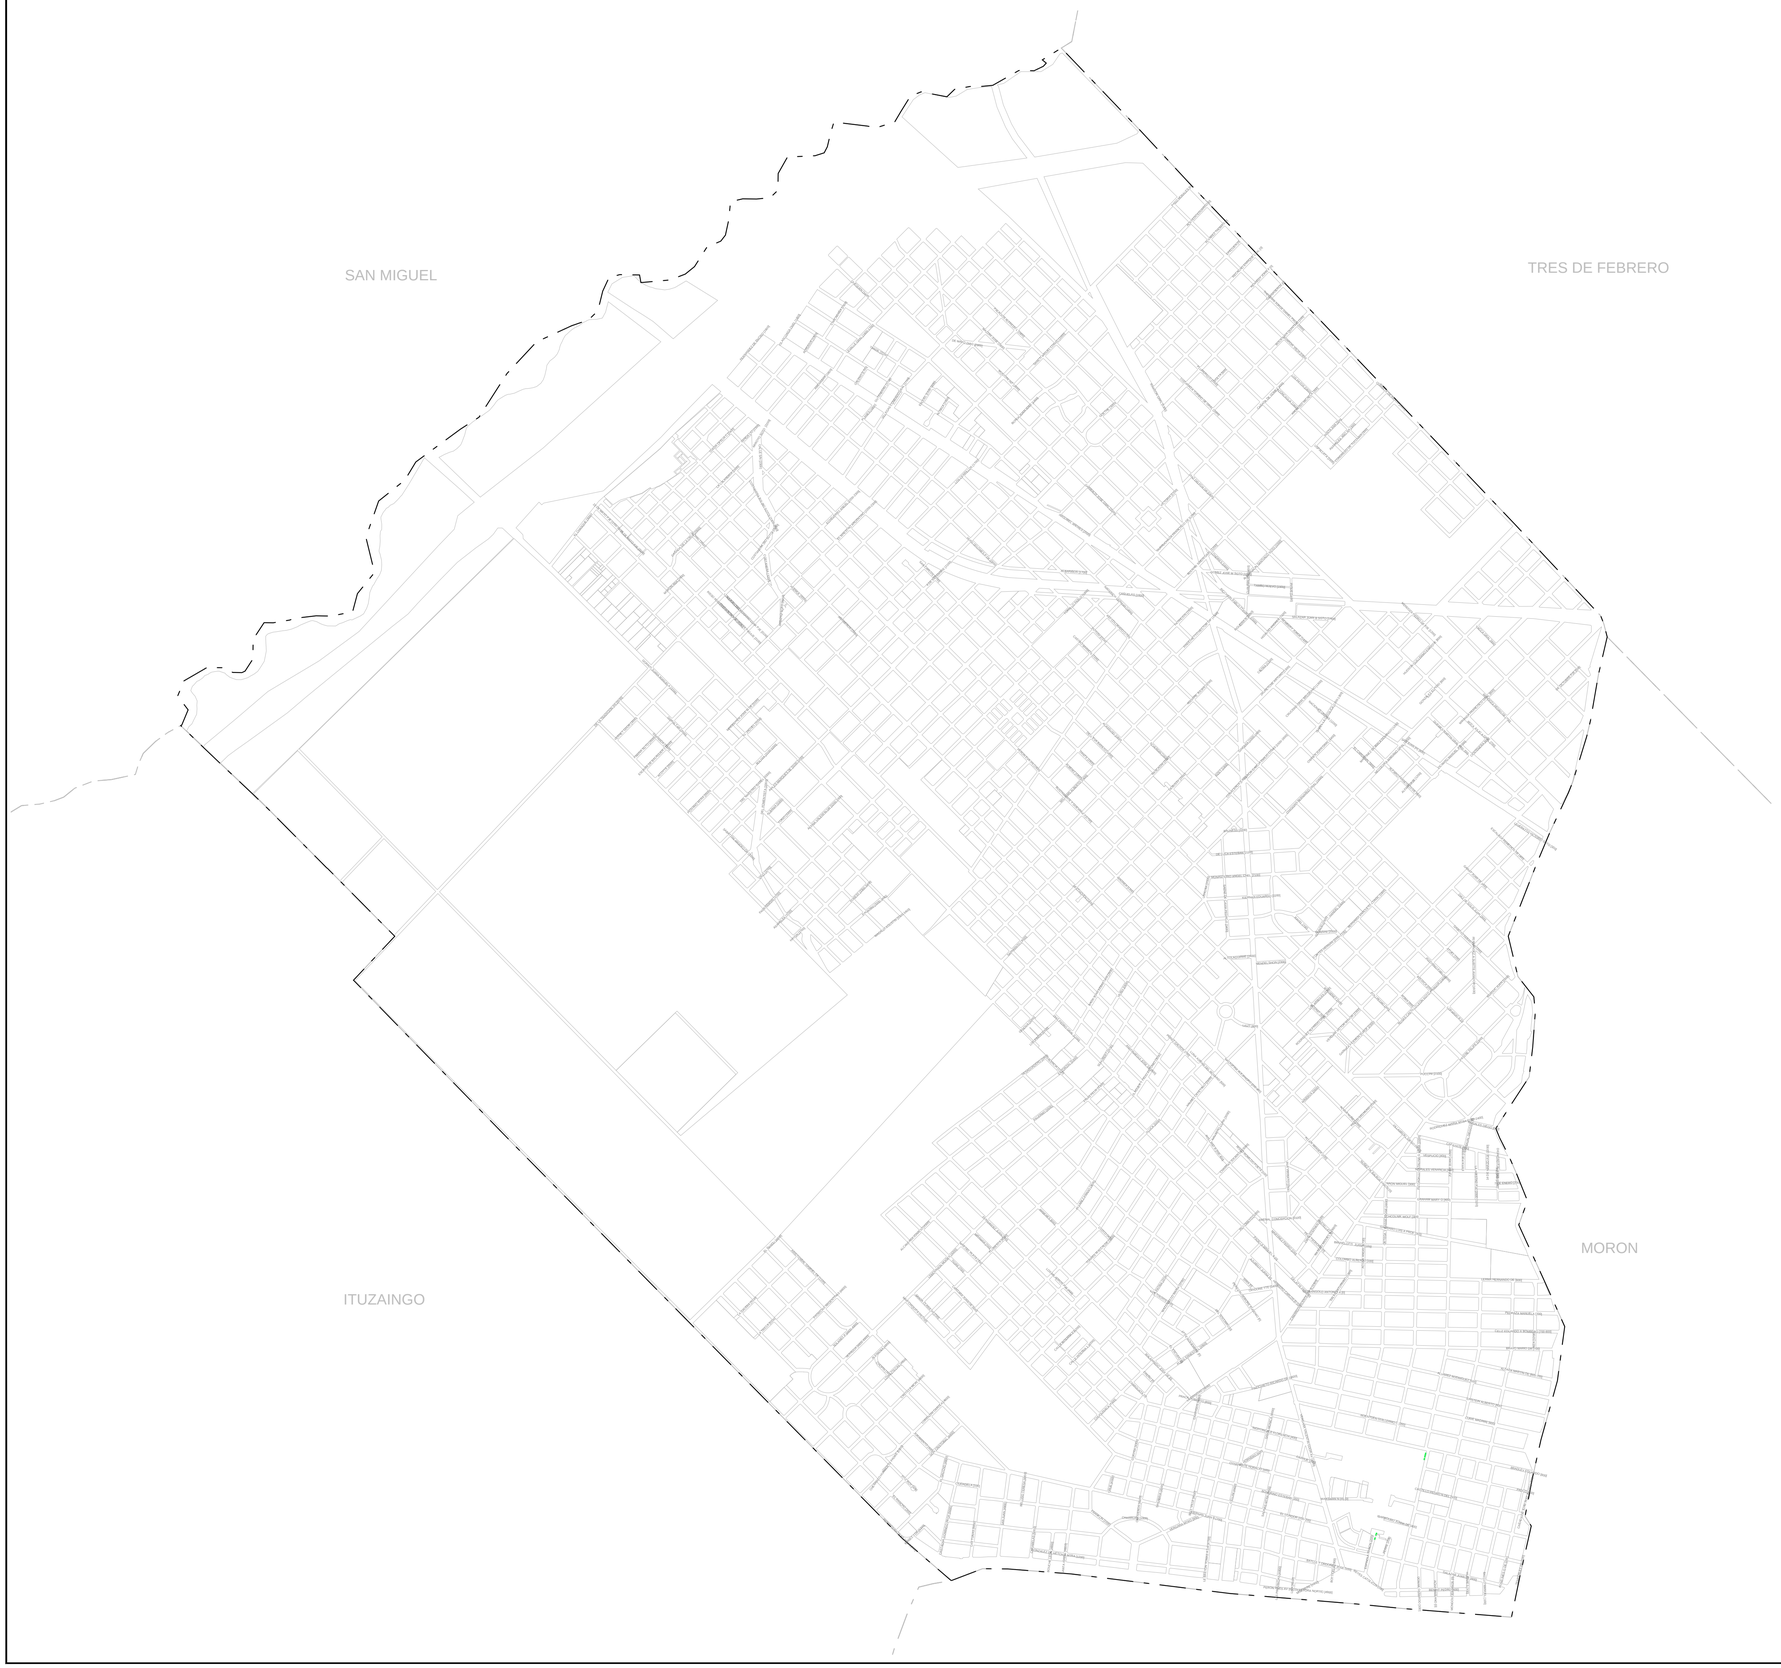

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO HURLINGHAM

4/5/2026


1:15000

REGION OESTE

2025

IRAHUR20

Censo 2022

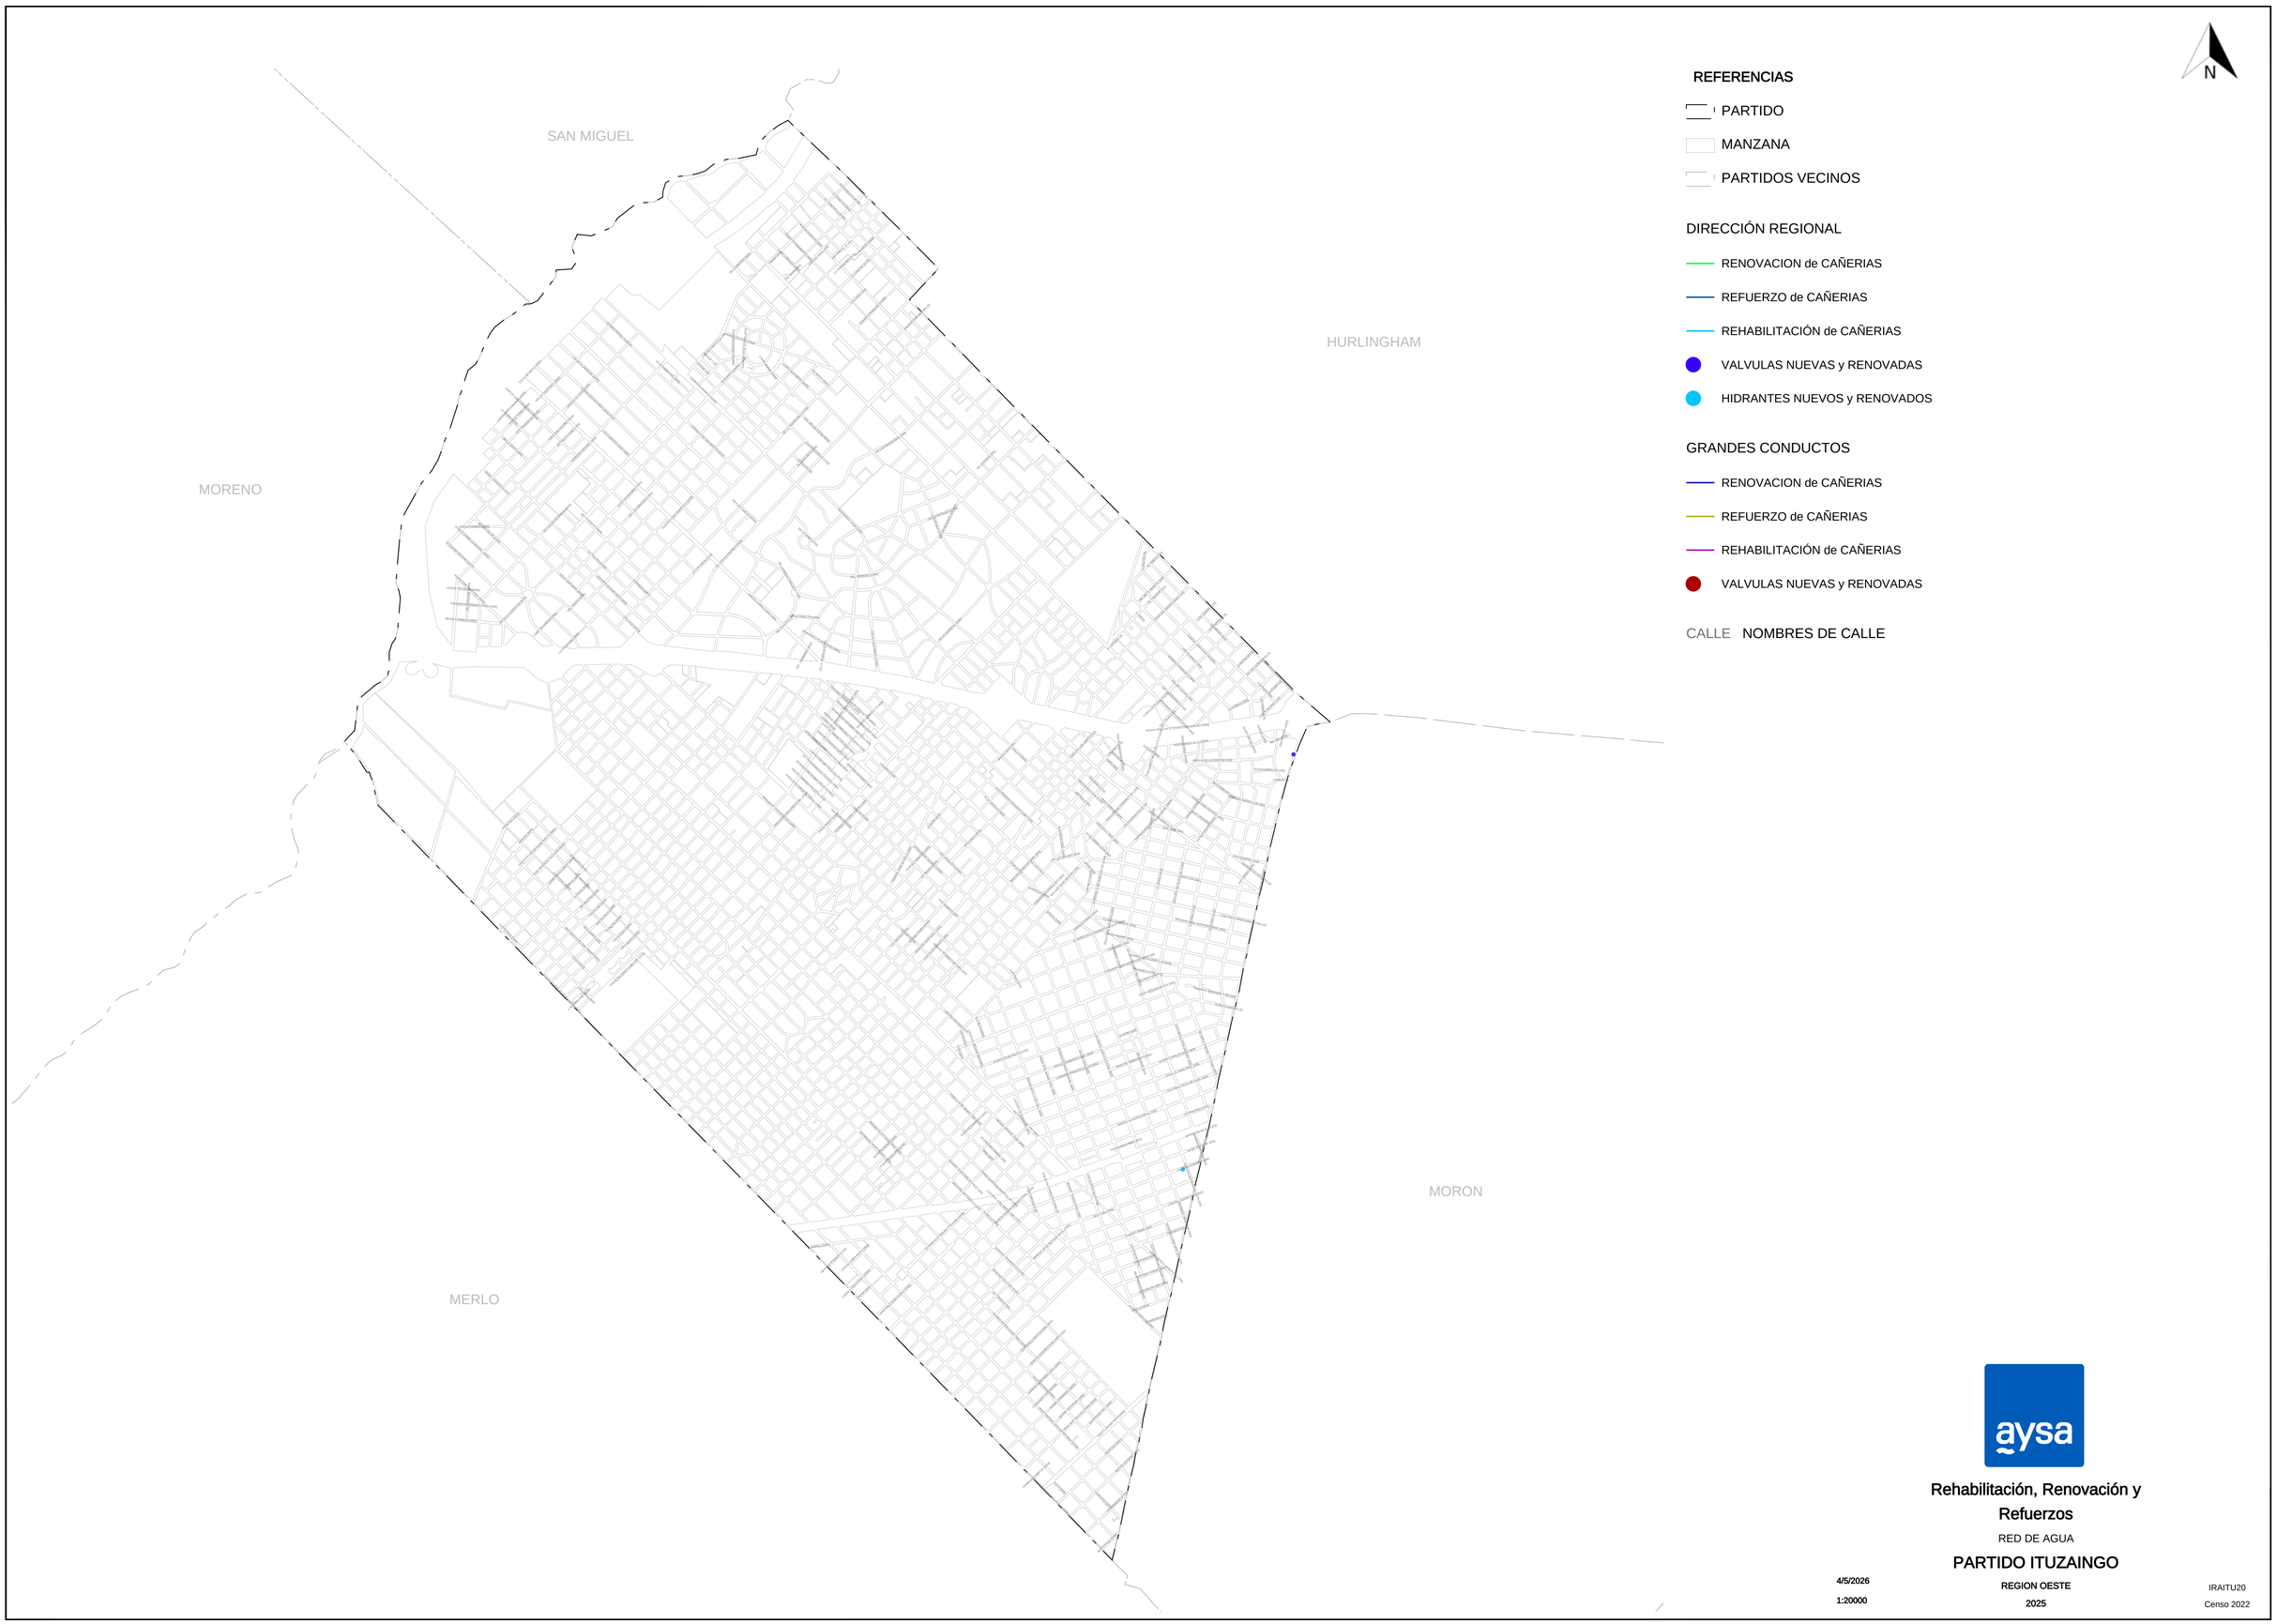

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
- HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO ITUZAINGO

REGION OESTE


2025

4/5/2026

1:20000

IRAITU20

Censo 2022

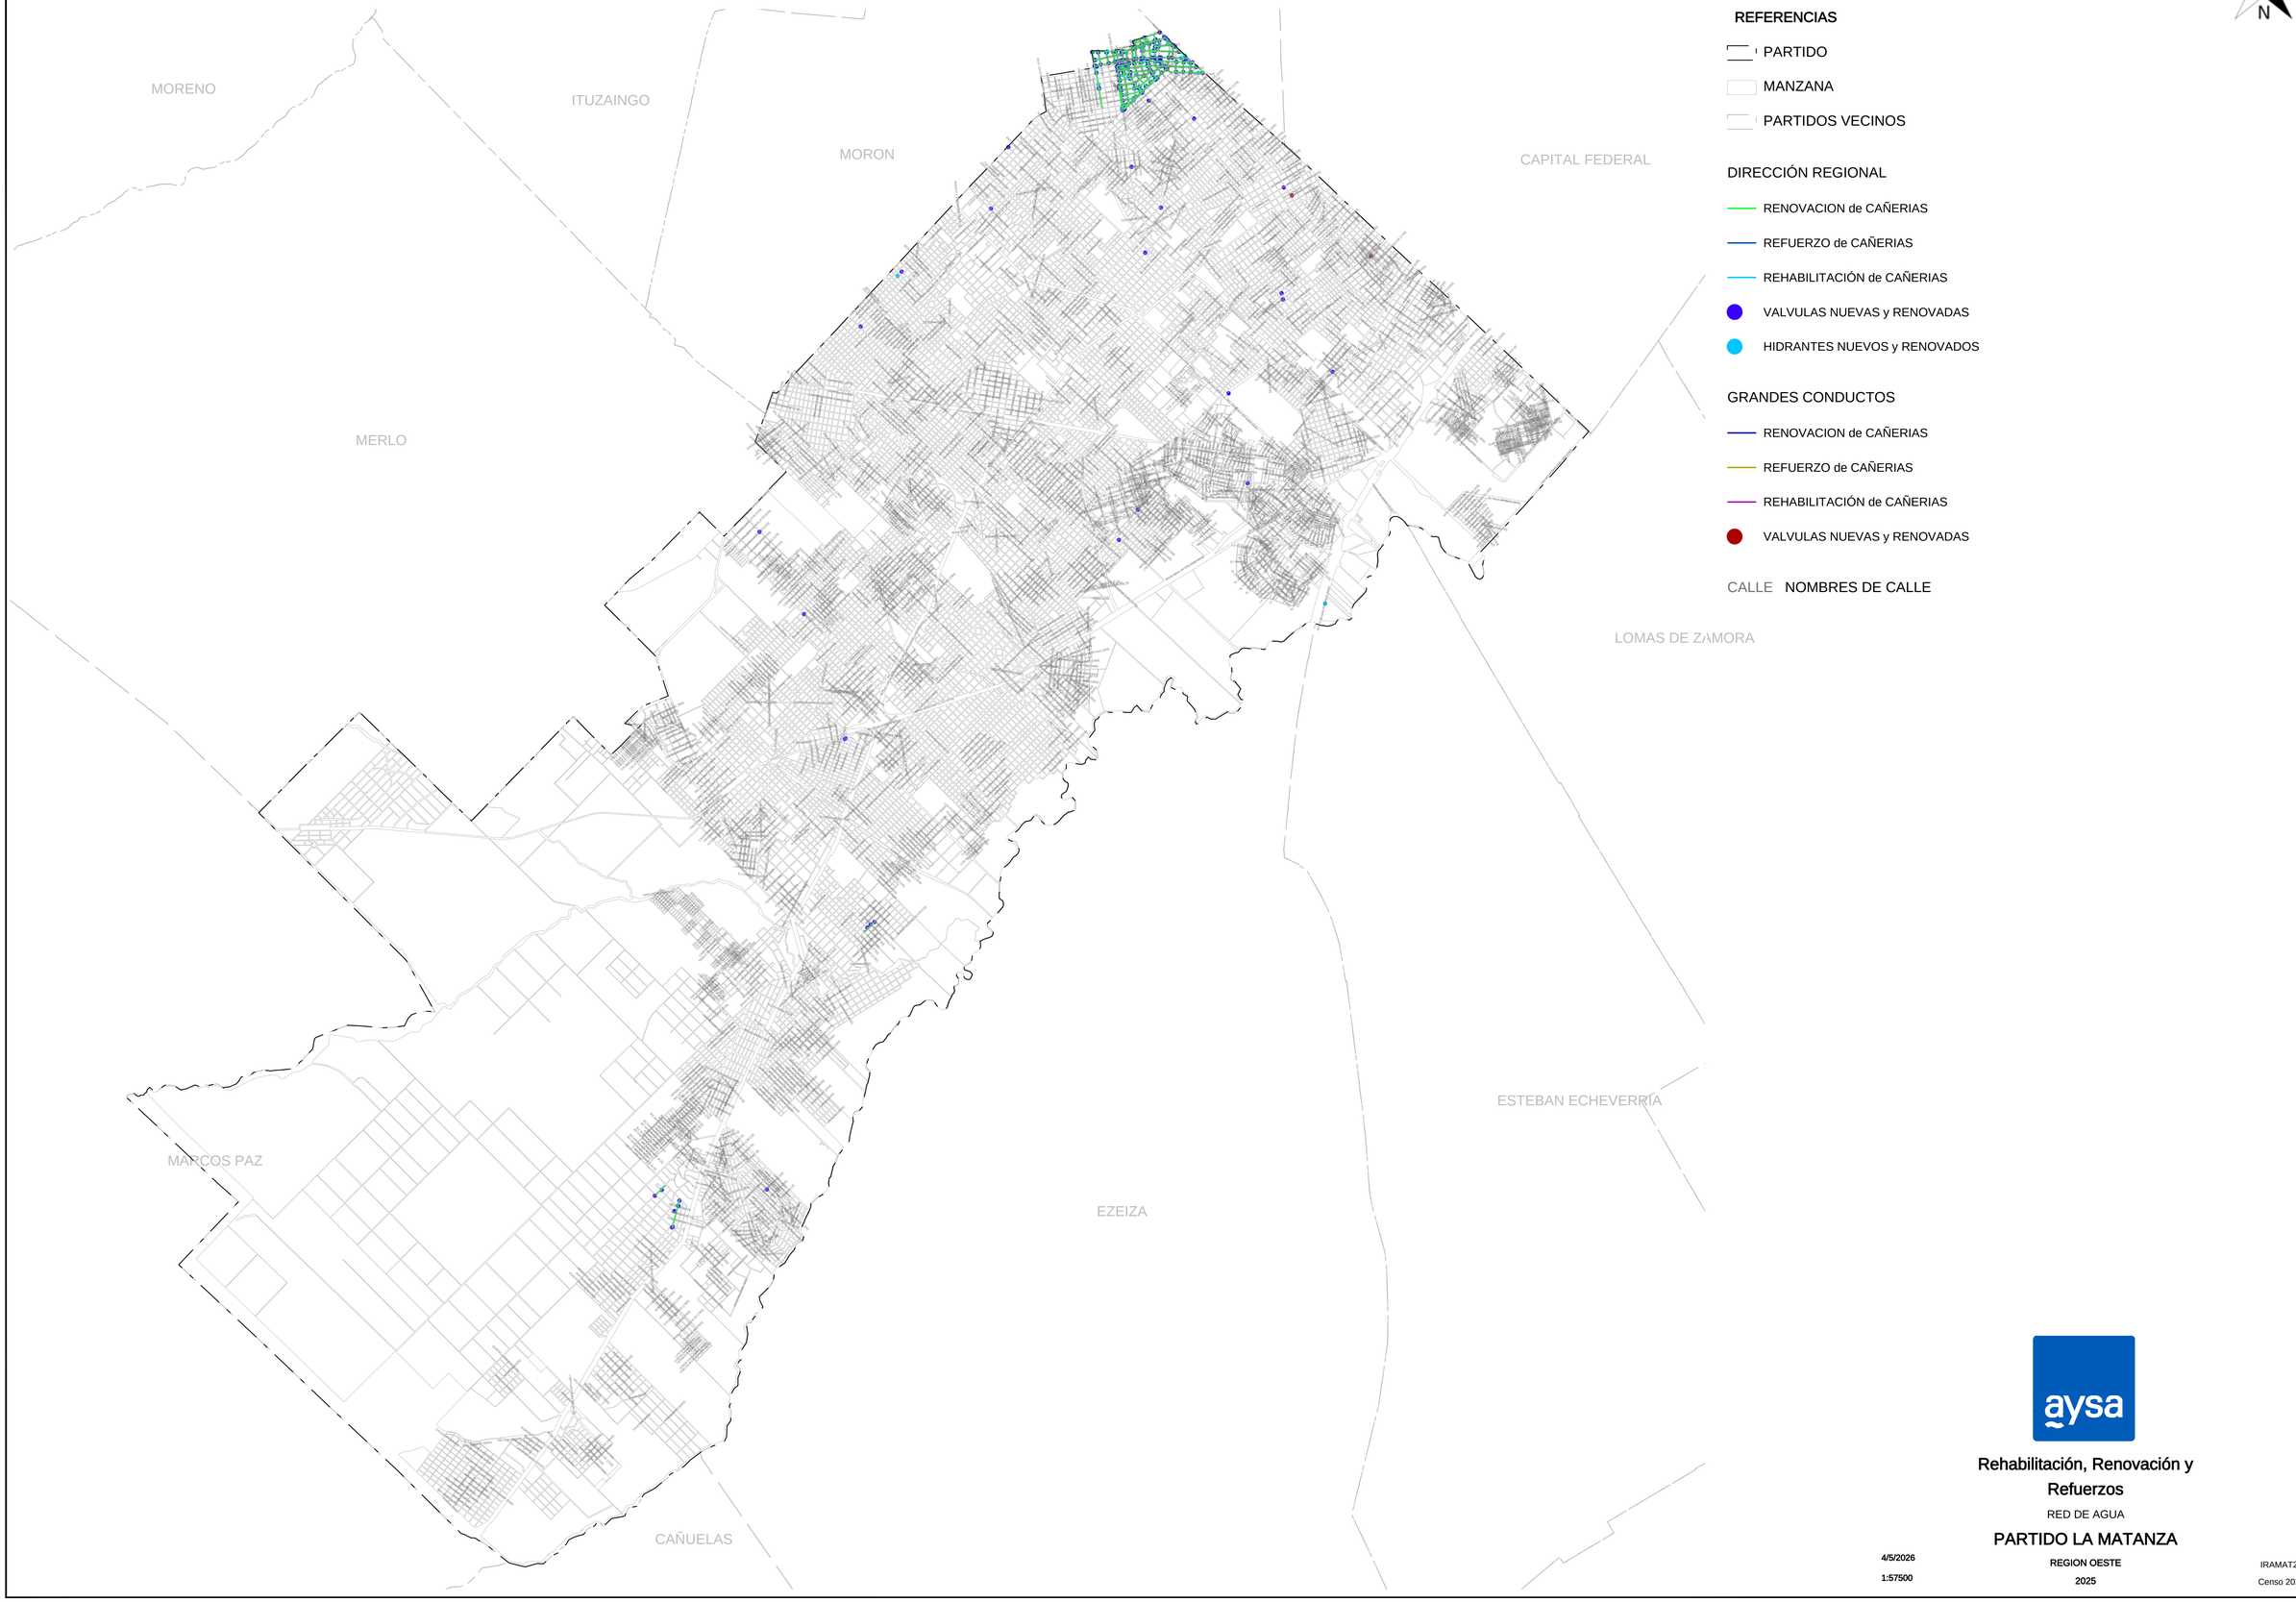

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO LA MATANZA

4/5/2026


1:57500

REGION OESTE

2025

IRAMAT20

Censo 2022

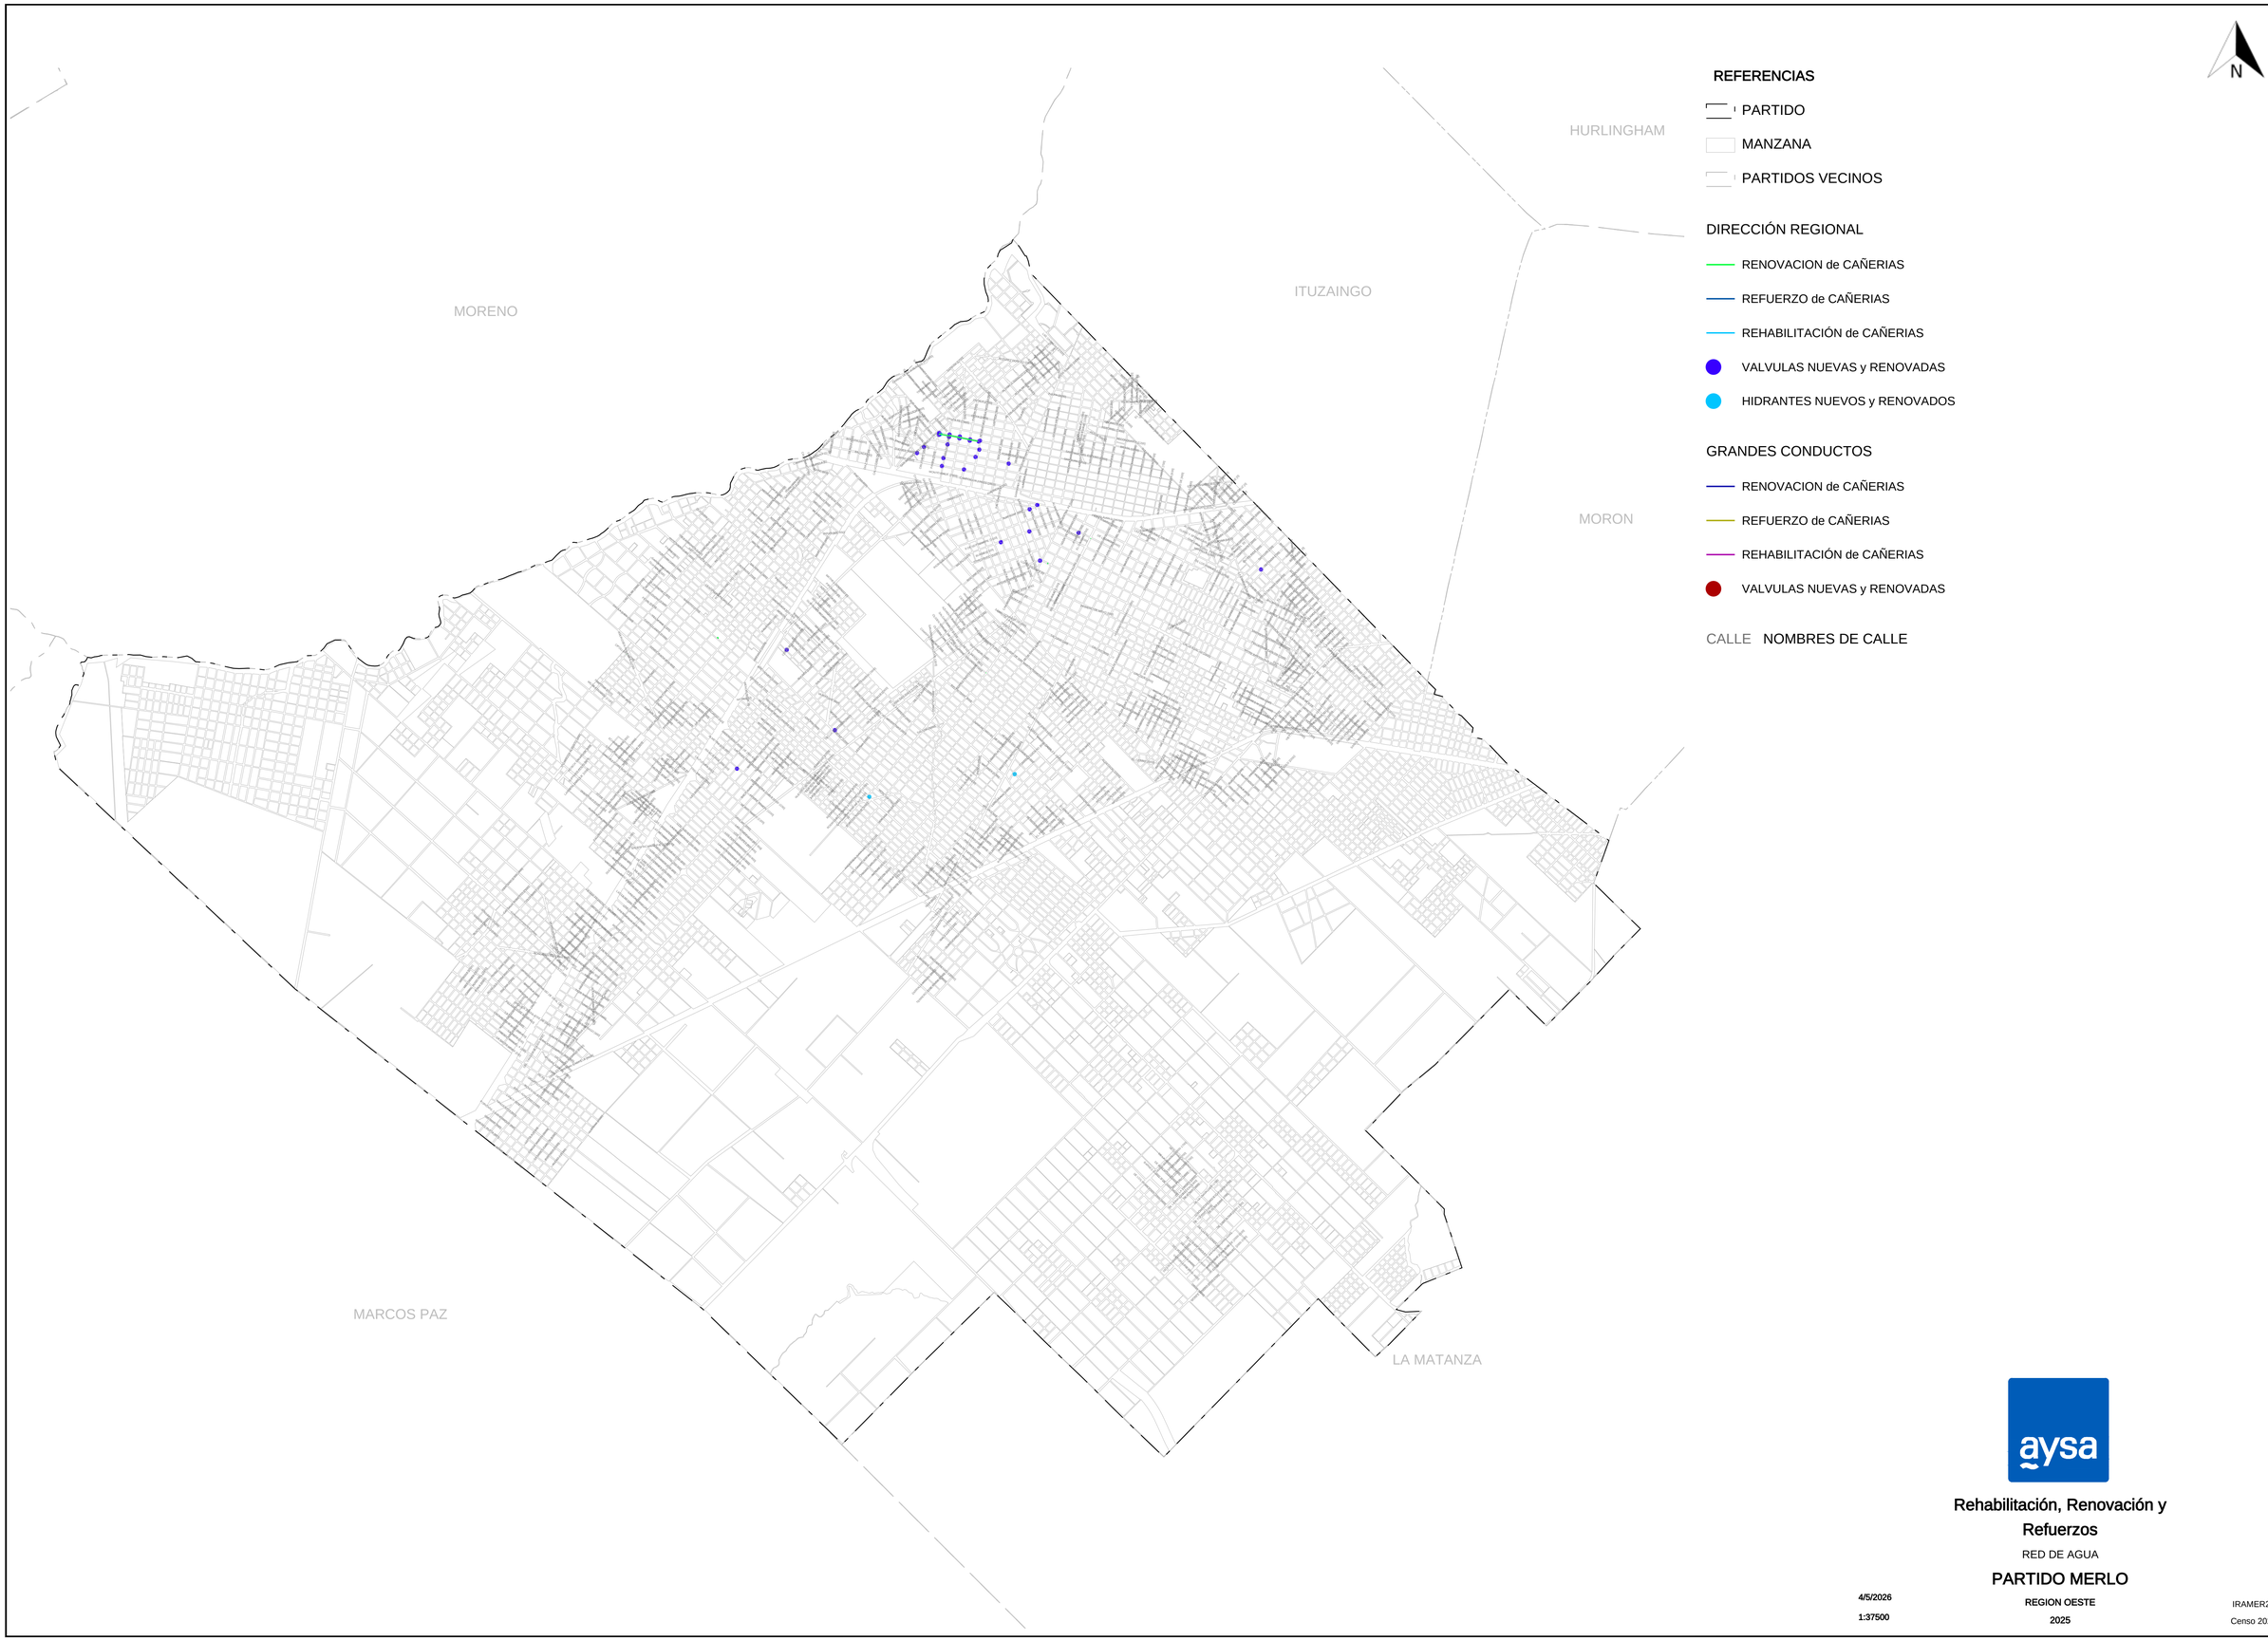

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO MERLO

4/5/2026


1:37500

REGION OESTE

2025

IRAMER20

Censo 2022

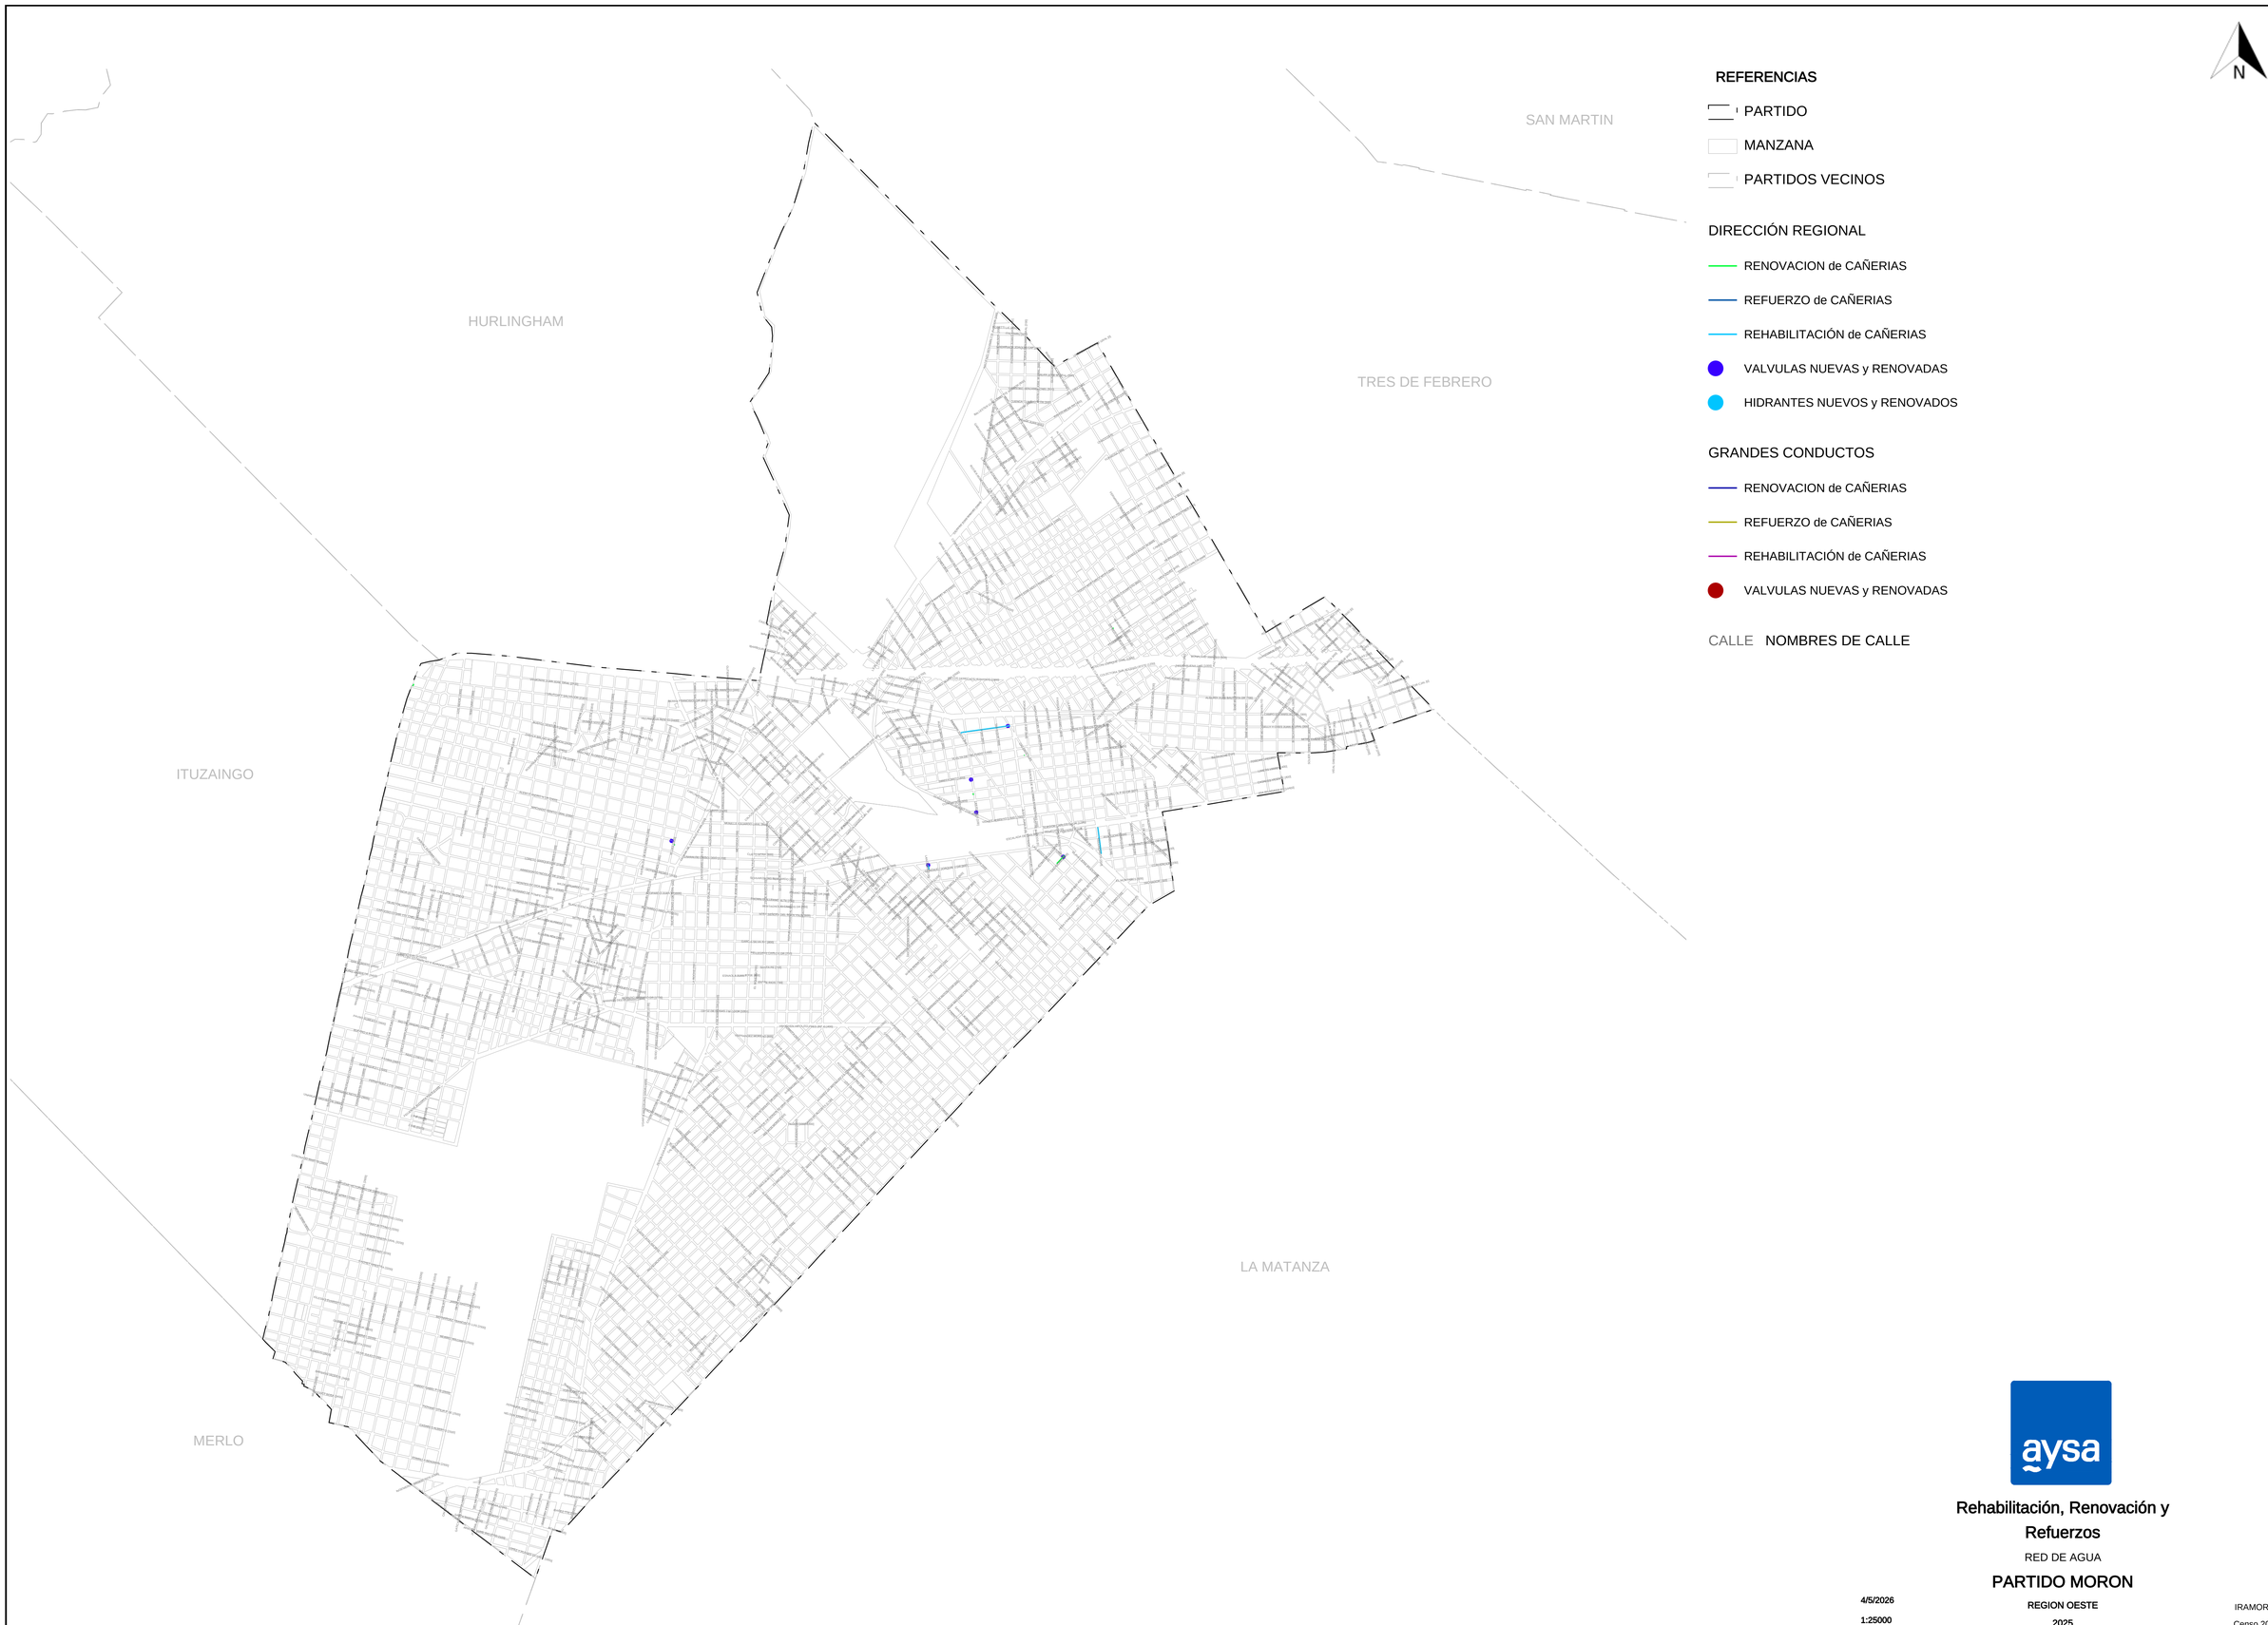

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO MORON

REGION OESTE


2025

4/5/2026

1:25000

IRAMOR20

Censo 2022

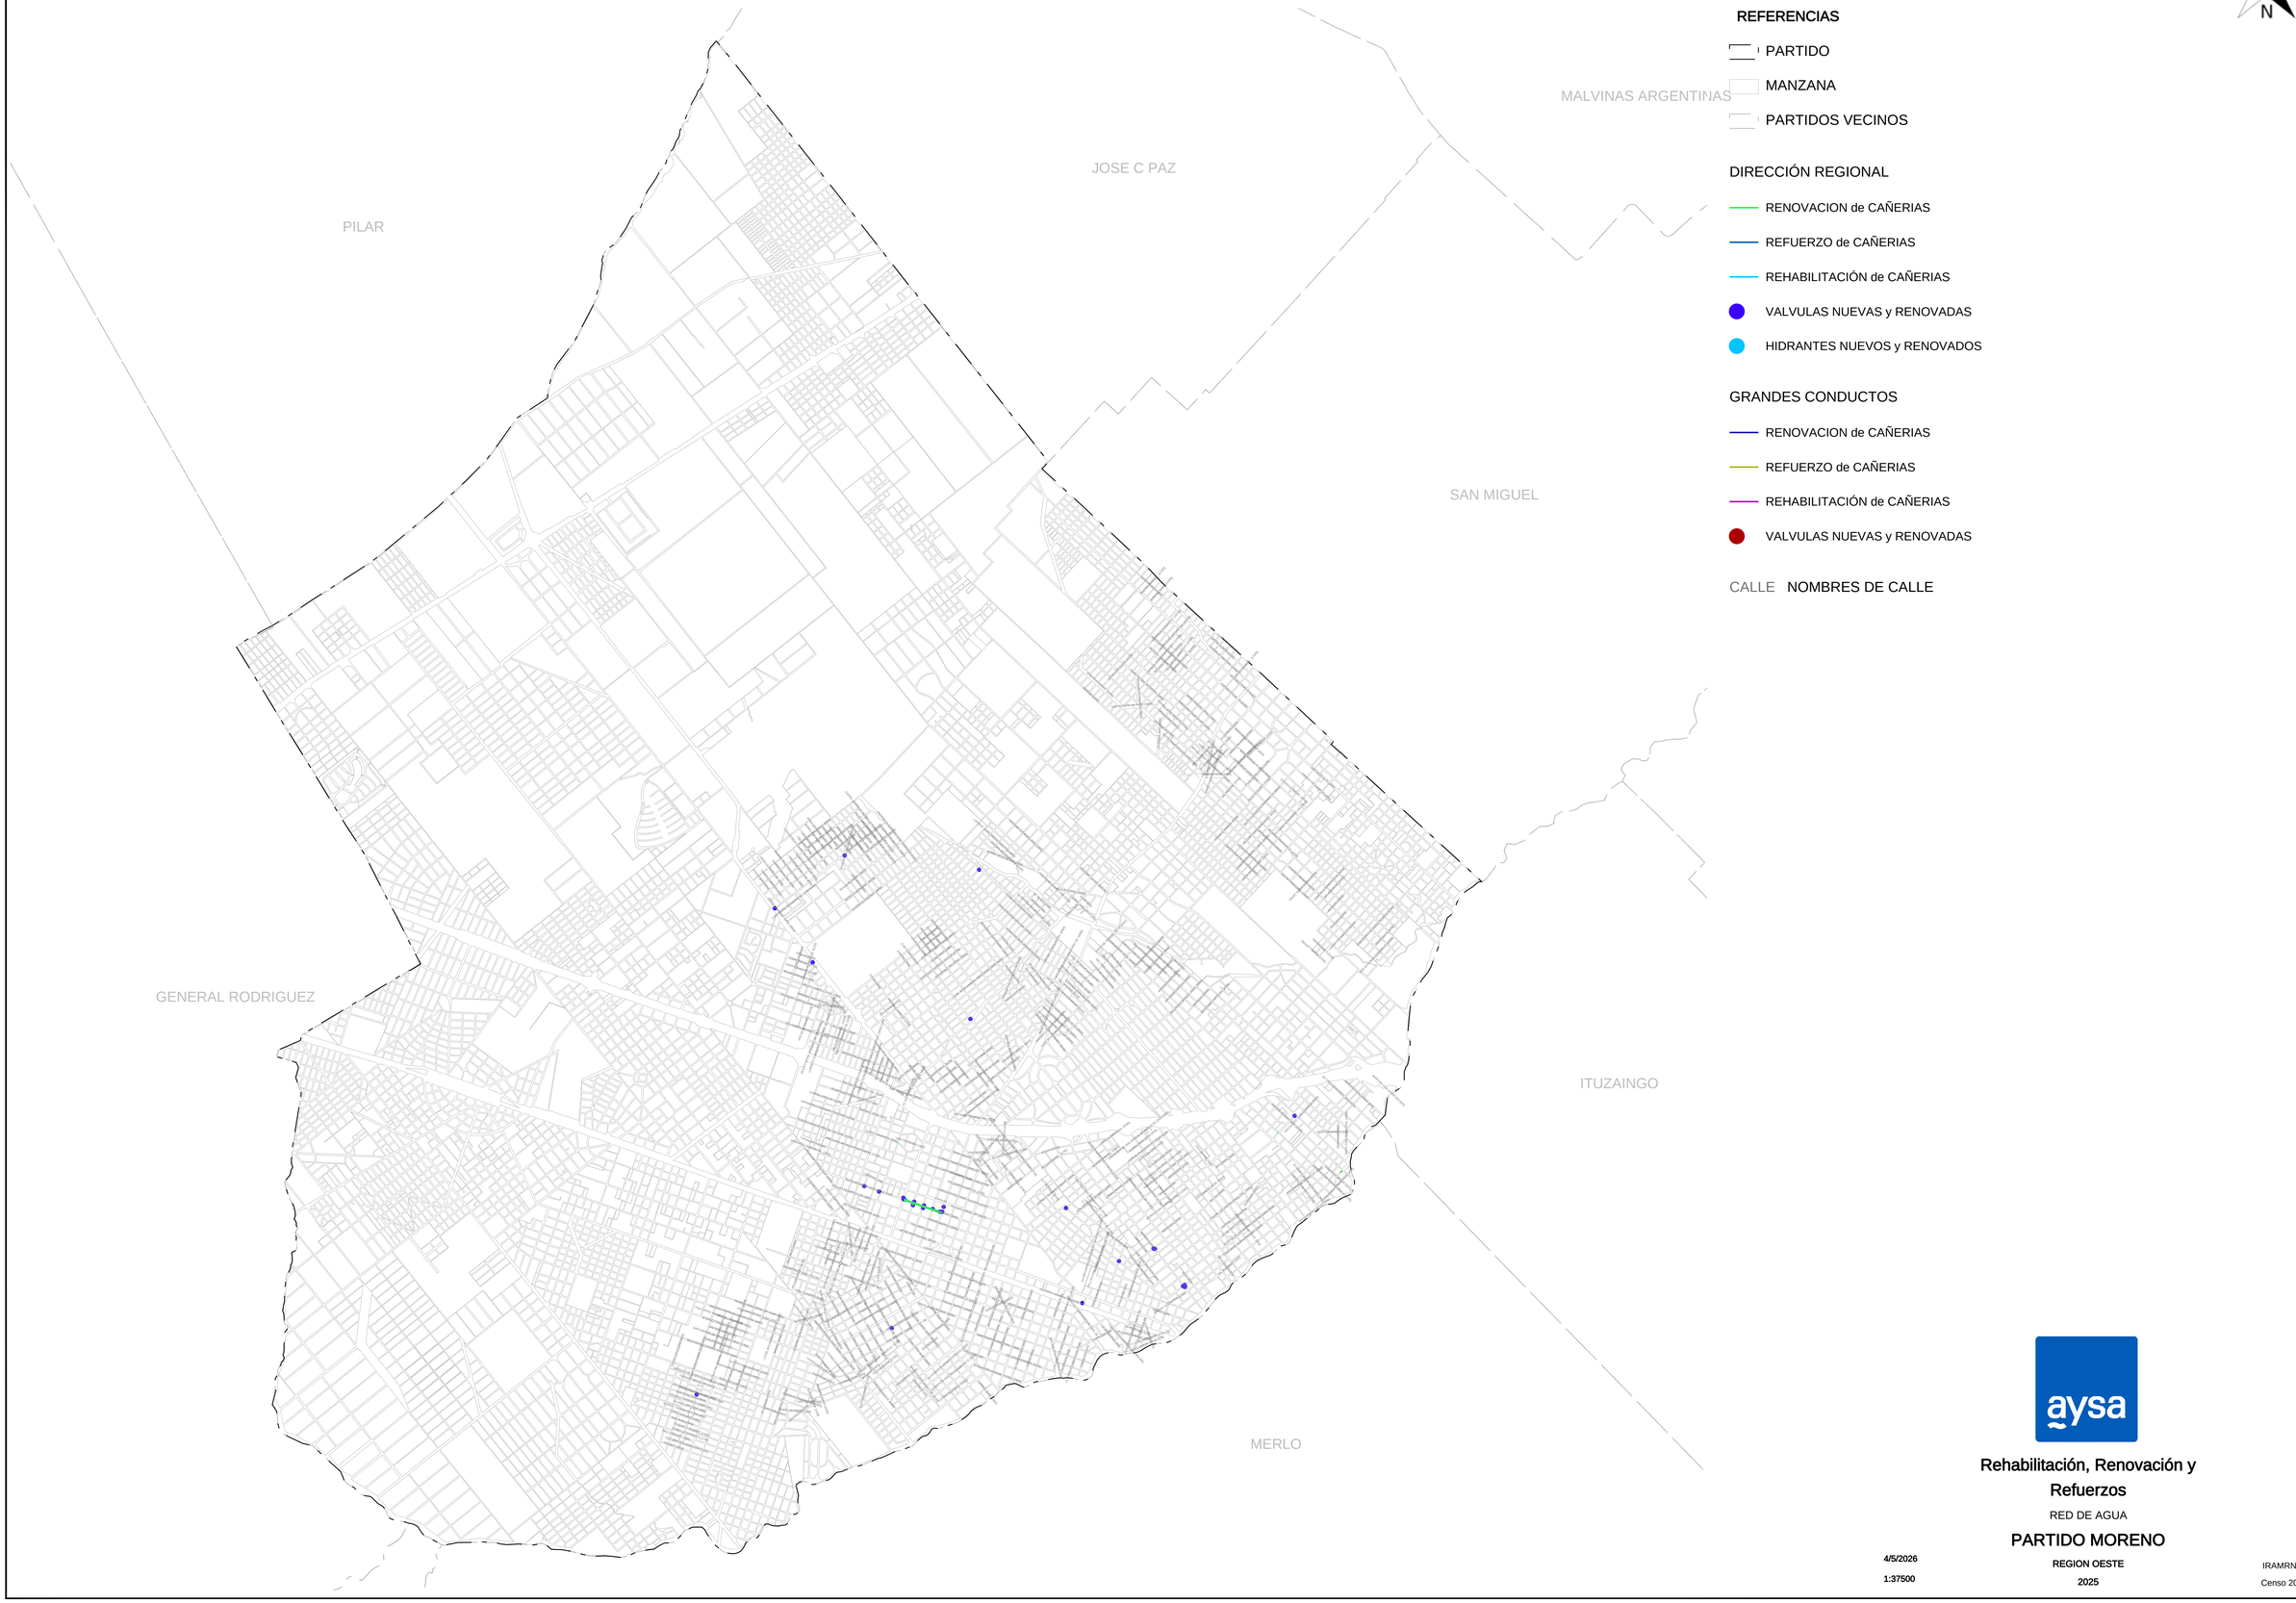

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO MORENO

4/5/2026


1:37500

REGION OESTE


2025

IRAMRN20

Censo 2022

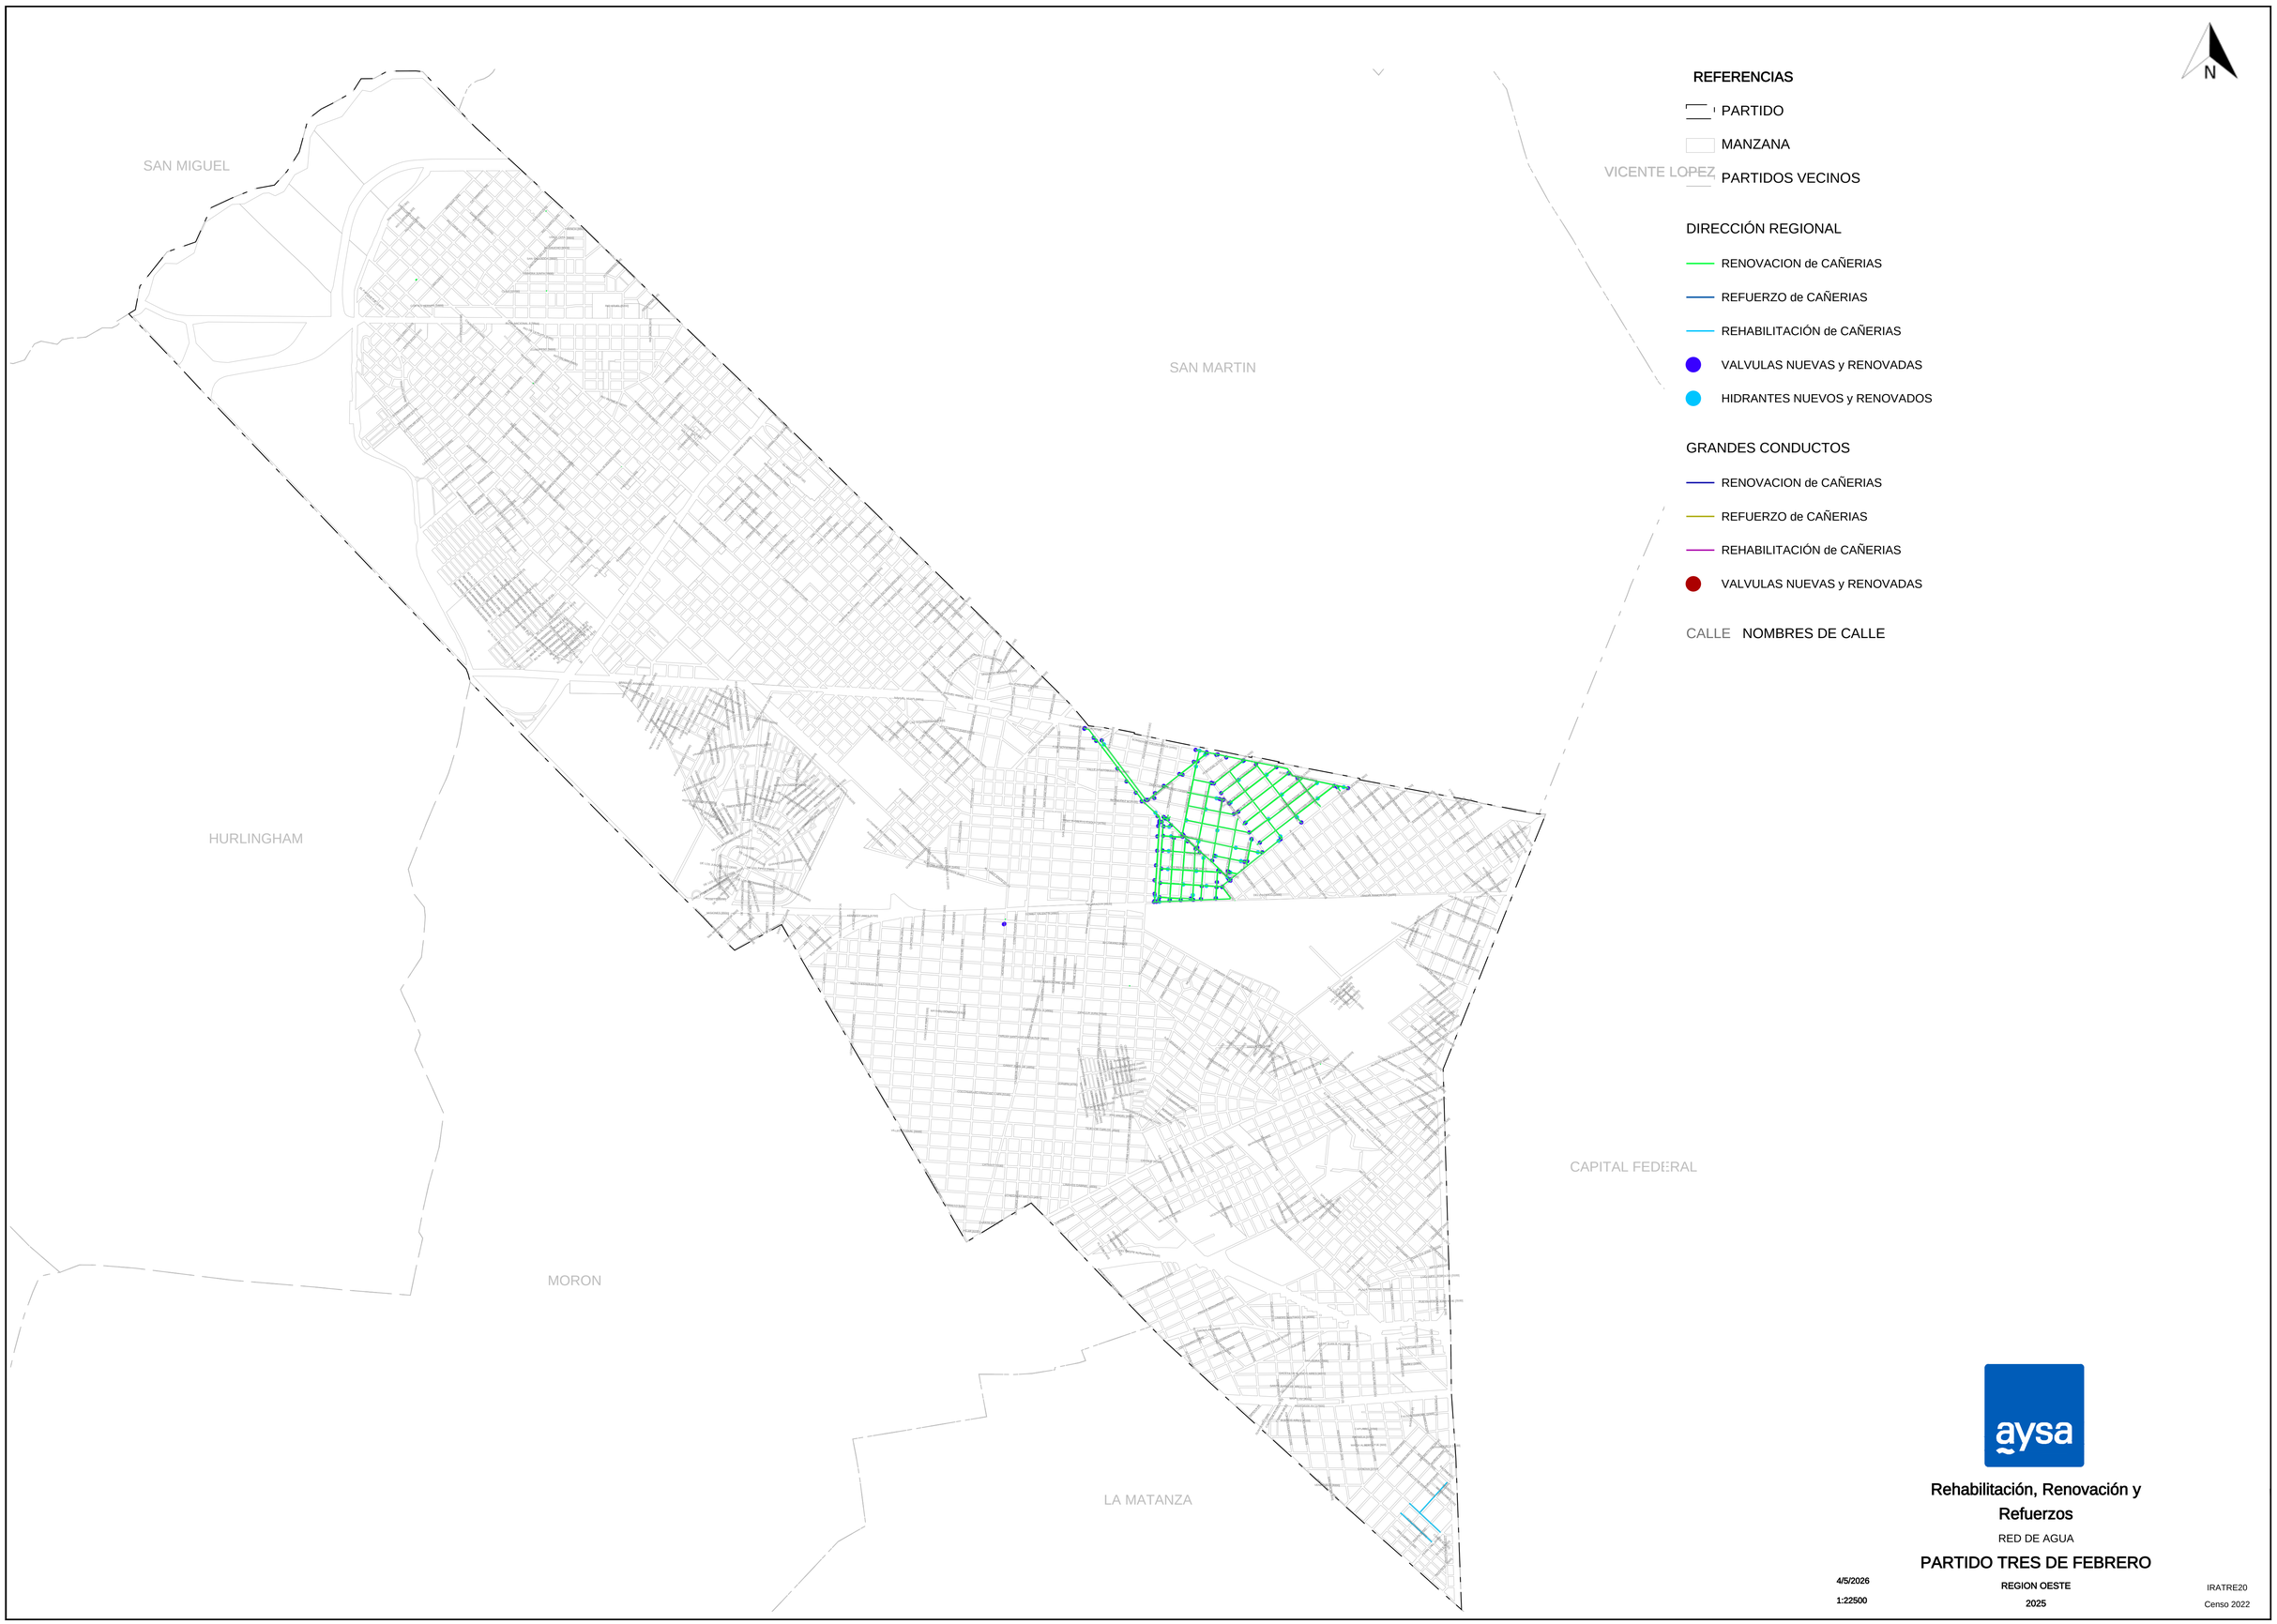
SAN MIGUEL
SAN MARTIN
VICENTE LOPEZ
HURLINGHAM
MORON
LA MATANZA
CAPITAL FEDERAL
N
REFERENCIAS
PARTIDO
MANZANA
PARTIDOS VECINOS
DIRECCIÓN REGIONAL
RENOVACION de CAÑERIAS
REFUERZO de CAÑERIAS
REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS
GRANDES CONDUCTOS
RENOVACION de CAÑERIAS
REFUERZO de CAÑERIAS
REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
CALLE NOMBRES DE CALLE
aysa
Rehabilitación, Renovación y Refuerzos
RED DE AGUA
PARTIDO TRES DE FEBRERO
4/5/2026
1:22500
REGION OESTE
2025
IRATRE20
Censo 2022

Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudeste

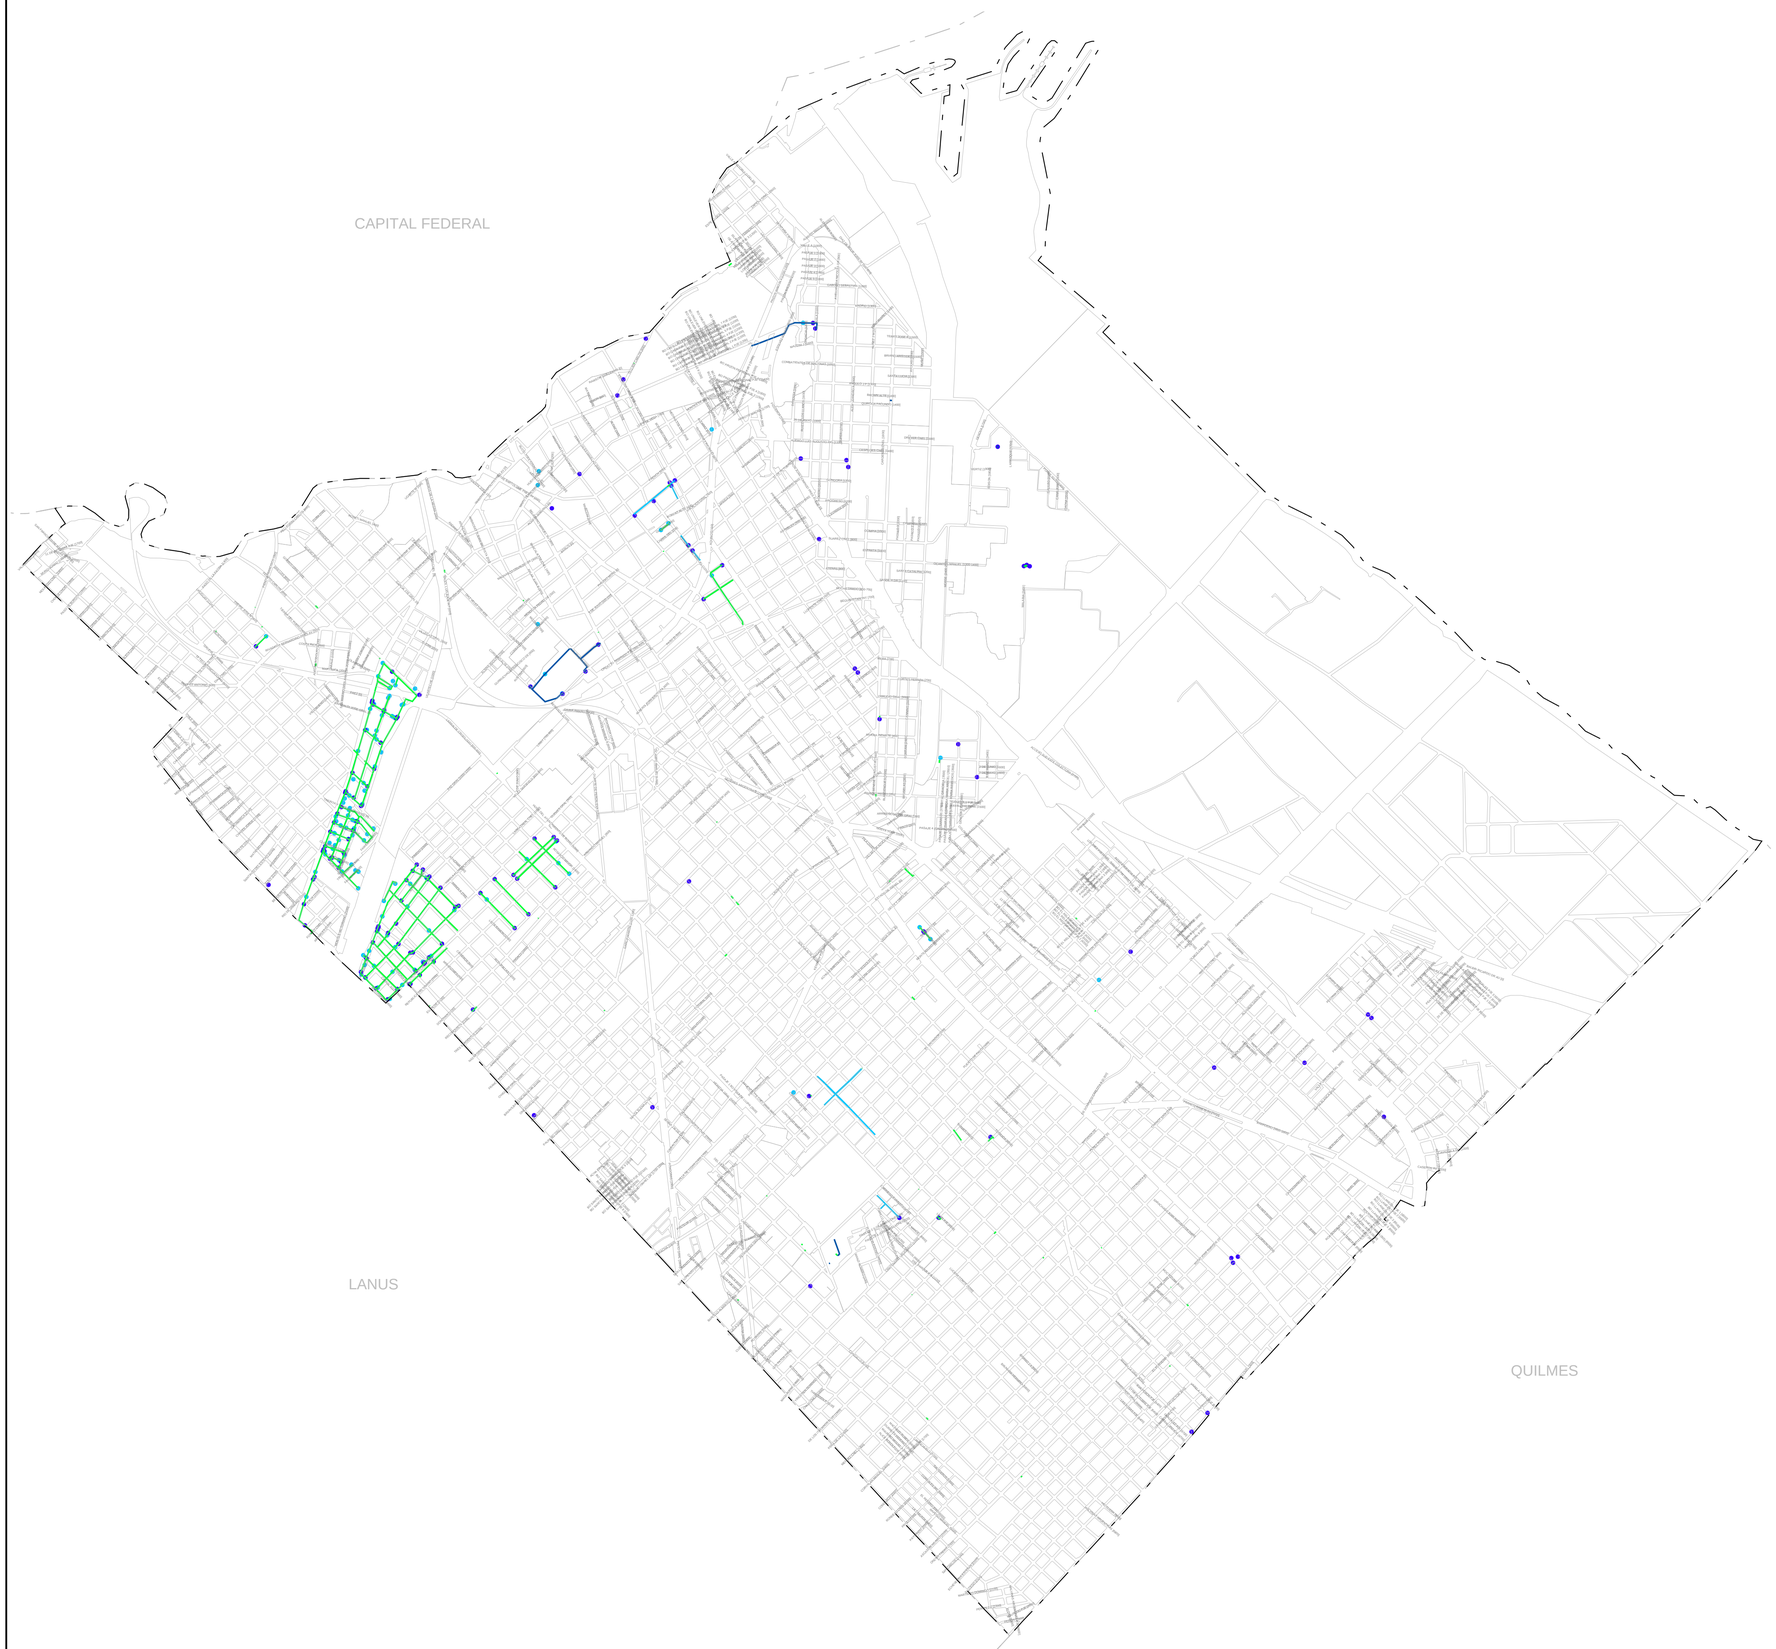

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO AVELLANEDA

REGION SUDESTE


2025

21/4/2026

1:20000

IRAAVE20

Censo 2022

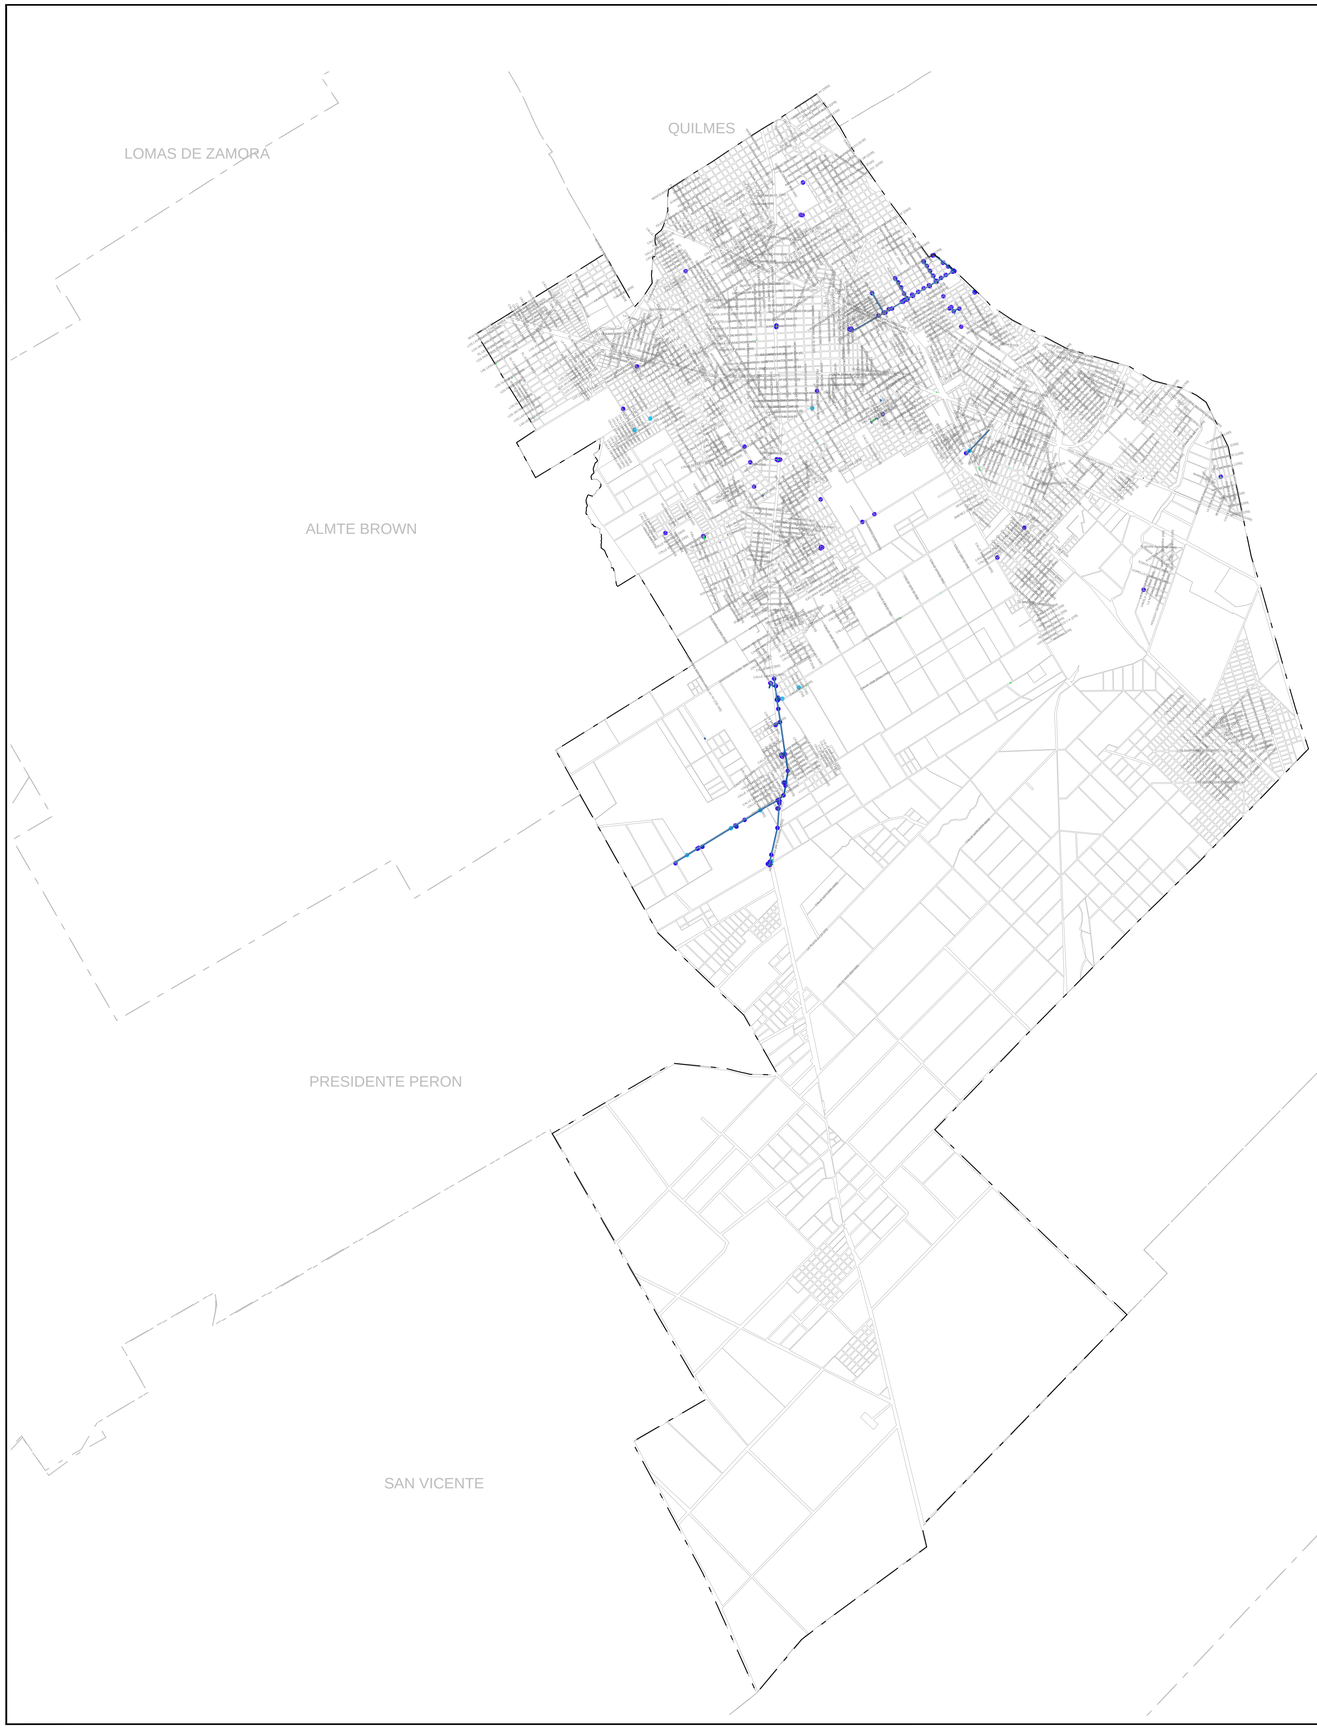

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO FLORENCIO VARELA

22/4/2026


1:50000

REGION SUDESTE

2025

IRAFVA20

Censo 2022

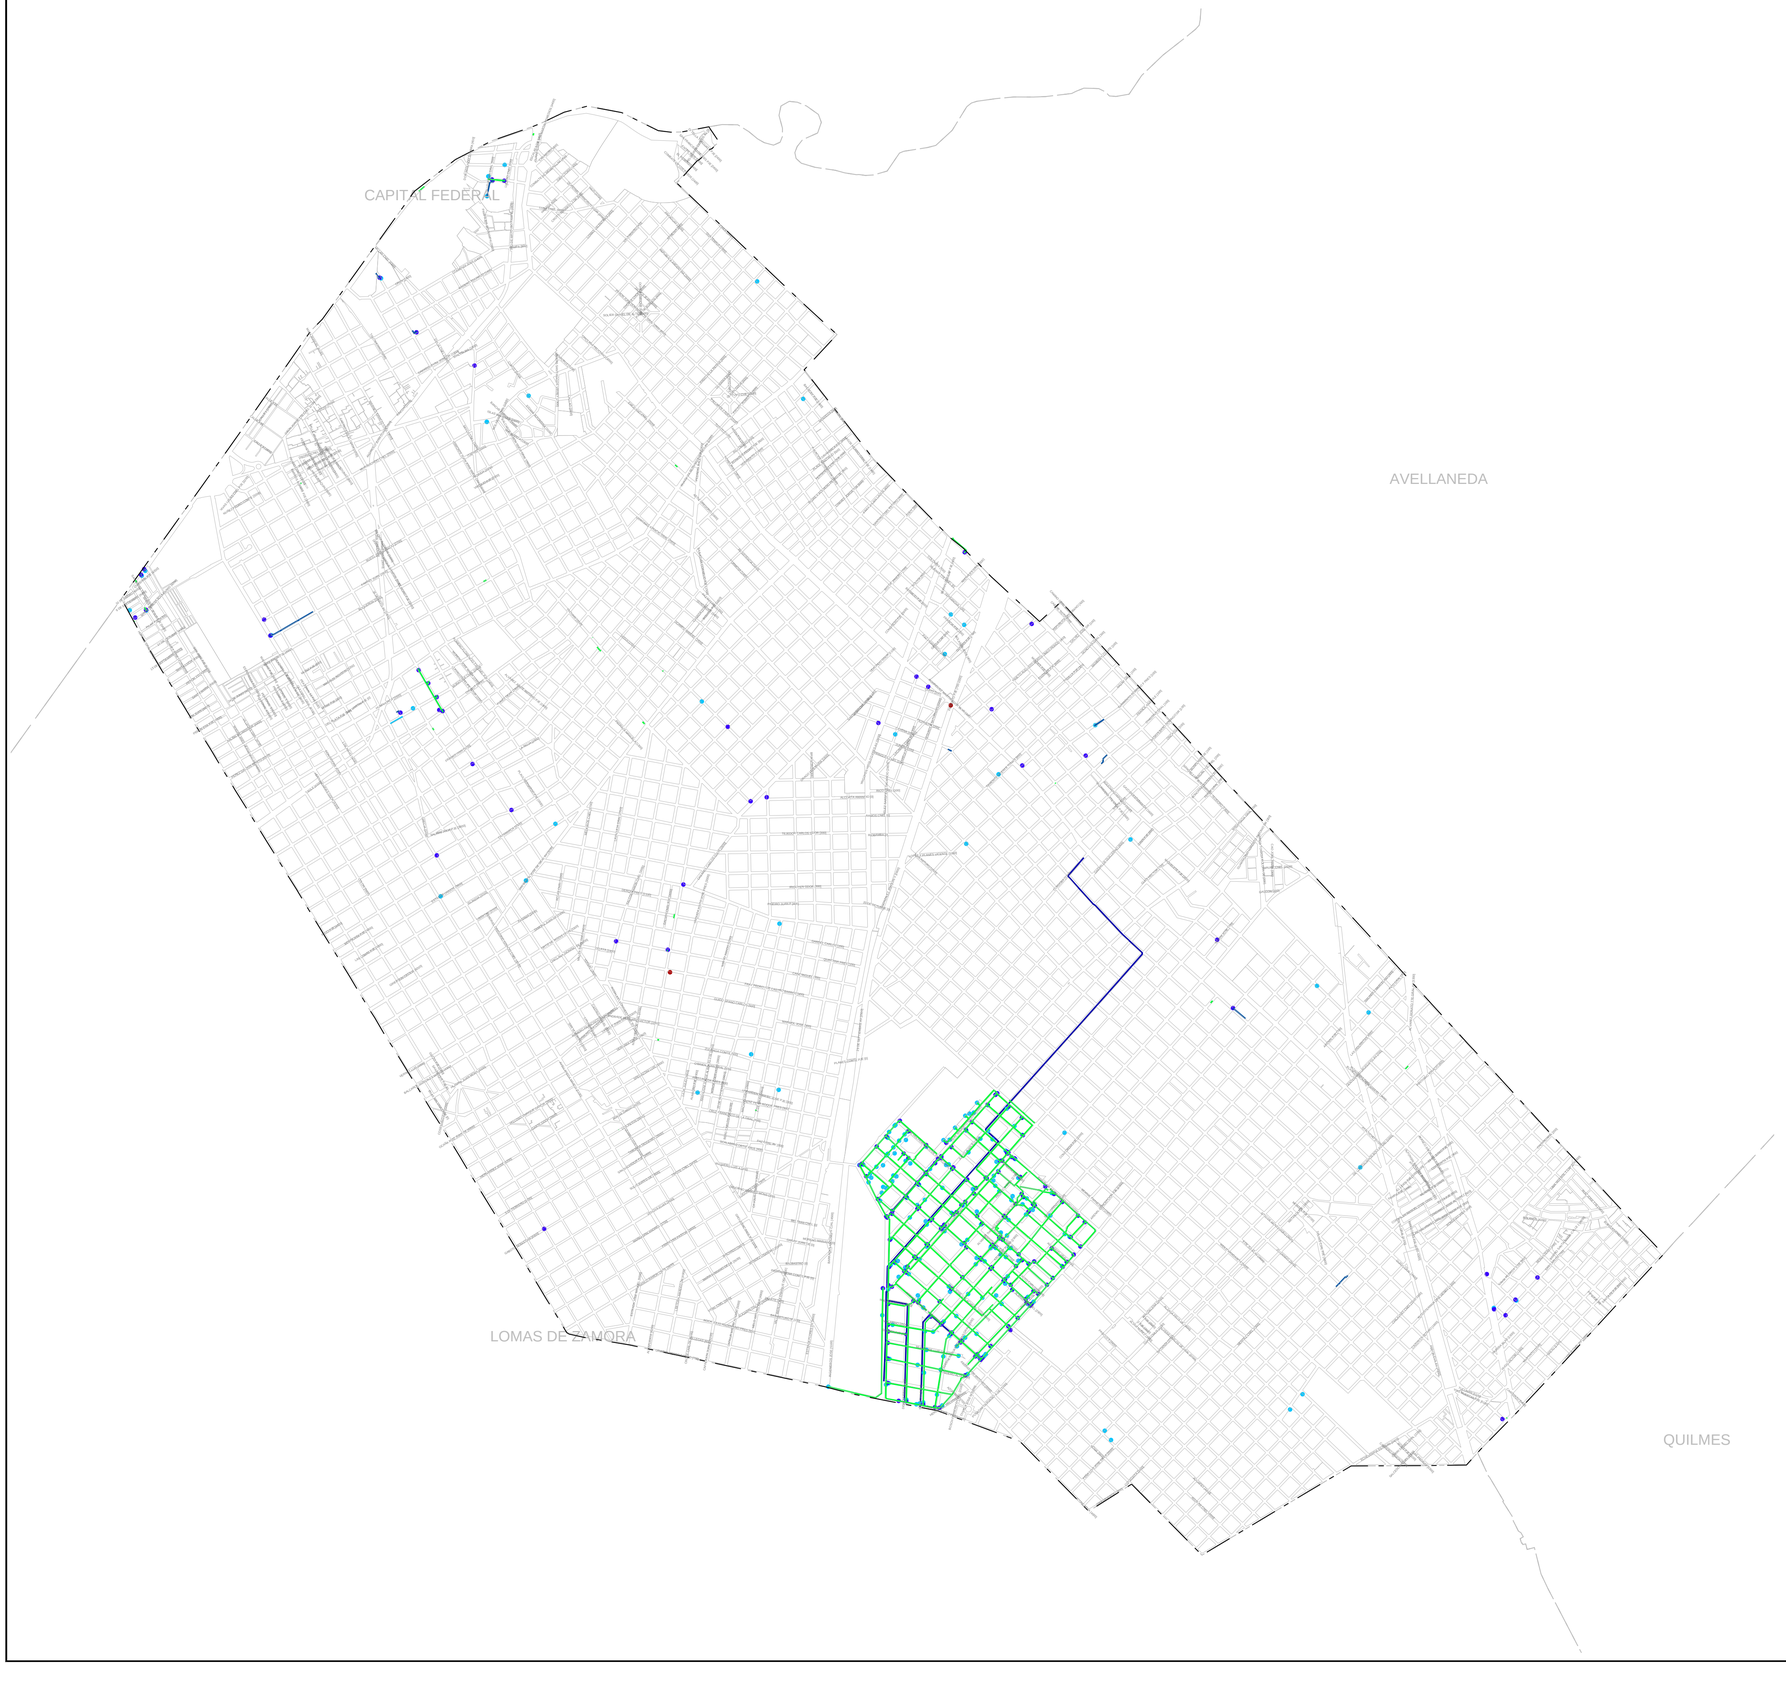

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO LANUS

21/4/2026

1:20000

REGION SUDESTE

2025

IRALAN20

Censo 2022

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

AVELLANEDA

LANUS

ALMTE BROWN

FLORENCIO VARELA

BERAZATEGUI

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO QUILMES

21/4/2026

1:25000


REGION SUDESTE

2025

IRAQLM20

Censo 2022

Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudoeste

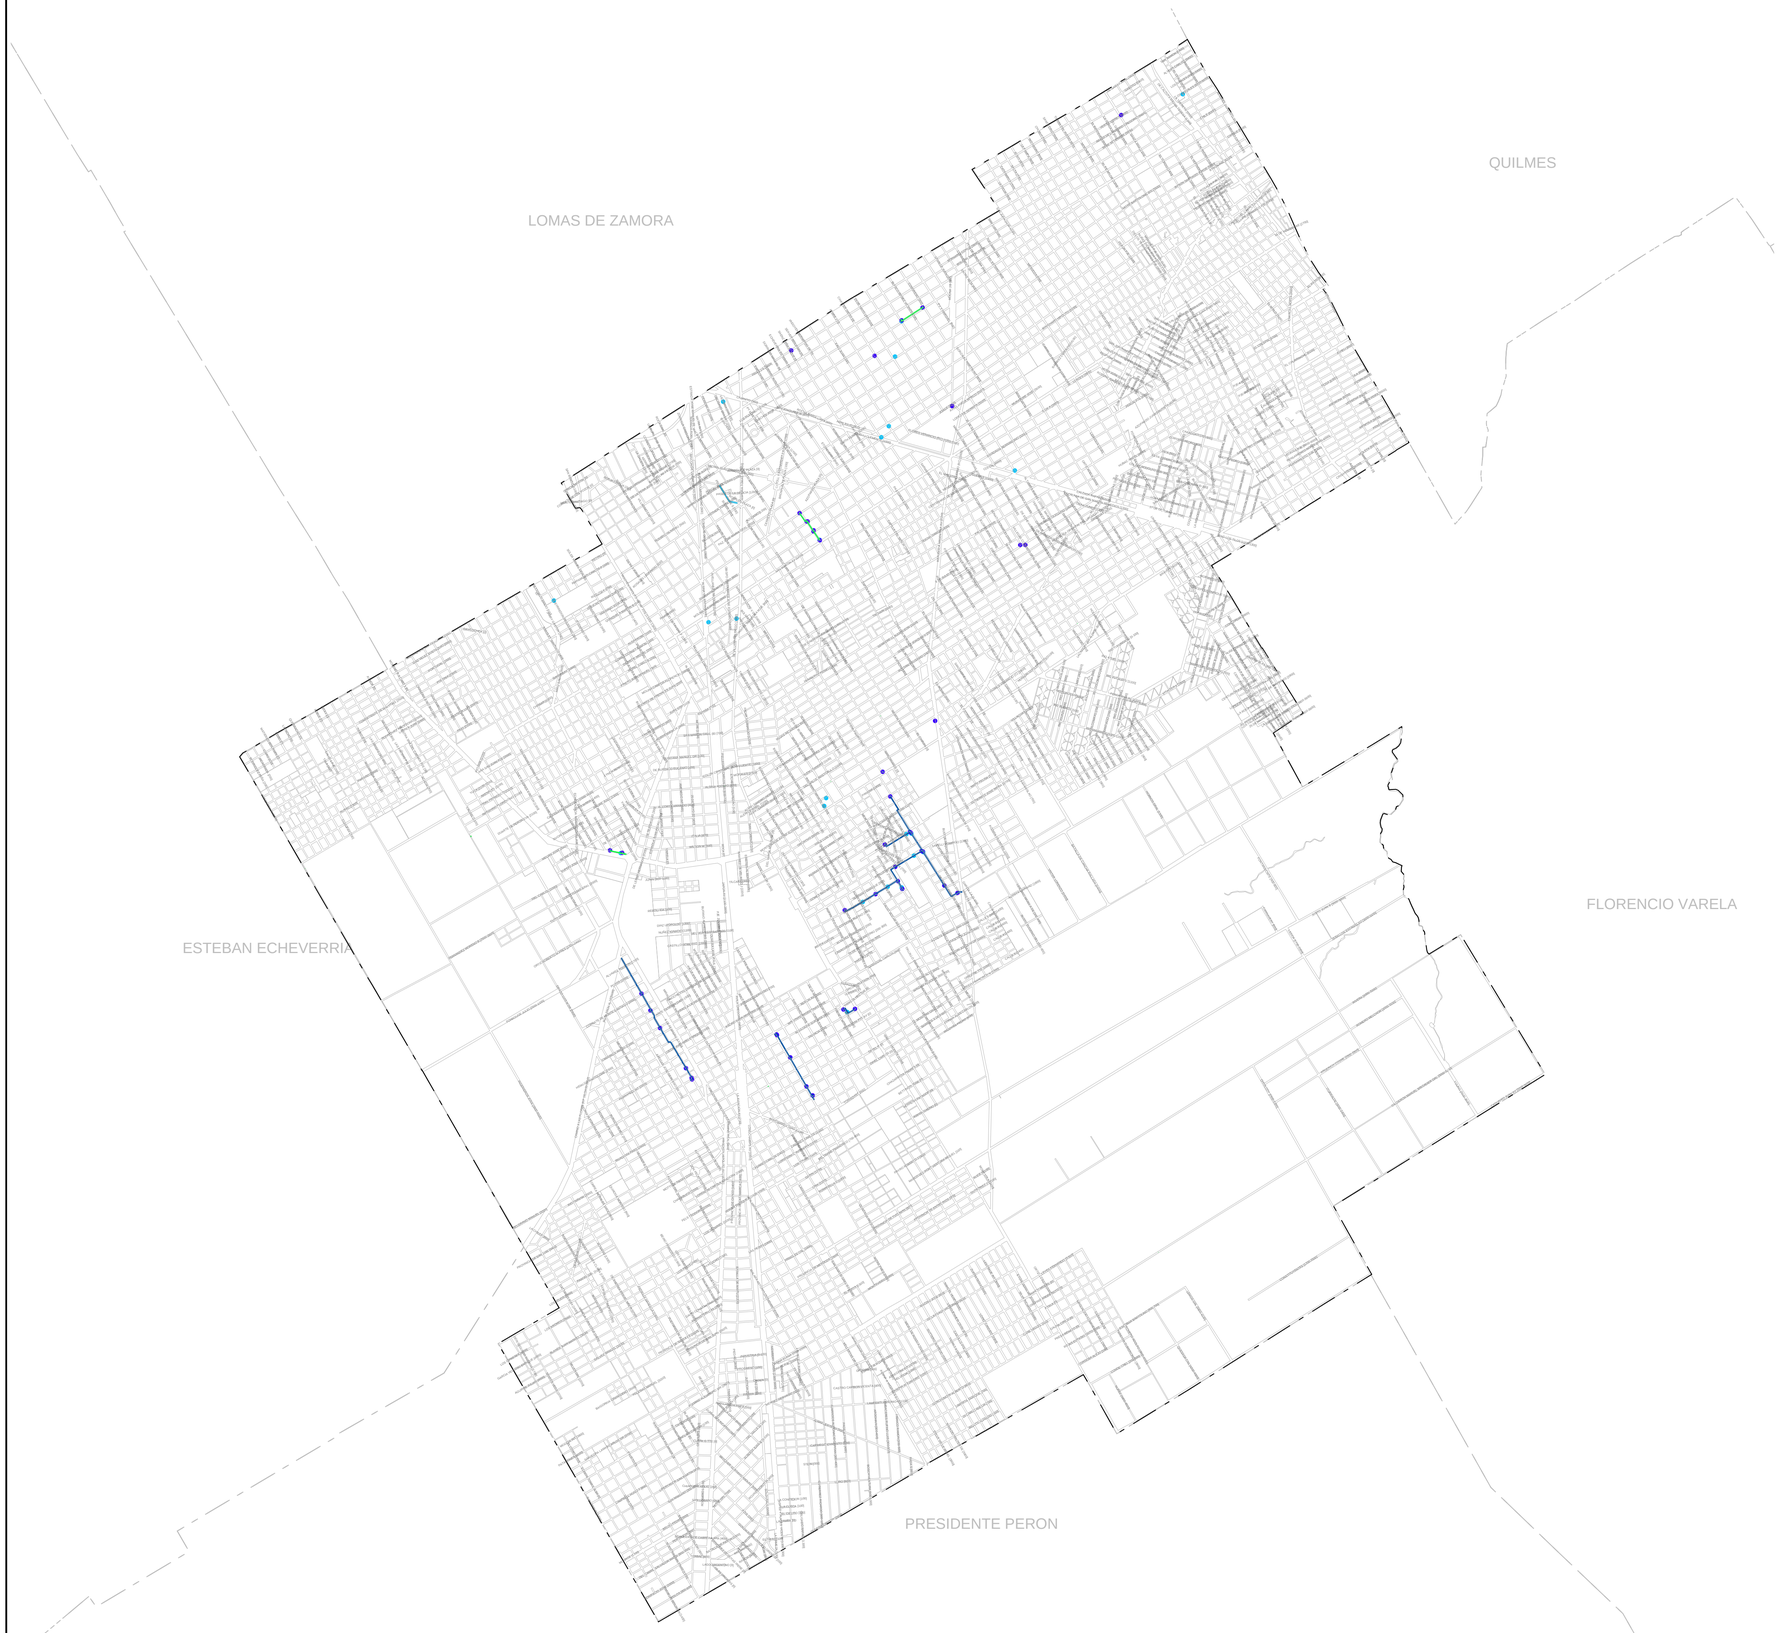

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

RENOVACION de CAÑERIAS

REFUERZO de CAÑERIAS

REHABILITACIÓN de CAÑERIAS

VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO ALMTE BROWN

11/5/2026

1:32500

REGION SUDOESTE

2025

IRAALM20

Censo 2022



N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
- HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO ESTEBAN ECHEVERRIA

11/5/2026


1:42500

REGION SUDOESTE

2025

IRAEST20

Censo 2022

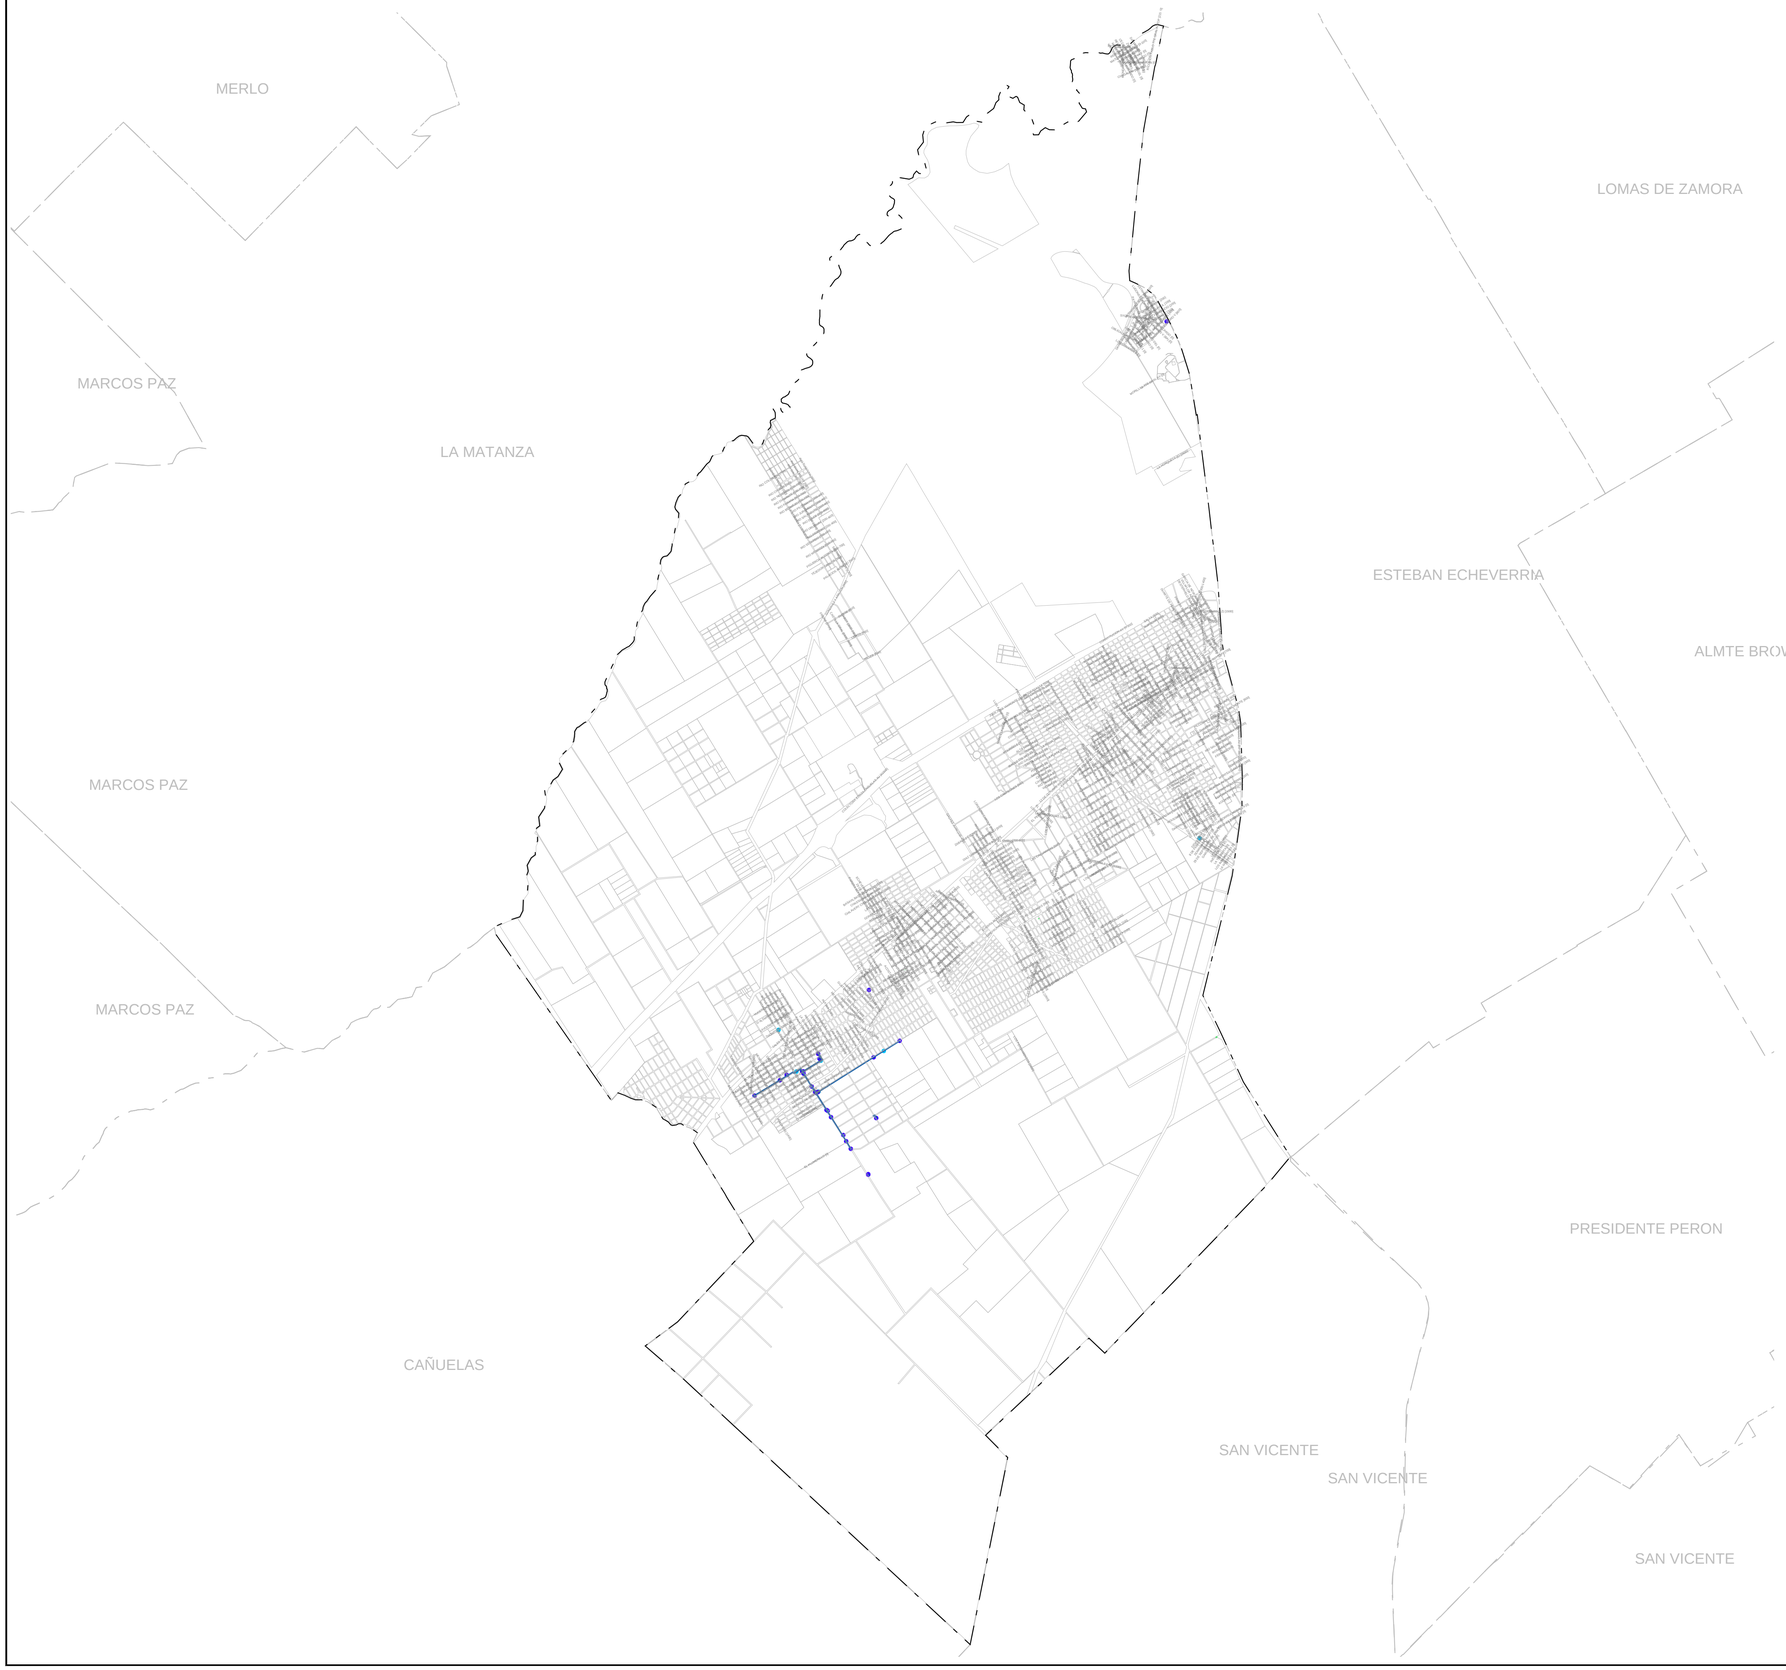

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
- HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO EZEIZA

REGION SUDOESTE


2025

11/5/2026

1:55000

IRAEZE20

Censo 2022

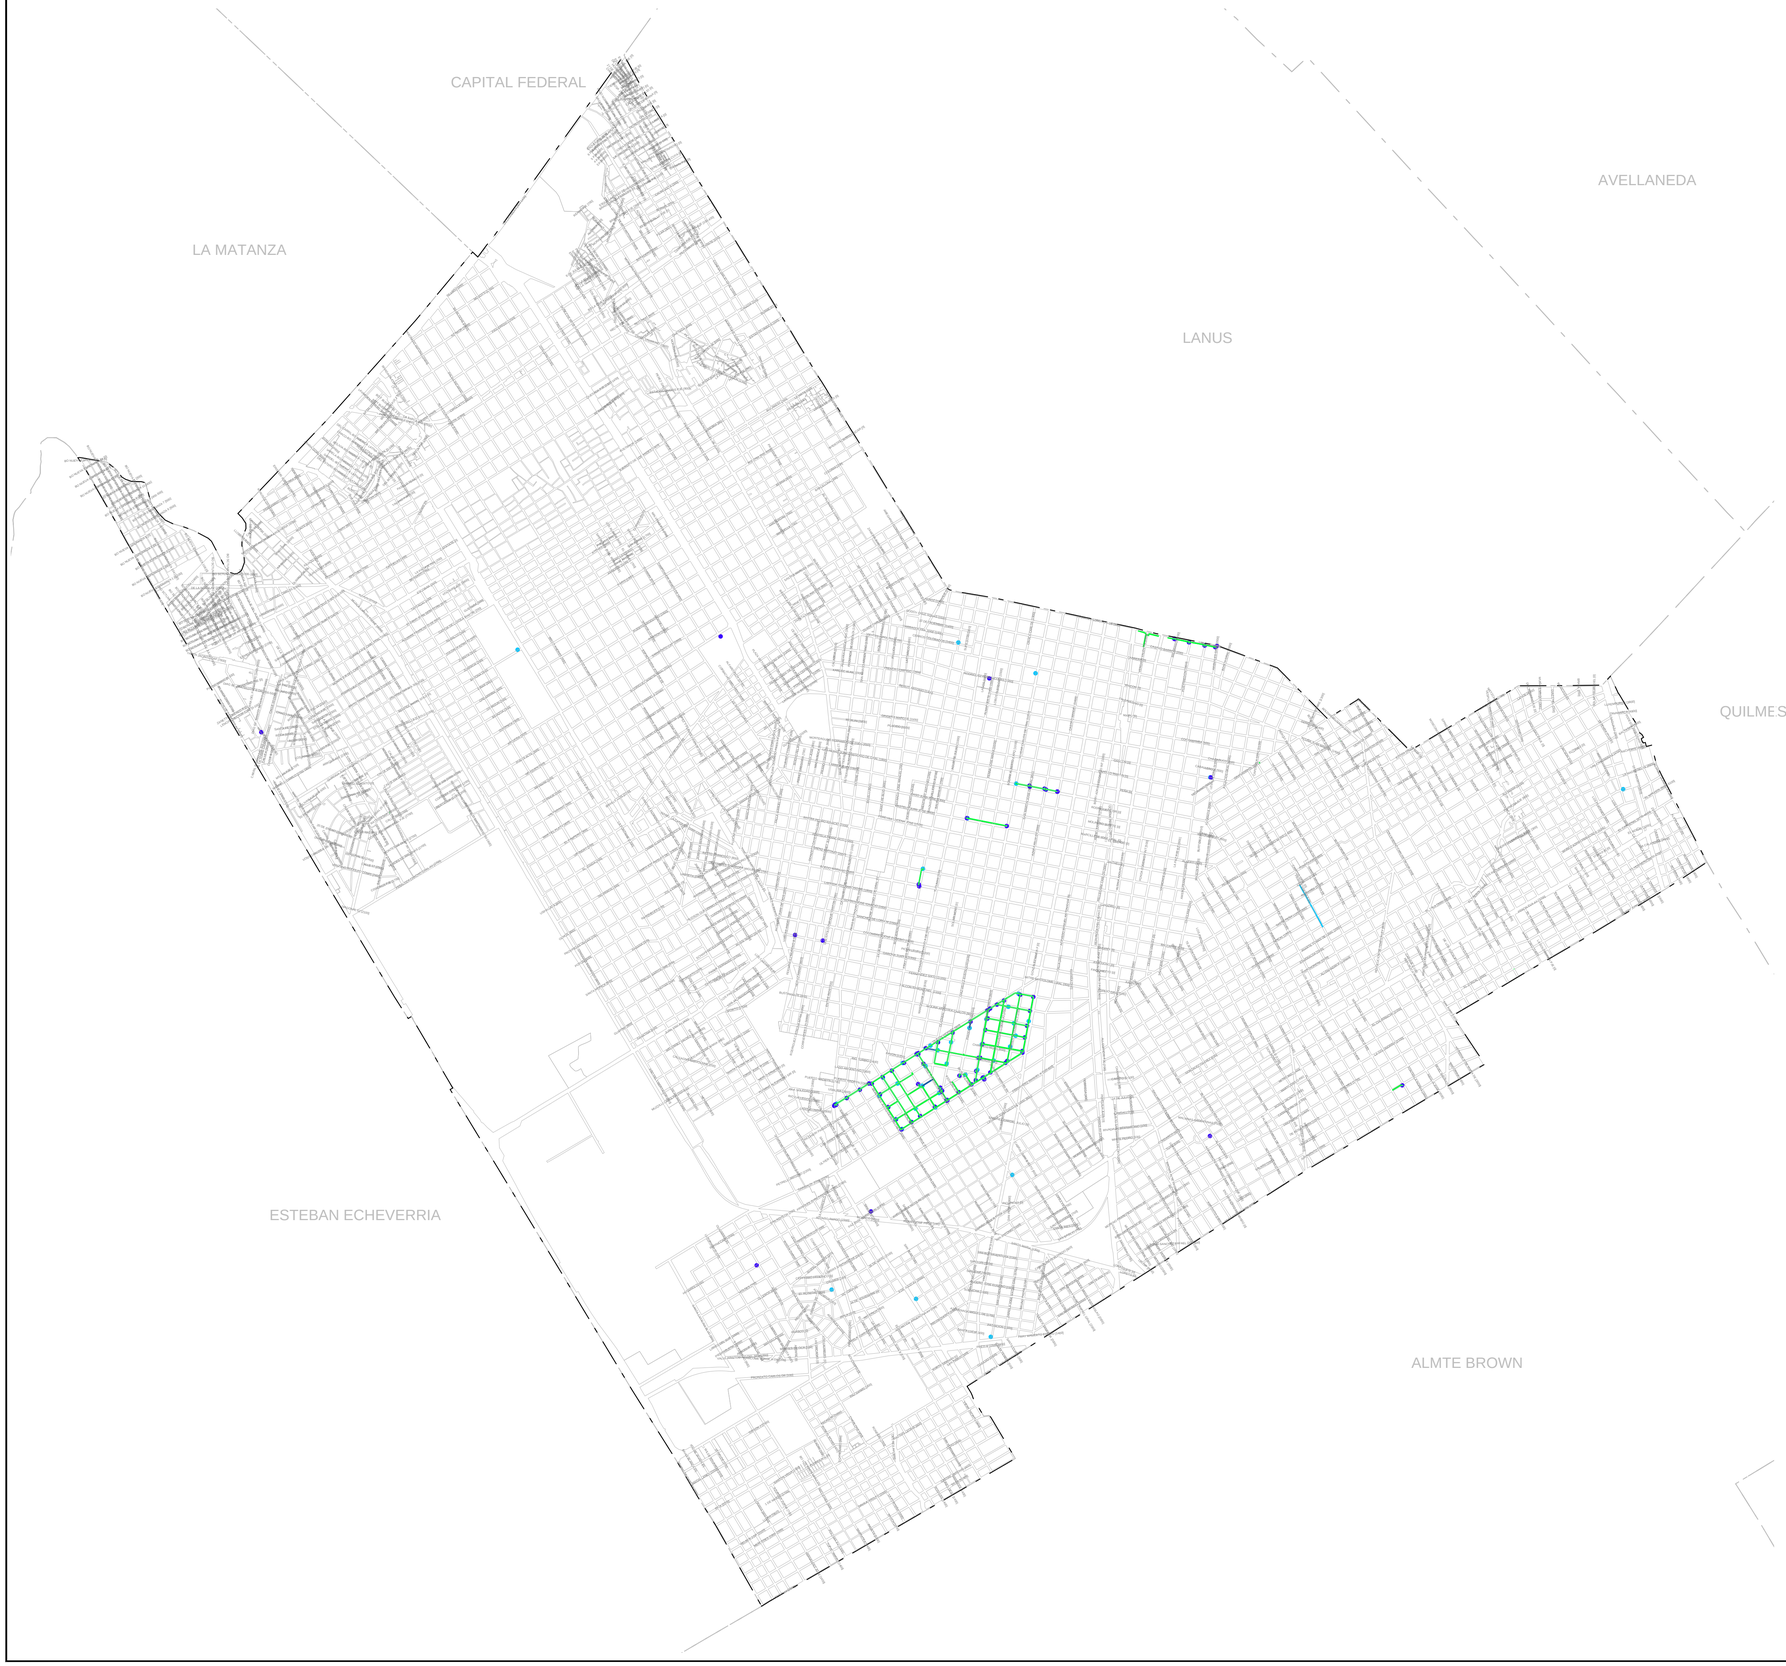

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS
- HIDRANTES NUEVOS y RENOVADOS

GRANDES CONDUCTOS

- RENOVACION de CAÑERIAS
- REFUERZO de CAÑERIAS
- REHABILITACIÓN de CAÑERIAS
- VALVULAS NUEVAS y RENOVADAS

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO LOMAS DE ZAMORA

11/5/2026


1:27500

REGION SUDOESTE

2025

IRALOM20

Censo 2022

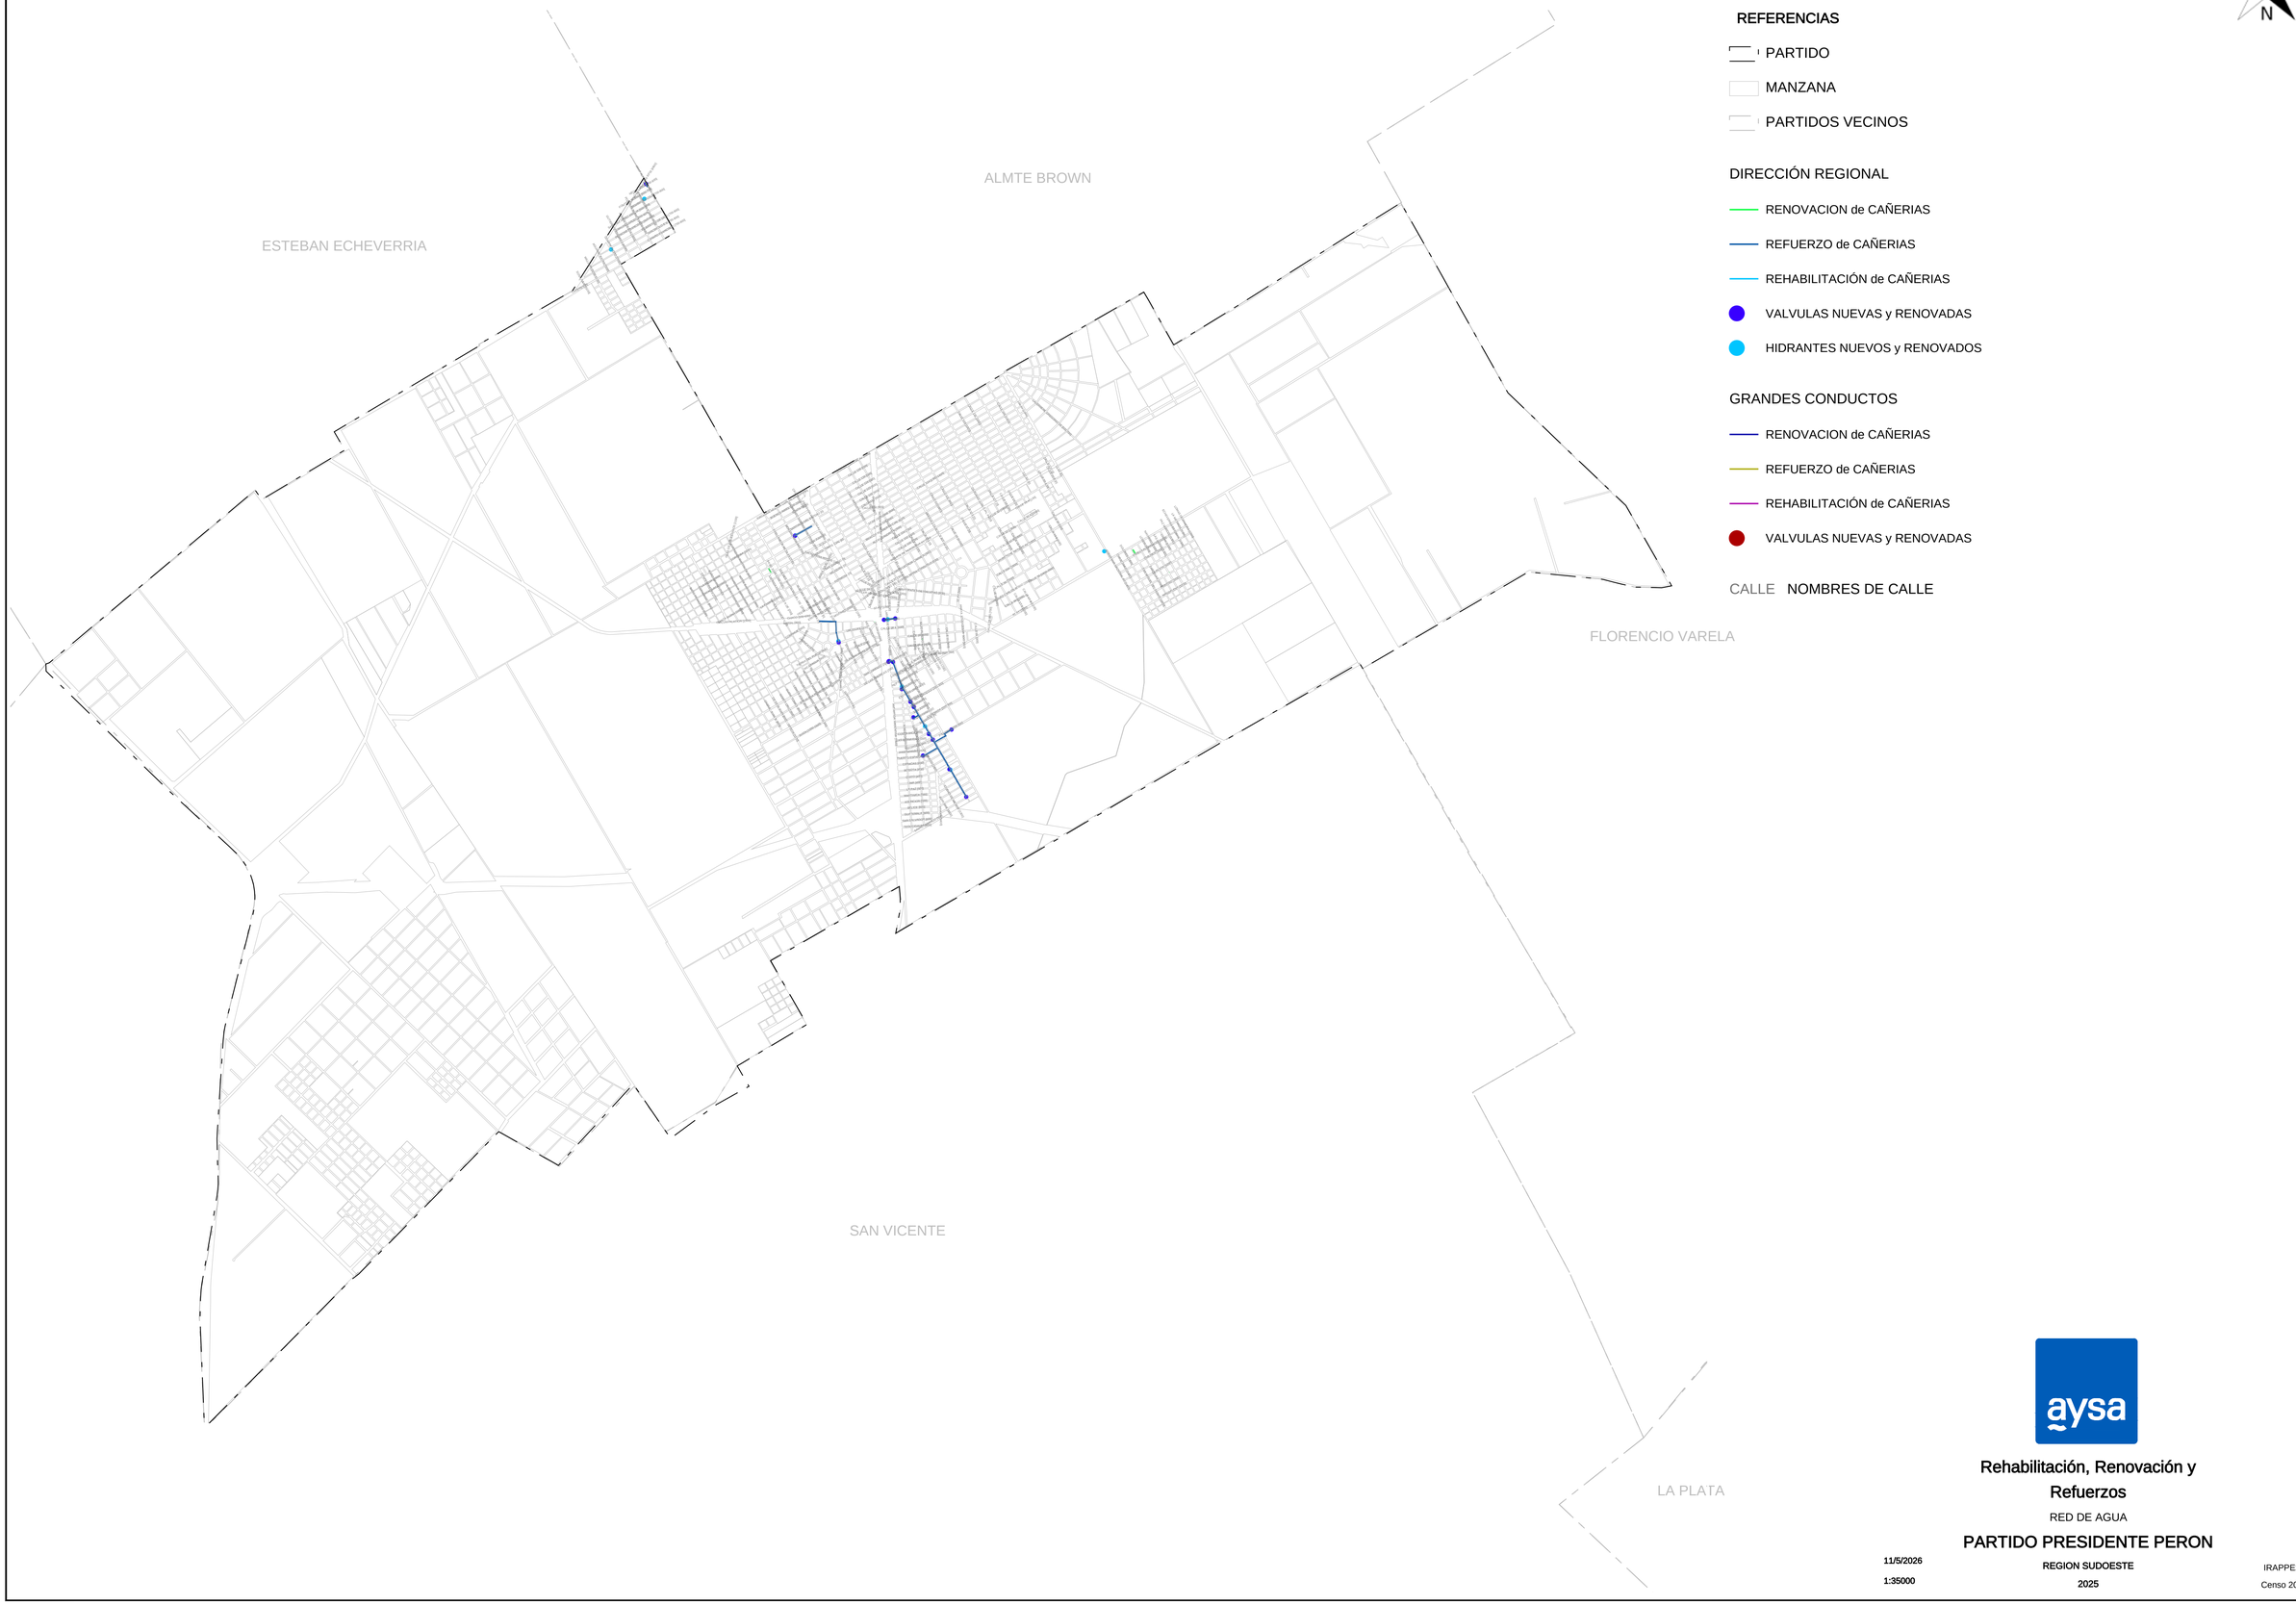

aysa

Rehabilitación, Renovación y Refuerzos

RED DE AGUA

PARTIDO PRESIDENTE PERON

11/5/2026

1:35000

REGION SUDOESTE


2025


IRAPPE20

Censo 2022





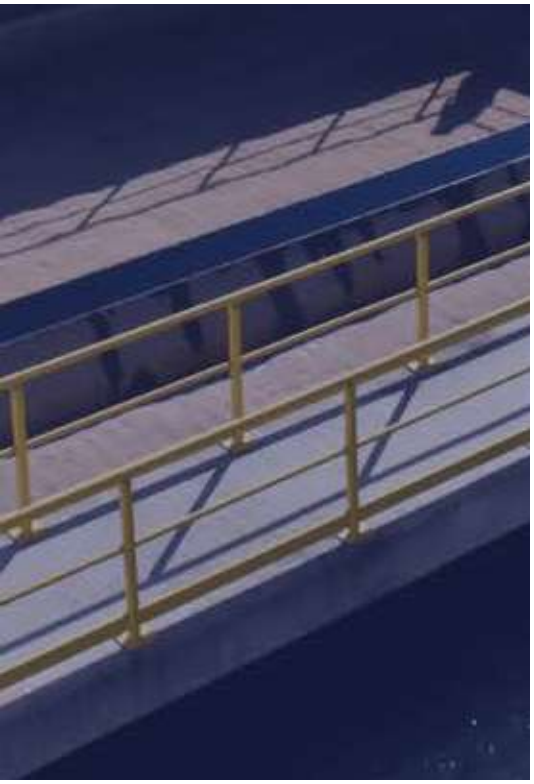

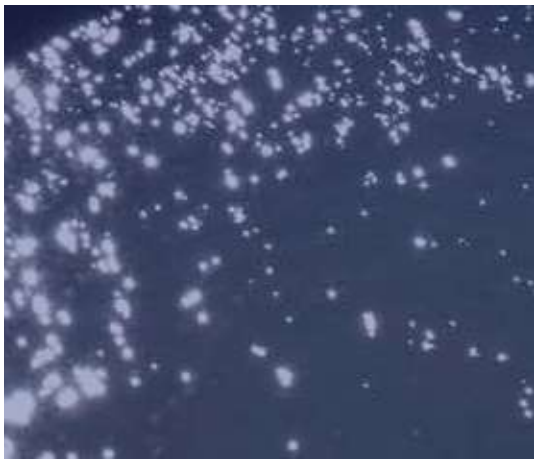INFORME ANUAL 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 5

aysa

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1

1 Obras Ejecutadas

TOMO 1.2

2 Mejora y Mantenimiento de Redes

3 Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos

4 Elementos Principales de la Red – Inventario

5 Certificación de Normas

6 Diagnósticos y Estudios

7 Estudios Ambientales

8 Gestión de Laboratorio

9 Desarrollo de la Comunidad

10 Plan de Prevención y Emergencias (PPE)

TOMO 2

11 Cobertura del Servicio de Agua Potable

12 Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable

13 Cartografía Expansión Agua Potable

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3

14 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales

15 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento

16 Instalaciones faltantes en la Red de Desagües Cloacales

17 Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

TOMO 4

18 Cartografía Agua Potable – Rehabilitación y Renovación

TOMO 5

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES (Planos Unificados)

19 - Rehabilitación Hidráulica.

20 - Rehabilitación Estructural.

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6

TOMO 6:

21 Aspectos Comerciales

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

21.2 Aspectos vinculados con la medición

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

21.4 Aspectos vinculados con la recaudación

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

21.6 Información adicional

22 Aspectos Económico-Financieros

22.1 a 22.5 Formatos vinculados a los Estados Contables de AySA (Tomo Apartado "Formatos Contables 2025").

22.6 Indicadores

22.7 Balance Económico Social

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1:

1 OBRAS EJECUTADAS

1.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.1.A	A) Obras en Plantas Potabilizadoras, Estaciones Elevadoras, Pozos de Agua, Rebombeos, y Plantas Tratamiento Agua Subterránea. Nuevas Áreas - Obras de Agua Potable.
	01.1.B	B) Ríos Subterráneos.
	01.1.C	C) Automatismo y Comunicaciones.
	01.1.D	D) Energía.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 02	01.1.01-IAT1-O-PRO-PS 01	PSS - Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 03	01.1.02-IAT1-O-PRO-PS 02	Pozos de Rebombeo de Agua Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 07	01.1.10-IAT1-O-A-PRO-PSM 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General San Martín.
PL IA N° 08	01.1.11-IAT1-O-A-PRO-PMB 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General Manuel Belgrano.
PL IA N° 09	01.1.13-IAT1-O-A-PRO-PJMR 01	Obras en el Establecimiento Juan Manuel de Rosas.
	01.1.21-IAT1-O-A-PRO-POI 01	Plantas Potabilizadoras de Osmosis Inversa (POI).
	01.1.23-IAT1-O-A-PRO-PII 02	Plantas Potabilizadoras de Intercambio Iónico (PII).
	01.1.24-IAT1-O-A-PRO-PAD 03	Plantas Potabilizadoras de Adsorción (PAD).
PL IA N° 11	01.1.30-IAT1-O-A-TRA-EE	Obras en Estaciones Elevadoras Paitoví, Centro, Caballito, Floresta, Devoto, Saavedra, Villa Adelina, Tres de Febrero, Morón, Matanza, Lanús y Quilmes.

1.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.2	Obras en Plantas Depuradoras, Estaciones de Bombeo, etc. Nuevas Areas - Obras de Saneamiento.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 19	01.2.20-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste.
	01.2.20A-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste II.
PL IA N° 20	01.2.21-IAT1-O-S-PRO-PDN 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Norte.
PL IA N° 21	01.2.22-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 01	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel.
	01.2.22A-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 02	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel II.
PL IA N° 21bis	01.2.23-IAT1-O-S-PRO-PDH 01	Obras en el Planta de Depuración Hurlingham.
PL IA N° 22	01.2.24-IAT1-O-S-PRO-PDBU 01	Obras en el Planta de Depuración Barrio Uno.
PL IA N° 22bis	01.2.25-IAT1-O-S-PRO-PDSC 01	Obras en el Planta de Depuración Santa Catalina.
	01.2.25.01-NA-IAT1-O-S-PRO-PDC 01	Obras en el Planta de Depuración Las Catonas.
	01.2.25.02-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFe 01	Obras en el Planta de Depuración Ferrari.
	01.2.25.03-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFV 01	Obras en el Planta de Depuración Florencio Varela.
	01.2.25.04-NA-IAT1-O-S-PRO-PDG 01	Obras en el Planta de Depuración Garín.
	01.2.25.05-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMN 01	Obras en el Planta de Depuración Merlo Norte.
	01.2.25.06-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMS 01	Obras en el Planta de Depuración Maquinista Savio.
	01.2.25.07-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPP 01	Obras en el Planta de Depuración Guernica (Pte. Perón).
	01.2.25.08-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPR 01	Obras en el Planta de Depuración Paso del Rey.
	01.2.25.09-NA-IAT1-O-S-PRO-PDBV 01	Obras en el Planta de Depuración Bella Vista.
	01.2.25.10-NA-IAT1-O-S-PRO-PDCH 01	Obras en el Planta de Depuración Champagnat
	01.2.25.11-NA-IAT1-O-S-PRO-PDESC 01	Obras en el Planta de Depuración Escobar
PL IA N° 14	01.2.26-IAT1-O-S-TRA-EB 01	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Wilde.
PL IA N° 15	01.2.27-IAT1-O-S-TRA-EB 02	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Boca-Barracas.
	01.2.28-IAT1-O-S-TRA-EB 03	Obras en Estaciones de Bombeo Centro, Norte y Sur.
	01.2.29-IAT1-O-S-TRA-EB 00	Obras en Planta Berazategui.
PL IA N° 13	01.2.30-IAT1-O-S-TRA-PLC 01	Obras en Grandes Conducciones Pluviocloacales.

1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 23	01.3.31-IAT1-O-X CONTRATO	Obras ejecutadas por vía contractual.
	01.3.33-IAT1-O-A (A+T)	Listado de Obras por convenio (A+T).
	01.3.34-IAT1-O-S (C+T)	Listado de Obras por convenio (C+T).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.2:

2 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 25	35-IAT1-O-A-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes de agua.
PL IA N° 26	36-IAT1-O-A-MyM 02	Redes de agua. Elementos de maniobra intervenidos.
PL IA N° 27	37-IAT1-O-A-MyM 03	Medidores colocados y/o intervenidos.
PL IA N° 28	38-IAT1-O-A-MyM 04	Conexiones domiciliarias de agua potable.
PL IA N° 29	39-IAT1-O-S-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes cloacales.
PL IA N° 30	40-IAT1-O-S-MyM 02	Conexiones domiciliarias de cloacas.

3 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos.
	03.2-IAT1-O-X-MyM-T 01	Mantenimiento de Grandes Equipos y Electrobombas.

4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED - INVENTARIO

4.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 31 A	42-IAT1-I-A-RED 01	Redes de Agua - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 31 B	43-IAT1-I-A-RED 02	Redes de Agua - Porcentaje por Material de cañería instalada.
	44-IAT1-I-A-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Agua.

4.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 32 A	45-IAT1-I-S-RED 01	Redes de Cloacas - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 32 B	46-IAT1-I-S-RED 02	Redes de Cloacas - Porcentajes por Material de cañería instalada.
	47-IAT1-I-S-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Desagües Cloacales.

5. CERTIFICACIÓN DE NORMAS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Laboratorios Central y de Plantas. Certificación ISO, IRAM, etc.

6 DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Diagnósticos y Estudios.

7 ESTUDIOS AMBIENTALES

Código Anterior	Código Actual	Título
		7.1 Estudios Ambientales.
		7.2 Control del Recurso.

8 GESTION DE LABORATORIO

Código Anterior	Código Actual	Título
		Gestión de Laboratorio.

9 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Código Anterior	Código Actual	Título
		Texto descriptivo de las tareas de AySA para el Desarrollo de la Comunidad.
		9.1 Anexos
		9.2 Planos

10 PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE)

Código Anterior	Código Actual	Título
		PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 2:

11. Cobertura del servicio de Agua Potable

11.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

11.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 33	48-IAT2-C-A-TRA 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Area Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A	49-IAT2-C-A-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A (Nuevas Áreas)	49-IAT2-C-A-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 34B	50-IAT2-C-A-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio de Agua Potable.
ex PL IA N° 35	51-IAT2-C-A-TRA 04	Expansión de redes de distribución de agua potable. Obras habilitadas en el año (por Partido).

12. Instalaciones Faltantes en la Red de Agua Potable

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 36	52-IAT2-C-A-RED 01	Red de Agua. Cierre de mallas faltantes (por Región y Partido).

13. Cartografía Expansión Agua

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IEADRC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IEASFE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Fernando.
	IEASIS-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Isidro.
	IEASMA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Martín.
	IEATIG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tigre.
	IEAVIC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Vicente López.
	IEAESC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Escobar.
	IEAJCP-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - José C. Paz.
	IEAMAR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Malvinas Argentinas.
	IEASMG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Miguel.
	IEAPIL-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IEAMAT-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - La Matanza.
	IEAHUR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Hurlingham.
	IEAITU-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ituzaingó.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Morón.
	IEATRE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tres de Febrero.
	IEAMER-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Merlo.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IEAALM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Almirante Brown.
	IEAEST-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Esteban Echeverría.
	IEAEZE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ezeiza.
	IEALOM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lomas de Zamora.
	IEAPPE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IEAAVE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Avellaneda.
	IEALAN-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lanús.
	IEAQLM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Quilmes.
	IEAFVA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3:

14. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales

14.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

14.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 38A	54-IAT3-C-S-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas.
	54-IAT3-C-S-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 38B	55-IAT3-C-S-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población beneficiada con obras o con servicio en trámite de habilitación.
ex PL IA N° 39	56-IAT3-C-S-TRA 04	Expansión de redes colectoras de desagües cloacales. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

15. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales según Sistema de Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 40	57-IAT3-C-S-PRO 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Area servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 41	58-IAT3-C-S-PRO 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario.
	61-IAT3-C-S-PRO 04	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 42	59-IAT3-C-S-PRO 03	Expansión de redes colectoras de Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

16. Instalaciones Faltantes en la Red de Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 43	60-IAT3-C-S-RED 01	Red de Cloacas. Colectoras faltantes (por Región y Partido).

17. Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IETDRC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IETSFE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Fernando.
	IETSIS-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Isidro.
	IETSMA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Martín.
	IETTIG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tigre.
	IETVIC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Vicente López.
	IETESC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Escobar.
	IETJCP-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - José C. Paz.
	IETMAR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Malvinas Argentinas.
	IEATMG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Miguel.
	IEATPIL-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IETMAT-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - La Matanza.
	IETCHUR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Hurlingham.
	IETITU-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ituzaingo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Morón.
	IETTRE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tres de Febrero.
	IETMER-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Merlo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IETALM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Almirante Brown.
	IETEST-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Esteban Echeverría.
	IETEZE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ezeiza.
	IETLOM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lomas de Zamora.
	IETPPE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IETAVE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Avellaneda.
	IETLAN-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lanús.
	IETQLM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Quilmes.
	IETFVA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 4:

18. CARTOGRAFÍA AGUA POTABLE (Planos de Rehabilitación y Renovación de Redes)

18.1 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRADRCF-2025	* Región Capital Federal.

18.2 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRASFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRASIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRASMA-2025	* Partido San Martín.
	IRATIG-2025	* Partido Tigre.
	IRAVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRAESC-2025	* Partido Escobar.
	IRAJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRAMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRASMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRAPIL-2025	* Partido Pilar.

18.3 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRAITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRAMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRAMOR-2025	* Partido Morón.
	IRATRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRAMER-2025	* Partido Merlo.
	IRAMOR-2025	* Partido Moreno.

18.4 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRAEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRAEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRALOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRAPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

18.5 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRALAN-2025	* Partido Lanús.
	IRAQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRAFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 5:

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES UNIFICADA (Rehabilitación Hidráulica y Estructural):

19. Rehabilitación Hidráulica.
20. Rehabilitación Estructural.

19/20.1 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCDRCF-2025	* Región Capital Federal.

19/20.2 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCSFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRCSIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRCSMA-2025	* Partido San Martín.
	IRCTIG-2025	* Partido Tigre.
	IRCVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRCESC-2025	* Partido Escobar.
	IRCJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRCMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRCSMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRCPIL-2025	* Partido Pilar.

19/20.3 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRCITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRCMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRCMOR-2025	* Partido Morón.
	IRCTRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRCMER-2025	* Partido Merlo.
	IRCMOR-2025	* Partido Moreno.

19/20.4 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRCEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRCEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRCLOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRCPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

19/20.5 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRCLAN-2025	* Partido Lanús.
	IRCQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRCFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6:

21 ASPECTOS COMERCIALES

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

Código Anterior	Código Actual	Título
300		Ingresos Año 2025.
301		Anexo de Ventas Año 2025 (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
302		Evolución de los Ingresos.
303		Emisión General y art. 34 Año 2025 - Grupos bimetrales - Ciclos completos de facturación.
304		Facturación a Consorcios del último ciclo completo de facturación. Todas las frecuencias.
305		Facturación Emisión Genereal. Ultimo ciclo completo de facturación bimestral.
307		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Capital Federal.
308		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Gran Buenos Aires.
309		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Capital Federal.
310		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Gran Buenos Aires.
311		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Capital Federal.
312		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Gran Buenos Aires.
313		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 08 - Capital Federal.
314		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - Residencial.
315		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - Residencial.
316		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - Residencial.
317		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - No Residencial.
318		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - No Residencial.
319		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - No Residencial.
320		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral - Factura Media.

21.2 Aspectos vinculados con la medición

Código Anterior	Código Actual	Título
330		Medidores cambiados e instalados en el Año 2025.
331		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 01 (Agua). Consumo del último año - Bimestralizado.
332		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 05 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
333		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
334		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 01 (Agua). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
335		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 05 (Agua y cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
336		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de Servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
337		Pérdida de Cuota Fija por mes, en cantidades de instalaciones y en Tarifa Básica Bimestral (TBB).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
306		Detalle de Unidades Funcionales.
350		Evolución del número de usuarios. Unidades funcionales.

21.4 Aspectos vinculados a la recaudación

Código Anterior	Código Actual	Título
360		Total Recaudado.
361		Ritmo de recaudación .
362		Evolución de la Recaudación y Evolución de la Recaudación por Categoría de Usuarios.

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
321		Cuentas a cobrar vencidas y a vencer al 31/12/2025 por Región, tipo de cliente, régimen y categoría de cliente.
322		Conciliación de créditos por servicios (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
370		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (por antigüedad).
371		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (con vencimientos operados por Año Contractual).
372		Impago vencido por rango de deuda al 31/12/25. Emisión por todo concepto, desagregado por Región y Grandes Usuarios.
373		Cuentas a cobrar a vencer y vencidas al 31/12/25, por Distrito y antigüedad de la deuda. Gráfico.
374		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25 por distrito, por situación comprobante y antigüedad de la deuda.
376		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25, correspondientes a ciertos Clientes fiscales. Detalle de las cuentas a cobrar originales más recargos extracontables teóricos estimados.
379		Deuda Vencida al 31/12/2025 más recargos extracontables teóricos estimados.

21.6 Información Adicional

Código Anterior	Código Actual	Título
323		Consumos de la previsión para deudores de dudoso cobro y ajustes de facturación del año 2025.
324		Cargo por corte de servicio - Intervenciones realizadas e imporetes de facturación devengados durante el año 2025.
375		Convenios de pagos.
377		Cargo por titularidad no informada año 2025.
380		Estimación de otras quitas y condonaciones de deuda extracontables otorgadas durante el Año 2025.
381		Recargos e intereses por demora de pago devengados durante el año 2025.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

22 ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS - TARIFA SOCIAL

22.1 a 22.5

Presentado en Tomo separado denominado "FORMATOS CONTABLES 2025".

22.6 Indicadores

Código Anterior	Código Actual	Título
850-851		Indicadores.
852		Benchmarking.

22.7 Balance económico social


Código Anterior	Código Actual	Título
900		Programa de tarifa social - Total.
901		Programa de tarifa social - Usuarios Residenciales.
902		Programa de tarifa social - Casos Sociales.
903		Programa de tarifa social - Instituciones sin fines de lucro.
904		Programa de tarifa social - Detalle de Usuarios Residenciales.
905		Programa de tarifa social - Detalle de Casos Sociales.
906		Programa de tarifa social - Detalle de Instituciones sin fines de lucro.
910		Plan Agua más Trabajo.
920		Programa de Barrios Carenciados - Modelo Participativo de Gestión (MPG).
930		Resumen de Expansión de Agua por Plan.
940		Resumen de Expansión de Desagües Cloacales por Plan.
950		Balance Económico Social.
970		Total de Usuarios con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
971		Total de Usuarios RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
972		Total de Usuarios NO RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
973		Total de Usuarios BALDÍOS con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.

CARTOGRAFIA UNIFICADA DE DESAGÜES CLOACALES


19. Rehabilitación Hidráulica

20. Rehabilitación Estructural

Rehabilitación Hidráulica y Estructural de redes de Desagües Cloacales Región Capital Federal

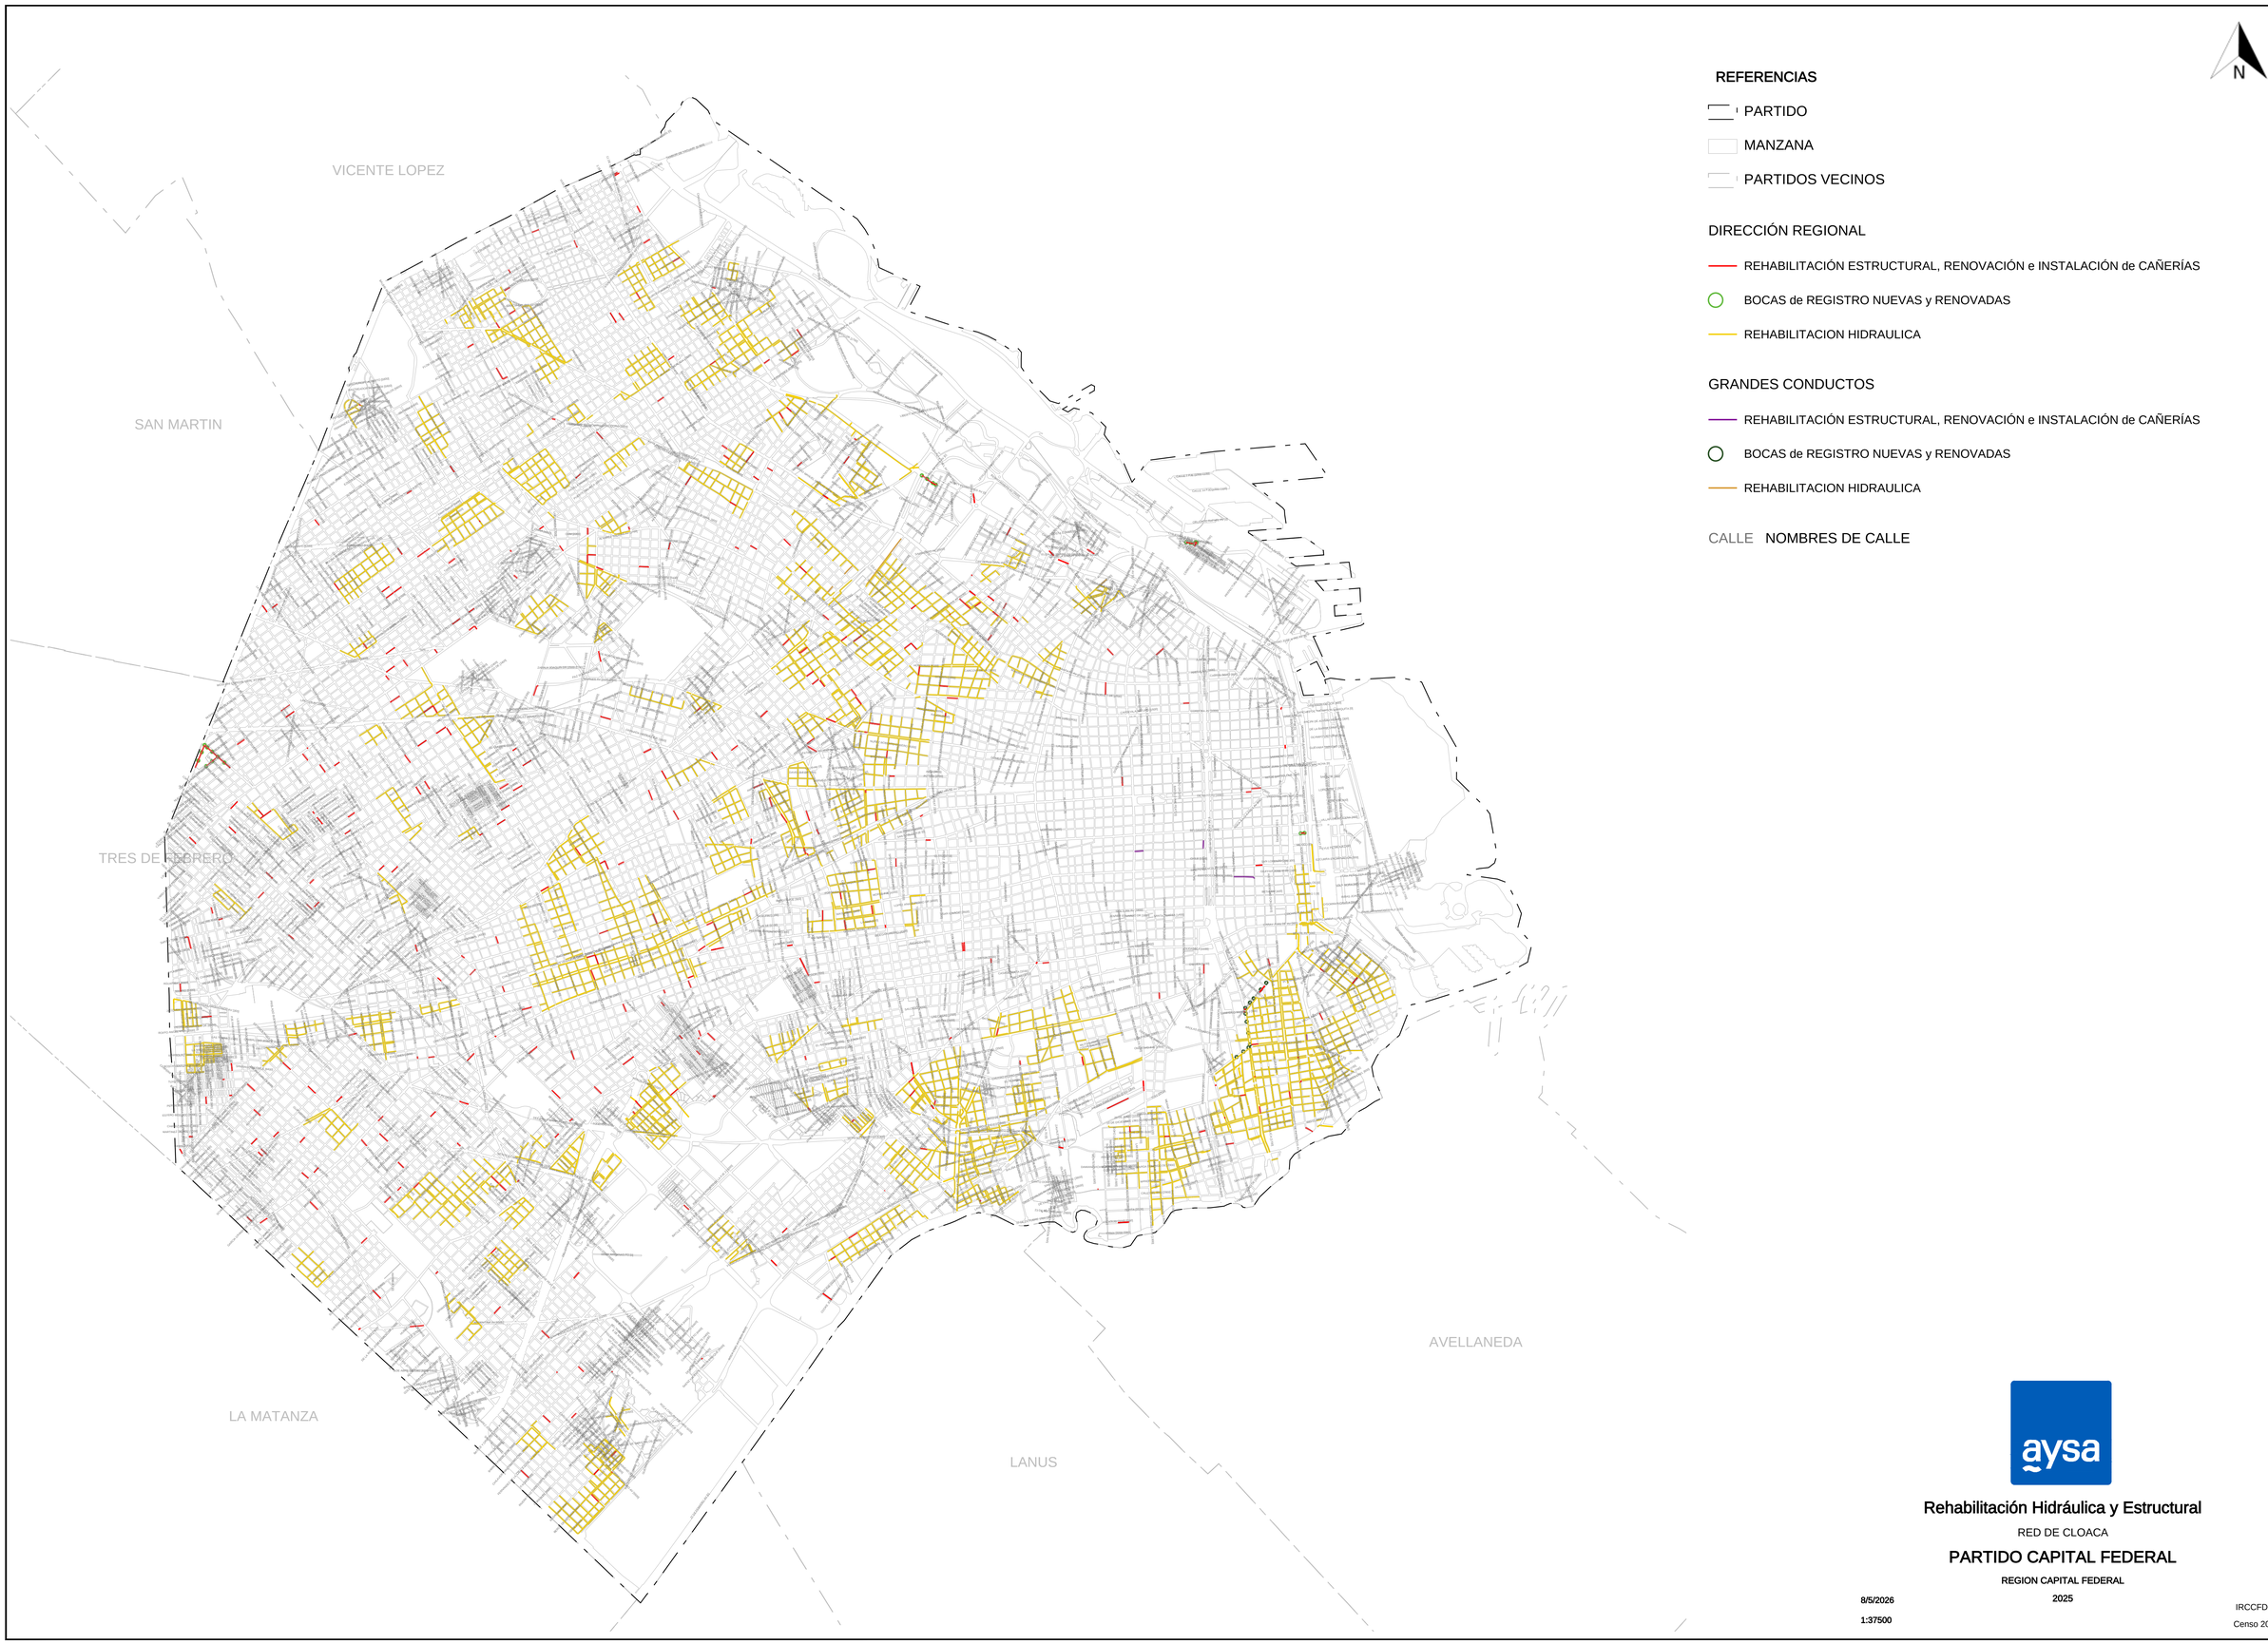
VICENTE LOPEZ
SAN MARTIN
TRES DE FEBRERO
LA MATANZA
LANUS
AVELLANEDA
N
REFERENCIAS
PARTIDO
MANZANA
PARTIDOS VECINOS
DIRECCIÓN REGIONAL
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
REHABILITACION HIDRAULICA
GRANDES CONDUCTOS
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
REHABILITACION HIDRAULICA
CALLE NOMBRES DE CALLE
aysa
Rehabilitación Hidráulica y Estructural
RED DE CLOACA
PARTIDO CAPITAL FEDERAL
REGION CAPITAL FEDERAL
2025
8/5/2026
1:37500
IRCCFD20
Censo 2022

Rehabilitación Hidráulica y Estructural de redes de Desagües Cloacales Región Norte

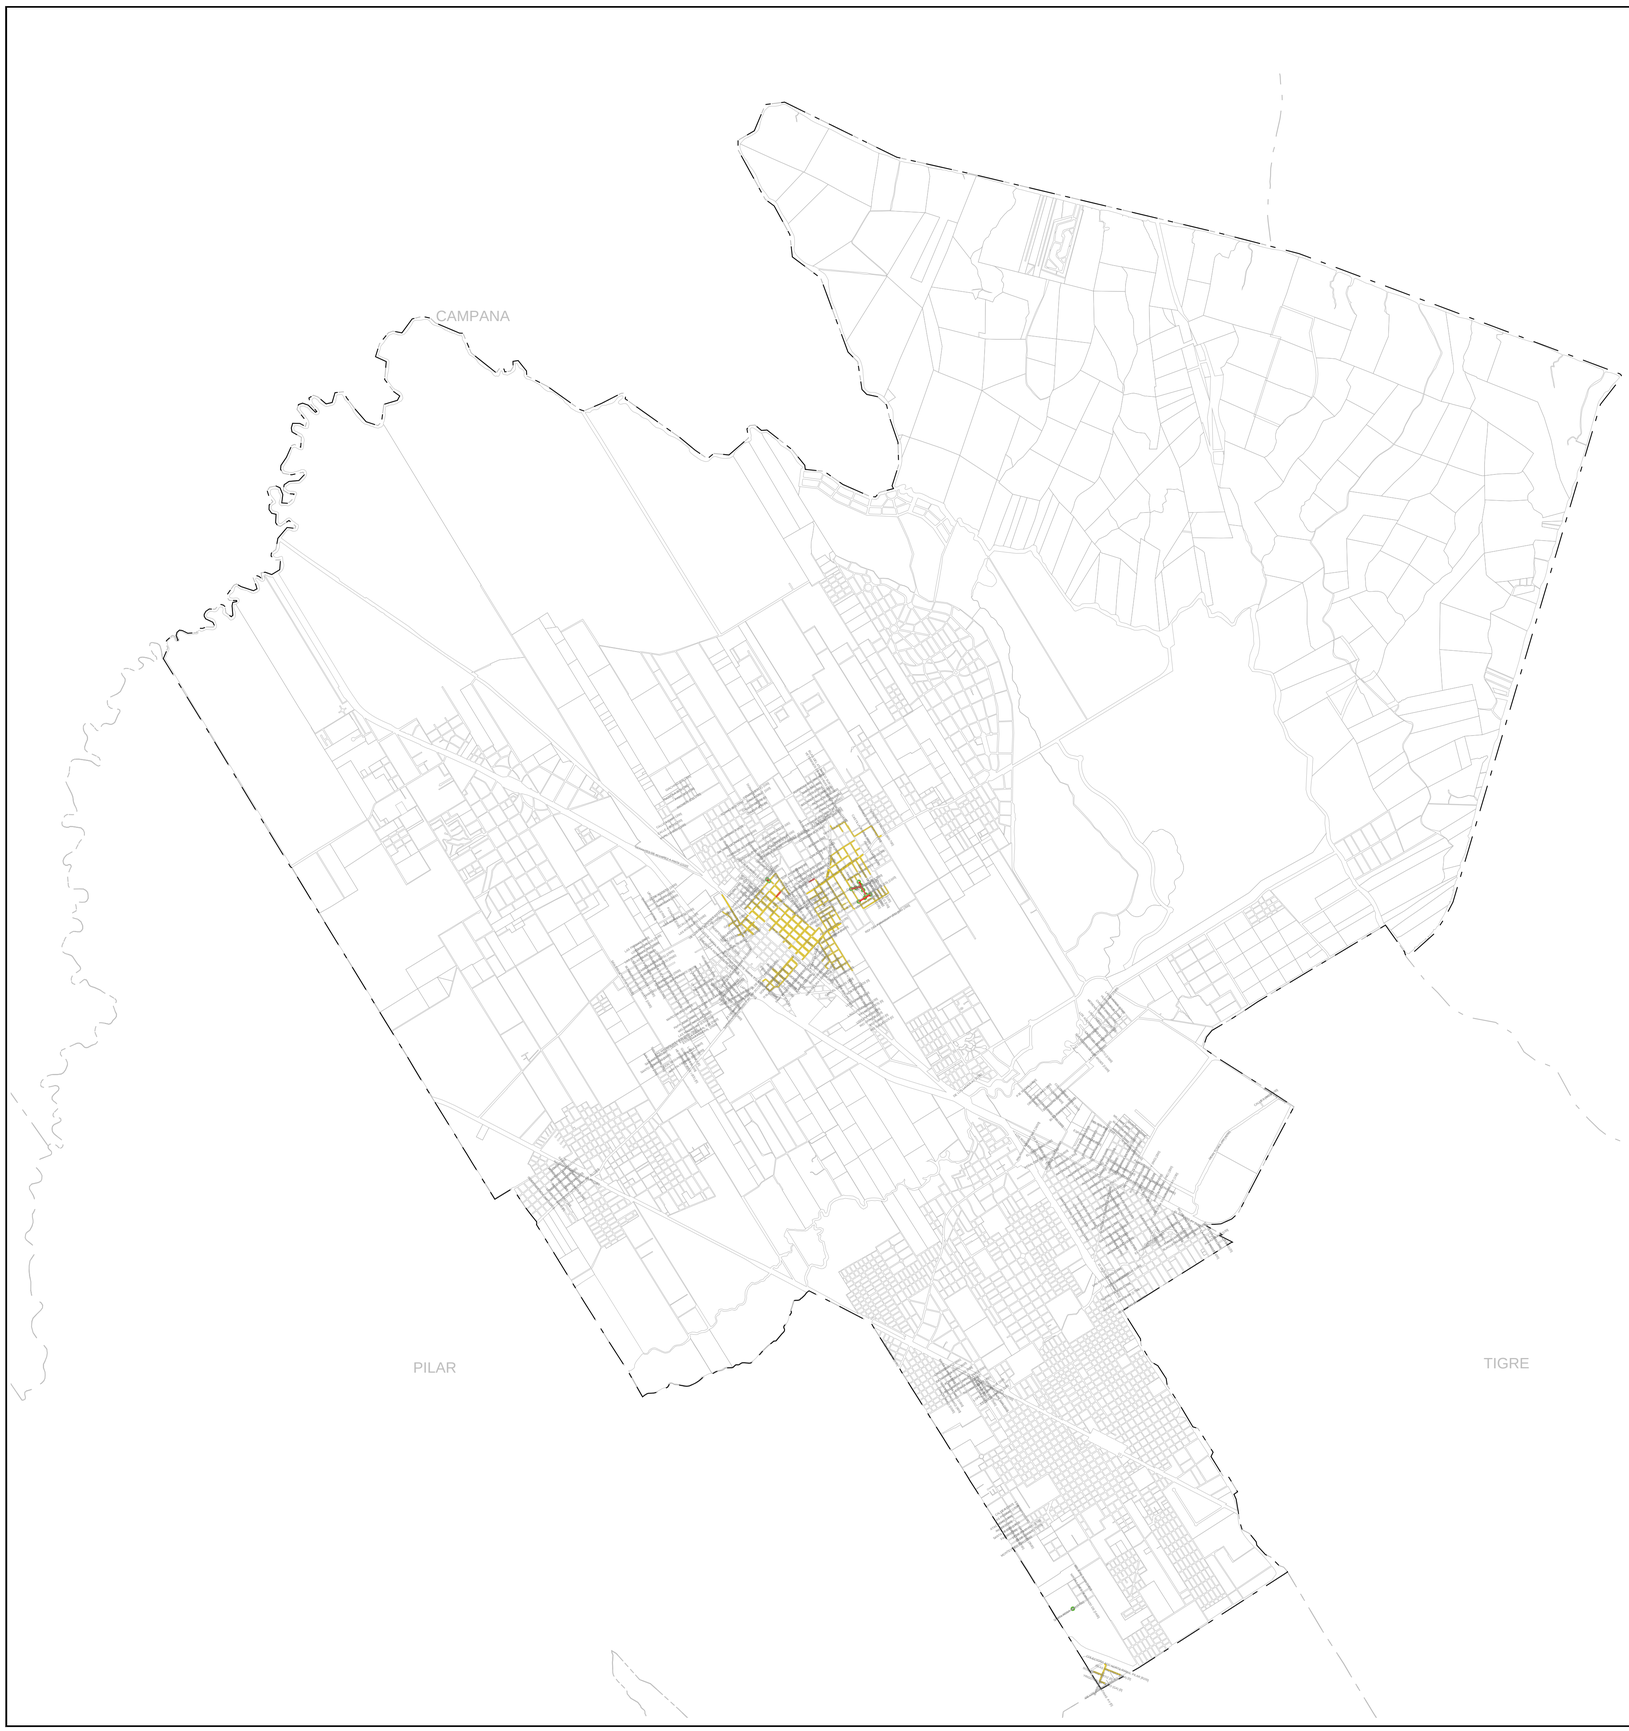

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO ESCOBAR

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:47500

IRCESC20

Censo 2022

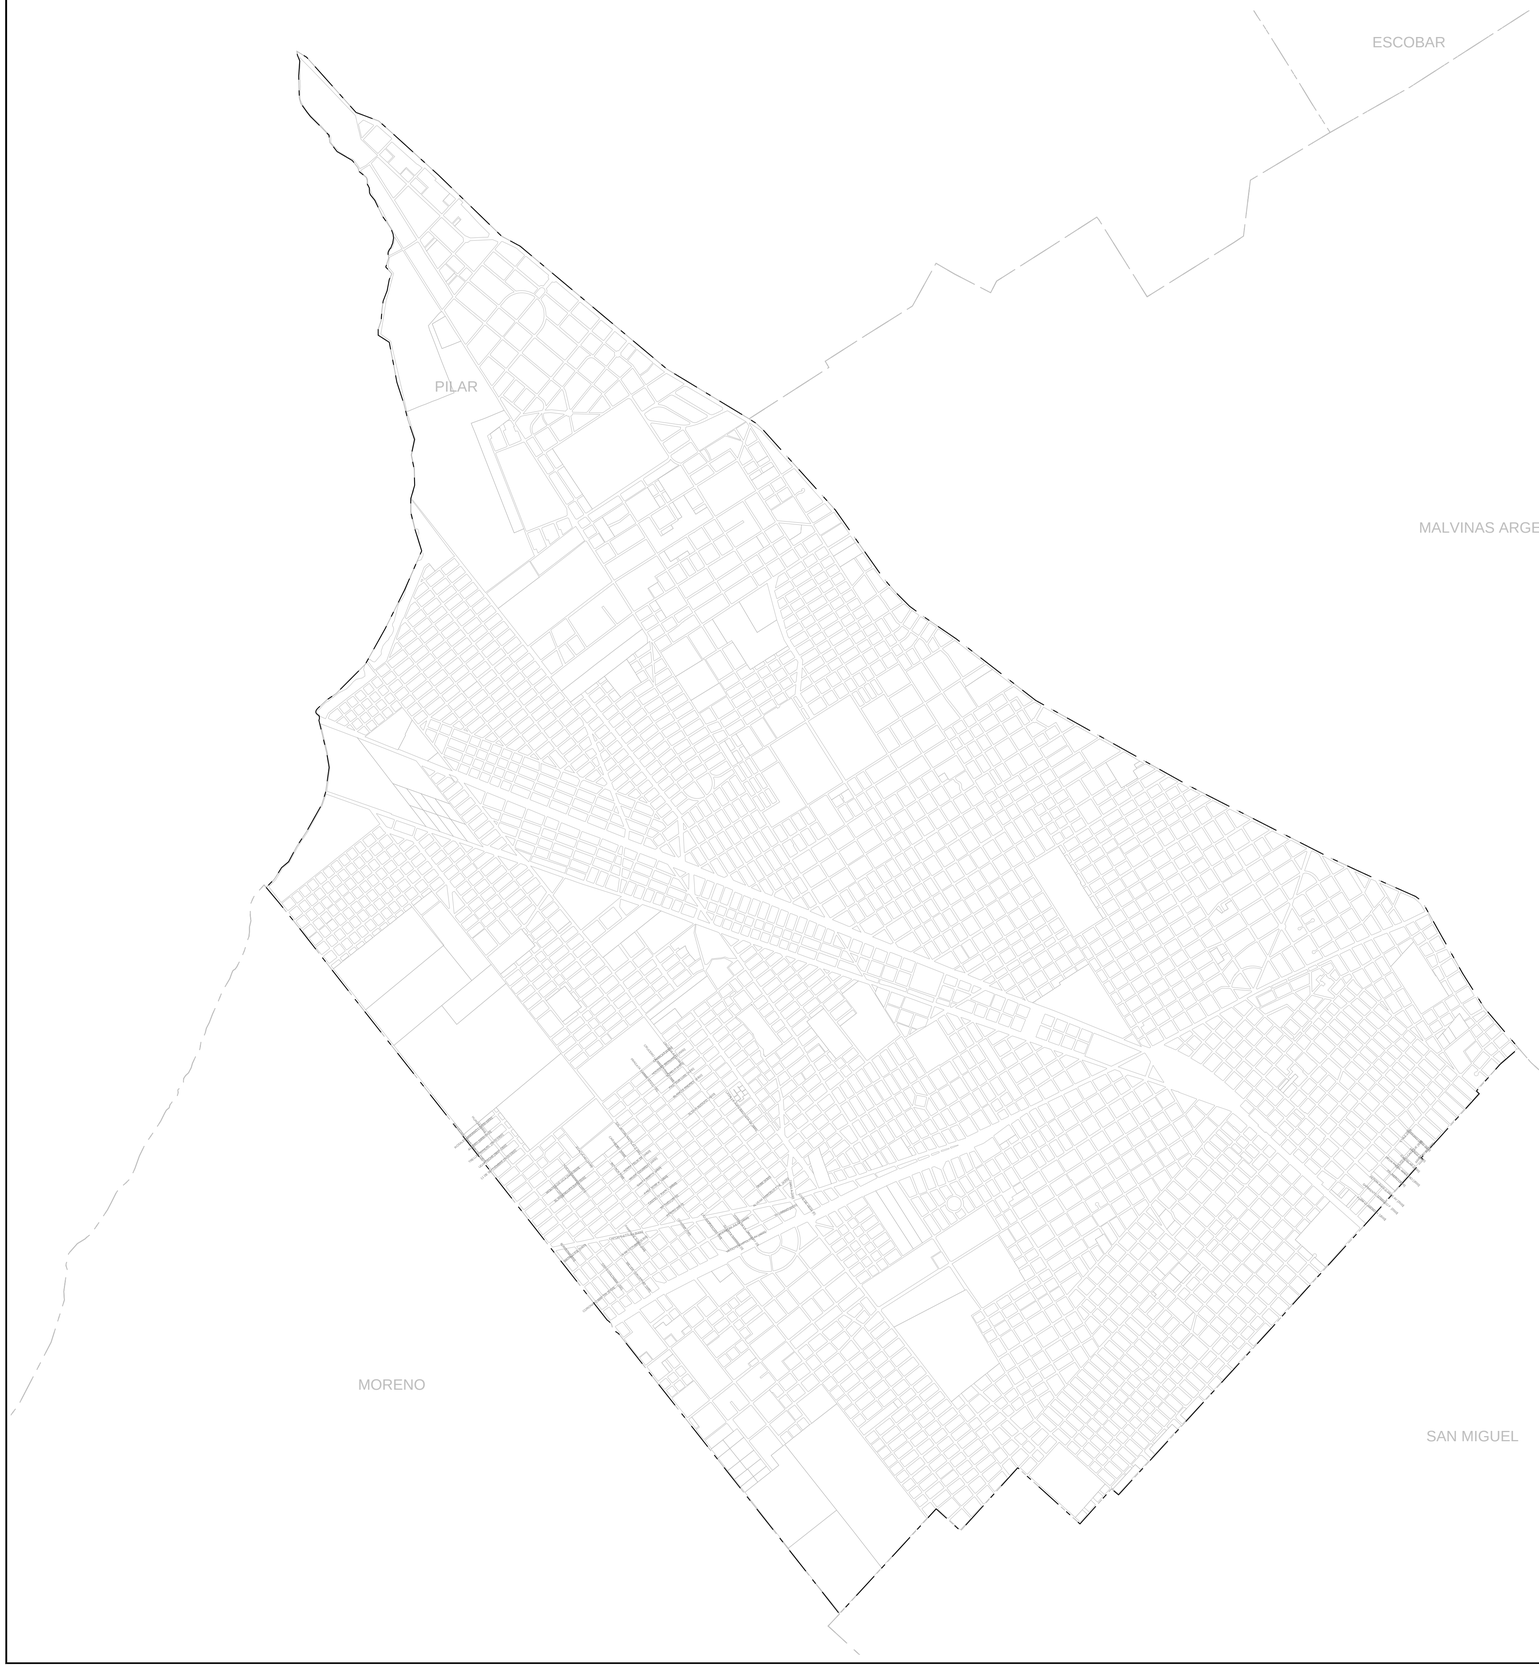

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO JOSE C PAZ

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:22500

IRCJCP20

Censo 2022

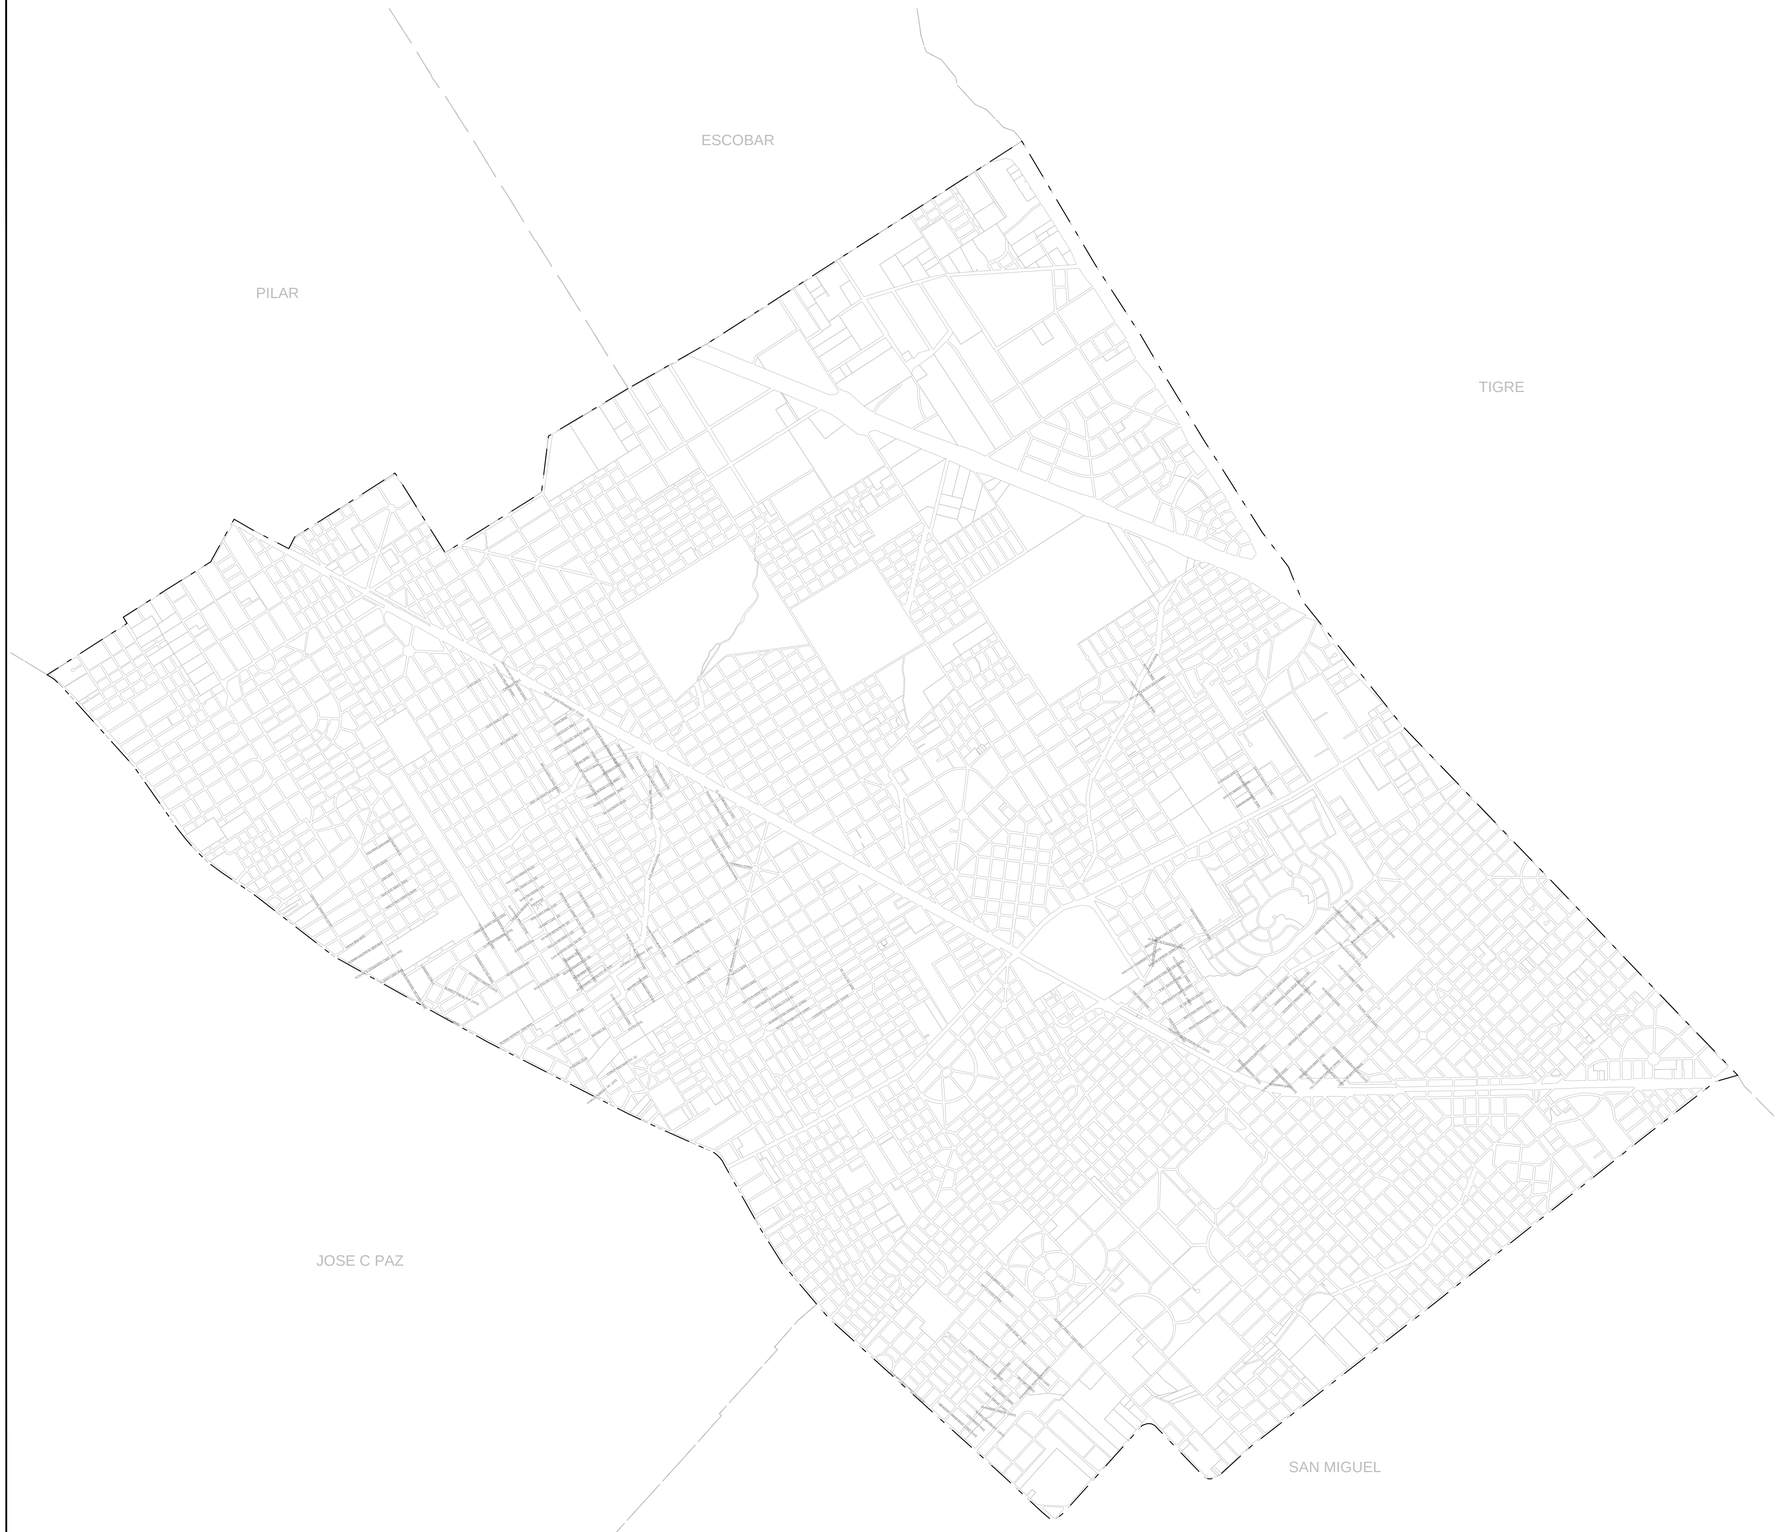

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO MALVINAS ARGENTINAS

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:22500

IRCMAR20

Censo 2022

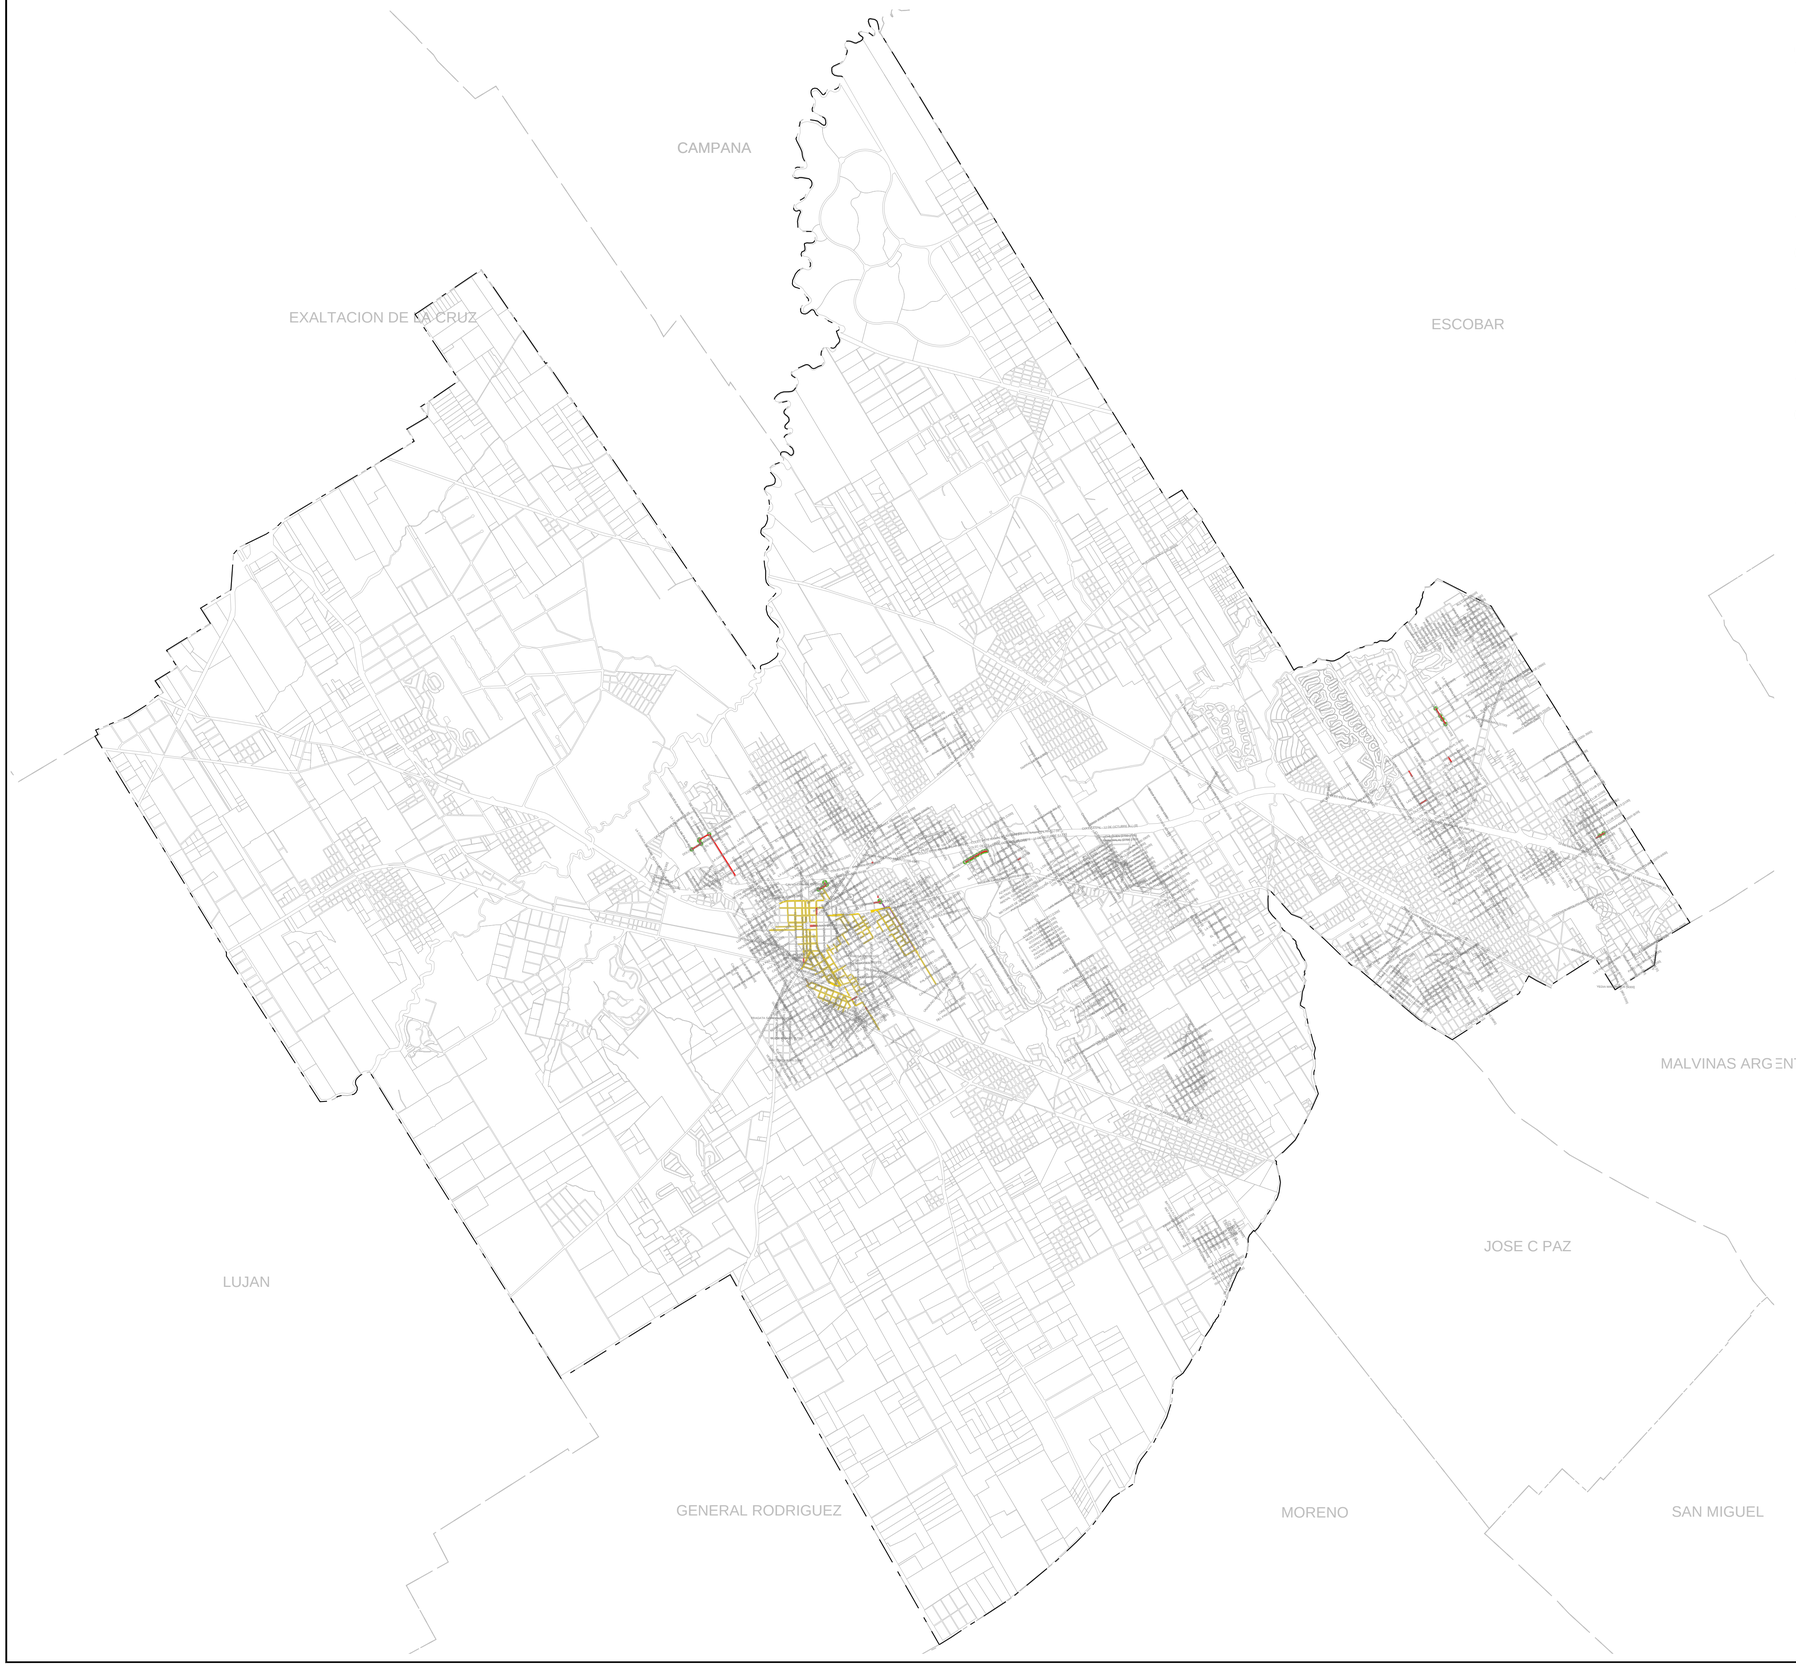

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO PILAR

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:55000

IRCPIL20

Censo 2022

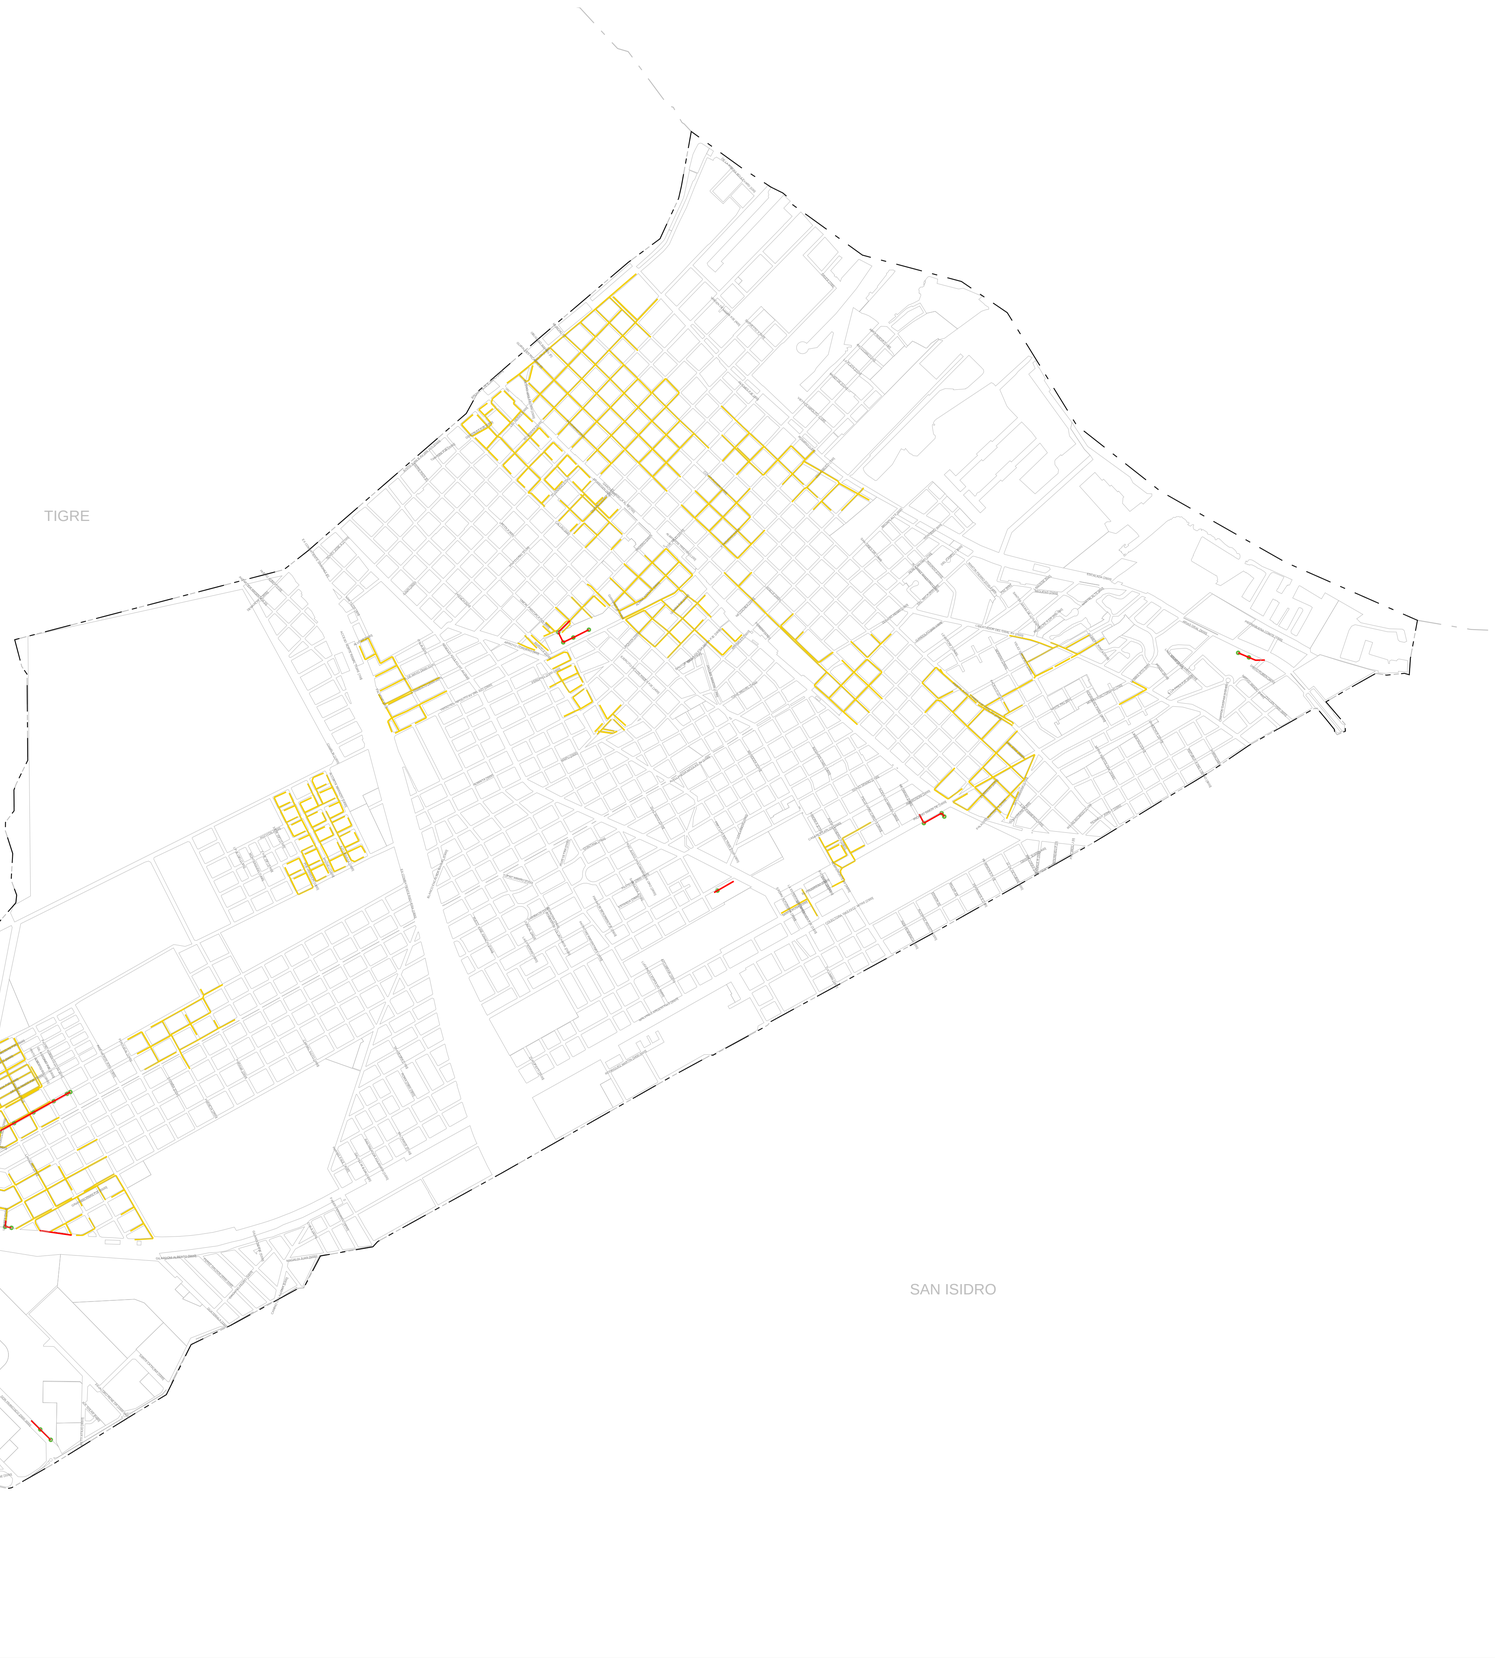

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO SAN FERNANDO

REGION NORTE

2025

29/5/2026

1:15000

IRCSFE20

Censo 2022



N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO SAN ISIDRO

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:20000

IRCSIS20

Censo 2022

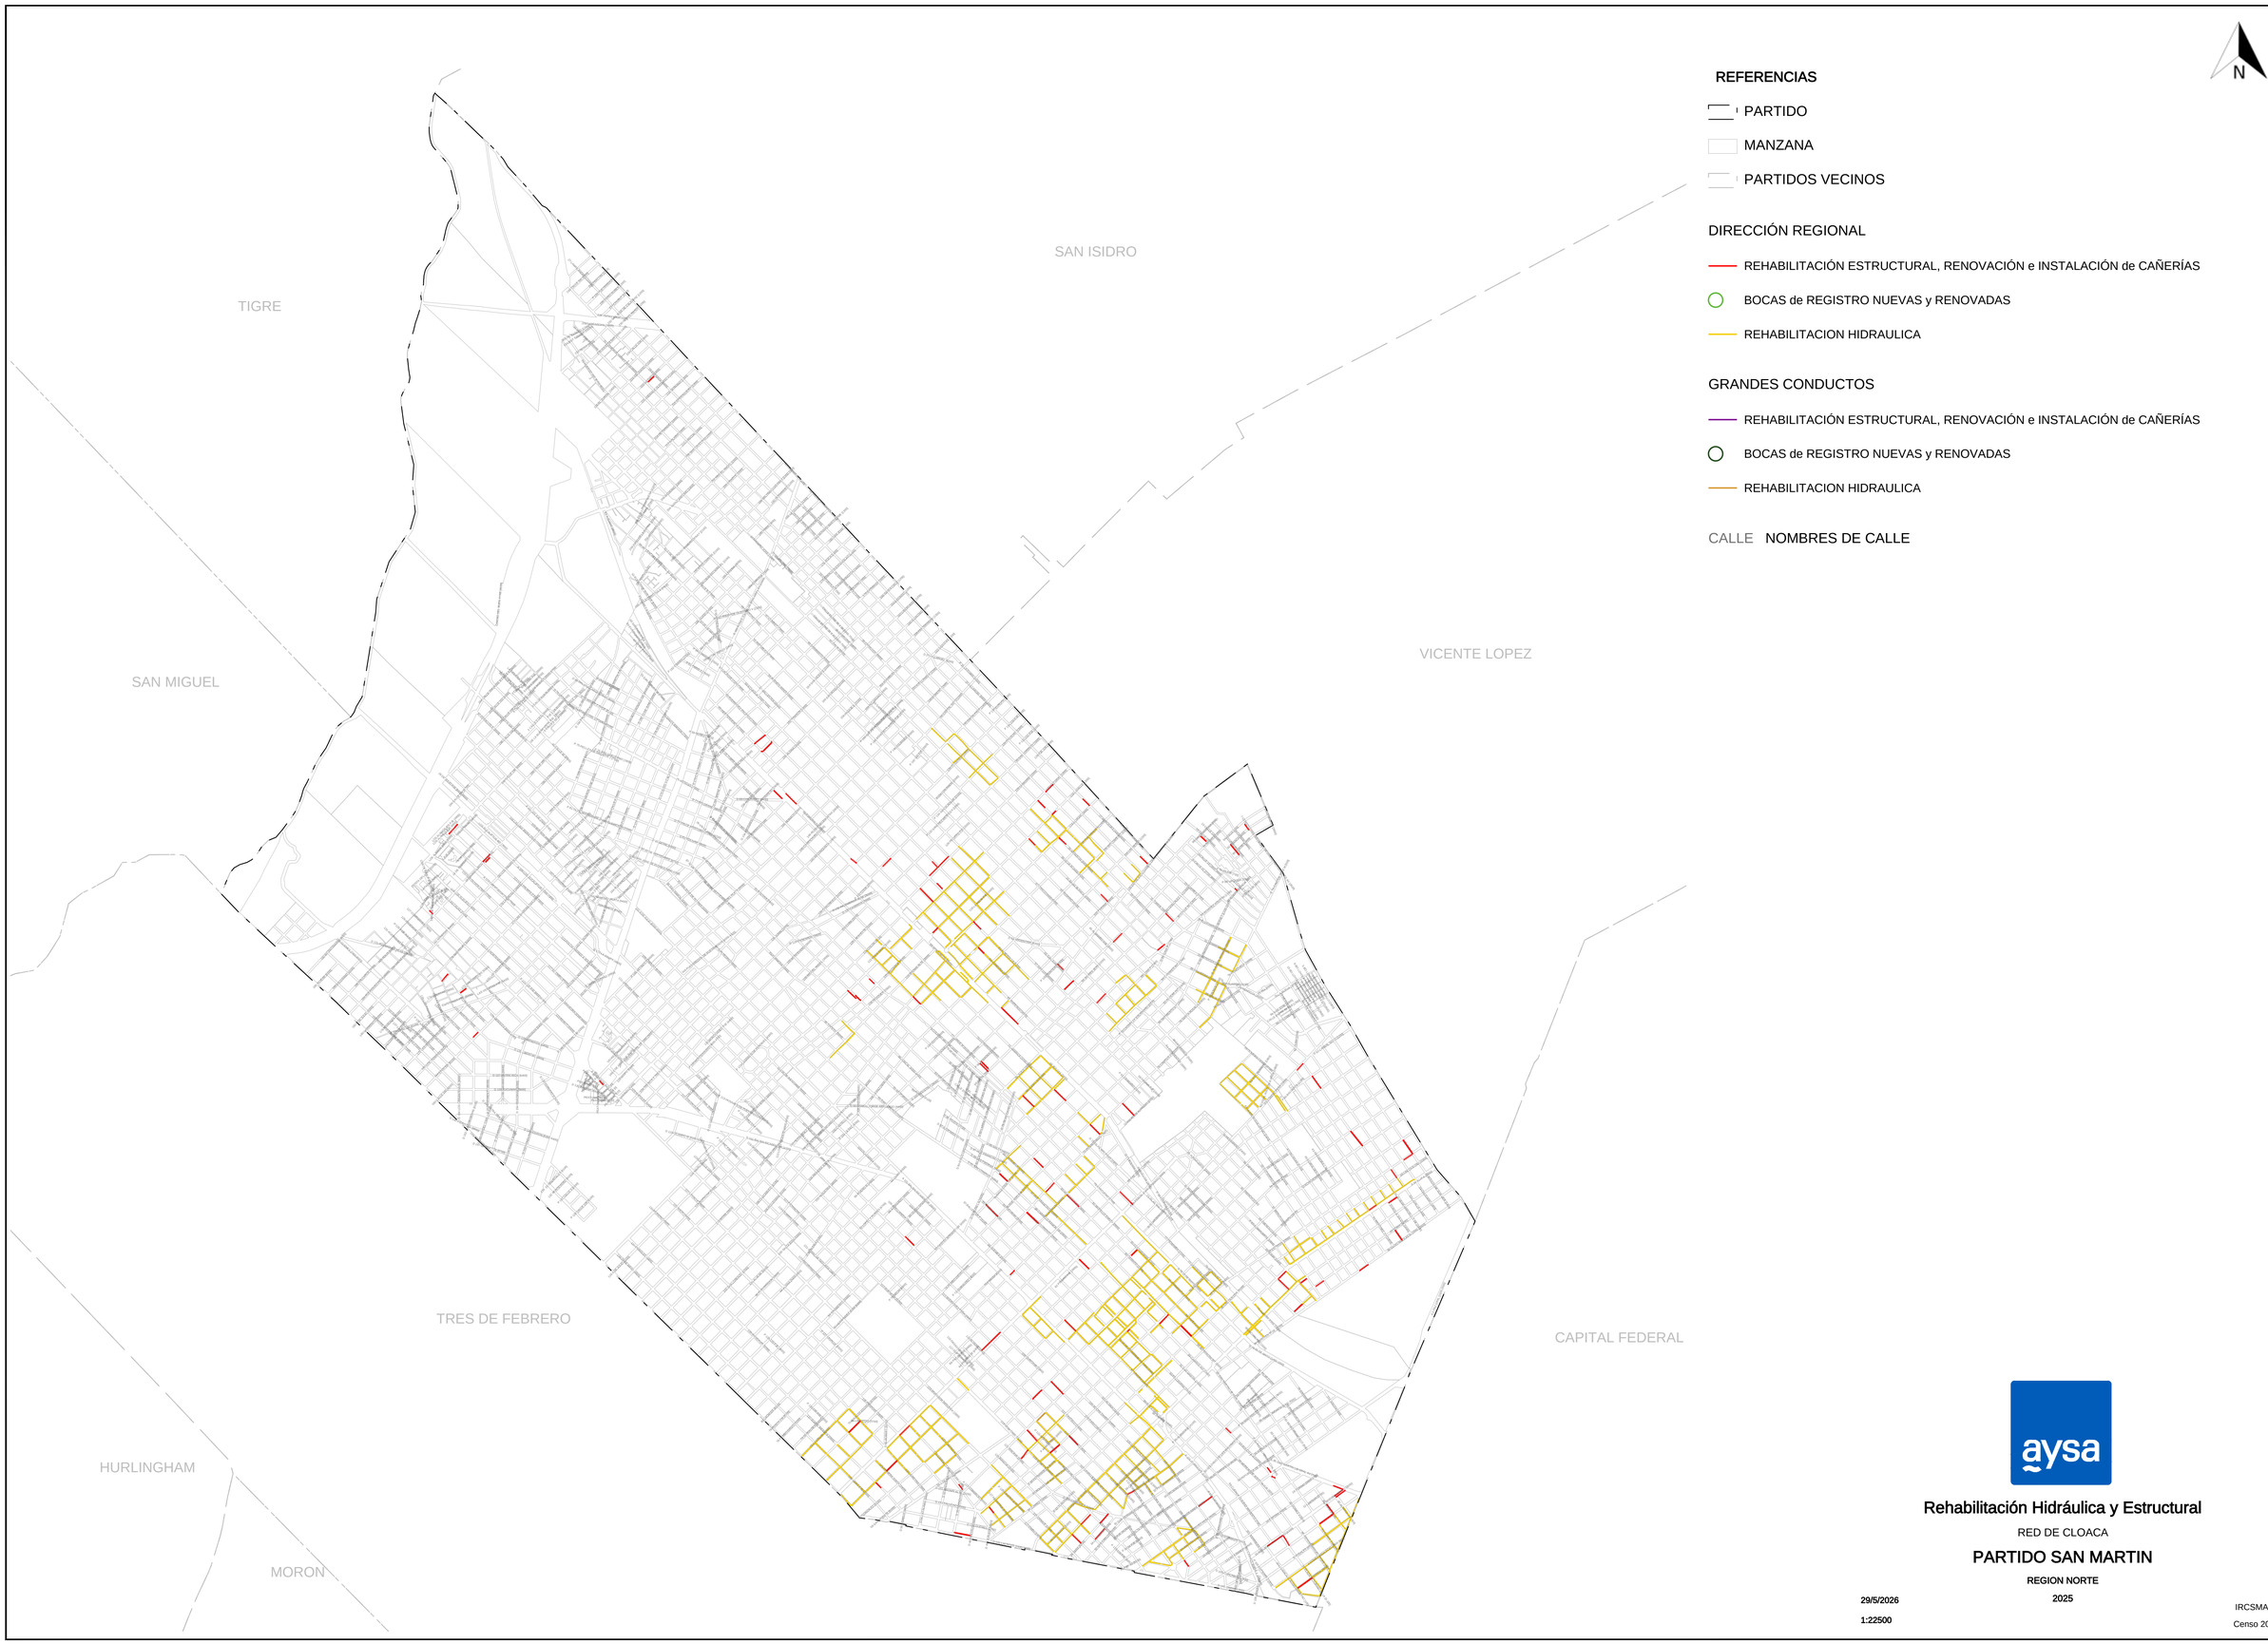

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO SAN MARTIN

REGION NORTE

2025

29/5/2026

1:22500

IRCSMA20

Censo 2022



REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO SAN MIGUEL

REGION NORTE


2025

29/5/2026

1:27500

IRCSMI20

Censo 2022

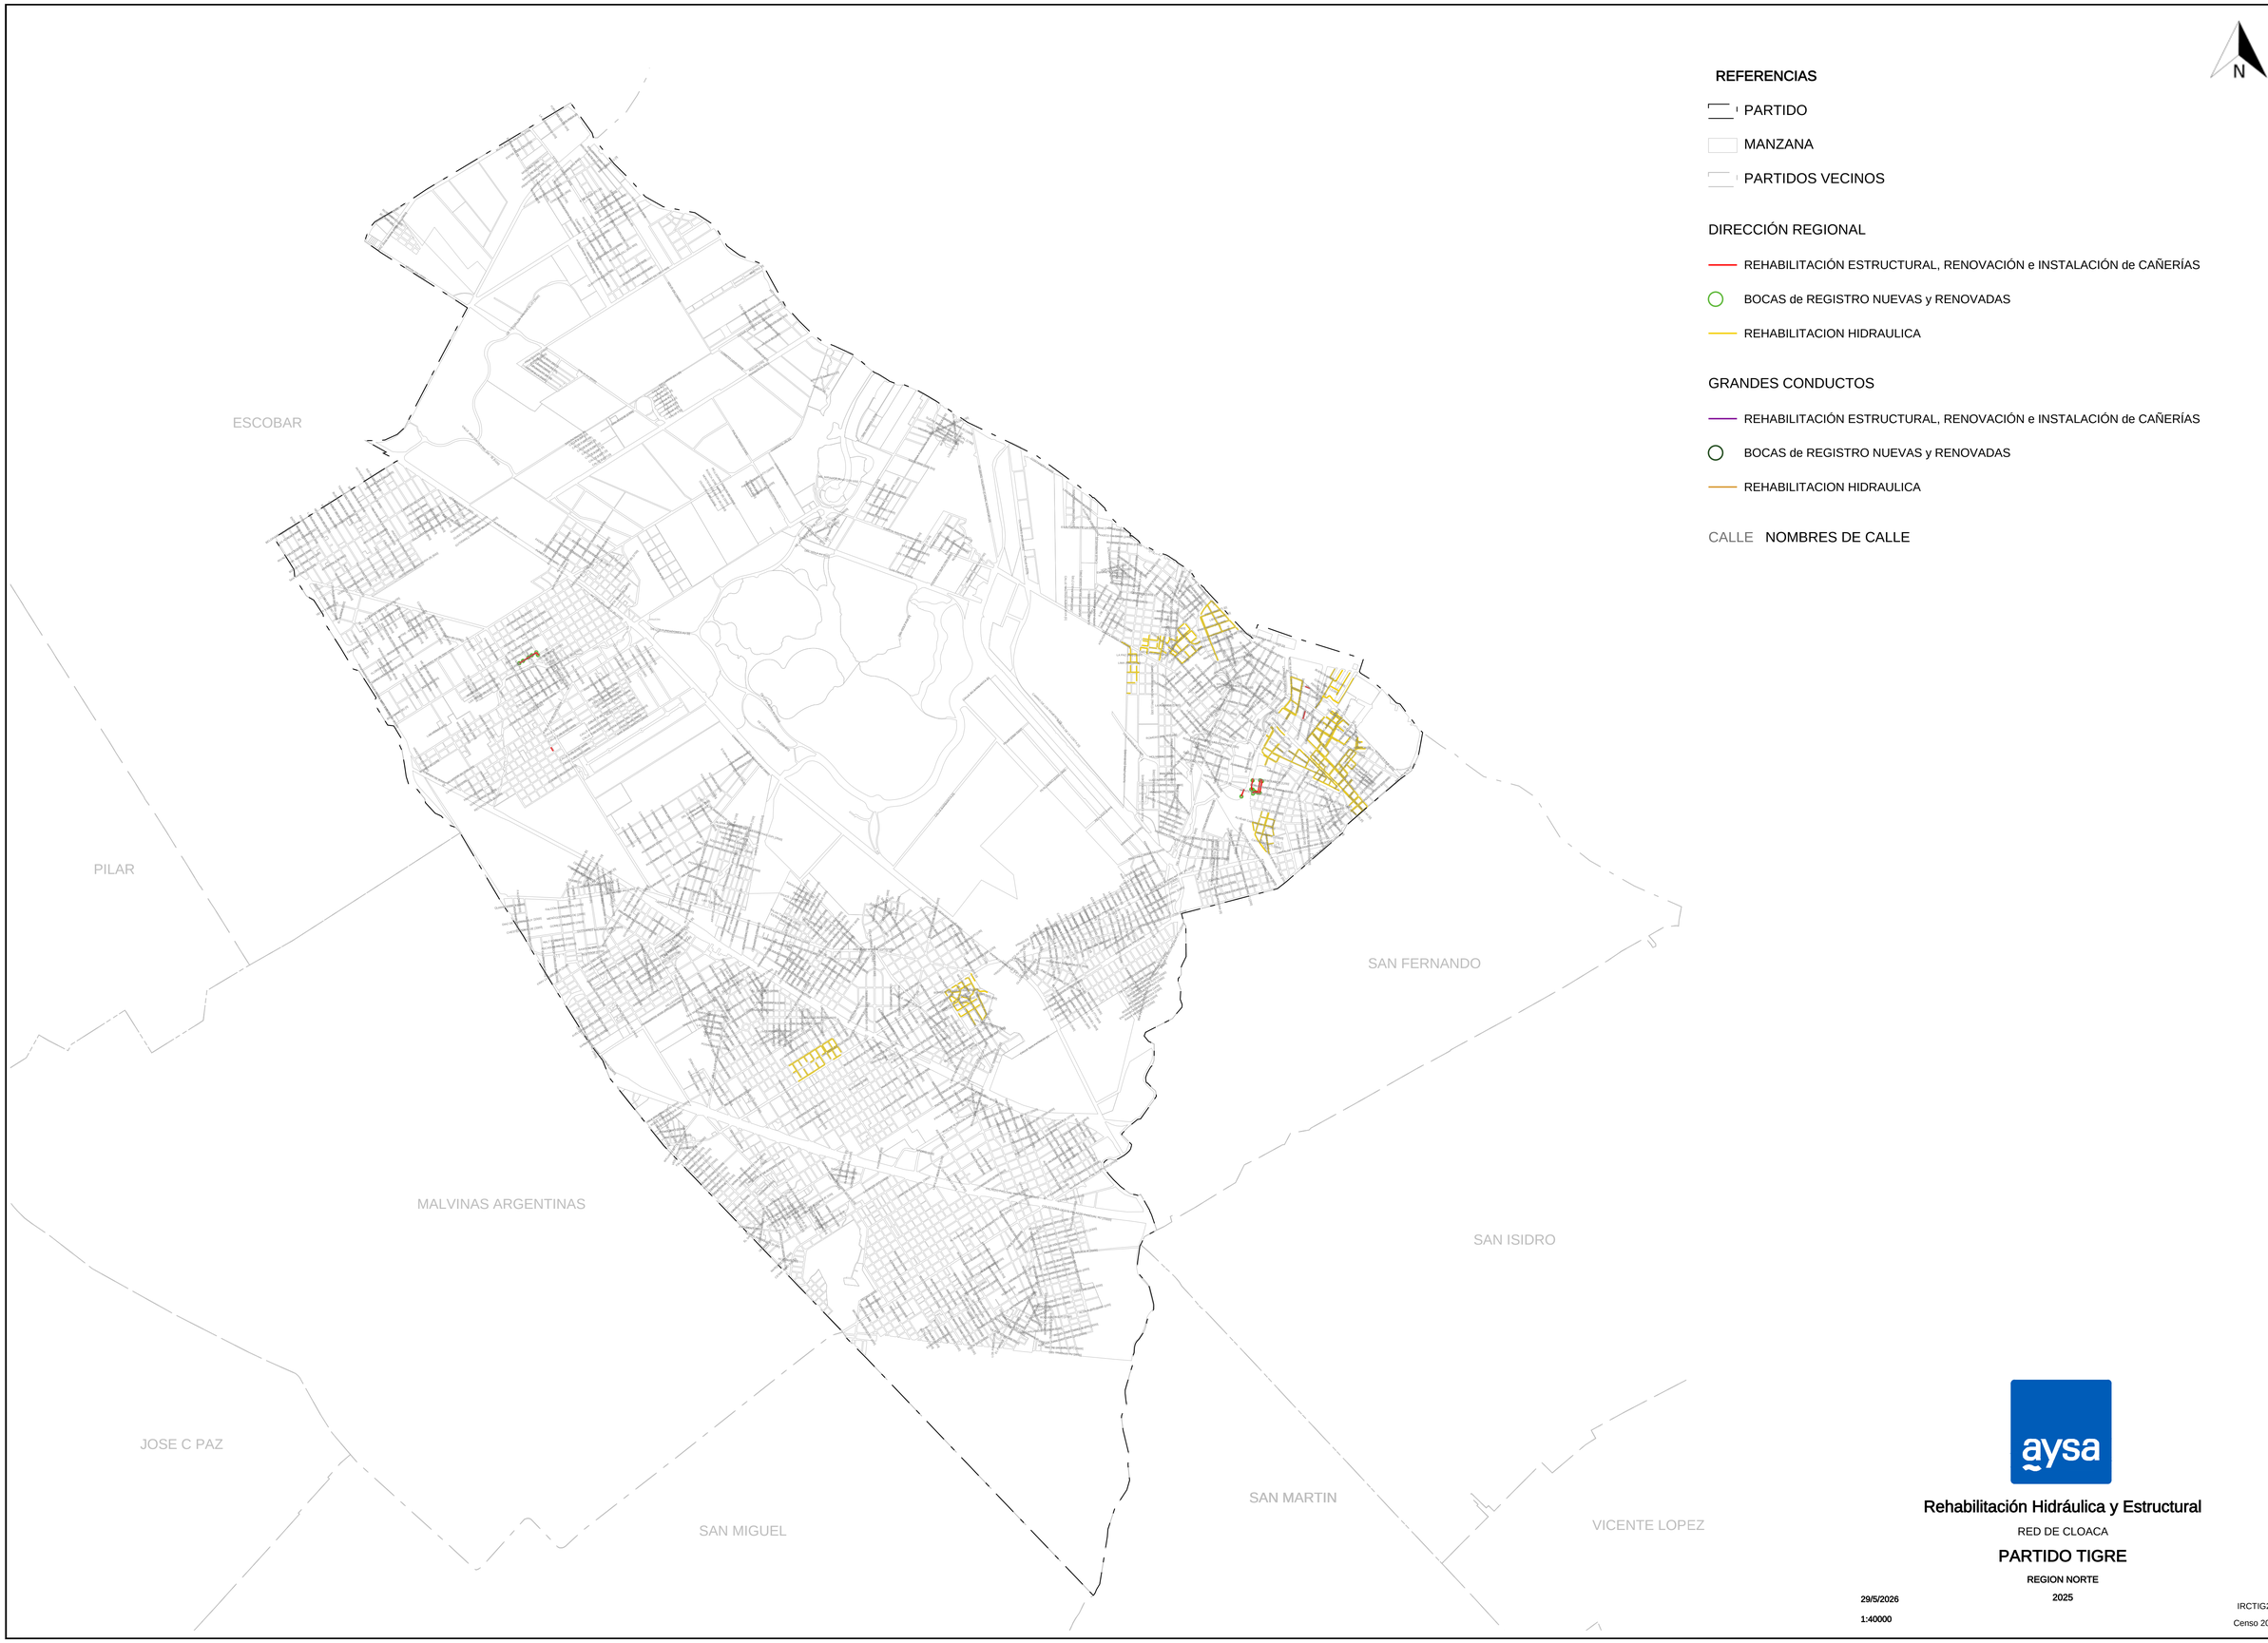
ESCOBAR
PILAR
MALVINAS ARGENTINAS
JOSE C PAZ
SAN MIGUEL
SAN FERNANDO
SAN ISIDRO
SAN MARTIN
VICENTE LOPEZ
N
REFERENCIAS
PARTIDO
MANZANA
PARTIDOS VECINOS
DIRECCIÓN REGIONAL
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
REHABILITACION HIDRAULICA
GRANDES CONDUCTOS
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
REHABILITACION HIDRAULICA
CALLE NOMBRES DE CALLE
aysa
Rehabilitación Hidráulica y Estructural
RED DE CLOACA
PARTIDO TIGRE
REGION NORTE
2025
29/5/2026
1:40000
IRCTIG20
Censo 2022



aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO VICENTE LOPEZ

REGION NORTE

2025


29/5/2026

1:17500

IRCVIC20

Censo 2022

Rehabilitación Hidráulica y Estructural de redes de Desagües Cloacales Región Oeste

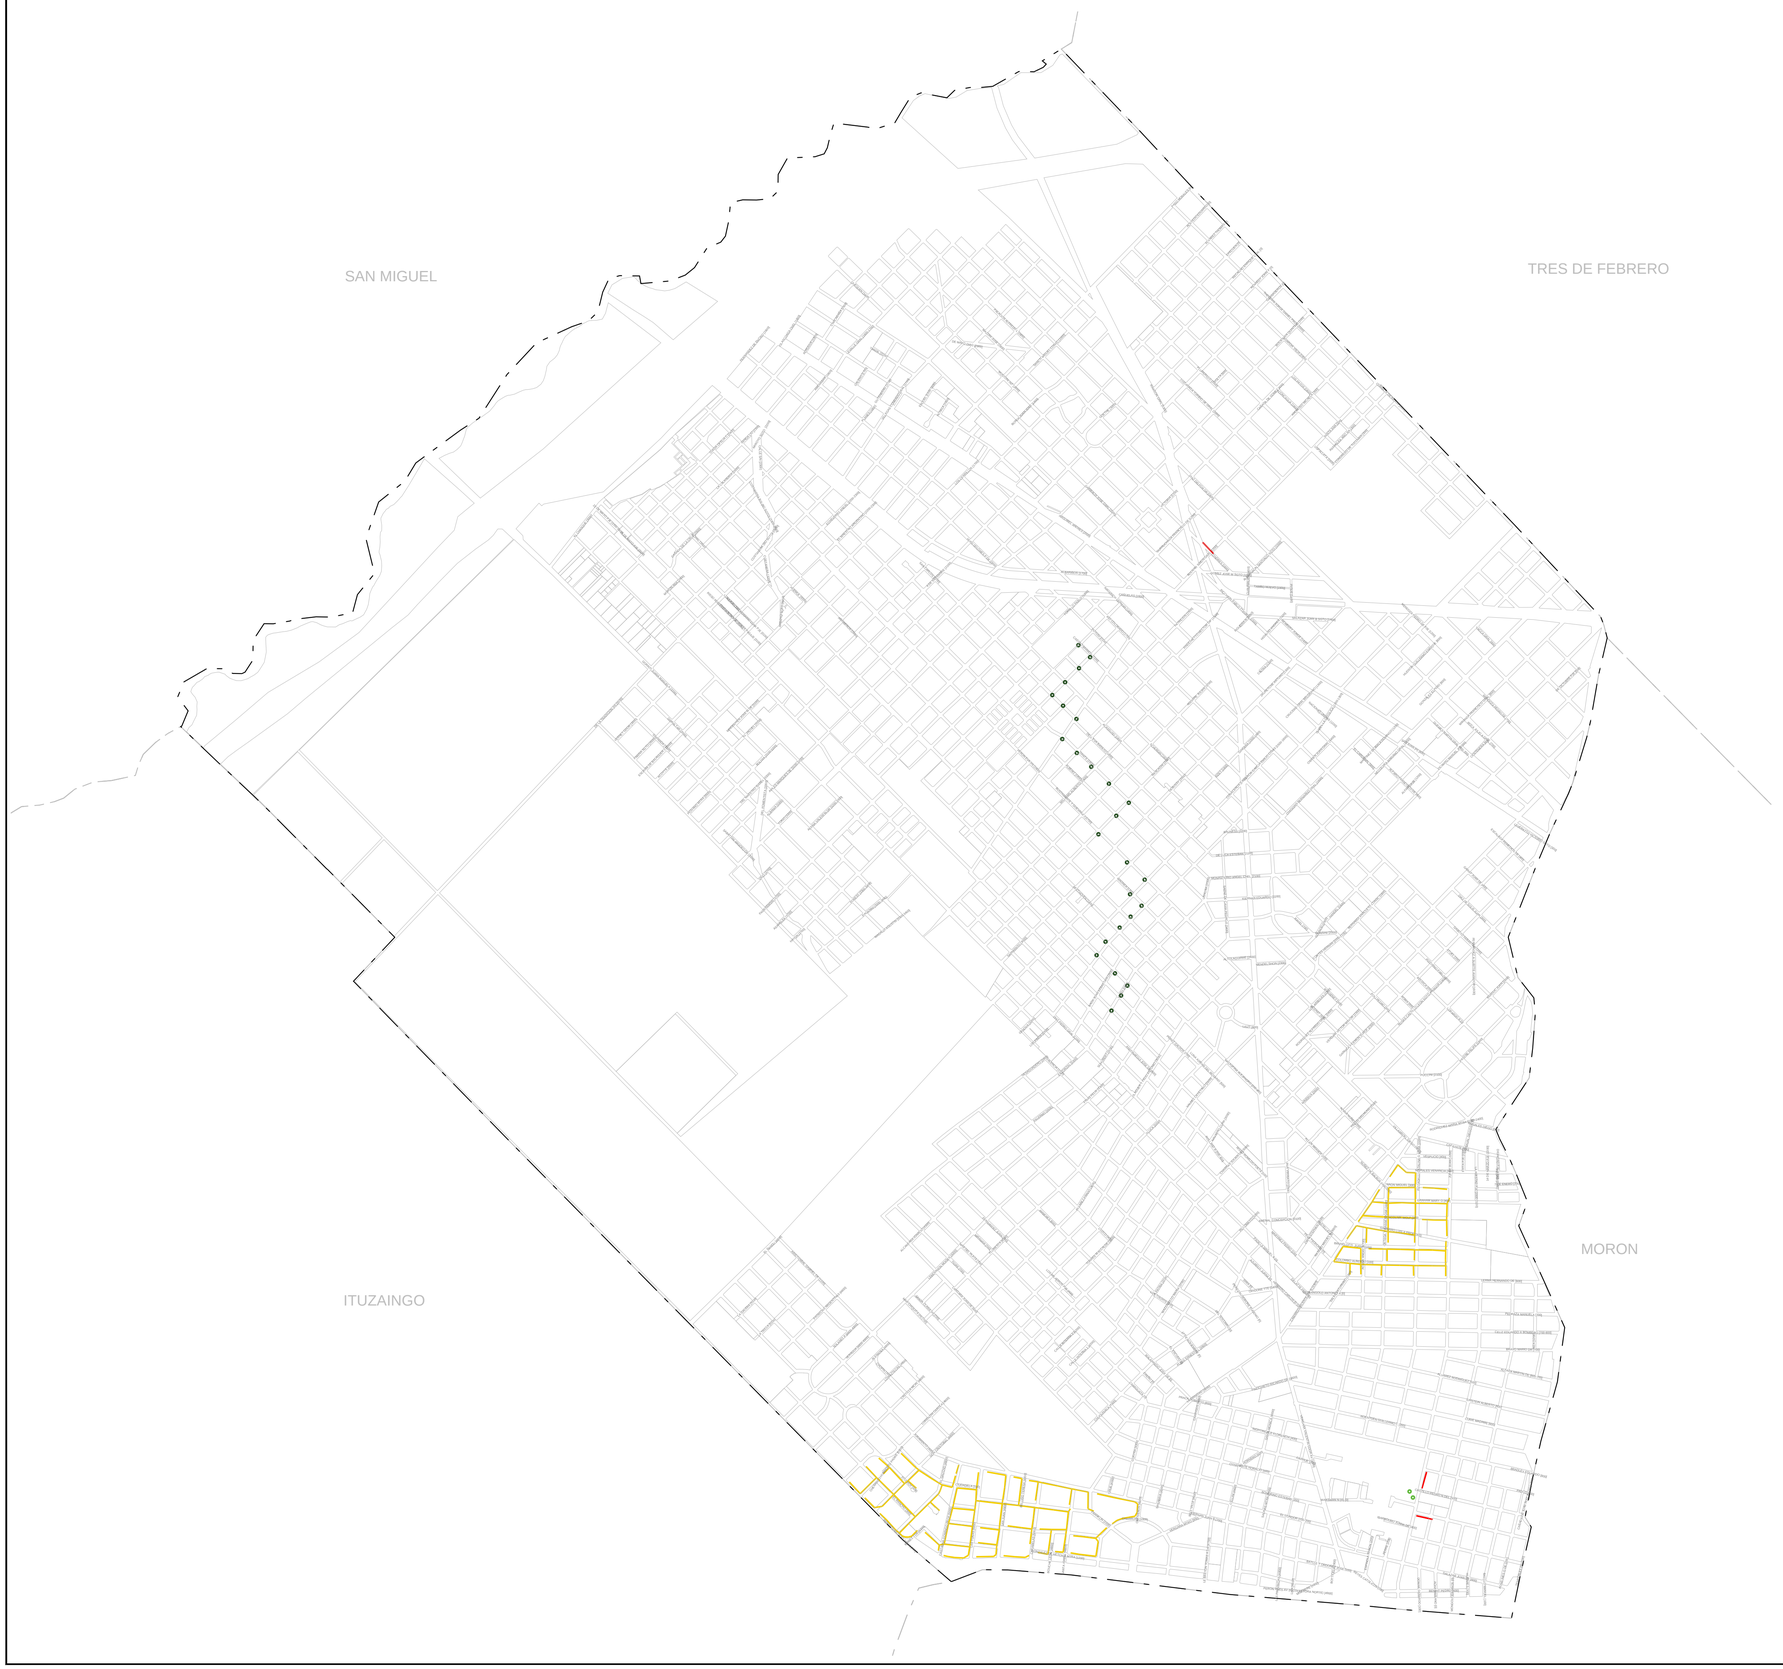

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO HURLINGHAM

REGION OESTE


2025

4/5/2026

1:15000

IRCHUR20

Censo 2022

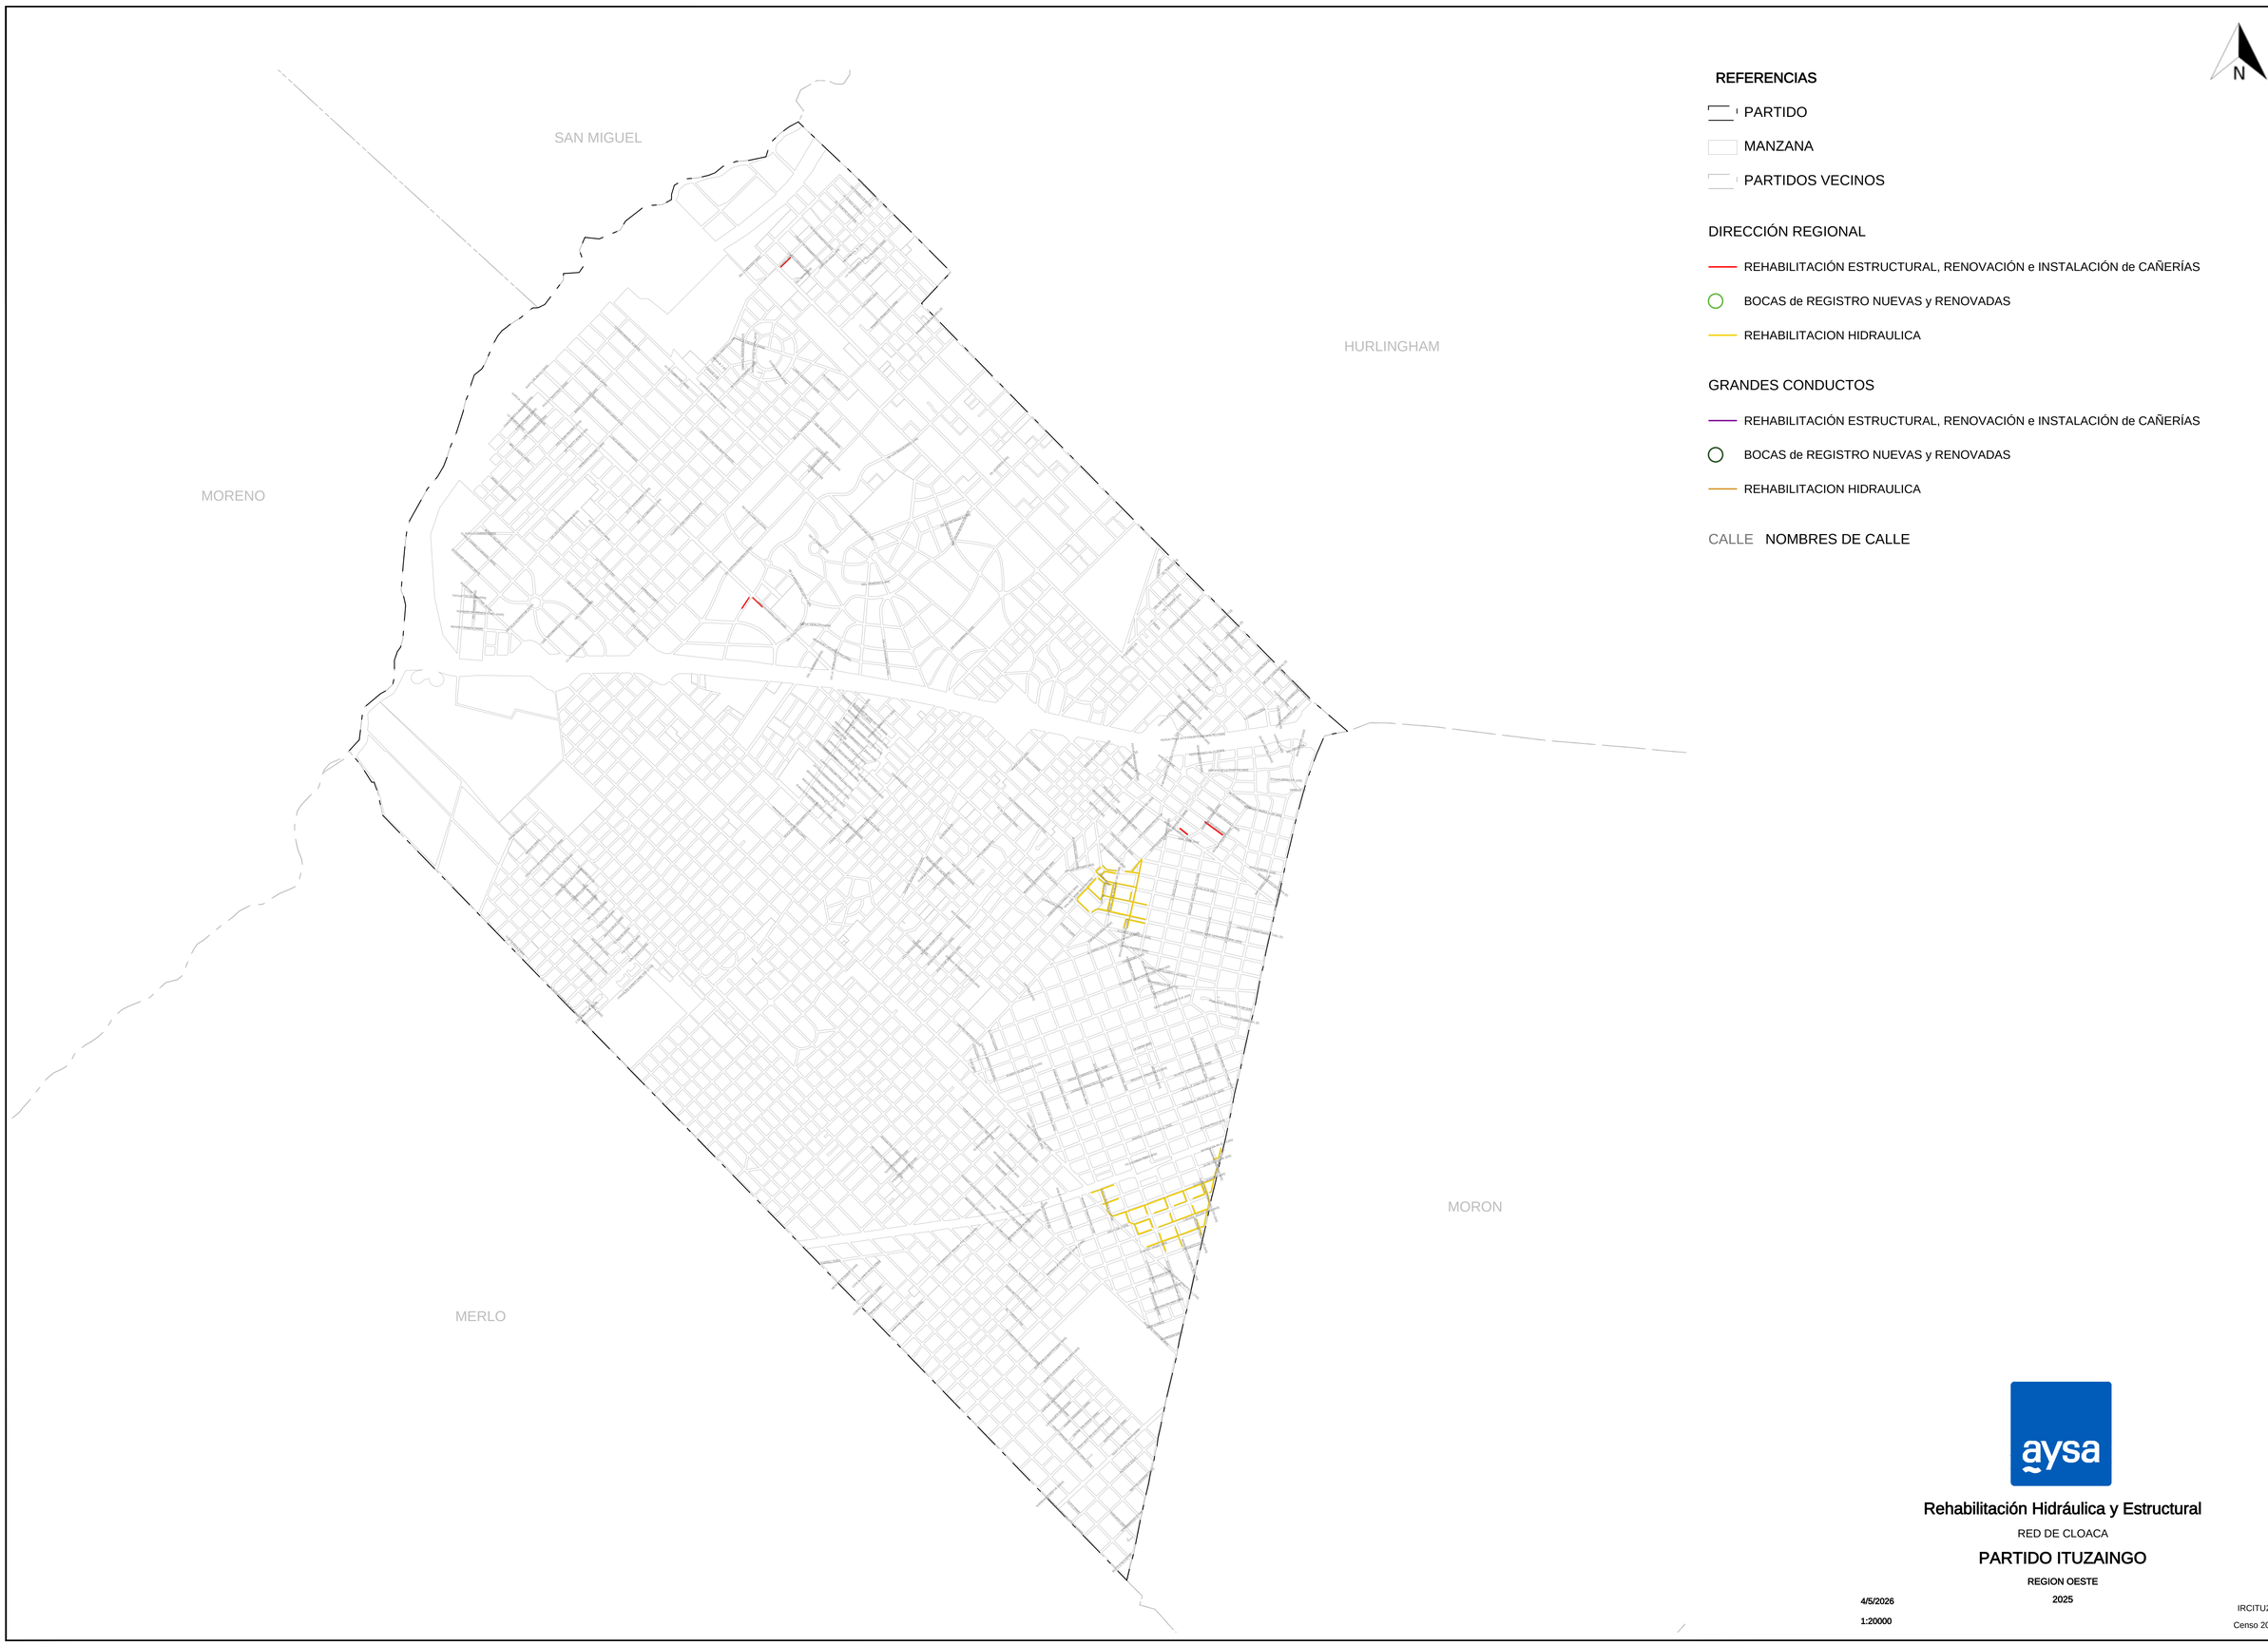

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO ITUZAINGO

REGION OESTE


2025

4/5/2026

1:20000

IRCITU20

Censo 2022

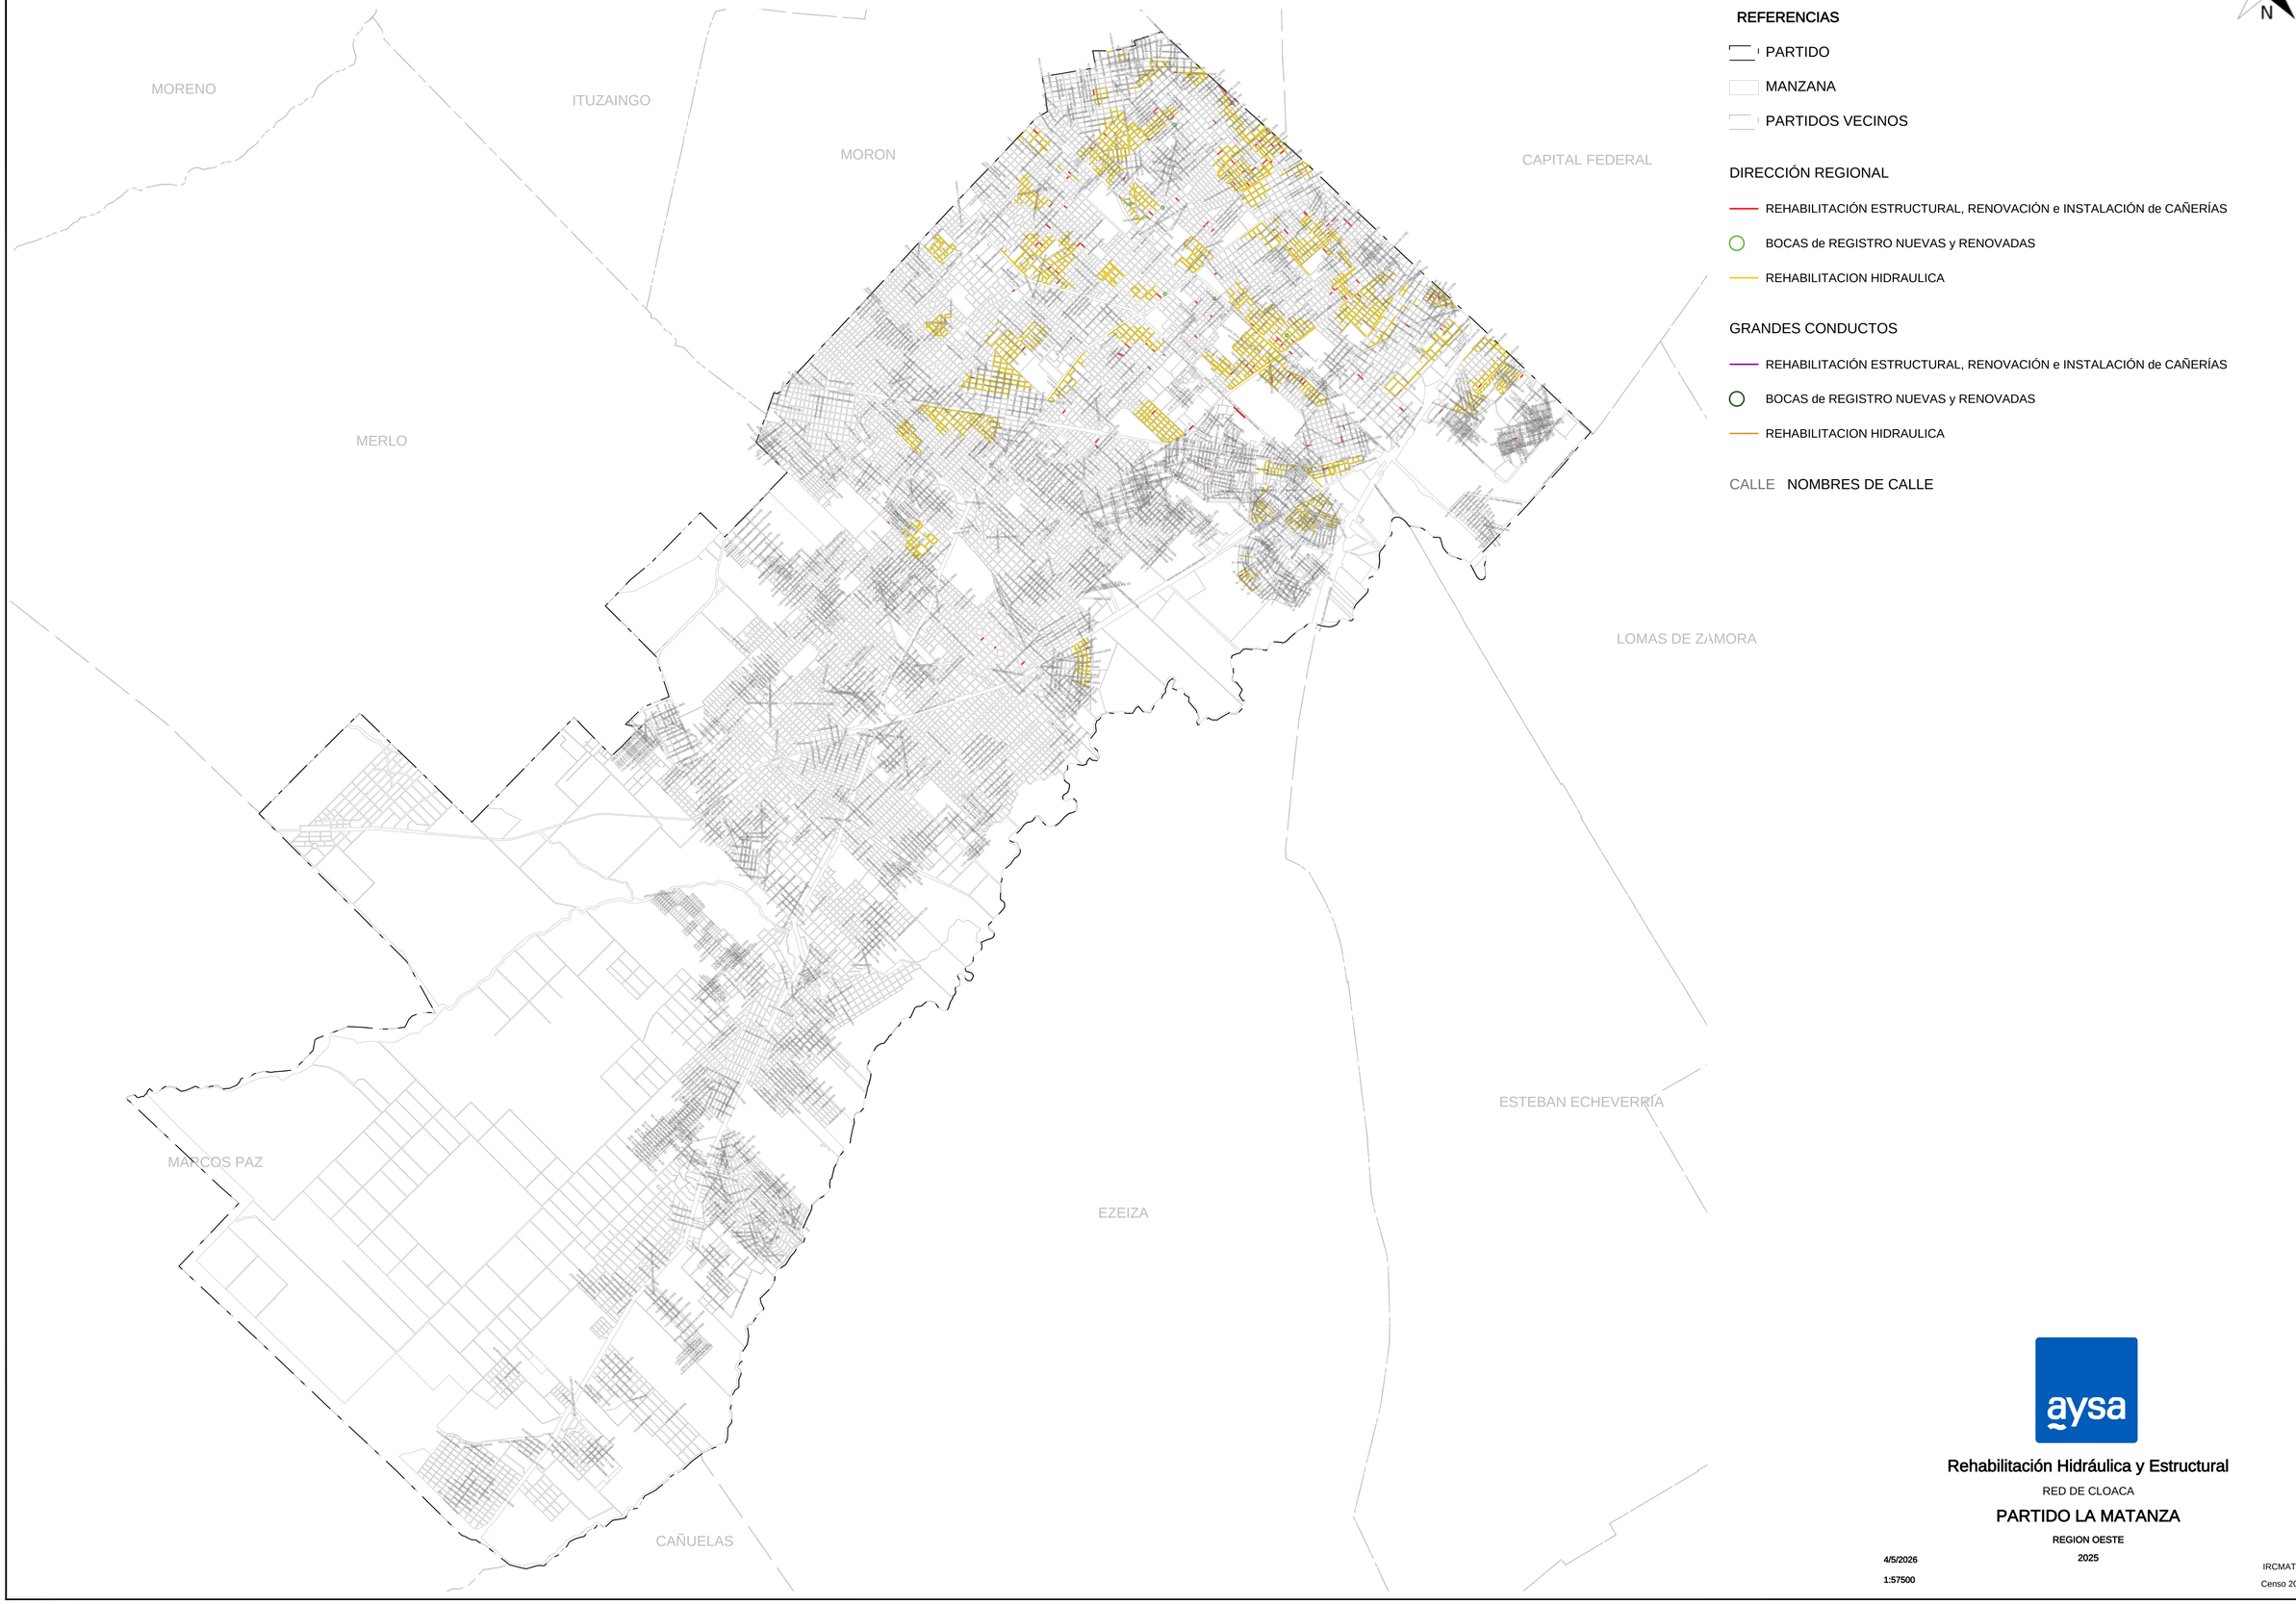

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO LA MATANZA

REGION OESTE


2025

4/5/2026

1:57500

IRCMAT20

Censo 2022

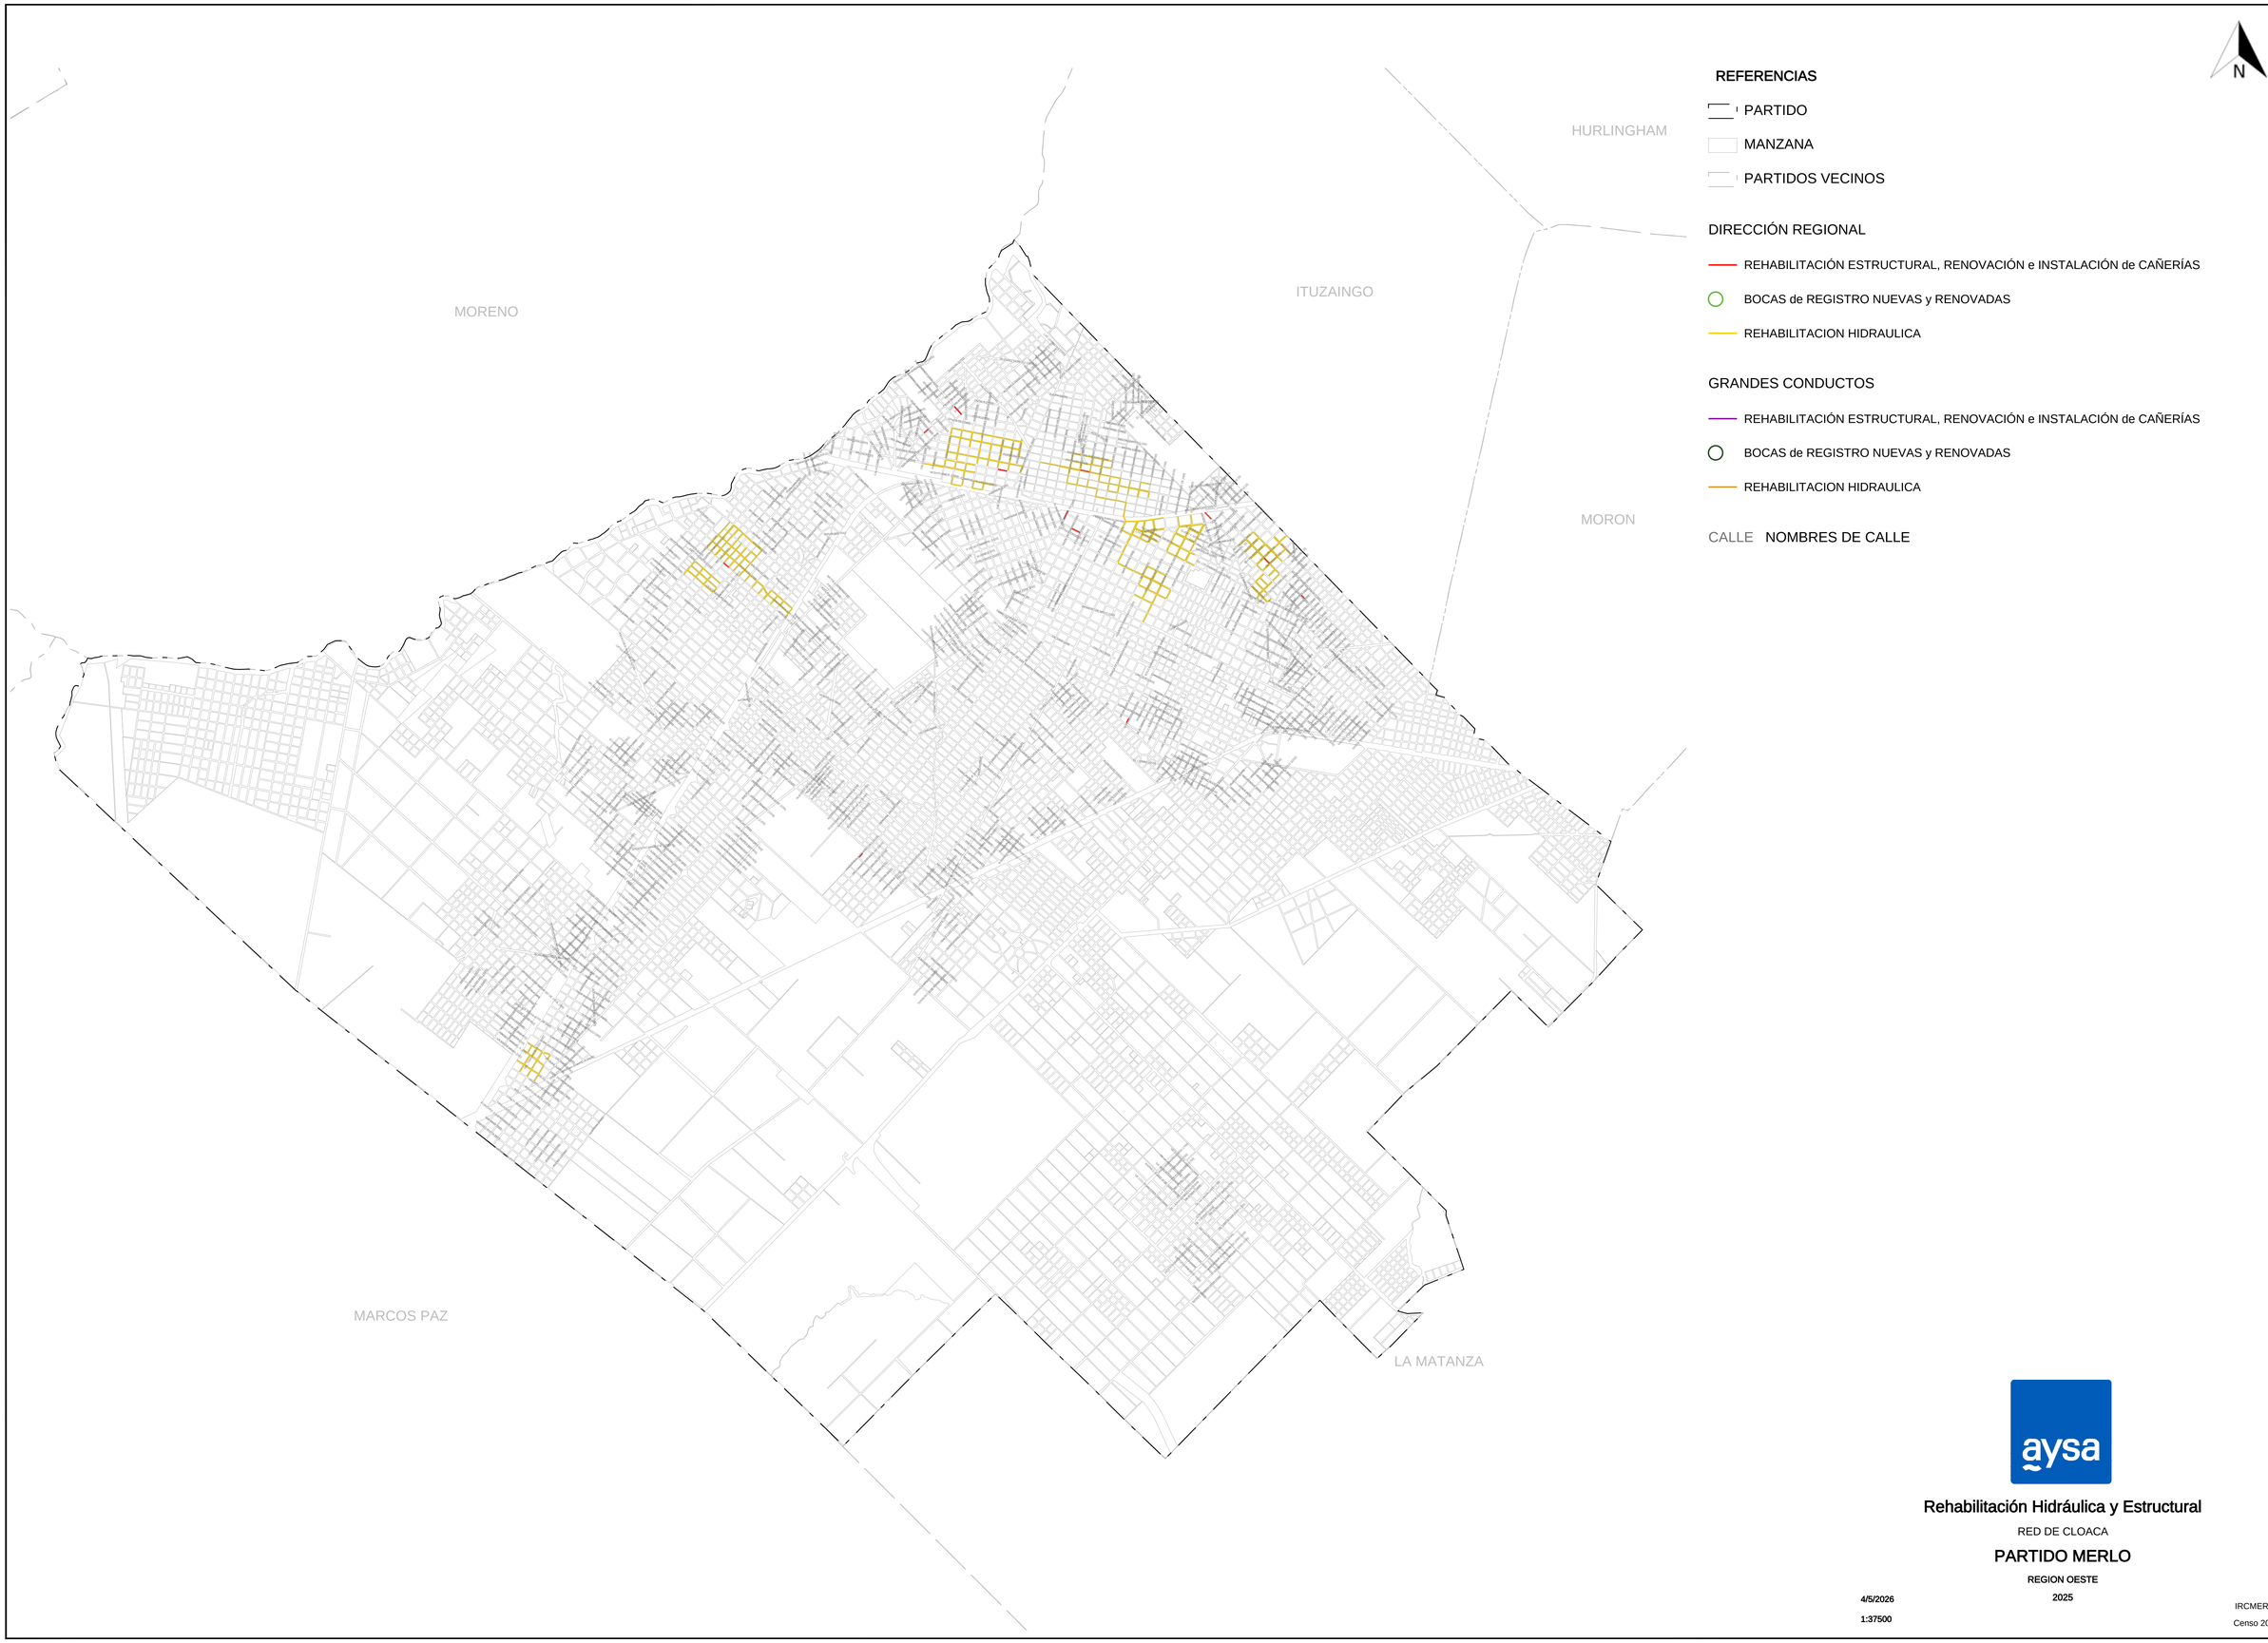

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO MERLO

REGION OESTE


2025


4/5/2026

1:37500

IRCMER20

Censo 2022

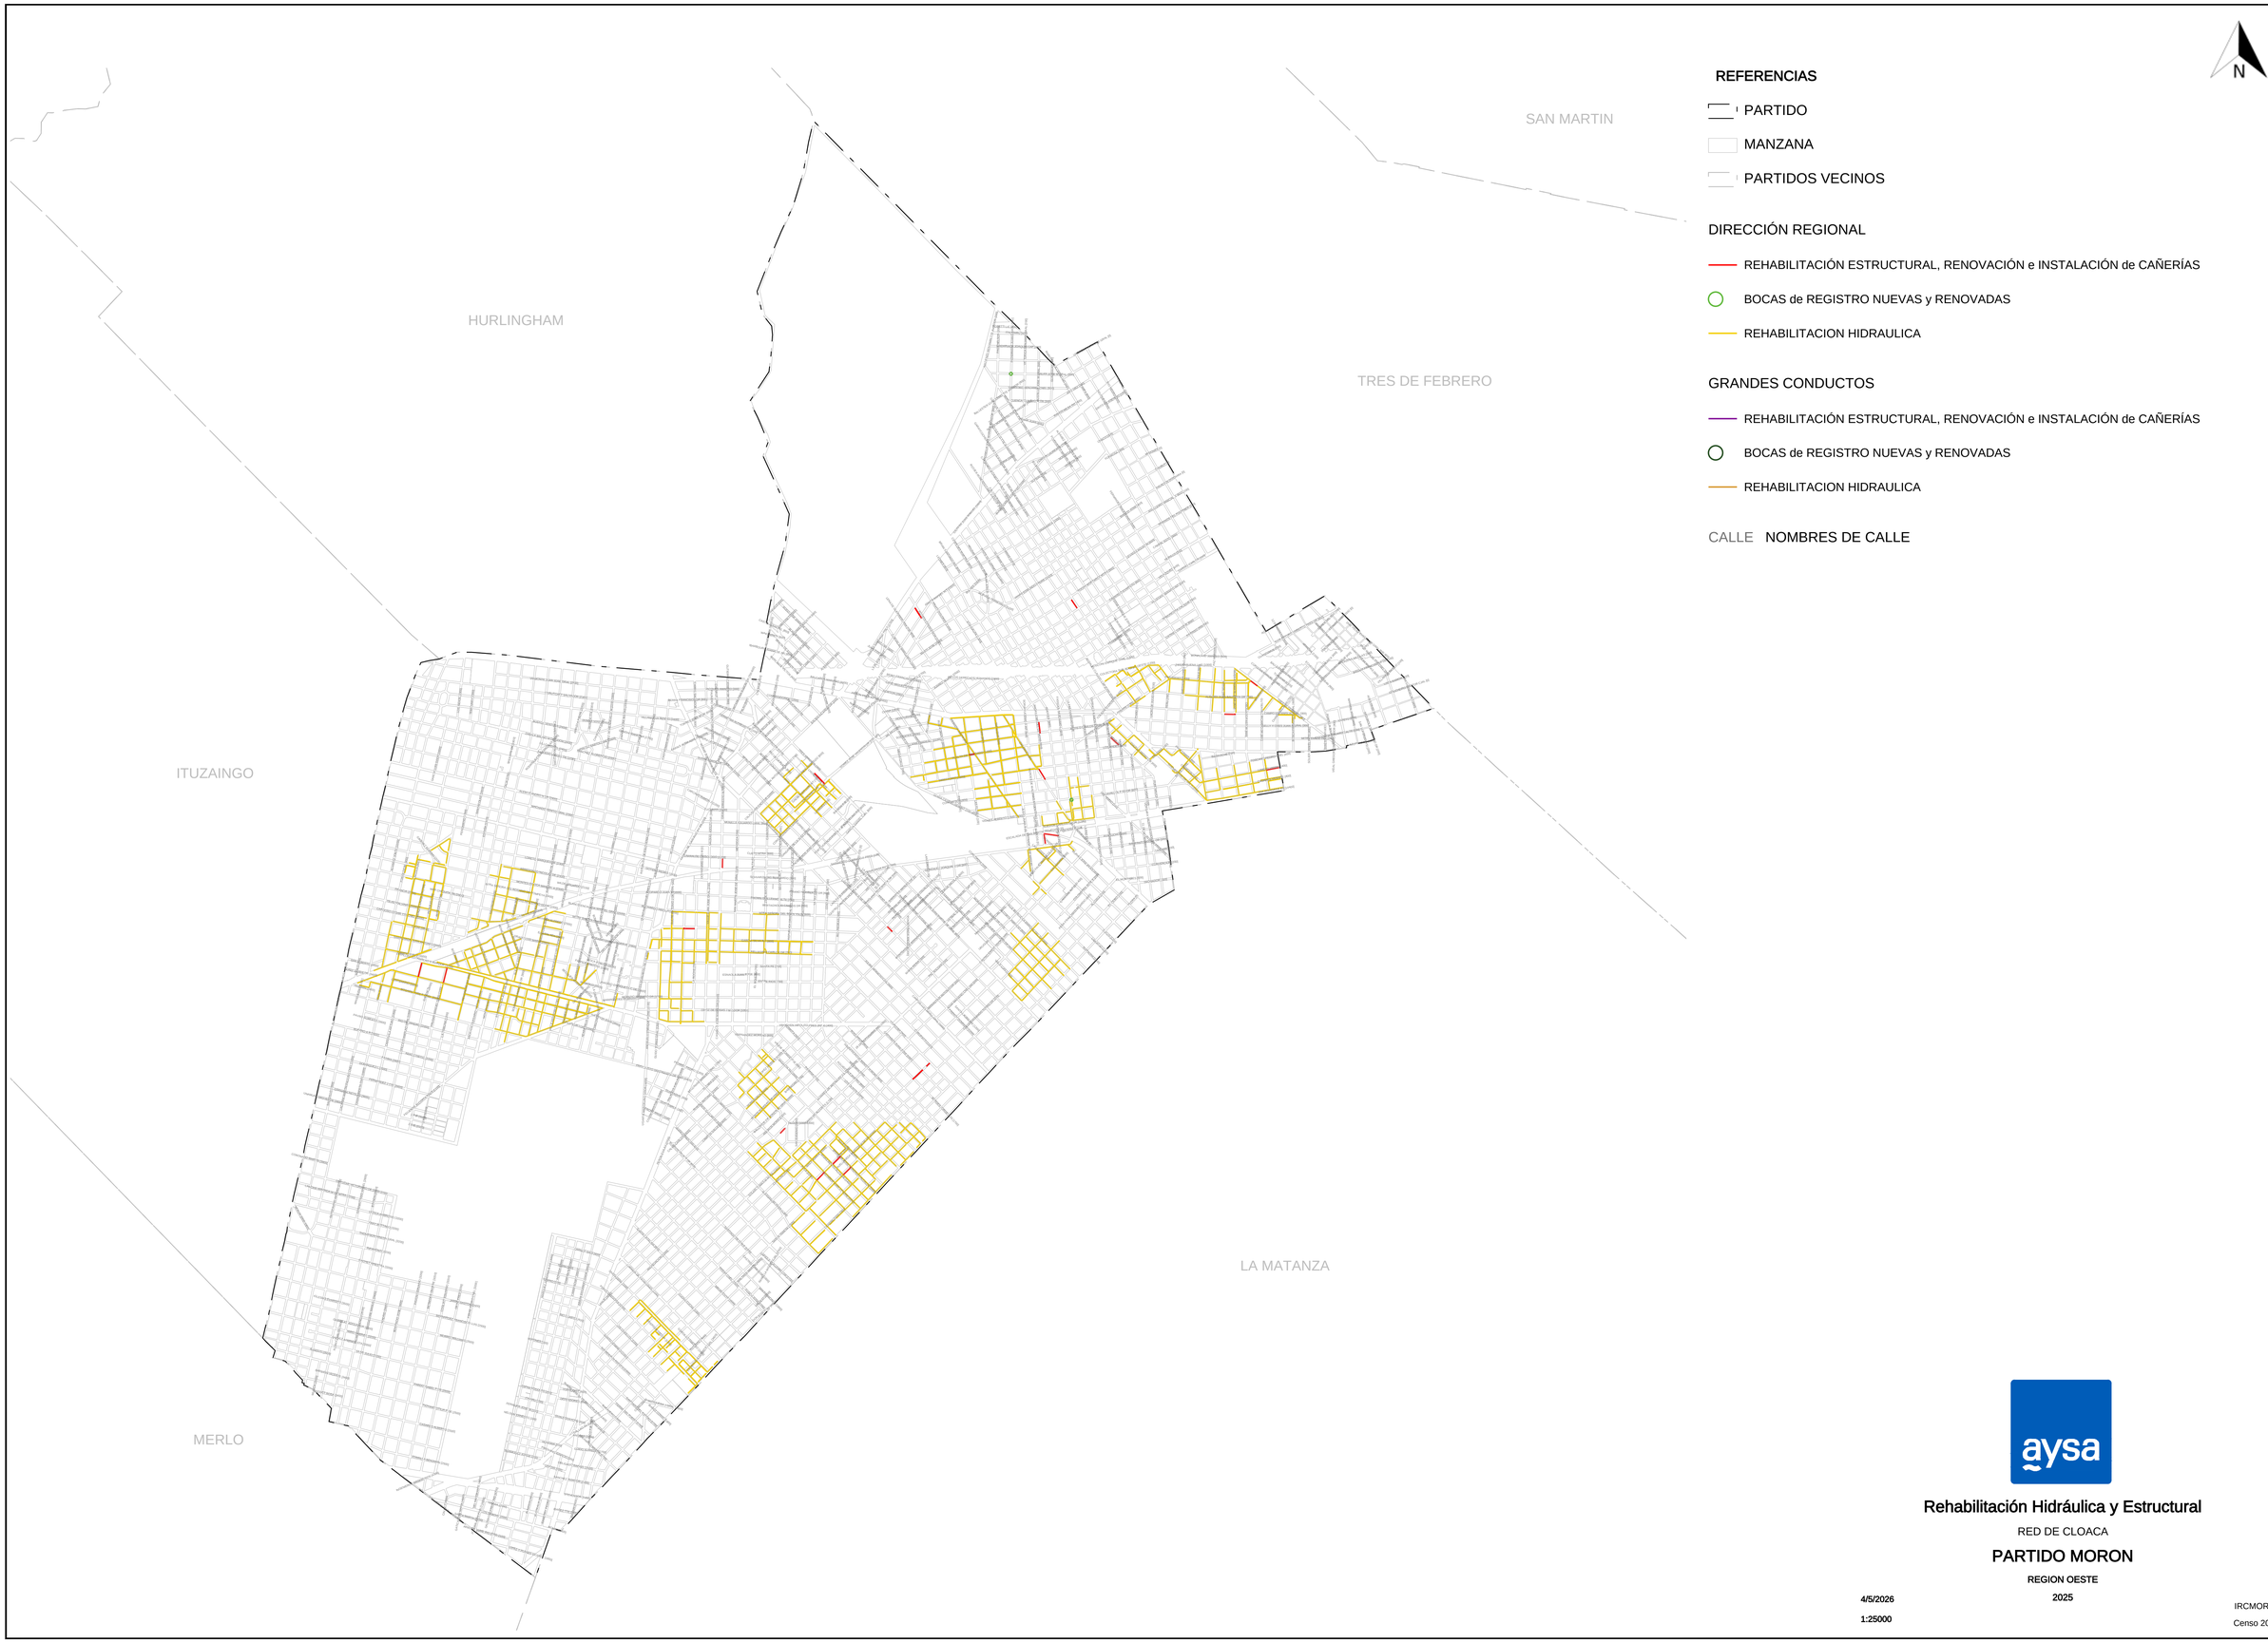
N
SAN MARTIN
HURLINGHAM
TRES DE FEBRERO
ITUZAINGO
LA MATANZA
MERLO
REFERENCIAS
PARTIDO
MANZANA
PARTIDOS VECINOS
DIRECCIÓN REGIONAL
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
REHABILITACION HIDRAULICA
GRANDES CONDUCTOS
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
REHABILITACION HIDRAULICA
CALLE NOMBRES DE CALLE
aysa
Rehabilitación Hidráulica y Estructural
RED DE CLOACA
PARTIDO MORON
REGION OESTE
2025
4/5/2026
1:25000
IRCMOR20
Censo 2022

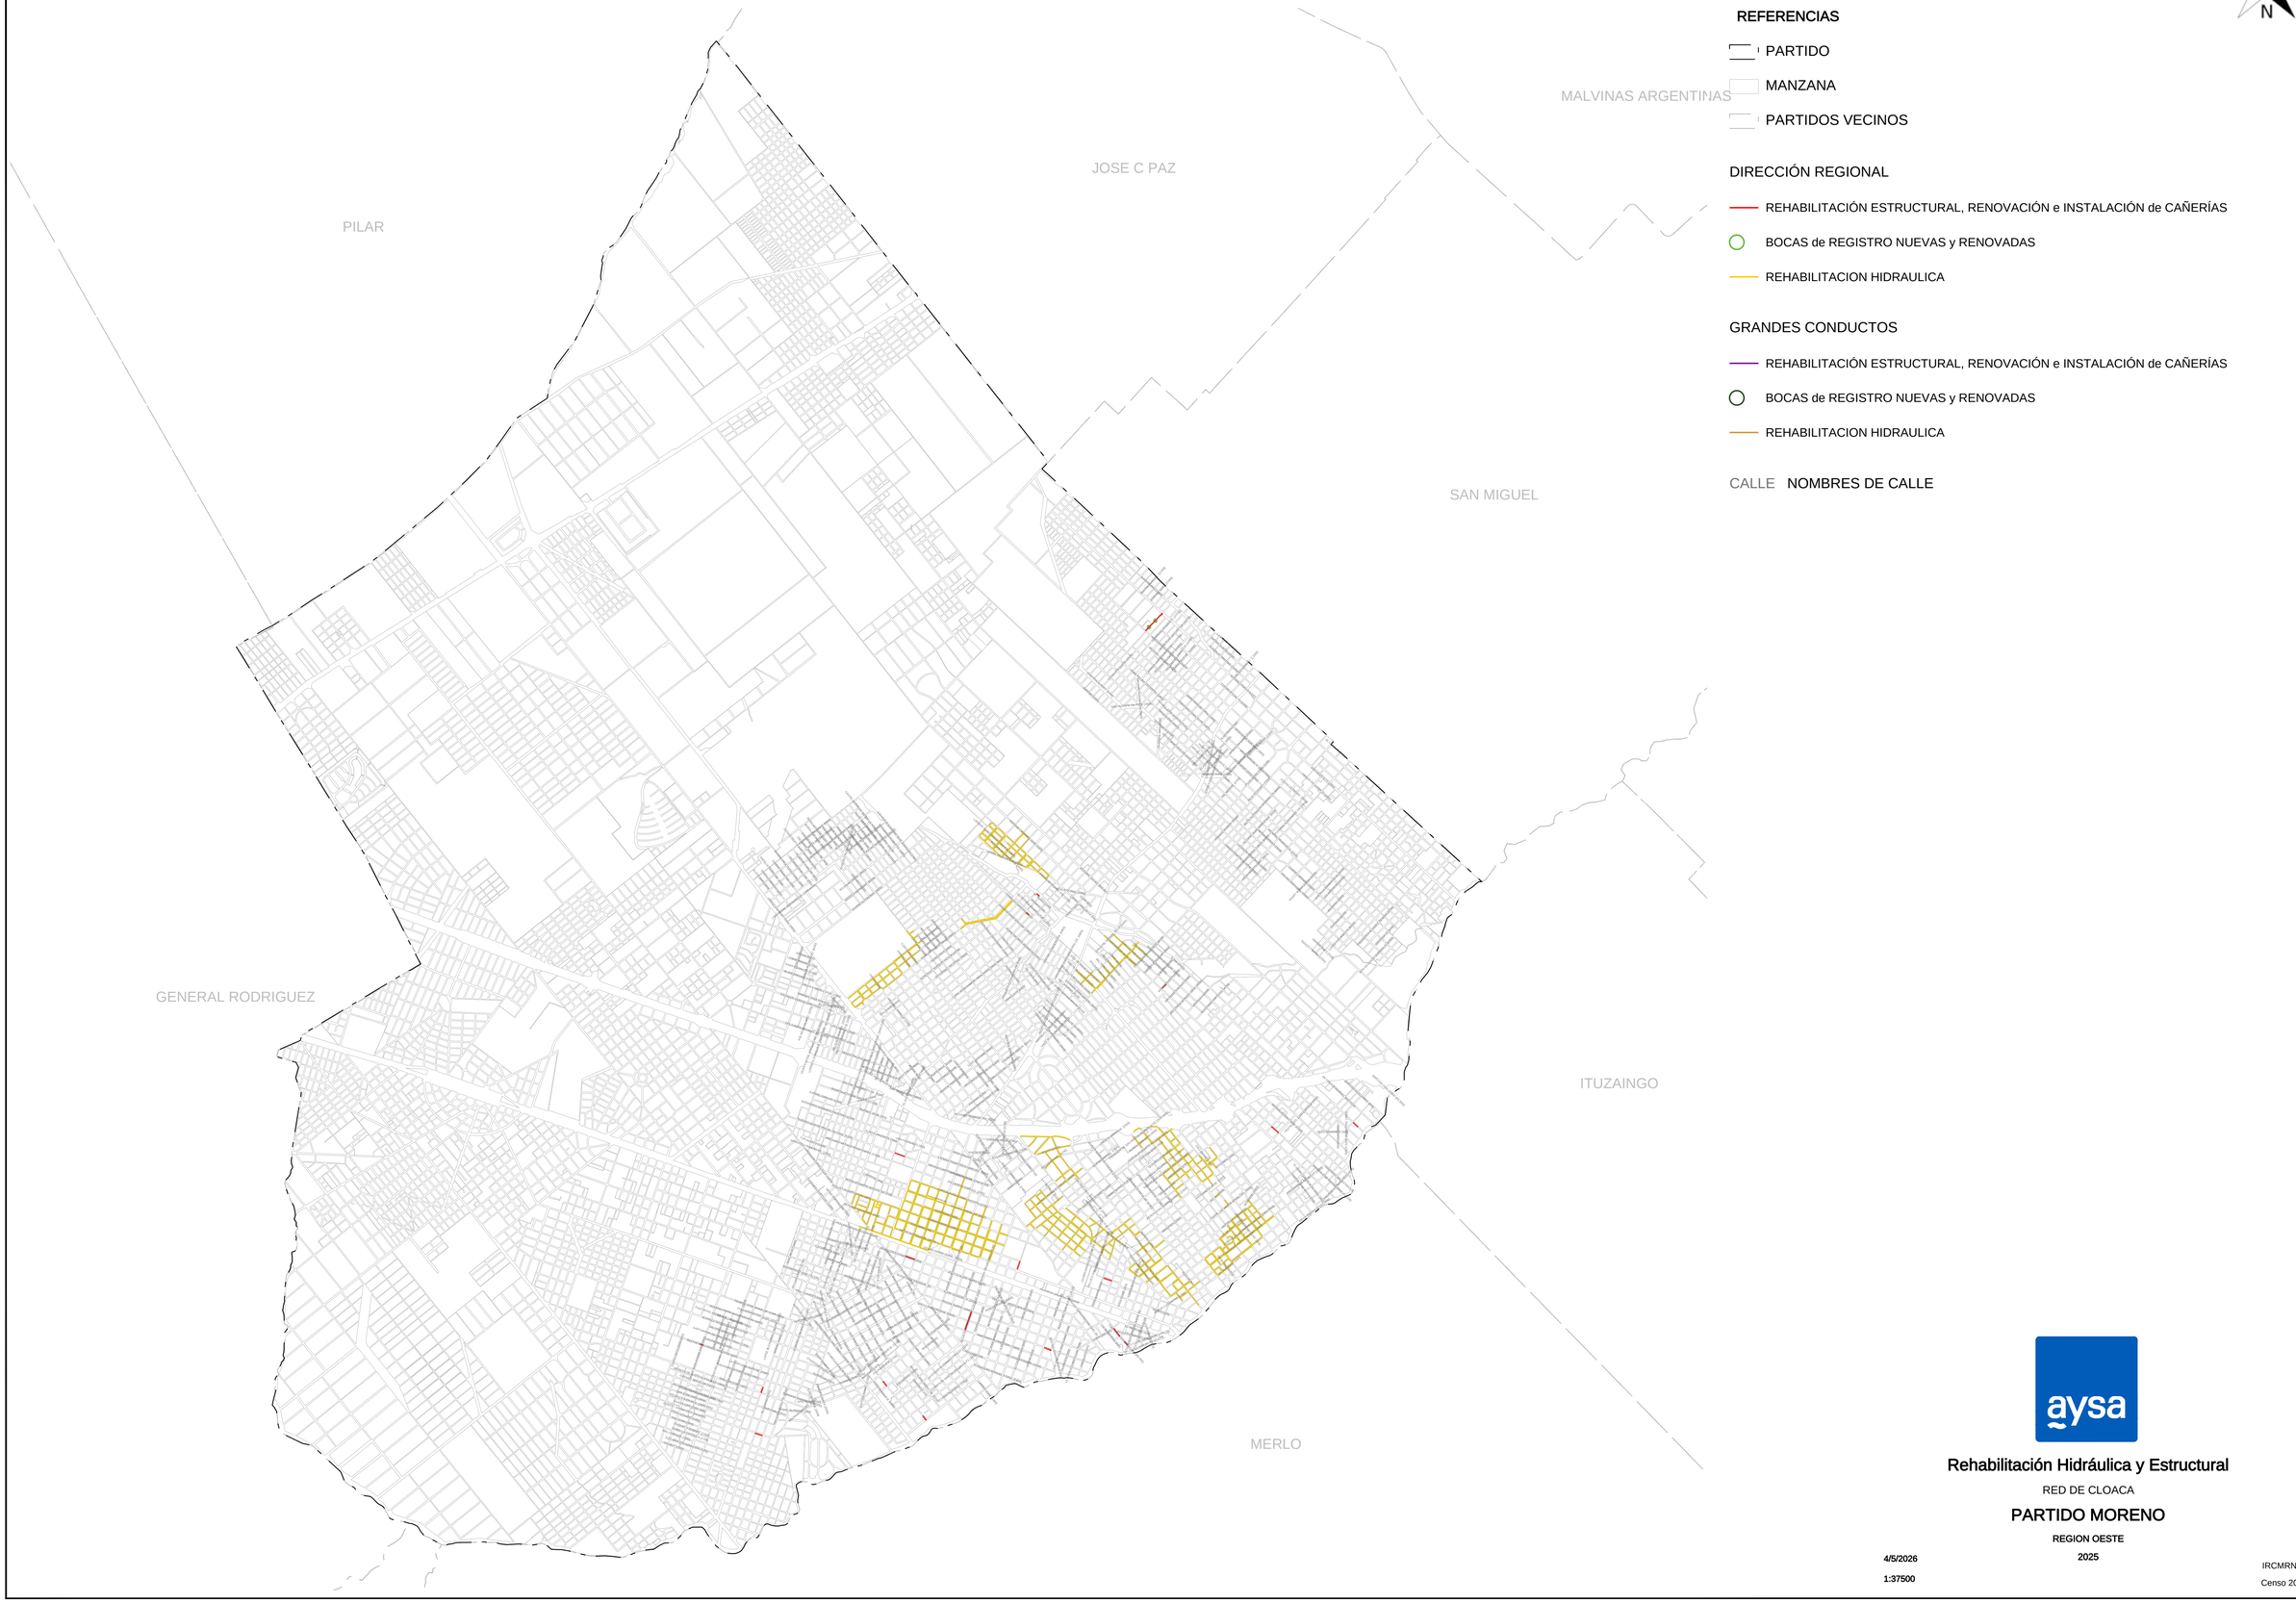

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO MORENO

REGION OESTE


2025

4/5/2026

1:37500

IRCMRN20

Censo 2022

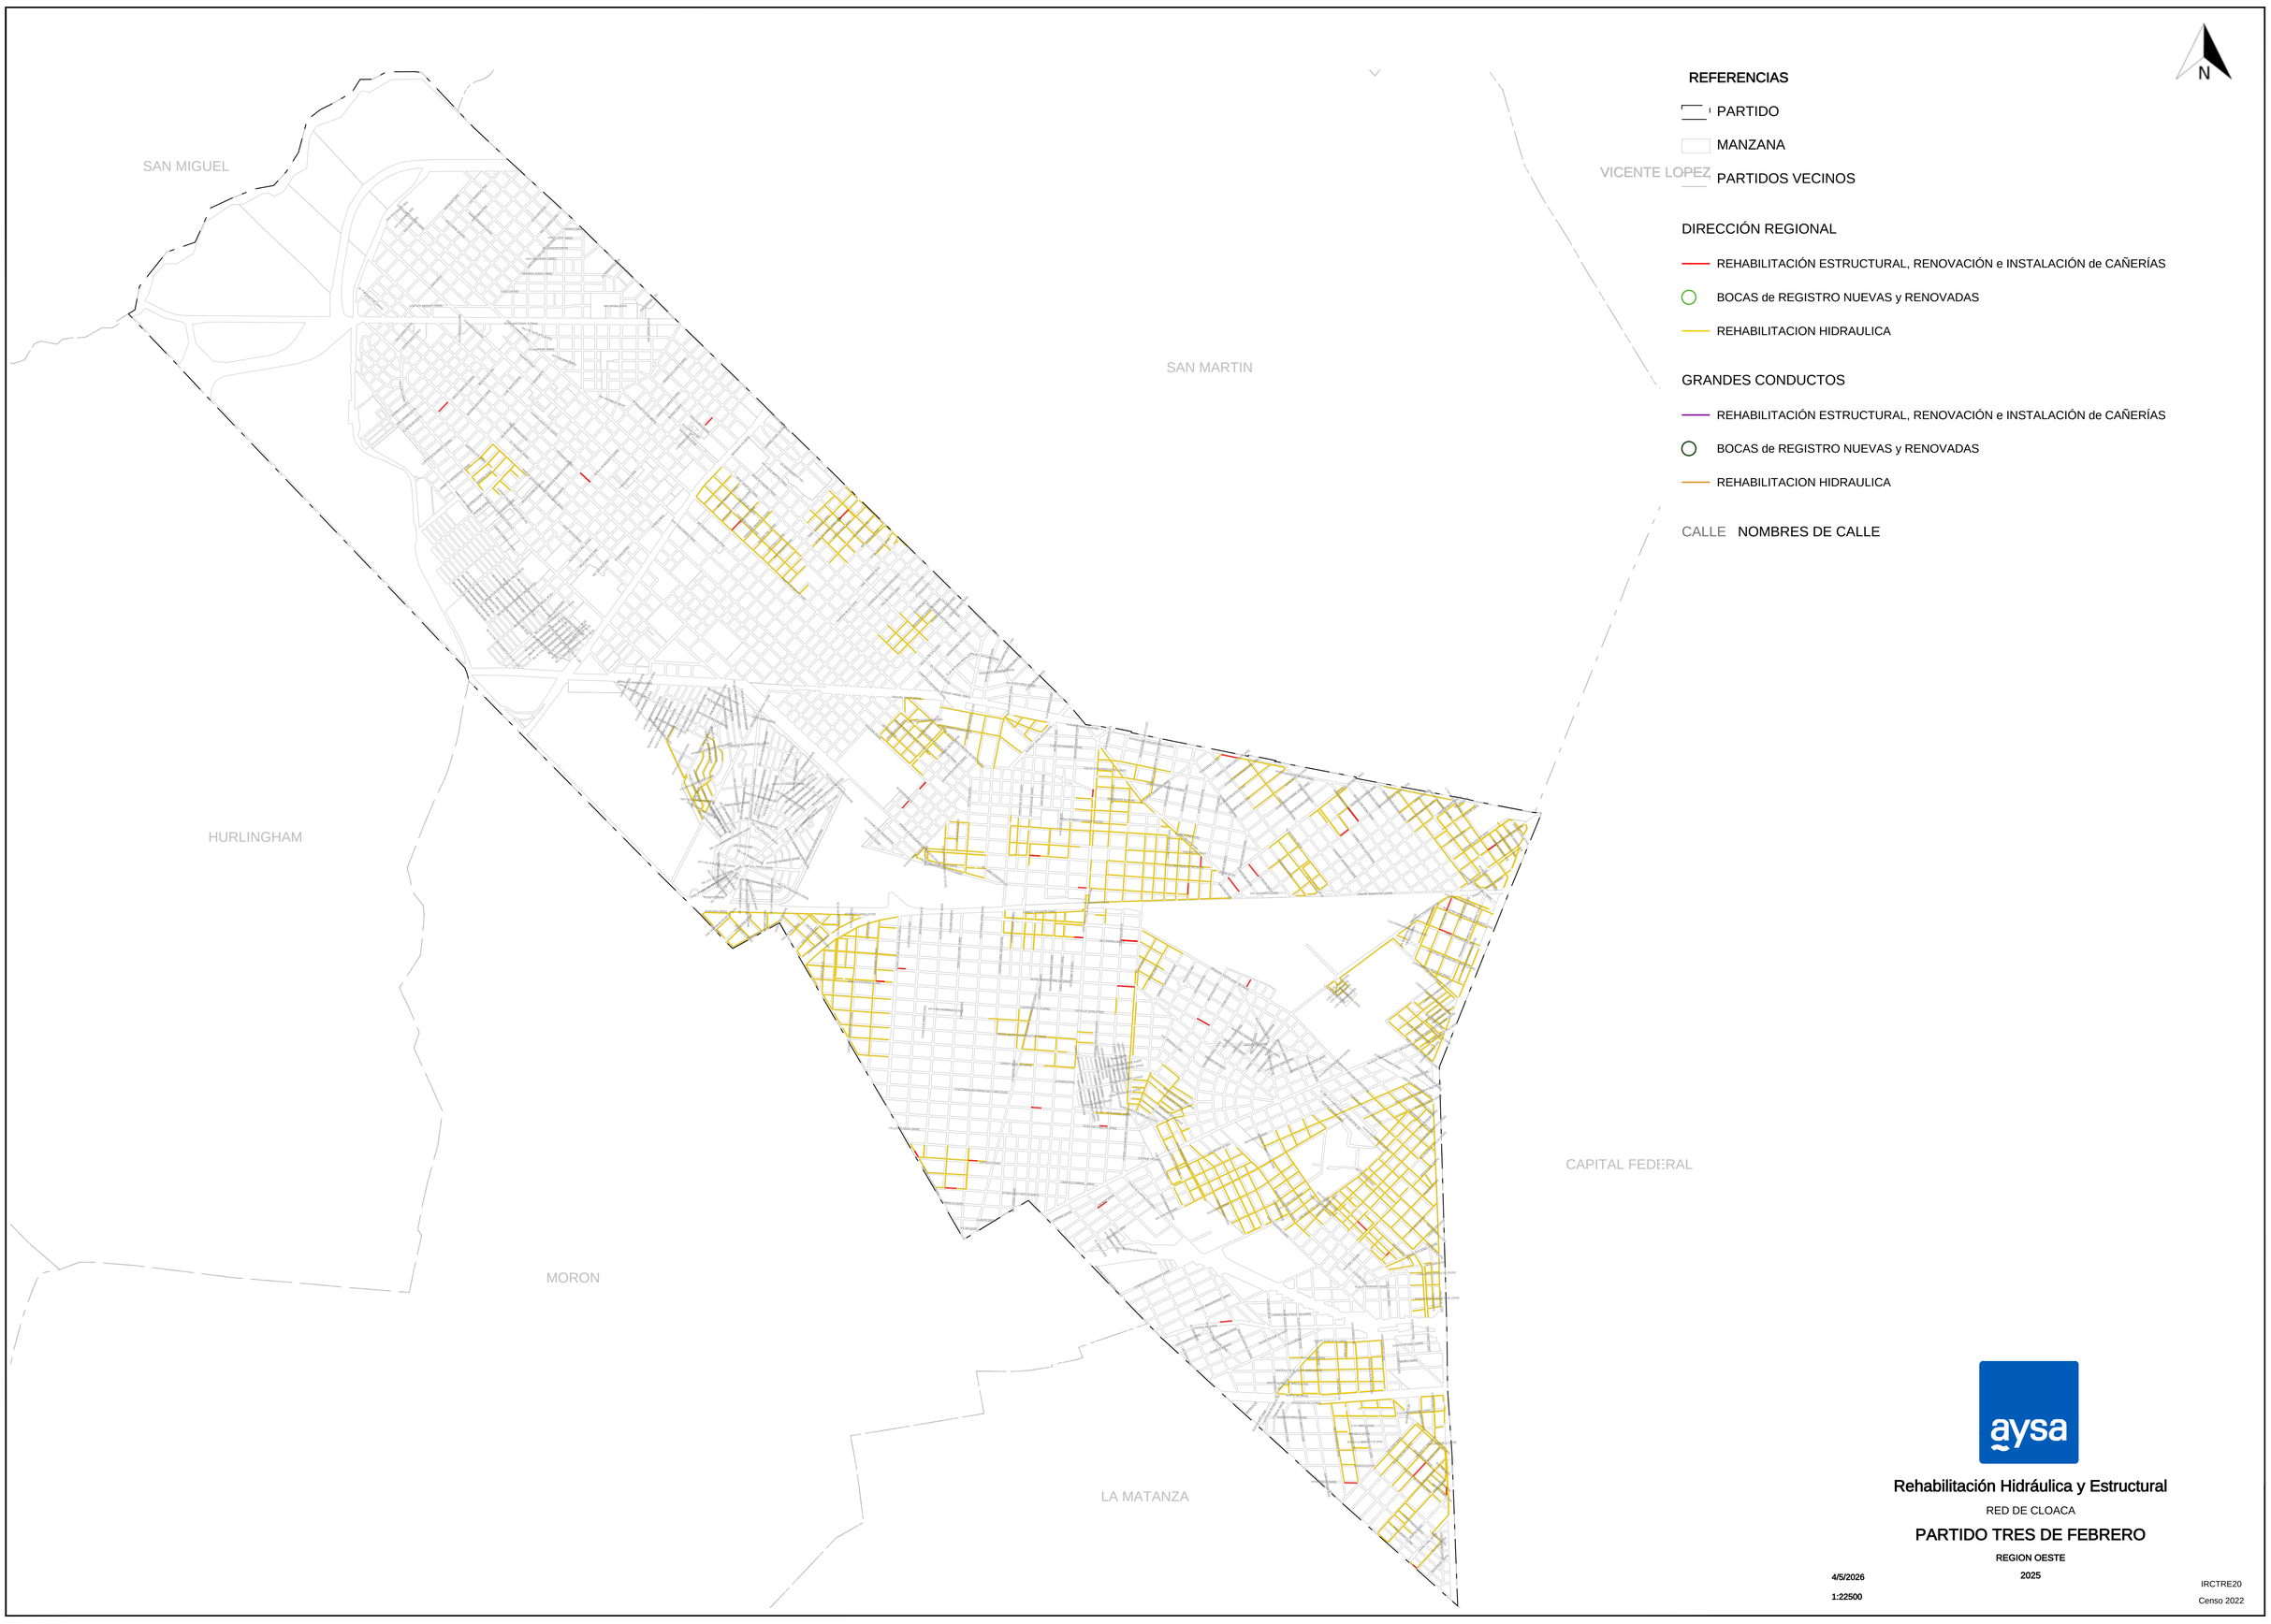

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO TRES DE FEBRERO

REGION OESTE

2025


4/5/2026

1:22500

IRCTRE20

Censo 2022

Rehabilitación Hidráulica y Estructural de redes de Desagües Cloacales Región Sudoeste

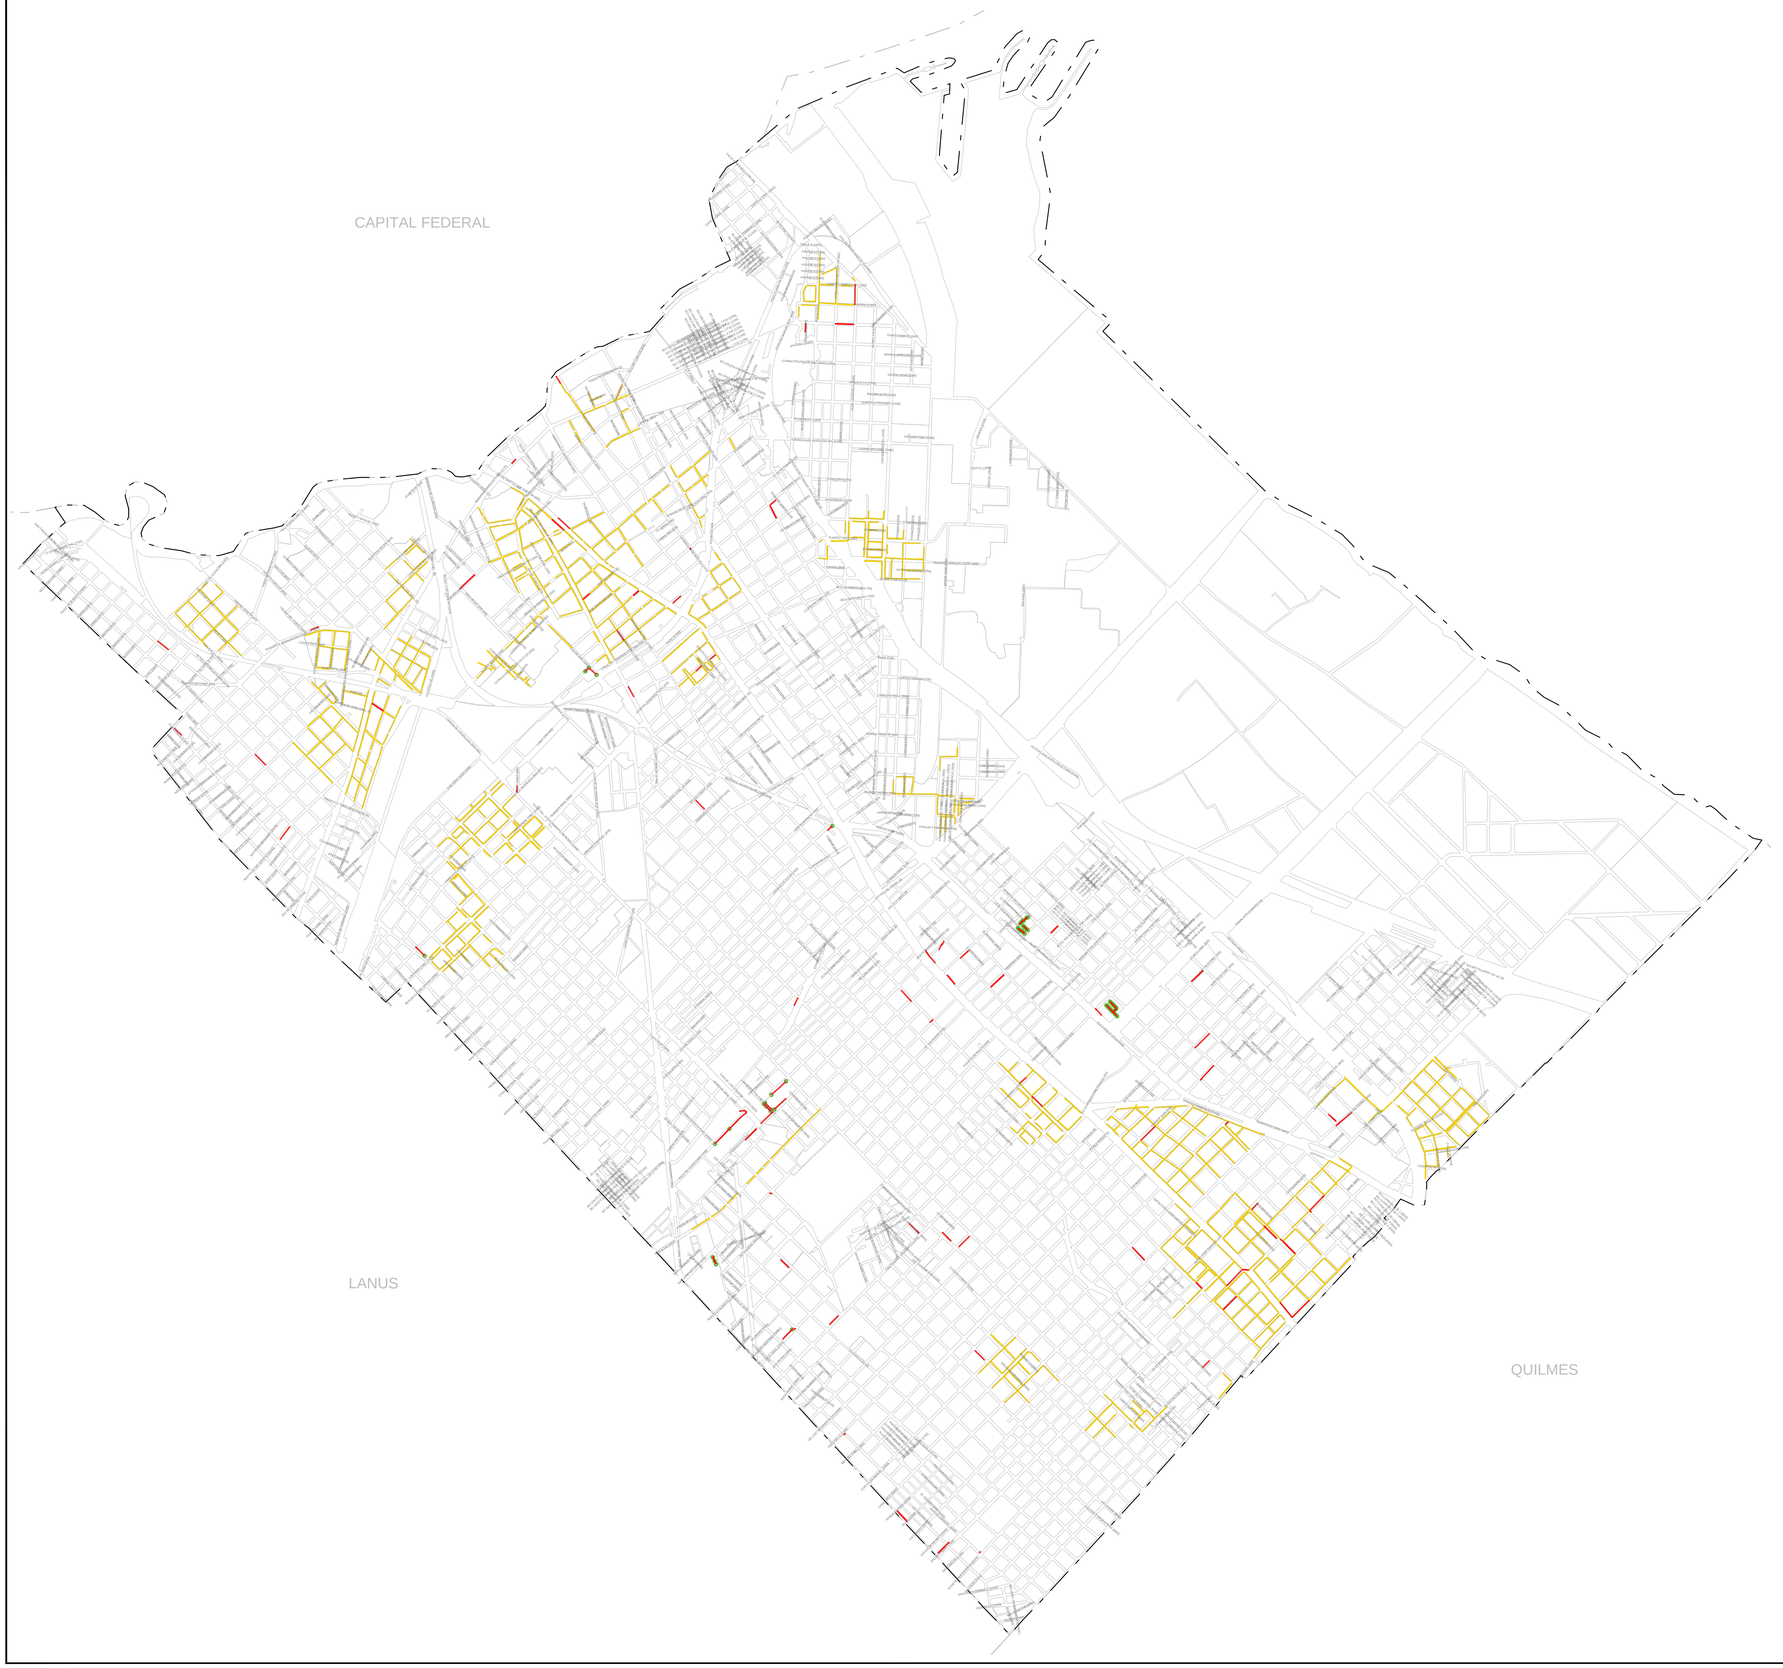

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO AVELLANEDA

REGION SUDESTE


2025

21/4/2026

1:20000

IRCAVE20

Censo 2022

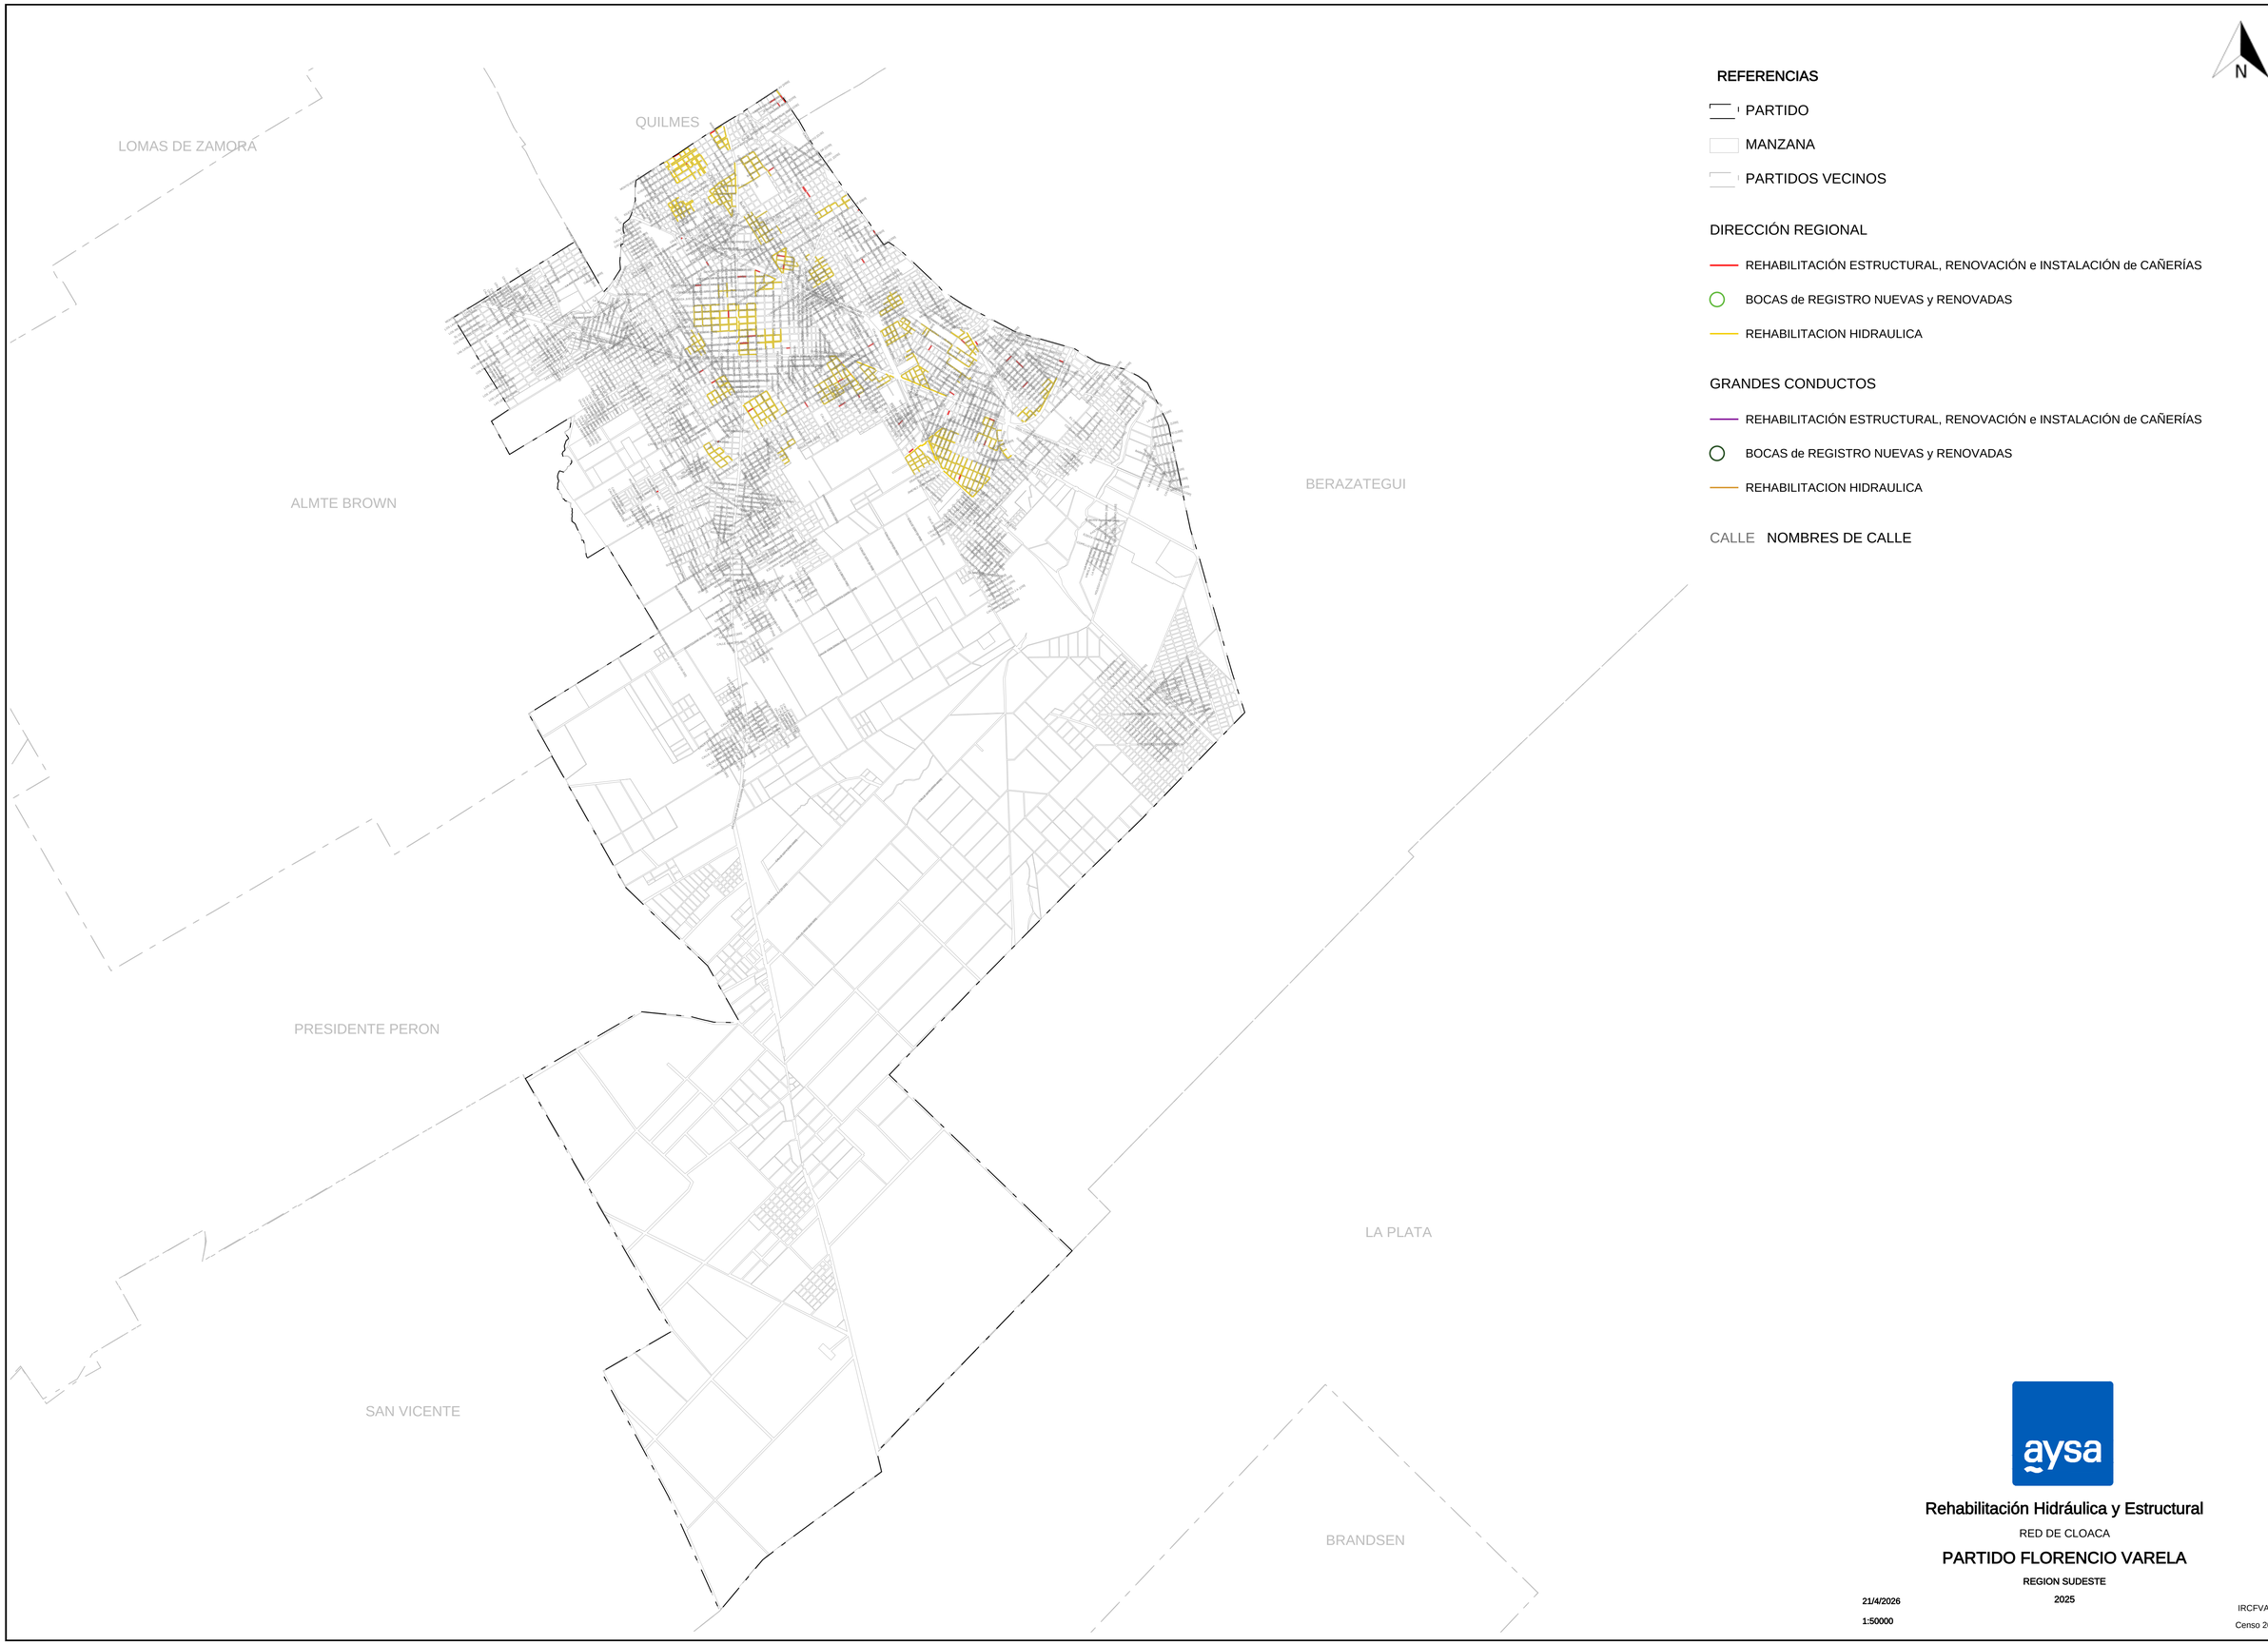

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO FLORENCIO VARELA

REGION SUDESTE


2025

21/4/2026

1:50000

IRCFVA20

Censo 2022

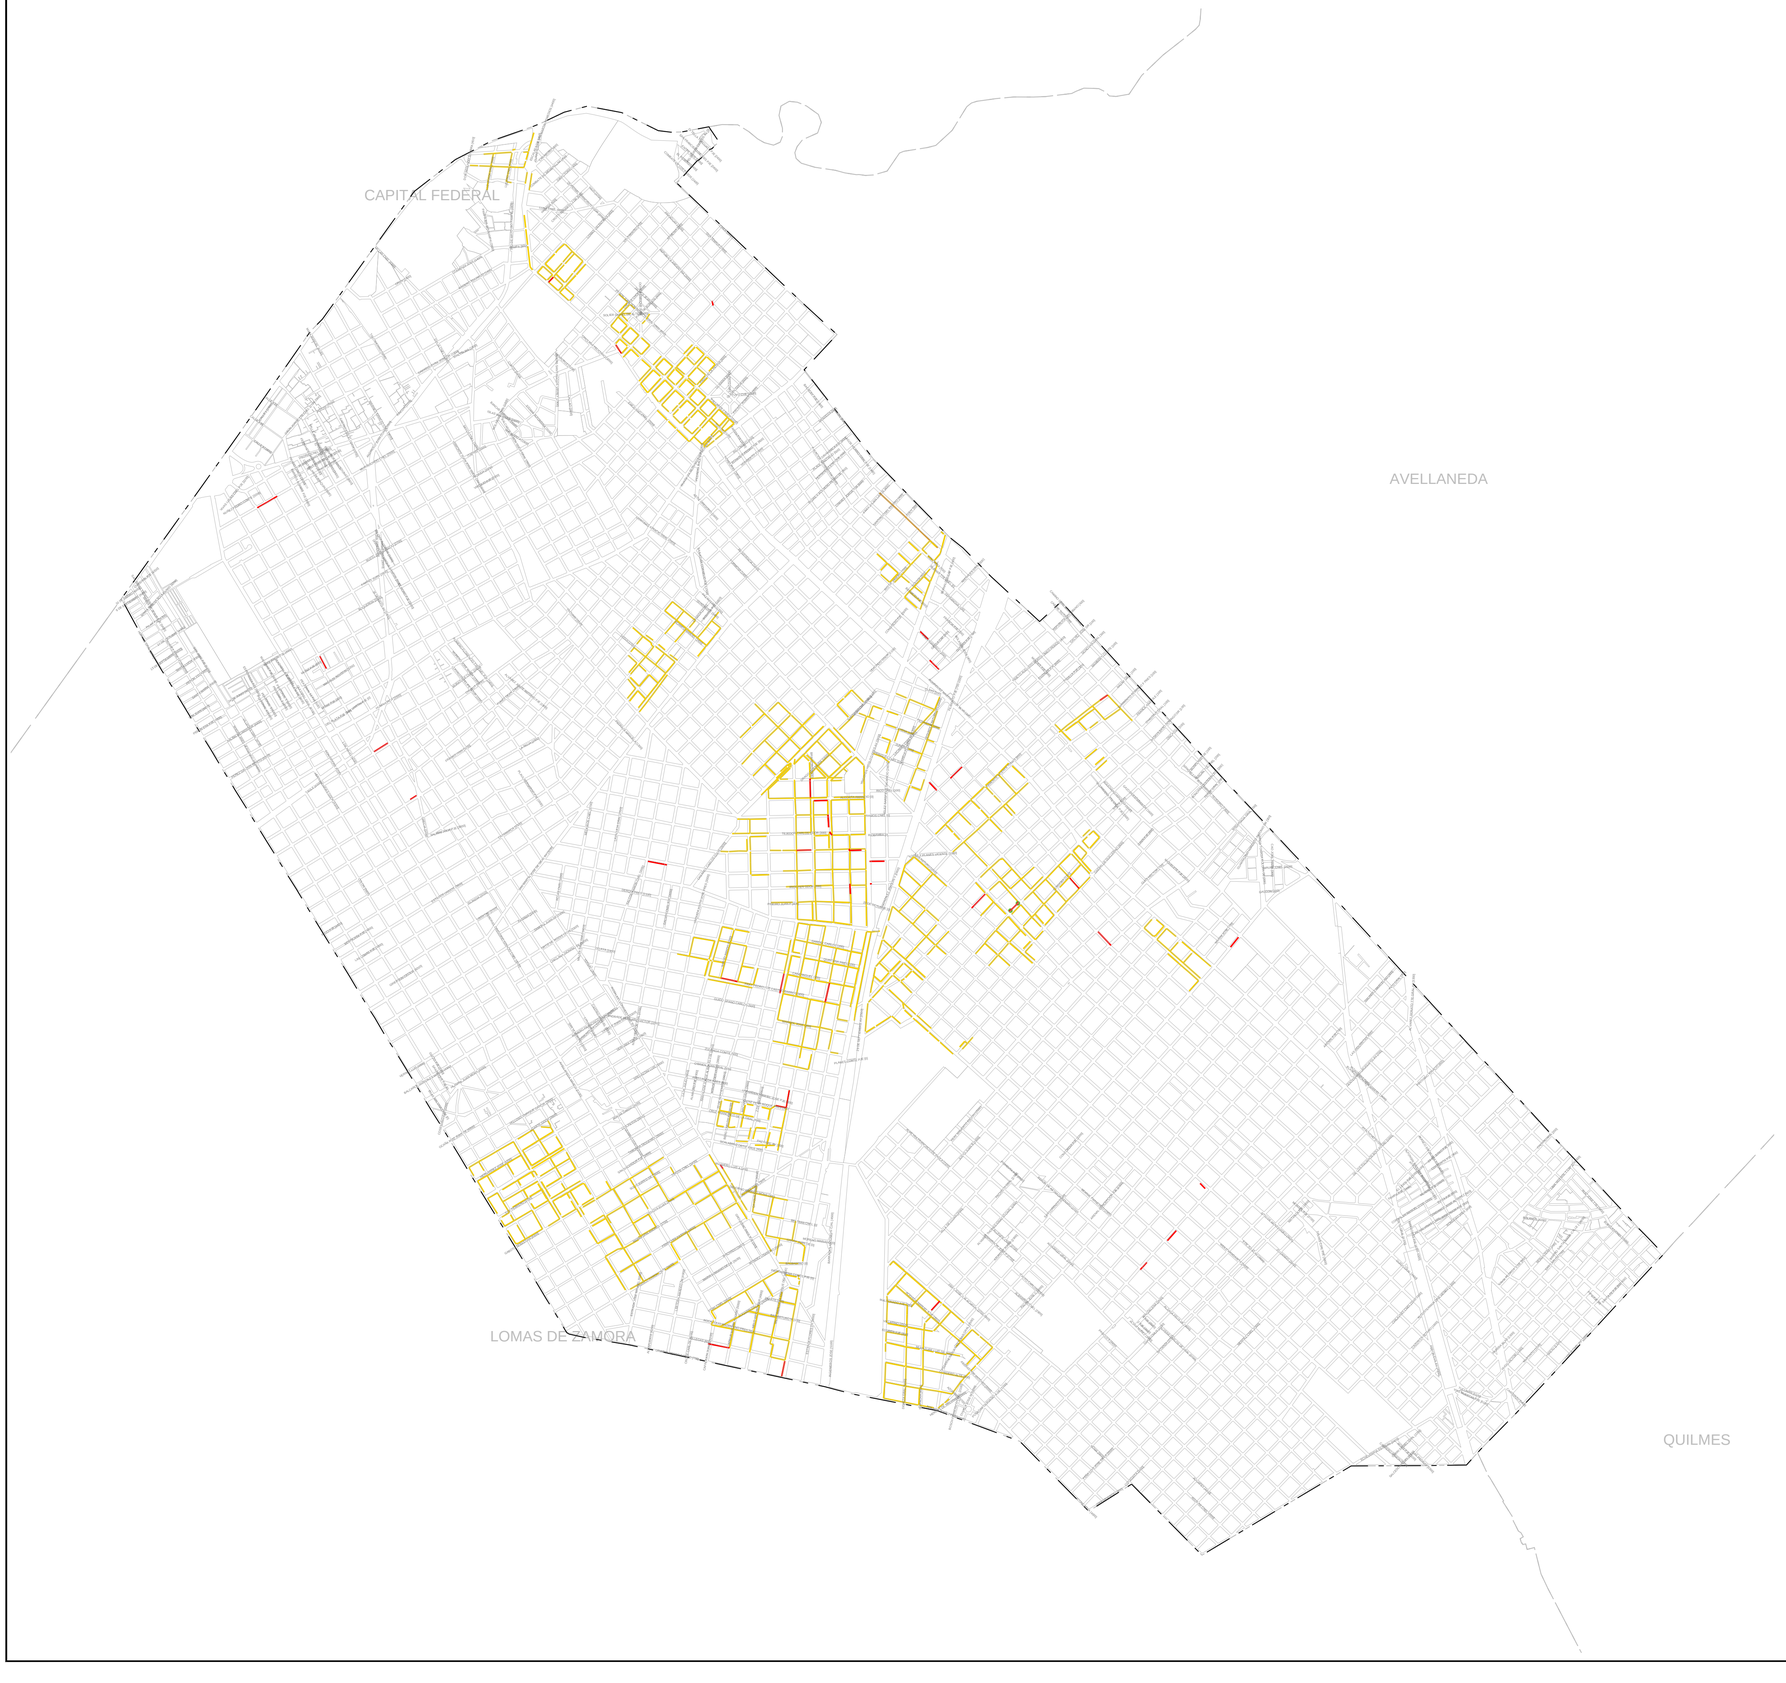

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO LANUS

REGION SUDESTE


2025

21/4/2026

1:20000

IRCLAN20

Censo 2022

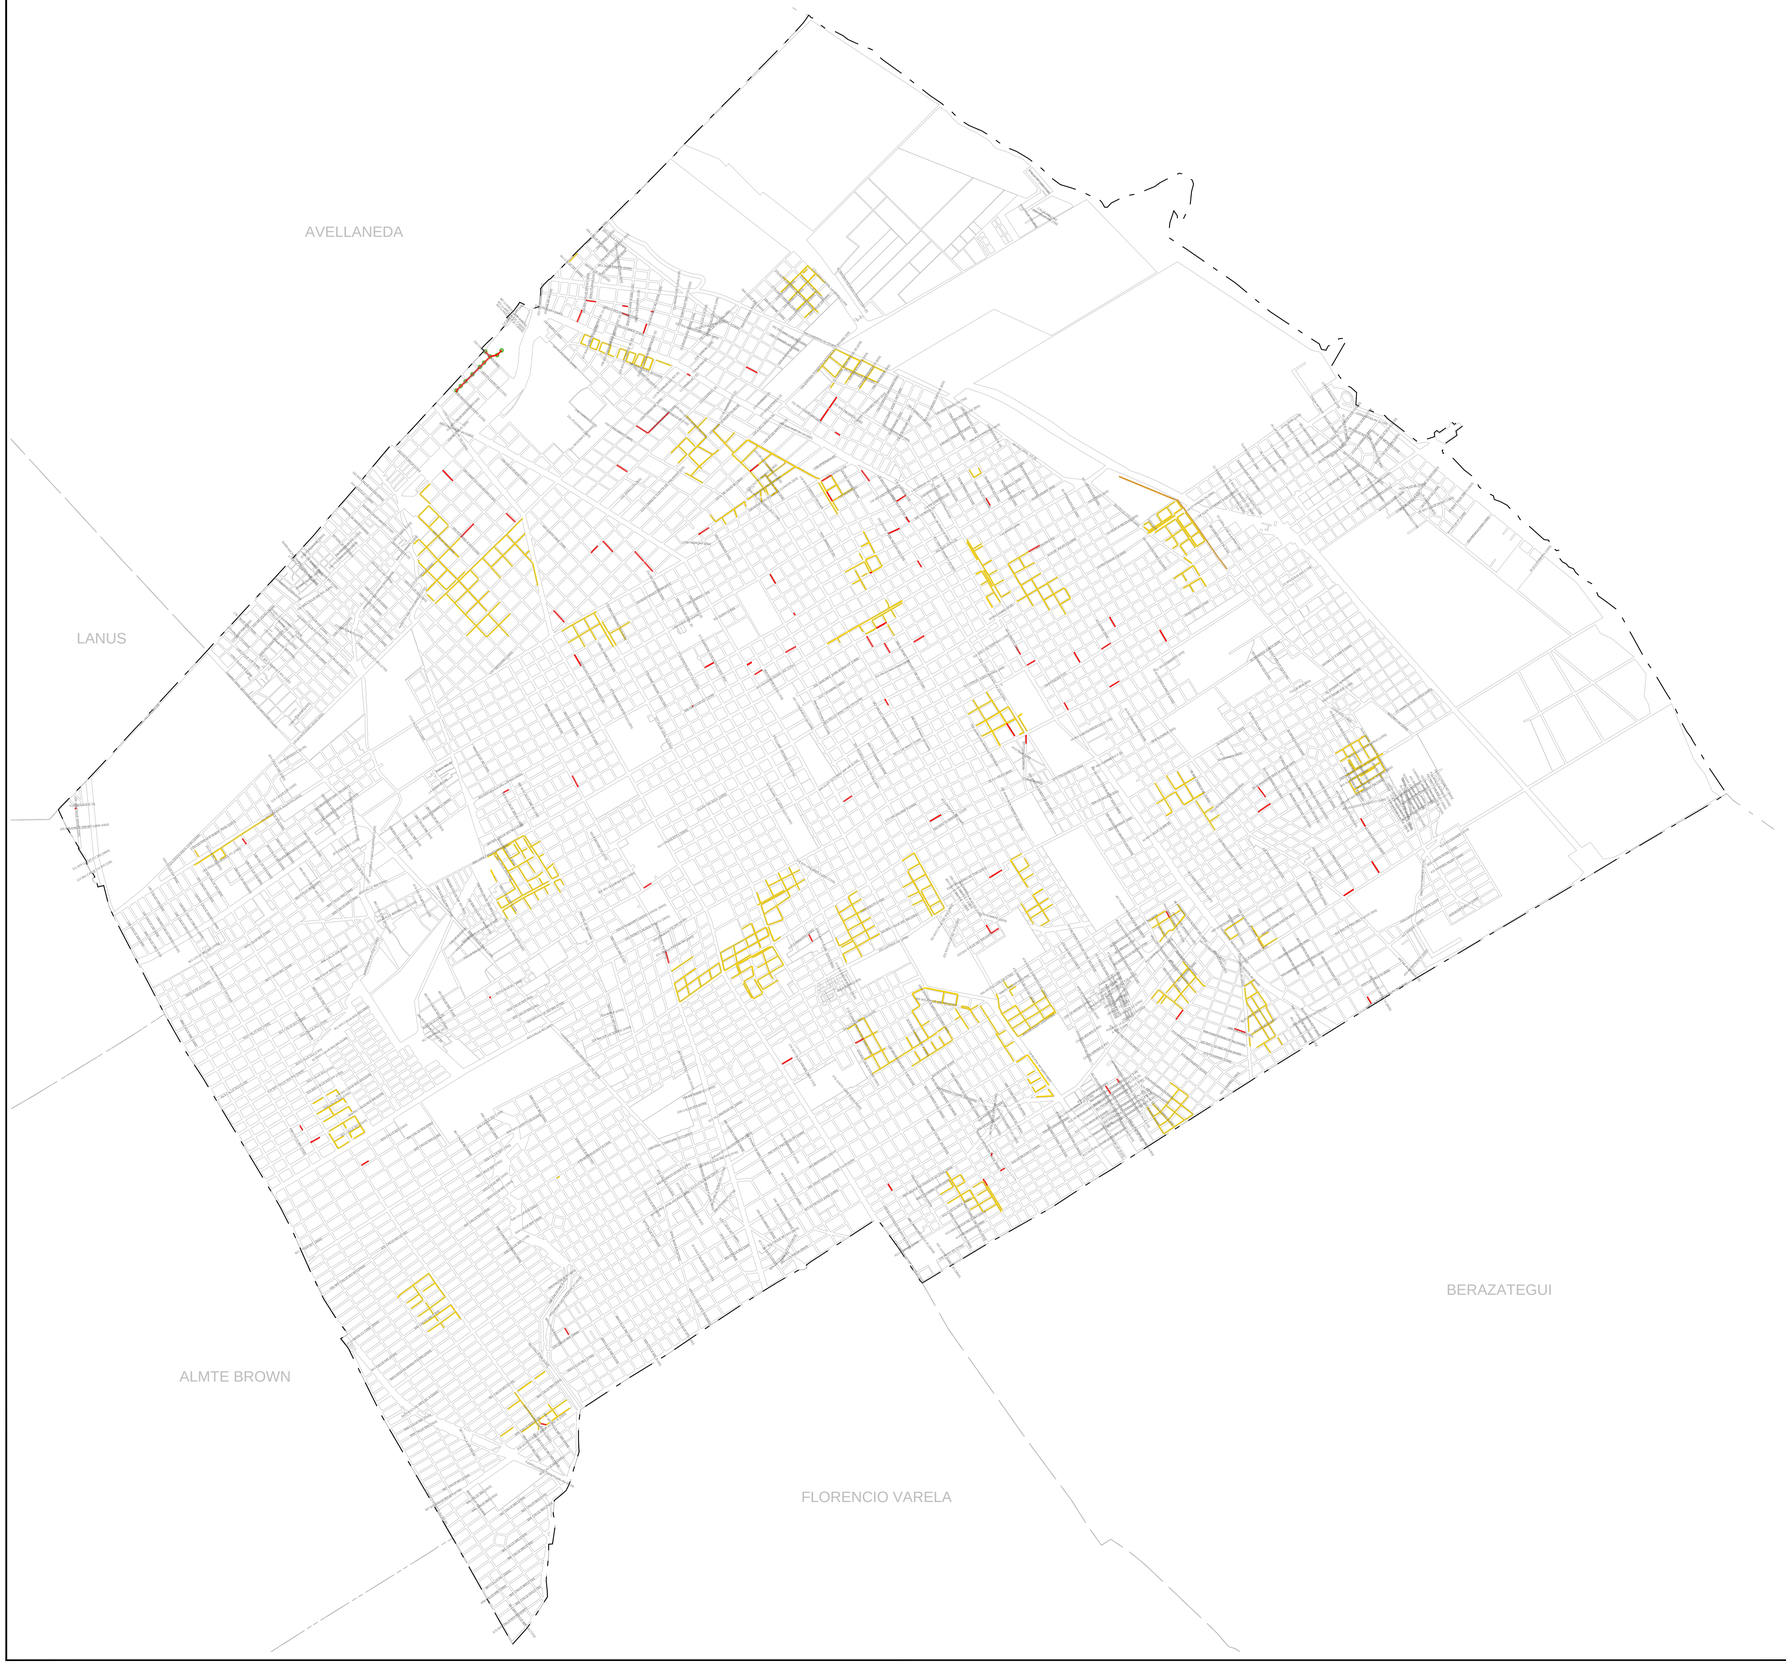

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO QUILMES

REGION SUDESTE

2025


21/4/2026

1:25000

IRCQLM20

Censo 2022

Rehabilitación Hidráulica y Estructural de redes de Desagües Cloacales Región Sudeste

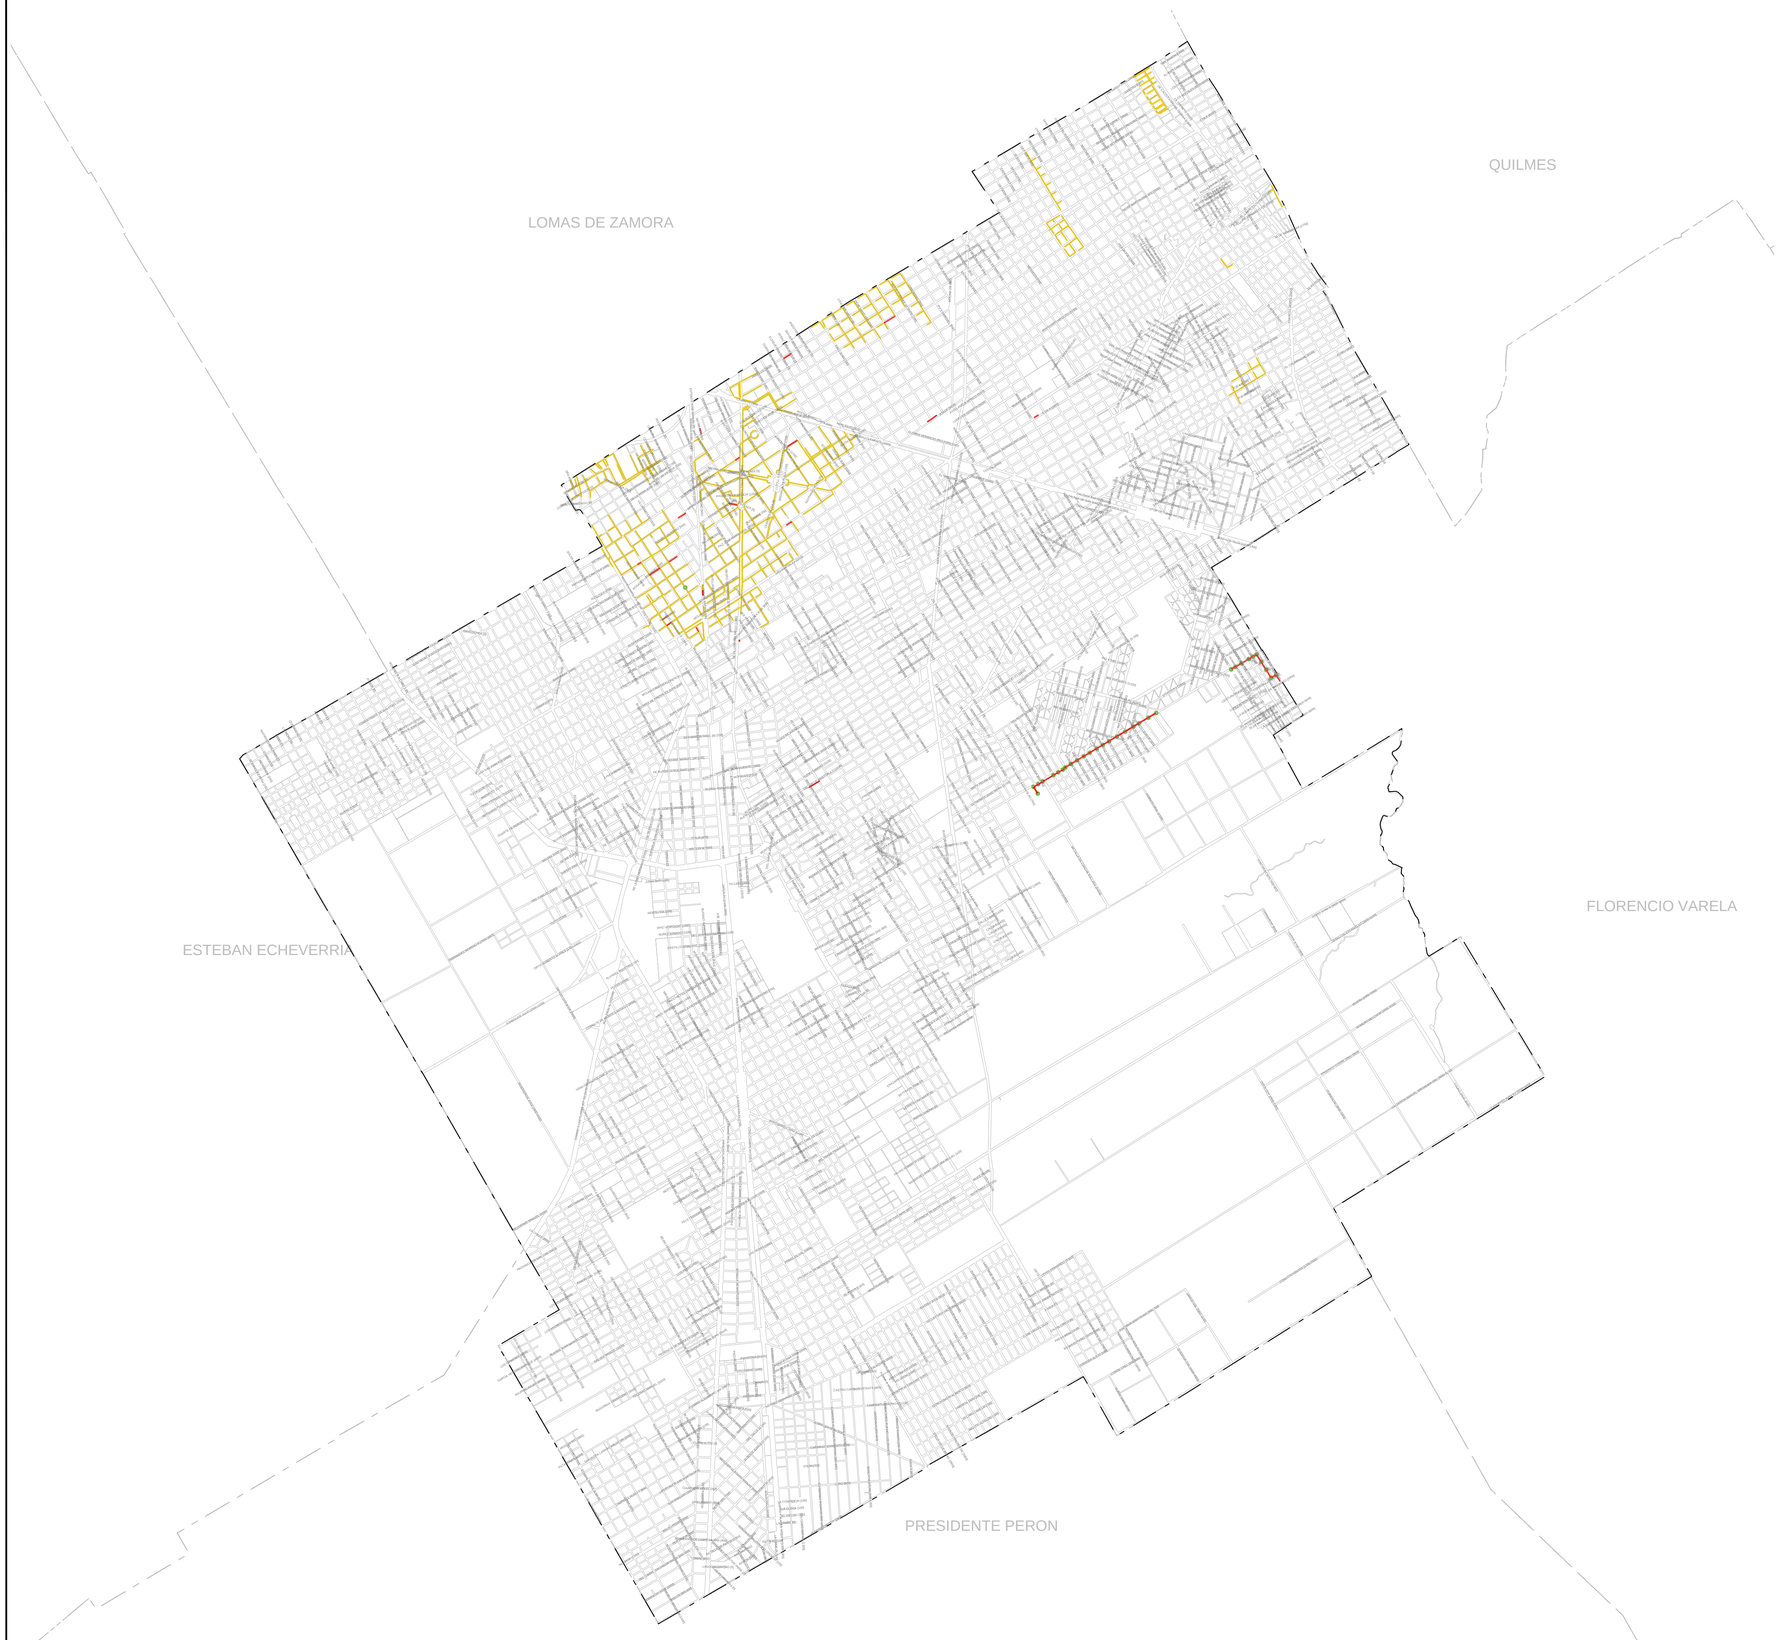

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO ALMTE BROWN

REGION SUDOESTE


2025

11/5/2026

1:32500

IRCALM20

Censo 2022

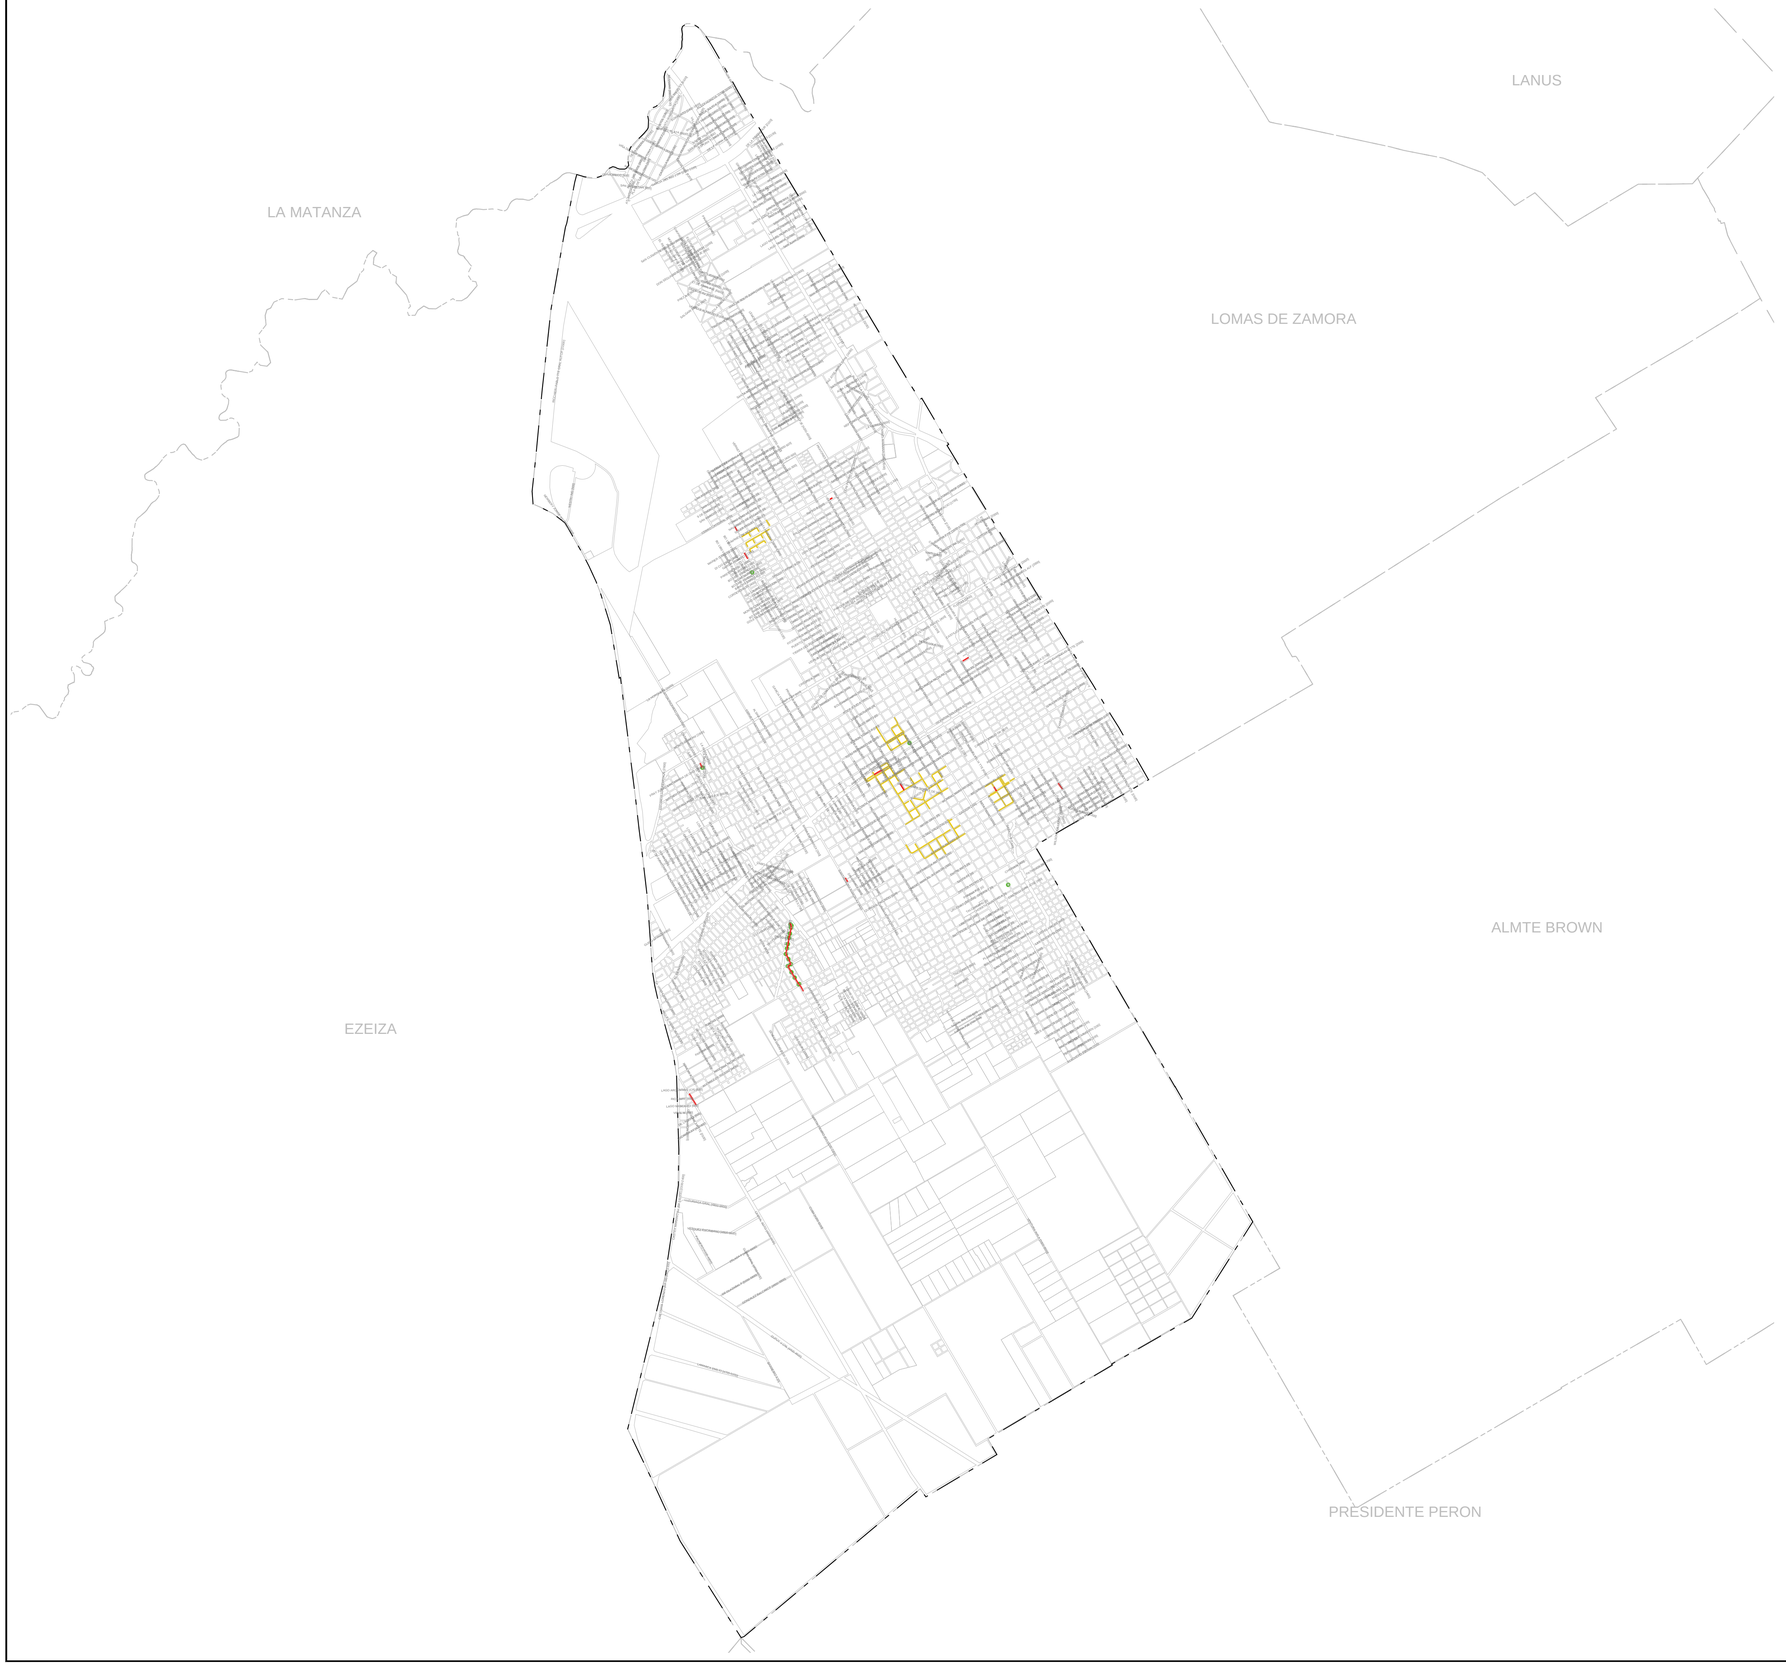

N

REFERENCIAS

- PARTIDO
- MANZANA
- PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

- REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS
- BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS
- REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO ESTEBAN ECHEVERRIA

REGION SUDOESTE


2025

11/5/2026

1:42500

IRCEST20

Censo 2022

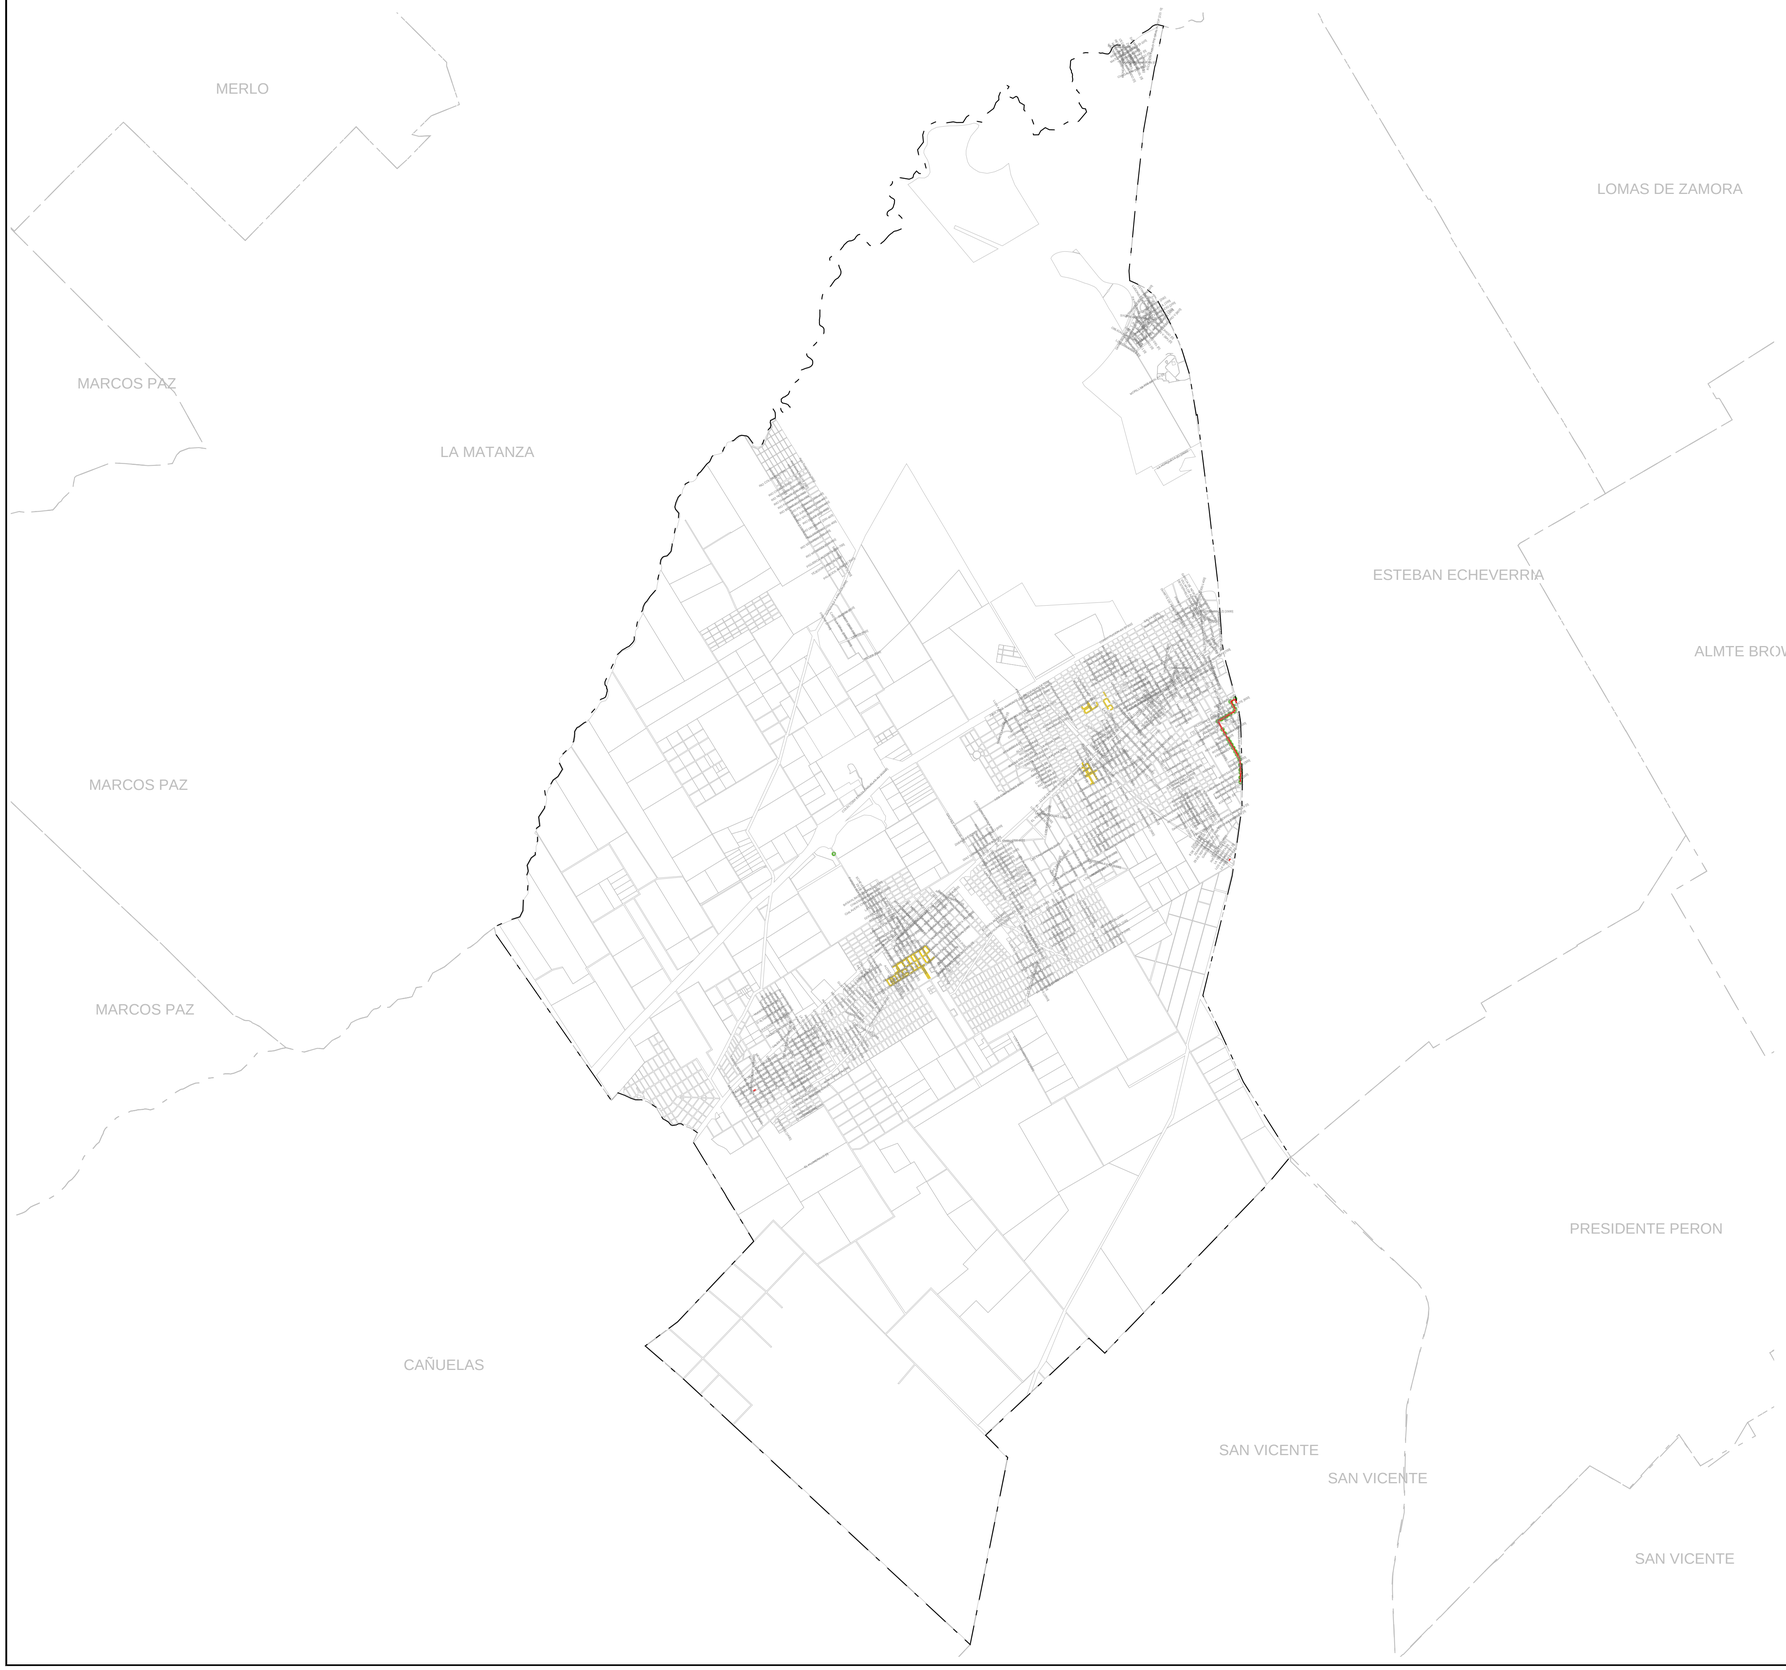

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO EZEIZA

REGION SUDOESTE

2025

11/5/2026

1:55000

IRCEZE20

Censo 2022

CAPITAL FEDERAL

LA MATANZA

LANUS

AVELLANEDA

QUILMES

ESTEBAN ECHEVERRIA

ALMTE BROWN

N

REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO LOMAS DE ZAMORA

REGION SUDOESTE

11/5/2026

1:27500

2025

IRCLOM20

Censo 2022



REFERENCIAS

PARTIDO

MANZANA

PARTIDOS VECINOS

DIRECCIÓN REGIONAL

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

GRANDES CONDUCTOS

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL, RENOVACIÓN e INSTALACIÓN de CAÑERÍAS

BOCAS de REGISTRO NUEVAS y RENOVADAS

REHABILITACION HIDRAULICA

CALLE NOMBRES DE CALLE

aysa

Rehabilitación Hidráulica y Estructural

RED DE CLOACA

PARTIDO PRESIDENTE PERON

REGION SUDOESTE

11/5/2026

2025


IRCPPE20


1:35000

Censo 2022





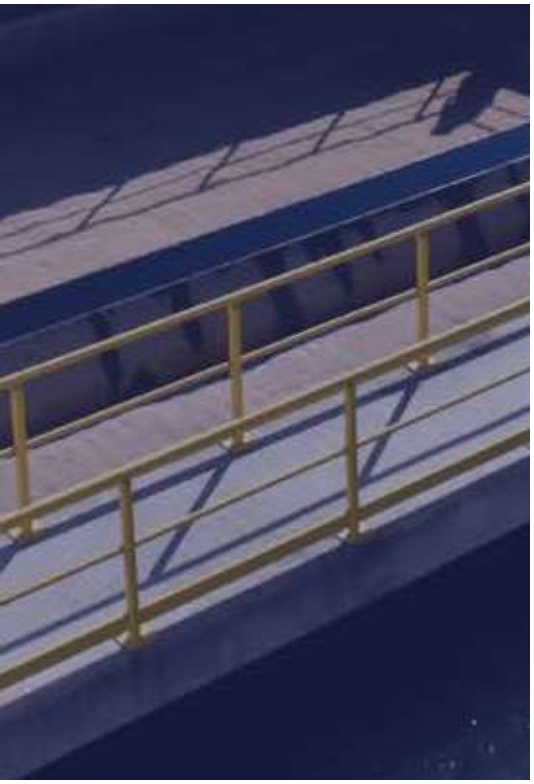

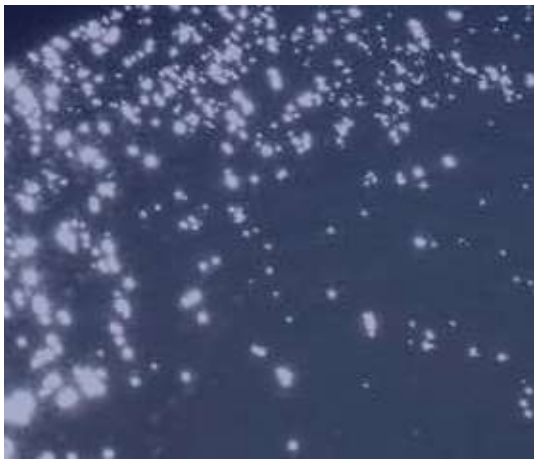INFORME ANUAL 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 6.1

aysa

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1

1 Obras Ejecutadas

TOMO 1.2

2 Mejora y Mantenimiento de Redes

3 Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos

4 Elementos Principales de la Red – Inventario

5 Certificación de Normas

6 Diagnósticos y Estudios

7 Estudios Ambientales

8 Gestión de Laboratorio

9 Desarrollo de la Comunidad

10 Plan de Prevención y Emergencias (PPE)

TOMO 2

11 Cobertura del Servicio de Agua Potable

12 Instalaciones faltantes en la Red de Agua Potable

13 Cartografía Expansión Agua Potable

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3

14 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales

15 Cobertura del Servicio de Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento

16 Instalaciones faltantes en la Red de Desagües Cloacales

17 Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

TOMO 4

18 Cartografía Agua Potable – Rehabilitación y Renovación

TOMO 5

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES (Planos Unificados)

19 - Rehabilitación Hidráulica.

20 - Rehabilitación Estructural.

Índice General del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6

TOMO 6:

21 Aspectos Comerciales

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

21.2 Aspectos vinculados con la medición

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

21.4 Aspectos vinculados con la recaudación

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

21.6 Información adicional

22 Aspectos Económico-Financieros

22.1 a 22.5 Formatos vinculados a los Estados Contables de AySA (Tomo Apartado "Formatos Contables 2025").

22.6 Indicadores

22.7 Balance Económico Social

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.1:

1 OBRAS EJECUTADAS

1.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.1.A	A) Obras en Plantas Potabilizadoras, Estaciones Elevadoras, Pozos de Agua, Rebombeos, y Plantas Tratamiento Agua Subterránea. Nuevas Áreas - Obras de Agua Potable.
	01.1.B	B) Ríos Subterráneos.
	01.1.C	C) Automatismo y Comunicaciones.
	01.1.D	D) Energía.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 02	01.1.01-IAT1-O-PRO-PS 01	PSS - Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 03	01.1.02-IAT1-O-PRO-PS 02	Pozos de Rebombeo de Agua Estado Funcionamiento y Obras Ejecutadas.
PL IA N° 07	01.1.10-IAT1-O-A-PRO-PSM 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General San Martín.
PL IA N° 08	01.1.11-IAT1-O-A-PRO-PMB 01	Obras en el Establecimiento Potabilizador General Manuel Belgrano.
PL IA N° 09	01.1.13-IAT1-O-A-PRO-PJMR 01	Obras en el Establecimiento Juan Manuel de Rosas.
	01.1.21-IAT1-O-A-PRO-POI 01	Plantas Potabilizadoras de Osmosis Inversa (POI).
	01.1.23-IAT1-O-A-PRO-PII 02	Plantas Potabilizadoras de Intercambio Iónico (PII).
	01.1.24-IAT1-O-A-PRO-PAD 03	Plantas Potabilizadoras de Adsorción (PAD).
PL IA N° 11	01.1.30-IAT1-O-A-TRA-EE	Obras en Estaciones Elevadoras Paitoví, Centro, Caballito, Floresta, Devoto, Saavedra, Villa Adelina, Tres de Febrero, Morón, Matanza, Lanús y Quilmes.

1.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
	01.2	Obras en Plantas Depuradoras, Estaciones de Bombeo, etc. Nuevas Areas - Obras de Saneamiento.

Planillas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 19	01.2.20-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste.
	01.2.20A-IAT1-O-S-PRO-PDSO 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Sudoeste II.
PL IA N° 20	01.2.21-IAT1-O-S-PRO-PDN 01	Obras en el Establecimiento de Depuración Cloacal Norte.
PL IA N° 21	01.2.22-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 01	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel.
	01.2.22A-IAT1-O-S-PRO-PDEJ 02	Obras en el Planta de Depuración El Jagüel II.
PL IA N° 21bis	01.2.23-IAT1-O-S-PRO-PDH 01	Obras en el Planta de Depuración Hurlingham.
PL IA N° 22	01.2.24-IAT1-O-S-PRO-PDBU 01	Obras en el Planta de Depuración Barrio Uno.
PL IA N° 22bis	01.2.25-IAT1-O-S-PRO-PDSC 01	Obras en el Planta de Depuración Santa Catalina.
	01.2.25.01-NA-IAT1-O-S-PRO-PDC 01	Obras en el Planta de Depuración Las Catonas.
	01.2.25.02-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFe 01	Obras en el Planta de Depuración Ferrari.
	01.2.25.03-NA-IAT1-O-S-PRO-PDFV 01	Obras en el Planta de Depuración Florencio Varela.
	01.2.25.04-NA-IAT1-O-S-PRO-PDG 01	Obras en el Planta de Depuración Garín.
	01.2.25.05-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMN 01	Obras en el Planta de Depuración Merlo Norte.
	01.2.25.06-NA-IAT1-O-S-PRO-PDMS 01	Obras en el Planta de Depuración Maquinista Savio.
	01.2.25.07-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPP 01	Obras en el Planta de Depuración Guernica (Pte. Perón).
	01.2.25.08-NA-IAT1-O-S-PRO-PDPR 01	Obras en el Planta de Depuración Paso del Rey.
	01.2.25.09-NA-IAT1-O-S-PRO-PDBV 01	Obras en el Planta de Depuración Bella Vista.
	01.2.25.10-NA-IAT1-O-S-PRO-PDCH 01	Obras en el Planta de Depuración Champagnat
	01.2.25.11-NA-IAT1-O-S-PRO-PDESC 01	Obras en el Planta de Depuración Escobar
PL IA N° 14	01.2.26-IAT1-O-S-TRA-EB 01	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Wilde.
PL IA N° 15	01.2.27-IAT1-O-S-TRA-EB 02	Obras en Estación de Bombeo Cloacal Boca-Barracas.
	01.2.28-IAT1-O-S-TRA-EB 03	Obras en Estaciones de Bombeo Centro, Norte y Sur.
	01.2.29-IAT1-O-S-TRA-EB 00	Obras en Planta Berazategui.
PL IA N° 13	01.2.30-IAT1-O-S-TRA-PLC 01	Obras en Grandes Conducciones Pluviocloacales.

1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 23	01.3.31-IAT1-O-X CONTRATO	Obras ejecutadas por vía contractual.
	01.3.33-IAT1-O-A (A+T)	Listado de Obras por convenio (A+T).
	01.3.34-IAT1-O-S (C+T)	Listado de Obras por convenio (C+T).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 1.2:

2 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 25	35-IAT1-O-A-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes de agua.
PL IA N° 26	36-IAT1-O-A-MyM 02	Redes de agua. Elementos de maniobra intervenidos.
PL IA N° 27	37-IAT1-O-A-MyM 03	Medidores colocados y/o intervenidos.
PL IA N° 28	38-IAT1-O-A-MyM 04	Conexiones domiciliarias de agua potable.
PL IA N° 29	39-IAT1-O-S-MyM 01	Mejoras y Mantenimiento Operativo de redes cloacales.
PL IA N° 30	40-IAT1-O-S-MyM 02	Conexiones domiciliarias de cloacas.

3 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE GRANDES EQUIPOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Mejora y Mantenimiento de Grandes Equipos.
	03.2-IAT1-O-X-MyM-T 01	Mantenimiento de Grandes Equipos y Electrobombas.

4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RED - INVENTARIO

4.1 AGUA POTABLE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 31 A	42-IAT1-I-A-RED 01	Redes de Agua - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 31 B	43-IAT1-I-A-RED 02	Redes de Agua - Porcentaje por Material de cañería instalada.
	44-IAT1-I-A-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Agua.

4.2 SANEAMIENTO

Código Anterior	Código Actual	Título
PL IA N° 32 A	45-IAT1-I-S-RED 01	Redes de Cloacas - Longitudes por diámetros.
PL IA N° 32 B	46-IAT1-I-S-RED 02	Redes de Cloacas - Porcentajes por Material de cañería instalada.
	47-IAT1-I-S-RED 03	Universo de Conexiones Domiciliarias de Desagües Cloacales.

5. CERTIFICACIÓN DE NORMAS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Laboratorios Central y de Plantas. Certificación ISO, IRAM, etc.

6 DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS

Código Anterior	Código Actual	Título
		Diagnósticos y Estudios.

7 ESTUDIOS AMBIENTALES

Código Anterior	Código Actual	Título
		7.1 Estudios Ambientales.
		7.2 Control del Recurso.

8 GESTION DE LABORATORIO

Código Anterior	Código Actual	Título
		Gestión de Laboratorio.

9 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Código Anterior	Código Actual	Título
		Texto descriptivo de las tareas de AySA para el Desarrollo de la Comunidad.
		9.1 Anexos
		9.2 Planos

10 PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE)

Código Anterior	Código Actual	Título
		PLAN DE PREVENCION Y EMERGENCIAS (PPE).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 2:

11. Cobertura del servicio de Agua Potable

11.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

11.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 33	48-IAT2-C-A-TRA 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Area Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A	49-IAT2-C-A-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable.
ex PL IA N° 34A (Nuevas Áreas)	49-IAT2-C-A-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio - Población Servida con Agua Potable sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 34B	50-IAT2-C-A-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio de Agua Potable.
ex PL IA N° 35	51-IAT2-C-A-TRA 04	Expansión de redes de distribución de agua potable. Obras habilitadas en el año (por Partido).

12. Instalaciones Faltantes en la Red de Agua Potable

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 36	52-IAT2-C-A-RED 01	Red de Agua. Cierre de mallas faltantes (por Región y Partido).

13. Cartografía Expansión Agua

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IEADRC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IEASFE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Fernando.
	IEASIS-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Isidro.
	IEASMA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Martín.
	IEATIG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tigre.
	IEAVIC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Vicente López.
	IEAESC-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Escobar.
	IEAJCP-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - José C. Paz.
	IEAMAR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Malvinas Argentinas.
	IEASMG-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - San Miguel.
	IEAPIL-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IEAMAT-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - La Matanza.
	IEAHUR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Hurlingham.
	IEAITU-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ituzaingó.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Morón.
	IEATRE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Tres de Febrero.
	IEAMER-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Merlo.
	IEAMOR-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IEAALM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Almirante Brown.
	IEAEST-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Esteban Echeverría.
	IEAEZE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Ezeiza.
	IEALOM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lomas de Zamora.
	IEAPPE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IEAAVE-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Avellaneda.
	IEALAN-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Lanús.
	IEAQLM-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Quilmes.
	IEAFVA-2025	Expansión Servicio - Red de Agua - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 3:

14. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales

14.1 Revisión detallada de las superficies y población servida

Código Anterior	Código Actual	Título
		Revisión detallada de las superficies y población servida.

14.2 Planillas

	Código Actual	Título
ex PL IA N° 38A	54-IAT3-C-S-TRA 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas.
	54-IAT3-C-S-TRA 02 (Nuevas Áreas)	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población servida con obras habilitadas sobre las Nuevas Áreas incorporadas en AySA.
ex PL IA N° 38B	55-IAT3-C-S-TRA 03	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales. Población beneficiada con obras o con servicio en trámite de habilitación.
ex PL IA N° 39	56-IAT3-C-S-TRA 04	Expansión de redes colectoras de desagües cloacales. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

15. Cobertura del servicio de Desagües Cloacales según Sistema de Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 40	57-IAT3-C-S-PRO 01	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Area servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 41	58-IAT3-C-S-PRO 02	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario.
	61-IAT3-C-S-PRO 04	Trabajos de Mejora y Expansión del Servicio. Población servida con Desagües Cloacales por Sistema de Tratamiento.
ex PL IA N° 42	59-IAT3-C-S-PRO 03	Expansión de redes colectoras de Desagües Cloacales con Tratamiento Primario y Secundario. Obras habilitadas en el año (por Región y Partido).

16. Instalaciones Faltantes en la Red de Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
ex PL IA N° 43	60-IAT3-C-S-RED 01	Red de Cloacas. Colectoras faltantes (por Región y Partido).

17. Cartografía Expansión de los Desagües Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
Plano Región Capital Federal		
	IETDRC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Capital Federal.
Planos Región Norte		
	IETSFE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Fernando.
	IETSIS-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Isidro.
	IETSMA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Martín.
	IETTIG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tigre.
	IETVIC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Vicente López.
	IETESC-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Escobar.
	IETJCP-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - José C. Paz.
	IETMAR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Malvinas Argentinas.
	IEATMG-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - San Miguel.
	IEATPIL-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Pilar.
Planos Región Oeste		
	IETMAT-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - La Matanza.
	IETCHUR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Hurlingham.
	IETITU-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ituzaingo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Morón.
	IETTRE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Tres de Febrero.
	IETMER-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Merlo.
	IETMOR-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Moreno.
Planos Región Sudoeste		
	IETALM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Almirante Brown.
	IETEST-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Esteban Echeverría.
	IETEZE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Ezeiza.
	IETLOM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lomas de Zamora.
	IETPPE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Presidente Perón.
Planos Región Sudeste		
	IETAVE-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Avellaneda.
	IETLAN-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Lanús.
	IETQLM-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Quilmes.
	IETFVA-2025	Expansión Servicio - Red Cloacal - Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 4:

18. CARTOGRAFÍA AGUA POTABLE (Planos de Rehabilitación y Renovación de Redes)

18.1 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRADRCF-2025	* Región Capital Federal.

18.2 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRASFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRASIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRASMA-2025	* Partido San Martín.
	IRATIG-2025	* Partido Tigre.
	IRAVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRAESC-2025	* Partido Escobar.
	IRAJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRAMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRASMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRAPIL-2025	* Partido Pilar.

18.3 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRAITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRAMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRAMOR-2025	* Partido Morón.
	IRATRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRAMER-2025	* Partido Merlo.
	IRAMOR-2025	* Partido Moreno.

18.4 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRAEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRAEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRALOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRAPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

18.5 Rehabilitación y Renovación de redes de Agua Potable Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRAAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRALAN-2025	* Partido Lanús.
	IRAQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRAFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 5:

CARTOGRAFÍA DESAGÜES CLOACALES UNIFICADA (Rehabilitación Hidráulica y Estructural):

19. Rehabilitación Hidráulica.
20. Rehabilitación Estructural.

19/20.1 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Capital Federal

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCDRCF-2025	* Región Capital Federal.

19/20.2 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Norte

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCSFE-2025	* Partido San Fernando.
	IRCSIS-2025	* Partido San Isidro.
	IRCSMA-2025	* Partido San Martín.
	IRCTIG-2025	* Partido Tigre.
	IRCVIC-2025	* Partido Vicente López.
	IRCESC-2025	* Partido Escobar.
	IRCJCP-2025	* Partido José C. Paz.
	IRCMAR-2025	* Partido Malvinas Argentinas.
	IRCSMG-2025	* Partido San Miguel.
	IRCPIL-2025	* Partido Pilar.

19/20.3 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Oeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCHUR-2025	* Partido Hurlingham.
	IRCITU-2025	* Partido Ituzaingó.
	IRCMAT-2025	* Partido La Matanza.
	IRCMOR-2025	* Partido Morón.
	IRCTRE-2025	* Partido Tres de Febrero.
	IRCMER-2025	* Partido Merlo.
	IRCMOR-2025	* Partido Moreno.

19/20.4 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudoeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCALM-2025	* Partido Almirante Brown.
	IRCEST-2025	* Partido Esteban Echeverría.
	IRCEZE-2025	* Partido Ezeiza.
	IRCLOM-2025	* Partido Lomas de Zamora.
	IRCPPE-2025	* Partido Presidente Perón.

19/20.5 Rehabilitación Hidráulica y Estructural Desagües Cloacales en Región Sudeste

Código Anterior	Código Actual	Título
	IRCAVE-2025	* Partido Avellaneda.
	IRCLAN-2025	* Partido Lanús.
	IRCQLM-2025	* Partido Quilmes.
	IRCFVA-2025	* Partido Florencio Varela.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

TOMO 6:

21 ASPECTOS COMERCIALES

21.1 Aspectos vinculados con la facturación

Código Anterior	Código Actual	Título
300		Ingresos Año 2025.
301		Anexo de Ventas Año 2025 (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
302		Evolución de los Ingresos.
303		Emisión General y art. 34 Año 2025 - Grupos bimetrales - Ciclos completos de facturación.
304		Facturación a Consorcios del último ciclo completo de facturación. Todas las frecuencias.
305		Facturación Emisión Genereal. Ultimo ciclo completo de facturación bimestral.
307		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Capital Federal.
308		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua - Código 01 - Gran Buenos Aires.
309		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Capital Federal.
310		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Cloaca - Código 02 - Gran Buenos Aires.
311		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Capital Federal.
312		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 05 - Gran Buenos Aires.
313		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por Distrito y Zonal. Agua y Cloacas - Código 08 - Capital Federal.
314		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - Residencial.
315		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - Residencial.
316		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - Residencial.
317		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua - Código 01 - No Residencial.
318		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Cloacas - Código 02 - No Residencial.
319		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral por intervalo de facturación - Agua y Cloacas - Códigos 05 y 08 - No Residencial.
320		Ultimo ciclo completo de facturación bimestral - Factura Media.

21.2 Aspectos vinculados con la medición

Código Anterior	Código Actual	Título
330		Medidores cambiados e instalados en el Año 2025.
331		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 01 (Agua). Consumo del último año - Bimestralizado.
332		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de Servicio 05 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
333		Histograma de Consumo. Residencial I - Código de servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último año - Bimestralizado.
334		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 01 (Agua). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
335		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de servicio 05 (Agua y cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
336		Histograma de Consumo. No Residencial I - Código de Servicio 08 (Agua y Cloaca). Consumo del último semestre - Bimestralizado.
337		Pérdida de Cuota Fija por mes, en cantidades de instalaciones y en Tarifa Básica Bimestral (TBB).

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

21.3 Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
306		Detalle de Unidades Funcionales.
350		Evolución del número de usuarios. Unidades funcionales.

21.4 Aspectos vinculados a la recaudación

Código Anterior	Código Actual	Título
360		Total Recaudado.
361		Ritmo de recaudación .
362		Evolución de la Recaudación y Evolución de la Recaudación por Categoría de Usuarios.

21.5 Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
321		Cuentas a cobrar vencidas y a vencer al 31/12/2025 por Región, tipo de cliente, régimen y categoría de cliente.
322		Conciliación de créditos por servicios (Ver nota a los puntos 22.1 - 22.6)
370		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (por antigüedad).
371		Deuda vencida al 31/12/2025, sin recargos e intereses a dicha fecha (con vencimientos operados por Año Contractual).
372		Impago vencido por rango de deuda al 31/12/25. Emisión por todo concepto, desagregado por Región y Grandes Usuarios.
373		Cuentas a cobrar a vencer y vencidas al 31/12/25, por Distrito y antigüedad de la deuda. Gráfico.
374		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25 por distrito, por situación comprobante y antigüedad de la deuda.
376		Cuentas a cobrar vencidas al 31/12/25, correspondientes a ciertos Clientes fiscales. Detalle de las cuentas a cobrar originales más recargos extracontables teóricos estimados.
379		Deuda Vencida al 31/12/2025 más recargos extracontables teóricos estimados.

21.6 Información Adicional

Código Anterior	Código Actual	Título
323		Consumos de la previsión para deudores de dudoso cobro y ajustes de facturación del año 2025.
324		Cargo por corte de servicio - Intervenciones realizadas e imporetes de facturación devengados durante el año 2025.
375		Convenios de pagos.
377		Cargo por titularidad no informada año 2025.
380		Estimación de otras quitas y condonaciones de deuda extracontables otorgadas durante el Año 2025.
381		Recargos e intereses por demora de pago devengados durante el año 2025.

Indice de Contenido del Informe Anual
Año 2025

22 ASPECTOS ECONOMICOS - FINANCIEROS - TARIFA SOCIAL

22.1 a 22.5

Presentado en Tomo separado denominado "FORMATOS CONTABLES 2025".

22.6 Indicadores

Código Anterior	Código Actual	Título
850-851		Indicadores.
852		Benchmarking.

22.7 Balance económico social

Código Anterior	Código Actual	Título
900		Programa de tarifa social - Total.
901		Programa de tarifa social - Usuarios Residenciales.
902		Programa de tarifa social - Casos Sociales.
903		Programa de tarifa social - Instituciones sin fines de lucro.
904		Programa de tarifa social - Detalle de Usuarios Residenciales.
905		Programa de tarifa social - Detalle de Casos Sociales.
906		Programa de tarifa social - Detalle de Instituciones sin fines de lucro.
910		Plan Agua más Trabajo.
920		Programa de Barrios Carenciados - Modelo Participativo de Gestión (MPG).
930		Resumen de Expansión de Agua por Plan.
940		Resumen de Expansión de Desagües Cloacales por Plan.
950		Balance Económico Social.
970		Total de Usuarios con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
971		Total de Usuarios RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
972		Total de Usuarios NO RESIDENCIALES con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.
973		Total de Usuarios BALDÍOS con descuento, según rango de Coeficiente Zonal.

21. ASPECTOS COMERCIALES

21.1. Aspectos vinculados con la facturación

INGRESOS AÑO CONTRACTUAL 20

CONCEPTO DE FACTURACION		ACUMULADO AÑO 20	% / TOTAL
REGIMEN REGULADO			
REGIMEN NO MEDIDO			
Residencial Privado	*Cargo Fijo*	178,44	0,00%
	Cargo Variable	389.637.717.742,25	29,17%
	Factura Mínima	43.363.777.740,48	3,25%
	Total	433.001.495.661,17	32,42%
Residencial Fiscal	*Cargo Fijo*	0,00	0,00%
	Cargo Variable	4.974.478.697,10	0,37%
	Factura Mínima	109.160.246,72	0,01%
	Total	5.083.638.943,82	0,38%
No residencial Privado	*Cargo Fijo*	39.104,30	0,00%
	Cargo Variable	100.857.910.271,15	7,55%
	Factura Mínima	6.812.356.379,69	0,51%
	Total	107.670.305.755,14	8,06%
No residencial Fiscal	*Cargo Fijo*	0,00	0,00%
	Cargo Variable	20.154.272.063,81	1,51%
	Factura Mínima	103.531.601,37	0,01%
	Total	20.257.803.665,18	1,52%
Baldios	*Cargo Fijo*	0,00	0,00%
	Cargo Variable	1.431.595.250,23	0,11%
	Factura Mínima	2.391.310.242,88	0,18%
	Total	3.822.905.493,11	0,29%
			0,00%
SUB TOTAL	***Cargo Fijo***	**39.282,74**	**0,00%**
	Cargo Variable	**517.055.974.024,54**	**38,71%**
	Factura Mínima	**52.780.136.211,14**	**3,95%**
SUB TOTAL REGIMEN NO MEDIDO		**569.836.149.518,42**	**42,66%**
			0,00%
Descuento CV por corte		-4.125.998.146,17	-0,31%
			0,00%
TOTAL REGIMEN NO MEDIDO		**565.710.151.372,25**	**42,35%**
REGIMEN MEDIDO			
Residencial Privado	*Cargo Fijo*	-40.783.226,77	0,00%
	Consumo	260.268.870.982,02	19,48%
	Factura Mínima	13.165.400.953,20	0,99%
	Provisión Consumo	15.957.810.514,29	1,19%
	Total	289.351.299.222,74	21,66%
Residencial Fiscal	*Cargo Fijo*	0,00	0,00%
	Consumo	1.784.499.084,40	0,13%
	Factura Mínima	6.229.518,31	0,00%
	Provisión Consumo	234.653.391,26	0,02%
	Total	2.025.381.993,97	0,15%
No residencial Privado	*Cargo Fijo*	-2.636.459,45	0,00%
	Consumo	162.719.472.738,22	12,18%
	Factura Mínima	8.252.851.041,35	0,62%
	Provisión Consumo	8.071.565.491,63	0,60%
	Total	179.041.252.811,75	13,40%
No residencial Fiscal	*Cargo Fijo*	-19.447,81	0,00%
	Consumo	50.898.498.945,76	3,81%
	Factura Mínima	104.868.851,14	0,01%
	Provisión Consumo	3.025.009.350,57	0,23%
	Total	54.028.357.699,66	4,04%
Baldios	*Cargo Fijo*	-188.595,55	0,00%
	Consumo	2.810.568.174,59	0,21%
	Factura Mínima	156.117.307,70	0,01%
	Provisión Consumo	73.322.843,62	0,01%
	Total	3.039.819.730,36	0,23%
			0,00%
SUB TOTAL	***Cargo Fijo (1)***	**-43.627.729,58**	**0,00%**
	Consumo	**478.481.909.924,99**	**35,82%**
	Factura Mínima	**21.685.467.671,70**	**1,62%**
	Provisión Consumo	**27.362.361.591,37**	**2,05%**
	Ajuste por Crédito a NR MED (CF)	**-13.254,47**	**0,00%**
TOTAL REGIMEN MEDIDO		**527.486.098.204,01**	**39,49%**
CARGOS			
Cargo por titularidad no informada		2.022.444.071,93	0,15%
AUD		210.458.479.728,11	15,76%
AUD FM		75.391.258.074,89	5,64%
Cargos CIS		0,00	0,00%
Retro K		2.284.858.682,65	0,17%
Notas de Crédito del Ejercicio		-17.195.807.458,87	-1,29%
Notas de Débito del Ejercicio		11.863.348.794,59	0,89%
Ajuste por Crédito Medidas Cautelares Res. 62/16		0,00	0,00%
Dto por falta de Servicio		-17,10	0,00%
OTRAS MODADLIDADES TARIFARIAS			
Descuento Barrios Carenciados		-147.636.769,67	-0,01%
Descuentos CV - Plan de Medición		0,00	0,00%
Descuentos No Recuperables		-6.408.488.722,76	-0,48%
Descuento Tarifa Social (2)		-35.665.255.928,40	-2,67%
TOTAL EMISION GENERAL		**1.335.799.450.031,63**	**100,00%**
SERVICIOS ESPECIALES			
Agua para construcción		3.753.493.398,32	15,37%
Agua a buque		0,00	0,00%
Instalaciones eventuales		0,00	0,00%
Agua para riego de plazas		2.112.959.952,63	8,65%
Agua a vehiculos aguadores		4.998.220,27	0,02%
Descarga vehiculos atmosféricos		618.969.333,24	2,53%
Desagüe colectora		7.755.757.530,32	31,75%
Cargo de conexión		2.153.370.153,20	8,82%
Cargo de desconexión		9.731.461,34	0,04%
Cargo de reconexión		1.397.377,80	0,01%
Corte de servicios		2.033.497.040,80	8,33%
Certificado Propter Rem		1.228.914.738,37	5,03%
Agua en bloque		4.176.400.287,30	17,10%
Desagüe cloacal en bloque		575.449.022,82	2,36%
Aporte al Servicio		0,00	0,00%
Total Servicios Especiales		24.424.938.516,41	100,00%
SUB TOTAL (EM GRAL + SCIOS ESP)		**1.360.224.388.548,04**	**100,70%**
RETROACTIVOS			
Ajuste retroactivos		986.458.259,58	0,07%
OTROS CONCEPTOS			
Recargos por demora de pago		55.498.706.638,85	4,11%
Venta de Medidores		20.415.764,27	0,00%
Varios		0,00	0,00%
Total		55.519.122.403,12	4,11%
TOTAL INGRESOS REGULADOS		**1.416.729.969.210,74**	**104,89%**
Subsidio al Servicio		**-66.023.964.926,46**	**-4,89%**
TOTAL INGRESOS CON SUBSIDIOS REGULADOS		**1.350.706.004.284,28**	**100,00%**
Anulaciones de Años Anteriores		-8.159.380.248,09	**-0,61%**
Refacturaciones de Años Anteriores		5.636.306.018,11	**0,42%**
Total		-2.523.074.229,98	**-0,19%**
TOTAL INGRESOS NETOS REGULADOS		**1.348.182.930.054,30**	**100,00%**
REGIMEN NO REGULADO			
Analisis de laboratorio		3.168.262,68	100,00%
TOTAL INGRESOS NO REGULADOS		**3.168.262,68**	**100,00%**
TOTAL INGRESOS NETOS REGULADOS Y NO REGULADOS (3)		**1.348.186.098.316,98**	**100,00%**

(1) Los cargos fijos facturados a usuarios medidos son negativos debido a que se imputa en dicha cuenta contable un descuento por obras de terceros (OPCT).
(2) El descuento de tarifa social incluye el descuento transitorio aplicado para mantener fija la facturación (sin aumentos tarifarios) a aquellos usuarios que cuentan con el be

(3) El total de ingresos netos incluye $90.713.776.576,11 correspondientes a las Nuevas Áreas (Escobar, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, Presidente Perón, Merlo, Moreno y Florencio Varela) y no incluye una compensación de impuestos del Municipio de Avellaneda por -1.751,3 millones de pesos.

FORMATO N° 302

EVOLUCION DE LOS INGRESOS

EVOLUCION DE LOS INGRESOS	dic-24	MESES ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ACUMULADO 20° Año
Reg. No Medido	45.591.567.744	45.755.861.749	41.802.742.520	47.719.646.261	45.580.281.428	47.350.052.520	46.357.756.928	48.416.576.295	48.750.783.785	47.638.016.333	49.653.355.443	48.339.691.566	50.460.524.406	**567.825.289.235**
Reg. Medido	40.522.477.093	43.443.629.714	39.101.361.361	44.203.244.881	43.557.364.759	45.754.950.176	44.796.801.303	41.827.317.255	44.081.651.798	43.294.203.150	45.718.410.166	44.191.351.906	47.685.532.554	**527.655.819.023**
EM. GRAL. BRUTA	**86.114.044.837**	**89.199.491.463**	**80.904.103.881**	**91.922.891.142**	**89.137.646.187**	**93.105.002.696**	**91.154.558.231**	**90.243.893.550**	**92.832.435.583**	**90.932.219.484**	**95.371.765.609**	**92.531.043.472**	**98.146.056.961**	**1.095.481.108.259**
Descuento Barrios Carenciados	-88.486.722	-91.696.156	-53.738.247	-2.202.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-147.636.770**
Descuento por falta de servicio	0	0	0	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	**-17**
Descuento Tarifa Social (A)	-3.074.056.565	-3.389.163.620	-2.964.863.738	-3.658.681.077	-3.174.579.615	-3.580.128.723	-3.046.124.895	-3.041.595.272	-2.909.804.206	-2.725.914.759	-2.463.406.047	-2.639.483.975	-2.071.510.000	**-35.665.255.928**
AUD	16.051.629.803	16.720.249.788	15.321.255.904	17.255.814.935	17.013.258.532	17.710.951.996	17.290.573.832	18.027.518.117	18.162.704.326	17.690.336.773	18.452.855.515	18.020.945.262	18.792.014.747	**210.458.479.728**
AUD FM	5.832.919.956	5.913.701.721	5.359.494.425	5.963.988.235	5.898.512.918	6.220.335.504	6.127.101.296	6.440.115.157	6.572.695.122	6.469.209.245	6.790.588.500	6.651.144.742	6.984.371.212	**75.391.258.075**
Cargo por titularidad no informada	163.212.899	168.941.062	155.010.904	173.437.126	171.935.754	179.643.199	175.593.160	183.526.578	185.483.243	181.310.775	184.024.692	135.540.795	127.996.783	**2.022.444.072**
Ajustes del Ej.	-488.813.341	221.240.648	-102.847.727	72.252.340	-588.524.896	-450.395.721	-788.900.828	-840.883.488	-728.808.510	-376.526.950	-510.153.656	-655.847.288	-583.062.588	**-5.332.458.664**
Ajuste por Crédito Medidas Cautelares Res. 62/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EM. GRAL. NETA	**104.510.450.866**	**108.742.764.907**	**98.618.415.401**	**111.727.500.334**	**108.458.248.879**	**113.185.408.934**	**110.912.800.795**	**111.012.574.642**	**114.114.705.558**	**112.170.634.568**	**117.825.674.614**	**114.043.343.009**	**121.395.867.115**	**1.342.207.938.754**
Retroactivos	22.531.371	53.555.592	28.613.080	115.184.763	94.574.413	2.005.973.169	-1.810.030.119	136.305.720	91.539.122	75.379.769	95.514.773	73.598.097	26.249.881	**986.458.260**
C.I.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Servicios Especiales (B)	1.326.471.117	1.516.403.796	1.458.466.929	1.489.154.169	1.417.338.976	1.630.143.281	1.660.595.522	1.574.267.796	1.835.619.661	1.926.890.676	1.978.443.562	1.693.656.863	1.492.107.976	**19.673.089.206**
Agua y Desag. en Bloque	385.229.776	434.242.341	456.274.427	375.892.193	396.441.247	380.048.726	377.061.036	354.637.409	363.937.410	372.739.969	380.319.688	424.742.644	435.512.220	**4.751.849.310**
Otros (C)	3.661.782.755	3.639.182.988	4.991.531.385	2.937.227.997	3.631.229.962	3.695.957.045	3.462.901.741	4.862.812.574	3.762.064.528	4.753.996.514	4.788.573.789	4.027.234.160	4.557.920.999	**49.110.633.680**
TOTAL INGRESOS REGULADOS	**109.906.465.884,37**	**114.386.149.624,73**	**105.553.301.221,48**	**116.644.959.455,80**	**113.997.833.476,26**	**120.897.531.154,98**	**114.603.328.974,88**	**117.940.598.140,13**	**120.167.866.278,23**	**119.299.641.495,70**	**125.068.526.424,64**	**120.262.574.772,08**	**127.907.658.191,83**	**1.416.729.969.210,74**
Subsidios al Servicio	**-4.916.530.869**	**-5.195.016.101**	**-4.786.403.677**	**-5.680.660.763**	**-5.365.424.322**	**-5.558.624.049**	**-5.415.871.244**	**-5.569.966.682**	**-5.637.710.365**	**-5.479.997.007**	**-5.783.919.187**	**-5.627.458.561**	**-5.922.912.968**	**-66.023.964.926**
TOTAL INGRESOS CON SUBSIDIO REGULADOS	**104.989.935.015,65**	**109.191.133.523,98**	**100.766.897.544,26**	**110.964.298.692,53**	**108.632.409.154,27**	**115.338.907.105,98**	**109.187.457.731,16**	**112.370.631.457,80**	**114.530.155.912,80**	**113.819.644.488,94**	**119.284.607.237,56**	**114.635.116.210,95**	**121.984.745.224,05**	**1.350.706.004.284,28**
Ajuste Años anteriores	**-18.962.463**	**-496.360.972,76**	**-315.523.364,72**	**-255.530.684,13**	**-290.192.912,18**	**5.188.620.183,29**	**-5.566.791.779,34**	**-136.189.448,31**	**-120.922.261,17**	**-138.443.165,48**	**-147.576.275,19**	**-117.239.303,25**	**-126.924.246,74**	**-2.523.074.229,98**
TOTAL INGRESOS NETOS REGULADOS	**104.970.972.552,36**	**108.694.772.551,22**	**100.451.374.179,54**	**110.708.768.008,40**	**108.342.216.242,09**	**120.527.527.289,27**	**103.620.665.951,82**	**112.234.442.009,49**	**114.409.233.651,63**	**113.681.201.323,46**	**119.137.030.962,37**	**114.517.876.907,70**	**121.857.820.977,31**	**1.348.182.930.054,30**
Ingresos No Regulados	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-76,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.168.338,68**	**0,00**	**3.168.262,68**
TOTAL INGRESOS NETOS REGULADO Y NO REGULADOS (D)	**104.970.972.552,36**	**108.694.772.551,22**	**100.451.374.179,54**	**110.708.768.008,40**	**108.342.216.242,09**	**120.527.527.213,27**	**103.620.665.951,82**	**112.234.442.009,49**	**114.409.233.651,63**	**113.681.201.323,46**	**119.137.030.962,37**	**114.521.045.246,38**	**121.857.820.977,31**	**1.348.186.098.316,98**

(A) El descuento de tarifa social incluye el descuento transitorio aplicado para mantener fija la facturación (sin aumentos tarifarios) a aquellos usuarios que cuentan con el beneficio.
(B) Se separaron de los servicios especiales los cargos por agua y desagüe en bloque.
(C) Otros contempla los ingresos por: recargos por mora, venta de medidores, varios y descuentos no recuperables.
(D) El total de ingresos netos incluye $90.713.776.576,11 correspondientes a las Nuevas Áreas (Escobar, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, Presidente Perón, Merlo, Moreno y Florencio Varela).

EVOLUCION DE LA EMISION GENERAL	dic-24	MESES ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ACUMULADO 20° Año
Mes i - 1	**80.621.336.570**	**86.114.044.837**	**89.199.491.463**	**80.904.103.881**	**91.922.891.142**	**89.137.646.187**	**93.105.002.696**	**91.154.558.231**	**90.243.893.550**	**92.832.435.583**	**90.932.219.484**	**95.371.765.609**	**92.531.043.472**	**1.083.449.096.135**
Pérd. Cuota Fija (1)	**-12.111.751**	-220.224.259	-166.318.173	-148.419.374	-128.468.864	-174.087.450	-142.300.638	-260.150.997	-213.699.467	-345.284.806	-595.214.307	-477.871.506	-2.040.319	**-2.874.080.162**
Consumo (2)	**1.700.824.538**	3.199.081.846	-106.590.548	949.639.723	756.035.119	682.662.841	465.127.750	-4.528.113.199	2.176.819.053	577.585.064	942.846.159	-82.315.848	1.990.445.677	**7.023.223.637**
MEDICION	**1.688.712.787**	**2.978.857.586**	**-272.908.721**	**801.220.350**	**627.566.255**	**508.575.391**	**322.827.112**	**-4.788.264.196**	**1.963.119.585**	**232.300.258**	**347.631.851**	**-560.187.353**	**1.988.405.358**	**4.149.143.475**
OTROS AJUSTES	**3.758.979.642**	106.589.040	-8.022.478.861	10.217.566.911	-3.412.811.211	3.458.781.119	-2.273.271.578	3.877.599.515	625.422.448	-2.132.516.356	4.091.914.274	-2.280.534.783	3.626.608.131	**7.882.868.649**
Mes i	**86.114.044.837**	**89.199.491.463**	**80.904.103.881**	**91.922.891.142**	**89.137.646.187**	**93.105.002.696**	**91.154.558.231**	**90.243.893.550**	**92.832.435.583**	**90.932.219.484**	**95.371.765.609**	**92.531.043.472**	**98.146.056.961**	**1.095.481.108.259**

(1) Es la suma de los cargos variables no medidos por 30 días de servicio que se le facturaron por última vez a los usuarios que pasaron al régimen medido en cada uno de esos meses (al coeficiente K correspondiente a aquel mes).

EMISION GENERAL 2025
GRUPOS BIMESTRALES
CICLOS COMPLETOS DE FACTURACION

FORMATO N° 303

EMISION GENERAL	Enero - Febrero (1)		Marzo - Abril (1)		Mayo - Junio (1)		Julio - Agosto (1)		Septiembre - Octubre (1)		Noviembre - Diciembre (1)		TOTAL	
	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos
Residencial	**5.768.109**	**147.001.313.311**	**5.841.727**	**155.813.769.826**	**6.513.801**	**174.015.307.426**	**5.782.485**	**156.707.264.315**	**5.861.477**	**160.039.337.925**	**5.064.962**	**141.105.753.854**	**34.832.561**	**934.682.746.655**
Clase R1	3.613.819	89.699.498.853	3.623.853	95.970.273.888	4.081.544	106.031.416.359	3.627.617	95.220.582.898	3.635.056	96.249.759.273	3.177.400	85.507.245.959	**21.759.289**	**568.678.777.230**
Clase R2	2.154.290	57.301.814.458	2.217.874	59.843.495.938	2.432.257	67.983.891.067	2.154.868	61.486.681.416	2.226.421	63.789.578.652	1.887.562	55.598.507.894	**13.073.272**	**366.003.969.426**
No Residencial	**582.348**	**61.102.470.878**	**582.233**	**62.801.243.329**	**650.838**	**70.030.861.800**	**582.851**	**65.187.431.088**	**583.557**	**65.700.953.261**	**515.410**	**60.011.909.032**	**3.497.237**	**384.834.869.388**
Clase NR1	372.349	50.435.229.316	372.470	51.858.562.460	415.780	57.581.141.937	373.654	53.874.327.501	373.958	54.151.700.013	331.863	49.690.688.286	**2.240.074**	**317.591.649.513**
Clase NR2	209.999	10.667.241.562	209.763	10.942.680.869	235.058	12.449.719.863	209.197	11.313.103.587	209.599	11.549.253.248	183.547	10.321.220.746	**1.257.163**	**67.243.219.875**
Baldíos	**130.713**	**1.559.606.571**	**131.269**	**1.666.231.502**	**148.301**	**1.872.014.031**	**132.165**	**1.681.821.953**	**132.809**	**1.702.779.024**	**116.395**	**1.527.847.302**	**791.652**	**10.010.300.385**
Total	**6.481.170**	**209.663.390.760**	**6.555.229**	**220.281.244.657**	**7.312.940**	**245.918.183.257**	**6.497.501**	**223.576.517.356**	**6.577.843**	**227.443.070.210**	**5.696.767**	**202.645.510.188**	**39.121.450**	**1.329.527.916.428**

EMISION GENERAL	Enero - Febrero (1)		Marzo - Abril (1)		Mayo - Junio (1)		Julio - Agosto (1)		Septiembre - Octubre (1)		Noviembre - Diciembre (1)		TOTAL	
	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos
Residencial	**5.768.109**	**147.001.313.311**	**5.841.727**	**155.813.769.826**	**6.513.801**	**174.015.307.426**	**5.782.485**	**156.707.264.315**	**5.861.477**	**160.039.337.925**	**5.064.962**	**141.105.753.854**	**34.832.561**	**934.682.746.655**
Medido	975.100	50.782.518.828	985.049	54.887.663.542	1.114.187	60.652.466.295	1.003.489	54.247.222.493	1.015.570	54.204.952.035	918.956	49.565.488.757	**6.012.351**	**324.340.311.950**
No Medido	4.793.009	96.218.794.482	4.856.678	100.926.106.284	5.399.614	113.362.841.131	4.778.996	102.460.041.822	4.845.907	105.834.385.890	4.146.006	91.540.265.096	**28.820.210**	**610.342.434.705**
No Residencial	**582.348**	**61.102.470.878**	**582.233**	**62.801.243.329**	**650.838**	**70.030.861.800**	**582.851**	**65.187.431.088**	**583.557**	**65.700.953.261**	**515.410**	**60.011.909.032**	**3.497.237**	**384.834.869.388**
Medido	248.565	37.486.965.489	248.952	38.562.193.828	278.413	42.943.491.595	250.389	39.892.517.361	250.946	39.693.090.476	222.870	36.426.379.573	**1.500.135**	**235.004.638.321**
No Medido	333.783	23.615.505.389	333.281	24.239.049.501	372.425	27.087.370.206	332.462	25.294.913.728	332.611	26.007.862.785	292.540	23.585.529.458	**1.997.102**	**149.830.231.067**
Baldíos	**130.713**	**1.559.606.571**	**131.269**	**1.666.231.502**	**148.301**	**1.872.014.031**	**132.165**	**1.681.821.953**	**132.809**	**1.702.779.024**	**116.395**	**1.527.847.302**	**791.652**	**10.010.300.385**
Total	**6.481.170**	**209.663.390.760**	**6.555.229**	**220.281.244.657**	**7.312.940**	**245.918.183.257**	**6.497.501**	**223.576.517.356**	**6.577.843**	**227.443.070.210**	**5.696.767**	**202.645.510.188**	**39.121.450**	**1.329.527.916.428**

EMISION GENERAL	Enero - Febrero (1)		Marzo - Abril (1)		Mayo - Junio (1)		Julio - Agosto (1)		Septiembre - Octubre (1)		Noviembre - Diciembre (1)		TOTAL	
	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos	Facturas	Pesos
Residencial	**5.768.109**	**147.001.313.311**	**5.841.727**	**155.813.769.826**	**6.513.801**	**174.015.307.426**	**5.782.485**	**156.707.264.315**	**5.861.477**	**160.039.337.925**	**5.064.962**	**141.105.753.854**	**34.832.561**	**934.682.746.655**
Capital	1.776.668	67.276.489.382	1.835.860	71.619.005.704	2.012.309	79.501.459.363	1.775.765	71.872.823.437	1.844.700	74.092.732.588	1.549.302	64.922.508.990	**10.794.604**	**429.285.019.463**
G.B.A.	3.343.155	68.990.339.114	3.354.020	72.971.668.425	3.732.449	81.087.931.934	3.350.100	72.897.562.275	3.355.541	73.667.298.226	2.965.905	65.690.858.377	**20.101.170**	**435.305.658.351**
Nuevas Áreas	648.286	10.734.484.815	651.847	11.223.095.697	769.043	13.425.916.130	656.620	11.936.878.602	661.236	12.279.307.111	549.755	10.492.386.487	**3.936.787**	**70.092.068.841**
No Residencial	**582.348**	**61.102.470.878**	**582.233**	**62.801.243.329**	**650.838**	**70.030.861.800**	**582.851**	**65.187.431.088**	**583.557**	**65.700.953.261**	**515.410**	**60.011.909.032**	**3.497.237**	**384.834.869.388**
Capital	259.765	33.262.960.885	259.536	34.205.065.942	292.182	37.800.993.271	259.052	34.805.422.876	259.471	35.338.488.019	226.147	32.281.668.680	**1.556.153**	**207.694.599.673**
G.B.A.	284.415	24.829.803.738	284.491	25.480.965.612	315.209	28.636.303.247	285.234	26.935.774.870	285.306	26.804.054.678	255.131	24.573.229.191	**1.709.786**	**157.260.131.337**
Nuevas Áreas	38.168	3.009.706.255	38.206	3.115.211.775	43.447	3.593.565.282	38.565	3.446.233.343	38.780	3.558.410.564	34.132	3.157.011.161	**231.298**	**19.880.138.379**
Baldíos	**130.713**	**1.559.606.571**	**131.269**	**1.666.231.502**	**148.301**	**1.872.014.031**	**132.165**	**1.681.821.953**	**132.809**	**1.702.779.024**	**116.395**	**1.527.847.302**	**791.652**	**10.010.300.385**
Capital	10.548	342.247.258	10.553	381.302.339	11.603	387.553.746	10.615	352.277.393	10.559	357.749.727	9.569	330.212.196	**63.447**	**2.151.342.659**
G.B.A.	75.597	842.542.884	75.778	895.954.653	83.434	1.015.146.731	76.160	910.511.547	76.445	913.805.626	69.024	836.662.021	**456.438**	**5.414.623.462**
Nuevas Áreas	44.568	374.816.430	44.938	388.974.511	53.264	469.313.553	45.390	419.033.014	45.805	431.223.671	37.802	360.973.085	**271.767**	**2.444.334.263**
Total	**6.481.170**	**209.663.390.760**	**6.555.229**	**220.281.244.657**	**7.312.940**	**245.918.183.257**	**6.497.501**	**223.576.517.356**	**6.577.843**	**227.443.070.210**	**5.696.767**	**202.645.510.188**	**39.121.450**	**1.329.527.916.428**

(1) Bimestres en los que se facturaron 8 semanas.

FACTURACION A CONSORCIOS
ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025)

AREA	CATEGORIA	NO MEDIDOS			MEDIDOS			TOTAL		
		FACTURAS	U.F.	PESOS	FACTURAS	U.F.	PESOS	FACTURAS	U.F.	PESOS
CAPITAL	Residencial	1.524.111	1.986.506	50.481.615.969	258.722	619.677	23.349.556.019	**1.782.833**	**2.606.183**	**73.831.171.988**
	No Residencial	170.502	176.645	13.528.821.911	88.586	152.341	21.994.251.948	**259.088**	**328.986**	**35.523.073.859**
Vicente López	Residencial	78.095	75.853	1.551.189.712	104.098	126.813	3.935.672.911	**182.193**	**202.666**	**5.486.862.622**
	No Residencial	6.346	6.009	446.525.667	11.933	12.731	1.675.112.374	**18.279**	**18.740**	**2.121.638.041**
San Isidro	Residencial	65.596	62.632	1.547.663.134	110.938	120.661	4.750.685.095	**176.534**	**183.293**	**6.298.348.230**
	No Residencial	6.930	6.643	429.265.696	9.690	11.138	1.379.153.349	**16.620**	**17.781**	**1.808.419.046**
San Martín	Residencial	122.249	123.098	1.975.395.684	86.777	91.498	3.372.460.297	**209.026**	**214.596**	**5.347.855.981**
	No Residencial	7.206	6.956	769.102.468	19.829	20.674	1.814.793.702	**27.035**	**27.630**	**2.583.896.170**
San Fernando	Residencial	51.022	51.358	1.231.834.759	17.843	19.947	903.819.599	**68.865**	**71.305**	**2.135.654.358**
	No Residencial	3.097	3.080	251.803.851	4.746	4.894	789.794.057	**7.843**	**7.974**	**1.041.597.908**
Tigre	Residencial	111.228	112.287	2.462.188.264	21.752	25.475	2.120.359.419	**132.980**	**137.762**	**4.582.547.683**
	No Residencial	5.489	5.485	768.311.959	5.189	5.255	767.809.409	**10.678**	**10.740**	**1.536.121.368**
Escobar	Residencial	40.444	40.433	705.600.008	1.164	1.674	312.950.975	**41.608**	**42.107**	**1.018.550.983**
	No Residencial	2.919	2.879	284.526.606	413	415	87.762.792	**3.332**	**3.294**	**372.289.398**
San Miguel	Residencial	119.193	119.185	2.156.949.490	1.580	1.852	120.347.903	**120.773**	**121.037**	**2.277.297.393**
	No Residencial	8.164	8.062	632.045.342	577	577	95.921.883	**8.741**	**8.639**	**727.967.224**
Jose C. Paz	Residencial	9.932	9.932	111.804.300	34	34	400.545	**9.966**	**9.966**	**112.204.845**
	No Residencial	407	407	14.126.602	27	27	985.551	**434**	**434**	**15.112.153**
Malvinas Argentinas	Residencial	13.237	13.239	168.814.470	42	42	606.052	**13.279**	**13.281**	**169.420.523**
	No Residencial	334	334	14.314.606	17	17	216.149	**351**	**351**	**14.530.755**
Pilar	Residencial	26.013	26.203	578.692.192	21.639	23.487	1.081.093.530	**47.652**	**49.690**	**1.659.785.721**
	No Residencial	185	183	70.932.151	2.794	2.898	452.887.720	**2.979**	**3.081**	**523.819.871**
TOTAL REGIÓN NORTE	Residencial	637.009	634.220	12.490.132.013	365.867	411.483	16.598.396.326	**1.002.876**	**1.045.703**	**29.088.528.339**
	No Residencial	41.077	40.038	3.680.954.948	55.215	58.626	7.064.436.986	**96.292**	**98.664**	**10.745.391.934**
Tres de Febrero	Residencial	145.456	150.474	3.052.848.981	32.972	38.697	1.045.181.862	**178.428**	**189.171**	**4.098.030.843**
	No Residencial	8.393	8.267	682.715.284	12.255	12.538	922.135.576	**20.648**	**20.805**	**1.604.850.859**
Morón (1)	Residencial	276.350	280.083	4.939.847.654	57.324	65.607	2.084.024.376	**333.674**	**345.690**	**7.023.872.031**
	No Residencial	12.393	12.646	1.109.462.855	11.442	12.460	1.182.591.798	**23.835**	**25.106**	**2.292.054.653**
La Matanza Norte	Residencial	188.641	190.535	3.234.742.583	114.908	125.766	3.871.103.633	**303.549**	**316.301**	**7.105.846.216**
	No Residencial	12.541	12.454	963.629.618	18.387	19.363	1.716.187.206	**30.928**	**31.817**	**2.679.816.824**
La Matanza Sur	Residencial	115.894	116.860	2.026.763.937	38.135	38.771	1.223.744.430	**154.029**	**155.631**	**3.250.508.367**
	No Residencial	4.347	4.336	502.957.256	4.318	4.354	737.931.513	**8.665**	**8.690**	**1.240.888.769**
La Matanza Oeste	Residencial	182.343	182.347	1.383.501.759	30	30	534.754	**182.373**	**182.377**	**1.384.036.513**
	No Residencial	5.775	5.777	244.285.702	151	151	4.796.602	**5.926**	**5.928**	**249.082.303**
Merlo	Residencial	128.731	129.321	1.943.064.450	492	514	12.880.123	**129.223**	**129.835**	**1.955.944.573**
	No Residencial	7.164	7.208	442.521.453	418	418	54.466.314	**7.582**	**7.626**	**496.987.767**
Moreno	Residencial	105.086	107.020	1.905.987.195	349	527	13.867.343	**105.435**	**107.547**	**1.919.854.538**
	No Residencial	7.042	7.255	511.013.062	450	454	53.683.099	**7.492**	**7.709**	**564.696.161**
TOTAL REGIÓN OESTE	Residencial	1.142.501	1.156.640	18.486.756.561	244.210	269.912	8.251.336.521	**1.386.711**	**1.426.552**	**26.738.093.082**
	No Residencial	57.655	57.943	4.456.585.229	47.421	49.738	4.671.792.108	**105.076**	**107.681**	**9.128.377.337**
Avellaneda	Residencial	152.999	159.615	2.823.262.009	33.647	39.520	1.611.792.706	**186.646**	**199.135**	**4.435.054.715**
	No Residencial	9.085	9.240	607.459.062	13.786	14.882	1.601.371.128	**22.871**	**24.122**	**2.208.830.190**
Lanus	Residencial	207.244	211.471	3.465.674.286	31.935	37.932	1.421.615.546	**239.179**	**249.403**	**4.887.289.832**
	No Residencial	9.431	9.425	595.249.567	14.903	15.479	1.253.320.799	**24.334**	**24.904**	**1.848.570.366**
Quilmes	Residencial	232.966	234.991	4.486.607.061	44.863	57.146	1.895.630.315	**277.829**	**292.137**	**6.382.237.376**
	No Residencial	11.763	11.772	945.676.422	11.864	12.640	1.211.662.361	**23.627**	**24.412**	**2.157.338.783**
Florencio Varela	Residencial	164.674	165.708	2.876.769.645	447	457	17.811.862	**165.121**	**166.165**	**2.894.581.507**
	No Residencial	6.334	6.416	651.356.612	626	638	75.244.774	**6.960**	**7.054**	**726.601.386**
TOTAL REGIÓN SUDESTE	Residencial	757.883	771.785	13.652.313.001	110.892	135.055	4.946.850.429	**868.775**	**906.840**	**18.599.163.430**
	No Residencial	36.613	36.853	2.799.741.662	41.179	43.639	4.141.599.063	**77.792**	**80.492**	**6.941.340.725**
Almirante Brown	Residencial	150.941	150.838	2.140.258.008	21.739	23.089	694.439.599	**172.680**	**173.927**	**2.834.697.607**
	No Residencial	5.718	5.556	280.444.702	3.892	4.162	347.883.817	**9.610**	**9.718**	**628.328.519**
E. Echeverría	Residencial	141.804	143.790	2.182.493.156	6.151	6.461	224.579.920	**147.955**	**150.251**	**2.407.073.076**
	No Residencial	7.265	7.039	536.438.221	2.610	2.616	287.704.264	**9.875**	**9.655**	**824.142.485**
Ezeiza	Residencial	72.726	73.952	1.008.837.599	1.579	1.579	49.207.778	**74.305**	**75.531**	**1.058.045.377**
	No Residencial	2.769	2.769	257.418.870	707	707	74.742.172	**3.476**	**3.476**	**332.161.042**
Lomas de Zamora	Residencial	297.383	298.751	3.809.295.280	31.280	42.102	1.466.524.713	**328.663**	**340.853**	**5.275.819.994**
	No Residencial	8.864	8.931	439.130.423	11.917	13.277	1.131.917.403	**20.781**	**22.208**	**1.571.047.825**
Presidente Perón	Residencial	29.528	29.528	423.720.588	38	76	1.141.851	**29.566**	**29.604**	**424.862.439**
	No Residencial	1.196	1.196	71.381.516	67	79	9.388.289	**1.263**	**1.275**	**80.769.805**
TOTAL REGIÓN SUDOESTE	Residencial	692.382	696.859	9.564.604.631	60.787	73.307	2.435.893.863	**753.169**	**770.166**	**12.000.498.494**
	No Residencial	25.812	25.491	1.584.813.732	19.193	20.841	1.851.635.944	**45.005**	**46.332**	**3.436.449.676**
TOTAL	**Residencial**	**4.753.886**	**5.246.010**	**104.675.422.174**	**1.040.478**	**1.509.434**	**55.582.033.158**	**5.794.364**	**6.755.444**	**160.257.455.332**
	No Residencial	**331.659**	**336.970**	**26.050.917.482**	**251.594**	**325.185**	**39.723.716.050**	**583.253**	**662.155**	**65.774.633.531**
	Total	**5.085.545**	**5.582.980**	**130.726.339.656**	**1.292.072**	**1.834.619**	**95.305.749.208**	**6.377.617**	**7.417.599**	**226.032.088.864**

(1) Distrito Morón incluye a los Partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

FACTURACION EMISION GENERAL
ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025)

DISTRITOS	CATEGORIA	NO MEDIDO		MEDIDO		TOTAL	
		FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS
CAPITAL	RESIDENCIAL + BALDIO	1.529.155	50.563.067.614	264.169	23.636.554.452	**1.793.324**	**74.199.622.066**
	NO RESIDENCIAL	170.502	13.528.821.911	88.586	21.994.251.948	**259.088**	**35.523.073.859**
	TOTAL	**1.699.657**	**64.091.889.525**	**352.755**	**45.630.806.400**	**2.052.412**	**109.722.695.925**
VICENTE LOPEZ	RESIDENCIAL + BALDIO	78.636	1.558.032.203	104.507	3.987.690.060	**183.143**	**5.545.722.263**
	NO RESIDENCIAL	6.346	446.525.667	11.933	1.675.112.374	**18.279**	**2.121.638.041**
	TOTAL	**84.982**	**2.004.557.870**	**116.440**	**5.662.802.434**	**201.422**	**7.667.360.304**
SAN ISIDRO	RESIDENCIAL + BALDIO	66.783	1.566.348.157	111.736	4.782.263.881	**178.519**	**6.348.612.038**
	NO RESIDENCIAL	6.930	429.265.696	9.690	1.379.153.349	**16.620**	**1.808.419.046**
	TOTAL	**73.713**	**1.995.613.853**	**121.426**	**6.161.417.231**	**195.139**	**8.157.031.084**
SAN MARTIN	RESIDENCIAL + BALDIO	123.245	1.986.826.417	87.102	3.387.401.990	**210.347**	**5.374.228.408**
	NO RESIDENCIAL	7.206	769.102.468	19.829	1.814.793.702	**27.035**	**2.583.896.170**
	TOTAL	**130.451**	**2.755.928.885**	**106.931**	**5.202.195.692**	**237.382**	**7.958.124.578**
SAN FERNANDO	RESIDENCIAL + BALDIO	51.533	1.243.970.389	17.998	914.902.944	**69.531**	**2.158.873.333**
	NO RESIDENCIAL	3.097	251.803.851	4.746	789.794.057	**7.843**	**1.041.597.908**
	TOTAL	**54.630**	**1.495.774.240**	**22.744**	**1.704.697.001**	**77.374**	**3.200.471.242**
TIGRE	RESIDENCIAL + BALDIO	117.566	2.552.056.333	22.217	2.136.352.750	**139.783**	**4.688.409.083**
	NO RESIDENCIAL	5.489	768.311.959	5.189	767.809.409	**10.678**	**1.536.121.368**
	TOTAL	**123.055**	**3.320.368.292**	**27.406**	**2.904.162.159**	**150.461**	**6.224.530.450**
ESCOBAR	RESIDENCIAL + BALDIO	42.656	730.965.274	1.173	313.938.115	**43.829**	**1.044.903.389**
	NO RESIDENCIAL	2.919	284.526.606	413	87.762.792	**3.332**	**372.289.398**
	TOTAL	**45.575**	**1.015.491.880**	**1.586**	**401.700.907**	**47.161**	**1.417.192.787**
SAN MIGUEL	RESIDENCIAL + BALDIO	122.655	2.184.254.359	1.598	120.553.769	**124.253**	**2.304.808.128**
	NO RESIDENCIAL	8.164	632.045.342	577	95.921.883	**8.741**	**727.967.224**
	TOTAL	**130.819**	**2.816.299.701**	**2.175**	**216.475.652**	**132.994**	**3.032.775.353**
JOSE C. PAZ	RESIDENCIAL + BALDIO	10.242	113.710.497	34	400.545	**10.276**	**114.111.042**
	NO RESIDENCIAL	407	14.126.602	27	985.551	**434**	**15.112.153**
	TOTAL	**10.649**	**127.837.099**	**61**	**1.386.096**	**10.710**	**129.223.195**
MALVINAS ARGENTINAS	RESIDENCIAL + BALDIO	13.418	170.065.392	44	617.932	**13.462**	**170.683.324**
	NO RESIDENCIAL	334	14.314.606	17	216.149	**351**	**14.530.755**
	TOTAL	**13.752**	**184.379.998**	**61**	**834.081**	**13.813**	**185.214.079**
PILAR	RESIDENCIAL + BALDIO	30.928	629.361.674	22.028	1.093.909.969	**52.956**	**1.723.271.643**
	NO RESIDENCIAL	185	70.932.151	2.794	452.887.720	**2.979**	**523.819.871**
	TOTAL	**31.113**	**700.293.825**	**24.822**	**1.546.797.690**	**55.935**	**2.247.091.514**
TOTAL REGIÓN NORTE	RESIDENCIAL + BALDIO	657.662	12.735.590.695	368.437	16.738.031.956	**1.026.099**	**29.473.622.651**
	NO RESIDENCIAL	41.077	3.680.954.948	55.215	7.064.436.986	**96.292**	**10.745.391.934**
	TOTAL	**698.739**	**16.416.545.643**	**423.652**	**23.802.468.942**	**1.122.391**	**40.219.014.585**
TRES DE FEBRERO	RESIDENCIAL + BALDIO	146.504	3.065.697.483	33.219	1.054.969.425	**179.723**	**4.120.666.907**
	NO RESIDENCIAL	8.393	682.715.284	12.255	922.135.576	**20.648**	**1.604.850.859**
	TOTAL	**154.897**	**3.748.412.766**	**45.474**	**1.977.105.000**	**200.371**	**5.725.517.767**
MORÓN (1)	RESIDENCIAL + BALDIO	283.466	5.008.885.178	57.568	2.100.327.399	**341.034**	**7.109.212.577**
	NO RESIDENCIAL	12.393	1.109.462.855	11.442	1.182.591.798	**23.835**	**2.292.054.653**
	TOTAL	**295.859**	**6.118.348.033**	**69.010**	**3.282.919.197**	**364.869**	**9.401.267.230**
LA MATANZA NORTE	RESIDENCIAL + BALDIO	191.307	3.273.320.486	115.407	3.888.162.772	**306.714**	**7.161.483.258**
	NO RESIDENCIAL	12.541	963.629.618	18.387	1.716.187.206	**30.928**	**2.679.816.824**
	TOTAL	**203.848**	**4.236.950.104**	**133.794**	**5.604.349.979**	**337.642**	**9.841.300.082**
LA MATANZA SUR	RESIDENCIAL + BALDIO	118.360	2.091.545.686	38.257	1.226.925.728	**156.617**	**3.318.471.414**
	NO RESIDENCIAL	4.347	502.957.256	4.318	737.931.513	**8.665**	**1.240.888.769**
	TOTAL	**122.707**	**2.594.502.942**	**42.575**	**1.964.857.241**	**165.282**	**4.559.360.183**
LA MATANZA OESTE	RESIDENCIAL + BALDIO	205.388	1.532.547.143	32	830.833	**205.420**	**1.533.377.976**
	NO RESIDENCIAL	5.775	244.285.702	151	4.796.602	**5.926**	**249.082.303**
	TOTAL	**211.163**	**1.776.832.845**	**183**	**5.627.434**	**211.346**	**1.782.460.279**
MERLO	RESIDENCIAL + BALDIO	136.455	1.999.823.096	506	17.283.233	**136.961**	**2.017.106.329**
	NO RESIDENCIAL	7.164	442.521.453	418	54.466.314	**7.582**	**496.987.767**
	TOTAL	**143.619**	**2.442.344.549**	**924**	**71.749.547**	**144.543**	**2.514.094.096**
MORENO	RESIDENCIAL + BALDIO	116.588	2.018.398.281	361	16.164.486	**116.949**	**2.034.562.767**
	NO RESIDENCIAL	7.042	511.013.062	450	53.683.099	**7.492**	**564.696.161**
	TOTAL	**123.630**	**2.529.411.343**	**811**	**69.847.585**	**124.441**	**2.599.258.928**
TOTAL REGIÓN OESTE	RESIDENCIAL + BALDIO	1.198.068	18.990.217.352	245.350	8.304.663.876	**1.443.418**	**27.294.881.228**
	NO RESIDENCIAL	57.655	4.456.585.229	47.421	4.671.792.108	**105.076**	**9.128.377.337**
	TOTAL	**1.255.723**	**23.446.802.581**	**292.771**	**12.976.455.984**	**1.548.494**	**36.423.258.565**
AVELLANEDA	RESIDENCIAL + BALDIO	153.725	2.832.958.493	33.747	1.619.621.722	**187.472**	**4.452.580.215**
	NO RESIDENCIAL	9.085	607.459.062	13.786	1.601.371.128	**22.871**	**2.208.830.190**
	TOTAL	**162.810**	**3.440.417.554**	**47.533**	**3.220.992.850**	**210.343**	**6.661.410.405**
LANUS	RESIDENCIAL + BALDIO	208.343	3.478.134.599	32.255	1.438.983.987	**240.598**	**4.917.118.586**
	NO RESIDENCIAL	9.431	595.249.567	14.903	1.253.320.799	**24.334**	**1.848.570.366**
	TOTAL	**217.774**	**4.073.384.166**	**47.158**	**2.692.304.786**	**264.932**	**6.765.688.952**
QUILMES	RESIDENCIAL + BALDIO	237.700	4.539.904.282	45.102	1.911.122.766	**282.802**	**6.451.027.048**
	NO RESIDENCIAL	11.763	945.676.422	11.864	1.211.662.361	**23.627**	**2.157.338.783**
	TOTAL	**249.463**	**5.485.580.703**	**56.966**	**3.122.785.128**	**306.429**	**8.608.365.831**
FLORENCIO VARELA	RESIDENCIAL + BALDIO	173.840	2.958.339.056	447	17.811.862	**174.287**	**2.976.150.918**
	NO RESIDENCIAL	6.334	651.356.612	626	75.244.774	**6.960**	**726.601.386**
	TOTAL	**180.174**	**3.609.695.668**	**1.073**	**93.056.636**	**181.247**	**3.702.752.304**
TOTAL REGIÓN SUDESTE	RESIDENCIAL + BALDIO	773.608	13.809.336.429	111.551	4.987.540.338	**885.159**	**18.796.876.767**
	NO RESIDENCIAL	36.613	2.799.741.662	41.179	4.141.599.063	**77.792**	**6.941.340.725**
	TOTAL	**810.221**	**16.609.078.092**	**152.730**	**9.129.139.401**	**962.951**	**25.738.217.492**
ALMTE. BROWN	RESIDENCIAL + BALDIO	154.469	2.175.235.197	21.825	697.823.147	**176.294**	**2.873.058.344**
	NO RESIDENCIAL	5.718	280.444.702	3.892	347.883.817	**9.610**	**628.328.519**
	TOTAL	**160.187**	**2.455.679.899**	**25.717**	**1.045.706.964**	**185.904**	**3.501.386.863**
ESTEBAN ECHEVERRIA	RESIDENCIAL + BALDIO	148.986	2.247.679.804	6.218	225.627.378	**155.204**	**2.473.307.183**
	NO RESIDENCIAL	7.265	536.438.221	2.610	287.704.264	**9.875**	**824.142.485**
	TOTAL	**156.251**	**2.784.118.025**	**8.828**	**513.331.642**	**165.079**	**3.297.449.667**
EZEIZA	RESIDENCIAL + BALDIO	77.843	1.047.964.494	1.590	49.322.776	**79.433**	**1.097.287.271**
	NO RESIDENCIAL	2.769	257.418.870	707	74.742.172	**3.476**	**332.161.042**
	TOTAL	**80.612**	**1.305.383.364**	**2.297**	**124.064.949**	**82.909**	**1.429.448.313**
LOMAS DE ZAMORA	RESIDENCIAL + BALDIO	301.491	3.843.735.253	31.619	1.476.880.771	**333.110**	**5.320.616.024**
	NO RESIDENCIAL	8.864	439.130.423	11.917	1.131.917.403	**20.781**	**1.571.047.825**
	TOTAL	**310.355**	**4.282.865.676**	**43.536**	**2.608.798.173**	**353.891**	**6.891.663.849**
PRESIDENTE PERÓN	RESIDENCIAL + BALDIO	35.780	484.936.949	38	1.141.851	**35.818**	**486.078.801**
	NO RESIDENCIAL	1.196	71.381.516	67	9.388.289	**1.263**	**80.769.805**
	TOTAL	**36.976**	**556.318.466**	**105**	**10.530.140**	**37.081**	**566.848.606**
TOTAL REGIÓN SUDOESTE	RESIDENCIAL + BALDIO	718.569	9.799.551.698	61.290	2.450.795.924	**779.859**	**12.250.347.622**
	NO RESIDENCIAL	25.812	1.584.813.732	19.193	1.851.635.944	**45.005**	**3.436.449.676**
	TOTAL	**744.381**	**11.384.365.429**	**80.483**	**4.302.431.868**	**824.864**	**15.686.797.298**
	RESIDENCIAL + BALDIO	**4.877.062**	**105.897.763.789**	**1.050.797**	**56.117.586.545**	**5.927.859**	**162.015.350.334**

TOTAL	**NO RESIDENCIAL**	**331.659**	**26.050.917.482**	**251.594**	**39.723.716.050**	**583.253**	**65.774.633.531**
	TOTAL	**5.208.721**	**131.948.681.270**	**1.302.391**	**95.841.302.595**	**6.511.112**	**227.789.983.866**

(1) Distrito Morón incluye a los Partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

CATEGORIA	AGUA		CLOACA		AGUA Y CLOACA		TOTAL	
	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS
RESIDENCIAL + BALDIO	108	5.167.837	1	44.085	1.793.215	74.194.410.144	**1.793.324**	**74.199.622.066**
NO RESIDENCIAL	420	250.161.953	1	0	258.667	35.272.911.906	**259.088**	**35.523.073.859**
CAPITAL	**528**	**255.329.790**	**2**	**44.085**	**2.051.882**	**109.467.322.051**	**2.052.412**	**109.722.695.925**

CATEGORIA	AGUA		CLOACA		AGUA Y CLOACA		TOTAL	
	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS
RESIDENCIAL + BALDIO	1.561.060	25.543.964.411	262.986	4.002.861.870	1.601.698	45.397.225.646	**3.425.744**	**74.944.051.927**
NO RESIDENCIAL	92.950	7.329.806.864	13.399	1.243.736.878	178.682	18.155.241.409	**285.031**	**26.728.785.152**
G.B.A. (2)	**1.654.010**	**32.873.771.276**	**276.385**	**5.246.598.748**	**1.780.380**	**63.552.467.055**	**3.710.775**	**101.672.837.079**

CATEGORIA	AGUA		CLOACA		AGUA Y CLOACA		TOTAL	
	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS
RESIDENCIAL + BALDIO	320.112	4.051.711.058	116.947	1.669.119.107	271.732	7.150.846.176	**708.791**	**12.871.676.341**
NO RESIDENCIAL	12.806	713.996.861	4.322	399.578.376	22.006	2.409.199.284	**39.134**	**3.522.774.521**
NUEVAS ÁREAS	**332.918**	**4.765.707.919**	**121.269**	**2.068.697.483**	**293.738**	**9.560.045.460**	**747.925**	**16.394.450.862**

CATEGORIA	AGUA		CLOACA		AGUA Y CLOACA		TOTAL	
	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS	FACTURAS	PESOS
RESIDENCIAL + BALDIO	**1.881.280**	**29.600.843.307**	**379.934**	**5.672.025.061**	**3.666.645**	**126.742.481.966**	**5.927.859**	**162.015.350.334**
NO RESIDENCIAL	**106.176**	**8.293.965.678**	**17.722**	**1.643.315.254**	**459.355**	**55.837.352.599**	**583.253**	**65.774.633.531**
TOTAL	**1.987.456**	**37.894.808.984**	**397.656**	**7.315.340.315**	**4.126.000**	**182.579.834.566**	**6.511.112**	**227.789.983.866**

(2) No incluye nuevas áreas (Escobar, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, Presidente Perón, Merlo, Moreno y Florencio Varela).

UNIDADES FUNCIONALES TOTALES A DICIEMBRE DE 2025 (1)

Área	RESIDENCIALES		NO RESIDENCIALES		BALDIOS	TOTAL 2025	TOTAL 2024	Diferencia
	RI	RII	NRI	NRII				
	Unidades totales	Unidades totales	Unidades totales	Unidades totales	Unidades totales	Unidades totales	Unidades totales	Unidades totales
Capital Federal	**176.833**	**1.129.768**	**53.783**	**122.235**	**5.438**	**1.488.057**	**1.484.017**	**4.040**
Alte. Brown	91.289	7.195	4.934	728	2.258	106.404	105.017	1.387
Avellaneda	58.686	40.847	9.075	3.377	457	112.442	112.211	231
Lanus	93.856	31.152	10.708	2.010	711	138.437	138.225	212
Lomas de Zamora	140.125	31.927	8.869	2.817	2.354	186.092	186.059	33
Morón **(2)**	148.590	29.932	10.665	2.608	3.841	195.636	195.440	196
San Fernando	25.452	10.214	2.946	1.180	347	40.139	40.054	85
San Isidro	61.190	30.464	5.486	3.595	998	101.733	101.613	120
Ezeiza	36.795	2.581	1.824	112	2.782	44.094	44.066	28
Tigre	66.586	19.590	5.730	717	3.549	96.172	94.285	1.887
Vicente López	52.229	49.036	6.577	2.996	466	111.304	111.217	87
San Martín	75.451	34.561	11.563	2.523	667	124.765	124.648	117
La Matanza Norte	118.631	39.643	13.167	3.175	1.670	176.286	176.029	257
Tres de Febrero	59.046	35.776	8.793	1.944	653	106.212	106.123	89
La Matanza Oeste	92.686	1.481	3.134	42	12.140	109.483	109.025	458
E. Echeverría	66.801	8.408	4.360	621	4.136	84.326	84.191	135
La Matanza Sur	58.405	19.609	4.097	435	1.350	83.896	83.610	286
Quilmes	122.072	23.630	10.341	2.680	2.915	161.638	161.882	-244
Gran Buenos Aires	**1.367.890**	**416.046**	**122.269**	**31.560**	**41.294**	**1.979.059**	**1.973.695**	**5.364**
Total	**1.544.723**	**1.545.814**	**176.052**	**153.795**	**46.732**	**3.467.116**	**3.457.712**	**9.404**
Florencio Varela	86.390	1.280	3.599	101	4.966	96.336	95.381	955
Merlo	78.069	2.285	3.950	216	5.184	89.704	89.105	599
Moreno	56.436	2.030	3.848	267	6.503	69.084	67.729	1.355
Presidente Perón	16.791	111	721	17	6.562	24.202	24.199	3
San Miguel	46.886	17.344	3.091	1.417	1.849	70.587	69.507	1.080
José C. Paz	5.188	7	214	10	161	5.580	5.538	42
Malvinas Argentinas	8.863	559	275	19	220	9.936	9.975	-39
Pilar	23.712	1.336	1.540	55	2.710	29.353	26.967	2.386
Escobar	17.507	4.322	1.531	284	1.211	24.855	23.834	1.021
Nuevas Áreas	**339.842**	**29.274**	**18.769**	**2.386**	**29.366**	**419.637**	**412.235**	**7.402**

(1) Incluye solo unidades funcionales.

(2) Distrito Morón incluye a los Partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

FORMATO N° 307

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A)
SERVICIO: AGUA - CODIGO: 01

AREA	DISTRITO	ZONAL	USUARIOS NO MEDIDOS						USUARIOS MEDIDOS						TOTAL					
			Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL	
			FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)
CAPITAL FEDERAL	Centro	2,00	2	20.986			2	20.986	4	42.611			4	42.611	6	63.597	0	0	**6**	**63.597**
		2,20	12	169.477	35	14.431.262	47	14.600.740	5	85.385	10	61.874.462	15	61.959.846	17	254.862	45	76.305.724	**62**	**76.560.586**
		2,40	12	126.383			12	126.383	12	127.888	4	63.098	16	190.987	24	254.271	4	63.098	**28**	**317.369**
		2,75	6	63.188	2	16.083.969	8	16.147.157			2	0	2	0	6	63.188	4	16.083.969	**10**	**16.147.157**
		3,10	4	42.076			4	42.076					0	0	4	42.076	0	0	**4**	**42.076**
		3,50	10	105.313	7	55.488.650	17	55.593.963	18	191.794	4	5.714.612	22	5.906.405	28	297.106	11	61.203.262	**39**	**61.500.368**
	TOTAL		**46**	**527.422**	**44**	**86.003.882**	**90**	**86.531.304**	**39**	**447.678**	**20**	**67.652.172**	**59**	**68.099.850**	**85**	**975.100**	**64**	**153.656.053**	**149**	**154.631.153**
	Caballito	1,80			1	2.565.919	1	2.565.919	8	85.305	2	187.845	10	273.150	8	85.305	3	2.753.764	**11**	**2.839.069**
		2,00	6	63.272	1	438.786	7	502.058	14	149.409			14	149.409	20	212.681	1	438.786	**21**	**651.467**
		2,20	8	84.306			8	84.306	14	149.145			14	149.145	22	233.451	0	0	**22**	**233.451**
		2,40	10	84.068			10	84.068	10	106.180	2	40.371	12	146.551	20	190.249	2	40.371	**22**	**230.620**
		2,75					0	0	1	10.596	3	61.300	4	71.896	1	10.596	3	61.300	**4**	**71.896**
		3,10	2	21.049			2	21.049	2	21.289			2	21.289	4	42.338	0	0	**4**	**42.338**
	TOTAL		**26**	**252.695**	**2**	**3.004.705**	**28**	**3.257.400**	**49**	**521.924**	**7**	**289.516**	**56**	**811.440**	**75**	**774.619**	**9**	**3.294.221**	**84**	**4.068.840**
	Constitución	1,45	3	49.881	4	78.424	7	128.305	8	170.755	2	62.650	10	233.405	11	220.636	6	141.074	**17**	**361.710**
		1,60	4	42.139			4	42.139	4	42.595	2	46.523	6	89.117	8	84.734	2	46.523	**10**	**131.256**
		1,80	2	21.140			2	21.140					0	0	2	21.140	0	0	**2**	**21.140**
	TOTAL		**9**	**113.159**	**4**	**78.424**	**13**	**191.584**	**12**	**213.350**	**4**	**109.172**	**16**	**322.522**	**21**	**326.509**	**8**	**187.597**	**29**	**514.106**
	Devoto	1,60	34	426.007			34	426.007	2	21.289	1	0	3	21.289	36	447.296	1	0	**37**	**447.296**
		1,80					0	0	8	100.794	11	82.974	19	183.768	8	100.794	11	82.974	**19**	**183.768**
	TOTAL		**34**	**426.007**	**0**	**0**	**34**	**426.007**	**10**	**122.083**	**12**	**82.974**	**22**	**205.056**	**44**	**548.090**	**12**	**82.974**	**56**	**631.064**
	Flores	1,30	5	89.793	19	40.648.464	24	40.738.257	1	10.811	5	9.013.515	6	9.024.326	6	100.604	24	49.661.979	**30**	**49.762.583**
		1,45	11	201.476	25	29.090.698	36	29.292.174	2	13.442	10	1.413.141	12	1.426.583	13	214.917	35	30.503.839	**48**	**30.718.757**
		1,60	4	42.139	1	45.740	5	87.879			2	30.372	2	30.372	4	42.139	3	76.113	**7**	**118.252**
		1,80	4	41.971			4	41.971	2	21.240	1	121.859	3	143.100	6	63.212	1	121.859	**7**	**185.071**
	TOTAL		**24**	**375.379**	**45**	**69.784.903**	**69**	**70.160.282**	**5**	**45.493**	**18**	**10.578.888**	**23**	**10.624.381**	**29**	**420.872**	**63**	**80.363.791**	**92**	**80.784.663**
	Belgrano	1,60	2	21.140	2	1.903.069	4	1.924.209	8	76.531	17	1.174.021	25	1.250.552	10	97.671	19	3.077.090	**29**	**3.174.761**
		2,00	4	42.279			4	42.279	10	106.977	7	56.402	17	163.379	14	149.256	7	56.402	**21**	**205.658**
		2,20	14	160.684	5	405.180	19	565.864	29	311.141	10	10.278.577	39	10.589.718	43	471.825	15	10.683.757	**58**	**11.155.582**
		2,40	8	84.362			8	84.362			2	79.600	2	79.600	8	84.362	2	79.600	**10**	**163.963**
	TOTAL		**28**	**308.465**	**7**	**2.308.250**	**35**	**2.616.714**	**47**	**494.650**	**36**	**11.588.600**	**83**	**12.083.250**	**75**	**803.114**	**43**	**13.896.850**	**118**	**14.699.964**
TOTAL			**167**	**2.003.127**	**102**	**161.180.163**	**269**	**163.183.291**	**162**	**1.845.177**	**97**	**90.301.322**	**259**	**92.146.499**	**329**	**3.848.304**	**199**	**251.481.486**	**528**	**255.329.790**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en el sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.

FORMATO N° 308

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A)
SERVICIO: AGUA - CODIGO: 01

AREA	DISTRITO	ZONAL	USUARIOS NO MEDIDOS						USUARIOS MEDIDOS						TOTAL					
			Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL	
			FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)
REGION NORTE	Vicente López	1,30	87	1.060.667	192	7.906.256	279	8.966.923	278	4.119.237	380	24.169.072	658	28.288.309	365	5.179.904	572	32.075.327	**937**	**37.255.231**
		1,45	52	537.288	118	2.798.902	170	3.336.190	200	2.283.987	285	27.243.373	485	29.527.360	252	2.821.275	403	30.042.275	**655**	**32.863.550**
		2,00	10	96.044	56	3.992.676	66	4.088.720	52	596.996	111	43.245.498	163	43.842.494	62	693.040	167	47.238.174	**229**	**47.931.214**
		2,75			6	262.674	6	262.674	8	113.964	6	6.313.261	14	6.427.226	8	113.964	12	6.575.935	**20**	**6.689.900**
	TOTAL		**149**	**1.694.000**	**372**	**14.960.507**	**521**	**16.654.507**	**538**	**7.114.184**	**782**	**100.971.204**	**1.320**	**108.085.388**	**687**	**8.808.184**	**1.154**	**115.931.711**	**1.841**	**124.739.895**
	San Isidro	1,30	6.906	86.333.441	8.738	317.653.996	15.644	403.987.437	8.342	118.042.981	17.748	1.076.849.988	26.090	1.194.892.969	15.248	204.376.422	26.486	1.394.503.984	**41.734**	**1.598.880.405**
		1,60	28	401.015	112	2.938.573	140	3.339.588	55	716.021	92	5.724.357	147	6.440.378	83	1.117.036	204	8.662.930	**287**	**9.779.965**
		2,00	4	25.109	12	211.488	16	236.598	6	43.346	15	827.192	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		2,20			56	2.304.584	56	2.304.584	53	697.147	193	15.413.009	246	16.110.156	53	697.147	249	17.717.593	**302**	**18.414.740**
		2,75			55	5.807.891	55	5.807.891	14	114.882	58	5.491.156	72	5.606.038	14	114.882	113	11.299.047	**127**	**11.413.929**
		3,10	2	42.097	76	6.204.391	78	6.246.488	59	655.247	223	15.187.574	282	15.842.821	61	697.344	299	21.391.965	**360**	**22.089.309**
	TOTAL		**6.940**	**86.801.662**	**9.049**	**335.120.922**	**15.989**	**421.922.584**	**8.529**	**120.269.623**	**18.329**	**1.119.493.276**	**26.858**	**1.239.762.899**	**15.469**	**207.071.285**	**27.378**	**1.454.614.198**	**42.847**	**1.661.685.484**
	San Martín	1,45	21.017	213.799.237	40.806	773.641.167	61.823	987.440.403	20.861	289.894.331	19.680	1.287.679.956	40.541	1.577.574.287	41.878	503.693.567	60.486	2.061.321.123	**102.364**	**2.565.014.690**
		1,80	2	28.394	36	913.881	38	942.275	69	944.673	126	5.758.462	195	6.703.135	71	973.067	162	6.672.342	**233**	**7.645.410**
	TOTAL		**21.019**	**213.827.631**	**40.842**	**774.555.048**	**61.861**	**988.382.678**	**20.930**	**290.839.004**	**19.806**	**1.293.438.418**	**40.736**	**1.584.277.422**	**41.949**	**504.666.635**	**60.648**	**2.067.993.465**	**102.597**	**2.572.660.100**
	San Fernando	1,30	6.050	78.335.861	19.308	633.620.894	25.358	711.956.755	1.650	28.774.976	3.183	485.452.695	4.833	514.227.671	7.700	107.110.837	22.491	1.119.073.589	**30.191**	**1.226.184.426**
		1,80	4	56.959	58	2.753.469	62	2.810.428	103	1.470.934	210	9.087.326	313	10.558.259	107	1.527.892	268	11.840.795	**375**	**13.368.687**
		3,10	2	25.168	26	14.125.373	28	14.150.541	20	259.649	87	13.560.288	107	13.819.937	22	284.817	113	27.685.661	**135**	**27.970.478**
	TOTAL		**6.056**	**78.417.987**	**19.392**	**650.499.736**	**25.448**	**728.917.723**	**1.773**	**30.505.559**	**3.480**	**508.100.308**	**5.253**	**538.605.867**	**7.829**	**108.923.546**	**22.872**	**1.158.600.045**	**30.701**	**1.267.523.591**
	Tigre	1,30	22.723	228.110.526	75.979	2.086.650.281	98.702	2.314.760.807	8.471	109.909.309	14.104	1.917.940.737	22.575	2.027.850.046	31.194	338.019.835	90.083	4.004.591.018	**121.277**	**4.342.610.853**
		1,60	168	2.349.805	1.691	47.362.384	1.859	49.712.189	208	4.194.347	499	55.882.447	707	60.076.794	376	6.544.152	2.190	103.244.832	**2.566**	**109.788.983**
		2,75			46	249.428.951	46	249.428.951	1	6.318	39	295.042.911	40	295.049.229	1	6.318	85	544.471.862	**86**	**544.478.180**
	TOTAL		**22.891**	**230.460.331**	**77.716**	**2.383.441.616**	**100.607**	**2.613.901.947**	**8.680**	**114.109.973**	**14.642**	**2.268.866.095**	**23.322**	**2.382.976.069**	**31.571**	**344.570.305**	**92.358**	**4.652.307.711**	**123.929**	**4.996.878.016**
	Escobar	1,30	3.463	29.684.339	17.566	336.808.755	21.029	366.493.095	88	1.238.527	126	18.682.621	214	19.921.148	3.551	30.922.866	17.692	355.491.376	**21.243**	**386.414.243**
		1,60	94	664.036	665	12.912.562	759	13.576.598	4	28.979	10	413.526	14	442.505	98	693.015	675	13.326.088	**773**	**14.019.103**
		2,75			10	13.875.200	10	13.875.200	1	7.136	13	124.957.737	14	124.964.873	1	7.136	23	138.832.937	**24**	**138.840.073**
	TOTAL		**3.557**	**30.348.375**	**18.241**	**363.596.517**	**21.798**	**393.944.892**	**93**	**1.274.642**	**149**	**144.053.884**	**242**	**145.328.526**	**3.650**	**31.623.017**	**18.390**	**507.650.402**	**22.040**	**539.273.418**
	San Miguel	1,30	2.384	17.307.441	24.177	364.517.337	26.561	381.824.779	58	579.563	41	2.322.245	99	2.901.807	2.442	17.887.004	24.218	366.839.582	**26.660**	**384.726.586**
		1,80	18	126.690	321	10.780.632	339	10.907.322	14	142.772	6	491.913	20	634.685	32	269.462	327	11.272.546	**359**	**11.542.008**
	TOTAL		**2.402**	**17.434.131**	**24.498**	**375.297.969**	**26.900**	**392.732.101**	**72**	**722.335**	**47**	**2.814.158**	**119**	**3.536.493**	**2.474**	**18.156.466**	**24.545**	**378.112.128**	**27.019**	**396.268.594**
	Jose C. Paz	1,30	792	5.203.849	9.857	122.633.250	10.649	127.837.099	39	361.687	22	1.024.409	61	1.386.096	831	5.565.537	9.879	123.657.658	**10.710**	**129.223.195**
	TOTAL		**792**	**5.203.849**	**9.857**	**122.633.250**	**10.649**	**127.837.099**	**39**	**361.687**	**22**	**1.024.409**	**61**	**1.386.096**	**831**	**5.565.537**	**9.879**	**123.657.658**	**10.710**	**129.223.195**
	Malvinas Argentinas	1,30	625	4.247.645	13.127	180.132.353	13.752	184.379.998	42	365.642	19	468.440	61	834.081	667	4.613.287	13.146	180.600.792	**13.813**	**185.214.079**
	TOTAL		**625**	**4.247.645**	**13.127**	**180.132.353**	**13.752**	**184.379.998**	**42**	**365.642**	**19**	**468.440**	**61**	**834.081**	**667**	**4.613.287**	**13.146**	**180.600.792**	**13.813**	**185.214.079**
	Pilar	1,30	9.398	60.364.992	16.233	180.349.180	25.631	240.714.172	2.687	19.380.011	2.934	111.363.446	5.621	130.743.457	12.085	79.745.003	19.167	291.712.626	**31.252**	**371.457.629**
		1,60	42	291.842	44	842.290	86	1.134.132	203	1.689.487	254	9.868.148	457	11.557.635	245	1.981.329	298	10.710.438	**543**	**12.691.767**
		2,75			32	42.290.556	32	42.290.556	4	57.725	25	90.805.679	29	90.863.404	4	57.725	57	133.096.235	**61**	**133.153.960**
	TOTAL		**9.440**	**60.656.835**	**16.309**	**223.482.026**	**25.749**	**284.138.860**	**2.894**	**21.127.223**	**3.213**	**212.037.273**	**6.107**	**233.164.496**	**12.334**	**81.784.058**	**19.522**	**435.519.298**	**31.856**	**517.303.356**
TOTAL REGION NORTE			**73.871**	**729.092.447**	**229.403**	**5.423.719.944**	**303.274**	**6.152.812.390**	**43.590**	**586.689.872**	**60.489**	**5.651.267.465**	**104.079**	**6.237.957.337**	**117.461**	**1.315.782.318**	**289.892**	**11.074.987.409**	**407.353**	**12.390.769.727**
REGION OESTE	Tres de Febrero	1,30	4.555	59.575.991	19.620	482.590.679	24.175	542.166.671	504	9.912.497	402	52.621.912	906	62.534.409	5.059	69.488.488	20.022	535.212.591	**25.081**	**604.701.079**
		1,45	75	843.890	170	4.390.003	245	5.233.893	52	626.211	90	2.967.552	142	3.593.763	0	0	0	0	**0**	**0**
		2,00	8	121.419	635	23.995.786	643	24.117.206	10	954.582	11	1.689.070	21	2.643.652	18	1.076.002	646	25.684.856	**664**	**26.760.857**
	TOTAL		**4.638**	**60.541.301**	**20.425**	**510.976.468**	**25.063**	**571.517.769**	**566**	**11.493.290**	**503**	**57.278.533**	**1.069**	**68.771.824**	**5.204**	**72.034.591**	**20.928**	**568.255.002**	**26.132**	**640.289.593**
	Morón (1)	1,45	14.478	179.841.704	95.402	2.081.111.466	109.880	2.260.953.170	8.213	129.279.602	10.609	638.990.824	18.822	768.270.426	22.691	309.121.306	106.011	2.720.102.290	**128.702**	**3.029.223.596**
		2,00	7	103.469	28	2.222.500	35	2.325.969	69	1.183.504	115	8.165.554	184	9.349.058	76	1.286.973	143	10.388.054	**219**	**11.675.027**
	TOTAL		**14.485**	**179.945.173**	**95.430**	**2.083.333.966**	**109.915**	**2.263.279.139**	**8.282**	**130.463.106**	**10.724**	**647.156.378**	**19.006**	**777.619.484**	**22.767**	**310.408.279**	**106.154**	**2.730.490.344**	**128.921**	**3.040.898.623**
	La Matanza Norte	1,30	23.069	237.865.263	57.009	1.087.391.012	80.078	1.325.256.275	670	11.080.636	732	127.078.045	1.402	138.158.681	23.739	248.945.899	57.741	1.214.469.057	**81.480**	**1.463.414.956**
		1,60					0	0			6	180.692	6	180.692	0	0	6	180.692	**6**	**180.692**
		2,20			4	511.833	4	511.833	4	85.222			4	85.222	4	85.222	4	511.833	**8**	**597.055**
	TOTAL		**23.069**	**237.865.263**	**57.013**	**1.087.902.845**	**80.082**	**1.325.768.108**	**674**	**11.165.859**	**738**	**127.258.736**	**1.412**	**138.424.595**	**23.743**	**249.031.122**	**57.751**	**1.215.161.582**	**81.494**	**1.464.192.703**
	La Matanza Sur	1,30	20.283	253.371.686	40.703	915.760.285	60.986	1.169.131.971	723	10.546.761	1.295	101.480.458	2.018	112.027.219	21.006	263.918.447	41.998	1.017.240.743	**63.004**	**1.281.159.189**
	TOTAL		**20.283**	**253.371.686**	**40.703**	**915.760.285**	**60.986**	**1.169.131.971**	**723**	**10.546.761**	**1.295**	**101.480.458**	**2.018**	**112.027.219**	**21.006**	**263.918.447**	**41.998**	**1.017.240.743**	**63.004**	**1.281.159.189**
	La Matanza Oeste	1,30	114.424	744.898.122	96.467	1.028.213.616	210.891	1.773.111.738	106	1.106.997	77	4.520.438	183	5.627.434	114.530	746.005.119	96.544	1.032.734.053	**211.074**	**1.778.739.172**
	TOTAL		**114.424**	**744.898.122**	**96.467**	**1.028.213.616**	**210.891**	**1.773.111.738**	**106**	**1.106.997**	**77**	**4.520.438**	**183**	**5.627.434**	**114.530**	**746.005.119**	**96.544**	**1.032.734.053**	**211.074**	**1.778.739.172**
	Merlo	1,30	15.802	102.656.105	53.827	712.918.116	69.629	815.574.222	36	328.265	49	6.288.810	85	6.617.076	15.838	102.984.371	53.876	719.206.927	**69.714**	**822.191.297**
		1,60			8	221.324	8	221.324					0	0	0	0	8	221.324	**8**	**221.324**
	TOTAL		**15.802**	**102.656.105**	**53.835**	**713.139.440**	**69.637**	**815.795.545**	**36**	**328.265**	**49**	**6.288.810**	**85**	**6.617.076**	**15.838**	**102.984.371**	**53.884**	**719.428.250**	**69.722**	**822.412.621**
	Moreno	1,30	13.371	119.731.150	25.279	400.734.536	38.650	520.465.686	73	914.701	38	10.267.668	111	11.182.369	13.444	120.645.851	25.317	411.002.204	**38.761**	**531.648.055**
		1,60	13	124.773	116	6.730.465	129	6.855.239			1	33.551	1	33.551	13	124.773	117	6.764.016	**130**	**6.888.789**
	TOTAL		**13.384**	**119.855.924**	**25.395**	**407.465.001**	**38.779**	**527.320.925**	**73**	**914.701**	**39**	**10.301.219**	**112**	**11.215.919**	**13.457**	**120.770.624**	**25.434**	**417.766.220**	**38.891**	**538.536.844**
TOTAL REGION OESTE			**206.085**	**1.699.133.574**	**389.268**	**6.746.791.621**	**595.353**	**8.445.925.196**	**10.460**	**166.018.979**	**13.425**	**954.284.572**	**23.885**	**1.120.303.551**	**216.545**	**1.865.152.553**	**402.693**	**7.701.076.193**	**619.238**	**9.566.228.747**
	Avellaneda	1,30	17.379	192.836.337	29.593	603.062.499	46.972	795.898.837	2.652	39.119.923	3.152	388.111.228	5.804	427.231.151	20.031	231.956.260	32.745	991.173.727	**52.776**	**1.223.129.988**

	Avellaneda	1,80	494	6.997.795	1.678	54.319.797	2.172	61.317.593	579	9.744.403	812	57.311.814	1.391	67.056.217	1.073	16.742.199	2.490	111.631.611	**3.563**	**128.373.810**
	TOTAL		**17.873**	**199.834.133**	**31.271**	**657.382.297**	**49.144**	**857.216.429**	**3.231**	**48.864.326**	**3.964**	**445.423.041**	**7.195**	**494.287.368**	**21.104**	**248.698.459**	**35.235**	**1.102.805.338**	**56.339**	**1.351.503.797**
	Lanús	1,10	36.015	369.856.538	52.447	1.010.697.947	88.462	1.380.554.485	2.299	34.425.220	2.739	215.065.595	5.038	249.490.815	38.314	404.281.758	55.186	1.225.763.541	**93.500**	**1.630.045.300**
		1,45	11.383	113.613.407	42.143	810.248.379	53.526	923.861.786	3.577	49.775.998	3.344	203.363.902	6.921	253.139.899	14.960	163.389.405	45.487	1.013.612.280	**60.447**	**1.177.001.685**
		1,80	738	7.632.163	2.082	48.648.589	2.820	56.280.752	1.148	11.814.275	1.645	73.135.199	2.793	84.949.474	1.886	19.446.438	3.727	121.783.788	**5.613**	**141.230.226**
REGION SUDESTE	**TOTAL**		**48.136**	**491.102.108**	**96.672**	**1.869.594.914**	**144.808**	**2.360.697.023**	**7.024**	**96.015.493**	**7.728**	**491.564.696**	**14.752**	**587.580.188**	**55.160**	**587.117.601**	**104.400**	**2.361.159.610**	**159.560**	**2.948.277.211**
	Quilmes	1,10	29.777	301.402.254	25.626	473.400.543	55.403	774.802.798	264	4.914.612	134	18.757.304	398	23.671.916	30.041	306.316.867	25.760	492.157.847	**55.801**	**798.474.714**
		1,45	8.086	87.992.902	40.353	916.159.150	48.439	1.004.152.051	1.263	22.329.686	1.121	99.143.649	2.384	121.473.334	9.349	110.322.587	41.474	1.015.302.798	**50.823**	**1.125.625.386**
		1,80	54	516.795	287	10.454.716	341	10.971.511	92	1.105.140	111	18.221.612	203	19.326.752	146	1.621.935	398	28.676.328	**544**	**30.298.263**
	TOTAL		**37.917**	**389.911.951**	**66.266**	**1.400.014.409**	**104.183**	**1.789.926.360**	**1.619**	**28.349.438**	**1.366**	**136.122.564**	**2.985**	**164.472.002**	**39.536**	**418.261.389**	**67.632**	**1.536.136.973**	**107.168**	**1.954.398.362**
	Florencio Varela	1,30	14.763	107.636.531	71.573	1.009.200.238	86.336	1.116.836.769	49	458.667	27	4.075.457	76	4.534.124	14.812	108.095.198	71.600	1.013.275.695	**86.412**	**1.121.370.893**
		1,45	92	813.927	281	7.821.563	373	8.635.490	5	64.060			5	64.060	97	877.987	281	7.821.563	**378**	**8.699.549**
		1,80	2	21.091	50	1.564.348	52	1.585.438			2	113.697	2	113.697	2	21.091	52	1.678.044	**54**	**1.699.135**
	TOTAL		**14.857**	**108.471.548**	**71.904**	**1.018.586.148**	**86.761**	**1.127.057.696**	**54**	**522.727**	**29**	**4.189.154**	**83**	**4.711.881**	**14.911**	**108.994.275**	**71.933**	**1.022.775.302**	**86.844**	**1.131.769.577**
TOTAL REGION SUDESTE			**118.783**	**1.189.319.740**	**266.113**	**4.945.577.768**	**384.896**	**6.134.897.508**	**11.928**	**173.751.984**	**13.087**	**1.077.299.455**	**25.015**	**1.251.051.439**	**130.711**	**1.363.071.724**	**279.200**	**6.022.877.223**	**409.911**	**7.385.948.947**
	Alte. Brown	1,10	236	1.799.303	1.316	14.988.687	1.552	16.787.990	2	21.418			2	21.418	238	1.820.720	1.316	14.988.687	**1.554**	**16.809.407**
		1,30	26.085	283.311.916	92.501	1.629.963.854	118.586	1.913.275.770	2.444	38.933.100	2.670	203.009.601	5.114	241.942.701	28.529	322.245.015	95.171	1.832.973.455	**123.700**	**2.155.218.471**
		1,80	13	157.982	58	2.366.731	71	2.524.713	157	1.988.757	213	10.761.452	370	12.750.209	170	2.146.739	271	13.128.183	**441**	**15.274.921**
		2,75					0	0					0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	TOTAL		**26.334**	**285.269.200**	**93.875**	**1.647.319.272**	**120.209**	**1.932.588.472**	**2.603**	**40.943.274**	**2.883**	**213.771.053**	**5.486**	**254.714.327**	**28.937**	**326.212.474**	**96.758**	**1.861.090.325**	**125.695**	**2.187.302.799**
	Esteban Echeverria	1,30	30.252	290.954.537	59.946	1.182.263.064	90.198	1.473.217.601	850	13.944.239	494	70.633.195	1.344	84.577.434	31.102	304.898.777	60.440	1.252.896.259	**91.542**	**1.557.795.035**
		1,45			2	58.846	2	58.846					0	0	0	0	2	58.846	**2**	**58.846**
REGION SUDOESTE	**TOTAL**		**30.252**	**290.954.537**	**59.948**	**1.182.321.910**	**90.200**	**1.473.276.447**	**850**	**13.944.239**	**494**	**70.633.195**	**1.344**	**84.577.434**	**31.102**	**304.898.777**	**60.442**	**1.252.955.105**	**91.544**	**1.557.853.881**
	Ezeiza	1,30	23.931	176.676.357	34.410	564.972.415	58.341	741.648.772	604	8.535.254	596	55.828.398	1.200	64.363.652	24.535	185.211.611	35.006	620.800.813	**59.541**	**806.012.424**
	TOTAL		**23.931**	**176.676.357**	**34.410**	**564.972.415**	**58.341**	**741.648.772**	**604**	**8.535.254**	**596**	**55.828.398**	**1.200**	**64.363.652**	**24.535**	**185.211.611**	**35.006**	**620.800.813**	**59.541**	**806.012.424**
	Lomas de Zamora	1,10	103.739	905.434.620	121.102	1.699.016.060	224.841	2.604.450.680	3.670	53.267.797	4.449	375.659.383	8.119	428.927.179	107.409	958.702.417	125.551	2.074.675.443	**232.960**	**3.033.377.860**
		1,45	1.046	13.889.152	6.518	143.903.658	7.564	157.792.809	496	8.234.665	557	39.276.000	1.053	47.510.665	1.542	22.123.816	7.075	183.179.658	**8.617**	**205.303.474**
		1,80	6	75.228	22	536.841	28	612.069	8	135.554	10	227.478	18	363.031	14	210.781	32	764.319	**46**	**975.101**
	TOTAL		**104.791**	**919.398.999**	**127.642**	**1.843.456.559**	**232.433**	**2.762.855.559**	**4.174**	**61.638.015**	**5.016**	**415.162.861**	**9.190**	**476.800.876**	**108.965**	**981.037.014**	**132.658**	**2.258.619.420**	**241.623**	**3.239.656.435**
	Presidente Perón	1,30	14.806	161.109.740	17.120	334.413.627	31.926	495.523.367	53	1.007.513	44	9.175.354	97	10.182.868	14.859	162.117.253	17.164	343.588.981	**32.023**	**505.706.235**
	TOTAL		**14.806**	**161.109.740**	**17.120**	**334.413.627**	**31.926**	**495.523.367**	**53**	**1.007.513**	**44**	**9.175.354**	**97**	**10.182.868**	**14.859**	**162.117.253**	**17.164**	**343.588.981**	**32.023**	**505.706.235**
TOTAL REGION SUDOESTE			**200.114**	**1.833.408.834**	**332.995**	**5.572.483.783**	**533.109**	**7.405.892.617**	**8.284**	**126.068.296**	**9.033**	**764.570.861**	**17.317**	**890.639.156**	**208.398**	**1.959.477.130**	**342.028**	**6.337.054.644**	**550.426**	**8.296.531.774**
TOTAL GRAN BUENOS AIRES			**598.853**	**5.450.954.595**	**1.217.779**	**22.688.573.116**	**1.816.632**	**28.139.527.712**	**74.262**	**1.052.529.130**	**96.034**	**8.447.422.353**	**170.296**	**9.499.951.483**	**673.115**	**6.503.483.725**	**1.313.813**	**31.135.995.469**	**1.986.928**	**37.639.479.195**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en el sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.
(1) Distrito Morón incluye a los Partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

FORMATO Nº 309



ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A)
SERVICIO: CLOACA - CODIGO: 02

AREA	DISTRITO	ZONAL	USUARIOS NO MEDIDOS						USUARIOS MEDIDOS						TOTAL					
			Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL	
			FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)
CAPITAL FEDERAL	Constitución	1,45			1	44.085	1	44.085					0	0	0	0	1	44.085	**1**	**44.085**
	TOTAL		**0**	**0,00**	**1**	**44.085**	**1**	**44.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**44.085**	**1**	**44.085**
	Devoto	1,80					0	0			1	0	1	0	0	0	1	0	**1**	**0**
	TOTAL		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
TOTAL			**0**	**0,00**	**1**	**44.085**	**1**	**44.085**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**44.085**	**2**	**44.085**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en el sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.

FORMATO N° 310

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A)
SERVICIO: CLOACA - CODIGO: 02

AREA	DISTRITO	ZONAL	USUARIOS NO MEDIDOS						USUARIOS MEDIDOS						TOTAL					
			Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL	
			FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)
REGION NORTE	Vicente López	1,30	2	23.628	29	10.610.517	31	10.634.145	9	136.437	15	8.436.853	24	8.573.290	11	160.066	44	19.047.370	**55**	**19.207.436**
		1,45	2	13.177	18	877.164	20	890.342			6	266.497	6	266.497	2	13.177	24	1.143.661	**26**	**1.156.839**
		2,00			10	1.819.999	10	1.819.999					0	0	0	0	10	1.819.999	**10**	**1.819.999**
	TOTAL		**4**	**36.805**	**57**	**13.307.681**	**61**	**13.344.486**	**9**	**136.437**	**21**	**8.703.350**	**30**	**8.839.787**	**13**	**173.243**	**78**	**22.011.031**	**91**	**22.184.274**
	San Isidro	1,30	130	1.720.852	413	9.140.971	543	10.861.823	309	4.665.925	811	38.828.426	1.120	43.494.351	439	6.386.777	1.224	47.969.397	**1.663**	**54.356.174**
		1,60					0	0			6	287.912	6	287.912	0	0	6	287.912	**6**	**287.912**
		2,20					0	0	8	115.518	2	140.839	10	256.358	8	115.518	2	140.839	**10**	**256.358**
		2,75			4	138.002	4	138.002					0	0	0	0	4	138.002	**4**	**138.002**
		3,10			8	486.168	8	486.168	2	28.827	6	233.933	8	262.761	2	28.827	14	720.102	**16**	**748.929**
	TOTAL		**130**	**1.720.852**	**425**	**9.765.141**	**555**	**11.485.993**	**319**	**4.810.271**	**825**	**39.491.111**	**1.144**	**44.301.381**	**449**	**6.531.123**	**1.250**	**49.256.252**	**1.699**	**55.787.374**
	San Martín	1,45	2.143	14.580.546	1.280	21.499.657	3.423	36.080.203	105	1.696.557	137	9.050.984	242	10.747.541	2.248	16.277.103	1.417	30.550.641	**3.665**	**46.827.744**
		1,80			2	46.956	2	46.956	4	57.523	6	395.022	10	452.545	4	57.523	8	441.978	**12**	**499.501**
	TOTAL		**2.143**	**14.580.546**	**1.282**	**21.546.613**	**3.425**	**36.127.159**	**109**	**1.754.080**	**143**	**9.446.006**	**252**	**11.200.086**	**2.252**	**16.334.626**	**1.425**	**30.992.619**	**3.677**	**47.327.245**
	San Fernando	1,30	345	4.365.546	406	15.127.963	751	19.493.509	41	804.643	39	4.130.234	80	4.934.877	386	5.170.189	445	19.258.197	**831**	**24.428.386**
		1,80					0	0	5	71.925	7	306.871	12	378.797	5	71.925	7	306.871	**12**	**378.797**
		3,10	1	12.523	45	2.489.254	46	2.501.777	9	133.793	40	3.503.441	49	3.637.235	10	146.316	85	5.992.695	**95**	**6.139.012**
	TOTAL		**346**	**4.378.069**	**451**	**17.617.217**	**797**	**21.995.286**	**55**	**1.010.362**	**86**	**7.940.546**	**141**	**8.950.908**	**401**	**5.388.431**	**537**	**25.557.763**	**938**	**30.946.195**
	Tigre	1,30	1.712	17.956.029	11.257	299.853.606	12.969	317.809.634	10	197.498	12	4.257.440	22	4.454.938	1.722	18.153.527	11.269	304.111.046	**12.991**	**322.264.572**
		1,60			12	291.934	12	291.934			4	538.213	4	538.213	0	0	16	830.147	**16**	**830.147**
		2,75			4	62.864.879	4	62.864.879					0	0	0	0	4	62.864.879	**4**	**62.864.879**
	TOTAL		**1.712**	**17.956.029**	**11.273**	**363.010.418**	**12.985**	**380.966.447**	**10**	**197.498**	**16**	**4.795.653**	**26**	**4.993.151**	**1.722**	**18.153.527**	**11.289**	**367.806.071**	**13.011**	**385.959.598**
	Escobar	1,30	1.737	9.554.871	4.761	119.952.246	6.498	129.507.117	9	143.728	1	13.846	10	157.575	1.746	9.698.600	4.762	119.966.092	**6.508**	**129.664.692**
		1,60	78	991.435	453	18.284.288	531	19.275.723	2	28.964			2	28.964	80	1.020.399	453	18.284.288	**533**	**19.304.687**
		2,75			4	4.984.730	4	4.984.730					0	0	0	0	4	4.984.730	**4**	**4.984.730**
	TOTAL		**1.815**	**10.546.306**	**5.218**	**143.221.263**	**7.033**	**153.767.570**	**11**	**172.692**	**1**	**13.846**	**12**	**186.538**	**1.826**	**10.718.999**	**5.219**	**143.235.110**	**7.045**	**153.954.108**
	San Miguel	1,30	4.863	33.615.948	46.312	769.269.532	51.175	802.885.480	10	109.359			10	109.359	4.873	33.725.307	46.312	769.269.532	**51.185**	**802.994.839**
		1,80	281	1.950.057	4.529	127.001.649	4.810	128.951.706	4	49.640			4	49.640	285	1.999.696	4.529	127.001.649	**4.814**	**129.001.345**
		2,75			175	17.677.790	175	17.677.790					0	0	0	0	175	17.677.790	**175**	**17.677.790**
	TOTAL		**5.144**	**35.566.005**	**51.016**	**913.948.971**	**56.160**	**949.514.976**	**14**	**158.998**	**0**	**0**	**14**	**158.998**	**5.158**	**35.725.004**	**51.016**	**913.948.971**	**56.174**	**949.673.975**
	Pilar	1,30	117	804.274	765	30.806.169	882	31.610.443	8	156.550	8	2.002.556	16	2.159.106	125	960.824	773	32.808.725	**898**	**33.769.549**
		2,75			15	113.053.854	15	113.053.854			2	1.763.665	2	1.763.665	0	0	17	114.817.519	**17**	**114.817.519**
	TOTAL		**117**	**804.274**	**780**	**143.860.023**	**897**	**144.664.297**	**8**	**156.550**	**10**	**3.766.221**	**18**	**3.922.771**	**125**	**960.824**	**790**	**147.626.244**	**915**	**148.587.068**
TOTAL REGION NORTE			**11.411**	**85.588.887**	**70.502**	**1.626.277.327**	**81.913**	**1.711.866.215**	**535**	**8.396.889**	**1.102**	**74.156.733**	**1.637**	**82.553.621**	**11.946**	**93.985.776**	**71.604**	**1.700.434.060**	**83.550**	**1.794.419.836**
REGION OESTE	Tres de Febrero	1,30	1.688	16.953.109	4.932	124.297.628	6.620	141.250.738	24	480.272	16	1.210.788	40	1.691.060	1.712	17.433.381	4.948	125.508.416	**6.660**	**142.941.798**
		1,45			5	8.142.570	5	8.142.570					0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	TOTAL		**1.688**	**16.953.109**	**4.937**	**132.440.198**	**6.625**	**149.393.308**	**24**	**480.272**	**16**	**1.210.788**	**40**	**1.691.060**	**1.712**	**17.433.381**	**4.953**	**133.650.986**	**6.665**	**151.084.368**
	Morón (1)	1,45	13.859	123.771.233	105.726	2.053.574.938	119.585	2.177.346.172	542	9.721.403	587	47.059.492	1.129	56.780.895	14.401	133.492.636	106.313	2.100.634.430	**120.714**	**2.234.127.067**
		2,00			6	355.993	6	355.993	1	13.246	7	263.513	8	276.760	1	13.246	13	619.507	**14**	**632.753**
		2,75			5	23.213.626	5	23.213.626					0	0	0	0	5	23.213.626	**5**	**23.213.626**
	TOTAL		**13.859**	**123.771.233**	**105.737**	**2.077.144.558**	**119.596**	**2.200.915.791**	**543**	**9.734.649**	**594**	**47.323.005**	**1.137**	**57.057.654**	**14.402**	**133.505.883**	**106.331**	**2.124.467.563**	**120.733**	**2.257.973.446**
	La Matanza Norte	1,30	3.030	38.426.492	7.590	164.113.083	10.620	202.539.575	68	1.353.850	57	13.992.364	125	15.346.214	3.098	39.780.342	7.647	178.105.447	**10.745**	**217.885.789**
	TOTAL		**3.030**	**38.426.492**	**7.590**	**164.113.083**	**10.620**	**202.539.575**	**68**	**1.353.850**	**57**	**13.992.364**	**125**	**15.346.214**	**3.098**	**39.780.342**	**7.647**	**178.105.447**	**10.745**	**217.885.789**
	La Matanza Sur	1,30	824	10.166.813	2.576	60.171.486	3.400	70.338.299	6	128.440	2	155.127	8	283.567	830	10.295.253	2.578	60.326.613	**3.408**	**70.621.866**
	TOTAL		**824**	**10.166.813**	**2.576**	**60.171.486**	**3.400**	**70.338.299**	**6**	**128.440**	**2**	**155.127**	**8**	**283.567**	**830**	**10.295.253**	**2.578**	**60.326.613**	**3.408**	**70.621.866**
	La Matanza Oeste	1,30			14	914.078	14	914.078					0	0	0	0	14	914.078	**14**	**914.078**
	TOTAL		**0**	**0**	**14**	**914.078**	**14**	**914.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**914.078**	**14**	**914.078**
	Merlo	1,30	5.009	33.174.120	16.562	201.482.045	21.571	234.656.165					0	0	5.009	33.174.120	16.562	201.482.045	**21.571**	**234.656.165**
	TOTAL		**5.009**	**33.174.120**	**16.562**	**201.482.045**	**21.571**	**234.656.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.009**	**33.174.120**	**16.562**	**201.482.045**	**21.571**	**234.656.165**
	Moreno	1,30	4.274	28.500.001	12.714	179.763.283	16.988	208.263.283	2	42.836			2	42.836	4.276	28.542.837	12.714	179.763.283	**16.990**	**208.306.119**
		1,60	47	353.062	292	4.816.207	339	5.169.269					0	0	47	353.062	292	4.816.207	**339**	**5.169.269**
	TOTAL		**4.321**	**28.853.063**	**13.006**	**184.579.490**	**17.327**	**213.432.552**	**2**	**42.836**	**0**	**0**	**2**	**42.836**	**4.323**	**28.895.898**	**13.006**	**184.579.490**	**17.329**	**213.475.388**
TOTAL REGION OESTE			**28.731**	**251.344.830**	**150.422**	**2.820.844.938**	**179.153**	**3.072.189.768**	**643**	**11.740.046**	**669**	**62.681.284**	**1.312**	**74.421.331**	**29.374**	**263.084.877**	**151.091**	**2.883.526.222**	**180.465**	**3.146.611.099**
REGION SUDESTE	Avellaneda	1,30	1.569	20.459.003	712	14.428.245	2.281	34.887.248	9	192.146	7	186.189	16	378.335	1.578	20.651.149	719	14.614.434	**2.297**	**35.265.583**
		1,80			4	204.799	4	204.799					0	0	0	0	4	204.799	**4**	**204.799**
	TOTAL		**1.569**	**20.459.003**	**716**	**14.633.045**	**2.285**	**35.092.047**	**9**	**192.146**	**7**	**186.189**	**16**	**378.335**	**1.578**	**20.651.149**	**723**	**14.819.233**	**2.301**	**35.470.382**
	Lanús	1,10	2.086	26.026.429	564	10.191.257	0,00	36.217.686					0	0	2.086	26.026.429	564	10.191.257	**2.650**	**36.217.686**
		1,45	132	1.391.677	1.059	25.498.333	1.191	26.890.010	9	192.148	2	97.760	11	289.908	141	1.583.825	1.061	25.596.093	**1.202**	**27.179.919**
		1,80			2	48.730	2	48.730					0	0	0	0	2	48.730	**2**	**48.730**
	TOTAL		**2.218**	**27.418.106**	**1.625**	**35.738.321**	**3.843**	**63.156.427**	**9**	**192.148**	**2**	**97.760**	**11**	**289.908**	**2.227**	**27.610.254**	**1.627**	**35.836.080**	**3.854**	**63.446.335**
	Quilmes	1,10	3.006	22.207.774	824	12.028.392	3.830	34.236.166	1	26.679	1	30.861	2	57.540	3.007	22.234.453	825	12.059.253	**3.832**	**34.293.706**
		1,45	1.159	8.229.003	1.118	23.414.004	2.277	31.643.007	35	626.519	41	2.496.068	76	3.122.587	1.194	8.855.522	1.159	25.910.072	**2.353**	**34.765.594**

		1,80	4	33.583	22	3.730.086	26	3.763.669					0	0	4	33.583	22	3.730.086	**26**	**3.763.669**
	TOTAL		**4.169**	**30.470.360**	**1.964**	**39.172.482**	**6.133**	**69.642.842**	**36**	**653.198**	**42**	**2.526.929**	**78**	**3.180.127**	**4.205**	**31.123.557**	**2.006**	**41.699.411**	**6.211**	**72.822.968**
	Florencio Varela	1,30	2.312	27.271.578	12.074	299.685.679	14.386	326.957.256	26	458.029	2	51.426	28	509.455	2.338	27.729.607	12.076	299.737.105	**14.414**	**327.466.712**
		1,45			12	252.993	12	252.993					0	0	0	0	12	252.993	**12**	**252.993**
		1,80	6	82.181	16	544.115	22	626.297					0	0	6	82.181	16	544.115	**22**	**626.297**
	TOTAL		**2.318**	**27.353.759**	**12.102**	**300.482.787**	**14.420**	**327.836.546**	**26**	**458.029**	**2**	**51.426**	**28**	**509.455**	**2.344**	**27.811.788**	**12.104**	**300.534.213**	**14.448**	**328.346.001**
TOTAL REGION SUDESTE			**10.274**	**105.701.227**	**16.407**	**390.026.634**	**26.681**	**495.727.862**	**80**	**1.495.522**	**53**	**2.862.303**	**133**	**4.357.825**	**10.354**	**107.196.749**	**16.460**	**392.888.938**	**26.814**	**500.085.687**
		1,10	1.222	8.145.019	10	111.554	1.232	8.256.573					0	0	1.222	8.145.019	10	111.554	**1.232**	**8.256.573**
	Alte. Brown	1,30	6.714	52.208.489	20.636	224.249.354	27.350	276.457.843	129	1.867.798	179	13.332.557	308	15.200.355	6.843	54.076.286	20.815	237.581.911	**27.658**	**291.658.197**
		1,80			8	192.541	8	192.541			4	1.175.135	4	1.175.135	0	0	12	1.367.676	**12**	**1.367.676**
	TOTAL		**7.936**	**60.353.508**	**20.654**	**224.553.449**	**28.590**	**284.906.957**	**129**	**1.867.798**	**183**	**14.507.692**	**312**	**16.375.489**	**8.065**	**62.221.305**	**20.837**	**239.061.141**	**28.902**	**301.282.446**
		1,30	9.142	75.946.185	37.542	710.913.428	46.684	786.859.613	45	813.874	3	300.053	48	1.113.927	9.187	76.760.059	37.545	711.213.481	**46.732**	**787.973.540**
	Esteban Echeverria	2,20			680	10.952.257	680	10.952.257					0	0	0	0	680	10.952.257	**680**	**10.952.257**
		2,75			1.236	155.760.742	1.236	155.760.742					0	0	0	0	1.236	155.760.742	**1.236**	**155.760.742**
	TOTAL		**9.142**	**75.946.185**	**39.458**	**877.626.427**	**48.600**	**953.572.612**	**45**	**813.874**	**3**	**300.053**	**48**	**1.113.927**	**9.187**	**76.760.059**	**39.461**	**877.926.480**	**48.648**	**954.686.539**
REGION SUDOESTE		1,30	5.840	68.597.544	12.994	315.501.260	18.834	384.098.803	183	3.661.186	119	9.647.012	302	13.308.197	6.023	72.258.729	13.113	325.148.271	**19.136**	**397.407.001**
	Ezeiza	2,75	6	37.477	16	107.331.388	22	107.368.865					0	0	6	37.477	16	107.331.388	**22**	**107.368.865**
	TOTAL		**5.846**	**68.635.021**	**13.010**	**422.832.648**	**18.856**	**491.467.669**	**183**	**3.661.186**	**119**	**9.647.012**	**302**	**13.308.197**	**6.029**	**72.296.206**	**13.129**	**432.479.660**	**19.158**	**504.775.866**
		1,10	4.046	30.116.245	1.928	32.076.662	5.974	62.192.907	40	714.553	30	2.491.763	70	3.206.316	4.086	30.830.798	1.958	34.568.425	**6.044**	**65.399.223**
	Lomas de Zamora	1,45	24	296.509	186	4.730.715	210	5.027.224	30	433.375	40	2.407.206	70	2.840.582	54	729.884	226	7.137.921	**280**	**7.867.805**
		1,80			4	126.854	4	126.854			2	36.098	2	36.098	0	0	6	162.952	**6**	**162.952**
	TOTAL		**4.070**	**30.412.754**	**2.118**	**36.934.231**	**6.188**	**67.346.984**	**70**	**1.147.929**	**72**	**4.935.067**	**142**	**6.082.996**	**4.140**	**31.560.683**	**2.190**	**41.869.298**	**6.330**	**73.429.980**
	Presidente Perón	1,30	2.865	25.846.234	922	14.158.544	3.787	40.004.778					0	0	2.865	25.846.234	922	14.158.544	**3.787**	**40.004.778**
	TOTAL		**2.865**	**25.846.234**	**922**	**14.158.544**	**3.787**	**40.004.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.865**	**25.846.234**	**922**	**14.158.544**	**3.787**	**40.004.778**
TOTAL REGION SUDOESTE			**29.859**	**261.193.701**	**76.162**	**1.576.105.299**	**106.021**	**1.837.299.000**	**427**	**7.490.786**	**377**	**29.389.823**	**804**	**36.880.609**	**30.286**	**268.684.487**	**76.539**	**1.605.495.122**	**106.825**	**1.874.179.609**
TOTAL GRAN BUENOS AIRES			**80.275**	**703.828.646**	**313.493**	**6.413.254.198**	**393.768**	**7.117.082.844**	**1.685**	**29.123.243**	**2.201**	**169.090.144**	**3.886**	**198.213.387**	**81.960**	**732.951.889**	**315.694**	**6.582.344.342**	**397.654**	**7.315.296.231**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en el sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.
(1) Distrito Morón incluye a los Partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

FORMATO N° 311

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A)
SERVICIO: AGUA Y CLOACA - CODIGO: 05

AREA	DISTRITO	ZONAL	USUARIOS NO MEDIDOS						USUARIOS MEDIDOS						TOTAL					
			Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL	
			FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)
CAPITAL FEDERAL	Centro	1,60	999	13.869.347	1.181	40.313.742	2.180	54.183.089	161	2.765.700	393	80.064.621	554	82.830.321	1.160	16.635.047	1.574	120.378.363	**2.734**	**137.013.410**
		1,80	1.102	15.901.590	1.706	41.632.590	2.808	57.534.179	246	4.474.731	417	66.838.097	663	71.312.829	1.348	20.376.321	2.123	108.470.687	**3.471**	**128.847.008**
		2,00	58	837.653	136	16.342.232	194	17.179.885	30	684.855	61	73.330.783	91	74.015.639	88	1.522.509	197	89.673.015	**285**	**91.195.524**
		2,20	1.609	8.659.299	2.136	333.304.801	3.745	341.964.100	22	8.662.258	93	306.676.435	115	315.338.693	1.631	17.321.556	2.229	639.981.237	**3.860**	**657.302.793**
		2,40			3	6.409.444	3	6.409.444	1	43.032	3	45.808.932	4	45.851.964	1	43.032	6	52.218.376	**7**	**52.261.408**
		2,75	524	5.329.961	5.059	558.163.418	5.583	563.493.378	16	1.406.010	107	201.164.488	123	202.570.498	540	6.735.970	5.166	759.327.906	**5.706**	**766.063.876**
		3,10	420	5.384.137	4.238	295.874.641	4.658	301.258.778	82	1.443.674	350	73.083.604	432	74.527.278	502	6.827.811	4.588	368.958.246	**5.090**	**375.786.057**
		3,50	496	10.407.719	15.536	2.353.467.982	16.032	2.363.875.701	36	7.039.731	283	891.005.759	319	898.045.490	532	17.447.449	15.819	3.244.473.741	**16.351**	**3.261.921.191**
	TOTAL		**5.208**	**60.389.705**	**29.995**	**3.645.508.849**	**35.203**	**3.705.898.554**	**594**	**26.519.991**	**1.707**	**1.737.972.721**	**2.301**	**1.764.492.711**	**5.802**	**86.909.696**	**31.702**	**5.383.481.570**	**37.504**	**5.470.391.266**
	Caballito	1,45	91	1.176.213	216	4.159.975	307	5.336.188	10	212.405	18	1.999.191	28	2.211.595	101	1.388.618	234	6.159.165	**335**	**7.547.783**
		1,60	14.136	201.901.858	25.019	740.613.462	39.155	942.515.320	1.329	25.120.387	2.770	433.697.193	4.099	458.817.581	15.465	227.022.245	27.789	1.174.310.656	**43.254**	**1.401.332.901**
		1,80	34.460	489.090.677	73.653	2.763.496.464	108.113	3.252.587.141	3.548	67.492.456	8.957	1.794.298.790	12.505	1.861.791.246	38.008	556.583.133	82.610	4.557.795.253	**120.618**	**5.114.378.387**
		2,00	44.810	639.745.143	109.876	3.568.594.810	154.686	4.208.339.953	2.136	45.475.009	6.015	1.972.519.356	8.151	2.017.994.365	46.946	685.220.152	115.891	5.541.114.166	**162.837**	**6.226.334.318**
		2,20	33.630	473.248.014	111.799	3.891.038.677	145.429	4.364.286.692	915	22.279.339	2.793	1.063.704.259	3.708	1.085.983.597	34.545	495.527.353	114.592	4.954.742.936	**149.137**	**5.450.270.289**
		2,40	14.073	189.891.224	55.269	1.905.960.473	69.342	2.095.851.697	216	4.755.423	739	361.701.208	955	366.456.631	14.289	194.646.648	56.008	2.267.661.680	**70.297**	**2.462.308.328**
		2,75	5.229	66.497.269	29.424	1.213.019.395	34.653	1.279.516.664	154	12.673.876	834	660.651.287	988	673.325.162	5.383	79.171.145	30.258	1.873.670.682	**35.641**	**1.952.841.826**
		3,10	5.642	70.324.001	38.112	1.366.180.157	43.754	1.436.504.157	94	9.070.717	386	252.013.301	480	261.084.017	5.736	79.394.717	38.498	1.618.193.457	**44.234**	**1.697.588.175**
	TOTAL		**152.071**	**2.131.874.400**	**443.368**	**15.453.063.412**	**595.439**	**17.584.937.813**	**8.402**	**187.079.611**	**22.512**	**6.540.584.583**	**30.914**	**6.727.664.194**	**160.473**	**2.318.954.012**	**465.880**	**21.993.647.995**	**626.353**	**24.312.602.007**
	Constitución	1,10			1	5.103.735	1	5.103.735					0	0	0	0	1	5.103.735	**1**	**5.103.735**
		1,30			4	204.115.972	4	204.115.972					0	0	0	0	4	204.115.972	**4**	**204.115.972**
		1,45	12.166	167.525.989	19.945	689.069.829	32.111	856.595.818	3.517	75.372.328	5.833	1.894.885.870	9.350	1.970.258.198	15.683	242.898.316	25.778	2.583.955.699	**41.461**	**2.826.854.016**
		1,60	14.928	217.994.136	23.696	884.423.328	38.624	1.102.417.464	3.059	55.367.375	7.158	1.440.818.804	10.217	1.496.186.179	17.987	273.361.510	30.854	2.325.242.133	**48.841**	**2.598.603.643**
		1,80	1.594	22.932.857	3.304	118.676.646	4.898	141.609.503	337	7.365.841	711	230.988.028	1.048	238.353.869	1.931	30.298.699	4.015	349.664.674	**5.946**	**379.963.373**
	TOTAL		**28.688**	**408.452.982**	**46.950**	**1.901.389.510**	**75.638**	**2.309.842.491**	**6.913**	**138.105.544**	**13.702**	**3.566.692.703**	**20.615**	**3.704.798.246**	**35.601**	**546.558.525**	**60.652**	**5.468.082.212**	**96.253**	**6.014.640.737**
	Devoto	1,60	3.036	39.842.437	17.786	1.115.458.590	20.822	1.155.301.027	27.099	483.124.889	54.304	4.759.383.729	81.403	5.242.508.618	30.135	522.967.326	72.090	5.874.842.319	**102.225**	**6.397.809.645**
		1,80	526	7.898.255	3.210	346.132.744	3.736	354.030.999	11.762	226.001.207	26.529	2.946.599.259	38.291	3.172.600.466	12.288	233.899.462	29.739	3.292.732.003	**42.027**	**3.526.631.465**
	TOTAL		**3.562**	**47.740.692**	**20.996**	**1.461.591.334**	**24.558**	**1.509.332.026**	**38.861**	**709.126.096**	**80.833**	**7.705.982.988**	**119.694**	**8.415.109.084**	**42.423**	**756.866.788**	**101.829**	**9.167.574.322**	**144.252**	**9.924.441.109**
	Flores	1,10			8	110.786.371	8	110.786.371			1	23.352.486	1	23.352.486	0	0	9	134.138.857	**9**	**134.138.857**
		1,30	33.975	460.932.298	29.258	1.046.356.417	63.233	1.507.288.715	1.074	19.680.360	1.898	379.875.048	2.972	399.555.408	35.049	480.612.658	31.156	1.426.231.465	**66.205**	**1.906.844.123**
		1,45	25.251	357.063.681	42.327	1.322.288.065	67.578	1.679.351.746	7.669	122.178.326	13.054	1.161.253.526	20.723	1.283.431.852	32.920	479.242.007	55.381	2.483.541.591	**88.301**	**2.962.783.598**
		1,60	42.767	627.992.036	59.944	1.946.988.031	102.711	2.574.980.067	11.761	188.221.514	23.566	2.218.406.443	35.327	2.406.627.957	54.528	816.213.550	83.510	4.165.394.474	**138.038**	**4.981.608.025**
		1,80	25.439	361.919.666	61.009	2.239.162.970	86.448	2.601.082.636	2.194	41.575.259	4.894	872.059.659	7.088	913.634.918	27.633	403.494.925	65.903	3.111.222.629	**93.536**	**3.514.717.554**
	TOTAL		**127.432**	**1.807.907.681**	**192.546**	**6.665.581.854**	**319.978**	**8.473.489.534**	**22.698**	**371.655.460**	**43.413**	**4.654.947.162**	**66.111**	**5.026.602.621**	**150.130**	**2.179.563.140**	**235.959**	**11.320.529.015**	**386.089**	**13.500.092.156**
	Belgrano	1,10			2	6.405.792	2	6.405.792					0	0	0	0	2	6.405.792	**2**	**6.405.792**
		1,60	3.823	54.792.989	13.612	1.105.062.895	17.435	1.159.855.884	14.778	334.489.217	32.850	4.179.128.614	47.628	4.513.617.832	18.601	389.282.207	46.462	5.284.191.509	**65.063**	**5.673.473.716**
		1,80	183	2.241.411	850	51.923.020	1.033	54.164.431	665	13.466.267	1.662	303.093.240	2.327	316.559.507	848	15.707.677	2.512	355.016.260	**3.360**	**370.723.938**
		2,00	2.180	30.199.318	20.161	3.224.294.333	22.341	3.254.493.651	5.633	150.482.633	12.311	2.100.823.000	17.944	2.251.305.633	7.813	180.681.951	32.472	5.325.117.333	**40.285**	**5.505.799.284**
		2,20	3.333	43.896.677	26.267	4.892.215.823	29.600	4.936.112.499	6.255	200.519.822	11.173	3.162.913.484	17.428	3.363.433.306	9.588	244.416.499	37.440	8.055.129.306	**47.028**	**8.299.545.805**
		2,40	722	10.099.801	12.369	1.333.495.342	13.091	1.343.595.142	95	2.343.127	520	760.831.001	615	763.174.127	817	12.442.927	12.889	2.094.326.342	**13.706**	**2.106.769.270**
	TOTAL		**10.241**	**141.230.196**	**73.261**	**10.613.397.204**	**83.502**	**10.754.627.400**	**27.426**	**701.301.065**	**58.516**	**10.506.789.339**	**85.942**	**11.208.090.404**	**37.667**	**842.531.261**	**131.777**	**21.120.186.543**	**169.444**	**21.962.717.804**
TOTAL			**327.202**	**4.597.595.655**	**807.116**	**39.740.532.162**	**1.134.318**	**44.338.127.818**	**104.894**	**2.133.787.766**	**220.683**	**34.712.969.495**	**325.577**	**36.846.757.261**	**432.096**	**6.731.383.421**	**1.027.799**	**74.453.501.658**	**1.459.895**	**81.184.885.079**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en el sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.

FORMATO N° 312

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A)
SERVICIO: AGUA Y CLOACA - CODIGO: 05

AREA	DISTRITO	ZONAL	USUARIOS NO MEDIDOS						USUARIOS MEDIDOS						TOTAL					
			Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL	
			FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)
REGION NORTE	Vicente López	1,30	2.579	35.343.857	4.345	207.591.150	6.924	242.935.007	4.496	70.095.801	7.365	558.531.447	11.861	628.627.248	7.075	105.439.658	11.710	766.122.597	**18.785**	**871.562.255**
		1,45	12.025	161.871.710	25.267	545.133.856	37.292	707.005.566	27.326	393.349.863	45.691	2.314.045.515	73.017	2.707.395.378	39.351	555.221.573	70.958	2.859.179.371	**110.309**	**3.414.400.944**
		2,00	3.914	54.671.140	14.583	376.974.673	18.497	431.645.813	4.512	72.917.937	9.305	912.558.862	13.817	985.476.799	8.426	127.589.077	23.888	1.289.533.535	**32.314**	**1.417.122.612**
		2,75	1.823	20.083.829	19.711	537.929.664	21.534	558.013.493	4.224	75.519.642	12.171	1.148.858.191	16.395	1.224.377.832	6.047	95.603.471	31.882	1.686.787.854	**37.929**	**1.782.391.325**
	TOTAL		**20.341**	**271.970.536**	**63.906**	**1.667.629.343**	**84.247**	**1.939.599.879**	**40.558**	**611.883.243**	**74.532**	**4.933.994.015**	**115.090**	**5.545.877.258**	**60.899**	**883.853.780**	**138.438**	**6.601.623.358**	**199.337**	**7.485.477.137**
	San Isidro	1,30	11.016	150.580.692	10.302	338.043.261	21.318	488.623.952	15.009	214.926.353	30.429	1.667.423.040	45.438	1.882.349.393	26.025	365.507.045	40.731	2.005.466.300	**66.756**	**2.370.973.345**
		1,60	2.005	27.092.347	3.189	73.672.601	5.194	100.764.949	3.016	45.752.542	6.435	382.097.502	9.451	427.850.045	5.021	72.844.890	9.624	455.770.104	**14.645**	**528.614.994**
		2,00	62	907.111	172	11.796.311	234	12.703.422	822	12.492.912	2.311	143.505.421	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		2,20	2.470	33.467.472	9.014	227.900.258	11.484	261.367.730	3.535	57.713.102	8.967	716.383.635	12.502	774.096.737	6.005	91.180.574	17.981	944.283.893	**23.986**	**1.035.464.466**
		2,75	122	1.523.420	1.250	114.852.456	1.372	116.375.877	1.598	23.447.393	6.985	573.504.378	8.583	596.951.771	1.720	24.970.814	8.235	688.356.834	**9.955**	**713.327.648**
		3,10	2.178	29.529.972	15.308	514.466.054	17.486	543.996.026	2.949	51.045.712	11.368	989.060.960	14.317	1.040.106.672	5.127	80.575.684	26.676	1.503.527.015	**31.803**	**1.584.102.698**
	TOTAL		**17.853**	**243.101.014**	**39.235**	**1.280.730.942**	**57.088**	**1.523.831.956**	**26.929**	**405.378.014**	**66.495**	**4.471.974.936**	**93.424**	**4.877.352.950**	**44.782**	**648.479.028**	**105.730**	**5.752.705.878**	**150.512**	**6.401.184.906**
	San Martín	1,45	14.915	200.785.337	33.677	891.056.275	48.592	1.091.841.612	24.334	376.978.758	31.243	2.313.573.012	55.577	2.690.551.770	39.249	577.764.094	64.920	3.204.629.288	**104.169**	**3.782.393.382**
		1,80	3.836	60.215.491	12.481	345.642.414	16.317	405.857.904	3.627	62.032.029	6.739	854.134.386	10.366	916.166.415	7.463	122.247.520	19.220	1.199.776.800	**26.683**	**1.322.024.319**
	TOTAL		**18.751**	**261.000.827**	**46.158**	**1.236.698.689**	**64.909**	**1.497.699.516**	**27.961**	**439.010.787**	**37.982**	**3.167.707.398**	**65.943**	**3.606.718.185**	**46.712**	**700.011.614**	**84.140**	**4.404.406.087**	**130.852**	**5.104.417.701**
	San Fernando	1,30	3.809	51.080.973	13.134	366.549.421	16.943	417.630.394	1.323	22.101.440	2.198	255.953.332	3.521	278.054.772	5.132	73.182.413	15.332	622.502.753	**20.464**	**695.685.166**
		1,80	2.009	33.278.351	9.044	205.780.399	11.053	239.058.750	4.339	67.956.025	8.001	678.461.376	12.340	746.417.401	6.348	101.234.376	17.045	884.241.775	**23.393**	**985.476.151**
		2,75			2	9.298.242	2	9.298.242			2	20.500.020	2	20.500.020	0	0	4	29.798.262	**4**	**29.798.262**
		3,10	9	130.208	353	75.528.967	362	75.659.175	330	4.859.470	1.157	107.308.564	1.487	112.168.034	339	4.989.678	1.510	182.837.531	**1.849**	**187.827.209**
	TOTAL		**5.827**	**84.489.532**	**22.533**	**657.157.030**	**28.360**	**741.646.561**	**5.992**	**94.916.934**	**11.358**	**1.062.223.292**	**17.350**	**1.157.140.226**	**11.819**	**179.406.466**	**33.891**	**1.719.380.321**	**45.710**	**1.898.786.787**
	Tigre	1,30	426	5.358.317	1.958	77.215.195	2.384	82.573.512	79	1.279.124	118	125.660.947	197	126.940.071	505	6.637.441	2.076	202.876.142	**2.581**	**209.513.583**
		1,60	678	10.394.997	6.381	200.592.527	7.059	210.987.524	1.167	20.093.567	2.694	369.159.301	3.861	389.252.868	1.845	30.488.564	9.075	569.751.828	**10.920**	**600.240.392**
		2,75			10	31.533.772	10	31.533.772					0	0	0	0	10	31.533.772	**10**	**31.533.772**
	TOTAL		**1.104**	**15.753.314**	**8.349**	**309.341.494**	**9.453**	**325.094.808**	**1.246**	**21.372.691**	**2.812**	**494.820.248**	**4.058**	**516.192.939**	**2.350**	**37.126.005**	**11.161**	**804.161.742**	**13.511**	**841.287.747**
	Escobar	1,30	2.473	30.299.003	6.002	135.015.655	8.475	165.314.658	25	363.678	69	24.588.504	94	24.952.182	2.498	30.662.681	6.071	159.604.159	**8.569**	**190.266.840**
		1,60	1.923	22.279.550	6.339	257.848.308	8.262	280.127.859	167	5.345.738	374	78.874.547	541	84.220.285	2.090	27.625.288	6.713	336.722.856	**8.803**	**364.348.144**
		2,75			7	22.336.902	7	22.336.902	191	2.748.411	506	144.264.965	697	147.013.375	191	2.748.411	513	166.601.866	**704**	**169.350.277**
	TOTAL		**4.396**	**52.578.553**	**12.348**	**415.200.865**	**16.744**	**467.779.418**	**383**	**8.457.826**	**949**	**247.728.016**	**1.332**	**256.185.843**	**4.779**	**61.036.380**	**13.297**	**662.928.881**	**18.076**	**723.965.261**
	San Miguel	1,30	2.451	29.094.123	12.249	350.619.436	14.700	379.713.559	60	970.433	103	18.260.585	163	19.231.018	2.511	30.064.555	12.352	368.880.021	**14.863**	**398.944.576**
		1,80	6.257	83.680.939	26.728	1.005.480.364	32.985	1.089.161.303	705	11.481.149	1.174	182.067.995	1.879	193.549.143	6.962	95.162.088	27.902	1.187.548.358	**34.864**	**1.282.710.446**
		2,75			74	5.177.762	74	5.177.762					0	0	0	0	74	5.177.762	**74**	**5.177.762**
	TOTAL		**8.708**	**112.775.062**	**39.051**	**1.361.277.562**	**47.759**	**1.474.052.624**	**765**	**12.451.581**	**1.277**	**200.328.579**	**2.042**	**212.780.161**	**9.473**	**125.226.643**	**40.328**	**1.561.606.141**	**49.801**	**1.686.832.784**
	Pilar	1,30	1.310	15.761.859	2.731	104.134.499	4.041	119.896.358	4.491	62.802.438	4.811	575.041.399	9.302	637.843.837	5.801	78.564.296	7.542	679.175.898	**13.343**	**757.740.195**
		1,60	191	2.401.947	203	5.526.996	394	7.928.944	2.322	38.203.392	2.592	230.485.590	4.914	268.688.982	2.513	40.605.339	2.795	236.012.586	**5.308**	**276.617.925**
		2,75	4	57.523	26	140.837.675	30	140.895.198	2.064	37.883.396	2.417	365.294.209	4.481	403.177.605	2.068	37.940.918	2.443	506.131.884	**4.511**	**544.072.802**
	TOTAL		**1.505**	**18.221.329**	**2.960**	**250.499.170**	**4.465**	**268.720.499**	**8.877**	**138.889.225**	**9.820**	**1.170.821.198**	**18.697**	**1.309.710.423**	**10.382**	**157.110.554**	**12.780**	**1.421.320.369**	**23.162**	**1.578.430.922**
TOTAL REGION NORTE			**78.485**	**1.059.890.168**	**234.540**	**7.178.535.094**	**313.025**	**8.238.425.262**	**112.711**	**1.732.360.301**	**205.225**	**15.749.597.683**	**317.936**	**17.481.957.984**	**191.196**	**2.792.250.469**	**439.765**	**22.928.132.777**	**630.961**	**25.720.383.246**
REGION OESTE	Tres de Febrero	1,30	17.986	242.967.216	33.556	862.066.041	51.542	1.105.033.257	8.343	135.336.075	5.095	438.967.011	13.438	574.303.086	26.329	378.303.291	38.651	1.301.033.052	**64.980**	**1.679.336.343**
		1,45	15.853	216.019.891	31.079	798.248.669	46.932	1.014.268.559	13.063	203.885.971	10.337	730.955.175	23.400	934.841.146	0	0	0	0	**0**	**0**
		1,80	2.320	35.212.666	13.214	498.887.604	15.534	534.100.270	3.656	63.969.011	3.379	312.175.413	7.035	376.144.423	0	0	0	0	**0**	**0**
		2,00	458	7.197.676	8.617	281.159.517	9.075	288.357.193	197	3.605.288	295	17.748.173	492	21.353.461	655	10.802.964	8.912	298.907.690	**9.567**	**309.710.654**
	TOTAL		**36.617**	**501.397.448**	**86.466**	**2.440.361.831**	**123.083**	**2.941.759.280**	**25.259**	**406.796.345**	**19.106**	**1.499.845.772**	**44.365**	**1.906.642.117**	**61.876**	**908.193.794**	**105.572**	**3.940.207.603**	**167.448**	**4.848.401.396**
	Morón (1)	1,45	12.966	175.051.373	39.989	1.094.279.823	52.955	1.269.331.195	14.346	213.431.815	21.493	1.274.541.230	35.839	1.487.973.045	27.312	388.483.188	61.482	2.368.821.052	**88.794**	**2.757.304.240**
		2,00	3.519	56.211.709	9.773	260.026.505	13.292	316.238.214	5.278	92.550.490	7.750	867.718.524	13.028	960.269.014	8.797	148.762.199	17.523	1.127.745.029	**26.320**	**1.276.507.228**
		2,75			2	513.678	2	513.678					0	0	0	0	2	513.678	**2**	**513.678**
	TOTAL		**16.485**	**231.263.082**	**49.764**	**1.354.820.005**	**66.249**	**1.586.083.087**	**19.624**	**305.982.305**	**29.243**	**2.142.259.754**	**48.867**	**2.448.242.059**	**36.109**	**537.245.386**	**79.007**	**3.497.079.759**	**115.116**	**4.034.325.146**
	La Matanza Norte	1,30	25.395	347.719.780	53.796	1.441.909.158	79.191	1.789.628.938	48.990	726.811.788	62.810	3.472.940.597	111.800	4.199.752.385	74.385	1.074.531.568	116.606	4.914.849.755	**190.991**	**5.989.381.323**
		1,60	3.760	56.058.623	6.214	159.666.912	9.974	215.725.535	6.221	96.462.265	8.342	564.940.301	14.563	661.402.566	9.981	152.520.888	14.556	724.607.213	**24.537**	**877.128.101**
		2,20	5.830	88.248.435	17.937	439.289.584	23.767	527.538.019	1.970	35.979.608	3.924	553.444.610	5.894	589.424.219	7.800	124.228.043	21.861	992.734.194	**29.661**	**1.116.962.238**
	TOTAL		**34.985**	**492.026.837**	**77.947**	**2.040.865.654**	**112.932**	**2.532.892.491**	**57.181**	**859.253.661**	**75.076**	**4.591.325.508**	**132.257**	**5.450.579.170**	**92.166**	**1.351.280.499**	**153.023**	**6.632.191.162**	**245.189**	**7.983.471.661**
	La Matanza Sur	1,30	27.985	374.461.207	30.047	945.731.429	58.032	1.320.192.637	14.788	212.737.408	25.761	1.639.809.048	40.549	1.852.546.456	42.773	587.198.615	55.808	2.585.540.477	**98.581**	**3.172.739.092**
		2,75			234	14.894.689	234	14.894.689					0	0	0	0	234	14.894.689	**234**	**14.894.689**
	TOTAL		**27.985**	**374.461.207**	**30.281**	**960.626.118**	**58.266**	**1.335.087.325**	**14.788**	**212.737.408**	**25.761**	**1.639.809.048**	**40.549**	**1.852.546.456**	**42.773**	**587.198.615**	**56.042**	**2.600.435.166**	**98.815**	**3.187.633.781**
	La Matanza Oeste	1,30	80	602.909	178	2.204.120	258	2.807.029					0	0	80	602.909	178	2.204.120	**258**	**2.807.029**
	TOTAL		**80**	**602.909**	**178**	**2.204.120**	**258**	**2.807.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**602.909**	**178**	**2.204.120**	**258**	**2.807.029**
	Merlo	1,30	6.874	91.444.189	42.629	1.118.791.065	49.503	1.210.235.255	341	5.491.671	279	33.978.849	620	39.470.520	7.215	96.935.860	42.908	1.152.769.914	**50.123**	**1.249.705.774**
		1,60	182	2.735.981	2.726	178.921.603	2.908	181.657.584	97	1.908.752	122	23.753.200	219	25.661.952	279	4.644.733	2.848	202.674.803	**3.127**	**207.319.535**
	TOTAL		**7.056**	**94.180.170**	**45.355**	**1.297.712.668**	**52.411**	**1.391.892.839**	**438**	**7.400.423**	**401**	**57.732.049**	**839**	**65.132.471**	**7.494**	**101.580.593**	**45.756**	**1.355.444.717**	**53.250**	**1.457.025.310**
	Moreno	1,30	18.436	240.344.350	40.477	1.107.315.838	58.913	1.347.660.188	178	3.032.512	170	24.605.757	348	27.638.269	18.614	243.376.862	40.647	1.131.921.595	**59.261**	**1.375.298.457**
		1,60	860	12.000.112	7.748	425.612.147	8.608	437.612.258	179	4.752.109	170	26.198.452	349	30.950.561	1.039	16.752.220	7.918	451.810.599	**8.957**	**468.562.819**
		2,75			2	3.385.420	2	3.385.420					0	0	0	0	2	3.385.420	**2**	**3.385.420**
	TOTAL		**19.296**	**252.344.461**	**48.227**	**1.536.313.404**	**67.523**	**1.788.657.865**	**357**	**7.784.621**	**340**	**50.804.210**	**697**	**58.588.830**	**19.653**	**260.129.082**	**48.567**	**1.587.117.614**	**68.220**	**1.847.246.696**
TOTAL REGION OESTE			**142.504**	**1.946.276.115**	**338.218**	**9.632.903.801**	**480.722**	**11.579.179.917**	**117.647**	**1.799.954.762**	**149.927**	**9.981.776.340**	**267.574**	**11.781.731.102**	**260.151**	**3.746.230.878**	**488.145**	**19.614.680.141**	**748.296**	**23.360.911.019**
	Avellaneda	1,30	27.484	373.688.409	42.881	1.081.804.222	70.365	1.455.492.631	6.997	117.102.662	11.576	1.165.914.959	18.573	1.283.017.620	34.481	490.791.071	54.457	2.247.719.181	**88.938**	**2.738.510.252**
		1,80	13.294	202.190.078	27.643	844.293.856	40.937	1.046.483.934	8.435	145.629.019	13.314	1.297.680.509	21.749	1.443.309.527	21.729	347.819.097	40.957	2.141.974.365	**62.686**	**2.489.793.461**

REGION SUDESTE	TOTAL		40.778	575.878.487	70.524	1.926.098.079	111.302	2.501.976.566	15.432	262.731.680	24.890	2.463.595.467	40.322	2.726.327.148	56.210	838.610.167	95.414	4.389.693.546	151.624	5.228.303.713
	Lanús	1,10	3.508	46.728.765	3.895	114.164.803	0,00	160.893.568	324	6.176.424	344	82.561.892	668	88.738.316	3.832	52.905.188	4.239	196.726.695	8.071	249.631.884
		1,45	7.187	96.591.001	27.687	679.041.433	34.874	775.632.433	4.154	70.341.345	5.424	479.225.512	9.578	549.566.858	11.341	166.932.346	33.111	1.158.266.945	44.452	1.325.199.291
		1,80	7.525	115.510.251	19.281	570.190.859	26.806	685.701.110	8.809	155.560.463	13.340	1.310.569.053	22.149	1.466.129.516	16.334	271.070.714	32.621	1.880.759.912	48.955	2.151.830.626
	TOTAL		18.220	258.830.016	50.863	1.363.397.095	69.083	1.622.227.111	13.287	232.078.233	19.108	1.872.356.457	32.395	2.104.434.690	31.507	490.908.249	69.971	3.235.753.552	101.478	3.726.661.801
	Quilmes	1,10	5.306	69.101.363	9.935	199.208.407	15.241	268.309.770	1.555	22.224.247	1.721	236.483.384	3.276	258.707.632	6.861	91.325.610	11.656	435.691.791	18.517	527.017.401
		1,45	10.348	140.487.725	67.062	1.601.854.787	77.410	1.742.342.512	9.705	151.991.210	12.063	701.804.705	21.768	853.795.915	20.053	292.478.934	79.125	2.303.659.492	99.178	2.596.138.427
		1,80	6.768	103.571.044	39.582	1.299.823.957	46.350	1.403.395.001	11.981	215.746.522	16.878	1.626.882.931	28.859	1.842.629.453	18.749	319.317.566	56.460	2.926.706.888	75.209	3.246.024.454
	TOTAL		22.422	313.160.132	116.579	3.100.887.152	139.001	3.414.047.283	23.241	389.961.979	30.662	2.565.171.020	53.903	2.955.132.999	45.663	703.122.110	147.241	5.666.058.172	192.904	6.369.180.282
	Florencio Varela	1,30	10.544	138.351.257	49.225	1.202.128.203	59.769	1.340.479.460	198	3.625.078	139	10.127.468	337	13.752.546	10.742	141.976.335	49.364	1.212.255.671	60.106	1.354.232.006
		1,45	830	11.001.587	7.219	269.354.602	8.049	280.356.189	121	2.345.392	75	40.163.059	196	42.508.450	951	13.346.979	7.294	309.517.660	8.245	322.864.639
		1,80	838	11.832.706	10.335	498.917.436	11.173	510.750.142	181	3.179.258	248	28.395.046	429	31.574.304	1.019	15.011.964	10.583	527.312.482	11.602	542.324.446
	TOTAL		12.212	161.185.550	66.779	1.970.400.241	78.991	2.131.585.790	500	9.149.728	462	78.685.573	962	87.835.301	12.712	170.335.278	67.241	2.049.085.813	79.953	2.219.421.091
TOTAL REGION SUDESTE			93.632	1.309.054.184	304.745	8.360.782.566	398.377	9.669.836.750	52.460	893.921.620	75.122	6.979.808.517	127.582	7.873.730.137	146.092	2.202.975.804	379.867	15.340.591.083	525.959	17.543.566.887
	Alte. Brown	1,30	2.972	36.390.612	5.087	109.284.139	8.059	145.674.751	5.092	70.717.286	6.932	286.424.042	12.024	357.141.328	8.064	107.107.898	12.019	395.708.181	20.083	502.816.079
		1,80	628	10.281.508	2.681	70.890.145	3.309	81.171.652	3.022	47.322.657	4.871	368.038.671	7.893	415.361.328	3.650	57.604.165	7.552	438.928.816	11.202	496.532.980
		2,75					0	0			2	2.114.492	2	2.114.492	0	0	2	2.114.492	2	2.114.492
	TOTAL		3.600	46.672.120	7.768	180.174.283	11.368	226.846.403	8.114	118.039.942	11.805	656.577.205	19.919	774.617.148	11.714	164.712.063	19.573	836.751.488	31.287	1.001.463.551
	Esteban Echeverria	1,30	2.808	31.974.537	11.746	261.906.139	14.554	293.880.676	2.310	33.944.337	2.833	223.707.767	5.143	257.652.104	5.118	65.918.873	14.579	485.613.906	19.697	551.532.780
		1,45	1.103	18.216.088	1.778	37.092.927	2.881	55.309.015	908	14.139.241	1.385	155.848.936	2.293	169.988.177	2.011	32.355.329	3.163	192.941.863	5.174	225.297.192
	TOTAL		3.911	50.190.624	13.524	298.999.066	17.435	349.189.691	3.218	48.083.578	4.218	379.556.703	7.436	427.640.281	7.129	98.274.202	17.742	678.555.769	24.871	776.829.972
	Ezeiza	1,30	929	9.920.877	2.484	61.981.994	3.413	71.902.871	291	4.086.897	504	42.306.203	795	46.393.100	1.220	14.007.774	2.988	104.288.197	4.208	118.295.971
	TOTAL		929	9.920.877	2.484	61.981.994	3.413	71.902.871	291	4.086.897	504	42.306.203	795	46.393.100	1.220	14.007.774	2.988	104.288.197	4.208	118.295.971
	Lomas de Zamora	1,10	10.229	125.678.550	14.528	296.796.963	24.757	422.475.513	1.219	20.672.281	1.869	187.922.827	3.088	208.595.108	11.448	146.350.831	16.397	484.719.790	27.845	631.070.621
		1,45	7.843	107.792.442	24.370	531.649.787	32.213	639.442.228	5.532	82.332.304	7.519	520.630.704	13.051	602.963.008	13.375	190.124.745	31.889	1.052.280.491	45.264	1.242.405.236
		1,80	4.073	62.367.110	10.589	282.212.188	14.662	344.579.299	7.079	120.130.306	10.986	1.194.225.880	18.065	1.314.356.186	11.152	182.497.416	21.575	1.476.438.069	32.727	1.658.935.485
	TOTAL		22.145	295.838.102	49.487	1.110.658.938	71.632	1.406.497.040	13.830	223.134.890	20.374	1.902.779.412	34.204	2.125.914.302	35.975	518.972.992	69.861	3.013.438.349	105.836	3.532.411.341
	Presidente Perón	1,30	546	6.263.882	717	14.526.440	1.263	20.790.321	4	84.962	4	262.310	8	347.272	550	6.348.843	721	14.788.750	1.271	21.137.593
	TOTAL		546	6.263.882	717	14.526.440	1.263	20.790.321	4	84.962	4	262.310	8	347.272	550	6.348.843	721	14.788.750	1.271	21.137.593
TOTAL REGION SUDOESTE			31.131	408.885.605	73.980	1.666.340.721	105.111	2.075.226.326	25.457	393.430.269	36.905	2.981.481.833	62.362	3.374.912.102	56.588	802.315.874	110.885	4.647.822.554	167.473	5.450.138.428
TOTAL GRAN BUENOS AIRES			345.752	4.724.106.073	951.483	26.838.562.182	1.297.235	31.562.668.254	308.275	4.819.666.952	467.179	35.692.664.373	775.454	40.512.331.326	654.027	9.543.773.025	1.418.662	62.531.226.555	2.072.689	72.074.999.580

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en el sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.
(1) Distrito Morón incluye a los Partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.



ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A)
SERVICIO: AGUA Y CLOACA RADIO ANTIGUO - CODIGO: 08

AREA	DISTRITO	ZONAL	USUARIOS NO MEDIDOS						USUARIOS MEDIDOS						TOTAL					
			Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL		Fact. igual o menor al Mínimo		Fact. mayor al Mínimo		TOTAL	
			FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)	FACTURAS	IMPORTE ($)
CAPITAL FEDERAL	Centro	1,60	1.502	21.917.287	1.614	38.455.112	3.116	60.372.398	154	3.363.158	321	234.912.585	475	238.275.743	1.656	25.280.445	1.935	273.367.696	**3.591**	**298.648.141**
		1,80	11.221	165.637.586	16.450	455.976.064	27.671	621.613.651	1.069	21.201.606	2.747	594.627.139	3.816	615.828.745	12.290	186.839.192	19.197	1.050.603.203	**31.487**	**1.237.442.395**
		2,00	25.333	376.729.243	48.732	1.286.043.485	74.065	1.662.772.727	1.886	42.183.071	4.313	1.155.644.147	6.199	1.197.827.218	27.219	418.912.314	53.045	2.441.687.632	**80.264**	**2.860.599.946**
		2,20	6.562	101.847.898	16.685	625.068.300	23.247	726.916.198	486	11.938.763	1.085	403.173.003	1.571	415.111.766	7.048	113.786.662	17.770	1.028.241.302	**24.818**	**1.142.027.964**
		2,40	28.436	467.753.283	98.051	3.728.968.935	126.487	4.196.722.219	1.292	48.016.670	3.137	1.870.378.993	4.429	1.918.395.663	29.728	515.769.954	101.188	5.599.347.928	**130.916**	**6.115.117.882**
		2,75	12.380	220.410.937	39.573	1.504.824.785	51.953	1.725.235.722	429	13.801.301	1.172	685.284.901	1.601	699.086.202	12.809	234.212.238	40.745	2.190.109.686	**53.554**	**2.424.321.924**
		3,10	2.767	37.991.754	29.192	1.250.573.919	31.959	1.288.565.673	103	2.488.485	384	254.382.857	487	256.871.342	2.870	40.480.239	29.576	1.504.956.776	**32.446**	**1.545.437.015**
		3,50	17.352	273.306.430	96.935	5.664.637.542	114.287	5.937.943.972	867	38.606.352	2.365	1.690.499.724	3.232	1.729.106.076	18.219	311.912.782	99.300	7.355.137.266	**117.519**	**7.667.050.048**
	TOTAL		**105.553**	**1.665.594.418**	**347.232**	**14.554.548.142**	**452.785**	**16.220.142.560**	**6.286**	**181.599.407**	**15.524**	**6.888.903.349**	**21.810**	**7.070.502.756**	**111.839**	**1.847.193.826**	**362.756**	**21.443.451.490**	**474.595**	**23.290.645.316**
	Caballito	1,80	3.054	45.984.126	4.987	227.360.365	8.041	273.344.491	194	5.107.658	414	183.145.654	608	188.253.312	3.248	51.091.784	5.401	410.506.019	**8.649**	**461.597.803**
		2,00	27.477	410.487.840	55.317	1.691.359.118	82.794	2.101.846.958	1.173	24.745.921	2.621	1.027.540.747	3.794	1.052.286.668	28.650	435.233.762	57.938	2.718.899.865	**86.588**	**3.154.133.626**
		2,20	2.189	33.080.892	7.023	246.273.268	9.212	279.354.160	124	2.630.630	291	129.126.690	415	131.757.319	2.313	35.711.522	7.314	375.399.957	**9.627**	**411.111.479**
		2,40	1.576	23.896.222	5.666	238.753.529	7.242	262.649.751	53	1.328.518	171	131.653.349	224	132.981.867	1.629	25.224.739	5.837	370.406.878	**7.466**	**395.631.618**
		3,10	394	5.371.410	3.568	196.622.328	3.962	201.993.738	2	43.962	24	17.782.086	26	17.826.048	396	5.415.372	3.592	214.404.415	**3.988**	**219.819.786**
	TOTAL		**34.690**	**518.820.490**	**76.561**	**2.600.368.607**	**111.251**	**3.119.189.097**	**1.546**	**33.856.689**	**3.521**	**1.489.248.526**	**5.067**	**1.523.105.215**	**36.236**	**552.677.178**	**80.082**	**4.089.617.133**	**116.318**	**4.642.294.312**
	Constitución	1,60					0	0			1	51.074.511	1	51.074.511	0	0	1	51.074.511	**1**	**51.074.511**
		1,80	98	1.521.280	352	12.975.263	450	14.496.543	10	188.374	29	47.031.784	39	47.220.158	108	1.709.654	381	60.007.047	**489**	**61.716.700**
	TOTAL		**98**	**1.521.280**	**352**	**12.975.263**	**450**	**14.496.543**	**10**	**188.374**	**30**	**98.106.295**	**40**	**98.294.669**	**108**	**1.709.654**	**382**	**111.081.558**	**490**	**112.791.212**
	Devoto	1,80					0	0			1	0	1	0	0	0	1	0	**1**	**0**
	TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
TOTAL			**140.341**	**2.185.936.188**	**424.145**	**17.167.892.012**	**564.486**	**19.353.828.200**	**7.842**	**215.644.470**	**19.076**	**8.476.258.170**	**26.918**	**8.691.902.640**	**148.183**	**2.401.580.658**	**443.221**	**25.644.150.182**	**591.404**	**28.045.730.839**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en el sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL POR INTERVALO DE FACTURACION. SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A) **FORMATO N° 314**

SERVICIO: AGUA - CODIGO: 01
RESIDENCIAL

AREA		INTERVALO DE FACTURACION	NO MEDIDOS								MEDIDOS								CONSORCIOS					
			RESIDENCIAL I				RESIDENCIAL II				RESIDENCIAL I				RESIDENCIAL II				MEDIDOS Y NO MEDIDOS					
			Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Unidades (2)		Importe ($)	
			q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%
CAP. FED.	A	X < 6.900 $	2	0,00	13.177	0,00		0,00		0,00	2	0,00	13.442	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	B	6.900 < X < 13.800 $	9	0,00	119.149	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	13.800 < X < 20.700 $	15	0,00	233.273	0,00		0,00		0,00	6	0,00	86.837	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	D	20.700 < X < 41.400 $	4	0,00	85.198	0,00		0,00		0,00	4	0,00	111.979	0,00		0,00		0,00	2	0,09	4	0,03	94.434	0,02
	E	41.400 < X < 70.380 $	1	0,00	61.139	0,00		0,00		0,00	2	0,00	82.974	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	F	70.380 < X < 140.760 $		0,00		0,00		0,00		0,00	3	0,00	307.751	0,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 140.760 $	2	0,00	2.447.539	0,01		0,00		0,00	3	0,00	868.872	0,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**33**	**0**	**2.959.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**1.471.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**	**0**	**94.434**	**0**
G.B.A.	A	X < 6.900 $	280.602	18,15	1.857.161.009	8,68	35.187	27,46	232.434.405	14,18	4.467	3,60	29.003.874	0,53	4	57,14	26.695	39,23	530	23,71	3.022	22,18	15.835.164	3,67
	B	6.900 < X < 13.800 $	481.758	31,15	5.104.477.145	23,87	54.039	42,18	646.026.497	39,41	42.764	34,43	531.396.591	9,76		0,00		0,00	881	39,42	3.294	24,18	35.164.417	8,15
	C	13.800 < X < 20.700 $	326.747	21,13	5.488.080.714	25,66	27.282	21,29	440.133.213	26,85	22.525	18,14	381.895.135	7,01	1	14,29	14.594	21,45	484	21,66	1.902	13,96	31.546.800	7,31
	D	20.700 < X < 41.400 $	162.724	10,52	4.243.931.067	19,84	5.284	4,12	137.275.197	8,37	27.011	21,75	790.427.797	14,52		0,00		0,00	199	8,90	770	5,65	21.092.387	4,89
	E	41.400 < X < 70.380 $	9.372	0,61	461.244.990	2,16	951	0,74	49.873.229	3,04	11.940	9,61	631.041.433	11,59		0,00		0,00	30	1,34	1.424	10,45	79.899.352	18,52
	F	70.380 < X < 140.760 $	1.160	0,08	104.793.850	0,49	661	0,52	63.631.600	3,88	6.454	5,20	617.263.404	11,34		0,00		0,00	20	0,89	2.191	16,08	202.848.562	47,01
	G	X > 140.760 $	517	0,03	674.630.321	3,15	106	0,08	22.396.394	1,37	3.198	2,58	2.149.207.093	39,47		0,00		0,00	9	0,40	62	0,46	13.382.206	3,10
TOTAL			**1.262.880**	**82**	**17.934.319.097**	**84**	**123.510**	**96**	**1.591.770.536**	**97**	**118.359**	**95**	**5.130.235.329**	**94**	**5**	**71**	**41.289**	**61**	**2.153**	**96**	**12.665**	**93**	**399.768.889**	**93**
NUEVAS ÁREAS	A	X < 6.900 $	44.256	2,86	284.149.357	1,33	1.684	1,31	10.277.743	0,63	2.493	2,01	15.947.849	0,29		0,00		0,00	32	1,43	165	1,21	849.162	0,20
	B	6.900 < X < 13.800 $	168.300	10,88	1.713.084.349	8,01	2.154	1,68	20.372.735	1,24	1.776	1,43	17.812.313	0,33	2	28,57	26.756	39,32	33	1,48	101	0,74	894.673	0,21
	C	13.800 < X < 20.700 $	52.253	3,38	860.376.136	4,02	462	0,36	7.710.597	0,47	643	0,52	10.592.952	0,19		0,00		0,00	12	0,54	272	2,00	4.809.987	1,11
	D	20.700 < X < 41.400 $	17.334	1,12	447.007.836	2,09	286	0,22	7.097.967	0,43	464	0,37	12.986.198	0,24		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
	E	41.400 < X < 70.380 $	996	0,06	49.948.431	0,23	18	0,01	931.760	0,06	180	0,14	9.547.151	0,18		0,00		0,00	1	0,04	230	1,69	9.945.464	2,30
	F	70.380 < X < 140.760 $	234	0,02	22.335.284	0,10	8	0,01	908.136	0,06	143	0,12	13.593.961	0,25		0,00		0,00	2	0,09	188	1,38	15.156.186	3,51
	G	X > 140.760 $	119	0,01	72.430.871	0,34	2	0,00	316.804	0,02	112	0,09	232.472.435	4,27		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
TOTAL			**283.492**	**18**	**3.449.332.265**	**16**	**4.614**	**4**	**47.615.742**	**3**	**5.811**	**5**	**312.952.859**	**6**	**2**	**29**	**26.756**	**39**	**80**	**4**	**956**	**7**	**31.655.473**	**7**
TOTAL	A	X < 6.900 $	324.860	21,01	2.141.323.544	10,01	36.871	28,78	242.712.149	14,81	6.962	5,61	44.965.165	0,83	4	57,14	26.695	39,23	562	25,15	3.187	23,39	16.684.326	3,87
	B	6.900 < X < 13.800 $	650.067	42,04	6.817.680.642	31,88	56.193	43,86	666.399.232	40,65	44.540	35,86	549.208.904	10,09	2	28,57	26.756	39,32	914	40,89	3.395	24,92	36.059.091	8,36
	C	13.800 < X < 20.700 $	379.015	24,51	6.348.690.123	29,69	27.744	21,65	447.843.809	27,32	23.174	18,66	392.574.924	7,21	1	14,29	14.594	21,45	496	22,19	2.174	15,96	36.356.787	8,43
	D	20.700 < X < 41.400 $	180.062	11,64	4.691.024.101	21,93	5.570	4,35	144.373.164	8,81	27.479	22,13	803.525.974	14,76	0	0,00	0	0,00	201	8,99	774	5,68	21.186.821	4,91
	E	41.400 < X < 70.380 $	10.369	0,67	511.254.561	2,39	969	0,76	50.804.989	3,10	12.122	9,76	640.671.558	11,77	0	0,00	0	0,00	31	1,39	1.654	12,14	89.844.817	20,82
	F	70.380 < X < 140.760 $	1.394	0,09	127.129.135	0,59	669	0,52	64.539.736	3,94	6.600	5,31	631.165.116	11,59	0	0,00	0	0,00	22	0,98	2.379	17,46	218.004.749	50,52
	G	X > 140.760 $	638	0,04	749.508.732	3,50	108	0,08	22.713.197	1,39	3.313	2,67	2.382.548.401	43,76	0	0,00	0	0,00	9	0,40	62	0,46	13.382.206	3,10
TOTAL			**1.546.405**	**100**	**21.386.610.837**	**100**	**128.124**	**100**	**1.639.386.277**	**100**	**124.190**	**100**	**5.444.660.042**	**100**	**7**	**100**	**68.045**	**100**	**2.235**	**100**	**13.625**	**100**	**431.518.795**	**100**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.
(1) Los casos corresponden a facturas. Por cada ciclo de facturación bimestral se emite 1 factura para usuarios fiscales y 2 facturas para usuarios públicos.
(2) Es la cantidad de unidades funcionales y unidades complementarias facturadas en esos casos.

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL POR INTERVALO DE FACTURACION. SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A) **FORMATO N° 315**

SERVICIO: CLOACA - CODIGO: 02
RESIDENCIAL

AREA		INTERVALO DE FACTURACION	NO MEDIDOS								MEDIDOS								CONSORCIOS					
			RESIDENCIAL I				RESIDENCIAL II				RESIDENCIAL I				RESIDENCIAL II				MEDIDOS Y NO MEDIDOS					
			Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Unidades (2)		Importe ($)	
			q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%
CAP. FED.	A	X < 13.800 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	B	13.800 < X < 27.600 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	27.600 < X < 41.400 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	D	41.400 < X < 82.800 $	1	0,00	44.085	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	E	82.800 < X < 140.760 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	F	140.760 < X < 281.520 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 281.520 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**1**	**0**	**44.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.B.A.	A	X < 13.800 $	147.483	44,80	1.360.575.034	28,45	17.755	54,63	164.382.493	31,45	855	33,06	11.445.816	12,18		0,00		0,00	181	53,08	1.123	25,10	11.294.956	7,99
	B	13.800 < X < 27.600 $	69.949	21,25	1.275.814.111	26,68	3.137	9,65	59.620.458	11,41	769	29,74	15.291.696	16,28		0,00		0,00	108	31,67	1.139	25,46	19.040.527	13,47
	C	27.600 < X < 41.400 $	6.863	2,08	222.467.842	4,65	1.847	5,68	63.407.674	12,13	391	15,12	13.116.515	13,96		0,00		0,00	3	0,88	126	2,82	5.117.024	3,62
	D	41.400 < X < 82.800 $	1.885	0,57	98.500.942	2,06	2.215	6,82	122.274.163	23,39	392	15,16	21.949.825	23,36		0,00		0,00	7	2,05	1.674	37,42	96.764.244	68,45
	E	82.800 < X < 140.760 $	219	0,07	22.055.520	0,46	162	0,50	16.517.071	3,16	75	2,90	7.715.123	8,21		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
	F	140.760 < X < 281.520 $	117	0,04	24.035.977	0,50	16	0,05	2.621.866	0,50	35	1,35	6.544.158	6,97		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
	G	X > 281.520 $	122	0,04	267.101.554	5,59		0,00		0,00	27	1,04	15.575.187	16,58		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
TOTAL			**226.638**	**69**	**3.270.550.981**	**68**	**25.132**	**77**	**428.823.724**	**82**	**2.544**	**98**	**91.638.321**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299**	**88**	**4.062**	**91**	**132.216.751**	**94**
NUEVAS ÁREAS	A	X < 13.800 $	69.436	21,09	589.034.487	12,32	5.536	17,03	18.713.070	3,58	30	1,16	374.548	0,40		0,00		0,00	28	8,21	174	3,89	1.654.095	1,17
	B	13.800 < X < 27.600 $	28.021	8,51	514.246.721	10,75	1.124	3,46	20.675.652	3,96	9	0,35	145.489	0,15		0,00		0,00	12	3,52	60	1,34	915.739	0,65
	C	27.600 < X < 41.400 $	3.597	1,09	116.566.314	2,44	132	0,41	4.406.782	0,84	1	0,04	33.203	0,04		0,00		0,00	2	0,59	178	3,98	6.582.205	4,66
	D	41.400 < X < 82.800 $	887	0,27	45.472.208	0,95	318	0,98	16.592.979	3,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
	E	82.800 < X < 140.760 $	328	0,10	40.639.886	0,85	219	0,67	27.003.482	5,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
	F	140.760 < X < 281.520 $	262	0,08	46.235.840	0,97	39	0,12	6.483.788	1,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
	G	X > 281.520 $	64	0,02	158.961.513	3,32		0,00		0,00	2	0,08	1.763.665	1,88		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
TOTAL			**102.595**	**31**	**1.511.156.969**	**32**	**7.368**	**23**	**93.875.753**	**18**	**42**	**2**	**2.316.904**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42**	**12**	**412**	**9**	**9.152.040**	**6**
TOTAL	A	X < 13.800 $	216.919	65,89	1.949.609.521	40,77	23.291	71,66	183.095.563	35,03	885	34,22	11.820.364	12,58	0	0,00	0	0,00	209	61,29	1.297	28,99	12.949.050	9,16
	B	13.800 < X < 27.600 $	97.970	29,76	1.790.060.832	37,44	4.261	13,11	80.296.110	15,36	778	30,09	15.437.184	16,43	0	0,00	0	0,00	120	35,19	1.199	26,80	19.956.266	14,12
	C	27.600 < X < 41.400 $	10.460	3,18	339.034.156	7,09	1.979	6,09	67.814.455	12,97	392	15,16	13.149.718	14,00	0	0,00	0	0,00	5	1,47	304	6,79	11.699.230	8,28
	D	41.400 < X < 82.800 $	2.773	0,84	144.017.234	3,01	2.533	7,79	138.867.141	26,57	392	15,16	21.949.825	23,36	0	0,00	0	0,00	7	2,05	1.674	37,42	96.764.244	68,45
	E	82.800 < X < 140.760 $	547	0,17	62.695.406	1,31	381	1,17	43.520.553	8,33	75	2,90	7.715.123	8,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	F	140.760 < X < 281.520 $	379	0,12	70.271.818	1,47	55	0,17	9.105.654	1,74	35	1,35	6.544.158	6,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	G	X > 281.520 $	186	0,06	426.063.067	8,91	0	0,00	0	0,00	29	1,12	17.338.852	18,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL			**329.234**	**100**	**4.781.752.034**	**100**	**32.500**	**100**	**522.699.477**	**100**	**2.586**	**100**	**93.955.225**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341**	**100**	**4.474**	**100**	**141.368.790**	**100**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.
(1) Los casos corresponden a facturas. Por cada ciclo de facturación bimestral se emite 1 factura para usuarios fiscales y 2 facturas para usuarios públicos.
(2) Es la cantidad de unidades funcionales y unidades complementarias facturadas en esos casos.

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL POR INTERVALO DE FACTURACION. SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A) **FORMATO N° 316**

SERVICIO: AGUA Y CLOACA - CODIGO: 05 Y 08
RESIDENCIAL

AREA		INTERVALO DE FACTURACION	NO MEDIDOS								MEDIDOS								CONSORCIOS					
			RESIDENCIAL I				RESIDENCIAL II				RESIDENCIAL I				RESIDENCIAL II				MEDIDOS Y NO MEDIDOS					
			Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Unidades (2)		Importe ($)	
			q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%
CAP. FED.	A	X < 13.800 $	4.606	0,60	56.226.314	0,22	145.552	7,65	1.580.443.215	4,25	9.719	1,13	120.070.522	0,31		0,00		0,00	21.727	22,48	296.720	24,28	3.018.394.430	12,77
	B	13.800 < X < 27.600 $	48.599	6,33	915.923.417	3,53	953.541	50,13	16.080.858.337	43,27	98.533	11,43	1.613.403.889	4,13	8	15,38	117.257	15,40	38.366	39,70	532.744	43,59	9.696.608.835	41,04
	C	27.600 < X < 41.400 $	42.204	5,49	1.326.929.341	5,11	179.681	9,45	5.451.092.692	14,67	43.189	5,01	1.380.060.952	3,53		0,00		0,00	15.557	16,10	188.658	15,43	5.674.756.395	24,02
	D	41.400 < X < 82.800 $	23.107	3,01	1.273.053.318	4,90	60.423	3,18	3.308.051.871	8,90	35.365	4,10	2.018.592.645	5,17		0,00		0,00	4.196	4,34	36.228	2,96	1.866.625.889	7,90
	E	82.800 < X < 140.760 $	4.461	0,58	463.231.403	1,78	9.897	0,52	1.020.420.382	2,75	12.711	1,47	1.347.346.233	3,45		0,00		0,00	510	0,53	2.646	0,22	266.320.311	1,13
	F	140.760 < X < 281.520 $	3.702	0,48	760.097.079	2,93	1.599	0,08	282.478.336	0,76	8.909	1,03	1.760.914.117	4,51		0,00		0,00	170	0,18	749	0,06	130.819.361	0,55
	G	X > 281.520 $	6.670	0,87	5.644.653.097	21,73	217	0,01	118.479.598	0,32	9.339	1,08	6.554.334.750	16,79		0,00		0,00	56	0,06	179	0,01	90.612.128	0,38
TOTAL			**133.349**	**17**	**10.440.113.970**	**40**	**1.350.910**	**71**	**27.841.824.431**	**75**	**217.765**	**25**	**14.794.723.109**	**38**	**8**	**15**	**117.257**	**15**	**80.582**	**83**	**1.057.924**	**87**	**20.744.137.349**	**88**
G.B.A.	A	X < 13.800 $	70.354	9,16	883.634.207	3,40	185.607	9,76	2.352.000.534	6,33	173.766	20,16	2.311.910.395	5,92	26	50,00	300.715	39,51	6.758	6,99	68.979	5,64	658.547.849	2,79
	B	13.800 < X < 27.600 $	247.014	32,16	4.591.274.213	17,68	287.833	15,13	4.884.701.621	13,14	203.055	23,56	3.533.196.710	9,05	13	25,00	195.142	25,64	6.106	6,32	58.997	4,83	1.068.890.173	4,52
	C	27.600 < X < 41.400 $	92.473	12,04	2.771.665.298	10,67	36.630	1,93	1.079.938.649	2,91	121.586	14,11	3.848.526.926	9,86	2	3,85	64.807	8,51	1.723	1,78	20.472	1,67	607.577.193	2,57
	D	41.400 < X < 82.800 $	17.224	2,24	903.968.762	3,48	5.173	0,27	275.159.557	0,74	83.550	9,69	4.706.770.590	12,06	1	1,92	51.591	6,78	390	0,40	5.312	0,43	292.930.858	1,24
	E	82.800 < X < 140.760 $	2.468	0,32	264.098.831	1,02	656	0,03	66.555.645	0,18	23.175	2,69	2.432.667.447	6,23		0,00		0,00	52	0,05	363	0,03	40.426.265	0,17
	F	140.760 < X < 281.520 $	1.551	0,20	297.678.156	1,15	126	0,01	23.581.570	0,06	12.427	1,44	2.394.475.167	6,13		0,00		0,00	22	0,02	55	0,00	9.812.551	0,04
	G	X > 281.520 $	863	0,11	784.209.114	3,02	166	0,01	69.490.249	0,19	6.814	0,79	3.858.006.191	9,88		0,00		0,00	2	0,00	6	0,00	1.995.385	0,01
TOTAL			**431.947**	**56**	**10.496.528.581**	**40**	**516.191**	**27**	**8.751.427.824**	**24**	**624.373**	**72**	**23.085.553.425**	**59**	**42**	**81**	**612.256**	**80**	**15.053**	**16**	**154.184**	**13**	**2.680.180.274**	**11**
NUEVAS ÁREAS	A	X < 13.800 $	35.979	4,68	465.831.669	1,79	8.668	0,46	81.226.244	0,22	4.777	0,55	61.025.159	0,16		0,00		0,00	344	0,36	4.276	0,35	44.014.028	0,19
	B	13.800 < X < 27.600 $	103.703	13,50	1.932.266.988	7,44	23.962	1,26	400.410.072	1,08	7.808	0,91	128.345.563	0,33	2	3,85	31.668	4,16	550	0,57	4.791	0,39	84.925.618	0,36
	C	27.600 < X < 41.400 $	49.783	6,48	1.508.633.472	5,81	2.196	0,12	64.745.189	0,17	3.134	0,36	99.285.615	0,25		0,00		0,00	77	0,08	376	0,03	11.727.931	0,05
	D	41.400 < X < 82.800 $	11.443	1,49	603.802.885	2,32	340	0,02	18.186.480	0,05	2.391	0,28	136.779.484	0,35		0,00		0,00	18	0,02	569	0,05	41.498.146	0,18
	E	82.800 < X < 140.760 $	1.160	0,15	120.330.224	0,46	40	0,00	4.065.220	0,01	783	0,09	82.670.585	0,21		0,00		0,00	4	0,00	93	0,01	8.869.332	0,04
	F	140.760 < X < 281.520 $	465	0,06	90.912.260	0,35	13	0,00	2.176.140	0,01	483	0,06	94.420.783	0,24		0,00		0,00	2	0,00	96	0,01	13.587.046	0,06
	G	X > 281.520 $	285	0,04	315.687.799	1,22	2	0,00	665.235	0,00	426	0,05	559.445.563	1,43		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
TOTAL			**202.818**	**26**	**5.037.465.297**	**19**	**35.221**	**2**	**571.474.580**	**2**	**19.802**	**2**	**1.161.972.753**	**3**	**2**	**4**	**31.668**	**4**	**995**	**1**	**10.201**	**1**	**204.622.100**	**1**
TOTAL	A	X < 13.800 $	110.939	14,44	1.405.692.191	5,41	339.827	17,86	4.013.669.993	10,80	188.262	21,84	2.493.006.077	6,39	26	50,00	300.715	39,51	28.829	29,83	369.975	30,27	3.720.956.308	15,75
	B	13.800 < X < 27.600 $	399.316	51,99	7.439.464.618	28,64	1.265.336	66,52	21.365.970.029	57,49	309.396	35,90	5.274.946.162	13,51	23	44,23	344.067	45,20	45.022	46,59	596.532	48,80	10.850.424.625	45,92
	C	27.600 < X < 41.400 $	184.460	24,01	5.607.228.110	21,59	218.507	11,49	6.595.776.530	17,75	167.909	19,48	5.327.873.492	13,65	2	3,85	64.807	8,51	17.357	17,96	209.506	17,14	6.294.061.519	26,64
	D	41.400 < X < 82.800 $	51.774	6,74	2.780.824.965	10,71	65.936	3,47	3.601.397.908	9,69	121.306	14,07	6.862.142.719	17,58	1	1,92	51.591	6,78	4.604	4,76	42.109	3,45	2.201.054.892	9,32
	E	82.800 < X < 140.760 $	8.089	1,05	847.660.459	3,26	10.593	0,56	1.091.041.247	2,94	36.669	4,25	3.862.684.265	9,89	0	0,00	0	0,00	566	0,59	3.102	0,25	315.615.908	1,34
	F	140.760 < X < 281.520 $	5.718	0,74	1.148.687.495	4,42	1.738	0,09	308.236.047	0,83	21.819	2,53	4.249.810.068	10,89	0	0,00	0	0,00	194	0,20	900	0,07	154.218.959	0,65
	G	X > 281.520 $	7.818	1,02	6.744.550.010	25,97	385	0,02	188.635.082	0,51	16.579	1,92	10.971.786.504	28,10	0	0,00	0	0,00	58	0,06	185	0,02	92.607.513	0,39
TOTAL			**768.114**	**100**	**25.974.107.847**	**100**	**1.902.322**	**100**	**37.164.726.835**	**100**	**861.940**	**100**	**39.042.249.287**	**100**	**52**	**100**	**761.181**	**100**	**96.630**	**100**	**1.222.309**	**100**	**23.628.939.724**	**100**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.
(1) Los casos corresponden a facturas. Por cada ciclo de facturación bimestral se emite 1 factura para usuarios fiscales y 2 facturas para usuarios públicos.
(2) Es la cantidad de unidades funcionales y unidades complementarias facturadas en esos casos.

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL POR INTERVALO DE FACTURACION. SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A) **FORMATO N° 317**

SERVICIO: AGUA - CODIGO: 01
NO RESIDENCIAL

AREA		INTERVALO DE FACTURACION	NO MEDIDOS								MEDIDOS								CONSORCIOS					
			NO RESIDENCIAL I				NO RESIDENCIAL II				NO RESIDENCIAL I				NO RESIDENCIAL II				MEDIDOS Y NO MEDIDOS					
			Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Unidades (2)		Importe ($)	
			q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%
CAP. FED.	A	X < 13.800 $	104	0,19	-7.163.529	-0,17		0,00		0,00	178	0,40	1.575.693	0,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	B	13.800 < X < 41.400 $	9	0,02	227.158	0,01		0,00		0,00	32	0,07	734.370	0,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	41.400 < X < 124.200 $	12	0,02	770.923	0,02	1	0,02	49.090	0,03	8	0,02	750.295	0,02		0,00		0,00	2	1,05	260	22,63	16.083.969	49,88
	D	124.200 < X < 372.600 $	20	0,04	4.737.492	0,11		0,00		0,00	7	0,02	1.343.170	0,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	E	372.600 < X < 1.117.800 $	22	0,04	14.135.698	0,33	1	0,02	535.344	0,30	3	0,01	2.400.743	0,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	F	1.117.800 < X < 3.353.400 $	6	0,01	11.008.624	0,26		0,00		0,00	5	0,01	9.878.699	0,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 3.353.400 $	6	0,01	119.115.184	2,82		0,00		0,00	4	0,01	73.979.030	1,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**179**	**0**	**142.831.550**	**3**	**2**	**0**	**584.434**	**0**	**237**	**1**	**90.662.000**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**260**	**23**	**16.083.969**	**50**
G.B.A.	A	X < 13.800 $	4.535	8,14	49.329.921	1,17	1.001	17,75	10.433.030	5,85	7.363	16,59	77.390.449	2,01	4	40,00	42.514	13,74	65	34,21	407	35,42	3.395.372	10,53
	B	13.800 < X < 41.400 $	19.927	35,76	523.682.486	12,40	3.596	63,77	87.140.812	48,90	23.822	53,67	561.269.344	14,57	4	40,00	85.203	27,54	102	53,68	420	36,55	8.871.870	27,52
	C	41.400 < X < 124.200 $	15.359	27,56	1.046.293.434	24,76	653	11,58	38.803.077	21,78	7.589	17,10	528.110.931	13,71		0,00		0,00	13	6,84	30	2,61	1.793.312	5,56
	D	124.200 < X < 372.600 $	3.355	6,02	663.540.811	15,71	66	1,17	13.432.653	7,54	2.997	6,75	613.117.166	15,92		0,00		0,00	2	1,05	10	0,87	1.523.086	4,72
	E	372.600 < X < 1.117.800 $	743	1,33	445.164.539	10,54	14	0,25	9.072.804	5,09	1.029	2,32	642.180.303	16,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	F	1.117.800 < X < 3.353.400 $	200	0,36	369.258.021	8,74	7	0,12	11.587.662	6,50	287	0,65	503.050.578	13,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 3.353.400 $	44	0,08	363.010.856	8,59		0,00		0,00	75	0,17	753.624.532	19,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**44.163**	**79**	**3.460.280.068**	**82**	**5.337**	**95**	**170.470.038**	**96**	**43.162**	**97**	**3.678.743.302**	**96**	**8**	**80**	**127.717**	**41**	**182**	**96**	**867**	**75**	**15.583.640**	**48**
NUEVAS ÁREAS	A	X < 13.800 $	1.551	2,78	10.401.393	0,25	127	2,25	1.241.495	0,70	498	1,12	4.728.896	0,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	B	13.800 < X < 41.400 $	6.376	11,44	164.700.943	3,90	123	2,18	2.970.284	1,67	241	0,54	5.784.466	0,15		0,00		0,00	4	2,11	18	1,57	299.142	0,93
	C	41.400 < X < 124.200 $	2.768	4,97	178.658.897	4,23	48	0,85	2.678.779	1,50	119	0,27	7.712.263	0,20	2	20,00	181.688	58,72	2	1,05	4	0,35	276.834	0,86
	D	124.200 < X < 372.600 $	527	0,95	108.673.025	2,57	2	0,04	252.999	0,14	74	0,17	15.353.121	0,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	E	372.600 < X < 1.117.800 $	129	0,23	70.749.571	1,67		0,00		0,00	48	0,11	32.056.473	0,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	F	1.117.800 < X < 3.353.400 $	35	0,06	64.828.851	1,53		0,00		0,00	5	0,01	11.283.568	0,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 3.353.400 $	2	0,00	23.800.265	0,56		0,00		0,00	1	0,00	4.983.040	0,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**11.388**	**20**	**621.812.945**	**15**	**300**	**5**	**7.143.557**	**4**	**986**	**2**	**81.901.826**	**2**	**2**	**20**	**181.688**	**59**	**6**	**3**	**22**	**2**	**575.977**	**2**
TOTAL	A	X < 13.800 $	6.190	11,11	52.567.785	1,24	1.128	20,00	11.674.525	6,55	8.039	18,11	83.695.038	2,17	4	40,00	42.514	13,74	65	34,21	407	35,42	3.395.372	10,53
	B	13.800 < X < 41.400 $	26.312	47,21	688.610.587	16,30	3.719	65,95	90.111.096	50,57	24.095	54,29	567.788.180	14,74	4	40,00	85.203	27,54	106	55,79	438	38,12	9.171.013	28,44
	C	41.400 < X < 124.200 $	18.139	32,55	1.225.723.254	29,01	702	12,45	41.530.945	23,31	7.716	17,38	536.573.489	13,93	2	20,00	181.688	58,72	17	8,95	294	25,59	18.154.115	56,30
	D	124.200 < X < 372.600 $	3.902	7,00	776.951.328	18,39	68	1,21	13.685.652	7,68	3.078	6,93	629.813.456	16,35	0	0,00	0	0,00	2	1,05	10	0,87	1.523.086	4,72
	E	372.600 < X < 1.117.800 $	894	1,60	530.049.807	12,55	15	0,27	9.608.148	5,39	1.080	2,43	676.637.519	17,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	F	1.117.800 < X < 3.353.400 $	241	0,43	445.095.496	10,53	7	0,12	11.587.662	6,50	297	0,67	524.212.844	13,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	G	X > 3.353.400 $	52	0,09	505.926.305	11,97	0	0,00	0	0,00	80	0,18	832.586.603	21,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL			**55.730**	**100**	**4.224.924.563**	**100**	**5.639**	**100**	**178.198.029**	**100**	**44.385**	**100**	**3.851.307.128**	**100**	**10**	**100**	**309.405**	**100**	**190**	**100**	**1.149**	**100**	**32.243.585**	**100**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.
(1) Los casos corresponden a facturas. Por cada ciclo de facturación bimestral se emite 1 factura para usuarios fiscales y 2 facturas para usuarios públicos.
(2) Es la cantidad de unidades funcionales y unidades complementarias facturadas en esos casos.

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL POR INTERVALO DE FACTURACION. SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A) **FORMATO N° 318**

SERVICIO: CLOACA - CODIGO: 02
NO RESIDENCIAL

AREA		INTERVALO DE FACTURACION	NO MEDIDOS								MEDIDOS								CONSORCIOS					
			NO RESIDENCIAL I				NO RESIDENCIAL II				NO RESIDENCIAL I				NO RESIDENCIAL II				MEDIDOS Y NO MEDIDOS					
			Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Unidades (2)		Importe ($)	
			q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%
CAP. FED.	A	X < 27.600 $		0,00		0,00		0,00		0,00	1	0,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	B	27.600 < X < 82.800 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	82.800 < X < 248.400 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	D	248.400 < X < 745.200 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	E	745.200 < X < 2.235.600 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	F	2.235.600 < X < 6.706.800 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 6.706.800 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.B.A.	A	X < 27.600 $	4.260	31,79	77.003.069	6,27	362	42,89	6.291.073	26,46	786	69,99	16.963.906	20,21		0,00		0,00	46	82,14	384	94,58	5.398.437	90,07
	B	27.600 < X < 82.800 $	5.151	38,43	244.207.373	19,90	70	8,29	3.058.238	12,86	239	21,28	11.877.459	14,15		0,00		0,00	8	14,29	16	3,94	533.484	8,90
	C	82.800 < X < 248.400 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	D	248.400 < X < 745.200 $	423	3,16	166.794.281	13,59	5	0,59	1.816.800	7,64	48	4,27	19.718.797	23,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	E	745.200 < X < 2.235.600 $	116	0,87	134.740.709	10,98		0,00		0,00	13	1,16	14.067.261	16,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	F	2.235.600 < X < 6.706.800 $	51	0,38	203.430.029	16,58		0,00		0,00	6	0,53	18.822.588	22,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 6.706.800 $	7	0,05	84.303.452	6,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**10.008**	**75**	**910.478.913**	**74**	**437**	**52**	**11.166.111**	**47**	**1.092**	**97**	**81.450.011**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**96**	**400**	**99**	**5.931.921**	**99**
NUEVAS ÁREAS	A	X < 27.600 $	1.575	11,75	23.327.681	1,90	359	42,54	4.721.282	19,86	27	2,40	516.755	0,62		0,00		0,00	2	3,57	6	1,48	62.012	1,03
	B	27.600 < X < 82.800 $	1.607	11,99	75.086.392	6,12	44	5,21	1.894.311	7,97	2	0,18	95.615	0,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	82.800 < X < 248.400 $		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	D	248.400 < X < 745.200 $	151	1,13	62.078.932	5,06	2	0,24	649.937	2,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	E	745.200 < X < 2.235.600 $	42	0,31	52.627.462	4,29		0,00		0,00	1	0,09	1.874.112	2,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	F	2.235.600 < X < 6.706.800 $	15	0,11	52.835.511	4,31	2	0,24	5.346.738	22,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 6.706.800 $	4	0,03	50.767.561	4,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**3.394**	**25**	**316.723.538**	**26**	**407**	**48**	**12.612.267**	**53**	**30**	**3**	**2.486.482**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	**6**	**1**	**62.012**	**1**
TOTAL	A	X < 27.600 $	5.835	43,54	100.330.750	8,18	721	85,43	11.012.354	46,31	814	72,48	17.480.661	20,83	0	0,00	0	0,00	48	85,71	390	96,06	5.460.449	91,10
	B	27.600 < X < 82.800 $	6.758	50,43	319.293.765	26,02	114	13,51	4.952.548	20,83	241	21,46	11.973.074	14,26	0	0,00	0	0,00	8	14,29	16	3,94	533.484	8,90
	C	82.800 < X < 248.400 $	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	D	248.400 < X < 745.200 $	574	4,28	228.873.213	18,65	7	0,83	2.466.737	10,37	48	4,27	19.718.797	23,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	E	745.200 < X < 2.235.600 $	158	1,18	187.368.171	15,27	0	0,00	0	0,00	14	1,25	15.941.373	18,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	F	2.235.600 < X < 6.706.800 $	66	0,49	256.265.540	20,88	2	0,24	5.346.738	22,49	6	0,53	18.822.588	22,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	G	X > 6.706.800 $	11	0,08	135.071.013	11,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL			**13.402**	**100**	**1.227.202.451**	**100**	**844**	**100**	**23.778.378**	**100**	**1.123**	**100**	**83.936.493**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56**	**100**	**406**	**100**	**5.993.932**	**100**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.
(1) Los casos corresponden a facturas. Por cada ciclo de facturación bimestral se emite 1 factura para usuarios fiscales y 2 facturas para usuarios públicos.
(2) Es la cantidad de unidades funcionales y unidades complementarias facturadas en esos casos.

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL POR INTERVALO DE FACTURACION. SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025) (A) **FORMATO Nº 319**

SERVICIO: AGUA Y CLOACA - CODIGO: 05 Y 08
NO RESIDENCIAL

AREA		INTERVALO DE FACTURACION	NO MEDIDOS								MEDIDOS								CONSORCIOS					
			NO RESIDENCIAL I				NO RESIDENCIAL II				NO RESIDENCIAL I				NO RESIDENCIAL II				MEDIDOS Y NO MEDIDOS					
			Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Importe ($)		Casos (1)		Unidades (2)		Importe ($)	
			q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%	q	%
CAP. FED.	A	X < 27.600 $	2.168	4,12	20.062.498	0,22	79.913	40,77	1.643.750.159	18,22	35.383	17,53	762.721.092	2,23	4	80,00	85.627	80,23	2.478	39,34	73.499	68,64	949.257.767	39,49
	B	27.600 < X < 82.800 $	6.548	12,43	349.993.728	3,92	55.046	28,08	2.475.502.649	27,44	21.505	10,65	1.064.899.031	3,12		0,00		0,00	1.907	30,27	17.851	16,67	785.423.185	32,68
	C	82.800 < X < 248.400 $	5.233	9,94	717.137.409	8,04	13.253	6,76	1.722.066.814	19,09	15.321	7,59	2.214.311.125	6,48		0,00		0,00	458	7,27	2.246	2,10	287.992.491	11,98
	D	248.400 < X < 745.200 $	1.558	2,96	631.086.449	7,07	2.650	1,35	1.037.087.024	11,50	8.727	4,32	3.686.599.704	10,79		0,00		0,00	81	1,29	330	0,31	116.829.599	4,86
	E	745.200 < X < 2.235.600 $	548	1,04	671.620.469	7,53	278	0,14	305.647.276	3,39	3.341	1,65	4.010.069.163	11,73		0,00		0,00	10	0,16	32	0,03	30.679.911	1,28
	F	2.235.600 < X < 6.706.800 $	173	0,33	632.339.212	7,09	36	0,02	122.495.830	1,36	874	0,43	3.123.264.158	9,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 6.706.800 $	88	0,17	1.830.619.959	20,52	8	0,00	171.448.280	1,90	259	0,13	5.656.213.924	16,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**16.316**	**31**	**4.852.859.725**	**54**	**151.184**	**77**	**7.477.998.032**	**83**	**85.410**	**42**	**20.518.078.198**	**60**	**4**	**80**	**85.627**	**80**	**4.934**	**78**	**93.958**	**88**	**2.170.182.952**	**90**
G.B.A.	A	X < 27.600 $	5.119	9,72	103.346.006	1,16	28.504	14,54	604.393.649	6,70	60.705	30,07	1.300.740.687	3,81	1	20,00	21.095	19,77	932	14,80	11.256	10,51	141.050.079	5,87
	B	27.600 < X < 82.800 $	10.777	20,46	560.335.331	6,28	11.597	5,92	490.014.597	5,43	28.162	13,95	1.366.081.078	4,00		0,00		0,00	258	4,10	1.055	0,99	45.318.142	1,89
	C	82.800 < X < 248.400 $	5.124	9,73	650.990.676	7,30	1.231	0,63	151.130.333	1,68	14.958	7,41	2.089.418.490	6,11		0,00		0,00	40	0,64	133	0,12	18.357.132	0,76
	D	248.400 < X < 745.200 $	952	1,81	368.588.183	4,13	130	0,07	50.686.808	0,56	6.060	3,00	2.498.804.524	7,31		0,00		0,00	4	0,06	8	0,01	3.522.377	0,15
	E	745.200 < X < 2.235.600 $	228	0,43	259.342.509	2,91	20	0,01	27.463.793	0,30	1.748	0,87	2.075.229.547	6,07		0,00		0,00	1	0,02	2	0,00	3.037.165	0,13
	F	2.235.600 < X < 6.706.800 $	64	0,12	243.066.297	2,72	8	0,00	33.022.086	0,37	407	0,20	1.430.914.842	4,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 6.706.800 $	19	0,04	371.077.398	4,16	6	0,00	80.302.035	0,89	116	0,06	2.166.723.139	6,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**22.283**	**42**	**2.556.746.400**	**29**	**41.496**	**21**	**1.437.013.301**	**16**	**112.156**	**56**	**12.927.912.308**	**38**	**1**	**20**	**21.095**	**20**		**20**	**12.454**	**12**	**211.284.895**	**9**
NUEVAS ÁREAS	A	X < 27.600 $	2.200	4,18	46.779.542	0,52	2.314	1,18	46.869.185	0,52	2.121	1,05	43.933.881	0,13		0,00		0,00	83	1,32	427	0,40	7.693.688	0,32
	B	27.600 < X < 82.800 $	7.247	13,76	376.756.114	4,22	889	0,45	36.723.536	0,41	1.055	0,52	51.998.888	0,15		0,00		0,00	37	0,59	167	0,16	7.041.016	0,29
	C	82.800 < X < 248.400 $	3.767	7,15	495.366.151	5,55	115	0,06	13.969.980	0,15	657	0,33	89.873.400	0,26		0,00		0,00	10	0,16	74	0,07	7.526.182	0,31
	D	248.400 < X < 745.200 $	702	1,33	269.023.655	3,02	11	0,01	4.995.913	0,06	330	0,16	140.342.259	0,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	E	745.200 < X < 2.235.600 $	123	0,23	146.578.288	1,64	4	0,00	3.992.259	0,04	119	0,06	134.996.944	0,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	F	2.235.600 < X < 6.706.800 $	26	0,05	89.059.302	1,00		0,00		0,00	34	0,02	119.234.828	0,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	G	X > 6.706.800 $	7	0,01	87.711.398	0,98		0,00		0,00	8	0,00	154.790.384	0,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL			**14.072**	**27**	**1.511.274.450**	**17**	**3.333**	**2**	**106.550.873**	**1**	**4.324**	**2**	**735.170.584**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130**	**2**	**668**	**1**	**22.260.886**	**1**
TOTAL	A	X < 27.600 $	9.487	18,01	170.188.045	1,91	110.731	56,49	2.295.012.994	25,44	98.209	48,64	2.107.395.660	6,17	5	100,00	106.722	100,00	3.493	55,45	85.182	79,55	1.098.001.534	45,68
	B	27.600 < X < 82.800 $	24.572	46,65	1.287.085.173	14,43	67.532	34,45	3.002.240.782	33,28	50.722	25,12	2.482.978.998	7,26	0	0,00	0	0,00	2.202	34,96	19.073	17,81	837.782.343	34,85
	C	82.800 < X < 248.400 $	14.124	26,82	1.863.494.236	20,89	14.599	7,45	1.887.167.127	20,92	30.936	15,32	4.393.603.015	12,85	0	0,00	0	0,00	508	8,06	2.453	2,29	313.875.805	13,06
	D	248.400 < X < 745.200 $	3.212	6,10	1.268.698.288	14,22	2.791	1,42	1.092.769.745	12,11	15.117	7,49	6.325.746.487	18,51	0	0,00	0	0,00	85	1,35	338	0,32	120.351.976	5,01
	E	745.200 < X < 2.235.600 $	899	1,71	1.077.541.266	12,08	302	0,15	337.103.328	3,74	5.208	2,58	6.220.295.655	18,20	0	0,00	0	0,00	11	0,17	34	0,03	33.717.076	1,40
	F	2.235.600 < X < 6.706.800 $	263	0,50	964.464.811	10,81	44	0,02	155.517.916	1,72	1.315	0,65	4.673.413.828	13,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	G	X > 6.706.800 $	114	0,22	2.289.408.755	25,66	14	0,01	251.750.315	2,79	383	0,19	7.977.727.447	23,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL			**52.671**	**100**	**8.920.880.575**	**100**	**196.013**	**100**	**9.021.562.207**	**100**	**201.890**	**100**	**34.181.161.090**	**100**	**5**	**100**	**106.722**	**100**	**6.299**	**100**	**107.080**	**100**	**2.403.728.734**	**100**

(A) Pueden existir ciertas diferencias con la información incluida en otros ANEXOS, debido a transacciones registradas en sistema comercial SAP entre las distintas fechas de generación de los mismos.
(1) Los casos corresponden a facturas. Por cada ciclo de facturación bimestral se emite 1 factura para usuarios fiscales y 2 facturas para usuarios públicos.
(2) Es la cantidad de unidades funcionales y unidades complementarias facturadas en esos casos.

FORMATO Nº 320

ULTIMO CICLO COMPLETO DE FACTURACION BIMESTRAL: SEMANAS 1383 A 1390 (Emitidas del 25.10.2025 al 13.12.2025)
FACTURA MEDIA (1)

DISTRITOS	CATEGORIA		AGUA Y CLOACA		AGUA		CLOACA		Totales por Régimen		Totales por Servicio			Total General
			medido	no medido	medido	no medido	medido	no medido	Total medido	Total no medido	Total Agua y Cloaca	Total Agua	Total Cloaca	
TOTAL CONCESIÓN	RI	Pesos	45.309	33.817	43.851	13.831	36.332	14.524	45.102	19.725	39.894	16.063	14.694	26.632
		Casos (2)	862.063	768.295	124.206	1.546.584	2.586	329.254	988.855	2.644.133	1.630.358	1.670.790	331.840	3.632.988
	RII	Pesos	14.638	19.537	9.721	12.795		16.083	14.055	19.064	19.537	12.795	16.083	19.064
		Casos (2)	52	1.902.555	7	128.125	0	32.500	59	2.063.180	1.902.607	128.132	32.500	2.063.239
	RII Consorcio	Pesos	210.858	282.122	414.442	111.095	169.140	428.249	213.227	277.255	244.527	193.073	414.571	243.952
		Casos (2)	50.982	45.658	604	1.631	18	323	51.604	47.612	96.640	2.235	341	99.216
	NRI	Pesos	169.309	186.381	86.770	75.679	80.545	97.086	154.067	126.307	172.944	80.590	95.869	144.701
		Casos (2)	201.981	54.651	44.395	55.859	1.237	15.574	247.613	126.084	256.632	100.254	16.811	373.697
	NRII	Pesos	21.344	46.092	30.941	31.587		29.989	27.742	45.620	46.092	31.586	29.989	45.619
		Casos (2)	5	196.076	10	5.645	0	858	15	202.579	196.081	5.655	858	202.594
	NRII Consorcio	Pesos	414.482	332.895	93.806	252.273	74.378	115.941	405.212	326.600	381.503	169.703	107.035	373.008
		Casos (2)	3.754	2.547	99	91	12	44	3.865	2.682	6.301	190	56	6.547
	Baldio	Pesos	53.535	14.990	27.026	8.386	20.206	8.612	50.275	9.939	24.386	8.673	8.638	13.091
		Casos (2)	9.112	28.269	1.234	78.966	34	15.216	10.380	122.451	37.381	80.200	15.250	132.831
	Total	Pesos	76.290	32.197	56.240	15.577	50.994	18.074	73.589	25.332	44.251	19.067	18.396	34.985
		Casos (2)	1.127.949	2.998.051	170.555	1.816.901	3.887	393.769	1.302.391	5.208.721	4.126.000	1.987.456	397.656	6.511.112

(1) Los valores incluyen todos los conceptos facturables (CARGOS FIJOS, CARGOS VARIABLES, AUD, etc.) excepto impuestos.

(2) Los casos corresponden a facturas. Por cada ciclo de facturación bimestral se emite 1 factura para usuarios fiscales y 2 facturas para usuarios públicos.

FORMATO N° 321

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS Y A VENCER

AL 31/12/2025

POR REGIÓN, TIPO DE USUARIO, REGIMEN Y CATEGORÍA DE USUARIO

Clasificación	Concepto	IMPAGO VENCIDO							IMPAGO A VENCER							TOTAL GENERAL
		Capital	Norte	Sur Este	Sur Oeste	Oeste	Grandes Usuarios	Total Vencido	Capital	Norte	Sur Este	Sur Oeste	Oeste	Grandes Clientes	Total a Vencer	
Privados	**Medidos**	**23.484.822.169**	**25.715.031.329**	**14.446.190.976**	**5.091.503.961**	**17.700.368.956**	**5.577.650.485**	**92.015.567.876**	**20.178.612.981**	**12.483.511.588**	**4.194.291.588**	**2.116.284.076**	**6.105.791.800**	**6.262.993.268**	**51.341.485.301**	**143.357.053.176**
	Residencial	12.964.277.810	18.609.493.877	8.270.882.363	2.618.729.912	12.663.620.720	57.396.987	55.184.401.669	13.329.102.085	8.950.378.739	2.559.139.596	1.306.178.488	4.191.903.396	107.813.198	30.444.515.502	85.628.917.171
	No Residencial	9.499.643.479	6.268.518.919	5.980.066.536	2.409.864.635	4.936.574.304	5.512.651.270	34.607.319.143	6.688.402.116	2.916.440.346	1.614.189.049	799.460.499	1.881.098.059	6.146.595.428	20.046.185.496	54.653.504.639
	Baldíos	436.792.139	232.835.395	143.056.749	37.706.713	75.130.486	2.822.156	928.343.639	156.258.199	73.673.625	20.681.435	8.869.721	25.133.099	6.590.853	291.206.931	1.219.550.570
	Eventuales	584.108.741	604.183.138	52.185.329	25.202.700	25.043.446	4.780.073	1.295.503.425	4.850.582	543.018.878	281.508	1.775.368	7.657.247	1.993.788	559.577.371	1.855.080.796
	No Medidos	**47.230.256.091**	**54.783.553.902**	**55.108.174.869**	**38.785.179.577**	**82.857.459.464**	**1.182.007.906**	**279.946.631.809**	**31.994.193.672**	**8.255.818.933**	**8.353.935.511**	**5.614.669.376**	**11.517.029.199**	**1.127.401.277**	**66.863.047.969**	**346.809.679.778**
	Residencial	30.989.514.399	41.139.630.522	43.712.344.017	31.813.136.268	65.538.876.467	42.283.573	213.235.785.247	25.775.636.659	6.310.958.590	6.925.003.885	4.768.221.114	9.289.361.393	29.517.754	53.098.699.395	266.334.484.641
	No Residencial	15.317.360.822	11.513.744.618	10.035.372.084	4.759.138.860	13.122.994.931	1.127.115.986	55.875.727.300	6.079.189.355	1.773.613.006	1.338.005.641	717.282.998	1.960.736.509	1.094.401.299	12.963.228.809	68.838.956.110
	Baldíos	250.213.245	1.656.525.455	1.081.963.451	1.809.929.730	3.856.344.265	4.019.750	8.658.995.895	33.001.373	132.103.518	83.203.313	124.552.732	252.912.527	3.482.224	629.255.687	9.288.251.582
	Eventuales	673.167.626	473.653.307	278.495.318	402.974.718	339.243.801	8.588.597	2.176.123.366	106.366.285	39.143.819	7.722.672	4.612.532	14.018.770	-	171.864.078	2.347.987.444
	Total Privados	**70.715.078.260**	**80.498.585.230**	**69.554.365.845**	**43.876.683.538**	**100.557.828.420**	**6.759.658.392**	**371.962.199.684**	**52.172.806.653**	**20.739.330.521**	**12.548.227.099**	**7.730.953.452**	**17.622.820.999**	**7.390.394.545**	**118.204.533.270**	**490.166.732.954**
Fiscales	**Medidos**	**6.076.702.672**	**171.011.523**	**825.949.470**	**171.351.614**	**133.093.375**	**5.688.507.563**	**13.066.616.217**	**1.278.981.717**	**221.539.647**	**219.659.030**	**20.178.935**	**123.563.044**	**4.560.897.835**	**6.424.820.207**	**19.491.436.424**
	Residencial	196.585.006	79.360.525	659.526.121	26.660	79.027.835	228.036.389	1.242.562.536	14.618.165	33.800.337	94.546.141	265.979	72.767.463	39.117.091	255.115.176	1.497.677.712
	No Residencial	5.845.369.567	91.456.127	160.921.002	171.324.955	53.128.614	5.434.974.309	11.757.174.574	1.263.689.866	187.682.495	125.068.272	19.912.956	50.768.715	4.506.852.747	6.153.975.050	17.911.149.624
	Baldíos	29.461.719	194.870	1.825.753	-	52.627	22.553.505	54.088.475	673.687	56.814	44.617	-	26.867	14.927.997	15.729.982	69.818.457
	Eventuales	5.286.380	-	3.676.594	-	884.298	2.943.360	12.790.631	-	-	-	-	-	-	-	12.790.631
	No Medidos	**7.429.151.680**	**258.538.245**	**773.979.996**	**71.134.922**	**1.188.446.112**	**4.540.675.134**	**14.261.926.089**	**296.710.780**	**81.070.689**	**182.974.344**	**39.572.498**	**243.818.706**	**1.586.855.103**	**2.431.002.120**	**16.692.928.209**
	Residencial	4.321.484.055	91.295.745	311.762.134	2.072.471	261.573.651	178.905.221	5.167.093.278	41.253.015	18.438.325	47.859.507	674.883	90.494.144	81.729.879	280.449.752	5.447.543.031
	No Residencial	2.891.999.466	150.762.787	421.879.158	64.683.843	479.135.113	4.155.217.339	8.163.677.705	242.582.523	61.418.295	134.089.676	38.442.232	148.832.272	1.486.157.860	2.111.522.857	10.275.200.562
	Baldíos	117.862.101	4.370.130	7.444.832	80.118	430.344.021	120.235.486	680.336.689	3.182.634	1.214.069	1.025.161	455.383	4.492.290	18.967.364	29.336.902	709.673.591
	Eventuales	97.806.058	12.109.582	32.893.872	4.298.490	17.393.327	86.317.088	250.818.417	9.692.608	-	-	-	-	-	9.692.608	260.511.025
	Total Fiscales	**13.505.854.352**	**429.549.767**	**1.599.929.466**	**242.486.537**	**1.321.539.486**	**10.229.182.697**	**27.328.542.306**	**1.575.692.497**	**302.610.336**	**402.633.374**	**59.751.432**	**367.381.750**	**6.147.752.938**	**8.855.822.327**	**36.184.364.633**
	TOTAL GENERAL	**84.220.932.612**	**80.928.134.998**	**71.154.295.311**	**44.119.170.074**	**101.879.367.906**	**16.988.841.089**	**399.290.741.990**	**53.748.499.151**	**21.041.940.857**	**12.950.860.473**	**7.790.704.885**	**17.990.202.749**	**13.538.147.482**	**127.060.355.597**	**526.351.097.587**

FORMATO N° 323

CONSUMOS DE LA PREVISIÓN PARA DEUDORES DE DUDOSO COBRO Y AJUSTES DE FACTURACIÓN DEL AÑO 2025

(en pesos)

	Ajustes de facturación	Incobrables	Total Consumos 2025
Enero	-453.510.293	-42.850.680	-496.360.973
Febrero	-282.988.118	-32.535.247	-315.523.365
Marzo	-215.952.216	-39.578.468	-255.530.684
Abril	-232.181.789	-58.011.123	-290.192.912
Mayo	5.230.525.818	-41.905.635	5.188.620.183
Junio	-5.501.261.893	-65.529.886	-5.566.791.779
Julio	-62.893.267	-73.296.182	-136.189.448
Agosto	-35.259.297	-85.662.964	-120.922.261
Septiembre	-21.399.764	-117.043.402	-138.443.165
Octubre	-34.253.335	-113.322.940	-147.576.275
Noviembre	-3.175.843	-114.063.460	-117.239.303
Diciembre	-3.080.570	-123.843.677	-126.924.247
Total 2025	**-1.615.430.565**	**-907.643.665**	**-2.523.074.230**

FORMATO N° 324

CARGO POR CORTE DE SERVICIO - INTERVENCIONES REALIZADAS E IMPORTES DE FACTURACIÓN DEVENGADOS DURANTE EL AÑO 2025

Conceptos	MESES												Acumulado Año 2025
	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Cantidad realizados (1) (2) (3)													
Aviso de Corte / Restricción	16.317	10.643	20.201	20.906	16.445	3.869	15.346	15.670	9.760	15.525	11.047	12.274	168.003
Corte con precinto / simple (4)	1.883	1.497	1.891	1.888	2.277	2.104	2.407	1.615	2.482	2.770	1.904	1.336	24.054
Corte de cloaca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corte profundo (5)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
Corte TCS	81	25	15	2	1	3		72	45	42	4	86	376
TOTAL	18.281	12.166	22.107	22.796	18.723	5.976	17.753	17.357	12.288	18.338	12.955	13.696	192.436
Monto facturado por cortes (cifras expresadas en pesos) (6)													
Aviso de Corte / Restricción	37.463.438	33.515.576	34.227.980	36.972.055	38.076.395	37.948.338	48.164.911	47.134.719	51.816.264	55.732.260	53.835.143	56.979.972	531.867.052
Restricción Simple	66.294.421	60.783.533	54.397.702	70.740.662	76.520.370	85.446.688	110.352.405	97.272.779	112.745.350	135.436.217	114.139.469	110.658.590	1.094.788.184
Corte con precinto	24.632.793	24.966.573	32.706.228	24.971.234	22.676.965	19.635.898	26.866.570	34.933.345	37.326.621	41.946.142	32.388.940	26.420.039	349.471.347
Corte de cloaca	0	47.371	0	59.969	61.898	902.194	65.945	923.221	70.256	72.516	74.849	77.257	2.355.476
Corte profundo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corte profundo de agua en acera	885.853	771.041	1.616.376	4.772.532	1.652.197	2.472.910	1.853.787	3.336.592	900.237	68.040	3.452.420	916.672	22.698.657
Corte profundo de agua en calzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.085	0	1.163.085
Corte TCS	3.362.593	2.048.422	1.500.195	2.070.828	1.176.472	1.290.016	1.258.932	4.322.996	3.705.700	3.187.011	2.853.728	4.376.347	31.153.240
TOTAL	132.639.098	122.132.515	124.448.481	139.587.279	140.164.297	147.696.043	188.562.550	187.923.652	206.564.428	236.442.186	207.907.635	199.428.876	2.033.497.041

(1) las cantidades fueron obtenidas del reporte historico de corte GCM18D

(2) la cantidad de avisos de corte hace referencia a las cuentas contrato

(3) la cantidad de cortes efectuados hace referencia a las conexiones efectivamente cortadas

(4) las cantidades de restricción simple y corte con precinto se reflejan en una sola línea como corte simple, en pesos se encuentra abierto.

(5) las cantidades de cortes profundos de agua en acera y calzada se reflejan en una sola línea como corte profundo, en pesos se encuentra abierto.

(6) las cantidades de cortes responden al momento de realización de los mismos mientras que los montos facturados están asociados al momento en el cual el usuario cancela el gasto de corte para levantar el mismo

21.2. Aspectos vinculados con la medición

REDES DE AGUA
MEDIDORES
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual
Año 2025
FORMATO N° 330

MEDIDORES

REGION	Existentes al 31/12/2024 dentro del Radio Servido	Instalación Nuevos													Ajustes sobre existentes	Existentes al 31/12/2025 dentro del Radio Servido	Renovados / Rehabilitados												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Residenciales	136.997	724	852	643	1.038	711	1.598	1.313	1.465	642	2.603	3.219	3.716	18.524	-116	155.405	220	325	291	278	434	687	922	796	1.093	750	662	665	7.123
No Residenciales	60.611	68	71	62	119	76	126	140	127	138	200	144	134	1.405	-460	61.556	76	79	145	227	211	273	427	541	501	503	477	382	3.842
Capital Federal	**197.608**	**792**	**923**	**705**	**1.157**	**787**	**1.724**	**1.453**	**1.592**	**780**	**2.803**	**3.363**	**3.850**	**19.929**	**-576**	**216.961**	**296**	**404**	**436**	**505**	**645**	**960**	**1.349**	**1.337**	**1.594**	**1.253**	**1.139**	**1.047**	**10.965**
Residenciales	172.148	2.350	3.467	185	398	1.245	3.187	750	3.058	2.633	7.068	5.753	5.621	35.715	-204	207.659	2.241	1.494	474	409	715	827	950	903	595	1.013	536	477	10.634
No Residenciales	32.288	90	44	26	34	44	87	59	48	51	74	69	107	733	-133	32.888	419	868	338	220	264	151	266	226	268	182	204	377	3.783
Total Región Norte	**204.436**	**2.440**	**3.511**	**211**	**432**	**1.289**	**3.274**	**809**	**3.106**	**2.684**	**7.142**	**5.822**	**5.728**	**36.448**	**-337**	**240.547**	**2.660**	**2.362**	**812**	**629**	**979**	**978**	**1.216**	**1.129**	**863**	**1.195**	**740**	**854**	**14.417**
Residenciales	128.547	29	16	20	22	9	10	32	23	28	27	3	13	232	-26	128.753	133	679	547	791	408	596	922	1.104	1.673	3.527	1.626	1.239	13.245
No Residenciales	26.065	16	17	13	25	7	14	12	31	17	32	16	22	222	0	26.287	33	168	124	144	100	129	238	162	219	551	218	152	2.238
Total Región Oeste	**154.612**	**45**	**33**	**33**	**47**	**16**	**24**	**44**	**54**	**45**	**59**	**19**	**35**	**454**	**-26**	**155.040**	**166**	**847**	**671**	**935**	**508**	**725**	**1.160**	**1.266**	**1.892**	**4.078**	**1.844**	**1.391**	**15.483**
Residenciales	31.662	12	6	8	6	12	13	7	6	14	53	3	6	146	6	31.814	29	28	68	76	172	170	40	112	81	108	88	200	1.172
No Residenciales	10.700	5	3	7	12	14	7	6	3	17	16	9	0	99	-48	10.751	17	6	25	25	49	55	30	37	58	22	47	51	422
Total Región Suroeste	**42.362**	**17**	**9**	**15**	**18**	**26**	**20**	**13**	**9**	**31**	**69**	**12**	**6**	**245**	**-42**	**42.565**	**46**	**34**	**93**	**101**	**221**	**225**	**70**	**149**	**139**	**130**	**135**	**251**	**1.594**
Residenciales	59.657	36	72	14	27	28	19	19	63	81	82	34	20	495	-2	60.150	72	149	201	480	258	382	378	312	262	99	219	192	3.004
No Residenciales	23.486	22	21	25	11	12	12	14	23	25	26	16	26	233	-95	23.624	38	59	77	149	112	154	165	178	101	79	79	64	1.255
Total Región Sureste	**83.143**	**58**	**93**	**39**	**38**	**40**	**31**	**33**	**86**	**106**	**108**	**50**	**46**	**728**	**-97**	**83.774**	**110**	**208**	**278**	**629**	**370**	**536**	**543**	**490**	**363**	**178**	**298**	**256**	**4.259**
Total Concesión	**682.161**	**3.352**	**4.569**	**1.003**	**1.692**	**2.158**	**5.073**	**2.352**	**4.847**	**3.646**	**10.181**	**9.266**	**9.665**	**57.804**	**-1.078**	**738.887**	**3.278**	**3.855**	**2.290**	**2.799**	**2.723**	**3.424**	**4.338**	**4.371**	**4.851**	**6.834**	**4.156**	**3.799**	**46.718**

FORMATO N° 331

HISTOGRAMAS DE CONSUMO
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DEL AÑO 2025
RESIDENCIAL I - CÓDIGO DE SERVICIO 01 (AGUA)
Consumo del último año - Bimestralizado

HISTOGRAMA DE CONSUMO (c)	VARIABLE	Total
0 <= c <= 10 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	6.558 11.368,87 6.674 109.292.923
10 < c <= 20 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	1.704 25.441,90 1.747 24.039.019
20 < c <= 30 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	1.409 35.075,40 1.446 20.542.929
30 < c <= 42 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	1.272 45.500,10 1.320 19.741.421
42 < c <= 60 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	1.256 63.033,40 1.327 28.915.060
60 < c <= 100 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	1.191 90.953,07 1.288 22.830.132
100 < c <= 200 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	736 101.253,93 843 17.295.055
c > 200 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	474 809.008,10 569 571.692.301
Total	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	14.600 1.181.634,77 15.214 814.348.841

(1) Es la suma de los cargos variables que se hubiesen facturado a los usuarios (medidos) en el caso de continuar en el régimen no medido.

FORMATO N° 332

HISTOGRAMAS DE CONSUMO
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DEL AÑO 2025
RESIDENCIAL I - CÓDIGO DE SERVICIO 05 (AGUA y CLOACA)
Consumo del último año - Bimestralizado

HISTOGRAMA DE CONSUMO (c)	VARIABLE	Total
0 <= c <= 10 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	98.295 322.550,17 100.251 3.738.392.903
10 < c <= 20 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	75.568 1.147.667,35 77.136 2.818.803.435
20 < c <= 30 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	73.746 1.840.365,75 75.604 2.968.839.594
30 < c <= 42 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	69.257 2.472.125,70 71.537 3.156.481.196
42 < c <= 60 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	63.452 3.180.885,95 66.512 3.275.917.003
60 < c <= 100 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	56.087 4.259.969,85 60.285 3.597.052.166
100 < c <= 200 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	30.674 4.162.450,03 34.220 2.893.484.469
c > 200 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	18.362 9.163.819,20 21.904 10.769.779.512
Total	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	485.441 26.549.834,00 507.449 33.218.750.277

(1) Es la suma de los cargos variables que se hubiesen facturado a los usuarios (medidos) en el caso de continuar en el régimen no medido.

FORMATO Nº 333

HISTOGRAMAS DE CONSUMO
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DEL AÑO 2025
RESIDENCIAL I - CÓDIGO DE SERVICIO 08 (AGUA y CLOACA)
Consumo del último año - Bimestralizado

HISTOGRAMA DE CONSUMO (c)	VARIABLE	Total
0 <= c <= 10 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	495 1.236,37 586 49.554.554
10 < c <= 20 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	266 4.149,38 315 23.724.334
20 < c <= 30 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	310 7.770,07 368 33.952.403
30 < c <= 42 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	304 10.949,43 357 25.085.059
42 < c <= 60 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	340 17.177,27 411 28.600.593
60 < c <= 100 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	402 31.230,60 518 45.425.402
100 < c <= 200 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	435 61.905,10 621 75.974.996
c > 200 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	739 474.707,13 1.158 812.640.093
Total	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	3.291 609.125,35 4.334 1.094.957.433

(1) Es la suma de los cargos variables que se hubiesen facturado a los usuarios (medidos) en el caso de continuar en el régimen no medido.

FORMATO N° 334

HISTOGRAMAS DE CONSUMO
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DEL AÑO 2025
NO RESIDENCIAL I - CÓDIGO DE SERVICIO 01 (AGUA)
Consumo del último año - Bimestralizado

HISTOGRAMA DE CONSUMO (c)	VARIABLE	Total
0 <= c <= 10 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	3.212 7.193,00 3.348 499.103.955
10 < c <= 20 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	815 12.113,33 844 80.422.660
20 < c <= 30 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	567 14.124,00 597 61.925.835
30 < c <= 42 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	479 17.106,33 538 98.640.878
42 < c <= 60 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	509 25.816,00 559 73.739.213
60 < c <= 100 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	565 44.909,17 615 88.167.209
100 < c <= 200 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	502 70.005,00 576 144.149.675
200 < c <= 500 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	415 130.261,33 534 170.895.929
500 < c <= 1000 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	172 122.007,33 257 152.728.159
1000 < c <= 2000 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	67 91.487,83 94 166.769.093
c > 2000 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	45 427.305,83 99 333.113.020
Total	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	7.348 962.329,17 8.061 1.869.655.627

(1) Es la suma de los cargos variables que se hubiesen facturado a los usuarios (medidos) en el caso de continuar en el régimen no medido.

FORMATO N° 335

HISTOGRAMAS DE CONSUMO
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DEL AÑO 2025
NO RESIDENCIAL I - CÓDIGO DE SERVICIO 05 (AGUA Y CLOACA)
Consumo del último año - Bimestralizado

HISTOGRAMA DE CONSUMO (c)	VARIABLE	Total
0 <= c <= 10 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	42.425 105.271,83 44.948 9.388.814.610
10 < c <= 20 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	13.039 193.047,33 14.038 2.677.818.299
20 < c <= 30 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	8.956 222.687,67 9.868 2.099.769.339
30 < c <= 42 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	7.602 272.479,83 8.454 1.893.766.568
42 < c <= 60 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	7.822 394.909,83 8.913 2.221.478.789
60 < c <= 100 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	9.305 724.556,50 10.965 3.209.249.347
100 < c <= 200 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	9.346 1.315.502,67 11.549 4.136.783.591
200 < c <= 500 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	7.218 2.247.772,83 10.079 5.304.653.439
500 < c <= 1000 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	2.649 1.814.501,00 4.538 4.033.300.719
1000 < c <= 2000 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	1.120 1.537.632,50 2.626 3.686.035.116
c > 2000 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	704 4.797.580,17 2.577 9.950.475.544
Total	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	110.186 13.625.942,17 128.555 48.602.145.361

(1) Es la suma de los cargos variables que se hubiesen facturado a los usuarios (medidos) en el caso de continuar en el régimen no medido.

FORMATO N° 336

HISTOGRAMAS DE CONSUMO
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DEL AÑO 2025
NO RESIDENCIAL I - CÓDIGO DE SERVICIO 08 (AGUA Y CLOACA)
Consumo del último año - Bimestralizado

HISTOGRAMA DE CONSUMO (c)	VARIABLE	Total
0 <= c <= 10 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	2.403 5.066,83 2.902 1.462.188.797
10 < c <= 20 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	755 11.191,17 945 381.641.268
20 < c <= 30 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	561 14.051,00 732 304.144.751
30 < c <= 42 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	486 17.391,67 645 325.328.358
42 < c <= 60 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	536 27.237,83 719 347.811.337
60 < c <= 100 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	825 64.594,67 1.151 649.694.469
100 < c <= 200 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	1.041 149.947,67 1.540 1.062.789.493
200 < c <= 500 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	1.237 398.904,67 2.096 1.876.535.753
500 < c <= 1000 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	642 449.368,67 1.160 1.580.642.660
1000 < c <= 2000 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	339 466.715,00 857 1.842.431.996
c > 2000 m3	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	167 971.107,33 683 2.991.230.427
Total	Unid. Func. Consumo Total (m3) Conex. Medidas Cargo Variable ($) (1)	8.992 2.575.576,50 13.430 12.824.439.309

(1) Es la suma de los cargos variables que se hubiesen facturado a los usuarios (medidos) en el caso de continuar en el régimen no medido.

FORMATO N° 337

PERDIDA DE CUOTA FIJA 2025

MES	Cant. unidades (1)	Suma CV (2)
202501	7.811	220.224.259
202502	4.887	166.318.173
202503	4.589	148.419.374
202504	4.575	128.468.864
202505	7.945	174.087.450
202506	5.548	142.300.638
202507	11.211	260.150.997
202508	8.449	213.699.467
202509	17.784	345.284.806
202510	22.035	595.214.307
202511	17.443	477.871.506
202512	53	2.040.319
Total	**112.330**	**2.874.080.162**

(1) Corresponde a la cantidad de unidades (funcionales y complementarias) que pasaron al ré
(2) Es la suma de los cargos variables no medidos por 30 días de servicio que se le facturaron

gimen medido y generaban un cargo variable (no medido) que se dejó de facturar.
por última vez a los usuarios que pasaron al régimen medido en cada uno de esos meses (al coefic

iente K correspondiente a aquel mes).

21.3. Aspectos vinculados con la incorporación de nuevos usuarios

FORMATO N° 350

EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS
UNIDADES FUNCIONALES

Distrito		Cod. Serv.	diciembre-24	diciembre-25	Diferencia
Capital Federal	Residencial	**Agua y Cloaca (1)**	1.307.089	1.312.022	**4.933**
		Agua	20	17	**-3**
		Cloaca	0	0	**0**
	No Residencial	**Agua y Cloaca (2)**	176.516	175.615	**-901**
		Agua	392	403	**11**
		Cloaca	0	0	**0**
	Total	**Agua y Cloaca**	**1.483.605**	**1.487.637**	**4.032**
		Agua	**412**	**420**	**8**
		Cloaca	**0**	**0**	**0**
Alte. Brown	Residencial	**Agua y Cloaca**	52.596	53.132	**536**
		Agua	25.770	25.743	**-27**
		Cloaca	21.116	21.867	**751**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	3.361	3.395	**34**
		Agua	1.616	1.668	**52**
		Cloaca	558	599	**41**
	Total	**Agua y Cloaca**	**55.957**	**56.527**	**570**
		Agua	**27.386**	**27.411**	**25**
		Cloaca	**21.674**	**22.466**	**792**
Avellaneda	Residencial	**Agua y Cloaca**	90.575	90.911	**336**
		Agua	9.076	9.000	**-76**
		Cloaca	123	79	**-44**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	11.486	11.527	**41**
		Agua	950	925	**-25**
		Cloaca	1	0	**-1**
	Total	**Agua y Cloaca**	**102.061**	**102.438**	**377**
		Agua	**10.026**	**9.925**	**-101**
		Cloaca	**124**	**79**	**-45**
Lanus	Residencial	**Agua y Cloaca**	90.157	94.854	**4.697**
		Agua	34.088	30.560	**-3.528**
		Cloaca	1.313	305	**-1.008**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	9.576	9.824	**248**
		Agua	3.019	2.882	**-137**
		Cloaca	72	12	**-60**
	Total	**Agua y Cloaca**	**99.733**	**104.678**	**4.945**
		Agua	**37.107**	**33.442**	**-3.665**
		Cloaca	**1.385**	**317**	**-1.068**
Lomas de Zamora	Residencial	**Agua y Cloaca**	97.816	97.838	**22**
		Agua	73.158	73.104	**-54**
		Cloaca	3.462	3.464	**2**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	8.255	8.297	**42**
		Agua	3.259	3.280	**21**
		Cloaca	109	109	**0**
	Total	**Agua y Cloaca**	**106.071**	**106.135**	**64**
		Agua	**76.417**	**76.384**	**-33**
		Cloaca	**3.571**	**3.573**	**2**
	Residencial	**Agua y Cloaca**	132.504	133.109	**605**
		Agua	10.896	10.398	**-498**
		Cloaca	38.840	38.856	**16**

EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS
UNIDADES FUNCIONALES

Distrito		Cod. Serv.	diciembre-24	diciembre-25	Diferencia
Morón (3)	No Residencial	**Agua y Cloaca**	10.545	10.590	**45**
		Agua	521	514	**-7**
		Cloaca	2.134	2.169	**35**
	Total	**Agua y Cloaca**	**143.049**	**143.699**	**650**
		Agua	**11.417**	**10.912**	**-505**
		Cloaca	**40.974**	**41.025**	**51**
San Fernando	Residencial	**Agua y Cloaca**	34.959	35.061	**102**
		Agua	862	862	**0**
		Cloaca	90	90	**0**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	3.796	3.856	**60**
		Agua	309	233	**-76**
		Cloaca	38	37	**-1**
	Total	**Agua y Cloaca**	**38.755**	**38.917**	**162**
		Agua	**1.171**	**1.095**	**-76**
		Cloaca	**128**	**127**	**-1**
San Isidro	Residencial	**Agua y Cloaca**	91.440	91.593	**153**
		Agua	1.043	1.013	**-30**
		Cloaca	44	46	**2**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	8.942	8.938	**-4**
		Agua	135	134	**-1**
		Cloaca	9	9	**0**
	Total	**Agua y Cloaca**	**100.382**	**100.531**	**149**
		Agua	**1.178**	**1.147**	**-31**
		Cloaca	**53**	**55**	**2**
Ezeiza	Residencial	**Agua y Cloaca**	14.770	14.762	**-8**
		Agua	20.614	20.595	**-19**
		Cloaca	6.804	6.801	**-3**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	989	1.006	**17**
		Agua	497	531	**34**
		Cloaca	392	399	**7**
	Total	**Agua y Cloaca**	**15.759**	**15.768**	**9**
		Agua	**21.111**	**21.126**	**15**
		Cloaca	**7.196**	**7.200**	**4**
Tigre	Residencial	**Agua y Cloaca**	44.950	50.427	**5.477**
		Agua	37.962	34.571	**-3.391**
		Cloaca	5.183	4.727	**-456**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	3.534	3.842	**308**
		Agua	2.196	2.162	**-34**
		Cloaca	460	443	**-17**
	Total	**Agua y Cloaca**	**48.484**	**54.269**	**5.785**
		Agua	**40.158**	**36.733**	**-3.425**
		Cloaca	**5.643**	**5.170**	**-473**
Vicente López	Residencial	**Agua y Cloaca**	101.345	101.442	**97**
		Agua	272	274	**2**
		Cloaca	17	15	**-2**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	9.398	9.390	**-8**
		Agua	169	168	**-1**
		Cloaca	16	15	**-1**
	Total	**Agua y Cloaca**	**110.743**	**110.832**	**89**
		Agua	**441**	**442**	**1**
		Cloaca	**33**	**30**	**-3**
	Residencial	**Agua y Cloaca**	92.716	92.741	**25**
		Agua	16.286	16.277	**-9**

EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS
UNIDADES FUNCIONALES

Distrito		Cod. Serv.	diciembre-24	diciembre-25	Diferencia
San Martín	No Residencial	**Cloaca**	1.657	1.661	**4**
		Agua y Cloaca	12.743	12.815	**72**
		Agua	1.200	1.221	**21**
		Cloaca	46	50	**4**
	Total	**Agua y Cloaca**	**105.459**	**105.556**	**97**
		Agua	**17.486**	**17.498**	**12**
		Cloaca	**1.703**	**1.711**	**8**
La Matanza Norte	Residencial	**Agua y Cloaca**	144.834	145.416	**582**
		Agua	13.243	12.764	**-479**
		Cloaca	1.620	1.764	**144**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	15.543	15.553	**10**
		Agua	719	714	**-5**
		Cloaca	70	75	**5**
	Total	**Agua y Cloaca**	**160.377**	**160.969**	**592**
		Agua	**13.962**	**13.478**	**-484**
		Cloaca	**1.690**	**1.839**	**149**
Tres de Febrero	Residencial	**Agua y Cloaca**	93.690	93.694	**4**
		Agua	1.513	1.513	**0**
		Cloaca	269	268	**-1**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	10.528	10.614	**86**
		Agua	100	100	**0**
		Cloaca	23	23	**0**
	Total	**Agua y Cloaca**	**104.218**	**104.308**	**90**
		Agua	**1.613**	**1.613**	**0**
		Cloaca	**292**	**291**	**-1**
La Matanza Oeste	Residencial	**Agua y Cloaca**	175	175	**0**
		Agua	105.740	106.132	**392**
		Cloaca	0	0	**0**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	11	11	**0**
		Agua	3.099	3.165	**66**
		Cloaca	0	0	**0**
	Total	**Agua y Cloaca**	**186**	**186**	**0**
		Agua	**108.839**	**109.297**	**458**
		Cloaca	**0**	**0**	**0**
E. Echeverría	Residencial	**Agua y Cloaca**	34.323	34.477	**154**
		Agua	19.009	18.806	**-203**
		Cloaca	25.990	26.062	**72**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	2.574	2.621	**47**
		Agua	1.051	1.092	**41**
		Cloaca	1.244	1.268	**24**
	Total	**Agua y Cloaca**	**36.897**	**37.098**	**201**
		Agua	**20.060**	**19.898**	**-162**
		Cloaca	**27.234**	**27.330**	**96**
La Matanza Sur	Residencial	**Agua y Cloaca**	76.342	76.441	**99**
		Agua	2.158	2.338	**180**
		Cloaca	585	585	**0**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	4.418	4.419	**1**
		Agua	97	103	**6**
		Cloaca	10	10	**0**
	Total	**Agua y Cloaca**	**80.760**	**80.860**	**100**
		Agua	**2.255**	**2.441**	**186**
		Cloaca	**595**	**595**	**0**
	Residencial	**Agua y Cloaca**	130.275	130.384	**109**

EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS
UNIDADES FUNCIONALES

Distrito		Cod. Serv.	diciembre-24	diciembre-25	Diferencia
Quilmes	No Residencial	**Agua**	14.681	15.103	**422**
		Cloaca	3.899	3.130	**-769**
		Agua y Cloaca	12.072	12.051	**-21**
	Total	**Agua**	838	856	**18**
		Cloaca	117	114	**-3**
		Agua y Cloaca	**142.347**	**142.435**	**88**
		Agua	**15.519**	**15.959**	**440**
		Cloaca	**4.016**	**3.244**	**-772**
Total Concesión	Residencial	**Agua y Cloaca**	2.630.556	2.648.479	**17.923**
		Agua	386.391	379.070	**-7.321**
		Cloaca	111.012	109.720	**-1.292**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	304.287	304.364	**77**
		Agua	20.167	20.151	**-16**
		Cloaca	5.299	5.332	**33**
	Total	**Agua y Cloaca**	**2.934.843**	**2.952.843**	**18.000**
		Agua	**406.558**	**399.221**	**-7.337**
		Cloaca	**116.311**	**115.052**	**-1.259**

Florencio Varela	Residencial	**Agua y Cloaca**	48.082	48.019	**-63**
		Agua	41.393	42.236	**843**
		Cloaca	2.358	2.381	**23**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	2.405	2.458	**53**
		Agua	1.093	1.188	**95**
		Cloaca	50	54	**4**
	Total	**Agua y Cloaca**	**50.487**	**50.477**	**-10**
		Agua	**42.486**	**43.424**	**938**
		Cloaca	**2.408**	**2.435**	**27**
Merlo	Residencial	**Agua y Cloaca**	25.870	26.152	**282**
		Agua	46.483	46.598	**115**
		Cloaca	12.624	12.788	**164**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	2.074	2.070	**-4**
		Agua	1.603	1.609	**6**
		Cloaca	451	487	**36**
	Total	**Agua y Cloaca**	**27.944**	**28.222**	**278**
		Agua	**48.086**	**48.207**	**121**
		Cloaca	**13.075**	**13.275**	**200**
Moreno	Residencial	**Agua y Cloaca**	36.721	38.675	**1.954**
		Agua	16.666	15.160	**-1.506**
		Cloaca	10.245	11.134	**889**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	2.782	2.920	**138**
		Agua	1.042	900	**-142**
		Cloaca	273	295	**22**
	Total	**Agua y Cloaca**	**39.503**	**41.595**	**2.092**
		Agua	**17.708**	**16.060**	**-1.648**
		Cloaca	**10.518**	**11.429**	**911**
Presidente Perón	Residencial	**Agua y Cloaca**	12.940	13.067	**127**
		Agua	8.900	8.752	**-148**
		Cloaca	1.648	1.645	**-3**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	567	600	**33**
		Agua	100	92	**-8**
		Cloaca	44	46	**2**
	Total	**Agua y Cloaca**	**13.507**	**13.667**	**160**
		Agua	**9.000**	**8.844**	**-156**

EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS
UNIDADES FUNCIONALES

Distrito		Cod. Serv.	diciembre-24	diciembre-25	Diferencia
		Cloaca	**1.692**	**1.691**	**-1**
San Miguel	Residencial	**Agua y Cloaca**	24.018	24.124	**106**
		Agua	12.311	12.270	**-41**
		Cloaca	28.727	29.685	**958**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	2.760	2.758	**-2**
		Agua	502	502	**0**
		Cloaca	1.189	1.248	**59**
	Total	**Agua y Cloaca**	**26.778**	**26.882**	**104**
		Agua	**12.813**	**12.772**	**-41**
		Cloaca	**29.916**	**30.933**	**1.017**
José C. Paz	Residencial	**Agua y Cloaca**	0	0	**0**
		Agua	5.322	5.356	**34**
		Cloaca	0	0	**0**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	0	0	**0**
		Agua	216	224	**8**
		Cloaca	0	0	**0**
	Total	**Agua y Cloaca**	**0**	**0**	**0**
		Agua	**5.538**	**5.580**	**42**
		Cloaca	**0**	**0**	**0**
Malvinas Argentinas	Residencial	**Agua y Cloaca**	0	0	**0**
		Agua	9.683	9.642	**-41**
		Cloaca	0	0	**0**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	0	0	**0**
		Agua	292	294	**2**
		Cloaca	0	0	**0**
	Total	**Agua y Cloaca**	**0**	**0**	**0**
		Agua	**9.975**	**9.936**	**-39**
		Cloaca	**0**	**0**	**0**
Pilar	Residencial	**Agua y Cloaca**	10.393	11.975	**1.582**
		Agua	14.858	15.313	**455**
		Cloaca	207	470	**263**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	1.164	1.187	**23**
		Agua	324	374	**50**
		Cloaca	21	34	**13**
	Total	**Agua y Cloaca**	**11.557**	**13.162**	**1.605**
		Agua	**15.182**	**15.687**	**505**
		Cloaca	**228**	**504**	**276**
Escobar	Residencial	**Agua y Cloaca**	10.977	11.887	**910**
		Agua	8.953	10.494	**1.541**
		Cloaca	2.238	659	**-1.579**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	1.233	1.306	**73**
		Agua	385	480	**95**
		Cloaca	48	29	**-19**
	Total	**Agua y Cloaca**	**12.210**	**13.193**	**983**
		Agua	**9.338**	**10.974**	**1.636**
		Cloaca	**2.286**	**688**	**-1.598**
Nuevas Areas	Residencial	**Agua y Cloaca**	169.001	173.899	**4.898**
		Agua	164.569	165.821	**1.252**
		Cloaca	58.047	58.762	**715**
	No Residencial	**Agua y Cloaca**	12.985	13.299	**314**
		Agua	5.557	5.663	**106**
		Cloaca	2.076	2.193	**117**
		Agua y Cloaca	**181.986**	**187.198**	**5.212**

EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS
UNIDADES FUNCIONALES

Distrito		Cod. Serv.	diciembre-24	diciembre-25	Diferencia
	Total	**Agua** **Cloaca**	**170.126** **60.123**	**171.484** **60.955**	**1.358** **832**

(1) Usuarios residenciales con servicio de radio antiguo:
2024: 273.466
2025: 274.002
(2) Usuarios no residenciales con servicio de radio antiguo:
2024: 86.826
2025: 86.305
(3) Distrito Morón incluye a los Partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

FORMATO N° 360

TOTAL RECAUDADO ABIERTO POR ENTIDAD RECAUDADORA

ENTIDADES RECAUDADORAS	Recaudacion entre el 01/01/25 y el 31/12/2025		
	CASOS (1)	IMPORTE ($)	PORCENTUAL (s/Importe)
1. Bancos	**10.941**	**15.635.674.647**	**1,06%**
2. Debito Automatico	**3.691.146**	**283.360.764.338**	**19,15%**
3. AySA	**106.250**	**43.609.479.344**	**2,95%**
Oficinas Comerciales	17.984	31.505.541.021	2,13%
Tarjetas de Crédito	88.266	12.103.938.322	0,82%
4. Entidades No Bancarias	**7.021.532**	**233.083.226.253**	**15,75%**
5. Redes, Internet, IVR y Pago Online	**18.766.907**	**830.631.615.225**	**56,13%**
6. Telecobranzas y Pagophone			**0,00%**
7. Interdepositos Fiscales (2)	**0**	**72.531.037.306**	**4,90%**
8. Colegio de Escribanos (2)	**0**	**1.334.840.022**	**0,09%**
9. Reversiones de tarjeta de crédito	**0**	**-386.604.805**	**-0,03%**
T O T A L	**29.596.776**	**1.479.800.032.329**	**100,00%**

(1) Son la cantidad de documentos abonados a través de dicha entidad recaudadora durante el año calendario.

FORMATO N° 361

RITMO DE RECAUDACION
EMISION DICIEMBRE 2021 (1)

Clase	Concepto	Total facturado por servicios Mes de emisión dic-21		Total																									
		Diciembre 24		Enero 25		Febrero 25		Marzo 25		Abril 25		Mayo 25		Junio 25		Julio 25		Agosto 25		Septiembre 25		Octubre 25		Noviembre 25		Diciembre 25		TOTAL	
		Casos (2)	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe
	Residencial I	1.702.205	1.026.983.251	3.141	1.855.829	2.324	1.504.146	1.341	956.971	1.506	972.875	1.808	1.102.374	1.352	914.817	1.242	811.613	1.914	1.246.237	1.881	1.233.137	1.791	1.136.625	2.227	1.028.612	1.464	907.704	1.311	951.020	**23.302**	**14.621.962**
CATEGORIA	- Usuarios Privados	1.701.912	1.024.979.560	3.137	1.837.337	2.316	1.455.406	1.340	953.977	1.505	972.153	1.808	1.102.374	1.350	915.592	1.239	798.502	1.913	1.244.530	1.880	1.233.699	1.790	1.136.598	2.226	1.029.395	1.463	908.472	1.311	951.020	**23.278**	**14.539.054**
	- Usuarios Fiscales	293	2.003.692	4	18.492	8	48.739	1	2.995	1	722	0	0	2	-774	3	13.111	1	1.707	1	-561	1	28	1	-783	1	-768	0	0	**24**	**82.908**
	Residencial II	1.602.429	673.816.073	1.002	541.724	735	354.843	447	246.502	471	258.906	565	278.196	523	255.094	428	221.670	696	331.402	667	371.873	609	307.607	774	247.578	416	201.248	436	239.215	**7.769**	**3.855.859**
	- Usuarios Privados	1.602.201	673.638.144	1.002	541.724	735	354.843	446	240.997	471	258.906	565	278.196	523	255.094	427	220.903	696	331.402	667	371.873	609	307.607	771	251.670	415	202.650	436	239.215	**7.763**	**3.855.080**
Y	- Usuarios Fiscales	228	177.929	0	0	0	0	1	5.506	0	0	0	0	0	0	1	768	0	0	0	0	0	0	3	-4.092	1	-1.402	0	0	**6**	**779**
	No Residencial I	328.738	627.612.053	392	612.501	339	413.247	253	375.116	264	368.228	283	498.903	274	390.248	267	642.716	294	493.280	406	574.624	485	932.557	430	680.933	333	547.049	248	1.228.567	**4.268**	**7.757.968**
	- Usuarios Privados	326.046	594.018.834	380	681.769	331	364.439	251	355.485	260	385.569	282	498.716	274	390.248	239	414.792	293	490.806	405	574.122	478	726.831	418	584.214	328	540.861	233	708.615	**4.172**	**6.716.468**
	- Usuarios Fiscales	2.692	33.593.219	12	-69.268	8	48.808	2	19.630	4	-17.341	1	187	0	0	28	227.924	1	2.473	1	503	7	205.726	12	96.719	5	6.187	15	519.952	**96**	**1.041.500**
TIPO	No Residencial II	261.160	167.021.843	232	153.232	128	74.857	103	101.660	106	72.383	125	119.731	133	107.726	96	83.333	118	108.475	227	199.586	190	226.733	226	242.750	150	147.546	142	203.626	**1.976**	**1.841.637**
	- Usuarios Privados	260.996	166.222.766	232	153.232	128	74.857	103	101.660	106	72.383	125	119.731	133	107.726	96	83.333	118	108.475	227	199.586	190	226.733	226	242.750	150	147.546	142	203.626	**1.976**	**1.841.637**
	- Usuarios Fiscales	164	799.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
DE	Baldio	94.704	31.047.689	111	47.457	106	61.240	77	39.138	65	17.941	88	25.532	74	31.236	83	40.118	113	69.209	121	99.643	71	24.316	93	28.905	68	45.014	92	81.921	**1.162**	**611.670**
	- Usuarios Privados	94.473	30.537.139	110	47.262	104	42.173	76	38.632	64	16.653	88	25.532	74	31.236	80	36.417	113	69.209	121	99.643	70	24.218	93	28.905	66	38.555	90	81.272	**1.149**	**579.708**
	- Usuarios Fiscales	231	510.550	1	195	2	19.066	1	506	1	1.288	0	0	0	0	3	3.701	0	0	0	0	1	98	0	0	2	6.458	2	649	**13**	**31.961**
	Eventual	138	9.611.044	0	0	0	0	0	0	2	121.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**121.817**
USUARIO	- Usuarios Privados	138	9.611.044	0	0	0	0	0	0	2	121.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**121.817**
	- Usuarios Fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Total	**3.989.374**	**2.536.091.952**	**4.878**	**3.210.743**	**3.632**	**2.408.332**	**2.221**	**1.719.387**	**2.414**	**1.812.150**	**2.869**	**2.024.736**	**2.356**	**1.699.122**	**2.116**	**1.799.450**	**3.135**	**2.248.602**	**3.302**	**2.478.863**	**3.146**	**2.627.838**	**3.750**	**2.228.778**	**2.431**	**1.848.561**	**2.229**	**2.704.349**	**38.479**	**28.810.912**

(1) Se presenta el ritmo de recaudación de la emisión exclusivamente hecha en diciembre 2021.
(2) Son la cantidad de documentos.

FORMATO N° 361

RITMO DE RECAUDACION
EMISION DICIEMBRE 2022 (1)

Clase	Concepto	Total facturado por servicios Mes de emisión dic-22		TOTAL																							
				Diciembre 24		Enero 25		Febrero 25		Marzo 25		Abril 25		Mayo 25		Junio 25		Julio 25		Agosto 25		Septiembre 25		Octubre 25		Noviembre 25		Diciembre 25		TOTAL	
		Casos (2)	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe
	Residencial I	2.093.780	2.800.646.763	4.791	6.107.630	3.697	4.894.156	2.192	3.011.173	2.273	3.284.435	2.671	3.300.298	2.123	2.932.116	1.996	2.727.891	3.081	4.082.676	2.735	3.585.431	2.690	3.547.356	3.744	3.127.529	2.278	3.166.651	1.898	2.531.870	**36.169**	**46.299.212**
CATEGORIA	- Usuarios Privados	2.092.631	2.791.287.751	4.788	6.103.112	3.686	4.466.460	2.189	2.897.932	2.267	3.095.976	2.669	3.293.691	2.120	2.883.590	1.988	2.554.614	3.079	4.062.451	2.734	3.582.088	2.689	3.545.843	3.743	3.123.084	2.277	3.166.258	1.898	2.531.870	**36.127**	**45.306.969**
	- Usuarios Fiscales	1.149	9.359.012	3	4.518	11	427.697	3	113.241	6	188.459	2	6.607	3	48.525	8	173.277	2	20.225	1	3.343	1	1.513	1	4.445	1	393	0	0	**42**	**992.243**
	Residencial II	1.979.901	2.366.464.199	1.633	2.387.862	1.306	1.953.126	836	1.439.404	810	1.255.863	987	1.417.463	853	1.174.314	751	1.447.641	1.083	1.715.754	1.054	1.687.570	950	1.349.926	1.344	1.346.444	763	1.186.019	650	1.330.239	**13.020**	**19.691.623**
	- Usuarios Privados	1.979.630	2.365.945.740	1.633	2.387.862	1.306	1.953.126	835	1.435.188	810	1.255.863	987	1.417.463	853	1.174.314	750	1.445.634	1.083	1.715.754	1.054	1.687.570	949	1.348.092	1.344	1.346.444	761	1.180.456	650	1.330.239	**13.015**	**19.678.004**
Y	- Usuarios Fiscales	271	518.459	0	0	0	0	1	4.216	0	0	0	0	0	0	1	2.007	0	0	0	0	1	1.833	0	0	2	5.563	0	0	**5**	**13.620**
	No Residencial I	409.421	1.559.013.401	642	1.496.274	579	1.379.032	452	1.158.211	479	1.463.713	481	1.448.449	416	1.174.388	457	1.962.010	428	1.581.540	590	1.506.604	666	1.853.053	660	1.723.571	463	1.023.088	414	2.771.921	**6.727**	**20.541.854**
	- Usuarios Privados	406.879	1.472.437.756	630	1.335.114	568	1.266.516	449	1.136.416	476	1.461.092	476	1.452.690	410	911.908	404	1.066.948	427	1.565.846	587	1.494.720	666	1.853.053	648	1.436.509	452	984.165	400	2.265.787	**6.593**	**18.230.764**
	- Usuarios Fiscales	2.542	86.575.645	12	161.159	11	112.516	3	21.795	3	2.621	5	-4.242	6	262.480	53	895.062	1	15.693	3	11.884	0	0	12	287.062	11	38.923	14	506.135	**134**	**2.311.089**
TIPO	No Residencial II	318.770	492.634.791	389	778.043	256	337.491	243	449.774	207	356.921	235	458.831	255	418.536	223	455.761	262	437.976	337	772.954	303	863.633	382	805.644	234	549.884	248	590.370	**3.574**	**7.275.817**
	- Usuarios Privados	318.523	489.899.668	386	695.488	256	337.491	243	449.774	207	356.921	235	458.831	255	418.536	223	455.761	262	437.976	337	772.954	303	863.633	382	805.644	234	549.884	248	590.370	**3.571**	**7.193.262**
	- Usuarios Fiscales	247	2.735.123	3	82.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**82.555**
DE	Baldio	109.310	88.738.998	182	218.411	161	183.798	119	133.984	120	109.889	148	103.805	118	101.738	164	141.127	168	324.595	146	152.109	144	104.550	136	120.126	112	125.495	121	164.931	**1.839**	**1.984.557**
	- Usuarios Privados	108.968	87.726.623	181	217.961	159	151.630	117	130.873	119	106.618	148	103.805	116	99.573	124	113.206	168	324.595	146	152.109	144	104.550	135	119.074	109	106.758	119	160.453	**1.785**	**1.891.205**
	- Usuarios Fiscales	342	1.012.375	1	450	2	32.168	2	3.111	1	3.271	0	0	2	2.165	40	27.921	0	0	0	0	0	0	1	1.052	3	18.737	2	4.478	**54**	**93.352**
	Eventual	290	29.884.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
USUARIO	- Usuarios Privados	290	29.884.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	- Usuarios Fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Total	**4.911.472**	**7.337.382.901**	**7.637**	**10.988.220**	**5.999**	**8.747.603**	**3.842**	**6.192.546**	**3.889**	**6.470.821**	**4.522**	**6.728.845**	**3.765**	**5.801.091**	**3.591**	**6.734.430**	**5.022**	**8.142.540**	**4.862**	**7.704.667**	**4.753**	**7.718.519**	**6.266**	**7.123.313**	**3.850**	**6.051.137**	**3.331**	**7.389.330**	**61.329**	**95.793.063**

(1) Se presenta el ritmo de recaudación de la emisión exclusivamente hecha en diciembre 2022.
(2) Son la cantidad de documentos.

FORMATO N° 361

RITMO DE RECAUDACION
EMISION DICIEMBRE 2023 (1)

Clase	Concepto	Total facturado por servicios Mes de emisión dic-23		TOTAL																							
		Diciembre 24		Enero 25		Febrero 25		Marzo 25		Abril 25		Mayo 25		Junio 25		Julio 25		Agosto 25		Septiembre 25		Octubre 25		Noviembre 25		Diciembre 25		TOTAL	
		Casos (2)	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe
	Residencial I	2.203.646	10.734.576.662	8.575	40.418.121	7.005	42.137.988	4.188	27.278.996	4.268	21.748.697	4.362	20.812.849	3.472	17.770.025	3.307	18.987.179	4.623	23.076.003	3.989	20.984.779	3.923	19.900.519	6.478	15.873.554	3.524	14.121.243	2.729	14.631.925	**60.443**	**297.741.877**
CATEGORIA	- Usuarios Privados	2.202.635	10.714.467.908	8.569	40.397.458	6.996	40.735.568	4.185	27.158.986	4.263	21.456.561	4.360	20.741.751	3.468	17.276.829	3.298	18.463.437	4.621	23.011.075	3.985	20.868.801	3.922	19.897.512	6.476	15.862.120	3.520	14.142.882	2.728	14.630.097	**60.391**	**294.643.077**
	- Usuarios Fiscales	1.011	20.108.754	6	20.663	9	1.402.420	3	120.010	5	292.135	2	71.098	4	493.196	9	523.742	2	64.929	4	115.979	1	3.007	2	11.434	4	-21.640	1	1.828	**52**	**3.098.801**
	Residencial II	2.081.506	8.066.888.579	3.557	21.855.402	2.891	19.742.101	1.974	14.091.026	1.920	12.393.397	1.820	12.764.146	1.623	10.486.035	1.455	7.376.160	1.828	9.622.161	1.685	9.557.087	1.573	7.744.789	2.431	7.563.267	1.352	5.775.296	1.159	7.642.725	**25.268**	**146.613.593**
	- Usuarios Privados	2.081.290	8.065.680.214	3.557	21.855.402	2.886	19.751.129	1.973	14.080.586	1.920	12.393.397	1.820	12.764.146	1.623	10.486.035	1.454	7.368.652	1.828	9.622.161	1.684	9.556.191	1.569	7.730.980	2.420	7.617.364	1.349	5.763.857	1.159	7.642.725	**25.242**	**146.632.627**
Y	- Usuarios Fiscales	216	1.208.365	0	0	5	-9.028	1	10.439	0	0	0	0	0	0	1	7.508	0	0	1	896	4	13.809	11	-54.098	3	11.439	0	0	**26**	**-19.034**
	No Residencial I	405.143	6.334.363.814	1.316	14.132.906	1.127	14.349.158	908	9.559.609	896	11.886.303	803	11.850.158	751	8.792.730	740	7.726.035	771	14.034.440	855	30.958.147	971	13.465.454	923	8.439.716	625	5.709.095	626	13.263.178	**11.312**	**164.166.928**
	- Usuarios Privados	402.589	6.026.723.403	1.305	13.480.088	1.101	12.539.813	903	9.494.809	892	11.863.916	800	11.822.390	749	8.378.428	672	7.128.272	771	14.034.440	850	30.696.265	967	12.297.534	916	8.528.884	614	5.657.429	616	12.352.059	**11.156**	**158.274.327**
	- Usuarios Fiscales	2.554	307.640.411	11	652.817	26	1.809.345	5	64.800	4	22.387	3	27.767	2	414.302	68	597.763	0	0	5	261.882	4	1.167.920	7	-89.169	11	51.667	10	911.119	**156**	**5.892.602**
TIPO	No Residencial II	328.569	1.929.367.767	731	6.136.781	552	3.396.457	432	4.679.147	423	3.521.055	438	3.071.460	471	2.919.500	388	2.488.270	415	3.492.756	465	4.004.078	411	2.767.366	483	3.303.933	360	3.159.838	339	2.869.969	**5.908**	**45.810.610**
	- Usuarios Privados	328.322	1.919.304.638	729	6.014.619	546	3.329.866	432	4.679.147	423	3.521.055	438	3.071.460	471	2.919.500	388	2.488.270	414	3.118.389	465	4.004.078	411	2.767.366	483	3.303.933	360	3.159.838	339	2.869.969	**5.899**	**45.247.491**
	- Usuarios Fiscales	247	10.063.128	2	122.162	6	66.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	374.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	**563.119**
DE	Baldio	105.453	332.194.917	326	1.233.007	272	1.696.653	186	548.482	176	612.895	219	512.135	176	627.741	199	4.500.446	233	808.538	192	704.164	222	2.075.556	293	551.958	158	468.964	197	715.272	**2.849**	**15.055.810**
	- Usuarios Privados	105.222	329.865.116	325	1.231.558	270	1.684.619	184	533.900	175	600.297	219	512.135	174	574.784	199	4.500.446	233	808.538	192	704.164	221	2.074.052	291	563.283	155	437.648	193	699.761	**2.831**	**14.925.184**
	- Usuarios Fiscales	231	2.329.802	1	1.449	2	12.034	2	14.582	1	12.598	0	0	2	52.957	0	0	0	0	0	0	1	1.504	2	-11.325	3	31.316	4	15.511	**18**	**130.627**
	Eventual	197	212.975.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
USUARIO	- Usuarios Privados	197	212.975.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	- Usuarios Fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Total	**5.124.514**	**27.610.366.893**	**14.505**	**83.776.216**	**11.847**	**81.322.357**	**7.688**	**56.157.260**	**7.683**	**50.162.347**	**7.642**	**49.010.748**	**6.493**	**40.596.031**	**6.089**	**41.078.089**	**7.870**	**51.033.898**	**7.186**	**66.208.256**	**7.100**	**45.953.685**	**10.608**	**35.732.427**	**6.019**	**29.234.436**	**5.050**	**39.123.069**	**105.780**	**669.388.819**

(1) Se presenta el ritmo de recaudación de la emisión exclusivamente hecha en diciembre 2023.
(2) Son la cantidad de documentos.

FORMATO N° 361

RITMO DE RECAUDACION
EMISION DICIEMBRE 2024 (1)

Clase	Concepto	Total facturado por servicios Mes de emisión dic-24		TOTAL																							
				Diciembre 24		Enero 25		Febrero 25		Marzo 25		Abril 25		Mayo 25		Junio 25		Julio 25		Agosto 25		Septiembre 25		Octubre 25		Noviembre 25		Diciembre 25		TOTAL	
		Casos (2)	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe	Casos	Importe
CATEGORIA Y TIPO DE USUARIO	Residencial I	2.009.577	39.056.667.425	456.424	4.021.075.627	739.138	24.187.833.811	73.661	2.061.147.841	30.149	562.172.909	23.611	543.902.291	15.422	287.022.149	11.521	222.574.365	11.488	217.870.654	8.572	158.498.488	7.488	140.161.179	12.969	131.565.849	6.698	96.831.101	4.983	114.773.284	**1.402.124**	**32.745.429.548**
	- Usuarios Privados	2.008.876	38.890.160.257	456.319	4.007.539.895	739.069	24.173.412.855	73.623	2.057.799.965	30.139	559.679.387	23.600	537.570.705	15.414	282.880.924	11.509	222.362.372	11.483	217.321.888	8.572	158.498.488	7.487	140.145.007	12.966	131.580.006	6.696	96.761.394	4.980	113.694.880	**1.401.857**	**32.699.247.764**
	- Usuarios Fiscales	701	166.507.168	105	13.535.732	69	14.420.956	38	3.347.876	10	2.493.521	11	6.331.586	8	4.141.224	12	211.993	5	548.767	0	0	1	16.172	3	-14.156	2	69.708	3	1.078.405	**267**	**46.181.784**
	Residencial II	1.768.405	26.378.498.335	300.098	2.671.744.407	558.001	19.101.638.790	48.678	1.500.721.388	20.936	443.200.485	14.786	281.841.676	9.879	180.527.121	6.567	133.818.941	5.772	110.411.199	4.241	78.756.677	3.861	83.144.596	6.104	56.265.242	3.033	50.632.325	2.213	53.865.176	**984.169**	**24.746.568.023**
	- Usuarios Privados	1.768.063	26.373.567.026	299.998	2.669.567.678	557.993	19.101.424.776	48.653	1.499.968.016	20.935	443.166.530	14.778	281.456.096	9.871	180.352.152	6.564	133.749.123	5.768	109.686.390	4.241	78.756.677	3.860	83.117.101	6.097	56.338.846	3.024	50.786.125	2.212	53.903.234	**983.994**	**24.742.272.744**
	- Usuarios Fiscales	342	4.931.309	100	2.176.729	8	214.014	25	753.372	1	33.955	8	385.580	8	174.970	3	69.818	4	724.809	0	0	1	27.495	7	-73.604	9	-153.801	1	-38.058	**175**	**4.295.280**
	No Residencial I	382.535	23.688.650.125	74.264	2.475.225.616	164.747	15.576.746.259	13.375	1.077.980.431	5.962	417.718.969	5.015	608.143.756	3.500	397.886.592	2.539	139.028.966	2.210	122.183.994	1.850	100.146.686	1.812	96.751.876	1.945	150.856.426	1.267	56.353.186	1.028	82.654.751	**279.514**	**21.301.677.510**
	- Usuarios Privados	378.286	22.115.297.254	73.864	2.336.545.187	164.164	15.129.938.296	13.087	915.435.160	5.894	369.596.654	4.767	232.890.334	3.376	170.771.625	2.276	121.333.751	2.203	121.411.876	1.844	98.736.040	1.800	92.054.188	1.916	137.879.759	1.250	55.146.601	1.013	74.055.776	**277.454**	**19.855.795.248**
	- Usuarios Fiscales	4.249	1.573.352.871	400	138.680.429	583	446.807.963	288	162.545.271	68	48.122.315	248	375.253.422	124	227.114.967	263	17.695.215	7	772.118	6	1.410.646	12	4.697.688	29	12.976.668	17	1.206.585	15	8.598.975	**2.060**	**1.445.882.262**
	No Residencial II	290.571	6.078.234.334	37.237	896.403.722	77.675	3.873.903.821	7.479	307.880.469	3.340	93.118.137	2.733	76.692.158	2.284	80.287.850	1.384	36.353.406	1.142	30.459.975	937	20.984.730	874	24.880.398	1.036	21.571.915	669	18.164.640	591	23.906.624	**137.381**	**5.504.607.846**
	- Usuarios Privados	290.079	6.032.279.896	37.163	879.216.636	77.640	3.869.697.435	7.455	299.187.539	3.340	93.118.137	2.730	74.406.956	2.265	73.949.870	1.377	33.779.322	1.142	30.459.975	936	20.690.436	872	24.859.069	1.033	22.008.573	669	18.164.640	591	23.906.624	**137.213**	**5.463.445.211**
	- Usuarios Fiscales	492	45.954.439	74	17.187.086	35	4.206.387	24	8.692.930	0	0	3	2.285.202	19	6.337.980	7	2.574.084	0	0	1	294.294	2	21.329	3	-436.658	0	0	0	0	**168**	**41.162.635**
	Baldio	75.555	1.023.220.842	9.075	125.792.024	15.898	351.753.049	1.495	31.497.435	786	16.512.865	706	13.875.702	546	12.450.671	402	39.599.384	402	20.782.986	307	22.853.780	265	11.334.340	315	3.864.498	203	3.010.451	213	6.162.230	**30.613**	**659.489.416**
	- Usuarios Privados	75.199	1.016.089.808	9.046	124.187.806	15.860	351.084.859	1.484	30.892.084	777	16.257.449	702	13.713.948	541	11.161.685	398	39.547.610	402	20.782.986	307	22.853.780	265	11.334.340	314	3.906.903	200	2.861.169	210	6.123.543	**30.506**	**654.708.162**
	- Usuarios Fiscales	356	7.131.034	29	1.604.218	38	668.190	11	605.351	9	255.416	4	161.754	5	1.288.987	4	51.774	0	0	0	0	0	0	1	-42.406	3	149.283	3	38.687	**107**	**4.781.254**
	Eventual	299	564.438.337	110	77.280.438	14	11.371.183	3	473.546.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.529.946	**128**	**563.727.908**
	- Usuarios Privados	299	564.438.337	110	77.280.438	14	11.371.183	3	473.546.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.529.946	**128**	**563.727.908**
	- Usuarios Fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Total	**4.526.942**	**96.789.709.398**	**877.208**	**10.267.521.834**	**1.555.473**	**63.103.246.913**	**144.691**	**5.452.773.905**	**61.173**	**1.532.723.364**	**46.851**	**1.524.455.584**	**31.631**	**958.174.383**	**22.413**	**571.375.063**	**21.014**	**501.708.809**	**15.907**	**381.240.362**	**14.300**	**356.272.389**	**22.369**	**364.123.930**	**11.870**	**224.991.704**	**9.029**	**282.892.011**	**2.833.929**	**85.521.500.251**

(1) Se presenta el ritmo de recaudación de la emisión exclusivamente hecha en diciembre 2024.
(2) Son la cantidad de documentos.

FORMATO N° 362

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN

Emisión (1)	AÑO 2006 - 2022	Año 2023	Año 2024
	Total (millones de $)	Total (millones de $)	Total (millones de $)
	214.232 (2)	178.230 (3)	1.000.301 (4)

	Total		Total		Total	
Años	% (6)	Millones de $	% (6)	Millones de $	% (6)	Millones de $
2006 a 2022	85,8%	183.717 (2)				
2023	5,0%	10.679	70,0%	124.810 (3)		
2024	1,1%	2.286	18,8%	33.462	72,1%	720.997 (4)
2025	0,9%	1.984	1,8%	3.176	15,8%	157.875
Total Recaudado	**92,7%**	**198.665**	**90,6%**	**161.448**	**87,9%**	**878.872**
Monto de Recargos			**10.106,1**		**42.007,9**	

(1) Incluye el total facturado en concepto de servicios, refacturaciones, tasa retributiva del ente regulador, contribuciones municipales, impuestos sobre ingresos brutos e IVA. Asimismo, se encuentra neta de las anulaciones correspondientes a cada año.

(2) No incluye recargos estimados por 9.970,8 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 7.976,6 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(3) No incluye recargos estimados por 10.106,1 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 8.084,8 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(4) No incluye recargos estimados por 42.007,9 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 33.606,3 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

FORMATO N° 362

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR CATEGORÍA DE USUARIO

Emisión (1)	Residenciales (millones de $)		No Residenciales (millones de $)		Total (millones de $)	
2006 a 2022	142.659		71.573		214.232	(2)
2023	123.860	(3)	54.371	(4)	178.230	(5)
2024	688.468	(6)	311.833	(7)	1.000.301	(8)
2025	1.116.752	(9)	528.059	(10)	1.644.811	(11)
Total Emitido	**2.071.739**		**965.836**		**3.037.575**	

Cobros de la Emisión por Año	Residenciales		No Residenciales		Total	
	% (12)	Millones de $	% (12)	Millones de $	% (12)	Millones de $
Cobros de la Emisión 2006-2022						
2006 a 2022	85,5%	121.929	86,3%	61.788	85,8%	**183.717**
2023	4,6%	6.555	5,8%	4.124	5,0%	**10.679**
2024	1,1%	1.503	1,1%	783	1,1%	**2.286**
2025	0,8%	1.201	1,1%	782	0,9%	**1.984**
Total Recaudado	**92,0%**	**131.188**	**94,3%**	**67.477**	**92,7%**	**198.665**
Cobros de la Emisión 2023						
2023	70,5%	87.276	69,0%	37.534	70,0%	**124.810**
2024	17,8%	22.079	20,9%	11.383	18,8%	**33.462**
2025	1,7%	2.062	2,0%	1.114	1,8%	**3.176**
Total Recaudado	**90,0%**	**111.417**	**92,0%**	**50.031**	**90,6%**	**161.448**
Cobros de la Emisión 2024						
2024	72,2%	497.377	71,7%	223.620	72,1%	**720.997**
2025	14,9%	102.442	17,8%	55.433	15,8%	**157.875**
Total Recaudado	**87,1%**	**599.818**	**89,5%**	**279.054**	**87,9%**	**878.872**
Cobros de la Emisión 2025						
2025	75,8%	846.484	75,9%	400.907	75,8%	**1.247.392**
Total Recaudado	**75,8%**	**846.484**	**75,9%**	**400.907**	**75,8%**	**1.247.392**

recargos 2006	**2,2**	**2,4**	**4,6**
recargos 2007	**6,8**	**7,4**	**14,2**
recargos 2008	**8,2**	**10,0**	**18,1**
recargos 2009	**9,8**	**11,1**	**20,9**
recargos 2010	**12,3**	**15,3**	**27,6**
recargos 2011	**15,0**	**15,9**	**30,9**
recargos 2012	**20,6**	**30,4**	**51,0**
recargos 2013	**22,1**	**20,5**	**42,5**
recargos 2014	**30,2**	**30,9**	**61,1**
recargos 2015	**55,5**	**55,2**	**110,7**
recargos 2016	**110,4**	**114,9**	**225,4**
recargos 2017	**211,2**	**247,2**	**458,4**
recargos 2018	**333,7**	**364,6**	**698,3**
recargos 2019	**720,0**	**690,2**	**1.410,2**
recargos 2020	**579,9**	**505,4**	**1.085,3**
recargos 2021	**1.074,2**	**1.082,4**	**2.156,6**
recargos 2022	**1.535,1**	**2.019,8**	**3.554,9**
recargos 2023	**5.106,2**	**4.999,9**	**10.106,1**
recargos 2024	**20.673,2**	**21.334,8**	**42.007,9**
recargos 2025	**34.307,8**	**35.065,5**	**69.373,4**

(1) Incluye el total facturado en concepto de servicios, refacturaciones, tasa retributiva del ente regulador, contribuciones municipales, impuestos sobre ingresos brutos e IVA. Asimismo, se encuentra neta de las anulaciones correspondientes a cada año.

(2) No incluye recargos estimados por 9.970,8 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 7.976,6 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(3) No incluye recargos estimados por 5.106,2 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 4.084,9 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(4) No incluye recargos estimados por 4.999,9 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 3.999,9 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(5) No incluye recargos estimados por 10.106,1 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 8.084,8 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(6) No incluye recargos estimados por 20.673,2 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 16.538,5 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(7) No incluye recargos estimados por 21.334,8 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 17.067,8 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(8) No incluye recargos estimados por 42.007,9 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 33.606,3 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(9) No incluye recargos estimados por 34.307,8 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 27.446,3 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(10) No incluye recargos estimados por 35.065,5 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 28.052,4 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(11) No incluye recargos estimados por 69.373,4 millones de pesos, los cuales surgen de los intereses ganados registrados contablemente por 55.498,7 millones de pesos más una carga impositiva estimada del 25%.

(12) Los porcentajes de recaudación de cada año de emisión surgen de dividir los cobros realizados en cada año por la emisión del año.

FORMATO N° 371

DEUDA VENCIDA AL 31/12/2025
SIN RECARGOS E INTERESES A DICHA FECHA

Deuda al 31/12/2025 con vencimientos que operaron en:

Clasificación	Concepto	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
		Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)	Casos (2)	Importe ($)
CATEGORIA	Residencial	**224.014**	**3.725.625**	**405.160**	**6.669.649**	**461.395**	**7.499.472**	**516.211**	**8.330.776**	**580.415**	**9.362.128**	**664.039**	**10.502.390**	**812.878**	**12.716.512**	**947.407**	**14.709.493**	**905.752**	**33.306.137**	**1.019.223**	**53.046.144**	**1.169.241**	**179.167.510**	**1.726.516**	**410.867.645**	**2.289.631**	**851.182.092**	**4.017.208**	**1.626.637.132**	**5.514.404**	**2.115.979.971**	**5.715.266**	**2.238.924.047**	**5.919.017**	**2.783.398.595**	**6.281.850**	**10.016.698.140**	**7.265.937**	**77.117.341.722**	**9.393.966**	**177.329.777.351**	**55.831.442**	**274.829.842.730**
	- Capital Federal	34.948	709.027	61.387	1.267.463	66.971	1.425.476	73.494	1.595.392	78.166	1.759.169	74.573	1.899.467	79.788	2.440.250	84.345	2.734.723	91.521	6.641.566	104.946	11.071.286	116.407	40.194.495	140.055	71.879.869	166.230	108.990.917	272.081	193.896.193	389.883	261.827.908	429.661	285.730.431	447.806	338.321.735	490.549	1.417.313.429	587.759	10.537.058.879	1.095.095	35.393.671.260	4.845.457	48.680.433.948
	- Gran Buenos Aires (1)	189.166	3.016.798	343.773	5.402.186	394.334	6.073.996	442.727	6.735.385	502.249	7.602.959	589.466	8.602.923	733.090	10.276.261	863.062	11.974.759	814.231	26.662.568	914.375	41.974.857	1.052.834	138.973.016	1.588.461	338.987.776	2.123.401	742.191.175	3.745.127	1.432.737.939	5.124.521	1.854.152.063	5.285.605	1.953.193.616	5.471.211	2.445.076.860	5.831.301	8.599.384.711	6.678.178	66.580.282.843	8.298.872	141.936.106.091	50.985.985	226.149.408.782
	No Residencial	**32.296**	**2.759.454**	**54.488**	**4.831.920**	**57.943**	**5.006.104**	**67.559**	**7.919.002**	**73.707**	**8.179.727**	**77.756**	**6.916.370**	**78.020**	**7.333.445**	**84.646**	**7.513.091**	**86.761**	**19.309.755**	**94.814**	**31.718.042**	**105.416**	**109.031.315**	**137.229**	**212.716.328**	**167.221**	**333.486.734**	**275.066**	**545.542.193**	**403.150**	**728.724.472**	**419.467**	**776.382.233**	**431.493**	**934.164.725**	**463.136**	**1.839.248.925**	**537.020**	**27.150.977.747**	**746.014**	**75.672.137.138**	**4.393.202**	**110.403.898.723**
	- Capital Federal	14.690	1.373.974	24.268	2.293.332	24.785	2.285.771	31.998	4.926.870	34.271	4.885.624	33.843	3.279.496	28.006	3.290.656	28.646	2.995.875	31.452	9.014.861	34.611	15.308.342	37.385	59.467.850	43.176	98.715.436	47.185	113.454.460	71.096	182.942.891	109.542	234.918.846	115.978	256.652.232	117.239	299.958.467	121.597	1.158.595.178	144.984	7.938.068.080	230.209	28.612.627.138	1.324.952	38.997.055.342
	- Gran Buenos Aires (1)	17.606	1.385.480	30.220	2.538.588	33.158	2.720.333	35.571	2.992.132	39.436	3.294.103	43.913	3.636.874	50.014	4.042.790	55.968	4.517.216	55.309	10.294.894	60.203	16.409.700	68.031	58.563.466	94.053	114.000.891	120.036	220.032.275	203.970	362.599.312	293.608	493.805.626	303.489	519.730.002	314.254	634.206.258	341.539	2.680.653.747	392.036	19.212.909.683	515.805	47.058.510.010	3.068.249	71.406.843.380
Y	Baldíos	**6.898**	**136.293**	**11.806**	**226.982**	**14.271**	**253.136**	**17.228**	**311.256**	**24.340**	**415.214**	**39.855**	**605.211**	**69.254**	**785.661**	**83.146**	**859.652**	**67.481**	**1.926.328**	**74.939**	**2.942.540**	**82.879**	**7.467.893**	**123.922**	**19.678.341**	**165.013**	**45.116.731**	**287.625**	**82.336.718**	**380.121**	**102.355.383**	**397.683**	**108.057.029**	**419.860**	**137.738.196**	**444.072**	**489.765.218**	**475.837**	**3.168.016.037**	**528.521**	**6.152.170.879**	**3.714.751**	**10.321.764.697**
	- Capital Federal	980	54.498	1.634	87.741	1.711	92.812	2.133	132.672	2.330	143.512	2.500	120.549	2.454	162.525	2.485	143.592	2.757	301.122	2.912	470.954	3.067	1.463.053	3.165	2.430.334	3.627	3.493.601	5.879	5.960.286	7.993	7.386.469	8.810	8.633.248	9.643	9.543.042	10.825	37.664.639	12.823	229.547.899	17.266	550.525.859	104.999	858.358.275
	- Gran Buenos Aires (1)	5.913	81.795	10.172	139.241	12.560	160.325	15.095	178.583	22.010	271.702	37.355	484.662	66.800	623.136	80.661	716.060	64.724	1.625.207	72.027	2.471.685	79.812	6.004.840	120.757	17.248.006	161.386	41.623.130	281.746	76.376.432	372.128	94.968.914	388.873	100.023.781	410.217	128.195.154	433.247	452.100.579	463.014	2.938.468.171	511.255	5.601.645.020	3.609.752	9.463.406.422
	Eventual (3)	**674**	**64.223**	**1.047**	**85.036**	**1.041**	**79.890**	**839**	**88.785**	**680**	**82.604**	**623**	**115.167**	**687**	**163.761**	**867**	**581.225**	**737**	**289.168**	**605**	**739.779**	**580**	**3.395.103**	**646**	**4.261.901**	**1.027**	**2.995.642**	**902**	**6.432.843**	**524**	**2.433.667**	**798**	**10.947.807**	**850**	**22.166.419**	**1.373**	**69.045.115**	**1.646**	**539.945.267**	**3.280**	**3.073.322.438**	**19.420**	**3.735.235.840**
	- Capital Federal	627	52.672	993	73.246	922	62.511	737	74.302	598	59.227	457	89.765	357	81.262	292	507.229	289	210.384	218	566.091	201	2.304.390	206	2.401.094	165	924.492	258	4.690.816	248	1.570.409	293	9.471.082	283	17.257.164	247	36.060.729	282	134.972.742	327	1.738.455.937	8.000	1.949.288.543
	- Gran Buenos Aires (1)	47	11.551	54	11.791	119	17.379	102	14.483	82	23.377	166	25.401	330	82.499	575	73.996	448	78.784	387	173.688	379	1.090.713	434	1.860.807	862	2.071.150	644	2.342.026	276	863.258	505	1.476.726	587	4.909.255	1.126	32.984.386	1.364	404.972.525	2.953	1.332.866.501	11.420	1.785.950.297
AREA																																										
	TOTAL	**263.882**	**6.685.796**	**472.501**	**11.813.588**	**534.560**	**12.838.602**	**601.837**	**16.649.820**	**679.142**	**18.039.672**	**782.273**	**18.139.137**	**960.839**	**20.999.379**	**1.116.066**	**23.663.460**	**1.060.731**	**54.831.388**	**1.189.581**	**88.446.505**	**1.358.116**	**299.061.821**	**1.990.307**	**647.524.214**	**2.622.892**	**1.232.781.198**	**4.580.801**	**2.260.948.887**	**6.298.199**	**2.949.493.493**	**6.533.214**	**3.134.911.116**	**6.771.220**	**3.877.467.934**	**7.190.431**	**14.414.757.398**	**8.280.440**	**107.976.280.774**	**10.671.783**	**282.225.407.807**	**63.958.815**	**399.290.741.996**
	- Capital Federal	**51.150**	**2.190.171**	**86.282**	**3.721.781**	**94.389**	**3.866.570**	**108.342**	**6.729.236**	**115.365**	**6.847.531**	**111.373**	**5.389.277**	**110.605**	**5.974.693**	**115.770**	**6.381.429**	**126.019**	**16.169.935**	**142.589**	**27.416.575**	**157.060**	**94.429.787**	**186.602**	**175.426.734**	**217.207**	**226.863.470**	**349.314**	**386.893.178**	**507.666**	**505.703.632**	**554.742**	**560.486.993**	**574.971**	**665.080.408**	**583.218**	**2.649.633.975**	**745.848**	**18.839.647.551**	**1.342.897**	**66.296.280.184**	**6.283.409**	**90.485.133.109**
	- Gran Buenos Aires (1)	**212.732**	**4.495.625**	**384.219**	**8.091.807**	**440.171**	**8.972.032**	**493.495**	**9.920.584**	**563.777**	**11.192.141**	**670.900**	**12.749.860**	**850.234**	**15.024.686**	**1.000.296**	**17.282.031**	**934.712**	**38.661.453**	**1.046.992**	**61.029.930**	**1.201.056**	**204.632.034**	**1.803.705**	**472.097.480**	**2.405.685**	**1.005.917.730**	**4.231.487**	**1.874.055.709**	**5.790.533**	**2.443.789.861**	**5.978.472**	**2.574.424.123**	**6.196.249**	**3.212.387.526**	**6.607.213**	**11.765.123.423**	**7.534.592**	**89.136.633.223**	**9.328.886**	**195.929.127.623**	**57.675.406**	**308.805.608.882**
CATEGORIA	Residencial	**224.014**	**3.725.625**	**405.160**	**6.669.649**	**461.395**	**7.499.472**	**516.211**	**8.330.776**	**580.415**	**9.362.128**	**664.039**	**10.502.390**	**812.878**	**12.716.512**	**947.407**	**14.709.493**	**905.752**	**33.306.137**	**1.019.223**	**53.046.144**	**1.169.241**	**179.167.510**	**1.726.516**	**410.867.645**	**2.289.631**	**851.182.092**	**4.017.208**	**1.626.637.132**	**5.514.404**	**2.115.979.971**	**5.715.266**	**2.238.924.047**	**5.919.017**	**2.783.398.595**	**6.281.850**	**10.016.698.140**	**7.265.937**	**77.117.341.722**	**9.393.966**	**177.329.777.351**	**55.831.442**	**274.829.842.730**
	- U. Privados	223.442	3.655.568	404.072	6.545.508	460.157	7.375.717	514.272	8.140.691	577.987	9.153.191	661.481	10.287.936	810.969	12.465.521	945.888	14.485.702	903.895	32.847.971	1.017.243	52.364.368	1.166.816	176.998.356	1.725.629	407.346.177	2.286.291	845.657.513	4.013.559	1.615.580.611	5.510.559	2.102.606.543	5.708.964	2.221.094.859	5.911.724	2.759.911.685	6.273.514	9.944.766.489	7.258.040	76.626.918.350	9.384.449	171.562.004.157	55.758.986	268.420.186.916
	- U. Fiscales	572	70.257	1.088	124.141	1.148	123.755	1.939	190.086	2.428	208.937	2.558	214.454	1.894	250.991	1.519	243.791	1.857	458.165	1.980	681.776	2.425	2.169.155	2.887	3.521.468	3.340	5.524.579	3.649	11.056.521	3.845	13.373.428	6.302	17.829.187	7.293	23.486.910	8.336	71.931.651	7.897	490.423.372	9.519	5.767.773.193	72.476	6.409.655.815
	No Residencial	**32.296**	**2.759.454**	**54.488**	**4.831.920**	**57.943**	**5.006.104**	**67.559**	**7.919.002**	**73.707**	**8.179.727**	**77.756**	**6.916.370**	**78.020**	**7.333.445**	**84.646**	**7.513.091**	**86.761**	**19.309.755**	**94.814**	**31.718.042**	**105.416**	**109.031.315**	**137.229**	**212.716.328**	**167.221**	**333.486.734**	**275.066**	**545.542.193**	**403.150**	**728.724.472**	**419.467**	**776.382.233**	**431.493**	**934.164.725**	**463.136**	**1.839.248.925**	**537.020**	**27.150.977.747**	**746.014**	**75.672.137.138**	**4.393.202**	**110.403.898.723**
	- U. Privados	30.975	2.377.575	51.939	4.108.860	55.956	4.406.388	59.166	4.569.041	63.241	4.996.133	68.142	5.128.306	75.601	5.858.671	82.569	6.179.481	84.490	16.014.998	92.352	26.392.513	103.000	95.832.724	134.551	177.804.760	164.213	302.927.052	271.161	486.373.803	398.804	666.464.708	414.759	703.114.865	426.254	844.466.890	457.539	3.530.213.865	539.921	24.814.428.526	729.924	58.781.587.307	4.295.557	90.483.046.443
	- U. Fiscales	1.321	381.879	2.549	723.060	1.987	599.716	8.393	3.349.961	10.466	3.183.594	9.614	1.788.064	2.419	1.474.774	2.077	1.333.610	2.271	3.294.757	2.462	5.325.530	2.416	13.198.592	2.678	35.111.567	3.008	30.559.683	3.905	59.168.392	4.346	62.259.765	4.708	73.267.368	5.239	89.697.835	5.597	309.035.060	6.099	2.336.549.221	16.090	16.890.549.831	97.645	19.920.852.280
Y	Baldíos	**6.898**	**136.293**	**11.806**	**226.982**	**14.271**	**253.136**	**17.228**	**311.256**	**24.340**	**415.214**	**39.855**	**605.211**	**69.254**	**785.661**	**83.146**	**859.652**	**67.481**	**1.926.328**	**74.939**	**2.942.540**	**82.879**	**7.467.893**	**123.922**	**19.678.341**	**165.013**	**45.116.731**	**287.625**	**82.336.718**	**380.121**	**102.355.383**	**397.683**	**108.057.029**	**419.860**	**137.738.196**	**444.072**	**489.765.218**	**475.837**	**3.168.016.037**	**528.521**	**6.152.170.879**	**3.714.751**	**10.321.764.697**
	- U. Privados	6.555	94.860	11.204	160.127	13.642	182.170	16.330	230.285	23.337	313.183	38.713	403.180	68.265	602.043	82.258	740.430	66.489	1.703.975	73.973	2.651.875	81.866	6.659.540	123.005	18.868.871	163.948	42.642.739	286.305	78.164.270	378.895	95.180.131	396.081	100.740.035	418.115	127.979.718	442.199	459.310.464	473.896	2.988.471.999	525.712	5.662.439.638	3.690.788	9.587.339.534
	- U. Fiscales	343	41.433	602	66.855	629	70.966	898	80.971	1.003	102.031	1.142	202.031	989	183.618	888	119.222	992	222.353	966	290.665	1.013	808.353	917	1.009.469	1.065	2.473.993	1.320	4.172.448	1.226	7.175.252	1.602	7.916.993	1.745	9.758.478	1.873	30.454.754	1.941	179.544.039	2.809	489.731.241	23.983	734.425.166
	Eventual (3)	**674**	**64.223**	**1.047**	**85.036**	**1.041**	**79.890**	**839**	**88.785**	**680**	**82.604**	**623**	**115.167**	**687**	**163.761**	**867**	**581.225**	**737**	**289.168**	**605**	**739.779**	**580**	**3.395.103**	**646**	**4.261.901**	**1.027**	**2.995.642**	**902**	**6.432.843**	**524**	**2.433.667**	**798**	**10.947.807**	**850**	**22.166.419**	**1.373**	**69.045.115**	**1.646**	**539.945.267**	**3.280**	**3.073.322.438**	**19.420**	**3.735.235.840**
	- U. Privados	672	62.129	1.034	75.028	1.026	71.446	829	82.535	676	80.846	610	101.806	669	127.078	843	489.398	703	149.148	576	209.015	558	1.718.027	623	3.688.600	1.017	2.893.233	892	6.220.643	515	1.520.443	787	7.540.111	838	21.163.854	1.358	58.415.779	1.618	400.319.011	3.254	2.986.698.664	19.089	3.471.626.792
	- U. Fiscales	2	2.095	13	10.008	15	8.444	10	6.250	4	1.758	13	13.361	27	36.683	24	91.827	34	140.020	29	530.764	22	1.677.076	17	573.301	10	102.409	10	212.200	9	913.224	11	3.407.696	12	1.002.565	15	10.629.336	28	139.626.256	26	104.623.774	331	263.609.048
TIPO USUARIO																																									
	TOTAL	**263.882**	**6.685.796**	**472.501**	**11.813.588**	**534.560**	**12.838.602**	**601.837**	**16.649.820**	**679.142**	**18.039.672**	**782.273**	**18.139.137**	**960.839**	**20.999.379**	**1.116.066**	**23.663.460**	**1.060.731**	**54.831.388**	**1.189.581**	**88.446.505**	**1.358.116**	**299.061.821**	**1.990.307**	**647.524.214**	**2.622.892**	**1.232.781.198**	**4.580.801**	**2.260.948.887**	**6.298.199**	**2.949.493.493**	**6.533.214**	**3.134.911.116**	**6.771.220**	**3.877.467.934**	**7.190.431**	**14.414.757.398**	**8.280.440**	**107.976.280.774**	**10.671.783**	**282.225.407.807**	**63.958.815**	**399.290.741.996**
	- U. Privados	**261.644**	**6.190.131**	**468.249**	**10.889.523**	**530.781**	**12.035.702**	**590.597**	**13.022.552**	**665.241**	**14.543.353**	**768.946**	**15.921.327**	**955.510**	**19.053.313**	**1.111.558**	**21.975.010**	**1.055.977**	**50.716.063**	**1.184.144**	**81.617.771**	**1.352.240**	**281.208.646**	**1.983.808**	**607.308.408**	**2.615.469**	**1.194.120.537**	**4.571.917**	**2.186.339.325**	**6.288.773**	**2.865.771.825**	**6.520.591**	**3.032.489.871**	**6.756.931**	**3.753.522.147**	**7.174.610**	**13.992.706.597**	**8.264.475**	**104.830.137.885**	**10.643.339**	**238.972.729.766**	**63.764.409**	**371.962.199.684**
	- U. Fiscales	**2.238**	**495.665**	**4.252**	**924.065**	**3.779**	**802.900**	**11.240**	**3.627.267**	**13.901**	**3.496.319**	**13.327**	**2.217.810**	**5.329**	**1.946.066**	**4.508**	**1.688.450**	**5.154**	**4.115.325**	**5.437**	**6.828.734**	**5.876**	**17.853.175**	**6.499**	**40.215.806**	**7.423**	**38.660.663**	**8.884**	**74.609.561**	**9.426**	**83.721.669**	**12.623**	**102.423.245**	**14.289**	**123.945.787**	**15.821**	**422.050.801**	**15.965**	**3.146.142.889**	**28.444**	**23.252.676.041**	**194.415**	**27.328.542.306**

(1) Incluye Nuevas Áreas Escobar. San Miguel. José C. Paz. Malvinas Argentinas. Pilar. Presidente Perón. Merlo. Moreno y Florencio Varela1.
(2) Los casos son la cantidad de documentos impagos.
(3) Eventuales son aquellos usuarios que se encuentran dentro de lo establecido por el Art. 21 del Anexo E del Marco Regulatorio (Lev 26.221/07).

21.5. Aspectos vinculados con la deuda de los usuarios

FORMATO Nº 372

IMPAGO VENCIDO POR RANGO DE DEUDA

AL 31/12/2025
EMISIÓN POR TODO CONCEPTO
DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL (A) (*)

Distrito: Centro (101)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	21.206	29.943	24.169	8.056	2.735	1.138	300	237	**87.784**
	%	25,49%	34,15%	27,00%	8,74%	2,74%	1,26%	0,34%	0,28%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	125.853	219.959	672.324	492.456	146.738	56.173	12.866	11.300	**1.737.669**
	%	7,24%	12,66%	38,69%	28,34%	8,44%	3,23%	0,74%	0,65%	100,00%
Pesos	**Nº**	236.261.182	1.394.815.146	5.460.007.132	4.935.757.223	3.271.660.599	3.012.649.107	1.849.214.244	5.821.078.930	**25.981.443.563**
	%	0,91%	5,37%	21,02%	19,00%	12,59%	11,60%	7,12%	22,40%	100,00%

Distrito: Caballito (102)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	30.041	41.190	25.220	5.348	1.388	639	201	123	**104.150**
	%	29,90%	40,36%	23,10%	4,70%	1,14%	0,52%	0,18%	0,11%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	84.969	254.110	697.396	310.190	61.470	19.930	7.243	4.109	**1.439.417**
	%	5,90%	17,65%	48,45%	21,55%	4,27%	1,38%	0,50%	0,29%	100,00%
Pesos	**Nº**	400.481.842	1.851.763.130	5.806.993.936	3.201.187.142	1.666.088.828	1.707.956.465	1.222.027.381	2.193.053.255	**18.049.551.977**
	%	2,22%	10,26%	32,17%	17,74%	9,23%	9,46%	6,77%	12,15%	100,00%

Distrito: Constitución (103)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	4.470	4.903	5.403	1.257	477	322	130	112	**17.074**
	%	25,42%	27,23%	33,95%	7,56%	2,57%	1,78%	0,76%	0,74%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	20.272	29.445	212.443	76.288	24.088	16.135	7.393	6.460	**392.524**
	%	5,16%	7,50%	54,12%	19,44%	6,14%	4,11%	1,88%	1,65%	100,00%
Pesos	**Nº**	53.658.344	223.916.997	1.334.366.494	760.764.231	586.430.283	879.210.644	781.374.120	4.619.250.437	**9.238.971.550**
	%	0,58%	2,42%	14,44%	8,23%	6,35%	9,52%	8,46%	50,00%	100,00%

Distrito: Devoto (201)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	11.017	6.099	4.888	1.329	682	440	135	46	**24.636**
	%	42,73%	24,86%	20,77%	5,92%	2,88%	2,06%	0,56%	0,23%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	101.773	54.561	82.720	44.302	22.771	13.579	5.747	1.818	**327.271**
	%	31,10%	16,67%	25,28%	13,54%	6,96%	4,15%	1,76%	0,56%	100,00%
Pesos	**Nº**	68.466.418	279.653.855	1.081.327.450	815.431.967	828.831.058	1.196.051.669	804.976.773	898.301.228	**5.973.040.417**
	%	1,15%	4,68%	18,10%	13,65%	13,88%	20,02%	13,48%	15,04%	100,00%

Distrito: Floresta (202)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	15.830	19.284	23.117	3.604	1.090	656	193	150	**63.924**
	%	24,96%	27,70%	39,90%	4,82%	1,21%	0,81%	0,30%	0,30%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	53.529	124.506	1.148.801	215.901	47.862	29.721	8.370	7.525	**1.636.215**
	%	3,27%	7,61%	70,21%	13,20%	2,93%	1,82%	0,51%	0,46%	100,00%
Pesos	**Nº**	206.236.954	881.285.808	5.875.770.538	2.156.694.291	1.315.633.893	1.730.556.850	1.187.755.978	3.736.879.631	**17.090.813.944**
	%	1,21%	5,16%	34,38%	12,62%	7,70%	10,13%	6,95%	21,86%	100,00%

Distrito: Saavedra (203)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	24.741	9.548	5.881	1.737	956	609	211	117	**43.800**
	%	58,65%	20,73%	12,50%	3,84%	2,09%	1,39%	0,49%	0,30%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	227.431	164.227	95.883	47.410	23.221	13.614	5.761	3.007	**580.554**
	%	39,17%	28,29%	16,52%	8,17%	4,00%	2,35%	0,99%	0,52%	100,00%
Pesos	**Nº**	115.633.594	424.347.776	1.285.392.398	1.068.784.659	1.155.697.897	1.672.742.382	1.303.861.256	2.773.690.536	**9.800.150.498**
	%	1,18%	4,33%	13,12%	10,91%	11,79%	17,07%	13,30%	28,30%	100,00%

TOTAL DIRECCION REGIONAL CAPITAL

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	107.305	110.967	88.678	21.331	7.328	3.804	1.170	785	**341.368**
	%	207,15%	175,02%	157,22%	35,58%	12,65%	7,81%	2,62%	1,96%	600,00%
Comprobantes	**Nº**	613.827	846.808	2.909.567	1.186.547	326.150	149.152	47.380	34.219	**6.113.650**
	%	91,85%	90,38%	253,27%	104,22%	32,73%	17,04%	6,39%	4,11%	600,00%
Pesos	**Nº**	1.080.738.335	5.055.782.711	20.843.857.948	12.938.619.512	8.824.342.557	10.199.167.117	7.149.209.753	20.042.254.017	**86.133.971.950**
	%	7,24%	32,22%	133,23%	82,14%	61,54%	77,79%	56,08%	149,76%	600,00%

(A) No incluye saldos de créditos por servicios a favor de usuarios por $

(*) Pueden existir diferencias en las sumatorias por el redondeo de decimales.

FORMATO N° 372

IMPAGO VENCIDO POR RANGO DE DEUDA

AL 31/12/2025

EMISIÓN POR TODO CONCEPTO

DIRECCION GRANDES USUARIOS (A) (*)

Grandes Usuarios (888)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	265	659	1.361	822	638	672	291	304	**5.012**
	%	4,85%	20,05%	29,56%	17,82%	12,43%	9,02%	2,66%	3,61%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	2.075	2.924	18.584	19.904	7.127	9.769	5.110	12.147	**77.640**
	%	2,67%	3,77%	23,94%	25,64%	9,18%	12,58%	6,58%	15,65%	100,00%
Pesos	**Nº**	1.628.041	32.141.582	319.245.777	519.418.762	818.029.120	1.883.060.468	1.743.224.378	11.920.882.683	**17.237.630.811**
	%	0,01%	0,19%	1,85%	3,01%	4,75%	10,92%	10,11%	69,16%	100,00%

(A) No incluye saldos de créditos por servicios a favor de usuarios por $

(*) Pueden existir diferencias en las sumatorias por el redondeo de decimales.



FORMATO N° 372

IMPAGO VENCIDO POR RANGO DE DEUDA

AL 31/12/2025
EMISIÓN POR TODO CONCEPTO
DIRECCION REGIONAL NORTE (A) (*)

Distrito: San Fernando (116)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	3.192	4.973	7.237	1.421	374	176	48	20	**17.441**
	%	17,77%	26,25%	44,69%	7,67%	2,15%	1,04%	0,29%	0,14%	100,00%
Comprobantes	**N°**	9.483	23.259	433.829	102.490	20.148	10.734	2.723	1.562	**604.228**
	%	1,57%	3,85%	71,80%	16,96%	3,33%	1,78%	0,45%	0,26%	100,00%
Pesos	**N°**	40.157.340	225.533.826	1.810.582.325	836.276.467	446.639.536	464.366.855	295.540.033	302.863.873	**4.421.960.255**
	%	0,91%	5,10%	40,95%	18,91%	10,10%	10,50%	6,68%	6,85%	100,00%

Distrito: San Isidro (118)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	7.037	10.053	10.733	2.123	979	553	150	71	**31.699**
	%	22,10%	30,39%	35,10%	6,57%	3,22%	1,85%	0,52%	0,25%	100,00%
Comprobantes	**N°**	17.655	50.444	498.467	99.306	44.970	27.094	7.285	4.715	**749.936**
	%	2,35%	6,73%	66,47%	13,24%	6,00%	3,61%	0,97%	0,63%	100,00%
Pesos	**N°**	85.949.633	471.619.658	2.483.352.862	1.305.236.518	1.200.526.683	1.452.171.081	918.215.954	990.097.104	**8.907.169.492**
	%	0,96%	5,29%	27,88%	14,65%	13,48%	16,30%	10,31%	11,12%	100,00%

Distrito: San Miguel (131)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	1.930	6.877	14.846	12.541	3.622	1.167	225	116	**41.324**
	%	4,70%	16,96%	36,09%	29,94%	8,68%	2,80%	0,54%	0,28%	100,00%
Comprobantes	**N°**	17.662	62.882	1.325.960	1.842.508	503.274	152.628	28.934	13.850	**3.947.698**
	%	0,45%	1,59%	33,59%	46,67%	12,75%	3,87%	0,73%	0,35%	100,00%
Pesos	**N°**	21.233.346	328.154.657	4.205.062.555	7.613.257.844	4.268.108.049	2.998.682.183	1.356.181.731	2.359.513.305	############
	%	0,09%	1,42%	18,16%	32,89%	18,44%	12,95%	5,86%	10,19%	100,00%

Distrito: José C. Paz (132)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	184	232	4.121	165	37	8	1	1	**4.749**
	%	3,86%	4,90%	86,75%	3,49%	0,78%	0,17%	0,02%	0,02%	100,00%
Comprobantes	**N°**	1.103	2.866	348.025	13.362	2.866	577	11	80	**368.890**
	%	0,30%	0,78%	94,34%	3,62%	0,78%	0,16%	0,00%	0,02%	100,00%
Pesos	**N°**	2.010.312	11.698.143	979.143.140	93.211.173	42.070.793	20.085.892	5.128.957	13.457.075	**1.166.805.486**
	%	0,17%	1,00%	83,92%	7,99%	3,61%	1,72%	0,44%	1,15%	100,00%

Distrito: Malvinas Argentinas (133)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	441	433	4.038	369	63	15	2	1	**5.362**
	%	8,21%	8,06%	75,37%	6,85%	1,17%	0,28%	0,04%	0,02%	100,00%
Comprobantes	**N°**	1.867	4.639	308.316	30.582	5.120	1.255	89	92	**351.960**
	%	0,53%	1,32%	87,60%	8,69%	1,45%	0,36%	0,03%	0,03%	100,00%
Pesos	**N°**	4.946.090	21.174.074	1.007.830.995	203.456.105	71.419.379	37.859.653	14.113.543	11.755.371	**1.372.555.211**
	%	0,36%	1,54%	73,43%	14,82%	5,20%	2,76%	1,03%	0,86%	100,00%

Distrito: Tigre (136)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	6.731	8.850	22.281	2.744	832	435	143	113	**42.129**
	%	14,43%	19,37%	56,21%	6,39%	1,96%	0,99%	0,33%	0,31%	100,00%
Comprobantes	**N°**	19.022	57.109	1.317.536	163.585	47.103	24.917	9.232	6.492	**1.644.996**
	%	1,16%	3,47%	80,09%	9,94%	2,86%	1,51%	0,56%	0,39%	100,00%
Pesos	**N°**	83.358.173	427.757.189	5.055.105.115	1.603.984.458	1.006.375.693	1.171.960.069	855.789.345	3.334.870.907	############
	%	0,62%	3,16%	37,34%	11,85%	7,43%	8,66%	6,32%	24,63%	100,00%

Distrito: Vicente Lopez (141)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	7.731	10.462	7.755	1.660	637	287	79	49	**28.660**
	%	27,32%	36,08%	27,25%	5,68%	2,21%	0,98%	0,28%	0,19%	100,00%
Comprobantes	**N°**	18.687	47.209	250.065	89.211	31.966	15.767	4.800	3.605	**461.310**
	%	4,05%	10,23%	54,21%	19,34%	6,93%	3,42%	1,04%	0,78%	100,00%
Pesos	**N°**	97.063.008	478.379.196	1.740.189.456	1.007.289.232	775.785.436	779.733.326	473.958.457	800.277.617	**6.152.675.729**
	%	1,58%	7,78%	28,28%	16,37%	12,61%	12,67%	7,70%	13,01%	100,00%

Distrito: San Martin (154)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	10.204	12.210	24.696	3.883	1.172	709	179	85	**53.138**
	%	15,70%	17,47%	58,43%	5,42%	1,64%	0,98%	0,25%	0,11%	100,00%
Comprobantes	**N°**	31.277	68.428	1.359.277	271.882	71.000	45.088	13.143	6.648	**1.866.743**
	%	1,68%	3,67%	72,82%	14,56%	3,80%	2,42%	0,70%	0,36%	100,00%
Pesos	**N°**	124.967.893	563.066.419	5.753.470.852	2.299.506.369	1.418.061.464	1.875.533.042	1.073.734.534	1.677.101.090	############
	%	0,85%	3,81%	38,91%	15,55%	9,59%	12,68%	7,26%	11,34%	100,00%

Distrito: Pilar (159)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	2.287	2.717	10.801	833	308	168	52	42	**17.208**
	%	13,22%	15,86%	62,79%	4,82%	1,79%	0,97%	0,30%	0,25%	100,00%
Comprobantes	**N°**	5.841	18.536	541.536	40.261	11.892	7.735	2.297	1.213	**629.311**
	%	0,93%	2,95%	86,05%	6,40%	1,89%	1,23%	0,37%	0,19%	100,00%
Pesos	**N°**	26.388.343	136.768.235	2.122.170.296	492.171.719	359.343.107	464.425.855	310.286.222	1.118.888.510	**5.030.442.288**
	%	0,52%	2,72%	42,19%	9,78%	7,14%	9,23%	6,17%	22,24%	100,00%

Distrito: Escobar (314)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	2.648	3.387	6.365	880	275	121	50	22	**13.748**
	%	19,42%	24,92%	46,00%	6,28%	1,96%	0,88%	0,37%	0,16%	100,00%
Comprobantes	**N°**	6.961	27.269	279.152	49.542	14.207	5.070	2.355	1.136	**385.692**
	%	1,80%	7,07%	72,38%	12,84%	3,68%	1,31%	0,61%	0,29%	100,00%
Pesos	**N°**	28.846.260	179.826.315	1.398.844.198	516.668.664	324.210.812	316.190.239	306.722.449	444.887.169	**3.516.196.107**
	%	0,82%	5,11%	39,78%	14,69%	9,22%	8,99%	8,72%	12,65%	100,00%

TOTAL DIRECCION REGIONAL NORTE

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	42.385	60.194	112.873	26.619	8.299	3.639	929	520	**255.458**
	%	146,74%	200,26%	528,69%	83,12%	25,55%	10,96%	2,94%	1,73%	1000,00%
Comprobantes	**N°**	129.558	362.641	6.662.163	2.702.729	752.546	290.865	70.869	39.393	**11.010.764**
	%	14,82%	41,65%	719,34%	152,28%	43,48%	19,66%	5,46%	3,31%	1000,00%
Pesos	**N°**	514.920.399	2.843.977.712	26.555.751.794	15.971.058.550	9.912.540.953	9.581.008.195	5.609.671.224	############	############
	%	6,88%	36,93%	430,84%	157,51%	96,82%	96,48%	60,50%	114,04%	1000,00%

(A) No incluye saldos de créditos por servicios a favor de usuarios por $

(*) Pueden existir diferencias en las sumatorias por el redondeo de decimales.

FORMATO Nº 372

IMPAGO VENCIDO POR RANGO DE DEUDA

AL 31/12/2025
EMISIÓN POR TODO CONCEPTO
DIRECCION REGIONAL OESTE (A) (*)

Distrito: Merlo (072)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	5.431	5.331	33.294	4.834	772	183	36	11	**49.892**
	%	10,89%	10,70%	66,71%	9,67%	1,56%	0,37%	0,07%	0,02%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	17.138	39.935	2.357.405	361.184	52.483	10.982	1.856	516	**2.841.499**
	%	0,60%	1,41%	82,96%	12,71%	1,85%	0,39%	0,07%	0,02%	100,00%
Pesos	**Nº**	52.928.837	256.351.621	7.599.890.011	2.760.007.511	901.574.494	478.677.764	204.256.023	326.250.848	**12.579.937.108**
	%	0,42%	2,04%	60,41%	21,94%	7,17%	3,81%	1,62%	2,59%	100,00%

Distrito: Moreno (074)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	3.401	4.704	30.464	6.337	1.029	321	60	27	**46.343**
	%	7,30%	10,24%	65,78%	13,58%	2,21%	0,69%	0,13%	0,06%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	12.000	43.261	2.189.792	501.328	78.014	22.000	3.950	1.626	**2.851.971**
	%	0,42%	1,52%	76,78%	17,58%	2,74%	0,77%	0,14%	0,06%	100,00%
Pesos	**Nº**	38.749.880	223.258.657	7.728.118.292	3.650.788.345	1.198.439.205	815.585.955	363.556.873	420.187.130	**14.438.684.337**
	%	0,27%	1,55%	53,52%	25,28%	8,30%	5,65%	2,52%	2,91%	100,00%

Distrito: Morón (086) (B)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	15.190	17.766	37.371	6.402	1.443	671	148	75	**79.066**
	%	18,51%	20,53%	50,48%	7,75%	1,70%	0,78%	0,16%	0,09%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	39.287	94.833	1.963.142	425.270	86.439	42.036	8.466	4.670	**2.664.143**
	%	1,47%	3,56%	73,69%	15,96%	3,24%	1,58%	0,32%	0,18%	100,00%
Pesos	**Nº**	186.123.791	808.448.020	8.844.747.929	3.723.140.260	1.735.901.755	1.770.846.751	893.651.192	###########	**19.099.530.154**
	%	0,97%	4,23%	46,31%	19,49%	9,09%	9,27%	4,68%	5,95%	100,00%

Distrito: La Matanza Norte (155)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	15.181	18.176	33.032	6.123	1.953	943	211	80	**75.699**
	%	19,18%	21,65%	48,81%	7,19%	1,99%	0,88%	0,20%	0,10%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	45.869	110.136	2.023.545	454.084	126.942	67.578	16.783	6.822	**2.851.759**
	%	1,61%	3,86%	70,96%	15,92%	4,45%	2,37%	0,59%	0,24%	100,00%
Pesos	**Nº**	188.497.043	849.087.826	7.897.295.824	3.628.068.568	2.364.114.532	2.420.687.677	1.232.877.662	###########	**20.000.849.205**
	%	0,94%	4,25%	39,48%	18,14%	11,82%	12,10%	6,16%	7,10%	100,00%

Distrito: Tres de Febrero (157)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	8.065	10.286	17.599	3.032	734	321	60	26	**40.123**
	%	19,96%	24,96%	44,61%	7,69%	1,86%	0,73%	0,13%	0,06%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	21.547	50.649	1.261.514	207.067	43.465	21.245	3.837	2.441	**1.611.765**
	%	1,34%	3,14%	78,27%	12,85%	2,70%	1,32%	0,24%	0,15%	100,00%
Pesos	**Nº**	102.434.145	467.019.698	4.691.726.120	1.789.372.392	876.342.165	845.730.906	370.777.052	378.223.434	**9.521.625.913**
	%	1,08%	4,90%	49,27%	18,79%	9,20%	8,88%	3,89%	3,97%	100,00%

Distrito: La Matanza Oeste (160)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	9.699	7.816	66.669	909	294	78	19	13	**85.497**
	%	11,20%	9,11%	78,14%	1,07%	0,35%	0,09%	0,02%	0,02%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	59.170	146.780	6.833.484	90.978	28.041	7.676	1.753	1.388	**7.169.270**
	%	0,83%	2,05%	95,32%	1,27%	0,39%	0,11%	0,02%	0,02%	100,00%
Pesos	**Nº**	97.510.774	388.112.063	11.144.991.275	539.878.028	349.615.185	197.604.174	114.902.934	243.955.400	**13.076.569.832**
	%	0,75%	2,97%	85,23%	4,13%	2,67%	1,51%	0,88%	1,87%	100,00%

Distrito: La Matanza Sur (166)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	6.759	8.291	26.624	3.451	891	405	96	46	**46.563**
	%	13,84%	16,70%	58,17%	8,26%	1,89%	0,83%	0,20%	0,11%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	20.145	57.053	2.145.712	267.178	60.141	27.902	7.834	3.720	**2.589.685**
	%	0,78%	2,20%	82,86%	10,32%	2,32%	1,08%	0,30%	0,14%	100,00%
Pesos	**Nº**	86.439.468	388.145.989	7.366.056.451	1.998.476.579	1.072.885.924	1.058.867.707	568.434.874	###########	**13.948.590.378**
	%	0,62%	2,78%	52,81%	14,33%	7,69%	7,59%	4,08%	10,10%	100,00%

TOTAL DIRECCION REGIONAL OESTE

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	63.726	72.370	245.053	31.088	7.116	2.922	630	278	**423.183**
	%	100,87%	113,89%	412,71%	55,22%	11,56%	4,39%	0,92%	0,45%	700,00%
Comprobantes	**Nº**	215.156	542.647	18.774.594	2.307.089	475.525	199.419	44.479	21.183	**22.580.092**
	%	7,05%	17,74%	560,83%	86,61%	17,69%	7,61%	1,68%	0,80%	700,00%
Pesos	**Nº**	752.683.938	3.380.423.874	55.272.825.901	18.089.731.683	8.498.873.259	7.588.000.933	3.748.456.610	###########	**############**
	%	5,05%	22,72%	387,04%	122,11%	55,94%	48,81%	23,83%	34,50%	700,00%

(A) No incluye saldos de créditos por servicios a favor de usuarios por $

(*) Pueden existir diferencias en las sumatorias por el redondeo de decimales.



FORMATO N° 372

IMPAGO VENCIDO POR RANGO DE DEUDA

AL 31/12/2025

EMISIÓN POR TODO CONCEPTO

DIRECCION REGIONAL SURESTE (A) (*)

Distrito: Avellaneda (006)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	8.572	9.987	20.432	3.513	947	608	189	97	**44.345**
	%	18,59%	20,75%	49,87%	7,00%	1,90%	1,25%	0,40%	0,25%	100,00%
Comprobantes	**N°**	33.520	67.463	1.367.311	276.777	62.530	42.118	14.344	6.727	**1.870.790**
	%	1,79%	3,61%	73,09%	14,79%	3,34%	2,25%	0,77%	0,36%	100,00%
Pesos	**N°**	103.849.749	462.708.680	5.305.518.146	2.120.000.216	1.153.458.197	1.624.964.489	1.145.529.864	2.225.803.556	**14.141.832.896**
	%	0,73%	3,27%	37,52%	14,99%	8,16%	11,49%	8,10%	15,74%	100,00%

Distrito: Florencio Varela (032)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	4.479	7.236	45.120	9.626	1.234	411	87	53	**68.246**
	%	6,55%	10,67%	66,12%	14,04%	1,80%	0,60%	0,13%	0,08%	100,00%
Comprobantes	**N°**	14.829	55.401	2.807.758	700.805	83.086	24.839	5.185	2.831	**3.694.734**
	%	0,40%	1,50%	75,99%	18,97%	2,25%	0,67%	0,14%	0,08%	100,00%
Pesos	**N°**	51.778.659	360.390.370	11.106.600.184	5.489.953.218	1.427.218.258	1.063.859.816	535.102.949	1.396.708.623	**21.431.612.077**
	%	0,24%	1,68%	51,82%	25,62%	6,66%	4,96%	2,50%	6,52%	100,00%

Distrito: Lanus (069)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	11.631	12.951	26.907	3.749	1.027	594	158	70	**57.087**
	%	18,52%	19,97%	53,54%	5,22%	1,52%	0,88%	0,24%	0,12%	100,00%
Comprobantes	**N°**	39.223	96.402	1.904.629	273.595	71.056	44.243	11.888	5.243	**2.446.279**
	%	1,60%	3,94%	77,86%	11,18%	2,90%	1,81%	0,49%	0,21%	100,00%
Pesos	**N°**	142.175.161	598.647.379	6.129.973.452	2.213.971.337	1.255.122.269	1.595.817.059	944.505.667	952.231.267	**13.832.443.590**
	%	1,03%	4,33%	44,32%	16,01%	9,07%	11,54%	6,83%	6,88%	100,00%

Distrito: Quilmes (301)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	10.747	15.799	38.801	7.960	1.655	796	180	106	**76.044**
	%	12,60%	17,02%	59,81%	7,96%	1,56%	0,77%	0,15%	0,13%	100,00%
Comprobantes	**N°**	47.575	104.961	2.893.260	657.938	122.531	62.761	14.350	8.255	**3.911.631**
	%	1,22%	2,68%	73,97%	16,82%	3,13%	1,60%	0,37%	0,21%	100,00%
Pesos	**N°**	129.568.873	736.360.709	9.657.310.610	4.616.530.067	1.978.324.204	2.039.741.344	1.091.097.066	1.989.615.976	**22.238.548.847**
	%	0,58%	3,31%	43,43%	20,76%	8,90%	9,17%	4,91%	8,95%	100,00%

TOTAL DIRECCION REGIONAL SURESTE

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	35.429	45.973	131.260	24.848	4.863	2.409	614	326	**245.722**
	%	56,26%	68,41%	229,34%	34,21%	6,79%	3,51%	0,92%	0,58%	400,00%
Comprobantes	**N°**	135.147	324.227	8.972.958	1.909.115	339.203	173.961	45.767	23.056	**11.923.434**
	%	5,01%	11,73%	300,90%	61,77%	11,63%	6,34%	1,76%	0,86%	400,00%
Pesos	**N°**	427.372.442	2.158.107.138	32.199.402.392	14.440.454.837	5.814.122.928	6.324.382.707	3.716.235.545	6.564.359.422	**71.644.437.410**
	%	2,59%	12,59%	177,08%	77,37%	32,79%	37,16%	22,33%	38,09%	400,00%

(A) No incluye saldos de créditos por servicios a favor de usuarios por $

(*) Pueden existir diferencias en las sumatorias por el redondeo de decimales.

FORMATO Nº 372

IMPAGO VENCIDO POR RANGO DE DEUDA

AL 31/12/2025
EMISIÓN POR TODO CONCEPTO
DIRECCION REGIONAL SUROESTE (A) (*)

Distrito: Alte. Brown (003)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	9.077	10.306	27.287	1.815	428	193	40	13	**49.159**
	%	17,46%	19,09%	59,60%	2,84%	0,64%	0,28%	0,06%	0,03%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	25.578	79.090	1.733.588	130.564	28.056	13.720	2.868	797	**2.014.261**
	%	1,27%	3,93%	86,07%	6,48%	1,39%	0,68%	0,14%	0,04%	100,00%
Pesos	**Nº**	107.753.094	483.433.207	5.819.119.769	1.057.210.708	507.081.881	517.756.546	222.696.026	296.976.466	**9.012.027.696**
	%	1,20%	5,36%	64,57%	11,73%	5,63%	5,75%	2,47%	3,30%	100,00%

Distrito: Lomas de Zamora (076)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	17.815	16.493	52.372	2.415	660	331	84	42	**90.212**
	%	16,67%	14,71%	65,94%	1,85%	0,51%	0,23%	0,05%	0,03%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	63.216	163.743	4.412.525	168.992	41.534	21.528	4.883	3.173	**4.879.594**
	%	1,30%	3,36%	90,43%	3,46%	0,85%	0,44%	0,10%	0,07%	100,00%
Pesos	**Nº**	203.040.268	782.856.525	10.451.379.108	1.424.808.467	791.001.748	870.959.333	497.942.509	712.415.437	**15.734.403.394**
	%	1,29%	4,98%	66,42%	9,06%	5,03%	5,54%	3,16%	4,53%	100,00%

Distrito: Presidente Perón (129)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	861	1.087	11.823	954	126	46	5	1	**14.903**
	%	5,72%	7,21%	79,65%	6,25%	0,83%	0,30%	0,03%	0,01%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	2.937	12.305	866.725	77.209	8.777	3.282	165	16	**971.416**
	%	0,30%	1,27%	89,22%	7,95%	0,90%	0,34%	0,02%	0,00%	100,00%
Pesos	**Nº**	10.140.118	53.770.953	3.021.798.402	510.981.475	156.015.012	120.677.711	25.591.970	24.257.261	**3.923.232.903**
	%	0,26%	1,37%	77,02%	13,02%	3,98%	3,08%	0,65%	0,62%	100,00%

Distrito: Ezeiza (130)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	4.038	3.569	17.279	944	246	111	30	10	**26.227**
	%	15,36%	13,38%	66,59%	3,30%	0,85%	0,38%	0,11%	0,04%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	14.267	43.166	1.293.586	84.973	21.077	9.716	1.899	617	**1.469.301**
	%	0,97%	2,94%	88,04%	5,78%	1,43%	0,66%	0,13%	0,04%	100,00%
Pesos	**Nº**	44.993.502	174.034.294	3.488.429.175	535.794.062	294.126.714	287.227.577	183.719.185	236.794.425	**5.245.118.934**
	%	0,86%	3,32%	66,51%	10,22%	5,61%	5,48%	3,50%	4,51%	100,00%

Distrito: E. Echeverria (161)

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	8.068	8.238	30.626	2.086	594	216	45	23	**49.896**
	%	16,11%	15,33%	63,34%	3,70%	1,03%	0,38%	0,07%	0,04%	100,00%
Comprobantes	**Nº**	26.570	77.481	2.314.240	155.496	41.514	16.538	3.856	1.446	**2.637.141**
	%	1,01%	2,94%	87,76%	5,90%	1,57%	0,63%	0,15%	0,05%	100,00%
Pesos	**Nº**	91.744.175	394.686.552	6.642.288.031	1.206.615.855	711.093.693	562.302.403	256.101.539	650.609.817	**10.515.442.066**
	%	0,87%	3,75%	63,17%	11,47%	6,76%	5,35%	2,44%	6,19%	100,00%

TOTAL DIRECCION REGIONAL SUROESTE

		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**Nº**	39.859	39.693	139.387	8.214	2.054	897	204	89	**230.397**
	%	71,32%	69,72%	335,11%	17,94%	3,87%	1,57%	0,32%	0,14%	500,00%
Comprobantes	**Nº**	132.568	375.785	10.620.664	617.234	140.958	64.784	13.671	6.049	**11.971.713**
	%	4,85%	14,42%	441,51%	29,57%	6,16%	2,75%	0,53%	0,20%	500,00%
Pesos	**Nº**	457.671.157	1.888.781.531	29.423.014.485	4.735.410.566	2.459.319.048	2.358.923.570	1.186.051.228	1.921.053.407	**44.430.224.992**
	%	4,47%	18,78%	337,69%	55,50%	27,00%	25,18%	12,23%	19,14%	500,00%

(A) No incluye saldos de créditos por servicios a favor de usuarios por $

(*) Pueden existir diferencias en las sumatorias por el redondeo de decimales.

FORMATO N° 372

IMPAGO VENCIDO POR RANGO DE DEUDA

AL 31/12/2025

EMISION POR TODO CONCEPTO (A) (*)

Impago al 31/10/25 por Rango de deuda		< 22.000 $	de 22.000 a 88.000 $	de 88.000 a 440.000 $	de 440.000 a 880.000 $	de 880.000 a 1.760.000 $	de 1.760.000 a 4.400.000 $	de 4.400.000 a 8.800.000 $	> 8.800.000 $	TOTAL
Cuentas	**N°**	288.969	329.856	718.612	112.922	30.298	14.343	3.838	2.302	**1.501.140**
	%	16,49%	18,58%	54,22%	7,69%	1,87%	0,81%	0,21%	0,13%	100,00%
Comprobantes	**N°**	1.228.331	2.455.032	47.958.530	8.742.618	2.041.509	887.950	227.276	136.047	**63.677.293**
	%	1,93%	3,86%	75,31%	13,73%	3,21%	1,39%	0,36%	0,21%	100,00%
Pesos	**N°**	3.235.014.312	15.359.214.548	164.614.098.297	66.694.693.910	36.327.227.864	37.934.542.990	23.152.848.738	56.837.052.279	**404.154.692.938**
	%	0,80%	3,80%	40,73%	16,50%	8,99%	9,39%	5,73%	14,06%	100,00%

(A) No incluye saldos de créditos por servicios a favor de usuarios por $

(*) Pueden existir diferencias en las sumatorias por el redondeo de decimales.

FORMATO N° 373

CUENTAS A COBRAR A VENCER Y VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO Y ANTIGUEDAD DE LA DEUDA (1)

(EN $)

DISTRITO	A VENCER		VENCIDAS DIAS (2)																				TOTAL GRAL.	
			0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		>1080 dias		TOTAL VENCIDO			
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Alte. Brown (003)	1.695.450.071	1,33%	641.926.917	1,78%	562.852.619	1,96%	493.665.614	2,03%	480.677.174	2,27%	783.651.779	1,93%	1.302.008.314	2,26%	1.253.474.302	2,41%	2.687.828.545	2,48%	376.712.899	2,52%	360.826.653	2,41%	**8.943.624.815**	**2,24%**	**10.639.074.886**	**2,02%**
Avellaneda (006)	3.359.095.028	2,64%	1.010.053.154	2,79%	915.927.567	3,19%	841.812.607	3,46%	677.726.051	3,20%	1.381.801.916	3,40%	2.092.812.868	3,64%	1.933.170.064	3,71%	3.974.401.233	3,66%	581.980.143	3,89%	608.087.056	4,06%	**14.017.772.659**	**3,51%**	**17.376.867.687**	**3,30%**
Florencio Varela (032)	1.965.599.381	1,55%	1.254.205.819	3,47%	1.192.932.452	4,15%	1.050.335.053	4,32%	1.145.573.037	5,40%	1.864.489.562	4,59%	3.057.622.385	5,31%	3.446.050.134	6,62%	6.873.856.063	6,33%	795.873.903	5,31%	713.729.097	4,76%	**21.394.667.505**	**5,36%**	**23.360.266.886**	**4,44%**
Lanus (069)	3.195.993.951	2,52%	969.182.971	2,68%	833.612.389	2,90%	775.759.672	3,19%	766.438.766	3,62%	1.322.503.708	3,25%	2.017.615.634	3,50%	1.905.543.033	3,66%	3.945.098.105	3,63%	576.505.010	3,85%	592.212.467	3,95%	**13.704.471.755**	**3,43%**	**16.900.465.706**	**3,21%**
Merlo (072)	1.316.305.381	1,04%	737.751.822	2,04%	749.080.933	2,61%	632.027.227	2,60%	665.162.301	3,14%	1.182.834.990	2,91%	1.797.715.206	3,12%	1.891.263.318	3,63%	3.947.925.122	3,64%	464.875.384	3,10%	482.716.142	3,22%	**12.551.352.444**	**3,14%**	**13.867.657.826**	**2,63%**
Moreno (074)	1.437.464.614	1,13%	839.070.875	2,32%	776.545.318	2,70%	765.700.743	3,15%	742.118.765	3,50%	1.412.589.832	3,47%	2.055.624.924	3,57%	1.898.496.565	3,64%	4.677.309.650	4,31%	614.554.048	4,10%	626.966.884	4,18%	**14.408.977.604**	**3,61%**	**15.846.442.219**	**3,01%**
Lomas de Zamora (076)	3.415.069.062	2,69%	1.077.866.204	2,98%	938.771.086	3,27%	877.750.006	3,61%	836.898.241	3,95%	1.488.186.186	3,66%	2.183.402.991	3,79%	2.107.941.773	4,05%	4.670.224.440	4,30%	675.370.489	4,51%	717.639.170	4,79%	**15.574.050.585**	**3,90%**	**18.989.119.647**	**3,61%**
Morón (086)	4.607.787.318	3,63%	1.457.646.707	4,03%	1.198.803.233	4,17%	1.059.911.837	4,36%	1.033.647.143	4,88%	1.826.236.748	4,49%	2.753.251.144	4,78%	2.616.199.141	5,02%	5.531.227.303	5,09%	793.750.412	5,30%	606.373.965	4,05%	**18.877.047.632**	**4,73%**	**23.484.834.950**	**4,46%**
Centro (101)	13.217.783.290	10,40%	3.267.222.394	9,03%	1.872.648.680	6,52%	1.933.295.843	7,95%	1.513.426.659	7,14%	2.465.730.582	6,06%	3.507.849.983	6,09%	3.113.919.250	5,98%	6.284.287.453	5,79%	916.291.023	6,12%	763.697.521	5,09%	**25.638.369.389**	**6,42%**	**38.856.152.679**	**7,38%**
Caballito (102)	14.843.347.192	11,68%	3.039.646.545	8,40%	1.468.667.226	5,11%	1.543.254.759	6,35%	989.585.435	4,67%	1.590.051.420	3,91%	2.313.405.808	4,02%	1.947.151.442	3,74%	3.716.200.333	3,42%	532.970.805	3,56%	433.779.539	2,89%	**17.574.713.312**	**4,40%**	**32.418.060.504**	**6,16%**
Constitución (103)	2.441.983.334	1,92%	1.502.928.515	4,16%	390.695.981	1,36%	738.121.302	3,04%	313.471.340	1,48%	828.502.959	2,04%	2.261.694.523	3,93%	823.761.397	1,58%	1.730.946.185	1,59%	267.159.182	1,78%	280.530.349	1,87%	**9.137.811.733**	**2,29%**	**11.579.795.068**	**2,20%**
San Fernando (116)	1.456.488.051	1,15%	369.864.689	1,02%	311.506.167	1,08%	273.734.750	1,13%	243.223.345	1,15%	424.514.566	1,04%	628.895.664	1,09%	583.412.974	1,12%	1.200.160.666	1,11%	164.377.431	1,10%	163.674.997	1,09%	**4.363.365.249**	**1,09%**	**5.819.853.300**	**1,11%**
San Isidro (118)	4.171.132.367	3,28%	892.078.638	2,47%	702.699.518	2,45%	532.250.506	2,19%	544.534.826	2,57%	898.164.138	2,21%	1.426.010.314	2,48%	1.151.927.473	2,21%	1.912.731.910	1,76%	230.180.879	1,54%	202.892.832	1,35%	**8.493.471.034**	**2,13%**	**12.664.603.401**	**2,41%**
Presidente Perón (129)	293.320.563	0,23%	205.792.605	0,57%	199.197.363	0,69%	174.692.244	0,72%	191.762.367	0,90%	307.745.378	0,76%	528.052.503	0,92%	595.707.832	1,14%	1.337.879.689	1,23%	190.514.257	1,27%	185.827.188	1,24%	**3.917.171.426**	**0,98%**	**4.210.491.989**	**0,80%**
Ezeiza (130)	709.406.502	0,56%	296.628.604	0,82%	293.003.589	1,02%	261.650.144	1,08%	261.307.857	1,23%	509.197.826	1,25%	732.713.547	1,27%	740.646.997	1,42%	1.635.285.485	1,51%	243.589.063	1,63%	252.144.500	1,68%	**5.226.167.612**	**1,31%**	**5.935.574.114**	**1,13%**
San Miguel (131)	1.729.084.328	1,36%	1.584.747.377	4,38%	1.405.869.509	4,89%	1.354.844.854	5,57%	1.284.867.284	6,06%	2.418.121.292	5,95%	3.379.161.022	5,87%	3.088.313.116	5,93%	7.084.492.895	6,52%	721.275.563	4,82%	748.529.898	4,99%	**23.070.222.809**	**5,78%**	**24.799.307.138**	**4,71%**
Jose C. Paz (132)	70.655.153	0,06%	62.539.898	0,17%	61.420.320	0,21%	48.112.676	0,20%	59.215.983	0,28%	81.916.099	0,20%	160.987.785	0,28%	198.206.773	0,38%	400.224.049	0,37%	42.225.207	0,28%	51.237.159	0,34%	**1.166.085.950**	**0,29%**	**1.236.741.103**	**0,23%**
Malvinas Argentinas (133)	99.969.627	0,08%	74.476.656	0,21%	75.525.295	0,26%	57.634.015	0,24%	72.900.039	0,34%	99.550.949	0,24%	189.459.501	0,33%	235.313.297	0,45%	476.019.992	0,44%	40.801.082	0,27%	49.321.761	0,33%	**1.371.002.586**	**0,34%**	**1.470.972.213**	**0,28%**
Tigre (136)	3.954.613.765	3,11%	1.561.989.174	4,32%	902.223.436	3,14%	818.700.282	3,37%	788.668.330	3,72%	1.394.619.420	3,43%	1.988.814.294	3,45%	1.740.289.035	3,34%	3.485.655.505	3,21%	429.377.856	2,87%	329.929.050	2,20%	**13.440.266.382**	**3,37%**	**17.394.880.147**	**3,30%**
Vte. Lopez (141)	3.636.933.181	2,86%	676.971.929	1,87%	512.765.043	1,78%	390.459.046	1,61%	392.128.523	1,85%	603.797.209	1,49%	885.251.872	1,54%	758.955.949	1,46%	1.342.990.664	1,24%	177.164.303	1,18%	180.597.884	1,20%	**5.921.082.421**	**1,48%**	**9.558.015.602**	**1,82%**
San Martin (154)	3.744.287.071	2,95%	1.205.532.460	3,33%	1.076.373.080	3,75%	942.283.506	3,87%	869.334.999	4,10%	1.557.427.483	3,83%	2.107.937.337	3,66%	1.829.932.907	3,51%	3.866.248.719	3,56%	572.433.821	3,82%	586.982.424	3,92%	**14.614.486.737**	**3,66%**	**18.358.773.807**	**3,49%**
La Matanza Norte (155)	4.762.965.636	3,75%	1.512.053.519	4,18%	1.349.909.791	4,70%	1.123.538.453	4,62%	1.112.498.659	5,25%	1.931.398.062	4,75%	2.920.975.124	5,07%	2.680.722.731	5,15%	5.470.032.316	5,04%	786.925.249	5,25%	840.681.932	5,61%	**19.728.735.835**	**4,94%**	**24.491.701.471**	**4,65%**
Tres de Febrero (157)	2.824.843.635	2,22%	778.714.224	2,15%	609.145.408	2,12%	559.931.777	2,30%	517.259.141	2,44%	962.964.610	2,37%	1.293.085.153	2,25%	1.200.666.305	2,30%	2.653.622.163	2,44%	391.913.080	2,62%	430.975.344	2,88%	**9.398.277.205**	**2,35%**	**12.223.120.840**	**2,32%**
Pilar (159)	1.293.750.665	1,02%	449.750.707	1,24%	397.785.404	1,38%	294.684.097	1,21%	321.944.967	1,52%	525.148.443	1,29%	710.075.057	1,23%	669.692.716	1,29%	1.369.545.772	1,26%	145.619.907	0,97%	101.452.263	0,68%	**4.985.699.334**	**1,25%**	**6.279.449.998**	**1,19%**
La Matanza Oeste (160)	967.384.132	0,76%	707.420.864	1,96%	675.621.068	2,35%	661.487.093	2,72%	639.692.001	3,02%	1.155.776.244	2,84%	1.767.309.205	3,07%	1.798.725.968	3,45%	4.215.421.539	3,88%	674.070.016	4,50%	765.985.488	5,11%	**13.061.509.486**	**3,27%**	**14.028.893.619**	**2,67%**
Esteban Echeverria (161)	1.677.458.687	1,32%	756.237.483	2,09%	625.382.656	2,18%	567.208.835	2,33%	550.923.009	2,60%	1.010.592.735	2,49%	1.440.878.769	2,50%	1.367.065.676	2,62%	3.209.822.464	2,96%	467.839.534	3,12%	462.204.474	3,08%	**10.458.155.636**	**2,62%**	**12.135.614.323**	**2,31%**
La Matanza Sur (166)	2.073.452.032	1,63%	964.440.601	2,67%	861.595.230	3,00%	739.332.897	3,04%	685.900.701	3,24%	1.361.031.552	3,35%	1.976.138.318	3,43%	1.889.691.422	3,63%	4.073.914.411	3,75%	608.992.016	4,07%	692.430.550	4,62%	**13.853.467.699**	**3,47%**	**15.926.919.731**	**3,03%**
Devoto (201)	5.143.484.990	4,05%	1.049.864.351	2,90%	549.791.573	1,91%	558.075.885	2,29%	315.152.197	1,49%	546.113.726	1,34%	802.527.088	1,39%	606.788.694	1,16%	1.033.984.513	0,95%	127.237.401	0,85%	167.408.005	1,12%	**5.756.943.433**	**1,44%**	**10.900.428.422**	**2,07%**
Floresta (202)	6.568.687.161	5,17%	2.509.210.604	6,94%	995.120.488	3,46%	1.419.662.079	5,84%	786.082.505	3,71%	1.501.476.465	3,69%	2.815.219.558	4,89%	1.831.868.750	3,52%	3.730.270.247	3,44%	574.443.766	3,84%	578.228.282	3,86%	**16.741.582.745**	**4,19%**	**23.310.269.906**	**4,43%**
Saavedra (203)	11.533.213.183	9,08%	2.028.838.897	5,61%	711.806.233	2,48%	872.388.377	3,59%	460.416.457	2,17%	852.585.673	2,10%	1.435.337.465	2,49%	931.017.049	1,79%	1.584.645.251	1,46%	195.008.449	1,30%	299.468.151	2,00%	**9.371.512.002**	**2,35%**	**20.904.725.185**	**3,97%**
Quilmes (301)	4.430.172.113	3,49%	1.527.637.265	4,22%	1.301.650.928	4,53%	1.223.235.337	5,03%	1.155.070.365	5,45%	1.975.451.164	4,86%	2.926.966.181	5,08%	2.938.390.010	5,64%	6.884.926.302	6,34%	1.033.909.335	6,90%	1.070.146.503	7,14%	**22.037.383.392**	**5,52%**	**26.467.555.504**	**5,03%**
Escobar (314)	885.026.649	0,70%	301.830.285	0,83%	249.763.785	0,87%	221.862.855	0,91%	235.601.460	1,11%	392.919.587	0,97%	535.161.391	0,93%	452.407.559	0,87%	916.115.944	0,84%	112.567.801	0,75%	84.221.828	0,56%	**3.502.452.496**	**0,88%**	**4.387.479.145**	**0,83%**
Grandes Usuarios (888)	13.538.147.482	10,65%	850.699.550	2,35%	3.966.385.606	13,80%	509.853.049	2,10%	547.014.128	2,58%	4.001.150.918	9,84%	1.577.990.216	2,74%	1.867.570.861	3,58%	2.660.472.213	2,45%	448.316.235	2,99%	559.388.312	3,73%	**16.988.841.089**	**4,25%**	**30.526.988.571**	**5,80%**
TOTAL GENERAL	**127.060.355.597**	**100%**	**36.164.822.302**	**100%**	**28.735.078.976**	**100%**	**24.317.257.421**	**100%**	**21.200.224.055**	**100%**	**40.658.243.216**	**100%**	**57.571.951.145**	**100%**	**52.094.284.516**	**100%**	**108.583.767.140**	**100%**	**14.974.825.552**	**100%**	**14.990.287.667**	**100%**	**399.290.741.990**	**100%**	**526.351.097.587**	**100%**

(1) No incluye la venta devengada no facturada ni netea los anticipos de clientes e incluye la facturación emitida no devengada.
(2) La apertura por dias se hizo en funcion de la antiguedad de cada comprobante



CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: ALTE. BROWN (003)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	140.054.243	10,91%	27.959.082	2,48%	14.566.591	1,48%	17.902.940	1,86%	33.760.937	2,15%	142.595.239	5,48%	9.176.399	0,37%	11.200.141	0,21%	1.891.323	0,25%	1.176.631	0,16%	**400.283.526**	2,24%
Reclamo	236.969.421	18,46%	255.544.299	22,70%	212.973.602	21,57%	170.985.961	17,79%	283.300.618	18,08%	402.393.473	15,45%	394.433.472	15,73%	878.316.171	16,34%	116.327.112	15,44%	108.194.190	14,99%	**3.059.438.318**	17,10%
Accion Judicial	27.868.401	2,17%	26.992.337	2,40%	26.214.838	2,66%	29.668.227	3,09%	57.965.718	3,70%	83.819.439	3,22%	80.804.885	3,22%	198.509.818	3,69%	29.659.456	3,94%	25.139.419	3,48%	**586.642.537**	3,28%
Extra Judicial	164.966.455	12,85%	149.023.488	13,24%	134.996.899	13,67%	150.528.966	15,66%	217.919.103	13,90%	349.421.427	13,42%	340.586.529	13,59%	621.154.075	11,55%	68.720.785	9,12%	56.221.567	7,79%	**2.253.539.293**	12,60%
Suspension Accion Reclamo	13.522.258	1,05%	13.829.122	1,23%	12.807.227	1,30%	12.305.309	1,28%	20.188.852	1,29%	30.105.629	1,16%	26.970.716	1,08%	59.208.846	1,10%	7.248.256	0,96%	9.882.008	1,37%	**206.068.225**	1,15%
Corte de Servicio - Accion Judicial	18.936.348	1,47%	11.815.791	1,05%	10.505.420	1,06%	14.515.013	1,51%	26.511.021	1,69%	48.602.527	1,87%	57.501.468	2,29%	127.725.211	2,38%	21.947.720	2,91%	22.969.245	3,18%	**361.029.763**	2,02%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	22.114.039	1,72%	20.109.569	1,79%	21.413.852	2,17%	19.032.217	1,98%	38.085.408	2,43%	64.006.785	2,46%	52.627.266	2,10%	65.370.096	1,22%	6.432.710	0,85%	4.659.354	0,65%	**313.851.297**	1,75%
Barrio Carenciado	658.920.341	51,32%	619.228.766	55,01%	553.205.889	56,03%	545.775.134	56,77%	887.857.308	56,65%	1.477.007.304	56,72%	1.543.300.723	61,56%	3.410.165.925	63,44%	500.464.082	66,43%	492.221.866	68,21%	**10.688.147.339**	59,75%
Fiscal	502.330	0,04%	1.202.783	0,11%	646.909	0,07%	640.581	0,07%	1.714.591	0,11%	6.064.804	0,23%	1.547.146	0,06%	4.006.808	0,07%	734.356	0,10%	1.189.025	0,16%	**18.249.332**	0,10%
TOTAL GENERAL	**1.283.853.835**	**100,00%**	**1.125.705.238**	**100,00%**	**987.331.228**	**100,00%**	**961.354.348**	**100%**	**1.567.303.557**	**100%**	**2.604.016.627**	**100%**	**2.506.948.604**	**100%**	**5.375.657.090**	**100%**	**753.425.799**	**100%**	**721.653.306**	**100%**	**17.887.249.630**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailings extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.



CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: AVELLANEDA (006)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	92.460.959	9,15%	3.745.542	0,41%	-2.440.025	-0,29%	-2.996.842	-0,44%	-3.861.550	-0,28%	2.200.305	0,11%	3.585.800	0,19%	9.403.768	0,24%	1.790.315	0,31%	1.822.848	0,30%	**105.711.121**	0,75%
Reclamo	203.180.335	20,12%	209.582.303	22,88%	186.016.089	22,10%	146.518.378	21,62%	253.858.203	18,37%	361.319.802	17,26%	354.947.687	18,36%	759.831.807	19,12%	118.941.733	20,44%	112.644.504	18,52%	**2.706.840.841**	19,31%
Accion Judicial	29.449.175	2,92%	30.585.240	3,34%	28.641.212	3,40%	30.559.045	4,51%	62.366.310	4,51%	96.359.274	4,60%	102.104.052	5,28%	233.008.788	5,86%	40.639.923	6,98%	39.301.746	6,46%	**693.014.766**	4,94%
Extra Judicial	141.184.708	13,98%	126.482.177	13,81%	121.979.010	14,49%	126.895.742	18,72%	189.809.796	13,74%	313.834.318	15,00%	290.552.073	15,03%	500.954.076	12,60%	52.271.977	8,98%	39.946.847	6,57%	**1.903.910.724**	13,58%
Suspension Accion Reclamo	22.450.985	2,22%	25.972.554	2,84%	24.153.521	2,87%	21.580.618	3,18%	42.879.349	3,10%	63.491.199	3,03%	63.108.867	3,26%	115.474.279	2,91%	18.855.569	3,24%	21.797.727	3,58%	**419.764.668**	2,99%
Corte de Servicio - Accion Judicial	53.699.354	5,32%	53.257.619	5,81%	51.361.277	6,10%	58.241.843	8,59%	98.056.726	7,10%	174.373.957	8,33%	176.673.214	9,14%	453.637.181	11,41%	81.317.447	13,97%	89.405.903	14,70%	**1.290.024.521**	9,20%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	26.930.466	2,67%	23.817.153	2,60%	24.539.125	2,92%	26.140.487	3,86%	50.654.213	3,67%	71.641.138	3,42%	59.541.552	3,08%	91.769.837	2,31%	7.061.122	1,21%	4.241.655	0,70%	**386.336.747**	2,76%
Barrio Carenciado	311.401.036	30,83%	278.477.484	30,40%	268.736.407	31,92%	257.147.933	37,94%	502.026.851	36,33%	721.846.318	34,49%	693.988.815	35,90%	1.619.190.459	40,74%	249.169.818	42,81%	288.176.441	47,39%	**5.190.161.562**	37,03%
Fiscal	129.296.137	12,80%	164.007.494	17,91%	138.825.990	16,49%	13.638.847	2,01%	186.012.018	13,46%	287.746.557	13,75%	188.668.004	9,76%	191.131.038	4,81%	11.932.239	2,05%	10.749.385	1,77%	**1.322.007.709**	9,43%
TOTAL GENERAL	**1.010.053.154**	**100%**	**915.927.567**	**100%**	**841.812.607**	**100%**	**677.726.051**	**100%**	**1.381.801.916**	**100%**	**2.092.812.868**	**100%**	**1.933.170.064**	**100%**	**3.974.401.233**	**100%**	**581.980.143**	**100%**	**608.087.056**	**100%**	**14.017.772.659**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adiudicada a estudios iurídicos oara su oestión.
Extra Judicial: Deuda adiudicada a estudios iurídicos (extra-iudiciales) oara su oestión.
Susoensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interouestos oor los Usuarios v oor resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez aue se le reclama iudicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: LANUS (069)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	106.983.134	11,04%	-1.752.616	-0,21%	-3.915.677	-0,50%	4.615.443	0,60%	7.298.948	0,55%	11.571.733	0,57%	13.658.256	0,72%	22.334.418	0,57%	2.152.352	0,37%	1.898.476	0,32%	**164.844.468**	1,20%
Reclamo	264.217.001	27,26%	286.430.879	34,36%	244.464.192	31,51%	193.438.124	25,24%	327.515.457	24,76%	472.698.634	23,43%	439.034.415	23,04%	993.207.465	25,18%	148.841.725	25,82%	147.759.678	24,95%	**3.517.607.569**	25,67%
Accion Judicial	54.027.552	5,57%	53.509.707	6,42%	50.982.402	6,57%	65.227.858	8,51%	106.521.954	8,05%	187.744.260	9,31%	182.974.211	9,60%	356.247.605	9,03%	60.535.985	10,50%	60.599.251	10,23%	**1.178.370.784**	8,60%
Extra Judicial	183.491.898	18,93%	168.546.180	20,22%	163.689.786	21,10%	186.107.500	24,28%	273.836.714	20,71%	405.648.031	20,11%	389.571.217	20,44%	643.163.444	16,30%	66.474.925	11,53%	53.707.263	9,07%	**2.534.236.957**	18,49%
Suspension Accion Reclamo	12.824.985	1,32%	17.313.683	2,08%	18.026.228	2,32%	18.055.514	2,36%	34.653.646	2,62%	58.270.018	2,89%	44.522.811	2,34%	81.758.517	2,07%	11.792.771	2,05%	13.856.356	2,34%	**311.074.529**	2,27%
Corte de Servicio - Accion Judicial	43.261.925	4,46%	39.559.219	4,75%	40.190.254	5,18%	42.084.784	5,49%	74.203.994	5,61%	140.539.424	6,97%	171.148.538	8,98%	384.175.328	9,74%	72.762.868	12,62%	77.490.902	13,08%	**1.085.417.236**	7,92%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	23.565.055	2,43%	30.316.480	3,64%	23.426.842	3,02%	25.864.088	3,37%	53.573.868	4,05%	106.991.593	5,30%	67.060.623	3,52%	91.353.122	2,32%	9.039.241	1,57%	4.866.359	0,82%	**436.057.271**	3,18%
Barrio Carenciado	273.248.850	28,19%	239.426.627	28,72%	237.784.321	30,65%	230.629.743	30,09%	426.228.974	32,23%	624.667.469	30,96%	584.600.938	30,68%	1.360.206.862	34,48%	202.382.803	35,11%	229.516.667	38,76%	**4.408.693.254**	32,17%
Fiscal	7.562.570	0,78%	262.232	0,03%	1.111.324	0,14%	415.711	0,05%	18.670.154	1,41%	9.484.473	0,47%	12.972.023	0,68%	12.651.344	0,32%	2.522.339	0,44%	2.517.516	0,43%	**68.169.686**	0,50%
TOTAL GENERAL	**969.182.971**	**100%**	**833.612.389**	**100%**	**775.759.672**	**100%**	**766.438.766**	**100%**	**1.322.503.708**	**100%**	**2.017.615.634**	**100%**	**1.905.543.033**	**100%**	**3.945.098.105**	**100%**	**576.505.010**	**100%**	**592.212.467**	**100%**	**13.704.471.755**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailnos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos oara su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interouestos por los Usuarios v nor resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama iudicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: LOMAS DE ZAMORA (076)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	105.110.072	9,75%	5.149.856	0,55%	-11.386.589	-1,30%	503.392	0,06%	5.461.181	0,37%	1.232.144	0,06%	8.130.771	0,39%	7.178.210	0,15%	1.487.572	0,22%	763.527	0,11%	**123.630.136**	0,79%
Reclamo	208.819.564	19,37%	229.237.308	24,42%	199.626.722	22,74%	161.576.459	19,31%	283.508.544	19,05%	390.822.853	17,90%	367.708.044	17,44%	839.190.816	17,97%	123.900.749	18,35%	123.670.886	17,23%	**2.928.061.943**	18,80%
Accion Judicial	27.109.034	2,52%	25.475.295	2,71%	26.706.431	3,04%	25.180.545	3,01%	48.573.001	3,26%	76.017.756	3,48%	69.722.883	3,31%	173.369.387	3,71%	30.841.551	4,57%	40.495.177	5,64%	**543.491.059**	3,49%
Extra Judicial	162.574.073	15,08%	148.524.885	15,82%	144.164.845	16,42%	146.537.539	17,51%	221.436.235	14,88%	355.878.911	16,30%	329.550.361	15,63%	582.858.515	12,48%	59.986.198	8,88%	45.763.928	6,38%	**2.197.275.492**	14,11%
Suspension Accion Reclamo	14.055.588	1,30%	13.858.621	1,48%	15.229.471	1,74%	13.641.492	1,63%	22.304.390	1,50%	30.297.935	1,39%	30.214.670	1,43%	62.017.655	1,33%	9.942.759	1,47%	9.681.298	1,35%	**221.243.879**	1,42%
Corte de Servicio - Accion Judicial	12.225.939	1,13%	12.936.948	1,38%	11.067.194	1,26%	11.686.506	1,40%	25.367.116	1,70%	47.196.836	2,16%	45.047.797	2,14%	121.454.292	2,60%	23.830.956	3,53%	26.337.945	3,67%	**337.151.529**	2,16%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	32.766.589	3,04%	25.722.513	2,74%	26.654.273	3,04%	25.337.431	3,03%	33.842.555	2,27%	64.322.900	2,95%	52.828.143	2,51%	61.394.035	1,31%	3.706.703	0,55%	2.664.254	0,37%	**329.239.396**	2,11%
Barrio Carenciado	514.868.897	47,77%	476.417.409	50,75%	465.392.465	53,02%	452.434.877	54,06%	845.244.244	56,80%	1.240.166.077	56,80%	1.204.501.402	57,14%	2.821.511.886	60,41%	421.433.046	62,40%	468.051.094	65,22%	**8.910.021.396**	57,21%
Fiscal	336.448	0,03%	1.448.251	0,15%	295.193	0,03%	0	0,00%	2.448.918	0,16%	-22.532.420	-1,03%	237.703	0,01%	1.249.644	0,03%	240.954	0,04%	211.062	0,03%	**-16.064.247**	-0,10%
TOTAL GENERAL	**1.077.866.204**	**100%**	**938.771.086**	**100%**	**877.750.006**	**100%**	**836.898.241**	**100%**	**1.488.186.186**	**100%**	**2.183.402.991**	**100%**	**2.107.941.773**	**100%**	**4.670.224.440**	**100%**	**675.370.489**	**100%**	**717.639.170**	**100%**	**15.574.050.585**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: MORON (086)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	181.689.046	12,46%	1.398.701	0,12%	-14.292.105	-1,35%	-4.569.823	-0,44%	-9.883.122	-0,54%	-3.473.340	-0,13%	-9.527.293	-0,36%	-6.155.533	-0,11%	1.141.545	0,14%	1.980.012	0,33%	**138.308.088**	0,73%
Reclamo	464.711.610	31,88%	480.147.392	40,05%	400.294.160	37,77%	346.672.964	33,54%	599.061.745	32,80%	838.504.394	30,46%	819.644.904	31,33%	1.888.833.211	34,15%	287.260.895	36,19%	227.011.510	37,44%	**6.352.142.785**	33,65%
Accion Judicial	76.542.325	5,25%	72.709.552	6,07%	68.289.735	6,44%	81.434.369	7,88%	141.057.950	7,72%	236.374.959	8,59%	237.890.291	9,09%	543.319.332	9,82%	85.384.350	10,76%	68.013.762	11,22%	**1.611.016.627**	8,53%
Extra Judicial	395.755.653	27,15%	340.362.244	28,39%	331.820.488	31,31%	342.987.559	33,18%	556.260.406	30,46%	875.138.839	31,79%	817.383.371	31,24%	1.471.702.351	26,61%	164.604.394	20,74%	93.964.793	15,50%	**5.389.980.099**	28,55%
Suspension Accion Reclamo	26.558.155	1,82%	20.679.620	1,73%	20.652.805	1,95%	21.599.012	2,09%	40.552.493	2,22%	59.701.868	2,17%	53.977.112	2,06%	109.475.221	1,98%	16.988.348	2,14%	14.004.207	2,31%	**384.188.839**	2,04%
Corte de Servicio - Accion Judicial	32.555.962	2,23%	33.452.932	2,79%	32.993.558	3,11%	33.279.377	3,22%	70.452.456	3,86%	112.894.412	4,10%	113.610.962	4,34%	318.125.240	5,75%	67.516.361	8,51%	64.714.854	10,67%	**879.596.114**	4,66%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	40.051.677	2,75%	37.311.668	3,11%	36.758.661	3,47%	32.835.054	3,18%	72.075.091	3,95%	117.819.483	4,28%	85.873.677	3,28%	103.863.012	1,88%	7.819.720	0,99%	2.182.267	0,36%	**536.590.312**	2,84%
Barrio Carenciado	210.892.129	14,47%	196.831.759	16,42%	180.815.345	17,06%	175.928.325	17,02%	321.973.377	17,63%	490.998.002	17,83%	483.466.128	18,48%	1.075.206.300	19,44%	155.257.798	19,56%	129.061.036	21,28%	**3.420.430.197**	18,12%
Fiscal	28.890.150	1,98%	15.909.364	1,33%	2.579.189	0,24%	3.480.306	0,34%	34.686.352	1,90%	25.292.526	0,92%	13.879.990	0,53%	26.858.169	0,49%	7.777.001	0,98%	5.441.524	0,90%	**164.794.571**	0,87%
TOTAL GENERAL	**1.457.646.707**	**100%**	**1.198.803.233**	**100%**	**1.059.911.837**	**100%**	**1.033.647.143**	**100%**	**1.826.236.748**	**100%**	**2.753.251.144**	**100%**	**2.616.199.141**	**100%**	**5.531.227.303**	**100%**	**793.750.412**	**100%**	**606.373.965**	**100%**	**18.877.047.632**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspención Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y oor resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.



CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: CENTRO (101)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	577.312.211	17,67%	50.077.431	2,67%	-31.265.272	-1,62%	-3.414.830	-0,23%	1.380.032	0,06%	-38.063.393	-1,09%	16.266.671	0,52%	35.831.992	0,57%	6.493.895	0,71%	761.812	0,10%	**615.380.550**	2,40%
Reclamo	758.951.369	23,23%	836.951.762	44,69%	664.064.153	34,35%	521.169.243	34,44%	681.144.935	27,62%	937.720.065	26,73%	856.945.551	27,52%	1.997.722.512	31,79%	324.908.947	35,46%	288.418.891	37,77%	**7.867.997.428**	30,69%
Accion Judicial	229.497.787	7,02%	204.732.980	10,93%	194.959.043	10,08%	205.202.889	13,56%	394.968.579	16,02%	607.510.262	17,32%	631.534.993	20,28%	1.556.142.168	24,76%	291.281.557	31,79%	267.716.096	35,06%	**4.583.546.355**	17,88%
Extra Judicial	598.848.449	18,33%	540.359.616	28,86%	500.547.984	25,89%	508.686.084	33,61%	844.851.428	34,26%	1.177.894.386	33,58%	976.031.063	31,34%	1.617.372.585	25,74%	163.069.692	17,80%	95.102.799	12,45%	**7.022.764.085**	27,39%
Suspension Accion Reclamo	39.836.747	1,22%	29.169.333	1,56%	27.758.941	1,44%	28.371.401	1,87%	49.667.018	2,01%	79.440.077	2,26%	64.985.567	2,09%	109.845.125	1,75%	14.837.565	1,62%	9.430.969	1,23%	**453.342.743**	1,77%
Corte de Servicio - Accion Judicial	36.131.277	1,11%	35.552.754	1,90%	34.279.103	1,77%	38.129.609	2,52%	70.314.428	2,85%	126.984.628	3,62%	119.762.796	3,85%	288.282.358	4,59%	63.019.912	6,88%	74.420.433	9,74%	**886.877.299**	3,46%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	158.201.560	4,84%	143.419.836	7,66%	125.341.401	6,48%	172.905.671	11,42%	222.568.422	9,03%	253.920.087	7,24%	218.381.624	7,01%	211.340.212	3,36%	17.738.885	1,94%	5.060.635	0,66%	**1.528.878.333**	5,96%
Barrio Carenciado	19.597.459	0,60%	18.954.610	1,01%	16.369.746	0,85%	17.391.154	1,15%	26.974.881	1,09%	45.047.755	1,28%	38.456.722	1,23%	43.100.145	0,69%	4.711.811	0,51%	218.578	0,03%	**230.822.860**	0,90%
Fiscal	848.845.536	25,98%	13.430.357	0,72%	401.240.745	20,75%	24.985.437	1,65%	173.860.859	7,05%	317.396.116	9,05%	191.554.263	6,15%	424.650.357	6,76%	30.228.759	3,30%	22.567.307	2,96%	**2.448.759.737**	9,55%
TOTAL GENERAL	**3.267.222.394**	**100%**	**1.872.648.680**	**100%**	**1.933.295.843**	**100%**	**1.513.426.659**	**100%**	**2.465.730.582**	**100%**	**3.507.849.983**	**100%**	**3.113.919.250**	**100%**	**6.284.287.453**	**100%**	**916.291.023**	**100%**	**763.697.521**	**100%**	**25.638.369.389**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.



CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: CABALLITO (102)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	719.429.065	23,67%	43.333.226	2,95%	-28.283.408	-1,83%	-10.253.536	-1,04%	-6.562.656	-0,41%	-233.740	-0,01%	6.972.969	0,36%	-16.395.865	-0,44%	799.365	0,15%	2.289.089	0,53%	**711.094.510**	4,05%
Reclamo	669.557.403	22,03%	747.119.612	50,87%	596.244.244	38,64%	381.979.870	38,60%	545.075.419	34,28%	757.264.081	32,73%	638.697.279	32,80%	1.452.303.791	39,08%	244.938.348	45,96%	200.308.707	46,18%	**6.233.488.754**	35,47%
Accion Judicial	64.535.749	2,12%	61.870.595	4,21%	59.042.829	3,83%	59.885.516	6,05%	110.689.694	6,96%	195.454.385	8,45%	191.169.573	9,82%	461.378.664	12,42%	91.760.522	17,22%	88.751.324	20,46%	**1.384.538.852**	7,88%
Extra Judicial	495.194.782	16,29%	451.293.573	30,73%	420.028.778	27,22%	412.119.981	41,65%	655.131.492	41,20%	971.792.113	42,01%	766.709.150	39,38%	1.260.148.466	33,91%	129.908.475	24,37%	70.200.796	16,18%	**5.632.527.607**	32,05%
Suspension Accion Reclamo	54.038.748	1,78%	29.265.959	1,99%	28.719.232	1,86%	30.426.699	3,07%	44.362.059	2,79%	74.382.126	3,22%	63.825.183	3,28%	107.279.979	2,89%	14.393.269	2,70%	11.084.277	2,56%	**457.777.530**	2,60%
Corte de Servicio - Accion Judicial	22.277.937	0,73%	44.126.682	3,00%	24.502.537	1,59%	24.183.058	2,44%	43.822.361	2,76%	64.618.860	2,79%	64.904.097	3,33%	175.336.182	4,72%	35.290.921	6,62%	45.551.086	10,50%	**544.613.720**	3,10%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	129.292.969	4,25%	91.809.095	6,25%	92.084.087	5,97%	90.541.008	9,15%	176.935.129	11,13%	205.965.121	8,90%	196.124.977	10,07%	213.151.735	5,74%	6.697.016	1,26%	5.772.500	1,33%	**1.208.373.638**	6,88%
Barrio Carenciado	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Fiscal	885.319.891	29,13%	-151.515	-0,01%	350.916.460	22,74%	702.838	0,07%	20.597.922	1,30%	44.162.861	1,91%	18.748.214	0,96%	62.997.381	1,70%	9.182.889	1,72%	9.821.760	2,26%	**1.402.298.701**	7,98%
TOTAL GENERAL	**3.039.646.545**	**100%**	**1.468.667.226**	**100%**	**1.543.254.759**	**100%**	**989.585.435**	**100%**	**1.590.051.420**	**100%**	**2.313.405.808**	**100%**	**1.947.151.442**	**100%**	**3.716.200.333**	**100%**	**532.970.805**	**100%**	**433.779.539**	**100%**	**17.574.713.312**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez aue se le reclama iudicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente



CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: CONSTITUCION (103)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	104.637.087	6,96%	15.398.108	3,94%	-1.858.403	-0,25%	802.347	0,26%	974.922	0,12%	-2.440.972	-0,11%	6.700.130	0,81%	4.080.412	0,24%	2.137.292	0,80%	1.402.702	0,50%	**131.833.626**	1,44%
Reclamo	141.634.743	9,42%	151.589.351	38,80%	113.012.123	15,31%	92.209.523	29,42%	140.384.843	16,94%	184.868.044	8,17%	166.971.619	20,27%	345.574.259	19,96%	52.307.104	19,58%	53.704.949	19,14%	**1.442.256.558**	15,78%
Accion Judicial	79.563.848	5,29%	75.229.231	19,26%	73.087.033	9,90%	76.475.934	24,40%	148.030.541	17,87%	249.198.749	11,02%	257.670.025	31,28%	566.911.368	32,75%	93.336.207	34,94%	107.443.940	38,30%	**1.726.946.875**	18,90%
Extra Judicial	76.215.042	5,07%	71.700.683	18,35%	71.836.418	9,73%	77.627.188	24,76%	116.962.173	14,12%	161.199.329	7,13%	142.630.944	17,31%	238.003.343	13,75%	22.289.672	8,34%	15.624.763	5,57%	**994.089.556**	10,88%
Suspension Accion Reclamo	5.043.870	0,34%	16.528.913	4,23%	10.488.681	1,42%	10.885.534	3,47%	21.316.089	2,57%	25.713.820	1,14%	30.707.235	3,73%	49.284.149	2,85%	9.467.487	3,54%	9.174.223	3,27%	**188.610.002**	2,06%
Corte de Servicio - Accion Judicial	20.355.426	1,35%	20.821.601	5,33%	21.105.598	2,86%	23.136.755	7,38%	43.773.061	5,28%	82.863.617	3,66%	81.545.783	9,90%	188.380.246	10,88%	40.483.807	15,15%	43.104.944	15,37%	**565.570.838**	6,19%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	19.031.014	1,27%	20.307.754	5,20%	17.859.266	2,42%	18.160.128	5,79%	31.624.369	3,82%	64.469.444	2,85%	54.716.142	6,64%	69.289.686	4,00%	5.966.969	2,23%	4.146.330	1,48%	**305.571.103**	3,34%
Barrio Carenciado	14.121.075	0,94%	13.320.914	3,41%	12.610.231	1,71%	12.490.920	3,98%	23.024.582	2,78%	34.250.847	1,51%	31.857.263	3,87%	67.508.127	3,90%	9.254.316	3,46%	12.383.774	4,41%	**230.822.050**	2,53%
Fiscal	1.042.326.410	69,35%	5.799.424	1,48%	419.980.357	56,90%	1.683.012	0,54%	302.412.378	36,50%	1.461.571.646	64,62%	50.962.255	6,19%	201.914.594	11,66%	31.916.327	11,95%	33.544.724	11,96%	**3.552.111.127**	38,87%
TOTAL GENERAL	**1.502.928.515**	**100%**	**390.695.981**	**100%**	**738.121.302**	**100%**	**313.471.340**	**100%**	**828.502.959**	**100%**	**2.261.694.523**	**100%**	**823.761.397**	**100%**	**1.730.946.185**	**100%**	**267.159.182**	**100%**	**280.530.349**	**100%**	**9.137.811.733**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: SAN FERNANDO (116)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	44.281.188	11,97%	4.167.854	1,34%	-7.027.469	-2,57%	-3.637.425	-1,50%	-1.507.857	-0,36%	-740.941	-0,12%	1.830.249	0,31%	2.989.464	0,25%	314.475	0,19%	320.611	0,20%	**40.990.147**	0,94%
Reclamo	66.635.060	18,02%	73.775.572	23,68%	64.770.336	23,66%	36.744.748	15,11%	65.799.900	15,50%	84.841.992	13,49%	75.142.108	12,88%	165.887.837	13,82%	24.848.260	15,12%	25.976.929	15,87%	**684.422.740**	15,69%
Accion Judicial	10.263.989	2,78%	9.261.560	2,97%	8.617.399	3,15%	8.676.742	3,57%	16.900.182	3,98%	27.701.747	4,40%	27.190.699	4,66%	68.656.911	5,72%	9.326.573	5,67%	8.951.375	5,47%	**195.547.179**	4,48%
Extra Judicial	52.308.078	14,14%	48.954.508	15,72%	46.724.545	17,07%	49.726.798	20,44%	88.125.423	20,76%	123.198.850	19,59%	86.824.045	14,88%	127.771.989	10,65%	11.525.595	7,01%	9.208.792	5,63%	**644.368.622**	14,77%
Suspension Accion Reclamo	2.708.222	0,73%	2.549.439	0,82%	3.007.473	1,10%	2.553.125	1,05%	4.234.491	1,00%	5.449.855	0,87%	4.856.637	0,83%	15.571.007	1,30%	3.479.398	2,12%	3.536.633	2,16%	**47.946.281**	1,10%
Corte de Servicio - Accion Judicial	7.068.674	1,91%	6.713.303	2,16%	6.785.384	2,48%	6.541.332	2,69%	12.141.516	2,86%	17.972.014	2,86%	16.322.089	2,80%	59.720.542	4,98%	12.147.603	7,39%	10.602.491	6,48%	**156.014.948**	3,58%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	8.754.118	2,37%	14.332.277	4,60%	10.853.806	3,97%	8.791.046	3,61%	12.624.476	2,97%	20.292.905	3,23%	17.074.372	2,93%	23.516.698	1,96%	1.354.324	0,82%	795.953	0,49%	**118.389.974**	2,71%
Barrio Carenciado	177.716.462	48,05%	152.577.364	48,98%	139.468.608	50,95%	133.826.979	55,02%	226.094.289	53,26%	349.995.204	55,65%	354.160.900	60,71%	720.325.211	60,02%	101.365.093	61,67%	104.302.349	63,73%	**2.459.832.459**	56,37%
Fiscal	128.898	0,03%	-825.709	-0,27%	534.669	0,20%	0	0,00%	102.145	0,02%	184.039	0,03%	11.875	0,00%	15.721.006	1,31%	16.111	0,01%	-20.136	-0,01%	**15.852.898**	0,36%
TOTAL GENERAL	**369.864.689**	**100%**	**311.506.167**	**100%**	**273.734.750**	**100%**	**243.223.345**	**100%**	**424.514.566**	**100%**	**628.895.664**	**100%**	**583.412.974**	**100%**	**1.200.160.666**	**100%**	**164.377.431**	**100%**	**163.674.997**	**100%**	**4.363.365.249**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluyente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: SAN ISIDRO (118)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	220.354.801	24,70%	19.743.170	2,81%	-57.062.368	-10,72%	-30.096.742	-5,53%	-52.183.119	-5,81%	-34.795.659	-2,44%	-20.551.704	-1,78%	-13.286.430	-0,69%	500.472	0,22%	1.106.569	0,55%	**33.728.989**	0,40%
Reclamo	244.568.337	27,42%	263.624.152	37,52%	210.526.211	39,55%	153.207.644	28,14%	250.823.444	27,93%	324.873.702	22,78%	230.691.554	20,03%	396.334.665	20,72%	54.526.977	23,69%	52.516.240	25,88%	**2.181.692.926**	25,69%
Accion Judicial	38.673.699	4,34%	43.212.185	6,15%	37.893.362	7,12%	41.476.925	7,62%	77.999.700	8,68%	120.730.181	8,47%	112.005.669	9,72%	258.713.415	13,53%	40.899.228	17,77%	28.038.010	13,82%	**799.642.373**	9,41%
Extra Judicial	174.941.720	19,61%	158.046.679	22,49%	151.327.104	28,43%	168.175.598	30,88%	247.342.726	27,54%	395.731.663	27,75%	285.705.560	24,80%	330.321.773	17,27%	28.958.688	12,58%	19.058.580	9,39%	**1.959.610.093**	23,07%
Suspension Accion Reclamo	17.343.924	1,94%	20.181.071	2,87%	18.447.674	3,47%	19.887.863	3,65%	41.078.356	4,57%	71.954.644	5,05%	46.725.725	4,06%	74.635.293	3,90%	9.009.000	3,91%	6.432.405	3,17%	**325.695.955**	3,83%
Corte de Servicio - Accion Judicial	21.050.388	2,36%	21.039.611	2,99%	21.288.731	4,00%	24.589.529	4,52%	50.592.486	5,63%	82.137.903	5,76%	71.414.531	6,20%	164.927.686	8,62%	24.099.177	10,47%	24.335.996	11,99%	**505.476.036**	5,95%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	35.165.154	3,94%	37.879.447	5,39%	35.059.173	6,59%	36.417.992	6,69%	71.618.355	7,97%	116.039.482	8,14%	59.650.533	5,18%	69.905.049	3,65%	3.514.788	1,53%	1.685.400	0,83%	**466.935.373**	5,50%
Barrio Carenciado	142.296.942	15,95%	140.197.520	19,95%	113.458.159	21,32%	130.804.459	24,02%	208.393.376	23,20%	344.538.566	24,16%	364.652.833	31,66%	627.758.438	32,82%	66.787.602	29,02%	68.273.166	33,65%	**2.207.161.061**	25,99%
Fiscal	-2.316.329	-0,26%	-1.224.317	-0,17%	1.312.461	0,25%	71.558	0,01%	2.498.814	0,28%	4.799.832	0,34%	1.632.773	0,14%	3.422.022	0,18%	1.884.947	0,82%	1.446.468	0,71%	**13.528.228**	0,16%
TOTAL GENERAL	**892.078.638**	**100%**	**702.699.518**	**100%**	**532.250.506**	**100%**	**544.534.826**	**100%**	**898.164.138**	**100%**	**1.426.010.314**	**100%**	**1.151.927.473**	**100%**	**1.912.731.910**	**100%**	**230.180.879**	**100%**	**202.892.832**	**100%**	**8.493.471.034**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluyente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

FORMATO 574

Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluyente

Distrito: EZEIZA (130)

Situacion Comprobante	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	2.423.270	0,82%	-166.468	-0,06%	98.471	0,04%	-139.726	-0,05%	318.297	0,06%	559.118	0,08%	-510.929	-0,07%	1.189.682	0,07%	39.750	0,02%	13.096	0,01%	**3.824.560**	0,07%
Reclamo	19.117.180	6,44%	20.753.099	7,08%	17.188.588	6,57%	25.577.228	9,79%	34.906.008	6,86%	42.422.843	5,79%	41.142.799	5,55%	87.835.536	5,37%	12.806.515	5,26%	10.527.915	4,18%	**312.277.710**	5,98%
Accion Judicial	3.646.626	1,23%	3.528.939	1,20%	3.259.229	1,25%	3.470.059	1,33%	6.988.390	1,37%	10.135.804	1,38%	9.510.586	1,28%	23.875.300	1,46%	3.625.118	1,49%	3.729.307	1,48%	**71.769.358**	1,37%
Extra Judicial	11.310.039	3,81%	12.208.350	4,17%	10.708.107	4,09%	12.557.245	4,81%	21.988.323	4,32%	30.952.364	4,22%	29.585.415	3,99%	65.108.404	3,98%	8.026.470	3,30%	4.151.005	1,65%	**206.595.723**	3,95%
Suspension Accion Reclamo	1.882.467	0,63%	1.863.844	0,64%	1.801.079	0,69%	1.732.897	0,66%	3.396.464	0,67%	5.223.399	0,71%	17.735.042	2,39%	3.779.807	0,23%	619.144	0,25%	115.542	0,05%	**38.149.685**	0,73%
Corte de Servicio - Accion Judicial	241.395	0,08%	147.682	0,05%	147.682	0,06%	252.577	0,10%	463.862	0,09%	659.473	0,09%	555.795	0,08%	1.137.314	0,07%	109.078	0,04%	12.972	0,01%	**3.727.830**	0,07%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	1.622.291	0,55%	1.763.184	0,60%	1.705.700	0,65%	2.237.408	0,86%	3.090.946	0,61%	15.214.507	2,08%	6.486.700	0,88%	12.868.506	0,79%	122.557	0,05%	101.834	0,04%	**45.213.633**	0,87%
Barrio Carenciado	256.366.881	86,43%	240.490.182	82,08%	225.764.499	86,28%	214.563.332	82,11%	412.170.400	80,95%	614.449.141	83,86%	613.387.735	82,82%	1.424.090.774	87,09%	217.833.561	89,43%	233.112.856	92,45%	**4.452.229.361**	85,19%
Fiscal	18.454	0,01%	12.414.777	4,24%	976.790	0,37%	1.056.838	0,40%	25.875.136	5,08%	13.096.899	1,79%	22.753.854	3,07%	15.400.161	0,94%	406.872	0,17%	379.974	0,15%	**92.379.753**	1,77%
TOTAL GENERAL	**296.628.604**	**100%**	**293.003.589**	**100%**	**261.650.144**	**100%**	**261.307.857**	**100%**	**509.197.826**	**100%**	**732.713.547**	**100%**	**740.646.997**	**100%**	**1.635.285.485**	**100%**	**243.589.063**	**100%**	**252.144.500**	**100%**	**5.226.167.612**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante malinos extraiudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluyente

Distrito: SAN MIGUEL (131)

Situacion Comprobante	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	146.237.136	9,23%	19.423.476	1,38%	-832.688	-0,06%	-4.892.667	-0,38%	-1.647.377	-0,07%	1.887.632	0,06%	-540.328	-0,02%	-4.905.975	-0,07%	-54.441	-0,01%	183.272	0,02%	**154.858.040**	0,67%
Reclamo	962.444.930	60,73%	922.018.354	65,58%	922.650.223	68,10%	850.293.179	66,18%	1.626.528.593	67,26%	2.282.452.482	67,54%	2.044.987.171	66,22%	4.601.292.146	64,95%	447.969.404	62,11%	488.839.958	65,31%	**15.149.476.439**	65,67%
Accion Judicial	172.906.330	10,91%	177.214.540	12,61%	153.442.211	11,33%	156.863.173	12,21%	308.286.766	12,75%	431.252.656	12,76%	427.491.137	13,84%	1.091.103.702	15,40%	111.145.758	15,41%	95.324.530	12,73%	**3.125.030.805**	13,55%
Extra Judicial	193.529.747	12,21%	179.580.726	12,77%	178.297.108	13,16%	172.744.162	13,44%	316.188.877	13,08%	427.542.538	12,65%	388.149.077	12,57%	899.055.640	12,69%	116.177.874	16,11%	110.762.529	14,80%	**2.982.028.276**	12,93%
Suspension Accion Reclamo	12.501.475	0,79%	15.810.612	1,12%	17.003.475	1,26%	14.458.639	1,13%	25.744.217	1,06%	28.832.538	0,85%	25.099.139	0,81%	62.086.726	0,88%	3.934.859	0,55%	4.054.333	0,54%	**209.526.014**	0,91%
Corte de Servicio - Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	25.428.836	1,60%	18.759.385	1,33%	24.832.898	1,83%	41.696.797	3,25%	43.144.851	1,78%	64.988.465	1,92%	58.719.313	1,90%	102.538.452	1,45%	3.483.108	0,48%	2.140.592	0,29%	**385.732.697**	1,67%
Barrio Carenciado	69.449.659	4,38%	66.729.163	4,75%	46.950.283	3,47%	46.499.016	3,62%	90.154.811	3,73%	129.646.931	3,84%	123.333.584	3,99%	304.062.709	4,29%	36.410.950	5,05%	45.400.377	6,07%	**958.637.483**	4,16%
Fiscal	2.249.265	0,14%	6.333.253	0,45%	12.501.344	0,92%	7.204.985	0,56%	9.720.552	0,40%	12.557.780	0,37%	21.074.025	0,68%	29.259.494	0,41%	2.208.050	0,31%	1.824.307	0,24%	**104.933.055**	0,45%
TOTAL GENERAL	**1.584.747.377**	**100%**	**1.405.869.509**	**100%**	**1.354.844.854**	**100%**	**1.284.867.284**	**100%**	**2.418.121.292**	**100%**	**3.379.161.022**	**100%**	**3.088.313.116**	**100%**	**7.084.492.895**	**100%**	**721.275.563**	**100%**	**748.529.898**	**100%**	**23.070.222.809**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante malinos extraiudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluyente

Distrito: JOSE C. PAZ (132)

Situacion Comprobante	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	464.354	0,74%	-110.443	-0,18%	3.086	0,01%	-143.566	-0,24%	-39.196	-0,05%	-1.640	0,00%	14.590	0,01%	38.463	0,01%	8.945	0,02%	7.079	0,01%	**241.672**	0,02%
Reclamo	57.192.671	91,45%	56.960.633	92,74%	44.244.577	91,96%	54.807.848	92,56%	75.780.006	92,51%	148.810.772	92,44%	185.644.028	93,66%	376.600.671	94,10%	39.559.017	93,69%	47.933.148	93,55%	**1.087.533.372**	93,26%
Accion Judicial	69.318	0,11%	68.631	0,11%	67.974	0,14%	67.301	0,11%	66.657	0,08%	196.791	0,12%	192.206	0,10%	534.347	0,13%	92.599	0,22%	91.202	0,18%	**1.447.026**	0,12%
Extra Judicial	4.212.977	6,74%	4.053.374	6,60%	3.425.333	7,12%	4.022.780	6,79%	5.343.675	6,52%	10.325.989	6,41%	11.084.943	5,59%	20.728.150	5,18%	2.347.223	5,56%	2.974.950	5,81%	**68.519.395**	5,88%
Suspension Accion Reclamo	429.154	0,69%	384.995	0,63%	242.727	0,50%	375.807	0,63%	542.579	0,66%	856.744	0,53%	925.528	0,47%	1.980.819	0,49%	198.730	0,47%	230.780	0,45%	**6.167.863**	0,53%
Corte de Servicio - Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	90.064	0,14%	63.130	0,10%	49.223	0,10%	85.813	0,14%	144.193	0,18%	646.736	0,40%	271.495	0,14%	230.591	0,06%	0	0,00%	0	0,00%	**1.581.245**	0,14%
Barrio Carenciado	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Fiscal	81.360	0,13%	0	0,00%	79.757	0,17%	0	0,00%	78.185	0,10%	152.393	0,09%	73.983	0,04%	111.007	0,03%	18.692	0,04%	0	0,00%	**595.377**	0,05%
TOTAL GENERAL	**62.539.898**	**100%**	**61.420.320**	**100%**	**48.112.676**	**100%**	**59.215.983**	**100%**	**81.916.099**	**100%**	**160.987.785**	**100%**	**198.206.773**	**100%**	**400.224.049**	**100%**	**42.225.207**	**100%**	**51.237.159**	**100%**	**1.166.085.950**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante malinos extraiudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: TIGRE (136)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	113.070.721	7,24%	1.613.296	0,18%	-4.591.413	-0,56%	-4.079.441	-0,52%	-6.598.803	-0,47%	3.843.331	0,19%	3.862.852	0,22%	4.725.278	0,14%	302.503	0,07%	783.578	0,24%	**112.931.902**	0,84%
Reclamo	736.233.971	47,13%	210.431.563	23,32%	210.007.202	25,65%	158.451.372	20,09%	318.288.104	22,82%	380.787.568	19,15%	320.021.872	18,39%	707.130.431	20,29%	82.431.484	19,20%	57.084.956	17,30%	**3.180.868.524**	23,67%
Accion Judicial	89.316.669	5,72%	86.610.557	9,60%	94.556.148	11,55%	87.899.118	11,15%	174.564.861	12,52%	260.911.217	13,12%	251.622.580	14,46%	608.297.490	17,45%	95.565.456	22,26%	51.696.534	15,67%	**1.801.040.628**	13,40%
Extra Judicial	206.237.261	13,20%	194.468.779	21,55%	183.516.965	22,42%	215.401.623	27,31%	340.866.308	24,44%	508.284.695	25,56%	425.066.448	24,43%	631.701.875	18,12%	50.903.468	11,86%	23.106.158	7,00%	**2.779.553.581**	20,68%
Suspension Accion Reclamo	67.010.237	4,29%	65.730.748	7,29%	13.755.705	1,68%	14.083.133	1,79%	21.460.840	1,54%	29.489.618	1,48%	21.838.894	1,25%	45.013.656	1,29%	6.453.434	1,50%	6.353.584	1,93%	**291.189.848**	2,17%
Corte de Servicio - Accion Judicial	12.190.663	0,78%	19.174.497	2,13%	19.765.592	2,41%	19.946.490	2,53%	38.571.032	2,77%	62.477.916	3,14%	55.627.324	3,20%	152.522.238	4,38%	23.190.759	5,40%	20.136.660	6,10%	**423.603.172**	3,15%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	18.874.930	1,21%	32.389.799	3,59%	20.154.266	2,46%	26.615.374	3,37%	26.568.040	1,91%	44.401.620	2,23%	30.133.079	1,73%	29.472.116	0,85%	2.142.603	0,50%	951.408	0,29%	**231.703.235**	1,72%
Barrio Carenciado	315.613.479	20,21%	287.058.089	31,82%	277.297.244	33,87%	266.351.229	33,77%	479.694.923	34,40%	698.217.393	35,11%	631.571.455	36,29%	1.306.023.418	37,47%	168.068.402	39,14%	169.726.319	51,44%	**4.599.621.951**	34,22%
Fiscal	3.441.243	0,22%	4.746.108	0,53%	4.238.573	0,52%	3.999.433	0,51%	1.204.115	0,09%	400.935	0,02%	544.531	0,03%	769.003	0,02%	319.746	0,07%	89.853	0,03%	**19.753.541**	0,15%
TOTAL GENERAL	**1.561.989.174**	**100%**	**902.223.436**	**100%**	**818.700.282**	**100%**	**788.668.330**	**100%**	**1.394.619.420**	**100%**	**1.988.814.294**	**100%**	**1.740.289.035**	**100%**	**3.485.655.505**	**100%**	**429.377.856**	**100%**	**329.929.050**	**100%**	**13.440.266.382**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: VTE. LOPEZ (141)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	163.530.172	24,16%	-1.852.045	-0,36%	-28.306.372	-7,25%	-11.776.216	-3,00%	-20.712.746	-3,43%	-14.854.042	-1,68%	-3.218.504	-0,42%	-13.331.724	-0,99%	-230.165	-0,13%	358.636	0,20%	**69.606.994**	1,18%
Reclamo	223.530.826	33,02%	249.269.135	48,61%	173.666.628	44,48%	129.407.723	33,00%	201.766.304	33,42%	245.563.887	27,74%	197.185.969	25,98%	398.287.566	29,66%	59.303.893	33,47%	60.298.347	33,44%	**1.938.280.279**	32,74%
Accion Judicial	37.178.721	5,49%	35.447.322	6,91%	34.476.995	8,83%	35.012.259	8,93%	53.946.568	8,93%	101.507.825	11,47%	102.919.906	13,56%	229.112.355	17,06%	32.533.523	18,36%	30.556.820	16,95%	**692.692.296**	11,70%
Extra Judicial	154.256.362	22,79%	132.633.817	25,87%	121.086.437	31,01%	144.047.519	36,73%	190.429.621	31,54%	282.222.564	31,88%	220.675.426	29,08%	302.014.601	22,49%	26.609.192	15,02%	21.241.689	11,78%	**1.595.217.226**	26,94%
Suspension Accion Reclamo	16.962.678	2,51%	16.209.732	3,16%	14.962.717	3,83%	14.480.135	3,69%	27.774.810	4,60%	44.217.983	4,99%	38.567.284	5,08%	59.854.119	4,46%	7.604.003	4,29%	8.467.688	4,70%	**249.101.150**	4,21%
Corte de Servicio - Accion Judicial	22.451.378	3,32%	23.547.405	4,59%	28.911.108	7,40%	29.049.848	7,41%	52.997.150	8,78%	81.948.166	9,26%	81.796.670	10,78%	186.771.470	13,91%	30.400.642	17,16%	33.928.830	18,82%	**571.802.665**	9,66%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	37.347.539	5,52%	28.426.355	5,54%	29.213.206	7,48%	28.193.471	7,19%	53.175.601	8,81%	83.689.987	9,45%	54.353.961	7,16%	65.278.053	4,86%	3.451.867	1,95%	1.925.888	1,07%	**385.055.927**	6,50%
Barrio Carenciado	21.550.261	3,18%	21.337.120	4,16%	16.287.569	4,17%	20.131.360	5,13%	33.764.747	5,59%	53.833.299	6,08%	52.564.505	6,93%	104.637.688	7,79%	16.623.820	9,38%	23.251.198	12,89%	**363.981.568**	6,15%
Fiscal	163.991	0,02%	7.746.203	1,51%	160.760	0,04%	3.582.424	0,91%	10.655.153	1,76%	7.122.202	0,80%	14.110.733	1,86%	10.366.535	0,77%	867.528	0,49%	293.313	0,16%	**55.068.842**	0,93%
TOTAL GENERAL	**676.971.929**	**100%**	**512.765.043**	**100%**	**390.459.046**	**100%**	**392.128.523**	**100%**	**603.797.209**	**100%**	**885.251.872**	**100%**	**758.955.949**	**100%**	**1.342.990.664**	**100%**	**177.164.303**	**100%**	**180.322.410**	**100%**	**5.920.806.947**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez aue se le reclama iudicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: SAN MARTIN (154)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	173.094.434	14,36%	2.849.547	0,26%	-8.309.853	-0,88%	-6.785.329	-0,78%	-2.749.501	-0,18%	8.050.298	0,38%	-2.127.741	-0,12%	12.206.370	0,32%	1.453.961	0,25%	778.253	0,13%	**178.460.438**	1,22%
Reclamo	367.491.687	30,48%	377.009.121	35,03%	342.873.901	36,39%	251.365.010	28,91%	462.763.589	29,71%	530.704.198	25,18%	441.020.214	24,10%	1.002.399.849	25,93%	151.395.107	26,45%	159.407.241	27,16%	**4.086.429.918**	27,96%
Accion Judicial	67.054.564	5,56%	66.808.671	6,21%	66.264.774	7,03%	67.516.978	7,77%	140.464.910	9,02%	214.318.420	10,17%	206.046.851	11,26%	437.465.079	11,31%	75.852.984	13,25%	78.477.797	13,37%	**1.420.271.028**	9,72%
Extra Judicial	239.493.501	19,87%	212.833.558	19,77%	210.966.529	22,39%	225.192.728	25,90%	363.372.451	23,33%	482.337.852	22,88%	356.004.637	19,45%	634.067.354	16,40%	66.834.982	11,68%	57.519.469	9,80%	**2.848.623.061**	19,49%
Suspension Accion Reclamo	29.749.446	2,47%	26.881.450	2,50%	30.312.363	3,22%	28.629.085	3,29%	42.220.030	2,71%	52.135.568	2,47%	38.743.082	2,12%	82.406.329	2,13%	15.342.732	2,68%	18.974.205	3,23%	**365.394.290**	2,50%
Corte de Servicio - Accion Judicial	51.694.513	4,29%	53.550.613	4,98%	57.252.403	6,08%	58.925.893	6,78%	114.336.670	7,34%	171.634.167	8,14%	173.010.613	9,45%	395.728.018	10,24%	66.999.754	11,70%	84.045.499	14,32%	**1.227.178.141**	8,40%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	39.599.132	3,28%	41.841.426	3,89%	43.994.501	4,67%	44.913.896	5,17%	78.337.915	5,03%	95.119.482	4,51%	71.784.724	3,92%	91.051.202	2,36%	6.767.158	1,18%	4.420.738	0,75%	**517.830.174**	3,54%
Barrio Carenciado	225.813.671	18,73%	211.423.965	19,64%	192.872.096	20,47%	198.700.781	22,86%	351.562.841	22,57%	550.389.490	26,11%	539.451.029	29,48%	1.205.945.285	31,19%	185.939.192	32,48%	179.608.481	30,60%	**3.841.706.831**	26,29%
Fiscal	11.541.513	0,96%	83.174.728	7,73%	6.056.792	0,64%	875.959	0,10%	7.118.577	0,46%	3.247.863	0,15%	5.999.498	0,33%	4.979.233	0,13%	1.847.952	0,32%	3.750.741	0,64%	**128.592.857**	0,88%
TOTAL GENERAL	**1.205.532.460**	**100%**	**1.076.373.080**	**100%**	**942.283.506**	**100%**	**869.334.999**	**100%**	**1.557.427.483**	**100%**	**2.107.937.337**	**100%**	**1.829.932.907**	**100%**	**3.866.248.719**	**100%**	**572.433.821**	**100%**	**586.982.424**	**100%**	**14.614.486.737**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado, a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente



CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: LA MATANZA NORTE (155)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	138.935.645	9,19%	-7.284.439	-0,54%	-20.649.900	-1,84%	-12.686.437	-1,14%	-16.026.930	-0,83%	-19.037.666	-0,65%	-7.959.047	-0,30%	-7.609.162	-0,14%	959.387	0,12%	1.214.962	0,14%	**49.856.412**	0,25%
Reclamo	266.685.358	17,64%	282.642.229	20,94%	219.971.782	19,58%	184.491.616	16,58%	299.613.514	15,51%	400.781.645	13,72%	344.189.363	12,84%	699.328.073	12,78%	108.221.791	13,75%	106.922.576	12,72%	**2.912.847.947**	14,76%
Accion Judicial	76.600.549	5,07%	74.117.766	5,49%	73.741.446	6,56%	78.729.776	7,08%	140.979.051	7,30%	248.724.734	8,52%	248.515.137	9,27%	517.075.469	9,45%	82.031.460	10,42%	96.108.540	11,43%	**1.636.623.928**	8,30%
Extra Judicial	208.321.569	13,78%	191.695.114	14,20%	178.988.575	15,93%	201.035.118	18,07%	309.337.124	16,02%	471.854.077	16,15%	409.328.872	15,27%	631.257.078	11,54%	63.507.515	8,07%	51.015.348	6,07%	**2.716.340.391**	13,77%
Suspension Accion Reclamo	29.369.619	1,94%	22.935.765	1,70%	22.223.363	1,98%	22.274.067	2,00%	35.320.934	1,83%	59.645.248	2,04%	56.639.571	2,11%	103.537.418	1,89%	16.007.248	2,03%	17.576.923	2,09%	**385.530.157**	1,95%
Corte de Servicio - Accion Judicial	28.006.204	1,85%	28.849.007	2,14%	29.445.232	2,62%	32.738.276	2,94%	60.262.684	3,12%	103.152.179	3,53%	103.767.980	3,87%	261.375.125	4,78%	52.728.467	6,70%	63.983.402	7,61%	**764.308.557**	3,87%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	32.458.785	2,15%	27.069.208	2,01%	29.434.103	2,62%	28.593.588	2,57%	54.633.379	2,83%	83.919.541	2,87%	67.283.228	2,51%	83.449.639	1,53%	5.314.836	0,68%	2.998.608	0,36%	**415.154.916**	2,10%
Barrio Carenciado	725.370.980	47,97%	628.201.465	46,54%	590.239.882	52,53%	577.171.776	51,88%	1.027.197.379	53,18%	1.545.263.179	52,90%	1.450.444.431	54,11%	3.159.308.420	57,76%	454.839.838	57,80%	496.381.641	59,05%	**10.654.418.991**	54,00%
Fiscal	6.304.809	0,42%	101.683.676	7,53%	143.969	0,01%	150.879	0,01%	20.080.926	1,04%	26.672.185	0,91%	8.513.197	0,32%	22.310.256	0,41%	3.314.706	0,42%	4.479.933	0,53%	**193.654.536**	0,98%
TOTAL GENERAL	**1.512.053.519**	**100%**	**1.349.909.791**	**100%**	**1.123.538.453**	**100%**	**1.112.498.659**	**100%**	**1.931.398.062**	**100%**	**2.920.975.124**	**100%**	**2.680.722.731**	**100%**	**5.470.032.316**	**100%**	**786.925.249**	**100%**	**840.681.932**	**100%**	**19.728.735.835**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez aue se le reclama iudicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente



CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: TRES DE FEBRERO (157)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	97.614.939	12,54%	1.319.345	0,22%	-4.267.843	-0,76%	-3.522.022	-0,68%	-1.155.765	-0,12%	-2.916.556	-0,23%	-3.821.752	-0,32%	2.783.199	0,10%	400.749	0,10%	906.391	0,21%	**87.340.685**	0,93%
Reclamo	180.587.147	23,19%	189.013.375	31,03%	157.304.742	28,09%	127.539.043	24,66%	239.713.095	24,89%	284.791.257	22,02%	263.683.282	21,96%	598.876.207	22,57%	92.551.420	23,62%	94.597.850	21,95%	**2.228.657.417**	23,71%
Accion Judicial	23.383.109	3,00%	21.029.884	3,45%	21.853.659	3,90%	22.478.397	4,35%	43.856.749	4,55%	72.338.561	5,59%	66.404.260	5,53%	151.075.534	5,69%	26.402.881	6,74%	23.521.052	5,46%	**472.344.087**	5,03%
Extra Judicial	117.350.505	15,07%	107.125.636	17,59%	104.466.644	18,66%	106.501.745	20,59%	176.604.684	18,34%	251.101.046	19,42%	223.336.852	18,60%	398.588.444	15,02%	41.336.029	10,55%	34.804.011	8,08%	**1.561.215.595**	16,61%
Suspension Accion Reclamo	9.098.237	1,17%	11.519.748	1,89%	11.029.605	1,97%	9.973.638	1,93%	18.155.235	1,89%	26.642.519	2,06%	22.707.943	1,89%	47.472.032	1,79%	5.805.950	1,48%	6.820.008	1,58%	**169.224.915**	1,80%
Corte de Servicio - Accion Judicial	10.821.909	1,39%	10.822.445	1,78%	10.261.855	1,83%	10.247.240	1,98%	21.240.303	2,21%	31.582.796	2,44%	29.560.167	2,46%	83.182.684	3,13%	18.746.983	4,78%	21.785.740	5,05%	**248.252.122**	2,64%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	44.067.998	5,66%	20.681.674	3,40%	21.090.474	3,77%	18.003.213	3,48%	47.322.875	4,91%	40.691.855	3,15%	37.380.676	3,11%	46.467.583	1,75%	3.133.913	0,80%	1.676.732	0,39%	**280.516.994**	2,98%
Barrio Carenciado	295.790.381	37,98%	245.733.159	40,34%	238.218.567	42,54%	224.657.539	43,43%	413.360.335	42,93%	586.883.404	45,39%	558.357.279	46,50%	1.324.536.212	49,91%	203.965.578	52,04%	245.754.459	57,02%	**4.337.256.914**	46,15%
Fiscal	0	0,00%	1.900.141	0,31%	-25.925	0,00%	1.380.347	0,27%	3.867.099	0,40%	1.970.270	0,15%	3.057.599	0,25%	640.268	0,02%	-430.422	-0,11%	1.109.099	0,26%	**13.468.477**	0,14%
TOTAL GENERAL	**778.714.224**	**100%**	**609.145.408**	**100%**	**559.931.777**	**100%**	**517.259.141**	**100%**	**962.964.610**	**100%**	**1.293.085.153**	**100%**	**1.200.666.305**	**100%**	**2.653.622.163**	**100%**	**391.913.080**	**100%**	**430.975.344**	**100%**	**9.398.277.205**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: La Matanza Oeste (160)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	82.119	0,01%	9.272	0,00%	-13.513	0,00%	3.556	0,00%	-4.447	0,00%	22.985	0,00%	7.420	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	31.365	0,00%	**138.757**	0,00%
Reclamo	2.663.036	0,38%	2.627.498	0,39%	2.556.061	0,39%	2.540.399	0,40%	4.876.199	0,42%	6.974.087	0,39%	6.858.637	0,38%	17.395.892	0,41%	2.742.897	0,41%	1.694.433	0,22%	**50.929.139**	0,39%
Accion Judicial	113.235	0,02%	112.114	0,02%	111.041	0,02%	109.942	0,02%	108.889	0,01%	321.474	0,02%	313.983	0,02%	872.896	0,02%	162.630	0,02%	141.411	0,02%	**2.367.614**	0,02%
Extra Judicial	3.047.060	0,43%	3.224.905	0,48%	2.765.233	0,42%	3.054.610	0,48%	5.188.956	0,45%	7.701.470	0,44%	7.498.335	0,42%	15.335.060	0,36%	2.277.565	0,34%	2.102.802	0,27%	**52.195.997**	0,40%
Suspension Accion Reclamo	89.554	0,01%	88.656	0,01%	84.661	0,01%	83.932	0,01%	145.584	0,01%	172.642	0,01%	189.655	0,01%	827.276	0,02%	37.676	0,01%	22.195	0,00%	**1.741.831**	0,01%
Corte de Servicio - Accion Judicial	8.785	0,00%	8.666	0,00%	8.544	0,00%	8.463	0,00%	8.316	0,00%	16.762	0,00%	17.448	0,00%	329.478	0,01%	73.432	0,01%	90.707	0,01%	**570.600**	0,00%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	10.039	0,00%	9.943	0,00%	9.844	0,00%	18.411	0,00%	34.472	0,00%	41.033	0,00%	24.405	0,00%	61.697	0,00%	4.801	0,00%	0	0,00%	**214.644**	0,00%
Barrio Carenciado	697.819.043	98,64%	669.540.492	99,10%	655.899.387	99,16%	633.872.688	99,09%	1.145.288.923	99,09%	1.751.827.456	99,12%	1.783.617.521	99,16%	4.179.975.476	99,16%	668.655.421	99,20%	761.777.347	99,45%	**12.948.273.753**	99,13%
Fiscal	3.587.993	0,51%	-478	0,00%	65.836	0,01%	0	0,00%	129.353	0,01%	231.296	0,01%	198.565	0,01%	623.763	0,01%	115.594	0,02%	125.229	0,02%	**5.077.151**	0,04%
TOTAL GENERAL	**707.420.864**	**100%**	**675.621.068**	**100%**	**661.487.093**	**100%**	**639.692.001**	**100%**	**1.155.776.244**	**100%**	**1.767.309.205**	**100%**	**1.798.725.968**	**100%**	**4.215.421.539**	**100%**	**674.070.016**	**100%**	**765.985.488**	**100%**	**13.061.509.486**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extraiudiciales.
Acción Judicial: Deuda adiudicada a estudios iurídicos oara su oestión.
Extra Judicial: Deuda adiudicada a estudios iurídicos (extra-iudiciales) oara su oestión.
Susoensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interouestos oor los Usuarios v oor resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama iudicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo.
Fiscal: Universo excluvente.

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: E. ECHEVERRIA (161)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	71.293.264	9,43%	33.038.829	5,28%	2.072.462	0,37%	2.307.103	0,42%	4.139.398	0,41%	6.875.739	0,48%	6.409.919	0,47%	13.213.184	0,41%	1.434.958	0,31%	1.422.172	0,31%	**142.207.028**	1,36%
Reclamo	137.082.177	18,13%	114.174.532	18,26%	99.704.291	17,58%	93.650.952	17,00%	136.034.881	13,46%	203.299.460	14,11%	197.802.603	14,47%	471.215.294	14,68%	70.478.182	15,06%	66.217.938	14,33%	**1.589.660.310**	15,20%
Accion Judicial	22.812.762	3,02%	23.157.954	3,70%	21.584.861	3,81%	22.121.270	4,02%	67.866.806	6,72%	65.211.038	4,53%	67.288.663	4,92%	156.170.590	4,87%	28.858.149	6,17%	24.466.143	5,29%	**499.538.235**	4,78%
Extra Judicial	79.643.619	10,53%	71.111.825	11,37%	62.692.197	11,05%	68.074.353	12,36%	109.111.500	10,80%	165.792.709	11,51%	156.569.885	11,45%	288.387.015	8,98%	29.686.905	6,35%	17.606.698	3,81%	**1.048.676.707**	10,03%
Suspension Accion Reclamo	9.786.524	1,29%	9.361.617	1,50%	9.108.985	1,61%	9.140.930	1,66%	18.127.986	1,79%	26.636.954	1,85%	26.098.049	1,91%	57.221.745	1,78%	2.748.851	0,59%	2.297.090	0,50%	**170.528.731**	1,63%
Corte de Servicio - Accion Judicial	3.314.639	0,44%	3.117.315	0,50%	3.281.390	0,58%	3.320.317	0,60%	5.690.589	0,56%	10.157.637	0,70%	11.559.669	0,85%	34.488.035	1,07%	6.206.070	1,33%	5.971.935	1,29%	**87.107.595**	0,83%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	7.290.835	0,96%	7.309.913	1,17%	7.288.143	1,28%	6.807.132	1,24%	10.780.690	1,07%	18.263.203	1,27%	16.944.130	1,24%	24.585.702	0,77%	1.938.240	0,41%	856.829	0,19%	**102.064.816**	0,98%
Barrio Carenciado	378.807.119	50,09%	355.058.031	56,77%	361.252.188	63,69%	336.961.642	61,16%	642.544.271	63,58%	921.147.316	63,93%	882.289.206	64,54%	2.120.853.265	66,07%	320.594.734	68,53%	341.394.716	73,86%	**6.660.902.487**	63,69%
Fiscal	46.206.543	6,11%	9.052.641	1,45%	224.320	0,04%	8.539.310	1,55%	16.296.615	1,61%	23.494.714	1,63%	2.103.553	0,15%	43.687.633	1,36%	5.893.445	1,26%	1.970.952	0,43%	**157.469.726**	1,51%
TOTAL GENERAL	**756.237.483**	**100%**	**625.382.656**	**100%**	**567.208.835**	**100%**	**550.923.009**	**100%**	**1.010.592.735**	**100%**	**1.440.878.769**	**100%**	**1.367.065.676**	**100%**	**3.209.822.464**	**100%**	**467.839.534**	**100%**	**462.204.474**	**100%**	**10.458.155.636**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluyente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: LA MATANZA SUR (166)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	60.556.440	6,28%	6.256.997	0,73%	-5.726.937	-0,77%	-1.186.014	-0,17%	-3.568.409	-0,26%	-3.201.311	-0,16%	161.349	0,01%	1.495.020	0,04%	354.841	0,06%	279.981	0,04%	**55.421.956**	0,40%
Reclamo	95.798.646	9,93%	97.520.155	11,32%	70.626.713	9,55%	58.569.591	8,54%	106.578.418	7,83%	142.488.192	7,21%	133.602.617	7,07%	255.543.391	6,27%	38.264.511	6,28%	51.526.930	7,44%	**1.050.519.165**	7,58%
Accion Judicial	20.058.720	2,08%	20.753.354	2,41%	20.726.446	2,80%	20.732.494	3,02%	36.659.251	2,69%	63.885.388	3,23%	66.291.118	3,51%	150.526.807	3,69%	23.980.552	3,94%	24.811.612	3,58%	**448.425.740**	3,24%
Extra Judicial	67.750.778	7,02%	60.705.293	7,05%	50.965.309	6,89%	53.545.528	7,81%	84.860.803	6,24%	134.219.388	6,79%	119.896.495	6,34%	179.455.643	4,40%	17.967.945	2,95%	18.650.639	2,69%	**788.017.822**	5,69%
Suspension Accion Reclamo	12.878.148	1,34%	9.960.363	1,16%	10.306.067	1,39%	10.133.195	1,48%	16.944.055	1,24%	24.747.246	1,25%	25.422.851	1,35%	45.059.472	1,11%	7.276.505	1,19%	6.600.612	0,95%	**169.328.513**	1,22%
Corte de Servicio - Accion Judicial	6.955.553	0,72%	8.292.134	0,96%	8.648.435	1,17%	9.544.066	1,39%	19.278.171	1,42%	35.404.536	1,79%	35.164.582	1,86%	82.487.291	2,02%	15.294.807	2,51%	22.507.005	3,25%	**243.576.579**	1,76%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	5.805.964	0,60%	7.148.781	0,83%	6.044.926	0,82%	4.382.165	0,64%	11.121.861	0,82%	14.519.674	0,73%	12.703.512	0,67%	12.764.535	0,31%	979.405	0,16%	636.017	0,09%	**76.106.840**	0,55%
Barrio Carenciado	638.032.286	66,16%	576.864.161	66,95%	524.878.362	70,99%	529.003.578	77,13%	938.631.028	68,96%	1.409.541.254	71,33%	1.411.504.917	74,69%	3.186.938.031	78,23%	477.814.041	78,46%	542.137.615	78,29%	**10.235.345.274**	73,88%
Fiscal	56.604.066	5,87%	74.093.992	8,60%	52.863.575	7,15%	1.176.098	0,17%	150.526.374	11,06%	154.533.950	7,82%	84.943.981	4,50%	159.644.222	3,92%	27.059.410	4,44%	25.280.140	3,65%	**786.725.808**	5,68%
TOTAL GENERAL	**964.440.601**	**100%**	**861.595.230**	**100%**	**739.332.897**	**100%**	**685.900.701**	**100%**	**1.361.031.552**	**100%**	**1.976.138.318**	**100%**	**1.889.691.422**	**100%**	**4.073.914.411**	**100%**	**608.992.016**	**100%**	**692.430.550**	**100%**	**13.853.467.699**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente



CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: DEVOTO (201)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	272.560.783	25,96%	11.053.675	2,01%	-27.027.931	-4,84%	-16.014.476	-5,08%	-17.732.754	-3,25%	-16.512.326	-2,06%	-5.039.477	-0,83%	-44.959	0,00%	186.562	0,15%	-411.702	-0,25%	**201.017.396**	3,49%
Reclamo	216.903.488	20,66%	332.427.861	60,46%	164.363.544	29,45%	107.587.501	34,14%	183.630.885	33,63%	206.566.639	25,74%	155.516.031	25,63%	265.731.803	25,70%	33.414.619	26,26%	62.981.471	37,62%	**1.729.123.841**	30,04%
Accion Judicial	18.071.048	1,72%	16.977.461	3,09%	18.863.971	3,38%	18.215.541	5,78%	40.567.859	7,43%	65.023.582	8,10%	59.267.110	9,77%	127.249.280	12,31%	15.984.964	12,56%	19.353.422	11,56%	**399.574.239**	6,94%
Extra Judicial	101.766.618	9,69%	94.012.709	17,10%	87.631.426	15,70%	103.261.785	32,77%	128.570.557	23,54%	199.317.157	24,84%	166.135.780	27,38%	216.337.597	20,92%	16.701.720	13,13%	17.140.490	10,24%	**1.130.875.839**	19,64%
Suspension Accion Reclamo	32.917.186	3,14%	23.201.226	4,22%	22.248.000	3,99%	21.433.695	6,80%	38.380.461	7,03%	52.892.043	6,59%	48.028.497	7,92%	88.867.643	8,59%	12.223.636	9,61%	13.201.682	7,89%	**353.394.069**	6,14%
Corte de Servicio - Accion Judicial	22.706.960	2,16%	23.071.138	4,20%	23.936.077	4,29%	26.422.243	8,38%	54.501.638	9,98%	96.823.909	12,06%	93.230.276	15,36%	228.738.896	22,12%	42.982.316	33,78%	48.493.764	28,97%	**660.907.217**	11,48%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	64.492.674	6,14%	49.217.428	8,95%	54.609.354	9,79%	54.414.747	17,27%	83.477.912	15,29%	108.723.570	13,55%	84.714.483	13,96%	89.793.948	8,68%	3.029.228	2,38%	1.468.165	0,88%	**593.941.509**	10,32%
Barrio Carenciado	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Fiscal	320.445.594	30,52%	-169.926	-0,03%	213.451.444	38,25%	-168.838	-0,05%	34.717.168	6,36%	89.692.513	11,18%	4.935.993	0,81%	17.310.305	1,67%	2.714.356	2,13%	5.180.713	3,09%	**688.109.323**	11,95%
TOTAL GENERAL	**1.049.864.351**	**100%**	**549.791.573**	**100%**	**558.075.885**	**100%**	**315.152.197**	**100%**	**546.113.726**	**100%**	**802.527.088**	**100%**	**606.788.694**	**100%**	**1.033.984.513**	**100%**	**127.237.401**	**100%**	**167.408.005**	**100%**	**5.756.943.433**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos oara su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) oara su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interouestos oor los Usuarios v oor resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez aue se le reclama iudicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: FLORESTA (202)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	307.862.391	12,27%	1.755.668	0,18%	-19.480.841	-1,37%	-4.017.241	-0,51%	-5.014.493	-0,33%	-8.092.210	-0,29%	-11.514.720	-0,63%	2.333.477	0,06%	6.558.198	1,14%	5.724.284	0,99%	**276.114.512**	1,65%
Reclamo	424.834.993	16,93%	447.488.010	44,97%	364.702.353	25,69%	257.986.797	32,82%	398.626.835	26,55%	526.895.606	18,72%	474.818.394	25,92%	1.072.095.160	28,74%	166.683.013	29,02%	157.100.624	27,17%	**4.291.231.783**	25,63%
Accion Judicial	58.745.498	2,34%	54.640.523	5,49%	49.758.378	3,50%	53.696.805	6,83%	102.824.289	6,85%	160.827.267	5,71%	186.692.872	10,19%	383.053.751	10,27%	55.881.272	9,73%	62.837.949	10,87%	**1.168.958.606**	6,98%
Extra Judicial	285.909.227	11,39%	254.644.861	25,59%	231.174.428	16,28%	240.337.853	30,57%	373.529.043	24,88%	566.692.028	20,13%	482.967.716	26,36%	777.847.784	20,85%	78.568.447	13,68%	54.036.935	9,35%	**3.345.708.323**	19,98%
Suspension Accion Reclamo	51.324.844	2,05%	33.667.109	3,38%	32.110.735	2,26%	23.754.935	3,02%	43.497.921	2,90%	77.452.923	2,75%	68.040.464	3,71%	120.563.664	3,23%	34.145.051	5,94%	29.148.007	5,04%	**513.705.653**	3,07%
Corte de Servicio - Accion Judicial	34.568.268	1,38%	35.044.228	3,52%	35.982.555	2,53%	42.463.155	5,40%	71.292.582	4,75%	119.494.785	4,24%	133.425.613	7,28%	279.525.387	7,49%	59.452.564	10,35%	74.478.865	12,88%	**885.728.002**	5,29%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	65.554.229	2,61%	57.457.320	5,77%	53.562.277	3,77%	59.120.654	7,52%	86.824.604	5,78%	131.495.350	4,67%	100.437.146	5,48%	128.264.659	3,44%	9.244.892	1,61%	5.190.916	0,90%	**697.152.047**	4,16%
Barrio Carenciado	99.318.219	3,96%	91.976.326	9,24%	85.031.172	5,99%	87.255.518	11,10%	156.718.586	10,44%	241.510.392	8,58%	241.244.934	13,17%	556.734.926	14,92%	88.915.879	15,48%	107.481.199	18,59%	**1.756.187.151**	10,49%
Fiscal	1.181.092.936	47,07%	18.446.444	1,85%	586.821.022	41,34%	25.484.031	3,24%	273.177.097	18,19%	998.943.417	35,48%	155.756.330	8,50%	409.851.439	10,99%	74.994.450	13,06%	82.229.503	14,22%	**3.806.796.667**	22,74%
TOTAL GENERAL	**2.509.210.604**	**100%**	**995.120.488**	**100%**	**1.419.662.079**	**100%**	**786.082.505**	**100%**	**1.501.476.465**	**100%**	**2.815.219.558**	**100%**	**1.831.868.750**	**100%**	**3.730.270.247**	**100%**	**574.443.766**	**100%**	**578.228.282**	**100%**	**16.741.582.745**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: SAAVEDRA (203)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	598.405.585	29,49%	-288.921	-0,04%	-44.639.651	-5,12%	-25.252.021	-5,48%	-30.663.174	-3,60%	-42.695.405	-2,97%	-26.356.569	-2,83%	-30.296.943	-1,91%	-1.241.611	-0,64%	-3.032.531	-1,01%	**393.938.761**	4,20%
Reclamo	324.372.723	15,99%	409.512.838	57,53%	286.252.617	32,81%	172.461.590	37,46%	314.655.740	36,91%	515.493.714	35,91%	238.215.743	25,59%	334.144.499	21,09%	39.845.969	20,43%	120.967.237	40,39%	**2.755.922.669**	29,41%
Accion Judicial	32.833.669	1,62%	27.583.429	3,88%	30.749.917	3,52%	34.759.218	7,55%	69.972.296	8,21%	127.021.999	8,85%	126.162.006	13,55%	352.550.138	22,25%	50.173.492	25,73%	43.839.973	14,64%	**895.646.137**	9,56%
Extra Judicial	162.268.456	8,00%	127.701.431	17,94%	155.031.101	17,77%	145.071.831	31,51%	192.308.054	22,56%	282.858.332	19,71%	212.524.507	22,83%	295.114.868	18,62%	22.020.310	11,29%	38.971.784	13,01%	**1.633.870.674**	17,43%
Suspension Accion Reclamo	50.911.875	2,51%	19.820.476	2,78%	19.517.287	2,24%	15.953.874	3,47%	24.598.001	2,89%	34.072.989	2,37%	43.102.428	4,63%	56.940.394	3,59%	6.625.763	3,40%	7.329.404	2,45%	**278.872.491**	2,98%
Corte de Servicio - Accion Judicial	16.452.897	0,81%	19.656.741	2,76%	19.539.481	2,24%	22.228.866	4,83%	39.980.274	4,69%	78.490.537	5,47%	75.962.122	8,16%	143.799.348	9,07%	29.705.829	15,23%	31.901.326	10,65%	**477.717.420**	5,10%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	120.769.010	5,95%	99.597.415	13,99%	82.358.448	9,44%	89.903.331	19,53%	168.133.272	19,72%	299.141.647	20,84%	181.512.264	19,50%	184.804.341	11,66%	7.296.002	3,74%	3.562.668	1,19%	**1.237.078.398**	13,20%
Barrio Carenciado	6.583.704	0,32%	5.871.890	0,82%	5.607.095	0,64%	5.309.102	1,15%	9.987.109	1,17%	13.621.313	0,95%	11.714.524	1,26%	26.535.391	1,67%	2.865.342	1,47%	2.591.186	0,87%	**90.686.655**	0,97%
Fiscal	716.240.979	35,30%	2.350.934	0,33%	317.972.082	36,45%	-19.334	0,00%	63.614.101	7,46%	127.332.340	8,87%	68.180.023	7,32%	221.053.214	13,95%	37.717.352	19,34%	53.337.104	17,81%	**1.607.778.798**	17,16%
TOTAL GENERAL	**2.028.838.897**	**100%**	**711.806.233**	**100%**	**872.388.377**	**100%**	**460.416.457**	**100%**	**852.585.673**	**100%**	**1.435.337.465**	**100%**	**931.017.049**	**100%**	**1.584.645.251**	**100%**	**195.008.449**	**100%**	**299.468.151**	**100%**	**9.371.512.002**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en gestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su gestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su gestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interpuestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama judicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluyente

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: QUILMES (301)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	141.022.790	9,23%	-7.480.692	-0,57%	-14.956.152	-1,22%	-1.131.666	-0,10%	-7.320.187	-0,37%	-1.515.939	-0,05%	4.142.717	0,14%	-4.277.651	-0,06%	1.674.556	0,16%	1.544.367	0,14%	**111.702.143**	0,51%
Reclamo	307.282.470	20,11%	313.034.776	24,05%	267.924.787	21,90%	215.569.150	18,66%	364.609.088	18,46%	490.417.391	16,76%	482.462.210	16,42%	1.202.164.892	17,46%	169.014.904	16,35%	164.246.052	15,35%	**3.976.725.720**	18,05%
Accion Judicial	71.836.700	4,70%	70.091.079	5,38%	74.605.620	6,10%	73.444.748	6,36%	136.820.315	6,93%	198.333.062	6,78%	200.935.032	6,84%	487.517.440	7,08%	86.486.643	8,37%	77.456.991	7,24%	**1.477.527.629**	6,70%
Extra Judicial	211.939.939	13,87%	186.886.396	14,36%	182.646.072	14,93%	186.406.646	16,14%	275.536.416	13,95%	434.281.475	14,84%	395.527.918	13,46%	689.279.950	10,01%	75.963.448	7,35%	54.281.470	5,07%	**2.692.749.731**	12,22%
Suspension Accion Reclamo	26.677.171	1,75%	25.164.362	1,93%	23.333.445	1,91%	21.979.623	1,90%	36.078.234	1,83%	66.277.243	2,26%	66.386.270	2,26%	150.570.736	2,19%	20.843.210	2,02%	15.126.665	1,41%	**452.436.959**	2,05%
Corte de Servicio - Accion Judicial	51.001.890	3,34%	53.782.743	4,13%	60.517.779	4,95%	66.213.191	5,73%	129.340.097	6,55%	186.528.467	6,37%	211.479.042	7,20%	557.363.328	8,10%	101.722.973	9,84%	89.746.368	8,39%	**1.507.695.878**	6,84%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	37.905.368	2,48%	36.222.345	2,78%	43.672.138	3,57%	33.136.627	2,87%	62.344.926	3,16%	74.446.431	2,54%	65.853.874	2,24%	115.782.281	1,68%	9.707.268	0,94%	4.534.502	0,42%	**483.605.760**	2,19%
Barrio Carenciado	679.424.778	44,48%	619.670.849	47,61%	584.805.239	47,81%	558.216.355	48,33%	975.997.191	49,41%	1.476.468.110	50,44%	1.510.439.430	51,40%	3.684.382.074	53,51%	568.093.136	54,95%	662.902.594	61,95%	**11.320.399.756**	51,37%
Fiscal	546.159	0,04%	4.279.072	0,33%	686.409	0,06%	1.235.692	0,11%	2.045.084	0,10%	1.729.940	0,06%	1.163.516	0,04%	2.143.254	0,03%	403.197	0,04%	307.494	0,03%	**14.539.816**	0,07%
TOTAL GENERAL	**1.527.637.265**	**100%**	**1.301.650.928**	**100%**	**1.223.235.337**	**100%**	**1.155.070.365**	**100%**	**1.975.451.164**	**100%**	**2.926.966.181**	**100%**	**2.938.390.010**	**100%**	**6.884.926.302**	**100%**	**1.033.909.335**	**100%**	**1.070.146.503**	**100%**	**22.037.383.392**	**100%**

Impago Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailinos extrajudiciales.
Acción Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos para su oestión.
Extra Judicial: Deuda adjudicada a estudios jurídicos (extra-judiciales) para su oestión.
Suspensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interouestos por los Usuarios y por resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez aue se le reclama iudicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Pago en Cumplimiento: Cuenta contrato con plan de pago no vencido. Suma deuda del plan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente



CUENTAS A COBRAR VENCIDAS

AL 31/12/2025

POR DISTRITO

POR SITUACION COMPROBANTE Y ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

(EN $)

Distrito: GRANDES USUARIOS (888)

Situacion	DIAS																					
	0 - 30 dias		31 - 60 dias		61 - 90 dias		91 - 120 dias		121 - 180 dias		181 -270 dias		271-360 dias		361-720 dias		721-1080 dias		> 1080 dias		TOTAL	
Comprobante	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%	$	%
Impago Normal	172.875.142	20,32%	-911.601	-0,02%	-6.765.977	-1,33%	-3.819.128	-0,70%	-4.730.735	-0,12%	-35.744.828	-2,27%	-4.901.493	-0,26%	-16.546.258	-0,62%	-3.280.450	-0,73%	-1.900.626	-0,34%	**94.274.045**	0,55%
Reclamo	221.743.174	26,07%	202.396.378	5,10%	158.693.993	31,13%	164.393.989	30,05%	231.194.718	5,78%	304.717.251	19,31%	265.007.802	14,19%	346.804.289	13,04%	67.715.513	15,10%	112.825.943	20,17%	**2.075.493.052**	12,22%
Accion Judicial	106.180.888	12,48%	106.959.101	2,70%	99.253.072	19,47%	85.806.120	15,69%	172.226.921	4,30%	277.492.293	17,59%	241.954.657	12,96%	368.372.817	13,85%	49.222.879	10,98%	63.041.577	11,27%	**1.570.510.324**	9,24%
Extra Judicial	67.760	0,01%	67.089	0,00%	66.447	0,01%	65.789	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	10.160	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**277.245**	0,00%
Suspension Accion Reclamo	129.018.769	15,17%	91.359.482	2,30%	95.128.694	18,66%	91.997.292	16,82%	179.138.603	4,48%	272.615.924	17,28%	247.000.084	13,23%	432.194.671	16,25%	39.408.723	8,79%	51.917.546	9,28%	**1.629.779.788**	9,59%
Corte de Servicio - Accion Judicial	13.139.534	1,54%	17.375.645	0,44%	17.294.586	3,39%	17.166.073	3,14%	34.838.823	0,87%	46.210.157	2,93%	57.634.170	3,09%	188.343.191	7,08%	39.028.688	8,71%	54.461.738	9,74%	**485.492.605**	2,86%
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	**0**	0,00%
Con Plan de Pago en Cumplimiento	39.486.525	4,64%	36.769.916	0,93%	41.509.697	8,14%	31.102.600	5,69%	55.816.982	1,40%	68.379.314	4,33%	32.200.932	1,72%	61.170.597	2,30%	7.846.420	1,75%	1.294.844	0,23%	**375.577.827**	2,21%
Barrio Carenciado	18.158.530	2,13%	46.137.070	1,16%	26.724.455	5,24%	31.529.487	5,76%	63.133.180	1,58%	53.856.648	3,41%	68.935.012	3,69%	160.017.779	6,01%	35.170.056	7,84%	24.591.288	4,40%	**528.253.505**	3,11%
Fiscal	150.029.229	17,64%	3.466.232.525	87,39%	77.948.084	15,29%	128.771.906	23,54%	3.269.532.426	81,71%	590.463.457	37,42%	959.739.697	51,39%	1.120.104.967	42,10%	213.204.405	47,56%	253.156.002	45,26%	**10.229.182.697**	60,21%
TOTAL GENERAL	**850.699.550**	**100%**	**3.966.385.606**	**100%**	**509.853.049**	**100%**	**547.014.128**	**100%**	**4.001.150.918**	**100%**	**1.577.990.216**	**100%**	**1.867.570.861**	**100%**	**2.660.472.213**	**100%**	**448.316.235**	**100%**	**559.388.312**	**100%**	**16.988.841.089**	**100%**

Imoaoo Normal: Deuda no incluida en oestión de cobranza.
Reclamo: Deuda reclamada al cliente mediante mailnos extraiudiciales.
Acción Judicial: Deuda adiudicada a estudios iurídicos oara su oestión.
Extra Judicial: Deuda adiudicada a estudios iurídicos (extra-iudiciales) oara su oestión.
Susoensión Acción Reclamo: Interrupción de las acciones de cobranza hasta la resolución de reclamos interouestos oor los Usuarios v oor resúmenes de deudas enviados.
Corte de Servicio - Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado. a la vez que se le reclama iudicialmente su deuda.
Corte de Servicio - Sin Accion Judicial: Usuario con el servicio cortado.
Con Plan de Paao en Cumolimiento: Cuenta contrato con olan de paao no vencido. Suma deuda del olan deuda no pactada.
Barrio Carenciado: Usuarios identificados en este universo
Fiscal: Universo excluvente

FORMATO N° 375

CONVENIOS DE PAGOS SUSCRIPTOS DURANTE EL AÑO 2025

Categoría	Cantidad de Convenios	Deuda Original (1) ($)	Intereses Aplicados ($)	Monto Financiado ($)	Plazos (cantidad de cuotas)			Tasa de interés mensual aplicada (%)		
					Mínimos	Máximos	Promedio	Mínima	Máxima	Promedio
Residencial I	64.123	29.038.521.399	7.213.124.726	36.251.646.126	2	48	8,8	0	5,24	2,80
Residencial II	26.642	4.518.413.780	894.308.424	5.412.722.204	2	48	7,0	0	5,24	2,64
No Residencial I	8.833	15.577.272.236	4.829.440.785	20.406.713.021	2	24	8,0	0	5,24	2,89
No Residencial II	3.670	2.509.517.289	781.294.731	3.290.812.020	2	24	7,4	0	5,24	2,92
Baldio	878	939.495.058	123.455.309	1.062.950.367	2	48	7,7	0	5,24	2,61
Consorcio	3.270	6.194.096.659	1.258.995.668	7.453.092.327	2	24	6,2	0	5,24	2,41
Total general	**107.416**	**58.777.316.421**	**15.100.619.643**	**73.877.936.064**	**2**	**48**	**7,5**	**0**	**5,24**	**2,71**

(1) Incluye recargos e intereses hasta la fecha de suscripción del convenio de pago.

FORMATO N° 376

CUENTAS A COBRAR VENCIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTES A CIERTOS CLIENTES FISCALES (1) (2)
(importes expresados en pesos)

Estado	Dependencia	Año Vencimiento																			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total General
Total ANSES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.769.096	2.622.414	5.391.510
FERROVIARIAS	FERROCARRIL ESTATAL																					
	FERROCARRIL PRIVADO	607	8.779	8.807	46.606	46.359	53.890	46.438	97.631	280.933	446.083	1.332.278	2.376.472	2.066.322	3.166.046	3.979.070	4.288.882	4.500.165	15.291.813	88.267.560	287.308.033	413.612.772
	FERROCARRIL PROVINCIAL																					
Total FERROVIARIAS		607	8.779	8.807	46.606	46.359	53.890	46.438	97.631	280.933	446.083	1.332.278	2.376.472	2.066.322	3.166.046	3.979.070	4.288.882	4.500.165	15.291.813	88.267.560	287.308.033	413.612.772
Total MUTUALES		287	564	564	564	564	564	2.507	0	189	9.489	0	20.376	9.496	121.586	272.889	340.109	117.989	1.587.489	17.009.177	255.660.320	275.154.722
NACION	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	23.566	51.156	62.151	66.716	64.797	62.412	83.453	111.057	170.880	299.061	635.355	1.092.675	2.187.138	3.731.219	5.185.284	5.254.809	6.059.602	19.015.027	122.702.985	399.391.256	566.250.600
	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA																					0
	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE																					0
	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA																					0
	MINISTERIO DE COMUNICACIONES																					0
	MINISTERIO DE CULTURA																					0
	MINISTERIO DE DEFENSA	0	0	0	0	0	0	0	0	14.721	27.801	95.832	119.320	59.715	113.294	242.557	289.056	585.957	2.925.693	18.716.659	1.100.347.615	1.123.538.221
	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL																					0
	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERÍA																					0
	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS																					0
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES																					0
	MINISTERIO DE TRANSPORTE																					0
	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	2.227	3.576	3.147	2.290	2.726	2.939	3.254	3.577	11.100	17.467	43.228	81.009	72.600	148.121	192.438	214.398	218.651	560.495	3.556.334	13.497.575	18.637.153
	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN																					0
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO	0	0	0	0	678	2.516	2.517	2.517	4.852	4.258	27.677	88.181	138.238	229.303	262.348	2.200.753	175.245	766.912	4.135.183	11.294.911	19.336.090
	MINISTERIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	21.579	20.175	675.665	224.335	975.423	2.139.166	1.956.478	1.957.070	2.990.260	8.435.853	99.833.385	253.828.955	373.058.344
	MINISTERIO DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.374	312.097	7.537.009	444.226.447	452.284.927
	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL																					0
	MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA																					0
	MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA																					0
	MINISTERIO PUBLICO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.103.226	3.103.226
	PODER JUDICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.545	42.545
	PODER LEGISLATIVO																					0
	PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561.055	349.061	2.887.395	38.928.458	42.725.969
Total NACION		25.792	54.732	65.298	69.006	68.200	67.867	89.224	117.151	223.132	368.762	1.477.758	1.605.521	3.433.114	6.361.103	7.839.106	9.916.085	10.800.144	32.365.139	259.368.951	2.264.660.990	2.598.977.075
TRIPARTITO	**CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES**																					
Total General		26.685	64.074	74.669	116.176	115.123	122.321	138.169	214.782	504.254	824.335	2.810.035	4.002.368	5.508.932	9.648.736	12.091.065	14.545.075	15.418.299	49.244.441	367.414.783	2.810.251.757	3.293.136.079

(1) Ciertos usuarios fiscales pueden estar categorizados en el sistema comercial como clientes privados
(2) Incluye usuarios con saldo a favor

FORMATO N° 377

CARGO POR TITULARIDAD NO INFORMADA
AÑO 2025

IMPORTES DE FACTURACIÓN DEVENGADOS POR EL CONCESIONARIO CORRESPONDIENTES AL CARGO POR TITULARIDAD NO INFORMADA DURANTE EL AÑO 2025

Mes	Importe facturado
Enero	165.408.039
Febrero	170.349.978
Marzo	217.093.434
Abril	133.614.925
Mayo	219.470.059
Junio	177.912.098
Julio	135.922.045
Agosto	225.474.332
Septiembre	157.809.264
Octubre	125.664.322
Noviembre	152.245.737
Diciembre	67.220.176
Total	**1.948.184.410**

IMPORTES COBRADOS POR EL CONCESIONARIO CORRESPONDIENTES AL CARGO POR TITULARIDAD NO INFORMADA DURANTE EL AÑO 2025

Mes	Importe cobrado
Enero	95.222.393
Febrero	90.714.109
Marzo	96.730.028
Abril	107.781.457
Mayo	89.225.656
Junio	104.486.509
Julio	114.049.392
Agosto	89.622.837
Septiembre	109.035.191
Octubre	98.453.906
Noviembre	61.909.499
Diciembre	61.583.101
Total	**1.118.814.076**

FORMATO N° 379

DEUDA VENCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 MAS RECARGOS EXTRACONTABLES TEORICOS ESTIMADOS (A)
(cifras en miles de pesos)

	Año Vencimiento	Importe Original Total Facturado (con IVA y tasa Ente)	Previsión Incobrables	IVA Debito fiscal Usuarios Residenciales (1)	Subtotal Importe Original Total Facturado (con IVA y tasa Ente) neto de Previsión incobrables y del IVA Debito fiscal Usuarios Residenciales	Estimación de Recargos teóricos con IVA (2)	Total Impago con Recargos teóricos estimados	Tasa teórica promedio
		I	II	III	IV = I - II - III	V = (IV * VII)* 1,21	VI = IV + V	VII
Deuda Usuarios Residenciales	2006	4.408	4.408	0	0	0	0	94754%
	2007	7.644	7.644	0	0	0	0	78767%
	2008	8.361	8.361	0	0	0	0	65475%
	2009	9.212	9.212	0	0	0	0	54423%
	2010	10.517	10.517	0	0	0	0	45234%
	2011	11.476	11.476	0	0	0	0	37593%
	2012	13.931	13.931	0	0	0	0	31240%
	2013	16.388	16.388	0	0	0	0	25958%
	2014	35.647	35.647	0	0	0	0	21035%
	2015	56.996	56.996	0	0	0	0	16458%
	2016	188.984	188.984	0	0	0	0	12523%
	2017	420.252	420.252	0	0	0	0	9546%
	2018	868.844	868.844	0	0	0	0	7398%
	2019	1.664.153	1.664.153	0	0	0	0	4415%
	2020	2.159.025	2.159.025	0	0	0	0	2690%
	2021	2.293.002	2.293.002	0	0	0	0	1816%
	2022	2.869.879	2.869.879	0	0	0	0	1140%
	2023	10.279.411	10.279.411	0	0	0	0	468%
	2024	78.215.941	78.215.941	0	0	0	0	91%
	2025	180.765.920	132.477.598	22.656.809	25.631.514	8.388.215	34.019.729	27%
		279.899.992	**231.611.669**	**22.656.809**	**25.631.514**	**8.388.215**	**34.019.729**	
Deuda Usuarios No Residenciales	2006	2.370	2.370	0	0	0	0	2622018%
	2007	4.311	4.311	0	0	0	0	1989983%
	2008	4.579	4.579	0	0	0	0	1510294%
	2009	7.550	7.550	0	0	0	0	1146229%
	2010	7.678	7.678	0	0	0	0	869918%
	2011	6.832	6.832	0	0	0	0	660209%
	2012	7.312	7.312	0	0	0	0	501048%
	2013	7.488	7.488	0	0	0	0	380251%
	2014	19.387	19.387	0	0	0	0	278120%
	2015	31.859	31.859	0	0	0	0	193172%
	2016	110.548	110.548	0	0	0	0	128839%
	2017	206.983	206.983	0	0	0	0	86232%
	2018	328.300	328.300	0	0	0	0	59182%
	2019	535.970	535.970	0	0	0	0	27829%
	2020	717.939	717.939	0	0	0	0	13574%
	2021	767.706	767.706	0	0	0	0	7712%
	2022	922.083	922.083	0	0	0	0	3992%
	2023	3.799.612	3.799.612	0	0	0	0	1193%
	2024	26.673.977	26.673.977	0	0	0	0	162%
	2025	74.458.059	46.950.862	0	27.507.197	14.206.065	41.713.262	43%
		108.620.545	**81.113.348**	**0**	**27.507.197**	**14.206.065**	**41.713.262**	
Deuda Vencida Total		**388.520.537 (3)**	**312.725.018**	**22.656.809**	**53.138.711**	**22.594.281**	**75.732.991**	

(A) La información sobre recargos teóricos estimados de la deuda vencida al 31/12/2025 corresponde a la mejor estimación del Concesionario según lo requerido por el E.T.O.S.S. en su nota N° 18.839 de fecha 26 de enero de 2004 y corresponde a información extracontable que no cumple con los requisitos requeridos por las normas contables profesionales vigentes para su registración contable como ingresos.

(1) Corresponde exclusivamente al importe del IVA Debito Fiscal de usuarios residenciales, proporcionado por el porcentaje de afectación de la previsión para incobrables respecto del importe original total facturado. Dicho importe no ha sido previsionado debido a que el mismo será reversado en caso de anulación de la deuda por incobrabilidad, ya que dicho gravamen se perfecciona en el momento de su cobranza.

(2) Incluve un porcentaie promedio de IVA del 21%.

(3) No incluye usuarios con saldo crédito. Los usuarios fiscales se distribuyen según corresponda en Residenciales o No Residenciales.

Formato N° 380

ESTIMACIÓN DE OTRAS QUITAS Y CONDONACIONES DE DEUDA EXTRACONTABLES OTORGADAS DURANTE EL AÑO 2025 (*)

Categoría	Monto Original ($) (1)	Recargos Teóricos ($) (2)	Quitas y Condonaciones		Recuperación de Deuda ($) (1)
			Capital ($)	Recargos ($)	
	I	II		III=I+II-IV	IV
Residencial I	41.418.032.117	11.859.879.887	0	7.102.538.535	46.175.373.470
Residencial II	119.999.892.012	36.746.652.338	0	26.868.341.285	129.878.203.064
No Residencial I	12.963.959.003	25.725.000.194	0	21.618.898.958	17.070.060.239
No Residencial II	68.217.613.268	153.971.512.448	0	140.504.182.610	81.684.943.107
Consorcios	34.089.253.146	5.940.503.422	0	3.976.911.984	36.052.844.585
Baldío	3.276.706.447	2.652.867.236	0	2.120.589.969	3.808.983.714
Total general	279.965.455.993	236.896.415.526	-	202.191.463.340	314.670.408.179

(1) Incluye impuestos y tasa ERAS.
(2) Incluye tasa promedio de impuestos (1,25), recargos por mora, recargos por acción extra judicial y recargos por acción judicial.

(*) Esta información NO INCLUYE aquellos Recargos Teóricos y sus correspondientes Eximidos originados automáticamente por la operatoria comercial.
Pueden existir diferencias en las sumatorias por el redondeo de decimales.

Formato N° 381

RECARGOS E INTERESES POR DEMORA DE PAGO DEVENGADOS DURANTE EL AÑO 2025
(Expresado en pesos)

Concepto	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Acumulado Año 2025
Recargos por Mora (resarcitorios y punitorios)	3.713.169.217	5.075.825.051	3.122.020.927	3.622.543.073	3.871.480.208	3.526.278.855	4.720.216.442	3.812.167.670	4.610.576.904	4.689.943.407	4.316.807.286	4.364.522.290	49.445.551.329
Recargos por Acción Judicial	116.753.870	118.590.818	91.526.317	128.825.237	86.819.152	124.091.890	190.750.267	202.286.207	233.712.219	151.492.802	73.750.953	184.946.915	1.703.546.646
Recargos por Acción Extrajudicial	310.859.605	274.415.368	277.755.265	323.646.494	331.326.495	350.540.256	435.339.709	371.901.995	459.574.612	497.711.455	266.916.335	449.621.073	4.349.608.663
Total de Recargos e Intereses	**4.140.782.692**	**5.468.831.237**	**3.491.302.508**	**4.075.014.804**	**4.289.625.856**	**4.000.911.001**	**5.346.306.418**	**4.386.355.873**	**5.303.863.735**	**5.339.147.663**	**4.657.474.574**	**4.999.090.278**	**55.498.706.639**

22. ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

22.1 a 22.5
Formatos vinculados a los Estados Contables

Los puntos 22.1 a 22.5 serán presentados de forma separada como "FORMATOS CONTABLES", sin la Certificación del Auditor Externo Contable conforme nota SSRH N° 313/2016 y respetando los plazos establecidos en los términos de referencia de la última contratación realizada por el ex- MINPLAN, en la que se estableció la fecha de presentación a los 30 días posteriores de la aprobación de los Estados Contables de la Sociedad por parte de la Asamblea o en su defecto, al 30 de junio del año siguiente, lo que sea anterior.

22.1 Estados contables resumidos.

22.2 Seguimiento de inversiones.

22.3 Pasivos.

22.4 Costos operativos y gastos no distribuidos.

22.5 Cuadros Adicionales e Indicadores Económicos.

22.6. Indicadores

FORMATO N° 851

INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADOR			UNIDAD	DEFINICION	
FACTURACION		Promedio de servicios de agua potable residenciales por cuenta	en miles de u$s/cuenta	Facturación por servicios residenciales de agua potable / Total de cuentas residenciales de agua potable	0,04
		Promedio de servicios de agua potable no residenciales por cuenta	en miles de u$s/cuenta	Facturación por servicios no residenciales de agua potable / Total de cuentas no residenciales de agua potable	0,45
		Promedio de servicios de agua potable y saneamiento residenciales por cuenta	en miles de u$s/cuenta	Facturación por servicios residenciales de agua potable y saneamiento / Total de cuentas residenciales de agua potable y saneamiento	
		Promedio de servicios de agua potable y saneamiento no residenciales por cuenta	en miles de u$s/cuenta	Facturación por servicios de agua potable y saneamiento / Total de cuentas no residenciales de agua potable y saneamiento	
		Promedio de servicios de saneamiento residenciales por cuenta	en miles de u$s/cuenta	Facturación por servicios residenciales de saneamiento / Total de cuentas residenciales de saneamiento	0,08
		Promedio de servicios de saneamiento no residenciales por cuenta	en miles de u$s/cuenta	Facturación por servicios de no residenciales de saneamiento / Total de cuentas no residenciales de saneamiento	0,54
		Unitaria de Agua Potable	en miles de u$s/m3	Facturación por servicios de agua potable, incluyendo agua exportada / Volumen comercializado de agua potable	
		Unitaria de Saneamiento	en miles de u$s/m3	Facturación por servicios de saneamiento / Volumen de Líquido Recibido	
COSTOS	Costos Conjuntos	Costos totales por cuenta	en miles de u$s/cuenta	Costos operativos y gastos generales de los servicios de agua potable y saneamiento / Cantidad total de cuentas de agua potable y saneamiento.	0,0001
		Relación costos operativos vs. facturación por servicios	%	Costos operativos totales / Facturación total por servicios * 100	0,03%
	Costos Operativos de Agua Potable	Costo unitario del agua comercializada	en miles de u$s/m3	Costos operativos de agua potable / Total agua comercializada.	
		Incidencia de la mano de obra	%	Costo de la mano de obra operativa propia y contratada de agua potable / Costo operativo de agua potable * 100	84,92%
		Incidencia del costo de la energía	%	Costo de la energía operativa de agua potable / Costo operativo de agua potable * 100	28,83%
		Incidencia del costo de los productos químicos	%	Costo de los productos químicos para el agua potable / Costo operativo de agua potable * 100	37,04%
	Costos Operativos de Saneamiento	Costo unitario del líquido recibido	en miles de u$s/m3	Costos operativos de saneamiento / Volumen total de aguas residuales recibido.	
		Incidencia de la mano de obra	%	Costo de la mano de obra operativa propia de saneamiento / Costo operativo de saneamiento * 100	106,92%
		Incidencia del costo de la energía	%	Costo de la energía operativa de saneamiento/ Costo operativo de saneamiento * 100	15,54%
	Costos de Administración y Ventas	Costos de administración y ventas por cuenta	en miles de u$s/cuenta	Costos de administración y ventas / Cuentas totales de agua potable y saneamiento	0,0001
		Incidencia de los trabajos de terceros	%	Costos de prestaciones de terceros / costos operativos y gastos generales * 100	24,85%
EJECUCION DE INVERSIONES		Ejecución de las Inversiones	%	Inversión ejecutada / inversión presupuestada * 100	96,74%
		Morosidad	meses	Facturación pendiente de cobro al cierre del ejercicio / (Facturación total anual / 12)	0,0043
	Endeudamiento	Sobre patrimonio neto	%	Pasivo Total / Patrimonio neto * 100.	-403,56%
		Composición del pasivo	%	Pasivo Circulante / Pasivo total * 100.	78,58%
	Rentabilidad	Sobre patrimonio neto	%	Resultado Neto / Patrimonio neto * 100.	-124,65%

AySA SA - VARIABLES PARA EL CALCULO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA BENCHMARKING - NUEVAS ÁREAS **F-852**

GRUPOS Y VARIABLES				Código ADERASA	Código Guía AySA	UNIDAD	DEFINICION	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
INOFRMACION DEL PRESTADOR	Personal del operador		Personal propio total	di-30	DI30	Nº	Sumatoria total del personal propio y contratado (a tiempo completo equivalente - TCE) empleado por el operador.	831	796	589						
			Personal empleado en el servicio de agua potable	di-31		Nº	Total de personal propio y contratado (TCE) empleado en el servicio de agua (tanto mano de obra directa, como personal administrativo, en comercialización, etc.).	343	303	235						
			Personal en Transporte y distribución de Agua Potable	di-33		Nº	Cantidad de personal propio y contratado (a TCE) empleado en redes de transporte y distribución de agua potable, incluyendo reservas (tanques de agua de la empresa).	343	303	235						
			Total Personal en el Servicio de Saneamiento	di-34		Nº	Total de personal propio y contratado (a TCE) empleado en el servicio de saneamiento (tanto mano de obra directa, como personal administrativo, en comercialización, etc.).	488	493	354						
			Personal en Transporte de Saneamiento	di-35		Nº	Cantidad de personal propio y contratado (a TCE) empleado en redes de recolección y transporte de saneamiento.	227	227	160						
			Entrenamiento en prevención y emergencias AP		DP16	Nº	Cantidad de personal que participó en simulaciones del Plan de Prevención y Emergencias de agua potable en el período	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Entrenamiento en prevención y emergencias AR		DP17	Nº	Cantidad de personal que participó en simulaciones del Plan de Prevención y Emergencias de aguas residuales en el período	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Capacitación del personal		DI36	horas	Cantidad de horas-empleado utilizadas para la capacitación del personal de la entidad prestadora en el período	147.626	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	
INFORMACIÓN AMBIENTAL	Lluvia caída		Promedio	dm-01		mm/año	Promedio de lluvia caída en todo el año en los últimos 30 años.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Actual	dm-04		mm/año	Lluvia caída en el año que se informa.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Temperatura		Promedio	dm-05		ºC	Temperatura diaria promedio de los últimos 30 años.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Máxima diaria	dm-06		ºC	Temperatura diaria promedio del día más caluroso del año en los últimos 30 años.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mínima diaria	dm-07		ºC	Temperatura diaria promedio del día más frío del año en los últimos 30 años.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Topografía		Máxima diferencia de nivel	dm-08		m	Diferencia entre el punto más alto y el más bajo del terreno del área con servicio de agua y cloacas.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Demografía		Población residente	dm-10	DM10	habitantes	Cantidad de habitantes residentes permanentes en el área de responsabilidad de distribución de Agua por el operador.	3.281.231	3.329.001	3.375.862	3.422.062	3.467.501	3.512.207,0	3.556.338,0	**3.409.297**	En 2025 se utiliza el Censo 2022.
			Población residente para saneamiento	dm-20		habitantes	Cantidad de habitantes residentes permanentes en el área de responsabilidad del saneamiento por el operador.	3.281.231	3.329.001	3.375.862	3.422.062	3.467.501	3.512.207,0	3.556.338,0	**3.409.297**	En 2025 se utiliza el Censo 2022.
			Densidad poblacional	dm-12		hab./km2	Población residente / área de responsabilidad del operador.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Tasa de crecimiento de la población	dm-13		% por año	Variación anual promedio del crecimiento de la población en los últimos 10 años.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Economía		Tasa de cambio al final del periodo	dm-14		Moneda local / USD	Tasa de cambio de la moneda local con el dólar estadounidense al final del período.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Tasa de cambio promedio del período	dm-15		Moneda local / USD	Tasa de cambio de la moneda local con el dólar estadounidense promedio del período, calculada como promedio del valor de cierre mensual.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			PBI	dm-18		USD	Producto Interno Bruto (PIB) por Habitante. Es un indicador económico referido a todo el País, estimado en dólares estadounidenses.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Ingreso Familiar Anual	dm-21		Moneda Local	Ingreso Familiar promedio de todos los estrato, anualizado y expresado en moneda local. Generalmente este dato es provisto por el Instituto de Estadísticas de cada país.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Tasa de inflación minorista oficial	dm-16		% por año	Variación del índice de precios al consumidor del país en el período considerado.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Sueldo mínimo anual (USD al cierre: dm-14)	dm-19		USD	Es el sueldo mínimo aceptado por el Estado para las relaciones laborales formales.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Tasa de desocupación	dm-17		%	Porcentaje de la población económicamente activa sin trabajo al final del período.	-	-	-	-	-	-	-	-	
INFORMACION SOBRE EL SERVICIO	Cobertura	Agua Potable	Población servida con conexión domiciliaria de agua potable	ds-01	DS01	habitantes	Cantidad de habitantes residentes con acceso a agua potable de red mediante una conexión domiciliaria, al final del período.	1.155.547	1.197.741	1.215.459	1.238.938	1.270.315	1.292.808	1.333.160	**1.189.290**	En 2025 se utiliza el Censo 2022.
			Población servida mediante una pileta pública de agua potable	ds-02	DS02	habitantes	Cantidad de habitantes residentes con acceso a agua potable, mediante una pileta pública (disponible a menos de 200 metros del hogar) al final del período.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Duración del abastecimiento	ds-12		horas/dia	Promedio ponderado de horas de servicio, resultante entre las conexiones con servicio contínuo y discontínuo (ej.: 2 conexiones de 24 hs. y 2 de 18 hs. = 21 hs.)	24	24	24	24	24	24	24	24	
			Clientes con servicio discontínuo (intermitente).	ds-13		%	Proporción de Población con servicio discontínuo o intermitente (abastecimiento inferior a 24 hs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saneamiento Sanitario	Población servida con saneamiento sanitario	ds-05	DS05	habitantes	Cantidad de habitantes residentes, al final del período, que vuelcan sus efluentes a la red de saneamiento, mediante una conexión domiciliaria.	758.595	798.146	825.529	827.640	883.192	900.740	918.577	**822.796**	En 2025 se utiliza el Censo 2022.
	Cuentas		Total de cuentas	ds-07		Nº	Cantidad total de cuentas a las que se les factura agua potable y/o saneamiento (clientes o unidades a las que se emite factura). NO es suma de ds-08 + ds-09.	364.663	373.181	378.404	381.967	385.955	402.271	412.235	419.637	
			Cuentas de Agua Potable	ds-08	DS08	Nº	Cantidad de cuentas a las que se les factura agua potable (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente el servicio de saneamiento).	312.679	324.453	328.096	332.123	336.113	345.033	352.112	358.682	
			Cuentas Residenciales de Agua Potable	ds-10	DS10	Nº	Cantidad de cuentas residenciales a las que se les factura agua potable (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente servicio de saneamiento).	299.197	309.628	313.048	316.737	319.892	327.641	333.570	339.720	
			Cuentas de saneamiento	ds-09	DS09	Nº	Cantidad de cuentas a las que se les factura saneamiento (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente servicio de agua potable).	197.347	205.881	210.187	219.762	222.610	234.157	242.109	248.153	
			Cuentas Residenciales de saneamiento	ds-11	DS11	Nº	Cantidad de cuentas residenciales a las que se les factura saneamiento (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente servicio de agua potable).	186.800	194.173	198.181	206.995	209.165	219.527	227.048	232.661	
ACTIVOS FISICOS	Tratamiento de agua y Almacenamiento		Capacidad de Potabilización Instalada en Plantas y Pozos	da-01	DA03	m3/dia	Sumatoria de la capacidad teórica de potabilización instalada en plantas o pozos que requieran intervención de un mínimo proceso de potabilización (por ej.: desinfección).	461.907	523.163	553.063	586.743	600.369	604.818	623.218	619.714	
			Potabilización Pico Anual	da-02		m3/dia	Volumen efectivo potabilizado, el día de máxima entrega del año.	492.899	536.229	558.767	601.496	614.426	616.075	636.367	634.183	
	Red de agua	Cañerías	Longitud total	da-04	DA04	Km	Longitud total de las cañerías de transporte y distribución de agua, excluidas las conexiones.	3.316	3.385	3.407	3.572	3.691	3.770	3.899	3.949	
			Cañerías reemplazadas		DA30	Km	Longitud de cañerías de agua potable reemplazadas en el período	2,15	2,43	1,13	8,28	11,36	7,08	1,41	3,50	
			Cañerías ferrosas desincrustadas		DA15	Km	Longitud de cañerías de tipo ferroso de agua potable desincrustadas en el período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Longitud cañerías ferrosas		DA16	Km	Longitud total de cañerías de tipo ferroso en la red de agua potable	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,59	0,60	
		Válvulas	Cantidad de válvulas		DA05	Nº	Cantidad total de válvulas en la red de agua potable al final del período	53	168	226	329	522	793	1.134	1.324	
			Válvulas reemplazadas		DA19	Nº	Cantidad de válvulas de agua potable reemplazadas en el período	140	257	96	134	261	145	72	161	
		Conexiones	Conexiones de Agua Potable	da-08	DA08	Nº	Total de conexiones de agua.	276.485	285.217	285.638	286.870	293.566	327.723	335.218	342.062	
			Conexiones de AP reemplazadas		DA31	Nº	Cantidad de conexiones domiciliarias de agua potable reemplazadas en el período	9.364	7.992	6.711	9.288	8.804	10.420	4.597	5.225	
			Nuevas conexiones de AP		DP36	Nº	Cantidad de conexiones domiciliarias nuevas de agua potable, instaladas en el período	5.728	8.732	421	963	5.760	5.357	8.029	5.286	
		Micromedición	Medidores Operativos	da-10	DA10	Nº	Cantidad total de medidores operativos (en funcionamiento y con lectura).	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Medidores Residenciales Operativos	da-11		Nº	Cantidad de medidores residenciales operativos (en funcionamiento y con lectura) en conexiones residenciales.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Red de saneamiento	Conexiones	Cantidad de conexiones de aguas residuales	da-20	DA20	Nº	Total de conexiones de saneamiento.	235.686	243.836	248.197	244.395	255.370	256.859	260.359	263.976	
			Conexiones de AR reemplazadas		DA33	Nº	Cantidad de conexiones domiciliarias de aguas residuales reemplazadas en el período	602	504	539	637	569	577	296	308	
			Nuevas conexiones de AR		DP37	Nº	Cantidad de conexiones domiciliarias nuevas de aguas residuales, instaladas en el período	8.260	8.150	4.361	357	6.816	1.621	3.500	3.617	
		Cañerías	Longitud Total de la Red	da-22	DA22	Km	Longitud total de las cañerías de recolección y transporte de aguas residuales, excluidas las conexiones domiciliarias.	2.726	2.865	2.905	2.953	3.214	3.223	3.272	3.322	
			Cañerías de AR reemplazadas		DA32	Km	Longitud de cañerías de aguas residuales reemplazadas en el período	12,96	10,45	6,74	19,30	13,75	14,42	7,73	24,54	
		Estaciones elevadoras	Cantidad de electrobombas		DA23	Nº	Cantidad total de electrobombas de los sistemas de bombeo de aguas residuales al final del período, excluidas las bombas de reserva	27	32	49	49	49	81	76	87	
			Potencia instalada		DA35	kw	Total de la potencia instalada en estaciones elevadoras de aguas residuales	426	426	777	777	777	1.036	1.350	1.683	
		Capacidad de tratamiento secundario	Medido en habitantes	da-25		habit. equiv.	Capacidad de tratamiento secundario total teórica instalada en plantas de tratamiento de aguas residuales, en habitantes equivalentes.	-	-	-	-	-	451.700	451.700	451.700	
			Medido en caudal	da-26	DA26	m3/dia	Capacidad de tratamiento secundario total teórica instalada en plantas de tratamiento de aguas residuales, en m3 por día de agua procesada.	-	-	-	-	-	108.864	108.864	108.864	
INFORMACION DE PRODUCCIÓN	Agua Potable (AP)	Extracción	Total agua extraída (captada)	dp-01	DP01	m3/dia	Promedio diario de agua extraída en el año: subterránea y superficial (captada).	461.907	523.163	553.063	586.743	600.369	604.818	623.218	619.714	
			Agua subterránea	dp-02		m3/dia	Promedio diario de agua subterránea extraída (captada).	461.907	523.163	553.063	586.743	600.369	604.818	623.218	619.714	
		Producción y despacho	Importación de Agua	dp-10		m3/dia	Promedio diario de agua ("en bloque") importada o comprada a otros durante el año informado.	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total agua despachada	dp-03	DP03	m3/dia	Promedio diario de agua despachada a la red en el año informado (Agua captada + importación - pérdidas en plantas). El despacho exportado en bloque debe incluirse.	-	-	-	-	-	646.427	672.658	670.161	
			Energía consumida en el bombeo de AP		DP18	kwh	Total de energía consumida en el bombeo de agua potable en el período	45.929.310	55.848.612	60.925.741	63.631.604	63.616.734	64.604.720	63.717.744	62.686.234	
			Energía consumida en el bombeo de AP - Estaciones Elevadoras				Total de energía consumida en el bombeo de agua potable en las Estaciones Elevadoras en el período considerado	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Factor de estandarización AP		DP19	m^3 x 100 mca	Sumatoria del agua potable elevada por cada bomba del sistema, multiplicada por la altura de elevación, expresada en centenares de metros de columna de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Producción de AP en plantas potabilizadoras		DP03a	m^3/día	Promedio diario de agua despachada a la red en el período, proveniente de las plantas potabilizadoras	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Producción de AP en plantas potabilizadoras en dia pico.		DP28	m^3	Volumen de agua tratada en las plantas potabilizadoras del día de mayor demanda	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Consumo de sulfato de aluminio en plantas potabilizadoras		DP15	ton	Cantidad de sulfato de aluminio utilizado en todo el período para el tratamiento del agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Agua comercializada	dp-04	DP04	m^3/día	Promedio diario de agua comercializada (que llega a destino, se facture o no, haya o no micromedición). Incluye despacho exportado.	-	-	-	-	-	-	350.003	295.691	
			Agua comercializada micromedida	dp-12		m^3/día	Promedio diario de agua comercializada con micromedición.	-	-	-	-	-	-	21.375	25.237	
			Agua comercializada a Clientes Residenciales	dp-13		m^3/día	Promedio diario de agua comercializada a clientes Residenciales (micromedida o no, que llega a destino).	-	-	-	-	-	-	306.600	261.639	
			Agua comercializada a Clientes NO Residenciales	dp-14		m^3/día	Promedio diario de agua comercializada a clientes No Residenciales (micromedida o no, que llega a destino).	-	-	-	-	-	-	43.402	30.257	
			Exportación de Agua	dp-11		m^3/día	Promedio diario de agua ("en bloque") exportada o vendida a otro distribuidor durante el año informado.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Consumo no Autorizado	dp-15		m^3/día	Promedio diario de agua robada por población residencial (clandestinos).	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Agua no Comercializada	dp-05		m^3/día	Promedio diario de agua despachada y no comercializada.	-	-	-	-	-	-	322.656	374.471	
	Tratados		Total Agua Residual Recibida	dp-06	DP06	m^3/día	Promedio diario estimado de aguas residuales ingresado a la red. Usualmente se adopta una fracción del agua potable comercializada.	-	-	-	-	-	-	-	-	

GRUPOS Y VARIABLES				Código ADERASA	Código Guía AySA	UNIDAD	DEFINICION	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
INFORMACION SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO	Aguas Residuales (AR) - saneamiento	Volúmenes Recolectados y Transport	Total Agua Residual Volcada	dp-07	DP07	m^3/día	Promedio diario medido de aguas residuales volcado a cuerpo receptor (con y sin tratamiento). Utilizar días secos (para excluir posibles aguas de lluvia).	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Vuelco prematuro		DP20	m^3/día	Promedio diario de aguas residuales espichadas en tiempo seco durante el período	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Desbordes de AR en vía pública		DP26	Nº	Cantidad de incidentes de desbordes de aguas residuales en la vía pública en el período	4.549	2.770	2.464	2.722	3.115	3.154	3.016	2.959	
			Inundaciones de propiedades con AR.		DP33	Nº	Cantidad de inundaciones de propiedades con aguas residuales durante el período	-	38	9	14	13	13	9	N/A	En 2025 se informa en la planilla 852 de manera unificada (sin discriminar Nuevos Partidos).
			Interrupciones de bombeo de AR		DP27	horas	Sumatoria del tiempo que las electrobombas de los sistemas de bombeo de aguas residuales estuvieron fuera de servicio durante el período	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Energía de bombeo de AR		DP21	kwh	Total de la energía utilizada para el bombeo de aguas residuales durante el período	962.381	1.328.752	1.513.943	1.695.037	973.187	1.628.178	1.748.077	2.265.856	
			Factor de estandarización AR		DP35	m^3 x 100 mca	Sumatoria del agua residual elevada por cada bomba del sistema, multiplicada por la altura de elevación, expresada en centenares de metros de columna de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tratamiento de Aguas Residuales	Vuelco con Tratamiento	dp-08	DP08	m^3/día	Promedio diario de aguas residuales vertido a cuerpo receptor previo tratamiento primario y/o secundario.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Vuelco con Tratamiento Secundario	dp-08b		m^3/día	Promedio diario de aguas residuales vertido a cuerpo receptor previo tratamiento secundario (DBO5 = 30 mg/lt; SS 10' = 0,5 ml/lt).	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Caudal de AR tratado el día de máxima	dp-09	DP25	m^3/día	Caudal de aguas residuales tratado (primario y/o secundario) el día de máxima del año.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Producción de barros de AR		DP31	toneladas	Barros totales producidos en el período en todas las plantas depuradoras de los sistemas a cargo de la entidad prestadora	-	-	-	-	-	1.961	2.252	2.364	
			Destino de los barros de AR		DP32	toneladas	Barros que recibieron un destino final ambientalmente adecuado en el período	-	-	-	-	-	1.961	2.252	2.364	
	Agua Potable	Continuidad del servicio	Total conexiones afectadas por cortes (Para servicios continuos)	dc-01	DC01	Nº	Cantidad de conexiones afectadas por cortes de duración > a 6 horas. La repetición de cortes deberán sumar repetidas conexiones.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Cuentas afectadas por corte por falta de pago (razones comerciales)	dc-02		Nº	Cuentas a las que se les cortó o redujo su caudal de servicio por lo menos una vez en el período, por falta de pago.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Interrupciones del servicio de AP		DC40	hab. x horas	Suma de (Población sujeta a interrupción del servicio x Duración de la interrupción en horas)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Roturas	Roturas en Redes	dc-03	DC03	Nº	Cantidad de roturas en redes de agua potable en el año, incluyendo válvulas y accesorios.	-	2.922	2.329	2.844	3.130	3.363	1.785	N/A	En 2025 se informa en la planilla 852 de manera unificada (sin discriminar Nuevos Partidos).
			Roturas en conexiones	dc-04	DC04	Nº	Cantidad de roturas en conexiones domiciliarias, incluyendo válvulas y accesorios y excluyendo medidores.	-	32.163	26.376	31.930	36.020	39.771	29.482	N/A	En 2025 se informa en la planilla 852 de manera unificada (sin discriminar Nuevos Partidos).
		Calidad de Agua en Redes	Población en rango >= 10 mca		DC16	nº	Población servida con agua potable cuya PMP del período considerado se haya verificado superior a los 10 mca	-	-	-	-	90.872	201.395	145.207	50.956	Se actualizó en base a Censo 2022 con Proyección x CV Se actualizaron los años 2022, 2023, 2024 y 2025
			Población en rango >= 7 mca a < 10 mca		DC17	nº	Población servida con agua potable cuya PMP del período considerado se haya verificado entre 7 y 10 mca	-	-	-	-	292.549	192.378	238.164	340.177	Se actualizó en base a Censo 2022 con Proyección x CV Se actualizaron los años 2022, 2023, 2024 y 2025
			Población en rango >= 4 mca a < 7 mca		DC18	nº	Población servida con agua potable cuya PMP del período considerado se haya verificado entre 4 y 7 mca	-	-	-	-	225.188	218.870	193.026	181.206	Se actualizó en base a Censo 2022 con Proyección x CV Se actualizaron los años 2022, 2023, 2024 y 2025
			Población en rango < 4 mca		DC19	nº	Población servida con agua potable cuya PMP del período considerado se haya verificado entre 0 y 4 mca	-	-	-	-	64.756	61.179	98.064	103.927	Se actualizó en base a Censo 2022 con Proyección x CV Se actualizaron los años 2022, 2023, 2024 y 2025
			Análisis de agua potable exigidos por la norma	dc-06	DC06	Nº	Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de agua potable en redes de distribución, de todo tipo exigidos por la normativa vigente en el período.	-	17.104	17.357	17.692	18.140	18.461	19.038	16.983	En 2025 se utiliza el Censo 2022.
			Análisis de agua potable realizados	dc-07	DC07	Nº	Cantidad total de análisis de todo tipo (determinaciones: no muestras) sobre agua potable realizados en redes de distribución en el período.	-	38.530	61.649	53.152	58.642	60.319	47.762	43.315	
			Análisis de agua potable conformes	dc-08	DC08	Nº	Cantidad total de análisis de todo tipo (determinaciones: no muestras) sobre agua potable realizados en redes de distribución en el período, cuyo resultado resultó en conformidad con la normativa aplicable.	-	38.193	60.129	51.639	56.771	58.562	46.213	41.857	
			Análisis de Cloro Residual exigidos por la norma	dc-13		Nº	Cantidad total de análisis de cloro residual en agua potable (en redes de distribución) exigidos por la normativa vigente en el período.	-	1.437	1.459	1.487	1.524	1.551	1.600	1.427	En 2025 se utiliza el Censo 2022.
			Análisis de Cloro Residual realizados	dc-13a		Nº	Total de análisis de cloro residual realizados en redes de distribución en el año.	-	2.853	2.993	3.054	3.172	3.195	3.159	3.223	
			Análisis de Cloro Residual conformes	dc-13b		Nº	Total de determinaciones conforme a norma respecto al parámetro cloro residual.	-	2.729	2.813	2.861	3.046	3.115	3.058	3.152	
			Análisis bacteriológicos conformes		DC10	Nº	Cantidad de análisis bacteriológicos de agua potable entregada realizados, que resultaron conformes con la normativa vigente	-	2.779	2.924	3.020	3.147	3.142	3.141	3.199	
			Análisis bacteriológicos realizados		DC11	Nº	Cantidad de análisis bacteriológicos de agua potable entregada realizados	-	2.851	2.993	3.054	3.172	3.195	3.159	3.223	
			Análisis de nitratos conformes		DC12	Nº	Cantidad de análisis de nitratos de agua potable entregada realizados, que resultaron conformes con la normativa vigente	-	391	389	288	332	396	310	259	
			Análisis de nitratos realizados		DC13	Nº	Cantidad de análisis de nitratos de agua potable entregada realizados	-	1.293	1.287	950	1.035	1.103	927	825	
			Análisis de arsénico conformes		DC14	Nº	Cantidad de análisis de arsénico de agua potable entregada realizados, que resultaron conformes con la normativa vigente	-	1.285	1.276	948	1.032	1.103	927	826	
			Análisis de arsénico realizados		DC15	Nº	Cantidad de análisis de arsénico de agua potable entregada realizados	-	1.293	1.287	950	1.035	1.103	927	826	
	saneamiento	Taponamientos	Taponamientos en Redes de saneamiento	dc-21	DC21	Nº	Cantidad de taponamientos ocurridos en cañerías maestras o conexiones de la red de saneamiento en el período.	22.851	19.730	16.762	19.769	24.186	21.326	21.555	23.088	
			Cañerías limpiadas		DC27	Km	Longitud total de las cañerías de recolección y transporte de aguas residuales, excluidas las conexiones domiciliarias, que fue sometida a un proceso de limpieza mecánica, hidráulica o de otra naturaleza, en el período.	326	323	135	319	446	430	448	421	
		Roturas	Roturas en Redes	dc-22	DC22	Nº	Cantidad de roturas en redes de saneamiento en el año, incluyendo cañerías, accesorios, bocas de registro, etc., excluyendo conexiones.	-	989	1.259	1.836	1.513	1.360	572	N/A	En 2025 se informa en la planilla 852 de manera unificada (sin discriminar Nuevos Partidos).
			Roturas en conexiones	dc-23	DC23	Nº	Cantidad de roturas en conexiones, incluyendo accesorios.	-	1.219	1.275	1.668	1.476	1.579	981	N/A	En 2025 se informa en la planilla 852 de manera unificada (sin discriminar Nuevos Partidos).
		Calidad del líquido volcado a cuerpo receptor	Análisis de aguas residuales exigidos por la norma	dc-24		Nº	Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de aguas residuales de todo tipo exigidos por la normativa vigente en el período.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Análisis de aguas residuales realizados	dc-25	DC25	Nº	Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de aguas residuales de todo tipo realizados en el período.	-	-	-	-	-	4.863	5.496	4.727	
			Análisis de aguas residuales conformes	dc-26	DC26	Nº	Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de aguas residuales de todo tipo realizados en el período cuyo resultado resultó en conformidad con la normativa aplicable.	-	-	-	-	-	4.795	5.391	4.702	
			Análisis a industrias realizados		DC30	Nº	Cantidad de análisis de todo tipo de aguas residuales no residenciales realizados durante el período	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Análisis a industrias exigidos		DC31	Nº	Cantidad de análisis de todo tipo de aguas residuales exigidos por la normativa vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	
ATENCION AL USUARIO	Reclamos Atendidos		Total de Reclamos	du-01	DU01	Nº	Total de reclamos al operador en el año por todo concepto.	91.090	81.595	54.200	63.689	88.537	97.146	80.743	72599	
			Comerciales	du-02	DU02	Nº	Reclamos por facturación, errores en la medición, etc.	13.325	13.461	6.733	4.778	7.481	9.677	8.912	8.192	
			Servicio de Agua	du-03		Nº	Reclamos por servicio de agua: falta de agua, presión, turbiedad, color, olor, pérdidas, medidores, etc.	47.951	43.226	26.979	34.036	50.567	58.604	45.473	46.286	
			Servicio de Saneamiento	du-04		Nº	Reclamos por servicio de saneamiento: obstrucciones, desbordes, pérdidas, inundaciones, olores, etc.	27.939	23.330	19.699	23.498	28.164	26.274	24.976	26.313	
			Respuestas en tiempo	du-05	DU05	Nº	Reclamos respondidos dentro del tiempo límite prescripto, en el período informado.	76.095	67.404	48.379	57.248	78.525	82.809	81.215	81.236	
SANCIONES			Sanciones aplicadas por la autoridad regulatoria	dz-01		Nº	Cantidad de sanciones aplicadas por la autoridad regulatoria, de cualquier tipo y monto.	0	0	0	0	0	0	0	0	
INFORMACION ECONOMICA	Costos de los servicios de Agua Potable y saneamiento	Facturación por tipo de servicios	Facturación total por servicios de agua potable y/o saneamiento	de-01	DE01	Moneda Local / 1000	Total de la facturación en el período, por los servicios de agua potable, incluyendo agua exportada, y saneamiento, incluyendo aguas residuales importadas (NO debe incluir impuesto "IVA", si en cambio otros impuestos que forman parte del costo de operación).									
			Agua Potable	de-02		Moneda Local / 1000	Facturación por servicios de agua potable, incluyendo agua exportada.									
			Agua Potable a Residenciales	de-46	DE46	Moneda Local / 1000	Facturación por servicios de agua potable, a cuentas Residenciales.									
			Saneamiento	de-03		Moneda Local / 1000	Facturación por servicios de saneamiento, incluyendo aguas residuales importadas.									
			saneamiento a Residenciales	de-47	DE47	Moneda Local / 1000	Facturación por servicios de saneamiento, a cuentas Residenciales.									
			Otros Servicios	de-04		Moneda Local / 1000	Facturación por otros servicios no relacionados con el Agua y saneamiento (única pregunta económica no centrada en Agua y saneamiento).									
		Cobro	Saldo pendiente de cobro	de-05	DE05	Moneda Local / 1000	Facturación pendiente de cobro al final del período informado (Deudores por Ventas).									
			Ingreso efectivo	de-58		Moneda Local / 1000	Total efectivamente recibido (por cualquier medio de pago) durante el año por servicios de agua y saneamiento.									
			Incobrabilidad	de-65		Moneda Local / 1000	Previsión de Incobrabilidad de la Facturación del Año (de-01). Generalmente se presenta entre las Ventas Brutas y Netas (es la diferencia entre ambas).									
			Otros Ingresos	de-59		Moneda Local / 1000	Ingresos durante el año sin contraprestación (Subsidios, donaciones, etc. relacionados con el Servicio de Agua y saneamiento).									
		Costos por Categoría	Costos operativos totales	de-10	DE10	Moneda Local / 1000	Costos directos de operación y gastos generales de administración y ventas (comercialización), excluidas depreciaciones, intereses, deuda e impuesto a la renta (o impuesto a la ganancia). (de-12 + de-21)									
			Depreciaciones	de-54		Moneda Local / 1000	Depreciaciones o amortización anual de los Bienes pertenecientes al Activo de la Prestadora.									
			Costo Laboral Total	de-55		Moneda Local / 1000	Costos laborales del total de personal propio y contratado directo de la empresa, con beneficios y cargas sociales.									
			Costo de la Energía	de-63		Moneda Local / 1000	Costo de la energía consumida por la empresa.									
			Consumo de Energía Física	de-64		Megawatt/h (1000 KWh)	Total de energía consumida por la empresa, en unidades equivalentes de 1000 kWh.									
			Costos de prestaciones de terceros	de-11		Moneda Local / 1000	Costos totales de operación, administración y ventas, contratados a terceros.									
		Costos de Explotación	Costos Operativos de Agua Potable y saneamiento	de-12		Moneda Local / 1000	Costos ligados a la operación y mantenimiento: mano de obra, combustibles, energía eléctrica, productos químicos, consumibles, servicios de terceros, etc. de los servicios de agua potable y saneamiento. (Es suma de de-13 + de-17).									
			Costos Operativos del Servicio de Agua Potable	de-13	DE13	Moneda Local / 1000	Costos ligados a la operación y mantenimiento: mano de obra, combustibles, energía eléctrica, productos químicos, consumibles, servicios de terceros, etc. de los servicios de agua potable. No incluye depreciaciones ni Intereses.									
			Costos de producción de Agua Potable		DE60	Moneda Local / 1000	Costos de producción de agua potable de fuente superficial o subterránea, desde la fuente hasta su ingreso a la red									
			Costos de mano de obra de operación y mantenimiento de Agua Potable	de-14		Moneda Local / 1000	Costo total de la mano de obra propia y contratada para la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable (inlcuye beneficios y cargas sociales).									
			Costos de la energía de operación y mantenimiento de agua potable	de-15		Moneda Local / 1000	Costo de la energía consumida para la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable.									
			Costos de los productos químicos de operación y mantenimiento de agua potable	de-16		Moneda Local / 1000	Costo de los productos químicos consumidos para la operación de los servicios de agua potable.									
			Costos operativos del servicio de saneamiento	de-17	DE17	Moneda Local / 1000	Costos ligados a la explotación del servicio de cloaca. No incluye Depreciaciones ni Intereses.									
			Costos de mano de obra de operación y mantenimiento de saneamiento	de-18		Moneda Local / 1000	Costo total de la mano de obra propia y contratada para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento (incluye beneficios y cargas sociales).									
			Costos de la energía de operación y mantenimiento de saneamiento	de-19		Moneda Local / 1000	Costo de la energía consumida para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.									
			Costos de los reclamos		DE61	Moneda Local / 1000	Costos de recepción y atención de reclamos									

GRUPOS Y VARIABLES			Código ADERASA	Código Guía AySA	UNIDAD	DEFINICION	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
INFORMA	Costos de conexió	Costo de conexión de AP		DE62	$	Costos de instalación de conexiones domiciliarias nuevas de agua potable en el período									
		Costo de conexión de AR		DE63	$	Costos de instalación de conexiones domiciliarias nuevas de aguas residuales en el período									
	Costos de administración y Ventas	Gastos Generales de Administración y Ventas	de-21	DE21	Moneda Local / 1000	Costos de sede, lectura de medidores, facturación, cobro, asesorías, comunicaciones, gastos grales., etc. (no incluye depreciaciones)									
	Inversiones	Inversión Presupuestada	de-30	DE49	Moneda Local / 1000	Monto total de inversión presupuestada para el período.									
		Inversión Ejecutada	de-31	DE31	Moneda Local / 1000	Monto total de la inversión ejecutada en el período.									
		Inversiones en sustitución de activos de AR		DE32	Moneda Local / 1000	Inversión en obras destinadas a sustituir activos de aguas residuales obsoletos por otros de más moderna tecnología o a aumentar la vida útil de los activos existentes durante el período.									
		Inversiones en sustitución de activos de AP		DE35	Moneda Local / 1000	Inversión en obras destinadas a sustituir activos de agua potable obsoletos por otros de más moderna tecnología o a aumentar la vida útil de los activos existentes.									
	Activo Moderno Equivalente (AME)	AME - AP		DE50	Moneda Local / 1000	Valor del Activo Moderno Equivalente total destinado al servicio de agua potable									
		AME - AR		DE48	Moneda Local / 1000	Valor del Activo Moderno Equivalente total del activo destinado a la prestación de servicios de aguas residuales al final del período.									
	Datos de Balance	Resultado Operativo (EBITDA)	de-40		Moneda Local / 1000	Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA).									
		Resultado Neto	de-41	DE41	Moneda Local / 1000	Resultado luego de impuestos.									
		Remuneración del Capital	de-56		Moneda Local / 1000	Pagos al Capital (utilidades) durante el período, en forma de dividendos en efectivo, pagos directos a propietarios, etc.									
		Total de Servicio de la deuda	de-49		Moneda Local / 1000	Total de intereses pagados para la satisfacción de las deudas de la empresa.									
		Resultado Financiero	de-57		Moneda Local / 1000	Interés Neto, resultado entre los intereses cedidos y los obtenidos durante el ejercicio contable. Un número NEGATIVO significa PERDIDAS (positivo=ganancias).									
		Activo Total	de-42		Moneda Local / 1000	Según balance.									
		Activo Fijo (No corriente)	de-50		Moneda Local / 1000	Son Activos que por su utilización o envergadura no podrían "venderse" o realizarse en el siguiente período.									
		Patrimonio neto	de-43	DE43	Moneda Local / 1000	Según balance (Diferencia entre el Activo y el Pasivo)									
		Pasivo Circulante (Corriente)	de-44		Moneda Local / 1000	Pasivo / Deudas de corto plazo (vencimiento menor a un año).									
		Pasivo total	de-45	DE45	Moneda Local / 1000	Pasivo / Deuda Total de corto y largo plazo.									
		Cargo fijo mensual para clientes residenciales	de-51		Moneda Local	El componente fijo de la factura (en su caso) por el suministro de servicios de abastecimiento de agua y recolección de aguas servidas, correspondiente a un MES. Consignar el número cero cuando no se apliquen cargos fijos.									
		Facilidades de Pago	de-60		si/no	¿Ofrece la empresa al cliente una opción de cobro flexible/amortizada (en cuotas) para recuperar el costo de conexión a la red de agua y/o saneamiento?	si	si	si	si	si	si	si		
		Cargos de Conexión de Agua Potable	de-52		Moneda Local	Costo total por la instalación de la conexión residencial al servicio de agua.									
		Nivel de Servicio de Agua Potable	de-61		si/no	¿Ofrece la empresa más de un nivel de servicio para el suministro de agua domiciliario (excluyendo a piletas públicas o gratuitas)?	no	no	no	no	no	no	no		
		Cargos de Conexión de saneamiento	de-53		Moneda Local	Costo total por la instalación de la conexión residencial a los servicios de saneamiento.									
		Nivel de Servicio de saneamiento	de-62		si/no	¿Ofrece la empresa más de un nivel de servicio de saneamiento o alternativa tecnológica para los hogares (excluyendo baños públicos)?	no	no	no	no	no	no	no		

AySA SA - VARIABLES PARA EL CALCULO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA BENCHMARKING **F-852**

GRUPOS Y VARIABLES			Código ADERASA	Código Guía AySA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
INOFORMACION DEL PRESTADOR	Personal del operador	Personal propio total	di-30	DI30	Nº	Sumatoria total del personal propio y contratado (a tiempo completo equivalente - TCE) empleado por el operador.	4.046	4.348	4.425	4.669	4.847	4.847	5.231	5.694	6.061	6.441	6.630	7.051	7.010	6.874	6.803	7.510	7.607	7.708	6.344	6.054	Valor correspondiente a AySA 2015 + Nuevos Partidos. Según informa RRHH, "ya no hay apertura entre AySA y Área ampliada".
		Personal empleado en el servicio de agua potable	di-31		Nº	Total de personal propio y contratado (TCE) empleado en el servicio de agua (tanto mano de obra directa, como personal administrativo, en comercialización etc.).	1.961	2.053	2.195	2.343	2.432	2.277	2.457	2.503	2.635	2.706	2.598	2.674	2.472	2.375	2.420	2.703	2.703	2.675	2.178	2.030	
		Personal en Transporte y distribución de Agua Potable	di-33		Nº	Cantidad de personal propio y contratado (a TCE) empleado en redes de transporte y distribución de agua potable, incluyendo reservas (tanques de agua de la empresa)	1.427	1.503	1.629	1.834	1.835	1.704	1.839	1.820	1.942	1.948	1.817	1.851	1.700	1.624	1.663	1.991	2.044	1.978	1.572	1.425	
		Total Personal en el Servicio de Saneamiento	di-34		Nº	Total de personal propio y contratado (a TCE) empleado en el servicio de saneamiento (tanto mano de obra directa, como personal administrativo, en comercialización etc.).	2.085	2.179	2.180	2.325	2.415	2.570	2.774	3.191	3.426	3.735	4.032	4.377	4.538	4.499	4.383	4.807	4.353	5.033	4.166	4.024	
		Personal en Transporte de Saneamiento	di-35		Nº	Cantidad de personal propio y contratado (a TCE) empleado en redes de recolección y transporte de saneamiento.	1.957	1.982	1.982	2.157	2.170	2.297	2.479	2.743	2.926	3.111	3.389	3.724	3.888	3.890	3.751	4.274	4.353	4.498	3.646	3.517	
		Entrenamiento en prevención y emergencias AP		DP16	Nº	Cantidad de personal que participó en simulaciones del Plan de Prevención y Emergencias de agua potable en el período	0	0	0	0	0	196	1	0	11	0	0	0	851	0	57	176	80	84	139	45	
		Entrenamiento en prevención y emergencias AR		DP17	Nº	Cantidad de personal que participó en simulaciones del Plan de Prevención y Emergencias de aguas residuales en el período	0	0	0	0	0	155	0	0	33	0	0	0	105	0	53	232	116	237	108	85	
		Capacitación del personal		DI36	horas	Cantidad de horas-empleado utilizadas para la capacitación del personal de la entidad prestadora en el período	22.550	43.349	57.105	59.858	67.451	82.028	84.911	79.189	84.271	146.327	86.271	133.303	147.626	108.110	13.041	75.354	105.017	89.068	67.233	54.874	
RMACIÓN AMBIENTAL	Lluvia caída	Promedio	dm-01		mm/año	Promedio de lluvia caída en todo el año en los últimos 30 años.	1.145,5	1.145,5	1.145,5	1.214	1.214																
		Actual	dm-04		mm/año	Lluvia caída en el año que se informa.	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0																
	Temperatura	Promedio	dm-05		ºC	Temperatura diaria promedio de los últimos 30 años.	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5																
		Máxima diaria	dm-06		ºC	Temperatura diaria promedio del día más caluroso del año en los últimos 30 años.	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2																
		Mínima diaria	dm-07		ºC	Temperatura diaria promedio del día más frío del año en los últimos 30 años.	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5																
	Topografía	Máxima diferencia de nivel	dm-08		m	Diferencia entre el punto más alto y el más bajo del terreno del área con servicio de agua y cloacas.	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
	Demografía	Población residente	dm-10	DM10	habitantes	Cantidad de habitantes residentes permanentes en el área de responsabilidad de distribución de Agua por el operador.	10.011.716	10.103.134	10.196.754	10.292.635	10.390.843	10.491.442	10.591.364	10.689.686	10.786.802	10.882.300	10.976.419	11.068.926	11.160.191	11.249.529	11.337.275	11.423.451	11.508.013	11.590.992	11.672.183	10.896.283	Datos de población en base al CENSO 2022.
		Población residente para saneamiento	dm-20		habitantes	Cantidad de habitantes residentes permanentes en el área de responsabilidad del saneamiento por el operador.	10.011.716	10.103.134	10.196.754	10.292.635	10.390.843	10.491.442	10.591.364	10.689.686	10.786.802	10.882.300	10.976.419	11.068.926	11.160.191	11.249.529	11.337.275	11.423.451	11.508.013	11.590.992	11.672.183	10.896.283	Datos de población en base al CENSO 2022.
		Densidad poblacional	dm-12		hab./km2	Población residente / área de responsabilidad del operador.	5.381	5.369	5.369	5.534	5.556	5.579	5.601	6.063	6.148	6.236	6.264	6.317	6.369	6.420	6.470	6.519	6.567	6.615	6.661	6.218	Datos de población en base al CENSO 2022.
		Tasa de crecimiento de la población	dm-13		% por año	Variación anual promedio del crecimiento de la población en los últimos 10 años.	1,90%	0,06%	1,49%	1,56%	0,40%	0,40%	0,40%	1,30%	1,40%	1,43%	0,45%	0,84%	0,82%	0,80%	0,78%	0,76%	0,74%	0,72%	0,70%	-6,65%	Datos de población en base al CENSO 2022.

GRUPOS Y VARIABLES			Código ADERASA	Código Guía AvSA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
INFO	Economía	Tasa de cambio al final del periodo	dm-14		Moneda local / USD	Tasa de cambio de la moneda local con el dólar estadounidense al final del período.	3,07	3,13	3,43	3,81							15,70	18,40	36,80	58,00	83,25	101,75	175,25	805,45	1.012,50	1.430,00	Tipo de Cambio comprador Banco de la Nación Argentina
		Tasa de cambio promedio del período	dm-15		Moneda local / USD	Tasa de cambio de la moneda local con el dólar estadounidense promedio del período, calculada como promedio del valor de cierre mensual.	3,07	3,10	3,16	3,75							15,64	16,53	28,70	46,79	68,63	94,24	138,65	313,72	904,29	1.217,42	Tipo de Cambio comprador Banco de la Nación Argentina
		PBI	dm-18		USD	Producto Interno Bruto (PIB) por Habitante. Es un indicador económico referido a todo el País, estimado en dólares estadounidenses.	4.434	4.873	4.095	3.222							12.449	14.402	N/D	10.006	9.912	N/D	13.686,00	13.730,50	14.187,48	ND	Banco Mundial - PBI per cápita (U$S a precios actuales)
		Ingreso Familiar Anual	dm-21		Moneda Local	Ingreso Familiar promedio de todos los estrato, anualizado y expresado en moneda local. Generalmente este dato es provisto por el Instituto de Estadísticas de cada país.											247.632	324.228	411.708	597.576	723.684	1.184.028	1.868.040	1.875.708	5.311.152	7.631.952	INDEC - EPH: Ingreso Medio
		Tasa de inflación minorista oficial	dm-16		% por año	Variación del índice de precios al consumidor del país en el período considerado.	9,60	9,80	8,80	8,60							39,36	25,04	47,10	52,87	34,10	51,44	95,19	211,40	117,80	31,50	IPC INDEC Nacional
		Sueldo mínimo anual (USD al cierre: dm-14)	dm-19		USD	Es el sueldo mínimo aceptado por el Estado para las relaciones laborales formales.	2.664	2.642	4.093	4.304							513,4	481,5	307,1	290,9	247,3	314,5	353,5	497,3	276,3	234,1	SMVM / TC BN
		Tasa de desocupación	dm-17		%	Porcentaje de la población económicamente activa sin trabajo al final del período.	11,60	8,70	8,50	7,90							7,6	7,2	9,1	8,9	11,0	7,0	6,3	5,7	6,4	7,5	INDEC - EPH
INFORMACION SOBRE EL SERVICIO	Cobertura	Agua Potable	Población servida con conexión domiciliaria de agua potable	ds-01	DS01	habitantes	Cantidad de habitantes residentes con acceso a agua potable de red mediante una conexión domiciliaria, al final del período.	7.616.018	7.704.065	7.820.602	7.956.544	8.143.044	8.407.861	8.692.693	8.866.497	8.941.988	9.094.364	9.204.479	9.348.365	9.479.929	9.577.462	9.709.817	9.848.585	9.967.791	10.058.728	10.140.068	9.536.730	Datos de población en base al CENSO 2022.
			Población servida mediante una pileta pública de agua potable	ds-02	DS02	habitantes	Cantidad de habitantes residentes con acceso a agua potable, mediante una pileta pública (disponible a menos de 200 metros del hogar) al final del período.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Duración del abastecimiento	ds-12		horas/día	Promedio ponderado de horas de servicio, resultante entre las conexiones con servicio continuo y discontinuo (ej.: 2 conexiones de 24 hs. y 2 de 18 hs. = 21 hs.)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
			Clientes con servicio discontinuo (intermitente).	ds-13		%	Proporción de Población con servicio discontinuo o intermitente (abastecimiento inferior a 24 hs.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saneamiento Sanitario	Población servida con saneamiento sanitario	ds-05	DS05	habitantes	Cantidad de habitantes residentes, al final del período, que vuelcan sus efluentes a la red de saneamiento, mediante una conexión domiciliaria.	5.712.926	5.761.618	5.801.169	5.871.510	5.963.157	6.115.270	6.430.898	6.649.446	6.828.624	6.969.100	7.223.433	7.383.488	7.632.488	7.855.750	7.973.450	8.171.518	8.361.424	8.596.741	8.745.432	8.233.815	Datos de población en base al CENSO 2022.
	Cuentas		Total de cuentas	ds-07		Nº	Cantidad total de cuentas a las que se les factura agua potable y/o saneamiento (clientes o unidades a las que se emite factura). NO es suma de ds-08 + ds-09.	2.839.937	2.879.746	2.894.719	2.925.485	3.007.171	3.057.692	3.112.567	3.159.921	3.193.267	3.224.954	3.246.770	3.294.144	3.326.065	3.355.578	3.371.074	3.392.362	3.413.948	3.435.777	3.457.712	3.467.116	
			Cuentas de Agua Potable	ds-08	DS08	Nº	Cantidad de cuentas a las que se les factura agua potable (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente el servicio de saneamiento).	2.815.600	2.855.069	2.869.951	2.901.193	2.975.342	3.020.289	3.063.007	3.091.295	3.116.529	3.142.072	3.157.356	3.200.896	3.220.159	3.245.985	3.261.096	3.280.235	3.307.440	3.323.647	3.341.401	3.352.064	
			Cuentas Residenciales de Agua Potable	ds-10	DS10	Nº	Cantidad de cuentas residenciales a las que se les factura agua potable (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente servicio de saneamiento).	2.513.983	2.549.378	2.563.379	2.591.631	2.661.485	2.702.849	2.740.156	2.762.732	2.789.510	2.813.600	2.830.184	2.871.511	2.890.662	2.916.789	2.931.867	2.950.845	2.981.841	2.998.495	3.016.947	3.027.549	
			Cuentas de saneamiento	ds-09	DS09	Nº	Cantidad de cuentas a las que se les factura saneamiento (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente servicio de agua potable).	2.297.409	2.310.551	2.317.079	2.333.465	2.370.515	2.422.049	2.498.262	2.560.571	2.612.932	2.652.056	2.701.709	2.747.747	2.802.605	2.864.497	2.884.221	2.921.192	2.955.128	3.013.460	3.051.154	3.067.895	
			Cuentas Residenciales de saneamiento	ds-11	DS11	Nº	Cantidad de cuentas residenciales a las que se les factura saneamiento (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente servicio de agua potable).	2.027.830	2.038.774	2.044.999	2.059.021	2.091.979	2.139.386	2.208.484	2.262.923	2.314.819	2.351.511	2.399.547	2.442.899	2.495.941	2.555.857	2.574.963	2.610.400	2.647.799	2.703.999	2.741.568	2.758.199	

GRUPOS Y VARIABLES				Código ADERASA	Código Guía AySA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
ACTIVOS FISICOS	Tratamiento de Agua y Almacenamiento		Capacidad de Potabilización Instalada en Plantas y Pozos	da-01	DA03	m3/dia	Sumatoria de la capacidad teórica de potabilización instalada en plantas o pozos que requieran intervención de un mínimo proceso de potabilización (por ej.: desinfección).	5.306.280	5.252.160	5.252.160	5.231.416	5.235.905	5.331.368	5.546.264	5.704.114	5.877.501	6.123.470	6.155.622	6.320.000	6.283.613	6.348.175	6.396.866	6.446.911	6.435.373	6.464.518	6.471.238	6.462.889	
			Potabilización Pico Anual	da-02		m3/dia	Volumen efectivo potabilizado, el día de máxima entrega del año.	4.932.861	5.094.700	5.144.000	5.107.103	7.637.861	5.194.174	5.287.501	5.287.501	5.552.641	5.849.830	5.798.450	5.740.992	5.909.239	5.757.197	5.939.525	6.046.065	6.097.075	6.068.909	5.854.611	6.426.329	
	Red de agua	Cañerías	Longitud total	da-04	DA04	Km	Longitud total de las cañerías de transporte y distribución de agua, excluidas las conexiones.	16.675	16.738	16.943	17.226	17.545	18.247	18.872	19.136	19.383	19.564	19.741	20.014	20.352	20.495	20.763	21.154	21.425	21.600	21.729	21.921,49	
			Cañerías reemplazadas		DA30	Km	Longitud de cañerías de agua potable reemplazadas en el período	16,87	48,57	17,68	79,26	50,82	168,28	109,30	64,58	71,21	61,44	59,20	59,71	58,20	28,27	25,36	151,48	25,11	97	98	211,68	
			Cañerías ferrosas desincrustadas		DA15	Km	Longitud de cañerías de tipo ferroso de agua potable desincrustadas en el período	0,23	17,10	30,07	24,94	33,58	29,71	29,73	31,42	26,75	48,13	45,90	36,13	54,86	8,58	15,02	4,90	7,55	21	26	27,01	
			Longitud cañerías ferrosas		DA16	Km	Longitud total de cañerías de tipo ferroso en la red de agua potable	6.677	6.677	6.669	6.681	6.673	6.656	6.660	6.641	6.611	6.579	6.554	6.543	6.529	6.503	6.493	6.432	6.357	6.334	6.328	6.325,71	
		Válvulas	Cantidad de válvulas		DA05	Nº	Cantidad total de válvulas en la red de agua potable al final del período	94.344	95.083	95.292	95.652	96.000	97.186	98.113	98.500	99.470	100.041	100.652	101.188	101.931	102.203	102.689	102.980	103.642	103.795	99.724	99.992	
			Válvulas reemplazadas		DA19	Nº	Cantidad de válvulas de agua potable reemplazadas en el período	185	379	441	361	421	542	327	471	362	616	730	779	666	361	360	1.280	1.634	59	731	1.540	
		Conexiones	Conexiones de Agua Potable	da-08	DA08	Nº	Total de conexiones de agua.	1.623.583	1.637.220	1.660.858	1.684.383	1.714.927	1.781.038	1.834.693	1.862.707	1.879.393	1.894.633	1.906.566	1.927.597	1.951.181	1.968.735	1.989.192	2.005.435	2.037.264	2.052.262	2.057.943	2.062.422	
			Conexiones de AP reemplazadas		DA31	Nº	Cantidad de conexiones domiciliarias de agua potable reemplazadas en el período	9.126	21.984	17.608	15.427	16.553	17.917	17.897	18.899	18.702	24.196	29.499	26.758	25.823	19.690	22.758	29.352	34.470	38.817	24.286	33.983	
			Nuevas conexiones de AP		DP36	Nº	Cantidad de conexiones domiciliarias nuevas de agua potable, instaladas en el período	9.791	13.637	23.638	23.525	30.544	66.111	53.788	28.014	16.686	15.240	11.933	21.031	23.659	17.554	20.457	20.344	30.326	14.998	5.711	4.502	
		Micromedición	Medidores Operativos	da-10	DA10	Nº	Cantidad total de medidores operativos (en funcionamiento y con lectura).	393.683	393.611	394.540	393.773	394.159	394.300	394.862	396.269	399.294	402.099	415.494	450.994	515.513	565.844	578.573	596.590	621.147	638.327	668.270	722.014	
			Medidores Residenciales Operativos	da-11		Nº	Cantidad de medidores residenciales operativos (en funcionamiento y con lectura) en conexiones residenciales.	300.486	300.486	301.153	300.378	300.596	300.733	301.176	301.465	302.067	302.988	305.671	316.417	373.168	420.321	432.396	448.687	472.250	488.779	517.989	570.073	
	Red de saneamiento	Conexiones	Cantidad de conexiones de aguas residuales	da-20	DA20	Nº	Total de conexiones de saneamiento.	1.043.893	1.047.875	1.052.662	1.067.340	1.088.049	1.136.776	1.199.927	1.241.540	1.284.238	1.315.171	1.349.917	1.382.494	1.430.873	1.479.753	1.493.018	1.520.929	1.560.693	1.603.724	1.632.440	1.645.108	
			Conexiones de AR reemplazadas		DA33	Nº	Cantidad de conexiones domiciliarias de aguas residuales reemplazadas en el período	904	2.704	2.206	1.582	2.081	2.297	2.318	2.886	3.016	3.173	3.788	5.488	4.189	2.974	3.499	3.757	2.949	2.845	2.610	2.039	
			Nuevas conexiones de AR		DP37	Nº	Cantidad de conexiones domiciliarias nuevas de aguas residuales, instaladas en el período	3.703	3.982	4.787	14.678	20.709	48.727	63.132	41.613	42.698	30.971	34.708	32.577	48.381	48.880	13.265	27.911	39.764	43.031	28.716	12.668	
		Cañerías	Longitud Total de la Red	da-22	DA22	Km	Longitud total de las cañerías de recolección y transporte de aguas residuales, excluidas las conexiones domiciliarias.	9.722	9.771	9.801	9.939	10.153	10.564	11.067	11.441	11.878	12.165	12.642	12.949	13.452	13.913	14.097	14.503	14.930	15.447	15.740	15.873	
			Cañerías de AR reemplazadas		DA32	Km	Longitud de cañerías de aguas residuales reemplazadas en el período	32,66	87,88	89,65	81,66	86,61	98,29	99,87	130,01	122,76	104,31	145,00	143,66	169,75	107,79	92,27	131,11	124,64	122	73	113	
		Estaciones elevadoras	Cantidad de electrobombas		DA23	Nº	Cantidad total de electrobombas de los sistemas de bombeo de aguas residuales al final del período, excluidas las bombas de reserva	193	195	199	198	189	201	221	248	276	287	166	319	315	332	354	354	373	401	381	371	
			Potencia instalada		DA35	kw	Total de la potencia instalada en estaciones elevadoras de aguas residuales	20.489	20.489	20.496	20.559	20.591	21.144	21.344	21.496	25.339	10.382	24.755	25.516	25.669	21.734	28.873	28.096	29.188	31.756	33.555	33.395	
		Capacidad de tratamiento secundario	Medido en habitantes	da-25		habit. equiv.	Capacidad de tratamiento secundario total teórica instalada en plantas de tratamiento de aguas residuales, en habitantes equivalentes.	655.500	698.884	710.512	860.000	995.000	995.000	995.000	1.261.226	1.621.270	1.621.270	1.621.270	1.702.220	1.702.220	1.702.220	1.702.220	1.702.220	1.943.433	2.226.000	2.226.000	2.226.000	
			Medido en caudal	da-26	DA26	m3/dia	Capacidad de tratamiento secundario total teórica instalada en plantas de tratamiento de aguas residuales, en m3 por día de agua procesada.	244.512	244.512	244.512	258.500	297.380	297.380	297.380	376.948	484.556	484.556	484.556	508.748	508.748	508.748	508.748	508.748	534.816	612.576	612.576	612.576	

GRUPOS Y VARIABLES				Código ADERASA	Código Guía AvSA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
MACION DE PRODUCCIÓN	Agua Potable (AP)	Extracción	Total agua extraída (captada)	dp-01	DP01	m3/día	Promedio diario de agua extraída en el año: subterránea y superficial (captada).	4.636.917	4.750.320	4.867.335	4.904.981	4.850.999	5.011.830	5.203.389	5.285.264	5.406.481	5.629.850	5.660.762	5.690.512	5.696.240	5.571.358	5.739.895	5.832.444	5.892.249	5.936.122	5.912.251	5.977.777	
			Agua subterránea	dp-02		m3/día	Promedio diario de agua subterránea extraída (captada).	176.420	195.450	217.107	231.416	235.905	249.672	252.017	253.351	245.373	252.282	260.015	273.262	304.701	316.523	360.787	406.282	435.373	464.518	471.238	453.423	
		Producción y despacho	Importación de Agua	dp-10		m3/día	Promedio diario de agua ("en bloque") importada o comprada a otros durante el año informado.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Total agua despachada	dp-03	DP03	m3/día	Promedio diario de agua despachada a la red en el año informado (Agua captada + importación - pérdidas en plantas). El despacho exportado en bloque debe incluirse.	4.513.948	4.619.514	4.803.902	4.948.888	4.978.989	5.039.634	4.971.341	4.960.837	5.048.167	5.144.149	5.083.918	5.192.190	5.169.982	5.106.979	5.308.255	5.418.790	5.461.798	5.473.921	5.420.066	5.389.065	
			Energía consumida en el bombeo de AP		DP18	kwh	Total de energía consumida en el bombeo de agua potable en el período	290.848.061	355.075.004	367.859.487	377.282.302	470.078.732	482.405.216	487.223.433	495.773.958	509.842.801	528.881.648	531.238.946	399.447.035	436.246.652	387.133.492	401.044.355	387.133.492	407.548.249	414.181.960	402.488.506	400.751.459	
			Factor de estandarización AP		DP19	m^3 x 100 mca	Sumatoria del agua potable elevada por cada bomba del sistema, multiplicada por la altura de elevación, expresada en centenares de metros de columna de agua												929.298.167	925.080.391	933.807.604	1.076.205.039	976.263.904	989.586.658	993.453.816	984.080.984	981.732.491	
			Producción de AP en plantas potabilizadoras		DP03a	m^3/día	Promedio diario de agua despachada a la red en el período, proveniente de las plantas potabilizadoras	4.271.265	4.338.254	4.406.946	4.442.065	4.407.527	4.527.333	4.689.361	4.753.462	4.863.731	5.072.879	4.967.460	5.089.391	5.102.030	5.011.660	5.143.228	5.153.457	5.199.895	5.151.120	5.014.992	5.086.752	
			Producción de AP en plantas potabilizadoras en día pico.		DP28	m^3	Volumen de agua tratada en las plantas potabilizadoras del día de mayor demanda	4.714.902	4.847.262	4.870.953	4.821.066	4.582.943	4.720.984	5.011.041	5.195.122	5.581.189	5.821.940	5.830.951	5.419.510	5.549.639	5.389.917	5.510.472	5.583.283	5.645.230	5.587.725	5.359.308	5.427.830	
			Consumo de sulfato de aluminio en plantas potabilizadoras		DP15	ton	Cantidad de sulfato de aluminio utilizado en todo el período para el tratamiento del agua potable	156.379	246.583	216.109	228.985	232.236	190.384	258.225	245.343	340.386	342.747	303.292	331.355	266.074	310.586	271.788	279.164	256.084	226.913	272.318	330.586	Se actualizó el valor del año 2024.-
			Agua comercializada	dp-04	DP04	m^3/día	Promedio diario de agua comercializada (que llega a destino, se factura o no, haya o no micromedición). Incluye despacho exportado.	2.912.927	2.929.924	2.716.154	2.752.076	2.797.168	2.842.465	2.825.651	2.895.655	2.928.410	3.073.221	2.985.835	3.055.425	3.046.808	3.010.659	2.984.415	3.045.583	3.120.440	3.129.997	3.389.526	2.759.790	
			Agua comercializada micromedida	dp-12		m^3/día	Promedio diario de agua comercializada con micromedición.		559.180	564.752	576.513	569.554	584.312	590.844	606.742	625.254	629.021	648.052	701.310	745.850	766.023	733.924	772.447	823.708	849.493	894.775	906.977	
			Agua comercializada a Clientes Residenciales	dp-13		m^3/día	Promedio diario de agua comercializada a clientes Residenciales (micromedida o no, que llega a destino).		2.389.539	2.126.571	2.192.030	2.358.523	2.305.643	2.329.554	2.315.681	2.375.210	2.447.914	2.350.241	2.479.663	2.523.975	2.533.267	2.541.913	2.607.199	2.644.784	2.646.396	2.934.137	2.702.786	
			Agua comercializada a Clientes NO Residenciales	dp-14		m^3/día	Promedio diario de agua comercializada a clientes No Residenciales (micromedida o no, que llega a destino).		540.385	589.583	560.046	540.408	536.821	496.097	579.974	553.200	625.306	635.594	567.866	514.845	468.398	405.851	429.824	466.067	473.316	445.029	409.855	
			Exportación de Agua	dp-11		m^3/día	Promedio diario de agua ("en bloque") exportada o vendida a otro distribuidor durante el año informado.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.895	7.988	8.995	13.130	8.560	9.588	10.286	10.360	10.276	
			Consumo no Autorizado	dp-15		m^3/día	Promedio diario de agua robada por población residencial (clandestinos).		156.810	156.810	150.724	156.862	165.393	140.202	115.310	115.310	110.631	110.631	106.764	106.764	136.448	121.170	78.012	78.012	66.953	-	-	
			Agua no Comercializada	dp-05		m^3/día	Promedio diario de agua despachada y no comercializada.	1.723.990	1.820.396	2.087.748	2.196.812	2.181.821	2.197.169	2.145.690	2.065.182	2.119.757	2.070.928	2.098.083	2.136.765	2.123.173	2.096.320	2.347.361	2.373.207	2.341.358	2.295.799	2.030.541	3.142.985	

GRUPOS Y VARIABLES				Código ADERASA	Código Guía AySA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
INFOR	Aguas Residuales (AR) - saneamiento	Volúmenes Recolectados y Transportados	Total Agua Residual Recibida	dp-06	DP06	m^3/día	Promedio diario estimado de aguas residuales ingresado a la red. Usualmente se adopta una fracción del agua potable comercializada.	2.095.438	2.227.494	2.181.283	2.249.494	2.219.849	2.045.994	2.060.308	1.974.089	2.258.870	2.615.776	2.545.514	2.553.742	2.626.679	2.742.073	2.801.629	2.730.474	2.679.785	2.906.007	2.984.430	3.709.208	Incluye a partir del mes de junio por la puesta en marcha de la Planta Dock Sud un caudal promedio de 10,5 m³/s en tiempo seco, estimado para esta etapa de puesta en marcha.
			Total Agua Residual Volcada	dp-07	DP07	m^3/día	Promedio diario medido de aguas residuales volcado a cuerpo receptor (con y sin tratamiento). Utilizar días secos (para excluir posibles aguas de lluvia)	2.095.438	2.227.494	2.181.283	2.249.494	2.219.849	2.045.994	2.060.308	1.974.089	2.258.870	2.615.776	2.545.514	2.553.742	2.626.679	2.742.073	2.801.629	2.730.474	2.679.785	2.906.007	2.984.430	3.709.208	Además incluye plantas Ferrari, Catonas, Bella Vista, Escobar y Garin.(No incluye Boca -Barracas).
			Vuelco prematuro		DP20	m^3/día	Promedio diario de aguas residuales espichadas en tiempo seco durante el período												-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Desbordes de AR en vía pública		DP26	Nº	Cantidad de incidentes de desbordes de aguas residuales en la vía pública en el período	5.998	10.706	10.805	11.776	10.288	12.468	12.749	11.871	14.013	13.767	15.364	16.465	16.200	15.245	13.026	14.783	14.469	14.443	15.184	14.249	
			Inundaciones de propiedades con AR.		DP33	Nº	Cantidad de inundaciones de propiedades con aguas residuales durante el período												2.591	2.533	3.062	2.394	2.335	2.201	2.034	1.617	1.649	
			Interrupciones de bombeo de AR		DP27	horas	Sumatoria del tiempo que las electrobombas de los sistemas de bombeo de aguas residuales estuvieron fuera de servicio durante el período					1.863	12.940	12.715	10.835	8.288	12.613	20.370	13.263	9.217	22.285	39.211	3.154	9.453	4.794	8.993	2.947	
			Energía de bombeo de AR		DP34	kwh	Total de la energía utilizada para el bombeo de aguas residuales durante el período	41.759.931	52.728.798	49.967.272	51.746.152	53.461.596	51.007.258	51.300.117	53.952.743	65.612.137	62.190.885	55.150.495	36.414.598	34.687.983	36.045.642	38.935.715	37.690.326	34.897.695	39.768.461	42.439.413	32.732.532	
			Factor de estandarización AR		DP35	m^3 x 100 mca	Sumatoria del agua residual elevada por cada bomba del sistema, multiplicada por la altura de elevación, expresada en centenares de metros												49.209.680	48.082.172	53.171.235	61.019.773	63.326.414	54.272.866	64.989.455	61.561.364	35.397.485	
		Tratamiento de Aguas Residuales	Vuelco con Tratamiento	dp-08	DP08	m^3/día	Promedio diario de aguas residuales vertido a cuerpo receptor previo tratamiento primario y/o secundario.	241.594	245.445	226.528	264.709	286.497	278.624	285.946	788.456	1.221.222	1.378.733	2.257.298	2.281.106	2.398.852	2.184.415	2.280.848	2.016.163	1.667.902	1.666.367	1.705.627	1.715.713	
			Vuelco con Tratamiento Secundario	dp-08b		m^3/día	Promedio diario de aguas residuales vertido a cuerpo receptor previo tratamiento secundario (DBO5 = 30 mg/lt; SS 10' = 0,5 ml/lt).	241.594	245.445	226.528	264.709	286.497	278.624	285.946	330.669	390.319	387.424	402.588	401.250	399.536	399.422	400.446	395.014	400.992	443.071	469.944	495.614	
			Caudal de AR tratado el día de máxima	dp-09	DP25	m^3/día	Caudal de aguas residuales tratado (primario y/o secundario) el día de máxima del año.	425.000	377.095	476.793	413.909	468.315	420.739	518.070	1.060.053	3.084.017	3.025.726	3.063.149	3.068.796	3.247.820	2.967.842	2.648.968	2.703.369	2.264.219	1.912.104	1.989.542	2.226.099	
			Producción de barros de AR		DP31	toneladas	Barros totales producidos en el período en todas las plantas depuradoras de los sistemas a cargo de la entidad prestadora	12.477	9.905	11.403	9.131	10.142	10.802	11.833	23.011	23.538	26.267	31.375	22.375	14.564	18.751	18.953	19.071	19.635	10.729	10.991	11.781	
			Destino de los barros de AR		DP32	toneladas	Barros que recibieron un destino final ambientalmente adecuado en el período	1.992	1.502	1.335	2.372	2.308	2.036	2.971	3.387	2.984	4.680	4.472	4.056	4.351	4.647	4.349	5.592	12.660	10.729	10.991	11.781	

GRUPOS Y VARIABLES				Código ADERASA	Código Guía AySA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
INFORMACION SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO	Agua Potable	Continuidad del servicio	Total conexiones afectadas por cortes (Para servicios contínuos)	dc-01	DC01	N°	Cantidad de conexiones afectadas por cortes de duración > a 6 horas. La repetición de cortes deberán sumar repetidas conexiones.	6.812.990	22.023.122	14.916.652	17.054.211	25.245.600	39.194.754	33.597.772	37.382.694	37.532.047	39.765.622	40.086.810	41.947.066	32.575.439	27.293.232	24.610.790	37.933.430	28.732.254	39.198.557	31.350.112	38.695.786	Se basa en cálculo con datos de población actualizado con CENSO 2022.
			Cuentas afectadas por corte por falta de pago (razones comerciales)	dc-02		N°	Cuentas a las que se les cortó o redujo su caudal de servicio por lo menos una vez en el período, por falta de pago.		24	1.151	437	4.638	3.868	4.097	3.801	3.675	7.116	8.860	11.611	12.118	9.250	2.752	4	4	0	9.357	24.433	
			Interrupciones del servicio de AP		DC40	hab. x horas	Suma de (Población sujeta a interrupción del servicio x Duración de la interrupción en horas)	606.264.726	2.025.697.923	1.242.036.726	1.137.564.130	1.713.344.628	2.512.661.255	2.726.127.523	3.098.194.090	3.584.421.881	3.012.106.055	3.211.710.240	3.063.502.101	2.650.011.991	2.281.805.545	1.944.978.382	3.363.883.903	3.445.880.072	3.452.925.754	3.674.029.762	3.850.920.853	A partir de 2024 el sector nos proporciona la información de manera unificada (AySA 2025 + Nuevas Areas), Ver archivo de Aysa 2015.
		Roturas	Roturas en Redes	dc-03	DC03	N°	Cantidad de roturas en redes de agua potable en el año, incluyendo válvulas y accesorios.	-	-	-	-	11.982	12.721	12.463	13.105	12.033	13.121	13.102	14.045	12.935	11.850	10.673	13.014	13.324	13.625	10.374	12.251	A partir de 2025 el sector nos proporciona la información de manera unificada (AySA 2025 + Nuevas Areas), Ver archivo de Aysa 2015.
			Roturas en conexiones	dc-04	DC04	N°	Cantidad de roturas en conexiones domiciliarias, incluyendo válvulas y accesorios y excluyendo medidores.	-	-	-	-	135.513	147.656	148.246	149.867	149.123	180.452	179.137	179.120	168.011	166.680	131.248	173.417	186.624	220.611	209.621	184.477	A partir de 2025 el sector nos proporciona la información de manera unificada (AySA 2025 + Nuevas Areas), Ver archivo de Aysa 2015.
		Presión en red	Población en rango >= 10 mca		DC16	Hab.	Población servida con agua potable cuya PMP del período considerado se haya verificado superior a los 10 mca	-	-	-	-	-	-	-	6.257.294	6.368.185	6.186.550	6.204.867	6.195.884	6.099.133	6.085.385	5.843.443	5.623.045	5.843.634	5.762.376	5.715.917	5.856.236	Se actualizó en base a Censo 2022 con Proyección x CV Se actualizaron los años 2022, 2023, 2024 y 2025
			Población en rango >= 7 mca a < 10 mca		DC17	Hab.	Población servida con agua potable cuya PMP del período considerado se haya verificado entre 7 y 10 mca	-	-	-	-	-	-	-	879.308	761.463	962.726	902.321	1.023.197	1.091.254	1.108.571	1.066.986	1.324.152	1.486.308	1.476.916	1.654.543	1.428.653	Se actualizó en base a Censo 2022 con Proyección x CV Se actualizaron los años 2022, 2023, 2024 y 2025
			Población en rango >= 4 mca a < 7 mca		DC18	Hab.	Población servida con agua potable cuya PMP del período considerado se haya verificado entre 4 y 7 mca	-	-	-	-	-	-	-	510.252	559.458	541.847	637.037	634.873	783.636	853.470	1.094.354	1.018.116	843.265	920.848	839.135	949.067	Se actualizó en base a Censo 2022 con Proyección x CV Se actualizaron los años 2022, 2023, 2024 y 2025
			Población en rango < 4 mca		DC19	Hab.	Población servida con agua potable cuya PMP del período considerado se haya verificado entre 0 y 4 mca	-	-	-	-	-	-	-	56.614	54.896	63.921	130.212	166.929	135.849	91.770	140.227	202.126	393.245	408.040	363.949	346.098	Se actualizó en base a Censo 2022 con Proyección x CV Se actualizaron los años 2022, 2023, 2024 y 2025
		Calidad de Agua en Redes	Análisis de agua potable exigidos por la norma	dc-06	DC06	N°	Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de agua potable en redes de distribución, de todo tipo exigidos por la normativa vigente en el período	106.659	106.704	107.711	108.871	110.519	113.979	116.797	125.789	127.692	129.981	131.440	133.495	135.373	136.766	138.656	140.638	142.340	143.639	144.800	136.185	En el presente año se basa en cálculos de población actualizados con CENSO 2022.
			Análisis de agua potable realizados	dc-07	DC07	N°	Cantidad total de análisis de todo tipo (determinaciones: no muestras) sobre agua potable realizados en redes de distribución en el período	87.744	127.141	131.634	139.092	138.250	137.744	135.860	137.029	143.002	141.933	145.856	133.501	144.623	145.614	146.354	148.112	150.671	153.027	152.022	149.632	
			Análisis de agua potable conformes	dc-08	DC08	N°	Cantidad total de análisis de todo tipo (determinaciones: no muestras) sobre agua potable realizados en redes de distribución en el período, cuyo resultado resultó en conformidad	87.476	126.605	130.929	138.359	137.261	137.198	134.567	135.896	141.719	140.966	144.852	132.752	143.511	144.539	145.509	147.150	149.189	152.070	150.963	148.276	
			Análisis de Cloro Residual exigidos por la norma	dc-13		N°	Cantidad total de análisis de cloro residual en agua potable (en redes de distribución) exigidos por la normativa vigente en el período.	8.963	8.967	9.051	9.149	9.287	9.578	9.815	10.570	10.730	10.923	11.045	11.218	11.376	11.493	11.652	11.818	11.961	12.070	12.168	11.444	En el presente año se basa en cálculos de población actualizados con CENSO 2022.
			Análisis de Cloro Residual realizados	dc-13a		N°	Total de análisis de cloro residual realizados en redes de distribución en el año.	11.145	10.979	10.940	11.152	11.247	11.184	11.240	11.473	11.713	12.081	12.300	12.333	12.409	12.558	12.610	12.761	12.811	13.022	13.152	13.329	
			Análisis de Cloro Residual conformes	dc-13b		N°	Total de determinaciones conforme a norma respecto al parámetro cloro residual.	11.056	10.915	10.754	10.961	11.192	11.141	11.159	11.391	11.602	11.952	12.194	12.258	12.353	12.472	12.518	12.667	12.744	12.998	13.118	13.290	
			Análisis bacteriológicos conformes		DC10	N°	Cantidad de análisis bacteriológicos de agua potable entregada realizados, que resultaron conformes con la normativa vigente	8.311	10.915	10.754	10.961	11.115	11.141	11.053	11.347	11.595	12.054	12.275	12.263	12.351	12.498	12.572	12.697	12.785	12.979	13.133	13.304	
			Análisis bactiológicos realizados		DC11	N°	Cantidad de análisis bacteriológicos de agua potable entregada realizados	8.348	10.979	10.940	11.152	11.244	11.184	11.228	11.474	11.719	12.081	12.300	12.332	12.410	12.559	12.611	12.762	12.811	13.022	13.151	13.329	
			Análisis de nitratos conformes		DC12	N°	Cantidad de análisis de nitratos de agua potable entregada realizados, que resultaron conformes con la normativa vigente	1.802	2.681	2.615	2.710	2.726	2.767	2.697	2.796	2.626	2.561	2.588	2.588	2.659	2.631	2.660	2.684	2.696	2.756	2.780	2.768	
			Análisis de nitratos realizados		DC13	N°	Cantidad de análisis de nitratos de agua potable entregada realizados	1.807	2.705	2.640	2.763	2.781	2.818	2.772	2.878	2.698	2.596	2.642	2.657	2.591	2.712	2.734	2.784	2.800	2.841	2.879	2.894	
			Análisis de arsénico conformes		DC14	N°	Cantidad de análisis de arsénico de agua potable entregada realizados, que resultaron conformes con la normativa vigente	1.847	2.660	2.601	2.742	2.687	2.724	2.704	2.805	2.692	2.596	2.644	2.654	2.660	2.713	2.734	2.792	2.800	2.839	2.878	2.887	
			Análisis de arsénico realizados		DC15	N°	Cantidad de análisis de arsénico de agua potable entregada realizados	1.847	2.661	2.603	2.749	2.694	2.729	2.716	2.805	2.694	2.596	2.644	2.654	2.660	2.713	2.734	2.792	2.800	2.839	2.878	2.887	

GRUPOS Y VARIABLES				Código ADERASA	Código Guía AySA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
	saneamiento	Taponamientos	Taponamientos en Redes de saneamiento	dc-21	DC21	Nº	Cantidad de taponamientos ocurridos en cañerías maestras o conexiones de la red de saneamiento en el período.	155.533	159.583	158.122	169.436	157.886	155.465	173.615	169.311	164.410	164.817	175.783	177.411	183.788	166.723	170.065	172.248	155.042	149.621	163.101	179.212	
			Cañerías limpiadas		DC27	Km	Longitud total de las cañerías de recolección y transporte de aguas residuales, excluidas las conexiones domiciliarias, que fue sometida a un proceso de limpieza mecánica, hidráulica o de	806	865	1.349	1.230	1.833	2.120	2.091	2.096	2.133	2.187	1.980	2.329	2.432	2.179	721	1.994	2.398	2.438	2.298	2.354	
		Roturas	Roturas en Redes	dc-22	DC22	Nº	Cantidad de roturas en redes de saneamiento en el año, incluyendo cañerías, accesorios, bocas de registro, etc., excluyendo conexiones.	-	-	-	-	2.935	2.986	3.210	3.839	3.692	4.022	4.555	4.710	4.498	4.815	5.107	6.538	6.639	5.969	4.072	4.532	A partir de 2025 el sector nos proporciona la información de manera unificada (AySA 2025 + Nuevas Areas), Ver archivo de Aysa 2015.
			Roturas en conexiones	dc-23	DC23	Nº	Cantidad de roturas en conexiones, inclyendo accesorios.	-	-	-	-	8.158	8.232	8.824	9.294	9.374	9.766	10.398	11.255	10.731	10.574	11.849	13.020	12.326	10.771	9.211	10.198	A partir de 2024 el sector nos proporciona la información de manera unificada (AySA 2025 + Nuevas Areas), Ver archivo de Aysa 2015.
		Calidad del líquido volcado a cuerpo receptor	Análisis de aguas residuales exigidos por la norma	dc-24		Nº	Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de aguas residuales de todo tipo exigidos por la normativa vigente en el período.	4.240	4.240	4.240	4.240	4.492	4.492	4.608	5.376	5.376	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488	7.168	7.168	7.168	7.168	7.168	7168	
			Análisis de aguas residuales realizados	dc-25	DC25	Nº	Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de aguas residuales de todo tipo realizados en el período.	8.304	9.954	10.823	11.138	13.082	13.082	8.257	8.926	8.267	9.295	11.812	10.145	20.023	17.965	21.009	31.381	29.464	27.552	25.858	21572	
			Análisis de aguas residuales conformes	dc-26	DC26	Nº	Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de aguas residuales de todo tipo realizados en el período cuyo resultado resultó en conformidad con la normativa aplicable.	8.182	9.528	10.484	10.931	12.987	12.987	8.191	8.997	8.217	9.185	11.744	10.075	19.970	17.793	20.926	31.210	29.299	27.268	25.759	21432	
			Análisis a industrias realizados		DC30	Nº	Cantidad de análisis de todo tipo de aguas residuales no residenciales realizados durante el período	-	-	-	-	-	-	1.324	1.577	1.021	999	1.183	649	875	980	274	201	470	593	630	605	
			Análisis a industrias exigidos		DC31	Nº	Cantidad de análisis de todo tipo de aguas residuales exigidos por la normativa vigente	-	-	-	-	-	-	2.604	6.940	3.318	2.555	2.462	2.429	2.067	1.762	1.777	1.617	1.344	1.427	1.518	1.911	
ATENCION AL USUARIO	Reclamos Atendidos		Total de Reclamos	du-01	DU01	Nº	Total de reclamos al operador en el año por todo concepto.	304.739	438.581	445.258	447.610	477.033	537.993	536.801	531.332	531.268	532.716	598.399	648.898	630.308	596.064	442.967	515.863	524.030	596.616	603.618	633.660	
			Comerciales	du-02	DU02	Nº	Reclamos por facturación, errores en la medición, etc.	55.071	79.741	58.711	38.917	71.984	122.014	108.855	86.642	88.706	97.044	151.861	192.428	169.967	164.500	56.285	64.497	71.520	92.841	105.574	138.736	
			Servicio de Agua	du-03		Nº	Reclamos por servicio de agua: falta de agua, presión, turbiedad, color, olor, pérdidas, medidores, etc.	162.867	163.525	211.891	211.765	221.536	230.740	241.582	243.403	232.535	237.707	234.855	239.861	236.137	223.614	187.474	239.105	254.616	308.019	295.157	280.711	
			Servicio de Saneamiento	du-04		Nº	Reclamos por servicio de saneamiento: obstrucciones, desbordes, pérdidas, inundaciones, obras, etc.	162.027	176.393	175.162	185.152	173.225	172.771	194.072	189.416	191.883	180.458	193.338	196.450	202.793	185.591	185.523	191.533	174.055	168.249	181.556	196.123	
			Respuestas en tiempo	du-05	DU05	Nº	Reclamos respondidos dentro del tiempo límite prescripto, en el período informado.	297.085	445.930	446.486	447.191	477.584	537.171	536.987	531.141	531.292	523.795	597.907	630.456	628.454	597.511	445.076	512.289	525.547	594.515	606.868	630.858	
SANCIONES			Sanciones aplicadas por la autoridad regulatoria	dz-01		Nº	Cantidad de sanciones aplicadas por la autoridad regulatoria, de cualquier tipo y monto.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GRUPOS Y VARIABLES			Código ADERASA	Código Guía AvSA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
Facturación por tipo de servicios		Facturación total por servicios de agua potable y/o saneamiento	de-01	DE01	Moneda Local / 1000	Total de la facturación en el período, por los servicios de agua potable, incluyendo agua exportada, y saneamiento, incluyendo aguas residuales importadas (NO debe incluir impuesto 'IVA', si en cambio otros impuestos que forman parte del costo de operación).	658.567	646.922	660.983	670.193	691.193	721.126	951.549	990.267	2.036.718	2.905.142	8.083.791	12.310.755	16.773.020	27.164.093	29.281.146	30.860.524	38.690.726	145.392.000	816.486.839	1.348.957.887	
		Agua Potable	de-02		Moneda Local / 1000	Facturación por servicios de agua potable, incluyendo agua exportada.	276.846	277.694	282.880	285.842	290.096	299.120	391.976	425.541	825.337	1.196.745	3.316.427	4.994.129	6.896.753	10.653.574	12.012.079	12.141.139	14.086.064	51.283.818	292.433.482	528.006.850	
		Agua Potable a Residenciales	de-46	DE46	Moneda Local / 1000	Facturación por servicios de agua potable, a cuentas Residenciales.	152.550	151.585	155.233	157.719	215.594	166.178	226.411	253.320	462.426	650.761	1.851.439	2.858.556	4.056.215	6.709.393	7.900.328	8.016.729	9.179.456	33.479.681	190.095.769	34.012.989	
		Saneamiento	de-03		Moneda Local / 1000	Facturación por servicios de saneamiento, incluyendo aguas residuales importadas.	243.743	245.497	250.063	252.446	256.456	263.058	350.926	382.097	753.467	1.104.086	3.059.351	4.602.887	6.288.332	9.712.756	11.064.439	11.181.385	13.030.483	47.944.992	273.881.309	496.933.718	
		saneamiento a Residenciales	de-47	DE47	Moneda Local / 1000	Facturación por servicios de saneamiento, a cuentas Residenciales.	132.777	132.484	135.766	137.942	139.892	143.977	200.874	225.126	417.988	595.835	1.699.922	2.632.103	3.699.132	6.099.807	7.280.660	7.382.932	8.486.002	31.325.860	177.866.592	13.853.026	
		Otros Servicios	de-04		Moneda Local / 1000	Facturación por otros servicios no relacionados con el Agua y saneamiento (única pregunta económica no centrada en Agua y saneamiento).	137.977	123.731	128.040	131.905	144.641	158.948	208.647	182.629	457.916	604.311	1.708.014	2.713.739	3.587.935	6.797.763	6.204.628	7.538.000	11.574.179	46.162.749	250.172.048	324.017.319	
Cobro		Saldo pendiente de cobro	de-05	DE05	Moneda Local / 1000	Facturación pendiente de cobro al final del período informado (Deudores por Ventas).	100.433	109.212	139.610	180.505	220.122	242.644	322.445	328.934	606.001	797.052	2.052.271	3.830.319	6.466.091	11.008.528	16.291.696	19.914.607	25.851.000	64.613.000	287.484.372	487.526	
		Ingreso efectivo	de-58		Moneda Local / 1000	Total efectivamente recibido (por cualquier medio de pago) durante el año por servicios de agua y saneamiento.	558.133	635.546	635.124	656.656	666.267	700.917	928.382	961.419	1.965.947	2.802.182	7.757.800	11.328.327	15.119.374	24.012.629	23.308.146	25.138.524	33.339.515	122.220.000	710.451.839	1.218.945.887	
		Incobrabilidad	de-65		Moneda Local / 1000	Previsión de Incobrabilidad de la Facturación del Año (de-01). Generalmente se presenta entre las Ventas Brutas y Netas (es la diferencia entre ambas).	100.433	11.376	25.859	13.537	24.926	20.209	23.167	28.848	70.771	102.960	325.991	982.428	1.653.646	3.151.464	5.973.000	5.722.000	5.351.211	23.172.000	106.035.000	130.012.000	
		Otros Ingresos	de-59		Moneda Local / 1000	Ingresos durante el año sin contraprestación (Subsidios, donaciones, etc. relacionados con el Servicio de Agua y saneamiento).	175.000	851.546	300.000	403.440	780.000	1.344.500	1.691.400	2.799.999	2.917.635	3.000.000	5.092.240	0	0	0	14.889.000	26.821.000	26.600.000	86.857.000	143.603.000	0	
Costos por Categoría		Costos operativos totales	de-10	DE10	Moneda Local / 1000	Costos directos de operación y gastos generales de administración y ventas (comercialización), excluidas depreciaciones, intereses, deuda e impuesto a la renta (o impuesto a la ganancia) (de-12 + de-21)	520.012	653.197	902.265	1.159.692	1.474.550	1.935.890	2.580.278	3.399.204	5.051.338	6.942.008	10.483.430	14.544.987	19.617.860	29.883.152	36.525.147	56.594.986	97.570.063	239.222.718	660.653.789	845.247.634	
		Depreciaciones	de-54		Moneda Local / 1000	Depreciaciones o amortización anual de los Bienes pertenecientes al Activo de la Prestadora.	627	1.919	2.504	222	357	9.634	19.695	27.575	25.138	42.841	94.114	996.678	1.689.960	2.633.645	2.414.809	2.916.083	4.604.000	10.687.000	18.809.000	31.075.000	
		Costo Laboral Total	de-55		Moneda Local / 1000	Costos laborales del total de personal propio y contratado directo de la empresa, con beneficios y cargas sociales.	281.133	310.499	419.539	557.038	724.214	1.038.937	1.402.287	1.849.412	2.592.377	3.769.014	5.482.348	7.779.026	10.019.596	14.579.796	17.984.092	27.862.330	51.275.000	123.459.805	296.435.071	320.007.000	
		Costo de la Energía	de-63		Moneda Local / 1000	Costo de la energía consumida por la empresa.	69.101	88.822	115.235	124.743	149.731	183.601	187.316	198.881	290.713	360.757	763.238	997.727	2.000.475	3.164.905	3.851.636	5.241.902	10.029.000	19.109.425	71.233.010	83.463.000	
		Consumo de Energía Física	de-64		Megawatt/h (1000 kWh)	Total de energía consumida por la empresa, en unidades equivalentes de 1000 kWh.				539.973	539.228	541.525	556.757	571.901	600.319	615.999	586.389	624.388	628.629	637.358	660.319	669.525	771.366	795.543	802.397		
		Costos de prestaciones de terceros	de-11		Moneda Local / 1000	Costos totales de operación, administración y ventas, contratados a terceros.	73.488	118.856	176.769	234.676	298.171	395.339	547.860	795.666	1.152.005	1.519.363	2.222.360	3.105.695	4.211.631	6.113.768	7.324.233	13.712.796	22.035.000	52.904.820	148.865.116	210.040.000	

GRUPOS Y VARIABLES				Código ADERASA	Código Guía AVSA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
INFORMACION ECONOMICA	Costos de los servicios de Agua Potable y saneamiento	Costos de Explotación	Costos Operativos de Agua Potable y saneamiento	de-12		Moneda Local / 1000	Costos ligados a la operación y mantenimiento: mano de obra, combustibles, energía eléctrica, productos químicos, consumibles, servicios de terceros, etc. de los servicios de agua potable y saneamiento. (Es suma de de-13 + de-17).	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2.856.467	3.944.188	5.874.136	8.120.356	11.329.091	18.107.403	23.681.959	36.930.375	63.783.869	153.460.883	423.976.162	546.962.204	
			Costos Operativos del Servicio de Agua Potable	de-13	DE13	Moneda Local / 1000	Costos ligados a la operación y mantenimiento: mano de obra, combustibles, energía eléctrica, productos químicos, consumibles, servicios de terceros, etc. de los servicios de agua potable. No incluye depreciaciones ni Intereses.	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2.066.129	2.774.280	4.010.014	5.557.123	8.042.274	12.730.151	16.756.924	25.276.065	42.272.989	100.139.647	280.485.894	360.734.207	
			Costos de producción de Agua Potable		DE60	Moneda Local / 1000	Costos de producción de agua potable de fuente superficial o subterránea, desde la fuente hasta su ingreso a la red	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1.002.950	1.224.952	1.829.407	2.545.704	3.762.096	6.121.601	7.599.464	11.811.173	21.510.880	44.347.961	133.751.660	203.014.457	
			Costos de mano de obra de operación y mantenimiento de Agua Potable	de-14		Moneda Local / 1000	Costo total de la mano de obra propia y contratada para la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable (incluye beneficios y cargas sociales).	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2.673.302	3.684.873	5.423.842	7.123.083	10.679.030	18.898.472	46.328.538	103.535.662	118.542.329	
			Costos de la energía de operación y mantenimiento de agua potable	de-15		Moneda Local / 1000	Costo de la energía consumida para la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable.	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	846.887	1.655.823	2.557.452	3.162.601	4.375.694	8.070.461	15.545.874	57.305.355	63.861.886	
			Costos de los productos químicos de operación y mantenimiento de agua potable	de-16		Moneda Local / 1000	Costo de los productos químicos consumidos para la operación de los servicios de agua potable.	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1.093.295	1.532.772	2.862.761	3.628.863	5.116.295	6.643.748	15.216.847	50.100.499	82.932.264	
			Costos operativos del servicio de saneamiento	de-17	DE17	Moneda Local / 1000	Costos ligados a la explotación del servicio de cloaca. No incluye Depreciaciones ni Intereses.	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	790.338	1.169.909	1.864.122	2.563.233	3.286.816	5.377.251	6.925.034	11.654.309	21.510.880	53.321.236	143.490.269	186.227.997	
			Costos de mano de obra de operación y mantenimiento de saneamiento	de-18		Moneda Local / 1000	Costo total de la mano de obra propia y contratada para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento (incluye beneficios y cargas sociales).	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1.740.564	2.046.425	3.407.513	4.265.452	6.835.551	12.833.160	32.415.580	75.536.349	90.927.280	
			Costos de la energía de operación y mantenimiento de saneamiento	de-19		Moneda Local / 1000	Costo de la energía consumida para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	150.420	344.652	607.452	664.825	811.493	1.864.024	3.366.790	12.658.149	18.454.468	
		Costos de conexión	Costo de conexión de AP		DE62	$	Costos de instalación de conexiones domiciliarias nuevas de agua potable en el período	250											10.462	15.903	24.173	37.226	55.356	86.013	158.244	492.159	1.455.079	Antes se actualizaba con Índice del costo de la construcción (nivel general) publicado por CABA. Se tomaron valores reales provisionados (materiales, permisos, contratista y mano de obra).
			Costo de conexión de AR		DE63	$	Costos de instalación de conexiones domiciliarias nuevas de aguas residuales en el período	318											17.045	25.909	39.381	60.647	139.360	226.523	414.871	2.683.931	1.976.428	
		Costos de administ	Gastos Generales de Administración y Ventas	de-21	DE21	Moneda Local / 1000	Costos de sede, lectura de medidores, facturación, cobro, asesorías, comunicaciones, gastos grales., etc. (no incluye depreciaciones)	222.881	303.159	412.865	560.828	755.717	1.160.800	1.484.490	1.968.430	2.180.809	2.997.819	4.603.118	6.424.632	8.288.770	11.775.760	12.843.188	19.664.611	33.786.195	85.761.836	236.677.627	298.285.430	

GRUPOS Y VARIABLES			Código ADERASA	Código Guía AvSA	UNIDAD	DEFINICION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observaciones
	Inversiones	Inversión Presupuestada	de-30	DE49	Moneda Local / 1000	Monto total de inversión presupuestada para el período.	77.904	220.000	1.051.000	1.956.401	2.591.300	3.290.736	4.403.931		6.185.253	8.817.212	11.523.520	19.097.018	22.592.878	27.666.215	40.616.163	80.770.160	174.443.895	327.953.655	250.419.032	302.256.348	A partir del 2025 se informa sin IVA. Anteriormente, el IVA Crédito Fiscal por gastos de capital se acumulaba de forma irrecuperable, convirtiéndose en un costo financiero adicional. A partir de 2024, la recomposición de tarifas aumentó el IVA Débito Fiscal, mientras que la reducción de la inversión disminuyó el crédito generado, obteniendo un saldo a pagar por este impuesto. Años 22 y 23 se ajustaron valores de inversión en AR (DE 32).
		Inversión Ejecutada	de-31	DE31	Moneda Local / 1000	Monto total de la inversión ejecutada en el período.	39.253	214.700	570.559	1.256.223	2.147.138	3.193.469	3.610.878	4.038.284	5.657.694	6.782.796	9.653.481	17.744.759	20.149.482	25.214.065	35.513.740	70.956.687	138.077.380	277.143.342	252.888.243	292.411.417	
		Inversiones en sustitución de activos de AR		DE32	Moneda Local / 1000	Inversión en obras destinadas a sustituir activos de aguas residuales obsoletos por otros de más moderna tecnología o a aumentar la vida útil de los activos existentes durante el período.	14.328	44.940	54.160	57.392	131.966	171.677	294.132	307.638	409.455	556.504	1.136.382	1.267.634	1.916.378	1.868.331	2.614.416	6.373.942	12.620.772	23.362.258	33.110.738	67.702.540	
		Inversiones en sustitución de activos de AP		DE35	Moneda Local / 1000	Inversión en obras destinadas a sustituir activos de agua potable obsoletos por otros de más moderna tecnología o a aumentar la vida útil de los activos existentes.	22.440	88.476	193.181	148.677	227.505	404.565	392.839	488.968	566.130	972.423	1.752.832	2.290.826	2.676.620	3.518.108	4.001.156	10.461.469	21.830.988	51.402.946	60.743.436	89.788.427	
	Datos de Balance	Resultado Operativo (EBITDA)	de-40		Moneda Local / 1000	Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA).	38.711	-9.121	-272.147	-501.736	-748.097	-1.241.764	-1.628.729	-2.408.937	-3.014.620	-4.036.866	-2.399.639	-2.234.232	-2.844.840	-2.719.059	-7.645.078	1.068.879	-32.279.000	-6.974.000	299.436.000	503.710.000	
		Resultado Neto	de-41	DE41	Moneda Local / 1000	Resultado luego de impuestos.	17.952	497	966	-124.088	-56.991	-279.622	-351.402	-527.840	-1.137.402	-3.343.730	432.837	-6.647.639	-18.723.609	-23.571.880	-15.442.299	-10.515.517	-51.242.000	-249.577.000	-19.435.000	229.451.000	
		Remuneración del Capital	de-56		Moneda Local / 1000	Pagos al Capital (utilidades) durante el período, en forma de dividendos en efectivo, pagos directos a propietarios, etc.	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Total de Servicio de la deuda	de-49		Moneda Local / 1000	Total de intereses pagados para la satisfacción de las deudas de la empresa.	0	216	0	0	0	315.737	356.502	621.921	1.004.509	1.455.421	1.951.699	2.125.163	2.774.282	4.602.154	2.932.993	9.983.814	11.604.000	17.911.000	37.194.000	51.242.000	
		Resultado Financiero	de-57		Moneda Local / 1000	Interés Neto, resultado entre los intereses cedidos y los obtenidos durante el ejercicio contable. Un número NEGATIVO significa PERDIDAS (positivo=ganancias).	-5.375	-11.640	6.673	-3.808	-35.233	-188.181	-97.641		634.893	1.720.980	1.098.559	621.962	10.100.449	12.402.653	11.773.533	-1.689.470	-6.358.000	-160.189.000	53.570.000	48.086.000	
		Activo Total	de-42		Moneda Local / 1000	Según balance.	410.478	655.881	2.092.674	3.972.911	5.985.988	9.179.566	12.913.435	17.109.489	22.609.239	28.468.037	39.224.496	55.422.995	76.280.340	96.261.480	152.389.468	292.714.000	393.134.000	677.068.000	971.832.000	558.775.000	
		Activo Fijo (No corriente)	de-50		Moneda Local / 1000	Son Activos que por su utilización o envergadura no podrían "venderse" o realizarse en el siguiente período.	122.785	395.797	1.051.315	2.954.997	5.088.551	6.915.711	11.410.776	15.123.535	20.558.422	25.898.563	34.206.228	49.061.033	63.622.310	85.963.189	114.876.523	175.036.000	304.446.000	528.790.000	737.797.000	178.109.000	
		Patrimonio neto	de-43	DE43	Moneda Local / 1000	Según balance (Diferencia entre el Activo y el Pasivo)	188.465	403.705	1.044.612	1.891.364	3.054.263	5.225.590	8.521.046	12.148.353	16.767.892	18.804.097	29.653.656	39.624.876	35.546.102	33.711.446	73.286.779	187.086.000	232.842.000	180.916.000	310.602.000	-184.072.000	
		Pasivo Circulante (Corriente)	de-44		Moneda Local / 1000	Pasivo / Deudas de corto plazo (vencimiento menor a un año).	144.530	235.087	342.234	924.278	1.242.977	2.191.423	2.183.701	2.452.722	3.084.420	6.230.956	5.804.546	11.183.055	14.534.046	23.940.532	27.203.555	39.887.000	80.678.000	288.146.000	452.643.000	583.718.000	
		Pasivo total	de-45	DE45	Moneda Local / 1000	Pasivo / Deuda Total de corto y largo plazo.	222.013	294.481	1.048.062	2.081.547	2.927.106	3.953.976	4.392.389	4.961.136	5.841.347	9.663.940	9.570.840	15.798.119	40.734.238	62.550.034	79.102.689	105.628.000	160.292.000	496.152.000	971.832.000	742.847.000	
		Cargo fijo mensual para clientes residenciales	de-51		Moneda Local	El componente fijo de la factura (en su caso) por el suministro de servicios de abastecimiento de agua y recolección de aguas servidas, correspondiente a un MES. Consignar el número cero cuando no se apliquen cargos fijos.	12	12	12	12	12	12	12	12	32	33	166	87	110	163	163	163	536,81	1.593,22	6.647,24	7.490,28	Resolución 9/2024 SOP
		Facilidades de Pago	de-60		si/no	¿Ofrece la empresa al cliente una opción de cobro flexible/amortizada (en cuotas) para recuperar el costo de conexión a la red de agua y/o saneamiento?	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
		Cargos de Conexión de Agua Potable	de-52		Moneda Local	Costo total por la instalación de la conexión residencial al servicio de agua.	250	250	250	250	250	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	3.011	3.011	3.011	13.253	13.253	13.253	43.680	129.640	540.883	609.481	Resolución 9/2024 SOP
		Nivel de Servicio de Agua Potable	de-61		si/no	¿Ofrece la empresa más de un nivel de servicio para el suministro de agua domiciliario (excluyendo a piletas públicas o gratuitas)?	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	
		Cargos de Conexión de saneamiento	de-53		Moneda Local	Costo total por la instalación de la conexión residencial a los servicios de saneamiento.	318	318	318	318	318	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	4.921	4.921	4.921	21.539	21.539	21.539	70.988	210.689	879.036	990.520	Resolución 9/2024 SOP
		Nivel de Servicio de saneamiento	de-62		si/no	¿Ofrece la empresa más de un nivel de servicio de saneamiento o alternativa tecnológica para los hogares (excluyendo baños públicos)?	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	

21.6. Información Adicional

Formato N° 900

Nuevo Programa de Tarifa Social

Totales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
CAPITAL FEDERAL	agua	-	3	3	-	96	$ 3.041.872,37	$ 5.071.556,57	$ 1.520.936,19	$ 3.550.620,38	$ 8.722.072,83	$ 21.307.362,53
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	72.908	47.823	26.008	51.093	546	$ 1.190.011.452,56	$ 52.058,95	$ 25.543,30	$ 26.515,65	$ 8.804.793.216,86	$ 13.221.243.056,26
	Total	72.908	47.826	26.011	51.093	546	$ 1.193.053.324,93	$ 52.274,42	$ 25.607,50	$ 26.666,93	$ 8.813.515.289,69	$ 13.242.550.418,79
NORTE	agua	2.700	1.360	975	2.285	374	$ 13.474.172,46	$ 17.314,84	$ 10.317,13	$ 6.997,71	$ 82.716.802,09	$ 71.268.970,36
	cloaca	814	511	340	641	368	$ 4.944.816,01	$ 16.098,26	$ 9.889,63	$ 6.208,63	$ 34.269.581,38	$ 24.554.097,64
	agua y cloaca	28.082	18.003	12.343	22.454	428	$ 425.809.357,26	$ 41.667,20	$ 24.596,20	$ 17.071,00	$ 2.360.966.497,57	$ 2.225.817.977,28
	Total	31.596	19.874	13.658	25.380	423	$ 444.228.345,73	$ 39.334,91	$ 23.236,13	$ 16.098,78	$ 2.477.952.881,04	$ 2.321.641.045,28
San Fernando	agua	42	23	14	33	615	$ 126.830,02	$ 12.104,84	$ 5.765,00	$ 6.339,84	$ 929.166,49	$ 1.231.324,26
	cloaca	3	1	-	2	421	$ 4.569,64	$ 7.903,38	$ 4.569,64	$ 3.333,74	$ 41.729,02	$ 43.338,57
	agua y cloaca	3.142	1.994	1.288	2.436	479	$ 40.812.033,92	$ 33.694,86	$ 21.037,13	$ 12.657,73	$ 240.669.680,75	$ 201.603.065,98
	Total	3.187	2.018	1.302	2.471	480	$ 40.943.433,59	$ 33.439,76	$ 20.857,58	$ 12.582,18	$ 241.640.576,27	$ 202.877.728,80
Tigre	agua	838	361	269	716	355	$ 4.568.489,08	$ 21.739,28	$ 13.165,67	$ 8.573,61	$ 28.588.571,43	$ 22.859.792,17
	cloaca	123	108	81	96	364	$ 839.401,39	$ 13.158,90	$ 7.772,24	$ 5.386,67	$ 5.610.482,02	$ 4.686.231,63
	agua y cloaca	2.994	1.906	1.374	2.492	367	$ 40.178.096,32	$ 37.572,15	$ 21.612,75	$ 15.959,40	$ 219.396.023,51	$ 215.730.298,98
	Total	3.955	2.375	1.724	3.304	365	$ 45.585.986,79	$ 34.058,48	$ 19.700,08	$ 14.358,40	$ 253.595.076,97	$ 243.276.322,78
San Isidro	agua	24	10	8	22	250	$ 800.854,69	$ 139.070,73	$ 88.983,85	$ 50.086,88	$ 3.506.098,02	$ 1.460.191,20
	cloaca	1	1	-	-	498	$ 10.076,76	$ 19.351,86	$ 10.076,76	$ 9.275,10	$ 105.884,25	$ 120.576,33
	agua y cloaca	5.340	3.511	2.678	4.507	388	$ 118.448.489,16	$ 62.726,96	$ 35.634,32	$ 27.092,64	$ 601.351.772,17	$ 567.641.434,38
	Total	5.365	3.522	2.686	4.529	388	$ 119.259.420,61	$ 62.920,04	$ 35.770,67	$ 27.149,37	$ 604.963.754,43	$ 569.222.201,91
San Martín	agua	702	356	228	574	439	$ 2.927.439,34	$ 14.734,08	$ 8.712,62	$ 6.021,46	$ 18.512.070,86	$ 17.601.920,31
	cloaca	22	9	7	20	194	$ 56.826,73	$ 10.838,03	$ 6.314,08	$ 4.523,95	$ 269.572,10	$ 261.732,96
	agua y cloaca	8.233	5.539	3.563	6.257	464	$ 119.900.961,46	$ 36.084,39	$ 22.542,01	$ 13.542,38	$ 629.534.655,35	$ 555.321.118,01
	Total	8.957	5.904	3.798	6.851	462	$ 122.885.227,53	$ 34.777,73	$ 21.695,84	$ 13.081,89	$ 648.316.298,30	$ 573.184.771,29
Vicente López	agua	10	2	2	10	62	$ 7.839,65	$ 7.566,20	$ 3.919,83	$ 3.646,38	$ 14.943,08	$ 18.213,45
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	6.148	3.678	2.562	5.032	421	$ 72.314.795,17	$ 34.227,06	$ 20.468,38	$ 13.758,67	$ 438.158.408,24	$ 389.528.192,57
	Total	6.158	3.680	2.564	5.042	421	$ 72.322.634,82	$ 34.211,97	$ 20.459,02	$ 13.752,95	$ 438.173.351,32	$ 389.546.406,03
Escobar	agua	175	116	89	148	320	$ 785.841,35	$ 11.826,95	$ 6.893,35	$ 4.933,60	$ 4.905.502,76	$ 4.402.604,26
	cloaca	26	11	7	20	351	$ 123.533,95	$ 17.495,61	$ 11.230,36	$ 6.265,25	$ 752.433,85	$ 559.995,62
	agua y cloaca	506	325	184	367	473	$ 11.547.465,28	$ 81.364,68	$ 36.542,61	$ 44.822,07	$ 94.520.000,43	$ 166.219.736,63
	Total	707	452	280	535	430	$ 12.456.840,57	$ 61.795,83	$ 28.246,80	$ 33.549,03	$ 100.177.937,04	$ 171.182.336,51
Jose C Paz	agua	106	56	35	85	471	$ 471.411,52	$ 15.809,10	$ 8.894,56	$ 6.914,55	$ 3.417.777,81	$ 3.226.852,45
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	106	56	35	85	471	$ 471.411,52	$ 15.809,10	$ 8.894,56	$ 6.914,55	$ 3.417.777,81	$ 3.226.852,45
Malvinas Argentinas	agua	194	104	71	161	380	$ 925.825,13	$ 15.797,94	$ 9.447,20	$ 6.350,75	$ 6.513.017,16	$ 5.168.106,22
	cloaca	1	1	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	195	105	71	161	380	$ 925.825,13	$ 15.797,94	$ 9.447,20	$ 6.350,75	$ 6.513.017,16	$ 5.168.106,22
San Miguel	agua	288	175	135	248	316	$ 1.601.679,00	$ 15.371,79	$ 9.312,09	$ 6.059,70	$ 9.957.902,03	$ 7.269.113,62
	cloaca	633	377	244	500	374	$ 3.889.829,86	$ 17.063,02	$ 10.570,19	$ 6.492,83	$ 27.294.536,16	$ 18.792.899,32
	agua y cloaca	1.284	827	494	951	432	$ 17.839.660,92	$ 36.514,91	$ 22.051,50	$ 14.463,41	$ 115.900.373,23	$ 99.429.090,47
	Total	2.205	1.379	873	1.699	402	$ 23.331.169,78	$ 28.512,75	$ 17.295,16	$ 11.217,59	$ 153.152.811,42	$ 125.491.103,41
Pilar	agua	321	157	124	288	317	$ 1.257.962,68	$ 14.428,96	$ 8.221,98	$ 6.206,99	$ 6.371.752,45	$ 8.030.852,41
	cloaca	5	3	1	3	373	$ 20.577,68	$ 15.764,82	$ 10.288,84	$ 5.475,99	$ 194.943,98	$ 89.323,20
	agua y cloaca	435	223	200	412	258	$ 4.767.855,05	$ 44.880,10	$ 22.489,88	$ 22.390,22	$ 21.435.583,88	$ 30.345.040,26
	Total	761	383	325	703	283	$ 6.046.395,40	$ 32.026,55	$ 16.475,19	$ 15.551,35	$ 28.002.280,31	$ 38.465.215,88
OESTE	agua	6.033	2.893	2.008	5.124	393	$ 17.124.683,21	$ 10.736,05	$ 6.135,68	$ 4.600,37	$ 115.744.846,52	$ 107.893.366,59
	cloaca	1.929	1.151	762	1.540	396	$ 8.571.259,27	$ 13.050,93	$ 7.646,08	$ 5.404,85	$ 58.155.758,42	$ 50.223.896,58
	agua y cloaca	42.049	27.456	18.096	32.713	445	$ 483.042.480,61	$ 30.794,38	$ 18.332,48	$ 12.461,90	$ 2.969.861.222,21	$ 2.587.818.074,61
	Total	50.011	31.500	20.866	39.377	438	$ 508.738.423,09	$ 28.287,08	$ 16.811,69	$ 11.475,40	$ 3.143.761.827,16	$ 2.745.935.337,78
La Matanza	agua	4.083	1.812	1.321	3.591	381	$ 9.187.239,84	$ 9.530,37	$ 5.249,85	$ 4.280,52	$ 59.563.880,37	$ 61.302.040,36
	cloaca	94	80	53	67	398	$ 508.719,93	$ 10.816,03	$ 6.439,49	$ 4.376,54	$ 3.159.006,32	$ 2.778.734,35
	agua y cloaca	19.353	12.432	8.872	15.794	415	$ 238.890.280,58	$ 34.145,64	$ 20.246,65	$ 13.898,98	$ 1.362.990.374,72	$ 1.183.397.976,16
	Total	23.530	14.324	10.246	19.452	410	$ 248.586.240,36	$ 30.849,50	$ 18.240,85	$ 12.608,65	$ 1.425.713.261,41	$ 1.247.478.750,86
Morón	agua	115	47	25	80	379	$ 334.967,66	$ 12.324,37	$ 7.443,73	$ 4.880,64	$ 2.322.275,05	$ 2.014.670,79
	cloaca	194	121	76	149	405	$ 929.775,86	$ 13.056,97	$ 7.879,46	$ 5.177,52	$ 6.468.877,32	$ 5.330.078,52
	agua y cloaca	7.925	5.660	3.533	5.811	457	$ 96.731.178,01	$ 28.787,23	$ 17.645,23	$ 11.141,99	$ 613.288.080,72	$ 515.595.417,75
	Total	8.234	5.828	3.634	6.040	455	$ 97.995.921,53	$ 28.327,17	$ 17.359,77	$ 10.967,40	$ 622.079.233,08	$ 522.940.167,06
Hurlingham	agua	127	100	72	99	333	$ 710.072,52	$ 12.674,85	$ 7.245,64	$ 5.429,21	$ 5.121.903,39	$ 4.930.242,87
	cloaca	728	465	300	563	438	$ 3.482.865,64	$ 12.999,20	$ 7.621,15	$ 5.378,05	$ 24.776.307,09	$ 20.732.100,42
	agua y cloaca	1.266	773	454	947	507	$ 11.684.070,50	$ 25.153,58	$ 15.455,12	$ 9.698,46	$ 83.185.291,88	$ 64.904.692,85
	Total	2.121	1.338	826	1.609	470	$ 15.877.008,66	$ 19.983,89	$ 12.110,61	$ 7.873,28	$ 113.083.502,36	$ 90.567.036,14
Ituzaingó	agua	129	86	67	110	276	$ 592.518,55	$ 12.243,97	$ 7.053,79	$ 5.190,18	$ 3.850.703,42	$ 3.340.282,17
	cloaca	407	193	153	367	274	$ 1.493.730,05	$ 14.560,69	$ 8.030,81	$ 6.529,89	$ 8.753.634,31	$ 8.594.511,29
	agua y cloaca	1.648	1.059	710	1.299	417	$ 13.836.054,64	$ 23.707,43	$ 13.726,24	$ 9.981,18	$ 94.324.263,59	$ 86.692.956,91
	Total	2.184	1.338	930	1.776	387	$ 15.922.303,24	$ 21.622,75	$ 12.458,77	$ 9.163,98	$ 106.928.601,32	$ 98.627.750,37
Tres de Febrero	agua	68	35	19	52	574	$ 178.076,84	$ 10.024,52	$ 5.087,91	$ 4.936,61	$ 1.121.792,51	$ 1.388.332,88
	cloaca	15	13	8	10	489	$ 71.368,20	$ 9.984,47	$ 5.489,86	$ 4.494,61	$ 529.307,84	$ 607.720,30
	agua y cloaca	8.334	5.334	3.191	6.191	499	$ 86.426.575,33	$ 28.639,76	$ 16.778,60	$ 11.861,16	$ 569.523.978,51	$ 520.568.519,42
	Total	8.417	5.382	3.218	6.253	500	$ 86.676.020,37	$ 28.467,80	$ 16.671,67	$ 11.796,12	$ 571.175.078,87	$ 522.564.572,60
Merlo	agua	1.031	557	374	848	383	$ 4.242.812,80	$ 13.207,92	$ 7.945,34	$ 5.262,58	$ 29.360.576,62	$ 23.675.666,08
	cloaca	308	169	99	238	407	$ 1.179.248,48	$ 12.485,83	$ 7.370,30	$ 5.115,52	$ 8.548.623,64	$ 7.138.448,56
	agua y cloaca	1.629	982	624	1.271	406	$ 15.754.837,35	$ 27.254,78	$ 16.514,50	$ 10.740,28	$ 107.167.304,71	$ 88.066.964,67
	Total	2.968	1.708	1.097	2.357	399	$ 21.176.898,63	$ 21.269,31	$ 12.850,06	$ 8.419,25	$ 145.076.504,96	$ 118.881.079,31
Moreno	agua	480	256	130	344	550	$ 1.878.995,01	$ 12.477,82	$ 7.669,37	$ 4.808,45	$ 14.403.715,16	$ 11.242.131,45
	cloaca	183	110	73	146	390	$ 905.551,10	$ 13.504,18	$ 8.384,73	$ 5.119,45	$ 5.920.001,90	$ 5.042.303,14
	agua y cloaca	1.894	1.216	712	1.400	470	$ 19.719.484,19	$ 28.580,00	$ 16.446,61	$ 12.133,39	$ 139.381.928,09	$ 128.591.546,85
	Total	2.557	1.582	915	1.890	477	$ 22.504.030,30	$ 24.989,01	$ 14.500,02	$ 10.488,99	$ 159.705.645,16	$ 144.875.981,43
SUDESTE	agua	4.012	3.078	2.074	2.932	404	$ 25.407.643,32	$ 13.283,41	$ 8.574,97	$ 4.708,44	$ 176.875.679,26	$ 123.909.525,57
	cloaca	152	123	87	112	429	$ 986.851,80	$ 13.254,64	$ 8.155,80	$ 5.098,84	$ 6.590.857,19	$ 5.671.317,25
	agua y cloaca	35.615	24.749	14.791	25.737	486	$ 461.285.511,87	$ 31.281,00	$ 19.241,88	$ 12.039,12	$ 3.157.864.440,00	$ 2.563.258.456,48
	Total	39.779	27.950	16.952	28.781	477	$ 487.680.006,98	$ 29.229,48	$ 18.024,17	$ 11.205,31	$ 3.341.330.976,46	$ 2.692.839.299,30
Avellaneda	agua	440	325	191	305	529	$ 2.621.859,39	$ 13.339,26	$ 8.193,31	$ 5.145,95	$ 16.609.815,38	$ 14.296.878,13
	cloaca	5	-	-	4	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	7.756	5.184	3.037	5.611	494	$ 97.752.863,49	$ 33.198,21	$ 19.507,66	$ 13.690,56	$ 680.669.184,03	$ 651.017.727,93
	Total	8.201	5.509	3.228	5.920	496	$ 100.374.722,87	$ 32.006,16	$ 18.828,50	$ 13.177,66	$ 697.278.999,42	$ 665.314.606,06
Lanús	agua	1.803	844	415	1.299	523	$ 7.001.415,67	$ 13.656,34	$ 8.466,04	$ 5.190,30	$ 51.472.709,47	$ 40.765.866,87
	cloaca	18	3	2	14	778	$ 57.903,39	$ 22.851,61	$ 19.301,13	$ 3.550,48	$ 344.850,61	$ 71.715,35
	agua y cloaca	8.764	5.805	3.218	6.255	517	$ 105.372.387,57	$ 29.877,47	$ 18.746,20	$ 11.131,27	$ 704.708.430,96	$ 571.638.463,52
	Total	10.585	6.652	3.635	7.568	518	$ 112.431.706,63	$ 27.794,70	$ 17.428,57	$ 10.366,13	$ 756.525.991,04	$ 612.476.045,74
Quilmes	agua	640	430	288	498	397	$ 2.366.677,41	$ 10.172,29	$ 5.594,98	$ 4.577,31	$ 17.151.422,53	$ 17.407.537,05
	cloaca	66	50	30	46	567	$ 315.701,24	$ 11.357,38	$ 6.577,11	$ 4.780,27	$ 2.381.851,00	$ 2.313.625,72
	agua y cloaca	14.671	9.661	5.854	10.864	494	$ 179.225.114,55	$ 31.213,42	$ 19.103,08	$ 12.110,34	$ 1.225.438.121,10	$ 994.622.989,71
	Total	15.377	10.141	6.172	11.408	490	$ 181.907.493,20	$ 30.213,37	$ 18.462,14	$ 11.751,22	$ 1.244.971.394,62	$ 1.014.344.152,48
Florencio Varela	agua	1.129	1.479	1.180	830	306	$ 13.417.690,85	$ 13.993,90	$ 9.632,23	$ 4.361,68	$ 91.641.731,89	$ 51.439.243,52
	cloaca	63	70	55	48	319	$ 613.247,16	$ 14.144,32	$ 8.760,67	$ 5.383,64	$ 3.864.155,59	$ 3.285.976,18
	agua y cloaca	4.424	4.099	2.682	3.007	414	$ 78.935.146,27	$ 31.007,24	$ 19.938,15	$ 11.069,09	$ 547.048.703,91	$ 345.979.275,32
	Total	5.616	5.648	3.917	3.885	385	$ 92.966.084,28	$ 26.418,53	$ 17.146,09	$ 9.272,44	$ 642.554.591,38	$ 400.704.495,01
SUDOESTE	agua	5.933	3.201	1.728	4.448	515	$ 19.546.090,97	$ 11.228,95	$ 6.252,75	$ 4.976,20	$ 142.364.116,66	$ 139.689.296,71
	cloaca	2.055	1.221	651	1.484	520	$ 7.726.534,47	$ 11.203,42	$ 6.487,43	$ 4.715,99	$ 56.692.033,31	$ 52.108.494,49
	agua y cloaca	17.217	11.323	6.557	12.464	499	$ 165.537.289,90	$ 26.446,36	$ 15.102,39	$ 11.343,97	$ 1.115.577.386,60	$ 1.042.436.855,76
	Total	25.205	15.745	8.936	18.396	504	$ 192.809.915,34	$ 22.144,49	$ 12.620,10	$ 9.524,39	$ 1.314.633.536,58	$ 1.234.234.646,96
Alte Brown	agua	1.087	626	345	805	500	$ 4.111.461,19	$ 11.386,37	$ 6.784,59	$ 4.601,78	$ 31.304.703,11	$ 26.279.898,60
	cloaca	637	392	217	462	506	$ 1.979.071,46	$ 9.779,41	$ 5.320,08	$ 4.459,33	$ 14.389.477,25	$ 14.963.160,11
	agua y cloaca	5.298	3.631	2.194	3.862	483	$ 53.215.711,04	$ 25.154,25	$ 15.269,93	$ 9.884,32	$ 372.163.025,22	$ 311.070.969,90
	Total	7.022	4.649	2.756	5.129	487	$ 59.306.243,68	$ 22.003,28	$ 13.288,43	$ 8.714,86	$ 417.857.205,57	$ 352.314.028,61
E. Echeverría	agua	870	456	224	630	536	$ 2.898.932,97	$ 10.788,23	$ 6.413,57	$ 4.374,67	$ 22.878.701,40	$ 19.468.963,86
	cloaca	1.167	693	355	829	533	$ 4.971.540,61	$ 12.214,90	$ 7.268,33	$ 4.946,57	$ 36.811.656,00	$ 31.772.020,20
	agua y cloaca	3.457	2.204	1.242	2.503	492	$ 31.167.332,71	$ 24.261,54	$ 14.422,64	$ 9.838,89	$ 219.595.490,93	$ 192.433.747,92
	Total	5.494	3.353	1.821	3.962	507	$ 39.037.806,29	$ 19.915,21	$ 11.840,40	$ 8.074,81	$ 279.285.848,33	$ 243.674.731,97
Ezeiza	agua	546	365	216	397	446	$ 2.088.228,99	$ 10.471,73	$ 5.932,47	$ 4.539,26	$ 15.423.864,40	$ 15.079.869,38
	cloaca	141	76	40	105	546	$ 494.149,51	$ 10.776,49	$ 6.588,66	$ 4.187,83	$ 3.604.917,50	$ 3.145.930,51
	agua y cloaca	951	662	352	641	553	$ 8.265.430,58	$ 22.129,12	$ 12.874,50	$ 9.254,62	$ 61.290.733,43	$ 56.649.358,53
	Total	1.638	1.103	608	1.143	517	$ 10.847.809,08	$ 17.494,09	$ 10.147,62	$ 7.346,46	$ 80.319.515,33	$ 74.875.158,43
Lomas de Zamora	agua	3.361	1.718	919	2.562	534	$ 10.250.571,55	$ 11.473,43	$ 6.101,53	$ 5.371,90	$ 71.310.561,21	$ 77.357.446,85
	cloaca	96	49	30	77	471	$ 226.541,58	$ 9.098,64	$ 4.623,30	$ 4.475,34	$ 1.633.711,13	$ 1.962.934,03
	agua y cloaca	6.930	4.377	2.487	5.040	517	$ 67.768.206,52	$ 29.814,02	$ 15.983,07	$ 13.830,95	$ 427.761.168,10	$ 447.850.628,14
	Total	10.387	6.144	3.436	7.679	521	$ 78.245.319,65	$ 24.481,93	$ 13.108,61	$ 11.373,32	$ 500.705.440,45	$ 527.171.009,01
Presidente Peron	agua	69	36	24	54	299	$ 196.896,26	$ 10.107,09	$ 5.469,34	$ 4.637,75	$ 1.446.286,54	$ 1.503.118,03
	cloaca	14	11	9	11	232	$ 55.231,31	$ 8.751,96	$ 5.021,03	$ 3.730,93	$ 252.271,43	$ 264.449,63
	agua y cloaca	581	449	282	418	411	$ 5.120.609,06	$ 21.174,27	$ 11.825,89	$ 9.348,39	$ 34.766.968,92	$ 34.432.151,28
	Total	664	496	315	483	398	$ 5.372.736,62	$ 20.059,56	$ 11.193,20	$ 8.866,35	$ 36.465.526,89	$ 36.199.718,94
TOTAL	agua	18.678	10.535	6.788	14.789	431	$ 78.594.462,32	$ 13.464,96	$ 7.714,42	$ 5.750,55	$ 526.423.517,37	$ 464.068.521,75
	cloaca	4.950	3.006	1.840	3.777	443	$ 22.229.461,54	$ 12.828,61	$ 7.579,09	$ 5.249,52	$ 155.708.230,30	$ 132.557.805,95
	agua y cloaca	195.871	129.354	77.795	144.461	493	$ 2.725.686.092,21	$ 39.924,30	$ 21.773,61	$ 18.150,69	$ 18.409.062.763,25	$ 21.640.574.420,41
	Total	219.499	142.895	86.423	163.027	487	$ 2.826.510.016,07	$ 37.400,59	$ 20.436,94	$ 16.963,65	$ 19.091.194.510,92	$ 22.237.200.748,11

Formato N° 901

Nuevo Programa de Tarifa Social

Usuarios Residenciales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
CAPITAL FEDERAL	agua	-	1	1	-	106	3.993	$ 7.633,33	$ 3.993,09	$ 3.640,23	$ 13.485,56	$ 14.560,93
	cloaca	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	71.573	46.945	25.395	50.023	548	770.867.229	$ 29.376,63	$ 16.844,40	$ 12.532,22	$ 5.202.669.539,35	$ 5.247.471.573,48
	Total	71.573	46.946	25.396	50.023	548	770.871.222	$ 29.376,15	$ 16.844,12	$ 12.532,03	$ 5.202.683.024,92	$ 5.247.486.134,41
NORTE	agua	2.688	1.349	966	2.275	375	12.820.602	$ 16.276,90	$ 9.892,44	$ 6.384,46	$ 79.626.241,31	$ 65.971.830,87
	cloaca	808	507	337	636	370	4.818.415	$ 15.381,42	$ 9.714,55	$ 5.666,88	$ 33.921.246,13	$ 23.770.624,08
	agua y cloaca	27.923	17.831	12.188	22.312	430	382.140.249	$ 35.484,60	$ 22.278,33	$ 13.206,27	$ 2.171.272.764,87	$ 1.818.354.235,94
	Total	31.419	19.687	13.491	25.223	424	399.779.266	$ 33.644,31	$ 21.102,10	$ 12.542,21	$ 2.284.820.252,31	$ 1.908.096.690,89
San Fernando	agua	41	22	13	32	636	103.059	$ 8.931,28	$ 4.907,56	$ 4.023,71	$ 811.727,59	$ 846.475,37
	cloaca	3	1	-	2	421	4.570	$ 7.903,38	$ 4.569,64	$ 3.333,74	$ 41.729,02	$ 43.338,57
	agua y cloaca	3.138	1.985	1.279	2.432	480	40.122.519	$ 32.996,66	$ 20.778,10	$ 12.218,55	$ 237.931.387,57	$ 198.618.436,47
	Total	3.182	2.008	1.292	2.466	482	40.230.148	$ 32.725,04	$ 20.599,15	$ 12.125,89	$ 238.784.844,18	$ 199.508.250,41
Tigre	agua	836	361	269	714	355	4.568.489	$ 21.739,28	$ 13.165,67	$ 8.573,61	$ 28.588.571,43	$ 22.859.792,17
	cloaca	123	107	80	96	365	826.382	$ 12.898,00	$ 7.723,19	$ 5.174,81	$ 5.536.876,53	$ 4.433.735,67
	agua y cloaca	2.977	1.889	1.359	2.477	368	38.208.519	$ 34.068,34	$ 20.742,95	$ 13.325,39	$ 211.267.422,07	$ 191.245.050,52
	Total	3.936	2.357	1.708	3.287	366	43.603.390	$ 31.218,42	$ 18.991,02	$ 12.227,40	$ 245.392.870,03	$ 218.538.578,37
San Isidro	agua	21	8	6	19	275	651.505	$ 93.070,54	$ 81.438,11	$ 11.632,43	$ 3.222.333,34	$ 744.746,23
	cloaca	1	1	-	-	498	10.077	$ 19.351,86	$ 10.076,76	$ 9.275,10	$ 105.884,25	$ 120.576,33
	agua y cloaca	5.291	3.462	2.634	4.463	390	94.049.026	$ 44.701,66	$ 28.682,23	$ 16.019,43	$ 528.296.400,80	$ 412.417.434,78
	Total	5.313	3.471	2.640	4.482	389	94.710.608	$ 44.811,63	$ 28.804,93	$ 16.006,70	$ 531.624.618,38	$ 413.282.757,34
San Martín	agua	700	353	226	573	440	2.520.127	$ 12.324,65	$ 7.567,95	$ 4.756,70	$ 16.281.354,98	$ 13.482.052,83
	cloaca	22	9	7	20	194	56.827	$ 10.838,03	$ 6.314,08	$ 4.523,95	$ 269.572,10	$ 261.732,96
	agua y cloaca	8.193	5.498	3.525	6.220	465	113.758.732	$ 33.335,35	$ 21.541,13	$ 11.794,22	$ 602.734.989,71	$ 494.836.550,34
	Total	8.915	5.860	3.758	6.813	463	116.335.686	$ 32.055,07	$ 20.689,26	$ 11.365,81	$ 619.285.916,79	$ 508.580.336,13
Vicente López	agua	10	2	2	10	62	7.840	$ 7.566,20	$ 3.919,83	$ 3.646,38	$ 14.943,08	$ 18.213,45
	cloaca	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	6.109	3.637	2.526	4.998	423	68.956.124	$ 32.386,18	$ 19.724,29	$ 12.661,89	$ 421.836.866,61	$ 363.532.475,55
	Total	6.119	3.639	2.528	5.008	423	68.963.963	$ 32.371,99	$ 19.715,26	$ 12.656,73	$ 421.851.809,69	$ 363.550.689,00
Escobar	agua	175	114	87	148	323	743.609	$ 11.661,06	$ 6.639,36	$ 5.021,70	$ 4.678.027,60	$ 4.402.604,26
	cloaca	26	11	7	20	351	123.534	$ 17.495,61	$ 11.230,36	$ 6.265,25	$ 752.433,85	$ 559.995,62
	agua y cloaca	503	319	179	365	476	4.839.676	$ 26.881,61	$ 15.561,66	$ 11.319,94	$ 34.092.562,90	$ 32.284.908,50
	Total	704	444	273	533	434	5.706.819	$ 22.715,83	$ 13.149,35	$ 9.566,48	$ 39.523.024,35	$ 37.247.508,38
Jose C Paz	agua	106	56	35	85	471	471.412	$ 15.809,10	$ 8.894,56	$ 6.914,55	$ 3.417.777,81	$ 3.226.852,45
	cloaca	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	106	56	35	85	471	471.412	$ 15.809,10	$ 8.894,56	$ 6.914,55	$ 3.417.777,81	$ 3.226.852,45
Malvinas Argentinas	agua	192	103	70	159	383	913.909	$ 15.837,96	$ 9.421,75	$ 6.416,22	$ 6.495.540,75	$ 5.168.106,22
	cloaca	1	1	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	193	104	70	159	383	913.909	$ 15.837,96	$ 9.421,75	$ 6.416,22	$ 6.495.540,75	$ 5.168.106,22
San Miguel	agua	286	174	135	247	312	1.585.168	$ 15.365,12	$ 9.269,99	$ 6.095,13	$ 9.757.014,08	$ 7.269.113,62
	cloaca	627	374	242	495	375	3.776.449	$ 16.165,26	$ 10.346,43	$ 5.818,83	$ 27.019.806,41	$ 18.261.921,72
	agua y cloaca	1.278	820	488	946	434	17.523.840	$ 35.692,38	$ 21.850,17	$ 13.842,21	$ 113.941.413,42	$ 95.313.898,28
	Total	2.191	1.368	865	1.688	402	22.885.456	$ 27.767,60	$ 17.104,23	$ 10.663,37	$ 150.718.233,90	$ 120.844.933,61
Pilar	agua	321	156	123	288	318	1.255.485	$ 14.423,19	$ 8.259,77	$ 6.163,42	$ 6.358.950,65	$ 7.953.874,26
	cloaca	5	3	1	3	373	20.578	$ 15.764,82	$ 10.288,84	$ 5.475,99	$ 194.943,98	$ 89.323,20
	agua y cloaca	434	221	198	411	259	4.681.813	$ 44.401,18	$ 22.188,69	$ 22.212,50	$ 21.171.721,80	$ 30.105.481,50
	Total	760	380	322	702	284	5.957.876	$ 31.760,28	$ 16.322,95	$ 15.437,34	$ 27.725.616,44	$ 38.148.678,97

Formato N° 901

Nuevo Programa de Tarifa Social

Usuarios Residenciales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
OESTE	agua	6.017	2.890	2.006	5.109	393	17.098.836	$ 10.738,34	$ 6.133,01	$ 4.605,32	$ 115.507.862,37	$ 107.893.366,59
	cloaca	1.914	1.135	749	1.528	399	8.339.685	$ 12.715,09	$ 7.547,23	$ 5.167,86	$ 56.982.418,98	$ 48.051.116,25
	agua y cloaca	41.887	27.277	17.947	32.581	446	460.891.521	$ 28.641,81	$ 17.599,34	$ 11.042,47	$ 2.880.861.449,16	$ 2.400.490.167,83
	Total	49.818	31.302	20.702	39.218	439	486.330.042	$ 26.397,40	$ 16.167,35	$ 10.230,05	$ 3.053.351.730,51	$ 2.556.434.650,67
La Matanza	agua	4.072	1.811	1.320	3.580	381	9.179.758	$ 9.531,54	$ 5.248,58	$ 4.282,97	$ 59.476.593,95	$ 61.302.040,36
	cloaca	94	80	53	67	398	508.720	$ 10.816,03	$ 6.439,49	$ 4.376,54	$ 3.159.006,32	$ 2.778.734,35
	agua y cloaca	19.302	12.373	8.824	15.754	415	223.975.341	$ 30.381,60	$ 19.069,85	$ 11.311,76	$ 1.307.968.386,07	$ 1.049.700.477,42
	Total	23.468	14.264	10.197	19.401	410	233.663.819	$ 27.581,01	$ 17.215,34	$ 10.365,67	$ 1.370.603.986,35	$ 1.113.781.252,12
Morón	agua	115	47	25	80	379	334.968	$ 12.324,37	$ 7.443,73	$ 4.880,64	$ 2.322.275,05	$ 2.014.670,79
	cloaca	191	121	76	146	405	929.776	$ 13.056,97	$ 7.879,46	$ 5.177,52	$ 6.468.877,32	$ 5.330.078,52
	agua y cloaca	7.885	5.624	3.501	5.775	458	94.582.469	$ 28.205,82	$ 17.348,22	$ 10.857,61	$ 602.899.383,03	$ 503.180.574,05
	Total	8.191	5.792	3.602	6.001	456	95.847.213	$ 27.760,19	$ 17.069,85	$ 10.690,34	$ 611.690.535,39	$ 510.525.323,36
Hurlingham	agua	126	100	72	98	333	710.073	$ 12.674,85	$ 7.245,64	$ 5.429,21	$ 5.121.903,39	$ 4.930.242,87
	cloaca	724	459	296	561	440	3.402.300	$ 12.733,56	$ 7.543,90	$ 5.189,66	$ 24.346.907,24	$ 20.263.178,77
	agua y cloaca	1.265	772	454	947	506	11.606.644	$ 24.983,48	$ 15.373,04	$ 9.610,44	$ 82.658.363,59	$ 63.914.704,88
	Total	2.115	1.331	822	1.606	471	15.719.016	$ 19.821,70	$ 12.054,46	$ 7.767,24	$ 112.127.174,22	$ 89.108.126,52
Ituzaingó	agua	129	86	67	110	276	592.519	$ 12.243,97	$ 7.053,79	$ 5.190,18	$ 3.850.703,42	$ 3.340.282,17
	cloaca	401	186	146	361	278	1.361.605	$ 13.167,37	$ 7.606,73	$ 5.560,64	$ 8.080.649,52	$ 7.045.497,78
	agua y cloaca	1.639	1.053	705	1.291	417	13.744.316	$ 23.623,62	$ 13.703,21	$ 9.920,41	$ 93.705.815,53	$ 85.823.415,67
	Total	2.169	1.325	918	1.762	388	15.698.439	$ 21.390,16	$ 12.400,03	$ 8.990,13	$ 105.637.168,47	$ 96.209.195,62
Tres de Febrero	agua	68	35	19	52	574	178.077	$ 10.024,52	$ 5.087,91	$ 4.936,61	$ 1.121.792,51	$ 1.388.332,88
	cloaca	15	13	8	10	489	71.368	$ 9.984,47	$ 5.489,86	$ 4.494,61	$ 529.307,84	$ 607.720,30
	agua y cloaca	8.287	5.272	3.138	6.153	502	82.619.405	$ 27.403,94	$ 16.218,96	$ 11.184,98	$ 554.198.349,64	$ 496.824.063,86
	Total	8.370	5.320	3.165	6.215	502	82.868.850	$ 27.241,60	$ 16.116,07	$ 11.125,53	$ 555.849.449,99	$ 498.820.117,05
Merlo	agua	1.028	556	373	845	383	4.231.914	$ 13.212,25	$ 7.939,80	$ 5.272,45	$ 29.301.724,93	$ 23.675.666,08
	cloaca	307	168	99	238	406	1.175.364	$ 12.465,01	$ 7.392,22	$ 5.072,78	$ 8.516.664,05	$ 6.983.603,39
	agua y cloaca	1.621	976	620	1.265	407	15.424.685	$ 26.872,03	$ 16.270,77	$ 10.601,26	$ 105.298.078,72	$ 85.734.142,73
	Total	2.956	1.700	1.092	2.348	399	20.831.963	$ 21.035,82	$ 12.702,42	$ 8.333,40	$ 143.116.467,70	$ 116.393.412,19
Moreno	agua	479	255	130	344	550	1.871.528	$ 12.498,36	$ 7.670,20	$ 4.828,16	$ 14.312.869,11	$ 11.242.131,45
	cloaca	182	108	71	145	395	890.553	$ 13.617,49	$ 8.401,44	$ 5.216,04	$ 5.881.006,69	$ 5.042.303,14
	agua y cloaca	1.888	1.207	705	1.396	471	18.938.661	$ 26.728,93	$ 15.901,48	$ 10.827,45	$ 134.133.072,59	$ 115.312.789,22
	Total	2.549	1.570	906	1.885	478	21.700.742	$ 23.573,79	$ 14.082,25	$ 9.491,54	$ 154.326.948,39	$ 131.597.223,80

Formato N° 901

Nuevo Programa de Tarifa Social

Usuarios Residenciales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
SUDESTE	agua	4.006	3.072	2.069	2.927	404	25.337.341	$ 13.237,90	$ 8.565,70	$ 4.672,20	$ 176.514.648,15	$ 123.025.111,20
	cloaca	152	122	86	112	430	964.802	$ 12.802,59	$ 8.040,02	$ 4.762,58	$ 6.423.965,55	$ 5.171.363,17
	agua y cloaca	35.467	24.605	14.667	25.609	487	445.100.002	$ 29.651,43	$ 18.671,09	$ 10.980,35	$ 3.047.133.718,05	$ 2.331.444.201,15
	Total	39.625	27.799	16.822	28.648	478	471.402.145	$ 27.772,58	$ 17.513,18	$ 10.259,40	$ 3.230.072.331,76	$ 2.459.640.675,52
Avellaneda	agua	440	323	189	305	531	2.598.351	$ 13.167,60	$ 8.170,91	$ 4.996,68	$ 16.526.308,41	$ 14.065.843,07
	cloaca	5	-	-	4	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	7.717	5.148	3.007	5.578	495	89.734.886	$ 29.238,09	$ 18.033,54	$ 11.204,55	$ 606.929.808,05	$ 492.360.007,00
	Total	8.162	5.471	3.196	5.887	497	92.333.236	$ 28.272,77	$ 17.441,11	$ 10.831,66	$ 623.456.116,47	$ 506.425.850,07
Lanús	agua	1.799	842	414	1.296	524	6.964.017	$ 13.555,68	$ 8.441,23	$ 5.114,45	$ 51.259.069,20	$ 40.112.487,57
	cloaca	18	3	2	14	778	57.903	$ 22.851,61	$ 19.301,13	$ 3.550,48	$ 344.850,61	$ 71.715,35
	agua y cloaca	8.727	5.753	3.175	6.227	519	103.145.662	$ 29.307,02	$ 18.501,46	$ 10.805,56	$ 691.615.398,56	$ 551.121.913,67
	Total	10.544	6.598	3.591	7.537	520	110.167.582	$ 27.274,50	$ 17.205,62	$ 10.068,88	$ 743.219.318,37	$ 591.306.116,59
Quilmes	agua	639	430	288	497	397	2.366.677	$ 10.172,29	$ 5.594,98	$ 4.577,31	$ 17.151.422,53	$ 17.407.537,05
	cloaca	66	50	30	46	567	315.701	$ 11.357,38	$ 6.577,11	$ 4.780,27	$ 2.381.851,00	$ 2.313.625,72
	agua y cloaca	14.617	9.618	5.814	10.813	495	176.317.310	$ 30.625,24	$ 18.875,64	$ 11.749,60	$ 1.209.984.918,70	$ 967.059.066,77
	Total	15.322	10.098	6.132	11.356	491	178.999.689	$ 29.649,24	$ 18.242,94	$ 11.406,31	$ 1.229.518.192,22	$ 986.780.229,54
Florencio Varela	agua	1.128	1.477	1.178	829	306	13.408.296	$ 13.997,21	$ 9.632,40	$ 4.364,81	$ 91.577.848,01	$ 51.439.243,52
	cloaca	63	69	54	48	319	591.197	$ 13.371,04	$ 8.568,08	$ 4.802,97	$ 3.697.263,95	$ 2.786.022,09
	agua y cloaca	4.406	4.086	2.671	2.991	415	75.902.143	$ 28.354,38	$ 19.230,34	$ 9.124,04	$ 538.603.592,74	$ 320.903.213,71
	Total	5.597	5.632	3.903	3.868	386	89.901.637	$ 24.467,72	$ 16.623,82	$ 7.843,90	$ 633.878.704,70	$ 375.128.479,32
SUDOESTE	agua	5.882	3.163	1.693	4.400	518	18.422.157	$ 10.379,34	$ 5.954,16	$ 4.425,19	$ 139.399.166,00	$ 132.274.546,90
	cloaca	2.047	1.217	648	1.477	521	7.651.766	$ 11.064,04	$ 6.446,31	$ 4.617,74	$ 56.325.018,54	$ 51.702.027,88
	agua y cloaca	16.874	11.211	6.456	12.132	502	156.258.218	$ 24.276,12	$ 14.383,12	$ 9.893,00	$ 1.084.638.548,59	$ 978.706.215,83
	Total	24.803	15.591	8.797	18.009	507	182.332.141	$ 20.401,62	$ 12.039,10	$ 8.362,52	$ 1.280.362.733,13	$ 1.162.682.790,61
Alte Brown	agua	1.086	625	345	805	500	4.103.962	$ 11.392,80	$ 6.783,41	$ 4.609,39	$ 31.213.464,30	$ 26.279.898,60
	cloaca	637	392	217	462	506	1.979.071	$ 9.779,41	$ 5.320,08	$ 4.459,33	$ 14.389.477,25	$ 14.963.160,11
	agua y cloaca	5.285	3.619	2.185	3.852	483	52.820.567	$ 25.071,08	$ 15.200,16	$ 9.870,92	$ 369.200.380,95	$ 309.180.605,48
	Total	7.008	4.636	2.747	5.119	488	58.903.600	$ 21.934,55	$ 13.230,82	$ 8.703,73	$ 414.803.322,50	$ 350.423.664,20
E. Echeverría	agua	854	455	223	614	537	2.890.759	$ 10.794,03	$ 6.409,66	$ 4.384,37	$ 22.789.331,45	$ 19.468.963,86
	cloaca	1.159	689	352	822	534	4.896.772	$ 11.977,55	$ 7.201,14	$ 4.776,42	$ 36.444.641,23	$ 31.365.553,59
	agua y cloaca	3.194	2.191	1.230	2.241	494	30.248.344	$ 23.636,37	$ 14.062,46	$ 9.573,91	$ 217.364.347,24	$ 190.126.456,42
	Total	5.207	3.335	1.805	3.677	508	38.035.875	$ 19.456,03	$ 11.589,24	$ 7.866,79	$ 276.598.319,92	$ 240.960.973,87
Ezeiza	agua	546	364	215	397	446	2.088.229	$ 10.471,73	$ 5.932,47	$ 4.539,26	$ 15.423.864,40	$ 15.079.869,38
	cloaca	141	76	40	105	546	494.150	$ 10.776,49	$ 6.588,66	$ 4.187,83	$ 3.604.917,50	$ 3.145.930,51
	agua y cloaca	948	656	347	639	556	8.182.338	$ 22.110,51	$ 12.845,11	$ 9.265,40	$ 60.822.550,56	$ 56.491.743,32
	Total	1.635	1.096	602	1.141	519	10.764.716	$ 17.461,17	$ 10.117,21	$ 7.343,95	$ 79.851.332,46	$ 74.717.543,22
Lomas de Zamora	agua	3.327	1.683	886	2.530	540	9.142.311	$ 9.880,63	$ 5.540,79	$ 4.339,84	$ 68.526.219,31	$ 69.942.697,03
	cloaca	96	49	30	77	471	226.542	$ 9.098,64	$ 4.623,30	$ 4.475,34	$ 1.633.711,13	$ 1.962.934,03
	agua y cloaca	6.866	4.302	2.418	4.982	522	60.026.311	$ 24.639,81	$ 14.384,45	$ 10.255,36	$ 402.974.029,25	$ 388.964.017,16
	Total	10.289	6.034	3.334	7.589	527	69.395.163	$ 20.362,88	$ 11.817,98	$ 8.544,90	$ 473.133.959,69	$ 460.869.648,22
Presidente Peron	agua	69	36	24	54	299	196.896	$ 10.107,09	$ 5.469,34	$ 4.637,75	$ 1.446.286,54	$ 1.503.118,03
	cloaca	14	11	9	11	232	55.231	$ 8.751,96	$ 5.021,03	$ 3.730,93	$ 252.271,43	$ 264.449,63
	agua y cloaca	581	443	276	418	414	4.980.659	$ 20.714,00	$ 11.637,05	$ 9.076,94	$ 34.277.240,59	$ 33.943.393,45
	Total	664	490	309	483	401	5.232.786	$ 19.633,09	$ 11.016,39	$ 8.616,70	$ 35.975.798,57	$ 35.710.961,11
TOTAL	agua	18.593	10.475	6.735	14.711	432	73.682.929	$ 12.065,94	$ 7.268,71	$ 4.797,22	$ 511.061.403,40	$ 429.179.416,48
	cloaca	4.921	2.981	1.820	3.753	445	21.774.668	$ 12.499,55	$ 7.487,85	$ 5.011,70	$ 153.652.649,20	$ 128.695.131,38
	agua y cloaca	193.724	127.869	76.653	142.657	494	2.215.257.219	$ 29.672,78	$ 17.892,68	$ 11.780,09	$ 14.386.576.020,03	$ 12.776.466.394,24
	Total	217.238	141.325	85.208	161.121	488	2.310.714.816	$ 28.003,68	$ 16.884,65	$ 11.119,04	$ 15.051.290.072,63	$ 13.334.340.942,10

(1) En días continuos con el beneficio.

(2) Descueto aplicado por mes en concepto del programa de Tarifa Social (incluye descuento al uso del servicio y descuento transitorio -DTO-)

(3) Es el descuento de tarifa social devengado durante 2025 (sin incluir el descuento transitorio por aumento del coeficiente K) para los usuarios vigentes en el programa al 31/12/2025. Para conocer el descuento total devengado durante el año calendario incluyendo a los usuarios que se dieron de baja en algún momento del año debe utilizarse el dato expuesto en los formularios 300 o 302.

(4) Es la facturación neta de descuento durante 2025 para los usuarios vigentes en el programa al 31/12/2025.

Formato N° 902

Nuevo Programa de Tarifa Social

Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
CAPITAL FEDERAL	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	1.011	602	427	836	439	$ 22.742.455,11	$ 40.039,53	$ 40.039,53	$ -	$ 168.386.345,85	$ -
	Total	1.011	602	427	836	439	$ 22.742.455,11	$ 40.039,53	$ 40.039,53	$ -	$ 168.386.345,85	$ -
NORTE	agua	3	5	4	2	272	$ 83.012,19	$ 16.602,44	$ 16.602,44	$ -	$ 509.659,70	$ -
	cloaca	1	2	1	-	263	$ 17.047,61	$ 8.523,81	$ 8.523,81	$ -	$ 128.854,83	$ -
	agua y cloaca	31	51	42	22	310	$ 1.818.651,06	$ 37.115,33	$ 37.115,33	$ -	$ 12.760.671,50	$ -
	Total	35	58	47	24	305	$ 1.918.710,86	$ 34.262,69	$ 34.262,69	$ -	$ 13.399.186,03	$ -
San Fernando	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	2	6	6	2	170	$ 283.474,41	$ 47.245,73	$ 47.245,73	$ -	$ 1.685.697,72	$ -
	Total	2	6	6	2	170	$ 283.474,41	$ 47.245,73	$ 47.245,73	$ -	$ 1.685.697,72	$ -
Tigre	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	3	5	4	2	241	$ 85.999,29	$ 17.199,86	$ 17.199,86	$ -	$ 646.331,87	$ -
	Total	3	5	4	2	241	$ 85.999,29	$ 17.199,86	$ 17.199,86	$ -	$ 646.331,87	$ -
San Isidro	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	3	8	7	2	463	$ 274.624,19	$ 34.328,02	$ 34.328,02	$ -	$ 1.809.248,16	$ -
	Total	3	8	7	2	463	$ 274.624,19	$ 34.328,02	$ 34.328,02	$ -	$ 1.809.248,16	$ -
San Martín	agua	1	1	1	1	155	$ 12.352,29	$ 12.352,29	$ 12.352,29	$ -	$ 63.820,18	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	12	15	12	9	358	$ 281.529,27	$ 20.109,23	$ 20.109,23	$ -	$ 2.534.656,25	$ -
	Total	13	16	13	10	345	$ 293.881,57	$ 19.592,10	$ 19.592,10	$ -	$ 2.598.476,43	$ -
Vicente López	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	10	14	10	6	262	$ 837.782,08	$ 59.841,58	$ 59.841,58	$ -	$ 5.522.170,19	$ -
	Total	10	14	10	6	262	$ 837.782,08	$ 59.841,58	$ 59.841,58	$ -	$ 5.522.170,19	$ -
Escobar	agua	-	2	2	-	130	$ 42.232,82	$ 21.116,41	$ 21.116,41	$ -	$ 227.475,16	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	1	1	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	-	3	3	-	130	$ 42.232,82	$ 21.116,41	$ 21.116,41	$ -	$ 227.475,16	$ -
Jose C Paz	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Malvinas Argentinas	agua	1	1	1	1	44	$ 11.915,74	$ 11.915,74	$ 11.915,74	$ -	$ 17.476,42	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	1	1	1	1	44	$ 11.915,74	$ 11.915,74	$ 11.915,74	$ -	$ 17.476,42	$ -
San Miguel	agua	1	1	-	-	903	$ 16.511,34	$ 16.511,34	$ 16.511,34	$ -	$ 200.887,95	$ -
	cloaca	1	2	1	-	263	$ 17.047,61	$ 8.523,81	$ 8.523,81	$ -	$ 128.854,83	$ -
	agua y cloaca	1	2	2	1	298	$ 55.241,82	$ 27.620,91	$ 27.620,91	$ -	$ 562.567,32	$ -
	Total	3	5	3	1	405	$ 88.800,77	$ 17.760,15	$ 17.760,15	$ -	$ 892.310,09	$ -
Pilar	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Formato N° 902

Nuevo Programa de Tarifa Social

Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
OESTE	agua	5	3	2	4	411	$ 25.846,95	$ 8.615,65	$ 8.615,65	$ -	$ 236.984,15	$ -
	cloaca	5	9	7	3	243	$ 89.189,01	$ 9.909,89	$ 9.909,89	$ -	$ 525.785,92	$ -
	agua y cloaca	65	104	89	50	339	$ 2.612.729,97	$ 28.711,32	$ 28.711,32	$ -	$ 17.050.027,02	$ -
	Total	75	116	98	57	332	$ 2.727.765,93	$ 26.483,16	$ 26.483,16	$ -	$ 17.812.797,09	$ -
La Matanza	agua	1	1	1	1	350	$ 7.481,69	$ 7.481,69	$ 7.481,69	$ -	$ 87.286,42	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	30	39	34	25	314	$ 1.091.414,60	$ 32.100,43	$ 32.100,43	$ -	$ 6.003.203,25	$ -
	Total	31	40	35	26	315	$ 1.098.896,29	$ 31.397,04	$ 31.397,04	$ -	$ 6.090.489,67	$ -
Morón	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	13	25	23	11	287	$ 598.103,20	$ 27.186,51	$ 27.186,51	$ -	$ 4.316.118,73	$ -
	Total	13	25	23	11	287	$ 598.103,20	$ 27.186,51	$ 27.186,51	$ -	$ 4.316.118,73	$ -
Hurlingham	agua	1	-	-	1	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	2	4	2	-	384	$ 36.517,87	$ 9.129,47	$ 9.129,47	$ -	$ 296.332,05	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	3	4	2	1	384	$ 36.517,87	$ 9.129,47	$ 9.129,47	$ -	$ 296.332,05	$ -
Ituzaingó	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	2	3	3	2	164	$ 37.672,98	$ 12.557,66	$ 12.557,66	$ -	$ 190.458,66	$ -
	agua y cloaca	3	2	1	2	1.129	$ 43.823,69	$ 21.911,84	$ 21.911,84	$ -	$ 379.303,27	$ -
	Total	5	5	4	4	550	$ 81.496,67	$ 16.299,33	$ 16.299,33	$ -	$ 569.761,93	$ -
Tres de Febrero	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	17	30	24	11	379	$ 689.543,43	$ 26.520,90	$ 26.520,90	$ -	$ 5.132.795,76	$ -
	Total	17	30	24	11	379	$ 689.543,43	$ 26.520,90	$ 26.520,90	$ -	$ 5.132.795,76	$ -
Merlo	agua	2	1	1	2	162	$ 10.898,46	$ 10.898,46	$ 10.898,46	$ -	$ 58.851,68	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	2	4	3	1	279	$ 122.590,11	$ 30.647,53	$ 30.647,53	$ -	$ 840.317,60	$ -
	Total	4	5	4	3	255	$ 133.488,57	$ 26.697,71	$ 26.697,71	$ -	$ 899.169,29	$ -
Moreno	agua	1	1	-	-	721	$ 7.466,80	$ 7.466,80	$ 7.466,80	$ -	$ 90.846,05	$ -
	cloaca	1	2	2	1	78	$ 14.998,16	$ 7.499,08	$ 7.499,08	$ -	$ 38.995,22	$ -
	agua y cloaca	-	4	4	-	194	$ 67.254,94	$ 22.418,31	$ 22.418,31	$ -	$ 378.288,40	$ -
	Total	2	7	6	1	243	$ 89.719,90	$ 14.953,32	$ 14.953,32	$ -	$ 508.129,66	$ -

Formato N° 902

Nuevo Programa de Tarifa Social

Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
SUDESTE	agua	1	2	2	1	204	$ 9.394,69	$ 9.394,69	$ 9.394,69	$ -	$ 63.883,87	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	46	72	62	36	276	$ 1.979.324,24	$ 29.542,15	$ 29.542,15	$ -	$ 13.342.947,40	$ -
	Total	47	74	64	37	275	$ 1.988.718,93	$ 29.245,87	$ 29.245,87	$ -	$ 13.406.831,28	$ -
Avellaneda	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	15	23	18	10	279	$ 617.274,67	$ 28.057,94	$ 28.057,94	$ -	$ 4.170.575,47	$ -
	Total	15	23	18	10	279	$ 617.274,67	$ 28.057,94	$ 28.057,94	$ -	$ 4.170.575,47	$ -
Lanús	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	13	24	19	8	336	$ 675.597,12	$ 29.373,79	$ 29.373,79	$ -	$ 4.517.320,78	$ -
	Total	13	24	19	8	336	$ 675.597,12	$ 29.373,79	$ 29.373,79	$ -	$ 4.517.320,78	$ -
Quilmes	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	12	18	18	12	210	$ 536.141,61	$ 33.508,85	$ 33.508,85	$ -	$ 3.631.554,38	$ -
	Total	12	18	18	12	210	$ 536.141,61	$ 33.508,85	$ 33.508,85	$ -	$ 3.631.554,38	$ -
Florencio Varela	agua	1	2	2	1	204	$ 9.394,69	$ 9.394,69	$ 9.394,69	$ -	$ 63.883,87	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	6	7	7	6	211	$ 150.310,84	$ 25.051,81	$ 25.051,81	$ -	$ 1.023.496,78	$ -
	Total	7	9	9	7	210	$ 159.705,52	$ 22.815,07	$ 22.815,07	$ -	$ 1.087.380,65	$ -
SUDOESTE	agua	4	5	3	2	582	$ 33.438,66	$ 8.359,67	$ 8.359,67	$ -	$ 332.217,16	$ -
	cloaca	1	2	1	-	406	$ 23.641,50	$ 11.820,75	$ 11.820,75	$ -	$ 269.021,44	$ -
	agua y cloaca	249	43	37	243	310	$ 924.127,35	$ 24.976,41	$ 24.976,41	$ -	$ 6.562.415,65	$ -
	Total	254	50	41	245	340	$ 981.207,51	$ 22.818,78	$ 22.818,78	$ -	$ 7.163.654,26	$ -
Alte Brown	agua	1	1	-	-	903	$ 7.499,08	$ 7.499,08	$ 7.499,08	$ -	$ 91.238,81	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	3	9	8	2	215	$ 255.442,03	$ 31.930,25	$ 31.930,25	$ -	$ 2.087.905,13	$ -
	Total	4	10	8	2	291	$ 262.941,11	$ 29.215,68	$ 29.215,68	$ -	$ 2.179.143,93	$ -
E. Echeverría	agua	1	1	1	1	328	$ 8.174,08	$ 8.174,08	$ 8.174,08	$ -	$ 89.369,95	$ -
	cloaca	1	2	1	-	406	$ 23.641,50	$ 11.820,75	$ 11.820,75	$ -	$ 269.021,44	$ -
	agua y cloaca	237	7	6	236	253	$ 158.807,40	$ 31.761,48	$ 31.761,48	$ -	$ 849.389,49	$ -
	Total	239	10	8	237	300	$ 190.622,97	$ 23.827,87	$ 23.827,87	$ -	$ 1.207.780,88	$ -
Ezeiza	agua	-	1	1	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	2	5	4	1	251	$ 67.167,66	$ 16.791,92	$ 16.791,92	$ -	$ 422.009,32	$ -
	Total	2	6	5	1	251	$ 67.167,66	$ 16.791,92	$ 16.791,92	$ -	$ 422.009,32	$ -
Lomas de Zamora	agua	2	2	1	1	548	$ 17.765,50	$ 8.882,75	$ 8.882,75	$ -	$ 151.608,40	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	7	18	15	4	418	$ 365.662,93	$ 21.509,58	$ 21.509,58	$ -	$ 2.860.061,47	$ -
	Total	9	20	16	5	432	$ 383.428,44	$ 20.180,44	$ 20.180,44	$ -	$ 3.011.669,88	$ -
Presidente Peron	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	4	4	-	123	$ 77.047,32	$ 25.682,44	$ 25.682,44	$ -	$ 343.050,24	$ -
	Total	-	4	4	-	123	$ 77.047,32	$ 25.682,44	$ 25.682,44	$ -	$ 343.050,24	$ -
TOTAL	agua	13	15	11	9	394	$ 151.692,49	$ 11.668,65	$ 11.668,65	$ -	$ 1.142.744,89	$ -
	cloaca	7	13	9	3	271	$ 129.878,11	$ 9.990,62	$ 9.990,62	$ -	$ 923.662,19	$ -
	agua y cloaca	1.402	872	657	1.187	401	$ 30.077.287,73	$ 37.040,99	$ 37.040,99	$ -	$ 218.102.407,43	$ -
	Total	1.422	900	677	1.199	399	$ 30.358.858,34	$ 36.227,75	$ 36.227,75	$ -	$ 220.168.814,51	$ -

(1) En días continuos con el beneficio.

(2) Descueto aplicado por mes en concepto del programa de Tarifa Social (descuento al uso del servicio)

(3) Es el descuento de tarifa social devengado durante 2025 (sin incluir el descuento transitorio por aumento del coeficiente K) para los usuarios vigentes en el programa al 31/12/2025. Para conocer el descuento total devengado durante el año calendario incluyendo a los usuarios que se dieron de baja en algún momento del año debe utilizarse el dato expuesto en los formularios 300 o 302.

Formato N° 902

Nuevo Programa de Tarifa Social

Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)

(4) Es la facturación neta de descuento durante 2025 para los usuarios vigentes en el programa al 31/12/2025.

Formato N° 903

Nuevo Programa de Tarifa Social

Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
CAPITAL FEDERAL	agua	-	2	2	-	86	$ 3.037.879,28	$ 10.135.479,81	$ 3.037.879,28	$ 7.097.600,53	$ 8.708.587,26	$ 21.292.801,60
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	324	276	186	234	486	$ 396.401.768,06	$ 4.133.546,53	$ 1.548.444,41	$ 2.585.102,13	$ 3.433.737.331,66	$ 7.973.771.482,79
	Total	324	278	188	234	484	$ 399.439.647,34	$ 4.156.900,36	$ 1.554.239,87	$ 2.602.660,49	$ 3.442.445.918,92	$ 7.995.064.284,38
NORTE	agua	9	6	5	8	235	$ 570.558,47	$ 287.063,55	$ 114.111,69	$ 172.951,86	$ 2.580.901,07	$ 5.297.139,49
	cloaca	5	2	2	5	148	$ 109.353,38	$ 201.448,64	$ 54.676,69	$ 146.771,95	$ 219.480,43	$ 783.473,56
	agua y cloaca	128	121	113	120	224	$ 41.850.457,42	$ 1.007.786,37	$ 380.458,70	$ 627.327,67	$ 176.933.061,19	$ 407.463.741,34
	Total	142	129	120	133	223	$ 42.530.369,27	$ 963.202,70	$ 363.507,43	$ 599.695,27	$ 179.733.442,69	$ 413.544.354,39
San Fernando	agua	1	1	1	1	190	$ 23.771,16	$ 78.749,57	$ 23.771,16	$ 54.978,41	$ 117.438,90	$ 384.848,88
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	2	3	3	2	125	$ 406.040,14	$ 456.006,29	$ 135.346,71	$ 320.659,57	$ 1.052.595,47	$ 2.984.629,51
	Total	3	4	4	3	141	$ 429.811,30	$ 361.692,11	$ 107.452,83	$ 254.239,28	$ 1.170.034,37	$ 3.369.478,39
Tigre	agua	2	-	-	2	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	1	1	-	247	$ 13.019,83	$ 41.074,94	$ 13.019,83	$ 28.055,11	$ 73.605,49	$ 252.495,95
	agua y cloaca	14	12	11	13	264	$ 1.883.578,06	$ 583.895,12	$ 156.964,84	$ 426.930,29	$ 7.482.269,58	$ 24.485.248,46
	Total	16	13	12	15	263	$ 1.896.597,89	$ 542.139,73	$ 145.892,15	$ 396.247,58	$ 7.555.875,07	$ 24.737.744,41
San Isidro	agua	3	2	2	3	57	$ 149.349,83	$ 507.072,32	$ 149.349,83	$ 357.722,49	$ 283.764,68	$ 715.444,97
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	46	41	37	42	263	$ 24.124.838,69	$ 1.666.298,89	$ 652.022,67	$ 1.014.276,22	$ 71.246.123,20	$ 155.223.999,59
	Total	49	43	39	45	258	$ 24.274.188,52	$ 1.635.792,92	$ 638.794,43	$ 996.998,49	$ 71.529.887,89	$ 155.939.444,57
San Martín	agua	1	2	1	-	386	$ 394.959,71	$ 417.094,21	$ 197.479,85	$ 219.614,35	$ 2.166.895,69	$ 4.119.867,48
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	28	26	26	28	172	$ 5.860.700,67	$ 650.305,63	$ 244.195,86	$ 406.109,77	$ 24.265.009,39	$ 60.484.567,67
	Total	29	28	27	28	189	$ 6.255.660,38	$ 632.366,29	$ 240.602,32	$ 391.763,97	$ 26.431.905,09	$ 64.604.435,15
Vicente López	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	29	27	26	28	201	$ 2.520.889,39	$ 298.448,93	$ 109.603,89	$ 188.845,04	$ 10.799.371,45	$ 25.995.717,02
	Total	29	27	26	28	201	$ 2.520.889,39	$ 298.448,93	$ 109.603,89	$ 188.845,04	$ 10.799.371,45	$ 25.995.717,02
Escobar	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	3	5	4	2	269	$ 6.707.788,96	$ 3.470.212,06	$ 1.341.557,79	$ 2.128.654,27	$ 60.427.437,53	$ 133.934.828,13
	Total	3	5	4	2	269	$ 6.707.788,96	$ 3.470.212,06	$ 1.341.557,79	$ 2.128.654,27	$ 60.427.437,53	$ 133.934.828,13
Jose C Paz	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Malvinas Argentinas	agua	1	-	-	1	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total	1	-	-	1	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
San Miguel	agua	1	-	-	1	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	5	1	1	5	49	$ 96.333,54	$ 361.822,35	$ 96.333,54	$ 265.488,80	$ 145.874,93	$ 530.977,60
	agua y cloaca	5	5	4	4	230	$ 260.579,53	$ 172.005,84	$ 52.115,91	$ 119.889,93	$ 1.396.392,49	$ 4.115.192,20
	Total	11	6	5	10	200	$ 356.913,07	$ 203.641,92	$ 59.485,51	$ 144.156,41	$ 1.542.267,43	$ 4.646.169,80
Pilar	agua	-	1	1	-	155	$ 2.477,77	$ 15.307,46	$ 2.477,77	$ 12.829,69	$ 12.801,80	$ 76.978,15
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	1	2	2	1	92	$ 86.041,98	$ 145.931,67	$ 86.041,98	$ 59.889,69	$ 263.862,07	$ 239.558,76
	Total	1	3	3	1	124	$ 88.519,75	$ 80.619,56	$ 44.259,87	$ 36.359,69	$ 276.663,87	$ 316.536,91

Formato N° 903

Nuevo Programa de Tarifa Social

Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
OESTE	agua	11	-	-	11	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	10	7	6	9	205	$ 142.385,39	$ 70.104,36	$ 20.340,77	$ 49.763,59	$ 647.553,52	$ 2.172.780,33
	agua y cloaca	97	75	60	82	357	$ 19.538.229,68	$ 838.810,05	$ 279.117,57	$ 559.692,48	$ 71.949.746,04	$ 187.327.906,78
	Total	118	82	66	102	343	$ 19.680.615,08	$ 768.927,71	$ 255.592,40	$ 513.335,31	$ 72.597.299,56	$ 189.500.687,11
La Matanza	agua	10	-	-	10	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	21	20	14	15	570	$ 13.823.525,15	$ 2.248.050,14	$ 691.176,26	$ 1.556.873,88	$ 49.018.785,39	$ 133.697.498,74
	Total	31	20	14	25	570	$ 13.823.525,15	$ 2.248.050,14	$ 691.176,26	$ 1.556.873,88	$ 49.018.785,39	$ 133.697.498,74
Morón	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	3	-	-	3	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	27	11	9	25	309	$ 1.550.605,56	$ 429.417,22	$ 193.825,70	$ 235.591,53	$ 6.072.578,96	$ 12.414.843,69
	Total	30	11	9	28	309	$ 1.550.605,56	$ 429.417,22	$ 193.825,70	$ 235.591,53	$ 6.072.578,96	$ 12.414.843,69
Hurlingham	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	2	2	2	2	106	$ 44.048,16	$ 80.639,29	$ 22.024,08	$ 58.615,21	$ 133.067,80	$ 468.921,65
	agua y cloaca	1	1	-	-	819	$ 77.426,52	$ 153.579,45	$ 77.426,52	$ 76.152,92	$ 526.928,30	$ 989.987,98
	Total	3	3	2	2	344	$ 121.474,68	$ 104.952,67	$ 40.491,56	$ 64.461,11	$ 659.996,09	$ 1.458.909,62
Ituzaingó	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	4	4	4	4	178	$ 94.452,36	$ 78.413,97	$ 23.613,09	$ 54.800,88	$ 482.526,14	$ 1.549.013,51
	agua y cloaca	6	4	4	6	202	$ 47.915,11	$ 52.924,20	$ 15.971,70	$ 36.952,49	$ 239.144,78	$ 869.541,24
	Total	10	8	8	10	188	$ 142.367,47	$ 67.489,78	$ 20.338,21	$ 47.151,57	$ 721.670,92	$ 2.418.554,75
Tres de Febrero	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	30	32	29	27	230	$ 3.117.627,12	$ 233.490,40	$ 100.568,62	$ 132.921,79	$ 10.192.833,12	$ 23.744.455,56
	Total	30	32	29	27	230	$ 3.117.627,12	$ 233.490,40	$ 100.568,62	$ 132.921,79	$ 10.192.833,12	$ 23.744.455,56
Merlo	agua	1	-	-	1	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	1	1	-	-	511	$ 3.884,87	$ 15.796,04	$ 3.884,87	$ 11.911,17	$ 31.959,59	$ 154.845,17
	agua y cloaca	6	2	1	5	431	$ 207.561,79	$ 201.894,91	$ 103.780,89	$ 98.114,01	$ 1.028.908,39	$ 2.332.821,95
	Total	8	3	1	6	458	$ 211.446,66	$ 139.861,95	$ 70.482,22	$ 69.379,73	$ 1.060.867,98	$ 2.487.667,12
Moreno	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	6	5	3	4	345	$ 713.568,43	$ 473.203,68	$ 142.713,69	$ 330.489,99	$ 4.870.567,10	$ 13.278.757,63
	Total	6	5	3	4	345	$ 713.568,43	$ 473.203,68	$ 142.713,69	$ 330.489,99	$ 4.870.567,10	$ 13.278.757,63

Formato N° 903

Nuevo Programa de Tarifa Social

Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)
SUDESTE	agua	5	4	3	4	234	$ 60.907,81	$ 47.905,60	$ 15.226,95	$ 32.678,64	$ 297.147,24	$ 884.414,36
	cloaca	-	1	1	-	322	$ 22.049,86	$ 67.500,23	$ 22.049,86	$ 45.450,37	$ 166.891,64	$ 499.954,09
	agua y cloaca	102	72	62	92	239	$ 14.206.185,88	$ 612.830,71	$ 212.032,63	$ 400.798,08	$ 97.387.774,54	$ 231.814.255,33
	Total	107	77	66	96	240	$ 14.289.143,54	$ 573.871,95	$ 198.460,33	$ 375.411,62	$ 97.851.813,42	$ 233.198.623,78
Avellaneda	agua	-	2	2	-	120	$ 23.508,85	$ 40.633,81	$ 11.754,43	$ 28.879,38	$ 83.506,97	$ 231.035,07
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	24	13	12	23	270	$ 7.400.703,15	$ 1.557.710,08	$ 569.284,86	$ 988.425,22	$ 69.568.800,51	$ 158.657.720,93
	Total	24	15	14	23	250	$ 7.424.212,00	$ 1.355.433,24	$ 494.947,47	$ 860.485,77	$ 69.652.307,48	$ 158.888.755,99
Lanús	agua	4	2	1	3	347	$ 37.398,96	$ 55.177,38	$ 18.699,48	$ 36.477,90	$ 213.640,27	$ 653.379,30
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	24	28	24	20	275	$ 1.551.128,10	$ 168.652,45	$ 67.440,35	$ 101.212,09	$ 8.575.711,63	$ 20.516.549,85
	Total	28	30	25	23	280	$ 1.588.527,05	$ 159.574,44	$ 63.541,08	$ 96.033,36	$ 8.789.351,90	$ 21.169.929,15
Quilmes	agua	1	-	-	1	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	42	25	22	39	185	$ 2.371.662,50	$ 249.512,23	$ 94.866,50	$ 154.645,73	$ 11.821.648,02	$ 27.563.922,94
	Total	43	25	22	40	185	$ 2.371.662,50	$ 249.512,23	$ 94.866,50	$ 154.645,73	$ 11.821.648,02	$ 27.563.922,94
Florencio Varela	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	1	1	-	322	$ 22.049,86	$ 67.500,23	$ 22.049,86	$ 45.450,37	$ 166.891,64	$ 499.954,09
	agua y cloaca	12	6	4	10	261	$ 2.882.692,12	$ 1.782.102,44	$ 480.448,69	$ 1.301.653,75	$ 7.421.614,39	$ 25.076.061,61
	Total	12	7	5	10	270	$ 2.904.741,98	$ 1.537.159,27	$ 414.963,14	$ 1.122.196,13	$ 7.588.506,03	$ 25.576.015,70
SUDOESTE	agua	47	33	32	46	147	$ 1.090.495,37	$ 105.519,90	$ 38.946,26	$ 66.573,64	$ 2.632.733,50	$ 7.414.749,82
	cloaca	7	2	2	7	70	$ 51.127,20	$ 93.308,04	$ 25.563,60	$ 67.744,43	$ 97.993,32	$ 406.466,60
	agua y cloaca	94	69	64	89	154	$ 8.354.944,12	$ 420.310,99	$ 139.249,07	$ 281.061,92	$ 24.376.422,37	$ 63.730.639,93
	Total	148	104	98	142	150	$ 9.496.566,69	$ 315.109,25	$ 105.517,41	$ 209.591,84	$ 27.107.149,19	$ 71.551.856,35
Alte Brown	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	10	3	1	8	518	$ 139.702,36	$ 142.557,50	$ 69.851,18	$ 72.706,32	$ 874.739,14	$ 1.890.364,42
	Total	10	3	1	8	518	$ 139.702,36	$ 142.557,50	$ 69.851,18	$ 72.706,32	$ 874.739,14	$ 1.890.364,42
E. Echeverría	agua	15	-	-	15	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	7	2	2	7	70	$ 51.127,20	$ 93.308,04	$ 25.563,60	$ 67.744,43	$ 97.993,32	$ 406.466,60
	agua y cloaca	26	6	6	26	79	$ 760.181,45	$ 285.708,33	$ 152.036,29	$ 133.672,04	$ 1.381.754,20	$ 2.307.291,50
	Total	48	8	8	48	77	$ 811.308,65	$ 230.736,82	$ 115.901,24	$ 114.835,58	$ 1.479.747,53	$ 2.713.758,11
Ezeiza	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	1	1	1	1	120	$ 15.925,03	$ 55.328,83	$ 15.925,03	$ 39.403,80	$ 46.173,56	$ 157.615,21
	Total	1	1	1	1	120	$ 15.925,03	$ 55.328,83	$ 15.925,03	$ 39.403,80	$ 46.173,56	$ 157.615,21
Lomas de Zamora	agua	32	33	32	31	147	$ 1.090.495,37	$ 105.519,90	$ 38.946,26	$ 66.573,64	$ 2.632.733,50	$ 7.414.749,82
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	57	57	54	54	150	$ 7.376.232,39	$ 464.477,04	$ 147.524,65	$ 316.952,39	$ 21.927.077,38	$ 58.886.610,98
	Total	89	90	86	85	149	$ 8.466.727,76	$ 335.620,63	$ 108.547,79	$ 227.072,84	$ 24.559.810,88	$ 66.301.360,80
Presidente Peron	agua	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	cloaca	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	agua y cloaca	-	2	2	-	86	$ 62.902,89	$ 112.911,08	$ 31.451,45	$ 81.459,64	$ 146.678,08	$ 488.757,83
	Total	-	2	2	-	86	$ 62.902,89	$ 112.911,08	$ 31.451,45	$ 81.459,64	$ 146.678,08	$ 488.757,83
TOTAL	agua	72	45	42	69	166	$ 4.759.840,93	$ 387.288,87	$ 125.258,97	$ 262.029,90	$ 14.219.369,08	$ 34.889.105,27
	cloaca	22	12	11	21	183	$ 324.915,83	$ 95.645,34	$ 27.076,32	$ 68.569,02	$ 1.131.918,91	$ 3.862.674,58
	agua y cloaca	745	613	485	617	354	$ 480.351.585,16	$ 2.298.471,46	$ 853.199,97	$ 1.445.271,49	$ 3.804.384.335,80	$ 8.864.108.026,17
	Total	839	670	538	707	339	$ 485.436.341,92	$ 2.136.874,64	$ 791.902,68	$ 1.344.971,96	$ 3.819.735.623,79	$ 8.902.859.806,01

(1) En días continuos con el beneficio.

(2) Descueto aplicado por mes en concepto del programa de Tarifa Social (incluye descuento al uso del servicio y descuento transitorio -DTO-)

(3) Es el descuento de tarifa social devengado durante 2025 (sin incluir el descuento transitorio por aumento del coeficiente K) para los usuarios vigentes en el programa al 31/12/2025. Para conocer el descuento total devengado durante el año calendario incluyendo a los usuarios que se dieron de baja en algún momento del año debe utilizarse el dato expuesto en los formularios 300 o 302.

Formato N° 903

Nuevo Programa de Tarifa Social

Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Partido	Servicio prestado	Beneficiarios (a dic 2024)	Beneficiarios (a dic 2025)	Altas (durante 2025)	Bajas (durante 2025)	Tiempo promedio del beneficio (a dic 2025) (1)	Descuento PTS (2)	Factura promedio sin descuento	Descuento Promedio	Factura promedio con descuento	Monto total del subsidio devengado (2025) (3)	Facturación total (2025) (4)

(4) Es la facturación neta de descuento durante 2025 para los usuarios vigentes en el programa al 31/12/2025.

Formato N° 904

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Usuarios Residenciales

Situación al 31 de diciembre de 2025

DADO EL VOLUMEN DE LA INFORMACIÓN DE REFERENCIA (registros)
SE ENTREGARÁ SOLAMENTE EL SOPORTE DIGITAL DE LA MISMA.

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	Piso	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2390	E.R.A.S.	19600	2189219	SAN JUAN AV	01953	C1232AAB	CAPITAL FEDERAL	JOSEFINA V. DE ARCA	A	0
2392	E.R.A.S.	21937	2310516	CASTAÑARES AV	01470	C1406IGN	CAPITAL FEDERAL	JUAN SOSA GUEDES	A	0
2313	E.R.A.S.	25365	2132698	CATAMARCA	01655	C1246AAI	CAPITAL FEDERAL	SILVANA MARISA MONTIEL	A	0
2384	E.R.A.S.	25491	564676	MORENO	02470	C1094ABN	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION LOYOLA	A	0
2313	E.R.A.S.	25596	2129197	PICHINCHA	00587	C1219ACA	CAPITAL FEDERAL	GERMAN RODRIGUEZ TAPIA	A	0
2367	E.R.A.S.	25725	728492	DE LOS INCAS AV	04414	C1427DNV	CAPITAL FEDERAL	LOPEZ CA/EDO EDUARDO	A	0
2399	E.R.A.S.	27827	2174724	ECHAGUE PEDRO ING	03115	C1261---	0	CONDE A P DE	A	0
2332	E.R.A.S.	28155	2382850	BRASIL AV	03225	C1260ABB	CAPITAL FEDERAL	SUNG CHAN OH	A	0
2382	E.R.A.S.	30908	2316993	ARENGREEN	01015	C1405CYK	CAPITAL FEDERAL	M PEDROSA	A	0
2366	E.R.A.S.	31977	990502	SALTA	00855	C1074AAQ	CAPITAL FEDERAL	RODOLFO MATIAS MACEIRA	A	0
2385	E.R.A.S.	33581	774684	COCHABAMBA	01516	C1148ABD	CAPITAL FEDERAL	CURIA HUMBERTO Y SRA	A	0
2360	E.R.A.S.	33895	2016297	HUMBERTO 1	01655	C1103ADG	CAPITAL FEDERAL	YANG CHUN MEI	A	0
2373	E.R.A.S.	35699	2126808	CADIZ	04020	C1431DMH	CAPITAL FEDERAL	LARKEN A RODRIGUEZ DE	A	0
2287	E.R.A.S.	37927	2165092	BAUNESS	01390	C1427BCT	CAPITAL FEDERAL	DYMINSKI ZUKEN	A	0
2257	E.R.A.S.	38258	611781	VENEZUELA	01667	C1096ABA	CAPITAL FEDERAL	BEAU GEST S.R.L.	A	0
2359	E.R.A.S.	41118	2192748	CONSTITUCION	03670	C1254ABL	CAPITAL FEDERAL	LILIANA CARMEN PECCETTO	A	0
2366	E.R.A.S.	44847	2090110	BOCAYUVA QUINTINO	00559	C1216AAA	CAPITAL FEDERAL	JOSE LAURO	A	0
2371	E.R.A.S.	47417	2302517	MUÑIZ	01218	C1255ACD	CAPITAL FEDERAL	EVA MARIA SMERIGLIO	A	0
2380	E.R.A.S.	49502	1098274	COMBATE DE LOS POZOS	00758	C1222AAF	CAPITAL FEDERAL	TOMASA M. PONCE	A	0
2359	E.R.A.S.	54588	1002542	SANTIAGO DEL ESTERO	00435	C1075AAI	CAPITAL FEDERAL	IRMA ROSA ARUEJ	A	0
2335	E.R.A.S.	56875	122657	TUCUMAN	01420	C1050AAD	CAPITAL FEDERAL	GUSTAVO G. GUTIERREZ	A	0
2382	E.R.A.S.	64017	2377793	OTAMENDI	00299	C1405BRA	CAPITAL FEDERAL	MANUEL DIOGENES GENTIL	A	0
2385	E.R.A.S.	67444	2394727	NEUQUEN	00750	C1405CKF	CAPITAL FEDERAL	MARIA DEL PILAR CASTROVIEJO	A	0
2129	E.R.A.S.	71272	546723	MORENO	01656	C1093ABD	CAPITAL FEDERAL	FEIGES	A	0
2364	E.R.A.S.	77144	2221302	ANCHORENA TOMAS MANUEL D	00770	C1170ACN	CAPITAL FEDERAL	NATALIO STRAFACE	A	0
2365	E.R.A.S.	87851	2276495	FRAGATA PRESIDENTE SARMIEI	01375	C1416CBE	CAPITAL FEDERAL	CHANTADA J BUGALLO DE	A	0
2363	E.R.A.S.	88566	1353366	AVALOS	02050	C1431DPN	CAPITAL FEDERAL	ADMINISTRACION DE CONSORCIO	A	0
2367	E.R.A.S.	88678	2226303	SEGUI F J ALTE	01407	C1416BXG	CAPITAL FEDERAL	AURELIO LEONARDO	A	0
2359	E.R.A.S.	88887	2153395	CALVO CARLOS	00891	C1102AAQ	CAPITAL FEDERAL	DANIEL ALBERTO MEJIA NINO	A	0
2385	E.R.A.S.	89017	2008616	ARENALES	01987	C1124AAC	CAPITAL FEDERAL	MARCELO MANUEL MANSILLA	A	0
2360	E.R.A.S.	89326	1982298	CHILE	02102	C1227AAH	CAPITAL FEDERAL	LILIANA ESTELA CORONEL GOMEZ	A	0
2296	E.R.A.S.	90836	1461083	DE LOS CONSTITUYENTES AV	04815	C1431EYA	CAPITAL FEDERAL	ALGAÑARAZ J	A	0
2367	E.R.A.S.	91550	2336064	ALVAREZ JULIAN	00528	C1414DRL	CAPITAL FEDERAL	MANUEL SOLIS	A	0
2358	E.R.A.S.	93153	2233570	ACEVEDO	00815	C1414DJQ	CAPITAL FEDERAL	C. R. DE DEMATE	A	0
2395	E.R.A.S.	93674	2213856	RIVADAVIA AV	02625	C1034ACF	CAPITAL FEDERAL	ELIZABETH ROSA DI COSTA	A	0
2375	E.R.A.S.	108877	1598578	VIRGILIO	00381	C1407BQE	CAPITAL FEDERAL	PATRICIA ISABEL VASQUEZ	A	0
2368	E.R.A.S.	109806	2093837	TRONADOR	04670	C1430DNJ	CAPITAL FEDERAL	BLANCA SELVA BENIGNA FLORES	A	0
2394	E.R.A.S.	110034	1969414	VALDENEGRO	04621	C1430EFG	CAPITAL FEDERAL	YOLANDA AIDA FONTANA	A	0
2363	E.R.A.S.	110192	1099575	RIVADAVIA AV	10485	C1408AAE	CAPITAL FEDERAL	ZAHRA ZAHEDI	A	0
2298	E.R.A.S.	110677	609966	VENEZUELA	01308	C1095ABB	CAPITAL FEDERAL	OLGA LYS	A	0
2374	E.R.A.S.	111034	1461462	HOMERO	00482	C1407IFJ	CAPITAL FEDERAL	ALBERTO RAUL POPRITKIN	A	0
2394	E.R.A.S.	112921	526540	ESCALADA AV	00416	C1407LDJ	CAPITAL FEDERAL	EDUARDO HECTOR CERDEIRA	A	0
2316	E.R.A.S.	112968	1409566	GALLO	01224	C1425EFB	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS GALLO 122	A	0
2388	E.R.A.S.	118928	1967218	SANTIAGO DEL ESTERO	01927	C1136ABO	CAPITAL FEDERAL	PEREZ S SORIANO DE	A	0
2387	E.R.A.S.	120123	1774564	HUMAHUACA	04124	C1192ACF	CAPITAL FEDERAL	MARIO JORGE ORTIZ	A	0
2396	E.R.A.S.	120909	2063812	LARRALDE CRISOLOGO	03920	C1430AIL	CAPITAL FEDERAL	MARIA MEGNA	A	0
2304	E.R.A.S.	121988	555587	SARANDI	00307	C1081ACG	CAPITAL FEDERAL	MARINA CATARI CASTRO	A	0
2396	E.R.A.S.	123766	555477	PIERES	00623	C1408HDK	CAPITAL FEDERAL	GRACIELA RAMONA RIVERO	A	0
2341	E.R.A.S.	125167	2162653	SOLIER DANIEL DE ALTE	01136	C1428CIF	CAPITAL FEDERAL	ELSA KASSARDJIAN	A	0
2383	E.R.A.S.	125421	1787147	RIOBAMBA	00719	C1025ABO	CAPITAL FEDERAL	ALFREDO FONTANA	A	0
2288	E.R.A.S.	128220	21823	PERU	02323	B1754EZA	SAN JUSTO	SILVIA PATRICIA HELU	A	0
2357	E.R.A.S.	136567	2294925	BRAVO MARIO	00084	C1175AAB	CAPITAL FEDERAL	MARTINEZ MANUEL J	A	0
2379	E.R.A.S.	138552	124903	TUCUMAN	01518	C1050AAF	CAPITAL FEDERAL	ROBERTO ESTEBAN PRUNES	A	0
2326	E.R.A.S.	144134	2202095	DIAZ VELEZ AV	04515	C1405DCA	CAPITAL FEDERAL	MARIA DEL PILAR MENDEZ	A	0
2298	E.R.A.S.	144940	1066401	CAÑADA DE GOMEZ	00940	C1408GNF	CAPITAL FEDERAL	MARCECANE LUIS	A	0
2393	E.R.A.S.	147121	1945903	ESMERALDA	00949	C1007ABK	CAPITAL FEDERAL	MONICA LUCIA P.CASEY	A	0
2399	E.R.A.S.	150549	1013208	EL RASTREADOR	00347	C1408GGA	CAPITAL FEDERAL	ANA OFELIA GINEPRO	A	0
2398	E.R.A.S.	152907	1545282	ANDALGALA	00988	C1408GDB	CAPITAL FEDERAL	ESTEVEZ FRANCISCO E.	A	0
2389	E.R.A.S.	153899	115861	TUCUMAN	00316	C1049AAH	CAPITAL FEDERAL	FIGUEROA EMILIA BEATRIZ	A	0
2378	E.R.A.S.	154542	1082084	PATRON	07132	C1408FBL	CAPITAL FEDERAL	DEBORA PAMELA SASSO	A	0
2318	E.R.A.S.	155067	2149410	LIMA	00645	C1073AAM	CAPITAL FEDERAL	SAAVEDRA MARIA A	A	0
2365	E.R.A.S.	162987	2129591	VIAMONTE	00370	C1053ABH	CAPITAL FEDERAL	RODRIGUEZ MANUEL E	A	0
2275	E.R.A.S.	163657	1274063	RIVADAVIA AV	05741	C1406GLA	CAPITAL FEDERAL	NELIDA A. D. COLLIA	A	0
2371	E.R.A.S.	165495	832454	CHILE	00672	C1098AAN	CAPITAL FEDERAL	JORGE ALBERTO BARTOLO LERDA	A	0
2352	E.R.A.S.	166689	494057	YRIGOYEN HIPOLITO	01145	C1086AAS	CAPITAL FEDERAL	MARTINEZ CUITIÑO CAR	A	0
2273	E.R.A.S.	173872	456603	MARTINEZ CASTRO	00814	C1407JXN	CAPITAL FEDERAL	RUBEN HERNANDEZ	A	0
2288	E.R.A.S.	184808	2023969	SANTIAGO DEL ESTERO	01457	C1136ABE	CAPITAL FEDERAL	CONTE MARTA	A	0
2363	E.R.A.S.	187933	2237190	CALVO CARLOS	01885	C1230AAA	CAPITAL FEDERAL	GUTIERREZ,ADELAIDA	A	0
2122	E.R.A.S.	187958	2237631	CALVO CARLOS	01885	C1230AAA	CAPITAL FEDERAL	ELENA PERLA YAGUST	A	0
2302	E.R.A.S.	192337	727768	GUARDIA NACIONAL	00958	C1440DTL	CAPITAL FEDERAL	NORMA LILIANA FERRARI	A	0
2292	E.R.A.S.	196310	2297715	COCHABAMBA	01732	C1148ABH	CAPITAL FEDERAL	ADRIANA GRACIELA SCARPATI	A	0
2132	E.R.A.S.	200387	2287339	BEAUCHEF	00401	C1424BDI	CAPITAL FEDERAL	HERNAN JOSE GAGLIARDO	A	0
2351	E.R.A.S.	201033	2125080	SAAVEDRA	00924	C1229ACJ	CAPITAL FEDERAL	MACAGNI MARTA ETHEL	A	0
2286	E.R.A.S.	203746	1488789	AREVALO	02778	C1426DJB	CAPITAL FEDERAL	LONGUEIRA MANUELA	A	0
2400	E.R.A.S.	203841	998685	ALBARIÑO	01345	C1440DEO	CAPITAL FEDERAL	STELLA MARIS SEGATA	A	0
2343	E.R.A.S.	206633	2355399	LAS HERAS GRAL AV	03419	C1425ASL	CAPITAL FEDERAL	PELZ M.	A	0
2371	E.R.A.S.	208936	1924320	VALDENEGRO	03067	C1431GAI	CAPITAL FEDERAL	VACHETTA JUAN	A	0
2396	E.R.A.S.	218106	1783056	MURGUIONDO	01888	C1440CNP	CAPITAL FEDERAL	MAURICIO FAINSZTEIN	A	0
2378	E.R.A.S.	223365	2151947	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV	01784	C1414DOR	CAPITAL FEDERAL	PETAZZE PEDRO	A	0
2388	E.R.A.S.	234934	521315	SARMIENTO	03917	C1197AAE	CAPITAL FEDERAL	MARIA H PEREYRA	A	0
2384	E.R.A.S.	239168	1132073	ALBERTI	00372	C1082AAH	CAPITAL FEDERAL	CANARO ESTELA BEATRIZ	A	0
2380	E.R.A.S.	239193	2359532	RIVADAVIA AV	03029	C1203AAC	CAPITAL FEDERAL	FLORINDA ANGELICA AVACA	A	0
2298	E.R.A.S.	243263	300724	COLOMBRES	00038	C1177AAB	CAPITAL FEDERAL	LUCIA PAREDES NACHO	A	0
2357	E.R.A.S.	247723	107450	PALACIOS ALFREDO L	00511	B1704AQK	RAMOS MEJIA	GASTALDO JOSE LUIS	A	0
2397	E.R.A.S.	251287	2238432	JUSTO JUAN B AV	03854	C1416DJS	CAPITAL FEDERAL	GALANTI ISAAC R	A	0
2360	E.R.A.S.	255700	2072111	ALBERTI	00565	C1223AAA	CAPITAL FEDERAL	LIDIA MARUJA RIVADENEIRA CARRETERO	A	0
2369	E.R.A.S.	256481	2282132	24 DE NOVIEMBRE	02240	C1242AAV	CAPITAL FEDERAL	BALLARI MARCELO A	A	0
2372	E.R.A.S.	256697	1836541	CABRERA JOSE ANTONIO	03870	C1186AAV	CAPITAL FEDERAL	IRMA SANTOS	A	0
2376	E.R.A.S.	261860	1756796	ALVAREZ CRISOSTOMO	05260	C1439AWT	CAPITAL FEDERAL	ROSA CARMELA ATTANASIA DE MORRONE	A	0
2364	E.R.A.S.	265112	1815607	AQUINO	04863	C1439ADG	CAPITAL FEDERAL	BENITEZ I Y OTRO	A	0
2400	E.R.A.S.	276166	162285	CORDOBA AV	00650	C1054AAS	CAPITAL FEDERAL	GHIORZI PELUSO	A	0
2389	E.R.A.S.	276363	162530	CORDOBA AV	00650	C1054AAS	CAPITAL FEDERAL	FIDELINA ALARCON CURTIDO	A	0
2167	E.R.A.S.	279202	1689335	RUCCI JOSE IGNACIO	03770	C1439FVN	CAPITAL FEDERAL	ADRIANA SILVA	A	0
2386	E.R.A.S.	280099	158130	PASO	00709	C1031ABO	CAPITAL FEDERAL	ROSA CLOTILDE MORALES MORENO	A	0
2378	E.R.A.S.	281092	2047780	URDININEA	01742	C1431FUD	CAPITAL FEDERAL	TEXIER GRACIELA	A	0
2367	E.R.A.S.	284694	1121074	ASUNCION	02409	C1419HFG	CAPITAL FEDERAL	CARMEN ROCIO PONCE DE LEON	A	0
2388	E.R.A.S.	285420	1790094	LA MESOPOTAMIA	04177	C1439GPA	CAPITAL FEDERAL	CELIA MAMANI TOLA Y OTRO	A	0
2395	E.R.A.S.	290483	1650090	MURGUIONDO	04636	C1439FTL	CAPITAL FEDERAL	MARIANA REINA ALBA AGUAYO	A	0

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2386	E.R.A.S.	292431	2382629	AMBROSETTI JUAN B	00205	C1405BIA	CAPITAL FEDERAL	TORRETTA LUIS	A	0
2360	E.R.A.S.	294983	936603	255-CARABELAS	01649	B1876DGQ	BERNAL ESTE	VANESA BETSABE Y OTRO VELAZQUEZ	A	0
2388	E.R.A.S.	297582	1110214	SARANDI	01350	C1251ADD	CAPITAL FEDERAL	LUIS DANIEL AYALA	A	0
2204	E.R.A.S.	299284	280320	BELTRAN CNEL	00190	B1826BRD	REMEDIOS DE ESC/	SILVIA ROSANA VAZQUEZ	A	0
2389	E.R.A.S.	302048	528755	ANCHORENA TOMAS MANUEL D	00395	C1170ACE	CAPITAL FEDERAL	PAGES JAIME M	A	0
2323	E.R.A.S.	308630	2188691	YRIGOYEN HIPOLITO	00910	C1086AAP	CAPITAL FEDERAL	ANDRES OSVALDO GAMBARDELLA Y OTRA	A	0
2374	E.R.A.S.	315104	1283937	ITAQUI	06714	C1439CSN	CAPITAL FEDERAL	RITA MARIA LOPEZ	A	0
2366	E.R.A.S.	324349	699543	MIRAMAR	04237	C1407FLE	CAPITAL FEDERAL	PEISACH SZINDEL	A	0
2359	E.R.A.S.	330096	1873089	BOGOTA	04191	C1407ESQ	CAPITAL FEDERAL	FERREIRA DIANA V N	A	0
2258	E.R.A.S.	331638	2141955	IBERA	04095	C1430AVO	CAPITAL FEDERAL	SPINELLI MIGUEL	A	0
2366	E.R.A.S.	335159	116785	140-SAN MARTIN AV	00822	B1876AAV	BERNAL ESTE	MARIA ANA ASARO	A	0
2385	E.R.A.S.	339416	552068	ALVAREZ JONTE AV	03967	C1407GOG	CAPITAL FEDERAL	M I S BESOZZI	A	0
2382	E.R.A.S.	339431	552630	LASCANO	03952	C1417GZH	CAPITAL FEDERAL	IVANOFF NESTOR	A	0
2401	E.R.A.S.	345446	1940327	PAZ GRAL AV	11858	C1408FHR	CAPITAL FEDERAL	BARABUCH ELVIRA	A	0
2374	E.R.A.S.	349676	515980	NAZARRE	03602	C1417DXL	CAPITAL FEDERAL	INES CARMEN ZARRELIA	A	0
2401	E.R.A.S.	357903	337127	COTAGAITA	03415	B1825DNU	MONTE CHINGOLO	SILVIA CASCO	A	0
2373	E.R.A.S.	359488	338795	ZULOAGA COMTE	00354	B1826BGH	REMEDIOS DE ESC/	BEATRIZ TOROSSIAN	A	0
2317	E.R.A.S.	363446	2003334	LA PLATA AV	00654	C1235ABQ	CAPITAL FEDERAL	MARIA CRISTINA PAGANO	A	0
2248	E.R.A.S.	376231	442490	56-MATHEU	04849	B1650CTG	SAN MARTIN	CANDIAGA ALEJANDRA	A	0
2296	E.R.A.S.	377285	1925540	FRAGATA LA ARGENTINA	01627	C1440EXE	CAPITAL FEDERAL	RICARDO RUBEN BUCCILLI	A	0
2359	E.R.A.S.	383191	2179935	MORENO	01773	C1093ABG	CAPITAL FEDERAL	CARABELLI HERMINDA ISABEL	A	0
2258	E.R.A.S.	398544	2068372	MATHEU	00681	C1219AAA	CAPITAL FEDERAL	ROFFE ALBERTO GABRIEL	A	0
2371	E.R.A.S.	399745	147635	148-CHACABUCO	00174	B1876AOD	BERNAL ESTE	IRMA BODELLA	A	0
2307	E.R.A.S.	404619	395027	BASAVILBASO DOMINGO DR	01913	B1824ARU	LANUS ESTE	SILVIA GLADYS ABAGNATO	A	0
2374	E.R.A.S.	409521	526701	GOMEZ VALENTIN	03162	C1191AAH	CAPITAL FEDERAL	CASTAGNELLO FRANCISC	A	0
2355	E.R.A.S.	411456	604626	VENEZUELA	00565	C1095AAK	CAPITAL FEDERAL	MARCELA FALABELLA	A	0
2385	E.R.A.S.	417360	155760	156-VIEJO BUENO	01407	B1883FNC	BERNAL OESTE	CESAR PINTOS	A	0
2378	E.R.A.S.	421084	2067614	VEDIA	02748	C1429EJV	CAPITAL FEDERAL	SANTORIO ENRIQUE	A	0
2394	E.R.A.S.	421985	2349452	ARENALES	03040	C1425BEL	CAPITAL FEDERAL	ELSA BEATRIZ DOPORTO	A	0
2295	E.R.A.S.	422726	419274	JUNCAL	00745	B1824ING	LANUS ESTE	ANA MARIA ESCADON	A	0
2393	E.R.A.S.	423147	1009515	109-CHACO	01193	B1883BVM	BERNAL OESTE	JESUS Y OTRO MAGUICHA DE KUPELIAN	A	0
2363	E.R.A.S.	428524	160587	107-PAMPA	01375	B1883CDQ	BERNAL OESTE	MIGUEL ANICAS	A	0
2359	E.R.A.S.	429027	160889	160-VICTORICA	01445	B1883FDC	BERNAL OESTE	SILVIO CASCO	A	0
2373	E.R.A.S.	430357	427875	BRIN MTRO	04153	B1826DYI	REMEDIOS DE ESC/	LILIA MARCELA FONTANA	A	0
2402	E.R.A.S.	434117	2078145	ALVEAR MARCELO T DE	02365	C1122AAK	CAPITAL FEDERAL	BRITES MARIA DE JESUS	A	0
2370	E.R.A.S.	439089	2237772	CASEROS AV	02741	C1264AAH	CAPITAL FEDERAL	GABRIELA MARISA RODRIGUEZ	A	0
2375	E.R.A.S.	445770	167921	120-ZEBALLOS	01241	B1883ALI	BERNAL OESTE	ALICIA HAYDEE SEBASTIAN	A	0
2389	E.R.A.S.	447395	448026	CASTELAR EMILIO	00722	C1407CPD	CAPITAL FEDERAL	C F C DE PRANTERA	A	0
2378	E.R.A.S.	450640	2104744	DE LOS CONSTITUYENTES AV	05267	C1431EZD	CAPITAL FEDERAL	MAYMO JAIME ANTONIO Y SRA	A	0
2395	E.R.A.S.	450775	687608	BERMUDEZ	01550	C1407BEB	CAPITAL FEDERAL	ADMINISTRACION DE CONSORCIO	A	0
2161	E.R.A.S.	451435	1766009	BULNES	01466	C1176ACB	CAPITAL FEDERAL	RAMIREZ MARTA	A	0
2336	E.R.A.S.	453807	2180976	ACUÑA DE FIGUEROA FRANCIS(	00586	C1180AAJ	CAPITAL FEDERAL	SAPIA, JORGE ALBERTO	A	0
2389	E.R.A.S.	454759	888320	SAN BLAS	04936	C1407FUH	CAPITAL FEDERAL	ALFREDO Y CACCAVALLO	A	0
2373	E.R.A.S.	455038	172182	154 BIS-ORIGONE	00171	B1883FQC	BERNAL OESTE	JUAN CARLOS SANSOTTA	A	0
2382	E.R.A.S.	463409	335924	MURATURE	05230	C1407FCP	CAPITAL FEDERAL	IVAN LUNA ZANINI	A	0
2386	E.R.A.S.	464953	114004	GONZALEZ ELPIDIO	05311	C1407GBO	CAPITAL FEDERAL	RICARDO PALOMBA	A	0
2366	E.R.A.S.	470869	265924	POSADAS	00682	B1704HWN	RAMOS MEJIA	MARSANO ANTONIO	A	0
2115	E.R.A.S.	471267	740838	CALDERON BARCA DE LA	00251	B1834---	0	FRANCISCO NICOLACI	A	0
2341	E.R.A.S.	480294	2100572	SARMIENTO	02187	C1044AAG	CAPITAL FEDERAL	SILVIA ESTER DE TEGERÍA	A	0
2401	E.R.A.S.	485397	1046052	118-FRANCO CTE	01582	B1883AGN	BERNAL OESTE	FRANCISCO MARTINUZZI	A	0
2396	E.R.A.S.	485606	489414	MALAVIA JOSE J PBRO	00536	B1826CBH	REMEDIOS DE ESC/	SALVADOR IERVASI .-DEJAR EN BUZON.-	A	0
2402	E.R.A.S.	495765	827749	SIMBRON	05531	C1408BHE	CAPITAL FEDERAL	D'DOMENICO ALFONSO	A	0
2401	E.R.A.S.	498758	938889	MARTI JOSE	00674	C1406FBN	CAPITAL FEDERAL	ALBERTO JOSÉ LIBRANDI	A	0
2386	E.R.A.S.	506078	510800	GABOTO SEBASTIAN	04199	B1826EWQ	REMEDIOS DE ESC/	GRACIELA D'ALOIA	A	0
2380	E.R.A.S.	510514	597965	106-LA PAZ	00126	B1653---	0	EDMUNDO Y MARISA ASHKAR	A	0
2372	E.R.A.S.	512658	2241891	CUCHA CUCHA	01047	C1405AIK	CAPITAL FEDERAL	ANGEL JOSE FERRERO	A	0
2295	E.R.A.S.	514726	2292226	SERRANO	00376	C1414DEH	CAPITAL FEDERAL	TROTIÑO NEGRETE JUSTINA	A	0
2373	E.R.A.S.	519138	978133	BOYACA AV	01476	C1416AAH	CAPITAL FEDERAL	MARIO ENRIQUE LAJE	A	0
2401	E.R.A.S.	519618	791651	ERICSON	2	B1834JFB	TEMPERLEY	EDUARDO SALVADOR PEREZ	A	0
2399	E.R.A.S.	522892	613686	BOLIVIA	01360	C1416ANF	CAPITAL FEDERAL	ROSARIO LIMARDO DE COZZO	A	0
2381	E.R.A.S.	525295	724062	LISBOA	00830	C1408CDJ	CAPITAL FEDERAL	RUBEN POLUTRANKA Y OTROS	A	0
2314	E.R.A.S.	544826	440405	CATAMARCA	00668	C1231AAD	CAPITAL FEDERAL	CARLOS RODOLFO NARDELLO	A	0
2402	E.R.A.S.	546211	1871351	URIBURU JOSE EVARISTO PRES	00620	C1027AAN	CAPITAL FEDERAL	ELTA MARTÍN	A	0
2384	E.R.A.S.	548151	1733521	POLA	02837	C1439ENE	CAPITAL FEDERAL	MADERERA CORDOBA S.A.	A	0
2359	E.R.A.S.	550911	2021186	YRIGOYEN HIPOLITO	02367	C1089AAS	CAPITAL FEDERAL	LOPEZ MARIA R	A	0
2253	E.R.A.S.	550978	932998	TACUARI	01402	C1139AAF	CAPITAL FEDERAL	DIEGO CARLOS SOSA	A	0
2385	E.R.A.S.	553270	556352	UCRANIA	00916	B1822CST	VALENTIN ALSINA	FACUNDO ARIAS	A	0
2291	E.R.A.S.	553322	2099331	LOS ALAMOS	4287	C1439---	CAPITAL FEDERAL	ESTELBINA ALCARAZ GARAY Y OTRO	A	0
2375	E.R.A.S.	553566	341950	CAVIA	00583	B1752DNK	LOMAS DEL MIRADO	TIBAU JOSE	A	0
2376	E.R.A.S.	554999	476874	YRIGOYEN HIPOLITO	01432	C1089AAB	CAPITAL FEDERAL	ESTER ANDREA ACUÑA	A	0
2363	E.R.A.S.	557868	1980298	BELGRANO AV	02616	C1096AAQ	CAPITAL FEDERAL	IVAS BORJES LEONOR	A	0
2135	E.R.A.S.	570034	180429	CAMACUA	00060	C1406DOB	CAPITAL FEDERAL	ADRIAN ENRIQUE MURATORIO	A	0
2387	E.R.A.S.	570441	1774854	GUARDIA VIEJA	04136	C1192AAR	CAPITAL FEDERAL	MARIA TERESA KERN	A	0
2314	E.R.A.S.	572591	174307	BOLIVIA	00366	C1406ADF	CAPITAL FEDERAL	GLORIA MIRTA PRAT	A	0
2382	E.R.A.S.	574829	139594	RIVADAVIA AV	07684	C1406GMT	CAPITAL FEDERAL	MARTA M CENTOMANI	A	0
2257	E.R.A.S.	582962	678454	131-POSADAS	03174	B1650IWT	SAN MARTIN	EMILIO ARMENI	A	0
2401	E.R.A.S.	585379	377248	PALACIOS ALFREDO L	02453	B1752BNI	LOMAS DEL MIRADO	DOMINGO RIZZO	A	0
2367	E.R.A.S.	587677	1314334	CHIVILCOY AV	01613	C1407AFE	CAPITAL FEDERAL	ROSA TORBISMAN	A	0
2396	E.R.A.S.	588994	2019922	YERBAL	02579	C1406GKE	CAPITAL FEDERAL	RICARDO OSVALDO DERRUICH	A	0
2371	E.R.A.S.	594968	1919646	CASTELLI	00256	C1032AAB	CAPITAL FEDERAL	ELIAS HARARIS	A	0
2368	E.R.A.S.	595981	1741650	SANTIAGO DEL ESTERO	01015	C1075AAU	CAPITAL FEDERAL	ANGELA J. PETITTO	A	0
2313	E.R.A.S.	597223	348641	TERRERO	00541	C1406BKI	CAPITAL FEDERAL	GUILLERMO ERNESTO BARR	A	0
2376	E.R.A.S.	599779	603634	SAN MARTIN JOSE DE GRAL AV	00320	B1823CNN	GERLI (L)	LEONARDO MANNARO	A	0
2374	E.R.A.S.	602221	699477	91-YAPEYU	05236	B1653MJL	VILLA BALLESTER	TERRANOVA LUIS CAYETANO	A	0
2310	E.R.A.S.	602688	2106553	SAN LUIS	02428	C1056AAB	CAPITAL FEDERAL	LUISA SALEM Y OTRO	A	0
2381	E.R.A.S.	607876	907013	TARIJA	02749	B1834---	0	PARIS JUAN GONZALEZ	A	0
2394	E.R.A.S.	609591	403587	PALACIOS ALFREDO L	02155	B1752BNC	LOMAS DEL MIRADO	ANTONIO JAKIC	A	0
2394	E.R.A.S.	628176	937431	WARNES	01436	B1834---	0	GARCIA ADRIANA	A	0
2384	E.R.A.S.	633027	290079	CALLE 885	0	B1881---	0	DELFIN AVALOS	A	0
2162	E.R.A.S.	637202	433556	LINIERS	00366	B1752DCH	LOMAS DEL MIRADO	ULISES DARIO PROVENZA	A	0
2374	E.R.A.S.	638065	294359	878-CALLE 878	05207	B1855CQS	VILLA LA FLORIDA	FROILAN ACOSTA	A	0
2355	E.R.A.S.	638592	1783682	RIOBAMBA	00574	C1025ABL	CAPITAL FEDERAL	ORTIZ ANGEL M	A	0
2389	E.R.A.S.	648013	302683	885-CALLE 885	04770	B1855CBF	VILLA LA FLORIDA	ANA TERESA RADOVIZTKI	A	0
2381	E.R.A.S.	657856	1451876	PRIMERA JUNTA	05305	C1440BPI	CAPITAL FEDERAL	ELIZABETH CATACORA	A	0
2376	E.R.A.S.	659880	677792	CENTENARIO URUGUAYO AV	01353	B1824CPM	LANUS ESTE	OMAR MARTIN HECTOR	A	0
2391	E.R.A.S.	661017	457823	GOYENA PEDRO	00860	B1751CJR	LA TABLADA (LMN)	BAIONA JOSE	A	0
2392	E.R.A.S.	662654	1887043	AZCUENAGA	00948	C1115AAD	CAPITAL FEDERAL	GUSTAVO DANIEL PELLICARI	A	0
2162	E.R.A.S.	663417	444044	ALBERDI JUAN BAUTISTA AV	03910	C1407GZT	CAPITAL FEDERAL	DANIEL PABLO MOLÉ	A	0

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2374	E.R.A.S.	675522	473132	IRIGOYEN BERNARDO DE	00185	B1751CLC	LA TABLADA (LMN)	MARIO VALLONE	A	0
2301	E.R.A.S.	685669	968603	TRES ARROYOS	02045	C1416DDE	CAPITAL FEDERAL	ANA SCROCCO	A	0
2349	E.R.A.S.	689551	2365666	SARMIENTO	04017	C1197AAG	CAPITAL FEDERAL	MERCEDES CORDERO	A	0
2137	E.R.A.S.	694080	1901096	CONDARCO	00402	C1406AFH	CAPITAL FEDERAL	MARIANA BEATRIZ CASTRO	A	0
2394	E.R.A.S.	702646	189440	YERBAL	02733	C1406GKI	CAPITAL FEDERAL	ROSANA ANDREA ARGAÑARAZ	A	0
2350	E.R.A.S.	706309	834323	75-ARTIGAS	00670	B1653---	0	CLAUDIA B. GUERCHUNY	A	0
2389	E.R.A.S.	707989	1855370	GAVILAN	00444	C1406BBF	CAPITAL FEDERAL	PATRICIA TERESA JULIA	A	0
2367	E.R.A.S.	717443	2102879	ALBERTI	00707	C1223AAE	CAPITAL FEDERAL	GRACIELA FELISA CARDOZO	A	0
2278	E.R.A.S.	722885	747374	HUMBERTO 1	01266	C1103ACZ	CAPITAL FEDERAL	CANDIDA CABEZAS	A	0
2384	E.R.A.S.	724567	217671	PARAGUAY	02497	C1121ABM	CAPITAL FEDERAL	THELMA R. MASCALI	A	0
2124	E.R.A.S.	726820	2138517	YATAY	00448	C1184ADH	CAPITAL FEDERAL	MIER AMALIA LIDIA	A	0
2358	E.R.A.S.	727676	228180	ARENALES	01630	C1061AAT	CAPITAL FEDERAL	DR. BENGOCHEA	A	0
2388	E.R.A.S.	728274	563002	SAAVEDRA	00322	C1083ACH	CAPITAL FEDERAL	GONZALEZC.	A	0
2390	E.R.A.S.	730217	831733	MORAN PEDRO	05249	C1419HLW	CAPITAL FEDERAL	HECTOR MACCARRONE	A	0
2334	E.R.A.S.	732922	105027	SAN LUIS	02642	C1056AAF	CAPITAL FEDERAL	MARIANO LUIS CANO Y OTRA	A	0
2358	E.R.A.S.	737175	1938704	SANTIAGO DEL ESTERO	01547	C1136ABG	CAPITAL FEDERAL	MARIA TERESA PUYAT	A	0
2402	E.R.A.S.	738480	2399286	LAS HERAS GRAL AV	03865	C1425ATC	CAPITAL FEDERAL	JORGE A. COVARO	A	0
2379	E.R.A.S.	740649	2115679	INDEPENDENCIA AV	02522	C1225AAU	CAPITAL FEDERAL	CERVIO NOEMI	A	0
2067	E.R.A.S.	746698	726993	LEONES	01496	C1408DBB	CAPITAL FEDERAL	IRENE BEATRIZ ROMERO	A	0
2323	E.R.A.S.	751152	1270803	SAN GINES MANUEL DE	01993	C1416BEA	CAPITAL FEDERAL	ANDREANO V. MANUEL	A	0
2390	E.R.A.S.	753454	652280	CALINGASTA	01817	C1407DXA	CAPITAL FEDERAL	PAOLA GRACIELA BRATE	A	0
2393	E.R.A.S.	784236	327011	ALDECOA FELIPE	00846	B1868DTH	PIÑEYRO	RIPOSATI, RUBEN RICARDO.-	A	0
2391	E.R.A.S.	788487	2233661	ACEVEDO	00240	C1414DJF	CAPITAL FEDERAL	RUBEN NOWICKY	A	0
2383	E.R.A.S.	790714	721346	FORMOSA	00573	B1824KYE	LANUS OESTE	DOMINGO VULCANO	A	0
2373	E.R.A.S.	792382	796068	BERUTTI ANTONIO LUIS	00346	B1708EXF	MORON	PICORELLI C	A	0
2400	E.R.A.S.	794656	1950057	MEXICO	02109	C1222ABG	CAPITAL FEDERAL	WALTER FABIAN GOMWEZ	A	0
2378	E.R.A.S.	797890	1078412	DE LA TORRE LISANDRO AV	00875	C1408GTQ	CAPITAL FEDERAL	LIDIA SERGI	A	0
2325	E.R.A.S.	803514	2130978	PARAGUAY	01275	C1057AAS	CAPITAL FEDERAL	EDUARDO.W NIETO CARBONEL	A	0
2356	E.R.A.S.	810647	730264	RESISTENCIA	00532	B1824LAD	LANUS OESTE	MARTA BEATRIZ UMEREZ	A	0
2262	E.R.A.S.	813590	2355206	VERA	00866	C1414AOR	CAPITAL FEDERAL	CLARA ANA MORGENSTERN	A	0
2286	E.R.A.S.	815687	1055950	LAMADRID	00674	B1832HDN	LOMAS DE ZAMORA	ALEJANDRO MEGHDESSIAN	A	0
2363	E.R.A.S.	817779	1975080	COSTA RICA	00286	B1834IWF	TEMPERLEY	AMALIA CORTESE	A	0
2375	E.R.A.S.	822691	724680	CALVO CARLOS	00632	C1102AAN	CAPITAL FEDERAL	MORALLI LYDIA ANA	A	0
2385	E.R.A.S.	836685	1264875	ROSALES LEONARDO	00654	B1846EFN	ADROGUE	GENEBRIERES JORGE AL	A	0
2387	E.R.A.S.	837799	1430267	LA BAJADA	01364	B1768GPB	LA TABLADA (LMS)	GIRARDINI JUAN	A	0
2255	E.R.A.S.	839873	1591467	CAMPOS LUIS MARIA AV	01053	C1426BOI	CAPITAL FEDERAL	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
2390	E.R.A.S.	840615	521929	PACHECO DE MELO JOSE ANDR	02465	C1425AUA	CAPITAL FEDERAL	MIRIAM GLADYS MENESCARDI	A	0
2374	E.R.A.S.	842969	827549	VALLE JUAN JOSE GRAL	00377	B1708IQG	MORON	GLADYS NOEMI SAULLO	A	0
2391	E.R.A.S.	846025	1742418	CORRALES	01841	C1437GLO	CAPITAL FEDERAL	RUBÉN ESTEBAN SANGUINETTI	A	0
2394	E.R.A.S.	847709	1868243	MEDRANO AV	01136	C1179AAV	CAPITAL FEDERAL	ERMINDA LEZCANO	A	0
2337	E.R.A.S.	851454	122807	SAN PEDRITO AV	00008	C1406EXN	CAPITAL FEDERAL	ARIEL CABALLERO	A	0
2359	E.R.A.S.	862616	901153	26-ASUNTA M	00198	B1650---	0	QUEVEDO ANA MARIA	A	0
2393	E.R.A.S.	863339	1676787	MOM	02830	C1437AKD	CAPITAL FEDERAL	FORTUNY,PERALBA Y CIA. S.R.L.	A	0
2161	E.R.A.S.	867160	1450782	CABILDO	00953	B1768CIO	LA TABLADA (LMS)	CARLOS ALBERTO PUNTI	A	0
2359	E.R.A.S.	869206	433643	413-REPUBLICA DE CUBA	01207	B1882FAY	EZPELETA ESTE	JULIA Y OTRO LOPEZ TERCEROS	A	0
2357	E.R.A.S.	869791	904959	93-GOMEZ V	00584	B1672AEB	VILLA LYNCH	EUGENIO SEMENTSOV	A	0
2364	E.R.A.S.	882044	438247	334-ANDRADE (Q)	03011	B1879---	0	CARLOS BARTOLOME	A	0
2382	E.R.A.S.	889339	127230	FRAY CAYETANO RODRIGUEZ	00041	C1406AVA	CAPITAL FEDERAL	HORACIO BATAGLIOTTO	A	0
2154	E.R.A.S.	892391	1611328	ATUEL	00492	C1437EPF	CAPITAL FEDERAL	MARIO EDUARDO DRAGONETTI	A	0
2316	E.R.A.S.	895868	2110033	LA PLATA AV	00360	C1235ABN	CAPITAL FEDERAL	MARINA B. PALLOTTI	A	0
2353	E.R.A.S.	897102	1423473	JUSTO JUAN B AV	07638	C1407FBO	CAPITAL FEDERAL	CLAUDIA PATRI MARIN	A	0
2394	E.R.A.S.	900635	1473576	9 DE JULIO	00492	B1842GDJ	MONTE GRANDE	GRACIELA BEATRIZ VILLAGRA	A	0
2373	E.R.A.S.	919326	1436848	JUNCAL (T)	01176	B1648FFD	TIGRE	DALLIA TORRE LUIS E-	A	0
2375	E.R.A.S.	922264	2262907	YERBAL	00533	C1405CDK	CAPITAL FEDERAL	CAGIANO I A	A	0
2374	E.R.A.S.	923124	2039413	VIAMONTE	02440	C1056ABN	CAPITAL FEDERAL	COLELLA LUIS MARIO	A	0
2399	E.R.A.S.	927595	1694842	ELIA	01357	C1437---	0	LUIS LORENZO ALCON TAPIA	A	0
2358	E.R.A.S.	932302	1514946	MORENO JOSE MARIA AV	00140	C1424AAO	CAPITAL FEDERAL	MARIANA CARLA LARRONDO	A	0
2386	E.R.A.S.	932324	2155137	RODRIGUEZ PEÑA	02048	C1021ABR	CAPITAL FEDERAL	ALEJANDRA CLARA PEMBERTON	A	0
2383	E.R.A.S.	940344	385305	CORREA	03623	C1430CLG	CAPITAL FEDERAL	CASTAÑO ANDRES (CASA 315)	A	0
2388	E.R.A.S.	949124	1527833	DE LA VEGA VENTURA	03831	C1437HPE	CAPITAL FEDERAL	LOPEZ MIGUEL ANGEL	A	0
2374	E.R.A.S.	949709	1662427	CHARCAS	03377	C1425BMQ	CAPITAL FEDERAL	ADRIANA NOEMI TCACH	A	0
2310	E.R.A.S.	953947	1196044	CORVALAN	02671	C1439EWE	CAPITAL FEDERAL	LAGO	A	0
2381	E.R.A.S.	960454	1702147	RIO CUARTO	04476	C1437HZD	CAPITAL FEDERAL	DE PEDRO FERNANDO EN	A	0
2367	E.R.A.S.	960509	828975	GROUSSAC PAUL	05772	C1408CVJ	CAPITAL FEDERAL	PAMELA INES MARTINEZ	A	0
2364	E.R.A.S.	963067	1863363	URIBURU JOSE EVARISTO PRES	00338	C1027AAH	CAPITAL FEDERAL	ANA MARIA FERNANDEZ	A	0
2398	E.R.A.S.	966862	1526364	CONSTITUCION	01754	B1646CYJ	SAN FERNANDO	TERESA CARMEN PELLICCIOTTA	A	0
2373	E.R.A.S.	969373	1050876	CEVALLOS VIRREY	00646	C1077AAN	CAPITAL FEDERAL	JUANA ANGELICA SOLIS	A	0
2311	E.R.A.S.	970504	473098	LADINES	03175	C1419EYO	CAPITAL FEDERAL	ADMINISTRACION DE CONSORCIO	A	0
2373	E.R.A.S.	976710	477480	MARTI JOSE	00452	C1406FBJ	CAPITAL FEDERAL	SANDRA AIDA RADAVIS	A	0
2368	E.R.A.S.	984286	2136291	BRASIL AV	00646	C1154AAJ	CAPITAL FEDERAL	TERESA AGUILAR YATO	A	0
2366	E.R.A.S.	985415	1247651	ITUZAINGO	00763	C1272AFA	CAPITAL FEDERAL	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.	A	0
2383	E.R.A.S.	986398	805102	ARENAL CONCEPCION PJE	02175	B1826GVC	LANUS ESTE	BEATRIZ RAMONA RINALDI	A	0
2397	E.R.A.S.	993815	1527267	PINTOS GRAL	02140	B1768BVB	VILLA CELINA	JOSE BLANCO	A	0
2308	E.R.A.S.	994883	1534553	LINIERS	01009	B1838AOA	LUIS GUILLON	MIGUEL ANGEL CABRERA	A	0
2394	E.R.A.S.	995118	1442907	FINOCHIETTO ENRIQUE DR	01749	C1275AAK	CAPITAL FEDERAL	LANARI JUAN JOSE	A	0
2398	E.R.A.S.	998876	1353524	MURATURE JOSE	01733	B1846ETY	ADROGUE	ENRIQUE FISCHER	A	0
2384	E.R.A.S.	1007902	411970	25 DE MAYO	00330	B1870BZH	AVELLANEDA	ESTELA R. PEREZ	A	0
2360	E.R.A.S.	1014288	2228579	ACOYTE AV	01316	C1414BZF	CAPITAL FEDERAL	ABAD MARIA DOLORES	A	0
2368	E.R.A.S.	1014753	1265345	LUJAN PEDRO DE	02180	C1294ABD	CAPITAL FEDERAL	MARÍA ESTHER CORREA FIGUEROA	A	0
2374	E.R.A.S.	1016678	1458002	CASTRO EMILIO AV	06890	C1408IGS	CAPITAL FEDERAL	ESTELA B. COLL	A	0
2376	E.R.A.S.	1018206	1548864	AMEGHINO FLORENTINO	01429	B1838AEI	LUIS GUILLON	ALICIA C. GHIBAUDI	A	0
2315	E.R.A.S.	1034519	978977	LIMA	01861	C1138ACM	CAPITAL FEDERAL	SILVIA BEATRIZ LUIS	A	0
2157	E.R.A.S.	1036509	2026298	DAVILA	00966	C1406DEH	CAPITAL FEDERAL	JOSE MARIA BLANCO	A	0
2376	E.R.A.S.	1036802	480049	GONZALEZ JOAQUIN V	00533	C1407CZI	CAPITAL FEDERAL	SONIA O. SCHNEIDER	A	0
2133	E.R.A.S.	1041617	416311	GOMEZ VALENTIN	02888	C1191AAB	CAPITAL FEDERAL	ANA MARIA BARBAGALLO	A	0
2395	E.R.A.S.	1041618	943623	SAN LUIS	00991	B1708JUE	MORON	VALLEJOS ANA M M DE	A	0
2380	E.R.A.S.	1049779	948728	ROLDAN BELISARIO	02056	B1685BOB	EL PALOMAR (M)	JORGE RUBÉN BASTIAS	A	0
2391	E.R.A.S.	1052086	1520990	MENDOZA (T)	01702	B1648GHJ	TIGRE	MACIEL JUAN J	A	0
2376	E.R.A.S.	1061998	1094821	SUDAMERICA	01934	B1676ASL	SANTOS LUGARES	TERESITA MABEL PAPALE	A	0
2399	E.R.A.S.	1062314	1576212	BUENOS AIRES BLVD	02010	B1838AHX	LUIS GUILLON	KALAPUJ VICTOR	A	0
2373	E.R.A.S.	1065546	434621	PERU	01425	B1868CZC	PIÑEYRO	CASSORATTI GIMENEZ FLORIS DEOL	A	0
2367	E.R.A.S.	1071802	2219544	RAMIREZ DE VELAZCO JUAN	00739	C1414AQO	CAPITAL FEDERAL	AMANDA ALEMIAN	A	0
2392	E.R.A.S.	1071844	2047282	URIBURU JOSE EVARISTO PRES	00526	C1027AAL	CAPITAL FEDERAL	ARRIETA HILDA HORTENSIA	A	0
2399	E.R.A.S.	1082748	1232065	ARAOZ DE LAMADRID G GRAL	00561	C1166AAI	CAPITAL FEDERAL	CARFI DE CATALDO LORENZA	A	0
2396	E.R.A.S.	1089336	1285454	CALIFORNIA	00671	C1168AAA	CAPITAL FEDERAL	LUIS ANGEL SIFFREDI	A	0
2396	E.R.A.S.	1089773	1189341	GROTE FEDERICO PADRE	00790	C1167ADD	CAPITAL FEDERAL	GUELFO OMAR	A	0
2374	E.R.A.S.	1089787	1304504	GARIBALDI	01878	C1167ACL	CAPITAL FEDERAL	DOMINGO NARIZZANO	A	0
2377	E.R.A.S.	1090002	1322138	CARBONARI FRANCISCO COMTE	01705	C1168ACC	CAPITAL FEDERAL	ROQUE ANASTASIO	A	0

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2055	E.R.A.S.	1090468	1976518	2 DE ABRIL DE 1982	06789	C1439HWG	CAPITAL FEDERAL	GARCIA J.	A	0
2400	E.R.A.S.	1091916	2407233	FRIAS EUSTAQUIO TTE GRAL	00132	C1414DVD	CAPITAL FEDERAL	GERALDINE ELIZABET BERELEJIS	A	0
2387	E.R.A.S.	1095112	715682	LEOPARDI	00027	C1407IDA	CAPITAL FEDERAL	EDUARDO ALBERTO ESTRADA	A	0
2124	E.R.A.S.	1108475	2346307	DOBLAS	00241	C1424BLC	CAPITAL FEDERAL	ALICIA EVA MANAGO	A	0
2256	E.R.A.S.	1109001	1978641	MONTIEL	03974	C1439HEH	CAPITAL FEDERAL	GERONIA CONSUELO BOZO LOPEZ	A	0
2336	E.R.A.S.	1115094	986779	MAIPU AV	00311	B1638AAD	VICENTE LOPEZ	EDUARDO VICTOR ANTMANN	A	0
2367	E.R.A.S.	1118744	1981353	MONTIEL	03884	C1439HEF	CAPITAL FEDERAL	SILVIA AMELIA CASADO	A	0
2402	E.R.A.S.	1133634	1137951	POLO MARCO	05357	B1678DKU	CASEROS	MARIA LUZ TOLENTINO	A	0
2375	E.R.A.S.	1137912	1441561	KING JUAN	00577	B1845AVK	JOSE MARMOL	FRANCISCO OSCAR BIANCO	A	0
2388	E.R.A.S.	1138267	1610420	CAAGUAZU	00683	B1768AXC	LA TABLADA (LMS)	POGGIO ANGEL	A	0
2380	E.R.A.S.	1138916	1629397	LIBERTAD	03536	B1644DHN	VICTORIA	CARLOS HANACSEK	A	0
2356	E.R.A.S.	1143659	1145861	CHACABUCO	00474	B1702FJJ	CIUDADELA	PONPONIO SUC	A	0
2389	E.R.A.S.	1144343	1146182	9 DE JULIO	00445	B1702FNI	CIUDADELA	MANUEL MEDINA	A	0
2358	E.R.A.S.	1144625	1447304	JORGE	03346	B1845DAP	RAFAEL CALZADA	BLANCO PEDRO JOSE	A	0
2373	E.R.A.S.	1150318	1150062	FRAY JUSTO SANTAMARIA DE O	05473	B1678DHC	CASEROS	CARLOS ALAGASTINO	A	0
2397	E.R.A.S.	1155624	2265259	BERTRES	00321	C1424AKC	CAPITAL FEDERAL	ANA MARIA SOLARI	A	0
2338	E.R.A.S.	1159873	2129673	GASCON	00619	C1181ACK	CAPITAL FEDERAL	JULIA JUSTINA FRIAS	A	0
2366	E.R.A.S.	1166474	1461881	OLIDEN	01723	C1440CQI	CAPITAL FEDERAL	MARIA J .H. PZOVIEIRO	A	0
2374	E.R.A.S.	1167118	596834	GANA	00182	C1408BNB	CAPITAL FEDERAL	DELFINA LOPEZ	A	0
2381	E.R.A.S.	1172175	1639554	VARISCO JUAN A	01756	B1838AXP	LUIS GUILLON	FUENTES LOPEZ MANUEL	A	0
2382	E.R.A.S.	1176152	1603144	GARIBALDI	01612	B1624EGR	TIGRE	MARCELA BIBIANA PESOA	A	0
2376	E.R.A.S.	1177875	907509	CAVOUR CAMILO V	03965	B1826ECE	REMEDIOS DE ESC/	PILAR VICTORIA CASTRO	A	0
2402	E.R.A.S.	1179548	1705584	COLMO ALFREDO	03948	C1437HRF	CAPITAL FEDERAL	ROSALIA TORO ESCALERA	A	0
2363	E.R.A.S.	1192484	2056630	QUITO	04080	C1212ABJ	CAPITAL FEDERAL	ANDREA L. SIMON	A	0
2386	E.R.A.S.	1193712	918897	RIO DE JANEIRO	02124	B1824DLV	LANUS OESTE	OSVALDO SCIPIONI	A	0
2336	E.R.A.S.	1198749	2087028	BOCAYUVA QUINTINO	00752	C1216AAF	CAPITAL FEDERAL	CELIA B. NUCARA	A	0
2402	E.R.A.S.	1209526	2238141	TROILO ANIBAL	00913	C1197ABA	CAPITAL FEDERAL	NICOLAS PERRONE	A	0
2402	E.R.A.S.	1209926	1004100	SANTIAGO DEL ESTERO	00539	C1075AAK	CAPITAL FEDERAL	SANCHEZ LEONOR	A	0
2401	E.R.A.S.	1213549	1044464	ATAHUALPA	01413	B1685BXI	EL PALOMAR (M)	TRIAS KLIMACO	A	0
2359	E.R.A.S.	1214450	1467467	CASEROS AV	01358	C1152AAW	CAPITAL FEDERAL	REY BUSZKO ALEJANDRO	A	0
2360	E.R.A.S.	1221236	505047	PIRAN GRAL	01354	B1875FTH	WILDE	TERESA DELLAGIOVANNA	A	0
2393	E.R.A.S.	1223935	1656977	CIRC 2 SECC 1 MANZ 7 CASA	00004	B1778---	0	ASPEE MARTIN F	A	0
2400	E.R.A.S.	1236649	512504	GUTIERREZ RICARDO	00836	B1871EFL	DOCK SUD	MUGURUZA TINEO MARITZA ISABEL	A	0
2334	E.R.A.S.	1244700	1463526	USPALLATA	02664	C1437JCB	CAPITAL FEDERAL	IRMA NOEMI MARIA	A	0
2351	E.R.A.S.	1246747	1082983	FRENCH	02967	C1425AWI	CAPITAL FEDERAL	PAULA ADRIANA LESCA	A	0
2400	E.R.A.S.	1247033	1068922	YATAY	00446	B1708JHH	MORON	GLORIA SUSANA GERVASI	A	0
2395	E.R.A.S.	1247485	1075862	PACHECO DE MELO JOSE ANDR	02750	C1425AUH	CAPITAL FEDERAL	SARA RUT NOEMI ZAIDNER	A	0
2358	E.R.A.S.	1253203	1302164	MITRE ING	00782	B1834BNP	TEMPERLEY	MARCELO GABRIEL MARTIN	A	0
2383	E.R.A.S.	1255311	1077604	FRANKLIN BENJAMIN	01780	B1604AYR	FLORIDA OESTE	LEOCADIA PEREZ	A	0
2389	E.R.A.S.	1262049	523446	OCANTOS MANUEL	00288	B1873BGF	AVELLANEDA	MARÍA SOLEDAD RAMOS	A	0
2394	E.R.A.S.	1263188	1228115	SOLIS	00647	B1702DKA	CIUDADELA	GUILLERMO H Y S FERREYRA	A	0
2376	E.R.A.S.	1264649	587657	855-CALLE 855	02126	B1881CQD	SAN FRANCISCO SC	JUAN C SANCHEZ	A	0
2331	E.R.A.S.	1267443	2295685	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV	00582	C1414DNS	CAPITAL FEDERAL	EVA CHICHOTKY	A	0
2392	E.R.A.S.	1271645	1320816	LEGUIZAMON MARTINIANO	03264	C1439FRH	CAPITAL FEDERAL	AURORA SANCHEZ	A	0
2393	E.R.A.S.	1278587	90008	CASTAÑARES AV	04897	C1439AKG	CAPITAL FEDERAL	RAMONA ESTHER SANCHEZ	A	0
2392	E.R.A.S.	1283475	1806113	AYACUCHO	00563	C1026AAC	CAPITAL FEDERAL	MARTA GRACIELA SANGIORGIO	A	0
2355	E.R.A.S.	1283611	964328	ARANGUREN JUAN FELIPE DR	02302	C1406FWR	CAPITAL FEDERAL	MARIA LEDER	A	0
2338	E.R.A.S.	1286158	2207363	VERA	00178	C1414AOD	CAPITAL FEDERAL	JUAN BEKERMAN	A	0
2252	E.R.A.S.	1291255	1214262	MONTES DE OCA MANUEL AV	00715	C1270AAH	CAPITAL FEDERAL	MURPHY GUILLERMO,F	A	0
2376	E.R.A.S.	1291395	1249672	PERIN CNEL	03860	B1702CZF	CIUDADELA	MIRIAM ROLDÁN	A	0
2315	E.R.A.S.	1293126	94279	CASTAÑARES AV	04595	C1439AKD	CAPITAL FEDERAL	ANTONIO IGNACIO BAMONTE	A	0
2389	E.R.A.S.	1296514	1838699	RODO JOSE E	04226	C1407HDL	CAPITAL FEDERAL	GUILLERMO ALBERTO GOMEZ	A	0
2401	E.R.A.S.	1301057	1148517	148-MAR DEL PLATA	03648	B1653NND	VILLA BALLESTER	PABLO ESTEBAN ROBLES	A	0
2370	E.R.A.S.	1301686	1257645	FRAY CAYETANO RODRIGUEZ	02477	B1703AXG	JOSE INGENIEROS	CUTRONES SANTOS Y JU	A	0
2368	E.R.A.S.	1303616	99468	DELLEPIANE LUIS JOSE TTE GR	04540	C1439DZP	CAPITAL FEDERAL	HUGO ALBERTO BIRMAN	A	0
2381	E.R.A.S.	1305716	1150890	188-LETZINA	02123	B1655BAC	JOSE LEON SUAREZ	CARLOS ALBERTO GELHORN	A	0
2357	E.R.A.S.	1310559	997490	LYNCH CNEL AV	02573	B1825FMM	MONTE CHINGOLO	JOSE LUIS LUGO	A	0
2331	E.R.A.S.	1318607	1266121	LAFUENTE AV	01550	C1406EUR	CAPITAL FEDERAL	ANA MARIA DURAN BELLOT	A	0
2402	E.R.A.S.	1319275	1934341	BONORINO ESTEBAN CNEL AV	02230	C1437---	0	GABRIELA NATALIA MORRA	A	0
2367	E.R.A.S.	1319382	47586	SARMIENTO	01727	C1042ABG	CAPITAL FEDERAL	LUIS ANTONIO ANCE PEREZ	A	0
2386	E.R.A.S.	1322966	552345	OBLIGADO PASTOR	00022	B1873BVB	AVELLANEDA	ALFONSO M. DEL CARMEN	A	0
2375	E.R.A.S.	1323270	2321415	PUJOL	01495	C1416CIG	CAPITAL FEDERAL	ADRIANA LUCRECIA IMIZCOZ	A	0
2353	E.R.A.S.	1323500	1585688	HERNANDEZ JOSE	01521	B1852BZG	BURZACO	LA CANDIA MIGUEL ANGEL	A	0
2352	E.R.A.S.	1340727	1133355	MEJICO	04342	B1603AEZ	VILLA MARTELLI	AMANI S.A.	A	0
2359	E.R.A.S.	1344255	2356823	ALBERDI JUAN BAUTISTA AV	01449	C1406GRD	CAPITAL FEDERAL	LAILA ALMIRON QUIROGA	A	0
2355	E.R.A.S.	1345681	1413286	ALBERDI JUAN BAUTISTA AV	05000	C1440AAN	CAPITAL FEDERAL	JUANA CHALUKI GORAYEB	A	0
2357	E.R.A.S.	1352208	2069925	PIEDRABUENA AV	03841	C1439GVH	CAPITAL FEDERAL	MARCELA Y KARINA BRAMBILLA	A	0
2395	E.R.A.S.	1352689	2361783	HIDALGO	01737	C1414CAQ	CAPITAL FEDERAL	CESPEDES RICARDO	A	0
2384	E.R.A.S.	1355270	1762522	SAAVEDRA	02461	B1645BGK	VIRREYES	GIMENEZ ROBERTO O.	A	0
2379	E.R.A.S.	1356270	1147354	GUARANI	01336	B1685BJN	EL PALOMAR (M)	GREGORIO YEDRO	A	0
2388	E.R.A.S.	1366802	1308872	WHITE	01137	C1407IIW	CAPITAL FEDERAL	ALFREDO CARVALLO	A	0
2370	E.R.A.S.	1367173	1148453	ALVAREZ AGUSTIN	03295	B1603DJC	VILLA MARTELLI	ZULEMA ANA ZENI Y OTRO	A	0
2401	E.R.A.S.	1370013	776057	INGENIEROS JOSE	05520	B1766EXX	LA TABLADA (LMN)	SANDRA ELENA MONTERO	A	0
2369	E.R.A.S.	1370729	919242	ESTADOS UNIDOS	03553	C1228ABK	CAPITAL FEDERAL	RAMON NAVARRO	A	0
2402	E.R.A.S.	1372439	1746458	MONOBLOCK	00047	B1772---	0	QUIROGA SIXTA	A	0
2376	E.R.A.S.	1372548	1773917	PASTEUR	04365	B1645DIQ	VIRREYES	ROSARIO CASIMIRO CABANA	A	0
2380	E.R.A.S.	1376403	666503	DIAZ VELEZ AV	03712	C1200AAR	CAPITAL FEDERAL	NANCY R. FLORES OYOS	A	0
2377	E.R.A.S.	1393736	1327229	ROCHA DARDO	00979	B1703ALA	JOSE INGENIEROS	BARBARICH WALTER	A	0
2381	E.R.A.S.	1393889	1393525	ISLANDIA	00668	B1821CAR	VILLA FIORITO	FATIMA LAURA DEL VALLE	A	0
2355	E.R.A.S.	1395327	1060123	SOLIS	00338	C1078AAH	CAPITAL FEDERAL	CAFICI FERNANDO R.	A	0
2339	E.R.A.S.	1395603	1524561	LIBERTAD	01154	C1012AAX	CAPITAL FEDERAL	OSVALDO OSCAR FERRETTI	A	0
2388	E.R.A.S.	1401601	1765435	RIO SANTIAGO	00474	B1772---	0	SAAVEDRA TELISFORO	A	0
2373	E.R.A.S.	1407135	98045	LAVALLE	02120	C1051ABH	CAPITAL FEDERAL	MATAMOROS MENDOZA	A	0
2315	E.R.A.S.	1412182	1862648	URIBURU JOSE EVARISTO PRES	00264	C1027AAF	CAPITAL FEDERAL	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
2386	E.R.A.S.	1437423	810657	CRISTIANIA (LMN)	02318	B1765HNP	ISIDRO CASANOVA	DAMIAN ESTEBAN TESORO	A	0
2347	E.R.A.S.	1443404	2244264	ALVAREZ JULIAN	00712	C1414DRP	CAPITAL FEDERAL	LUIS ALBERTO ARAGUNDE	A	0
2392	E.R.A.S.	1444502	1641215	GUARANI	00630	C1437EBN	CAPITAL FEDERAL	ATHINA KOKINIS	A	0
2395	E.R.A.S.	1445442	2108401	GUEMES	04144	C1425BKZ	CAPITAL FEDERAL	COBAS M.D.O.I.H.	A	0
2325	E.R.A.S.	1448066	605441	ALBERDI JUAN BAUTISTA	00041	B1873BMA	AVELLANEDA	SARA DEL CARMEN OSORIO RIQUELME	A	0
2367	E.R.A.S.	1450345	2191019	BRASIL AV	00901	C1154AAO	CAPITAL FEDERAL	SILVIA LEONOR FACTUN	A	0
2280	E.R.A.S.	1456717	2085450	BO GRAL SAVIO	05491	C0000---	0	LILIANA ESTHER GOMOLLON	A	0
2387	E.R.A.S.	1466625	612122	SANTIAGO DEL ESTERO	02068	B1868DFN	PIÑEYRO	JULIO LUIS OCON	A	0
2363	E.R.A.S.	1470495	2071682	VILLEGAS CONRADO GRAL	05402	C1439CYB	CAPITAL FEDERAL	DOLORES G CAMARA	A	0
2381	E.R.A.S.	1472687	830630	ESTOCOLMO	02021	B1765JIG	ISIDRO CASANOVA	EDGARDO VICTOR BELLA Y OTROS	A	0
2354	E.R.A.S.	1472750	2232995	INCLAN	04230	C1258ABN	CAPITAL FEDERAL	ESTUARDO ALONSO MANCILLA CORTEZ	A	0
2393	E.R.A.S.	1473122	2233418	INCLAN	04230	C1258ABN	CAPITAL FEDERAL	ALEJANDRA MARCELA ARCE	A	0
2396	E.R.A.S.	1487502	329773	TERRERO	00934	C1406BKR	CAPITAL FEDERAL	ALEJANDRA PATRICIA GODOY	A	0
2383	E.R.A.S.	1497750	2154437	RIVADAVIA AV	04320	C1205AAQ	CAPITAL FEDERAL	ITATI LILIANA BERTONI	A	0

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2358	E.R.A.S.	1502539	2255365	LAS CASAS	04146	C1238ACP	CAPITAL FEDERAL	GUILLERMO LEOPOLDO GUIDOBONO	A	0
2359	E.R.A.S.	1503384	2252727	PERON EVA AV	01597	C1406HMD	CAPITAL FEDERAL	RAMON BLANCHE	A	0
2259	E.R.A.S.	1518748	1428832	BONIFACINI	05284	B1678CZR	CASEROS	JOSE BRADASCHIA	A	0
2383	E.R.A.S.	1520990	1430476	AREVALO	02038	B1678IBD	CASEROS	DINA ELIZABETH FISAS	A	0
2380	E.R.A.S.	1523739	1847341	TUYUTI	01099	B1770AWC	TAPIALES	LAPELOSA J Y OTROS	A	0
2359	E.R.A.S.	1527499	1670221	ATUEL	00659	C1437EPI	CAPITAL FEDERAL	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
2384	E.R.A.S.	1531292	173766	FALCON RAMON L CNEL	02099	C1406GNO	CAPITAL FEDERAL	IRMA ELVIRA KRACHLER	A	0
2380	E.R.A.S.	1535339	461013	PAGANO JOSE LEON	2663	C1425AOA	CAPITAL FEDERAL	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	A	0
2346	E.R.A.S.	1536546	1791022	20 DE SETIEMBRE	00230	C1155ABB	CAPITAL FEDERAL	GUMERSINDA NETO	A	0
2395	E.R.A.S.	1543379	1858355	HUMAHUACA	00417	B1770AMI	TAPIALES	RODRIGUEZ M	A	0
2385	E.R.A.S.	1554819	1601003	MALVINAS ARGENTINAS	00096	C1406CXB	CAPITAL FEDERAL	NICOLAS MARTIN DOMINGUEZ	A	0
2395	E.R.A.S.	1555342	2032768	TUCUMAN	01724	C1050AAJ	CAPITAL FEDERAL	JORGE JUAN GORINI	A	0
2368	E.R.A.S.	1557349	1176978	ARAOZ DE LAMADRID G GRAL	00546	C1166AAJ	CAPITAL FEDERAL	GUERRA VICTOR E.	A	0
2374	E.R.A.S.	1566927	1837840	GUISE	01926	C1425DPH	CAPITAL FEDERAL	MARCELA FRIAS	A	0
2303	E.R.A.S.	1573634	2095364	CORRIENTES AV	01242	C1043AAZ	CAPITAL FEDERAL	CAMELINO MARIA ALEJANDRA	A	0
2285	E.R.A.S.	1585027	1547635	SANCHEZ DE BUSTAMANTE	01969	C1425DUM	CAPITAL FEDERAL	ILEANA LAVIN	A	0
2289	E.R.A.S.	1586130	816660	AGRELO	03625	C1224ABK	CAPITAL FEDERAL	LORENA VERONICA MORENO	A	0
2387	E.R.A.S.	1595876	1875815	AROZARENA (AB)	00981	B1785ARI	ALDO BONZI	LEONARDO DANIEL GASCON	A	0
2356	E.R.A.S.	1596069	1159325	CORRIENTES AV	02783	C1046AAF	CAPITAL FEDERAL	RAUL OSVALDO RABINOVICH	A	0
2396	E.R.A.S.	1604392	1481421	FRAY MAMERTO ESQUIU	04293	B1678DAA	CASEROS	SABRINA SOLEDAD FERNANDEZ	A	0
2380	E.R.A.S.	1608986	1371467	SANTIAGO DEL ESTERO	00835	B1640HKS	MARTINEZ	AGUSTIN SEBASTIÁN TAPIA	A	0
2402	E.R.A.S.	1609818	1485507	VARELA FLORENCIO	02773	B1678DZC	CASEROS	NORMA MARIA RODRIGUEZ	A	0
2395	E.R.A.S.	1620530	1888186	AYACUCHO	00823	B1785CEA	ALDO BONZI	CHERIL ANTELO CASTEDO	A	0
2371	E.R.A.S.	1620840	1495164	CANO	03287	B1678HXA	CASEROS	VILELA CARLOS	A	0
2396	E.R.A.S.	1624772	1349486	86-GUIDO SPANO	05836	B1650DUH	SAN MARTIN	LUME JUAN MARIO	A	0
2379	E.R.A.S.	1629433	2205140	ALVEAR MARCELO T DE	01467	C1060AAA	CAPITAL FEDERAL	SCLAR FELIPE	A	0
2378	E.R.A.S.	1637996	1509849	TRES LOMAS	00538	B1702EVB	CIUDADELA	JOSE ALBERTO MORALEJO	A	0
2388	E.R.A.S.	1653641	2226490	GALICIA	01042	C1416DGL	CAPITAL FEDERAL	AMADO GONZALEZ CASTRO	A	0
2382	E.R.A.S.	1658470	1387500	CONESA	00706	B1706DXF	HAEDO	NILDA BEATRIZ LESCANO	A	0
2368	E.R.A.S.	1668336	1246646	OSORIO CNEL	01499	B1822DOI	VALENTIN ALSINA	EDIF N 4 LIMONGI EST	A	0
2317	E.R.A.S.	1669724	1247703	OSORIO CNEL	01499	B1822DOI	VALENTIN ALSINA	EDIF N 10 MITRE PEDRO	A	0
2065	E.R.A.S.	1673908	181382	CORDOBA AV	01638	C1055AAT	CAPITAL FEDERAL	ZERDEZKY OLGA.	A	0
2284	E.R.A.S.	1676874	723061	BRANDSEN CNEL	06051	B1875ADI	WILDE	P. DIEGO VITTORI	A	0
2374	E.R.A.S.	1681984	1391641	139-LAS ROSAS	06878	B1655DPB	LOMA HERMOSA (SI	SANDRA KARINA LABONIO	A	0
2391	E.R.A.S.	1684073	1629254	ALMAFUERTE AV	00834	C1437JLV	CAPITAL FEDERAL	GUMERSINDA PAVON	A	0
2384	E.R.A.S.	1687682	2396178	ANCHORENA TOMAS MANUEL D	01684	C1425ELL	CAPITAL FEDERAL	BURGOS CORTEZ E N	A	0
2355	E.R.A.S.	1694992	159563	BACACAY	02449	C1406GDQ	CAPITAL FEDERAL	MONICA MARTINEZ	A	0
2367	E.R.A.S.	1695254	2281160	INDEPENDENCIA AV	03928	C1226AAR	CAPITAL FEDERAL	ROSANA DILLON	A	0
2388	E.R.A.S.	1708050	1388269	DARIO RUBEN	04851	B1605ALA	MUNRO	ANGELICA LOMBI	A	0
2327	E.R.A.S.	1708921	1565739	LINARES GABRIEL	05120	B1678CCP	CASEROS	JUAN CARLOS ANDRADA	A	0
2285	E.R.A.S.	1710636	1174714	LEOPARDI	00161	C1407IDC	CAPITAL FEDERAL	JORGE ALEJANDRO CUPI	A	0
2390	E.R.A.S.	1713730	809977	DE MAYO AV	00748	C1084AAP	CAPITAL FEDERAL	JUAN B.VARGAS PEREZ	A	0
2387	E.R.A.S.	1715495	1571164	MARTIN FIERRO	06481	B1682ALO	VILLA BOSCH	PENACHINO PEDRO	A	0
2367	E.R.A.S.	1719727	2280485	CORDOBA AV	05215	C1414BAK	CAPITAL FEDERAL	MARIA ELECTRA CORBO	A	0
2397	E.R.A.S.	1722312	2310814	RINCON	01078	C1227ACL	CAPITAL FEDERAL	FABIANA EDITH RODRIGUEZ	A	0
2385	E.R.A.S.	1722734	1666629	CANE MIGUEL	01010	B1832---	0	ANA N. PROZAPAS	A	0
2125	E.R.A.S.	1724527	1577941	HORNOS GRAL (659)	03729	B1678HQA	CASEROS	FIDEL MARRONE	A	0
2389	E.R.A.S.	1729791	157284	VIAMONTE	02207	C1056ABI	CAPITAL FEDERAL	JUAN PABLO TOMAS GRASSI	A	0
2389	E.R.A.S.	1738639	751407	HERRERA	00066	B1872EAB	VILLA DOMINICO	LAURA INES CANOSA	A	0
2360	E.R.A.S.	1745688	754959	CHASCOMUS	00031	B1874DTA	VILLA DOMINICO	E GNECCO Y OTRO	A	0
2326	E.R.A.S.	1749102	1006253	LA PAZ	04776	B1753EHJ	VILLA LUZURIAGA	NOCENTINI,BRUNO	A	0
2270	E.R.A.S.	1752081	2265466	AMBROSETTI JUAN B	00274	C1405BIB	CAPITAL FEDERAL	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
2382	E.R.A.S.	1757459	1466190	MORENO JOSE MARIA DR	01169	B1706CRU	HAEDO	DUBLO, GONZALO FEDERICO	A	0
2374	E.R.A.S.	1758453	1440828	SANTA MARIA DEL BUEN AIRE	00624	C1277ADH	CAPITAL FEDERAL	JORGE ENRIQUE VELASCO CHIRINOS	A	0
2391	E.R.A.S.	1759184	2101085	ALVEAR MARCELO T DE	02486	C1122AAN	CAPITAL FEDERAL	JOHNSON	A	0
2359	E.R.A.S.	1762870	1611012	AZCUENAGA	04317	B1678BEQ	CASEROS	GABRIELA MERINO	A	0
2282	E.R.A.S.	1766872	2327047	GODOY CRUZ	01233	C1414CYA	CAPITAL FEDERAL	MARIA DEL CARMEN SCOZZARI	A	0
2366	E.R.A.S.	1769382	1070248	SOLIS	00766	C1078AAP	CAPITAL FEDERAL	SUAREZ AMALIA ADELA	A	0
2375	E.R.A.S.	1781017	773106	POSADAS	00055	B1874DHA	VILLA DOMINICO	JOSE MARIA CABEIRO	A	0
2380	E.R.A.S.	1787782	2406988	VIALE LUIS	00170	C1414ECD	CAPITAL FEDERAL	IRMA GRISELDA ROSEMBERG	A	0
2358	E.R.A.S.	1796408	336265	GONZALEZ JOAQUIN V	00406	C1407CZH	CAPITAL FEDERAL	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
2355	E.R.A.S.	1796614	1938310	ROOSEVELT FRANKLIN D	05555	C1431BZO	CAPITAL FEDERAL	MARCELO FABIAN GALLIPOLI	A	0
2381	E.R.A.S.	1802492	1466934	FLEMING ALEXANDER	02319	B1605DCC	MUNRO	MARIA E. CEBALLOS	A	0
2161	E.R.A.S.	1805025	1505767	ARTIGAS JOSE GERVASIO GRAL	00683	B1714NAM	ITUZAINGO	MORAN NORMA	A	0
2386	E.R.A.S.	1805976	519065	DARWIN	00651	C1414CUM	CAPITAL FEDERAL	JAIDAR JUAN	A	0
2386	E.R.A.S.	1808467	2283314	CHACABUCO	01489	C1140AAE	CAPITAL FEDERAL	JUAN JOSE BIARDO	A	0
2312	E.R.A.S.	1809280	1378121	MONTES DE OCA MANUEL AV	01230	C1270AAZ	CAPITAL FEDERAL	MAURICIO JAVIER ALFATO RIOS	A	0
2358	E.R.A.S.	1814686	1058521	SOLIS	00232	C1078AAF	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION COMPACIONISTA	A	0
2356	E.R.A.S.	1821295	275922	DIAZ CNEL AV	02089	C1425DQG	CAPITAL FEDERAL	ROGGER ANTONIO BAGU	A	0
2396	E.R.A.S.	1825742	1526171	RIO NEGRO	01797	B1685DBA	EL PALOMAR (M)	FRANCISCO ALBERTO BATTAGLIA	A	0
2302	E.R.A.S.	1827683	1669142	IRIBARREN R	03165	B1678INK	CASEROS	NODAR LUIS	A	0
2374	E.R.A.S.	1828809	1327324	DE JOVELLANOS GASPAR MELC	01661	C1269ACO	CAPITAL FEDERAL	AMELIA MARIANA VILELA	A	0
2312	E.R.A.S.	1834597	342584	BACACAY	03864	C1407EDL	CAPITAL FEDERAL	ANTONIO REY	A	0
2379	E.R.A.S.	1835045	1917774	SEGUI JUAN FRANCISCO	03511	C1425ACA	CAPITAL FEDERAL	MAC CULLOCH DE	A	0
2125	E.R.A.S.	1835858	1536310	ARGERICH COSME DR	00545	B1706EQK	HAEDO	HUGO DANIEL CUELLO	A	0
2377	E.R.A.S.	1840155	649546	MEXICO	01851	C1222ABA	CAPITAL FEDERAL	ISABEL VAZQUEZ	A	0
2381	E.R.A.S.	1844994	1951189	FRIAS J A	02933	B1845BUU	JOSE MARMOL	ANTONIA MARQUI	A	0
2365	E.R.A.S.	1845765	1951768	BERNARDI CONSC	02863	B1845BWS	JOSE MARMOL	HILICH ESTEBAN	A	0
2269	E.R.A.S.	1856761	520564	ALSINA ADOLFO	01905	C1090AAC	CAPITAL FEDERAL	VALLE, DINA GRACIELA	A	0
2375	E.R.A.S.	1866591	2226151	CAMARGO	00687	C1414AHM	CAPITAL FEDERAL	AARON DANIEL LIBERMAN	A	0
2363	E.R.A.S.	1871542	2141881	URIBURU JOSE EVARISTO PRES	00137	C1027AAC	CAPITAL FEDERAL	NORBERTO FICHTEMBERG	A	0
2301	E.R.A.S.	1887436	2058485	SOLIS	01630	C1134ADJ	CAPITAL FEDERAL	EDUARDO FERREIRA	A	0
2337	E.R.A.S.	1890595	879679	BAHIA BLANCA	00580	B1875CXL	WILDE	DANIEL OSVALDO BASUALDO	A	0
2306	E.R.A.S.	1898301	1635609	MARCONI GUILLERMO ING	01160	B1685ABU	EL PALOMAR (M)	ENRIQUE NICOLAS MOYANO	A	0
2378	E.R.A.S.	1900498	2143973	PERU	01210	C1141ACB	CAPITAL FEDERAL	JANE MIRYAM CAHUAYME LIZARZABURU	A	0
2359	E.R.A.S.	1901347	1840688	EL CHURRINCHE	3702	B1834COX	SAN JOSE (LZ)	MABEL JAIME	A	0
2388	E.R.A.S.	1907609	2043634	SAN JUAN AV	01981	C1232AAB	CAPITAL FEDERAL	ROSSAROLI ELBA	A	0
2338	E.R.A.S.	1908682	908352	SALADILLO	00026	B1872---	0	NORBERTO OSVALDO CORRIPIO	A	0
2401	E.R.A.S.	1915106	2202652	CASTRO BARROS AV	01756	C1237ABN	CAPITAL FEDERAL	ALBERTO RAFAEL TOCCI	A	0
2380	E.R.A.S.	1926243	2275074	CAMPICHUELO	00556	C1405BOH	CAPITAL FEDERAL	PETRAY AMALIA V R D	A	0
2384	E.R.A.S.	1931982	2133956	ALVEAR MARCELO T DE	00976	C1058AAN	CAPITAL FEDERAL	JULIO ARTURO PALACIOS PEREZ	A	0
2395	E.R.A.S.	1935217	2120116	ESTADOS UNIDOS	02521	C1227ABO	CAPITAL FEDERAL	FLORES, MARIA DEL CARMEN	A	0
2367	E.R.A.S.	1938027	2099826	INDEPENDENCIA AV	00315	C1099AAD	CAPITAL FEDERAL	ELSA FIGUEREDO	A	0
2388	E.R.A.S.	1941232	2145591	URQUIZA GRAL	01327	C1243AEC	CAPITAL FEDERAL	BEATRIZ HAYDEE CARLOS	A	0
2378	E.R.A.S.	1942262	1778854	ACUÑA DE FIGUEROA FRANCIS	01006	C1180AAT	CAPITAL FEDERAL	FERNANDEZ JORGE M.	A	0
2355	E.R.A.S.	1945505	1373101	BERUTI	02833	C1425BBG	CAPITAL FEDERAL	GABRIEL CRISTIAN TABOADA	A	0
2372	E.R.A.S.	1946424	1359451	MEDRANO AV	00517	C1179AAI	CAPITAL FEDERAL	SOCORRO MAGDALENA MOURIÑO	A	0
2358	E.R.A.S.	1956402	1881316	LA PLATA	00007	B1828BJA	BANFIELD	SCORPINO ESTHER	A	0

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2273	E.R.A.S.	1957551	1780910	BOSCH LUIS MARIA	01882	B1678EZB	CASEROS	GRENADER	A	0
2394	E.R.A.S.	1958988	949301	CRAIG COMTE	00040	B1872BQB	SARANDI	IVAN GABRIEL TOLI	A	0
2147	E.R.A.S.	1959511	178918	FALCON RAMON L CNEL	02974	C1406GOH	CAPITAL FEDERAL	EDUARDO PIRILLO	A	0
2391	E.R.A.S.	1960674	2295641	TREINTA Y TRES ORIENTALES	01415	C1257ACI	CAPITAL FEDERAL	PERLA SILVIA WOLFMAN	A	0
2375	E.R.A.S.	1963862	2282365	GUAYAQUIL	00160	C1424CAD	CAPITAL FEDERAL	STELLA MARIS MERICO	A	0
2387	E.R.A.S.	1964952	938246	ARANGUREN JUAN FELIPE DR	04733	C1407EMC	CAPITAL FEDERAL	ANALIA BEATRIZ SERRA	A	0
2392	E.R.A.S.	1965424	1203460	CERVANTES	00446	C1407BGF	CAPITAL FEDERAL	ANA MARIA EIRANOVA	A	0
2387	E.R.A.S.	1966278	752689	CORDOBA AV	03006	C1187AAR	CAPITAL FEDERAL	VASILIADIS,MIGUEL Y	A	0
2364	E.R.A.S.	1979438	2171380	HUMAHUACA	04625	C1192ACO	CAPITAL FEDERAL	OFELIA CHAZAN	A	0
2334	E.R.A.S.	1983038	1029689	LAMAS ANDRES	00922	C1406BIF	CAPITAL FEDERAL	ANGELA TODARO	A	0
2135	E.R.A.S.	1998258	2018182	GUATEMALA	04663	C1425BUK	CAPITAL FEDERAL	BERMAN ROBERTO L.	A	0
2368	E.R.A.S.	1998863	2368846	SALGUERO JERONIMO	02270	C1425DET	CAPITAL FEDERAL	SERGIO DANIEL MARTINEZ	A	0
2400	E.R.A.S.	2015567	1827463	BELGRANO	03545	B1678AFK	CASEROS	ADELINA ROSALES	A	0
2395	E.R.A.S.	2017258	1828707	MORENO MARIANO	06014	B1684DSD	EL PALOMAR (TF)	N VELAZQUEZ	A	0
2317	E.R.A.S.	2026818	2242486	FORMOSA	00070	C1424BZB	CAPITAL FEDERAL	DANIEL JORGE DANILOV	A	0
2346	E.R.A.S.	2027820	1023189	CONDARCO	00460	B1875DXJ	WILDE	FATIMA NELFA NOBLE FONSECA	A	0
2315	E.R.A.S.	2029231	2387020	YERBAL	00727	C1405CDO	CAPITAL FEDERAL	AHIDA ELEUTERIA MORALES	A	0
2328	E.R.A.S.	2033069	1928277	LARREA JUAN	01351	B1832INA	LOMAS DE ZAMORA	CREDENTI JOSE	A	0
2353	E.R.A.S.	2035703	1667431	SALK JONAS DR	03957	B1636BIY	OLIVOS	CLAUDIO DANIEL COSTAS	A	0
2386	E.R.A.S.	2038739	1747689	AVELLANEDA MARCOS M DE DR	02376	B1708GGX	MORON	MIGUEL B GOMEZ	A	0
2374	E.R.A.S.	2039529	1711105	ITUZAINGO	00119	B1642DPC	SAN ISIDRO	JOSE ALBERTO DE NAVAS	A	0
2378	E.R.A.S.	2046924	1937212	LARREA JUAN	01820	B1832INL	LOMAS DE ZAMORA	SUSANA ESTER FASCIOLO	A	0
2375	E.R.A.S.	2049151	63014	CORRIENTES AV	01642	C1042AAP	CAPITAL FEDERAL	ANA B. DE PIÑERO	A	0
2305	E.R.A.S.	2051924	526439	SARMIENTO	03861	C1197AAC	CAPITAL FEDERAL	LAURA DORA TACSIR Y OTRO	A	0
2358	E.R.A.S.	2053637	1941485	VELEZ SARFIELD	00871	B1834HWQ	TEMPERLEY	CECILIA VAZQUEZ GARCIA	A	0
2163	E.R.A.S.	2066435	1483324	TUCUMAN	02253	C1051ACA	CAPITAL FEDERAL	SIROTA	A	0
2373	E.R.A.S.	2076321	1955732	EL TALA	03262	B1834EUP	TEMPERLEY	AUSILIO FRANCISCO	A	0
2397	E.R.A.S.	2083108	1878195	ITALIA	04360	B1702AKN	CIUDADELA	OMAR A. CAMARA	A	0
2400	E.R.A.S.	2086929	1605264	GASCON	00826	C1181ACP	CAPITAL FEDERAL	ERNESTO ZORZO	A	0
2355	E.R.A.S.	2098196	2204455	ARAOZ	01653	C1414DQG	CAPITAL FEDERAL	ELIZABETH ANDREA ZAMPAGLIONE	A	0
2330	E.R.A.S.	2100444	760866	GUARDIA VIEJA	03842	C1192AAL	CAPITAL FEDERAL	TERESA C CONTRERAS	A	0
2146	E.R.A.S.	2100478	2291423	SAN MARTIN AV	01841	C1416CRG	CAPITAL FEDERAL	TAKARA	A	0
2402	E.R.A.S.	2102387	2377868	TREINTA Y TRES ORIENTALES	00055	C1182AEA	CAPITAL FEDERAL	JULIO LAREU	A	0
2353	E.R.A.S.	2105546	2321515	FORMOSA	00353	C1424BZG	CAPITAL FEDERAL	GRACIELA IRMA ALVAREZ	A	0
2314	E.R.A.S.	2107020	2243590	BORGES JORGE LUIS	1745	C1414DGC	CAPITAL FEDERAL	ZAVALA ADELINA	A	0
2388	E.R.A.S.	2112686	2399151	FIGUEROA APOLINARIO DE CNE	00730	C1416DPF	CAPITAL FEDERAL	MIIRAM SANCHEZ AGUILAR	A	0
2385	E.R.A.S.	2117522	304493	SANTA FE AV	03818	C1425BHN	CAPITAL FEDERAL	ANDREA LORENA PALACIO BASSILIOU	A	0
2402	E.R.A.S.	2127880	1157251	LAS HERAS GRAL AV	02925	C1425ASG	CAPITAL FEDERAL	NELIDA ROSA SALOMONOVICE	A	0
2359	E.R.A.S.	2136092	1828130	ABERASTAIN ANTONIO DR	00640	B1708GZN	MORON	CELEDONIO BURGOS	A	0
2376	E.R.A.S.	2138665	1844640	ANDRADE OLEGARIO VICTOR	00963	B1712KBI	CASTELAR	NORBERTO JOSÉ BURTONE	A	0
2357	E.R.A.S.	2141361	1860689	ARENA CNEL	03681	B1712EFQ	CASTELAR	MARIA INES ACENARRO	A	0
2387	E.R.A.S.	2141881	1863670	BUFANO A R	03460	B1712DWN	CASTELAR	MARINONI CHEVALLIER MARIA ANGE	A	0
2368	E.R.A.S.	2142920	1182469	VENEZUELA	06676	B1875BGR	WILDE	CACERES CEFERINA	A	0
2402	E.R.A.S.	2149799	1911447	ALESSANDRI PRES	00412	B1708BLD	MORON	MARGARITA CIRAVEGNA	A	0
2375	E.R.A.S.	2150139	1913479	GARAYCOCHEA PABLO P TTE AV	00768	B1685DMD	EL PALOMAR (M)	MARGARITA RITA TOLEDO	A	0
2355	E.R.A.S.	2166081	1346951	ASCASUBI HILARIO	02010	B1875EIP	WILDE	NORMA BEATRIZ PARROTA	A	0
2400	E.R.A.S.	2172031	2012380	CUCHA CUCHA	01225	B1708---	0	HUGO RODRIGUEZ	A	0
2389	E.R.A.S.	2173372	2016916	SANTO DOMINGO	01168	B1708ARJ	MORON	OCAMPO, E.	A	0
2285	E.R.A.S.	2175650	1129189	ALBERTI	00162	C1082AAD	CAPITAL FEDERAL	MIRTA SILVIA VELOSO	A	0
2381	E.R.A.S.	2181355	1287971	GALICIA	01025	B1712KOA	CASTELAR	ADMINISTRACION DE CONSORCIO	A	0
2359	E.R.A.S.	2182225	2125066	SAAVEDRA	01004	C1229ACL	CAPITAL FEDERAL	PIEDAD AMOR TERRAZO	A	0
2382	E.R.A.S.	2184057	2392053	LOBOS ELEODORO DR	00281	C1405BLA	CAPITAL FEDERAL	MABEL LAVALLEN	A	0
2358	E.R.A.S.	2184194	2392627	LOBOS ELEODORO DR	00281	C1405BLA	CAPITAL FEDERAL	LEON VALENZUELA IRIS	A	0
2380	E.R.A.S.	2184564	2121422	LA PLATA AV	00259	C1184AAC	CAPITAL FEDERAL	PORZIO ANTONINO F	A	0
2360	E.R.A.S.	2185245	2295756	CEVALLOS VIRREY	01192	C1077AAX	CAPITAL FEDERAL	H. L. PROLL	A	0
2358	E.R.A.S.	2185643	137376	TUCUMAN	02362	C1051ACD	CAPITAL FEDERAL	SZURMAN	A	0
2297	E.R.A.S.	2186634	1001807	SANTIAGO DEL ESTERO	00326	C1075AAH	CAPITAL FEDERAL	CURGEIRAS AGUETE MARIA J	A	0
2396	E.R.A.S.	2189248	2149221	LIMA	01445	C1138ACE	CAPITAL FEDERAL	NORMA BEATRIZ FILGUEIRA	A	0
2369	E.R.A.S.	2189350	442819	CALVO CARLOS	02722	C1230AAT	CAPITAL FEDERAL	ELISA DELIA PERSONENI	A	0
2375	E.R.A.S.	2191170	1800679	AYACUCHO	00376	C1025AAH	CAPITAL FEDERAL	AUAT MARCELO	A	0
2360	E.R.A.S.	2193458	486803	YRIGOYEN HIPOLITO	02205	C1089AAQ	CAPITAL FEDERAL	FRANCISCA ANA KAKOL	A	0
2400	E.R.A.S.	2194202	2184444	GARRO	03066	C1243ACB	CAPITAL FEDERAL	JORGE MIGUEL NOWICKY	A	0
2392	E.R.A.S.	2194614	2256203	LAVALLEJA	00738	C1414DTP	CAPITAL FEDERAL	LEON MUICEY	A	0
2356	E.R.A.S.	2198107	766147	SAAVEDRA	00907	C1229ACI	CAPITAL FEDERAL	MARIA ISABEL LAZARTE	A	0
2285	E.R.A.S.	2198460	2012835	URIBURU JOSE EVARISTO PRES	00748	C1027AAP	CAPITAL FEDERAL	MARTHA ELENA DONNET	A	0
2336	E.R.A.S.	2199896	2145512	PRINGLES	01162	C1183AEV	CAPITAL FEDERAL	ALEJANDRA PATRICIA FREUDWEILER	A	0
2285	E.R.A.S.	2200232	1386768	SUIPACHA	00976	C1008AAT	CAPITAL FEDERAL	VELAZQUEZ MIRTA	A	0
2313	E.R.A.S.	2203339	1036929	SAENZ PEÑA LUIS PRES	00479	C1110AAI	CAPITAL FEDERAL	JOSE LUIS CACERES ACOSTA	A	0
2397	E.R.A.S.	2204421	1390613	SALGUERO JERONIMO	00568	C1177AEJ	CAPITAL FEDERAL	DIANA BEATRIZ MANESEVICH	A	0
2105	E.R.A.S.	2206882	2032455	BORGES JORGE LUIS	2420	C1425FFJ	CAPITAL FEDERAL	NYDIA EMILIA JASSE	A	0
2383	E.R.A.S.	2207275	66935	CORRIENTES AV	01847	C1045AAA	CAPITAL FEDERAL	GABRIELA ZULOAGA	A	0
2375	E.R.A.S.	2210406	583788	SARMIENTO	03932	C1197AAF	CAPITAL FEDERAL	LIDIA ANA CEI	A	0
2379	E.R.A.S.	2211562	2352412	PLANES	00895	C1405DBE	CAPITAL FEDERAL	LAVIE ELISO ISABEL	A	0
2376	E.R.A.S.	2215007	1686387	ROCAMORA	04062	C1184ABB	CAPITAL FEDERAL	ITALO J IAÑEZ	A	0
2280	E.R.A.S.	2216414	356056	BILLINGHURST	00427	C1174ABG	CAPITAL FEDERAL	MARTA LILIANA GONZALEZ	A	0
2389	E.R.A.S.	2220107	1717688	GUEMES MARTIN MIGUEL DE GR	04966	B1603CUD	VILLA MARTELLI	DARIO NARCISI	A	0
2395	E.R.A.S.	2232864	1881769	LARREA	00080	B1609EBB	BOULOGNE SUR ME	LILIANA GISELA ALTOBELLI	A	0
2378	E.R.A.S.	2233775	1819007	GUEMES MARTIN MIGUEL DE GR	03970	B1603BEJ	VILLA MARTELLI	LIDIA MAXIMA NUÑEZ	A	0
2285	E.R.A.S.	2245154	2077463	BARRIO VILLA LUGANO	05582	C0000---	0	RUBEN REYNADO	A	0
2375	E.R.A.S.	2245794	2087605	BARRIO VILLA LUGANO	05807	C0000---	0	DECKER ANDREA MOLINA PEREZ	A	0
2386	E.R.A.S.	2249388	1149453	CARACAS	01444	C1416AIF	CAPITAL FEDERAL	VIRGINIA CASTAÑO	A	0
2375	E.R.A.S.	2250521	143538	BONORINO ESTEBAN CNEL AV	00032	C1406DMB	CAPITAL FEDERAL	NORMA CARMEN DURANTE	A	0
2338	E.R.A.S.	2250969	962235	MIRALLA	01011	C1440DCI	CAPITAL FEDERAL	JORGE LATERZA	A	0
2376	E.R.A.S.	2257664	1922001	INDEPENDENCIA	02667	B1606DMC	CARAPACHAY	JUAN ALEJANDRO BORGIA	A	0
2368	E.R.A.S.	2260467	1929633	BRANDSEN FEDERICO	01114	B1604BJD	FLORIDA OESTE	CARINA DEL VALLE ROJO	A	0
2298	E.R.A.S.	2277807	2027644	ACHA MARIANO GRAL	01499	C1430DUC	CAPITAL FEDERAL	ADALBERTO JACINTO BESEGATO	A	0
2372	E.R.A.S.	2285124	563332	COSQUIN	00016	C1408GIB	CAPITAL FEDERAL	POMARI PABLO	A	0
2357	E.R.A.S.	2311398	2409317	SITIO DE MONTEVIDEO	066	B1824KCB	LANUS OESTE	CARLOS ALBERTO ALI	A	0
2388	E.R.A.S.	2316748	2694293	TRES LOMAS	00688	C1416EAD	CAPITAL FEDERAL	DE PINO R A DE	A	0
2395	E.R.A.S.	2320173	2458937	SEGUI F J ALTE	02577	C1416BYC	CAPITAL FEDERAL	AVELINA TORRES ARIAS	A	0
2375	E.R.A.S.	2321903	2772106	SARAZA	00675	C1424CWE	CAPITAL FEDERAL	ENRIQUE J. SODANO	A	0
2376	E.R.A.S.	2325458	2520873	BALBASTRO	02268	C1406ICR	CAPITAL FEDERAL	LORETO DEODATO SOSA	A	0
2396	E.R.A.S.	2327470	2421354	FERNANDEZ ISABEL RVDA MADR	01132	B1675ATB	VILLA RAFFO	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
2270	E.R.A.S.	2331800	2537404	MIRAFLORES	02286	C1406COF	CAPITAL FEDERAL	AGUSTIN CASTRO	A	0
2279	E.R.A.S.	2333348	2523740	SALVIGNY	01940	C1406IQF	CAPITAL FEDERAL	SEBASTIANA GUTIERREZ ZAMBRANA	A	0
2273	E.R.A.S.	2333468	2515735	ROBERTSON	01262	C1406DZP	CAPITAL FEDERAL	SILVIO MARIO FRANS Y OTRO	A	0
2283	E.R.A.S.	2338345	2512180	EGUIA MANUEL	01191	C1406EJE	CAPITAL FEDERAL	LAURA RODRIGUEZ	A	0
2385	E.R.A.S.	2346074	2414836	OLAVARRIA	00814	C1162ABR	CAPITAL FEDERAL	JULIO ANDRES GONCALVES DA SILVA	A	0

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2362	E.R.A.S.	2348201	2438543	ARENALES	02134	B1646HIL	SAN FERNANDO	IDALIA DORA SANDOBAL	A	0
2365	E.R.A.S.	2352574	2451195	REPUBLICA DEL LIBANO	01170	B1869CSF	GERLI (AV)	SICOLO MIGUEL ANGEL	A	0
2377	E.R.A.S.	2353122	2526400	BERON DE ASTRADA	02099	C1437FSE	CAPITAL FEDERAL	ALVAREZ,OSVALDO LUIS	A	0
2132	E.R.A.S.	2355134	2580601	RIVERA FRUCTUOSO GRAL	02245	C1437GRE	CAPITAL FEDERAL	CARDENAS MARIA CRISTINA	A	0
2376	E.R.A.S.	2356880	2458801	HERNANDARIAS	01317	C1164AAQ	CAPITAL FEDERAL	ANTONIO E GONCALVES	A	0
2317	E.R.A.S.	2359504	2552338	BERG CARLOS	02717	C1437BDA	CAPITAL FEDERAL	ANGEL GREGORIO DI COSTRA	A	0
2366	E.R.A.S.	2359998	2549046	ROCHA	00978	C1166AFB	CAPITAL FEDERAL	FERRINI BRUNO	A	0
2383	E.R.A.S.	2365407	2614421	CARACAS	01729	C1416AIK	CAPITAL FEDERAL	JOSE LUIS OCAMPO	A	0
2324	E.R.A.S.	2368814	2463829	HORNOS GRAL (659)	03050	B1678HPL	CASEROS	ALICIA BEATRIZ GAUNA	A	0
2326	E.R.A.S.	2372820	2480757	MAGALLANES	00917	C1166ADA	CAPITAL FEDERAL	ANGELA ELISA TORMEY	A	0
2382	E.R.A.S.	2373042	2659799	AÑASCO	03084	C1416CUT	CAPITAL FEDERAL	GUADALUPE PELOSI	A	0
2370	E.R.A.S.	2373973	2469251	AZCUENAGA	04554	B1678BEV	CASEROS	HORACIO ALBERTO BACHER	A	0
2385	E.R.A.S.	2379392	2469948	GRIGERA MARCOS	00375	B1828HRG	BANFIELD	LILIANA BEATRIZ FARAY	A	0
2382	E.R.A.S.	2385756	2655568	DE LEON BERNARDO	02367	C1416AGA	CAPITAL FEDERAL	HIGINIO H PANZZITA	A	0
2376	E.R.A.S.	2385825	2474810	ARNOLDI ADOLFO INT AV	00401	B1646BDI	SAN FERNANDO	MARIA CRISTINA SOUTO	A	0
2364	E.R.A.S.	2386066	2448921	SUAREZ	00986	C1162AFB	CAPITAL FEDERAL	ANA DANGIOLO	A	0
2387	E.R.A.S.	2401367	2419719	MITRE BARTOLOME	01644	C1037ABF	CAPITAL FEDERAL	MARIA CRISTINA SILVEYRA	A	0
2402	E.R.A.S.	2410133	2596700	TABARE	03324	C1437FIV	CAPITAL FEDERAL	MAGAN JOSE	A	0
2372	E.R.A.S.	2410560	2416450	GUALEGUAY	01195	C1165ACC	CAPITAL FEDERAL	ROLDAN CANDELARIA JOSEFA	A	0
2381	E.R.A.S.	2412493	2682990	CONDARCO	02357	C1416AQY	CAPITAL FEDERAL	SUC DE ROSA KAPILOFF	A	0
2386	E.R.A.S.	2415607	2721508	JUNIN	01553	C1113AAO	CAPITAL FEDERAL	CONSTANZA MATILDE MC CULLOCH	A	0
2136	E.R.A.S.	2417447	2458297	BELGRANO AV	03342	C1210AAO	CAPITAL FEDERAL	CEJAS RODOLFO DE JESUS.	A	0
2402	E.R.A.S.	2419147	2412484	ESPARZA	00023	C1171ACA	CAPITAL FEDERAL	ALICIA IRENE SCHEMPER	A	0
2375	E.R.A.S.	2421483	2510450	ALMAFUERTE	02022	B1828CRX	BANFIELD	OLIVELLA NELDA	A	0
2384	E.R.A.S.	2425526	2531054	ALMAFUERTE	01610	B1753ARH	VILLA LUZURIAGA	EDGARDO OSCAR TUCHSCHERR Y OTRA	A	0
2379	E.R.A.S.	2429458	2531143	39-OLIVEIRA CESAR	02219	B1650LPS	VILLA MAIPU	ALBERTO RAUL SUAREZ	A	0
2402	E.R.A.S.	2430580	2696161	BUFANO ALFREDO R	02809	C1417DMG	CAPITAL FEDERAL	ALEJANDRO EDUARDO LEDO	A	0
2365	E.R.A.S.	2430893	2742434	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV	02446	C1425DBS	CAPITAL FEDERAL	RODOLFO GUSTAVO SOLARI	A	0
2390	E.R.A.S.	2431750	2537743	ALMAFUERTE	00595	B1753AQK	VILLA LUZURIAGA	HERNAN PABLO MAIDANA	A	0
2058	E.R.A.S.	2446052	2719718	PUEYRREDON AV	01923	C1119ACC	CAPITAL FEDERAL	MENI BATTAGLIA OSVALDO J.	A	0
2359	E.R.A.S.	2448914	2708763	JAURES JEAN	01125	C1425ESA	CAPITAL FEDERAL	HANDJI STELLO	A	0
2383	E.R.A.S.	2450118	2623585	B RIVADAVIA CASA	00567	C1406---	0	CARMELA RODRIGUEZ (CASA 567)	A	0
2375	E.R.A.S.	2450652	2608486	B RIVADAVIA CASA	00616	C1406---	0	ROQUE JUANA Y OTROS (CASA 616)	A	0
2380	E.R.A.S.	2451491	2512386	MONTEVIDEO	00290	C1019ABF	CAPITAL FEDERAL	PEDRO DE LA FUENTE	A	0
2134	E.R.A.S.	2453531	2700455	SARMIENTO	01947	C1044AAC	CAPITAL FEDERAL	AMALIA M, BOVER	A	0
2301	E.R.A.S.	2454231	2469226	IRALA	01188	C1164ACB	CAPITAL FEDERAL	SOFIA LAURA GARCIA MORIS	A	0
2395	E.R.A.S.	2468022	2671999	JAURES JEAN	00628	C1215ACL	CAPITAL FEDERAL	BUCACHI ADOLFO	A	0
2380	E.R.A.S.	2474271	2573711	MORENO PERITO	02750	B1607BNJ	VILLA ADELINA	GONZALEZ LUIS	A	0
2367	E.R.A.S.	2474667	2573760	ADER BERNARDO AV	01353	B1607BTE	VILLA ADELINA	DUGNAS LADISLAO	A	0
2385	E.R.A.S.	2479290	2574635	TAPALQUE	03113	B1872EWQ	GERLI (AV)	ROXANA SILVIA MARTINEZ	A	0
2395	E.R.A.S.	2481240	2612773	CULPINA	03490	C1437BMF	CAPITAL FEDERAL	MONICA SUSANA MELLA	A	0
2359	E.R.A.S.	2484779	2438969	ASAMBLEA AV	01927	C1406HVJ	CAPITAL FEDERAL	DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ DE FREITAS	A	0
2393	E.R.A.S.	2485858	2695715	MORENO	02857	C1209ABA	CAPITAL FEDERAL	MAYRA NICOLE ORTIZ	A	0
2397	E.R.A.S.	2486580	2578822	317-1 DE MAYO	02682	B1879ADP	QUILMES OESTE	JOSE MIGUEL LIONTI	A	0
2122	E.R.A.S.	2488913	2587383	JUNIN	01768	B1609AMR	BOULOGNE SUR MÉ	ASOCIACIÓN CIVIL REFUGIO EMANUEL	A	0
2353	E.R.A.S.	2489187	2779031	BALBASTRO	00465	C1424CVA	CAPITAL FEDERAL	MARIA CRISTINA MARSIGLIA	A	0
2390	E.R.A.S.	2490664	2591660	OLAGUER Y FELIU A VIRREY	01959	B1636GTK	OLIVOS	WALTER LEONEL SALINAS	A	0
2367	E.R.A.S.	2494496	2594368	61-FRENCH	02195	B1650LCA	VILLA MAIPU	PASCUALI MARIO	A	0
2379	E.R.A.S.	2494497	2593046	SAN MARTIN JUAN DE CAP	02887	B1609FZE	BOULOGNE SUR MÉ	FERREYRA Y MORENO	A	0
2278	E.R.A.S.	2495872	2486494	PERON JUAN D TTE GRAL	01971	C1040AAC	CAPITAL FEDERAL	CARMEN JOSEFA RIESEN	A	0
2398	E.R.A.S.	2502849	2591674	GUIDO SPANO CARLOS	00027	B1824OCC	LANUS OESTE	MIRTA CLELIA NAVAS	A	0
2375	E.R.A.S.	2503625	2595197	ALEMANIA	03805	B1834FHS	TEMPERLEY	MIRTA EMILCE RUSSO	A	0
2402	E.R.A.S.	2507496	2657036	373-GONZALEZ J V (QO)	02435	B1879---	0	CARLOS MILITELLO	A	0
2379	E.R.A.S.	2507843	2474966	ZUVIRIA	02937	C1406HSY	CAPITAL FEDERAL	CHAHNARIAN CARLA	A	0
2378	E.R.A.S.	2513228	2610717	JUNIN	01360	B1609AMJ	BOULOGNE SUR MÉ	I. DE ANDREU	A	0
2336	E.R.A.S.	2514446	2604386	ALCORTA AMANCIO	00264	B1824LZF	LANUS OESTE	GUSTAVO TESSARO	A	0
2331	E.R.A.S.	2517601	2638457	VALPARAISO	03515	C1437GXC	CAPITAL FEDERAL	SUSANA NELIDA TOROSSIAN	A	0
2384	E.R.A.S.	2527097	2592789	LAFUENTE AV	01208	C1406EUO	CAPITAL FEDERAL	MARTIN WENCESLAO BAREIRO	A	0
2376	E.R.A.S.	2535598	2645973	M ACOSTA 3535 ED 27 BLOCK 21	00012	C1437---	0	ISMAEL JUAN BENITEZ	A	0
2397	E.R.A.S.	2537922	2758798	RONDEAU	02384	C1262ABB	CAPITAL FEDERAL	LOPEZ DE LOZA ELDA	A	0
2132	E.R.A.S.	2538804	2651841	MONTEVIDEO	00255	C1019ABE	CAPITAL FEDERAL	CELSO BANEGAS	A	0
2374	E.R.A.S.	2539017	2643347	GRANADEROS	05929	B1753GPG	VILLA LUZURIAGA	GARCIA J	A	0
2338	E.R.A.S.	2539201	2649370	M ACOSTA 3535 ED 40 BLOCK 19	00011	C1437---	0	JUANA VAUGHAN	A	0
2369	E.R.A.S.	2541453	2700375	JAURES JEAN	00623	C1215ACK	CAPITAL FEDERAL	MIRYAM MABEL DENTTI	A	0
2320	E.R.A.S.	2543475	2642634	ENTRE RIOS	00619	B1636GAA	OLIVOS	LUISA FAVALE	A	0
2400	E.R.A.S.	2548899	2722503	ALSINA ADOLFO	03201	C1207AAI	CAPITAL FEDERAL	GUTIERREZ MARIA	A	0
2355	E.R.A.S.	2555692	2668175	M ACOSTA 3535 ED 117 BLOCK 6	00070	C1437---	0	SANTOS MUÑOZ	A	0
2289	E.R.A.S.	2556730	2625750	DELLEPIANE LUIS JOSE TTE GR	04781	C1439DZE	CAPITAL FEDERAL	PATRICIA LAURA BANAZZI	A	0
2399	E.R.A.S.	2557297	2770141	ASAMBLEA AV	00362	C1424COQ	CAPITAL FEDERAL	CARMEN EVA TARSITANO	A	0
2285	E.R.A.S.	2559490	2545078	ALSINA ADOLFO	03078	C1207AAF	CAPITAL FEDERAL	HUMBERTO RENEE COPA	A	0
2382	E.R.A.S.	2561122	2668494	AMERICA	05139	B1753FLQ	VILLA LUZURIAGA	JOSE ARIAS	A	0
2398	E.R.A.S.	2563390	2670851	SAN MATIAS (LMN)	00801	B1755EPO	RAFAEL CASTILLO (	ADAN GIMENEZ	A	0
2379	E.R.A.S.	2567415	2730738	ARAOZ	02073	C1425DGC	CAPITAL FEDERAL	DANIEL VILLALBA	A	0
2402	E.R.A.S.	2570233	2619360	LA RIOJA	00476	C1214ADJ	CAPITAL FEDERAL	PASTORINI LUIS	A	0
2346	E.R.A.S.	2571236	2442333	DONIZETTI	00015	C1407IEA	CAPITAL FEDERAL	GLORIA LETIZIA IBACETA	A	0
2365	E.R.A.S.	2575728	2668435	ESPARZA	00087	C1171ACA	CAPITAL FEDERAL	EDITH SEGUNDA VILCA MAMANI	A	0
2363	E.R.A.S.	2576093	2663584	ARGERICH	02383	C1416AXY	CAPITAL FEDERAL	ANA FAZEKAS DE REDEI	A	0
2321	E.R.A.S.	2576997	2706704	JAURES JEAN	00840	C1215ACP	CAPITAL FEDERAL	JORGE LUIS RODRIGUEZ	A	0
2369	E.R.A.S.	2577608	2752049	RIOBAMBA	00178	C1025ABD	CAPITAL FEDERAL	AARON VICTOR NASSIMOFF	A	0
2384	E.R.A.S.	2578576	2688147	LASCANO	03712	C1417GZD	CAPITAL FEDERAL	LORENA VANESA MAZA	A	0
2316	E.R.A.S.	2588922	2567319	JUNCAL	02037	C1116AAE	CAPITAL FEDERAL	CASAS GUSTAVO EDUARDO	A	0
2359	E.R.A.S.	2603184	2619061	JUJUY AV	00466	C1083AAR	CAPITAL FEDERAL	JULIA GOMEZ TOLEDO	A	0
2328	E.R.A.S.	2605363	2774256	VIEL	02085	C1424BKO	CAPITAL FEDERAL	OSVALDO ALFREDO TUCCI	A	0
2261	E.R.A.S.	2609212	2714292	LARREA	01372	C1117ABL	CAPITAL FEDERAL	COTLER, ADELA	A	0
2355	E.R.A.S.	2611863	2592593	JUNCAL	02431	C1425AYA	CAPITAL FEDERAL	CLARA MACEK DE KABAT	A	0
2359	E.R.A.S.	2615457	2706191	SAN LUIS	03060	C1186ACH	CAPITAL FEDERAL	MOISES SAIDON	A	0
2313	E.R.A.S.	2618366	2668032	MAZA	00036	C1206ACB	CAPITAL FEDERAL	ANA MARIA SUAREZ	A	0
2340	E.R.A.S.	2619111	2713104	BOEDO AV	00410	C1218AAN	CAPITAL FEDERAL	ISABEL SILVIA MACIEL	A	0
2330	E.R.A.S.	2634302	2704866	MITRE BARTOLOME	01419	C1037ABA	CAPITAL FEDERAL	MARIA EULALIA VALDEZ	A	0
2383	E.R.A.S.	2634738	2643389	ECUADOR	00990	C1214ACP	CAPITAL FEDERAL	ISMAIEL CHADIR	A	0
2383	E.R.A.S.	2639521	2426741	MITRE BARTOLOME	01734	C1037ABH	CAPITAL FEDERAL	MARIA ELENA PALAVECINO	A	0
2367	E.R.A.S.	2641878	2697487	PERON JUAN D TTE GRAL	01418	C1037ACB	CAPITAL FEDERAL	AGUSTIN HECTOR VIGNAU	A	0
2381	E.R.A.S.	2644912	2477498	RIVADAVIA AV	03422	C1203AAT	CAPITAL FEDERAL	FRANCISCA ALICIA BERBEN	A	0
2380	E.R.A.S.	2646228	2762427	LA RIOJA	01800	C1244ABL	CAPITAL FEDERAL	MARTA ALICIA LOPEZ	A	0
2381	E.R.A.S.	2649861	2624447	RIVADAVIA AV	03454	C1203AAT	CAPITAL FEDERAL	WALTER FABIAN BERTOA	A	0
2358	E.R.A.S.	2650888	2604973	PUEYRREDON AV	00764	C1032ABU	CAPITAL FEDERAL	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
2383	E.R.A.S.	2652338	2607991	RIVADAVIA AV	01725	C1033AAH	CAPITAL FEDERAL	NOEMI TABOCCHINI	A	0
2373	E.R.A.S.	2658181	2698453	MORENO	00984	C1091AAT	CAPITAL FEDERAL	GONZALEZ, ANA DELIA	A	0

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2390	E.R.A.S.	2661840	2610186	RIOBAMBA	00010	C1025ABB	CAPITAL FEDERAL	GIAMPAOLI.	A	0
2378	E.R.A.S.	2672013	2744669	MEDRANO AV	01670	C1425GDB	CAPITAL FEDERAL	JOSE CHAMI	A	0
2365	E.R.A.S.	2673499	2504820	CATAMARCA	00234	C1213ABF	CAPITAL FEDERAL	ALEJANDRA PATRICIA ARISTIA	A	0
2380	E.R.A.S.	2693744	1175815	PEREYRA ING	03466	B1702CTB	CIUDADELA	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2357	E.R.A.S.	2755099	10018662	BEAUCHEF	01819	C1424BEK	CAPITAL FEDERAL	JOSE GRASSO	A	0
2401	E.R.A.S.	2766907	10022825	MENDOZA	1102	B1845BQY	JOSE MARMOL	MIGUEL ANGEL ARGAÑARAZ	A	0
2394	E.R.A.S.	2775739	10024761	55-ZAPATA	02332	B1650KZD	VILLA MAIPU	GRACIELA JANUSZ	A	0
2325	E.R.A.S.	2790729	10029833	ALSINA ADOLFO	02228	C1090AAJ	CAPITAL FEDERAL	SCIOLA GENARO	A	0
2395	E.R.A.S.	2797252	1175436	HOLMBERG	02353	C1430DOQ	CAPITAL FEDERAL	LEONARDO JORGE WINKHAUS	A	0
2392	E.R.A.S.	2797808	10032250	ALSINA	00963	B1702GDO	CIUDADELA	GLORIA BABUINI GALLI	A	0
2387	E.R.A.S.	2805868	1234062	BOGOTA	02528	C1406GBV	CAPITAL FEDERAL	MARIANO GASTON POMARAZ	A	0
2363	E.R.A.S.	2808032	990837	21-CALLE 21	04080	B1651BJP	VILLA ZAGALA	SALUM JUAN CARLOS Y OTROS	A	0
2395	E.R.A.S.	2808243	1011277	ENTRE RIOS AV	01652	C1133AAR	CAPITAL FEDERAL	CLEMENCIA .C LAVALLE AVILA	A	0
2317	E.R.A.S.	2821047	10041090	FERNANDEZ DE LA CRUZ F GRA	05301	C1439COD	CAPITAL FEDERAL	SANTIAGO ESTRADA	A	0
2401	E.R.A.S.	2828727	10045944	MAFALDA PRINCESA	0662	B1804IJN	JOSE MARIA EZEIZA	DAVID DINAMARCA	A	0
2375	E.R.A.S.	2838429	2191785	PARAGUAY	00754	C1057AAJ	CAPITAL FEDERAL	VILMA ZORAIDA ASTUHUAMAN CHINCHILLA	A	0
2379	E.R.A.S.	2839634	10053822	BALET ROGER	0522	B1812DML	CARLOS SPEGAZZI	DAIANA YANINA GONZALEZ	A	0
2381	E.R.A.S.	2850621	10062177	MAURE CNEL	1997	B1823ALG	GERLI (L)	NESTOR ADRIAN ALVAREZ	A	0
2359	E.R.A.S.	2854542	10064312	IRIBARNE LUIS (EX SAN MARTIN)	1187	B1839CCA	NUEVE DE ABRIL	SERGIO CARI QUISPE	A	0
2357	E.R.A.S.	2856558	670471	BRAGADO	04794	C1407HBF	CAPITAL FEDERAL	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
2373	E.R.A.S.	2863169	1309573	SANTA FE AV	02002	C1123AAP	CAPITAL FEDERAL	JULIO MAURIZIO	A	0
2356	E.R.A.S.	2867091	10070927	SAENZ PEÑA LUIS PRES	00890	C1110AAR	CAPITAL FEDERAL	SALAH GUERGUES	A	0
2391	E.R.A.S.	2868553	892329	CHACABUCO	00948	C1069AAT	CAPITAL FEDERAL	JULIAN GOLLASCH	A	0
2394	E.R.A.S.	2889201	119781	MURATURE	04759	C1407FCE	CAPITAL FEDERAL	CABANILLAS NORMA	A	0
2313	E.R.A.S.	2904548	10085500	CATRILO	00653	B1752EMC	LOMAS DEL MIRADO	ALBERTO TURIENZO	A	0
2356	E.R.A.S.	2909706	10088421	BONORINO ESTEBAN CNEL AV	01855	C1406DNK	CAPITAL FEDERAL	ELENA ELSA APAZA	A	0
2356	E.R.A.S.	2940915	10108082	BO SAN JAVIER 16	4	B1763AFC	VIRREY DEL PINO	ROSANA VIVIANA ANAGUA	A	0
2383	E.R.A.S.	2942921	10110048	MITRE EMILIO	00055	B1704HLA	RAMOS MEJIA	MAXIMA QUEZADA	A	0
2386	E.R.A.S.	2956759	10118474	CONSTITUYENTES	01258	B1768COR	LA TABLADA (LMS)	MARCIAL ANGEL PEREZ	A	0
2400	E.R.A.S.	2956814	10118286	JANER ANA MARIA	2310	C1437HGL	CAPITAL FEDERAL	JUAN CAMA CRUZ	A	0
2376	E.R.A.S.	2991969	10142374	152-SIGLO XX	01398	B1653GKD	VILLA BALLESTER	ISOLINA DEL VALLE BARRIENTOS	A	0
2368	E.R.A.S.	2995639	10145244	LAS CALAS	946	B1778JET	CIUDAD EVITA	CHRISTIAN MARCELO CONDORI	A	0
2382	E.R.A.S.	2998868	814355	TERRERO	01533	C1416BMI	CAPITAL FEDERAL	ENRIQUE CARLOS GARCIA	A	0
2395	E.R.A.S.	3007433	1030087	GARAY JUAN DE AV	01405	C1153ABM	CAPITAL FEDERAL	NANCY EDITH BARRERA	A	0
2287	E.R.A.S.	3029941	10169005	VIEYTES	00356	C0000---	0	ANTONIA F. CHIRINOS	A	0
2398	E.R.A.S.	3038319	10175657	SARMIENTO	01587	C1042ABC	CAPITAL FEDERAL	CARINA P. GLUZMAN	A	0
2326	E.R.A.S.	3038339	10175637	SARMIENTO	01587	C1042ABC	CAPITAL FEDERAL	RUBEN E. ROMERO	A	0
2368	E.R.A.S.	3046307	10182969	HUEYO BELISARIO	000000	B1870BNB	AVELLANEDA	LUIS ENRIQUE PEREYRA	A	0
2395	E.R.A.S.	3055319	10189505	SOSA OSVALDO SOLD (LMS)	6168	B1757PWV	GREGORIO DE LAFI	LAURA CORDOBA	A	0
2375	E.R.A.S.	3070811	10199176	PAZ MARCOS (LMS)	2584	B1757LMF	GREGORIO DE LAFI	MARIA SILVIA ROJAS	A	0
2374	E.R.A.S.	3071101	10200052	PASO JUAN JOSE	1296	B1832IJZ	LOMAS DE ZAMORA	JULIO ENRIQUE MARQUEZ COSTA	A	0
2305	E.R.A.S.	3086721	10211525	FUNES DEAN	01141	C1231ABM	CAPITAL FEDERAL	PATRICIA OLGA BOLLON	A	0
2374	E.R.A.S.	3091943	134429	QUIRNO	00063	C1406EZA	CAPITAL FEDERAL	GUSTAVO FELIPE LOPZ	A	0
2387	E.R.A.S.	3120528	10235818	BRUIX	631	B1755DYM	RAFAEL CASTILLO (	MYRIAM BAHAMONDES SOTOMAYOR Y OTR	A	0
2395	E.R.A.S.	3125967	10241808	SANCHEZ DE LORIA	02090	C1241ACP	CAPITAL FEDERAL	BERTA ISABEL QUINTEROS	A	0
2372	E.R.A.S.	3139028	1105329	CHASSAING JUAN	00156	B1707CBD	VILLA SARMIENTO	ROSA CLAUDIA PIZZIO	A	0
2393	E.R.A.S.	3158419	10258186	PITAGORAS	4072	B1825DAN	MONTE CHINGOLO	GLADYS LILIANA NIEVA	A	0
2402	E.R.A.S.	3172412	10264533	MONTEAGUDO	00597	C1437EVK	CAPITAL FEDERAL	LORENZO CUCHULA	A	0
2378	E.R.A.S.	3172437	10264613	MONTEAGUDO	00597	C1437EVK	CAPITAL FEDERAL	CRESCENCIA GONZALEZ	A	0
2374	E.R.A.S.	3172496	10264473	MONTEAGUDO	00597	C1437EVK	CAPITAL FEDERAL	MARY ESTELA ORTIGOZA MEDINA	A	0
2395	E.R.A.S.	3172526	10264493	MONTEAGUDO	00597	C1437EVK	CAPITAL FEDERAL	MIGUEL ANGEL BERROSPI CARTOLIN	A	0
2376	E.R.A.S.	3179047	10267623	CAMPICHUELO	2035	B1869BIM	GERLI (AV)	NELIDA GUERRERO	A	0
2283	E.R.A.S.	3232011	10322393	GARCIA CUEVA GUSTAVO CAP	3602	B1827GAB	VILLA ALBERTINA	MARIA ELENA HUARAYO GUTIERREZ	A	0
2388	E.R.A.S.	3249790	10328390	PUAN	00540	C1406CQL	CAPITAL FEDERAL	ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIO	A	0
2388	E.R.A.S.	3257850	10332433	ALIGHIERI DANTE (LMS)	5570	B1765LPZ	ISIDRO CASANOVA (	LUIS CHAZARRETA	A	0
2390	E.R.A.S.	3258517	500730	CONCORDIA	05395	C1419AOY	CAPITAL FEDERAL	IRRAZABAL CELSA L	A	0
2285	E.R.A.S.	3259528	10338561	IRIGOYEN PEDRO	102	B1848CND	MINISTRO RIVADAVI	CIPRIANO DAMIAN SUAREZ	A	0
2384	E.R.A.S.	3264390	10342862	BO 1990 VIVIENDAS 1	3330	B1842---	MONTE GRANDE	HORACIO ROJAS	A	0
2369	E.R.A.S.	3279805	10359563	VERA	00730	C1414AOP	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2399	E.R.A.S.	3281925	10361236	BERNARDEZ FRANCISCO LUIS	2594	B1712FIB	CASTELAR	MARIA BURGOS FERREL	A	0
2399	E.R.A.S.	3286903	10365940	EL VOLCAN	1756	B1803CAD	LA UNION	FRIDA REYNA CHAVARRÍA ÁLVAREZ	A	0
2395	E.R.A.S.	3318513	10401276	SAN LORENZO (EZ)	235	B1804BGE	JOSE MARIA EZEIZA	ARCADIO ALOMO	A	0
2360	E.R.A.S.	3324620	10407497	VERNET LUIS (LMS)	5250	B1757PBZ	GREGORIO DE LAFI	AURORA FELISA BAYGORRIA	A	0
2366	E.R.A.S.	3351675	1628844	POLA	01483	C1440DAO	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2382	E.R.A.S.	3371206	10448243	CASEROS AV	02042	C1264AAN	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2338	E.R.A.S.	3381014	10456502	VALETTE LUCIANO AV	00352	B1842EAQ	MONTE GRANDE	ROMINA ELIZABETH BICCHIERAI	A	0
2359	E.R.A.S.	3410364	2678569	DORREGO MANUEL CNEL	01638	B1636FKB	OLIVOS	MARTIN BONCAGNI	A	0
2380	E.R.A.S.	3439112	10511783	GARCIA MEROU M (LMS)	6346	B1757ACP	GREGORIO DE LAFI	NORMA SANSIMO	A	0
2376	E.R.A.S.	3454789	10527636	DE MATURANA JOSE	05038	C1417GKH	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2313	E.R.A.S.	3458962	10531339	LINIERS (EZ)	1306	B1804FCZ	JOSE MARIA EZEIZA	CELINA CABRERA	A	0
2307	E.R.A.S.	3478255	10549675	RISSO ROMILDO POETA	00492	B1688BID	VILLA SANTOS TESE	PATRICIA ROBORTELLA	A	0
2396	E.R.A.S.	3481864	1593294	AZOPARDO	01539	C1107AEA	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2310	E.R.A.S.	3489134	2545243	SALVIGNY	01822	C1406IQD	CAPITAL FEDERAL	CONS. DE PROP. SALVIGNY	A	0
2374	E.R.A.S.	3489165	2622041	TERRADA	02335	C1416ARY	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2399	E.R.A.S.	3496298	10563169	GIFFORD BONIFACIO	1336	B1838CGH	LUIS GUILLON	ZUNILDA MABEL VERA	A	0
2384	E.R.A.S.	3499374	10565609	LOS INDIOS	2258	B1712KUV	CASTELAR	ANTONIO FIGUEROA	A	0
2379	E.R.A.S.	3506451	1390348	EZEIZA	02649	C1419FTG	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2389	E.R.A.S.	3535395	10594308	OLIVERA DOMINGO	1656	B1714GUX	ITUZAINGO SUR	LIBERTARIA GODOY	A	0
2400	E.R.A.S.	3541542	1021396	CHARCAS	03075	C1425BMK	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2248	E.R.A.S.	3544733	182178	FALCON RAMON L CNEL	02559	C1406GNY	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2373	E.R.A.S.	3550295	2084322	GUEMES	04550	C1425BLH	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2375	E.R.A.S.	3552964	10606918	BOUCHARD HIPOLITO	6301	B1844---	SAN JOSE (AB)	PATRICIA MABEL CARABAJAL	A	0
2400	E.R.A.S.	3556551	2092053	PRINGLES	00760	C1183AEN	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2336	E.R.A.S.	3559211	808699	LAMARCA EMILIO	01265	C1407DFY	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2386	E.R.A.S.	3559265	1748971	DIAZ DE GUZMAN RUY	00101	C1267ACC	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2324	E.R.A.S.	3560126	2050847	CORDOBA AV	05943	C1414BBF	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2379	E.R.A.S.	3560941	628743	BEIRO FRANCISCO AV	03888	C1419HZN	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2369	E.R.A.S.	3562138	1349085	VIRGILIO	01321	C1407BQY	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2402	E.R.A.S.	3565004	2213765	ALSINA ADOLFO	02603	C1090AAQ	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2379	E.R.A.S.	3574731	10622612	DEL MAESTRO ISABEL	1504	B1681---	WILLIAM C MORRIS	CLAUDIA MABEL VILLEGAS	A	0
2402	E.R.A.S.	3583221	10627316	RIVERA FRUCTUOSO GRAL	02150	C1437GRD	CAPITAL FEDERAL	JUAN CARDENAS TAPIA	A	0
2336	E.R.A.S.	3590291	10632594	ALVAR NUÑEZ	120	B1688COD	VILLA SANTOS TESE	FERNANDO SALDIVIA	A	0
2376	E.R.A.S.	3594902	10637125	DE LOS INMIGRANTES AV	02509	B1625AZC	BELEN DE ESCOBA	MEIER ELENA	A	0
2340	E.R.A.S.	3633451	10676278	ALVEAR CARLOS M DE	2548	B1663---	SANTA MARIA	SOFIA DELIA VEGA	A	0
2285	E.R.A.S.	3642107	10683839	EL ZONDA	2047	B1663---	SANTA MARIA	NELIDA MASCARO	A	0
2397	E.R.A.S.	3660068	10701379	GUATEMALA	640	B1667---	TIERRAS ALTAS	LAVALLOL BROCHERO	A	0
2378	E.R.A.S.	3665076	10706266	CALLE 24	1	B1862LKA	GUERNICA	ARROYO ALEJANDRO DOMINGO	A	0
2385	E.R.A.S.	3666549	10708523	HONDURAS	77	B1862DCA	GUERNICA	ESCRIBA AUQUI ISABEL	A	0

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2399	E.R.A.S.	3667701	10709130	SANTIAGO DEL ESTERO	652	B1862SCN	GUERNICA	SILVIA ELISABET ALMIRON	A	0
2394	E.R.A.S.	3668792	10709679	CALLE 120	2194	B1862BKD	GUERNICA	ANTONIA VEGA PAREDES	A	0
2308	E.R.A.S.	3694786	10734346	DEMOCRACIA	01022	B1743MYD	MORENO	STELLA MARIS CONTRERAS	A	0
2393	E.R.A.S.	3697908	10737618	BALBI MANUEL R	385	B1744DAG	MORENO	ALICIA ESTELA VANZINI	A	0
2377	E.R.A.S.	3698697	10739085	MIGUEL ANGEL	2119	B1744DUQ	MORENO	ALICIA CASTILLO	A	0
2384	E.R.A.S.	3702189	10742864	GNECCO EMILIO F INT	02961	B1736---	TRUJUI	CARMEN NOLASCO	A	0
2401	E.R.A.S.	3724683	10765320	MERLO	454	B1742EGJ	PASO DEL REY	CARLOS ROSA	A	0
2359	E.R.A.S.	3725394	10766438	PELLICO ARMANDO CJAL	01318	B1742ECH	PASO DEL REY	GLADYS NELLI BRAVO DE JESUS	A	0
2400	E.R.A.S.	3729743	10769478	USPALLATA	6927	B1743BAC	MORENO	GERARDO JOSÉ PINTO	A	0
2357	E.R.A.S.	3741874	10781806	MERLO FRANCISCO DE	656	B1722IUN	MERLO	LUCIANO JAVIER MAREMMA	A	0
2337	E.R.A.S.	3752904	10794366	BALCARCE	335	B1722DVG	MERLO	AGUSTIN GARRIDO	A	0
2380	E.R.A.S.	3771780	10810666	CAMPICHUELO	3168	B1722PFB	MERLO	TEIJIDO ANTONIO	A	0
2391	E.R.A.S.	3805848	10844350	MACIEL	790	B1722GLL	MERLO	HORTENCIA ROCA	A	0
2367	E.R.A.S.	3816714	10858121	ILLIA ARTURO U PRES	246	B1887FSF	SAN JUAN BAUTISTA	PATRICIA ALEJANDRA SOSA	A	0
2368	E.R.A.S.	3816824	10858436	URQUIZA JUSTO JOSE DE GRAL	243	B1887FZE	SAN JUAN BAUTISTA	ANIBAL MOREIRA	A	0
2384	E.R.A.S.	3820216	10862869	ABRAHAM JUAN OMAR SUBTTE	2240	B1888HFZ	SAN JUAN BAUTISTA	GARCIA OFELIA	A	0
2374	E.R.A.S.	3823702	10864696	MISTRAL GABRIELA	3330	B1888CCT	SAN JUAN BAUTISTA	WALTER EZEQUIEL NOBLEGA	A	0
2402	E.R.A.S.	3832379	10873695	SUDAMERICA	645	B1887FKK	SAN JUAN BAUTISTA	CLAUDIA FABIANA AROCENA	A	0
2375	E.R.A.S.	3859973	10900625	LINIERS SANTIAGO DE	1265	B1853---	VILLA VATTEONE	MILLA KARINA CLAUDIA	A	0
2402	E.R.A.S.	3870139	10912391	ALTA GRACIA	1601	B1889BAC	BOSQUES	MARIA MERCEDES VILQUEZ	A	0
2367	E.R.A.S.	3885117	10924753	CHIMBORA	4673	B1713BDA	VILLA GOBERNADOI	MARIA ESTER NUÑEZ	A	0
2355	E.R.A.S.	3897360	10943318	HAEDO	133	B1662CJC	MUÑIZ	OSEAS HECTOR IGLESIAS LOSADA	A	0
2376	E.R.A.S.	3927488	10982944	CAMPICHUELO	815	B1722PDE	MERLO	ROSARIO PROFUMO	A	0
2391	E.R.A.S.	3962408	11017365	PEREZ GALDOS BENITO	102	B1889---	BOSQUES	DOMINGO ANTONIO VALDEZ	A	0
2382	E.R.A.S.	3969621	11025926	CASTAÑARES AV	4213	C1407KUJ	CAPITAL FEDERAL	MABEL LEONOR CHARRA	A	0
2341	E.R.A.S.	3972323	11038492	GUTIERREZ RICARDO (B)	1942	B1621---	BENAVIDEZ	MARIA DEL CARMEN SUAREZ	A	0
2374	E.R.A.S.	3975177	11032964	LACARRA AV	02049	C1407JRO	CAPITAL FEDERAL	MARIA SELVA ARECO MARTINEZ	A	0
2373	E.R.A.S.	3975186	11032968	LACARRA AV	02049	C1407JRO	CAPITAL FEDERAL	DELGADO ANGULO MARY INES	A	0
2389	E.R.A.S.	3982044	11038920	SUIPACHA	979	B1804---	JOSE MARIA EZEIZA	CHAVEZ ALIAGA	A	0
2384	E.R.A.S.	3992457	11046304	DIAZ DE SOLIS JUAN	1917	B1686---	HURLINGHAM	NOEMI AZARI	A	0
2279	E.R.A.S.	3997913	11049926	ZAÑARTU	01520	C1406IID	CAPITAL FEDERAL	DELFINA AREVALO	A	0
2360	E.R.A.S.	4026708	11075496	MARTIN FIERRO (EJ)	335	B1805---	EL JAGUEL	RAFAEL EDGARDO VIDAL	A	0
2379	E.R.A.S.	4028868	11078186	O'BRIEN	01259	C1137ABC	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2373	E.R.A.S.	4030028	368779	ASUNCION	02602	C1419HFL	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2354	E.R.A.S.	4041455	11086262	VICARIO LEONA SENDERO	4376	C1437CNL	CAPITAL FEDERAL	ALFREDO ROBERTO ALVAREZ	A	0
2373	E.R.A.S.	4042704	11086754	GOMEZ MIRANDA FLORENTINA S	4384	C1437CNL	CAPITAL FEDERAL	JULIO CESAR JUSTINIANO PANIAGUA	A	0
2296	E.R.A.S.	4045738	1492726	DE MONTALVO FERNANDO	00128	C1427EOB	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2376	E.R.A.S.	4045824	890946	MAGARIÑOS CERVANTES ALEJA	05160	C1407MLL	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2159	E.R.A.S.	4045862	10254728	MOLIERE	00863	C1407BTO	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2398	E.R.A.S.	4051007	688279	FERROCARRIL	06373	C1408IEA	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2337	E.R.A.S.	4051338	2234515	BONIFACIO JOSE	00174	C1424CHD	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2360	E.R.A.S.	4060272	11099909	PAZ JOSE MARIA GRAL	00000(	B1888EID	SAN JUAN BAUTISTA	ROBERTO LUJAN SERENO	A	0
2373	E.R.A.S.	4061666	2061719	14 DE JULIO	00195	C1427CJC	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2402	E.R.A.S.	4064566	11106399	CASTELLI (ING)	01150	B1623---	INGENIERO MASCHI	CESAR FADER	A	0
2135	E.R.A.S.	4076997	2072376	CASTRO	01126	C1237AAB	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2377	E.R.A.S.	4077177	1113224	CORTINA	02771	C1419CQA	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2369	E.R.A.S.	4078396	11163230	IGUAZU	01835	C1437EUS	CAPITAL FEDERAL	IRINEO VEGA MONGES	A	0
2334	E.R.A.S.	4079400	819051	MILLER	02367	C1431GDK	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2357	E.R.A.S.	4091150	1989616	NAON ROMULO S DR AV	02134	C1430EPH	CAPITAL FEDERAL	ROSA SUSANA CONTRERAS	A	0
2375	E.R.A.S.	4093396	11129108	ACOSTA	01531	B1702---	CIUDADELA	JOSE LUIS MARTINEZ	A	0
2379	E.R.A.S.	4106531	11157866	ZORRILLA ALBERTO	04520	C1439---	CAPITAL FEDERAL	WANDA ADRIANA SOL BENITEZ SIVORI	A	0
2364	E.R.A.S.	4149904	11184007	O'BRIEN (B)	5629	B1621---	BENAVIDEZ	MARIA ALEJANDRA QUIROGA	A	0
2400	E.R.A.S.	4162747	2468597	AÑASCO	02468	C1416CUH	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2144	E.R.A.S.	4162925	2528766	CONDARCO	01447	C1416AQG	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2353	E.R.A.S.	4162976	2564977	BOLIVIA	02055	C1416ANU	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2381	E.R.A.S.	4163143	2665951	LAMAS ANDRES	02014	C1416BIT	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2369	E.R.A.S.	4163201	2675041	GARCIA JUAN AGUSTIN	01256	C1416EKF	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2384	E.R.A.S.	4163863	2699584	MAGARIÑOS CERVANTES ALEJA	01739	C1416DYI	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2376	E.R.A.S.	4164472	2686621	ARCOS	01737	C1426BGM	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2391	E.R.A.S.	4165129	2696898	ARENAL CONCEPCION	02435	C1426DFC	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2137	E.R.A.S.	4167563	1388696	ALVAREZ THOMAS AV	00833	C1427CCI	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2144	E.R.A.S.	4169201	1772651	O'HIGGINS	03010	C1429BBF	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2392	E.R.A.S.	4169511	1099002	FREIRE RAMON CAP GRAL	03539	C1429ASM	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2376	E.R.A.S.	4171743	373203	LACROZE FEDERICO AV	03709	C1427EDC	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2378	E.R.A.S.	4172943	560331	EL TROVADOR	03151	C1416DAC	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2389	E.R.A.S.	4173891	237767	GONZALEZ JOAQUIN V	02029	C1407DAM	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2333	E.R.A.S.	4176359	2011806	PICO	04825	C1430CYM	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2361	E.R.A.S.	4176959	934575	SAN FRANCISCO DE ASIS	03086	C1430DXB	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2094	E.R.A.S.	4177078	998647	PACHECO	03157	C1431FJM	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2339	E.R.A.S.	4177341	1505811	TAMBORINI JOSE P	05251	C1431AGM	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2387	E.R.A.S.	4178790	386456	MAURE	03802	C1427EFH	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2400	E.R.A.S.	4179063	288261	BAIGORRIA	04270	C1417FSF	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2398	E.R.A.S.	4179611	450877	FITZ ROY	02435	C1425FVG	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2268	E.R.A.S.	4179812	501447	AGUIRRE	01109	C1414ASW	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2219	E.R.A.S.	4180420	700282	VERA	01248	C1414AOZ	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2382	E.R.A.S.	4180552	738061	OTERO	00387	C1427BMG	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2367	E.R.A.S.	4181025	1266403	ALLENDE	02535	C1417BMG	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2373	E.R.A.S.	4181396	1486228	CORRIENTES AV	05948	C1414AJZ	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2352	E.R.A.S.	4183206	135011	JURAMENTO	01417	C1428DMQ	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2252	E.R.A.S.	4186802	29390	MENDOZA	02551	C1428DKQ	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2343	E.R.A.S.	4187031	209852	ROOSEVELT FRANKLIN D	02261	C1428BOG	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2343	E.R.A.S.	4187031	209854	ROOSEVELT FRANKLIN D	02261	C1428BOG	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2288	E.R.A.S.	4187534	100048	VIDAL	01886	C1428CSB	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
2388	E.R.A.S.	4189110	11194702	MANSILLA LUCIO	02352	B1715---	VILLA GOBERNADOI	JULIO ALBERTO DIAZ	A	0
2313	E.R.A.S.	4193433	11196595	PERETTE CARLOS H	01005	C1104---	CAPITAL FEDERAL	JULIO ARMANDO ROSALES VALERIO	A	0
2373	E.R.A.S.	4193456	11196617	PERETTE CARLOS H	01005	C1104---	CAPITAL FEDERAL	SHARON SANDRA ALVARADO PALOMINO	A	0
2363	E.R.A.S.	4193532	11197091	QUETZAL	00873	C1104---	CAPITAL FEDERAL	MELISA ASCARZA	A	0
2367	E.R.A.S.	4193555	11197114	QUETZAL	00873	C1104---	CAPITAL FEDERAL	MARITZA RAQUEL ASCARZA HILARIO	A	0
2385	E.R.A.S.	4197500	11200879	ASCASUBI HILARIO	02986	B1715---	VILLA GOBERNADOI	ROMINA LILIANA LOPEZ	A	0
2370	E.R.A.S.	4203649	11203811	SAAVEDRA CORNELIO	402	B1662CSJ	MUÑIZ	CAROLINA DE SANTO	A	0
2393	E.R.A.S.	4220485	11251160	SAN LORENZO (ES)	2034	B1625---	BELEN DE ESCOBA	SALINAS	A	0
2396	E.R.A.S.	4231893	11226075	LEBENSOHN MOISES	2855	B1661KKB	BELLA VISTA	VANESA ELIZABETH VARGAS	A	0
2377	E.R.A.S.	4234902	11143981	DE BEAUVOIR SIMONE	01748	C1107---	CAPITAL FEDERAL	MARIA LAURA ANTUNEZ	A	0
2392	E.R.A.S.	4235060	11237080	DE BEAUVOIR SIMONE	01704	C1107---	CAPITAL FEDERAL	EVA MELINA GAASTELU SAENZ	A	0
2367	E.R.A.S.	4235315	11180349	8 DE MARZO	01707	C1107---	CAPITAL FEDERAL	MARGARITA RAMIREZ	A	0
2367	E.R.A.S.	4235696	11235022	PARRA VIOLETA	01765	C1107---	CAPITAL FEDERAL	RAMONA BERNARDITA CARBALLO	A	0
2374	E.R.A.S.	4236570	11234457	SUMAC YMA	00944	C1107---	CAPITAL FEDERAL	CARLOS EULEUTERIO CARDENAS ANTAYHU	A	0
2374	E.R.A.S.	4236573	11234460	SUMAC YMA	00944	C1107---	CAPITAL FEDERAL	MERCEDES MERCADO	A	0

Formato N° 905

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Casos Sociales

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
2376	E.R.A.S.	4236802	11236160	SENDERO BRB E	01760	C1107---	CAPITAL FEDERAL	CESAR AUGUSTO BACA VEGA	A	0
2373	E.R.A.S.	4239763	11235943	DEGLIUOMINI DELIA	01160	C1107---	CAPITAL FEDERAL	YOLANDA GONZALEZ QUIROZ	A	0
2384	E.R.A.S.	4240133	11169741	SENDERO BRB D	01791	C1107---	CAPITAL FEDERAL	VIDALINA WILCAMAGNO FERNANDEZ	A	0
2379	E.R.A.S.	4245709	11239554	YAGUARETÉ	00852	C1104---	CAPITAL FEDERAL	FABIANA GUSZMAN	A	0
2378	E.R.A.S.	4246432	11238593	PERETTE CARLOS H	01125	C1104---	CAPITAL FEDERAL	RUBEN GARCIA	A	0
2308	E.R.A.S.	4246434	11238595	PERETTE CARLOS H	01125	C1104---	CAPITAL FEDERAL	ELIAS CAYO	A	0
2379	E.R.A.S.	4246707	11239495	PERETTE CARLOS H	00851	C1104---	CAPITAL FEDERAL	SILVIA MARICELA PUENTE LEON	A	0
2378	E.R.A.S.	4246710	11239498	PERETTE CARLOS H	00851	C1104---	CAPITAL FEDERAL	ROSALINA BORDON MERELES	A	0
2376	E.R.A.S.	4246739	11239527	PERETTE CARLOS H	00851	C1104---	CAPITAL FEDERAL	JUAN CARLOS MACHUCA VELASQUEZ	A	0
2395	E.R.A.S.	4247012	11238965	PUMA	00825	C1104---	CAPITAL FEDERAL	YESSICA SANDRA ALMERCO LIMAYLLA	A	0
2378	E.R.A.S.	4247072	11239597	PUMA	00874	C1104---	CAPITAL FEDERAL	OFELIA LOVERA	A	0
2308	E.R.A.S.	4247320	11238615	PUMA	00824	C1104---	CAPITAL FEDERAL	KARINA ASCARZA	A	0
2377	E.R.A.S.	4247331	11238626	PUMA	00824	C1104---	CAPITAL FEDERAL	MIGUEL ANGEL BAYLON	A	0
2382	E.R.A.S.	4247475	11238093	SENDERO BRB E	01744	C1107---	CAPITAL FEDERAL	VICTOR JESUS LACOTERA CASTILLO	A	0
2389	E.R.A.S.	4247477	11238095	SENDERO BRB E	01744	C1107---	CAPITAL FEDERAL	JENNIFER GISELA RODRIGUEZ ALBARRACIN	A	0
2389	E.R.A.S.	4247481	11238099	SENDERO BRB E	01744	C1107---	CAPITAL FEDERAL	VICTOR CRISTALDO	A	0
2385	E.R.A.S.	4248923	11241118	PUMA	00875	C1104---	CAPITAL FEDERAL	MARGOT BERNEDO	A	0
2397	E.R.A.S.	4333511	11326645	FREIRE RAMON CAP GRAL	02984	C1429ASB	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3298	E.R.A.S.	26	1689	DUARTE DE PERON EVA	01250	B1872AFB	SARANDI	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3420	E.R.A.S.	1397	129	BELGRANO MANUEL AV	00667	B1870ARE	AVELLANEDA	INSTITUTO MARIA AUXILIADORA	A	0
3340	E.R.A.S.	1482	2887	IRIGOYEN BERNARDO DE DR	00161	B1712HEC	CASTELAR	CLUB MORON SOC CIVIL	A	0
3197	E.R.A.S.	2021	5945	CORDOBA	01901	B1640GVM	MARTINEZ	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	2248	4147	FRANKLIN	00054	C1405DDB	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	2253	3529	HIDALGO	01057	C1405BCQ	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	2258	2482	YRIGOYEN HIPOLITO	03238	C1207ABR	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	2261	2569	INDEPENDENCIA AV	03051	C1225AAM	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	2266	3618	PUAN	00430	C1406CQJ	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3343	E.R.A.S.	2272	4149	MACHADO ANTONIO	00141	C1405DHC	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	2278	4074	RAMOS MEJIA	00841	C1405CAE	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3197	E.R.A.S.	3448	11055	INDEPENDENCIA AV	02161	C1225AAD	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3454	13599	CORRIENTES AV	02038	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3458	13600	AZCUENAGA	00280	C1029AAF	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3462	14242	PASEO COLON AV	00850	C1063ACV	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3468	13571	MORENO	00350	C1091AAH	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3422	E.R.A.S.	3469	3197	DARREGUEYRA	02356	C1425FLQ	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION EL CENTAVO	A	0
3298	E.R.A.S.	3474	5671	BOLIVAR	00233	C1066AAE	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3475	11053	VIAMONTE	00430	C1053ABJ	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3398	E.R.A.S.	3478	2575	ECUADOR	00627	C1214ACI	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION RETORNA ISRAEL	A	0
3298	E.R.A.S.	3479	3200	VIAMONTE	00414	C1053ABJ	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3398	E.R.A.S.	3482	2621	ECUADOR	00649	C1214ACI	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION RETORNA ISRAEL	A	0
3298	E.R.A.S.	3483	8579	RECONQUISTA	00694	C1003ABN	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3487	4757	ALVEAR MARCELO T DE	01835	C1122AAA	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3491	4758	ALVEAR MARCELO T DE	01871	C1122AAA	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	3494	3401	ARMENIA	01366	C1414DKD	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION CULTURAL ARMENIA	A	0
3298	E.R.A.S.	3495	12264	AYACUCHO	01245	C1111AAI	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3499	12655	LAS HERAS GRAL AV	02214	C1127AAR	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3503	13564	PARAGUAY	02151	C1121ABG	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3507	4363	CORDOBA AV	02351	C1120AAF	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3511	14250	ARENALES	01371	C1061AAM	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3520	4761	URIBURU JOSE EVARISTO PRES	00920	C1114AAD	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3305	E.R.A.S.	3557	5124	25 DE MAYO	00217	C1002ABE	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	3560	14116	FIGUEROA ALCORTA PRES AV	02401	C1425CKD	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3197	E.R.A.S.	3563	4318	CORDOBA AV	02120	C1120AAQ	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3305	E.R.A.S.	3827	6139	LYNCH	03737	C1437HOG	CAPITAL FEDERAL	SUC. SAN VICENTE DE PAUL	A	0
3408	E.R.A.S.	4210	2955	24 DE NOVIEMBRE	00454	C1170AAJ	CAPITAL FEDERAL	SOCIEDAD DE SAN JOSE	A	0
3395	E.R.A.S.	4218	3310	24 DE NOVIEMBRE	01655	C1242AAI	CAPITAL FEDERAL	SUC. SAN VICENTE DE PAUL	A	0
3293	E.R.A.S.	4391	2826	RIVADAVIA AV	05652	C1424CEY	CAPITAL FEDERAL	INSTITUTO CULTURAL MARIANISTA	A	0
3399	E.R.A.S.	4437	3634	GUTIERREZ JUAN MARIA	03968	C1425ARF	CAPITAL FEDERAL	A.C.I.S.A.	A	0
3304	E.R.A.S.	4883	14015	PUEYRREDON AV	00645	C1032ABG	CAPITAL FEDERAL	ASOC. HEBREA ARG. DE SOCORROS MUTUOS	A	0
3422	E.R.A.S.	4953	5103	JUNCAL	01260	C1062ABN	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION EL CENTAVO	A	0
3406	E.R.A.S.	5178	4448	83-YAPEYU	02068	B1650BHJ	SAN MARTIN	AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3406	E.R.A.S.	5182	4450	52-BELGRANO	03541	B1650CCI	SAN MARTIN	AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL	A	0
3392	E.R.A.S.	5354	4748	ALVEAR MARCELO T DE	01149	C1058AAQ	CAPITAL FEDERAL	EMBAJADA DE ITALIA	A	0
3414	E.R.A.S.	6383	5030	LOPE DE VEGA	02518	B1675AOJ	JOSE INGENIEROS	CLUB ATLETICO FERROCARRIL GRAL. S.MARTIN	A	0
3324	E.R.A.S.	6393	4105	PASTEUR	00633	C1028AAM	CAPITAL FEDERAL	A.M.I.A.	A	0
3324	E.R.A.S.	6408	12654	URIBURU JOSE EVARISTO PRES	00642	C1027AAN	CAPITAL FEDERAL	A.M.I.A.	A	0
3423	E.R.A.S.	6666	7630	LIBERTADOR DEL AV	01031	B1638BEJ	VICENTE LOPEZ	CIRCULO TROVADOR ASOC. CULTURAL	A	0
3416	E.R.A.S.	7168	7665	VARELA FLORENCIO	01903	B1754JEC	SAN JUSTO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA	A	0
3406	E.R.A.S.	7178	4430	79-AYACUCHO	00044	B1650---	0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	A	0
3406	E.R.A.S.	7179	4603	93-TUCUMAN	00073	B1650---	0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	A	0
3404	E.R.A.S.	7602	6437	CALVO CARLOS	01325	C1102ABA	CAPITAL FEDERAL	CIRCULO SUBOF. DE PREFECTURA NAVAL ARG.	A	0
3384	E.R.A.S.	7842	3397	LAVALLE	00865	C1047AAQ	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION CIVIL IGLESIA INTERNACIONAL D	A	0
3400	E.R.A.S.	7852	3454	LAVALLE	01334	C1048AAH	CAPITAL FEDERAL	SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIM.	A	0
3298	E.R.A.S.	8321	10972	SAN MARTIN AV	05401	C1417DTB	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3299	E.R.A.S.	8328	10864	FERNANDEZ DE ENCISO	04250	C1419GDR	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	8333	10876	HABANA	03855	C1419GRC	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	8339	12342	CUBAS JOSE	03888	C1419GOB	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	8344	12042	SAN MARTIN AV	05285	C1417DSM	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3270	E.R.A.S.	8350	10614	BEIRO FRANCISCO AV	02286	C1419HXO	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	8356	12707	CHORROARIN AV	00168	C1427CWN	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	8846	12777	HOLMBERG	02614	C1430DPB	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3197	E.R.A.S.	8851	13803	GUIRALDES INT	02502	C1428BGA	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3406	E.R.A.S.	9357	12729	BEIRO FRANCISCO AV	02110	C1419HXN	CAPITAL FEDERAL	CLUB ARQUITECTURA ASOC CIVIL	A	0
3332	E.R.A.S.	9391	8392	BOULOGNE SUR MER	00439	B1766FXI	LA TABLADA (LMS)	ASOC. HEBREA ARG. DE SOCORROS MUTUOS	A	0
3410	E.R.A.S.	9535	12143	ALVAREZ JONTE AV	04896	C1407GPP	CAPITAL FEDERAL	UNION RELIGIOSA ISRAELITA V. MITRE	A	0
3405	E.R.A.S.	9984	11249	350 BIS-GARCIA MARTIN (Q)	03429	B1878EFQ	QUILMES ESTE	COOPERATIVA DE TRABAJO 1 DE AGOSTO	A	0
3370	E.R.A.S.	10555	13672	MONTAÑESES	02351	C1428AQK	CAPITAL FEDERAL	F.L.E.N.I.	A	0
3363	E.R.A.S.	10658	13401	BALBIN RICARDO DR AV	04131	C1430AAM	CAPITAL FEDERAL	SOCIEDAD DE SAN JOSE	A	0
3408	E.R.A.S.	10683	9332	BACACAY	02051	C1406GDI	CAPITAL FEDERAL	SOCIEDAD DE SAN JOSE	A	0
3422	E.R.A.S.	11583	15521	TINOGASTA	03455	C1417EIC	CAPITAL FEDERAL	CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE V. DEL PARQUE	A	0
3408	E.R.A.S.	11788	16161	ALBERTI	01541	C1247AAG	CAPITAL FEDERAL	ASOC. YABRUDENSE DE B. Y S. MUTUOS	A	0
3401	E.R.A.S.	11831	15564	GUEVARA	00471	C1427BRI	CAPITAL FEDERAL	FUND. NUEVO HOGAR Y CENTRO	A	0
3412	E.R.A.S.	12105	15198	PERON JUAN D TTE GRAL	02143	C1040AAG	CAPITAL FEDERAL	CLUB VASCO ARGENTINO GURE ECHEA	A	0
3113	E.R.A.S.	16405	2279305	COLOMBRES	01419	C1238AAI	CAPITAL FEDERAL	S.O.C.A.M.G.L Y P	A	0
3415	E.R.A.S.	19125	2330660	AZOPARDO	01422	C1107ADZ	CAPITAL FEDERAL	CONG.SUECA EN BS.AS.	A	0
3352	E.R.A.S.	21496	2072109	HUMBERTO 1	02360	C1229AAL	CAPITAL FEDERAL	FED.ASOC.CRIST.FEMEN.R.A.	A	0
3410	E.R.A.S.	23547	643069	MEXICO	01879	C1222ABA	CAPITAL FEDERAL	PANFILO COCA CLAROS Y OTRA	A	0
3343	E.R.A.S.	24459	2009811	CHILE	02076	C1227AAF	CAPITAL FEDERAL	JORGE VICTOR VALENCIA	A	0
3197	E.R.A.S.	27282	65249	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65250	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65251	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65252	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65253	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65254	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65255	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65256	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65257	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65258	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3419	E.R.A.S.	27282	65259	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65260	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65261	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65262	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3419	E.R.A.S.	27282	65263	CORRIENTES AV	02046	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3298	E.R.A.S.	27284	2132493	CORRIENTES AV	02042	C1045AAP	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3408	E.R.A.S.	29168	812167	SARMIENTO	02130	C1044AAH	CAPITAL FEDERAL	SOCIEDAD DE SAN JOSE	A	0
3387	E.R.A.S.	29517	1456887	ARISMENDI	02682	C1427DLF	CAPITAL FEDERAL	CLUB S Y D VILLA MODELO	A	0
3409	E.R.A.S.	30425	2148692	CHACABUCO	00838	C1069AAR	CAPITAL FEDERAL	TIMON CLUB	A	0
3371	E.R.A.S.	34411	2180240	CONSTITUCION	01779	C1151AAO	CAPITAL FEDERAL	INST.JOSÉ MANUEL ESTRADA	A	0
3390	E.R.A.S.	35404	604606	VENEZUELA	00584	C1095AAL	CAPITAL FEDERAL	SEC.HAC.C/ASOC.AYUD.AL CIEGO	A	0
3413	E.R.A.S.	36669	2190778	LIMA	00481	C1073AAI	CAPITAL FEDERAL	ROBERTO D.OCCHIPINTI Y OT	A	0
3411	E.R.A.S.	37608	2135240	BUCARELLI	01467	C1431DQA	CAPITAL FEDERAL	ASOC. FOMENTO PARQUE CHAS	A	0
3351	E.R.A.S.	38778	821596	BALCARCE	00234	C1064AAF	CAPITAL FEDERAL	CONFERENCIA EPISCOPAL ARG.	A	0
3408	E.R.A.S.	39785	1441515	CARABELAS	00259	C1009AAA	CAPITAL FEDERAL	GONZALEZ LAURA	A	0
3326	E.R.A.S.	40435	1621780	PARANA	00666	C1017AAN	CAPITAL FEDERAL	FOCOMFA	A	0
3347	E.R.A.S.	40729	133538	TUCUMAN	01762	C1050AAJ	CAPITAL FEDERAL	MAGUID NORA B	A	0
3347	E.R.A.S.	41354	1792539	RIOBAMBA	01018	C1116ABF	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION HASTINAPURA	A	0
3369	E.R.A.S.	41528	1848793	JUNIN	01063	C1113AAE	CAPITAL FEDERAL	FED.CIRC.CAT.OBREROS	A	0
3399	E.R.A.S.	41606	2325872	AZCUENAGA	00980	C1115AAD	CAPITAL FEDERAL	S A DE CARDIOLOGIA	A	0
3392	E.R.A.S.	43037	2084757	CALVO CARLOS	03893	C1230ABO	CAPITAL FEDERAL	OBRA CULTURAL SOPEÑA.	A	0
3403	E.R.A.S.	44321	2150626	SARMIENTO	01495	C1042ABA	CAPITAL FEDERAL	SARMIENTO 1499 S.R.L.	A	0
3403	E.R.A.S.	44906	530405	ALSINA ADOLFO	01465	C1088AAK	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACIONITALIANADES.M.	A	0
3091	E.R.A.S.	45337	29157	PERON JUAN D TTE GRAL	02261	C1040AAI	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION ESPIRITISTA CONS.	A	0
3387	E.R.A.S.	45897	1765776	NAON ROMULO S DR AV	03027	C1430EQG	CAPITAL FEDERAL	CLUB SOCIAL Y DEP.EL TABANO ASOC.CIVIL	A	0
3371	E.R.A.S.	46287	2014361	ENTRE RIOS AV	01428	C1133AAP	CAPITAL FEDERAL	INST. JOSE MANUEL ESTRADA	A	0
3385	E.R.A.S.	47092	2315169	RINCON	01300	C1251ACB	CAPITAL FEDERAL	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.	A	0
3347	E.R.A.S.	57577	2302969	SAN JUAN AV	03659	C1233ABG	CAPITAL FEDERAL	RAFFO MARIA ELVIRA	A	0
3324	E.R.A.S.	58466	554472	LAREDO PEDRO PJE PEAT	00129	C1178ACA	CAPITAL FEDERAL	GANDOLFO,CARLOS ANTO	A	0
3390	E.R.A.S.	59336	2121740	PERON JUAN D TTE GRAL	03988	C1198AAX	CAPITAL FEDERAL	A.S.A.C.	A	0
3410	E.R.A.S.	59337	2083667	PERON JUAN D TTE GRAL	03942	C1198AAX	CAPITAL FEDERAL	LA CASA DE RONALD MC. DONALD	A	0
3387	E.R.A.S.	64279	2375272	YERBAL	00176	C1405CDD	CAPITAL FEDERAL	CONFEDERACION ARG.DE SORDOMUDOS	A	0
3412	E.R.A.S.	64501	2401969	OTAMENDI	00228	C1405BRB	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION UNIDA	A	0
3342	E.R.A.S.	65114	2272514	CAMPICHUELO	00472	C1405BOF	CAPITAL FEDERAL	CLUB PREMIER	A	0
3343	E.R.A.S.	70095	2377039	ARANGUREN JUAN FELIPE DR	00334	C1405CRH	CAPITAL FEDERAL	CLUB PREMIER	A	0
3424	E.R.A.S.	70542	2386831	DIAZ VELEZ AV	04972	C1405DCR	CAPITAL FEDERAL	CONS ARQ MUJERESN ISRA	A	0
3397	E.R.A.S.	78031	2398592	SAN LUIS	03358	C1186ACN	CAPITAL FEDERAL	COOP. DE TRABAJO DEL VALLE L	A	0
3421	E.R.A.S.	78933	727029	BILLINGHURST	00658	C1174ABL	CAPITAL FEDERAL	ASOC ISRAELITA ARG. TZEIRE AGUDATH JABAD	A	0
3347	E.R.A.S.	78998	308571	RIVADAVIA AV	03687	C1204AAB	CAPITAL FEDERAL	ALVAREZ OSCAR O	A	0
3391	E.R.A.S.	79421	660727	LAVALLE	03636	C1190AAT	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION CARLOS SOMIGLIANA	A	0
3406	E.R.A.S.	80636	2297064	BRAVO MARIO	00539	C1175ABI	CAPITAL FEDERAL	IGLESIA SADDLEBACK COMMUNITY CHURCH	A	0
3406	E.R.A.S.	81594	1506226	LUGONES	03147	C1430ECK	CAPITAL FEDERAL	SUNDERLAND CLUB	A	0
3384	E.R.A.S.	85244	2222279	RODRIGUEZ MANUEL A GRAL	01191	C1416CMA	CAPITAL FEDERAL	ASOC.CIRCULO ITALO ARG.	A	0
3410	E.R.A.S.	86895	684453	INDEPENDENCIA AV	00986	C1099AAW	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION .E.D .L.V. B.A EUSKALTZALEAK	A	0
3422	E.R.A.S.	93414	2326868	LERMA	00568	C1414AZL	CAPITAL FEDERAL	ASOC. CIVIL PATIO DE ACTORES	A	0
3422	E.R.A.S.	93415	2326836	LERMA	00562	C1414AZL	CAPITAL FEDERAL	ASOC. CIVIL PATIO DE ACTORES	A	0
3418	E.R.A.S.	95373	2268942	VEGA NICETO CNEL AV	05036	C1414BEJ	CAPITAL FEDERAL	ASOC.CULT.ARMENIA	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3416	E.R.A.S.	97345	1495392	ANDONAEGUI	03347	C1431DWS	CAPITAL FEDERAL	CLUB, CALIFORNIA	A	0
3396	E.R.A.S.	97663	357567	AVELLANEDA AV	03885	C1407EJF	CAPITAL FEDERAL	LA FLORESTA ASOC CUL	A	0
3376	E.R.A.S.	98370	1600398	GASCON	01155	C1181ACU	CAPITAL FEDERAL	AS ARG DE SORDOMUDAS	A	0
3402	E.R.A.S.	101183	2123583	NICARAGUA	04441	C1414BVC	CAPITAL FEDERAL	REINALDO R. MICHELI,	A	0
3421	E.R.A.S.	102226	377745	ACOSTA MARIANO	00140	C1407KBD	CAPITAL FEDERAL	ALMIRANTE BROWN COLEGIO NACIONAL	A	0
3405	E.R.A.S.	104396	2115830	SERRANO	01932	C1414---	0	A C I L B A	A	0
3414	E.R.A.S.	105509	1919298	PLAZA	03846	C1430DIP	CAPITAL FEDERAL	J Y P, COGLAN Y VILLA URQUIZ	A	0
3424	E.R.A.S.	105960	2145333	DARREGUEYRA	02370	C1425FLQ	CAPITAL FEDERAL	ASOC EL CENTAVO	A	0
3396	E.R.A.S.	106177	2388264	HONDURAS	05246	C1414BMV	CAPITAL FEDERAL	ASOC. CIV. EVANGELICA COREANA EN ARG.	A	0
3412	E.R.A.S.	106781	2052841	FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO	02254	C1425FOF	CAPITAL FEDERAL	KURATA, KATSUTOSHI	A	0
3318	E.R.A.S.	112667	2123028	PEDRAZA MANUELA	05139	C1431AJI	CAPITAL FEDERAL	C S Y D PINOCHO	A	0
3397	E.R.A.S.	119055	743890	FONROUGE	00068	C1408HFB	CAPITAL FEDERAL	CENTRO RESIDENTES PAMPEANOS	A	0
3415	E.R.A.S.	119924	558879	GOMEZ VALENTIN	03357	C1191AAK	CAPITAL FEDERAL	CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO HOMERO	A	0
3393	E.R.A.S.	120563	1797701	SOLER	03483	C1425BWE	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION HEMOFILIA	A	0
3419	E.R.A.S.	121462	1068510	MADERO	00247	C1408BRC	CAPITAL FEDERAL	DORA DEVOTO	A	0
3392	E.R.A.S.	125998	294576	LARREA JUAN	00350	B1832IMH	LOMAS DE ZAMORA	ASOCIACION CIVIL CENTRO CULTURAL Y	A	0
3380	E.R.A.S.	126687	146671	VIAMONTE	00877	C1053ABQ	CAPITAL FEDERAL	JURREBASO V.	A	0
3392	E.R.A.S.	130698	972602	ALBERDI JUAN BAUTISTA AV	06159	C1440AAM	CAPITAL FEDERAL	COOP.DE TRABAJO LOS CABRITOS LTDA	A	0
3406	E.R.A.S.	132264	2066594	LUGONES	03151	C1430ECK	CAPITAL FEDERAL	SUNDERLAND CLUB	A	0
3426	E.R.A.S.	132556	2166884	PICO	03540	C1430CWD	CAPITAL FEDERAL	ASOC.VECINAL LOMAS DE SAAVED	A	0
3406	E.R.A.S.	147126	744261	OLAZABAL AV	01778	C1428DGV	CAPITAL FEDERAL	SCHROTT ROSA NOEMI	A	0
3352	E.R.A.S.	148736	651051	AGUIRRE	01272	C1414ASZ	CAPITAL FEDERAL	ESPACIO AGUIRRE 1270 ASOCIACION CIVIL	A	0
3419	E.R.A.S.	150141	335380	SAENZ ANTONIO	00749	B1832HUO	LOMAS DE ZAMORA	CRUZ ROJA ARG	A	0
3397	E.R.A.S.	150913	37278	ARDOINO GABRIEL DR	00430	B1704EIJ	RAMOS MEJIA	CLUB SAN HUMBERTO	A	0
3386	E.R.A.S.	153855	648735	GUEVARA	00035	C1427BRA	CAPITAL FEDERAL	CLUB TINETENSE RES.ASTURIANA	A	0
3360	E.R.A.S.	155113	343765	PORTELA FRANCISCO	00970	B1832HXT	LOMAS DE ZAMORA	CENTRO DE JUBILADOS 1+DE MAY	A	0
3406	E.R.A.S.	160675	1636816	HUMBOLDT	01420	C1414CTL	CAPITAL FEDERAL	PIANTANIDA, CAYETANO	A	0
3408	E.R.A.S.	163472	2024313	BONPLAND	01975	C1414CMY	CAPITAL FEDERAL	ARZOBISPADO DE BS. AS.	A	0
3399	E.R.A.S.	169955	1956851	ALVEAR MARCELO T DE	02302	C1122AAL	CAPITAL FEDERAL	SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGIA	A	0
3399	E.R.A.S.	169962	1956855	ALVEAR MARCELO T DE	02302	C1122AAL	CAPITAL FEDERAL	SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGIA	A	0
3364	E.R.A.S.	182779	672420	MORETO	00814	C1407IYR	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION EVANGELICA	A	0
3420	E.R.A.S.	190572	44439	54-LAVALLE (Q)	00811	B1878FUQ	QUILMES ESTE	CHAIA ALBERTO MIGUEL	A	0
3417	E.R.A.S.	198138	882847	25-GARAY	00276	B1878IOF	QUILMES ESTE	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALUMNI	A	0
3415	E.R.A.S.	201950	433276	PIAGGIO A MONS	00661	B1832DKM	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3388	E.R.A.S.	204465	393781	NEWBERY JORGE	02814	C1426CYB	CAPITAL FEDERAL	CENTRO MONTAÑES	A	0
3397	E.R.A.S.	211570	1203002	EL SALVADOR	05470	C1414BQB	CAPITAL FEDERAL	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DEMALDO	A	0
3370	E.R.A.S.	213513	2049375	BOCAYUVA QUINTINO	00805	C1216AAG	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION CIVIL ANANDA MARGA PRACARAK S	A	0
3387	E.R.A.S.	220026	463659	LOPEZ VICENTE FIDEL	00789	B1834GKO	TEMPERLEY	SOCIEDAD ITALIANA DE SOC. MUT.	A	0
3402	E.R.A.S.	233087	483525	SUIPACHA	00250	B1834---	0	BETANIA ENCUENTRO DE NIÑOS ESPECIALES	A	0
3420	E.R.A.S.	237533	67673	353-LOPEZ VICENTE AV (Q)	00181	B1878DUB	QUILMES ESTE	ROSA SALGADO	A	0
3420	E.R.A.S.	237535	67675	353-LOPEZ VICENTE AV (Q)	00191	B1878DUB	QUILMES ESTE	ROSA SALGADO	A	0
3422	E.R.A.S.	245272	501195	COLON	1102	B1834HMX	TEMPERLEY	COLON FOOTBOL CLUB	A	0
3414	E.R.A.S.	246103	70969	309-SANCHEZ JOSE MARIA OF	00165	B1878CHC	QUILMES ESTE	CARIDAD EUG IGLESIAS	A	0
3422	E.R.A.S.	248830	506521	COLON	1101	B1834HMW	TEMPERLEY	COLON FUTBOL CLUB	A	0
3387	E.R.A.S.	263006	521223	LAMADRID	00528	B1832HDL	LOMAS DE ZAMORA	A.P.E.A.D.ASOC.CIVIL	A	0
3347	E.R.A.S.	265425	524978	SALGUERO	00063	B1832AED	LOMAS DE ZAMORA	CLUB G Y ESGRIMA DE	A	0
3379	E.R.A.S.	271260	685441	INDEPENDENCIA AV	01259	C1099AAM	CAPITAL FEDERAL	INAS ARGENTINA	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3387	E.R.A.S.	278557	512970	LEGUIZAMON MARTINIANO	03567	C1439FRM	CAPITAL FEDERAL	ASOC UNION VECINAL DE FOMENTO GRAL PAZ	A	0
3413	E.R.A.S.	285248	327446	48-MORENO	00173	B1650---	0	SOCORROS MUTUOS SOC ARGENTIN	A	0
3420	E.R.A.S.	298788	97598	254-CIUDADELA	01153	B1876DFA	BERNAL ESTE	APHE ASOCIACIÓN DE PADRES	A	0
3424	E.R.A.S.	305220	352646	56-MATHEU	03728	B1650CSL	SAN MARTIN	ADMINIST DE CONSORCIO	A	0
3347	E.R.A.S.	312582	2408429	GUEMES	02973	C1425BKA	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION HASTINAPURA	A	0
3405	E.R.A.S.	315383	709312	TRES ARROYOS	03861	C1407EZK	CAPITAL FEDERAL	ASOC FOM CUL B P	A	0
3387	E.R.A.S.	316457	1222132	SAN MARTIN	00663	C1004AAM	CAPITAL FEDERAL	FIGUEROA JULIO ENRIQUE	A	0
3398	E.R.A.S.	320086	371750	93-TUCUMAN	00028	B1650---	0	ASOC.MUSICA EN SAN MARTIN	A	0
3405	E.R.A.S.	320089	371753	93-TUCUMAN	02171	B1650BPA	SAN MARTIN	ASOCIACION MUSICA EN SAN MARTIN	A	0
3413	E.R.A.S.	325869	379268	93-TUCUMAN	00085	B1650---	0	SOC. ITALIANA SOCORROS MUTUOS	A	0
3415	E.R.A.S.	326903	112719	141-PRINGLES (B)	01230	B1877AFH	DON BOSCO	CLUB SOC Y DEP DON BOSCO	A	0
3414	E.R.A.S.	326907	112721	106-PILCOMAYO	00044	B1877BTB	DON BOSCO	CLUB SOC Y DEP DON BOSCO	A	0
3413	E.R.A.S.	327671	382208	93-PELLEGRINI	00030	B1650---	0	SOC. ITALIANA DE SOC MUTUOS	A	0
3414	E.R.A.S.	330734	114430	141-PRINGLES (B)	01230	B1877AFH	DON BOSCO	CLUB SOC Y DEP DON BOSCO	A	0
3413	E.R.A.S.	330805	337024	SASTRE MARCOS	03244	C1417FYN	CAPITAL FEDERAL	GESUALDO CARIA	A	0
3412	E.R.A.S.	331272	386473	95-CASEROS	02564	B1651GYB	SAN MARTIN	TACYP	A	0
3425	E.R.A.S.	331877	277383	BAIGORRIA	03373	C1417FRM	CAPITAL FEDERAL	ASOC VECINAL DEL PAR	A	0
3345	E.R.A.S.	340973	317090	MATANZA	03500	B1825FCR	MONTE CHINGOLO	CLUB S D COLUMBIA	A	0
3408	E.R.A.S.	342325	318667	ACEVEDO MANUEL A DE	03901	B1825BQK	MONTE CHINGOLO	CLUB ESTRELLA DEL SUR	A	0
3397	E.R.A.S.	347189	123086	148-CHACABUCO	00835	B1876AOQ	BERNAL ESTE	SOCIEDAD FOMENTO BERNAL ESTE	A	0
3396	E.R.A.S.	348032	2065420	ALSINA ADOLFO	01450	C1088AAL	CAPITAL FEDERAL	LAURA CRISTINA MUSA	A	0
3403	E.R.A.S.	348040	123625	CERRITO 119	00380	B1876---	0	ASOC ITALIANA EX-COMBATIENTES	A	0
3402	E.R.A.S.	350155	619866	FRAY MAMERTO ESQUIU	00399	B1834---	0	CON JESUS BETANIAENCUENTRO DE NIÑOS ESPE	A	0
3403	E.R.A.S.	357971	627834	TRIUNVIRATO	01208	B1834BUR	TEMPERLEY	CLUB J DEL SUD	A	0
3419	E.R.A.S.	359085	628933	COCHABAMBA	00950	B1828ILT	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3411	E.R.A.S.	365010	186452	DE MAYO AV	00056	B1704BUN	RAMOS MEJIA	CASA AUXILIO DE R MEJIA	A	0
3418	E.R.A.S.	366644	978842	142-BELGRANO (B)	00450	B1876AFJ	BERNAL ESTE	ASOC. CULTURAL MARIANO MORENO	A	0
3425	E.R.A.S.	372533	354064	SARMIENTO DOMINGO F PRES	01384	B1824AMJ	LANUS ESTE	CENTRO ASTURIANO LAN	A	0
3424	E.R.A.S.	379848	362903	LAS PIEDRAS	03237	B1826DKE	REMEDIOS DE ESCALADA (L)	S DE FOMENTO V PELLERANO	A	0
3409	E.R.A.S.	379860	649221	PUIG LUIS AV	00563	B1834---	0	CIRC.CATOLICO OBREROS TUR	A	0
3385	E.R.A.S.	380544	137762	132-RODRIGUEZ PEÑA	00026	B1876BEB	BERNAL ESTE	CLUB CUL Y DEP VLADI	A	0
3414	E.R.A.S.	381271	507321	ALSINA ADOLFO	01437	C1088AAK	CAPITAL FEDERAL	OFICINA SERVICIOS GENERALES	A	0
3414	E.R.A.S.	381277	507323	ALSINA ADOLFO	01437	C1088AAK	CAPITAL FEDERAL	OFICINA SERVICIOS GENERALES	A	0
3414	E.R.A.S.	381280	507325	ALSINA ADOLFO	01437	C1088AAK	CAPITAL FEDERAL	OFICINA SERVICIOS GENERALES	A	0
3363	E.R.A.S.	382459	365670	VIAMONTE JUAN JOSE GDOR GRAL	02559	B1822CHA	VALENTIN ALSINA	SOC SAN JOSE	A	0
3420	E.R.A.S.	386494	370413	DEHEZA GRAL	03166	B1826GIX	REMEDIOS DE ESCALADA (L)	CLUB LUZ Y ARTE	A	0
3381	E.R.A.S.	390492	374646	REPUBLICA DEL LIBANO	00363	B1823DJE	GERLI (L)	SOC DE FOM VILLA ANG	A	0
3394	E.R.A.S.	391477	661511	ALBERTI	00190	B1832HJO	LOMAS DE ZAMORA	LIGA ARG. CONTRA CANCER	A	0
3412	E.R.A.S.	404495	173564	BERNALDES	01571	C1407CTI	CAPITAL FEDERAL	SZYR MIGUEL Y OT	A	0
3408	E.R.A.S.	408145	403339	TUCUMAN	02805	B1824KBO	LANUS ESTE	OCON, DE LUCA, PAROD	A	0
3410	E.R.A.S.	410028	892739	ACOSTA MARIANO	01544	C1407KCF	CAPITAL FEDERAL	SOC FOMENTO M ACOSTA	A	0
3373	E.R.A.S.	410795	406674	SUIPACHA	03025	B1826GOS	REMEDIOS DE ESCALADA (L)	CLUB SOC Y DEP SIGLO XX	A	0
3384	E.R.A.S.	419668	491974	LARRAZABAL AV	00829	C1440CUA	CAPITAL FEDERAL	CLUB LARRAZABAL	A	0
3397	E.R.A.S.	421351	810818	ALBARIÑO	02253	C1440DFG	CAPITAL FEDERAL	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO	A	0
3384	E.R.A.S.	433357	263795	BERMUDEZ	03127	C1417BWY	CAPITAL FEDERAL	CTRO. DE RESID. DE ACERENZA - LUCANIA	A	0
3414	E.R.A.S.	440827	941373	BOYACA AV	00046	C1406BGB	CAPITAL FEDERAL	PROMOVER ASOCIACION MUTUAL	A	0
3387	E.R.A.S.	442083	525808	63-CORDOBA	03276	B1651EIF	SAN ANDRES	SOC. DE FOM. SAN ANDRES	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3159	E.R.A.S.	452914	307873	MORON	02581	C1406FVE	CAPITAL FEDERAL	YU FANG CHIU	A	0
3399	E.R.A.S.	470622	556579	57-BALLESTER	05065	B1653BAI	VILLA BALLESTER	CENTRO UNIVERSITARIO	A	0
3347	E.R.A.S.	476957	677691	BONIFACIO JOSE	02372	C1406GXZ	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION NASTINAPURA	A	0
3415	E.R.A.S.	477964	747189	RINCON	00565	B1828IGK	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3402	E.R.A.S.	478496	748102	SUIPACHA	00240	B1834---	0	BETANIA ENCUENTRO DE NIÑOS E.	A	0
3346	E.R.A.S.	486898	84437	LAVALLE	01141	C1048AAC	CAPITAL FEDERAL	HERMAN ABRAHAM	A	0
3385	E.R.A.S.	487725	210804	FALCON RAMON L CNEL	02750	C1406GOD	CAPITAL FEDERAL	AGRUPAC.FOLKLORICA EL PIAL	A	0
3339	E.R.A.S.	512808	172570	RIVERA INDARTE AV	00369	C1406DXG	CAPITAL FEDERAL	ASOC. BENEF. CRIST. PRODEIN	A	0
3416	E.R.A.S.	512900	783953	LAUTARO	00801	B1834---	0	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3396	E.R.A.S.	517645	606601	65-INDEPENDENCIA	05044	B1653BOJ	VILLA BALLESTER	IGLESIA E.LUTERANA UNIDA	A	0
3363	E.R.A.S.	523016	212654	316-12 DE OCTUBRE (RP 49)	03401	B1879ABE	QUILMES OESTE	SOCIEDAD DE SAN JOSE HOGAR OLMOS	A	0
3415	E.R.A.S.	532087	807058	CAAGUAZU	1001	B1834JKU	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3387	E.R.A.S.	535420	978120	BOGOTA	04301	C1407ESU	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION CIVIL ESCUELA LIBRE MICAEL	A	0
3387	E.R.A.S.	535741	722867	GALLARDO	00616	C1408BSL	CAPITAL FEDERAL	ASOSV Y C B ROLDAN	A	0
3386	E.R.A.S.	537696	629058	24-BUENOS AIRES	04458	B1650HFD	SAN MARTIN	IGLESIA EVANG LUTERANA	A	0
3385	E.R.A.S.	548556	514813	ALBERDI JUAN BAUTISTA AV	04563	C1407GZM	CAPITAL FEDERAL	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.	A	0
3415	E.R.A.S.	550879	274281	PAZ GRAL AV	17400	C1439HNT	CAPITAL FEDERAL	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.	A	0
3416	E.R.A.S.	557250	837951	FALLIERES	02328	B1821FBB	VILLA FIORITO	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3397	E.R.A.S.	586697	589735	HONDURAS	02056	B1823CCL	GERLI (L)	CLUB S Y D ELEVACION	A	0
3418	E.R.A.S.	590887	259670	875-CALLE 875	04464	B1855CXR	VILLA LA FLORIDA	CARLOS ENRIQUE Y OTRAS CHEVALIER	A	0
3421	E.R.A.S.	595662	253355	HELGUERA	02329	C1417CQC	CAPITAL FEDERAL	A.I.A. TZEIRE A. JABAD	A	0
3421	E.R.A.S.	595664	192754	HELGUERA	02333	C1417CQC	CAPITAL FEDERAL	A.I.A. TZEIRE A. JABAD	A	0
3387	E.R.A.S.	601371	305592	SAN BLAS	04577	C1407FTY	CAPITAL FEDERAL	CLUB ATLETICO NUESTRO BUENOS AIRES	A	0
3390	E.R.A.S.	615055	98936	NAVARRO	02325	C1419HSE	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION REGALBUTESE	A	0
3410	E.R.A.S.	615100	493585	SASTRE MARCOS	03256	C1417FYN	CAPITAL FEDERAL	C.S.Y.D. PARQUE	A	0
3423	E.R.A.S.	616853	918383	ARAGUAYA	00937	B1836GYS	LLAVALLOL	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3410	E.R.A.S.	617554	624123	PALLARES J SDOR	00747	B1823BXE	GERLI (L)	CTRO.JUB.Y PENS.LANUS O.CLARID	A	0
3132	E.R.A.S.	627842	2258799	ROCA JULIO A PRES AV	00584	C1067ABN	CAPITAL FEDERAL	FUND. T.E.A. TRABAJO, EDUC, AMBIENTE	A	0
3132	E.R.A.S.	627858	2259317	ROCA JULIO A PRES AV	00584	C1067ABN	CAPITAL FEDERAL	FUND. T.E.A. TRABAJO,EDUC.,AMBIENTE	A	0
3132	E.R.A.S.	627860	2259319	ROCA JULIO A PRES AV	00584	C1067ABN	CAPITAL FEDERAL	FUND. T.E.A. TRABAJO, EDUC, AMBIENTE	A	0
3389	E.R.A.S.	634746	741639	A 125-PERON EVA	02590	B1650AQB	SAN MARTIN	COOP. DE TRABAJO UNIDOS POR EL CALZADO	A	0
3367	E.R.A.S.	661212	314182	383-BLANCO JOSE A	03433	B1879HRC	QUILMES OESTE	ASOCIACION CIVIL CASA REFUGIO BETANIA PA	A	0
3397	E.R.A.S.	661749	314692	384-PALMA DE MALLORCA	03636	B1879HUP	QUILMES OESTE	UNION JUBILADOS CALCHAQUI	A	0
3298	E.R.A.S.	670417	1341201	CHORROARIN AV	00268	C1427CWO	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3397	E.R.A.S.	671323	207108	LAVAISSE BENJAMIN J	03869	C1419BIA	CAPITAL FEDERAL	CIRCULO VILLA DEVOTO	A	0
3385	E.R.A.S.	672826	518781	ARREGUI	06750	C1408AWD	CAPITAL FEDERAL	CLUB ATLETICO VERSAILLES	A	0
3426	E.R.A.S.	675384	1062450	PAZ GRAL AV	09040	C1408FFP	CAPITAL FEDERAL	ASOC.MUT.ESLOV.TRIGLAV	A	0
3408	E.R.A.S.	677477	696759	DAMONTE VICENTE TOMAS	00753	B1823DQM	GERLI (L)	SOC FOM F SARMIENTO	A	0
3340	E.R.A.S.	681241	1262581	FLORIDA	00683	C1005AAM	CAPITAL FEDERAL	FUN.CCNV	A	0
3390	E.R.A.S.	691595	1538706	TALCAHUANO	00481	C1013AAI	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION DE MARTILLER	A	0
3408	E.R.A.S.	698553	501947	FORMOSA	03935	B1754BWU	LA TABLADA (LMN)	SOC FOMENTO CNEL BRA	A	0
3384	E.R.A.S.	712721	848608	A 64-PERON JUAN DOMINGO	05701	B1650JJD	SAN MARTIN	CLUB SAN MARTIN	A	0
3387	E.R.A.S.	733809	255308	URUGUAY	01037	C1016ACA	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION CARI	A	0
3387	E.R.A.S.	733810	255310	URUGUAY	01037	C1016ACA	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION CARI	A	0
3387	E.R.A.S.	733815	255314	URUGUAY	01037	C1016ACA	CAPITAL FEDERAL	CONSEJO ARG. PARA LAS REL. INT.	A	0
3388	E.R.A.S.	782864	1328967	ALZAGA FELIX DE	02752	B1826DBN	REMEDIOS DE ESCALADA (L)	SOC DE FOMENTO J DE	A	0
3426	E.R.A.S.	783780	787869	ALEM LEANDRO N DR	00842	B1708EPD	MORON	CIRCULO DE LA RAZA	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3387	E.R.A.S.	784897	789116	MACHADO BENITO GRAL	00837	B1708EOE	MORON	CIRCULO DE LA RAZA	A	0
3351	E.R.A.S.	788778	2250910	VIALE LUIS	00625	C1416DMC	CAPITAL FEDERAL	SEBASTIAN KIRSZNER	A	0
3392	E.R.A.S.	801366	726665	LINIERS SANTIAGO DE VIRREY	00851	B1824LIM	LANUS OESTE	CLUB UNION VECINAL V	A	0
3390	E.R.A.S.	804623	862273	ANDRADE OLEGARIO	00087	B1641BEA	ACASSUSO	FUNDACION NOSOTROS	A	0
3415	E.R.A.S.	813002	1973442	COLLIVADINO CARLOS DR	00777	B1834INO	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3400	E.R.A.S.	813857	1788258	MANZI HOMERO	02976	C1437CLD	CAPITAL FEDERAL	CLUB JUVENTUD Y ARMONIA	A	0
3400	E.R.A.S.	813863	1742441	TABARE	01299	C1437FHE	CAPITAL FEDERAL	BEJAR ALFONSO Y OTRO	A	0
3416	E.R.A.S.	820850	1438423	WHITE ING	01153	B1644BHM	VICTORIA	CLUB SOCIAL Y DE FOMENTO VICTORIA	A	0
3409	E.R.A.S.	825197	736510	TACUARI	00748	B1824LTF	LANUS OESTE	CIRC. JUB. DOC. DE LANÚS	A	0
3421	E.R.A.S.	825792	815635	SAN MARTIN JOSE DE GRAL AV	02149	B1602BWG	FLORIDA	CLUB SAN MARTIN	A	0
3399	E.R.A.S.	839989	890055	97-PLAZA VICTORINO DE LA	00557	B1672AGK	VILLA LYNCH	CLUB SOCIAL LYNCH	A	0
3418	E.R.A.S.	845674	1742421	EREZCANO AV	02960	C1437AVN	CAPITAL FEDERAL	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
3407	E.R.A.S.	853625	213612	YERBAL	02248	C1406GJZ	CAPITAL FEDERAL	DEUCO DEF. US. Y CONS. ASOC. CIVIL	A	0
3390	E.R.A.S.	859551	1397923	LOPEZ VICENTE (T)	00444	B1648AQP	TIGRE	FUNDACION NOSOTROS	A	0
3393	E.R.A.S.	872402	900484	DORREGO	00359	B1640HTG	MARTINEZ	FUNDACION RIO PINTURAS	A	0
3393	E.R.A.S.	872409	900488	DORREGO	00359	B1640HTG	MARTINEZ	FUNDACIÓN RIO PINTURAS	A	0
3398	E.R.A.S.	872415	900492	DORREGO	00359	B1640HTG	MARTINEZ	FUNDACION RIO PINTURAS	A	0
3384	E.R.A.S.	874016	844344	2DA RIVADAVIA AV	15570	B1706AYQ	HAEDO	CENTRO DE JUBILADOS BARRIO GUEMES	A	0
3412	E.R.A.S.	891010	851940	ESPAÑA	00446	B1602BBH	FLORIDA	ASOC.ARG.MONSEÑOR FRANCOIS	A	0
3340	E.R.A.S.	914088	1504231	AGACES	00272	C1437EAF	CAPITAL FEDERAL	GERMAN ABELARDO LADO	A	0
3340	E.R.A.S.	914090	1506207	AGACES	00280	C1437EAF	CAPITAL FEDERAL	FUND. CCNV	A	0
3384	E.R.A.S.	917207	585798	MALABIA	03652	B1754JJH	SAN JUSTO	CIRCULO ITALIANO DE LOS RESIDENTES DE	A	0
3413	E.R.A.S.	924087	1595311	ALCORTA AMANCIO AV	03333	C1437HUD	CAPITAL FEDERAL	COOP. DE TRABAJO AMASANDO EL FUTURO LTDA	A	0
3389	E.R.A.S.	933940	879083	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE	02064	B1602EFL	FLORIDA	CLUB SOC Y DEP DEFENSORES DE FLORIDA	A	0
3326	E.R.A.S.	943166	1451925	SAN MARTIN LIB GRAL AV (T)	00440	B1648EVR	TIGRE	BIB.POP. SARMIENTO	A	0
3387	E.R.A.S.	949584	786559	SARMIENTO DOMINGO F PRES	00530	B1823DSJ	GERLI (L)	CIDECO	A	0
3388	E.R.A.S.	953389	464208	340-MAZZA SALVADOR DR	02324	B1879CLL	QUILMES OESTE	CENTRO DE JUBILADOS	A	0
3405	E.R.A.S.	953550	2115984	BELGRANO AV	01580	C1093AAQ	CAPITAL FEDERAL	ASOC ARG ING SANITAR	A	0
3401	E.R.A.S.	978210	400855	ENTRE RIOS	00947	B1868BJS	PIÑEYRO	CENTRO DE JUBILADOS	A	0
3401	E.R.A.S.	978215	400858	ENTRE RIOS	00951	B1868BJS	PIÑEYRO	CTRO.JUBILADOS Y PENSIONADOS	A	0
3407	E.R.A.S.	979943	801651	PICO GRAL	01925	B1824CKY	LANUS ESTE	CTRO. JUB. V. PELLER	A	0
3424	E.R.A.S.	984822	804250	9 DE JULIO AV	03225	B1824KKS	LANUS ESTE	SOC VILLA PELLERANO	A	0
3389	E.R.A.S.	987736	1571016	VILLAFAÑE WENCESLAO	01539	C1295AEG	CAPITAL FEDERAL	ASOC ISRAELITA LUZ E	A	0
3389	E.R.A.S.	987743	1323395	VILLAFAÑE WENCESLAO	01501	C1295AEG	CAPITAL FEDERAL	ASOC.LUZ ETERNA	A	0
3426	E.R.A.S.	989170	1051954	LA PLATA AV	03434	B1676AFO	SANTOS LUGARES	CLUB SARMIENTO INSTITUCION	A	0
3401	E.R.A.S.	990883	965162	CAMPO ESTANISLAO DEL	00089	B1642HQA	SAN ISIDRO	A.C.C.DE R.PROGRAMA ANDRES	A	0
3386	E.R.A.S.	991511	1442844	QUIRNO COSTA	05540	B1822---	0	CTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS	A	0
3398	E.R.A.S.	995473	1055453	ALMAFUERTE	03465	B1676AHA	SANTOS LUGARES	CLUB SOCIAL GLORIAS ARG	A	0
3390	E.R.A.S.	999020	969925	MANZONE	00441	B1641AEA	SAN ISIDRO	FUNDACION NOSOTROS	A	0
3390	E.R.A.S.	999030	969929	MANZONE	00431	B1641AEA	SAN ISIDRO	FUNDACIO NOSOTROS	A	0
3406	E.R.A.S.	1002379	1262484	QUINQUELA MARTIN BENITO	01778	C1296ADJ	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION ANTORCHAS	A	0
3425	E.R.A.S.	1005587	1313603	ALVARADO	01963	C1290AAA	CAPITAL FEDERAL	TEVELEVICH MIGUEL ROBERTO	A	0
3410	E.R.A.S.	1012769	1622374	IRIARTE	02163	C1291ABQ	CAPITAL FEDERAL	BETTINELLI JUAN C	A	0
3401	E.R.A.S.	1016343	1556795	DE LA RIBERA BOULEVARD	00151	B1646---	SAN FERNANDO	CLUB NAUTICO BELGRANO	A	0
3349	E.R.A.S.	1019159	1366148	EREZCANO	01359	B1846CTA	JOSE MARMOL	CLUB HURACAN DE ADROGUE	A	0
3402	E.R.A.S.	1024505	1430380	RIO CUARTO	02560	C1292ABH	CAPITAL FEDERAL	INST.NUESTRA SRA.DEL BUEN CONSEJO...	A	0
3406	E.R.A.S.	1024530	985926	11-URIBURU	03601	B1651BOE	VILLA ZAGALA	CAJA AYUDA MUTUAL V CONCEPCI	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3422	E.R.A.S.	1025201	1552833	ARANA EDUARDO	01269	B1838ABE	LUIS GUILLON	ASOCIACION CIVIL EL ENCUENTRO	A	0
3424	E.R.A.S.	1029850	933085	VERGARA VALENTIN GDOR	03940	B1604CCD	FLORIDA OESTE	FLORIDA CLUB	A	0
3422	E.R.A.S.	1034981	1559131	YRIGOYEN HIPOLITO	01632	B1838ACN	LUIS GUILLON	ASOCIACION CIVIL EL ENCUENTRO	A	0
3411	E.R.A.S.	1037182	1560334	AMEGHINO FLORENTINO	01654	B1838AEN	LUIS GUILLON	BIBLIOTECA POPULAR FLORENTINO AMEGHINO	A	0
3399	E.R.A.S.	1038692	423397	PALAA JUAN B	00536	B1870ATJ	AVELLANEDA	PIEL ASOC. CIVIL S/F. DE LUCRO	A	0
3385	E.R.A.S.	1040100	993397	GUTIERREZ RICARDO	01516	B1640ADF	MARTINEZ	SOCIEDAD S MUTUO COSMOP	A	0
3425	E.R.A.S.	1062011	1390929	ARIAS JOSE J GRAL	00074	B1845BAB	JOSE MARMOL	UNION VECINAL MARMOL	A	0
3384	E.R.A.S.	1066366	1097292	EL TREBOL	00068	B1674---	0	CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS JOSE I	A	0
3390	E.R.A.S.	1073063	1010918	MANZONE	00501	B1641AEC	ACASSUSO	FUNDACION NOSOTROS	A	0
3411	E.R.A.S.	1075016	1012829	61-LACROZE	06120	B1653BGF	VILLA BALLESTER	F.C.C.O	A	0
3374	E.R.A.S.	1086214	1265382	OLAVARRIA	00636	C1162ABN	CAPITAL FEDERAL	ASOC. S. MUTUOS UNION DE LA BOCA	A	0
3366	E.R.A.S.	1086517	291783	SANTA FE AV	01821	C1123AAA	CAPITAL FEDERAL	CLORINDO TESTA	A	0
3393	E.R.A.S.	1086761	1108314	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	02646	B1675ARJ	VILLA RAFFO	CENTRO CULTURAL Y RECREAT	A	0
3393	E.R.A.S.	1088489	1109188	CHILE	01223	B1675AGC	VILLA RAFFO	CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO VILLA RAFFO	A	0
3355	E.R.A.S.	1096729	1511799	MAURE CNEL	02060	B1823ALJ	GERLI (L)	SOC. FOMENTO VILLA OTAMENDI	A	0
3405	E.R.A.S.	1097249	2349330	ARAOZ	02836	C1425DGT	CAPITAL FEDERAL	INST.DES.ECONOMICO	A	0
3389	E.R.A.S.	1099047	1576731	BRANDSEN	01458	C1287AAF	CAPITAL FEDERAL	ASOC. ISRAELITA LUZ ETERNA	A	0
3162	E.R.A.S.	1101345	658418	OMBU	05637	B1766EGC	LA TABLADA (LMN)	ATE.CUL. Y DEP. SAN MARTIN	A	0
3162	E.R.A.S.	1101348	658420	OMBU	05657	B1766EGC	LA TABLADA (LMN)	ATE.CUL. Y DEP. SAN MARTIN	A	0
3162	E.R.A.S.	1101360	658423	OMBU	05671	B1766EGC	LA TABLADA (LMN)	ATE.CUL. Y DEP. SAN MARTIN	A	0
3419	E.R.A.S.	1113160	1658197	SUAREZ	00419	C1162AEI	CAPITAL FEDERAL	C. COMUNITARIO LOS PIBES A.S.	A	0
3384	E.R.A.S.	1113785	1558288	PAMPA	01795	B1624AQM	RINCON DE MILBERG	CENTRO DE JUBILADOS PENSIONA	A	0
3407	E.R.A.S.	1119270	988614	MELO CARLOS FRANCISCO	02763	B1602CXA	FLORIDA	PADRE PABLO R. TISSERA E.S.ASOC. CIVIL.	A	0
3390	E.R.A.S.	1126136	1319987	BRASIL AV	00050	C1107AIA	CAPITAL FEDERAL	DARLING TENNIS CLUB	A	0
3402	E.R.A.S.	1131370	1436631	SANTA MARIA DEL BUEN AIRE	00917	C1277ADM	CAPITAL FEDERAL	INST. NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO ASOC.	A	0
3340	E.R.A.S.	1131980	1851603	GUARANI	00365	C1437EBG	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA	A	0
3394	E.R.A.S.	1136351	463972	25 DE MAYO	00458	B1870BZJ	AVELLANEDA	CENTRO GALLEGO DE JUB. Y PENS.	A	0
3414	E.R.A.S.	1137385	1609635	ALVAREZ	01115	B1768BPA	LA TABLADA (LMS)	CLUB SOCIAL MADERO CENTRAL	A	0
3410	E.R.A.S.	1160045	1632707	INDEPENDENCIA	01650	B1838AYN	LUIS GUILLON	CLUB VECINAL L. GUIL	A	0
3408	E.R.A.S.	1168938	1163564	25 DE MAYO	00434	B1702FKJ	CIUDADELA	CLUB ATLETICO CIUDADELA N	A	0
3384	E.R.A.S.	1169069	1020732	HAEDO MARTIN J	03885	B1604CXE	FLORIDA OESTE	SOC. FOMENTO FLORIDA SUD	A	0
3406	E.R.A.S.	1171979	479803	ITALIA	00071	B1870COA	AVELLANEDA	CLUB SOCIAL CAI	A	0
3425	E.R.A.S.	1180416	1644715	RECONQUISTA	00663	B1842CIM	MONTE GRANDE	SOCIEDAD DE FOMENTO SANTA ROSA	A	0
3393	E.R.A.S.	1195999	1178260	NOLTING	03732	B1702CSH	CIUDADELA	CENTRO DE JUBILADOS LA ARMONIA	A	0
3386	E.R.A.S.	1205896	1185758	CUEVAS	03736	B1702CWH	CIUDADELA	UNION VECINAL DE CIUDADELA	A	0
3379	E.R.A.S.	1210636	500362	AVELLANEDA NICOLAS DR	01693	B1871AFO	DOCK SUD	JUBILADOS MADRESELVA	A	0
3387	E.R.A.S.	1228815	1480573	BELGRANO AV	01687	C1093AAE	CAPITAL FEDERAL	LUDICOM S.R.L.	A	0
3399	E.R.A.S.	1242832	952043	RUCCI JOSE IGNACIO	01845	B1822CKK	VALENTIN ALSINA	TIEMPOS DE FE	A	0
3404	E.R.A.S.	1249345	1110638	FORMOSA	02045	B1643BVI	BECCAR	CLUB INDEPENDIENTE DE BECCAR	A	0
3382	E.R.A.S.	1255720	520772	DEBENEDETTI AGUSTIN	01290	B1871AAD	DOCK SUD	U S TRAB FRIG ANGLO	A	0
3414	E.R.A.S.	1264874	1084127	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE	02929	B1602EGC	FLORIDA	CLUB VILLA PEARSON	A	0
3416	E.R.A.S.	1275254	1314233	MONTEROS	00037	B1834---	0	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3399	E.R.A.S.	1279964	1713311	LUGONES LEOPOLDO	02593	B1644FPA	VICTORIA	ASOC. CULT. Y DEP. VIRREYES	A	0
3392	E.R.A.S.	1301759	1305125	IRIARTE	02295	C1291ACA	CAPITAL FEDERAL	CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 21 DE	A	0
3414	E.R.A.S.	1315797	1268944	REPUBLICA ARABE SIRIA	01930	B1703AIT	JOSE INGENIEROS	S.F. JOSÉ INGENIEROS	A	0
3414	E.R.A.S.	1316184	1001914	CASTRO MANUEL	05182	B1824OWN	LANUS OESTE	SOCIEDAD DE FOMENTO N. P. GIARDINO	A	0
3401	E.R.A.S.	1317589	1694572	SANTIAGO DEL ESTERO (GP)	00167	B1617BPC	GENERAL PACHECO	ASOC. DE FOMENTO Y CLUB SOCI	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3401	E.R.A.S.	1317594	1694573	SANTIAGO DEL ESTERO (GP)	00187	B1617BPC	GENERAL PACHECO	ASOC. DE FOMENTO Y CLUB SOCIAL	A	0
3401	E.R.A.S.	1317598	1694574	SANTA FE (GP)	00602	B1617FPN	GENERAL PACHECO	ASOC.DE FOMENTO Y CLUB SOCIA	A	0
3401	E.R.A.S.	1317905	1694575	SANTA FE (GP)	00602	B1617FPN	GENERAL PACHECO	ASOC.DE FOMENTO Y CLUB SOCIA	A	0
3392	E.R.A.S.	1320651	1005274	CENTENARIO URUGUAYO AV	00578	B1825FYQ	MONTE CHINGOLO	OLGA COSSETTINI BIBLIOTECA POPULAR	A	0
3328	E.R.A.S.	1321429	1158954	ALSINA	00261	B1642FNE	SAN ISIDRO	FEDERAC.CIRC.CATOL.OBRERO	A	0
3398	E.R.A.S.	1322397	1274392	JUSTO JUAN B AV	03268	B1702AIP	CIUDADELA	CLUB SOC Y DEP SAAVEDRA	A	0
3388	E.R.A.S.	1330729	1012663	SALCEDO MIGUEL	02061	B1825FAE	MONTE CHINGOLO	C.J.P.M.M. DE GUEMES	A	0
3415	E.R.A.S.	1351517	1760022	CANE MIGUEL	00440	B1646HNB	SAN FERNANDO	JTA.VEC. LA FLORESTA	A	0
3414	E.R.A.S.	1354483	1356547	FINOCHIETTO ENRIQUE DR	01802	C1275AAN	CAPITAL FEDERAL	BACHI BACHILLERATO	A	0
3401	E.R.A.S.	1370397	573311	SANTA FE	01849	B1868DDG	PIÑEYRO	CLUB ORIENTACION JUVENIL	A	0
3419	E.R.A.S.	1388223	1051129	FERNANDEZ ENRIQUE	02170	B1824FBV	LANUS OESTE	CTRO. DE JUB. Y PENS. V. INDUS	A	0
3406	E.R.A.S.	1390907	1391079	FALLIERES	02424	B1821FBD	VILLA FIORITO	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3400	E.R.A.S.	1416746	1775865	CROVARA E J INT AV (LMS)	00844	B1751CQV	LA TABLADA (LMS)	CTRO. COMERCIAL CROVARA	A	0
3417	E.R.A.S.	1429416	1421332	GIBSON J	00429	B1836ARA	LLAVALLOL	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3403	E.R.A.S.	1433268	1191958	LAS HERAS JUAN GREGORIO DE GRAL	03259	B1603AWC	VILLA MARTELLI	M PADILLA C DE FOMEN	A	0
3374	E.R.A.S.	1439007	1242407	JUSTO JUAN B	00873	B1643FMQ	BECCAR	CLUB INDEPENDIENTE BECCAR	A	0
3408	E.R.A.S.	1454327	1242510	222-MATHEU	01232	B1655JJB	JOSE LEON SUAREZ	ASOC. COMUNITARIA CORAZONES ABIERTOS	A	0
3392	E.R.A.S.	1465168	1212526	PERU	00882	B1603CIR	VILLA MARTELLI	SOCIEDAD POLACA	A	0
3408	E.R.A.S.	1470782	1454403	BOERO FELIPE	0768	B1832CUP	LOMAS DE ZAMORA	CENTRO DE JUBILADO Y	A	0
3407	E.R.A.S.	1476124	1392771	TORRE LISANDRO DE LA (515)	01966	B1676AWB	SANTOS LUGARES	CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS	A	0
3383	E.R.A.S.	1488279	1266189	122-ROCA GRAL	03155	B1653MXE	VILLA BALLESTER	BIBLIOT.POP. B. RIVADAVIA	A	0
3398	E.R.A.S.	1492910	1472462	FALUCHO	1401	B1828EIC	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3405	E.R.A.S.	1509054	1130559	SAENZ PEÑA ROQUE PRES	00472	B1826BKJ	REMEDIOS DE ESCALADA (L)	SOC FOMENTO V LOB G PAZ	A	0
3423	E.R.A.S.	1515220	1298309	SAAVEDRA	01710	B1640BZV	MARTINEZ	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3398	E.R.A.S.	1526165	1848658	CURAPALIGUE	01260	B1770AFH	TAPIALES	C.C Y R JUV Y BIB.POP.M. MORENO	A	0
3392	E.R.A.S.	1527411	1290546	79-VALLE ARISTOBULO DEL	02500	B1655---	0	ASOCIACION CIVIL BELVEDERE MARITIMO	A	0
3416	E.R.A.S.	1536732	1510680	KURTH GERMAN	00527	B1836---	0	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3413	E.R.A.S.	1537550	1297358	120-BALCARCE	01530	B1653---	0	SOC.FOMENTO.LYNCH PUEYRREDON	A	0
3416	E.R.A.S.	1576340	1557381	GINEBRA	00432	B1821AAJ	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3415	E.R.A.S.	1590882	1873114	LAGOS LINO	01726	B1785BSP	ALDO BONZI	SOC FTO ALDO BONZI	A	0
3416	E.R.A.S.	1599068	1576404	DAVILA ADOLFO	00860	B1836BSR	LLAVALLOL	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3414	E.R.A.S.	1628723	1330122	PARERA BLAS	00345	B1602CTE	FLORIDA	CLUB VILLA PEARSON	A	0
3414	E.R.A.S.	1628736	1330134	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE	02935	B1602EGC	FLORIDA	CLUB VILLA PEARSON	A	0
3386	E.R.A.S.	1631717	2145800	24 DE NOVIEMBRE	01896	C1242AAN	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION ARG. DE ARTISTAS ESCULTORES	A	0
3386	E.R.A.S.	1631720	2145801	24 DE NOVIEMBRE	01898	C1242AAN	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION ARG. DE ARTISTAS ESCULTORES	A	0
3369	E.R.A.S.	1674605	1842371	ENTRE RIOS	01555	B1847---	0	CIRCULO CATOLICO OBRERO	A	0
3416	E.R.A.S.	1678505	1423880	DON BOSCO	00043	B1642FDA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3315	E.R.A.S.	1689852	1551504	DANTE	04721	B1678DCI	CASEROS	CIRCULO ITALIANO UNIDOS DE C	A	0
3397	E.R.A.S.	1713036	1935882	EL SAUCE	00093	B1778---	0	CENTRO ALMACENEROS	A	0
3379	E.R.A.S.	1729393	738986	168-CALLE 168	02280	B1883EMT	BERNAL OESTE	SOCIEDAD DE FOMENTO 1` DE MA	A	0
3410	E.R.A.S.	1755665	1688379	PERON EVA AV	1802	B1834BES	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3360	E.R.A.S.	1763543	1458027	174-FERNANDEZ CRESPENCIO	04270	B1655---	JOSE LEON SUAREZ	ORDEN FRANCISCANA	A	0
3412	E.R.A.S.	1764856	1496107	JUSTO JUAN B	01437	B1643FNC	BECCAR	STA,RAFAELA MARIA ,FUNDACION..	A	0
3325	E.R.A.S.	1770763	1476879	SOCRATES	02020	B1706CAB	HAEDO	SOC. DE FOM. VECINAL B° LA RURAL	A	0
3415	E.R.A.S.	1794160	1459601	MELO CARLOS FRANCISCO	01756	B1602CWF	FLORIDA	ASOC. TEATRO DE REPERT. NORTE	A	0
3407	E.R.A.S.	1824383	1666052	ROSAS J M DE GDOR DON	02984	B1678ILQ	CASEROS	C A Y S AMERICA	A	0
3407	E.R.A.S.	1836090	1676397	AYOLAS	02970	B1678IQH	CASEROS	CLUB MITRE	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3402	E.R.A.S.	1853376	1691940	MITRE BARTOLOME AV	05221	B1678AVK	CASEROS	CLUB SOCIAL COLON	A	0
3387	E.R.A.S.	1869905	1536012	QUINTANA HILARION DE LA	04226	B1636AOR	OLIVOS	ASOC.CIVIL S/F DE LUCRO PROGRAMA DELTA	A	0
3402	E.R.A.S.	1925297	1576699	MALAVER ANTONIO	04750	B1604CTP	FLORIDA OESTE	CLUB ATLETICO COLEGIALES	A	0
3419	E.R.A.S.	1934141	1584901	MELO CARLOS FRANCISCO	04548	B1603BGT	VILLA MARTELLI	CLUB ATLETICO LA ESCUELITA	A	0
3399	E.R.A.S.	1968502	1612970	HAEDO MARTIN J	04789	B1604CXW	FLORIDA OESTE	UN RINCON DE AMIGOS	A	0
3416	E.R.A.S.	1973362	1892281	LYNCH CNEL	2901	B1828---	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3420	E.R.A.S.	1984977	1265725	897-CALLE 897	03552	B1881APB	SAN FRANCISCO SOLANO (Q)	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL EL INCA	A	0
3402	E.R.A.S.	1991313	1109207	339-AGOTE LUIS DR	01012	B1879---	0	SOC. FOM. NUEVA VILLA ARGENTINA	A	0
3414	E.R.A.S.	1998545	1906894	FONROUGE	01878	B1832HCJ	BANFIELD	CTRO.JUBILADOS Y PENS.	A	0
3415	E.R.A.S.	1998981	1907265	ARMESTI	02200	B1828---	0	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3295	E.R.A.S.	2005017	1643018	ZUFRIATEGUI JUAN	03561	B1603DAI	VILLA MARTELLI	HOGAR PIMPINELA PARA LA NIÑEZ	A	0
3416	E.R.A.S.	2068389	1950734	MONROE	301	B1834IYG	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3340	E.R.A.S.	2123388	729886	BILLINGHURST	00649	C1174ABK	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION MEDICA HOMEOPATICA VITALIS	A	0
3382	E.R.A.S.	2133089	1107297	REPUBLICA DEL LIBANO	00770	B1872ACJ	SARANDI	SOCIEDAD TOSCANA AYU	A	0
3425	E.R.A.S.	2149207	1907796	MARCONI GUILLERMO ING	00494	B1685ABN	EL PALOMAR (M)	CLUB ATLETICO EL PALOMAR	A	0
3425	E.R.A.S.	2149209	1907901	MARCONI GUILLERMO ING	00494	B1685ABN	EL PALOMAR (M)	CLUB ATLETCO EL PALOMAR	A	0
3425	E.R.A.S.	2149211	1907916	MARCONI GUILLERMO ING	00494	B1685ABN	EL PALOMAR (M)	CLUB ATLETICO EL PALOMAR	A	0
3324	E.R.A.S.	2159169	1965596	HUSARES	00476	B1688HGJ	VILLA SANTOS TESEI	ILE ASE OSUN DOYO	A	0
3413	E.R.A.S.	2166475	1350037	MAGDALENA	01820	B1874DRL	VILLA DOMINICO	CENTRO DE JUB.SAN EM	A	0
3354	E.R.A.S.	2184874	2010440	SAAVEDRA	00569	C1229ACA	CAPITAL FEDERAL	CAERO FABIAN DOMINGO	A	0
3413	E.R.A.S.	2220247	1719043	NICARAGUA	05249	B1605AQC	MUNRO	CLUB SOC Y DEP V SAR	A	0
3417	E.R.A.S.	2226469	1764128	PARANA	06098	B1606ATJ	CARAPACHAY	S.U.V.A. SOCIEDADES UNIDAS DE V. ADELINA	A	0
3399	E.R.A.S.	2240086	1922215	PICHINCHA	00520	B1609DIL	BOULOGNE SUR MER	GEO S.R.L.	A	0
3399	E.R.A.S.	2240088	1922220	PICHINCHA	00520	B1609DIL	BOULOGNE SUR MER	CLUB J.U.SANTA RITA	A	0
3387	E.R.A.S.	2250465	1901537	CABRAL JUAN BAUTISTA SGTO	03221	B1605EEY	MUNRO	SOC. DE FOM. SGTO. CABRAL	A	0
3397	E.R.A.S.	2256549	1781660	OLIVERA AV	01497	C1407IOB	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION CIVIL SER CON VOS	A	0
3392	E.R.A.S.	2260012	1927772	ADER BERNARDO AV	04042	B1606DVN	CARAPACHAY	UNION VEC. V. ADELINA	A	0
3413	E.R.A.S.	2260886	1930902	AVALOS AMARO INT CNEL	03510	B1605ECF	MUNRO	ASOCIACION CIVIL FLORAL BIENESTAR	A	0
3412	E.R.A.S.	2263420	1938255	AYACUCHO	03939	B1636BPM	OLIVOS	AGRUPACION APIAD	A	0
3410	E.R.A.S.	2276634	1971479	MOLDES JOSE	04950	B1603ASH	VILLA MARTELLI	GAYNOR SOC. FOM.	A	0
3420	E.R.A.S.	2320944	2418459	LIBERTAD	00553	B1706CZI	HAEDO	HERMANAS DE SAN ANTO	A	0
3426	E.R.A.S.	2325431	2691305	RODRIGUEZ MANUEL A GRAL	02650	C1416CNF	CAPITAL FEDERAL	CLUB S Y D AÑASCO	A	0
3408	E.R.A.S.	2328950	2706262	LARREA	01225	C1117ABI	CAPITAL FEDERAL	ORG. SIONISTA FEM. ARGENTINA	A	0
3385	E.R.A.S.	2332293	2537856	COBO AV	01760	C1406ILP	CAPITAL FEDERAL	ASOC FOMENTO MIRAFLORES	A	0
3408	E.R.A.S.	2335370	2430246	SARMIENTO	02706	B1678HBF	CASEROS	BIBLIOTECA J.B.ALBERDI	A	0
3385	E.R.A.S.	2335427	2537859	COBO AV	01780	C1406ILP	CAPITAL FEDERAL	AS FOMENTO V MIRAFLORES	A	0
3411	E.R.A.S.	2336660	2431544	HORNOS GRAL (659)	03584	B1678HPV	CASEROS	RADIO CLUB CASEROS	A	0
3397	E.R.A.S.	2337067	2431954	MAGDALENA DAVID	03043	B1678GMM	CASEROS	CLUB ATLETICO 9 DE J	A	0
3352	E.R.A.S.	2339034	2439731	307-OLIVIERI PEDRO INT	01259	B1878CLY	QUILMES ESTE	NOSOTROS PODEMOS ASOC CIVIL	A	0
3403	E.R.A.S.	2340330	2484270	FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO	01951	C1416CBQ	CAPITAL FEDERAL	CLUB A LA PATERNAL	A	0
3420	E.R.A.S.	2342287	2438169	CONSTITUCION	00318	B1706DEF	HAEDO	CLUB BRISAS DEL PLATA	A	0
3410	E.R.A.S.	2347820	2514371	PALACIOS ALFREDO	00801	C1167ABA	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION CASA RAFAEL	A	0
3344	E.R.A.S.	2353245	2443622	PENNA JOSE MARIA	01606	B1828CPR	BANFIELD	C S D DEF DE BANFIELD	A	0
3401	E.R.A.S.	2355148	2548634	SANCHEZ	02256	C1416BQL	CAPITAL FEDERAL	CENTRO PATERNAL JUB.Y PENS.	A	0
3386	E.R.A.S.	2356663	2769615	HUMBOLDT	01591	C1414CTM	CAPITAL FEDERAL	HECTOR PRESA	A	0
3417	E.R.A.S.	2356730	2727908	BOULOGNE SUR MER	00865	C1213AAM	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION DE ESTUDIOS TALMUDICOS TORAT M	A	0
3400	E.R.A.S.	2357808	2452245	MITRE BARTOLOME AV	04750	B1678AVS	CASEROS	BIBLIOTECA BME MITRE	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3400	E.R.A.S.	2357815	2452249	MITRE BARTOLOME AV	04750	B1678AVS	CASEROS	BIBLIOTECA POPULAR B. MITRE	A	0
3310	E.R.A.S.	2361066	2706432	JAURES JEAN	00852	C1215ACP	CAPITAL FEDERAL	GABRIELA IRUETA	A	0
3399	E.R.A.S.	2364504	2649711	MEXICO	02849	C1223ABG	CAPITAL FEDERAL	CENTRO CULTURAL DEL PARTIDO	A	0
3395	E.R.A.S.	2367403	2469833	MARCON JOSE F MONS	00341	B1753AMG	VILLA LUZURIAGA	CLUB A Y SOCIAL EL CICLON	A	0
3425	E.R.A.S.	2368391	2764166	24 DE NOVIEMBRE	00140	C1170AAD	CAPITAL FEDERAL	FUNDAMIND	A	0
3418	E.R.A.S.	2373007	2469024	315-PERON JUAN D PRES	01055	B1878BUU	QUILMES ESTE	FUNDACION ELEGIMOS SERVIR	A	0
3420	E.R.A.S.	2377633	2481146	JOSE CANEPA	01990	B0000---	0	TEMPLO LA REFORMA	A	0
3384	E.R.A.S.	2379497	2666237	BELGRANO AV	03538	C1210AAQ	CAPITAL FEDERAL	ASOC.MUTUAL HOMERO MANZI	A	0
3412	E.R.A.S.	2387882	2489371	66-PAZ JOSE C	04040	B1651GOF	SAN MARTIN	TALLER DE CAPAC Y PROCUCC	A	0
3422	E.R.A.S.	2388500	2630102	PARAGUAY	04176	C1425BSH	CAPITAL FEDERAL	ASOC.EL CENTAVO	A	0
3414	E.R.A.S.	2389007	2490095	73-ISLAS MALVINAS	02681	B1651AYC	SAN ANDRES	CLUB A. 3 DE FEBRERO	A	0
3411	E.R.A.S.	2389278	2749149	VIDT	01982	C1425DJH	CAPITAL FEDERAL	ASOC. ISRAELITA ARG.TZEIRE AGUDATH JABAD	A	0
3397	E.R.A.S.	2390414	2486139	MAGDALENA DAVID	03053	B1678GMM	CASEROS	CLUB ATLETICO 9 DE J	A	0
3425	E.R.A.S.	2394943	2674590	AGRELO	03356	C1224ABF	CAPITAL FEDERAL	KANAIMA ASOCIACION CIVIL	A	0
3425	E.R.A.S.	2394946	2674593	AGRELO	03356	C1224ABF	CAPITAL FEDERAL	KANAIMA	A	0
3408	E.R.A.S.	2408424	2504965	SARMIENTO	02720	B1678HBF	CASEROS	BIBLIOTECA J.B.ALBERDI	A	0
3423	E.R.A.S.	2409747	2509194	LIMAY	01234	B1869CKF	GERLI (AV)	SOC. FOM. V.MODELO YBP JB ALBERDI	A	0
3384	E.R.A.S.	2445349	2774170	ECUADOR	01176	C1425EUB	CAPITAL FEDERAL	FUNDACION ARMONIA	A	0
3419	E.R.A.S.	2453597	2561098	SARRATEA	01331	B1753BNA	VILLA LUZURIAGA	SOC FOM MARTIN FIERRO	A	0
3426	E.R.A.S.	2459784	2538088	VARELA	01802	C1406ELL	CAPITAL FEDERAL	CLUB DAOM	A	0
3386	E.R.A.S.	2460219	2541777	TABARE	02091	C1437FHU	CAPITAL FEDERAL	CLUB CRESPO J.	A	0
3417	E.R.A.S.	2461150	2586245	RABANAL FRANCISCO INT	02301	C1437FPK	CAPITAL FEDERAL	CLUB SOC.Y CULT. D.F.SARMIENTO	A	0
3426	E.R.A.S.	2461557	2583436	LAFUENTE AV	02199	C1406EUK	CAPITAL FEDERAL	CLUB D.A.O.M	A	0
3397	E.R.A.S.	2462601	2551367	PENNA JOSE MARIA	01184	B1828CPH	BANFIELD	CEN.JUB Y PENS BANFIELD O.	A	0
3410	E.R.A.S.	2465846	2562021	COGHLAN	01780	B1869DEF	GERLI (AV)	WALTROSSE ISAUL	A	0
3398	E.R.A.S.	2474224	2573039	CARHUE	04435	B1678BZE	CASEROS	MANUEL RODRIGUEZ	A	0
3398	E.R.A.S.	2474228	2573042	CARHUE	04443	B1678BZE	CASEROS	RODRIGUEZ MANUEL	A	0
3299	E.R.A.S.	2520352	2610435	KLOOSTERMAN DIRK HENRY	01752	B1825EFF	MONTE CHINGOLO	ASOCIACION ITALIANA SANTA CRISTINA	A	0
3379	E.R.A.S.	2544250	2678158	JUNIN	01441	C1113AAM	CAPITAL FEDERAL	ASOC.FOMENTO SOCIAL NESTOR P.M	A	0
3423	E.R.A.S.	2553421	2653969	JUSTO JUAN B	02639	B1636BSM	OLIVOS	CONS J B JUSTO 2639	A	0
3411	E.R.A.S.	2561894	2649572	SANTIAGO DEL ESTERO	03433	B1824EBU	LANUS OESTE	CLUB VECINAL	A	0
3419	E.R.A.S.	2562246	2649824	FERNANDEZ ENRIQUE	03168	B1824FCP	LANUS OESTE	S.F.25 FR MAYO Y B.P.M.MORENO	A	0
3410	E.R.A.S.	2585868	2780932	AZARA FELIX DE	00231	B1832BTE	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3410	E.R.A.S.	2585873	2780933	CASTRO MANUEL	00220	B1832BSF	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3415	E.R.A.S.	2585883	2780935	CASTRO MANUEL	00254	B1832BSF	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3415	E.R.A.S.	2585888	2780937	CASTRO MANUEL	00256	B1832BSF	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3415	E.R.A.S.	2585892	2780941	CASTRO MANUEL	00262	B1832BSF	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3414	E.R.A.S.	2633749	2752329	SAENZ PEÑA ROQUE PRES AV	00832	C1035AAQ	CAPITAL FEDERAL	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	A	0
3411	E.R.A.S.	2633751	2752330	SAENZ PEÑA ROQUE PRES AV	00832	C1035AAQ	CAPITAL FEDERAL	ZEFIR S.A	A	0
3411	E.R.A.S.	2633754	2752332	SAENZ PEÑA ROQUE PRES AV	00832	C1035AAQ	CAPITAL FEDERAL	ZEFIR SA	A	0
3411	E.R.A.S.	2633762	2752336	SAENZ PEÑA ROQUE PRES AV	00832	C1035AAQ	CAPITAL FEDERAL	PABLO EZEQUIEL UZQUIZA	A	0
3411	E.R.A.S.	2633766	2752338	SAENZ PEÑA ROQUE PRES AV	00832	C1035AAQ	CAPITAL FEDERAL	ZEFIR S.A.	A	0
3416	E.R.A.S.	2646108	1021190	PAZ JOSE MARIA GRAL	01405	B1834ASC	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3415	E.R.A.S.	2646139	2780964	MOLINA ARROTEA CARLOS	801	B1832JKK	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3415	E.R.A.S.	2646146	2780965	PIAGGIO A MONS	00653	B1832DKM	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3415	E.R.A.S.	2646151	2780966	PIAGGIO A MONS	00649	B1832DKM	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3397	E.R.A.S.	2646153	2780967	LOPEZ VICENTE FIDEL	00963	B1834GKS	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3416	E.R.A.S.	2646156	2780968	YRIGOYEN HIPOLITO AV	10047	B1834GTB	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3417	E.R.A.S.	2646187	2780977	CASTRO BARROS	00130	B1828ATD	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3415	E.R.A.S.	2646431	2780993	PIAGGIO A MONS	00162	B1832DKD	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3416	E.R.A.S.	2646445	2780999	GOMEZ INDALECIO	00702	B1834BYP	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3417	E.R.A.S.	2646448	2781401	ALAS CLAUDIO DE	02584	B1827BQJ	INGENIERO BUDGE	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3423	E.R.A.S.	2646453	2781422	DARWIN CARLOS	1835	B1821DGC	VILLA FIORITO	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3423	E.R.A.S.	2646623	2781498	ANCHORIS	4402	B1834FAJ	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3398	E.R.A.S.	2646624	2781499	METAN	530	B1827HHL	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3410	E.R.A.S.	2646632	2781703	NEWTON ISAAC	04171	B1827FJG	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3423	E.R.A.S.	2646649	2781712	QUESADA	01720	B1827EMF	INGENIERO BUDGE	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3416	E.R.A.S.	2646654	2781716	PARIS	01947	B1821BDM	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3398	E.R.A.S.	2646657	2781718	LAVARDEN MANUEL JOSE DE	00913	B1821FQS	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3423	E.R.A.S.	2646661	2781720	NUÑEZ DE ARCE GASPAR	00553	B1821EWK	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3416	E.R.A.S.	2646663	2781731	CAMPOAMOR RAMON DE	01004	B1821FGV	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3410	E.R.A.S.	2646666	2781732	LAS HERAS JUAN GREGORIO DE GRAL	02299	B1828IAS	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3398	E.R.A.S.	2646672	2781734	FLORES H G	00001	B1836---	LLAVALLOL	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3416	E.R.A.S.	2646681	2781738	LAS HERAS JUAN GREGORIO DE GRAL	02200	B1832ITR	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3416	E.R.A.S.	2646685	2781739	INGENIEROS JOSE	1601	B1828ECG	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3423	E.R.A.S.	2646692	2781742	DOYHENARD	01240	B1836EVZ	LLAVALLOL	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3398	E.R.A.S.	2646695	2781743	MORAZAN FRANCISCO DE	00742	B1821EDP	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3398	E.R.A.S.	2646699	2781747	DE LOS EUCALIPTUS	00047	B1834---	0	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3410	E.R.A.S.	2647201	2781748	PERON EVA AV	02853	B1834BFC	SAN JOSE (LZ)	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3417	E.R.A.S.	2647205	2781752	BUSTOS	773	B1832GLO	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3398	E.R.A.S.	2647206	2781753	BUSTOS	00777	B1832GLO	LOMAS DE ZAMORA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3423	E.R.A.S.	2647210	2781754	CARAZA EDUARDO	1848	B1828ENJ	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3416	E.R.A.S.	2647214	2781762	GORDILLO TIMOTEO	01531	B1828GAO	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3417	E.R.A.S.	2647215	2781764	LAS TROPAS	1302	B1828DWB	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3423	E.R.A.S.	2647223	2781767	CARHUE	850	B1834IJR	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3408	E.R.A.S.	2651871	2776012	BEAUCHEF	01032	C1424BDV	CAPITAL FEDERAL	CONCESIONARIO GCBA	A	0
3384	E.R.A.S.	2654041	2783538	COMBATE DE LOS POZOS	01881	C1245AAM	CAPITAL FEDERAL	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.	A	0
3350	E.R.A.S.	2664126	2759608	RIVAROLA RODOLFO DR	00139	C1015AAA	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE COPROPIETARIOS RIVAROLA	A	0
3411	E.R.A.S.	2670172	2781014	9 DE JULIO	00506	B1642DLF	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3417	E.R.A.S.	2670179	2781026	ROCA PRES	00179	B1643EBC	BECCAR	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3417	E.R.A.S.	2670185	2781039	ENTRE RIOS	01300	B1640GBJ	MARTINEZ	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3417	E.R.A.S.	2670190	2781049	ROLON ANDRES AV	01897	B1643BOF	BECCAR	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3417	E.R.A.S.	2670191	2781050	ARAMBURU PEDRO EUGENIO TTE GRAL	00583	B1640HZK	MARTINEZ	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3424	E.R.A.S.	2670193	2781055	BECCO INT	02312	B1643BZV	BECCAR	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3417	E.R.A.S.	2670199	2781073	NEYER INT	01300	B1643GAZ	BECCAR	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3416	E.R.A.S.	2673197	2784300	LA PLATA AV	01169	C1250AAB	CAPITAL FEDERAL	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.	A	0
3415	E.R.A.S.	2673301	2781078	NAVARRO JULIAN	02020	B1643FIP	BECCAR	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3417	E.R.A.S.	2673303	2781083	SANTA FE AV	00431	B1642BZA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3417	E.R.A.S.	2673307	2781100	SAENZ VALIENTE BENJAMIN	02136	B1640GNR	MARTINEZ	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3409	E.R.A.S.	2673310	2781216	GUIDO GRAL	02002	B1643EXP	BECCAR	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3410	E.R.A.S.	2673315	2781231	UDAONDO GDOR	01390	B1643EPB	BECCAR	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3384	E.R.A.S.	2673316	2781233	DE MAYO AV	01397	B1607DDA	VILLA ADELINA	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3410	E.R.A.S.	2673320	2781564	ELCANO SEBASTIAN	02380	B1640IET	MARTINEZ	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3386	E.R.A.S.	2673321	2781571	ROLON AVELINO AV	02315	B1609HVD	BOULOGNE SUR MER	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3425	E.R.A.S.	2673333	2782331	CERVANTES	01702	B1609FRD	BOULOGNE SUR MER	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3419	E.R.A.S.	2673337	2782359	SAENZ PEÑA ROQUE	01250	B1642DBH	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3423	E.R.A.S.	2673339	2782362	LAMADRID GRAL	01523	B1607ASO	VILLA ADELINA	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3411	E.R.A.S.	2673357	2782895	CENTENARIO AV	1891	B1643CGF	BECCAR	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3420	E.R.A.S.	2673359	2782899	CAMINO REAL MORON SAN FERNANDO	01535	B1609GCE	BOULOGNE SUR MER	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3400	E.R.A.S.	2674942	2785211	LARRALDE CRISOLOGO	05255	C1431APK	CAPITAL FEDERAL	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.	A	0
3387	E.R.A.S.	2674975	2785533	TAMBORINI JOSE P	04227	C1430ASC	CAPITAL FEDERAL	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.	A	0
3420	E.R.A.S.	2783962	1728730	POSADAS GERVASIO ANTONIO	02098	B1643FUP	BECCAR	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3298	E.R.A.S.	2824511	4133	SAN JOSE	01046	C1076AAV	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3410	E.R.A.S.	2828553	10045479	ITUZAINGO	0684	B1804EWL	JOSE MARIA EZEIZA	RADIO CLUB EZEIZA	A	0
3384	E.R.A.S.	2837050	10051820	CASTRO GDOR	834	B1607BWD	VILLA ADELINA	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3410	E.R.A.S.	2990096	1954185	PERON EVA AV	03002	B1834BFR	TEMPERLEY	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3384	E.R.A.S.	2990538	854125	BECCAR VARELA ADRIAN	00772	B1642DMD	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	A	0
3422	E.R.A.S.	3055606	10041316	COMBATE DE LOS POZOS	2183	C1245AAS	CAPITAL FEDERAL	ALUBA	A	0
3408	E.R.A.S.	3063563	1688593	VEGA A DE LA	00636	B1682BZB	VILLA BOSCH	CONSORCIO SARDEGNA	A	0
3396	E.R.A.S.	3107927	10226416	RUIZ DE LOS LLANOS (LMS)	52	B1765BRB	ISIDRO CASANOVA (LMS)	IGLESIA EVANGELICA	A	0
3408	E.R.A.S.	3134805	896	SAN LORENZO	2115	B1826GRA	REMEDIOS DE ESCALADA (L)	REMAR ARGENTINA	A	0
3406	E.R.A.S.	3161121	5600	38-IRIGOYEN M DE	03150	B1650IEB	SAN MARTIN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	A	0
3400	E.R.A.S.	3170504	12131	WARNES AV	02194	C1427---	0	FUNDACION UNA VIDA MEJOR	A	0
3416	E.R.A.S.	3175895	10265935	BUSTOS	2102	B1827CNB	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3395	E.R.A.S.	3206845	2780952	SARMIENTO	00669	C1041AAM	CAPITAL FEDERAL	AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITAD	A	0
3361	E.R.A.S.	3230684	1416004	SABATTINI A DR	04960	B1678CQL	CASEROS	LUCHA CONTRA EL CANCER CASEROS	A	0
3416	E.R.A.S.	3234822	10314186	ZELARRAYAN M A SOLD	1103	B1827GNG	VILLA ALBERTINA	UNIDAD SANITARIA 2 DE ABRIL	A	0
3338	E.R.A.S.	3234921	10313962	PEDRAZA MANUELA	3001	B1827DLI	VILLA ALBERTINA	PRODEIN A.B.C	A	0
3398	E.R.A.S.	3240376	10323138	CABALLERO A	601	B1827---	VILLA ALBERTINA	JARDIN MUNICIPAL N° 12	A	0
3423	E.R.A.S.	3240822	10319244	DIAG 61 - ILLESCAS RODOLFO	201	B1827---	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3416	E.R.A.S.	3269402	10348166	VOLTAIRE	1660	B1828FBH	VILLA ALBERTINA	UNIDAD SANITARIA SANTA MARTA	A	0
3374	E.R.A.S.	3291743	10371775	EDISON TOMAS A (LMN)	3269	B1765MDE	ISIDRO CASANOVA (LMN)	CENTRO DE JUBILADOS SAN CARLOS	A	0
3416	E.R.A.S.	3292414	10371546	CORSINI IGNACIO	3502	B1827DIT	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3398	E.R.A.S.	3292416	10371551	PEDRAZA MANUELA	3509	B1827DLS	VILLA ALBERTINA	JARDIN INFANTES N°11	A	0
3354	E.R.A.S.	3304258	10387996	CATAMARCA	946	B1692APH	EL LIBERTADOR	CENTRO DE JUBILADOS	A	0
3388	E.R.A.S.	3316919	9468	ALVAREZ DONATO TTE GRAL AV	01132	C1416BTN	CAPITAL FEDERAL	COOP.DE TRABAJO FRIGORIFICO TORGELON 58	A	0
3360	E.R.A.S.	3322000	10405347	ECHEVERRIA ESTEBAN (LMS)	5545	B1757AVW	GREGORIO DE LAFERRERE LM	CTRO DE JUBILADOS ENTRE AMIGOS	A	0
3400	E.R.A.S.	3333696	10412723	ALAS ARGENTINAS	6043	B1684CRA	EL PALOMAR (TF)	CLUB A.F.A.L.P.	A	0
3411	E.R.A.S.	3365878	10443481	PASO MORALES	272	B1686BQF	HURLINGHAM	MARY DEVITA	A	0
3421	E.R.A.S.	3367311	10445843	RUTA NACIONAL 8	9835	B1692ASC	EL LIBERTADOR	MARÍA VARGAS	A	0
3362	E.R.A.S.	3377039	1208498	CAMPO ESTANISLAO DEL	00065	B1642HQA	SAN ISIDRO	ASOC.CENTRO CRISTIANO DE REHABILITACIÓN	A	0
3405	E.R.A.S.	3394109	10469990	PALACIOS ALFREDO	1955	B1828DNM	BANFIELD	SOCIEDAD DE FOMENTO LUZ Y FUERZA	A	0
3417	E.R.A.S.	3399316	10475599	VERNET LUIS AV	3809	B1842FWW	MONTE GRANDE	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA	A	0
3417	E.R.A.S.	3399317	10475600	VERNET LUIS AV	3807	B1842FWW	MONTE GRANDE	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA	A	0
3423	E.R.A.S.	3405465	10482798	ALBERTI MANUEL	1075	B1714FLU	ITUZAINGO	CLUB M. RODRIGUEZ FRAGIO	A	0
3400	E.R.A.S.	3421718	10497751	DE LOS GERANIOS	05902	B1678---	CASEROS	A. F. A. L. P.	A	0
3392	E.R.A.S.	3423077	10498841	GARZON CNL	3130	B1757---	GREGORIO DE LAFERRERE LM	CENTRO DE JUBILADOS NUEVA ESPERANZA	A	0
3405	E.R.A.S.	3463802	2781280	MORON	02453	C1406FVC	CAPITAL FEDERAL	ASOCIACION CIVIL HOGAR INFANTIL	A	0
3415	E.R.A.S.	3509820	10575362	CARRILLO RAMON	1702	B1827---	VILLA ALBERTINA	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3416	E.R.A.S.	3522818	10583502	PERON EVA PJE	2414	B1821---	VILLA FIORITO	LA SALUD COMO DERECHO UNIDAD SANITARIA	A	0
3398	E.R.A.S.	3529705	286662	CULPINA	01033	C1406ENU	CAPITAL FEDERAL	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3402	E.R.A.S.	3574047	10621975	24 DE OCTUBRE	1820	B1714GTD	ITUZAINGO SUR	INSTITUCIÓN NACIONAL DEL SCOUTISMO ARGEN	A	0
3414	E.R.A.S.	3578743	10624571	URQUIZA JUSTO JOSE DE	1054	B1838BXB	LUIS GUILLON	MONICA RUSH	A	0
3298	E.R.A.S.	3582519	10656	CHORROARIN AV	00134	C1427CWN	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3391	E.R.A.S.	3584823	10628119	BLAS PARERA (M)	1206	B1712LVZ	CASTELAR	ASOCIACION EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS	A	0
3392	E.R.A.S.	3589170	10629956	QUIROS CESAREO B DE	2174	B1714HHH	ITUZAINGO SUR	TITULARIDAD NO INFORMADA	A	0
3197	E.R.A.S.	3593701	8852	DE LOS ITALIANOS AV	651	C1107BLD	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3370	E.R.A.S.	3595000	10637310	COLECTORA OESTE RAMAL ESCOBAR (	39001	B1625---	LOMA VERDE	FUNDACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFER	A	0
3385	E.R.A.S.	3597705	10640242	MITRE (ES)	00797	B1625GDG	BELEN DE ESCOBAR	SOC. COSMOPOLITA DE SOCORROS MUTUOS	A	0
3396	E.R.A.S.	3598122	10639201	COLON (ES)	517	B1625GGI	BELEN DE ESCOBAR	CLUB SPORTIVO ESCOBAR	A	0
3399	E.R.A.S.	3598128	10639207	COLON (ES)	533	B1625GGI	BELEN DE ESCOBAR	CLUB SPORTIVO ESCOBAR	A	0
3406	E.R.A.S.	3598139	10639218	COLON (ES)	533	B1625GGI	BELEN DE ESCOBAR	CLUB SPORTIVO ESCOBAR	A	0
3410	E.R.A.S.	3605071	10647198	ITALIA	802	B1663NXR	SAN MIGUEL	CITE	A	0
3413	E.R.A.S.	3609281	10650399	PRINGLES	1511	B1663LKE	SAN MIGUEL	COOP TRABAJO EDUCADRORES MADRE TIERRA	A	0
3416	E.R.A.S.	3609338	10650625	FRAGA MANUEL CNEL	2101	B1663GAU	SAN MIGUEL	HOGAR LA POSADA	A	0
3382	E.R.A.S.	3609518	10649517	PELUFFO	1349	B1663GLE	SAN MIGUEL	FUNDACION SUZUKI	A	0
3359	E.R.A.S.	3626917	10668490	PAZ JOSE M	402	B1662AZJ	MUÑIZ	CLUB ATLE SAN LOREN	A	0
3420	E.R.A.S.	3637129	10678405	SANTA ANA	2001	B1663---	SANTA MARIA	ASOCIACION COOPERADORA CFP N°401 SAN MIG	A	0
3353	E.R.A.S.	3681522	10723001	RIVADAVIA BERNARDINO	620	B1744BUN	MORENO	MONASTERIO DE SANTA CLARA	A	0
3369	E.R.A.S.	3683687	10724635	ZEBALLOS ESTANISLAO S	347	B1744HKG	MORENO	CIRC.CAT. DE OBREROS	A	0
3381	E.R.A.S.	3694853	10734566	PIOVANO SALVADOR	00641	B1744OFC	MORENO	EL REMANSO DE MORENO CENTRO DE JUBILADOS	A	0
3402	E.R.A.S.	3717727	10757543	POSADAS ALEJANDRO DR	6276	B1743BGP	MORENO	CONGREGACION CRISTIANA EN LA ARGENTINA	A	0
3388	E.R.A.S.	3752611	10793559	CALLE REAL AV	575	B1722DPF	MERLO	CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PA	A	0
3352	E.R.A.S.	3754130	10794596	PASTEUR	656	B1722ENF	MERLO	CLUB ATLETICO Y SOCIAL BELGRANO	A	0
3360	E.R.A.S.	3761772	10802612	LOS PINOS	345	B1718ECG	SAN ANTONIO DE PADUA	DANIEL FRATEA	A	0
3411	E.R.A.S.	3810257	10927575	RODRIGUEZ MARTIN GRAL	202	B1828FJP	BANFIELD	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3408	E.R.A.S.	3816314	10857930	BATALLA DE AYACUCHO	98	B1887GIB	SAN JUAN BAUTISTA	RAUL ERNESTO AON	A	0
3390	E.R.A.S.	3827954	10870711	GORRITI JOSE IGNACIO	2939	B1888BXG	SAN JUAN BAUTISTA	EL REDENTOR VIVE IGLESIA EVANGELICA PENT	A	0
3416	E.R.A.S.	3840164	10880695	CALCHAQUI AV	6201	B1888AAM	SAN JUAN BAUTISTA	UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE	A	0
3384	E.R.A.S.	3842749	10885810	FLEMING ALEJANDRO	125	B1853---	VILLA VATTEONE	IGLESIA EVANGELICA LUTERANA ARGENTINA	A	0
3368	E.R.A.S.	3866492	10908743	PODESTA PABLO	1501	B1889HBK	BOSQUES	ASOC ARG DE LOS ADVEN	A	0
3386	E.R.A.S.	3909354	10964833	RANGUGNI JORGE ALFREDO	2803	B1714LCE	ITUZAINGO	CENTRO DE JUBILADOS B° AERONAUTICO	A	0
3401	E.R.A.S.	3914726	10987790	DARACT JUSTO	02231	B1744NCG	MORENO	CENTRO COMUNITARIO KADIMA	A	0
3415	E.R.A.S.	3938872	10995391	CALLE 9	501	B1862LBK	GUERNICA	IGLESIA NOSOTROS SOM	A	0
3415	E.R.A.S.	3938892	10995466	CALLE 9	601	B1862LBM	GUERNICA	LAS VIÑAS CLUB DEPORTIVO	A	0
3352	E.R.A.S.	3947165	11003565	LORENZINI CAROLINA ELENA	2091	B1888FZY	SAN JUAN BAUTISTA	MOVIMIENTO CRISTIANO	A	0
3419	E.R.A.S.	3960874	11016061	MONTERREY	1201	B1863---	ESTANISLAO SEVERO ZEBALL(	MARIANO BORRELLI	A	0
3388	E.R.A.S.	3972233	11029251	IRIARTE	1840	C1291ABL	CAPITAL FEDERAL	CLUB SPORTIVO BARRACAS	A	0
3387	E.R.A.S.	3983801	1904416	LARREA	00782	C1030AAP	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
3410	E.R.A.S.	3999514	1211357	DOYHENARD	002	B1836EVB	LLAVALLOL	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3417	E.R.A.S.	3999518	1401189	GIBSON J	00434	B1836ARB	LLAVALLOL	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	A	0
3413	E.R.A.S.	4000721	11052594	AVILES MARQUES DE	2345	B1681---	WILLIAM C MORRIS	IGLESIA EVANGELICA ESMIRNA	A	0
3422	E.R.A.S.	4006904	11057046	MARQUEZ TOMAS AV	1153	B1629AHC	PILAR	CLUB SPORTIVO PILAR	A	0
3414	E.R.A.S.	4031987	11135337	AZURDUY JUANA	1242	B1635ACZ	PILAR	ASOCIACION IGLESIA EVANGELICA DEL NAZARE	A	0
3424	E.R.A.S.	4094233	130413	MISTRAL GABRIELA	03151	C1419GFU	CAPITAL FEDERAL	CLUB SOC. SPORTIVO DEVOTO	A	0
3408	E.R.A.S.	4105808	11140911	YRIGOYEN HIPOLITO AV (RP 24)	00132	B1617FRO	GENERAL PACHECO	FACULTAD REGIONAL GRAL. PACHECO UNIVERSI	A	0
3419	E.R.A.S.	4114045	11147980	PIAZZOLA ASTOR	03056	C1281---	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3396	E.R.A.S.	4125282	11156809	BENAVIDEZ AV (B)	1064	B1621---	BENAVIDEZ	ASOC.REL. Y CUL.ISRAELITA LAMROTH HAKOL	A	0

Formato N° 906

Nuevo Programa de Tarifa Social

Detalle de Instituciones sin fines de lucro

Situación al 31 de diciembre de 2025

Lote de ingreso	Marca	Cuenta Contrato	Instalación	Calle	Nro.	CodPostal	Localidad	Titularidad del servicio	Acción	Módulos
3380	E.R.A.S.	4125285	11157354	BENAVIDEZ AV (B)	904	B1621---	BENAVIDEZ	NATALIA MACARIO	A	0
3298	E.R.A.S.	4136226	2782836	ROCA CNEL AV	04509	C1439DUI	CAPITAL FEDERAL	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	A	0
3421	E.R.A.S.	4155004	11179887	CHILAVERT	00225	B1621---	BENAVIDEZ	FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS	A	0
3385	E.R.A.S.	4156717	11180858	GUAYAQUIL	00800	B1609BDP	BOULOGNE SUR MER	CENTRO DE SALUD "BARRIO OBRERO"	A	0
3400	E.R.A.S.	4170679	830991	GARCIA DEL RIO AV	02735	C1429DED	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
3400	E.R.A.S.	4170679	830997	GARCIA DEL RIO AV	02735	C1429DED	CAPITAL FEDERAL	CONSORCIO DE PROPIETARIOS	A	0
3406	E.R.A.S.	4192878	11196354	LIBERTAD (PD)	2967	B1635---	PRESIDENTE DERQUI	CENTRO COMUNITARIO	A	0
3408	E.R.A.S.	4194169	11197418	3 DE OCTUBRE	02365	B1715---	VILLA GOBERNADOR UDAOND	DIEGO DE NAZARET CENTRO TERAPEUTICO	A	0
3408	E.R.A.S.	4194170	11197419	3 DE OCTUBRE	02379	B1715---	VILLA GOBERNADOR UDAOND	DIEGO DE NAZARET CENTRO TERAPEUTICO	A	0
3408	E.R.A.S.	4194172	11197421	CHAZARRETA ANDRES	02366	B1715---	VILLA GOBERNADOR UDAOND	DIEGO DE NAZARET CENTRO TERAPEUTICO	A	0
3386	E.R.A.S.	4212704	11209466	215-LOMAS DE ZAMORA	00234	B1877CDF	DON BOSCO	CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS EL ABU	A	0
3394	E.R.A.S.	4252103	11260308	WILLIAMS (ET)	1101	B1618FMC	EL TALAR	MISION EVANGELICA ARGENTINA	A	0
3393	E.R.A.S.	4261202	11258426	WILLIAMS (RM-T)	2245	B1624EJK	RINCON DE MILBERG	MARIA SOLEDAD Y JUNTA VEC REM DUT ASOC C	A	0
3405	E.R.A.S.	4283705	11275739	24 DE OCTUBRE	1818	B1714GTD	ITUZAINGO SUR	INSTITUCIÓN NACIONAL DEL SCOUTISMO ARGEN	A	0
3414	E.R.A.S.	4298782	2780634	REPUBLICA ARABE SIRIA	01950	B1703AIT	JOSE INGENIEROS	ASOCIACIÓN DE FOMENTO JOSE INGENIEROS	A	0
3410	E.R.A.S.	4303473	2542473	SALTA	01799	B1869DGK	GERLI (AV)	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA ARGENTINA	A	0

22.7. Balance Económico Social

aysa	**Información Cualitativa** **para el** **Balance Económico Social**	**Informe Anual** **20vo. Año de la Concesión** **Formato N° 950**

Caracterización Económica y Social de la Población

El Régimen Tarifario de AySA S.A. incluye entre los parámetros de facturación variables que pueden considerarse proxy de nivel socioeconómico de los usuarios. Entre ellas la más destacada es la correspondiente al Coeficiente Zonal.

Si bien los perímetros zonales vigentes no han sido actualizados en los últimos 30 años, existe un trabajo de relevamiento de micro áreas con cambios significativos en sus características inmobiliarias que fue aprobado por el ex ETOSS durante el 2001. Tal trabajo de calificación y redefinición de perímetros fue re-validado en el marco de la Comisión de Trabajo integrada por el ERAS, la APLA, la SSRH y AySA a los efectos de proponer el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias tras verificar la correspondencia de las distintas áreas zonales con otros indicadores de nivel socioeconómico. Considerando la introducción de tales modificaciones, independientemente de su vigencia tarifaria, es posible describir de manera aproximada la distribución de los usuarios en niveles socioeconómicos a partir de la ubicación de sus inmuebles en las distintas áreas zonales. Adicionalmente, la base catastral de la Empresa identifica a los barrios caracterizados como carenciados, sirviendo esta clasificación adicional como una distinción más precisa para las situaciones de mayor vulnerabilidad social y económica.


A partir de tales consideraciones, la distribución de usuarios residenciales (asimilable aproximadamente a hogares) en las distintas áreas zonales y en los barrios caracterizados como “carenciados” es la que se detalla en el cuadro 1.

Cuadro 1: Distribución de usuarios a diciembre de 2025 según zona.

Tipo de Area	Usuarios Residenciales			
	PV	PH	TOTAL	%
Barrio Carenciado	617.125	103.661	720.786	20,8%
1,10	69.713	7.550	77.263	2,2%
1,30	533.439	74.356	607.795	17,6%
1,45	297.234	105.749	402.983	11,6%
1,60	119.796	217.441	337.237	9,7%
1,80	130.398	222.027	352.425	10,2%
2,00	60.013	302.949	362.962	10,5%
2,20	24.257	191.004	215.261	6,2%
2,40	6.421	90.194	96.615	2,8%
2,75	17.519	119.477	136.996	4,0%
3,10	8.168	64.188	72.356	2,1%
3,50	482	76.492	76.974	2,2%
Totales	**1.884.565**	**1.575.088**	**3.459.653**	**100,0%**

A efectos de simplificar tal descripción es razonable agrupar las áreas correspondientes a barrios carenciados, zonales 1,10 y 1,30 como áreas con preponderancia de nivel socioeconómico bajo. Asimismo, las áreas zonales 1,45 y 1,60 presentarán preponderancia de niveles socioeconómicos medios – bajos, las correspondientes a zonales 1,80, 2,00 y 2,20 a niveles socioeconómicos medios, las correspondientes a zonales 2,40 y 2,75 a niveles socioeconómicos medios – altos y finalmente las correspondientes a zonales 3,10 y 3,50 a niveles socioeconómicos altos. El resultado de la distribución tras tal simplificación se presenta en el gráfico 1.

Gráfico 1: Distribución de usuarios según nivel socioeconómico preponderante en las áreas que habitan.

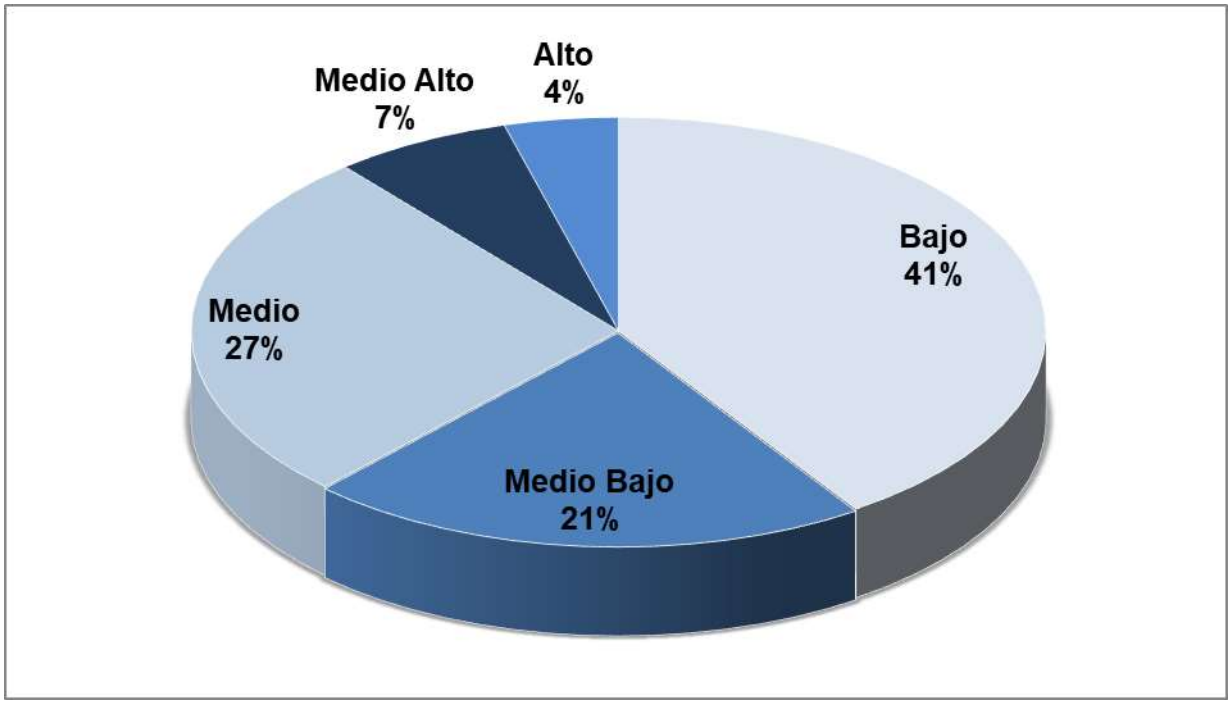

FORMATO Nº 970

Usuarios con descuento según rango de coeficiente zonal

Al 31 de diciembre de 2025

Partido	Cantidad de usuarios (unidades funcionales)	Usuarios en rango zonal BAJO (Z ≤ 1,45)			Usuarios en rango zonal MEDIO (1,60 ≤ Z ≥ 2,00)			Usuarios en rango zonal ALTO (Z ≥ 2,20)		
		Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social	Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social	Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social
Capital	**1.488.054**	**12.757**	**88.053**	**5.671**	**787.255**		**30.281**	**552.163**		**11.874**
Vicente López	111.304	6.380	58.205	2.372	20.297		627	22.742		681
San Isidro	101.733	4.471	47.238	2.330	9.697		397	36.805		795
San Martín	124.764	10.909	93.176	5.232	14.775		672			
San Fernando	40.139	2.410	21.761	1.557	12.217		434	1.733		27
Tigre	96.172	5.217	69.718	1.990	7.020		383	11.842		2
Escobar	24.855	1.010	17.655	335	5.370		117	368		
San Miguel	70.587	2.129	47.040	764	19.548		613	491		2
José C. Paz	5.580	224	5.300	56						
Malvinas Argentinas	9.936	294	9.538	104						
Pilar	29.353	842	22.108	322	3.036		55	2.984		6
Norte	**614.423**	**33.886**	**391.739**	**15.062**	**91.960**	**0**	**3.298**	**76.965**	**0**	**1.513**
Tres de Febrero	106.212	8.852	73.939	4.339	18.039		1.043			
Morón	113.703	5.672	86.649	5.251	15.554		577			
Hurlingham	45.058	2.433	41.285	1.338				2		
Ituzaingó	36.875	2.071	33.463	1.338				3		
La Matanza	369.665	20.568	305.103	13.078	13.071		621	16.599		625
Merlo	89.704	3.667	82.618	1.647	1.711		61			
Moreno	69.084	3.067	59.003	1.394	5.202		188	230		
Oeste	**830.301**	**46.330**	**682.060**	**28.385**	**53.577**	**0**	**2.490**	**16.834**	**0**	**625**
Avellaneda	112.442	6.798	63.057	3.663	37.078		1.846			
Lanús	138.437	8.390	93.396	5.119	29.999		1.533			
Quilmes	161.637	7.730	101.037	7.682	41.881		2.459	848		
Florencio Varela	96.336	2.963	81.984	5.043	5.741		605			
Sur Este	**508.852**	**25.881**	**339.474**	**21.507**	**114.699**	**0**	**6.443**	**848**	**0**	**0**
Almirante Brown	106.404	4.749	90.729	4.478	6.233		171	44		
Esteban Echeverría	84.326	4.959	71.469	3.331				4.545		22
Ezeiza	44.094	1.930	40.470	1.101				591		2
Lomas de Zamora	186.092	7.968	150.064	5.652	21.916		492			
Pte. Perón	24.202	735	22.971	496						
Sur Oeste	**445.118**	**20.341**	**375.703**	**15.058**	**28.149**	**0**	**663**	**5.180**	**0**	**24**
Total AySA	**3.886.748**	**139.195**	**1.877.029**	**85.683**	**1.075.640**	**0**	**43.175**	**651.990**	**0**	**14.036**

FORMATO Nº 971

Usuarios Residenciales con descuento según rango de coeficiente zonal

Al 31 de diciembre de 2025

Partido	Cantidad de usuarios (unidades funcionales)	Usuarios en rango zonal BAJO (Z ≤ 1,45)			Usuarios en rango zonal MEDIO (1,60 ≤ Z ≥ 2,00)			Usuarios en rango zonal ALTO (Z ≥ 2,20)		
		Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social	Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social	Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social
Capital	**1.315.150**		**87.257**	**5.638**	**722.603**		**30.117**	**457.771**		**11.764**
Vicente López	101.349		57.941	2.349	18.518		623	21.238		680
San Isidro	91.673		46.790	2.306	9.099		394	32.305		779
San Martín	110.083		92.567	5.215	11.641		660			
San Fernando	35.685		21.561	1.555	10.510		433	1.600		26
Tigre	86.179		66.321	1.978	5.968		381	11.529		2
Escobar	21.840		16.593	333	4.433		113	368		
San Miguel	64.230		45.621	762	16.758		609	478		2
José C. Paz	5.195		5.139	56						
Malvinas Argentinas	9.422		9.318	104						
Pilar	25.048		19.613	319	2.134		55	2.921		6
Norte	**550.704**	**0**	**381.464**	**14.977**	**79.061**	**0**	**3.268**	**70.439**	**0**	**1.495**
Tres de Febrero	94.979		73.429	4.317	16.203		1.030			
Morón	103.797		85.463	5.242	12.520		572			
Hurlingham	41.751		40.415	1.334				2		
Ituzaingó	33.135		31.803	1.330				2		
La Matanza	330.696		290.154	13.058	11.659		621	14.582		622
Merlo	80.369		77.464	1.645	1.200		60			
Moreno	58.497		52.687	1.390	4.005		185	230		
Oeste	**743.224**	**0**	**651.415**	**28.316**	**45.587**	**0**	**2.468**	**14.816**	**0**	**622**
Avellaneda	99.604		62.722	3.651	31.390		1.841			
Lanús	125.054		92.815	5.091	25.618		1.530			
Quilmes	146.648		98.972	7.673	36.714		2.441	848		
Florencio Varela	87.682		77.187	5.036	4.855		604			
Sur Este	**458.988**	**0**	**331.696**	**21.451**	**98.577**	**0**	**6.416**	**848**	**0**	**0**
Almirante Brown	98.511		88.531	4.475	5.290		171	44		
Esteban Echeverría	75.669		68.079	3.319				4.249		22
Ezeiza	39.469		37.804	1.100				563		2
Lomas de Zamora	172.350		147.822	5.573	18.475		480			
Pte. Perón	16.902		16.409	493						
Sur Oeste	**402.901**	**0**	**358.645**	**14.960**	**23.765**	**0**	**651**	**4.856**	**0**	**24**
Total AySA	**3.470.967**	**0**	**1.810.477**	**85.342**	**969.593**	**0**	**42.920**	**548.730**	**0**	**13.905**

FORMATO Nº 972

Usuarios No Residenciales con descuento según rango de coeficiente zonal

Al 31 de diciembre de 2025

Partido	Cantidad de usuarios (unidades funcionales)	Usuarios en rango zonal BAJO (Z ≤ 1,45)			Usuarios en rango zonal MEDIO (1,60 ≤ Z ≥ 2,00)			Usuarios en rango zonal ALTO (Z ≥ 2,20)		
		Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social	Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social	Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social
Capital	**167.476**	**12.757**		**33**	**61.056**		**164**	**93.356**		**110**
Vicente López	9.490	6.380		23	1.697		4	1.385		1
San Isidro	9.064	4.471		24	529		3	4.021		16
San Martín	14.014	10.909		17	3.076		12			
San Fernando	4.107	2.410		2	1.632		1	61		1
Tigre	6.446	5.217		12	927		2	288		
Escobar	1.803	1.010		2	787		4			
San Miguel	4.508	2.129		2	2.364		4	9		
José C. Paz	224	224								
Malvinas Argentinas	294	294								
Pilar	1.595	842		3	748			2		
Norte	**51.545**	**33.886**	**0**	**85**	**11.760**	**0**	**30**	**5.766**	**0**	**18**
Tres de Febrero	10.581	8.852		22	1.694		13			
Morón	8.602	5.672		9	2.916		5			
Hurlingham	2.437	2.433		4						
Ituzaingó	2.079	2.071		8						
La Matanza	23.811	20.568		20	1.340			1.880		3
Merlo	4.151	3.667		2	481		1			
Moreno	4.084	3.067		4	1.010		3			
Oeste	**55.745**	**46.330**	**0**	**69**	**7.441**	**0**	**22**	**1.880**	**0**	**3**
Avellaneda	12.391	6.798		12	5.576		5			
Lanús	12.673	8.390		28	4.252		3			
Quilmes	12.474	7.730		9	4.717		18			
Florencio Varela	3.688	2.963		7	717		1			
Sur Este	**41.226**	**25.881**	**0**	**56**	**15.262**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**
Almirante Brown	5.635	4.749		3	883					
Esteban Echeverría	4.973	4.959		11				3		
Ezeiza	1.937	1.930		1				6		
Lomas de Zamora	11.405	7.968		79	3.346		12			
Pte. Perón	738	735		3						
Sur Oeste	**24.688**	**20.341**	**0**	**97**	**4.229**	**0**	**12**	**9**	**0**	**0**
Total AySA	**340.680**	**139.195**	**0**	**340**	**99.748**	**0**	**255**	**101.011**	**0**	**131**

FORMATO Nº 973

Usuarios Baldios con descuento según rango de coeficiente zonal

Al 31 de diciembre de 2025

Partido	Cantidad de usuarios (unidades funcionales)	Usuarios en rango zonal BAJO (Z ≤ 1,45)			Usuarios en rango zonal MEDIO (1,60 ≤ Z ≥ 2,00)			Usuarios en rango zonal ALTO (Z ≥ 2,20)		
		Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social	Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social	Sin subsidio	Subsidio del estado nacional	Tarifa Social
Capital	**5.428**		**796**		**3.596**			**1.036**		
Vicente López	465		264		82			119		
San Isidro	996		448		69			479		
San Martín	667		609		58					
San Fernando	347		200		75			72		
Tigre	3.547		3.397		125			25		
Escobar	1.212		1.062		150					
San Miguel	1.849		1.419		426			4		
José C. Paz	161		161							
Malvinas Argentinas	220		220							
Pilar	2.710		2.495		154			61		
Norte	**12.174**	**0**	**10.275**	**0**	**1.139**	**0**	**0**	**760**	**0**	**0**
Tres de Febrero	652		510		142					
Morón	1.304		1.186		118					
Hurlingham	870		870							
Ituzaingó	1.661		1.660					1		
La Matanza	15.158		14.949		72			137		
Merlo	5.184		5.154		30					
Moreno	6.503		6.316		187					
Oeste	**31.332**	**0**	**30.645**	**0**	**549**	**0**	**0**	**138**	**0**	**0**
Avellaneda	447		335		112					
Lanús	710		581		129					
Quilmes	2.515		2.065		450					
Florencio Varela	4.966		4.797		169					
Sur Este	**8.638**	**0**	**7.778**	**0**	**860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Almirante Brown	2.258		2.198		60					
Esteban Echeverría	3.684		3.390	1				293		
Ezeiza	2.688		2.666					22		
Lomas de Zamora	2.337		2.242		95					
Pte. Perón	6.562		6.562							
Sur Oeste	**17.529**	**0**	**17.058**	**1**	**155**	**0**	**0**	**315**	**0**	**0**
Total AySA	**75.101**	**0**	**66.552**	**1**	**6.299**	**0**	**0**	**2.249**	**0**	**0**



