INFORME DE NIVELES DE SERVICIO 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 1.1

aysa

Índice General del
Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 1.1

1 Agua

1.1 Calidad de Agua

1.1.1 Calidad Agua Cruda Subterránea

1.1.2 Calidad Agua Cruda Superficial

1.1.3 Calidad Agua Producida

1.1.4 Calidad Agua en Redes de Distribución

TOMO 1.2

1.2 Producción

1.3 Transporte

1.4 Insumos Químicos

1.4.1 Consumo Plantas

1.4.2 Consumo Elevadoras + Pozos + Plantas Tratamiento

1.5 Información General

1.5.1 Continuidad del Abastecimiento – Reclamos

1.5.2 Conexiones

1.5.3 Fuentes Alternativas

1.5.4 Contactos con los Usuarios

1.6 Presión del Servicio

1.7 Reducción de Agua No Contabilizada

Índice General del
Informe Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 2

2 Saneamiento

2.1 Calidad de los Efluentes

2.1.1 Redes Cloacales

2.1.2 Plantas Depuradoras

2.1.3 Descarga a Cuerpo Receptor

2.1.4 Efluentes Industriales

2.1.5 Biosólidos

2.2 Depuración

2.3 Transporte

2.4 Información General

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 1.1

1 AGUA

1.1 CALIDAD DE AGUA

1.1.1 Calidad de Agua Cruda Subterránea

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 07	**010-INS-A-CA-CRU-PS-00**	Calidad de Agua Cruda Subterránea.
PL INS 08	**020-INS-A-CA-CRU-PS-01**	Calidad de Agua Cruda Subterránea (parque de PSS - parámetros: Nitratos, Arsénico, Escherichia Coli, Pseudomonas, Coliformes Totales, Bacterias Heterótrofas, Tetracloruro de Carbono y Tricloroetileno).
PL INS 09	**030-INS-A-CA-CRU-PS-02**	Evolución Calidad Agua Subterránea producida Area Concesión.
		Gráfico de la evolución del número de pozos en funcionamiento.
		Gráfico Evolución de los Nitratos y de Sales disueltos.
		Gráfico Evolución de Arsénico y Tricloroetileno.
PL INS 69	**040-INS-A-CA-CRU-PS-03**	Listado de pozos con muestreo incompleto.
	050-INS-A-CA-CRU-PS-04	Listado puntos cercanos.

1.1.2 Calidad de Agua Cruda Superficial

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 02	**060-INS-A-CA-CRU-PSM-00**	Calidad de agua cruda superficial Planta San Martín.
PL INS 57/60/63	**070-INS-A-CA-CRU-PSM-01**	Planta San Martín: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global y por salida - número de determinaciones.
PL INS 03	**080-INS-A-CA-CRU-PMB-00**	Calidad de Agua Cruda Superficial Planta Manuel Belgrano.
PL INS 58/61/64	**090-INS-A-CA-CRU-PMB-01**	Planta Belgrano: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global y por salida - número de determinaciones.
	120-INS-A-CA-CRU-PJMR-00	Calidad de agua cruda superficial Planta Juan Manuel de Rosas
	130-INS-A-CA-CRU-PJMR-01	Planta Juan Manuel del Rosas: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global y por salida - número de determinaciones
	135-Gráficos PSM	Gráficos Planta San Martín - Agua Cruda y de Consumo. Parámetros: Turbiedad, pH, Amonio y UV254.-
	136-Gráficos PMB	Gráficos Planta Manuel Belgrano - Agua Cruda y de Consumo. Parámetros: Turbiedad, pH, Amonio y UV254.-
	137-Gráficos PJMR	Gráficos Planta Juan Manuel de Rosas - Agua Cruda y de Consumo. Parámetros: Turbiedad, pH, Amonio y UV254.-

1.1.3 Calidad de Agua Producida

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 01	**140-INS-A-CA-PR-00**	Calidad de agua producida - SIT Anual.
PL INS 05	**150-INS-A-CA-PR-01**	Calidad de agua superficial tratada (Plantas: San Martín, M. Belgrano y J.M. Rosas).

1.1.4 Calidad de Agua en Redes de Distribución (PARTE 1)

Código Anterior	Código Actual	Título
SIT REDES	**160-INS-A-CA-RED-00**	Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución.
PL INS 10	**170-INS-A-CA-RED-01**	Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución.
PL INS 11	**180-INS-A-CA-RED-02**	Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución.

TOMO 1.2

1.1.4 Calidad de Agua en Redes de Distribución (PARTE 2)

Código Anterior	Código Actual	Título
	200-INS-A-CA-RED-03	Análisis y seguimiento anomalías en Red.
	210-INS-A-CA-RED-04	Análisis y seguimiento anomalías en puntos cercanos a PSS.

1.2 PRODUCCION

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 55	**220-INS-A-PR-00**	SIT - Producción de Agua.
PL INS 70	**230-INS-A-PR-01**	Almacenamiento de agua potable - instalaciones en uso.

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

1.3 TRANSPORTE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 56	**240-INS-A-TR-00**	SIT - Transporte Agua.

1.4 INSUMOS QUIMICOS

1.4.1 Consumo Plantas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 66	**250-INS-A-IQ-PSM**	Planta San Martín: Evolución de Consumos de Insumos Químicos.
PL INS 67	**260-INS-A-IQ-PMB**	Planta Manuel Belgrano: Evolución de Consumos de Insumos Químicos.
	280-INS-A-IQ-PJMR	Planta Juan Manuel Rosas: Evolución de Consumos de Insumos Químicos.

1.4.2 Consumo Elevadoras + Pozos + Plantas Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
	290-INS-A-IQ-TR-00	Estaciones Elevadoras - Pozos de Agua - Evolución de insumos químicos.
	291-INS-A-IQ-TR-01	Plantas de Tratamiento de Agua Subterránea - Evolución de insumos químicos.

1.5 INFORMACION GENERAL

1.5.1 Continuidad del Abastecimiento - Reclamos

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 12/13/14/15 /16/17/18/40/41/42	**300-INS-A-IG-SIT-DDRR**	Continuidad del abastecimiento de Agua - Cortes Programados en el Servicio (Identificación del número y de la magnitud de los cortes).

1.5.2 Conexiones

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 19	**310-INS-A-IG-CON-00**	Agua - Solicitudes de Conexión, Reconexión y Desconexión.

1.5.3 Fuentes Alternativas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 20	**320-INS-A-IG-FA-00**	Mantenimiento de Fuentes Alternativas (Resumen de MFA por Región y Partido).

1.5.4 Contactos con los Usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 52	**330-INS-IG-USU-00**	Clasificación de los contactos con los usuarios.
PL INS 53	**340-INS-IG-USU-01**	Contactos personales y telefónicos con usuarios.
PL INS 54	**350-INS-IG-USU-02**	Telemarketing: Nivel de Servicio.

1.6 PRESIÓN DEL SERVICIO

Código Anterior	Código Actual	Título
	360-INS 1.6	Presión del Servicio.
Planos		Presiones Máximas, Mínimas y Promedio anual. Curvas de Presión AySA y regionales.

1.7 REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

Código Anterior	Código Actual	Título
	370-INS 1.7	Reducción de Agua No Contabilizada.

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 2

2.1 CALIDAD DE LOS EFLUENTES

2.1.1 Redes Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 22/30/37	**2010-INS-S-CS-RED-00**	Calidad en Redes Cloacales por áreas de tratamiento.

2.1.2 Plantas Depuradoras

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 23/24/25/26/27	**2020-INS-S-CS-PD-00**	Calidad en Plantas Depuradoras: Caudal, DBO, DQO, SS 10', MES, Barros Bombeados, Biosólidos evacuados y % de eliminación de DBO, DQO, SS10' y MES. Se exponen Gráficos de DBO por planta.

2.1.3 Descarga a cuerpo receptor

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/39	**2030-INS-S-CS-CR-00**	Calidad de Efluentes - Descarga de los Establecimientos Depuradores: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. **Datos Lab. Plantas.**
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/39	**2040-INS-S-CS-CR-01**	Calidad de Efluentes - Descarga de los Establecimientos Depuradores: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. **Datos Lab. Central.**
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/39	**2050-INS-S-CS-CR-02**	Calidad de Efluentes - Descarga de Wilde - Radio Antiguo - Berazategui: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. **Datos Lab. Central.**
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/40	**2060-INS-S-CS-CR-03**	Calidad de Efluentes - Descarga Radio Antiguo - Berazategui: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. DETALLE - **Datos Lab. Central.**

2.1.4 Efluentes Industriales

Código Anterior	Código Actual	Título
	2070-2.1.4 INS-CIC-2024	Control Integral de la Contaminación (CIC).
S/N	**2070-INS-S-CS-CIC-00**	SIT - Efluentes industriales - Anual.
PL INS 71	**2071-INS-S-CS-CIC-01**	Control de Industrias.
PL INS 72	**2072-INS-S-CS-CIC-02**	Efluentes industriales a colectoras - Operativos.
PL INS 72	**2073-INS-S-CS-CIC-03**	Efluentes industriales a colectoras - Control Directo Programado.
PL INS 72	**2074-INS-S-CS-CIC-04**	Efluentes industriales a colectoras - Control Directo No Programado.

2.1.5 Biosólidos

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 76 y 77	**2080-INS-S-CS-BS-00**	Planta Depuradora Norte - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2081-INS-S-CS-BS-02	PD Sudoeste - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2084-INS-S-CS-BS-04	PDH - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2086-INS-S-CS-BS-06	PSC - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2088-INS-S-CS-BS-08	PDEJ2 - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2090-INS-S-CS-BS-10	PDBU - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2091-INS-S-CS-BS-14	PDBV - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2092-INS-S-CS-BS-15	PDE - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2093-INS-S-CS-BS-17	PDFe - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2094-INS-S-CS-BS-20	PDG - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2095-INS-S-CS-BS-21	PDCAT - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2096-INS-S-CS-BS-19	PDL - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

2.2 DEPURACIÓN

Código Anterior	Código Actual	Título
S/N	**2100-INS-S-DP-00**	SIT - Tratamiento.
PL INS 74	**2110-INS-S-DP-01**	Volúmenes de Líquidos Cloacales Bombeados y Tratados.

2.3 TRANSPORTE

Código Anterior	Código Actual	Título
S/N	**2120-INS-S-TR-00**	SIT - Transporte.
PL INS 75	**2121-INS-S-TR-01**	Estaciones de Bombeo de Líquidos Cloacales (Región Centro, Región Norte, Región Sur).

2.4 INFORMACIÓN GENERAL

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 43	**2130-INS-S-IG-CON-00**	Conexiones - Conexión, reconexión, desconexión.
PL INS 45	**2140-INS-S-IG-MDA-00**	Mantenimiento de Fuentes Alternativas (Resumen de MFA por Región y Partido).
PL INS 49/50/51	**2150-INS-S-IG-DBC-00**	Instalaciones de desborde de seguridad en red y en estaciones de bombeo.
PL INS 46/47/48	**2151-INS-S-DBC-01**	Instalaciones de desborde de seguridad.
	2160-INS-S-RES-00	Residuos de Rejas y/o Tamices
Plano		Red de Cloaca - Desbordes de Seguridad - Concesión.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Capital Federal.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Norte.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Oeste.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Sudoeste.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Sudeste.

1 AGUA

1.1 CALIDAD DE AGUA

1.1.1 Calidad Agua Cruda Subterránea

REGIONES/Distritos		Cantidad de pozos considerados	Color (u.de.Color)	Turbiedad (NTU)	Alcalinidad (mg/l)	Aluminio (mg/l)	Arsénico (µg/l)	Cadmio (µg/l)	Cianuros (mg/l)	Cloruros (mg/l)	Cobre (mg/l)	Cromo (µg/l)	Dureza Total (mg/l)	Fluoruros (mg/l)	Hierro (mg/l)	Manganeso (mg/l)	Mercurio (µg/l)	Nitratos (NO3) [mg/l]	pH (u.de.pH)	Plomo (µg/l)	Selenio (µg/l)	Sulfatos (mg/l)	Zinc (mg/l)	Trihalometanos Totales (µg/l)	Aldrin (µg/l)	Dieldrin (µg/l)
			38	91	9	12	16	25	27	34	36	40	44	49	55	60	61	66	72	75	79	82	28	90	10	43
ESCOBAR	N° de muestras	3	6	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	6	6
	Concentración Promedio		< 5	0,25	394	< 0,1	17	< 0,1	< 0,05	18,1	< 0,05	20,7	152	0,7	< 0,05	< 0,04	< 0,5	35	7,7	< 5	< 5	11,4	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	21%	7%	0%	11%	0%	0%	8%	0%	108%	8%	13%	0%	0%	0%	10%	2%	0%	0%	16%	22%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,30	412	< 0,1	19	< 0,1	< 0,05	19,5	< 0,05	53,0	168	0,8	< 0,05	< 0,04	< 0,5	38	7,9	< 5	< 5	13,6	0,08	< 6	< 0,01	< 0,01
JOSE C PAZ	N° de muestras	4	8	16	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	8	8
	Concentración Promedio		< 5	0,31	397	< 0,1	38	< 0,1	< 0,05	35,0	< 0,05	< 5	108	0,8	< 0,05	< 0,04	< 0,5	58	7,6	< 5	< 5	13,2	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	39%	8%	0%	6%	0%	0%	16%	0%	0%	12%	11%	0%	0%	0%	16%	2%	0%	0%	11%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,60	459	< 0,1	41	< 0,1	< 0,05	43,7	< 0,05	< 5	133	1,0	< 0,05	< 0,04	< 0,5	70	7,7	< 5	< 5	15,8	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
MALVINAS ARGENTINAS	N° de muestras	11	21	43	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	10	21	21
	Concentración Promedio		< 5	0,29	415	< 0,1	17	< 0,1	< 0,05	41,6	< 0,05	< 5	226	0,6	< 0,05	< 0,04	< 0,5	74	7,5	< 5	< 5	14,7	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	22%	13%	0%	14%	0%	0%	32%	0%	0%	17%	19%	0%	0%	0%	28%	2%	0%	0%	43%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,50	555	< 0,1	22	< 0,1	< 0,05	69,9	< 0,05	< 5	289	0,9	< 0,05	< 0,04	< 0,5	112	7,8	< 5	< 5	39,6	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
PILAR	N° de muestras	60	117	235	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	81	117	117
	Concentración Promedio		< 5	0,28	433	< 0,1	25	< 0,1	< 0,05	29,7	< 0,05	5,2	149	0,8	< 0,05	< 0,04	< 0,5	44	7,5	< 5	5,1	16,9	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	26%	10%	0%	26%	0%	0%	36%	0%	35%	45%	19%	0%	0%	0%	43%	2%	0%	8%	41%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,50	559	< 0,1	42	< 0,1	< 0,05	61,5	< 0,05	19,0	329	1,2	< 0,05	< 0,04	< 0,5	88	8,1	< 5	7,8	39,6	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
SAN MIGUEL	N° de muestras	58	114	226	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	68	114	114
	Concentración Promedio		< 5	0,27	445	< 0,1	19	< 0,1	< 0,05	74,1	< 0,05	< 5	242	0,6	< 0,05	0,05	< 0,5	72	7,4	< 5	5,1	56,5	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	30%	19%	0%	48%	0%	0%	244%	0%	0%	39%	19%	23%	92%	0%	23%	3%	0%	8%	334%	24%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,80	577	< 0,1	58	< 0,1	< 0,05	1.230	< 0,05	< 5	483	1,0	0,15	0,30	< 0,5	107	8,1	< 5	8,2	1.250,0	0,18	< 6	< 0,01	< 0,01
TOTAL NORTE	**N° de muestras**	**136**	**266**	**532**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**166**	**266**	**266**
	Concentración Promedio		**< 5**	**0,28**	**435**	**< 0,1**	**22**	**< 0,1**	**< 0,05**	**49,5**	**< 0,05**	**5,5**	**194**	**0,7**	**< 0,05**	**< 0,04**	**< 0,5**	**58,9**	**7,5**	**< 5**	**5,1**	**33,5**	**< 0,05**	**< 6**	**< 0,01**	**< 0,01**
	Coeficiente de Variación		**0%**	**28%**	**15%**	**0%**	**39%**	**0%**	**0%**	**242%**	**0%**	**74%**	**46%**	**26%**	**15%**	**70%**	**0%**	**38%**	**3%**	**0%**	**8%**	**373%**	**17%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**< 5**	**0,80**	**577**	**< 0,1**	**58**	**< 0,1**	**< 0,05**	**1.230**	**< 0,05**	**53,0**	**483**	**1,2**	**0,15**	**0,30**	**< 0,5**	**112,0**	**8,1**	**< 5**	**8,2**	**1.250,0**	**0,18**	**< 6**	**< 0,01**	**< 0,01**
LA MATANZA NORTE	N° de muestras	26	53	111	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	51	53	53
	Concentración Promedio		< 5	0,37	426	< 0,1	19	< 0,1	< 0,05	48	< 0,05	< 5	201	0,6	< 0,05	< 0,04	< 0,5	70	7,5	< 5	< 5	18,3	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	78%	10%	0%	33%	0%	0%	50%	0%	0%	41%	28%	24%	0%	0%	50%	2%	0%	0%	43%	16%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	2,80	533	< 0,1	32	< 0,1	< 0,05	99	< 0,05	< 5	353	1,1	0,13	< 0,04	< 0,5	122	7,7	< 5	< 5	40,3	0,10	< 6	< 0,01	< 0,01
LA MATANZA OESTE	N° de muestras	51	99	199	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	81	99	99
	Concentración Promedio		< 5	0,38	448	< 0,1	24	< 0,1	< 0,05	49	< 0,05	< 5	170	0,8	< 0,05	< 0,04	< 0,5	58	7,6	< 5	< 5	26,3	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	55%	12%	0%	30%	0%	0%	52%	0%	47%	45%	24%	0%	0%	0%	42%	2%	0%	0%	67%	53%	4%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	1,80	592	< 0,1	41	< 0,1	< 0,05	175	< 0,05	29	391	1,2	< 0,05	< 0,04	< 0,5	109	7,9	< 5	< 5	136,0	0,33	8,1	< 0,01	< 0,01
LA MATANZA SUR	N° de muestras	7	13	27	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Concentración Promedio		< 5	0,38	464	< 0,1	18	< 0,1	< 0,05	98	< 0,05	< 5	180	0,7	< 0,05	< 0,04	< 0,5	79	7,5	< 5	< 5	28,3	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	45%	8%	0%	11%	0%	0%	44%	0%	146%	27%	16%	0%	0%	0%	29%	1%	0%	0%	17%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,70	543	< 0,1	22	< 0,1	< 0,05	169	< 0,05	49	271	0,9	< 0,05	< 0,04	< 0,5	119	7,8	< 5	< 5	35,9	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
MERLO	N° de muestras	87	160	326	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	133	160	160
	Concentración Promedio		< 5	0,29	474	< 0,1	22	< 0,1	< 0,05	49,0	< 0,05	5,1	172	0,8	< 0,05	< 0,04	< 0,5	66	7,6	< 5	< 5	28,4	< 0,05	7,1	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	32%	16%	0%	38%	0%	0%	171%	0%	8%	41%	28%	20%	42%	0%	31%	2%	0%	0%	317%	31%	126%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,85	678	< 0,1	46	< 0,1	< 0,05	1.090	< 0,05	8,4	389	1,4	0,17	0,26	< 0,5	108	8,1	< 5	< 5	1160,0	0,25	89,9	< 0,01	< 0,01
MORENO	N° de muestras	80	157	310	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	143	157	157
	Concentración Promedio		< 5	0,29	486	< 0,1	22	< 0,1	< 0,05	51,0	< 0,05	< 5	155	0,8	< 0,05	< 0,04	< 0,5	64	7,5	< 5	< 5	29,0	< 0,05	6,5	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	38%	13%	1%	30%	0%	0%	222%	0%	0%	32%	19%	29%	18%	0%	34%	2%	0%	0%	227%	3%	44%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	1,50	591	0,11	41	< 0,1	< 0,05	1.110	< 0,05	< 5	358	1,2	0,23	0,11	< 0,5	105	8,1	< 5	< 5	668,0	0,07	27,6	< 0,01	< 0,01
MORON	N° de muestras	14	27	53	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	26	27	27
	Concentración Promedio		< 5	0,37	462	< 0,1	16	< 0,1	< 0,05	50	< 0,05	< 5	168	0,8	< 0,05	< 0,04	< 0,5	53	7,5	< 5	< 5	24,9	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	66%	11%	0%	15%	0%	0%	35%	0%	0%	23%	19%	0%	0%	0%	36%	2%	0%	0%	50%	0%	57%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	1,50	555	< 0,1	21	< 0,1	< 0,05	96	< 0,05	< 5	250	1,1	< 0,05	< 0,04	< 0,5	82	8,0	< 5	< 5	60,2	< 0,05	25,6	< 0,01	< 0,01
TOTAL OESTE	**N° de muestras**	**265**	**509**	**1026**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**447**	**509**	**509**
	Concentración Promedio		**< 5**	**0,32**	**467**	**< 0,1**	**22**	**< 0,1**	**< 0,05**	**51**	**< 0,05**	**< 5**	**169**	**0,8**	**0,05**	**< 0,04**	**< 0,5**	**64**	**7,5**	**< 5**	**< 5**	**26,9**	**< 0,05**	**6,5**	**< 0,01**	**< 0,01**
	Coeficiente de Variación		**0%**	**53%**	**14%**	**0%**	**34%**	**0%**	**0%**	**158%**	**0%**	**43%**	**40%**	**24%**	**21%**	**26%**	**0%**	**37%**	**2%**	**0%**	**0%**	**234%**	**30%**	**80%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**< 5**	**2,80**	**678**	**< 0,1**	**46**	**< 0,1**	**< 0,05**	**1.110**	**< 0,05**	**49**	**391**	**1,4**	**0,23**	**0,26**	**< 0,5**	**122**	**8,1**	**< 5**	**< 5**	**1160,0**	**0,33**	**89,9**	**< 0,01**	**< 0,01**

aysa

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

010-INS-A-CA-CRU-PS-00-A (Ex 07)

REGIONES/Distritos		Cantidad de pozos considerados	Color (u.de.Color)	Turbiedad (NTU)	Alcalinidad (mg/l)	Aluminio (mg/l)	Arsénico (µg/l)	Cadmio (µg/l)	Cianuros (mg/l)	Cloruros (mg/l)	Cobre (mg/l)	Cromo (µg/l)	Dureza Total (mg/l)	Fluoruros (mg/l)	Hierro (mg/l)	Manganeso (mg/l)	Mercurio (µg/l)	Nitratos (NO3) [mg/l]	pH (u.de.pH)	Plomo (µg/l)	Selenio (µg/l)	Sulfatos (mg/l)	Zinc (mg/l)	Trihalometanos Totales (µg/l)	Aldrin (µg/l)	Dieldrin (µg/l)
			38	91	9	12	16	25	27	34	36	40	44	49	55	60	61	66	72	75	79	82	28	90	10	43
ALMTE BROWN	N° de muestras	33	48	96	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	48	48
	Concentración Promedio		< 5	0,29	418	< 0,1	37	< 0,1	< 0,05	71	< 0,05	< 5	105	0,8	< 0,05	< 0,04	< 0,5	39	7,6	< 5	< 5	57,1	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	38%	19%	0%	35%	0%	0%	301%	0%	0%	47%	20%	0%	54%	0%	58%	3%	0%	0%	389%	9%	10%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,85	556	< 0,1	59	< 0,1	< 0,05	1.100	< 0,05	< 5	222	1,0	< 0,05	0,16	< 0,5	86	8,1	< 5	< 5	1.150,0	0,08	10,2	< 0,01	< 0,01
ESTEBAN ECHEVERRIA	N° de muestras	87	135	290	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	101	135	135
	Concentración Promedio		< 5	0,31	462	< 0,1	24	< 0,1	< 0,05	75	< 0,05	< 5	171	0,7	< 0,05	< 0,04	< 0,5	57	7,5	< 5	5,2	44,4	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	47%	21%	0%	32%	0%	0%	239%	0%	217%	73%	20%	190%	53%	0%	51%	3%	0%	17%	284%	7%	197%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	1,20	653	< 0,1	56	< 0,1	< 0,05	1.260	< 0,05	138	878	1,1	1,40	0,23	< 0,5	125	8,1	< 5	12,0	1.100,0	0,09	150,0	< 0,01	< 0,01
EZEIZA	N° de muestras	48	74	148	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	67	74	74
	Concentración Promedio		< 5	0,33	456	< 0,1	37	< 0,1	< 0,05	63	< 0,05	< 5	101	0,9	< 0,05	< 0,04	< 0,5	16	7,7	< 5	< 5	50,5	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		11%	32%	16%	0%	41%	0%	0%	163%	0%	0%	23%	18%	0%	17%	0%	101%	2%	0%	0%	137%	2%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		10	0,70	591	< 0,1	81	< 0,1	< 0,05	671	< 0,05	< 5	194	1,3	< 0,05	0,08	< 0,5	74	8,2	< 5	< 5	448,0	0,06	< 6	< 0,01	< 0,01
LOMAS DE ZAMORA	N° de muestras	42	73	147	74	73	74	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	75	73	73	73	73	73	50	73	73
	Concentración Promedio		< 5	0,31	440	< 0,1	26	< 0,1	< 0,05	74	< 0,05	< 5	152	0,7	< 0,05	< 0,04	< 0,5	59	7,5	< 5	< 5	51,5	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	131%	20%	0%	41%	0%	0%	235%	0%	0%	40%	25%	147%	59%	0%	46%	3%	0%	0%	376%	0%	29%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	4,90	617	< 0,1	48	< 0,1	< 0,05	1.100	< 0,05	< 5	320	1,2	0,82	0,20	< 0,5	104	8,0	< 5	< 5	1.200,0	< 0,05	18,2	< 0,01	< 0,01
PRESIDENTE PERON	N° de muestras	24	46	92	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	30	46	46
	Concentración Promedio		< 5	0,30	362	< 0,1	32	< 0,1	< 0,05	32,5	< 0,05	< 5	108	0,8	< 0,05	< 0,04	< 0,5	29	7,6	< 5	< 5	13,0	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	44%	15%	0%	32%	0%	0%	39%	0%	0%	38%	16%	0%	0%	0%	64%	1%	0%	0%	32%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,95	494	< 0,1	58	< 0,1	< 0,05	54,8	< 0,05	< 5	191	1,0	< 0,05	< 0,04	< 0,5	67	7,8	< 5	< 5	23,0	< 0,05	< 6	< 0,01	< 0,01
TOTAL SUDOESTE	**N° de muestras**	**234**	**376**	**773**	**377**	**376**	**377**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**378**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**292**	**376**	**376**
	Concentración Promedio		**< 5**	**0,31**	**439**	**< 0,1**	**30**	**< 0,1**	**< 0,05**	**67**	**< 0,05**	**< 5**	**137**	**0,8**	**0,06**	**< 0,04**	**< 0,5**	**44**	**7,6**	**< 5**	**5,1**	**44,8**	**< 0,05**	**7,5**	**< 0,01**	**< 0,01**
	Coeficiente de Variación		**5%**	**68%**	**20%**	**0%**	**42%**	**0%**	**0%**	**238%**	**0%**	**159%**	**64%**	**22%**	**143%**	**47%**	**0%**	**68%**	**3%**	**0%**	**10%**	**317%**	**5%**	**158%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**10**	**4,90**	**653**	**< 0,1**	**81**	**< 0,1**	**< 0,05**	**1.260**	**< 0,05**	**138**	**878**	**1,3**	**1,40**	**0,23**	**< 0,5**	**125**	**8,2**	**< 5**	**12,0**	**1.200,0**	**0,09**	**150,0**	**< 0,01**	**< 0,01**
QUILMES	N° de muestras	4	6	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6
	Concentración Promedio		< 5	0,38	417	< 0,1	12	< 0,1	< 0,05	57	< 0,05	< 5	209	0,5	< 0,05	< 0,04	< 0,5	44	7,4	< 5	< 5	41,1	< 0,05	21,7	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		0%	29%	37%	0%	34%	0%	0%	19%	0%	0%	35%	0%	167%	0%	0%	26%	1%	0%	0%	13%	0%	85%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 5	0,65	705	< 0,1	20	< 0,1	< 0,05	73	< 0,05	< 5	293	0,5	0,69	< 0,04	< 0,5	55	7,5	< 5	< 5	46,3	< 0,05	42,7	< 0,01	< 0,01
FLORENCIO VARELA	N° de muestras	147	281	573	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	168	281	281
	Concentración Promedio		5,12	0,32	413	< 0,1	24	< 0,1	< 0,05	50,8	< 0,05	< 5	150	0,6	0,06	< 0,04	< 0,5	53	7,5	< 5	5,1	28,5	< 0,05	6,2	< 0,01	< 0,01
	Coeficiente de Variación		41%	69%	19%	0%	32%	0%	0%	255%	0%	2%	49%	20%	75%	28%	0%	50%	3%	0%	7%	309%	0%	26%	0%	0%
	Concentración Máxima		40	4,70	632	< 0,1	44	< 0,1	< 0,05	1.140	< 0,05	6,9	377	1,1	0,54	0,17	< 0,5	120	8,3	< 5	8,2	781,0	< 0,05	25,5	< 0,01	< 0,01
TOTAL SUDESTE	**N° de muestras**	**151**	**287**	**587**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**171**	**287**	**287**
	Concentración Promedio		**< 5**	**0,32**	**413**	**< 0,1**	**24**	**< 0,1**	**< 0,05**	**51**	**< 0,05**	**< 5**	**151**	**0,6**	**0,06**	**< 0,04**	**< 0,5**	**53**	**7,5**	**< 5**	**< 5**	**28,8**	**< 0,05**	**6,4**	**< 0,01**	**< 0,01**
	Coeficiente de Variación		**40%**	**68%**	**20%**	**0%**	**33%**	**0%**	**0%**	**252%**	**0%**	**2%**	**48%**	**20%**	**96%**	**28%**	**0%**	**50%**	**3%**	**0%**	**7%**	**303%**	**0%**	**51%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**40**	**4,70**	**705**	**< 0,1**	**44**	**< 0,1**	**< 0,05**	**1140**	**< 0,05**	**6,9**	**377**	**1,1**	**0,69**	**0,17**	**< 0,5**	**120**	**8,3**	**< 5**	**8**	**781,0**	**< 0,05**	**42,7**	**< 0,01**	**< 0,01**
TOTAL CONCESIÓN	**N° de muestras**	**786**	**1438**	**2918**	**1439**	**1438**	**1439**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1440**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1076**	**1438**	**1438**
	Concentración Promedio		**< 5**	**0,31**	**443**	**< 0,1**	**24**	**< 0,1**	**< 0,05**	**55**	**< 0,05**	**< 5**	**162**	**0,7**	**0,05**	**< 0,04**	**< 0,5**	**56**	**7,5**	**< 5**	**< 5**	**33,2**	**< 0,05**	**6,7**	**< 0,01**	**< 0,01**
	Coeficiente de Variación		**19%**	**58%**	**18%**	**0%**	**40%**	**0%**	**0%**	**222%**	**0%**	**96%**	**50%**	**24%**	**91%**	**45%**	**0%**	**49%**	**3%**	**0%**	**7%**	**318%**	**20%**	**107%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**40**	**4,90**	**705**	**< 0,1**	**81**	**< 0,1**	**< 0,05**	**1.260**	**< 0,05**	**138**	**878**	**1,4**	**1,40**	**0,30**	**< 0,5**	**125**	**8,3**	**< 5**	**12,0**	**1.250,0**	**0,33**	**150,0**	**< 0,01**	**< 0,01**

			29	41	58	51	52	57	62	0	19	53	63	4	7	83	87	3	89	5	2	33	20	88	48
REGIONES/Distritos		**Cantidad de pozos considerados**	**Clordano (µg/l)**	**DDT (Total) (µg/l)**	**M.B.A.S. (mg/l)**	**Heptacloro (µg/l)**	**Heptacloro epóxido (µg/l)**	**Lindano (µg/l)**	**Metoxicloro (µg/l)**	**2.4-D (µg/l)**	**Benceno (µg/l)**	**Hexacloro benceno (µg/l)**	**Monocloro benceno (µg/l)**	**1.2-Dicloro benceno (µg/l)**	**1.4-Dicloro benceno (µg/l)**	**Fenoles (µg/l)**	**Tetracloruro de carbono (µg/l)**	**1.1-Dicloroeteno (µg/l) (*)**	**Tricloroetileno (µg/l)**	**1.2-Dicloroetano (µg/l)**	**1.1.1-Tricloroetano (µg/l)**	**Cloruro de vinilo (µg/l)**	**Benzopireno (µg/l)**	**Tolueno (µg/l)**	**Etilbenceno (µg/l)**
ESCOBAR	N° de muestras	3	6	6	6	6	6	6	6	---	2	6	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	6	2	2
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
JOSE C PAZ	N° de muestras	4	8	8	8	8	8	8	8	---	5	8	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
MALVINAS ARGENTINAS	N° de muestras	11	21	21	21	21	21	21	21	---	10	21	10	10	10	14	10	10	10	10	10	10	21	10	10
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	2,4	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	206%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	16,0	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
PILAR	N° de muestras	60	117	117	117	117	117	117	117	---	81	117	81	81	81	56	81	81	81	81	81	81	89	81	81
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	0,6	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	3,9	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
SAN MIGUEL	N° de muestras	58	114	114	114	114	114	114	114	---	68	114	68	68	68	27	68	68	68	68	68	68	69	68	68
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	0,8	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	176%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	0,6	9,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
TOTAL NORTE	**N° de muestras**	**136**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**---**	**166**	**266**	**166**	**166**	**166**	**102**	**166**	**166**	**166**	**166**	**166**	**166**	**190**	**166**	**166**
	Concentración Promedio		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**< 0,5**	**< 0,2**	**0,8**	**< 1**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**
	Coeficiente de Variación		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**---**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**19%**	**200%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**< 0,5**	**0,6**	**16,0**	**< 1**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**
LA MATANZA NORTE	N° de muestras	26	53	53	53	53	53	53	53	---	51	53	51	51	51	26	51	51	51	51	51	51	52	51	51
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	0,60	0,3	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
LA MATANZA OESTE	N° de muestras	51	99	99	99	99	99	99	99	---	81	99	81	81	81	31	81	81	81	81	81	81	90	81	81
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	27%	37%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	0,60	0,70	2,0	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
LA MATANZA SUR	N° de muestras	7	13	13	13	13	13	13	13	---	13	13	13	13	13	6	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	3,1	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	192%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	21,0	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
MERLO	N° de muestras	87	160	160	160	160	160	160	160	---	133	160	133	133	133	64	133	133	133	133	133	133	133	133	133
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
MORENO	N° de muestras	80	157	157	157	157	157	157	157	---	143	157	143	143	143	74	143	143	143	143	143	143	147	143	143
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	1,1	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%	17%	265%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	3,2	0,6	28,0	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
MORON	N° de muestras	14	27	27	27	27	27	27	27	---	26	27	26	26	26	13	26	26	26	26	26	26	23	26	26
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	0,9	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	218%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	10,2	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
TOTAL OESTE	**N° de muestras**	**265**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**0**	**447**	**509**	**447**	**447**	**447**	**214**	**447**	**447**	**447**	**447**	**447**	**447**	**458**	**447**	**447**
	Concentración Promedio		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**0,5**	**< 0,2**	**0,8**	**< 1**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**
	Coeficiente de Variación		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**---**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**92%**	**15%**	**255%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**10,2**	**0,7**	**28,0**	**< 1**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2025

Informe Anual de Niveles de Servicio

Año 2025

010-INS-A-CA-CRU-PS-00-B (Ex 07)

REGIONES/Distritos		Cantidad de pozos considerados	Clordano (µg/l)	DDT (Total) (µg/l)	M.B.A.S. (mg/l)	Heptacloro (µg/l)	Heptacloro epóxido (µg/l)	Lindano (µg/l)	Metoxicloro (µg/l)	2.4-D (µg/l)	Benceno (µg/l)	Hexacloro benceno (µg/l)	Monocloro benceno (µg/l)	1.2-Dicloro benceno (µg/l)	1.4-Dicloro benceno (µg/l)	Fenoles (µg/l)	Tetracloruro de carbono (µg/l)	1.1-Dicloroeteno (µg/l) (*)	Tricloroetileno (µg/l)	1.2-Dicloroetano (µg/l)	1.1.1-Tricloro etano (µg/l)	Cloruro de vinilo (µg/l)	Benzopireno (µg/l)	Tolueno (µg/l)	Etilbenceno (µg/l)
			29	41	58	51	52	57	62	0	19	53	63	4	7	83	87	3	89	5	2	33	20	88	48
ALMTE BROWN	N° de muestras	33	48	48	48	48	48	48	48	---	44	48	44	44	44	27	44	44	44	44	44	44	40	44	44
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	0,7	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	140%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	6,6	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
ESTEBAN ECHEVERRIA	N° de muestras	87	135	135	135	135	135	135	135	---	101	135	101	101	101	54	101	101	101	101	101	101	119	101	101
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	1,1	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	42%	228%	18%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	1,4	0,9	21,0	2,8	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
EZEIZA	N° de muestras	48	74	74	74	74	74	74	74	---	67	74	67	67	67	35	67	67	67	67	67	67	63	67	67
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	0,9	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	0%	244%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	1,2	< 0,2	18,0	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
LOMAS DE ZAMORA	N° de muestras	42	73	73	73	73	73	73	73	---	50	73	50	50	50	39	50	50	50	50	50	50	61	50	50
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	0,6	< 0,2	0,6	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	0%	72%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	3,2	< 0,2	3,4	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
PRESIDENTE PERON	N° de muestras	24	46	46	46	46	46	46	46	---	30	46	30	30	30	24	30	30	30	30	30	30	27	30	30
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
TOTAL SUDOESTE	**N° de muestras**	**234**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**0**	**292**	**376**	**292**	**292**	**292**	**179**	**292**	**292**	**292**	**292**	**292**	**292**	**310**	**292**	**292**
	Concentración Promedio		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**0,5**	**< 0,2**	**0,9**	**< 1**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**
	Coeficiente de Variación		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**---**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**39%**	**26%**	**222%**	**10%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**3,2**	**0,9**	**21,0**	**2,8**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**
Quilmes	N° de muestras	4	6	6	6	6	6	6	6	---	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	0,30	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
FLORENCIO VARELA	N° de muestras	147	281	281	281	281	281	281	281	---	168	281	168	168	168	65	168	168	168	168	168	168	197	168	168
	Concentración Promedio		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	0,7	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	---	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	189%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Concentración Máxima		< 0,1	< 1	< 0,2	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 5	---	< 2,5	< 0,01	< 2,5	< 0,3	< 0,1	< 0,01	< 0,5	< 0,2	16,0	< 1	< 0,5	< 2	< 0,01	< 5	< 5
TOTAL SUDESTE	**N° de muestras**	**151**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**---**	**171**	**287**	**171**	**171**	**171**	**68**	**171**	**171**	**171**	**171**	**171**	**171**	**200**	**171**	**171**
	Concentración Promedio		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**< 0,5**	**< 0,2**	**0,7**	**< 1**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**
	Coeficiente de Variación		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**---**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**188%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**< 0,5**	**< 0,2**	**16,0**	**< 1**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**
TOTAL CONCESIÓN	**N° de muestras**	**786**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**1438**	**0**	**1076**	**1438**	**1076**	**1076**	**1076**	**563**	**1076**	**1076**	**1076**	**1076**	**1076**	**1076**	**1158**	**1076**	**1076**
	Concentración Promedio		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**0,5**	**< 0,2**	**0,8**	**< 1**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**
	Coeficiente de Variación		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**---**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**64%**	**19%**	**230%**	**5%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Concentración Máxima		**< 0,1**	**< 1**	**< 0,2**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 0,04**	**< 5**	**---**	**< 2,5**	**< 0,01**	**< 2,5**	**< 0,3**	**< 0,1**	**< 0,01**	**10,2**	**0,9**	**28,0**	**2,8**	**< 0,5**	**< 2**	**< 0,01**	**< 5**	**< 5**

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

010-INS-A-CA-CRU-PS-00-C (Ex 07)

REGIONES/Distritos		Cantidad de pozos considerados	Estireno (µg/l)	Tetracloro etano (µg/l)	Bacterias Heterotrofas viales a 36°C (UFC/ml)	Coliformes totales [UFC/100ml]	Escherichia coli [UFC/100ml]	Pseudomonas Aeruginosas (U/100ml)	Temperatura (°C)	Sodio (mg/l)	Potasio (mg/l)	Níquel (µg/l)	Silicio (mg/l)	Conductividad (µS/cm)	ALFA HCH (µg/l)	Oxidabilidad (mg/l)	Residuo conductimétrico [mg/l]	Calcio (mg/l)	Magnesio (mg/l)	Nitritos (mg/l)	Amonio (mg/l)	Cloroformo (µg/l)	Diclorobromo metano (µg/l)	Dibromocloro metano (µg/l)	Bromoformo (µg/l)	pH de saturación (u.de.pH)	Tetracloroeteno [µg/l]
			46	85	17	37	45	77	84	81	76	65	80	39	11	69	78	26	59	67	13	32	22	42	23	73	86
ESCOBAR	N° de muestras	3	2	2	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	6	2
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	15	< 1	< 1	Ausencia	18	126	8,7	< 5	32,7	799	< 0,04	0,5	539	35,5	15,4	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,2	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	323%	179%	0%	346%	13%	6%	9%	0%	6%	1%	0%	30%	1%	9%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	164	21	< 1	Presencia	20	134	10,0	< 5	36,0	816	< 0,04	0,7	551	38,8	17,4	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,3	< 0,5
JOSE C PAZ	N° de muestras	4	5	5	16	16	16	16	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	8	5
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	< 1	< 1	< 1	Ausencia	17	180	9,2	< 5	32,4	931	< 0,04	0,5	629	22,5	12,6	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,5	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	7%	9%	0%	2%	6%	0%	20%	6%	10%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	< 1	< 1	< 1	Ausencia	20	199	10,2	< 5	33,0	1.001	< 0,04	0,6	676	27,0	16,0	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,5	< 0,5
MALVINAS ARGENTINAS	N° de muestras	11	10	10	43	43	43	43	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	10	10	10	10	21	10
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	55	< 1	< 1	Ausencia	17	138	10,8	< 5	34,2	1.000	< 0,04	0,5	675	52,3	23,2	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,1	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	256%	76%	0%	369%	8%	13%	9%	0%	5%	12%	0%	21%	12%	17%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	> 500	5	< 1	Presencia	20	184	12,2	< 5	37,0	1.328	< 0,04	0,7	896	67,9	30,0	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,2	< 0,5
PILAR	N° de muestras	60	81	81	235	235	235	235	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	81	81	81	81	117	81
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	10	< 1	< 1	Ausencia	17	162	9,2	< 5	31,7	907	< 0,04	0,5	612	34,3	15,3	< 0,01	< 0,05	2,0	< 2	< 1	< 1	7,3	0,6
	Coeficiente de Variación		0%	0%	460%	134%	0%	572%	9%	41%	15%	0%	7%	13%	0%	35%	13%	48%	42%	0%	0%	17%	0%	0%	0%	3%	145%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	> 500	23	< 1	Presencia	20	808	14,6	< 5	38,0	1.201	< 0,04	0,9	811	78,3	32,3	< 0,01	< 0,05	5,1	< 2	< 1	< 1	7,7	8,5
SAN MIGUEL	N° de muestras	58	68	68	226	226	226	226	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	68	68	68	68	114	68
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	13	< 1	< 1	Ausencia	17	197	11,6	< 5	33,2	1.266	< 0,04	0,5	854	56,1	24,7	< 0,01	< 0,05	2,1	< 2	< 1	< 1	7,1	0,9
	Coeficiente de Variación		0%	0%	448%	259%	0%	363%	10%	103%	18%	0%	17%	69%	0%	33%	69%	43%	34%	0%	0%	24%	0%	0%	0%	3%	191%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	> 500	48	< 1	Presencia	21	1.262	18,6	< 5	42,0	5.920	< 0,04	0,7	3.996	113,4	50,0	< 0,01	< 0,05	5,3	< 2	< 1	< 1	7,9	13,9
TOTAL NORTE	**N° de muestras**	**136**	**166**	**166**	**532**	**532**	**532**	**532**	**267**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**266**	**166**	**166**	**166**	**166**	**266**	**166**
	Concentración Promedio		**< 5**	**< 0,5**	**15**	**< 1**	**< 1**	**Ausencia**	**17**	**175**	**10,3**	**< 5**	**32,6**	**1.066**	**< 0,04**	**0,5**	**720**	**44,7**	**19,9**	**< 0,01**	**< 0,05**	**< 2**	**< 2**	**< 1**	**< 1**	**7,2**	**0,7**
	Coeficiente de Variación		**0%**	**0%**	**438%**	**224%**	**0%**	**433%**	**10%**	**81%**	**20%**	**0%**	**13%**	**56%**	**0%**	**33%**	**56%**	**50%**	**43%**	**0%**	**0%**	**19%**	**0%**	**0%**	**0%**	**3%**	**178%**
	Concentración Máxima		**< 5**	**< 0,5**	**> 500**	**48**	**< 1**	**Presencia**	**21**	**1.262**	**18,6**	**< 5**	**42,0**	**5.920**	**< 0,04**	**0,9**	**3.996**	**113,4**	**50,0**	**< 0,01**	**< 0,05**	**5,3**	**< 2**	**< 1**	**< 1**	**7,9**	**13,9**
LA MATANZA NORTE	N° de muestras	26	51	51	111	111	111	111	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	51	51	51	51	53	51
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	25	<	< 1	Ausencia	18	146	10,4	< 5	32,2	1.009	< 0,04	0,4	681	49,9	18,6	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,1	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	193%	232%	0%	202%	11%	17%	24%	0%	8%	19%	0%	47%	19%	43%	39%	0%	0%	28%	0%	0%	6%	3%	32%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	280	46	< 1	Presencia	20	194	15,6	< 5	37,0	1.287	< 0,04	0,7	869	90,1	31,9	< 0,01	< 0,05	5,3	< 2	< 1	< 1	7,6	1,6
LA MATANZA OESTE	N° de muestras	51	81	81	199	199	199	199	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	81	81	81	81	99	81
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	24	< 1	< 1	Ausencia	17	177	9,7	< 5	31,9	1.080	< 0,04	0,4	729	38,6	17,8	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,2	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	353%	282%	0%	414%	8%	17%	19%	0%	7%	16%	0%	44%	16%	50%	40%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	3%	0%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	> 500	52	< 1	Presencia	19	305	16,1	< 5	37,0	1.702	< 0,04	0,9	1.149	97,1	36,1	< 0,01	< 0,05	8	< 2	< 1	< 1	7,7	< 0,5
LA MATANZA SUR	N° de muestras	7	13	13	27	27	27	27	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	46,9	< 1	< 1	Ausencia	17	195	9,2	< 5	30,4	1.256	< 0,04	0,4	848	43,7	17,3	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,1	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	214%	158%	0%	157%	5%	17%	16%	0%	8%	13%	0%	56%	13%	27%	26%	0%	0%	16%	0%	0%	0%	2%	0%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	416	20	< 1	Presencia	18	246	11,3	< 5	36,0	1.566	< 0,04	0,8	1.057	66,4	25,6	< 0,01	< 0,05	2,90	< 2	< 1	< 1	7,3	< 0,5
MERLO	N° de muestras	87	133	133	326	326	326	326	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	133	133	133	133	160	133
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	24	< 1	< 1	Ausencia	18	195	10,1	< 5	32,7	1.129	< 0,04	0,5	762	40,5	17,3	< 0,01	< 0,05	2,9	2,2	< 1	< 1	7,2	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	366%	275%	0%	403%	9%	46%	17%	0%	10%	36%	0%	37%	36%	43%	38%	0%	0%	231%	89%	44%	0%	3%	0%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	> 500	44	< 1	Presencia	23	1.257	15,2	< 5	41,0	5.870	< 0,04	0,8	3.962	92,5	38,3	< 0,01	< 0,05	63,5	21,2	5,2	< 1	7,7	< 0,5
MORENO	N° de muestras	80	143	143	310	310	310	310	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	143	143	143	143	157	143
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	26	< 1	< 1	Ausencia	19	201	10,2	< 5	31,7	1.130	< 0,04	0,4	763	33,8	17,2	< 0,01	< 0,05	2,6	2,1	< 1	< 1	7,2	0,67
	Coeficiente de Variación		0%	0%	338%	234%	0%	285%	9%	42%	15%	0%	11%	34%	0%	42%	34%	35%	29%	0%	0%	113%	61%	0%	0%	3%	144%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	> 500	45	< 1	Presencia	22	894	17,1	< 5	39,0	4.280	< 0,04	0,8	2.889	83,6	36,2	< 0,01	< 0,05	26,4	17,5	< 1	< 1	8,0	9,1
MORON	N° de muestras	14	26	26	53	53	53	53	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	27	26
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	42	< 1	< 1	Ausencia	18	179	9,4	< 5	32,3	1.058	< 0,04	0,5	714	40,4	16,2	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,1	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	303%	102%	0%	412%	9%	12%	11%	0%	4%	11%	0%	51%	11%	24%	22%	0%	0%	159%	0%	0%	0%	2%	0%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	500	8	< 1	Presencia	22	243	11,4	< 5	34,0	1.221	< 0,04	1,0	824	65,1	23,4	< 0,01	< 0,05	25,6	< 2	< 1	< 1	7,4	< 0,5
TOTAL OESTE	**N° de muestras**	**265**	**447**	**447**	**1026**	**1026**	**1026**	**1026**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**509**	**447**	**447**	**447**	**447**	**509**	**447**
	Concentración Promedio		**5,00**	**< 0,5**	**26**	**< 1**	**< 1**	**Ausencia**	**18**	**187**	**10,0**	**< 5**	**32,1**	**1.107**	**< 0,04**	**0,4**	**747**	**39,1**	**17,4**	**< 0,01**	**< 0,05**	**2,6**	**2,1**	**< 1**	**< 1**	**7,2**	**0,6**
	Coeficiente de Variación		0%	0%	331%	258%	0%	310%	9%	39%	18%	0%	9%	30%	0%	42%	30%	44%	35%	0%	0%	162%	62%	25%	2%	3%	99%
	Concentración Máxima		**5,00**	**< 0,5**	**> 500**	**52**	**< 1**	**Presencia**	**23**	**1.257**	**17,1**	**< 5**	**41,0**	**5.870**	**< 0,04**	**1,0**	**3.962**	**97,1**	**38,3**	**< 0,01**	**< 0,05**	**63,5**	**21,2**	**5,2**	**1,3**	**8,0**	**9,1**
ALMTE BROWN	N° de muestras	33	44	44	96	96	96	96	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44	48	44
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	13	< 1	< 1	Ausencia	18	207	8,4	< 5	30,6	1.041	< 0,04	0,5	703	24,1	11,0	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,5	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	395%	165%	0%	358%	5%	106%	18%	0%	16%	88%	0%	31%	88%	49%	45%	0%	0%	59%	0%	0%	0%	3%	29%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	339	25	< 1	Presencia	19	1.335	11,4	< 5	36,0	5.320	< 0,04	0,7	3.591	52,3	22,7	< 0,01	< 0,05	10,2	< 2	< 1	< 1	8,0	1,5
ESTEBAN ECHEVERRIA	N° de muestras	87	101	101	290	290	290	290	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	101	101	101	101	135	101
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	14	< 1	< 1	Ausencia	18	212	10,8	< 5	30,4	1.202	< 0,04	0,4	811	35,6	19,9	< 0,01	< 0,05	6,0	< 2	< 1	< 1	7,3	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	436%	213%	0%	342%	5%	65%	22%	0%	14%	57%	0%	37%	57%	65%	85%	0%	0%	276%	75%	35%	11%	3%	24%

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

010-INS-A-CA-CRU-PS-00-C (Ex 07)

REGIONES/Distritos		Cantidad de pozos considerados	Estireno (µg/l)	Tetracloro etano (µg/l)	Bacterias Heterotrofas viales a 36°C (UFC/ml)	Coliformes totales [UFC/100ml]	Escherichia coli [UFC/100ml]	Pseudomonas Aeruginosas (U/100ml)	Temperatura (°C)	Sodio (mg/l)	Potasio (mg/l)	Níquel (µg/l)	Silicio (mg/l)	Conductividad (µS/cm)	ALFA HCH (µg/l)	Oxidabilidad (mg/l)	Residuo conductimétrico [mg/l]	Calcio (mg/l)	Magnesio (mg/l)	Nitritos (mg/l)	Amonio (mg/l)	Cloroformo (µg/l)	Diclorobromo metano (µg/l)	Dibromocloro metano (µg/l)	Bromoformo (µg/l)	pH de saturación (u.de.pH)	Tetracloroeteno [µg/l]
			46	85	17	37	45	77	84	81	76	65	80	39	11	69	78	26	59	67	13	32	22	42	23	73	86
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	> 500	40	< 1	Presencia	19	1.200	20,5	< 5	38,0	5.160	< 0,04	0,8	3.483	138,8	131,1	< 0,01	< 0,05	100,0	18	5	2	8,0	1,6
EZEIZA	N° de muestras	48	67	67	148	148	148	148	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	67	67	67	67	74	67
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	12	< 1	< 1	Ausencia	18	215	9,4	< 5	28,1	1.085	< 0,04	0,4	732	19,7	12,7	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,5	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	505%	217%	0%	394%	4%	43%	13%	0%	16%	0	0%	42%	39%	26%	23%	0%	0%	13%	0%	7%	0%	2%	7%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	> 500	49	< 1	Presencia	19	697	11,9	< 5	35,0	3.330	< 0,04	0,8	2.248	36,4	25,1	< 0,01	< 0,05	4,2	< 2	2	< 1	8,0	0,8
LOMAS DE ZAMORA	N° de muestras	42	50	50	147	147	147	147	73	73	73	73	73	75	73	73	75	73	73	73	73	50	50	50	50	73	50
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	14	< 1	< 1	Ausencia	18	214	9,6	< 5	32,4	1.160	< 0,04	0,5	783	34,5	16,0	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,3	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	363%	205%	0%	298%	4%	81%	16%	0%	15%	69%	0%	33%	69%	43%	38%	0%	0%	97%	0%	0%	0%	3%	11%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	420	45	< 1	Presencia	19	1.210	13,1	< 5	41,0	5.740	< 0,04	0,8	3.875	78,7	30,0	< 0,01	< 0,05	18,2	< 2	< 1	< 1	7,9	0,9
PRESIDENTE PERON	N° de muestras	24	30	30	92	92	92	92	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	30	30	30	30	46	30
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	2	< 1	< 1	Ausencia	18	139	9,0	< 5	30,9	820	< 0,04	0,4	554	22,8	12,3	< 0,01	< 0,05	< 2	< 2	< 1	< 1	7,5	0,6
	Coeficiente de Variación		0%	0%	541%	228%	0%	237%	4%	16%	17%	0%	7%	14%	0%	33%	14%	44%	32%	0%	0%	2%	0%	29%	0%	3%	73%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	120	39	< 1	Presencia	19	194	11,6	< 5	36,0	1.070	< 0,04	0,7	722	44,2	19,7	< 0,01	< 0,05	2,2	< 2	2,7	< 1	7,8	2,8
TOTAL SUDOESTE	**N° de muestras**	**234**	**292**	**292**	**773**	**773**	**773**	**773**	**376**	**376**	**376**	**376**	**376**	**378**	**376**	**376**	**378**	**376**	**376**	**376**	**376**	**292**	**292**	**292**	**292**	**376**	**292**
	Concentración Promedio		**< 5**	**< 0,5**	**12**	**< 1**	**< 1**	Ausencia	**18**	**203**	**9,8**	**< 5**	**30,4**	**1.104**	**< 0,04**	**0,5**	**745**	**29,2**	**15,6**	**< 0,01**	**< 0,05**	**3,6**	**< 2**	**< 1**	**< 1**	**7,4**	**0,5**
	Coeficiente de Variación		0%	0%	448%	217%	0%	322%	4%	71%	21%	0%	15%	61%	0%	36%	61%	61%	72%	0%	0%	276%	46%	23%	6%	3%	32%
	Concentración Máxima		**< 5**	**< 0,5**	**> 500**	**49**	**< 1**	**Presencia**	**19**	**1.335**	**20,5**	**< 5**	**41,0**	**5.740**	**< 0,04**	**0,8**	**3.875**	**138,8**	**131,1**	**< 0,01**	**< 0,05**	**100**	**18,3**	**4,6**	**2,1**	**8,0**	**2,8**
QUILMES	N° de muestras	4	3	3	14	14	14	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	6	3
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	< 1	< 1	< 1	Ausencia	19	154	11,4	< 5	31,2	1.021	< 0,04	2,8	689	46,8	22,5	< 0,01	< 0,05	17,4	4,8	1,5	< 1	7,2	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	0%	0%	0%	374%	2%	41%	15%	0%	28%	22%	0%	97%	22%	35%	34%	0%	0%	64%	101%	58%	0%	3%	0%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	< 1	< 1	< 1	Presencia	19	258	12,8	< 5	40,0	1.440	< 0,04	6,2	972	65,5	31,4	< 0,01	< 0,05	29,8	10,3	2,5	< 1	7,4	< 0,5
FLORENCIO VARELA	N° de muestras	147	168	168	573	573	573	573	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	168	168	168	168	281	168
	Concentración Promedio		< 5	< 0,5	34	< 1	< 1	Ausencia	19	183	9,7	< 5	31,3	1.020	< 0,04	0,4	689	33,9	15,8	< 0,01	< 0,05	2,3	< 2	< 1	< 1	7,3	< 0,5
	Coeficiente de Variación		0%	0%	334%	236%	0%	310%	3%	67%	23%	0%	11%	56%	0%	37%	56%	49%	49%	0%	0%	92%	0%	0%	0%	3%	8%
	Concentración Máxima		< 5	< 0,5	> 500	47	< 1	Presencia	19	1.179	15,8	< 5	39,0	5.600	< 0,04	0,9	3.780	85,1	40,7	< 0,01	< 0,05	25,5	< 2	< 1	< 1	7,9	1,0
TOTAL SUDESTE	**N° de muestras**	**151**	**171**	**171**	**587**	**587**	**587**	**587**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**171**	**171**	**171**	**171**	**287**	**171**
	Concentración Promedio		**< 5**	**< 0,5**	**33**	**< 1**	**< 1**	Ausencia	**19**	**182**	**9,8**	**< 5**	**31,3**	**1.020**	**< 0,04**	**0,5**	**689**	**34,2**	**15,9**	**< 0,01**	**< 0,05**	**2,5**	**< 2**	**< 1**	**< 1**	**7,3**	**0,5**
	Coeficiente de Variación		0%	0%	338%	236%	0%	311%	3%	66%	23%	0%	11%	55%	0%	109%	55%	49%	49%	0%	0%	123%	31%	11%	0%	3%	8%
	Concentración Máxima		**< 5**	**< 0,5**	**> 500**	**47,00**	**< 1**	**Presencia**	**19**	**1.179**	**15,8**	**< 5**	**40,0**	**5.600**	**< 0,04**	**6,2**	**3.780**	**85,1**	**40,7**	**< 0,01**	**< 0,05**	**29,8**	**10,3**	**2,5**	**< 1**	**7,9**	**1,00**
TOTAL CONCESIÓN	**N° de muestras**	**786**	**1.076**	**1.076**	**2.918**	**2.918**	**2.918**	**2.918**	**1.439**	**1.438**	**1.438**	**1.438**	**1.438**	**1.440**	**1.438**	**1.438**	**1.440**	**1.438**	**1.438**	**1.438**	**1.438**	**1.076**	**1.076**	**1.076**	**1.076**	**1.438**	**1.076**
	Concentración Promedio		**< 5**	**< 0,5**	**22**	**< 1**	**< 1**	**Ausencia**	**18**	**188**	**10,0**	**< 5**	**31,6**	**1.081**	**< 0,04**	**0,5**	**730**	**36,6**	**17,1**	**< 0,01**	**< 0,05**	**2,8**	**< 2**	**< 1**	**< 1**	**7,3**	**0,6**
	Coeficiente de Variación		**0%**	**0%**	**378%**	**241%**	**0%**	**329%**	**8%**	**63%**	**20%**	**0%**	**12%**	**50%**	**0%**	**61%**	**50%**	**52%**	**50%**	**0%**	**0%**	**216%**	**49%**	**21%**	**4%**	**3%**	**112%**
	Concentración Máxima		**< 5**	**< 0,5**	**> 500**	**52**	**< 1**	**Presencia**	**23**	**1.335**	**20,5**	**< 5**	**42,0**	**5.920**	**< 0,04**	**6,2**	**3.996**	**138,8**	**131,1**	**< 0,01**	**< 0,05**	**100,0**	**21,2**	**5,2**	**2,1**	**8,0**	**13,9**

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ARSENICO TOTAL [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Rebuerzo Ciudad									
AB057	P. Echaquier y Serrano	AB14		1%	99%			PLANTA - AB057		PUELCHE	2	28,0	5,1%	29,0	28,0	24,4
AB061	Lavalle Narciso a 1900	AB23	5%	6%	89%					PUELCHE	2	50,0	0,0%	50,0	37,0	32,2
AB063	Lavalle barcino 3001	AB23		100%						PUELCHE					37,0	32,2
AB064	Juan B. Justo 2050	AB23	17%	6%	77%	-	-			PUELCHE	2	38,0	0,0%	38,0	37,0	32,2
AB065	Juan B. Justo 2700	AB23	8%	8%	92%	-	-			PUELCHE	1	40,0	0,0%	40,0	37,0	32,2
AB066	Juan B Justo 2101	AB23	19%	45%	37%					PUELCHE	1	40,0	0,0%	40,0	37,0	32,2
AB067	Juan B. Justo 2802	AB23		100%						PUELCHE					37,0	32,2
AB068	Av. Zeballos (4000 a 700 mts. de Avda. República Argentina	AB23	21%	27%	52%					PUELCHE	3	43,0	2,3%	44,0	37,0	32,2
AB070	Francisco N. Laprida y Moreno	AB23	8%	8%	91%					PUELCHE	2	43,0	0,0%	43,0	37,0	32,2
AB071	Narciso Laprida 2301	AB23	17%	69%	14%					PUELCHE					37,0	32,2
AB072	República Argentina 6670	AB23	6%	6%	88%					PUELCHE	1	55,0	0,0%	55,0	37,0	32,2
AB074	Pres. Argentina y Juan B. Justo	AB23	14%	8%	78%					PUELCHE	2	50,0	7,0%	53,0	37,0	32,2
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	AB23	9%	34%	56%					PUELCHE					37,0	32,2
AB076	República Argentina 7570 e/ Juan Jose Castro y Alice	AB23	20%	29%	51%					PUELCHE					37,0	32,2
AB084	Esnoile s/n	AB23	3%	48%	49%					PUELCHE	1	54,0	0,0%	54,0	37,0	32,2
AB085	Leyes y Romero	AB23	36%	16%	48%					PUELCHE	1	45,0	0,0%	45,0	37,0	32,2
AB086	Romero y Calderón	AB23		100%						PUELCHE					37,0	32,2
AB087	Calderon 1251	AB23	14%	35%	51%					PUELCHE	1	52,0	0,0%	52,0	37,0	32,2
AB088	Calderon 1891	AB23	0,6%	99%	1%					PUELCHE					37,0	32,2
AB089	Calderon 3000	AB23	1%	99%	1%			BATERIA GLEW		PUELCHE					37,0	32,2
AB090	Calderon 3400 1848	AB23	10%	14%	76%					PUELCHE	2	45,5	4,7%	47,0	37,0	32,2
AB091	Calderon 3650 1848	AB23	16%	99%	1%					PUELCHE	1	58,0	0,0%	58,0	37,0	32,2
AB092	Broadier Calderón e/ Lezica y Young	AB23		100%						PUELCHE					37,0	32,2
AB093	Broadier Calderón e/ Young y Dr. Eduardo Holmberg	AB23	1,3%	99%	68%					PUELCHE	1	39,0	0,0%	39,0	37,0	32,2
AB094	Romero 3800	AB23	1%	9%	90%					PUELCHE	2	59,0	0,0%	59,0	37,0	32,2
AB095	Lemos 3800	AB23		63%	37%					PUELCHE	1	45,0	0,0%	45,0	37,0	32,2
AB096	Rocha y J.A. Cavassotti	AB23		1%	99%					PUELCHE	2	38,5	23,3%	46,0	37,0	32,2
AB099	Fernando Lahille y M. Acosta	AB23	3%	2%	95%					PUELCHE	2	41,0	3,4%	42,0	37,0	32,2
AB100	Gral. Cardenas y Arrate, Iriarte (Plaza)	AB23	1%	2%	97%					PUELCHE	1	40,0	0,0%	40,0	37,0	32,2
AB101	Agustin Barrios y Viney Cevallos	AB23		2%	98%					PUELCHE	2	33,0	4,3%	34,0	37,0	32,2
AB102	Martiniano Leguizamón entre 25 de Mayo y F. Alvarez	AB23	2%	2%	96%					PUELCHE	1	40,0	0,0%	40,0	37,0	32,2
AB105	Av. Juan B. Justo e/ Av. República Argentina y Av. Espora	AB23	4%	1%	95%					HORIZONTE	2	5,8	0,0%	5,8	37,0	32,2
AB106	Pablo Podesta y Otilia Rico	AB23	10%	85%	5%					PUELCHE					37,0	32,2
AB107	Fernando Ochoa y Juan Sarcione	AB23	18%	76%	6%					PUELCHE					37,0	32,2
AB108	Rubino Cordoba y Cesar Kieb	AB23	23%	75%	2%					PUELCHE					37,0	32,2
AB109	Luis Viale y Enrique de Rosas	AB23	12%	75%	13%					PUELCHE					37,0	32,2
AB110	Boulevard Sur Mercy Arbores Luis Beruti	AB23		1%	99%					PUELCHE	1	34,0	0,0%	34,0	37,0	32,2
AB601	Kino y Bouchard	AB04	15%	8%	77%				X	PUELCHE	1	22,0	0,0%	22,0	4,5	4,5
AB728	8° Segba (D. Rocha y Paraguay)	PCAB728		1%	99%				X	PUELCHE	2	22,0	4,4%	23,0	22,0	18,3
AB1101	MALVINAS ARGENTINAS v/Dr. Chevsa	PCAB1101		1%	99%				X	PUELCHE	2	24,5	2,9%	25,0	26,0	20,8
AB096	Manuela Pedraza 1209	ABPC1		1%		99%		PLANTA RAYO DE SOL		PUELCHE	2	41,5	1,7%	42,0	42,0	21,3
AB057	Santiago del Estero 3075	ABPC1		100%						PUELCHE					22,0	21,3
EE001	Las Heras y Guillon	EEPC1		1%	99%					PUELCHE	2	14,0	4,9%	15,0	33,0	31,4
EE002	Rivadavia y Arana	EEPC1		1%	99%					PUELCHE	2	25,0	11,3%	27,0	33,0	31,4
EE003	Obligado y Arana	EEPC1		1%	99%					PUELCHE	2	26,0	5,4%	27,0	33,0	31,4
EE004	Las Heras y Chacabuco	EEPC1	-	2%	98%					PUELCHE	1	26,0	0,0%	26,0	33,0	31,4
EE005	Terrasosa y Colon	EEPC1	-	4%	96%					PUELCHE	2	23,0	0,0%	23,0	33,0	31,4
EE016	Dorrego y Dorrer	EEPC1		7%	93%					PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	33,0	31,4
EE027	Mayo y Colon	EEPC1		30%	70%					PUELCHE					33,0	31,4
EE028	Lavalle y Mayo	EEPC1		11%	89%					PUELCHE					33,0	31,4
EE029	Lavalle	EEPC1		2%	98%					PUELCHE					33,0	31,4
EE030	Lavalle	EEPC1		4%	96%					PUELCHE					33,0	31,4
EE031	Lavalle	EEPC1		27%	73%					PUELCHE					33,0	31,4
EE032	Lavalle	EEPC1		10%	90%					PUELCHE	1	30,0	0,0%	30,0	33,0	31,4
EE033	Lavalle	EEPC1		66%	34%					PUELCHE					33,0	31,4
EE034	Mayo	EEPC1		12%	88%					PUELCHE	1	41,0	0,0%	41,0	33,0	31,4
EE035	Ventura Avila	EEPC1		9%	91%			BATERIA LA LATA		PUELCHE	1	40,0	0,0%	40,0	33,0	31,4
EE036	Ventura Avila y Calle 13	EEPC1		9%	91%					PUELCHE	1	32,0	0,0%	32,0	33,0	31,4
EE040	Ventura Avila	EEPC1		2%	98%					PUELCHE					33,0	31,4
EE041	Ventura Avila	EEPC1		1%	99%					PUELCHE					33,0	31,4
EE042	Ventura Avila	EEPC1		20%	80%					PUELCHE					33,0	31,4
EE043	Juana de Arco	EEPC1	2%	39%	59%					PUELCHE	1	37,0	0,0%	37,0	33,0	31,4
EE044	Juana de Arco	EEPC1	-	11%	89%					PUELCHE					33,0	31,4
EE045	Juana de Arco	EEPC1	4%	5%	91%					PUELCHE	1	36,0	0,0%	36,0	33,0	31,4
EE046	Lavalle entre Torquist y Brigadier	EEPC1	-	2%	98%					PUELCHE					33,0	31,4
EE047	Martin Fierro a 700mts de 56	EE21		3%	97%					PUELCHE	1	31,0	0,0%	31,0	31,0	25,2
EE048	Martin Fierro a 100 m de Vasquez	EE21		8%	92%					PUELCHE	2	36,5	1,9%	37,0	31,0	25,2
EE057	Dolores a 700 metros de Chiquiano	EEPC1		8%	92%					PUELCHE	2	39,5	1,8%	40,0	33,0	31,4
EE058	Avila Ventura 3000	EEPC1		3%	97%					PUELCHE					33,0	31,4
EE059	Avila ventura 3400	EEPC1		6%	94%					PUELCHE	2	30,0	116,2%	36,0	33,0	31,4
EE060	Los Claveles y General Las Heras	EEPC1		9%	91%					PUELCHE	2	37,0	3,8%	38,0	33,0	31,4
EE070	Colon y Mayo	EEPC1	-	2%	98%					HORIZONTE	2	5,5	0,0%	5,5	33,0	31,4
EE064	Pueyrredon y Pizzurno	PCEE064	25%	2%	73%				X	PUELCHE	1	36,0	0,0%	36,0	34,0	30,7
EE013	Cap. Lozano y Acassuso	EE05	-	3%		97%		PLANTA - EE013		PUELCHE	2	22,0	0,0%	22,0	33,0	31,4
EE065	Pedro Arocena y E. de Lapeyrere			100%				BATERIA SANTA ISABEL	X	PUELCHE						
EE066	Amado Nervo y San Pedrito		50%	-	20%					PUELCHE						
EE073	Villegas esq. Colón	EE21		1%	99%					PUELCHE	2	34,5	2,0%	35,0	31,0	25,2
EE049	Martin Fierro y Vazquez	EE21		1%	99%					PUELCHE	1	31,0	0,0%	31,0	31,0	25,2
EE050	Vazquez a 700 m de Martin Fierro	EE21		2%	98%					PUELCHE	1	26,0	0,0%	26,0	31,0	25,2
EE051	Martin Fierro y Dolores	EE21		1%	99%					PUELCHE	1	30,0	0,0%	30,0	31,0	25,2
EE052	Martin Fierro a 1300m de E. Vazquez	EE21		46%	54%			BATERIA BAFICO		PUELCHE					31,0	25,2
EE054	Martin Fierro y Dorrer	EE21			100%					PUELCHE	1	28,0	0,0%	28,0	31,0	25,2
EE056	Dolores a 700 metros de Chiquiano	EE21		8%	92%					PUELCHE	2	36,0	7,9%	38,0	31,0	25,2
EE061	Republica de Costa Rica y Libertad	EE21			100%					PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	31,0	25,2
EE062	El Cebo y Frasso	EE21		100%						PUELCHE					31,0	25,2
EE063	Alvarez de Toledo y Miguel Angel	EE03	-	1%	99%					PUELCHE	2	27,0	0,0%	27,0	31,0	25,2
EE006	Almafuerte a/Andrade y Chiquiano	EE03	39%	1%		60%				PUELCHE	1	30,0	0,0%	30,0	26,0	23,2
EE007	R. Darío y M. Cane	EE03	1%	1%		98%		PLANTA BARRIO UNO		PUELCHE	2	27,0	6,4%	29,0	26,0	23,2
EE038	Av. Tte. Gral. Montes a 1000 mts de La Horqueta	EE03	-	1%		99%				PUELCHE	2	24,5	4,8%	25,0	26,0	23,2
EE039	Tte. Gral. Montes s/n - Villa Nta. Sra. Del Rosario	EE03	-	1%		99%				PUELCHE	2	20,0	3,4%	21,0	26,0	23,2
EEN001	Lavo Garcia 3901 y Los Andes	EEPC4	-	1%	99%					PUELCHE	2	24,5	2,9%	25,0	6,7	6,3
EEN002	Pedro Crivi 3460 e/Olivieri y sanguinetti	EEPC4	-	2%	98%					PUELCHE	2	20,0	2,4%	20,0	6,7	6,3
EEN003	Palleros 1700 /S. Nicolas y/Mte. Grande	EEPC4	-	1%	99%					PUELCHE	2	23,0	6,1%	24,0	6,7	6,3
EEN005	Sansinena 601 e/Hueso y 9 de julio	EEPC4	-	9%	91%					PUELCHE	2	8,8	4,1%	8,8	6,7	6,3
EEN006	Caceres 580 e/Hueso y 9 de Julio	EEPC4	3%	7%	90%					PUELCHE					6,7	6,3
EEN007	Sarmiento 2700 e/Tricotti y Barros	EEPC4	-	63%	37%					PUELCHE	1	12,0	0,0%	12,0	6,7	6,3
EEN008	Ing. Huergo 2900 e/Pereaca y Sauze	EEPC4	5%	11%	84%					PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	6,7	6,3
EEN009	Pio Desiderio 601 e/Hueso y 9 de abril	EEPC4	-	22%	78%					PUELCHE	2	16,5	28,0%	21,0	6,7	6,3
EEN010	Ing. Huergo 1600 1842	EEPC4	-	4%	96%					PUELCHE	2	25,5	6,3%	27,0	6,7	6,3
EEN012	M. Alegre 992 e/Gomez y Vernet	EEPC4	-	1%	99%					PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	6,7	6,3
EEN013	Tricotti 10 e/Manuras y Barros	EEPC4	-	3%	97%					PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	6,7	6,3
EEN014	Coet. Ic. Eda 186 e/Palermo y/Centenario	EEPC4	-	6%	94%					PUELCHE	2	24,0	0,0%	24,0	6,7	6,3
EEN015	Coostanas 2090 e/P. Argentino y Rivero	EEPC4	-	1%	99%					PUELCHE	2	31,5	2,2%	32,0	6,7	6,3
EEN016	Tierra del Fuego 178 e/Constanzo	EEPC4	15%	6%	94%					PUELCHE	2	28,5	25,2%	31,0	6,7	6,3
EEN017	Constanzo 1220 e/Navarro y Cesari	EEPC4	-	12%	88%					PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	6,7	6,3
EEN019	Provones 3150, entre Palleros y Lopez	EEPC4	-	7%	93%					PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	6,7	6,3
EEN021	Rebizo 1100 e/ Fair y Crespo	EEPC4	-	2%	98%					PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	6,7	6,3
EEN026	M. Alegre 1720 e/Alegre y Urquiza	EEPC4	-	2%	98%					PUELCHE	2	24,5	4,8%	25,0	6,7	6,3
EEN059	Enrique Banch y Rebuzo	EEPC4	-	1%	99%					PUELCHE	2	27,0	10,5%	29,0	6,7	6,3
EEN020	Sansinena 105 e/ Dorcool y Constanzo	EEPC4	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	6,7	6,3
EEN022	Sansinena e Vernet y Benavidez	EEPC4	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	12,5	6,7%	13,0	6,7	6,3
EEN023	Benavidez 3180 e / F Lopez y Scaglia	EEPC4	-	2%	98%				X	PUELCHE	2	10,5	6,7%	11,0	6,7	6,3
EEN027	Fernandez y Dicio	EE23	-	-	100%				X	PUELCHE	2	27,5	12,9%	30,0	29,0	27,6
EE028	Rivero y Chimondeguy	EE23	-	2%	98%				X	PUELCHE	2	31,5	4,6%	32,0	28,0	27,6
EEN029	Av. Fair y Piemma Junta	EE34	-	22%	78%					PUELCHE					28,0	26,2
EEN030	Cervetti y Av. Fair	EE34	-	1%	99%			BATERIA CORREO ARGENTINO		PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	28,0	26,2
EEN031	Cervetti y La Horqueta	EE34	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	24,0	5,9%	25,0	28,0	26,2
EEN032	Av Fair e Islas Trinidad	EE34		-	100%					PUELCHE	2	26,0	5,4%	27,0	28,0	26,2
EEN033	Urbano González e Independencia	EE31	-	1%	99%					PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	12,0	11,2
EEN034	Alberto Grande a 38m de las vias	EE31	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	22,0	6,4%	23,0	12,0	11,2
EEN035	Casacuberta e/Valette y Gonzalez	EE31	-	1%	99%					PUELCHE	2	27,5	7,7%	29,0	12,0	11,2
EEN036	Lima e/Valette y Francia	EE31	8%	2%	90%	-	-			PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	12,0	11,2
EEN037	Cepeda y de los Constituyentes	EE31	-	46%	54%	-	-			PUELCHE	1	25,0	0,0%	25,0	12,0	11,2
EEN038	Lago Garcia y Cepeda	EE31	-	23%	77%					PUELCHE	2	23,5	9,0%	25,0	12,0	11,2
EEN039	Cepeda y Alberto Grande	EE31	1%	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	27,0	5,2%	28,0	12,0	11,2
EEN040	Lago Garcia a 50m de Valette	EE31	-	1%	99%			BATERIA SANTA CATALINA		PUELCHE	2	24,0	0,0%	24,0	12,0	11,2
EEN041	9 de Abril e/Valette y Wieman	EE31	-	1%	99%					PUELCHE	2	25,5	2,8%	26,0	12,0	11,2
EEN042	Las Talitas e/Sarmiento y M. Alegre	EE31	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	12,0	11,2
EEN043	Avellaneda e/Trangoni y C. Monte Grande	EE31	64%	36%						PUELCHE					12,0	11,2
EEN044	Bruzzone e/Foz y Gonzalez	EE31	1%	1%	98%	-	-			PUELCHE	3	19,3	7,9%	21,0	12,0	11,2
EEN045	Bruzzone e/Tte. Alberto Grande	EE31	-	1%	99%					PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	12,0	11,2
EEN046	Bourquet e/ Ameghino y Gabaston	EE31	-	4%	96%	-	-			PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	12,0	11,2
EEN047	Juan M. de Rosas i Tte. Gabaston	EE31	9%	13%	78%					PUELCHE	1	17,0	0,0%	17,0	12,0	11,2
EEN048	Robertson e/ J. Newbery y T. Malienzo	EE31	1%	4%	95%					PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	12,0	11,2
EEN049	J. A. Roca v.Est. Los Remedios	EE29	-	4%	96%					PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	22,0	20,4
EEN050	Los Robles y T. A. Edison	EE29	30%	5%	65%			BATERIA SAN IGNACIO		PUELCHE	1	17,0	0,0%	17,0	22,0	20,4
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	EE29	23%	4%	73%					PUELCHE	1	23,0	0,0%	23,0	22,0	20,4
EEN052	20 de Junio y L. Lopez	EE29	-	1%	99%					PUELCHE	2	22,5	3,0%	23,0	22,0	20,4
EE053	Cichero 700 e/ Hipolito Bouchard y Julio Argentino Roca	EEPC5	-	-	99%					PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	8,6	8,2
EE054	Destacamento Melchior 733	EEPC5	-	-	100%			BATERIA LA MORITA		PUELCHE	2	22,0	6,4%	23,0	8,6	8,2
EE056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	EEPC5	-	1%	99%					PUELCHE					8,6	8,2
EE058	Fray Luis Beltran 1415	EEPC5	-	-	100%					PUELCHE	2	25,5	8,3%	27,0	8,6	8,2
EET001	Falucho y Las Dalias	EEPC2	-	81%	19%			BATERIA TRISTAN SUAREZ		PUELCHE	1	48,0	0,0%	48,0	44,0	40,3
EET004	Av. Saenz Peña y Bogado	EEPC2	-	75%	25%					PUELCHE					44,0	40,3
EEU001	Maipu 800 e Bransen Hussay B.	EE20	-	25%	75%					PUELCHE	1	37,0	0,0%	37,0	46,0	38,0
EEU002	San Bernardo 980 e/ Belcarce P. Moreno	EE20	-	12%	88%					PUELCHE	2	32,0	4,4%	33,0	46,0	38,0
EEU003	Los Robles al 9000	EE23	-	3%	97%					PUELCHE	1	35,0	0,0%	35,0	46,0	38,0
EEU004	Los Robles al 9700	EE23	-	4%	96%					PUELCHE	1	34,0	0,0%	34,0	40,0	35,4
EEU005	O.Cabral a 200mts de Lacarra	EE26	-	1%	99%					PUELCHE	2	34,0	8,3%	36,0	40,0	35,4
										PUELCHE	2	26,0	8,1%	27,0	34,0	29,0

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ARSENICO TOTAL [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEU006	S.Cabral 3588 a 700 m de EEU005	EE26	-	62%	38%			BATERIA UNION		PUELCHE	1	23,0	0,0%	23,0	32,0	29,0
EEU007	S.Cabral a 700mts de EEU006	EE26	-	2%	98%					PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	32,0	29,0
EEU009	Sgto Cabral 5149 e/ Gral. Antonio Gonzalez y Jose Alvarez Condarco	EE26	2%	2%	96%					PUELCHE	2	28,5	7,4%	30,0	32,0	29,0
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	EE26	-	1%	99%					PUELCHE	1	30,0	0,0%	30,0	32,0	29,0
EEU011	Sgto. Cabral a 700 m de EEU010	EE32	-	45%	55%					PUELCHE	1	25,0	0,0%	25,0	32,0	29,0
EEU012	Calle s/n a 700 m de Sgto. Cabral	EE32	-	99%	1%					PUELCHE	-	-	-	-	32,0	29,0
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	EE32	-	25%	65%					PUELCHE	1	36,0	0,0%	36,0	32,0	29,0
EEU014	Juana de Arco a 700 m de S20	EE24	-	51%	49%					PUELCHE	-	-	-	-	40,0	35,4
EEU015	Lavalleja y 9 de Julio	EE32	-	33%	67%					PUELCHE	1	26,0	0,0%	26,0	32,0	29,0
EEU016	Av. Mitre a 40 esq. RP58	EE32	-	84%	16%					PUELCHE	-	-	-	-	32,0	29,0
EEU017	Av. Mitre a 40 esq. RP59	EE32	-	3%	97%					PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	32,0	29,0
EEU018	Antonovaco 80 e/ Jose Chumpasenac	EE32	-	7%	93%					PUELCHE	2	29,5	10,1%	30,0	32,0	29,0
EEU019	Montes de Oca 80 e/Ruta Prov 58 y Jose Chamopasnac	EE32	-	6%	94%					PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	32,0	29,0
EEU020	Veintes 9 entre Mariano Castex y José Chamopasnac	EE32	-	-	100%					PUELCHE	2	28,5	2,5%	29,0	32,0	29,0
EEU021	Sgto. Sarquiento Cabral a 700m del EEU011	EE32	-	1%	99%					PUELCHE	2	32,0	6,8%	34,0	32,0	29,0
EEU022	Juana de Arco S/N	EE32	-	4%	96%					PUELCHE	2	38,0	0,0%	38,0	32,0	29,0
EEU023	Los Robles 249	EE32	-	76%	24%					PUELCHE	-	-	-	-	32,0	29,0
EEU005	Sgto. Cabral a 100 mts de Cáceres	EE32	-	19%	81%					PUELCHE	2	28,5	7,4%	30,0	32,0	29,0
EEU026	Juana de Arco N° 7100	EE32	-	18%	82%					PUELCHE	1	28,0	0,0%	28,0	32,0	29,0
EEZ001	Río Bermejo y Río Guatequay	EE28	-	3%	-	97%	-	PLANTA LA CELIA		PUELCHE	2	22,5	3,1%	23,0	9,0	7,1
EEZ002	Río Bermejo y La Alamica	EE28	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	1	14,0	0,0%	14,0	9,6	7,1
EEZ003	Las Hortensias Norte	EE22	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	32,0	4,4%	33,0	45,0	40,0
EES001	25 de Mayo 2371	EZPC1	100%	-	-	-	-	BATERIA EZEIZA		PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EES004	Rosario y Paisanos	EZPC1	16%	4%	80%	-	-			PUELCHE	2	37,5	1,9%	38,0	48,0	42,4
EEZ006	Caminito 1200	EZPC1	31%	52%	18%	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EEZ007	Camunito 1900	EZPC1	-	100%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EEZ010	Paso de los Libres 1800 e Islas Cook.	EZPC1	41%	1%	58%	-	-			PUELCHE	2	63,5	10,0%	68,0	48,0	42,4
EEZ011	Falucho y Paso de los Libres	EZPC1	24%	1%	88%	-	-			PUELCHE	2	49,0	2,9%	49,0	48,0	42,4
EEZ012	Paso de los Libres a 700m de Falucho	EZPC1	18%	1%	81%	-	-			PUELCHE	2	47,5	4,5%	49,0	48,0	42,4
EEZ013	Paso de los Libres 1400	EZPC1	39%	1%	61%	-	-			PUELCHE	2	49,0	0,0%	49,0	48,0	42,4
EEZ014	Paso de los Libres 1500	EZPC1	-	100%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EEZ015	Paso de los Libres a 1700 mts de RP N°52	EZPC1	27%	1%	73%	-	-			PUELCHE	1	60,0	0,0%	60,0	48,0	42,4
EEZ016	Moreno Moreno a 700m de Falucho	EZPC1	10%	48%	37%	-	-			PUELCHE	2	44,0	0,0%	44,0	48,0	42,4
EEZ017	Moreno 3500	EZPC1	-	100%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EEZ018	Paso de los Libres 900	EZPC1	-	100%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EEZ019	Ruta Provincial N 52, 4000	EZPC1	26%	1%	73%	-	-			PUELCHE	2	61,0	0,0%	61,0	48,0	42,4
EEZ020	RP N° 52 1000	EZPC1	34%	2%	59%	-	-			PUELCHE	2	70,5	5,0%	73,0	48,0	42,4
EEZ021	RP N° 52 1200	EZPC1	26%	2%	73%	-	-			PUELCHE	2	57,5	6,1%	60,0	48,0	42,4
EEZ022	RP N° 52 s/n	EZPC1	43%	23%	72%	-	-			PUELCHE	2	51,0	1,5%	51,0	48,0	42,4
EEZ023	RP N° 52 1300	EZPC1	8%	1%	91%	-	-			PUELCHE	2	46,5	10,6%	48,0	48,0	42,4
EEZ024	Ruta N°52 kilometro 2	EZPC1	5%	3%	92%	-	-			PUELCHE	2	45,5	7,8%	48,0	48,0	42,4
EEZ025	Farvia 2000	EZPC1	-	100%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EEZ026	Valle de Río Negro y América del Norte (PA Ezeiza)	EZPC1	-	-	100%	-	-			HIPOPUELCHE	2	< 5	0,0%	< 5	48,0	42,4
EEZ027	Cañada de Gomez y 25 de Mayo	EZPC1	16%	17%	67%	-	-			PUELCHE	1	36,0	0,0%	36,0	48,0	42,4
EEZ028	Ouso y Arroyo	EZPC1	11%	89%	1%	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EEZ029	Valle de Río Negro y América del Norte	EZPC1	14%	9%	77%	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EEZ030	O. F. Sarmiento y Rosas Balet	EZPC1	14%	18%	68%	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
EEZ031	Roger Balet y Sargento Cabral	EZPC1	14%	17%	69%	-	-			PUELCHE	1	34,0	0,0%	34,0	48,0	42,4
EEZ032	Valle de Río Negro y 25 de Mayo	EZPC1	22%	52%	27%	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	48,0	42,4
ES022	Scalabrini Ortiz e/Hg. Pablo Marin y 1° de Mayo.	PCES022-24	-	4%	-	96%	-	TANQUE FONAVI		PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	18,0	17,7
ES023	Islas Malvinas e/Constituyentes y Pablo Marin.	PCES022-24	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	15,0	9,4%	16,0	18,0	17,7
ES024	Scalabrini Ortiz y Av. Patricias Argentinas.	PCES022-24	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	2	18,0	0,0%	18,0	18,0	17,7
FV002	San Martin y San Juan	FV-TAN-CEN	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	1	16,0	0,0%	16,0	13,0	12,7
FV003	Constitución 198	FV-TAN-CEN	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	1	14,0	0,0%	14,0	13,0	12,7
FV004	Carriego y Alem	FV-TAN-CEN	-	53%	-	47%	-			PUELCHE	1	15,0	0,0	15,0	13,0	12,7
FV005	San Martin y Delfina a	PCFV005			100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	17,0	0,0	17,0	13,0	13,0
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	PCFV006			100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	19,0	0,0%	19,0	20,0	19,7
FV007	Cariboni N° 2351 e/ Chaco y Rosario	PCFV007	-	14%	86%	-	-	-	X	PUELCHE	2	28,5	2,5%	29,0	28,0	27,0
FV009	Cariboni y Rio Bermejo	PCFV009		3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	28,0	23,5
FV011	Corrientes esq. 12 de Octubre	PCFV011			100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	9,9%	23,0	22,0	20,7
FV013	Av Bélgica N° 1101 esq. Jorge Novak	PCFV013	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	22,0	21,3
FV014	J.D. Perón 535 y Pringles	PCFV014			100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	12,5	5,7%	13,0	15,0	14,0
FV018	Av. Eva Perón y Gral. Hornos	PCFV018		3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	3,3%	22,0	22,0	21,7
FV019	Río Caraguata n° 1401 y Directorio	PCFV019	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,5	3,1%	23,0	24,0	23,3
FV020	Cabildo y Eva Perón	PCFV020		1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,0	6,4%	23,0	21,0	20,0
FV021	Mantovani y Calle 1407	FV-CIS-SAR		2%	98%	-	-	REBOMBEO SARMIENTO		PUELCHE	2	29,5	2,4%	30,0	29,0	28,3
FV022	Juan Mantovani 587 e/ C.1423 y C. 1409	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	35,5	2,0%	36,0	29,0	28,3
FV023	Mantovani y Calle 1429	FV-CIS-SAR		3%	97%	-	-			PUELCHE	2	37,5	1,9%	38,0	29,0	28,3
FV025	Calle 1423 (901) a 400 mts de Mantovani	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-			PUELCHE	2	34,0	0,0%	34,0	29,0	28,3
FV040	1439 y Juan Mantovani.	FV-TAN-CRU	-	4%	96%	-	-			PUELCHE	2	39,0	3,6%	40,0	25,0	24,3
FV064	C. 1439 e/ C.1420 y a 300 mts de Juan Mantovani	FV-CIS-SAR		5%	95%	-	-			PUELCHE	2	37,0	3,8%	38,0	29,0	28,3
FV065	Eva Perón N° 9695 y C. 1423	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	29,0	28,3
FV066	Avenida Eva Perón y Calle 1352	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	28,0	5,1%	29,0	29,0	28,3
FV084	1610 e/RP 53 y 1647	FV-CIS-SAR		2%	98%	-	-			PUELCHE	2	23,0	6,1%	24,0	29,0	28,3
FV085	1653 e/Av. La Plata y A° Las Conchitas	FV-CIS-SAR		1%	99%	-	-			PUELCHE	2	29,0	4,9%	30,0	29,0	28,3
FV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Suecia	PCFV112		7%	93%	-	-			PUELCHE	2	34,0	4,2%	35,0	33,0	32,3
FV120	Calle 1404 N° 498 e/ R.P. 53 y campo	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	29,0	28,3
FV121	Av. Gral. Savio N° 598 esq. Sicilia	FV-TAN-MAY			100%	-	-			PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	23,0	20,7
FV124	E.B. SARMIENTO	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-			HIPOPUELCHE	2	< 5	0,0%	< 5	29,0	28,3
FV132	Calle 1426 esq. 1437 – B° San Francisco Grande (oeste)	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	3	32,0	8,3%	34,0	29,0	28,3
FV147	Av. La Plata 50	FV-CIS-SAR	-	8%	92%	-	-			PUELCHE	2	35,5	2,0%	36,0	29,0	28,3
FV149	Av. La Plata y Calle 1305	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	37,5	5,7%	39,0	29,0	28,3
FV156	Calle 1433a y 1418	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	31,0	4,6%	32,0	29,0	28,3
FV157	Calle 1443 y 1430	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	29,0	28,3
FV158	Calle 1440 a 400m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-			PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	29,0	28,3
FV159	calle 1440 a 1000m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-			PUELCHE	2	30,0	0,0%	30,0	29,0	28,3
FV160	calle 1452 y RP53	FV-CIS-SAR		3%	97%	-	-			PUELCHE	2	30,5	7,0%	32,0	29,0	28,3
FV166	Calle 1440 y 1455	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-			PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	29,0	28,3
FV024	Eva Peron y Calle 1409	FV-CIS-SL	-	22%	78%	-	-	REBOMBEO SAN LUIS		PUELCHE	3	28,7	4,0%	30,0	26,0	25,7
FV036	Calle 1422 y Eva Perón	FV-CIS-SL		3%	97%	-	-			PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	26,0	25,7
FV037	Calle 1432 N° 901 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-			PUELCHE	2	22,5	3,1%	23,0	26,0	25,7
FV041	Calle 1335 N° 801 y 1328	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-			PUELCHE	2	19,5	3,6%	20,0	26,0	25,7
FV042	Calle 1316 y 1333	FV-CIS-SL		2%	98%	-	-			PUELCHE	2	22,0	0,0%	22,0	26,0	25,7
FV045	Los Inmigrantes y Calle 1355	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	23,0	12,3%	25,0	26,0	25,7
FV050	Av. Eva Perón N° 7700 e/1310 y Cacheuta	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-			PUELCHE	2	33,0	4,3%	34,0	26,0	25,7
FV087	1364 N° 1862 esq. 1317a	FV-CIS-SL		6%	94%	-	-			PUELCHE	2	33,5	6,3%	35,0	26,0	25,7
FV088	1327 N° 3201 e/ 1364 y 1370	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	33,5	10,6%	36,0	26,0	25,7
FV089	1356 N° 1700 e/ 1347 y 1349	FV-CIS-SL	-	5%	95%	-	-			PUELCHE	2	28,0	5,1%	29,0	26,0	25,7
FV086	1374 N° 900 esq. 1313	FV-CIS-SL		28%	72%	-	-			PUELCHE	1	31,0	0,0%	31,0	26,0	25,7
FV092	1345 e/Av. La Plata y 1364	PCFV090-94		4%	96%	-	-			PUELCHE	2	35,0	4,0%	36,0	32,0	29,7
FV104	Calle 1363 N° 100 y Los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	24,0	5,9%	25,0	26,0	25,7
FV116	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	FV-CIS-SAR		3%	97%	-	-			PUELCHE	2	24,0	5,9%	25,0	29,0	28,3
FV130	Calle 1341 N° 511 esquina calle 1310	FV-CIS-SL		2%	98%	-	-			PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	26,0	25,7
FV134	Los Inmigrantes y calle 1363	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-			HIPOPUELCHE	2	6,0	9,4%	6,4	26,0	25,7
FV143	Calle 1328 y 1355	FV-CIS-SL		3%	97%	-	-			PUELCHE	2	28,0	0,0%	28,0	26,0	25,7
FV177	Calle 1347 a 58 mts de Av. De los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	8%	92%	-	-			PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	26,0	25,7
FV026	Calle 77 y Posadas	FV02	-	2%	98%	-	-	BATERIA SAN NICOLAS		PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	27,0	25,3
FV027	El Zonda y El Gaucho	FV02		1%	99%	-	-			PUELCHE	2	19,5	3,6%	20,0	27,0	25,3
FV028	Riobamba N° 1501 y Olivero	FV02		1%	99%	-	-			PUELCHE	2	17,0	0,0%	17,0	27,0	25,3
FV029	Pte. Illia y Alvear	FV02	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	27,0	25,3
FV097	Castelli N° 1001 esq. EE.UU	FV02		43%	57%	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	27,0	25,3
FV152	El Apero entre Calle 437 y El Malambo	FV02	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	30,0	9,4%	32,0	27,0	25,3

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ARSENICO TOTAL [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
FV174	Castelli esquina EEUU de América	FV02	-	7%	93%	-	-			PUELCHE	2	16,5	12,9%	18,0	27,0	25,3
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	FV-TAN-MAY	-	12%	-	88%	-			PUELCHE	1	28,0	0,0%	28,0	23,0	20,7
FV031	Virgen del Valle y El Clavel	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	2	24,5	8,7%	26,0	23,0	20,7
FV032	Virgen del Valle y La Ancianidad	FV-TAN-MAY	-	23%	-	77%	-			PUELCHE	2	20,0	7,1%	21,0	23,0	20,7
FV033	Virgen del Valle y Río Pilcomayo	FV-TAN-MAY	-	5%	-	95%	-	TANQUE MAYOL		PUELCHE	2	22,0	6,8%	23,0	23,0	20,7
FV034	Av Cacheuta y Boston	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	2	24,0	5,9%	25,0	23,0	20,7
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	FV-TAN-MAY	-	11%	-	89%	-			PUELCHE	1	23,0	0,0%	23,0	23,0	20,7
FV053	Cacheuta 2701 y Calle 1353	FV-TAN-MAY	-	3%	-	97%	-			PUELCHE	2	28,0	0,0%	28,0	23,0	20,7
FV063	Av Eva Perón 5880	FV-TAN-MAY	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	17,0	0,0%	17,0	23,0	20,7
FV038	Calle 1423 e/ 1422 y 1428	PCFV038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	21,0	18,7
FV046	Batalla de Ituzaingo 2780 e/ Contreras y C 214A	PCFV046	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	8,3%	18,0	19,0	18,7
FV047	Boedo e/ Montserrat y Túnez	PCFV047	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	16,0	15,3
FV048	León XIII e/ Pte. Perón y Beirut	PCFV048	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	0,0%	18,0	17,0	15,0
FV049	San Antonio e/ Inda y Alvar Cabeza de Vaca	PCFV049	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	11,5	6,1%	12,0	12,0	11,3
FV051	Cacheuta 3601 y 1371	PCFV051	-	31%	69%	-	-	-	X	PUELCHE	1	28,0	0,0%	28,0	27,0	26,5
FV055	Calle 832 e/M.Grass y Piedrabuena (V.A.)	PCFV055	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	26,0	24,0
FV057	Virgen del Valle N° 2599 y Chaco	PCFV057	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	2	29,0	0,0%	29,0	29,0	26,3
FV058	Juan B. Justo y Ascasubi	PCFV058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	18,0	17,0
FV059	Av Bosques y Ruta 36	PCFV059	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	14,0	13,0
FV060	Delgado y Cafiuelas	PCFV060	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	1	11,0	0,0%	11,0	13,0	12,0
FV062	Calle 740 y El Clavel	PCFV062	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	29,0	23,7
FV067	Calle 1108 N° 1702 e/ 1131 y 1139	PCFV067-70	-	23%	77%	-	-			PUELCHE	2	27,0	5,2%	28,0	26,0	24,7
FV068	Calle 1108 N° 2280 esq. 1139	PCFV067-70	-	4%	96%	-	-			PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	26,0	24,7
FV069	Diag. Los Quilmes N° 500	PCFV067-70	-	27%	73%	-	-	BATERIA ING. ALLAN		PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	26,0	24,7
FV070	Calle 1108 N° 2300	PCFV067-70	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	25,5	8,3%	27,0	26,0	24,7
FV148	Calle 153a 301	PCFV148	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	24,5	8,7%	26,0	24,0	23,3
FV167	Calle 1145 y Calle 1122	PCFV067-70	-	7%	93%	-	-			PUELCHE	2	22,5	9,4%	24,0	26,0	24,7
FV071	San Nicolás N° 2501 y Chaco	PCFV071	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,0	13,5%	23,0	20,0	19,3
FV072	Finochietto N° 1411 y Fracción V	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	12,0	11,8%	13,0	25,0	24,3
FV073	C.O.Cruce	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO CRUCE VARELA		PUELCHE	2	12,5	5,7%	13,0	25,0	24,3
FV074	Carlos Gardel N° 700 y Campichuelo	FV-TAN-CRU	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	11,0	12,9%	12,0	25,0	24,3
FV142	Dardo Rocha y Cerro Famatina	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	14,0	10,1%	15,0	25,0	24,3
FV078	Bruselas y Polonia	PCFV078	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	31,0	0,0%	31,0	33,0	31,3
FV079	Bruselas y Bulgaria	PCFV079	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	40,5	8,7%	43,0	39,0	38,0
FV080	517 N° 1700 y Portela	PCFV080	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,0	0,0%	21,0	20,0	19,7
FV082	El Paisano N° 1899 e/445 (B° Don José Planificado)	FV-TAN-PB2	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	26,0	5,4%	27,0	28,0	27,0
FV131	El Malambo N° 105 esq. La Tranquera	PCFV131	-	1%	99%	-	-	BATERIA DON JOSE PLANIFICADO		PUELCHE	2	29,5	7,2%	31,0	29,0	28,3
FV165	Calle Monteverde e/445 y 449	PCFV165	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	24,0	0,0%	24,0	27,0	26,3
FV090	Av. La Plata N° 1200 e/1327 y 1319a	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	23,0	0,0%	23,0	32,0	29,7
FV093	1681 esq. 1608	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	33,5	6,3%	35,0	32,0	29,7
FV094	1364 N° 2592 e/ 1371 Y 1357	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-	BATERIA LAS COLONIAS		PUELCHE	2	35,0	8,1%	37,0	32,0	29,7
FV144	La Plata 1700	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	24,5	2,9%	25,0	32,0	29,7
FV146	Calle 1353 4100	PCFV090-94	-	7%	93%	-	-			PUELCHE	2	21,0	0,0%	21,0	32,0	29,7
FV176	Calle 1608 entre 1671 y 1673	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-			PUELCHE	2	36,5	5,8%	39,0	32,0	29,7
FV095	Pisani N° 1101 esq. Suecia	PCFV095	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	34,0	0,0%	34,0	35,0	34,0
FV096	Humahuaca N° 501 y 511	PCFV096	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	23,0	12,3%	25,0	25,0	23,0
FV098	Cno. Touring Club N° 1499 y Canalejas	PCFV098	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	3	11,0	9,1%	12,0	13,0	11,3
FV100	228-Gral Perón N° 1501 y Bs. As.	PCFV100	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	19,0	18,3
FV102	V.Abrille N° 975 casi esquina Calle 519	PCFV154	-	6%	94%	-	-	BATERIA SAN JORGE		PUELCHE	2	18,5	11,5%	20,0	33,0	31,7
FV154	La Paloma y calle 560	PCFV154	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	33,5	6,3%	35,0	33,0	31,7
FV103	Cicilia N° 2020	PCFV103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,0	6,7%	22,0	22,0	21,7
FV105	Calle 527 e/ 554 y 554A	PCFV105	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	3,3%	22,0	26,0	25,7
FV106	Calle 554 N° 1103 e/ Diag. Jarilla	PCFV106	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	37,0	7,6%	39,0	37,0	35,7
FV108	Calle 1348 N° 1003 e/ 1317 Ay 1319 A - (B° San Francisco Este)	PCFV108	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,0	5,2%	28,0	28,0	26,3
FV109	Calle 1435 N° 1719 esq. 1434 - (B° San Francisco Oeste)	PCFV109	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	26,0	5,4%	27,0	28,0	26,0
FV110	Las Lengas N° 2303 e/ El cardenal y El Zorzal - (B° Santa Inés)	FV01	-	7%	93%	-	-			PUELCHE	2	37,5	9,4%	40,0	29,0	27,3
FV111	Los Alamos N° 2502 e/ Av. Blas Parera y El Hornero - (B° Santa Inés)	FV01	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	22,0	12,9%	24,0	29,0	27,3
FV150	El Nandú e/ Las Casuarinas y Los Alamos	FV01	-	2%	98%	-	-	BATERIA GOBERNADOR COSTA		PUELCHE	2	24,0	11,8%	26,0	29,0	27,3
FV151	Los Lapachos y Tinkunaku	FV01	-	5%	95%	-	-			PUELCHE	2	34,0	12,5%	37,0	29,0	27,3
FV161	Los Laureles y El Cardenal	FV01	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	1	24,0	0,0%	24,0	29,0	27,3
FV162	La Paloma y Los Sauces	FV01	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	34,0	8,3%	36,0	29,0	27,3
FV163	El Mirlo entre Los Olivos y Los Lapachos	FV01	-	6%	94%	-	-			PUELCHE	2	41,0	10,3%	44,0	29,0	27,3
FV113	Bonn N° 1203 y Austria	PCFV113	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,0	5,2%	28,0	30,0	26,3
FV114	Calle 531 N° 2200	PCFV114	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	30,0	29,3
FV115	Progreso 2190 e/ Intendente Jose Luis Cariboni y virgen de valle	PCFV115	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	22,0	22,0
FV117	Lourdes N° 402 y Ruta Prov. N° 53	PCFV117	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	26,0	25,3
FV119	Suecia N° 1601 esq. Lisboa	PCFV119	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	35,0	4,0%	36,0	37,0	34,3
FV122	Copenhage N° 502 esq. Alemania	PCFV122	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,0	6,4%	23,0	24,0	22,7
FV123	Calle 172 - Río Negro N° 1790 esq. Alvarado	PCFV123	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	11,5	6,1%	12,0	21,0	20,0
FV125	Bourel y Chacabuco	PCFV125	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	12,0	11,8%	13,0	13,0	12,7
FV126	Riobamba y Vías	PCFV126	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	11,0	0,0%	11,0	25,0	24,3
FV127	Calle 1151 Ay Calle 1130	PCFV127	-	46%	54%	-	-	-	X	PUELCHE	1	18,0	0,0%	18,0	19,0	19,0
FV128	Río Diamante N° 3080 esquina Villegas	PCFV128	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,0	5,9%	25,0	24,0	22,7
FV129	Río Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	PCFV129	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	23,0	0,0%	23,0	23,0	22,3
FV133	Calle 1151 y Calle 1118	PCFV133	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,0	6,7%	22,0	22,0	20,0
FV137	San Geronimo 605	PCFV137	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	22,0	20,7
FV138	Campana y Esmeralda	PCFV138	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	21,0	19,7
FV139	Guamini 2711	PCFV139	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	0,0%	17,0	17,0	17,0
FV140	San Martin y Monteagudo	PCFV140	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	11,0	0,0%	11,0	13,0	12,3
FV141	Alfonsina Storni 74	PCFV153	-	2%	98%	-	-	BATERIA BARRIO ALTAMIRA		PUELCHE	2	13,0	10,9%	14,0	13,0	12,8
FV153	Florida y Miguel Cané	PCFV153	-	4%	96%	-	-			PUELCHE	1	12,0	0,0%	12,0	13,0	12,8
FV145	Av. Cacheuta entre Calle 1363 y Calle 1371	PCFV145	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,5	2,9%	25,0	26,0	25,3
FV164	calle 1155 y 1138	PCFV164	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,0	6,4%	23,0	24,0	22,5
FV168	Calle 1149 y Calle 1136	PCFV168	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	9,9%	23,0	23,0	22,0
FV169	Calle Jacinto Benavente y E. D Amicis	PCFV059	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	14,0	13,0
FV175	Santa Lucia y Aconquija	PCFV118	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,0	0,0%	16,0	12,0	11,7
FV178	Av. Bosques y calle 619	PCFV178	-	50%	50%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV183	Remedios de Escalada esquina Carmen de Areco	PCFV183	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,0	0,0%	13,0	12,0	12,0
FV184	Turquia, entre, Bruselas y Milán	PCFV184	-	6%	94%	-	-	-	X	PUELCHE	2	26,0	5,4%	27,0	-	-
FV191	Rumania entre Paris y Paysandú		-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ARSENICO TOTAL [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	4%	-	96%	-	TANQUE OESTE - SAN MARTIN		PUELCHE	1	20,0	0,0%	20,0	28,0	25,0
GU002	Colombia 1007 e/Av. De las Americas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	28,0	25,0
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-			PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	28,0	25,0
GU005	Bogado 800 e/Islas Malvinas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	28,0	25,0
GU007	Republica Argentina 578 e/Venezuela.	GU-TAN-PED	-	8%	-	92%	-			PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	28,0	25,0
GU008	Brasil 103 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-			PUELCHE	2	23,5	9,0%	25,0	28,0	25,0
GU020	Remedios de Escalada e/Tomas Guido y Godoy Cruz	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	28,0	25,0
GU031	Brasil y Mesopotamia	GU-TAN-PED	-	17%	-	83%	-			PUELCHE	1	32,0	0,0%	32,0	28,0	25,0
GU032	Avenida 38 entre calle 5 y 6	GU-TAN-PED	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	28,0	25,0
GU010	Violeta Antier 5095 e/Santos Discepolo.	PCGU010	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	43,5	8,1%	46,0	42,0	40,2
GU011	Alfonso Ansat 4611 e/Jose Neglia.	PCGU011	-	100%	-	-	-	-	x	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU012	Calle 117 1000 / Av. C. Mereles 1050 e/calles 118 y 120.	GU-TAN-YA	3%	1%	-	96%	-	TANQUE ESTE - LA YAYA		PUELCHE	2	25,5	2,8%	26,0	37,0	34,0
GU013	Calle 118 N° 1633 e/calles 121 y 123.	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-			PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	37,0	34,0
GU014	Cjal. Capuano 490 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	33,5	6,3%	35,0	37,0	34,0
GU015	Calle 118 2041 e/calles 127 y 129.	GU-TAN-YA	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	39,5	1,8%	40,0	37,0	34,0
GU016	Calle 118 2471 e/calles 133 y 135.	GU-TAN-YA	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	2	37,0	0,0%	37,0	37,0	34,0
GU017	Av. 139 N° 510 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA	-	4%	-	96%	-			PUELCHE	2	41,5	10,8%	46,0	37,0	34,0
GU023	Calle 103 y Calle 124	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-			PUELCHE	2	23,0	6,1%	24,0	37,0	34,0
GU024	Calle 116 y Av. 99	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-			PUELCHE	2	30,5	7,0%	32,0	37,0	34,0
GU018	Av. 21 N° 1099 e/calle 36.	GU01	-	3%	97%	-	-	BATERIA LAS LOMAS		PUELCHE	3	53,3	12,1%	58,0	41,0	38,5
GU019	Cjal. Placido Bajo N° 901 e/ calle39.	GU01	-	-	100%	-	-			PUELCHE	2	30,0	0,0%	30,0	41,0	38,5
GU006	Av. Nestor Kirchner 630 e/Avellaneda y Güemes.	GU02	1%	25%	74%	-	-	BATERIA B° SANTA MAGDALENA		PUELCHE	1	49,0	0,0%	49,0	44,0	42,3
GU021	Roque Saenz Peña y Santa Elena	GU02	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	26,5	2,7%	27,0	44,0	42,3
GU022	Dorrego y Luis A. Testa	GU02	2%	12%	86%	-	-			PUELCHE	2	36,0	3,9%	37,0	44,0	42,3
GU025	Calle 6 y Tte. Juan Domingo Baldini	PCGU025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	43,5	4,9%	45,0	30,0	21,3
GU026	Kingston y Honduras	-	10%	89%	1%	-	-	BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU027	Brasilia y Guayanas	-	2%	89%	9%	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU028	Puerto España y Brasilia	-	10%	89%	1%	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU029	Gral Paz e/calle 7 y Lib. Gral J. de S.Martin	-	11%	89%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU030	La Rioja e/ Av. Hipólito Yrigoyen y Sarmiento	-	11%	89%	-	-	-	BATERIA NUMANCIA		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
JCP002	Wilde 4573 e/Corbeta Uruguay y Fragata Sarmiento	JCP-TAN-PR	-	-	-	100%	-	TANQUE PRIMAVERA		PUELCHE	2	38,5	9,2%	41,0	36,0	35,7
JCP003	AV. Derqui e/ Av. Pres. Hipolito Yrigoyen	JCP-TAN-PR	-	-	-	100%	-			PUELCHE	2	39,5	1,8%	40,0	36,0	35,7
JCP005	Las 3 Marias 5700 e/ Av. Jose Altube y Jose C. Paz	JCP-TAN-PR	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	2	38,0	7,4%	40,0	36,0	35,7
JCP006	Calle Pampa de Junin a 50 m de Yrigoyen	JCP-TAN-PR	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	2	36,0	3,9%	37,0	36,0	35,7
LMO046	Fortin Yunke y Guanabara.	LMO03	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	34,0	29,0
LMO047	Colect. R3 y Hipolitamma B° Piñer Letour.	LMO03	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	34,0	29,0
LMO049	Escribano y Cullen B°El Pino.	LMO27	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	34,0	29,0
LMO053	Haiti y Gallego - Haiti y Torren.	LMO08	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	26,0	23,5
LMO054	Luciano Torrent N° 600 y Simón Perez B° San Enrique.	LMO08	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	26,0	11,3%	30,0	26,0	23,5
LMO056	Guanacache y Pino B° Recoleta.	LMO07	72%	1%	27%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	32,0	29,8
LMO063	Huemul y Rodeo B°Maria Elena	LMO02	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	12,0	7,4
LMO064	Urdaneta y Rodeo B° Maria Elena.	LMO02	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	11,0	12,9%	12,0	12,0	7,4
LMO068	M.Gamboa y Colegiales (E/Colegiales y M. Besares)	LMO11	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,5	14,4%	27,0	26,0	24,1
LMO070	M.Gamboa e/S. Favardo y Rocamora B° 17 de Octubre	LMO11	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	4,0%	18,0	26,0	24,1
LMO072	J. De Atucón y Solid. Favardo B° 24 de febrero	LMO11	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	26,0	24,1
LMO073	J. De Atucón y Solid. Favardo B° 24 de febrero	LMO11	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,5	6,6%	23,0	24,0	20,8
LMO074	Echauri N° 3200 e/ J.B.Justo y Vidal	LMO14	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	24,0	20,8
LMO075	Lavalleja y Conde.	LMO26	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	35,5	6,0%	37,0	35,0	33,4
LMO076	N de Balboa y Luaces	LMO26	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,5	7,7%	22,0	35,0	33,4
LMO077	Castaños y Río Cuarto B° El Porvenir	LMO09	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	12,5	5,7%	13,0	17,0	15,4
LMO078	Zequeira garcia E/ Fajardo y Rocamora	LMO02	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	12,0	7,4
LMO079	Urdaneta y Rocamora (E/ T de Rocamora y Del Tejar)	LMO02	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,0	10,9%	14,0	12,0	7,4
LMO081	Echauri e/ Ortega .Zeyra Villa Scasso	LMO14	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	23,0	12,2%	25,0	24,0	20,8
LMO083	Duarte N° 800 E/ Rios 21 (Cerro) y Dragones	LMO24	10%	1%	89%	-	-	-	X	PUELCHE	2	23,5	8,0%	25,0	32,0	30,8
LMO085	Martinez y Lasalle.	LMO24	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	29,5	2,8%	30,0	32,0	30,8
LMO087	Resero e/Acasusso y Alagon	LMO11	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	3,3%	22,0	26,0	24,1
LMO094	A.Vives 700 y Guanabara E/ Guasavan y Morris B° Piñer Letour.	LMO03	96%	2%	2%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	34,0	29,0
LMO095	Montesquiza N° 6100 e/Numancia y Acoyte.	LMO04	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	33,5	6,3%	35,0	35,0	33,8
LMO096	M.Herrera e/ Guanacache y Eder - B° el Tubin.	LMO09	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	34,0	29,0
LMO098	E. Clay (e) Mirador y Purero.	LMO24	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	31,0	4,6%	32,0	32,0	30,8
LMO099	Hugo West e/ Madreselva y milamores.	LMO29	98%	-	2%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	32,0	29,8
LMO101	Scvisk y Gallardo.	LMO01	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	28,0	0,0%	28,0	28,0	7,9
LMO108	Lavalleja N° 6100 e/ Alegria y Arcos	LMO03	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	32,5	4,6%	33,0	33,0	30,3
LMO109	Gamarra y Pereda.	LMO24	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	31,0	4,6%	32,0	32,0	30,8
LMO112	Fernandez y Leopardi B° Caridad.	LMO08	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	40,0	3,5%	41,0	26,0	23,5
LMO118	El Resero 3351(e) Ortega y Zequeira.	LMO46	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	25,0	23,2
LMO121	L. Da Vinci 4000	LMO09	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,5	5,2%	14,0	17,0	15,4
LMO123	Timoteta y Colegiales	LMO09	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	16,0	0,0%	16,0	17,0	15,4
LMO124	Mancos Paz y Colegiales	LM047	84%	16%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 5	< 5
LMO125	Corrales Pte N° 1100 y Espejo.	LMO03	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	31,5	2,2%	32,0	34,0	29,0
LMO126	Ancon al 3584 esquina Zinny	LMO26	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	39,0	0,0%	39,0	35,0	33,4
LMO127	Castex 4000 esq. J.B. Justo	LMO09	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	14,5	4,9%	15,0	17,0	15,4
LMO139	Casarravilla 500 e/ Simon Perez y Pinas.	LMO08	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	26,0	23,5
LMO140	Castro e/ Cepeda y Sanabria.	LMO26	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	32,0	4,4%	33,0	35,0	33,4
LMO143	Scarlatti y Arcos.	LMO25	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	11,0	7,4
LMO146	Dragones y Figueredo.	LMO08	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,0	0,0%	27,0	26,0	23,5
LMO158	Almagro y Apipe.	LMO45	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	25,0	0,0%	25,0	33,0	27,4
LMO161	Arias Manuel y Bacon - Union Pte N° 5800	LMO16	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	3,3%	22,0	20,0	15,0
LMO164	Saenz y Croacia.	LMO08	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	36,0	3,9%	37,0	26,0	23,5
LMO170	Ancon y Alegria E/ Fournier.	LMO16	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	25,0	2,8%	26,0	20,0	15,0
LMO172	J.F Echauri y Donizetti E/ Alagon	LMO09	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	18,0	2,8%	18,0	17,0	15,4
LMO175	Baez y Bavio.	LMO16	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	4,0%	19,0	20,0	15,0
LMO177	Ibera y Barrientos.	LMO34	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	0,0%	17,0	17,0	16,0
LMO179	Coronel Conde e/ Martinez Villena y Martin Coronado.	LMO48	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,0	6,4%	23,0	20,0	18,6
LMO180	Machain esq. Puerto Argentino.	LMO08	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	26,0	23,5
LMO187	Pto Argentino y Cno. del Valle.	LMO08	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	35,0	33,4
LMO189	Leones Entre Gana y Conde.	LMO26	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,5	3,1%	23,0	35,0	33,4
LMO191	Icalma esq. M. Arias	LMO26	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	35,0	33,4
LMO192	Toloral entre Barrientos y Barragan.	LMO48	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	20,0	18,6
LMO193	Jachal esq. Juan Pio Gana.	LMO48	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	20,0	18,6
LMO196	Esquina entre toloral y Gallardo.	LMO08	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	8,2%	18,0	26,0	23,5
LMO197	Scarlatti e/ Villanueva y Monzoni.	LMO25	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	26,5	3,7%	27,0	11,0	7,4
LMO198	Enrique Clay y M. Doello	LMO51	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	31,0	29,6
LMO067	Guamini 12710 E/ San Ignacio y San Juan	LMO04	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	34,5	2,0%	35,0	35,0	33,8
LO025	M.Pasqui y Olden	LO05	64%	2%	33%	-	-	-	X	PUELCHE	1	12,0	0,0%	12,0	< 5	< 5
LO042	Santa Lucia e H. Yrigoyen	LO01	-	1%	-	99%	-	PLANTA - LO042		PUELCHE	2	11,0	0,0%	11,0	28,0	9,7
LO067	De la Peña y Moldes	LO04	-	-	-	100%	-	PLANTA - LO067		PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	21,0	19,8
LO072	Timbo y Cao. Moyano	LOPC1	-	2%	-	98%	-	PLANTA - LO072		PUELCHE	2	14,5	4,7%	17,0	22,0	20,2
LO078	Arenales a 100m de J. Ingenieros	LOPC1	-	9%	91%	-	-	-		PUELCHE	2	21,5	3,3%	22,0	22,0	20,2
LO079	Arenales a 300m de L.M.Draqui	LOPC1	-	1%	99%	-	-	-		PUELCHE	2	23,0	0,0%	23,0	22,0	20,2
LO080	Juan xxiii 2400 entre L.M.Draqui y Bahia Blanca	LOPC1	-	13%	87%	-	-	-		PUELCHE	1	21,0	6,7%	22,0	22,0	20,2
LO081	L.M.Draqui y Merlan	LOPC1	3%	77%	21%	-	-	-		PUELCHE	1	32,0	0,0%	32,0	22,0	20,2
LO116	Merlo Rodriguez y Tinnis	LOPC1	1%	74%	25%	-	-	-		PUELCHE	2	20,0	7,1%	21,0	22,0	20,2
LO119	Tala y Pino	LOPC1	3%	3%	94%	-	-	-		PUELCHE	3	23,3	20,3%	27,0	22,0	20,2
LO121	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	-	19%	81%	-	-	-		PUELCHE	2	29,5	6,3%	35,0	35,0	30,5
LO125	Av. Argentina y Gualo	LOPC2	-	37%	63%	-	-	-		PUELCHE	2	40,0	10,6%	46,0	35,0	30,5
LO126	Av. Argentina	LOPC2	-	79%	21%	-	-	BATERIA LLAVALLOL		PUELCHE	1	41,0	0,0%	41,0	35,0	30,5
LO132	Av. Argentina y Junin	LOPC2	-	69%	30%	-	-	-		PUELCHE	-	-	-	-	35,0	30,5
LO136	Junin 170 entre Rodriguez y Las Heras	LOPC1	-	6%	96%	-	-	-		PUELCHE	2	42,5	1,7%	43,0	22,0	20,2
LO139	Amat y Petiribi	LOPC1	-	11%	89%	-	-	-		PUELCHE	1	36,0	0,0%	36,0	22,0	20,2
LO140	Av.Argentina 2090 y Peleta	LOPC1	-	5%	95%	-	-	-		PUELCHE	2	30,0	6,4%	32,0	22,0	20,2
LO141	Rodriguez 3507 esq Mercedes	LOPC1	-	12%	88%	-	-	-		PUELCHE	2	37,0	7,6%	39,0	22,0	20,2
LO142	Jose Ingenieros 1658 e/ Calleraia Norte y Juan XXIII	LOPC1	-	20%	80%	-	-	-		PUELCHE	-	-	-	-	22,0	20,2
LO146	Calle Pintos 2007 e/ Viel y Florida	LOPC1	-	4%	96%	-	-	-		PUELCHE	2	21,0	0,0%	21,0	22,0	20,2
LO147	Calle Magnolia 2099 e/ Moreno y Barbieri	LOPC1	-	-	100%	-	-	-		PUELCHE	2	25,5	10,8%	28,0	22,0	20,2
LO148	Magallanes 2899 entre Uccelay y Diputado	LOPC1	-	1%	99%	-	-	-		HOPUELCHE	2	7,5	0,0%	7,5	22,0	20,2
AB019	Combatientes MALVINAS ARGENTINAS y Pilar	LOPC2	-	1%	99%	-	-	-		PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	35,0	30,5
AB060	Tiglio y Policastro	LOPC2	-	8%	92%	-	-	-		PUELCHE	2	20,0	7,1%	21,0	35,0	30,5
LO063	L.M. Draqui e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	1%	1%	99%	-	-	-		PUELCHE	2	26,5	5,7%	27,0	35,0	30,5
LO084	L.M. Draqui e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	-	2%	98%	-	-	-		PUELCHE	2	27,0	0,0%	27,0	35,0	30,5
LO085	L.M.Draqui e/Cno las Flores y Fonrouge	LOPC2	-	2%	98%	-	-	-		PUELCHE	2	25,5	3,9%	26,0	35,0	30,5
LO086	Cno de las Flores a 500m de Draqui	LOPC2	-	2%	98%	-	-	-		PUELCHE	2	25,5	3,9%	26,0	35,0	30,5
LO087	Cno de las Flores y MALVINAS ARGENTINAS	LOPC2	-	3%	97%	-	-	-		PUELCHE	2	42,5	1,7%	43,0	35,0	30,5
LO093	Cno San Vte a 500m de el 87	LOPC2	3%	12%	85%	-	-	BATERIA BURZACO		PUELCHE	3	40,3	4,6%	43,0	35,0	30,5
LO106	J. B. Justo y Cuyo	LOPC2	65%	3%	32%	-	-	-		PUELCHE	1	17,0	0,0%	17,0	35,0	30,5
LO117	Mendoza y N. Silva	LOPC2	-	2%	98%	-	-	-		PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	35,0	30,5
LO122	J. Ingenieros	LOPC2	-	1%	99%	-	-	-		PUELCHE	2	38,0	7,4%	40,0	35,0	30,5
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	2%	23%	75%	-	-	-		PUELCHE	1	42,0	0,0%	42,0	35,0	30,5
LO144	Avenida Argentina y RP N° 16	LOPC2	-	2%	98%	-	-	-		PUELCHE	2	39,5	6,4%	41,0	35,0	30,5
LO145	Villarino y Avenida Argentina	LOPC2	-	-	100%	-	-	-		PUELCHE	2	46,5	1,5%	47,0	35,0	30,5
LO149	Rene Valle y Jose Merlan	LOPC2	67%	-	33%	-	-	-		PUELCHE	1	15,0	0,0%	15,0	35,0	30,5
LO095	Larrea y Gardel	AB14	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	26,5	8,0%	28,0	28,0	24,4
LO111	Leloir 432.	LO08	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,0	17,7%	18,0	< 5	< 5
LO120	Pino y el Cano	LOPC1	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,5	2,9%	25,0	22,0	20,2

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ARSENICO TOTAL [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
LO127	Jose Marmol e/Allemandri y Anchorena	LO47	-	1%		99%	-	PLANTA - LO127	-	PUELCHE	2	16,0	4,3%	17,0	8,0	7,1
LO128	Marti y Av. Cabred	LO13	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	1	18,0	0,0%	18,0	< 5	< 5
LO134	Larrea y Colihue	AB14	-	6%	-	94%	-	PLANTA - LO134	-	PUELCHE	2	19,0	0,0%	19,0	28,0	24,4
LO135	Maitenes y Rodriguez	AB22	1%	2%	-	96%	-	PLANTA - LO135	-	PUELCHE	2	24,0	6,9%	25,0	22,0	17,2
LO152	Necochea esquina Lujan		-	100%	-	-	-	PLANTA - LO152	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA002	Ambrosetti 1900 e/Beltran y Martin Fierro.	MAPC1	-	21%	79%	-	-	BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	-	PUELCHE	3	17,7	6,5%	19,0	20,0	17,8
MA003	ALMIRANTE BROWN 2500 e/Viena y Rep. Argentina.	MAPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	18,0	0,0%	18,0	20,0	17,8
MA004	Asamblea 1800 e/11 de Septiembre.	MAPC1	1%	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	20,5	10,3%	22,0	20,0	17,8
MA006	Viena e/Canning.	MAPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	17,0	8,3%	18,0	20,0	17,8
MA018	Olden entre 11 de Septiembre y Juan Cruz Varela	MAPC1	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	17,0	8,3%	18,0	20,0	17,8
MA009	Cangallo 1200 e/San Lorenzo y Uspallata.	PCMA009	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	17,0	16,8
MA010	Uspallata 1000 e/Soller y O´Brien.	PCMA010	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	15,0	14,8
MA011	Stoppler 900 e/Bat. de Maipu y Paso de los Andes.	PCMA011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	16,0	14,5
MA012	San Lorenzo y Seguí	PCMA012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	19,0	18,3
MA016	Canadá 748 y Seguí	MAPC2	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	8,3%	18,0	17,0	15,8
MA017	Palacios y Seguí	MAPC2	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,0	19,8%	14,0	17,0	15,8
ME001	25 DE MAYO E/PUEYRREDON	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-	TANQUE MERLO	-	PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	6,5	5,5
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	6,5	5,5
ME003	25 MAYO E/ 9 DE JULIO	ME-TAN-CES	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	12,0	11,8%	13,0	6,5	5,5
ME004	BROWN E/ CENTENARIO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	16,0	8,8%	17,0	6,5	5,5
ME006	BROWN E/ CARLOS PELEGRINI	ME-TAN-CES	-	6%	-	94%	-		-	PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	6,5	5,5
ME007	BROWN E/ M.BRAVO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	15,0	0,0%	15,0	6,5	5,5
ME015	9 DE JULIO E/ SAN LORENZO	ME-TAN-CES	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	6,5	5,5
ME016	SAN LORENZO E/CANNING	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	6,5	5,5
ME060	SAENZ PEÑA Y AV. CALLE REAL	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	13,0	0,0%	13,0	6,5	5,5
ME005	25 MAYO E/ J.M.Castro ex Pearson	ME02	75%	-	25%	-	-	BATERIA PARQUE SAN MARTIN NORTE	-	PUELCHE	-	-	-	-	16,0	15,0
ME014	BROWN E/PIZURNO	ME02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	15,0	0,0%	15,0	16,0	15,0
ME008	LIBERTAD E/ ARGENTINA Y PUCHEU	PCME008	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	8,2	6,9
ME009	COVIPOL. EDIF 38. ROSSI Y ECHEVERRY	PCME009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	15,0	14,0
ME010	COVIPOL. EDIF 13. ROMAY Y ZUNDA	PCME010	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	12,0	10,8
ME017	DEFENSA E/BARAVINO Y HORTIGUERA	PCME017	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	16,0	8,8%	17,0	17,0	16,0
ME018	OYUELA E/FRIAS Y RUTA 200	PCME018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	19,0	7,4%	20,0	19,0	18,7
ME019	PEDRIEL E/ TALA	PCME019	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	13,0	10,4
ME020	INDEPENDENCIA E/ SULLIVAN	PCME020	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	16,0	15,3
ME021	ESNAOLA Y BOYACÁ	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-	TANQUE LOMA GRANDE	-	PUELCHE	2	25,0	0,0%	25,0	21,0	19,7
ME022	ESNAOLA Y BACH	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	20,0	0,0%	20,0	21,0	19,7
ME023	AV.ARGENTINA Y CHOPIN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	21,0	19,7
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	15,0	0,0%	15,0	21,0	19,7
ME025	AV.ARGENTINA E/GAVILAN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	21,0	4,6%	22,0	21,0	19,7
ME081	Strauss y Juan Sebastian Bach	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	14,0	10,1%	15,0	21,0	19,7
ME087	Av. Argentina y Lezama	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	18,5	11,5%	20,0	21,0	19,7
ME090	Angel Rodriguez y Curapaligue	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	17,0	8,3%	18,0	21,0	19,7
ME026	TUNUYAN E/AREVALO	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-	TANQUE RECONQUISTA	-	PUELCHE	2	19,0	0,0%	19,0	19,0	18,0
ME027	VIDT E/ FEBAL	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	21,0	6,7%	22,0	19,0	18,0
ME028	VIDT E/DEMOCRACIA	ME-TAN-REC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	16,0	8,8%	17,0	19,0	18,0
ME029	VIDT E/CHASAS	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	19,0	18,0
ME030	VIDT E/FAMATINA Y DESSY	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	26,0	0,0%	26,0	19,0	18,0
ME063	FILIBERTO Y TARIJA	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	19,0	18,0
ME079	Antofagasta y Fraga	ME-TAN-REC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	19,0	18,0
ME082	Cacheuta y José Marti	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	21,0	6,7%	22,0	19,0	18,0
ME031	GARDEL E/PAYRÓ	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-	TANQUE ARCO IRIS	-	PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	28,0	26,0
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	29,0	0,0%	29,0	28,0	26,0
ME033	VIDT E/DISCEPOLO	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	31,0	4,6%	32,0	28,0	26,0
ME034	VIDT E/VACCAROS	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	33,0	8,6%	35,0	28,0	26,0
ME035	VIDT E/MEDMA	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	28,0	26,0
ME068	JOSE MARTI Y DALTON	ME-TAN-ARC	-	6%	-	94%	-		-	PUELCHE	2	19,0	0,0%	19,0	28,0	26,0
ME088	Lorenzini entre Deán Funes y Fraga	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	31,0	0,0%	31,0	28,0	26,0
ME091	P.Echague y P. Podestá	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	28,5	2,5%	29,0	28,0	26,0
ME092	Carcavallo entre Cassaux y Orfilia Rico	ME-TAN-ARC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	31,0	4,6%	32,0	28,0	26,0
ME102	Fraga y Dávila	ME-TAN-ARC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	28,0	26,0
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	PCME036	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	25,0	5,7%	26,0	27,0	26,0
ME037	AMADO NERVO E/ANCON Y AMPERE	ME-CIS-PSM	-	18%	82%	-	-	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	-	PUELCHE	2	26,5	2,7%	27,0	31,0	29,0
ME038	LOS ALELIES Y TILCARA	ME-CIS-PSM	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	34,0	4,2%	35,0	31,0	29,0
ME039	LOS ALELIES E/TILCARA Y AGUARIBAY	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	33,0	4,3%	34,0	31,0	29,0
ME040	LOS JACINTOS E/ETIOPIA	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	39,0	7,3%	41,0	31,0	29,0
ME041	ACHALA E/ LAS RETAMAS	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	43,0	9,9%	46,0	31,0	29,0
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	32,0	0,0%	32,0	31,0	29,0
ME045	ALVAREZ JONTE E/ LOS ALELIES	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	38,0	3,7%	39,0	31,0	29,0
ME046	LAS RETAMAS E/JURAMENTO	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	41,5	8,5%	44,0	31,0	29,0
ME047	ALVAREZ JONTE E/ LOS GERANIOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	39,5	5,4%	41,0	31,0	29,0
ME048	ALVAREZ JONTE E/LAS DALIAS	PCME048	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	39,0	7,3%	41,0	37,0	36,3
ME049	GABRIELA MISTRAL E/ALTE BROWN	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	23,5	3,0%	24,0	31,0	29,0
ME051	GENDARMERIA GURRUCHAGA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	31,5	2,2%	32,0	31,0	29,0
ME053	ZARRAGA E/ GAGUERRE Y PEDERNERA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	31,0	29,0
ME054	ZARRAGA E/ GAVILAN	ME-CIS-PSM	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	35,5	6,0%	37,0	31,0	29,0
ME058	12DE FEBRERO	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	19,5	10,8%	21,0	31,0	29,0
ME076	El Hornero 3710	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	29,5	2,4%	30,0	31,0	29,0
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	HIPOPUELCHE	1	< 5	0,0%	< 5	31,0	29,0
ME086	Garmendia y Almte. Brown	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	35,0	8,1%	37,0	31,0	29,0
ME042	GENDARMERIA E/ FLORES A.	PCME042	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,5	2,9%	25,0	25,0	23,7
ME050	GABRIELA MISTRAL E/BENOIT	PCME050	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,0	0,0%	13,0	13,0	12,3
ME055	PUEYRREDON Y O'BRIEN	PCME055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	19,5	3,6%	20,0	18,0	16,0
ME056	SAN ANTONIO Y PARAGUAY	PCME056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	19,0	0,0%	19,0	19,0	18,3
ME057	CHACO N° 310 E/DIRECTORIO Y NOGUERA	PCME057	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	15,0	0,0%	15,0	19,0	18,3
ME059	GABRIELA MISTRAL Y ALPATACAL	PCME059	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	19,0	18,7
ME061	SAENZ PEÑA Y AV. RIVADAVIA	PCME061	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	8,3%	18,0	17,0	16,0
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	PCME065	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	19,0	18,3
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA T SOLANET	PCME066	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	16,0	0,0%	16,0	16,0	15,7
ME067	TRAFUL Y BLANCO ESCALADA	PCME067	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	19,0	0,0%	19,0	19,0	18,3
ME069	ATAHUALPA Y PEDRO CHUTRO	PCME069	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	11,0	0,0%	11,0	13,0	11,7

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ARSENICO TOTAL [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
ME070	TUCUMAN Y LA RIOJA	PCME070	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	15,0	14,0
ME073	SARMIENTO 2398 Y LA HABANA	PCME012-73	-		100%	-			x	PUELCHE	2	18,0	0,0%	18,0	18,0	17,0
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	PCME074	-		100%	-			x	PUELCHE	1	14,0	0,0%	14,0	14,0	13,7
ME075	MEDRANO 811 Y SANTA FE	PCME075	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	19,0	18,3
ME078	Garay 1753	PCME078	-		100%	-			x	PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	17,0	15,7
ME080	Federico Lacroze y Matorras	PCME080	-		100%	-			X	PUELCHE	2	25,5	2,8%	26,0	29,0	25,8
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	ME01	-	-	100%	-	-	POI MERLO		PUELCHE	1	18,0	0,0%	18,0	9,1	6,8
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	ME01	2%	-	98%	-	-			PUELCHE	1	21,0	0,0%	21,0	9,1	6,8
ME089	Curapaligüe y 25 de Mayo	PCME089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	28,5	2,5%	29,0	33,0	29,3
ME093	Morse y Av. del Bicentenario	PCME093	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	15,0	0,0%	15,0	16,0	15,3
ME094	Brasil y Guardia Vieja	PCME094	-		100%	-		-	x	PUELCHE	2	13,5	5,2%	14,0	15,0	13,3
ME095	Sullivan y Sargento Cabral	PCME095	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,0	0,0%	22,0	23,0	20,7
ME096	Gral Ocampo y T Saley	-	-	100%						PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME097	Orán entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%						PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME098	Tasso y Oran	-	-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME099	De Roma y Necochea			100%						PUELCHE						
ME100	Republiquetas entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME101	Juan A Maza y Dr Ricardo Raúl Alfonsin	PCME101	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	19,0	18,0
ME103	Los Arrieros y San Martin	PCME103	-	1%	99%				x	PUELCHE	2	14,0	10,1%	15,0	15,0	14,3
ME113	EVA PERON E/PELLEGRINI	PCME113	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	19,0	0,0%	19,0	19,0	18,0
M001	Belgrano 400 e/Vicente Lopez y C. Malnatti.	MIPC2	-	-		100%	-			PUELCHE	2	10,3	10,3%	11,0	14,0	13,3
M020	Julio A. Roca 216 e/Dorrego y Roseti.	MIPC2	-	1%		99%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE		PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	14,0	13,3
M035	Pavon 1100 e/R. Peña y Sgto. Cabral.	MIPC2	-	-	-	100%	-			PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	14,0	13,3
M002	Julio A. Roca 800 e/Serrano y Muñoz	PCM0002	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	11,5	6,1%	12,0	14,0	13,0
M003	Italia 1300 e/Francia y L. N. Alem.	PCM0003	-	2%	98%				x	PUELCHE	2	13,5	5,2%	14,0	15,0	13,3
M006	Pardo 400 e/San Luis y C. Malnatti.	PCM0006	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,0	21,8%	15,0	11,0	10,6
M007	Julio A. Roca 1900 e/Gelly Obes y Zuviria.	PCM0007	-	5%	95%			-	x	PUELCHE	2	19,0	0,0%	19,0	19,0	18,3
M008	Conesa 2000 e/ Gelly Obes y J. M. Zapiola	PCM0008	1%	-	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	0,0%	17,0	18,0	17,3
M009	Serrano 800 e/Conesa y SAN_JOSE	PCM0009	1%	1%	98%				X	PUELCHE	2	9,5	7,8%	10,0	15,0	12,7
M010	Cjal. E. Tribulato 700 e/Serrano y Urquiza.	PCM0010	2%	27%	72%				x	PUELCHE	2	10,1	12,8%	11,0	12,0	10,2
M011	Int. J. Irigoin 700 e/Serrano y Stgo. Del Estero.	PCM0011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	15,0	18,9%	17,0	13,0	12,0
M013	J. B. Alberdi 200 e/Dorrego y Aacuenaga.	PCM013	-	-	100%	-			x	PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	17,0	16,0
M014	Serrano 400 e/J. B. Alberdi y Haedo.	MIPC1	-	100%				CAG SAN MIGUEL CENTRO		PUELCHE	-	-	-	-	12,0	11,7
M046	Paunero 100 e/Pardo.	MIPC1	-	100%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	12,0	11,7
M015	Cnel. Fraga 2300 e/Int. J. Irigoin y Marcos Sastre.	PCM0015	-	2%	98%				x	PUELCHE	2	13,5	15,7%	15,0	16,0	13,7
M016	Cnel. M. Fraga e/Salerno y Tomas Edison.	PCM0016	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	12,7	52,6%	17,0	16,0	15,0
M017	Vicente Lopez e/Marcos Sastre y Malvinas.	PCM0017	-	4%	96%	-			x	PUELCHE	2	13,5	5,2%	14,0	15,0	15,0
M018	Pardo e/Libertad y J. M. Zapiola	PCM0008	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	18,0	17,3
M019	J. B. Alberdi e/J. Zapiola y Gelly Obes.	PCM0008	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,0	0,0%	13,0	18,0	17,3
M021	Cjal. E. Tribulato 2300 e/ G. Campos y Libertad.	PCM021	-	2%	98%	-			x	PUELCHE	2	16,0	0,0%	16,0	13,0	13,0
M022	Tomas Guido 4400 e/J. R. Lopez y El Zonda.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	2	27,0	5,2%	28,0	40,0	34,0
M023	Av. Alte. J. Lopez 4500 e/J. D. Solis y Eva Peron.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	30,0	33,0%	37,0	40,0	34,0
M025	T. Guido 5900 e/Linarte.	MI_CIS_SAR	-	2%		98%	-	TANQUE SARMIENTO		PUELCHE	2	39,0	10,4%	47,0	40,0	34,0
M026	T. Guido 5301 e/La Pinta.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-			PUELCHE	2	30,5	67,2%	45,0	40,0	34,0
M032	Marchena 3256	MI_CIS_SAR	-	5%	-	95%	-			PUELCHE	2	37,0	80,3%	58,0	40,0	34,0
M024	E. Ferreyra 4200 e/T. Guido.	MI_CIS_GUA	1%	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	29,5	12,0%	32,0	28,0	26,8
M028	Santa Maria 5100 e/Vicente Fatome.	MI_CIS_GUA	1%	3%	96%	-	-			PUELCHE	2	30,0	51,9%	41,0	28,0	26,8
M037	Cisterna La Guarida	MI_CIS_GUA	4%	4%	92%			REBOMBEO GUARIDA		PUELCHE	2	17,0	16,6%	19,0	28,0	26,8
M065	Calle Defensa e Italia	MI_CIS_GUA	-	2%	98%					PUELCHE	2	25,0	0,0%	25,0	28,0	26,8
M066	Dr. Enrique Finochietto e/Sta Maria y Fray Antonio Marchena	MI_CIS_GUA	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	43,5	11,4%	47,0	28,0	26,8
M033	Int. J. Irigoin 400 Gelly Obes y Granaderos.	PCM0033	1%	1%	99%				x	PUELCHE	3	22,0	7,9%	24,0	21,0	20,7
M036	Cnel. M. Fraga 3400 e/Marconi.	PCM0036	-	3%	97%			-	X	PUELCHE	2	11,5	6,1%	12,0	14,0	13,0
M038	Roca 1400 e/Alen.	PCM0038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,0	0,0%	13,0	14,0	13,7
M039	Belgrano 2000 Gelly Obes y R. S. Peña.	PCM0039	-	2%	98%				x	PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	20,0	18,3
M040	Italia 2300 e/Gaspar Campos y J. M. Zapiola.	PCM0040	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,0	0,0%	21,0	24,0	23,0
M041	Belgrano 900 e/D´elia y Muñoz.	PCM041	-	-	100%				x	PUELCHE	2	12,5	5,7%	13,0	11,0	10,6
M042	Pardo 10 e/Ruta 10.	PCM042	-	3%	97%				X	PUELCHE	2	13,5	36,7%	17,0	19,0	15,7
M043	Conesa 416 e/San Luis.	PCM043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	14,0	30,3%	17,0	12,0	11,3
M045	Rodriguez Peña 2600 e/Williams.	PCM040	-	8%	92%				x	PUELCHE	2	25,0	0,0%	25,0	24,0	23,0
M004	Conesa 1300 e/Martin Irigoyen.	MI_CIS_CEN	-	20%	80%					PUELCHE	1	13,0	0,0%	13,0	17,0	14,7
M034	Martin Irigoyen y Juan B Alberdi	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	12,5	5,7%	13,0	17,0	14,7
M047	Martin Irigoyen e/Obligado y Francia.	MI_CIS_CEN		1%	99%					PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	17,0	14,7
M048	Av. Francia 500 e/Sta. Fe y Parana.	MI_CIS_CEN	-	2%	98%			REBOMBEO MUÑIZ		PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	17,0	14,7
M049	Av. Francia 600 e/Moreno.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	13,0	10,9%	14,0	17,0	14,7
M051	Av. Francia 1100 e/Tucuman y Azopardo.	MI_CIS_CEN		1%	99%					PUELCHE	2	16,5	12,9%	18,0	17,0	14,7
M060	Conesa entre Martin Irigoyen y Sarmiento	MI_CIS_CEN	-	1%	99%					HIPOPUELCHE	2	< 5	0,0%	< 5	17,0	14,7
M067	Conesa e Irigoyen	MI_CIS_CEN	1%	14%	84%	-	-			PUELCHE	1	< 5	0,0%	< 5	17,0	14,7
M052	Rodrigo de Triana 1500 e/R. Balbin.	PCM052	-	3%	97%				X	PUELCHE	2	28,0	5,1%	29,0	29,0	28,7
M053	Defensa e/R. Balbin.	PCM053	-	4%	96%				X	PUELCHE	2	26,5	2,7%	27,0	34,0	29,7
M054	Cruz del Sur e/Tomas Espora.	PCM062	-	1%	99%	-	-	BATERIA MI054-MI062		PUELCHE	2	23,5	9,0%	25,0	26,0	24,7
M062	Calle Guemes e Isabel La Catolica	PCM062		2%	98%					PUELCHE	2	18,5	11,5%	20,0	26,0	24,7
M055	J. J. Paso 5500 e/La Niña y Isabel la Catolica.	PCM055	-	-	100%				X	PUELCHE	2	23,0	8,6%	25,0	26,0	25,8
M056	Juan J. Paso e/Beron de Estrada y Salguero.	PCM056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	25,5	8,3%	27,0	27,0	26,7
M057	Maestro Ferreyra y Charlone	PCM057		3%	97%				x	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	29,0	26,0
M058	José M. Zapiola y Güemes	PCM058	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	19,5	3,6%	20,0	22,0	19,7
M059	Concejal Tribulato y Monseñor Blois	PCM059	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,5	5,2%	14,0	17,0	16,3
M061	Luis Salguero y Tomás Alba Edison	PCM061	-	4%	96%				x	PUELCHE	2	36,0	2,0%	36,0	37,0	35,3
M063	Egipto y Libertad	MI01	1%	1%	98%				X	PUELCHE	2	19,5	10,9%	21,0	19,0	18,3
M064	San Nicolás y Gral Las Heras	MI01	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,0	6,7%	22,0	19,0	18,3
MN001	Lavalleja al 7100 El Conde y Achaval Rod.	LMO19	-	1%	99%					PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	33,0	30,3
MN002	Ammonia a 150 m de La Fuente.	LMO19	-	2%	98%					PUELCHE	2	26,5	2,7%	27,0	33,0	30,3
MN003	Ammonia y Billinghurst.	LMO19	-	2%	98%					PUELCHE	2	30,0	5,2%	31,0	33,0	30,3
MN004	Billinghurst 3800 y Ammonia.	LMO19	-	2%	98%					PUELCHE	2	27,5	5,2%	29,0	33,0	30,3
MN005	Billinghurst y Doblas / Casperdes.	LMO19	-	2%	98%			BATERIA GONZALEZ CATAN		PUELCHE	2	29,0	2,4%	30,0	33,0	30,3
MN006	Int. Rocco y Ramon Lista.	LMO46	-	1%	99%					PUELCHE	2	24,0	5,9%	26,0	26,0	23,2
MN007	Billinghurst e Int Rocco.	MN24	-	1%	99%					PUELCHE	2	30,5	7,0%	32,0	17,0	12,0
MN008	Billinghurst y Las Flores.	MN24	-	4%	96%					PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	17,0	12,0
MN009	Billinghurst 5300 y Rio Cuedo	MN24	-	1%	99%					PUELCHE	2	19,0	7,4%	20,0	17,0	12,0
MN010	Las Flores y Ramon Lista	MN24	-	-	100%					PUELCHE	2	25,5	8,3%	27,0	17,0	12,0
MN011	Monte Egmont y Casperdes	LMO19	-	3%	97%					PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	33,0	30,3
MN012	Acassuso al 1700 y Santa Rosa	MN23	-	-	100%					PUELCHE	2	12,0	0,0%	12,0	< 5	< 5
MN033	Acassuso e Ibirangas	MN23	-	1%	99%					PUELCHE	-	-	-	-	< 5	< 5
MN034	Noriega y Zavala	MN16	-	-	100%			BATERIA RAFAEL CASTILLO		PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	16,0	16,6
MN036	Hucal y Feria	MN16	-	4%	96%					PUELCHE	3	13,0	0,0%	13,0	16,0	16,6
MN037	Lavalleja y Tres Cruces	MN23	-	4%	96%					PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	< 5	< 5
MN039	Lt. 3 el camino y Aguirre	MN23	-	100%						PUELCHE	-	-	-	-	< 5	< 5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ARSENICO TOTAL [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MN044	Huaitin y Lacar	MN23	-	-	100%	-	-			PUELCHE	2	15,0	0,0%	15,0	<5	<5
MN043	Castañon N° 2922, e/E. Echeverria	MN23	-	100%	-	-	-	POI MN043		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MN059	Beethoven y La Doma E/ El Torero	MN24	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	17,0	12,0
MN106	Beethoven entre. Aquirre y Mendez de Andes	MN24	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,5	5,2%	14,0	17,0	12,0
MN110	V. de la Plaza E/ Davila y Beazley	MN25	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	20,0	16,1
MN122	Santa Rosa y Aquirre	MN24	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	17,0	12,0
MN147	Zamudio e/ Bouvard y Aquirre	MN25	-	9%	91%	-	-	POI MN147		PUELCHE	2	17,0	8,3%	18,0	20,0	16,1
MN151	Bouchard y Heredia	MN25	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	20,0	16,1
MN173	Hucal 1700, e/ Vozel y Polledo	MN26	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,0	10,8%	14,0	18,0	16,6
MN169	Lavalle y Sudamericas	MN23	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	0,0%	17,0	<5	<5
MN166	M.T. de Alvear 1100 esq. Del colegio	MN27	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	12,0	0,0%	12,0	<5	<5
MN211	Esquiu y Eulogios	MN19	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	11,0	0,0%	11,0	<5	<5
MN212	Victorino de la plaza y Luis Maria Drago. RAFAEL CASTILLO	MN19	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	<5	<5
MO087	Cipoll y Vidalita	MOPC1	100%	-	-	-	-	BATERIA PARQUE LELOIR - ITUZAINGO		PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO088	De los Recuerdos y De los Pasadores	MOPC1	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	17,0	0,0%	17,0	<5	<5
MO089	Gaona y La Chacarera	MOPC1	100%	-	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO093	De los Reseros y E. Frers	MOPC1	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	19,5	3,6%	20,0	<5	<5
MO094	La Estrella y de los Reseros	MOPC1	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	16,5	4,9%	16,0	<5	<5
MO095	De La Doma Pje N° 1282 y El Ombu	MOPC1	100%	-	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO097	De La Vidalita y J. Hernández	MOPC1	81%	1%	18%	-	-			PUELCHE	1	14,0	0,0%	14,0	<5	<5
MO146	N. Repetto y Del Palenque	MOPC1	4%	-	96%	-	-			PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	<5	<5
MO147	N. Repetto y De la Rebelión	MOPC1	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	<5	<5
MO148	Del Mensjulito y De las Cachilas	MOPC1	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	13,0	0,0%	13,0	<5	<5
MO149	N. Repetto a 130 metros de F. Ielpo	MOPC1	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	<5	<5
MO153	De la Condición y Colectora Acceso Oeste	MOPC1	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO100	Videla y Peredo	MOPC1	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	14,5	4,9%	15,0	<5	<5
MO105	Fray J. S. M. de Oro y Figueroa Alcorta	MO21	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO106	Figueroa Alcorta y La Tribuna	MO21	95%	5%	-	-	-	BATERIA VII BRIGADA AEREA - MORON		PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO107	S. Lopez y Coet. Arenas	MO88	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO108	Figueroa Alcorta y Montevideo	MO21	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO130	Lazcano y Cuadra Suarez	MO21	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO137	Madrid y Jarry	MO32	95%	5%	-	-	-	BATERIA BARRIO SAN JUAN		PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO138	Pasaron e/Pedro Diaz y Juan Gorriti	MO31	-	-	100%	-	-			PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	16,0	15,2
MO139	Amheres y Padevenkov	MO31	-	1%	99%	-	-	BATERIA HURLINGHAM INTA		PUELCHE	2	19,0	14,7%	21,0	16,0	15,2
MO140	Cuzco entre M. de Aviles y Tokio	MO31	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	12,5	5,7%	13,0	16,0	15,2
MO141	Cuzco y Ecuador	MO31	-	100%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	16,0	15,2
MO150	La Tribu a 14m de Juaneverio	HU01	-	1%	99%	-	-	BATERIA HURLINGHAM 2		PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	17,0	15,6
MO151	Aristobal a 21,63m de Veragua	HU01	-	17%	83%	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	17,0	15,6
MO152	Chemborá y Los Cardales	HU01	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	17,0	15,6
MO142	Piran esq. Lavalle	IT01	99%	1%	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO144	Sta Teresa y La Gaceta	MO33	95%	5%	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO154	Coronel Arenas esq. Andrade	MO21	95%	5%	-	-	-	BATERIA CASTELAR		PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MO155	Olivuar esq. Palermo	MO21	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	<5	<5
MR001	J.V. González 2625 e/Balzak y Rodriguez Peña.	PCMR001	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	32,0	0,0%	32,0	32,0	30,7
MR002	J.V. González 2435 e/Güemes y V. Alsina.	PCMR002	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	31,0	9,1%	33,0	30,0	29,0
MR003	Güemes 901 e/Bolivia y Paraguay.	PCMR003	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	25,0	0,0%	25,0	25,0	24,3
MR004	Larralde 1341 e/J. Gonzalez y R. Gutierrez.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	TANQUE MORENO		PUELCHE	2	25,0	5,7%	26,0	21,0	20,3
MR005	Int. Bossi 1080 e/Ecuador y Paraguay.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-			PUELCHE	2	22,5	3,1%	23,0	21,0	20,3
MR006	Int. Bossi e/Venezuela y Ecuador.	MR-TAN-MOR	-	8%	-	92%	-			PUELCHE	2	19,5	10,9%	21,0	21,0	20,3
MR007	Guatemala 2400 e/Güemes y Alsina.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-			PUELCHE	2	19,0	7,9%	20,0	21,0	20,3
MR008	Guatemala 2700 e/marmol y Colectora Gaona	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-			PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	21,0	20,3
MR019	Int. Bossi e/Guatemala.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-			PUELCHE	2	9,9	1,4%	10,0	21,0	20,3
MR011	P. Ansaldo e/Blas Parera y M. Melo.	PCMR011	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	20,0	18,7
MR012	M. Obarrio 2048 e/Alberdi y Rafael.	MRPC1	-	3%	-	97%	-	PLANTA CAG MORENO		PUELCHE	2	28,0	0,0%	28,0	27,0	27,0
MR046	Del Cañon/M. Obarrio e/San Carlos.	MRPC1	-	45%	-	55%	-			PUELCHE	2	26,5	2,7%	27,0	27,0	27,0
MR013	Av. Perón e/Del Cañon.	PCMR013	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,5	2,9%	25,0	23,0	22,3
MR014	Alcorta 2500 e/Bouchard y Uruguay.	PCMR014	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	14,0	0,0%	14,0	21,0	20,3
MR015	Ameghino e/Centenario y Argentina.	PCMR015	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	18,0	17,3
MR016	Callao e/Av. Alcorta y Mitre.	PCMR016	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	19,5	3,6%	20,0	19,0	18,3
MR017	Alcorta e/Haedo y Ramos Mejia.	PCMR017	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	18,0	17,0
MR018	Misiones e/ Sta. Fe y D´errico.	PCMR018	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	3,3%	22,0	22,0	21,0
MR020	Alte. Brown e/25 de Mayo y Andrade.	MR01	-	2%	98%	-	-	BATERIA MR020-MR021		PUELCHE	2	17,0	8,3%	18,0	18,0	17,3
MR021	Alte. Brown e/Pio XII.	MR01	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	18,0	17,3
MR022	Sanchez 4800 e/Ruta 25 y San Justo.	PCMR022-23	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	33,0	0,0%	33,0	38,0	35,7
MR023	Florencio Sanchez e/Gandhi y Sofocles.	PCMR022-23	-	11%	89%	-	-	-	X	PUELCHE	1	36,0	0,0%	36,0	38,0	35,7
MR024	Costa Rica e/F. Sanchez y Solocles.	MR-TAN-PER	-	30%	-	70%	-	TANQUE LA PERLITA		PUELCHE	2	27,5	2,6%	28,0	24,0	22,7
MR025	A. Storni 5600 e/Danubio.	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-			PUELCHE	2	24,5	2,9%	25,0	24,0	22,7
MR026	A. Storni 5900 e/Madariaga.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-			PUELCHE	2	21,5	3,3%	22,0	24,0	22,7
MR027	Ecuador 5700 e/La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	13,5	5,2%	14,0	24,0	22,7
MR029	La Plata e/Ruta23 y Camil.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-			PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	24,0	22,7
MR035	Gutierrez 5600 e/La Plata y Cost Rica.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-			PUELCHE	2	21,0	6,7%	22,0	24,0	22,7
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	24,0	22,7
MR070	Honduras y Marquez	MR-TAN-PER	-	5%	-	95%	-			PUELCHE	3	25,3	4,6%	26,0	24,0	22,7
MR072	Honduras y Gral. Madariaga	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-			PUELCHE	2	22,0	6,4%	23,0	24,0	22,7
MR028	El Salvador e/Chile y Mexico.	PCMR028	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	19,0	18,7
MR030	Pedrell e/Ascasubi y Carriega.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	TANQUE TRUJUI		PUELCHE	2	36,5	10,0%	38,0	37,0	35,0
MR031	R Rojas e/Libano y Gral. Pintos.	MR-TAN-TRU	-	3%	-	97%	-			PUELCHE	2	38,5	6,2%	41,0	37,0	35,0
MR032	F. Sanchez e/Libano y Pitagoras.	MR-TAN-TRU	-	4%	-	96%	-			PUELCHE	2	37,0	7,6%	39,0	37,0	35,0
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	-	-	-	-	37,0	35,0
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	29,5	16,8%	33,0	37,0	35,0
MR051	Tablada e/Oribe y Puccini.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	25,0	5,7%	26,0	37,0	35,0
MR075	Diego de Villaroel y Cellerino Namuncurá	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-			PUELCHE	2	31,5	2,2%	32,0	37,0	35,0
MR036	Ruta 25 e/Cataliña.	PCMR036	83%	2%	15%	-	-	-	X	PUELCHE	1	24,0	0,0%	24,0	28,0	27,0
MR037	Giralde e/Pastor Obligado y Lavarden.	PCMR037	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	39,5	5,4%	41,0	37,0	35,3
MR040	Piovato 4132 e/Bochardo y Balcarce.	PCMR040	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,0	5,9%	25,0	24,0	23,3
MR041	Dorrego e/Dorrego y Darat.	PCMR041	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	18,0	16,3
MR042	1 de Mayo e/Alcorta.	PCMR042	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,0	8,8%	17,0	18,0	16,7
MR043	San Pablo e/San Cayetano.	PCMR043	5%	2%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	33,0	32,0
MR044	Piovano e/El Salvador y Venezuela.	PCMR044	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,0	0,0%	24,0	24,0	23,7
MR048	Echeverria e/Darwin y Peron.	PCMR048	-	100%	-	-	-	-	x	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR049	Sarratea e/Victoria.	PCMR049	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	15,0	0,0%	15,0	15,0	14,7
MR050	Marcos Paz 1116 e/larrea y J.J. Urquiza.	PCMR050	10%	2%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	20,0	18,3
MR052	Ambeños e/Concordia.	PCMR052	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,5	3,4%	21,0	18,0	17,3
MR009	V. Alsina e/Libertador.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MORENO 1		PUELCHE	2	17,5	12,1%	19,0	18,0	17,0
MR053	Córdoba E/Palo y Sfheden.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	16,0	0,0%	16,0	18,0	17,0
MR054	Alvear e/Ratael Arco.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	21,0	6,7%	22,0	18,0	17,0
MR055	Córdoba e/V. Lopez y Linch.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	17,0	0,0%	17,0	18,0	17,0
MR056	Corvalán 2733 e/B de Yrigoyen y Graham Bell.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	18,0	17,0
MR057	Uruguay e/E. Rios y colectora.	MR-CIS-MOR	2%	4%	94%	-	-			PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	18,0	17,0
MR058	Misiones 1970 e/ Moron.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	18,0	17,0
MR059	Facundo Quiroga e/Moron y Yapeyu.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	18,0	17,0
MR060	Facundo Quiroga e/ La Tropilla y Quilmes.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	18,0	0,0%	18,0	18,0	17,0
MR061	Corvalán e/La Tropilla.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	18,0	17,0
MR062	SAN_JUAN_BAUTISTA 2026 e/ Int. Corvalan Dean Funes	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	17,5	4,0%	18,0	18,0	17,0
MR063	Lincoln e/Soldado Derrico y E. Rios.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	18,0	17,0
MR064	Intendente Corvalan 2302 e/ Alvear y Alejandro Graham Bell	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-			PUELCHE	2	19,5	3,6%	20,0	18,0	17,0
MR095	Uruguay y Chiclana	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-			PUELCHE	2	15,5	4,6%	16,0	18,0	17,0
MR097	Entre Rios esquina Abraham Lincoln	MR-CIS-MOR	2%	3%	95%	-	-			PUELCHE	2	18,0	0,0%	18,0	18,0	17,0

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ARSENICO TOTAL [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MR100	Moron e/ Facundo Quiroga y Arribeños	MR-CIS-MOR	1%	2%	97%	-	-			PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	18,0	17,0
MR101	Lincoln N°1644	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-			HIPO/PUELCHE	2	< 5	0,0%	< 5	18,0	17,0
MR065	J.V. González e/ Ruta 25 y Brasil.	PCMR065	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,0	0,0%	22,0	25,0	24,0
MR067	Lobos e/La Tablada y Manzana 36.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,0	5,2%	28,0	32,0	31,0
MR068	Lafinur e/Lobos y 3 de Marzo.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	34,0	0,0%	34,0	32,0	31,0
MR069	Tablada e/Democracia y Colectora	PCMR069	12%	4%	84%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,0	21,0%	31,0	35,0	34,0
MR071	Shakespeare y Manuel Galvez	PCMR071	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	23,5	9,0%	25,0	24,0	22,7
MR073	Colombia y Ricardo Gutiérrez	MR-TAN-PER	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,5	12,1%	18,0	24,0	22,7
MR074	Colectora Acceso Oeste y Ecuador	PCMR074	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	24,0	22,7
MR076	Hipólito Yrigoyen y San Luis	PCMR076	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	25,0	5,7%	26,0	25,0	23,7
MR077	Teniente Ibañez 3224	PCMR077	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	3	13,0	7,7%	14,0	25,0	19,5
MR078	Alberti entre Marcos Paz y Vera	PCMR078	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,5	7,7%	29,0	27,0	25,3
MR079	Juana de Azurduy y San Cayetano	PCMR079	43%	2%	55%	-	-	-	X	PUELCHE	1	34,0	0,0%	34,0	33,0	30,7
MR086	Ecuador y Marquez de Aguado	MR-TAN-PER	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	25,0	0,0%	25,0	24,0	22,7
MR088	Lobos entre Misiones y José Hernández	PCMR088	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	21,0	20,3
MR089	Pavón y Cervasio de Posadas (Plaza del Estudiante)	PCMR089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,5	3,1%	23,0	24,0	23,3
MR093	Mendoza y Jose Ingenieros	PCMR093	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	0,0%	18,0	18,0	17,7
MR098	Av. Luis Pasteur entre Facundo Quiroga y Arribeños	PCMR098	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	3,3%	22,0	20,0	19,3
MR099	Marcos Paz entre J.J Urquiza y Larrea	PCMR050	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	20,0	18,3
MR104	Marcos Paz entre Larrea y Justo Jose de Urquiza	PCMR050	-	36%	64%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	20,0	18,3
MS025	Cipoara y El Pindo	MS_CIS_MUN	-	-	100%	-	-			PUELCHE	2	18,5	11,5%	20,0	6,0	5,4
MS026	Calle 200 x Rotonda	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	16,0	6,9%	17,0	6,0	5,4
MS027	Av.Central y Calle 500	MS_CIS_MUN	-	5%	95%	-	-	BATERIA CIUDAD EVITA		PUELCHE	1	17,0	0,0%	17,0	6,0	5,4
MS034	El Tapeti y El Sauce	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	16,5	4,3%	17,0	6,0	5,4
MS042	Av.Central y calle 900	MS_CIS_MUN	97%	3%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	6,0	5,4
MS030	Las calas y Los tulipanes	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	21,5	3,3%	22,0	6,2	5,4
MS091	Las Orquideas y Las Gardenias	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	19,0	7,4%	20,0	6,2	5,4
MS092	Costanera y Las Dalias - B° 22 de Enero	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	19,0	7,4%	20,0	6,2	5,4
MS105	Guayabos y Jonquiles	MS34	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 5	< 5
MS114	Magnasco y Av. Cristiano	MS33	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 5	< 5
PI001	J. B. Justo y Sanguinetti al 500.	PCPI001	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	17,0	8,3%	18,0	24,0	21,3
PI002	J. B. Justo 615 y Posadas.	PCPI002	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,0	6,8%	23,0	23,0	22,0
PI003	Av. Tratado de Pilar 242 y Sanguinetti.	PCPI003	25%	35%	39%	-	-	-	X	PUELCHE	1	25,0	0,0%	25,0	24,0	23,7
PI004	Lagrave 84 (Yrigoyen y Pampa).	PCPI004	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	16,0	0,0%	16,0	18,0	17,0
PI005	Planta Champagnat.	PCPI005	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,0	6,7%	22,0	26,0	21,7
PI006	Rincón entre San Martín y Esteban Luca	PCPI006	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	23,0	0,0%	23,0	23,0	22,3
PI007	José María Paz 873.	PCPI007	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,0	0,0%	20,0	20,0	19,0
PI008	ITUZAINGO 331.	PCPI008	1%	3%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	20,0	14,1%	22,0	21,0	20,0
PI009	Maipú y Vías F.F.C.C. San Martín.	PCPI009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	36,0	7,9%	38,0	34,0	33,7
PI010	Gral. O´Higgins y Bergantín Congreso.	PCPI010	-	13%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	2	30,0	9,4%	32,0	29,0	28,7
PI011	Juan Bautista Alberdi 1106 y 11 Septiembre	PCPI011	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,0	0,0%	27,0	32,0	28,7
PI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambrosetti.	PCPI012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	32,5	2,2%	33,0	31,0	30,3
PI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Mapuche)	PCPI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	26,0	5,7%	28,0	31,0	28,0
PI014	Las Araucarias y M. Acosta.	PIPC2	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	40,0	7,1%	42,0	43,0	36,3
PI059	Ubicado dentro de predio Campo Suite II. frente a Parque Austral.	PIPC2	23%	77%	-	-	-	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL		PUELCHE	-	-	-	-	43,0	36,3
PI067	Mariano Acosta y Los Alamos	PIPC2	-	-	100%	-	-			PUELCHE	2	30,0	0,0%	30,0	43,0	36,3
PI089	Los Alamos y Av. Eva Perón	PIPC2	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	38,0	3,7%	39,0	43,0	36,3
PI015	Dr. Ignacio Pirovano 728 esq. Costa Rica	PCPI015	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,5	3,1%	23,0	26,0	25,7
PI016	Chacabuco 2130 e/Paraguay y Bolivia	PCPI016	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	23,0	20,3
PI017	Tortugas Country Club	PCPI017	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	19,0	0,0%	19,0	20,0	18,5
PI018	Tortugas Country Club	PCPI018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	17,0	16,7
PI020	Tortugas Country Club	PCPI020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	20,0	18,0
PI021	Tortugas Country Club	PCPI021	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	19,0	0,0%	19,0	20,0	18,7
PI022	Las Campanillas esq. Av. Highland Park	PCPI022	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	20,0	19,0
PI025	Country El Carmel	PCPI025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	31,0	29,3
PI026	Las Amapolas. Villahaus - Country Ayres del Pilar	PCPI026	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	20,0	19,0
PI035	Country Ayres del Pilar	PCPI035	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,5	9,4%	24,0	20,0	19,3
PI037	Country La Lomada	PCPI037	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,5	2,9%	25,0	26,0	24,7
PI040	Las Margaritas 1100 e/ Los Claveles y Las Rosas	PCPI040	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	15,0	0,0%	15,0	16,0	15,7
PI041	Las Glicinas 1080 (proximo a R8)	PCPI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	28,5	2,5%	29,0	28,0	27,3
PI042	Musladini 374. esquina Bergantin Independencia.	PCPI042	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	33,0	0,0%	33,0	34,0	32,7
PI043	Segui esq. Colectora Este Ramal Pilar	PCPI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	31,0	4,6%	32,0	32,0	30,3
PI044	Posadas 1635 e/J.V. Gonzalez y H. Ascasubi	PCPI044	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,0	5,9%	25,0	23,0	22,3
PI045	Country B° Campo grande	PCPI045	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,5	3,8%	19,0	19,0	17,7
PI048	Cjal. Dr. Martitegui 219. Plaza.	PCPI048	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	25,5	2,8%	26,0	32,0	28,0
PI049	Bergantín República y Bergantín Independencia.	PCPI049	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	30,0	28,0
PI050	Av. Constitucion(R26) e/Nicaragua y San Salvador.	PCPI050	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	12,0	0,0%	12,0	13,0	12,3
PI051	Guatemala y R26.	PCPI051	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	26,0	5,4%	27,0	27,0	25,7
PI052	Guatemala 4300 esq. Alemania (MANUEL_ALBERTI)	PCPI052	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	13,0	10,9%	14,0	25,0	17,5
PI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ramón Gimenez	PCPI053	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	8,9%	23,0	22,0	21,7
PI054	Leguizamon e Ituzaingo	PCPI054	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	22,5	3,1%	23,0	23,0	22,0
PI056	Ameghino y Colectora Oeste	PCPI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	31,0	29,0
PI058	Nicaragua 1250 e/Haiti y Santo Domingo	PCPI058	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,0	5,2%	28,0	28,0	26,3
PI061	RN 25 y Chubut	PCPI061	4%	24%	71%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI062	Panamá y Alejandro Korn	PCPI062	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	25,0	0,0%	25,0	30,0	26,0
PI063	Patagones y Tagle	PCPI063	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	24,0	0,0%	24,0	24,0	21,0
PI064	Andes y Avda. Patricias Argentinas	PCPI064	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	19,5	3,6%	20,0	20,0	19,0
PI065	Goleta Constitución y Fragata Sarmiento	PCPI065	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	28,0	2,5%	29,0	28,0	27,3
PI066	Calle s/n e/ Haiti y Santo Domingo	PCPI066	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	18,0	7,9%	19,0	16,0	15,0
PI068	Alazan e/Overo y Picasso- Highland Park	PCPI068	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	12,0	46,4%	17,0	15,0	14,7
PI070	Paraguay y Tierra del Fuego	PCPI070	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	26,5	2,7%	27,0	34,0	30,3
PI075	Guatemala y Levene	PCPI075	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	29,0	28,0
PI076	Gatti y Vasco Da Gama	PCPI076	-	-	100%	-	-	BATERIA PERUZZOTTI		PUELCHE	2	28,5	2,5%	29,0	29,0	28,0
PI078	Vasco Da Gama entre Hermita y Camino Comercial	PCPI076	-	1%	99%	-	-			PUELCHE	2	30,5	2,3%	31,0	29,0	28,0
PI080	Monseñor D´Andrea y La Carreta	PCPI080	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	28,5	7,4%	30,0	32,0	29,0
PI084	Chubut y San Ignacio	PCPI084	-	20%	80%	-	-	-	X	PUELCHE	2	27,5	7,7%	29,0	34,0	30,0
PI100	Calle Sarmiento e/ Bahia Grande y Bahia Redonda	PIPC1	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	32,5	2,2%	33,0	34,0	32,7
PI101	Ruta 234 y Bahia Darbel	PIPC1	-	-	100%	-	-			PUELCHE	2	30,0	4,7%	31,0	34,0	32,7
PI102	Calle Henry Martin y Bahia Darbel	PIPC1	-	1%	99%	-	-	BATERIA DERQUI		PUELCHE	2	33,0	12,9%	36,0	34,0	32,7
PI103	Cerrito 3287 e Isla Gran Malvinas	PIPC1	-	-	100%	-	-			PUELCHE	2	31,0	4,6%	32,0	34,0	32,7
PI105	Libertad e Isla Candelaria	PIPC1	-	-	100%	-	-			PUELCHE	2	32,5	19,6%	37,0	34,0	32,7
QU037	346 y 383	QU07	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	1	11,0	0,0%	11,0	< 5	< 5
QU076	Cno. G. Belgrano y Av. Montevideo	QU08	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	2	10,0	0,0%	10,0	11,0	9,2
QU138	Calle 866 Esq. D. Alvarez	QU07	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	9,8	4,8%	9,8	18,0	15,5
QU141	Calle 863 Esq. Donato Alvarez	QU07	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	1	20,0	0,0%	20,0	18,0	15,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ARSENICO TOTAL [µg/l]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									

X	Pozo a Red

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

aysa

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
AB057	P. Echagüe y Serrano	AB14	-	1%	-	99%	-	PLANTA - AB057	-	PUELCHE	2	85,6	0,0%	85,6	35,1	30,8
AB061	Laprida Narciso 1900	AB23	5%	6%	89%	-	-		-	PUELCHE	2	43,2	1,5%	43,6	40,0	33,4
AB063	Laprida Narciso 3001	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB064	Juan B. Justo 2050	AB23	17%	6%	77%	-	-		-	PUELCHE	2	18,6	15,2%	20,6	40,0	33,4
AB065	Juan B. Justo 2700	AB23	8%	-	92%	-	-		-	PUELCHE	1	23,5	0,0%	23,5	40,0	33,4
AB066	Juan B Justo 2101	AB23	19%	45%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	26,5	0,0%	26,5	40,0	33,4
AB067	Juan B. Justo 2802	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB068	Av. Ceballos (400) a 700 mts. de Avda. República Argentina	AB23	21%	27%	52%	-	-		-	PUELCHE	3	12,3	3,7%	12,7	40,0	33,4
AB070	Francisco N. Laprida y Muesca	AB23	8%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	2	54,6	0,6%	54,8	40,0	33,4
AB071	Narciso Laprida 2301	AB23	17%	69%	14%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB073	República Argentina 6670	AB23	6%	8%	86%	-	-		-	PUELCHE	1	31,7	0,0%	31,7	40,0	33,4
AB074	Rep. Argentina y Juan B. Justo	AB23	14%	8%	78%	-	-		-	PUELCHE	2	16,7	3,4%	17,1	40,0	33,4
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	AB23	9%	34%	56%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB076	Republica Argentina 7570 e/ Juan Jose Castro y Alice	AB23	20%	29%	51%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB084	Espoile s/n	AB23	3%	48%	49%	-	-		-	PUELCHE	1	13,5	0,0%	13,5	40,0	33,4
AB085	Leyes y Romero	AB23	36%	16%	48%	-	-		-	PUELCHE	1	13,5	0,0%	13,5	40,0	33,4
AB086	Romero y Calderón	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB087	Calderon 1251	AB23	24%	25%	51%	-	-		-	PUELCHE	1	34,6	0,0%	34,6	40,0	33,4
AB088	Calderón 1851	AB23	53%	36%	11%	-	-	BATERIA GLEW	-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB089	Calderón 3000	AB23	1%	98%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB090	Calderon 3400 1848	AB23	10%	14%	76%	-	-		-	PUELCHE	2	18,4	8,1%	19,4	40,0	33,4
AB091	Calderon 3650 1848	AB23	15%	49%	36%	-	-		-	PUELCHE	1	14,3	0,0%	14,3	40,0	33,4
AB092	Brigadier Calderón e/ Lezica y Young	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB093	Brigadier Calderón e/ Young y Av. Eduardo Holmberg	AB23	13%	19%	68%	-	-		-	PUELCHE	1	14,0	0,0%	14,0	40,0	33,4
AB094	Romero 3800	AB23	1%	9%	90%	-	-		-	PUELCHE	2	28,3	0,3%	28,3	40,0	33,4
AB095	Lemos 3800	AB23	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	35,1	0,0%	35,1	40,0	33,4
AB098	Rocha y J.A. Casacuberta	AB23	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	58,6	7,7%	61,8	40,0	33,4
AB099	Fernando Lahille y M. Acosta	AB23	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	74,0	3,1%	75,6	40,0	33,4
AB100	Gral. Cardenas y Almte. Irizar (Plaza)	AB23	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	53,5	0,0%	53,5	40,0	33,4
AB101	Agustín Barrios y Virrey Cevallos	AB23	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	58,0	0,4%	58,1	40,0	33,4
AB102	Martiniano Leguizamón entre 25 de Mayo y F. Alvarez	AB23	2%	1%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	60,6	0,0%	60,6	40,0	33,4
AB105	Av. Juan B. Justo e/ AV. República Argentina y Av. Espora	AB23	4%	1%	95%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	5,1	23,8%	5,9	40,0	33,4
AB106	Pablo Podesta y Orillia Rico	AB23	10%	85%	5%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB107	Fernando Ochoa y Juan Sarciore	AB23	19%	75%	6%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB108	Rufino Cordoba y Cesar Ratti	AB23	23%	75%	2%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB109	Luis Viale y Enrique de Rosas	AB23	12%	75%	13%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	40,0	33,4
AB110	Boulogne Sur Mer y Antonio Luis Beruti	AB23	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	55,9	0,0%	55,9	40,0	33,4
AB601	King y Bouchard	AB04	55%	8%	37%	-	-	-	X	PUELCHE	1	77,4	0,0%	77,4	7,7	5,4
AB728	B° Segba (D. Rocha y Paraguay)	PCAB728	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	61,9	1,9%	62,7	61,5	51,0
AB103	MALVINAS_ARGENTINAS y Dr. Chiesa	PCAB103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	35,3	1,0%	35,5	35,6	34,8
AB096	Manuela Pedraza 1209	ABPC1	-	1%	-	99%	-	PLANTA RAYO DE SOL	-	PUELCHE	2	25,4	2,0%	25,7	15,3	13,8
AB097	Santiago del Estero 3075	ABPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	15,3	13,8
EE001	Las Heras y Guillon	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	58,0	4,3%	59,7	31,8	30,3
EE002	Rivadavia y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	65,3	1,8%	66,1	31,8	30,3
EE003	Origone y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	69,1	2,7%	70,4	31,8	30,3
EE004	Las Heras y Chacabuco	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	69,1	0,0%	69,1	31,8	30,3
EE005	Terrarosa y Colon	EEPC1	-	14%	86%	-	-		-	PUELCHE	2	54,7	14,4%	60,2	31,8	30,3
EE015	Dorrego y Dreyer	EEPC1	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	58,2	6,3%	60,8	31,8	30,3
EE027	Maipú y Colón	EEPC1	-	30%	70%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE028	Lavalle y Maipú	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE029	Lavalle	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE030	Lavalle	EEPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE031	Lavalle	EEPC1	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE032	Lavalle	EEPC1	-	10%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	19,2	0,0%	19,2	31,8	30,3
EE033	Lavalle	EEPC1	-	66%	34%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE034	Maipú	EEPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	36,3	0,0%	36,3	31,8	30,3
EE035	Ventura Avila	EEPC1	-	5%	95%	-	-	BATERIA LA LATA	-	PUELCHE	1	9,3	0,0%	9,3	31,8	30,3
EE036	Ventura Avila y Calle 13	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	32,2	0,0%	32,2	31,8	30,3
EE040	Ventura Avila	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE041	Ventura Avila	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE042	Ventura Avila	EEPC1	-	20%	80%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE043	Juana de Arco	EEPC1	2%	39%	59%	-	-		-	PUELCHE	1	25,6	0,0%	25,6	31,8	30,3
EE044	Juana de Arco	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE045	Juana de Arco	EEPC1	4%	5%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	14,0	0,0%	14,0	31,8	30,3
EE046	Lavalle entre Tomquist y Bragado	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE047	Martin Fierro a 700mts de S6	EE21	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	15,9	0,0%	15,9	37,6	31,6
EE048	Martin Fierro a 700 m de Vazquez	EE21	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	25,7	0,8%	25,8	37,6	31,6
EE057	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EEPC1	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	28,2	4,5%	29,1	31,8	30,3
EE058	Avila Ventura 3000	EEPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	31,8	30,3
EE059	Avila ventura 3400	EEPC1	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	8,9	53,5%	12,2	31,8	30,3
EE060	Los Claveles y General Las Heras	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	2	55,0	5,4%	57,1	31,8	30,3
EE070	Colon y Maipú	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	5,0	70,7%	7,5	31,8	30,3
EE064	Puan y Pablo Pizzurno	PCEE064	25%	2%	73%	-	-	-	X	PUELCHE	1	30,5	0,0%	30,5	30,1	29,8
EE013	Cap. Lozano y Ascasubi	EE05	-	3%	-	97%	-	PLANTA - EE013	-	PUELCHE	2	92,1	3,5%	94,3	33,0	31,4
EE065	Pedro Arocena y E. de Laperriere	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE066	Amado Nervo y San Pedrito	-	50%	20%	30%	-	-	BATERIA SANTA ISABEL	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE073	Villegas esq. Colón	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	69,0	1,9%	68,9	37,6	31,6
EE049	Martin Fierro y Vazquez	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	22,8	0,0%	22,8	37,6	31,6
EE050	Vazquez a 700 m de Martin Fierro	EE21	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	13,5	0,0%	13,5	37,6	31,6
EE051	Martin Fierro y Dolores	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	40,4	0,0%	40,4	37,6	31,6
EE052	Martin Fierro a 1300m de E. Vazquez	EE21	-	46%	54%	-	-	BATERIA BAFICO	-	PUELCHE	-	-	-	-	37,6	31,6
EE054	Martin Fierro y Dreyer	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	31,6	0,0%	31,6	37,6	31,6
EE055	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EE21	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	25,7	1,1%	25,9	37,6	31,6
EE061	Republica de Costa Rica y Libertad	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	34,6	0,4%	34,7	37,6	31,6
EE062	El Ceibo y Fraga	EE21	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,6	31,6
EE063	Alvarez de Toledo y Miguel Angel	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	26,9	1,1%	27,1	37,6	31,6
EE006	Almafuerte e/Andrare y Obligado	EE03	39%	1%	-	60%	-		-	PUELCHE	1	43,7	0,0%	43,7	37,8	36,4
EE007	R. Dario y M. Cane	EE03	1%	1%	-	98%	-	PLANTA BARRIO UNO	-	PUELCHE	2	45,9	2,3%	46,6	37,8	36,4
EE038	Av. Tte. Gral. Morillas a 1000 mts de La Horqueta	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	23,7	7,2%	24,9	37,8	36,4
EE039	Tte. Gral. Morillas s/n - Villa Ntra. Sra. Del Rosario	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	43,7	1,8%	44,2	37,8	36,4

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEN001	Lago Garcia 3901 y Los Andes	EEPC4	-	1%	99%	-	-	POI 9 DE ABRIL	-	PUELCHE	2	41,4	19,5%	47,1	35,2	30,5
EEN002	Pedro Coni 3401e/Oliver y sancinena	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	42,5	6,5%	44,4	35,2	30,5
EEN003	Palleros 1700 /S. Nicolas y Mte. Grande	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	61,2	2,2%	62,1	35,2	30,5
EEN005	Sansinena 601 e/ Huergo y 9 de julio	EEPC4	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	2	86,6	2,0%	87,8	35,2	30,5
EEN006	Caseros 980 e/Huergo y 9 de Julio	EEPC4	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	35,2	30,5
EEN007	Sarmiento 2700 e/Tricotti y Barros	EEPC4	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	125,0	0,0%	125,0	35,2	30,5
EEN008	Ing. Huergo 2500 e/Petraca y Sastre	EEPC4	5%	11%	84%	-	-		-	PUELCHE	2	83,6	4,4%	86,2	35,2	30,5
EEN009	Pto Deseado 601 e/Huergo y 9 de abril	EEPC4	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	2	88,9	2,9%	90,7	35,2	30,5
EEN010	Ing. Huergo 1600 1842	EEPC4	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	83,3	0,2%	83,4	35,2	30,5
EEN012	M.Alegre 992 e/Gomez y Vernet	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	105,0	2,7%	107,0	35,2	30,5
EEN013	Tricotti 10 e/Malvinas y Barros	EEPC4	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	82,9	2,3%	84,2	35,2	30,5
EEN014	Cnel. D° Elia 190 e/Palleros y Constanzo	EEPC4	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	74,5	0,6%	74,8	35,2	30,5
EEN015	Constanzo 2090 e/P. Argentino y Rivero	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	40,3	5,8%	41,9	35,2	30,5
EEN016	Tierra del Fuego 179 e/Constanzo	EEPC4	15%	1%	84%	-	-		-	PUELCHE	2	75,6	15,1%	83,6	35,2	30,5
EEN018	Constanzo 1229 e/Guarany y Crespo	EEPC4	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	2	100,1	2,8%	102,0	35,2	30,5
EEN019	Prayones 3150 entre Palleros y Lopez	EEPC4	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	81,4	1,2%	82,1	35,2	30,5
EEN021	Rebizo 1100 e/ Fair y Crespo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	88,3	0,2%	88,4	35,2	30,5
EEN026	M. Alegre 1720 e/Alegre y Urquiza	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	80,9	5,2%	83,9	35,2	30,5
EEN059	Enrique Banch y Rebiza	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	17,3	7,8%	18,2	35,2	30,5
EEN020	Sansinena 105 e/ Doclout y Constanzo	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	4,4	50,4%	5,9	35,2	30,5
EEN022	Sansinena e Vernet y Benavidez	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	78,3	0,0%	78,3	35,2	30,5
EEN023	Benavidez 3190 e / F.Lopez y Scaglia	EEPC4	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	110,5	0,6%	111,0	35,2	30,5
EEN027	Fernadez y Dicio	EE23	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	17,7	9,2%	18,8	44,8	36,0
EEN028	Rivero y Chimondegui	EE23	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	26,9	1,8%	27,2	44,8	36,0
EEN029	Av. Fair y Primera Junta	EE34	-	22%	78%	-	-	BATERIA CORREO ARGENTINO	-	PUELCHE	-	-	-	-	50,4	45,7
EEN030	Cervetti y Av. Fair	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	25,8	2,2%	26,2	50,4	45,7
EEN031	Cervetti y La Horqueta	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	46,4	2,0%	47,0	50,4	45,7
EEN032	Av Fair e Islas Trinidad	EE34	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	46,6	1,8%	47,2	50,4	45,7
EEN033	Urbano González e Independencia	EE31	-	1%	99%	-	-	BATERIA SANTA CATALINA	-	PUELCHE	2	72,8	8,9%	77,4	43,9	43,1
EEN034	Alberto Grande a 38m de las vias	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	62,3	0,7%	62,6	43,9	43,1
EEN035	Casacubierta e/Valette y Gonzalez	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	82,3	1,8%	83,3	43,9	43,1
EEN036	Lima e/Valette y Francia	EE31	8%	2%	90%	-	-		-	PUELCHE	2	64,5	0,7%	64,8	43,9	43,1
EEN037	Cepeda y de los Constituyentes	EE31	-	46%	54%	-	-		-	PUELCHE	1	93,6	0,0%	93,6	43,9	43,1
EEN038	Lago Garcia y Cepeda	EE31	-	23%	77%	-	-		-	PUELCHE	2	93,3	10,2%	100,0	43,9	43,1
EEN039	Cepeda y Alberto Grande	EE31	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	40,8	5,0%	42,2	43,9	43,1
EEN040	Lago Garcia a 50m de Valette	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	88,2	0,3%	88,4	43,9	43,1
EEN041	9 de Abril e/Valette y Wieman	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	95,4	0,2%	95,5	43,9	43,1
EEN042	Las Talitas e/Sarmiento y M. Alegre	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	98,0	1,5%	99,0	43,9	43,1
EEN043	Avellaneda e/Trangoni y C. Monte Grande	EE31	64%	36%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	43,9	43,1
EEN044	Bruzzone e/Foz y Gonzalez	EE31	1%	1%	98%	-	-		-	PUELCHE	3	83,2	1,8%	84,9	43,9	43,1
EEN045	Bruzzone e/Tte. Alberto Grande	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	65,7	0,9%	66,1	43,9	43,1
EEN046	Bourquet e/ Amaghino y Gabastion	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	67,4	0,8%	67,8	43,9	43,1
EEN047	Juan M. de Rosas t Tte. Gabaston	EE31	9%	13%	78%	-	-		-	PUELCHE	1	84,5	0,0%	84,5	43,9	43,1
EEN048	Robertson e/ J. Newbery y T. Matienzo	EE31	1%	4%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	72,0	6,2%	75,1	43,9	43,1
EEN049	J. A. Roca y Est. Los Remedios	EE29	-	4%	96%	-	-	BATERIA SAN IGNACIO	-	PUELCHE	2	18,1	6,3%	18,9	35,4	27,0
EEN050	Los Robles y T. A. Edison	EE29	30%	5%	65%	-	-		-	PUELCHE	1	70,7	0,0%	70,7	35,4	27,0
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	EE29	2,0%	5%	73%	-	-		-	PUELCHE	1	20,2	0,0%	20,2	35,4	27,0
EEN052	20 de Junio y L. Lopez	EE29	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	20,2	4,2%	20,8	35,4	27,0
EEN053	Cichero 700 e/ Hipolito Bouchard y Julio Argentino Roca	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	46,1	1,4%	46,5	28,0	26,2
EEN054	Destacamento Melchior 733	EEPC5	-	-	100%	-	-	BATERIA LA MORITA	-	PUELCHE	2	77,0	12,4%	83,7	28,0	26,2
EEN056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	28,0	26,2
EEN058	Fray Luis Beltran 1415	EEPC5	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	55,8	1,3%	56,5	28,0	26,2
EET001	Falucho y Las Dalias	EEPC2	-	81%	19%	-	-	BATERIA TRISTAN SUAREZ	-	PUELCHE	1	27,4	0,0%	27,4	5,5	5,2
EET004	Av. Saenz Peña y Bogado	EEPC2	-	75%	25%	-	-		-	PUELCHE	1	6,5	0,0%	6,5	5,5	5,2
EEU001	Maipu 800 e Bransen Hussay B.	EE20	-	25%	75%	-	-	BATERIA UNION	-	PUELCHE	2	30,7	1,4%	31,0	18,8	8,3
EEU002	San Bernardo 980 e/ Balcarce P Moreno	EE20	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	44,6	0,0%	44,6	18,8	8,3
EEU003	Los Robles al 5000	EE24	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	2,9	0,0%	2,9	7,5	6,2
EEU004	Los Robles al 5700	EE24	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	2,4	17,7%	2,7	7,5	6,2
EEU005	S.Cabral a 200mts de Lacarra	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	26,5	5,1%	27,4	15,6	14,5
EEU006	S.Cabral 3588 a 700 m de EEU005	EE26	-	62%	38%	-	-		-	PUELCHE	1	12,9	0,0%	12,9	15,6	14,5
EEU007	S.Cabral a 700mts de EEU006	EE26	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	10,9	2,0%	11,0	15,6	14,5
EEU008	Sgto Cabral 5149 e/ Gral. Antonio Gonzalez y Jose Alvarez Condarco	EE26	2%	2%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	2,4	11,8%	2,6	15,6	14,5
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	5,7	0,0%	5,7	15,6	14,5
EEU011	Sgto. Cabral a 700 m de EEU010	EE32	-	45%	55%	-	-		-	PUELCHE	1	9,1	0,0%	9,1	16,6	14,7
EEU012	Calle s/n a 700 m de Sgto. Cabral	EE32	-	99%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	16,6	14,7
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	EE32	-	35%	65%	-	-		-	PUELCHE	1	5,0	0,0%	5,0	16,6	14,7
EEU014	Juana de Arco a 700 m de S20	EE24	-	51%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	7,5	6,2
EEU015	Lacarra y 9 de Julio	EE32	-	33%	67%	-	-		-	PUELCHE	1	30,0	0,0%	30,0	16,6	14,7
EEU016	Av. Maipu 40 esq. RP58	EE32	-	84%	16%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	16,6	14,7
EEU017	Av. Maipu 40 esq. RP59	EE32	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	17,7	15,6%	19,6	16,6	14,7
EEU018	Andromaco 80 e/ Jose Champagnat	EE32	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	28,6	40,9%	36,8	16,6	14,7
EEU019	Montes de Oca 80 e/Ruta Prov 58 y Jose Champagnat	EE32	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	38,3	5,9%	39,9	16,6	14,7
EEU020	Vieytes 9 entre Mariano Castex y José Champagmat	EE32	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	3,4	16,6%	3,8	16,6	14,7
EEU021	Sobre Sargento Cabral a 700m del EEU011	EE32	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	8,9	7,9%	9,4	16,6	14,7
EEU022	Juana de Arco S/N	EE32	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	2,3	18,4%	2,6	16,6	14,7
EEU023	Los Robles 249	EE32	-	76%	24%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	16,6	14,7
EEU025	Sgto. Cabral a 100 mts de Cáceres	EE32	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	2	12,0	2,4%	12,2	16,6	14,7
EEU026	Juana de Arco N° 7100	EE32	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	1	< 2	0,0%	< 2	16,6	14,7
EEZ001	Río Bermejo y Río Gualeguay	EE28	-	3%	-	97%	-	PLANTA LA CELIA	-	PUELCHE	2	43,6	1,9%	44,2	38,3	35,0
EEZ002	Río Bermejo y La Atlántica	EE28	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	73,7	0,0%	73,7	38,3	35,0
EEZ003	Las Hortensias Norte	EE22	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	25,6	1,9%	25,9	11,4	5,7
EES001	25 de Mayo 2371	EZPC1	100%	-	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EES004	Rosario y Palacios	EZPC1	16%	4%	80%	-	-		-	PUELCHE	2	23,3	17,9%	26,2	8,0	5,4
EEZ006	Caminito 1200	EZPC1	31%	52%	18%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EEZ007	Caminito 1900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EEZ010	Paso de los Libres 1800 e Islas Cook	EZPC1	41%	1%	58%	-	-		-	PUELCHE	2	2,4	23,6%	2,8	8,0	5,4
EEZ011	Falucho y Paso de los Libres	EZPC1	24%	7%	68%	-	-		-	PUELCHE	2	11,1	0,6%	11,1	8,0	5,4
EEZ012	Paso de los Libres a 700m de Falucho	EZPC1	18%	1%	81%	-	-		-	PUELCHE	2	2,1	0,0%	2,1	8,0	5,4
EEZ013	Paso de los Libres 1400	EZPC1	39%	1%	61%	-	-		-	PUELCHE	2	2,3	18,4%	2,6	8,0	5,4
EEZ014	Paso de los Libres 1500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EEZ015	Paso de los Libres a 1700 mts de RP N°52	EZPC1	27%	1%	73%	-	-		-	PUELCHE	1	< 2	0,0%	< 2	8,0	5,4

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEZ016	Mariano Moreno a 200m de Falucho	EZPC1	15%	48%	37%	-	-	BATERIA EZEIZA	-	PUELCHE	1	10,0	0,0%	10,0	8,0	5,4
EEZ017	Moreno 3500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EEZ018	Paso de los Libres 900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EEZ019	Ruta Provincial N°52 4000	EZPC1	25%	1%	75%	-	-		-	PUELCHE	2	< 2	0,0%	< 2	8,0	5,4
EEZ020	RP N° 52 1000	EZPC1	34%	7%	59%	-	-		-	PUELCHE	2	2,1	3,4%	2,1	8,0	5,4
EEZ021	RP N° 52 1200	EZPC1	25%	2%	73%	-	-		-	PUELCHE	2	3,5	30,7%	4,2	8,0	5,4
EEZ022	RP N° 52 s/n	EZPC1	4%	23%	72%	-	-		-	PUELCHE	2	2,3	18,4%	2,6	8,0	5,4
EEZ023	RP N° 52 1300	EZPC1	6%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	2	6,5	2,2%	6,6	8,0	5,4
EEZ024	Ruta N°52 kilómetro 2	EZPC1	5%	3%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	7,0	7,1%	7,3	8,0	5,4
EEZ025	Fariña 2000	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EEZ026	Valle de Río Negro y América del Norte (PA.Ezeiza)	EZPC1	-	-	100%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	3,0	47,1%	4,0	8,0	5,4
EEZ027	Cañada de Gomez y 25 de Mayo	EZPC1	16%	17%	67%	-	-		-	PUELCHE	1	3,3	0,0%	3,3	8,0	5,4
EEZ028	Quito y Arroyo	EZPC1	11%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EEZ029	Valle de Río Negro y América del Norte	EZPC1	14%	9%	77%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EEZ030	D. F. Sarmiento y Roger Balet	EZPC1	34%	18%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
EEZ031	Roger Balet y Sargento Cabral	EZPC1	14%	17%	69%	-	-		-	PUELCHE	1	6,1	0,0%	6,1	8,0	5,4
EEZ032	Valle de Río Negro y 25 de Mayo	EZPC1	22%	52%	27%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	8,0	5,4
ES022	Scalabrini Ortiz e/Ing. Pablo Marin y 1° de Mayo.	PCES022-24	-	4%	-	96%	-	TANQUE FONAVI	-	PUELCHE	2	36,0	2,2%	36,5	36,9	36,3
ES023	Islas Malvinas e/Constituyentes y Pablo Marin.	PCES022-24	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	30,4	1,9%	30,8	36,9	36,3
ES024	Scalabrini Ortiz y Av. Patricias Argentinas.	PCES022-24	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	37,2	4,0%	38,2	36,9	36,3
FV002	San Martin y San Juan	FV-TAN-CEN	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	78,8	0,0%	78,8	86,8	85,0
FV003	Constitución 198	FV-TAN-CEN	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	82,4	0,0%	82,4	86,8	85,0
FV004	Carriego y Alem	FV-TAN-CEN	-	53%	-	47%	-		-	PUELCHE	1	82,4	0,0	82,4	86,8	85,0
FV005	San Martin y Defensa	PCFV005	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	1	91,2	0,0	91,2	91,0	90,9
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	PCFV006	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	1	79,8	0,0%	79,8	81,5	80,8
FV007	Cariboni N° 2351 e/ Chaco y Rosario	PCFV007	-	14%	86%	-	-	-	x	PUELCHE	2	47,5	1,9%	48,1	48,8	47,9
FV009	Caribonl y Rio Bermejo	PCFV009	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	73,4	2,3%	74,6	76,7	62,0
FV011	Corrientes esq. 12 de Octubre	PCFV011	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	66,0	3,8%	67,7	67,2	66,2
FV013	Av.Bélgica N° 1101 esq. Jorge Novak	PCFV013	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	89,3	2,5%	90,9	91,8	90,8
FV014	J.D. Perón 535 y Pringles	PCFV014	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	80,6	1,2%	81,3	76,6	75,5
FV018	Av. Eva Perón y Gral. Hornos	PCFV018	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	81,3	9,5%	86,7	77,4	76,3
FV019	Río Caraguata n° 1401 y Directorio	PCFV019	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	76,0	2,8%	77,5	71,7	70,6
FV020	Cabildo y Eva Perón	PCFV020	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	82,0	1,9%	83,1	83,1	81,2
FV021	Mantovani y Calle 1407	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO SARMIENTO	-	PUELCHE	2	33,2	1,9%	33,6	27,6	26,0
FV022	Juan Mantovani 587 e/ C.1423 y C. 1409	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	25,6	3,0%	26,1	27,6	26,0
FV023	Mantovani y Calle 1429	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	25,9	1,1%	26,1	27,6	26,0
FV025	Calle 1423 (901) a 400 mts de Mantovani	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	27,9	4,3%	28,7	27,6	26,0
FV040	1439 y Juan Mantovani.	FV-TAN-CRU	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	24,2	4,1%	24,9	45,1	39,5
FV064	C. 1439 e/ C.1420 y a 300 mts de Juan Mantovani	FV-CIS-SAR	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	30,0	1,7%	30,3	27,6	26,0
FV065	Eva Perón N° 9695 y C. 1423	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	41,8	1,2%	42,1	27,6	26,0
FV066	Avenida Eva Perón y Calle 1352	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	27,0	1,8%	27,3	27,6	26,0
FV084	1610 e/RP 53 y 1647	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	41,0	1,2%	41,3	27,6	26,0
FV085	1653 e/Av. La Plata y A° Las Conchitas	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	47,4	2,4%	48,2	27,6	26,0
FV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Suecia	PCFV112	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	20,7	4,8%	21,4	20,6	17,7
FV120	Calle 1404 N° 498 e/ R.P. 53 y campo	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	31,3	2,3%	31,8	27,6	26,0
FV121	Av. Gral. Savio N° 598 esq. Sicilia	FV-TAN-MAY	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	31,4	0,5%	31,5	62,9	59,5
FV124	E.B. SARMIENTO	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	< 2	0,0%	< 2	27,6	26,0
FV132	Calle 1426 esq. 1437 – B° San Francisco Grande (oeste)	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	3	27,1	6,5%	29,1	27,6	26,0
FV147	Av. La Plata 50	FV-CIS-SAR	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	21,8	4,9%	22,5	27,6	26,0
FV149	Av. La Plata y Calle 1305	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	34,2	8,5%	36,2	27,6	26,0
FV156	Calle 1433a y 1418	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	25,4	5,9%	26,4	27,6	26,0
FV157	Calle 1443 y 1430	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	25,1	5,9%	26,1	27,6	26,0
FV158	Calle 1440 a 400m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	10,0	11,3%	10,8	27,6	26,0
FV159	calle 1440 a 1000m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	23,6	1,8%	23,9	27,6	26,0
FV160	calle 1452 y RP53	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	25,0	3,7%	25,6	27,6	26,0
FV166	Calle 1440 y 1455	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	33,9	5,6%	35,2	27,6	26,0
FV024	Eva Peron y Calle 1409	FV-CIS-SL	-	22%	78%	-	-	REBOMBEO SAN LUIS	-	PUELCHE	3	33,7	0,3%	33,8	48,6	45,6
FV036	Calle 1422 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	39,8	5,7%	41,4	48,6	45,6
FV037	Calle 1432 N° 901 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	36,7	2,7%	37,4	48,6	45,6
FV041	Calle 1335 N° 801 y 1328	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	68,0	0,3%	68,1	48,6	45,6
FV042	Calle 1316 y 1333	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	50,0	1,6%	50,5	48,6	45,6
FV045	Los Inmigrantes y Calle 1355	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	72,0	1,1%	72,5	48,6	45,6
FV050	Av. Eva Perón N° 7700 e/1310 y Cacheuta	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	34,1	0,0%	34,1	48,6	45,6
FV087	1364 N° 1082 esq. 1317a	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	40,0	1,2%	40,3	48,6	45,6
FV088	1327 N° 3201 e/ 1364 y 1370	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	34,3	2,7%	34,9	48,6	45,6
FV089	1356 N° 1700 e/ 1347 y 1349	FV-CIS-SL	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	30,8	4,4%	31,7	48,6	45,6
FV086	1374 N° 900 esq. 1313	FV-CIS-SL	-	28%	72%	-	-		-	PUELCHE	1	32,5	0,0%	32,5	48,6	45,6
FV092	1345 e/Av. La Plata y 1364	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	18,3	7,7%	19,3	21,7	20,9
FV104	Calle 1363 N° 100 y Los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	63,9	1,0%	64,3	48,6	45,6
FV116	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	46,2	4,4%	47,6	27,6	26,0
FV130	Calle 1341 N° 511 esquina calle 1310	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	83,4	0,8%	83,8	48,6	45,6
FV134	Los Inmigrantes y calle 1363	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	< 2	0,0%	< 2	48,6	45,6
FV143	Calle 1328 y 1355	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	73,6	2,6%	74,9	48,6	45,6
FV177	Calle 1347 a 58 mts de Av. De los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	80,9	1,7%	81,9	48,6	45,6
FV026	Calle 77 y Posadas	FV02	-	2%	98%	-	-	BATERIA SAN NICOLAS	-	PUELCHE	2	87,0	1,4%	87,8	86,6	83,3
FV027	El Zonda y El Gaucho	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	88,2	1,0%	88,8	86,6	83,3
FV028	Riobamba N° 1501 y Olivero	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	118,0	0,0%	118,0	86,6	83,3
FV029	Pte. Illia y Alvear	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	108,0	0,0%	108,0	86,6	83,3
FV097	Castelli N° 1001 esq. EE.UU	FV02	-	43%	57%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	86,6	83,3
FV152	El Apero entre Calle 437 y El Malambo	FV02	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	55,6	8,9%	59,1	86,6	83,3
FV174	Castelli esquina EEUU de América	FV02	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	118,0	2,4%	120,0	86,6	83,3
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	FV-TAN-MAY	-	12%	-	88%	-	TANQUE MAYOL	-	PUELCHE	1	44,8	0,0%	44,8	62,9	59,5
FV031	Virgen del Valle y El Clavel	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	61,3	3,3%	62,7	62,9	59,5
FV032	Virgen del Valle y La Ancianidad	FV-TAN-MAY	-	23%	-	77%	-		-	PUELCHE	2	58,2	3,3%	59,5	62,9	59,5
FV033	Virgen del Valle y Río Pilcomayo	FV-TAN-MAY	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	2	46,8	5,7%	48,7	62,9	59,5
FV034	Av Cacheuta y Boston	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	41,3	0,7%	41,5	62,9	59,5
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	FV-TAN-MAY	-	11%	-	89%	-		-	PUELCHE	1	39,8	0,0%	39,8	62,9	59,5
FV053	Cacheuta 2701 y Calle 1353	FV-TAN-MAY	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	58,8	0,5%	59,0	62,9	59,5
FV063	Av Eva Perón 5880	FV-TAN-MAY	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	72,8	0,2%	72,9	62,9	59,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
FV038	Calle 1423 e/ 1422 y 1428	PCFV038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	57,6	1,1%	58,0	60,4	58,9
FV046	Batalla de Ituzaingo 2780 e/ Contreras y C.214A	PCFV046	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	87,7	0,9%	88,2	89,2	87,6
FV047	Boedo e/ Montserrat y Túnez	PCFV047	-	4%	96%	-	-	-	x	PUELCHE	2	72,0	2,5%	73,2	75,5	74,3
FV048	León XIII e/ Pte. Perón y Beirut	PCFV048	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	98,5	1,4%	99,4	101,0	98,6
FV049	San Antonio e/ Irala y Alvar Cabeza de Vaca	PCFV049	-	4%	96%	-	-	-	x	PUELCHE	2	59,9	17,8%	67,4	71,8	68,4
FV051	Cacheuta 3601 y 1371	PCFV051	-	31%	69%	-	-	-	X	PUELCHE	1	35,2	0,0%	35,2	57,7	55,4
FV055	Calle 832 e/M.Grass y Piedrabuena (V.A.)	PCFV055	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	84,7	0,0%	84,7	77,8	65,1
FV057	Virgen del Valle N° 2599 y Chaco	PCFV057	-	10%	90%	-	-	-	x	PUELCHE	2	36,8	9,4%	39,2	37,8	36,6
FV058	Juan B. Justo y Arcasubi	PCFV058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	56,5	0,5%	56,7	55,8	55,3
FV059	Av.Bosques y Ruta 36	PCFV059	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	61,0	2,0%	61,8	61,5	60,1
FV060	Delgado y Cafferatas	PCFV060	-	10%	90%	-	-	-	x	PUELCHE	1	98,0	0,0%	98,0	99,6	97,7
FV062	Calle 740 y El Clavel	PCFV062	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	66,7	4,9%	69,0	66,4	52,4
FV067	Calle 1108 N° 1702 e/ 1131 y 1139	PCFV067-70	-	23%	77%	-	-	BATERIA ING. ALLAN	-	PUELCHE	2	29,8	13,5%	32,6	35,1	32,2
FV068	Calle 1108 N° 2280 esq. 1139	PCFV067-70	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	23,9	3,9%	24,5	35,1	32,2
FV069	Diag. Los Quilmes N° 500	PCFV067-70	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	2	25,8	8,0%	27,2	35,1	32,2
FV070	Calle 1108 N° 2300	PCFV067-70	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	38,9	8,2%	41,1	35,1	32,2
FV148	Calle 153a 301	PCFV148	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	31,3	0,5%	31,4	32,8	31,9
FV167	Calle 1145 y Calle 1122	PCFV067-70	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	32,7	2,8%	33,3	35,1	32,2
FV071	San Nicolás N° 2501 y Chaco	PCFV071	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	79,2	0,2%	79,3	82,2	78,9
FV072	Finochietto N° 1411 y Fracción V	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO CRUCE VARELA	-	PUELCHE	2	82,4	0,0%	82,4	45,1	39,5
FV073	C.O.Cruce	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	77,5	0,4%	77,7	45,1	39,5
FV074	Carlos Gardel N° 700 y Campichuelo	FV-TAN-CRU	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	69,9	0,2%	70,0	45,1	39,5
FV142	Dardo Rocha y Cerro Famatina	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	87,8	12,0%	95,3	45,1	39,5
FV078	Bruselas y Polonia	PCFV078	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	31,4	5,6%	32,6	32,1	31,1
FV079	Bruselas y Bulgaria	PCFV079	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	12,9	5,5%	13,4	16,6	14,4
FV080	517 N° 1700 y Portela	PCFV080	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	78,9	0,3%	79,0	86,1	82,8
FV082	El Paisano N° 1899 e/445 (B° Don José Planificado)	FV-TAN-P82	-	1%	99%	-	-	BATERIA DON JOSE PLANIFICADO	-	PUELCHE	2	63,5	1,0%	63,9	64,2	63,2
FV131	El Malambo N° 105 esq. La Tranquera	PCFV131	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	80,2	4,0%	82,4	84,0	82,9
FV165	Calle Monteverde e/445 y 449	PCFV165	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	95,0	7,5%	100,0	89,9	87,7
FV090	Av. La Plata N° 1200 e/1327 y 1319a	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-	BATERIA LAS COLONIAS	-	PUELCHE	2	10,8	4,6%	11,1	21,7	20,9
FV093	1681 esq. 1608	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	26,0	1,9%	26,3	21,7	20,9
FV094	1364 N° 2592 e/ 1371 Y 1357	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	18,8	8,7%	19,9	21,7	20,9
FV144	La Plata 1700	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	10,5	24,2%	12,3	21,7	20,9
FV146	Calle 1353 4100	PCFV090-94	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	22,9	5,9%	23,8	21,7	20,9
FV176	Calle 1608 entre 1671 y 1673	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	34,6	11,0%	37,3	21,7	20,9
FV095	Pisani N° 1101 esq. Suecia	PCFV095	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	36,2	8,0%	38,2	39,9	38,2
FV096	Humahuaca N° 501 y 511	PCFV096	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	99,1	0,1%	99,2	106,0	101,4
FV098	Cno. Touring Club N° 1499 y Canalejas	PCFV098	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	3	71,0	1,2%	71,8	70,3	69,2
FV100	228-Gral Perón N° 1501 y Bs. As.	PCFV100	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	83,3	2,3%	84,6	84,9	83,0
FV102	V.Abrille N° 975 casi esquina Calle 519	PCFV154	-	6%	94%	-	-	BATERIA SAN JORGE	-	PUELCHE	2	91,8	2,2%	93,2	42,5	34,1
FV154	La Paloma y calle 560	PCFV154	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	19,9	0,4%	19,9	42,5	34,1
FV103	Cicilia N° 2020	PCFV103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	65,6	0,6%	65,9	67,4	67,0
FV105	Calle 527 e/ 554 y 554A	PCFV105	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	91,7	1,7%	92,8	71,4	70,9
FV106	Calle 554 N° 1103 e/ Diag. Jarilla	PCFV106	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	12,9	1,1%	13,0	14,8	13,2
FV108	Calle 1348 N° 1003 e/ 1317 A y 1319 A - (B° San Francisco Este)	PCFV108	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	39,0	6,9%	40,9	43,9	40,5
FV109	Calle 1435 N° 1719 esq. 1434 - (B° San Francisco Oeste)	PCFV109	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	21,5	2,3%	21,8	21,9	21,6
FV110	Las Lengas N° 2303 e/ El cardenal y El Zorzal - (B° Santa Inés)	FV01	-	7%	93%	-	-	BATERIA GOBERNADOR COSTA	-	PUELCHE	2	33,3	6,8%	34,9	60,0	57,8
FV111	Los Alamos N° 2502 e/ Av. Blas Parera y El Homero - (B° Santa Inés)	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	78,3	3,0%	79,9	60,0	57,8
FV150	El Nandú e/ Las Casuarinas y Los Alamos	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	63,0	2,7%	64,2	60,0	57,8
FV151	Los Lapachos y Tinkunaku	FV01	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	48,2	0,4%	48,3	60,0	57,8
FV161	Los Laureles y El Cardenal	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	96,1	0,0%	96,1	60,0	57,8
FV162	La Paloma y Los Sauces	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	36,7	0,0%	36,7	60,0	57,8
FV163	El Mirlo entre Los Olivos y Los Lapachos	FV01	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	32,7	11,0%	35,2	60,0	57,8
FV113	Bonn N° 1203 y Austria	PCFV113	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	97,2	3,3%	99,5	101,0	98,4
FV114	Calle 531 N° 2200	PCFV114	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	2	31,9	32,6%	39,2	43,5	40,8
FV115	Progreso 2190 e/ Intendente Jose Luis Cariboni y virgen de valle	PCFV115	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	54,7	3,9%	56,2	55,6	54,5
FV117	Lourdes N° 402 y Ruta Prov. N° 53	PCFV117	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	58,2	2,2%	59,1	60,2	58,2
FV119	Suecia N° 1601 esq. Lisboa	PCFV119	-	4%	96%	-	-	-	x	PUELCHE	2	18,4	6,9%	19,3	39,4	37,5
FV122	Copenhage N° 502 esq. Alemania	PCFV122	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	77,8	5,4%	80,7	77,4	66,6
FV123	Calle 172 - Río Negro N° 1790 esq. Alvarado	PCFV123	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	92,4	0,9%	93,0	64,1	59,3
FV125	Bourel y Chacabuco	PCFV125	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	85,5	5,5%	88,8	88,0	86,2
FV126	Riobamba y Vías	PCFV126	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	88,5	0,0%	88,5	38,1	36,7
FV127	Calle 1151 A y Calle 1130	PCFV127	-	46%	54%	-	-	-	x	PUELCHE	1	49,6	0,0%	49,6	47,0	47,0
FV128	Río Diamante N° 3080 esquina Villegas	PCFV128	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	77,9	0,4%	78,1	79,0	76,7
FV129	Río Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	PCFV129	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	62,8	0,0%	62,8	65,6	62,7
FV133	Calle 1151 y Calle 1118	PCFV133	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	39,6	1,3%	39,9	43,1	42,5
FV137	San Geronimo 605	PCFV137	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	55,2	1,5%	55,8	55,9	55,2
FV138	Campana y Esmeralda	PCFV138	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	63,4	0,2%	63,5	98,9	76,0
FV139	Guamini 2711	PCFV139	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	56,3	0,3%	56,4	56,7	55,5
FV140	San Martin y Monteagudo	PCFV140	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	86,6	0,0%	86,6	89,4	89,0
FV141	Alfonsina Storni 74	PCFV153	-	2%	98%	-	-	BATERIA BARRIO ALTAMIRA	-	PUELCHE	2	29,6	1,9%	30,0	48,5	47,2
FV153	Florida y Miguel Cané	PCFV153	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	48,2	0,0%	48,2	48,5	47,2
FV145	Av. Cacheuta entre Calle 1363 y Calle 1371	PCFV145	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	56,0	1,9%	56,7	55,1	54,5
FV164	calle 1155 y 1138	PCFV164	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	44,5	0,5%	44,6	47,6	45,9
FV168	Calle 1149 y Calle 1136	PCFV168	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	41,0	6,2%	42,8	43,9	40,6
FV169	Calle Jacinto Benavente y E, D Amicis	PCFV059	-	4%	96%	-	-	-	x	PUELCHE	2	66,1	3,1%	67,5	61,5	60,1
FV175	Santa Lucia y Aconquija	PCFV118	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	51,7	0,8%	52,0	69,8	69,0
FV178	Av. Bosques y calle 819	PCFV178	-	50%	50%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV183	Remedios de Escalada esquina Carmen de Areco	PCFV183	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	99,3	1,0%	100,0	104,0	102,3
FV184	Turquia, entre Bruselas y Milán	PCFV184	-	6%	94%	-	-	-	X	PUELCHE	2	62,0	29,4%	74,9	-	-
FV191	Rumania entre París y Paysandú	-	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	4%	-	96%	-	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	-	PUELCHE	1	20,7	0,0%	20,7	25,3	23,6
GU002	Colombia 1007 e/Av. De las Americas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	3,8	26,1%	4,5	25,3	23,6
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	2	7,6	14,9%	8,4	25,3	23,6
GU005	Bogado 800 e/Islas Malvinas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	< 2	0,0%	< 2	25,3	23,6
GU007	Republica Argentina 578 e/Venezuela.	GU-TAN-PED	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	2	35,8	3,2%	36,6	25,3	23,6
GU008	Brasil 103 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	2	32,7	1,7%	33,1	25,3	23,6
GU020	Remedios de Escalada e/Tomas Guido y Godoy Cruz	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	6,2	0,0%	6,2	25,3	23,6
GU031	Brasil y Mesopotamia	GU-TAN-PED	-	17%	-	83%	-		-	PUELCHE	1	48,4	0,0%	48,4	25,3	23,6
GU032	Avenida 38 entre calle 5 y 6	GU-TAN-PED	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	30,6	3,0%	31,2	25,3	23,6

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
GU010	Violeta Antier 5095 e/Santos Discepolo.	PCGU010	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	15,4	6,0%	16,0	15,9	15,1
GU011	Alfonso Amat 4611 e/Jose Negiba.	PCGU011		100%					X	PUELCHE	-				-	-
GU012	Calle 117 1000 / Av. C. Mereles 1050 e/calles 118 y 120.	GU-TAN-YA	3%	1%		96%	-		-	PUELCHE	2	43,7	4,2%	45,0	43,0	41,0
GU013	Calle 118 N° 1633 e/calles 121 y 123.	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	44,7	2,1%	45,3	43,0	41,0
GU014	Cjal. Capuano 490 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		2%		98%	-		-	PUELCHE	2	22,1	6,1%	23,0	43,0	41,0
GU015	Calle 118 2041 e/calles 127 y 129.	GU-TAN-YA	-	2%	-	98%	-	TANQUE ESTE - LA YAYA	-	PUELCHE	2	33,2	21,3%	38,2	43,0	41,0
GU016	Calle 118 2471 e/calles 133 y 135.	GU-TAN-YA	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	45,2	4,1%	46,5	43,0	41,0
GU017	Av. 139 N° 510 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		4%		96%	-		-	PUELCHE	2	35,0	39,0%	44,6	43,0	41,0
GU023	Calle 103 y Calle 124	GU-TAN-YA	-			100%	-		-	PUELCHE	2	67,1	0,7%	67,4	43,0	41,0
GU024	Calle 116 y Av. 99	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	61,5	3,1%	62,8	43,0	41,0
GU018	Av. 21 N° 1099 e/calle 36.	GU01	-	3%	97%	-	-	BATERIA LAS LOMAS	-	PUELCHE	3	19,9	16,3%	23,5	20,7	18,9
GU019	Cjal. Placido Bajo N° 901 e/ calle39.	GU01	-	-	100%				-	PUELCHE	2	15,3	9,2%	16,3	20,7	18,9
GU006	Av. Nestor Kirchner 630 e/Avellaneda y Güemes.	GU02	1%	25%	74%	-	-		-	PUELCHE	1	30,6	0,0%	30,6	35,5	34,3
GU021	Roque Saenz Peña y Santa Elena	GU02	-	1%	99%			BATERIA B° SANTA MAGDALENA	-	PUELCHE	2	50,7	4,9%	52,4	35,5	34,3
GU022	Dorrego y Luis A. Testa	GU02	2%	12%	86%	-	-		-	PUELCHE	2	39,7	0,4%	39,8	35,5	34,3
GU025	Calle 6 y Tte. Juan Domingo Baldini	PCGU025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	3,2	51,6%	4,3	29,4	21,7
GU026	Kingston y Honduras		10%	89%	1%					PUELCHE						
GU027	Brasilia y Guayanas	-	2%	89%	9%			BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	-	PUELCHE	-				-	-
GU028	Puerto España y Brasilia	-	10%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU029	Gral Paz esCalle 7 y Lib. Gral J. de S.Martin		11%	89%						PUELCHE						
GU030	La Rioja e/ Av. Hipólito Yrigoyen y Sarmiento	-	11%	89%				BATERIA NUMANCIA	-	PUELCHE						
JCP002	Wilde 4573 e/Corbeta Uruguay y Fragata Sarmiento	JCP-TAN-PR			-	100%	-		-	PUELCHE	2	60,6	0,4%	60,7	62,0	40,8
JCP003	Av. Deseja e/ Av. Pres. Hipólito Yrigoyen	JCP-TAN-PR				100%	-	TANQUE PRIMAVERA	-	PUELCHE	2	69,3	1,5%	70,0	62,0	40,8
JCP005	Las 3 Marías 5700 e/ Av. Jose Alube y Jose C. Paz	JCP-TAN-PR	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	2	44,9	4,9%	46,4	62,0	40,8
JCP006	Calle Pampa de Junin a 50 m de Yrigoyen	JCP-TAN-PR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	59,2	2,6%	60,3	62,0	40,8
LM0046	Ferro Nuevo y Guanabara	LM003	100%						X	PUELCHE					51,5	42,3
LM0047	Colect. R3 y Huillanimi B° Pque Lelior.	LM003	100%						X	PUELCHE					51,5	42,3
LM0049	Escribano y Colten B°El Pino.	LM027	100%						X	PUELCHE					27,2	25,7
LM0053	Haidi y Galileo - Haidi y Torres.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	2	58,2	1,8%	58,9	84,9	80,2
LM0054	Luciano Torrens N° 600 y Sermón Perez B° San Enrique.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	2	65,0	36,8%	81,9	84,9	80,2
LM0056	Guanacache y Pino B° Recoleta.	LM007	72%		27%				X	PUELCHE					47,5	33,3
LM0063	Huemul y Rodney B°Maria Elena	LM002		100%					X	PUELCHE					107,0	61,5
LM0064	Undaneta y Rodney B° Maria Elena	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	2	106,0	1,3%	107,0	107,0	61,5
LM0060	M.Garrido e/ S. Favardo y Colegiales (Ex Colegiales y M. Becerra)	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	2	26,1	0,8%	26,2	26,2	24,8
LM0070	M.Garrido e/ S. Favardo y Rocamora B° 17 de Octubre	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	2	57,7	12,1%	64,9	26,2	24,8
LM0072	J. De Alvarado y Solá, Favardo B° 24 de febrero	LM011		2%	98%				X	PUELCHE	2	65,7	4,0%	67,5	26,2	24,8
LM0073	J. De Alvarado y Solá, Favardo B° 24 de febrero	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	2	54,4	0,7%	54,9	53,6	51,0
LM0074	Echauri N° 3200 e/ J.B.Justo y Vidal	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	2	65,3	1,2%	65,8	53,6	51,0
LM0075	Lavalleja y Conde	LM026		2%	98%				X	PUELCHE	2	37,9	0,7%	38,1	38,9	37,7
LM0076	N de Balboa y Lujan.	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	2	34,7	1,4%	34,9	38,9	37,7
LM0077	Castellon y Rio Cuarto B° El Porvenir	LM009		2%	98%				X	PUELCHE	2	64,3	1,3%	64,9	86,4	79,7
LM0078	Zequeira garcia Ex Favardo y Rocamora	LM002			100%				X	PUELCHE	2	82,0	3,4%	84,9	107,0	61,5
LM0079	Undaneta y Rocamora (Ex T de Rocamora y Del Tejar)	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	2	93,8	1,7%	94,9	107,0	61,5
LM0081	Echauri el Ortega Zyvni Villa Scasso	LM014			100%				X	PUELCHE	2	59,8	7,1%	62,8	53,6	51,0
LM0083	Durero N° 900 Ex Ruta 21 (Cerro) y Dragones.	LM024	10%	1%	89%				X	PUELCHE	2	41,6	6,5%	43,5	20,2	19,7
LM0085	Martinez y Lasalle.	LM024		1%	99%				X	PUELCHE	2	36,8	0,4%	36,9	20,2	19,7
LM0087	Resero e/Acsusso y Alagon	LM011			100%				X	PUELCHE	2	38,1	2,2%	38,7	28,2	24,8
LM0094	A.Vives 700 y Guanabara E/ Guasayan y Morris B° Pque Lelior.	LM003	96%	2%	2%				X	PUELCHE	-				51,5	42,3
LM0095	Menegazza N° 6100 e/Numancia y Acuye.	LM024		1%	99%				X	PUELCHE	2	29,9	3,8%	30,7	27,2	25,7
LM0096	M.Herrera e/ Guancache y Eder - B° el Tubin.	LM003		1%	99%				X	PUELCHE	2	48,9	2,2%	49,6	51,5	42,3
LM0098	E. Clay (e) Mirador y Puerto.	LM024	-		100%				X	PUELCHE	2	18,7	3,4%	19,1	20,2	19,7
LM0099	Hugo Wast e/ Madresselva y Holanderas.	LM029	98%		2%				X	PUELCHE	-				50,3	43,0
LM0101	Soyuki y Gallardo.	LM001			100%				X	PUELCHE	2	59,8	0,2%	60,0	30,7	11,9
LM0108	Lavalleja N° 6100 e/ Alegria y Alcazo.	LM019		1%	99%				X	PUELCHE	2	47,6	5,3%	49,4	46,9	41,4
LM0109	Gamay y Peridon	LM024			100%				X	PUELCHE	2	27,5	40,4%	53,1	20,2	19,7
LM0112	Fernandez y Leopardi B°. Caridad.	LM008			100%				X	PUELCHE	2	19,9	2,6%	19,7	84,9	80,2
LM0118	El Rosario 3151(e) Cerezo y Zequeira.	LM046			100%				X	PUELCHE	2	59,1	0,6%	59,3	27,5	22,8
LM0121	L. De Vinci 4000	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	2	70,5	0,5%	70,8	86,4	79,7
LM0123	Tinogasta y Colegiales	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	1	42,0	0,0%	42,0	86,4	79,7
LM0124	Merces Paz y Colegiales	LM047	94%	1%					X	PUELCHE					9,7	6,8
LM0125	Corrales Fte N° 1100 y Espejo	LM003			100%				X	PUELCHE	2	37,7	1,4%	38,1	51,5	42,3
LM0126	Ancon al 3584 esquina Zinny	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	2	63,1	1,0%	63,5	38,9	37,7
LM0127	Catelin 4000 esq. J.B. Justo	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	2	54,7	1,4%	55,4	86,4	79,7
LM0139	Cavanaille 900 e/ Simon Perez y Rivas.	LM008		100%					X	PUELCHE	-				84,9	80,2
LM0140	Castro e/ Ceseda y Senabria	LM026			100%				X	PUELCHE	2	32,4	0,2%	32,4	38,9	37,7
LM0143	Scavino y Areco	LM023	100%						X	PUELCHE	-				23,0	13,4
LM0146	Dragones y Figueredo	LM008			100%				X	PUELCHE	2	68,9	0,8%	69,3	84,9	80,2
LM0158	Alvarado y Alagon	LM045			100%				X	PUELCHE	2	60,0	0,6%	60,2	23,0	22,4
LM0161	Aros, Manuel y Bacon - Union Fte N° 5800	LM016	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	90,4	0,1%	90,4	98,2	89,4
LM0164	Saenz y Cnacio	LM008	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	25,6	3,8%	26,0	84,9	80,2
LM0170	Ancon y Alegria E/ Fournier	LM016	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	97,0	1,5%	98,2	98,2	89,4
LM0172	J.F.Echauri y Donizetti E/ Alagón	LM009	-	3%	97%				X	PUELCHE	2	66,4	1,9%	67,2	86,4	79,7
LM0175	Saez y Bayo.	LM026	-		100%				X	PUELCHE	2	108,0	1,3%	109,0	98,2	89,4
LM0177	Ibera y Barcelona.	LM034	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	81,4	1,0%	82,0	81,8	80,3
LM0179	Coronel Conde e/ Martinez Villena y Martin Coronado.	LM048	-	-	100%				X	PUELCHE	2	73,1	1,8%	74,0	87,8	90,2
LM0180	Machain esq. Puerto Argentino.	LM008	-	2%	98%				X	PUELCHE	2	65,2	1,3%	65,8	84,9	80,2
LM0187	Pio Argentino y Cnel. del Valle.	LM026	-		100%				X	PUELCHE	2	93,8	2,1%	95,2	38,9	37,7
LM0189	Leones Entre Gana y Conde	LM026	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	62,7	0,1%	62,7	38,9	37,7
LM0191	Ivanna esq. M. Arias	LM026	-	2%	98%				X	PUELCHE	2	37,4	1,4%	37,9	38,9	37,7
LM0192	Toloral entre Barrientos y Barrasain.	LM048			100%				X	PUELCHE	2	103,0	1,4%	103,0	87,8	90,2
LM0193	Jachal esq. Juan Pio Gana.	LM048	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	73,4	2,4%	74,6	87,8	90,2
LM0196	Escuela entre toloral y Gallardo.	LM008	-	-	100%				X	PUELCHE	2	105,5	4,7%	109,0	84,9	80,2
LM0197	Scarlatti e/ Villanueva y Monzoni.	LM025	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	48,6	2,6%	49,5	23,0	13,4
LM0198	Enrique Clay y M. Doello	LM051	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	37,5	0,4%	37,6	38,4	36,6
LM0967	Guamini 12710 E/ San Ignacio y San Juan	LM004	-	-	100%				X	PUELCHE	2	23,2	3,4%	23,7	27,2	25,7
L0025	M.Piaggio y Olíden	L005	64%	2%	33%				X	PUELCHE	1	31,2	0,0%	31,2	10,4	6,7
L0042	Santa Lucia e H.Yrigoyen	L001	-	1%	-	99%	-	PLANTA - L0042	-	PUELCHE	2	50,2	0,1%	50,2	44,4	16,9
L0067	De la Peña y Médes	L004				100%	-	PLANTA - L0067	-	PUELCHE	2	61,3	1,6%	62,0	49,6	44,6
L0072	Timbó y Cap. Moyano	LOPC1		2%		98%	-	PLANTA - L0072	-	PUELCHE	2	91,9	1,9%	93,1	48,4	45,8
L0078	Arenales a 100m de J. Ingenieros	LOPC1	-	9%	91%				-	PUELCHE	2	103,0	1,4%	104,0	48,4	45,8
L0079	Arenales a 300m de L.M.Drago	LOPC1		1%	99%				-	PUELCHE	2	69,6	5,6%	73,3	48,4	45,8
L0080	Juan xxIII 2400 entre L.M.Drago y Bahia Blanca	LOPC1	-	13%	87%				-	PUELCHE	2	100,9	1,5%	102,0	48,4	45,8
L0081	L.M.Drago y Melian	LOPC1	3%	77%	21%	-	-		-	PUELCHE	1	41,7	0,0%	41,7	48,4	45,8
LO118	Martin Rodriguez y Timbó	LOPC1	1%	14%	85%				-	PUELCHE	2	92,7	0,7%	93,1	48,4	45,8
LO119	Tala y Pino	LOPC1	3%	3%	94%				-	PUELCHE	3	91,3	3,1%	94,3	48,4	45,8
LO121	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	2	54,6	4,9%	56,5	43,0	39,9
LO125	Av. Argentina y Guido	LOPC2		37%	63%				-	PUELCHE	2	17,0	2,9%	17,3	43,0	39,9
LO126	Av. Argentina	LOPC2	-	79%	21%			BATERIA LLAVALLOL	-	PUELCHE	1	20,7	0,0%	20,7	43,0	39,9
LO133	Av. Argentina y Junin	LOPC2	-	50%	50%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	43,0	39,9
LO138	Junin 170 entre Rodriguez y Las Heras	LOPC1		4%	96%				-	PUELCHE	2	37,3	1,7%	37,7	48,4	45,8
LO139	Amat y Petiribi	LOPC1		11%	89%				-	PUELCHE	1	55,1	0,0%	55,1	48,4	45,8
LO140	Av.Argentina 2950 y Petirbi	LOPC1	-	5%	95%				-	PUELCHE	2	94,9	1,4%	95,8	48,4	45,8
LO141	Rodriguez 3507 esq Mercedes	LOPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	2	75,5	0,2%	75,6	48,4	45,8
LO142	Jose Ingenieros 1668 e/ Cafferata Norte y Juan XXIII	LOPC1		20%	80%				-	PUELCHE					48,4	45,8
LO146	Calle Pintos 2007 e/ Viel y Florida	LOPC1	-	4%	96%				-	PUELCHE	2	84,2	1,9%	85,3	48,4	45,8
LO147	Calle Magnolia 2099 e/ Moreno y V.Barbieri	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	67,4	2,4%	68,5	48,4	45,8
LO148	Magallanes 2600 entre Ucrania y Duhalde	LOPC1		1%	99%				-	HIPO/PUELCHE	2	8,3	88,6%	13,5	48,4	45,8
AB019	Combatientes MALVINAS_ARGENTINAS y Pilar	LOPC2	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	54,7	1,4%	55,2	43,0	39,9
AB060	Tiglio y Policastro	LOPC2	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	59,7	5,0%	61,8	43,0	39,9
LO083	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	1%	1%	99%				-	PUELCHE	2	56,4	1,4%	56,9	43,0	39,9
LO084	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	-	2%	98%				-	PUELCHE	2	45,2	9,2%	48,1	43,0	39,9
LO085	L.M.Drago e/Cno las Flores y Fonrouge	LOPC2	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	42,1	0,5%	42,2	43,0	39,9
LO086	Cno de las Flores a 500m de Drago	LOPC2		2%	98%				-	PUELCHE	2	33,1	4,1%	34,0	43,0	39,9
LO087	Cno de las Flores y MALVINAS_ARGENTINAS	LOPC2	-	3%	97%				-	PUELCHE	2	36,0	0,4%	36,1	43,0	39,9
LO093	Cno San Vte a 500m pozo 87	LOPC2	3%	12%	85%	-	-	BATERIA BURZACO	-	PUELCHE	3	27,7	4,6%	29,1	43,0	39,9
LO106	J. B. Justo y Cuyo	LOPC2	65%	5%	30%				-	PUELCHE	1	44,2	0,0%	44,2	43,0	39,9
LO117	Mendoza y N. Silva	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	62,3	6,2%	65,0	43,0	39,9

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
LO122	J. Ingenieros	LOPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	40,3	3,7%	41,3	43,0	39,9
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	2%	23%	75%	-	-		-	PUELCHE	1	24,9	0,0%	24,9	43,0	39,9
LO144	Avenida Argentina y RP N° 16	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	42,9	3,1%	43,8	43,0	39,9
LO145	Villarino y Avenida Argentina	LOPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	11,3	3,8%	11,6	43,0	39,9
LO149	Rene Vallo y Jose Melián	LOPC2	67%	-	33%	-	-		-	PUELCHE	1	69,2	0,0%	69,2	43,0	39,9
LO095	Larrea y Gardel	AB14	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	79,2	2,1%	80,3	35,1	30,8
LO113	Leloir 432	LO38	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	49,4	52,1%	67,6	12,8	6,5
LO120	Pino y el Cairo	LOPC1	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	100,5	2,1%	102,0	48,4	45,8
LO127	Jose Marmol e/Allemandri y Anchorena	LO47	-	1%	-	99%	-	PLANTA - LO127	-	PUELCHE	2	62,3	0,3%	62,4	21,4	17,1
LO128	Marti y Av. Cabred	LO13	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	48,3	0,4%	48,4	13,6	9,3
LO134	Larrea y Colihue	AB14	-	6%	-	94%	-	PLANTA - LO134	-	PUELCHE	2	94,9	1,3%	95,8	35,1	30,8
LO135	Matienzo y Rodriguez	AB22	1%	2%	-	96%	-	PLANTA - LO135	-	PUELCHE	2	87,3	5,1%	90,4	56,9	40,1
LO152	Necochea esquina Lujan	-	-	100%	-	-	-	PLANTA - LO152	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA002	Ambrosetti 1900 e/Beltran y Martin Fierro.	MAPC1	-	21%	79%	-	-		-	PUELCHE	3	84,7	29,6%	99,5	87,6	68,9
MA003	ALMIRANTE_BROWN 2500 e/Viena y Rep. Argentina.	MAPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	81,5	0,9%	82,0	87,6	68,9
MA004	Asamblea 1800 e/11 de Septiembre.	MAPC1	1%	2%	98%	-	-	BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	-	PUELCHE	2	55,7	1,1%	56,1	87,6	68,9
MA006	Viena e/Canning.	MAPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	48,2	2,1%	48,9	87,6	68,9
MA018	Olden entre 11 de Septiembre y Juan Cruz Varela	MAPC1	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	62,1	3,0%	63,4	87,6	68,9
MA009	Cangallo 1200 e/San Lorenzo y Uspallata.	PCMA009	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	114,0	107,6
MA010	Uspallata 1000 e/Soiller y O´Brien.	PCMA010	-	3%	97%	-	-		X	PUELCHE	2	85,4	2,0%	86,6	87,9	85,8
MA011	Stoppler 900 e/Bat. de Maipu y Paso de los Andes.	PCMA011	-	3%	97%	-	-		X	PUELCHE	2	101,5	0,7%	102,0	104,0	90,8
MA012	San Lorenzo y Seguí	PCMA012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	93,8	27,4%	112,0	110,0	95,4
MA016	Canadá 748 y Seguí	MAPC2	-	7%	93%	-	-		X	PUELCHE	2	79,2	0,2%	79,3	85,9	80,8
MA017	Palacios y Seguí	MAPC2	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	47,3	3,1%	48,3	85,9	80,8
ME001	25 DE MAYO E/PUEYRREDON	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	72,7	1,9%	73,7	39,7	28,9
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	39,7	28,9
ME003	25 MAYO E/ 9 DE JULIO	ME-TAN-CES	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	83,9	3,0%	85,6	39,7	28,9
ME004	BROWN E/ CENTENARIO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	79,8	1,5%	80,6	39,7	28,9
ME006	BROWN E/ CARLOS PELEGRINI	ME-TAN-CES	-	6%	-	94%	-	TANQUE MERLO	-	PUELCHE	2	85,8	1,6%	86,8	39,7	28,9
ME007	BROWN E/ M.BRAVO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	76,6	4,2%	78,8	39,7	28,9
ME015	9 DE JULIO E/ SAN LORENZO	ME-TAN-CES	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	103,5	2,0%	105,0	39,7	28,9
ME016	SAN LORENZO E/CANNING	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	80,5	2,6%	82,0	39,7	28,9
ME060	SAENZ PEÑA Y AV. CALLE REAL	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	106,5	2,0%	108,0	39,7	28,9
ME005	25 MAYO E/ J.M Castro ex Pearson	ME02	75%	-	25%	-	-	BATERIA PARQUE SAN MARTIN NORTE	-	PUELCHE	-	-	-	-	61,2	60,7
ME014	BROWN E/PIZURNO	ME02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	61,4	3,2%	62,8	61,2	60,7
ME008	LIBERTAD E/ ARGENTINA Y PUCHEU	PCME008	-	100%	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	46,2	36,2
ME009	COVIPOL. EDIF 38. ROSSI Y ECHEVERRY	PCME009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	81,7	1,9%	82,8	85,2	82,8
ME010	COVIPOL. EDIF 13. ROMAY Y ZUNDA	PCME010	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	83,9	55,3
ME017	DEFENSA E/BARAVINO Y HORTIGUERA	PCME017	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	66,4	1,1%	66,9	68,5	65,9
ME018	OYUELA E/FRIAS Y RUTA 200	PCME018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	71,6	2,6%	72,9	71,3	66,6
ME019	PEDRIEL E/ TALA	PCME019	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	83,3	1,4%	84,1	80,2	54,4
ME020	INDEPENDENCIA E/ SULLIVAN	PCME020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	78,3	1,3%	80,1	81,5	77,7
ME021	ESNAOLA Y BOYACÁ	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	60,0	1,9%	60,8	72,6	69,9
ME022	ESNAOLA Y BACH	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	71,9	0,0%	71,9	72,6	69,9
ME023	AV.ARGENTINA Y CHOPIN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	77,1	0,6%	77,4	72,6	69,9
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-	TANQUE LOMA GRANDE	-	PUELCHE	1	75,5	0,0%	75,5	72,6	69,9
ME025	AV.ARGENTINA E/GAVILAN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	45,0	2,5%	45,8	72,6	69,9
ME081	Strauss y Juan Sebastian Bach	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	80,8	2,0%	81,9	72,6	69,9
ME087	Av. Argentina y Lezama	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	72,7	3,0%	74,2	72,6	69,9
ME090	Angel Rodriguez y Curapaligue	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	56,3	50,0%	76,2	72,6	69,9
ME026	TUNUYÁN E/AREVALO	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	65,2	0,0%	65,2	83,5	81,9
ME027	VIDT E/ FEBAL	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	65,5	2,2%	66,5	83,5	81,9
ME028	VIDT E/DEMOCRACIA	ME-TAN-REC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	82,5	1,6%	83,4	83,5	81,9
ME029	VIDT E/CHACAS	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-	TANQUE RECONQUISTA	-	PUELCHE	2	104,5	4,7%	108,0	83,5	81,9
ME030	VIDT E/AMATINA Y DESSY	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	70,7	1,2%	71,3	83,5	81,9
ME063	FILIBERTO Y TARIJA	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	96,0	5,9%	100,0	83,5	81,9
ME079	Arbolagasta y Fraga	ME-TAN-REC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	84,6	9,5%	90,2	83,5	81,9
ME082	Cacheuta y José Martí	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	70,1	1,7%	70,9	83,5	81,9
ME031	GARDEL E/PAYRÓ	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	70,3	1,7%	71,1	69,3	63,0
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	38,4	0,0%	38,4	69,3	63,0
ME033	VIDT E/DISCEPOLO	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	56,7	0,1%	56,7	69,3	63,0
ME034	VIDT E/VACCAROS	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	68,4	20,3%	78,2	69,3	63,0
ME035	VIDT E/AEDIMA	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-	TANQUE ARCO IRIS	-	PUELCHE	2	59,7	3,2%	61,0	69,3	63,0
ME068	JOSE MARTI Y DALTON	ME-TAN-ARC	-	6%	-	94%	-		-	PUELCHE	2	96,6	2,6%	98,3	69,3	63,0
ME088	Lorenzini entre Deán Funes y Fraga	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	40,3	0,0%	40,3	69,3	63,0
ME091	P.Echague y P. Podestá	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	36,2	0,2%	36,2	69,3	63,0
ME092	Carcavallo entre Cassaux y Orfilia Rico	ME-TAN-ARC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	36,4	0,4%	36,5	69,3	63,0
ME102	Fraga y Dávila	ME-TAN-ARC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	24,3	1,2%	24,5	69,3	63,0
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	PCME036	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	82,7	3,1%	84,5	85,7	83,7
ME037	AMADO NERVO E/ANCON Y AMPERE	ME-CIS-PSM	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	2	39,1	2,9%	39,9	43,0	39,5
ME038	LOS ALELIES Y TILCARA	ME-CIS-PSM	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	41,7	15,3%	46,2	43,0	39,5
ME039	LOS ALELIES E/TILCARA Y AGUARIBAY	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	36,5	3,7%	37,4	43,0	39,5
ME040	LOS JACINTOS E/ETIOPIA	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	35,8	1,6%	36,2	43,0	39,5
ME041	ACHALA E/ LAS RETAMAS	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	34,7	0,6%	34,8	43,0	39,5
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	34,8	0,0%	34,8	43,0	39,5
ME045	ALVAREZ JONTE E/ LOS ALELIES	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	40,4	3,0%	41,2	43,0	39,5
ME046	LAS RETAMAS E/JURAMENTO	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	37,2	0,8%	37,4	43,0	39,5
ME047	ALVAREZ JONTE E/ LOS GERANIOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	42,2	2,3%	42,9	43,0	39,5
ME048	ALVAREZ JONTE E/LAS DALIAS	PCME048	-	-	100%	-	-	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	-	PUELCHE	2	49,4	0,3%	49,5	51,9	51,0
ME049	GABRIELA MISTRAL E/ALTE BROWN	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	74,8	0,9%	75,3	43,0	39,5
ME051	GENDARMERIA GURRUCHAGA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	44,6	8,2%	47,2	43,0	39,5
ME053	ZARRAGA E/ GAGUERRE Y PEDERNERA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	42,4	6,5%	44,3	43,0	39,5
ME054	ZARRAGA E/ GAVILAN	ME-CIS-PSM	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	16,5	3,0%	16,8	43,0	39,5
ME058	12DE FEBRERO	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	76,7	1,2%	77,3	43,0	39,5
ME076	El Hornero 3710	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	32,3	6,4%	33,7	43,0	39,5
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	HIPOPUELCHE	1	3,7	0,0%	3,7	43,0	39,5
ME086	Garmendia y Almte. Brown	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	55,0	0,5%	55,2	43,0	39,5
ME042	GENDARMERIA E/ FLORES A.	PCME042	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	86,0	2,7%	87,6	87,3	85,3
ME050	GABRIELA MISTRAL E/BENOIT	PCME050	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	89,6	2,8%	91,4	89,3	87,2

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
ME055	PUEYRREDON Y O'BRIEN	PCME055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	79,0	4,3%	81,4	73,7	72,2
ME056	SAN ANTONIO Y PARAGUAY	PCME056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	73,9	0,9%	74,3	72,9	70,5
ME057	CHACO N° 310 E/DIRECTORIO Y NOGUERA	PCME057	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	73,1	4,9%	75,6	76,4	74,6
ME059	GABRIELA MISTRAL Y ALPATACAL	PCME059	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	55,7	4,3%	57,4	57,8	56,4
ME061	SAENZ PEÑA Y AV. RIVADAVIA	PCME061	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	74,5	3,6%	76,4	76,0	75,3
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	PCME065	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	78,5	3,2%	80,3	79,7	77,0
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA T SOLANET	PCME066	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	69,1	0,0%	69,1	73,2	70,9
ME067	TRAFUL Y BLANCO ESCALADA	PCME067	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	62,2	0,0%	62,2	62,7	62,0
ME069	ATAHUALPA Y PEDRO CHUTRO	PCME069	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	99,6	2,1%	101,0	100,0	98,6
ME070	TUCUMAN Y LA RIOJA	PCME070	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	73,1	1,8%	74,0	74,4	74,3
ME073	SARMIENTO 2398 Y LA HABANA	PCME312-73	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	63,4	1,8%	64,2	62,2	61,8
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	PCME074	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	67,5	0,0%	67,5	79,1	76,4
ME075	MEDRANO 811 Y SANTA FE	PCME075	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	77,8	1,3%	78,5	74,7	70,4
ME078	Garay 1753	PCME078	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	76,4	3,0%	78,0	78,1	75,1
ME080	Federico Lacroze y Matorras	PCME080	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	77,3	0,8%	77,7	79,5	76,7
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	ME01	-	-	100%	-	-	POI MERLO	-	PUELCHE	1	68,7	0,0%	68,7	37,4	31,1
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	ME01	2%	-	98%	-	-		-	PUELCHE	1	79,3	0,0%	79,3	37,4	31,1
ME089	Curapaligüe y 25 de Mayo	PCME089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	64,1	3,6%	65,7	43,5	42,0
ME093	Morse y Av. del Bicentenario	PCME093	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	58,6	4,5%	60,4	64,4	62,9
ME094	Brasil y Guardia Vieja	PCME094	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	83,5	0,8%	84,0	83,2	81,9
ME095	Sullivan y Sargento Cabral	PCME095	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	59,9	1,3%	60,4	74,8	64,6
ME096	Gral Ocampo y T Saley	-	-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME097	Orán entre Av. de La Union y De Roma		-	100%	-	-	-		-	PUELCHE						
ME098	Tasso y Oran		-	100%	-	-	-		-	PUELCHE						
ME099	De Roma y Necochea	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME100	Republiquetas entre Av. de La Union y De Roma		-	100%	-	-	-		-	PUELCHE						
ME101	Juan A Maza y Dr Ricardo Raúl Alfonsin	PCME101	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	71,3	0,6%	71,6	76,3	75,3
ME103	Los Arrieros y San Martin	PCME103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	58,8	4,5%	60,6	62,0	58,7
ME113	EVA PERON E/PELLEGRINI	PCME113	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	71,2	5,5%	73,9	73,4	71,5
MI001	Belgrano 400 e/Vicente Lopez y C. Malnatti.	MIPC2	-	-	-	100%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE	-	PUELCHE	2	68,5	3,1%	70,0	89,9	86,5
MI020	Julio A. Roca 216 e/Dorrego y Roseti.	MIPC2	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	68,4	2,3%	69,5	89,9	86,5
MI035	Pavon 1100 e/R. Peña y Sgto. Cabral.	MIPC2	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	48,9	0,4%	49,0	89,9	86,5
MI002	Julio A. Roca 800 e/Serrano y Muñoz	PCMI002	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	89,1	1,5%	90,0	71,7	69,8
MI003	Italia 1300 e/Francia y L. N. Alem.	PCMI003	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	81,3	1,4%	82,1	82,4	81,6
MI006	Pardo 400 e/San Luis y C. Malnatti.	PCMI006	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	71,9	20,5%	82,3	83,1	82,8
MI007	Julio A. Roca 1900 e/Gelly Obes y Zuviria.	PCMI007	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	2	56,9	0,1%	56,9	57,8	56,7
MI008	Conesa 2000 e/ Gelly Obes y J. M. Zapiola	PCMI008	1%	-	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	79,0	1,1%	79,6	74,9	73,8
MI009	Serrano 800 e/Conesa y SAN_JOSE	PCMI009	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	86,1	0,6%	86,4	72,8	71,4
MI010	Cjal. E. Tribulato 700 e/Serrano y Urquiza.	PCMI010	2%	27%	72%	-	-	-	X	PUELCHE	2	78,0	1,1%	78,6	80,8	77,1
MI011	Int. J. Irigoin 700 e/Serrano y Stgo. Del Estero.	PCMI011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	81,4	3,6%	83,5	83,5	82,8
MI013	J. B. Alberdi 200 e/Dorrego y Azcuenaga.	PCMI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	61,7	0,2%	61,8	62,2	45,3
MI014	Serrano 400 e/J. B. Alberdi y Haedo.	MIPC1	-	100%	-	-	-	CAG SAN MIGUEL CENTRO	-	PUELCHE					70,9	69,9
MI046	Paunero 100 e/Pardo.	MIPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	70,9	69,9
MI015	Cnel. Fraga 2300 e/Int. J. Irigoin y Marcos Sastre.	PCMI015	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	73,5	18,8%	83,2	78,7	69,8
MI016	Cnel. M. Fraga e/Salerno y Tomas Edison.	PCMI016	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	67,8	3,0%	70,0	71,5	69,0
MI017	Vicente Lopez e/Marcos Sastre y Malvinas.	PCMI017	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	106,0	1,3%	107,0	108,0	105,7
MI018	Pardo e/Libertad y J. M. Zapiola	PCMI008	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	64,0	1,0%	64,4	74,9	73,8
MI019	J. B. Alberdi e/J. Zapiola y Gelly Obes.	PCMI008	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	87,3	1,8%	88,4	74,9	73,8
MI021	Cjal. E. Tribulato 2300 e/ G. Campos y Libertad.	PCMI021	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	73,4	1,8%	74,3	77,2	74,3
MI022	Tomas Guido 4400 e/J. R. Lopez y El Zonda.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	2	69,4	6,1%	72,4	97,2	74,3
MI023	Av. Alte. J. Lopez 4500 e/J. D. Solis y Eva Peron.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	72,8	8,3%	77,0	97,2	74,3
MI025	T. Guido 5900 e/Uriarte.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	68,4	1,1%	68,9	97,2	74,3
MI026	T. Guido 5301 e/La Pinta.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	74,8	8,2%	79,1	97,2	74,3
MI032	Marchena 3256	MI_CIS_SAR	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	2	55,2	45,1%	72,8	97,2	74,3
MI024	E. Ferreyra 4200 e/T. Guido.	MI_CIS_GUA	1%	2%	98%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	2	66,9	0,0%	66,9	68,7	67,5
MI028	Santa Maria 5100 e/Vicente Fatome.	MI_CIS_GUA	1%	3%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	54,0	38,9%	68,8	68,7	67,5
MI037	Cisterna La Guarida	MI_CIS_GUA	4%	4%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	89,3	0,3%	89,5	68,7	67,5
MI065	Calle Defensa e Italia	MI_CIS_GUA	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	76,7	2,6%	78,1	68,7	67,5
MI066	Dr. Enrique Finochietto e/Sta Maria y Fray Antonio Marchena	MI_CIS_GUA	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	44,1	1,4%	44,5	68,7	67,5
MI033	Int. J. Irigoin 400 Gelly Obes y Granaderos.	PCMI033	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	61,7	4,1%	63,9	68,7	67,3
MI036	Cnel. M. Fraga 3400 e/Marconi.	PCMI036	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	73,4	3,4%	75,1	72,6	72,3
MI038	Roca 1400 e/Alen.	PCMI038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	70,0	4,5%	72,2	71,7	70,7
MI039	Belgrano 2000 Gelly Obes y R. S. Peña	PCMI039	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	65,2	3,9%	67,0	71,8	68,2
MI040	Italia 2300 e/Gaspar Campos y J. M. Zapiola.	PCMI040	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	61,1	2,3%	62,1	61,5	58,3
MI041	Belgrano 900 e/D´elia y Muñoz.	PCMI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	89,9	0,3%	90,1	88,4	80,4
MI042	Pardo 10 e/Ruta 10.	PCMI042	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	64,7	9,7%	69,1	70,9	64,1
MI043	Conesa 416 e/San Luis.	PCMI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	66,3	14,3%	73,0	73,0	72,0
MI045	Rodriguez Peña 2600 e/Williams.	PCMI040	-	8%	92%	-	-	-	X	PUELCHE	2	57,7	0,5%	57,9	61,5	58,3
MI004	Conesa 1300 e/Martin Irigoyen.	MI_CIS_CEN	-	20%	80%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	1	82,8	0,0%	82,8	73,3	71,4
MI034	Martin Irigoyen y Juan B.Alberdi	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	91,3	12,2%	99,2	73,3	71,4
MI047	Martin Irigoyen e/Obligado y Francia.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	76,7	8,0%	81,0	73,3	71,4
MI048	Av. Francia 500 e/Sta. Fe y Parana.	MI_CIS_CEN	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	74,4	0,1%	74,4	73,3	71,4
MI049	Av. Francia 600 e/Moreno.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	77,8	27,6%	92,9	73,3	71,4
MI051	Av. Francia 1100 e/Tucuman y Azopardo.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	68,6	13,0%	74,9	73,3	71,4
MI060	Conesa entre Martin Irigoyen y Sarmiento	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	41,4	117,1%	75,6	73,3	71,4
MI067	Conesa e Irigoyen	MI_CIS_CEN	1%	14%	84%	-	-		-	PUELCHE	1	< 2	0,0%	< 2	73,3	71,4
MI052	Rodrigo de Triana 1500 e/R. Balbin.	PCMI052	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	62,8	1,1%	63,3	64,1	63,2
MI053	Defensa e/R. Balbin.	PCMI053	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	70,9	1,0%	71,4	69,2	68,1
MI054	Cruz del Sur e/Tomas Espora.	PCMI062	-	1%	99%	-	-	BATERIA MI054-MI062	-	PUELCHE	2	98,7	0,8%	99,2	101,0	97,6
MI062	Calle Güemes e Isabel La Catolica	PCMI062	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	94,4	1,8%	95,6	101,0	97,6
MI055	J. J. Paso 5500 e/La Niña y Isabel la Catolica.	PCMI055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	87,1	0,2%	87,2	77,5	74,7
MI056	Juan J. Paso e/Beron de Estrada y Salguero.	PCMI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	105,5	2,0%	107,0	105,0	81,6
MI057	Maestro Ferreyra y Charlone	PCMI057	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	79,8	2,5%	81,2	80,3	75,1
MI058	José M. Zapiola y Güemes	PCMI058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	70,6	1,6%	71,4	67,6	60,3
MI059	Concejal Tribulato y Monseñor Blois	PCMI059	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	75,5	0,2%	75,6	73,0	72,3
MI061	Luis Salguero y Tomás Alba Edison	PCMI061	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	76,9	0,4%	77,1	76,8	71,4
MI063	Egipto y Libertad	MI01	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	71,2	2,2%	72,3	71,8	68,4
MI064	San Nicolás y Gral Las Heras	MI01	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	61,8	3,3%	63,2	71,8	68,4
MN001	Lavalleja al 7100 El Conde y Achaguitas	LMO19	-	1%	99%	-	-	-	-	PUELCHE	2	33,2	1,8%	34,0	46,9	41,4
MN002	Armonia a 150 m de La Fuente.	LMO19	-	2%	98%	-	-	-	-	PUELCHE	2	33,2	5,3%	34,5	46,9	41,4
MN003	Armonia y Billinghurst	LMO19	-	2%	98%	-	-	-	-	PUELCHE	2	35,7	3,4%	37,1	46,9	41,4

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MN004	Billinshurst 3800 y Armonía.	LMO19	-	2%	98%					PUELCHE	2	18,6	3,8%	19,1	46,9	41,4
MN005	Billinsurts y Doblas/ Cesnedes.	LMO19	-	2%	98%			BATERIA GONZALEZ CATAN		PUELCHE	2	21,8	1,3%	22,1	46,9	41,4
MN006	Int. Rocuo y Ramon Lista	LMO46	-	2%	98%					PUELCHE	2	30,5	0,7%	30,4	57,5	56,6
MN007	Billinsurts e Int Rocuo	MN24	-	1%	99%					PUELCHE	2	14,9	5,7%	15,5	113,0	77,5
MN008	Billinsurts y Las Flores	MN24	-	2%	98%					PUELCHE	2	21,8	1,3%	22,1	113,0	77,5
MN009	Billinshurst 5300 y Rio Cuarto	MN24	-	1%	99%					PUELCHE	2	51,1	1,7%	51,7	113,0	77,5
MN010	Las Flores y Ramon Lista	MN24	-	100%						PUELCHE	2	39,8	43,2%	50,6	113,0	77,5
MN011	Monte Egmont y Cesnedes.	LMO19	-	3%	97%					PUELCHE	2	79,1	2,5%	79,4	46,9	41,4
MN032	Acassuso 17001 y Santa Rosa	MN23	-	-	100%					PUELCHE	2	83,5	16,9%	93,5	26,0	15,4
MN033	Acassuso e Iberoamo	MN23	-	1%	99%					PUELCHE	-	-	-	-	26,0	15,4
MN034	Noogun y Zavale	MN16	-	-	100%			BATERIA RAFAEL CASTILLO		PUELCHE	2	81,5	1,0%	82,1	113,0	84,9
MN036	Hucal y Feron	MN16	-	4%	96%					PUELCHE	3	86,5	4,3%	89,0	111,0	84,5
MN037	Lavalle y Tres Cruces	MN23	-	2%	98%					PUELCHE	2	96,5	3,4%	97,5	26,0	15,4
MN039	E. Del campo y Aquiarey	MN23	-	100%						PUELCHE	-	-	-	-	26,0	15,4
MN044	Huallin y Lacar	MN23	-	-	100%					PUELCHE	2	80,8	0,3%	80,9	26,0	15,4
MN043	Cesation N° 2022 c/E. Echeverria	MN23	-	100%				PCR MN043		PUELCHE	-	-	-	-	26,0	15,4
MN059	Beethoven y La Doma B°El Torero	MN24	-	100%					X	PUELCHE	-	-	-	-	113,0	77,5
MN106	Beethoven entre. Aquirre y Mendez de Andes	MN26	-	-	100%				X	PUELCHE	2	88,7	1,9%	90,5	113,0	77,5
MN110	V. de la Plaza E/ Dávila y Beades	MN26	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	113,5	3,1%	116,8	110,0	106,8
MN122	Santa Rosa y Aquirre	MN24	-	-	100%				X	PUELCHE	2	120,5	1,8%	122,0	113,0	77,5
MN147	Zarrouito e/ Brovard y Aquirre	MN26	-	3%	97%			PCR MN147		PUELCHE	2	113,8	3,1%	116,8	110,0	106,8
MN157	Bouchard y Heredia	MN25	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	2	108,5	1,3%	109,0	110,0	106,8
MN173	Hucal 1700 e/ Hogar y Polledo	MN16	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	2	85,4	1,7%	86,4	111,0	84,5
MN163	Lavalle y Sudamérica	MN22	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	2	74,1	1,8%	75,6	26,0	15,4
MN186	M. T. de Alvear 1100 esq. Del colegio	MN27	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	2	108,5	1,4%	109,0	10,9	8,2
MN211	Escuela y Esteban	MN19	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	2	106,9	0,5%	107,5	10,0	7,4
MN212	Victorino de la plaza y Luis María Drago. RAFAEL CASTILLO.	MN19	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	2	105,5	2,0%	107,0	10,0	7,4
MO087	Cielito y Vidalita	MOPC1	100%	-	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	4,2	3,3
MO088	De los Recuerdos y De los Paisajeros	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	2	27,6	1,0%	27,8	4,2	3,3
MO089	Gaona y La Chacarera	MOPC1	100%	-	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	4,2	3,3
MO093	De los Recuerdos y E. Frers	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	2	30,7	0,9%	30,9	4,2	3,3
MO094	La Saavedra y de los Recuerdos	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	2	52,7	0,4%	52,8	4,2	3,3
MO095	De La Doma Pje.N° 1282 y El Ombu	MOPC1	100%	-	-	-	-	BATERIA PARQUE LELOIR - ITUZAINGO		PUELCHE	-	-	-	-	4,2	3,3
MO097	De La Vidalita y J. Hernandez	MOPC1	81%	1%	18%					PUELCHE	1	58,5	0,0%	58,5	4,2	3,3
MO146	N. Repetto y Del Palenque	MOPC1	4%	-	96%					PUELCHE	2	69,6	1,3%	70,5	4,2	3,3
MO147	N. Repetto y De la Tradición	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	2	33,1	5,1%	34,3	4,2	3,3
MO148	Del Mercrudio v/ De las Cachuas	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	2	57,2	1,4%	57,8	4,2	3,3
MO149	N. Repetto a 130 metros de F. Ielpo	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	2	46,0	7,4%	46,3	4,2	3,3
MO153	De la Condición , v/Colectora Acceso Oeste	MOPC1	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	4,2	3,3
MO100	Videla y Peredo	MOPC1	-	-	100%				X	PUELCHE	2	81,1	0,2%	81,2	4,2	3,3
MO105	Fray J. S. M. de Oro y Figueroa Alcorta.	MO01	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	10,1	4,5
MO106	Figueroa Alcorta y/ La Tribuna	MO01	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	10,1	4,5
MO107	E. Lopez y Cnel. Aeroes	MO80	95%	5%	-	-	-	BATERIA VII BRIGADA AEREA - MORON		PUELCHE	-	-	-	-	4,1	3,2
MO108	Figueroa Alcorta y Monteadeo	MO01	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	10,1	4,5
MO136	Lavcera y Cuecha Cuchu	MO01	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	10,1	4,5
MO137	Madrid y Jarry	MO32	95%	5%	-	-	-	BATERIA BARRIO SAN JUAN	-	PUELCHE	-	-	-	-	3,5	2,7
MO138	Pevarano e/Pedro Diaz y Juan Gorriti	MO01	-	-	100%					PUELCHE	2	63,3	1,8%	64,0	53,9	51,2
MO139	Amberes y Pedernesky	MO01	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM - INTA		PUELCHE	2	30,4	0,7%	30,5	53,9	51,2
MO140	Cuezo entre M. de Aélen y Tolio.	MO01	-	1%	99%					PUELCHE	2	77,6	1,4%	81,6	53,9	51,2
MO141	Cuezo y Acovie	MO01	-	100%						PUELCHE	-	-	-	-	53,9	51,2
MO150	La Trilla a 14m de Juravento	DU01	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM 2		PUELCHE	2	68,1	0,3%	68,2	47,7	43,2
MO151	Arcobaleo a c/1 50m de Veracua	MU01	-	17%	83%					PUELCHE	-	-	-	-	47,7	43,2
MO152	Chimbera y Los Samberos	MU01	-	1%	99%					PUELCHE	2	64,9	2,4%	66,0	47,7	43,2
MO142	Piran esq. Lavalle	JT01	99%	1%	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	4,7	3,1
MO144	Sta Teresa y/ La Gaceta	MO03	95%	5%	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	4,7	3,4
MO154	Coronel Arenas esq. Andrade	MO21	95%	5%	-	-	-	BATERIA CASTELAR		PUELCHE	-	-	-	-	10,1	4,5
MO155	Oquyar esq. Palermo	MO21	95%	5%	-	-	-			PUELCHE	-	-	-	-	10,1	4,5
MR001	J.V. González 2625 e/Balzak y Rodriguez Peña.	PCMR001	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	2	30,4	0,9%	30,6	38,1	33,8
MR002	J.V. González 2435 e/Güemes y V. Alsina.	PCMR002	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	36,4	22,4%	42,1	42,4	34,7
MR003	Guemes 901 e/Bolivia y Paraguay.	PCMR003	-	4%	96%				X	PUELCHE	2	51,8	2,7%	52,8	54,4	51,3
MR004	Larralde 1341 e/J. Gonzalez y R. Gutierrez.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	2	33,9	1,5%	34,2	57,4	56,3
MR005	Int. Bossi 1080 e/Ecuador y Paraguay.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	40,2	18,1%	45,3	57,4	56,3
MR006	Int. Bossi e/Venezuela y Ecuador.	MR-TAN-MOR	-	8%	-	92%	-	TANQUE MORENO	-	PUELCHE	2	61,2	0,1%	61,2	57,4	56,3
MR007	Guatemala 2400 e/Güemes y Alsina.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	69,1	0,3%	69,2	57,4	56,3
MR008	Guatemala 2700 e/marmol y Colectora Gaona	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	70,2	0,4%	70,4	57,4	56,3
MR019	Int. Bossi e/Guatemala.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	66,8	4,8%	69,0	57,4	56,3
MR011	P. Ansaldo e/Blas Parera y M. Melo.	PCMR011	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	91,0	2,0%	92,3	84,8	82,5
MR012	M. Obarrio 2048 e/Alberdi y Rafael.	MRPC1	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	53,9	2,1%	54,7	44,7	44,1
MR046	Del Cañon/M. Obarrio e/San Carlos.	MRPC1	-	45%	-	55%	-	PLANTA CAG MORENO	-	PUELCHE	2	30,1	0,9%	30,3	44,7	44,1
MR013	Av. Perón e/Del Cañon.	PCMR013	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	74,7	4,3%	76,9	74,7	72,9
MR014	Alcorta 2500 e/Bouchard y Uruguay.	PCMR014	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	73,2	0,4%	73,4	59,1	55,7
MR015	Ameghino e/Centenario y Argentina.	PCMR015	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	83,1	0,5%	83,4	82,9	81,9
MR016	Callao e/Av. Alcorta y Mitre.	PCMR016	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	53,4	0,4%	53,5	61,6	57,4
MR017	Alcorta e/Haedo y Ramos Mejia.	PCMR017	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	62,1	0,0%	62,1	66,2	66,1
MR018	Misiones e/ Sta. Fe y D´errico.	PCMR018	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	76,1	0,1%	76,1	75,4	74,6
MR020	Alte. Brown e/25 de Mayo y Andrade.	MR01	-	2%	98%			BATERIA MR020-MR02		PUELCHE	2	105,0	0,0%	105,0	80,6	80,1
MR021	Alte. Brown e/Pio XII.	MR01	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	81,1	0,4%	81,3	80,6	80,1
MR022	Sanchez 4800 e/Ruta 25 y San Justo.	PCMR022-23	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	30,7	3,9%	31,5	31,2	30,6
MR023	Florencio Sanchez e/Gandhi y Solodes.	PCMR022-23	-	11%	89%	-	-	-	X	PUELCHE	1	31,6	0,0%	31,6	31,2	30,6
MR024	Costa Rica e/F. Sanchez y Solodes.	MR-TAN-PER	-	30%	-	70%	-		-	PUELCHE	2	54,7	4,1%	56,3	79,9	78,6
MR025	A.Storni 5600 e/Danubio.	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	65,7	3,0%	67,1	79,9	78,6
MR026	A. Storni 5900 e/Madariaga.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	83,9	3,2%	85,8	79,9	78,6
MR027	Ecuador 5700 e/La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	99,1	2,7%	101,0	79,9	78,6
MR029	La Plata e/Ruta23 y Camil.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-	TANQUE LA PERLITA	-	PUELCHE	2	92,5	2,8%	94,3	79,9	78,6
MR035	Gutierrez 5600 e/La Plata y Cost Rica.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	87,2	0,8%	87,7	79,9	78,6
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	80,6	2,5%	82,0	79,9	78,6
MR070	Honduras y Marquez	MR-TAN-PER	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	3	79,3	5,2%	81,8	79,9	78,6
MR072	Honduras y Gral. Madariaga	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	96,1	2,2%	97,6	79,9	78,6
MR028	El Salvador e/Chile y Mexico.	PCMR028	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	79,9	0,9%	80,4	80,0	79,5
MR030	Pedaell e/Ascasubi y Carnega.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	52,7	1,3%	53,2	50,4	48,5
MR031	R Rojas e/Libano y Gral. Pintos.	MR-TAN-TRU	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	30,3	4,9%	31,3	50,4	48,5
MR032	F. Sanchez e/Libano y Pitagoras.	MR-TAN-TRU	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	35,5	0,6%	35,6	50,4	48,5
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	TANQUE TRUJUI	-	PUELCHE	-	-	-	-	50,4	48,5
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	77,8	2,6%	79,2	50,4	48,5
MR051	Tablada e/Oribe y Puccini.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	77,3	0,3%	77,4	50,4	48,5
MR075	Diego de Villarroel y Cellerino Namuncurá	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	82,7	0,0%	82,7	50,4	48,5
MR036	Ruta 25 e/Cataliña.	PCMR036	83%	2%	15%	-	-	-	X	PUELCHE	1	33,3	0,0%	33,3	33,0	31,5
MR037	Giralde e/Pastor Obligado y Lavarden.	PCMR037	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	26,4	3,7%	27,1	26,3	25,4
MR040	Piovato 4132 e/Bochardo y Balcarce.	PCMR040	-	3%	97%				X	PUELCHE	2	45,3	0,8%	45,5	45,8	44,6
MR041	Dorrego e/Dorrego y Darat.	PCMR041	1%	2%	97%				X	PUELCHE	2	63,8	0,2%	63,9	63,8	62,7
MR042	1 de Mayo e/Alcorta.	PCMR042	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	82,0	1,8%	83,0	86,4	83,6
MR043	San Pablo e/San Cayetano.	PCMR043	5%	2%	93%				X	PUELCHE	2	37,2	0,4%	37,3	38,7	37,1
MR044	Piovano e/El Salvador y Venezuela.	PCMR044	-	2%	98%				X	PUELCHE	2	60,1	1,3%	60,6	62,9	62,3
MR048	Echeverría e/Darwin y Peron.	PCMR048	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR049	Sarratea e/Victoria.	PCMR049	-	2%	98%				X	PUELCHE	2	68,3	1,9%	69,2	69,8	68,2
MR050	Marcos Paz 1116 e/Iarrea y J.J. Urquiza.	PCMR050	10%	2%	87%				X	PUELCHE	2	87,0	5,0%	90,1	89,0	86,8
MR052	Arribeños e/Concordia.	PCMR052	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	2	70,3	0,3%	70,4	72,9	70,8
MR009	V. Alsina e/Libertador.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	80,2	2,1%	81,4	73,7	68,2
MR053	Córdoba E/Palo y Sheden.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%				-	PUELCHE	2	80,0	0,3%	80,1	73,7	68,2
MR054	Alvear e/Rafael Arco.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	57,0	2,2%	57,9	73,7	68,2
MR055	Córdoba e/V. Lopez y Linch.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	70,0	1,2%	70,6	73,7	68,2
MR056	Convalán 2733 e/B de Yrigoyen y Graham Bell.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%				-	PUELCHE	2	55,4	0,5%	55,6	73,7	68,2
MR057	Uruguay e/E. Rios y colectora.	MR-CIS-MOR	2%	4%	94%				-	PUELCHE	2	49,3	2,0%	50,0	73,7	68,2
MR058	Misiones 1970 e/ Moron.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	76,5	1,5%	77,3	73,7	68,2
MR059	Facundo Quiroga e/Moron y Yapeyu.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	73,7	68,2
MR060	Facundo Quiroga e/ La Tropilla y Quilmes.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MORENO	-	PUELCHE	2	87,7	1,4%	88,5	73,7	68,2

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MR061	Corvalán e/La Tropilla.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	80,4	0,1%	80,4	73,7	68,2
MR062	SAN_JUAN_BAUTISTA 2026 e/ Int. Corvalan Dean Funes	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	71,8	1,8%	72,7	73,7	68,2
MR063	Lincoln e/Soldado Derrico y E. Rios.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	73,7	68,2
MR064	Intendente Corvalan 2302 e/ Alvear y Alejandro Graham Bell	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	71,4	2,0%	72,4	73,7	68,2
MR095	Uruguay y Chictana.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	70,8	2,2%	71,8	73,7	68,2
MR097	Entre Rios esquina Abraham Lincoln	MR-CIS-MOR	2%	3%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	45,7	10,7%	49,1	73,7	68,2
MR100	Moron e/ Facundo Quiroga y Arribeños	MR-CIS-MOR	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	95,2	1,3%	96,1	73,7	68,2
MR101	Lincoln N°1644	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	3,1	48,7%	4,1	73,7	68,2
MR065	J.V. Gonzalez e/ Ruta 25 y Brasil.	PCMR065	-	5%	95%	-	-	-	x	PUELCHE	2	43,1	2,6%	43,9	43,7	43,6
MR067	Lobos e/La Tablada y Manzana 36.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	60,1	0,9%	60,5	48,6	38,1
MR068	Lafinur e/Lobos y 3 de Marzo.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	20,0	2,1%	20,3	48,6	38,1
MR069	Tablada e/Democracia y Colectora	PCMR069	12%	4%	84%	-	-	-	x	PUELCHE	2	20,1	3,2%	20,5	21,2	20,5
MR071	Shakespeare y Manuel Galvez	PCMR071	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	72,4	5,5%	75,2	84,8	79,2
MR073	Colombia y Ricardo Gutiérrez	MR-TAN-PER	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	72,2	5,4%	74,9	79,9	78,6
MR074	Colectora Acceso Oeste y Ecuador	PCMR074	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	51,3	3,4%	52,5	51,7	50,2
MR076	Hipólito Yrigoyen y San Luis	PCMR076	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	92,2	3,3%	94,3	92,9	88,1
MR077	Teniente Ibañez 3224	PCMR077	1%	2%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	3	82,2	2,2%	83,4	82,6	80,5
MR078	Alberti entre Marcos Paz y Vera	PCMR078	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	59,6	0,6%	59,8	89,3	70,8
MR079	Juana de Azurduy y San Cayetano	PCMR079	43%	2%	55%	-	-	-	x	PUELCHE	1	20,0	0,0%	20,0	39,6	38,3
MR086	Ecuador y Marquez de Aguado	MR-TAN-PER	-	4%	96%	-	-	-	x	PUELCHE	2	74,7	7,1%	78,4	79,9	78,6
MR088	Lobos entre Misiones y José Hernández	PCMR088	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	74,6	6,4%	77,9	78,4	76,1
MR089	Pavón y Gervasio de Posadas (Plaza del Estudiante)	PCMR089	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	67,4	2,6%	68,6	69,6	67,3
MR093	Mendoza y Jose Ingenieros	PCMR093	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	77,7	2,0%	78,8	77,8	77,5
MR098	Av. Luis Pasteur entre Facundo Quiroga y Arribeños	PCMR098	-	10%	90%	-	-	-	x	PUELCHE	2	50,8	6,8%	53,2	75,6	68,5
MR099	Marcos Paz entre J.J Urquiza y Larrea	PCMR050	-	100%	-	-	-	-	x	PUELCHE	-	-	-	-	89,0	86,8
MR104	Marcos Paz entre Larrea y Justo Jose de Urquiza	PCMR050	-	36%	64%	-	-	-	x	PUELCHE	-	-	-	-	89,0	86,8
MS025	Covara y El Pinar	MS_CIS_MUN	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	114,0	6,2%	119,0	34,6	29,6
MS026	Calle 200 y Riberalda	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-	BATERIA CIUDAD EVITA	-	PUELCHE	2	95,5	5,2%	99,7	34,6	29,6
MS027	Av. Central y Calle 500	MS_CIS_MUN	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	113,0	0,0%	113,0	34,6	29,6
MS034	El Tapeti y El Sauce	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	62,1	6,3%	65,7	34,6	29,6
MS042	Av. Central y calle 300	MS_CIS_MUN	97%	3%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	34,6	29,6
MS030	Las calas y Los balcones	MS32	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	59,0	1,5%	60,5	32,9	27,4
MS091	Las Orquideas y Las Gardenias	MS32	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	70,8	2,9%	72,2	32,9	27,4
MS092	Costanera y Las Calas - Al 22 de Enero	MS32	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	69,8	2,5%	69,8	32,9	27,4
MS105	Guayraca y Torquino	MS34	100%	-	-	-	-	-	x	PUELCHE	-	-	-	-	7,5	6,2
MS114	Mayoraco y Av. Costanera	MS35	100%	-	-	-	-	-	x	PUELCHE	-	-	-	-	6,4	6,3
PI001	J. B. Justo y Sanguinetti al 500.	PCPI001	-	4%	96%	-	-		x	PUELCHE	2	65,9	0,6%	66,2	65,3	57,4
PI002	J. B. Justo 615 y Posadas.	PCPI002	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	50,1	2,1%	50,8	49,9	48,2
PI003	Av. Tratado de Pilar 242 y Sanguinetti.	PCPI003	25%	35%	39%	-	-	-	x	PUELCHE	1	72,2	0,0%	72,2	72,8	64,1
PI004	Lagrave 84 (Yrigoyen y Pampa).	PCPI004	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	61,6	1,3%	62,1	62,0	42,3
PI005	Planta Champagnat.	PCPI005	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	68,7	1,2%	69,3	71,9	65,5
PI006	Rincón entre San Martín y Esteban Luca	PCPI006	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	77,8	1,8%	78,8	79,2	76,5
PI007	José María Paz 873.	PCPI007	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	52,2	1,4%	52,7	54,1	51,9
PI008	ITUZAINGO 331.	PCPI008	1%	3%	96%	-	-	-	x	PUELCHE	2	77,2	1,8%	78,2	75,5	75,0
PI009	Maipú y Vías F.F.C.C. San Martín.	PCPI009	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	41,6	9,9%	44,5	54,8	44,1
PI010	Gral. O´Higgins y Bergantín Congreso.	PCPI010	-	13%	87%	-	-	-	x	PUELCHE	2	25,8	12,6%	28,1	26,1	25,6
PI011	Juan Bautista Alberdi 1106 y 11 Septiembre	PCPI011	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	38,5	62,4%	55,5	57,1	39,9
PI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambrosetti.	PCPI012	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	36,6	0,4%	36,7	40,6	37,7
PI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Mapuche)	PCPI013	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	33,7	4,6%	34,8	39,3	35,7
PI014	Las Araucarias y M. Acosta.	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	48,1	0,6%	48,3	47,4	45,8
PI059	Ubicado dentro de predio Campo Suite II. frente a Parque Austral.	PIPC2	23%	77%	-	-	-	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	-	PUELCHE	-	-	-	-	47,4	45,8
PI067	Mariano Acosta y Los Alamos	PIPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	43,2	0,2%	43,2	47,4	45,8
PI089	Los Alamos y Av. Eva Perón	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	44,2	5,3%	45,8	47,4	45,8
PI015	Dr. Ignacio Pirovano 728 esq. Costa Rica	PCPI015	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	74,7	3,5%	76,5	58,2	57,5
PI016	Chacabuco 2130 e/Paraguay y Bolivia	PCPI016	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	73,5	0,7%	73,8	73,1	70,4
PI017	Tortugas Country Club	PCPI017	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	44,7	14,4%	49,2	52,3	44,9
PI018	Tortugas Country Club	PCPI018	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	36,8	3,5%	37,7	37,9	37,3
PI020	Tortugas Country Club	PCPI020	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	34,8	0,2%	34,8	35,7	34,8
PI021	Tortugas Country Club	PCPI021	1%	1%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	44,7	19,9%	51,0	51,9	40,6
PI022	Las Campanillas esq. Av. Highland Park	PCPI022	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	42,8	1,2%	43,1	54,2	46,1
PI025	Country El Carmel	PCPI025	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	50,9	2,4%	51,7	51,9	50,8
PI026	Las Amapolas. Villahaus - Country Ayres del Pilar	PCPI026	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	40,4	2,1%	41,0	40,5	40,3
PI035	Country Ayres del Pilar	PCPI035	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	61,0	2,0%	61,8	61,9	50,5
PI037	Country La Lomada	PCPI037	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	46,3	3,7%	47,5	46,4	45,6
PI040	Las Margaritas 1100 e/ Los Claveles y Las Rosas	PCPI040	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	55,7	2,3%	56,6	55,3	49,8
PI041	Las Glicinas 1080 (proximo a R8)	PCPI041	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	38,2	3,7%	39,2	39,3	38,2
PI042	Musladini 374. esquina Bergantín Independencia.	PCPI042	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	56,4	3,9%	57,9	55,2	43,4
PI043	Segui esq. Colectora Este Ramal Pilar	PCPI043	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	31,2	0,0%	31,2	31,8	30,7
PI044	Posadas 1635 e/J.V. Gonzalez y H. Ascasubi	PCPI044	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	48,1	1,3%	48,5	47,7	46,2
PI045	Country B° Campo grande	PCPI045	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	73,3	5,3%	76,0	71,0	70,7
PI048	Cjal. Dr. Martiegui 219. Plaza.	PCPI048	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	34,6	1,4%	34,9	63,3	43,6
PI049	Bergantín República y Bergantín Independencia.	PCPI049	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	33,2	0,2%	33,2	34,7	28,3
PI050	Av. Constitucion(R26) e/Nicaragua y San Salvador.	PCPI050	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	84,1	7,0%	88,2	82,1	80,6
PI051	Guatemala y R26.	PCPI051	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	28,8	33,2%	35,5	22,0	21,1
PI052	Guatemala 4300 esq. Alemania (MANUEL_ALBERTI)	PCPI052	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	57,2	0,6%	57,4	56,2	42,7
PI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ramón Gimenez.	PCPI053	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	39,6	58,9%	56,1	24,2	23,4
PI054	Leguizamon e Iluzaingo	PCPI054	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	34,4	39,3%	43,9	46,7	45,3
PI056	Ameghino y Colectora Oeste	PCPI056	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	51,4	2,2%	52,2	52,7	48,1
PI058	Nicaragua 1250 e/Haiti y Santo Domingo	PCPI058	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	71,8	2,5%	73,0	73,0	69,4
PI061	RN 25 y Chubut	PCPI061	4%	24%	71%	-	-	-	x	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI062	Panamá y Alejandro Korn	PCPI062	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	22,9	1,2%	23,1	23,9	23,1
PI063	Patagones y Tagle	PCPI063	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	42,4	3,3%	43,4	73,2	52,0
PI064	Andes y Avda. Patricias Argentinas	PCPI064	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	26,6	3,5%	27,2	26,4	25,6
PI065	Goleta Constitución y Fragata Sarmiento	PCPI065	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	36,7	79,3%	57,2	44,6	29,1
PI066	Calle s/n e/ Haiti y Santo Domingo	PCPI066	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	35,9	40,6%	46,2	55,2	49,6
PI068	Alazan e/Overo y Picasso- Highland Park	PCPI068	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	38,4	3,9%	39,4	38,9	37,2
PI070	Paraguay y Tierra del Fuego	PCPI070	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	52,6	2,7%	53,6	53,4	49,8
PI075	Guatemala y Levene	PCPI075	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	39,3	2,5%	40,0	39,1	37,2
PI076	Gallo y Vasco Da Gama	PCPI076	-	-	100%	-	-	BATERIA PERUZZOTTI	-	PUELCHE	2	16,9	12,6%	18,4	21,4	19,0
PI078	Vasco Da Gama entre Hermita y Camino Comercial	PCPI076	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	26,6	1,1%	26,8	21,4	19,0
PI080	Monseñor D´Andrea y La Carreta	PCPI080	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	51,7	9,4%	55,1	53,1	46,9
PI084	Chubut y San Ignacio	PCPI084	-	20%	80%	-	-	-	x	PUELCHE	2	63,9	3,2%	65,3	64,3	55,0
PI100	Calle Sarmiento e/ Bahía Grande y Bahía Redonda	PIPC1	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	18,3	7,4%	19,2	14,2	13,6
PI101	Ruta 234 y Bahía Darbel	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	4,6	32,6%	5,6	14,2	13,6

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	NITRATOS [mg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
PI102	Calle Henry Martin y Bahía Darbel	PIPC1	-	1%	99%	-	-	BATERIA DERQUI	-	PUELCHE	2	16,2	89,8%	26,4	14,2	13,6
PI103	Cerrito 3287 e Isla Gran Malvinas	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	8,2	11,3%	8,8	14,2	13,6
PI105	Libertad e Isla Candelaria	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	4,5	49,3%	6,0	14,2	13,6
QU037	345 y 383	QU37	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	29,1	0,0%	29,1	6,2	4,7
QU076	Cno. G. Belgrano y Av. Mosconi	QU08	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	53,6	0,8%	53,8	59,8	45,8
QU136	Calle 866 Esq. D. Alvarez	QU07	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	35,4	0,8%	35,6	51,2	45,8
QU141	Calle 863 Esq. Donato Alvarez	QU07	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	54,8	0,0%	54,8	51,2	45,8

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
AB057	P. Echagüe y Serrano	AB14	-	1%	-	99%	-	PLANTA - AB057	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB061	Laprida Narciso 1900	AB23	5%	6%	89%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB063	Laprida Narciso 3001	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB064	Juan B. Justo 2050	AB23	17%	6%	77%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB065	Juan B. Justo 2700	AB23	8%	-	92%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB066	Juan B Justo 2101	AB23	19%	45%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB067	Juan B. Justo 2802	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB068	Av. Ceballos (400) a 700 mts de Avda. República Argentina	AB23	21%	27%	52%	-	-		-	PUELCHE	3	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB070	Francisco N. Laprida y Muesca	AB23	8%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB071	Narciso Laprida 2301	AB23	17%	69%	14%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB073	República Argentina 6670	AB23	6%	8%	86%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB074	Rep. Argentina y Juan B. Justo	AB23	14%	8%	78%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	AB23	9%	34%	56%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB076	Republica Argentina 7570 e/ Juan Jose Castro y Alice	AB23	20%	29%	51%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB084	Espoile s/n	AB23	3%	48%	49%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB085	Leyes y Romero	AB23	36%	16%	48%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB086	Romero y Calderón	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB087	Calderon 1251	AB23	24%	25%	51%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB088	Calderón 1851	AB23	53%	36%	11%	-	-	BATERIA GLEW	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB089	Calderón 3000	AB23	1%	98%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB090	Calderon 3400 1848	AB23	10%	14%	76%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB091	Calderon 3650 1848	AB23	15%	49%	36%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB092	Brigadier Calderón e/ Lezica y Young	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB093	Brigadier Calderón e/ Young y Av. Eduardo Holmberg	AB23	13%	19%	68%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB094	Romero 3800	AB23	1%	9%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB095	Lemos 3800	AB23	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB098	Rocha y J.A. Casacuberta	AB23	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB099	Fernando Lahille y M. Acosta	AB23	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB100	Gral. Cardenas y Almte. Irizar (Plaza)	AB23	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB101	Agustín Barrios y Virrey Cevallos	AB23	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB102	Martiniano Leguizamón entre 25 de Mayo y F. Alvarez	AB23	2%	1%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB105	Av. Juan B. Justo e/ AV. República Argentina y Av. Espora	AB23	4%	1%	95%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB106	Pablo Podesta y Orillia Rico	AB23	10%	85%	5%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB107	Fernando Ochoa y Juan Sarciore	AB23	19%	75%	6%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB108	Rufino Cordoba y Cesar Ratti	AB23	23%	75%	2%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB109	Luis Viale y Enrique de Rosas	AB23	12%	75%	13%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB110	Boulogne Sur Mer y Antonio Luis Beruti	AB23	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB601	King y Bouchard	AB04	55%	8%	37%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
AB728	B° Segba (D. Rocha y Paraguay)	PCAB728	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB103	MALVINAS_ARGENTINAS y Dr. Chiesa	PCAB103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
AB096	Manuela Pedraza 1209	ABPC1	-	1%	-	99%	-	PLANTA RAYO DE SOL	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
AB097	Santiago del Estero 3075	ABPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE001	Las Heras y Guillon	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE002	Rivadavia y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE003	Origone y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE004	Las Heras y Chacabuco	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE005	Terrarosa y Colon	EEPC1	-	14%	86%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE015	Dorrego y Dreyer	EEPC1	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE027	Maipú y Colón	EEPC1	-	30%	70%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE028	Lavalle y Maipú	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE029	Lavalle	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE030	Lavalle	EEPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE031	Lavalle	EEPC1	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE032	Lavalle	EEPC1	-	10%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE033	Lavalle	EEPC1	-	66%	34%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE034	Maipú	EEPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE035	Ventura Avila	EEPC1	-	5%	95%	-	-	BATERIA LA LATA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE036	Ventura Avila y Calle 13	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE040	Ventura Avila	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE041	Ventura Avila	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE042	Ventura Avila	EEPC1	-	20%	80%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE043	Juana de Arco	EEPC1	2%	39%	59%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE044	Juana de Arco	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE045	Juana de Arco	EEPC1	4%	5%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE046	Lavalle entre Tomquist y Bragado	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE047	Martin Fierro a 700mts de S6	EE21	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE048	Martin Fierro a 700 m de Vazquez	EE21	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE057	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EEPC1	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE058	Avila Ventura 3000	EEPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE059	Avila ventura 3400	EEPC1	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE060	Los Claveles y General Las Heras	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE070	Colon y Maipú	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE064	Puan y Pablo Pizzurno	PCEE064	25%	2%	73%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE013	Cap. Lozano y Ascasubi	EE05	-	3%	-	97%	-	PLANTA - EE013	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EE065	Pedro Arocena y E. de Laperriere	-	-	100%	-	-	-	BATERIA SANTA ISABEL	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE066	Amado Nervo y San Pedrito	-	50%	20%	30%	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE073	Villegas esq. Colón	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE049	Martin Fierro y Vazquez	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE050	Vazquez a 700 m de Martin Fierro	EE21	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE051	Martin Fierro y Dolores	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE052	Martin Fierro a 1300m de E. Vazquez	EE21	-	46%	54%	-	-	BATERIA BAFICO	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE054	Martin Fierro y Dreyer	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE055	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EE21	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE061	República de Costa Rica y Libertad	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE062	El Ceibo y Fraga	EE21	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE063	Alvarez de Toledo y Miguel Angel	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EE006	Almafuerte e/Andrare y Obligado	EE03	39%	1%	-	60%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EE007	R. Dario y M. Cane	EE03	1%	1%	-	98%	-	PLANTA BARRIO UNO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EE038	Av. Tte. Gral. Morillas a 1000 mts de La Horqueta	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EE039	Tte. Gral. Morillas s/n - Villa Ntra. Sra. Del Rosario	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEN001	Lago Garcia 3901 y Los Andes	EEPC4	-	1%	99%	-	-	POI 9 DE ABRIL	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN002	Pedro Coni 3401e/Oliver y sanciniena	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN003	Palleros 1700 /S. Nicolas y Mte. Grande	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN005	Sansinena 601 e/ Huergo y 9 de julio	EEPC4	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN006	Caseros 580 e/Huergo y 9 de Julio	EEPC4	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEN007	Sarmiento 2700 e/Tricotti y Barros	EEPC4	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN008	Ing. Huergo 2500 e/Petraca y Sastre	EEPC4	5%	11%	84%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN009	Pto Deseado 601 e/Huergo y 9 de abril	EEPC4	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN010	Ing. Huergo 1600 1842	EEPC4	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN012	M.Alegre 992 e/Gomez y Vernet	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN013	Tricotti 10 e/Malvinas y Barros	EEPC4	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN014	Cnel. D° Elia 190 e/Palleros y Constanzo	EEPC4	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN015	Constanzo 2090 e/P. Argentino y Rivero	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN016	Tierra del Fuego 179 e/Constanzo	EEPC4	15%	1%	84%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN018	Constanzo 1229 e/Guarany y Crespo	EEPC4	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN019	Prayones 3150 entre Palleros y Lopez	EEPC4	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN021	Rebizo 1100 e/ Fair y Crespo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN026	M.Alegre 1720 e/Alegre y Urquiza	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN059	Enrique Banch y Rebizo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN020	Sansinena 105 e/ Doclout y Constanzo	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN022	Sansinena e Vernet y Benavidez	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN023	Benavidez 3190 e / F.Lopez y Scaglia	EEPC4	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN027	Fernadez y Dicio	EE23	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN028	Rivero y Chimondegui	EE23	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN029	Av. Fair y Primera Junta	EE34	-	22%	78%	-	-	BATERIA CORREO ARGENTINO	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEN030	Cervetti y Av. Fair	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN031	Cervetti y La Horqueta	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN032	Av Fair e Islas Trinidad	EE34	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN033	Urbano González e Independencia	EE31	-	1%	99%	-	-	BATERIA SANTA CATALINA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN034	Alberto Grande a 38m de las vias	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN035	Casacubierta e/Valette y Gonzalez	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN036	Lima e/Valette y Francia	EE31	8%	2%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN037	Cepeda y de los Constituyentes	EE31	-	46%	54%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN038	Lago Garcia y Cepeda	EE31	-	23%	77%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN039	Cepeda y Alberto Grande	EE31	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN040	Lago Garcia a 50m de Valette	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN041	9 de Abril e/Valette y Wieman	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN042	Las Talitas e/Sarmiento y M.Alegre	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN043	Avellaneda e/Trangoni y C. Monte Grande	EE31	64%	36%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEN044	Bruzzone e/Foz y Gonzalez	EE31	1%	1%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN045	Bruzzone e/Tte. Alberto Grande	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN046	Bourquet e/ Amaghino y Gabastón	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN047	Juan M. de Rosas t Tte. Gabaston	EE31	9%	13%	78%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN048	Robertson e/ J. Newbery y T. Matienzo	EE31	1%	4%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN049	J. A. Roca y Est. Los Remedios	EE29	-	4%	96%	-	-	BATERIA SAN IGNACIO	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN050	Los Robles y T. A. Edison	EE29	30%	5%	65%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	EE29	27%	2%	71%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN052	20 de Junio y L. Lopez	EE29	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEN053	Cichero 700 e/ Hipolito Bouchard y Julio Argentino Roca	EEPC5	-	1%	99%	-	-	BATERIA LA MORITA	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN054	Destacamento Melchior 733	EEPC5	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEN056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEN058	Fray Luis Beltran 1415	EEPC5	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EET001	Falucho y Las Dalias	EEPC2	-	81%	19%	-	-	BATERIA TRISTAN SUAREZ	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EET004	Av. Saenz Peña y Bogado	EEPC2	-	75%	25%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEU001	Maipu 800 e Bransen Hussay B.	EE20	-	25%	75%	-	-	BATERIA UNION	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEU002	San Bernardo 980 e/ Balcarce P Moreno	EE20	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEU003	Los Robles al 5000	EE24	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEU004	Los Robles al 5700	EE24	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEU005	S.Cabral a 200mts de Lacarra	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEU006	S.Cabral 3588 a 700 m de EEU005	EE26	-	62%	38%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEU007	S.Cabral a 700mts de EEU006	EE26	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEU008	Sgto Cabral 5149 e/ Gral. Antonio Gonzalez y Jose Alvarez Condarco	EE26	2%	2%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEU011	Sgto. Cabral a 700 m de EEU010	EE32	-	45%	55%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEU012	Calle s/n a 700 m de Sgto. Cabral	EE32	-	99%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	EE32	-	35%	65%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEU014	Juana de Arco a 700 m de S20	EE24	-	51%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEU015	Lacarra y 9 de Julio	EE32	-	33%	67%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEU016	Av. Maipu 40 esq. RP58	EE32	-	84%	16%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEU017	Av. Maipu 40 esq. RP59	EE32	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEU018	Andromaco 80 e/ Jose Champagnat	EE32	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEU019	Montes de Oca 80 e/Ruta Prov 58 y Jose Champagnat	EE32	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEU020	Vieytes 9 entre Mariano Castex y José Champagmat	EE32	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEU021	Sobre Sargento Cabral a 700m del EEU011	EE32	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEU022	Juana de Arco S/N	EE32	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEU023	Los Robles 249	EE32	-	76%	24%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEU025	Sgto. Cabral a 100 mts de Cáceres	EE32	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEU026	Juana de Arco N° 7100	EE32	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
EEZ001	Río Bermejo y Río Gualeguay	EE28	-	3%	-	97%	-	PLANTA LA CELIA	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ002	Río Bermejo y La Atlántica	EE28	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ003	Las Hortensias Norte	EE22	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EES001	25 de Mayo 2371	EZPC1	100%	-	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EES004	Rosario y Palacios	EZPC1	16%	4%	80%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ006	Caminito 1200	EZPC1	31%	52%	18%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ007	Caminito 1900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ010	Paso de los Libres 1800 e Islas Cook	EZPC1	41%	1%	58%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ011	Falucho y Paso de los Libres	EZPC1	24%	7%	68%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ012	Paso de los Libres a 700m de Falucho	EZPC1	18%	1%	81%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ013	Paso de los Libres 1400	EZPC1	39%	1%	61%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ014	Paso de los Libres 1500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ015	Paso de los Libres a 1700 mts de RP N°52	EZPC1	27%	1%	73%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEZ016	Mariano Moreno a 200m de Falucho	EZPC1	15%	48%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ017	Moreno 3500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ018	Paso de los Libres 900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ019	Ruta Provincial N°52 4000	EZPC1	25%	1%	75%	-	-	BATERIA EZEIZA	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ020	RP N° 52 1000	EZPC1	34%	7%	59%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ021	RP N° 52 1200	EZPC1	25%	2%	73%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ022	RP N° 52 s/n	EZPC1	4%	23%	72%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ023	RP N° 52 1300	EZPC1	6%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ024	Ruta N°52 kilómetro 2	EZPC1	5%	3%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ025	Fariña 2000	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ026	Valle de Río Negro y América del Norte (PA.Ezeiza)	EZPC1	-	-	100%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ027	Cañada de Gomez y 25 de Mayo	EZPC1	16%	17%	67%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ028	Quito y Arroyo	EZPC1	11%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ029	Valle de Río Negro y América del Norte	EZPC1	14%	9%	77%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ030	D. F. Sarmiento y Roger Balet	EZPC1	34%	18%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ031	Roger Balet y Sargento Cabral	EZPC1	14%	17%	69%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ032	Valle de Río Negro y 25 de Mayo	EZPC1	22%	52%	27%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
ES022	Scalabrini Ortiz e/Ing. Pablo Marin y 1° de Mayo.	PCES022-24	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ES023	Islas Malvinas e/Constituyentes y Pablo Marin.	PCES022-24	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ES024	Scalabrini Ortiz y Av. Patricias Argentinas.	PCES022-24	-	1%	-	99%	-	TANQUE FONAVI	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV002	San Martin y San Juan	FV-TAN-CEN	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV003	Constitución 198	FV-TAN-CEN	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV004	Carriego y Alem	FV-TAN-CEN	-	53%	-	47%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV005	San Martin y Defensa	PCFV005	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	PCFV006	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV007	Cariboni N° 2351 e/ Chaco y Rosario	PCFV007	-	14%	86%	-	-		x	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV009	Cariboni y Rio Bermejo	PCFV009	-	3%	97%	-	-		x	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV011	Corrientes esq. 12 de Octubre	PCFV011	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV013	Av.Bélgica N° 1101 esq. Jorge Novak	PCFV013	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV014	J.D. Perón 535 y Pringles	PCFV014	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV018	Av. Eva Perón y Gral. Hornos	PCFV018	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV019	Río Caraguata n° 1401 y Directorio	PCFV019	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV020	Cabildo y Eva Perón	PCFV020	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV021	Mantovani y Calle 1407	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV022	Juan Mantovani 587 e/ C.1423 y C. 1409	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV023	Mantovani y Calle 1429	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV025	Calle 1423 (901) a 400 mts de Mantovani	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV040	1439 y Juan Mantovani.	FV-TAN-CRU	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV064	C. 1439 e/ C.1420 y a 300 mts de Juan Mantovani	FV-CIS-SAR	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV065	Eva Perón N° 9695 y C. 1423	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV066	Avenida Eva Perón y Calle 1352	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV084	1610 e/RP 53 y 1647	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV085	1653 e/Av. La Plata y A° Las Conchitas	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Suecia	PCFV112	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV120	Calle 1404 N° 498 e/ R.P. 53 y campo	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO SARMIENTO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV121	Av. Gral. Savio N° 598 esq. Sicilia	FV-TAN-MAY	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV124	E.B. SARMIENTO	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV132	Calle 1426 esq. 1437 – B° San Francisco Grande (oeste)	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV147	Av. La Plata 50	FV-CIS-SAR	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV149	Av. La Plata y Calle 1305	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV156	Calle 1433a y 1418	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV157	Calle 1443 y 1430	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV158	Calle 1440 a 400m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV159	calle 1440 a 1000m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV160	calle 1452 y RP53	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV166	Calle 1440 y 1455	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV024	Eva Peron y Calle 1409	FV-CIS-SL	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	3	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV036	Calle 1422 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV037	Calle 1432 N° 901 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV041	Calle 1335 N° 801 y 1328	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV042	Calle 1316 y 1333	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV045	Los Inmigrantes y Calle 1355	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV050	Av. Eva Perón N° 7700 e/1310 y Cacheuta	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV087	1364 N° 1082 esq. 1317a	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV088	1327 N° 3201 e/ 1364 y 1370	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO SAN LUIS	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV089	1356 N° 1700 e/ 1347 y 1349	FV-CIS-SL	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV086	1374 N° 900 esq. 1313	FV-CIS-SL	-	28%	72%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV092	1345 e/Av. La Plata y 1364	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV104	Calle 1363 N° 100 y Los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV116	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV130	Calle 1341 N° 511 esquina calle 1310	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV134	Los Inmigrantes y calle 1363	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV143	Calle 1328 y 1355	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV177	Calle 1347 a 58 mts de Av. De los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV026	Calle 77 y Posadas	FV02	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV027	El Zonda y El Gaucho	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV028	Riobamba N° 1501 y Olivero	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV029	Pte. Illia y Alvear	FV02	-	1%	99%	-	-	BATERIA SAN NICOLAS	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV097	Castelli N° 1001 esq. EE.UU	FV02	-	43%	57%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV152	El Apero entre Calle 437 y El Malambo	FV02	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV174	Castelli esquina EEUU de América	FV02	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	FV-TAN-MAY	-	12%	-	88%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV031	Virgen del Valle y El Clavel	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV032	Virgen del Valle y La Ancianidad	FV-TAN-MAY	-	23%	-	77%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV033	Virgen del Valle y Río Pilcomayo	FV-TAN-MAY	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV034	Av Cacheuta y Boston	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-	TANQUE MAYOL	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	FV-TAN-MAY	-	11%	-	89%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV053	Cacheuta 2701 y Calle 1353	FV-TAN-MAY	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV063	Av Eva Perón 5880	FV-TAN-MAY	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
FV038	Calle 1423 e/ 1422 y 1428	PCFV038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV046	Batalla de Ituzaingo 2780 e/ Contreras y C.214A	PCFV046	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV047	Boedo e/ Montserrat y Túnez	PCFV047	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV048	León XIII e/ Pte. Perón y Beirut	PCFV048	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV049	San Antonio e/ Irala y Alvar Cabeza de Vaca	PCFV049	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV051	Cacheuta 3601 y 1371	PCFV051	-	31%	69%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV055	Calle 832 e/M.Grass y Piedrabuena (V.A.)	PCFV055	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV057	Virgen del Valle N° 2599 y Chaco	PCFV057	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV058	Juan B. Justo y Arcasubi	PCFV058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV059	Av.Bosques y Ruta 36	PCFV059	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV060	Delgado y Cafferatas	PCFV060	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV062	Calle 740 y El Clavel	PCFV062	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV067	Calle 1108 N° 1702 e/ 1131 y 1139	PCFV067-70	-	23%	77%	-	-	BATERIA ING. ALLAN	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV068	Calle 1108 N° 2280 esq. 1139	PCFV067-70	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV069	Diag. Los Quilmes N° 500	PCFV067-70	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV070	Calle 1108 N° 2300	PCFV067-70	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV148	Calle 153a 301	PCFV148	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV167	Calle 1145 y Calle 1122	PCFV067-70	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV071	San Nicolás N° 2501 y Chaco	PCFV071	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV072	Finochietto N° 1411 y Fracción V	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO CRUCE VARELA	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV073	C.O.Cruce	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV074	Carlos Gardel N° 700 y Campichuelo	FV-TAN-CRU	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV142	Dardo Rocha y Cerro Famatina	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV078	Bruselas y Polonia	PCFV078	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV079	Bruselas y Bulgaria	PCFV079	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV080	517 N° 1700 y Portela	PCFV080	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV082	El Paisano N° 1899 e/445 (B° Don José Planificado)	FV-TAN-P82	-	1%	99%	-	-	BATERIA DON JOSE PLANIFICADO	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV131	El Malambo N° 105 esq. La Tranquera	PCFV131	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV165	Calle Monteverde e/445 y 449	PCFV165	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV090	Av. La Plata N° 1200 e/1327 y 1319a	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-	BATERIA LAS COLONIAS	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV093	1681 esq. 1608	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV094	1364 N° 2592 e/ 1371 Y 1357	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV144	La Plata 1700	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV146	Calle 1353 4100	PCFV090-94	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV176	Calle 1608 entre 1671 y 1673	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV095	Pisani N° 1101 esq. Suecia	PCFV095	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV096	Humahuaca N° 501 y 511	PCFV096	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV098	Cno. Touring Club N° 1499 y Canalejas	PCFV098	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV100	228-Gral Perón N° 1501 y Bs. As.	PCFV100	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV102	V.Abrille N° 975 casi esquina Calle 519	PCFV154	-	6%	94%	-	-	BATERIA SAN JORGE	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV154	La Paloma y calle 560	PCFV154	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV103	Cicilia N° 2020	PCFV103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV105	Calle 527 e/ 554 y 554A	PCFV105	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV106	Calle 554 N° 1103 e/ Diag. Jarilla	PCFV106	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV108	Calle 1348 N° 1003 e/ 1317 A y 1319 A - (B° San Francisco Este)	PCFV108	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV109	Calle 1435 N° 1719 esq. 1434 - (B° San Francisco Oeste)	PCFV109	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV110	Las Lengas N° 2303 e/ El cardenal y El Zorzal - (B° Santa Inés)	FV01	-	7%	93%	-	-	BATERIA GOBERNADOR COSTA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV111	Los Alamos N° 2502 e/ Av. Blas Parera y El Homero - (B° Santa Inés)	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV150	El Nandú e/ Las Casuarinas y Los Alamos	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV151	Los Lapachos y Tinkunaku	FV01	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV161	Los Laureles y El Cardenal	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV162	La Paloma y Los Sauces	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV163	El Mirlo entre Los Olivos y Los Lapachos	FV01	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV113	Bonn N° 1203 y Austria	PCFV113	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV114	Calle 531 N° 2200	PCFV114	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV115	Progreso 2190 e/ Intendente Jose Luis Cariboni y virgen de valle	PCFV115	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV117	Lourdes N° 402 y Ruta Prov. N° 53	PCFV117	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV119	Suecia N° 1601 esq. Lisboa	PCFV119	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV122	Copenhage N° 502 esq. Alemania	PCFV122	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV123	Calle 172 - Río Negro N° 1790 esq. Alvarado	PCFV123	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV125	Bourel y Chacabuco	PCFV125	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV126	Riobamba y Vías	PCFV126	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV127	Calle 1151 A y Calle 1130	PCFV127	-	46%	54%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV128	Río Diamante N° 3080 esquina Villegas	PCFV128	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV129	Río Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	PCFV129	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV133	Calle 1151 y Calle 1118	PCFV133	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV137	San Geronimo 605	PCFV137	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV138	Campana y Esmeralda	PCFV138	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV139	Guamini 2711	PCFV139	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV140	San Martin y Monteagudo	PCFV140	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV141	Alfonsina Storni 74	PCFV153	-	2%	98%	-	-	BATERIA BARRIO ALTAMIRA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV153	Florida y Miguel Canè	PCFV153	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV145	Av. Cacheuta entre Calle 1363 y Calle 1371	PCFV145	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV164	calle 1155 y 1138	PCFV164	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV168	Calle 1149 y Calle 1136	PCFV168	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV169	Calle Jacinto Benavente y E, D Amicis	PCFV059	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV175	Santa Lucia y Aconquija	PCFV118	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FV178	Av. Bosques y calle 819	PCFV178	-	50%	50%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV183	Remedios de Escalada esquina Carmen de Areco	PCFV183	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV184	Turquia, entre Bruselas y Milán	PCFV184	-	6%	94%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
FV191	Rumania entre París y Paysandú	-	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	4%	-	96%	-	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU002	Colombia 1007 e/Av. De las Americas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU005	Bogado 800 e/Islas Malvinas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU007	Republica Argentina 578 e/Venezuela.	GU-TAN-PED	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU008	Brasil 103 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU020	Remedios de Escalada e/Tomas Guido y Godoy Cruz	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU031	Brasil y Mesopotamia	GU-TAN-PED	-	17%	-	83%	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
GU032	Avenida 38 entre calle 5 y 6	GU-TAN-PED	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
GU010	Violeta Antier 5095 e/Santos Discepolo.	PCGU010	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU011	Alfonso Amat 4611 e/Jose Negila.	PCGU011		100%					X	PUELCHE	-					
GU012	Calle 117 1000 / Av. C. Mereles 1050 e/calles 118 y 120.	GU-TAN-YA	3%	1%	-	96%	-	TANQUE ESTE - LA YAYA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU013	Calle 118 N° 1633 e/calles 121 y 123.	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU014	Cjal. Capuano 490 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU015	Calle 118 2041 e/calles 127 y 129.	GU-TAN-YA	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU016	Calle 118 2471 e/calles 133 y 135.	GU-TAN-YA	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU017	Av. 139 N° 510 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU023	Calle 103 y Calle 124	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU024	Calle 116 y Av. 99	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU018	Av. 21 N° 1099 e/calle 36.	GU01	-	3%	97%	-	-	BATERIA LAS LOMAS	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU019	Cjal. Placido Bajo N° 901 e/ calle39.	GU01	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU006	Av. Nestor Kirchner 630 e/Avellaneda y Güemes.	GU02	1%	25%	74%	-	-	BATERIA B° SANTA MAGDALENA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU021	Roque Saenz Peña y Santa Elena	GU02	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU022	Dorrego y Luis A. Testa	GU02	2%	12%	86%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
GU025	Calle 6 y Tte. Juan Domingo Baldini	PCGU025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
GU026	Kingston y Honduras		10%	89%	1%			BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	-	PUELCHE						
GU027	Brasilia y Guayanas	-	2%	89%	9%				-	PUELCHE	-				-	-
GU028	Puerto España y Brasilia	-	10%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU029	Gral Paz esCalle 7 y Lib. Gral J. de S.Martin		11%	89%					-	PUELCHE						
GU030	La Rioja e/ Av. Hipólito Yrigoyen y Sarmiento	-	11%	89%				BATERIA NUMANCIA	-	PUELCHE						
JCP002	Wilde 4573 e/Corbeta Uruguay y Fragata Sarmiento	JCP-TAN-PR	-		-	100%	-	TANQUE PRIMAVERA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
JCP003	Av. Deqiue e/ Av. Pres. Hipólito Yrigoyen	JCP-TAN-PR				100%			-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
JCP005	Las 3 Marías 5700 e/ Av. Jose Alube y Jose C. Paz	JCP-TAN-PR	-	1%		99%			-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
JCP006	Calle Pampa de Junin a 50 m de Yrigoyen	JCP-TAN-PR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO046	Ferro Nuevo y Guanabara	LMO03	100%						X	PUELCHE						
LMO047	Colect.R3 y Huillanimi B° Playa Lebon	LMO03	100%						X	PUELCHE						
LMO049	Escribano y Colden B°El Pino	LMO27	100%						X	PUELCHE						
LMO053	Haidi y Galileo - Haidi y Torres	LMO08	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO054	Luciano Torres N° 600 y Sarrión Perez B° San Enrique	LMO08	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO056	Guanacache y Pino B° Recoleta	LMO07	72%		27%				X	PUELCHE					< 0,5	< 0,5
LMO060	Huemul y Rodney B° Maria Elena	LMO02	-	100%					X	PUELCHE						
LMO064	Urdaneta y Rodney B° Maria Elena	LMO02	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO066	M.Garrido e/ Colegiales (EC Colegiales y M. Becerra)	LMO11	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO070	M.Garrido e/ S. Favardo y Rocamora B° 17 de Octubre	LMO11	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO072	J. De Atapén y Solá. Favardo B° 24 de febrero	LMO11	-	2%	98%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO073	J. De Atapén y Solá. Favardo B° 24 de febrero	LMO11	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO074	Echauri N° 3200 e/ J.B.Justo y Vidal	LMO14	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO075	Lavalleja y Conde	LMO26	-	2%	98%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO076	N de Balboa y Lujan.	LMO26	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO077	Castañon y Rio Cuarto B° El Porvenir	LMO09	-	2%	98%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO078	Zequeira garcia E/ Favardo y Rocamora	LMO02	-	-	100%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO079	Urdaneta y Rocamora (E/ T de Rocamora y Del Tejar)	LMO02	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO081	Echauri e/ Ortega Zyrni Villa Scasso	LMO14	-	-	100%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO083	Quiroz N° 900 E/ Riva 21 /Cleno y Draqones	LMO24	10%	1%	89%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO085	Martinez y Lasalle	LMO24	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO087	Reseno e/Acasuso y Alagon	LMO11	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO094	A Vivas 700 y Guanabara E/ Guasayan y Morris B° Playa Lebon	LMO03	96%	2%	2%				X	PUELCHE	-				-	-
LMO095	Mantequeras N° 6100 e/Humanao y Acoate	LMO04	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO096	M.Herrero e/ Guanacache y Eder - B° el Tobin	LMO03	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO098	E. Clay (e/ Medrano y Puerto)	LMO24			100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO099	Hugo West e/ Madreselva y milamores	LMO29	98%		2%				X	PUELCHE	-				< 0,5	< 0,5
LMO101	Scrivti y Gallardo	LMO10	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO108	Lavalleja N° 6100 e/ Alegria y Arcon	LMO10	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO109	Gamay y Perichi	LMO24	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO112	Fernandez y progreso B° Candiati	LMO08	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO118	El Reseno 3351/e1 Ortega v Zequeira	LMO46	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO121	L. Da Vinci 4000	LMO09	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO123	Tinogasta y Colegiales	LMO09	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO124	Marcos Paz y Colegiales	LMO47	84%	16%					X	PUELCHE	-				-	-
LMO125	Corrales, Pje N° 1100 y Espejo	LMO03	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO126	Arcon al 3564 esquina Zinny	LMO26	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO127	Castin 4000 esq. J.B. Justo	LMO09	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO139	Cavenaille 3600 e/ Simon Perez y Rivas	LMO08	-	100%					X	PUELCHE	-				< 0,5	< 0,5
LMO140	Castro e/ Cepeda y Saraboa	LMO26			100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO143	Scrivti y Arcon	LMO25	100%						X	PUELCHE	-				< 0,5	< 0,5
LMO146	Dragones y Reconquista	LMO08	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO158	Almacno y Agrelo	LMO46	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO161	Ayax, Mauvel y Bacon - Lopez Fte N° 5900	LMO16	-	2%	98%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO164	Saenz y Oyarzun	LMO08	-	4%	96%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO170	Arcon y Alegria E/ Fournier	LMO16	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	0,6	12,9%	0,6	-	-
LMO172	J.E Echauri y Donuerb E/ Alagon	LMO09	-	3%	97%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO175	Baez y Bavio	LMO16			100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LMO177	Baez y Barrientos	LMO34	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO179	Coronel Conde e/ Martinez Villena y Martin Coronado	LMO48	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO180	Machain esq. Puerto Argentino	LMO08	-	3%	97%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO187	Dto Argentino y Cons. del Valle	LMO26	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO189	Leones Entre Garay y Conde	LMO26	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO191	Icalma esq. M. Arias	LMO26	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO192	Tidoal entre Barrientos y Barataari	LMO48	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO193	Jachal esq. Juan Pio Gana	LMO48	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO195	Escuela entre Iguazu y Gallardo	LMO08	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO197	Scarlatti e/ Villanueva y Monteoru	LMO25	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO198	Enrique Clay y M. Doello	LMO61	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LMO957	Guevnos 127/16 E/ San Ignacio y San Juan	LMO04			100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LO025	M. Piaggio y Olleden	LO05	64%	2%	33%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5		
LO042	Santa Lucia e H.Yrigoyen	LO01	-	1%		99%		PLANTA - LO042	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO067	De la Peña y Moldes	LO04	-	-	-	100%	-	PLANTA - LO067	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO072	Timbó y Cap. Moyano	LOPC1		2%		98%		PLANTA - LO072	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO078	Arenales a 100m de J. Ingenieros	LOPC1	-	9%	91%				-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO079	Arenales a 300m de L.M.Drago	LOPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO080	Juan witi 2400 entre L.M.Drago y Bahia Blanca	LOPC1	-	13%	87%				-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO081	L.M.Drago y Melian	LOPC1	3%	77%	21%				-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO118	Martin Rodriguez y Timbó	LOPC1	1%	14%	85%	-	-		-	PUELCHE	2	1,0	7,4%	1,0	< 0,5	< 0,5
LO119	Tala y Pino	LOPC1	3%	3%	94%				-	PUELCHE	3	1,2	80,4%	2,3	< 0,5	< 0,5
LO121	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO125	Av. Argentina y Guido	LOPC2	-	37%	63%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO126	Av. Argentina	LOPC2		79%	21%			BATERIA LLAVALLOL	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO133	Av. Argentina y Junin	LOPC2		50%	50%				-	PUELCHE	-				< 0,5	< 0,5
LO138	Junin 170 entre Rodriguez y Las Heras	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO139	Arnat y Petinbi	LOPC1		11%	89%				-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO140	Av.Argentina 2950 y Petribi	LOPC1	-	5%	95%				-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO141	Rodriguez 3507 esq Mercedes	LOPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO142	Jose Ingenieros 1668 e/ Calferata Norte y Juan XXIII	LOPC1		20%	80%				-	PUELCHE					< 0,5	< 0,5
LO146	Calle Pintos 2007 e/ Viel y Florida	LOPC1	-	4%	96%				-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO147	Calle Magnolia 2099 e/ Moreno y V.Barbieri	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO148	Magallanes 2600 entre Ucrania y Duhalde	LOPC1		1%	99%				-	HIPOPUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
A8019	Comisarentes MALVINAS ARGENTINAS y Pilar	LOPC2	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
A8066	Tigre y Policastro	LOPC2	-	8%	92%				-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO083	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
LO084	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO085	L.M.Drago e/Cno las Flores y Fonrouge	LOPC2	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO086	Cno de las Flores a 500m de Drago	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO087	Cno de las Flores y MALVINAS ARGENTINAS	LOPC2		3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO093	Cno San Vte a 500m pozo 87	LOPC2	3%	12%	85%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO106	J. B. Justo y Cuyo	LOPC2	65%	5%	30%	-	-	BATERIA BURZACO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO117	Mendoza y N. Silva	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO122	J. Ingenieros	LOPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	2%	23%	75%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
LO144	Avenida Argentina y RP N° 16	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO145	Villarino y Avenida Argentina	LOPC2	-	-	100%		-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO149	Rene Vallo y Jose Melián	LOPC2	67%	-	33%		-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO095	Larrea y Gardel	AB14	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO113	Letoir 432	LO38	-	3%	97%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LO120	Pino y el Cairo	LOPC1	-	2%	98%		-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO127	Jose Marmol e/Allemandri y Anchorena	LO47	-	1%	-	99%	-	PLANTA - LO127	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO128	Mitre y Av. Cabred	LO13	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
LO134	Larrea y Colihue	AB14	-	6%	-	94%	-	PLANTA - LO134	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO135	Matienzo y Rodriguez	AB22	1%	2%	-	96%	-	PLANTA - LO135	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
LO152	Necochea esquina Lujan	-	-	100%	-	-	-	PLANTA - LO152	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA002	Ambrosetti 1900 e/Beltran y Martin Fierro.	MAPC1	-	21%	79%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MA003	ALMIRANTE_BROWN 2500 e/Viena y Rep. Argentina.	MAPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MA004	Asamblea 1800 e/J.t de Septiembre.	MAPC1	1%	2%	98%	-	-	BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MA006	Viena e/Canning.	MAPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MA018	Olíden entre 11 de Septiembre y Juan Cruz Varela	MAPC1	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MA009	Cangallo 1200 e/San Lorenzo y Uspallata.	PCMA009	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA010	Uspallata 1000 e/Soller y O´Brien.	PCMA010	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MA011	Stoppler 900 e/Bat. de Maipu y Paso de los Andes.	PCMA011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MA012	San Lorenzo y Seguí	PCMA012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MA016	Canadá 748 y Seguí	MAPC2	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MA017	Palacios y Seguí	MAPC2	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME001	25 DE MAYO E/PUEYRREDON	ME-TAN-CES	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	ME-TAN-CES	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME003	25 MAYO E/ 9 DE JULIO	ME-TAN-CES	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME004	BROWN E/ CENTENARIO	ME-TAN-CES	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME006	BROWN E/ CARLOS PELEGRINI	ME-TAN-CES	-	6%		94%	-	TANQUE MERLO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME007	BROWN E/ M.BRAVO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME015	9 DE JULIO E/ SAN LORENZO	ME-TAN-CES	-	2%		98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME016	SAN LORENZO E/CANNING	ME-TAN-CES	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME060	SAENZ PEÑA Y AV. CALLE REAL	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME005	25 MAYO E/ J.M.Castro ex Pearson	ME02	75%		25%			BATERIA PARQUE SAN MARTIN NORTE	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME014	BROWN E/PIZURNO	ME02	-	1%	99%				-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME008	LIBERTAD E/ ARGENTINA Y PUCHEU	PCME008	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
ME009	COVIPOL. EDIF 38. ROSSI Y ECHEVERRY	PCME009	-		100%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME010	COVIPOL. EDIF 13. ROMAY Y ZUNDA	PCME010	100%						X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME017	DEFENSA E/BARAVINO Y HORTIGUERA	PCME017	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME018	OYUELA E/FRIAS Y RUTA 200	PCME018			100%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME019	PEDRIEL E/ TALA	PCME019			100%				X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME020	INDEPENDENCIA E/ SULLIVAN	PCME020	-	-	100%			-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME021	ESNAOLA Y BOYACÁ	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME022	ESNAOLA Y BACH	ME-TAN-LOM		1%		99%			-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME023	AV.ARGENTINA Y CHOPIN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-	TANQUE LOMA GRANDE	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME025	AV.ARGENTINA E/GAVILAN	ME-TAN-LOM				100%			-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME081	Strauss y Juan Sebastian Bach	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME087	Av. Argentina y Lezama	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME090	Angel Rodriguez y Curapaligue	ME-TAN-LOM		1%		99%			-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME026	TUNUYÁN E/AREVALO	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME027	VIDT E/ FEBAL	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME028	VIDT E/DEMOCRACIA	ME-TAN-REC		4%		96%			-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME029	VIDT E/CHAGAS	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-	TANQUE RECONQUISTA	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME030	VIDT E/FAMATINA Y DESSY	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME063	FILIBERTO Y TARIJA	ME-TAN-REC		1%		99%			-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME079	Antofagasta y Fraga	ME-TAN-REC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME082	Cacheuta y José Martí	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME031	GARDEL E/PAYRO	ME-TAN-ARC	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	ME-TAN-ARC	-	-		100%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME033	VIDT E/DISCEPOLO	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME034	VIDT E/ACCARCOS	ME-TAN-ARC	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME035	VIDT E/MEDMA	ME-TAN-ARC	-	-		100%	-	TANQUE ARCO IRIS	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME068	JOSE MARTI Y DALTON	ME-TAN-ARC	-	6%	-	94%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME088	Lorenzini entre Delin Funes y Fraga	ME-TAN-ARC		1%		99%			-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME091	P.Echague y P. Podestá	ME-TAN-ARC	-	-		100%			-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME092	Carcavallo entre Cassaux y Orfilia Rico	ME-TAN-ARC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME102	Fraga y Davila	ME-TAN-ARC		3%		97%			-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	PCME036	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME037	AMADO NERVO E/ANCON Y AMPERE	ME-CIS-PSM	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME038	LOS ALELIES Y TILCARA	ME-CIS-PSM		4%	96%				-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME039	LOS ALELIES E/TILCARA Y AGUARIBAY	ME-CIS-PSM	-	2%	98%				-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME040	LOS JACINTOS E/ETIOPIA	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME041	ACHALA E/LAS RETAMAS	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME045	ALVAREZ JONTE E/ LOS ALELIES	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME046	LAS RETAMAS E/JURAMENTO	ME-CIS-PSM		2%	98%				-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME047	ALVAREZ JONTE E/ LOS GERANIOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%			REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME048	ALVAREZ JONTE E/LAS DALIAS	PCME048	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME049	GABRIELA MISTRAL E/ALTE BROWN	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME051	GENDARMERIA GURRUCHAGA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME053	ZARRAGA E/ GAGUERRE Y PEDERNERA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME054	ZARRAGA E/ GAVILAN	ME-CIS-PSM	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME058	12DE FEBRERO	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME076	El Hornero 3710	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	HIPO/PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME086	Garmendia y Almte. Brown	ME-CIS-PSM	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME042	GENDARMERIA E/ FLORES A.	PCME042	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME050	GABRIELA MISTRAL E/BENOIT	PCME050	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME055	PUEYRREDON Y O'BRIEN	PCME055	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME056	SAN ANTONIO Y PARAGUAY	PCME056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
ME057	CHACO N° 310 E/DIRECTORIO Y NOGUERA	PCME057	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME059	GABRIELA MISTRAL Y ALPATACAL	PCME059	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME061	SAENZ PEÑA Y AV. RIVADAVIA	PCME061	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	PCME065	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA Y SOLANET	PCME066	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
ME067	TRAFUL Y BLANCO ESCALADA	PCME067	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME069	ATAHUALPA Y PEDRO CHUTRO	PCME069	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME070	TUCUMAN Y LA RIOJA	PCME070	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME073	SARMIENTO 2398 Y LA HABANA	PCME012-73	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	PCME074	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME075	MEDRANO 811 Y SANTA FE	PCME075	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME078	Garay 1753	PCME078	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME080	Federico Lacroze y Matorras	PCME080	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	ME01	-	-	100%	-	-	POI MERLO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	ME01	2%	-	98%	-	-	POI MERLO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME089	Curapaligüe y 25 de Mayo	PCME089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME093	Morse y Av. del Bicentenario	PCME093	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME094	Brasil y Guardia Vieja	PCME094	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME095	Sullivan y Sargento Cabral	PCME095	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME096	Gral Ocampo y T Saley		-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME097	Orán entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME098	Tasso y Oran	-	-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME099	De Roma y Necochea	-	-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME100	Republiquetas entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME101	Juan A Maza y Dr Ricardo Raúl Alfonsin	PCME101	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ME103	Los Arneros y San Martin	PCME103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
ME113	EVA PERON E/PELLEGRINI	PCME113	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI001	Belgrano 400 e/Vicente Lopez y C. Malnatti.	MIPC2	-	-	-	100%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI020	Julio A. Roca 216 e/Dorrego y Roseti.	MIPC2	-	1%	-	99%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI035	Pavon 1100 e/R. Peña y Sgto. Cabral.	MIPC2	-	-	-	100%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI002	Julio A. Roca 800 e/Serrano y Muñoz.	PCMI002	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI003	Italia 1300 e/Francia y L. N. Alem.	PCMI003	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI006	Pardo 400 e/San Luis y C. Malnatti.	PCMI006	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI007	Julio A. Roca 1900 e/Gelly Obes y Zuviria.	PCMI007	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI008	Conesa 2000 e/ Gelly Obes y J. M. Zapiola	PCMI008	1%	-	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI009	Serrano 800 e/Conesa y SAN_JOSE	PCMI009	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI010	Cjal. E. Tribulato 700 e/Serrano y Urquiza.	PCMI010	2%	27%	72%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI011	Int. J. Irigoin 700 e/Serrano y Stgo. Del Estero.	PCMI011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI013	J. B. Alberdi 200 e/Dorrego y Accuenaga.	PCMI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI014	Serrano 400 e/J. B. Alberdi y Haedo.	MIPC1	-	100%	-	-	-	CAG SAN MIGUEL CENTRO	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MI046	Paunero 100 e/Pardo.	MIPC1	-	100%	-	-	-	CAG SAN MIGUEL CENTRO	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MI015	Cnel. Fraga 2300 e/Int. J. Irigoin y Marcos Sastre.	PCMI015	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI016	Cnel. M. Fraga e/Salerno y Tomas Edison.	PCMI016	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI017	Vicente Lopez e/Marcos Sastre y Malvinas.	PCMI017	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	1,2	1,2
MI018	Pardo e/Libertad y J. M. Zapiola	PCMI008	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI019	J. B. Alberdi e/J. Zapiola y Gelly Obes.	PCMI008	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI021	Cjal. E. Tribulato 2300 e/ G. Campos y Libertad.	PCMI021	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI022	Tomas Guido 4400 e/J. R. Lopez y El Zonda.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI023	Av. Alte. J. Lopez 4500 e/J. D. Solis y Eva Peron.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI025	T. Guido 5900 e/Uriarte.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI026	T. Guido 5301 e/La Pinta.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI032	Marchena 3256	MI_CIS_SAR	-	5%	-	95%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI024	E. Ferreyra 4200 e/T. Guido.	MI_CIS_GUA	1%	2%	98%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI028	Santa Maria 5100 e/Vicente Fatome.	MI_CIS_GUA	1%	3%	96%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI037	Cisterna La Guarida	MI_CIS_GUA	4%	4%	92%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI065	Calle Defensa e Italia	MI_CIS_GUA	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI066	Dr. Enrique Finochietto e/Sta. Maria y Fray Antonio Marchena	MI_CIS_GUA	-	3%	97%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI033	Int. J. Irigoin 400 Gelly Obes y Granaderos.	PCMI033	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI036	Cnel. M. Fraga 3400 e/Marconi.	PCMI036	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI038	Roca 1400 e/Alen.	PCMI038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI039	Belgrano 2000 Gelly Obes y R. S. Peña.	PCMI039	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI040	Italia 2300 e/Gaspar Campos y J. M. Zapiola.	PCMI040	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI041	Belgrano 900 e/D´elia y Muñoz	PCMI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI042	Pardo 10 e/Ruta 10.	PCMI042	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI043	Conesa 416 e/San Luis.	PCMI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI045	Rodriguez Peña 2600 e/Williams.	PCMI040	-	8%	92%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI004	Conesa 1300 e/Martin Irigoyen.	MI_CIS_CEN	-	20%	80%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI034	Martin Irigoyen y Juan B Alberdi	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI047	Martin Irigoyen e/Obilitio y Francia.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI048	Av. Francia 500 e/Sta. Fe y Parana.	MI_CIS_CEN	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI049	Av. Francia 600 e/Moreno.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI051	Av. Francia 1100 e/Tucuman y Azpiardo.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI060	Conesa entre Martin Irigoyen y Sarmiento	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	HIPOPUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI067	Conesa e Irigoyen	MI_CIS_CEN	1%	14%	84%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MI052	Rodrigo de Triana 1500 e/R. Balbin.	PCMI052	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI053	Defensa e/R. Balbin.	PCMI053	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI054	Cruz del Sur e/Tomas Espora.	PCMI062	-	1%	99%	-	-	BATERIA MI054-MI062	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI062	Calle Güemes e Isabel La Catolica	PCMI062	-	2%	98%	-	-	BATERIA MI054-MI062	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI055	J. J. Paso 5500 e/La Niña y Isabel la Catolica.	PCMI055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI056	Juan J. Paso e/Beron de Estrada y Salguero.	PCMI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI057	Maestro Ferreyra y Charlone	PCMI057	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MI058	José M. Zapiola y Güemes	PCMI058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI059	Concejal Tribulato y Monseñor Blois	PCMI059	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI061	Luis Salguero y Tomás Alba Edison	PCMI061	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI063	Egipto y Libertad	MI01	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MI064	San Nicolás y Gral Las Heras	MI01	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN001	Lavalleja al 7100 E/ Conde y Achupallas.	LMO19	-	1%	99%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MN002	Armonia a 150 m de La Fuente.	LMO19	-	2%	98%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MN003	Armonia y Billinghurst.	LMO19	-	2%	98%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MN004	Billinghurst 3800 y Armonia.	LMO19	-	2%	98%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MN005	Billinghurst y Dobles/ Cespedes.	LMO19	-	2%	98%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MN006	Int. Russo y Ramón Lista	LMO46	-	1%	99%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN007	Billinghurst e Int Russo	MN24	-	1%	99%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MN008	Billinghurst y Las Flores	MN24	-	4%	96%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN009	Billinghurst 5300 y Río Cuarto	MN24	-	1%	99%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN010	Las Flores y Ramón Lista	MN24	-	-	100%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN011	Monte Egmont y Cayupedes	LMO19	-	3%	97%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MN032	Acassuso 1700 y Santa Rosa	MN23	-	-	100%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN033	Acassuso e Iturraspe	MN23	-	1%	99%					PUELCHE	1	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MN034	Noruan y Zavala	MN16	-	-	100%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN036	Hucal y Fiore	MN16	-	4%	96%			BATERIA RAFAEL CASTILLO		PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN037	Lavalle y Tres Cruces	MN23	-	4%	96%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN039	E. Del campo y Aguirre	MN23	-	100%	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MN044	Huarpe y Lacar	MN23	-	-	100%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN043	Cassafoux N° 2922 y E. Echeverría	MN23	-	100%	-			POI MN043		PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MN099	Beethoven y La Gorina B°El Tovero	MN24	-	100%	-			-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MN106	Beethoven entre. Aguirre y Mendez de Andes	MN24	-	-	100%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN110	V. de la Plaza B° Dávila y Beadley	MN24	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	2	0,6	12,9%	0,8	< 0,5	< 0,5
MN122	Santa Rosa y Aguirre	MN23	-	-	100%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN147	Zamudio e/ Bravard y Aguirre	MN25	-	9%	91%			POI MN147		PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN167	Beauchard y Heredia	MN26	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN173	Hucal 1700 e/ Vogel y Polledo	MN16	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN183	Lavalle y Sudamércia	MN23	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN186	M. T. de Alvear 1100 esq. Del colegio	MN23	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	1	-	-	-	-	-
MN211	Esquino y Eulmes	MN19	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MN212	Victorino de la plaza y Luis María Drago. RAFAEL CASTILLO	MN19	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MO087	Cirilo y Vidalita	MOPC1	100%	-	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO088	De los Recuerdos y De los Pavadores	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MO089	Correa y La Chacarera	MOPC1	100%	-	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO093	De los Reseros y E. Frers	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MO094	La Esquella y de los Reseros	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MO095	De La Doma Pje N° 1282 y El Ombu	MOPC1	100%	-	-			BATERIA PARQUE LELOIR - ITUZAINGO		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO097	De La Vidalita y J. Hernández	MOPC1	81%	1%	18%					PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MO146	N. Repetto y Del Patagonia	MOPC1	4%	-	96%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MO147	N. Repetto y De la Tradición	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MO148	Del Mensjulio y De las Cachuelas	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MO149	N. Repetto a 180 mutros de F. Ielosi	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MO150	De la Conviccion y Colectora Acceso Oeste	MOPC1	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO100	Videla y Peredo	MOPC1	-	-	100%				X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MO105	Fray J. S. M. de Oro y Figueroa Alcorta	MO03	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO106	Figueroa Alcorta y La Tribuna	MO21	95%	5%	-			BATERIA VII BRIGADA AEREA - MORON		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO107	E. López y Cnel. Arenas	MO30	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO108	Figueroa Alcorta y Montevideo	MO21	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO130	Lacarra y Cucha Cucha	MO21	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO137	Madrid y Jarry	MO32	95%	5%	-			BATERIA BARRIO SAN JUAN		PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MO138	Paganini e/Pedro Diaz y Juan Gorriti	MO31	-	-	100%			BATERIA HURLINGHAM - INTA		PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MO139	Amberes y Pedernera/v	MO31	-	1%	99%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MO140	Cuzco entre M. de Aviles y Toivo	MO31	-	1%	99%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MO141	Cuzco y Arowe	MO31	-	100%	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MO150	La Trilla a 1dm de Juramento	HU01	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM 2		PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MO151	Arotahal a 21,93m de Veragua	HU01	-	17%	83%					PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MO152	Chamberí y Los Cerdales	HU01	-	1%	99%					PUELCHE	2	5,4	128,2%	10,2	< 0,5	< 0,5
MO142	Pavas esq. Lavalle	JT01	99%	1%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO144	Sta. Teresa y La Garzela	MO03	95%	5%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MO154	Coronel Arevas esq. Andrade	MO21	95%	5%	-			BATERIA CASTELAR		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO155	Olivari esq. Palermo	MO21	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR001	J.V. González 2625 e/Balzak y Rodriguez Peña.	PCMR001	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR002	J.V. González 2435 e/Güemes y V. Alsina.	PCMR002	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR003	Güemes 901 e/Bolivia y Paraguay.	PCMR003	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR004	Larralde 1341 e/J. Gonzalez y R. Gutierrez.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR005	Int. Bossi 1080 e/Ecuador y Paraguay.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR006	Int. Bossi e/Venezuela y Ecuador.	MR-TAN-MOR	-	8%	-	92%	-	TANQUE MORENO	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR007	Guatemala 2400 e/Güemes y Alsina.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR008	Guatemala 2700 e/marmol y Colectora Gaona	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR019	Int. Bossi e/Guatemala.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR011	P. Ansaldo e/Blas Parera y M. Melo.	PCMR011	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR012	M.Obarrio 2048 e/Alberdi y Rafael.	MRPC1	-	3%	-	97%	-	PLANTA CAG MORENO	-	PUELCHE	2	2,4	33,1%	2,9	-	-
MR046	Del Cañon/M. Obarrio e/San Carlos.	MRPC1	-	45%	-	55%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR013	Av. Perón e/Del Cañon.	PCMR013	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR014	Alcorta 2500 e/Bouchard y Uruguay.	PCMR014	1%	2%	97%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR015	Ameghino e/Centenario y Argentina.	PCMR015	1%	2%	97%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR016	Callao e/Av. Alcorta y Mitre.	PCMR016	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR017	Alcorta e/Haedo y Ramos Mejia	PCMR017	-	7%	93%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR018	Misiones e/ Sta. Fe y D´errico.	PCMR018	-	3%	97%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR020	Alte. Brown e/25 de Mayo y Andrade.	MR01	-	2%	98%	-	-	BATERIA MR020-MR02	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR021	Alte. Brown e/Pio XII.	MR01	-	3%	97%				-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR022	Sanchez 4800 e/Ruta 25 y San Justo.	PCMR022-23	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR023	Florencio Sanchez e/Gandhi y Solocles.	PCMR022-23	-	11%	89%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR024	Cosa Rica e/F. Sanchez y Solocles.	MR-TAN-PER	-	30%	-	70%	-		-	PUELCHE	2	0,6	12,9%	0,8	-	-
MR025	A. Storni 5600 e/Danubio.	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR026	A. Storni 5900 e/Madariaga.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR027	Ecuador 5700 e/La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR029	La Plata e/Ruta23 y Camil.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-	TANQUE LA PERLITA	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR035	Gutierrez 5600 e/La Plata y Cost Rica.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR070	Honduras y Marquez	MR-TAN-PER	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR072	Honduras y Gral. Madariaga	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR028	El Salvador e/Chile y Mexico.	PCMR028	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR030	Pedrell e/Ascasubi y Carriega.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR031	R Rojas e/Libano y Gral. Pintos.	MR-TAN-TRU	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR032	F. Sanchez e/Libano y Pitagoras.	MR-TAN-TRU	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	TANQUE TRUJUI	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	0,6	23,6%	0,7	< 0,5	< 0,5
MR051	Tablada e/Oribe y Puccini.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR075	Diego de Villaroel y Celerino Namuncurá	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR036	Ruta 25 e/Cataliña.	PCMR036	83%	2%	15%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR037	Giralde e/Pastor Obligado y Lavarden.	PCMR037	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR040	Piovato 4132 e/Bochardo y Balcarce.	PCMR040	-	3%	97%			-	X	PUELCHE	2	1,9	96,8%	3,2	< 0,5	< 0,5
MR041	Dorrego e/Dorrego y Darat.	PCMR041	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR042	1 de Mayo e/Alcorta.	PCMR042	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR043	San Pablo e/San Cayetano.	PCMR043	5%	2%	93%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR044	Piovano e/El Salvador y Venezuela.	PCMR044	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR048	Echeverría e/Darwin y Peron.	PCMR048	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR049	Sarratea e/Victoria.	PCMR049	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR050	Marcos Paz 1116 e/Iarrea y J.J. Urquiza.	PCMR050	10%	2%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR052	Arribeños e/Concordia.	PCMR052	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR009	V. Alsina e/Libertador.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR053	Córdoba E/Palo y Sheden.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR054	Alvear e/Rafael Arco.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR055	Córdoba e/V. Lopez y Linch.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%					PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR056	Corvalán 2733 e/B de Yrigoyen y Graham Beil.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR057	Uruguay e/E. Rios y colectora.	MR-CIS-MOR	2%	4%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR058	Misiones 1970 e/ Moron.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR059	Facundo Quiroga e/Moron y Yapeyu.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR060	Facundo Quiroga e/ La Tropilla y Quilmes.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MORENO	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR061	Corvalán e/La Tropilla.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR062	SAN_JUAN_BAUTISTA 2026 e/ Int. Corvalan Dean Funes	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MR063	Lincoln e/Soldado Derrico y E. Rios.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR064	Intendente Corvalan 2302 e/ Alvear y Alejandro Graham Bell	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR095	Uruguay y Chiclana	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR097	Entre Rios esquina Abraham Lincoln	MR-CIS-MOR	2%	3%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR100	Moron e/ Facundo Quiroga y Arribeños	MR-CIS-MOR	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR101	Lincoln N°1644	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR065	J.V. González e/ Ruta 25 y Brasil.	PCMR065	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR067	Lobos e/La Tablada y Manzana 36.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR068	Lafinur e/Lobos y 3 de Marzo.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR069	Tablada e/Democracia y Colectora	PCMR069	12%	4%	84%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR071	Shakespeare y Manuel Galvez	PCMR071	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR073	Colombia y Ricardo Gutiérrez	MR-TAN-PER	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR074	Colectora Acceso Oeste y Ecuador	PCMR074	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR076	Hipólito Yrigoyen y San Luis	PCMR076	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR077	Teniente Ibañez 3224	PCMR077	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR078	Alberti entre Marcos Paz y Vera	PCMR078	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR079	Juana de Asurduy y San Cayetano	PCMR079	43%	2%	55%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR086	Ecuador y Marquez de Aguado	MR-TAN-PER	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR088	Lobos entre Misiones y José Hernández	PCMR088	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR089	Pavón y Gervasio de Posadas (Plaza del Estudiante)	PCMR089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR093	Mendoza y Jose Ingenieros	PCMR093	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MR098	Av. Luis Pasteur entre Facundo Quiroga y Arribeños	PCMR098	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MR099	Marcos Paz entre J.J Urquiza y Larrea	PCMR050	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR104	Marcos Paz entre Larrea y Justo Jose de Urquiza	PCMR050	-	36%	64%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MS025	Crovara y El Pindo	MS_CIS_MUN	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MS026	Calle 200 y Rotonda	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-	BATERIA CIUDAD EVITA	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MS027	Av. Central y Calle 500	MS_CIS_MUN	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MS034	El Tapeti y El Sauce	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
MS042	Av. Central y calle 900	MS_CIS_MUN	97%	3%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MS030	Las calas y Las Baleares	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MS091	Las Orquideas y Las Gardenias	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MS092	Costanera y Las Dalias - Bº 22 de Enero	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
MS105	Gaviotas y Torquinis	MS34	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MS114	Magnasco y Av. Costanera	MS33	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
PI001	J. B. Justo y Sanguinetti al 500.	PCPI001	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI002	J. B. Justo 615 y Posadas.	PCPI002	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI003	Av. Tratado de Pilar 242 y Sanguinetti.	PCPI003	25%	35%	39%	-	-		X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI004	Lagrave 84 (Yrigoyen y Pampa).	PCPI004	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI005	Planta Champagnat.	PCPI005	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI006	Rincón entre San Martín y Esteban Luca	PCPI006	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI007	José María Paz 873.	PCPI007	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI008	ITUZAINGO 331.	PCPI008	1%	3%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI009	Maipú y Vías F.F.C.C. San Martín.	PCPI009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI010	Gral. O´Higgins y Bergantín Congreso.	PCPI010	-	13%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI011	Juan Bautista Alberdi 1106 y 11 Septiembre	PCPI011	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambrosetti.	PCPI012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Mapuche)	PCPI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI014	Las Araucarias y M. Acosta.	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI059	Ubicado dentro de predio Campo Suite II. frente a Parque Austral.	PIPC2	23%	77%	-	-	-	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI067	Mariano Acosta y Los Alamos	PIPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI089	Los Alamos y Av. Eva Perón	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI015	Dr. Ignacio Pirovano 728 esq. Costa Rica	PCPI015	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI016	Chacabuco 2130 e/Paraguay y Bolivia	PCPI016	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI017	Tortugas Country Club	PCPI017	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
PI018	Tortugas Country Club	PCPI018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI020	Tortugas Country Club	PCPI020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI021	Tortugas Country Club	PCPI021	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI022	Las Campanillas esq. Av. Highland Park	PCPI022	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI025	Country El Carmel	PCPI025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI026	Las Amapolas. Villahaus - Country Ayres del Pilar	PCPI026	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI035	Country Ayres del Pilar	PCPI035	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI037	Country La Lomada	PCPI037	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI040	Las Margaritas 1100 e/ Los Claveles y Las Rosas	PCPI040	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI041	Las Glicinas 1080 (proximo a R8)	PCPI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI042	Musladini 374. esquina Bergantín Independencia.	PCPI042	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI043	Sequi esq. Colectora Este Ramal Pilar	PCPI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI044	Posadas 1635 e/J.V. Gonzalez y H. Ascasubi	PCPI044	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI045	Country B° Campo grande	PCPI045	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI048	Cjal. Dr. Martiegui 219. Plaza.	PCPI048	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI049	Bergantín República y Bergantín Independencia.	PCPI049	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI050	Av. Constitucion(R26) e/Nicaragua y San Salvador.	PCPI050	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI051	Guatemala y R26.	PCPI051	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI052	Guatemala 4300 esq. Alemania (MANUEL ALBERTI)	PCPI052	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ramón Gimenez	PCPI053	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI054	Leguizamon e Ituzaingo	PCPI054	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI056	Ameghino y Colectora Oeste	PCPI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI058	Nicaragua 1250 e/Haití y Santo Domingo	PCPI058	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI061	RN 25 y Chubut	PCPI061	4%	24%	71%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI062	Panamá y Alejandro Korn	PCPI062	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI063	Patagones y Tagle	PCPI063	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI064	Andes y Avda. Patricias Argentinas	PCPI064	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI065	Goleta Constitución y Fragata Sarmiento	PCPI065	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI066	Calle s/n e/ Haití y Santo Domingo	PCPI066	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI068	Alazan e/Overo y Picasso- Highland Park	PCPI068	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI070	Paraguay y Tierra del Fuego	PCPI070	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI075	Guatemala y Levene	PCPI075	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI076	Gatti y Vasco Da Gama	PCPI076	-	-	100%	-	-	BATERIA PERUZZOTTI	-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI078	Vasco Da Gama entre Hermita y Camino Comercial	PCPI076	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	-	-
PI080	Monseñor D´Andrea y La Carreta	PCPI080	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI084	Chubut y San Ignacio	PCPI084	-	20%	80%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI100	Calle Sarmiento e/ Bahía Grande y Bahía Redonda	PIPC1	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI101	Ruta 234 y Bahía Darbel	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI102	Calle Henry Martin y Bahía Darbel	PIPC1	-	1%	99%	-	-	BATERIA DERQUI	-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
PI103	Cerrito 3287 e Isla Gran Malvinas	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TETRACLORURO DE CARBONO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
PI105	Libertad e Isla Candelaria	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
CU037	345 y 283	CU37	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
CU076	Cno. G. Belgrano y Av. Monteverde	CU38	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
CU139	Calle 866 Esq. D. Alvarez	CU07	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5
CU141	Calle 867 Esq. Donato Alvarez	CU07	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	1	< 0,5	0,0%	< 0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
AB057	P. Echagüe y Serrano	AB14	-	1%	-	99%	-	PLANTA - AB057	-	PUELCHE	4	7,5	173,3%	27,0	< 1	< 1
AB061	Laprida Narciso 1900	AB23	5%	6%	89%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB063	Laprida Narciso 3001	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB064	Juan B. Justo 2050	AB23	17%	6%	77%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB065	Juan B. Justo 2700	AB23	8%	-	92%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB066	Juan B Justo 2101	AB23	19%	45%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB067	Juan B. Justo 2802	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB068	Av. Ceballos (400) a 700 mts. de Avda. República Argentina	AB23	21%	27%	52%	-	-		-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB070	Francisco N. Laprida y Muesca	AB23	8%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB071	Narciso Laprida 2301	AB23	17%	69%	14%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB073	República Argentina 6670	AB23	6%	8%	86%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB074	Rep. Argentina y Juan B. Justo	AB23	14%	8%	78%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	AB23	9%	34%	56%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB076	Republica Argentina 7570 e/ Juan Jose Castro y Alice	AB23	20%	29%	51%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB084	Espoile s/n	AB23	3%	48%	49%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB085	Leyes y Romero	AB23	36%	16%	48%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB086	Romero y Calderón	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB087	Calderon 1251	AB23	24%	25%	51%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB088	Calderón 1851	AB23	53%	36%	11%	-	-	BATERIA GLEW	-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB089	Calderón 3000	AB23	1%	98%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB090	Calderon 3400 1848	AB23	10%	14%	76%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB091	Calderon 3650 1848	AB23	15%	49%	36%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB092	Brigadier Calderón e/ Lezica y Young	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB093	Brigadier Calderón e/ Young y Av. Eduardo Holmberg	AB23	13%	19%	68%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB094	Romero 3800	AB23	1%	9%	90%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB095	Lemos 3800	AB23	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB098	Rocha y J.A. Casacuberta	AB23	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB099	Fernando Lahille y M. Acosta	AB23	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	22,3	191,0%	86,0	< 1	< 1
AB100	Gral. Cardenas y Almte. Irizar (Plaza)	AB23	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB101	Agustín Barrios y Virrey Cevallos	AB23	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB102	Martiniano Leguizamón entre 25 de Mayo y F. Alvarez	AB23	2%	1%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	24,5	135,6%	48,0	< 1	< 1
AB105	Av. Juan B. Justo e/ AV. República Argentina y Av. Espora	AB23	4%	1%	95%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	68,5	197,1%	271,0	< 1	< 1
AB106	Pablo Podesta y Orillia Rico	AB23	10%	86%	5%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB107	Fernando Ochoa y Juan Sarcione	AB23	19%	75%	6%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB108	Rufino Cordoba y Cesar Ratti	AB23	23%	75%	2%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB109	Luis Viale y Enrique de Rosas	AB23	12%	75%	13%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB110	Boulogne Sur Mer y Antonio Luis Beruti	AB23	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB601	King y Bouchard	AB04	55%	8%	37%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB728	B° Segba (D. Rocha y Paraguay)	PCAB728	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	92,0	179,5%	339,0	< 1	< 1
AB103	MALVINAS_ARGENTINAS y Dr. Chiesa	PCAB103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	16,3	187,7%	62,0	87,0	6,7
AB096	Manuela Pedraza 1209	ABPC1	-	1%	-	99%	-	PLANTA RAYO DE SOL	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
AB097	Santiago del Estero 3075	ABPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE001	Las Heras y Guillon	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE002	Rivadavia y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE003	Origone y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE004	Las Heras y Chacabuco	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE005	Terrarosa y Colon	EEPC1	-	14%	86%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE015	Dorrego y Dreyer	EEPC1	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE027	Maipú y Colón	EEPC1	-	30%	70%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE028	Lavalle y Maipú	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	88,0	4,6
EE029	Lavalle	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE030	Lavalle	EEPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE031	Lavalle	EEPC1	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	88,0	4,6
EE032	Lavalle	EEPC1	-	10%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE033	Lavalle	EEPC1	-	66%	34%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE034	Maipú	EEPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE035	Ventura Avila	EEPC1	-	5%	95%	-	-	BATERIA LA LATA	-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE036	Ventura Avila y Calle 13	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE040	Ventura Avila	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	88,0	4,6
EE041	Ventura Avila	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	88,0	4,6
EE042	Ventura Avila	EEPC1	-	20%	80%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE043	Juana de Arco	EEPC1	2%	39%	59%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE044	Juana de Arco	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE045	Juana de Arco	EEPC1	4%	5%	91%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE046	Lavalle entre Tomquist y Bragado	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE047	Martin Fierro a 700mts de S6	EE21	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE048	Martin Fierro a 700 m de Vazquez	EE21	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE057	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EEPC1	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE058	Avila Ventura 3000	EEPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE059	Avila ventura 3400	EEPC1	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE060	Los Claveles y General Las Heras	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	88,0	4,6
EE070	Colon y Maipú	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	3	115,3	171,7%	344,0	88,0	4,6
EE064	Puan y Pablo Pizzurno	PCEE064	25%	2%	73%	-	-	-	X	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	53,0	5,3
EE013	Cap. Lozano y Ascasubi	EE05	-	3%	-	97%	-	PLANTA - EE013	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE065	Pedro Arocena y E. de Laperriere	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE066	Amado Nervo y San Pedrito	-	50%	20%	30%	-	-	BATERIA SANTA ISABEL	X	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	-	-
EE073	Villegas esq. Colón	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	18,5	189,2%	71,0	< 1	< 1
EE049	Martin Fierro y Vazquez	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE050	Vazquez a 700 m de Martin Fierro	EE21	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE051	Martin Fierro y Dolores	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE052	Martin Fierro a 1300m de E. Vazquez	EE21	-	46%	54%	-	-	BATERIA BAFICO	-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE054	Martin Fierro y Dreyer	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE055	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EE21	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	5	37,0	106,2%	88,0	< 1	< 1
EE061	República de Costa Rica y Libertad	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE062	El Ceibo y Fraga	EE21	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE063	Alvarez de Toledo y Miguel Angel	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE006	Almafuerte e/Andrare y Obligado	EE03	39%	1%	-	60%	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE007	R. Dario y M. Cane	EE03	1%	1%	-	98%	-	PLANTA BARRIO UNO	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE038	Av. Tte. Gral. Morillas a 1000 mts de La Horqueta	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EE039	Tte. Gral. Morillas s/n - Villa Ntra. Sra. Del Rosario	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEN001	Lago Garcia 3901 y Los Andes	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN002	Pedro Coni 3401e/Oliver y sancinena	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN003	Palleros 1700 /S. Nicolas y Mte. Grande	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN005	Sansinena 601 e/ Huergo y 9 de julio	EEPC4	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	23,5	191,5%	91,0	< 1	< 1
EEN006	Caseros 580 e/Huergo y 9 de Julio	EEPC4	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEN007	Sarmiento 2700 e/Tricotti y Barros	EEPC4	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	255,0	69,3%	380,0	< 1	< 1
EEN008	Ing. Huergo 2500 e/Petraca y Sastre	EEPC4	5%	11%	84%	-	-		-	PUELCHE	4	76,0	197,4%	301,0	< 1	< 1
EEN009	Pto Deseado 601 e/Huergo y 9 de abril	EEPC4	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	4	11,5	182,6%	43,0	< 1	< 1
EEN010	Ing. Huergo 1600 1842	EEPC4	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN012	M.Alegre 992 e/Gomez y Vernet	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN013	Tricotti 10 e/Malvinas y Barros	EEPC4	-	3%	97%	-	-	POI 9 DE ABRIL	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN014	Cnel. D° Elia 190 e/Palleros y Constanzo	EEPC4	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN015	Constanzo 2090 e/P. Argentino y Rivero	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN016	Tierra del Fuego 179 e/Constanzo	EEPC4	15%	1%	84%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN018	Constanzo 1229 e/Guarany y Crespo	EEPC4	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN019	Prayones 3150 entre Palleros y Lopez	EEPC4	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN021	Rebizo 1100 e/ Fair y Crespo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN026	M.Alegre 1720 e/Alegre y Urquiza	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN059	Enrique Banch y Rebizo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN020	Sansinena 105 e/ Doclout y Constanzo	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN022	Sansinena e Vernet y Benavidez	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	48,0	195,8%	189,0	< 1	< 1
EEN023	Benavidez 3190 e / F.Lopez y Scaglia	EEPC4	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN027	Fernadez y Dicio	EE23	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN028	Rivero y Chimondegui	EE23	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN029	Av. Fair y Primera Junta	EE34	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN030	Cervetti y Av. Fair	EE34	-	1%	99%	-	-	BATERIA CORREO ARGENTINO	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN031	Cervetti y La Horqueta	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	108,3	171,6%	323,0	< 1	< 1
EEN032	Av Fair e Islas Trinidad	EE34	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN033	Urbano González e Independencia	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN034	Alberto Grande a 38m de las vias	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN035	Cascabutenta e/Valette y Gonzalez	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
EEN036	Lima e/Valette y Francia	EE31	8%	2%	90%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN037	Cepeda y de los Constituyentes	EE31	-	46%	54%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN038	Lago Garcia y Cepeda	EE31	-	23%	77%	-	-		-	PUELCHE	4	40,8	195,1%	160,0	< 1	< 1
EEN039	Cepeda y Alberto Grande	EE31	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN040	Lago Garcia a 50m de Valette	EE31	-	1%	99%	-	-	BATERIA SANTA CATALINA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN041	9 de Abril e/Valette y Wieman	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN042	Las Talitas e/Sarmiento y M. Alegre	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN043	Avellaneda e/Trangoni y C. Monte Grande	EE31	64%	36%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEN044	Bruzzone e/Foz y Gonzalez	EE31	1%	1%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN045	Bruzzone e/Tte. Alberto Grande	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN046	Bourquet e/ Amaghino y Gabastion	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN047	Juan M. de Rosas t Tte. Gabaston	EE31	9%	13%	78%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN048	Robertson e/ J. Newbery y T. Matienzo	EE31	1%	4%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	146,0	146,1%	453,0	< 1	< 1
EEN049	J. A. Roca y Est. Los Remedios	EE29	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	5	4,4	172,8%	18,0	< 1	< 1
EEN050	Los Robles y T. A. Edison	EE29	30%	5%	65%	-	-	BATERIA SAN IGNACIO	-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	EE29	27%	3%	70%	-	-		-	PUELCHE	2	30,0	141,4%	99,0	< 1	< 1
EEN052	20 de Junio y L. Lopez	EE29	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	57,5	117,7%	136,0	< 1	< 1
EEN053	Cichero 700 e/ Hipolito Bouchard y Julio Argentino Roca	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN054	Destacamento Melchior 733	EEPC5	-	-	100%	-	-	BATERIA LA MORITA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEN056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEN058	Fray Luis Beltran 1415	EEPC5	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EET001	Falucho y Las Dalias	EEPC2	-	81%	19%	-	-	BATERIA TRISTAN SUAREZ	-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EET004	Av. Saenz Peña y Bogado	EEPC2	-	75%	25%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU001	Maipu 800 e Bransen Hussay B.	EE20	-	25%	75%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU002	San Bernardo 980 e/ Balcarce P Moreno	EE20	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU003	Los Robles al 5000	EE24	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU004	Los Robles al 5700	EE24	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU005	S.Cabral a 200mts de Lacarra	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU006	S.Cabral 3588 a 700 m de EEU005	EE26	-	62%	38%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU007	S.Cabral a 700mts de EEU006	EE26	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU008	Sgto Cabral 5149 e/ Gral. Antonio Gonzalez y Jose Alvarez Condarco	EE26	2%	2%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU011	Sgto. Cabral a 700 m de EEU010	EE32	-	45%	55%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU012	Calle s/n a 700 m de Sgto. Cabral	EE32	-	99%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	EE32	-	35%	65%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU014	Juana de Arco a 700 m de S20	EE24	-	51%	49%	-	-	BATERIA UNION	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEU015	Lacarra y 9 de Julio	EE32	-	33%	67%	-	-		-	PUELCHE	2	250,5	140,9%	> 500	< 1	< 1
EEU016	Av. Maipu 40 esq. RP58	EE32	-	84%	16%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU017	Av. Maipu 40 esq. RP59	EE32	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	3	47,7	169,6%	141,0	< 1	< 1
EEU018	Andromaco 80 e/ Jose Champagnat	EE32	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU019	Montes de Oca 80 e/Ruta Prov 58 y Jose Champagnat	EE32	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU020	Vieytes 9 entre Mariano Castex y José Champagmat	EE32	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU021	Sobre Sargento Cabral a 700m del EEU011	EE32	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU022	Juana de Arco S/N	EE32	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU023	Los Robles 249	EE32	-	76%	24%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEU025	Sgto. Cabral a 100 mts de Cáceres	EE32	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	4	48,0	195,8%	189,0	< 1	< 1
EEU026	Juana de Arco N° 7100	EE32	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ001	Río Bermejo y Río Gualeguay	EE28	-	3%	-	97%	-	PLANTA LA CELIA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ002	Río Bermejo y La Atlántica	EE28	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ003	Las Hortensias Norte	EE22	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EES001	25 de Mayo 2371	EZPC1	100%	-	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EES004	Rosario y Palacios	EZPC1	16%	4%	80%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ006	Caminito 1200	EZPC1	31%	52%	18%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ007	Caminito 1900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ010	Paso de los Libres 1800 e Islas Cook	EZPC1	41%	1%	58%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ011	Falucho y Paso de los Libres	EZPC1	24%	7%	68%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ012	Paso de los Libres a 700m de Falucho	EZPC1	18%	1%	81%	-	-		-	PUELCHE	3	60,7	118,0%	140,0	< 1	< 1
EEZ013	Paso de los Libres 1400	EZPC1	39%	1%	61%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ014	Paso de los Libres 1500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ015	Paso de los Libres a 1700 mts de RP N°52	EZPC1	27%	1%	73%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEZ016	Mariano Moreno a 200m de Falucho	EZPC1	15%	48%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	25,5	135,9%	50,0	< 1	< 1
EEZ017	Moreno 3500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ018	Paso de los Libres 900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ019	Ruta Provincial N°52 4000	EZPC1	25%	1%	75%	-	-	BATERIA EZEIZA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ020	RP N° 52 1000	EZPC1	34%	7%	59%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ021	RP N° 52 1200	EZPC1	25%	2%	73%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ022	RP N° 52 s/n	EZPC1	4%	23%	72%	-	-		-	PUELCHE	4	110,8	198,2%	440,0	< 1	< 1
EEZ023	RP N° 52 1300	EZPC1	6%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ024	Ruta N°52 kilómetro 2	EZPC1	5%	3%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ025	Fariña 2000	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ026	Valle de Río Negro y América del Norte (PA.Ezeiza)	EZPC1	-	-	100%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	22,3	191,0%	86,0	< 1	< 1
EEZ027	Cañada de Gomez y 25 de Mayo	EZPC1	16%	17%	67%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ028	Quito y Arroyo	EZPC1	11%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ029	Valle de Río Negro y América del Norte	EZPC1	14%	9%	77%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ030	D. F. Sarmiento y Roger Balet	EZPC1	34%	18%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ031	Roger Balet y Sargento Cabral	EZPC1	14%	17%	69%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
EEZ032	Valle de Río Negro y 25 de Mayo	EZPC1	22%	52%	27%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
ES022	Scalabrini Ortiz e/Ing. Pablo Marin y 1° de Mayo.	PCES022-24	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	41,8	195,2%	164,0	189,0	16,7
ES023	Islas Malvinas e/Constituyentes y Pablo Marin.	PCES022-24	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	189,0	16,7
ES024	Scalabrini Ortiz y Av. Patricias Argentinas.	PCES022-24	-	1%	-	99%	-	TANQUE FONAVI	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	189,0	16,7
FV002	San Martin y San Juan	FV-TAN-CEN	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	408,0	34,9
FV003	Constitución 198	FV-TAN-CEN	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	408,0	34,9
FV004	Carriego y Alem	FV-TAN-CEN	-	53%	-	47%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	408,0	34,9
FV005	San Martin y Defensa	PCFV005	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	PCFV006	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	68,0	6,6
FV007	Cariboni N° 2351 e/ Chaco y Rosario	PCFV007	-	14%	86%	-	-	-	x	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	> 500	95,1
FV009	Cariboni y Rio Bermejo	PCFV009	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	3	168,3	170,6%	> 500	341,0	31,9
FV011	Corrientes esq. 12 de Octubre	PCFV011	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	232,0	20,3
FV013	Av.Bélgica N° 1101 esq. Jorge Novak	PCFV013	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	4	4,8	157,9%	16,0	< 1	< 1
FV014	J.D. Perón 535 y Pringles	PCFV014	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	42,6
FV018	Av. Eva Perón y Gral. Hornos	PCFV018	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	4	30,8	139,6%	92,0	59,0	5,8
FV019	Río Caraguata n° 1401 y Directorio	PCFV019	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
FV020	Cabildo y Eva Perón	PCFV020	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV021	Mantovani y Calle 1407	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
FV022	Juan Mantovani 587 e/ C.1423 y C. 1409	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV023	Mantovani y Calle 1429	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV025	Calle 1423 (901) a 400 mts de Mantovani	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV040	1439 y Juan Mantovani.	FV-TAN-CRU	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	46,1
FV064	C. 1439 e/ C.1420 y a 300 mts de Juan Mantovani	FV-CIS-SAR	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
FV065	Eva Perón N° 9695 y C. 1423	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV066	Avenida Eva Perón y Calle 1352	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV084	1610 e/RP 53 y 1647	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	9,8	179,5%	36,0	< 1	< 1
FV085	1653 e/Av. La Plata y A° Las Conchitas	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Suecia	PCFV112	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	380,0	32,6
FV120	Calle 1404 N° 498 e/ R.P. 53 y campo	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO SARMIENTO	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV121	Av. Gral. Savio N° 598 esq. Sicilia	FV-TAN-MAY	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV124	E.B. SARMIENTO	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV132	Calle 1426 esq. 1437 – B° San Francisco Grande (oeste)	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV147	Av. La Plata 50	FV-CIS-SAR	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV149	Av. La Plata y Calle 1305	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	54,8	159,8%	184,0	< 1	< 1
FV156	Calle 1433a y 1418	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV157	Calle 1443 y 1430	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV158	Calle 1440 a 400m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
FV159	calle 1440 a 1000m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV160	calle 1452 y RP53	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV166	Calle 1440 y 1455	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV024	Eva Peron y Calle 1409	FV-CIS-SL	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	5	54,2	181,9%	228,0	< 1	< 1
FV036	Calle 1422 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	< 1	< 1
FV037	Calle 1432 N° 901 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	50,0	196,0%	197,0	< 1	< 1
FV041	Calle 1335 N° 801 y 1328	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	204,3	115,5%	> 500	< 1	< 1
FV042	Calle 1316 y 1333	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV045	Los Inmigrantes y Calle 1355	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	7,5	173,3%	27,0	< 1	< 1
FV050	Av. Eva Perón N° 7700 e/1310 y Cacheuta	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV087	1364 N° 1082 esq. 1317a	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV088	1327 N° 3201 e/ 1364 y 1370	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO SAN LUIS	-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
FV089	1356 N° 1700 e/ 1347 y 1349	FV-CIS-SL	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV086	1374 N° 900 esq. 1313	FV-CIS-SL	-	28%	72%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV092	1345 e/Av. La Plata y 1364	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
FV104	Calle 1363 N° 100 y Los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
FV116	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV130	Calle 1341 N° 511 esquina calle 1310	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV134	Los Inmigrantes y calle 1363	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV143	Calle 1328 y 1355	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	250,5	115,0%	> 500	< 1	< 1
FV177	Calle 1347 a 58 mts de Av. De los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	169,0	139,2%	> 500	< 1	< 1
FV026	Calle 77 y Posadas	FV02	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	> 500	42,6
FV027	El Zonda y El Gaucho	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	42,6
FV028	Riobamba N° 1501 y Olivero	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	> 500	42,6
FV029	Pte. Illia y Alvear	FV02	-	1%	99%	-	-	BATERIA SAN NICOLAS	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	42,6
FV097	Castelli N° 1001 esq. EE.UU	FV02	-	43%	57%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	> 500	42,6
FV152	El Apero entre Calle 437 y El Malambo	FV02	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	80,8	197,5%	320,0	> 500	42,6
FV174	Castelli esquina EEUU de América	FV02	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	170,3	138,2%	> 500	> 500	42,6
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	FV-TAN-MAY	-	12%	-	88%	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV031	Virgen del Valle y El Clavel	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV032	Virgen del Valle y La Ancianidad	FV-TAN-MAY	-	23%	-	77%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV033	Virgen del Valle y Río Pilcomayo	FV-TAN-MAY	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV034	Av Cacheuta y Boston	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-	TANQUE MAYOL	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	FV-TAN-MAY	-	11%	-	89%	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV053	Cacheuta 2701 y Calle 1353	FV-TAN-MAY	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	9,0	177,8%	33,0	< 1	< 1
FV063	Av Eva Perón 5880	FV-TAN-MAY	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	137,0	177,3%	> 500	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
FV038	Calle 1423 e/ 1422 y 1428	PCFV038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	40,3	195,0%	158,0	79,0	11,2
FV046	Batalla de Ituzaingo 2780 e/ Contreras y C.214A	PCFV046	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	68,0	6,6
FV047	Boedo e/ Montserrat y Túnez	PCFV047	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV048	León XIII e/ Pte. Perón y Beirut	PCFV048	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	116,8	198,3%	464,0	< 1	< 1
FV049	San Antonio e/ Irala y Alvar Cabeza de Vaca	PCFV049	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
FV051	Cacheuta 3601 y 1371	PCFV051	-	31%	69%	-	-	-	X	PUELCHE	2	250,5	140,9%	> 500	< 1	< 1
FV055	Calle 832 e/M.Grass y Piedrabuena (V.A.)	PCFV055	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV057	Virgen del Valle N° 2599 y Chaco	PCFV057	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV058	Juan B. Justo y Arcasubi	PCFV058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	20,0	190,0%	77,0	36,0	3,9
FV059	Av.Bosques y Ruta 36	PCFV059	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	3	10,3	156,4%	29,0	< 1	< 1
FV060	Delgado y Cafferatas	PCFV060	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	34,0	3,8
FV062	Calle 740 y El Clavel	PCFV062	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	7,5	173,3%	27,0	< 1	< 1
FV067	Calle 1108 N° 1702 e/ 1131 y 1139	PCFV067-70	-	23%	77%	-	-	BATERIA ING. ALLAN	-	PUELCHE	4	8,5	176,5%	31,0	< 1	< 1
FV068	Calle 1108 N° 2280 esq. 1139	PCFV067-70	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV069	Diag. Los Quilmes N° 500	PCFV067-70	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	4	250,5	115,0%	> 500	< 1	< 1
FV070	Calle 1108 N° 2300	PCFV067-70	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV148	Calle 153a 301	PCFV148	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV167	Calle 1145 y Calle 1122	PCFV067-70	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	18,8	189,3%	72,0	< 1	< 1
FV071	San Nicolás N° 2501 y Chaco	PCFV071	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	6,3	168,0%	22,0	205,0	18,0
FV072	Finochietto N° 1411 y Fracción V	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO CRUCE VARELA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	46,1
FV073	C.O.Cruce	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	46,1
FV074	Carlos Gardel N° 700 y Campichuelo	FV-TAN-CRU	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	46,1
FV142	Dardo Rocha y Cerro Famatina	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	46,1
FV078	Bruselas y Polonia	PCFV078	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	18,3	189,0%	70,0	> 500	56,8
FV079	Bruselas y Bulgaria	PCFV079	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	14,3	186,0%	54,0	< 1	< 1
FV080	517 N° 1700 y Portela	PCFV080	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	16,0	187,5%	61,0	< 1	< 1
FV082	El Paisano N° 1899 e/445 (B° Don José Planificado)	FV-TAN-P82	-	1%	99%	-	-	BATERIA DON JOSE PLANIFICADO	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	238,0	61,8
FV131	El Malambo N° 105 esq. La Tranquera	PCFV131	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	272,0	23,6
FV165	Calle Monteverde e/445 y 449	PCFV165	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	130,0	180,0%	480,0	< 1	< 1
FV090	Av. La Plata N° 1200 e/1327 y 1319a	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-	BATERIA LAS COLONIAS	-	PUELCHE	4	5,5	163,6%	19,0	< 1	< 1
FV093	1681 esq. 1608	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV094	1364 N° 2592 e/ 1371 Y 1357	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV144	La Plata 1700	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV146	Calle 1353 4100	PCFV090-94	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	50,0	196,0%	197,0	< 1	< 1
FV176	Calle 1608 entre 1671 y 1673	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	188,0	127,0%	> 500	< 1	< 1
FV095	Pisani N° 1101 esq. Suecia	PCFV095	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV096	Humahuaca N° 501 y 511	PCFV096	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV098	Cno. Touring Club N° 1499 y Canalejas	PCFV098	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	6,0	166,7%	21,0	< 1	< 1
FV100	228-Gral Perón N° 1501 y Bs. As.	PCFV100	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV102	V.Abrille N° 975 casi esquina Calle 519	PCFV154	-	6%	94%	-	-	BATERIA SAN JORGE	-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
FV154	La Paloma y calle 560	PCFV154	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV103	Cicilia N° 2020	PCFV103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV105	Calle 527 e/ 554 y 554A	PCFV105	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV106	Calle 554 N° 1103 e/ Diag. Jarilla	PCFV106	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	53,3	196,2%	210,0	161,0	14,3
FV108	Calle 1348 N° 1003 e/ 1317 Ay 1319 A - (B° San Francisco Este)	PCFV108	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	480,0	40,9
FV109	Calle 1435 N° 1719 esq. 1434 - (B° San Francisco Oeste)	PCFV109	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV110	Las Lengas N° 2303 e/ El cardenal y El Zorzal - (B° Santa Inés)	FV01	-	7%	93%	-	-	BATERIA GOBERNADOR COSTA	-	PUELCHE	4	179,5	131,7%	> 500	< 1	< 1
FV111	Los Alamos N° 2502 e/ Av. Blas Parera y El Homero - (B° Santa Inés)	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV150	El Ñandú e/ Las Casuarinas y Los Alamos	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	85,8	197,7%	340,0	< 1	< 1
FV151	Los Lapachos y Tinkunaku	FV01	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	11,5	182,6%	43,0	< 1	< 1
FV161	Los Laureles y El Cardenal	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV162	La Paloma y Los Sauces	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV163	El Mirlo entre Los Olivos y Los Lapachos	FV01	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV113	Bonn N° 1203 y Austria	PCFV113	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	148,0	13,3
FV114	Calle 531 N° 2200	PCFV114	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	5	52,0	219,3%	256,0	> 500	58,5
FV115	Progreso 2190 e/ Intendente Jose Luis Cariboni y virgen de valle	PCFV115	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV117	Lourdes N° 402 y Ruta Prov. N° 53	PCFV117	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	78,0	7,4
FV119	Suecia N° 1601 esq. Lisboa	PCFV119	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV122	Copenhage N° 502 esq. Alemania	PCFV122	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	93,0
FV123	Calle 172 - Río Negro N° 1790 esq. Alvarado	PCFV123	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	38,3	179,4%	141,0	< 1	< 1
FV125	Bourel y Chacabuco	PCFV125	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	49,3	195,9%	194,0	24,0	2,9
FV126	Riobamba y Vías	PCFV126	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV127	Calle 1151 Ay Calle 1130	PCFV127	-	46%	54%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	198,0	29,1
FV128	Río Diamante N° 3080 esquina Villegas	PCFV128	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	42,6
FV129	Río Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	PCFV129	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	> 500	39,4
FV133	Calle 1151 y Calle 1118	PCFV133	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	73,0	6,9
FV137	San Geronimo 605	PCFV137	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	68,7
FV138	Campana y Esmeralda	PCFV138	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	42,6
FV139	Guamini 2711	PCFV139	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV140	San Martin y Monteagudo	PCFV140	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV141	Alfonsina Storni 74	PCFV153	-	2%	98%	-	-	BATERIA BARRIO ALTAMIRA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	53,0	5,3
FV153	Florida y Miguel Cané	PCFV153	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	66,5	199,3%	132,0	53,0	5,3
FV145	Av. Cacheuta entre Calle 1363 y Calle 1371	PCFV145	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	16,0	187,5%	61,0	> 500	95,9
FV164	calle 1155 y 1138	PCFV164	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV168	Calle 1149 y Calle 1136	PCFV168	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
FV169	Calle Jacinto Benavente y E, D Amicis	PCFV059	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	4,8	157,9%	16,0	< 1	< 1
FV175	Santa Lucia y Aconquija	PCFV118	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	20,0	190,0%	77,0	< 1	< 1
FV178	Av. Bosques y calle 819	PCFV178	-	50%	50%	-	-	-	X	PUELCHE					-	-
FV183	Remedios de Escalada esquina Carmen de Areco	PCFV183	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	9,0	177,8%	33,0	> 500	71,7
FV184	Turquia, entre Bruselas y Milán	PCFV184	-	6%	94%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	-	-
FV191	Rumania entre París y Paysandú	-	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE					-	-
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	4%	-	96%	-	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU002	Colombia 1007 e/Av. De las Americas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU005	Bogado 800 e/Islas Malvinas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU007	Republica Argentina 578 e/Venezuela.	GU-TAN-PED	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU008	Brasil 103 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU020	Remedios de Escalada e/Tomas Guido y Godoy Cruz	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU031	Brasil y Mesopotamia	GU-TAN-PED	-	17%	-	83%	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU032	Avenida 38 entre calle 5 y 6	GU-TAN-PED	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
GU010	Violeta Antier 5095 e/Santos Discepolo.	PCGU010	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU011	Alfonso Amat 4611 e/Jose Negiia.	PCGU011		100%					X	PUELCHE	-					
GU012	Calle 117 1000 / Av. C. Mereles 1050 e/calles 118 y 120.	GU-TAN-YA	3%	1%		96%		TANQUE ESTE - LA YAYA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	184,0	16,3
GU013	Calle 118 N° 1633 e/calles 121 y 123.	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	184,0	16,3
GU014	Cjal. Capuano 490 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		2%		98%			-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	184,0	16,3
GU015	Calle 118 2041 e/calles 127 y 129.	GU-TAN-YA		2%		98%			-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	184,0	16,3
GU016	Calle 118 2471 e/calles 133 y 135.	GU-TAN-YA	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	184,0	16,3
GU017	Av. 139 N° 510 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		4%		96%			-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	184,0	16,3
GU023	Calle 103 y Calle 124	GU-TAN-YA				100%			-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	184,0	16,3
GU024	Calle 116 y Av. 99	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	184,0	16,3
GU018	Av. 21 N° 1099 e/calle 36.	GU01	-	3%	97%	-		BATERIA LAS LOMAS	-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU019	Cjal. Placido Bajo N° 901 e/ calle39.	GU01	-	-	100%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU006	Av. Nestor Kirchner 630 e/Avellaneda y Güemes.	GU02	1%	25%	74%	-	-	BATERIA B° SANTA MAGDALENA	-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU021	Roque Saenz Peña y Santa Elena	GU02	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU022	Dorrego y Luis A. Testa	GU02	2%	12%	86%	-			-	PUELCHE	4	30,8	193,5%	120,0	< 1	< 1
GU025	Calle 6 y Tte. Juan Domingo Baldini	PCGU025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
GU026	Kingston y Honduras		10%	89%	1%			BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	-	PUELCHE						
GU027	Brasilia y Guayanas	-	2%	89%	9%				-	PUELCHE	-					
GU028	Puerto España y Brasilia	-	10%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU029	Gral Paz esicalle 7 y Lib. Gral J. de S.Martin		11%	89%						PUELCHE						
GU030	La Rioja e/ Av. Hipólito Yrigoyen y Sarmiento	-	11%	89%				BATERIA NUMANCIA	-	PUELCHE						
JCP002	Wilde 4573 e/Corbeta Uruguay y Fragata Sarmiento	JCP-TAN-PR	-		-	100%	-	TANQUE PRIMAVERA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
JCP003	Av. Deniue e/ Av. Pres. Hipólito Yrigoyen	JCP-TAN-PR				100%			-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
JCP005	Las 3 Marías 5700 e/ Av. Jose Alube y Jose C. Paz	JCP-TAN-PR	-	1%		99%			-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
JCP006	Calle Pampa de Junin a 50 m de Yrigoyen	JCP-TAN-PR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0046	Ferro Nuevo y Guanabara	LM003	100%						X	PUELCHE					< 1	< 1
LM0047	Colect. R3 y Huillanimi B° Playa Lelior.	LM003	100%						X	PUELCHE					< 1	< 1
LM0049	Escribano y Colden B°El Pino.	LM027	100%						X	PUELCHE	-				< 1	< 1
LM0053	Haidi y Galileo - Haidi y Torres.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	62,0	4,6
LM0054	Luciano Torrens N° 600 y Sermón Perez B° San Enrique.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	4	35,8	113,2%	77,0	62,0	4,6
LM0056	Guanacache y Pino B° Recoleta.	LM007	72%		28%				X	PUELCHE	1	-	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0060	Huemul y Rodney B°Maria Elena	LM002		100%					X	PUELCHE					16,0	1,4
LM0064	Urdaneta y Rodney B° Maria Elena	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	16,0	1,4
LM0060	M.Garrido e/ y Colegiales / EC Colegiales y M. Becerra)	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0070	M.Garrido e/ S. Fajardo y Rocamora B° 17 de Octubre	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0072	J. De Alvarado y Solid. Fajardo B° 24 de febrero	LM011		2%	98%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0073	J. De Alvarado y Solid. Fajardo B° 24 de febrero	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	196,7%	12,0	< 1	< 1
LM0074	Echauri N° 3200 e/ J.B.Justo y Vidal	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	4	22,0	144,1%	68,0	< 1	< 1
LM0075	Lavalleja y Conde	LM026		2%	98%				X	PUELCHE	4	15,3	186,8%	58,0	< 1	< 1
LM0076	N de Balboa y Lujan.	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	56,0	194,3%	134,0	< 1	< 1
LM0077	Castañon y Rio Cuarto B° El Porvenir	LM009		2%	98%				X	PUELCHE	4	32,8	193,9%	126,0	< 1	< 1
LM0078	Zequeira garcia E/ Falardo y Rocamora	LM002			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	16,0	1,4
LM0079	Urdaneta y Rocamora (E/ T de Rocamora y Del Tejar)	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	16,0	1,4
LM0081	Echauri e/ Ortega Zyrni Villa Scasso	LM014			100%				X	PUELCHE	4	115,8	196,1%	466,0	< 1	< 1
LM0083	Quiero N° 900 E/ Riva 21 /Cleno V/Draqones	LM024	10%	1%	89%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	21,8
LM0085	Martinez y Lasalle.	LM024		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	21,8
LM0087	Reseno e/Acaseuso y Alagon	LM011			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0094	A Vilela 700 y Guanabara E/ Guasayan y Morris B° Playa Lelior.	LM003	96%	2%	2%				X	PUELCHE	-				< 1	< 1
LM0095	Mantequazas N° 6100 e/Humanca y Acoade.	LM004		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	62,0	6,4
LM0096	M.Herrero e/ Guanacache y Eder - B° el Tobin	LM003		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0098	E. Clay (e/ Meadow y Puerto.	LM024			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	21,8
LM0099	Hugo West e/ Madreselva y milamores.	LM029	98%		2%				X	PUELCHE	-				98,0	3,7
LM0101	Scalzat y Gallardo.	LM001			100%				X	PUELCHE	4	8,0	175,0%	29,0	< 1	< 1
LM0108	Lavalleja N° 6100 e/ Alegria y Arcon	LM010		1%	99%				X	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
LM0109	Gamay y Peridn.	LM024			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	21,8
LM0112	Fernandez y Leopardo B° Candiati	LM008			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	62,0	4,6
LM0118	El Reseno 3351/e/ Ortega y Zequeira.	LM046			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	76,0	4,1
LM0121	L. Da Vinci 4000	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
LM0123	Tinogasta y Colegiales	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0124	Marcos Paz y Colegiales	LM047	84%	16%					X	PUELCHE	-				< 1	< 1
LM0125	Corrales, Pte N° 1100 y Espejo	LM003			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0126	Arcon al 3584 esquina Zinny	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	21,0	114,3%	49,0	< 1	< 1
LM0127	Castin 4000 esq. J.B. Justo	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	4	5,0	163,6%	19,0	< 1	< 1
LM0139	Caseravalle 3000 e/ Senori Perez y Rivas.	LM008		100%					X	PUELCHE	-				62,0	4,6
LM0140	Castro e/ Cepeda y Saraboa	LM026			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0143	Scalzati y Arcon	LM025	100%						X	PUELCHE	-				< 1	< 1
LM0146	Dragones y Fonvenido	LM008			100%				X	PUELCHE	4	37,1	194,6%	146,0	62,0	4,6
LM0158	Almacro y Apipe	LM045			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	16,9
LM0161	Ayax, Mauvel y Bacon - Jones Fte N° 5900	LM016		2%	98%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0164	Saenz y Cepeda	LM008		4%	96%				X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	62,0	4,6
LM0170	Arcon y Alegria E/ Fournier	LM016		1%	99%				X	PUELCHE	4	19,3	189,6%	74,0	< 1	< 1
LM0172	J.F.Echauri y Donuerb E/ Alagon	LM009		2%	98%				X	PUELCHE	4	214,3	185,7%	> 500	< 1	< 1
LM0175	Baez y Bavio	LM016			100%				X	PUELCHE	4	11,8	183,0%	44,0	< 1	< 1
LM0177	Baez y Barrientos	LM034		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0179	Coronel Conde e/ Martinez Villena y Martin Coronado	LM048			100%				X	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
LM0180	Machain esq. Puerto Argentino.	LM008		3%	97%				X	PUELCHE	4	46,3	195,7%	182,0	62,0	4,6
LM0187	Pte Argentino y Conc. del Valle	LM026			100%				X	PUELCHE	4	6,0	166,7%	21,0	< 1	< 1
LM0189	Leones Entre Garay y Conde	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	39,0	193,9%	129,0	< 1	< 1
LM0191	Icalma esq. M. Arias	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	8,8	161,2%	16,0	< 1	< 1
LM0192	Tolosa entre Barrientos y Barataari.	LM048			100%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0193	Jachal esq. Juan Pio Gana.	LM048		1%	99%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LM0195	Escuela entre Iriarte y Gallardo	LM026			100%				X	PUELCHE	4	8,0	175,0%	< 1	62,0	4,6
LM0197	Scarlatti e/ Villanueva y Moreno	LM025		1%	99%				X	PUELCHE	4	32,8	176,8%	76,0	< 1	< 1
LM0198	Enrique Clay y M. Doello	LM051		1%	99%				X	PUELCHE	4	56,5	196,5%	233,0	< 1	< 1
LM0957	Guerrico 1270 E/ San Ignacio y San Juan	LM004			100%				X	PUELCHE	4	16,0	188,1%	64,0	62,0	6,4
L0025	M. Piaggio y Olden	L005	64%	2%	33%				X	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO042	Santa Lucia e H.Yrigoyen	LO01	-	1%		99%		PLANTA - LO042	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO067	De la Peña y Moldes	LO04	-	-	-	100%	-	PLANTA - LO067	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO072	Timbó y Cap. Moyano	LOPC1		2%		98%		PLANTA - LO072	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO078	Arenales a 100m de J. Ingenieros	LOPC1	-	9%	91%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO079	Arenales a 300m de L.M.Drago	LOPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	10,3	180,5%	38,0	< 1	< 1
LO080	Juan xxiii 2400 entre L.M.Drago y Bahia Blanca	LOPC1	-	13%	87%				-	PUELCHE	4	19,5	189,7%	75,0	< 1	< 1
LO081	L.M.Drago y Melian	LOPC1	3%	77%	21%				-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO118	Martin Rodriguez y Timbó	LOPC1	1%	14%	85%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO119	Tala y Pino	LOPC1	3%	3%	94%				-	PUELCHE	5	6,8	190,7%	30,0	< 1	< 1
LO121	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	-	19%	81%				-	PUELCHE	4	73,0	197,3%	289,0	< 1	< 1
LO125	Av. Argentina y Guido	LOPC2	-	37%	63%	-	-		-	PUELCHE	3	53,3	170,0%	158,0	< 1	< 1
LO126	Av. Argentina	LOPC2		79%	21%			BATERIA LLAVALLOL	-	PUELCHE	2	63,0	139,2%	125,0	< 1	< 1
LO133	Av. Argentina y Junin	LOPC2		50%	50%				-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO138	Junin 170 entre Rodriguez y Las Heras	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO139	Arnaty Peiribl	LOPC1		11%	89%				-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO140	Av.Argentina 2950 y Peiribi	LOPC1	-	5%	95%				-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO141	Rodriguez 3507 esq Mercedes	LOPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	4	22,8	191,2%	88,0	< 1	< 1
LO142	Jose Ingenieros 1668 e/ Calleriata Norte y Juan XXIII	LOPC1		20%	80%				-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO146	Calle Pintos 2007 e/ Viel y Florida	LOPC1	-	4%	96%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO147	Calle Magnolia 2099 e/ Moreno y V.Barbieri	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO148	Magallanes 2600 entre Ucrania y Duhalde	LOPC1		1%	99%				-	HIPOPUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
A8019	Comisarenes MALVINAS ARGENTINAS y Pilar	LOPC2		1%	99%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
A8066	Tigre y Policastro	LOPC2		8%	92%				-	PUELCHE	4	56,5	196,3%	215,0	< 1	< 1
LO083	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO084	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	22,8	191,2%	88,0	< 1	< 1
LO085	L.M.Drago e/Cno las Flores y Fonrouge	LOPC2	-	4%	96%				-	PUELCHE	4	48,5	130,8%	135,0	< 1	< 1
LO086	Cno de las Flores a 500m de Drago	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO087	Cno de las Flores y MALVINAS ARGENTINAS	LOPC2		3%	97%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO093	Cno San Vte a 500m pozo 87	LOPC2	3%	12%	85%				-	PUELCHE	5	38,4	217,8%	188,0	< 1	< 1
LO106	J. B. Justo y Cuyo	LOPC2	65%	5%	30%	-	-	BATERIA BURZACO	-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO117	Mendoza y N. Silva	LOPC2		2%	98%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO122	J. Ingenieros	LOPC2	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	2%	23%	75%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
LO144	Avenida Argentina y RP N° 16	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO145	Villarino y Avenida Argentina	LOPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO149	Rene Vallo y Jose Melián	LOPC2	67%	-	33%	-	-		-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO095	Larrea y Gardel	AB14	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	8,5	176,5%	31,0	< 1	< 1
LO113	Letoir 432	LO38	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO120	Pino y el Cairo	LOPC1	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	30,3	138,7%	90,0	< 1	< 1
LO127	Jose Marmol e/Allemandri y Anchorena	LO47	-	1%	-	99%	-	PLANTA - LO127	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO128	Martí y Av. Cabred	LO13	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO134	Larrea y Colihue	AB14	-	6%	-	94%	-	PLANTA - LO134	-	PUELCHE	4	14,5	186,2%	55,0	< 1	< 1
LO135	Matienzo y Rodriguez	AB22	1%	2%	-	96%	-	PLANTA - LO135	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
LO152	Necochea esquina Lujan	-	-	100%	-	-	-	PLANTA - LO152	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA002	Ambrosetti 1900 e/Beltran y Martin Fierro.	MAPC1	-	21%	79%	-	-		-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MA003	ALMIRANTE_BROWN 2500 e/Viena y Rep. Argentina.	MAPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	180,5	131,1%	> 500	< 1	< 1
MA004	Asamblea 1800 e/1 de Septiembre.	MAPC1	1%	2%	98%	-	-	BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	-	PUELCHE	5	81,4	220,9%	403,0	< 1	< 1
MA006	Viena e/Canning.	MAPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	17,5	188,6%	67,0	< 1	< 1
MA018	Olíden entre 11 de Septiembre y Juan Cruz Varela	MAPC1	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
MA009	Cangallo 1200 e/San Lorenzo y Uspallata.	PCMA009	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MA010	Uspallata 1000 e/Soller y O´Brien.	PCMA010	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	67,0	6,5
MA011	Stoppler 900 e/Bat. de Maipu y Paso de los Andes.	PCMA011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	88,0	13,1
MA012	San Lorenzo y Seguí	PCMA012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	42,6
MA016	Canadá 748 y Seguí	MAPC2	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MA017	Palacios y Seguí	MAPC2	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	165,0	138,7%	> 500	< 1	< 1
ME001	25 DE MAYO E/PUEYRREDON	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	8,5	176,5%	31,0	64,0	6,3
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	64,0	6,3
ME003	25 MAYO E/ 9 DE JULIO	ME-TAN-CES	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	64,0	6,3
ME004	BROWN E/ CENTENARIO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	64,0	6,3
ME006	BROWN E/ CARLOS PELEGRINI	ME-TAN-CES	-	6%	-	94%	-	TANQUE MERLO	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	64,0	6,3
ME007	BROWN E/ M.BRAVO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	13,5	185,2%	51,0	64,0	6,3
ME015	9 DE JULIO E/ SAN LORENZO	ME-TAN-CES	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	64,0	6,3
ME016	SAN LORENZO E/CANNING	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	64,0	6,3
ME060	SAENZ PEÑA Y AV. CALLE REAL	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	64,0	6,3
ME005	25 MAYO E/ J.M.Castro ex Pearson	ME02	75%	-	25%	-	-	BATERIA PARQUE SAN MARTIN NORTE	-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	57,0	9,0
ME014	BROWN E/PIZURNO	ME02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	57,0	9,0
ME008	LIBERTAD E/ ARGENTINA Y PUCHEU	PCME008	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	63,0	6,2
ME009	COVIPOL. EDIF 38. ROSSI Y ECHEVERRY	PCME009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	33,5	194,0%	131,0	< 1	< 1
ME010	COVIPOL. EDIF 13. ROMAY Y ZUNDA	PCME010	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
ME017	DEFENSA E/BARAVINO Y HORTIGUERA	PCME017	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	42,6
ME018	OYUELA E/FRIAS Y RUTA 200	PCME018	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	24,3	114,3%	56,0	41,0	4,3
ME019	PEDRIEL E/ TALA	PCME019	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	29,5	114,9%	68,0	29,0	3,3
ME020	INDEPENDENCIA E/ SULLIVAN	PCME020	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	12,5	184,0%	47,0	< 1	< 1
ME021	ESNAOLA Y BOYACÁ	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME022	ESNAOLA Y BACH	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME023	AV.ARGENTINA Y CHOPIN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-	TANQUE LOMA GRANDE	-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME025	AV.ARGENTINA E/GAVILAN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME081	Strauss y Juan Sebastian Bach	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME087	Av. Argentina y Lezama	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME090	Angel Rodriguez y Curapaligue	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME026	TUNUYÁN E/AREVALO	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME027	VIDT E/ FEBAL	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME028	VIDT E/DEMOCRACIA	ME-TAN-REC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	18,5	189,2%	73,0	< 1	< 1
ME029	VIDT E/CHAGAS	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-	TANQUE RECONQUISTA	-	PUELCHE	4	13,0	184,6%	49,0	< 1	< 1
ME030	VIDT E/FAMATINA Y DESSY	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	113,8	198,2%	452,0	< 1	< 1
ME063	FILIBERTO Y TARIJA	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	35,8	194,4%	140,0	< 1	< 1
ME079	Antofagasta y Fraga	ME-TAN-REC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	45,8	195,6%	180,0	< 1	< 1
ME082	Cacheuta y José Martí	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME031	GARDEL E/PAYRO	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	46,0	4,8
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	3	167,0	87,9%	280,0	46,0	4,8
ME033	VIDT E/DISCEPOLO	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	6,3	168,0%	22,0	46,0	4,8
ME034	VIDT E/ACCARCOS	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	80,8	197,5%	320,0	46,0	4,8
ME035	VIDT E/MEDMA	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-	TANQUE ARCO IRIS	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	46,0	4,8
ME068	JOSE MARTI Y DALTON	ME-TAN-ARC	-	6%	-	94%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	46,0	4,8
ME088	Lorenzini entre Delin Funes y Fraga	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	250,5	140,9%	> 500	46,0	4,8
ME091	P.Echague y P. Podestá	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	142,0	169,5%	> 500	46,0	4,8
ME092	Carcavallo entre Cassaux y Orfilia Rico	ME-TAN-ARC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	46,0	4,8
ME102	Fraga y Davila	ME-TAN-ARC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	20,8	196,4%	80,0	46,0	4,8
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	PCME036	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	3	28,0	167,0%	82,0	< 1	< 1
ME037	AMADO NERVO E/ANCON Y AMPERE	ME-CIS-PSM	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	4	5,3	161,9%	18,0	< 1	< 1
ME038	LOS ALELIES Y TILCARA	ME-CIS-PSM	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME039	LOS ALELIES E/TILCARA Y AGUARIBAY	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME040	LOS JACINTOS E/ETIOPIA	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	22,3	191,0%	86,0	< 1	< 1
ME041	ACHALA E/LAS RETAMAS	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME045	ALVAREZ JONTE E/ LOS ALELIES	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	19,8	189,9%	76,0	< 1	< 1
ME046	LAS RETAMAS E/JURAMENTO	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME047	ALVAREZ JONTE E/ LOS GERANIOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME048	ALVAREZ JONTE E/LAS DALIAS	PCME048	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	25,0	3,0
ME049	GABRIELA MISTRAL E/ALTE BROWN	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	19,8	189,9%	76,0	< 1	< 1
ME051	GENDARMERIA GURRUCHAGA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME053	ZARRAGA E/ GAGUERRE Y PEDERNERA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME054	ZARRAGA E/ GAVILAN	ME-CIS-PSM	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	5,0	160,0%	17,0	< 1	< 1
ME058	12DE FEBRERO	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME076	El Hornero 3710	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	5,8	165,2%	20,0	< 1	< 1
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	HIPO/PUELCHE	3	167,3	172,2%	> 500	< 1	< 1
ME086	Garmendia y Almte. Brown	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME042	GENDARMERIA E/ FLORES A.	PCME042	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	18,8	189,3%	72,0	55,0	5,5
ME050	GABRIELA MISTRAL E/BENOIT	PCME050	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME055	PUEYRREDON Y O'BRIEN	PCME055	-	-	-	100%	-	-	X	PUELCHE	4	17,3	188,4%	66,0	37,0	3,8
ME056	SAN ANTONIO Y PARAGUAY	PCME056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
ME057	CHACO N° 310 E/DIRECTORIO Y NOGUERA	PCME057	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME059	GABRIELA MISTRAL Y ALPATACAL	PCME059	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME061	SAENZ PEÑA Y AV. RIVADAVIA	PCME061	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	PCME065	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA Y SOLANET	PCME066	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	167,3	172,2%	> 500	< 1	< 1
ME067	TRAFUL Y BLANCO ESCALADA	PCME067	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	68,0	6,6
ME069	ATAHUALPA Y PEDRO CHUTRO	PCME069	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME070	TUCUMAN Y LA RIOJA	PCME070	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	16,5	187,9%	63,0	52,0	5,3
ME073	SARMIENTO 2398 Y LA HABANA	PCME012-73	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	56,0	7,7
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	PCME074	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME075	MEDRANO 811 Y SANTA FE	PCME075	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME078	Garay 1753	PCME078	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME080	Federico Lacroze y Matorras	PCME080	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	ME01	-	-	100%	-	-	POI MERLO	-	PUELCHE	2	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	ME01	2%	-	98%	-	-		-	PUELCHE	2	313,0	84,5%	> 500	< 1	< 1
ME089	Curapaligüe y 25 de Mayo	PCME089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
ME093	Morse y Av. del Bicentenario	PCME093	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
ME094	Brasil y Guardia Vieja	PCME094	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	64,0	6,3
ME095	Sullivan y Sargento Cabral	PCME095	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	9,8	179,5%	36,0	< 1	< 1
ME096	Gral Ocampo y T Saley		-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME097	Orán entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME098	Tasso y Oran	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME099	De Roma y Necochea	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME100	Republiquetas entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME101	Juan A Maza y Dr Ricardo Raúl Alfonsin	PCME101	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	29,0	123,7%	76,0	< 1	< 1
ME103	Los Arneros y San Martin	PCME103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	70,8	197,2%	280,0	< 1	< 1
ME113	EVA PERON E/PELLEGRINI	PCME113	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	12,3	117,2%	31,0	< 1	< 1
MI001	Belgrano 400 e/Vicente Lopez y C. Malnatti.	MIPC2	-	-	-	100%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE	-	PUELCHE	4	98,0	198,0%	389,0	< 1	< 1
MI020	Julio A. Roca 216 e/Dorrego y Roseti.	MIPC2	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	20,8	190,4%	80,0	< 1	< 1
MI035	Pavon 1100 e/R. Peña y Sgto. Cabral.	MIPC2	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	16,5	187,9%	63,0	< 1	< 1
MI002	Julio A. Roca 800 e/Serrano y Muñoz.	PCMI002	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	52,5	196,2%	207,0	< 1	< 1
MI003	Italia 1300 e/Francia y L. N. Alem.	PCMI003	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	7,3	172,4%	26,0	82,0	7,8
MI006	Pardo 400 e/San Luis y C. Malnatti.	PCMI006	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI007	Julio A. Roca 1900 e/Gelly Obes y Zuviria.	PCMI007	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	39,0	4,2
MI008	Conesa 2000 e/ Gelly Obes y J. M. Zapiola	PCMI008	1%	-	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI009	Serrano 800 e/Conesa y SAN_JOSE	PCMI009	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	147,0	162,4%	> 500	198,0	17,4
MI010	Cjal. E. Tribulato 700 e/Serrano y Urquiza.	PCMI010	2%	27%	72%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	300,0	25,9
MI011	Int. J. Irigoin 700 e/Serrano y Stgo. Del Estero.	PCMI011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	31,5	193,7%	123,0	< 1	< 1
MI013	J. B. Alberdi 200 e/Dorrego y Accuenaga.	PCMI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	6,8	170,4%	24,0	28,0	3,3
MI014	Serrano 400 e/J. B. Alberdi y Haedo.	MIPC1	-	100%	-	-	-	CAG SAN MIGUEL CENTRO	-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	310,0	29,3
MI046	Paunero 100 e/Pardo.	MIPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	310,0	29,3
MI015	Cnel. Fraga 2300 e/Int. J. Irigoin y Marcos Sastre.	PCMI015	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI016	Cnel. M. Fraga e/Salerno y Tomas Edison.	PCMI016	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI017	Vicente Lopez e/Marcos Sastre y Malvinas.	PCMI017	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	27,0	3,2
MI018	Pardo e/Libertad y J. M. Zapiola	PCMI008	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	21,5	190,7%	83,0	< 1	< 1
MI019	J. B. Alberdi e/J. Zapiola y Gelly Obes.	PCMI008	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	9,3	178,4%	34,0	< 1	< 1
MI021	Cjal. E. Tribulato 2300 e/ G. Campos y Libertad.	PCMI021	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
MI022	Tomas Guido 4400 e/J. R. Lopez y El Zonda.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	188,0	16,6
MI023	Av. Alte. J. Lopez 4500 e/J. D. Solis y Eva Peron.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	188,0	16,6
MI025	T. Guido 5900 e/Uriarte.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	188,0	16,6
MI026	T. Guido 5301 e/La Pinta.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	188,0	16,6
MI032	Marchena 3256	MI_CIS_SAR	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	188,0	16,6
MI024	E. Ferreyra 4200 e/T. Guido.	MI_CIS_GUA	1%	2%	98%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI028	Santa Maria 5100 e/Vicente Fatome.	MI_CIS_GUA	1%	3%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI037	Cisterna La Guarida	MI_CIS_GUA	4%	4%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI065	Calle Defensa e Italia	MI_CIS_GUA	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI066	Dr. Enrique Finochietto e/Sta Maria y Fray Antonio Marchena	MI_CIS_GUA	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI033	Int. J. Irigoin 400 Gelly Obes y Granaderos.	PCMI033	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	5	7,8	194,9%	35,0	60,0	5,9
MI036	Cnel. M. Fraga 3400 e/Marconi.	PCMI036	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	3,8	146,7%	12,0	35,0	3,8
MI038	Roca 1400 e/Alen.	PCMI038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI039	Belgrano 2000 Gelly Obes y R. S. Peña.	PCMI039	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	33,5	194,0%	131,0	140,0	12,6
MI040	Italia 2300 e/Gaspar Campos y J. M. Zapiola.	PCMI040	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	8,5	176,5%	31,0	76,0	7,3
MI041	Belgrano 900 e/D' elia y Muñoz	PCMI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI042	Pardo 10 e/Ruta 10.	PCMI042	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI043	Conesa 416 e/San Luis.	PCMI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	60,0	8,6
MI045	Rodriguez Peña 2600 e/Williams.	PCMI040	-	8%	92%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	76,0	7,3
MI004	Conesa 1300 e/Martin Irigoyen.	MI_CIS_CEN	-	20%	80%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	28,0	3,1
MI034	Martin Irigoyen y Juan B Alberdi	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	28,0	3,1
MI047	Martin Irigoyen e/Obilitio y Francia.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	28,0	3,1
MI048	Av. Francia 500 e/Sta. Fe y Parana.	MI_CIS_CEN	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	28,0	3,1
MI049	Av. Francia 600 e/Moreno.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	15,0	186,7%	57,0	28,0	3,1
MI051	Av. Francia 1100 e/Tucuman y Azopardo.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	28,0	3,1
MI060	Conesa entre Martin Irigoyen y Sarmiento	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	28,0	3,1
MI067	Conesa e Irigoyen	MI_CIS_CEN	1%	14%	84%	-	-		-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	28,0	3,1
MI052	Rodrigo de Triana 1500 e/R. Balbin.	PCMI052	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI053	Defensa e/R. Balbin.	PCMI053	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI054	Cruz del Sur e/Tomas Espora.	PCMI062	-	1%	99%	-	-	BATERIA MI054-MI062	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI062	Calle Güemes e Isabel La Catolica	PCMI062	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI055	J. J. Paso 5500 e/La Niña y Isabel la Catolica.	PCMI055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MI056	Juan J. Paso e/Beron de Estrada y Salguero.	PCMI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	15,0	2,2
MI057	Maestro Ferreyra y Charlone	PCMI057	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	7,3	172,4%	26,0	< 1	< 1
MI058	José M. Zapiola y Güemes	PCMI058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	5,8	165,2%	20,0	< 1	< 1
MI059	Concejal Tribulato y Monseñor Blois	PCMI059	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	21,5	190,7%	83,0	120,0	16,1
MI061	Luis Salguero y Tomás Alba Edison	PCMI061	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	8,5	176,5%	31,0	< 1	< 1
MI063	Egipto y Libertad	MI01	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	7,8	174,2%	28,0	21,0	3,2
MI064	San Nicolás y Gral Las Heras	MI01	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	30,0	133,6%	86,0	21,0	3,2
MN001	Lavalleja al 7100 E/ Conde y Achupallas	LMO19	-	1%	99%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	4	4,3	152,9%	14,0	< 1	< 1
MN002	Armonia a 150 m de La Fuente.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	37,0	192,6%	156,0	< 1	< 1
MN003	Armonia y Billinghurst.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MN004	Billinghurst 2800 y Armonia.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	28,3	192,8%	110,0	< 1	< 1
MN005	Billingurst y Dobles/ Cespedes.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	11,3	76,1%	26,0	< 1	< 1
MN006	Int. Russo y Ramón Lista	LMO46	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	35,8	194,4%	140,0	76,0	4,1
MN007	Billingurst e Int Russo	MN24	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	16,0	187,6%	63,0	36,0	2,6

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MN008	Billinghurst y Las Flores	MN24	-	4%	96%				-	PUELCHE	4	36,0	113,1%	77,0	36,0	2,0
MN009	Billinghurst 5300 y Río Cuarto	MN24	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	15,8	187,5%	60,0	36,0	2,0
MN010	Las Flores y Ramón Lista	MN24	-	-	100%				-	PUELCHE	4	4,8	157,9%	16,0	36,0	2,0
MN011	Monte Egmont y Casarotti	LMO19	-	3%	97%				-	PUELCHE	4	20,5	160,2%	79,0	< 1	< 1
MN032	Acassuso 4100 y Santa Rosa	MN23	-	-	100%				-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MN033	Acassuso e Iturraspe	MN23	-	1%	99%				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MN034	Noruan y Zavala	MN16	-	-	100%				-	PUELCHE	4	11,5	182,6%	43,0	23,0	1,9
MN036	Hucal y Feria	MN16	-	4%	96%			BATERIA RAFAEL CASTILLO	-	PUELCHE	6	55,7	70,7%	200,0	23,0	1,9
MN037	Lavalleí y Tres Cruces	MN23	-	4%	96%				-	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MN039	E. Del campo y Aguanev	MN23	-	100%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MN044	Huarpe y Lacar	MN23	-	-	100%				-	PUELCHE	5	16,8	210,3%	80,0	< 1	< 1
MN043	Cazadon N° 2922 y E. Echeverria	MN23	-	100%	-			POI MN043	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MN099	Beethoven y La Gorina B°El Tordo	MN24	-	100%	-			-	X	PUELCHE	-	-	-	-	36,0	2,0
MN106	Beethoven entre. Aquino y Mendez de Andes	MN24	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	50,8	138,4%	150,0	36,0	2,0
MN110	V. de la Plaza E/ Dávila y Beaubey	MN25	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	12,5	111,1%	74,0	74,0	6,4
MN122	Santa Rosa y Aquino	MN23	-	-	100%			-	X	PUELCHE	5	20,6	165,9%	62,0	36,0	2,0
MN147	Zamudio e/ Bravard y Aquino	MN25	-	9%	91%			POI MN147	-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	74,0	6,4
MN157	Beauchard y Heredia	MN25	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	4	13,0	116,8%	38,0	74,0	6,4
MN173	Hucal 1700 e/ Vogel y Polledo	MN16	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	4	76,5	172,8%	280,0	23,0	1,9
MN183	Lavalleí y Sudamércia	MN23	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	5	44,0	171,3%	175,0	< 1	< 1
MN186	M. T. de Alvear 1100 esq. Del colegio	MN23	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	4	30,2	193,4%	60,0	< 1	< 1
MN211	Esquino y Eulmes	MN19	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	4	4,5	155,6%	15,0	31,0	2,3
MN212	Victorino de la plaza y Luis María Drago. RAFAEL CASTILLO	MN19	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	5	5,0	178,9%	21,0	31,0	2,3
MO087	Cipriano y Vidalita	MOPC1	100%	-	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO088	De los Recuerdos y De los Pavadores	MOPC1	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	45,8	195,6%	180,0	< 1	< 1
MO089	Gelena y La Chacarera	MOPC1	100%	-	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO093	De los Reseros y E. Frers	MOPC1	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MO094	La Esquecita y de los Reseros	MOPC1	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MO095	De La Doma Pje N° 1282 y El Ombu	MOPC1	100%	-	-			BATERIA PARQUE LELOIR - ITUZAINGO	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO097	De La Vidalita y J. Hernández	MOPC1	81%	1%	18%				-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MO146	N. Repetto y Del Patagonia	MOPC1	4%	-	96%				-	PUELCHE	4	125,8	186,4%	> 500	< 1	< 1
MO147	N. Repetto y De la Tradición	MOPC1	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	69,6	169,8%	76,0	< 1	< 1
MO148	Del Mesquido y De las Cachuelas	MOPC1	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MO149	N. Repetto a 180 metros de F. Ielosi	MOPC1	-	4%	96%				-	PUELCHE	4	125,8	186,4%	> 500	< 1	< 1
MO153	De la Conviccion y Colectora Acceso Oeste	MOPC1	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO100	Videla y Peredo	MOPC1	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MO105	Fray J. S. M. de Oro y Figueroa Alcorta	MO03	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO106	Figueroa Alcorta y La Tribuna	MO21	95%	5%	-			BATERIA VII BRIGADA AEREA - MORON	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO107	E. Lopez y Cnel. Arenas	MO30	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	27,0	2,9
MO108	Figueroa Alcorta y Montevideo	MO21	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO130	Lacarra y Cucha Cucha	MO21	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO137	Madrid y Jarry	MO32	95%	5%	-			BATERIA BARRIO SAN JUAN	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO138	Paganini e/Pedro Diaz y Juan Gorriti	MO31	-	-	100%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MO139	Amberes y Pedernera/v	MO31	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM - INTA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MO140	Cuzco entre M. de Aviles y Toivo	MO31	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	12,3	183,7%	46,0	< 1	< 1
MO141	Cuzco y Arones	MO31	-	100%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO150	La Trilla a 1dm de Juramento	HU01	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM 2	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MO151	Arotahal a 21.93m de Veragua	HU01	-	17%	83%				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO152	Chamberí y Los Cerdales	HU01	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	215,5	118,0%	> 500	< 1	< 1
MO142	Pavas esq. Lavalle	T01	99%	1%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO144	Sta. Teresa y La Gaceta	MO03	95%	5%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO154	Coronel Arenas esq. Andrade	MO21	95%	5%	-			BATERIA CASTELAR	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO155	Olivari esq. Palermo	MO23	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MR001	J.V. González 2625 e/Balzak y Rodriguez Peña.	PCMR001	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	67,0	165,8%	232,0	36,0	3,9
MR002	J.V. González 2435 e/Güemes y V. Alsina.	PCMR002	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	24,0	2,9
MR003	Güemes 901 e/Bolivia y Paraguay.	PCMR003	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	4	131,5	187,0%	> 500	138,0	18,6
MR004	Larralde 1341 e/J. Gonzalez y R. Gutierrez.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	61,0	6,0
MR005	Int. Bossi 1080 e/Ecuador y Paraguay.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	61,0	6,0
MR006	Int. Bossi e/Venezuela y Ecuador.	MR-TAN-MOR	-	8%	-	92%	-	TANQUE MORENO	-	PUELCHE	4	75,3	116,3%	171,0	61,0	6,0
MR007	Guatemala 2400 e/Güemes y Alsina.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	129,3	191,3%	> 500	61,0	6,0
MR008	Guatemala 2700 e/marmol y Colectora Gaona	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	61,0	6,0
MR019	Int. Bossi e/Guatemala.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	61,0	6,0
MR011	P. Ansaldo e/Blas Parera y M. Melo.	PCMR011	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR012	M.Obarrio 2048 e/Iliberdi y Rafael.	MRPC1	-	3%	-	97%	-	PLANTA CAG MORENO	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR046	Del Cañon/M. Obarrio e/San Carlos.	MRPC1	-	45%	-	55%	-	-	-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR013	Av. Perón e/Del Cañon.	PCMR013	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	150,0	13,4
MR014	Alcorta 2500 e/Bouchard y Uruguay.	PCMR014	1%	2%	97%				X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR015	Ameghino e/Centenario y Argentina.	PCMR015	1%	2%	97%				X	PUELCHE	4	13,8	185,5%	52,0	< 1	< 1
MR016	Callao e/Av. Alcorta y Mitre.	PCMR016	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	21,5	112,4%	48,0	< 1	< 1
MR017	Alcorta e/Haedo y Ramos Mejia	PCMR017	-	7%	93%				X	PUELCHE	4	30,8	193,5%	120,0	< 1	< 1
MR018	Misiones e/ Sta. Fe y D´errico.	PCMR018	-	3%	97%			-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR020	Alte. Brown e/25 de Mayo y Andrade.	MR01	-	2%	98%	-	-	BATERIA MR020-MR022	-	PUELCHE	4	12,3	183,7%	46,0	< 1	< 1
MR021	Alte. Brown e/Pio XII.	MR01	-	3%	97%				-	PUELCHE	4	10,5	181,0%	39,0	< 1	< 1
MR022	Sanchez 4800 e/Ruta 25 y San Justo.	PCMR022-23	-	4%	96%				X	PUELCHE	4	12,3	183,7%	46,0	< 1	< 1
MR023	Florencio Sanchez e/Gandhi y Solocles.	PCMR022-23	-	11%	89%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR024	Costa Rica e/F. Sanchez y Solocles.	MR-TAN-PER	-	30%	-	70%	-	-	-	PUELCHE	4	16,3	187,7%	62,0	40,0	4,3
MR025	A. Storni 5600 e/Danubio.	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-	-	-	PUELCHE	4	66,8	128,3%	181,0	40,0	4,3
MR026	A. Storni 5900 e/Madariaga.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	40,0	4,3
MR027	Ecuador 5700 e/La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	4	145,0	165,1%	> 500	40,0	4,3
MR029	La Plata e/Ruta23 y Camil.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-	TANQUE LA PERLITA	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	40,0	4,3
MR035	Gutierrez 5600 e/La Plata y Cost Rica.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	40,0	4,3
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	40,0	4,3
MR070	Honduras y Marquez	MR-TAN-PER	-	5%	-	95%	-	-	-	PUELCHE	5	16,4	210,0%	78,0	40,0	4,3
MR072	Honduras y Gral. Madariaga	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	40,0	4,3
MR028	El Salvador e/Chile y Mexico.	PCMR028	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	14,8	186,4%	56,0	< 1	< 1
MR030	Pedrell e/Ascasubi y Carriega.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	29,0	3,3
MR031	R Rojas e/Libano y Gral. Pintos.	MR-TAN-TRU	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	29,0	3,3
MR032	F. Sanchez e/Libano y Pitagoras.	MR-TAN-TRU	-	4%	-	96%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	29,0	3,3
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	TANQUE TRUJUI	-	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	29,0	3,3
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	29,0	3,3
MR051	Tablada e/Oribe y Puccini.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	29,0	3,3
MR075	Diego de Villaroel y Celerino Namuncurá	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	4	34,8	194,2%	136,0	29,0	3,3
MR036	Ruta 25 e/Cataliña.	PCMR036	83%	2%	15%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR037	Giralde e/Pastor Obligado y Lavarden.	PCMR037	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR040	Piovato 4132 e/Bochardo y Balcarce.	PCMR040	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR041	Dorrego e/Dorrego y Darat.	PCMR041	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	48,5	123,9%	126,0	< 1	< 1
MR042	1 de Mayo e/Alcorta.	PCMR042	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	30,3	193,4%	118,0	< 1	< 1
MR043	San Pablo e/San Cayetano.	PCMR043	5%	2%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR044	Piovano e/El Salvador y Venezuela.	PCMR044	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR048	Echeverría e/Darwin y Peron.	PCMR048	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR049	Sarratea e/Victoria.	PCMR049	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	125,8	186,4%	> 500	> 500	42,6
MR050	Marcos Paz 1116 e/Iarrea y J.J. Urquiza.	PCMR050	10%	2%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	4	11,5	182,6%	43,0	< 1	< 1
MR052	Arribeños e/Concordia.	PCMR052	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	13,5	185,2%	51,0	320,0	27,6
MR009	V. Alsina e/Libertador.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	8,3	175,8%	30,0	< 1	< 1
MR053	Córdoba E/Palo y Sheden.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR054	Alvear e/Rafael Arco.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR055	Córdoba e/V. Lopez y Linch.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%				-	PUELCHE	4	9,8	179,5%	36,0	< 1	< 1
MR056	Corvalán 2733 e/B de Yrigoyen y Graham Beil.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	6,0	166,7%	21,0	< 1	< 1
MR057	Uruguay e/E. Rios y colectora.	MR-CIS-MOR	2%	4%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR058	Misiones 1970 e/ Moron.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR059	Facundo Quiroga e/Moron y Yapeyu.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MR060	Facundo Quiroga e/ La Tropilla y Quilmes.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MORENO	-	PUELCHE	4	34,3	194,2%	134,0	< 1	< 1
MR061	Corvalán e/La Tropilla.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR062	SAN_JUAN_BAUTISTA 2026 e/ Int. Corvalan Dean Funes	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MR063	Lincoln e/Soldado Derrico y E. Rios.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MR064	Intendente Corvalan 2302 e/ Alvear y Alejandro Graham Bell	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR095	Uruguay y Chiclana	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR097	Entre Rios esquina Abraham Lincoln	MR-CIS-MOR	2%	3%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	34,8	194,2%	136,0	< 1	< 1
MR100	Moron e/ Facundo Quiroga y Arribeños	MR-CIS-MOR	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR101	Lincoln N°1644	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	213,0	118,5%	> 500	< 1	< 1
MR065	J.V. González e/ Ruta 25 y Brasil.	PCMR065	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	4	90,8	197,8%	360,0	< 1	< 1
MR067	Lobos e/La Tablada y Manzana 36.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	78,0	7,4
MR068	Lafinur e/Lobos y 3 de Marzo.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	6,3	168,0%	22,0	78,0	7,4
MR069	Tablada e/Democracia y Colectora	PCMR069	12%	4%	84%	-	-	-	X	PUELCHE	4	95,8	197,9%	380,0	180,0	15,9
MR071	Shakespeare y Manuel Galvez	PCMR071	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	10,3	180,5%	38,0	< 1	< 1
MR073	Colombia y Ricardo Gutiérrez	MR-TAN-PER	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	71,8	167,1%	250,0	40,0	4,3
MR074	Colectora Acceso Oeste y Ecuador	PCMR074	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	240,0	20,9
MR076	Hipólito Yrigoyen y San Luis	PCMR076	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	8,0	175,0%	29,0	31,0	3,5
MR077	Teniente Ibañez 3224	PCMR077	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	5	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR078	Alberti entre Marcos Paz y Vera	PCMR078	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
MR079	Juana de Asurduy y San Cayetano	PCMR079	43%	2%	55%	-	-	-	X	PUELCHE	2	258,5	140,9%	> 500	> 500	42,6
MR086	Ecuador y Marquez de Aguado	MR-TAN-PER	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	12,3	183,7%	46,0	40,0	4,3
MR088	Lobos entre Misiones y José Hernández	PCMR088	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	220,0	19,3
MR089	Pavón y Gervasio de Posadas (Plaza del Estudiante)	PCMR089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	159,0	148,3%	> 500	< 1	< 1
MR093	Mendoza y Jose Ingenieros	PCMR093	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	11,8	183,0%	44,0	< 1	< 1
MR098	Av. Luis Pasteur entre Facundo Quiroga y Arribeños	PCMR098	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	4	15,8	187,3%	60,0	< 1	< 1
MR099	Marcos Paz entre J.J Urquiza y Lamea	PCMR050	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MR104	Marcos Paz entre Larrea y Justo Jose de Urquiza	PCMR050	-	36%	64%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MS025	Crovara y El Pindo	MS_CIS_MUN	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	19,5	123,9%	57,0	< 1	< 1
MS026	Calle 200 y Rotonda	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	5,5	163,6%	19,0	< 1	< 1
MS027	Av. Central y Calle 500	MS_CIS_MUN	-	5%	95%	-	-	BATERIA CIUDAD EVITA	-	PUELCHE	3	129,3	172,0%	416,0	< 1	< 1
MS034	El Tapeti y El Sauce	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	123,5	128,2%	350,0	< 1	< 1
MS042	Av. Central y calle 900	MS_CIS_MUN	97%	3%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MS030	Las calas y Los balnearios	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	83,0	68,4%	54,0	28,0	1,8
MS091	Las Orquídeas y Las Gardenias	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	10,5	60,5%	14,0	28,0	1,8
MS092	Costanera y Las Dalias - Bº 22 de Enero	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	26,0	66,4%	40,0	28,0	1,8
MS105	Gaviotas y Tonquins	MS34	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MS114	Magnasco y Av. Costanera	MS33	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
PI001	J. B. Justo y Sanguinetti al 500.	PCPI001	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	35,0	3,8
PI002	J. B. Justo 615 y Posadas.	PCPI002	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI003	Av. Tratado de Pilar 242 y Sanguinetti.	PCPI003	25%	35%	39%	-	-	-	X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI004	Lagrave 84 (Yrigoyen y Pampa).	PCPI004	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI005	Planta Champagnat.	PCPI005	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	80,0	7,6
PI006	Rincón entre San Martín y Esteban Luca	PCPI006	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	7,3	172,4%	26,0	< 1	< 1
PI007	José María Paz 873.	PCPI007	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	43,3	195,4%	170,0	< 1	< 1
PI008	ITUZAINGO 331.	PCPI008	1%	3%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI009	Maipú y Vías F.F.C.C. San Martín.	PCPI009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	33,0	3,7
PI010	Gral. O´Higgins y Bergantín Congreso.	PCPI010	-	13%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	45,0	6,7
PI011	Juan Bautista Alberdi 1106 y 11 Septiembre	PCPI011	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	7,8	174,2%	28,0	< 1	< 1
PI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambrosetti.	PCPI012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	21,5	190,7%	83,0	84,0	7,9
PI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Mapuche)	PCPI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	80,0	14,0
PI014	Las Araucarias y M. Acosta.	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	125,8	198,4%	> 500	< 1	< 1
PI059	Ubicado dentro de predio Campo Suite II. frente a Parque Austral.	PIPC2	23%	77%	-	-	-	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
PI067	Mariano Acosta y Los Alamos	PIPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI089	Los Alamos y Av. Eva Perón	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI015	Dr. Ignacio Pirovano 728 esq. Costa Rica	PCPI015	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	44,0	5,6
PI016	Chacabuco 2130 e/Paraguay y Bolivia	PCPI016	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	77,8	197,4%	308,0	< 1	< 1
PI017	Tortugas Country Club	PCPI017	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	33,0	3,7
PI018	Tortugas Country Club	PCPI018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	42,8	195,3%	188,0	< 1	< 1
PI020	Tortugas Country Club	PCPI020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	8,0	1,6
PI021	Tortugas Country Club	PCPI021	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	46,0	143,7%	141,0	< 1	< 1
PI022	Las Campanillas esq. Av. Highland Park	PCPI022	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	27,5	137,1%	81,0	66,0	6,4
PI025	Country El Carmel	PCPI025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI026	Las Amapolas. Villahaus - Country Ayres del Pilar	PCPI026	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	40,0	5,5
PI035	Country Ayres del Pilar	PCPI035	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI037	Country La Lomada	PCPI037	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	12,0	183,3%	45,0	67,0	7,7
PI040	Las Margaritas 1100 e/ Los Claveles y Las Rosas	PCPI040	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	83,0	7,8
PI041	Las Glicinas 1080 (proximo a R8)	PCPI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	4,5	155,6%	15,0	< 1	< 1
PI042	Musladini 374. esquina Bergantín Independencia.	PCPI042	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI043	Sequi esq. Colectora Este Ramal Pilar	PCPI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI044	Posadas 1635 e/J.V. Gonzalez y H. Ascasubi	PCPI044	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	80,0	7,6
PI045	Country B° Campo grande	PCPI045	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	20,0	129,8%	56,0	< 1	< 1
PI048	Cjal. Dr. Martitegui 219. Plaza.	PCPI048	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI049	Bergantín República y Bergantín Independencia.	PCPI049	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	41,0	195,1%	161,0	< 1	< 1
PI050	Av. Constitucion(R26) e/Nicaragua y San Salvador.	PCPI050	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI051	Guatemala y R26.	PCPI051	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI052	Guatemala 4300 esq. Alemania (MANUEL ALBERTI)	PCPI052	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	> 500	42,6
PI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ramón Gimenez.	PCPI053	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI054	Leguizamon e Ituzaingo	PCPI054	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI056	Ameghino y Colectora Oeste	PCPI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI058	Nicaragua 1250 e/Haití y Santo Domingo	PCPI058	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	80,0	3,4
PI061	RN 25 y Chubut	PCPI061	4%	24%	71%	-	-	-	X	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI062	Panamá y Alejandro Korn	PCPI062	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI063	Patagones y Tagle	PCPI063	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI064	Andes y Avda. Patricias Argentinas	PCPI064	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	78,0	13,1
PI065	Goleta Constitución y Fragata Sarmiento	PCPI065	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	70,0	6,8
PI066	Calle s/n e/ Haití y Santo Domingo	PCPI066	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI068	Alazan e/Overo y Picasso- Highland Park	PCPI068	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	220,0	19,3
PI070	Paraguay y Tierra del Fuego	PCPI070	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI075	Guatemala y Levene	PCPI075	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	8,0	1,6
PI076	Gatti y Vasco Da Gama	PCPI076	-	-	100%	-	-	BATERIA PERUZZOTTI	-	PUELCHE	4	13,3	184,9%	50,0	462,0	39,4
PI078	Vasco Da Gama entre Hermita y Camino Comercial	PCPI076	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	8,5	176,5%	31,0	462,0	39,4
PI080	Monseñor D´Andrea y La Carreta	PCPI080	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	4	22,0	190,9%	85,0	61,0	9,1
PI084	Chubut y San Ignacio	PCPI084	-	20%	80%	-	-	-	X	PUELCHE	3	5,3	140,7%	14,0	< 1	< 1
PI100	Calle Sarmiento e/ Bahía Grande y Bahía Redonda	PIPC1	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI101	Ruta 234 y Bahía Darbel	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI102	Calle Henry Martin y Bahía Darbel	PIPC1	-	1%	99%	-	-	BATERIA DERQUI	-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
PI103	Cerrito 3287 e Isla Gran Malvinas	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	BACTERIAS HETEROTROFAS VIALES [UFC/ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
PI105	Libertad e Isla Candelaria	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
CU037	345 y 283	CU37	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	< 1	< 1
CU076	Cno. G. Belgrano y Av. Monteverde	CU36	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	4	< 1	0,0%	< 1	140,0	6,8
CU139	Calle 866 Esq. D. Alvarez	CU07	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	1	< 1	0,0%	< 1	> 500	21,0
CU141	Calle 867 Esq. Donato Alvarez	CU07	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	3	< 1	0,0%	< 1	> 500	23,0

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
AB057	P. Echagüe y Serrano	AB14	-	1%	-	99%	-	PLANTA - AB057	-	PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	< 1	< 1
AB061	Laprida Narciso 1900	AB23	5%	6%	89%	-	-		-	PUELCHE	4	4,3	100,5%	10,0	< 1	< 1
AB063	Laprida Narciso 3001	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB064	Juan B. Justo 2050	AB23	17%	6%	77%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB065	Juan B. Justo 2700	AB23	8%	-	92%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB066	Juan B Justo 2101	AB23	19%	45%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB067	Juan B. Justo 2802	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB068	Av. Ceballos (400) a 700 mts. de Avda. República Argentina	AB23	21%	27%	52%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB070	Francisco N. Laprida y Muesca	AB23	8%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
AB071	Narciso Laprida 2301	AB23	17%	69%	14%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB073	República Argentina 6670	AB23	6%	8%	86%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB074	Rep. Argentina y Juan B. Justo	AB23	14%	8%	78%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	AB23	9%	34%	56%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB076	Republica Argentina 7570 e/ Juan Jose Castro y Alice	AB23	20%	29%	51%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB084	Espoile s/n	AB23	3%	48%	49%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB085	Leyes y Romero	AB23	36%	16%	48%	-	-		-	PUELCHE	4	1,8	85,7%	4,0	< 1	< 1
AB086	Romero y Calderón	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB087	Calderon 1251	AB23	24%	25%	51%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB088	Calderón 1851	AB23	53%	36%	11%	-	-	BATERIA GLEW	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB089	Calderón 3000	AB23	1%	98%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB090	Calderon 3400 1848	AB23	10%	14%	76%	-	-		-	PUELCHE	3	1,3	43,3%	2,0	< 1	< 1
AB091	Calderon 3650 1848	AB23	15%	49%	36%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB092	Brigadier Calderón e/ Lezica y Young	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB093	Brigadier Calderón e/ Young y Av. Eduardo Holmberg	AB23	13%	19%	68%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB094	Romero 3800	AB23	1%	9%	90%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB095	Lemos 3800	AB23	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB098	Rocha y J.A. Casacuberta	AB23	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	7,0	171,4%	25,0	< 1	< 1
AB099	Fernando Lahille y M. Acosta	AB23	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB100	Gral. Cardenas y Almte. Irizar (Plaza)	AB23	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB101	Agustín Barrios y Virrey Cevallos	AB23	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB102	Martiniano Leguizamón entre 25 de Mayo y F. Alvarez	AB23	2%	1%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	2,0	70,7%	3,0	< 1	< 1
AB105	Av. Juan B. Justo e/ AV. República Argentina y Av. Espora	AB23	4%	1%	95%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	2,3	111,1%	6,0	< 1	< 1
AB106	Pablo Podesta y Orillia Rico	AB23	10%	85%	5%					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB107	Fernando Ochoa y Juan Sarcione	AB23	19%	75%	6%					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB108	Rufino Cordoba y Cesar Ratti	AB23	23%	75%	2%					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB109	Luis Viale y Enrique de Rosas	AB23	12%	75%	13%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB110	Boulogne Sur Mer y Antonio Luis Beruti	AB23	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB601	King y Bouchard	AB04	55%	8%	37%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB728	B° Segba (D. Rocha y Paraguay)	PCAB728	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB103	MALVINAS_ARGENTINAS y Dr. Chiesa	PCAB103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB096	Manuela Pedraza 1209	ABPC1	-	1%	-	99%	-	PLANTA RAYO DE SOL	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB097	Santiago del Estero 3075	ABPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE001	Las Heras y Guillon	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE002	Rivadavia y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE003	Origone y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	1,8	85,7%	4,0	< 1	< 1
EE004	Las Heras y Chacabuco	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE005	Terrarosa y Colon	EEPC1	-	14%	86%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE015	Dorrego y Dreyer	EEPC1	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	3	1,7	69,3%	3,0	< 1	< 1
EE027	Maipú y Colón	EEPC1	-	30%	70%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE028	Lavalle y Maipú	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE029	Lavalle	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE030	Lavalle	EEPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE031	Lavalle	EEPC1	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE032	Lavalle	EEPC1	-	10%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE033	Lavalle	EEPC1	-	66%	34%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE034	Maipú	EEPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE035	Ventura Avila	EEPC1	-	5%	95%	-	-	BATERIA LA LATA	-	PUELCHE	2	8,0	123,7%	15,0	< 1	< 1
EE036	Ventura Avila y Calle 13	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE040	Ventura Avila	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE041	Ventura Avila	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE042	Ventura Avila	EEPC1	-	20%	80%	-	-		-	PUELCHE	2	16,0	132,6%	31,0	< 1	< 1
EE043	Juana de Arco	EEPC1	2%	39%	59%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE044	Juana de Arco	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE045	Juana de Arco	EEPC1	4%	5%	91%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE046	Lavalle entre Tomquist y Bragado	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE047	Martin Fierro a 700mts de S6	EE21	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE048	Martin Fierro a 700 m de Vazquez	EE21	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE057	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EEPC1	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	5	4,6	175,0%	19,0	< 1	< 1
EE058	Avila Ventura 3000	EEPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE059	Avila ventura 3400	EEPC1	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE060	Los Claveles y General Las Heras	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	13,8	121,0%	36,0	< 1	< 1
EE070	Colon y Maipú	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE064	Puan y Pablo Pizzurno	PCEE064	25%	2%	73%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE013	Cap. Lozano y Ascasubi	EE05	-	3%	-	97%	-	PLANTA - EE013	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE065	Pedro Arocena y E. de Laperriere	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE066	Amado Nervo y San Pedrito	-	50%	20%	30%	-	-	BATERIA SANTA ISABEL	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	-	-
EE073	Villegas esq. Colón	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE049	Martin Fierro y Vazquez	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE050	Vazquez a 700 m de Martin Fierro	EE21	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE051	Martin Fierro y Dolores	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	2,7	108,3%	6,0	< 1	< 1
EE052	Martin Fierro a 1300m de E. Vazquez	EE21	-	46%	54%	-	-	BATERIA BAFICO	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE054	Martin Fierro y Dreyer	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE055	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EE21	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE061	República de Costa Rica y Libertad	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE062	El Ceibo y Fraga	EE21	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE063	Alvarez de Toledo y Miguel Angel	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE006	Almafuerte e/Andrare y Obligado	EE03	39%	1%	-	60%	-	PLANTA BARRIO UNO	-	PUELCHE	3	3,7	126,0%	9,0	< 1	< 1
EE007	R. Dario y M. Cane	EE03	1%	1%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE038	Av. Tte. Gral. Morillas a 1000 mts de La Horqueta	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE039	Tte. Gral. Morillas s/n - Villa Ntra. Sra. Del Rosario	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
EEN001	Lago Garcia 3901 y Los Andes	EEPC4	-	1%	99%	-	-	POI 9 DE ABRIL	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN002	Pedro Coni 3401e/Oliver y sancinena	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	3,0	133,3%	9,0	< 1	< 1
EEN003	Palleros 1700 /S. Nicolas y Mte. Grande	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	1,3	40,0%	2,0	< 1	< 1
EEN005	Sansinena 601 e/ Huergo y 9 de julio	EEPC4	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	2,3	111,1%	6,0	< 1	< 1
EEN006	Caseros 980 e/Huergo y 9 de Julio	EEPC4	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEN007	Sarmiento 2700 e/Tricotti y Barros	EEPC4	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	11,5	129,1%	22,0	< 1	< 1
EEN008	Ing. Huergo 2500 e/Petraca y Sastre	EEPC4	5%	11%	84%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN009	Pto Deseado 601 e/Huergo y 9 de abril	EEPC4	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN010	Ing. Huergo 1600 1842	EEPC4	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	7,0	105,0%	16,0	< 1	< 1
EEN012	M.Alegre 992 e/Gomez y Vernet	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN013	Tricotti 10 e/Malvinas y Barros	EEPC4	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	7,3	172,4%	26,0	< 1	< 1
EEN014	Cnel. D° Elia 190 e/Palleros y Constanzo	EEPC4	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
EEN015	Constanzo 2090 e/P. Argentino y Rivero	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
EEN016	Tierra del Fuego 179 e/Constanzo	EEPC4	15%	1%	84%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN018	Constanzo 1229 e/Guarany y Crespo	EEPC4	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN019	Prayones 3150 entre Palleros y Lopez	EEPC4	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
EEN021	Rebizo 1100 e/ Fair y Crespo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
EEN026	M.Alegre 1720 e/Alegre y Urquiza	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN059	Enrique Banch y Rebizo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN020	Sansinena 105 e/ Doclout y Constanzo	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN022	Sansinena e Vernet y Benavidez	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN023	Benavidez 3190 e / F.Lopez y Scaglia	EEPC4	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN027	Fernadez y Dicio	EE23	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN028	Rivero y Chimondegui	EE23	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN029	Av. Fair y Primera Junta	EE34	-	22%	78%	-	-	BATERIA CORREO ARGENTINO	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN030	Cervetti y Av. Fair	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN031	Cervetti y La Horqueta	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN032	Av Fair e Islas Trinidad	EE34	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN033	Urbano González e Independencia	EE31	-	1%	99%	-	-	BATERIA SANTA CATALINA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN034	Alberto Grande a 38m de las vias	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN035	Cascabutenta e/Valette y Gonzalez	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	6,5	104,7%	15,0	< 1	< 1
EEN036	Lima e/Valette y Francia	EE31	8%	2%	90%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN037	Cepeda y de los Constituyentes	EE31	-	46%	54%	-	-		-	PUELCHE	2	17,5	52,5%	24,0	< 1	< 1
EEN038	Lago Garcia y Cepeda	EE31	-	23%	77%	-	-		-	PUELCHE	4	4,8	144,2%	15,0	< 1	< 1
EEN039	Cepeda y Alberto Grande	EE31	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN040	Lago Garcia a 50m de Valette	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN041	9 de Abril e/Valette y Wieman	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN042	Las Talitas e/Sarmiento y M. Alegre	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	5	7,0	124,1%	20,0	< 1	< 1
EEN043	Avellaneda e/Trangoni y C. Monte Grande	EE31	64%	36%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEN044	Bruzzone e/Foz y Gonzalez	EE31	1%	1%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN045	Bruzzone e/Te. Alberto Grande	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN046	Bourquet e/ Amaghino y Gabaston	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN047	Juan M. de Rosas t Te. Gabaston	EE31	9%	13%	78%	-	-		-	PUELCHE	2	5,5	115,7%	10,0	< 1	< 1
EEN048	Robertson e/ J. Newbery y T. Matienzo	EE31	1%	4%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN049	J. A. Roca y Est. Los Remedios	EE29	-	4%	96%	-	-	BATERIA SAN IGNACIO	-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN050	Los Robles y T. A. Edison	EE29	30%	5%	65%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	EE29	27%	0%	73%	-	-		-	PUELCHE	2	10,5	114,0%	20,0	< 1	< 1
EEN052	20 de Junio y L. Lopez	EE29	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN053	Cichero 700 e/ Hipolito Bouchard y Julio Argentino Roca	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN054	Destacamento Melchior 733	EEPC5	-	-	100%	-	-	BATERIA LA MORITA	-	PUELCHE	4	7,5	173,3%	27,0	< 1	< 1
EEN056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEN058	Fray Luis Beltran 1415	EEPC5	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EET001	Falucho y Las Dalias	EEPC2	-	81%	19%	-	-	BATERIA TRISTAN SUAREZ	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EET004	Av. Saenz Peña y Bogado	EEPC2	-	75%	25%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU001	Maipu 800 e Bransen Hussay B.	EE20	-	25%	75%	-	-	BATERIA UNION	-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU002	San Bernardo 980 e/ Balcarce P Moreno	EE20	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	2	1,5	47,1%	2,0	< 1	< 1
EEU003	Los Robles al 5000	EE24	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU004	Los Robles al 5700	EE24	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	2,3	99,0%	5,0	< 1	< 1
EEU005	S.Cabral a 200mts de Lacarra	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU006	S.Cabral 3588 a 700 m de EEU005	EE26	-	62%	38%	-	-		-	PUELCHE	2	10,0	127,3%	19,0	< 1	< 1
EEU007	S.Cabral a 700mts de EEU006	EE26	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU008	Sgto Cabral 5149 e/ Gral. Antonio Gonzalez y Jose Alvarez Condarco	EE26	2%	2%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	7,3	94,5%	17,0	< 1	< 1
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	5,3	140,7%	14,0	< 1	< 1
EEU011	Sgto. Cabral a 700 m de EEU010	EE32	-	45%	55%	-	-		-	PUELCHE	2	20,5	134,5%	40,0	< 1	< 1
EEU012	Calle s/n a 700 m de Sgto. Cabral	EE32	-	99%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	EE32	-	35%	65%	-	-		-	PUELCHE	2	2,5	84,9%	4,0	< 1	< 1
EEU014	Juana de Arco a 700 m de S20	EE24	-	51%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEU015	Lacarra y 9 de Julio	EE32	-	33%	67%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU016	Av. Maipu 40 esq. RP58	EE32	-	84%	16%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU017	Av. Maipu 40 esq. RP59	EE32	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU018	Andromaco 80 e/ Jose Champagnat	EE32	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	5,8	143,0%	18,0	< 1	< 1
EEU019	Montes de Oca 80 e/Ruta Prov 58 y Jose Champagnat	EE32	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU020	Vieytes 9 entre Mariano Castex y José Champagmat	EE32	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU021	Sobre Sargento Cabral a 700m del EEU011	EE32	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	18,0	119,9%	49,0	< 1	< 1
EEU022	Juana de Arco S/N	EE32	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	6,3	128,9%	18,0	< 1	< 1
EEU023	Los Robles 249	EE32	-	76%	24%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU025	Sgto. Cabral a 100 mts de Cáceres	EE32	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	4	11,5	182,6%	43,0	< 1	< 1
EEU026	Juana de Arco N° 7100	EE32	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ001	Río Bermejo y Río Gualeguay	EE28	-	3%	-	97%	-	PLANTA LA CELIA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ002	Río Bermejo y La Atlántica	EE28	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ003	Las Hortensias Norte	EE22	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EES001	25 de Mayo 2371	EZPC1	100%	-	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
EES004	Rosario y Palacios	EZPC1	16%	4%	80%	-	-		-	PUELCHE	4	9,5	106,5%	21,0	37,0	2,9
EEZ006	Caminito 1200	EZPC1	31%	52%	18%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
EEZ007	Caminito 1900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
EEZ010	Paso de los Libres 1800 e Islas Cook	EZPC1	41%	1%	58%	-	-		-	PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	37,0	2,9
EEZ011	Falucho y Paso de los Libres	EZPC1	24%	7%	68%	-	-		-	PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	37,0	2,9
EEZ012	Paso de los Libres a 700m de Falucho	EZPC1	18%	1%	81%	-	-		-	PUELCHE	3	2,7	108,3%	6,0	37,0	2,9
EEZ013	Paso de los Libres 1400	EZPC1	39%	1%	61%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	37,0	2,9
EEZ014	Paso de los Libres 1500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
EEZ015	Paso de los Libres a 1700 mts de RP N°52	EZPC1	27%	1%	73%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	37,0	2,9

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEZ016	Mariano Moreno a 200m de Falucho	EZPC1	15%	48%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	37,0	2,9
EEZ017	Moreno 3500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
EEZ018	Paso de los Libres 900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
EEZ019	Ruta Provincial N°52 4000	EZPC1	25%	1%	75%	-	-	BATERIA EZEIZA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	37,0	2,9
EEZ020	RP N° 52 1000	EZPC1	34%	7%	59%	-	-		-	PUELCHE	4	5,0	134,7%	15,0	37,0	2,9
EEZ021	RP N° 52 1200	EZPC1	25%	2%	73%	-	-		-	PUELCHE	4	2,3	111,1%	6,0	37,0	2,9
EEZ022	RP N° 52 s/n	EZPC1	4%	23%	72%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	37,0	2,9
EEZ023	RP N° 52 1300	EZPC1	6%	1%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	3,5	85,7%	7,0	37,0	2,9
EEZ024	Ruta N°52 kilómetro 2	EZPC1	5%	3%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	37,0	2,9
EEZ025	Fariña 2000	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
EEZ026	Valle de Río Negro y América del Norte (PA.Ezeiza)	EZPC1	-	-	100%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	37,0	2,9
EEZ027	Cañada de Gomez y 25 de Mayo	EZPC1	16%	17%	67%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	37,0	2,9
EEZ028	Quito y Arroyo	EZPC1	11%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
EEZ029	Valle de Río Negro y América del Norte	EZPC1	14%	9%	77%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	37,0	2,9
EEZ030	D. F. Sarmiento y Roger Balet	EZPC1	34%	18%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
EEZ031	Roger Balet y Sargento Cabral	EZPC1	14%	17%	69%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	37,0	2,9
EEZ032	Valle de Río Negro y 25 de Mayo	EZPC1	22%	52%	27%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	37,0	2,9
ES022	Scalabrini Ortiz e/Ing. Pablo Marin y 1° de Mayo.	PCES022-24	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ES023	Islas Malvinas e/Constituyentes y Pablo Marin.	PCES022-24	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	6,0	166,7%	21,0	< 1	< 1
ES024	Scalabrini Ortiz y Av. Patricias Argentinas.	PCES022-24	-	1%	-	99%	-	TANQUE FONAVI	-	PUELCHE	4	3,3	138,5%	10,0	< 1	< 1
FV002	San Martin y San Juan	FV-TAN-CEN	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV003	Constitución 198	FV-TAN-CEN	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV004	Carriego y Alem	FV-TAN-CEN	-	53%	-	47%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV005	San Martin y Defensa	PCFV005	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	PCFV006	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV007	Cariboni N° 2351 e/ Chaco y Rosario	PCFV007	-	14%	86%	-	-	-	x	PUELCHE	4	5,3	161,8%	18,0	4,0	1,3
FV009	Cariboni y Rio Bermejo	PCFV009	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV011	Corrientes esq. 12 de Octubre	PCFV011	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV013	Av.Bélgica N° 1101 esq. Jorge Novak	PCFV013	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV014	J.D. Perón 535 y Pringles	PCFV014	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV018	Av. Eva Perón y Gral. Hornos	PCFV018	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV019	Río Caraguata n° 1401 y Directorio	PCFV019	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV020	Cabildo y Eva Perón	PCFV020	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV021	Mantovani y Calle 1407	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV022	Juan Mantovani 587 e/ C.1423 y C. 1409	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV023	Mantovani y Calle 1429	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV025	Calle 1423 (901) a 400 mts de Mantovani	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV040	1439 y Juan Mantovani.	FV-TAN-CRU	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	6,3	99,0%	13,0	< 1	< 1
FV064	C. 1439 e/ C.1420 y a 300 mts de Juan Mantovani	FV-CIS-SAR	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	3,3	138,5%	10,0	< 1	< 1
FV065	Eva Perón N° 9695 y C. 1423	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV066	Avenida Eva Perón y Calle 1352	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV084	1610 e/RP 53 y 1647	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV085	1653 e/Av. La Plata y A° Las Conchitas	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	1,3	40,0%	2,0	< 1	< 1
FV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Suecia	PCFV112	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	27,0	3,2
FV120	Calle 1404 N° 498 e/ R.P. 53 y campo	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO SARMIENTO	-	PUELCHE	4	4,8	157,9%	16,0	< 1	< 1
FV121	Av. Gral. Savio N° 598 esq. Sicilia	FV-TAN-MAY	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV124	E.B. SARMIENTO	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV132	Calle 1426 esq. 1437 – B° San Francisco Grande (oeste)	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	11,5	182,6%	43,0	< 1	< 1
FV147	Av. La Plata 50	FV-CIS-SAR	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV149	Av. La Plata y Calle 1305	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
FV156	Calle 1433a y 1418	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV157	Calle 1443 y 1430	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV158	Calle 1440 a 400m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	11,5	182,6%	43,0	< 1	< 1
FV159	calle 1440 a 1000m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV160	calle 1452 y RP53	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV166	Calle 1440 y 1455	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV024	Eva Peron y Calle 1409	FV-CIS-SL	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	5	5,2	141,6%	18,0	< 1	< 1
FV036	Calle 1422 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV037	Calle 1432 N° 901 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	2,5	120,0%	7,0	< 1	< 1
FV041	Calle 1335 N° 801 y 1328	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	15,5	140,3%	47,0	< 1	< 1
FV042	Calle 1316 y 1333	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV045	Los Inmigrantes y Calle 1355	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV050	Av. Eva Perón N° 7700 e/1310 y Cacheuta	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	5,3	96,3%	11,0	< 1	< 1
FV087	1364 N° 1082 esq. 1317a	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
FV088	1327 N° 3201 e/ 1364 y 1370	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO SAN LUIS	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV089	1356 N° 1700 e/ 1347 y 1349	FV-CIS-SL	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	5,5	163,6%	19,0	< 1	< 1
FV086	1374 N° 900 esq. 1313	FV-CIS-SL	-	28%	72%	-	-		-	PUELCHE	3	14,3	161,1%	41,0	< 1	< 1
FV092	1345 e/Av. La Plata y 1364	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV104	Calle 1363 N° 100 y Los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	7,8	174,2%	28,0	< 1	< 1
FV116	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV130	Calle 1341 N° 511 esquina calle 1310	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV134	Los Inmigrantes y calle 1363	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV143	Calle 1328 y 1355	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV177	Calle 1347 a 58 mts de Av. De los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV026	Calle 77 y Posadas	FV02	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV027	El Zonda y El Gaucho	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV028	Riobamba N° 1501 y Olivero	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV029	Pte. Illia y Alvear	FV02	-	1%	99%	-	-	BATERIA SAN NICOLAS	-	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
FV097	Castelli N° 1001 esq. EE.UU	FV02	-	43%	57%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
FV152	El Apero entre Calle 437 y El Malambo	FV02	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV174	Castelli esquina EEUU de América	FV02	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	FV-TAN-MAY	-	12%	-	88%	-		-	PUELCHE	3	1,3	43,3%	2,0	< 1	< 1
FV031	Virgen del Valle y El Clavel	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV032	Virgen del Valle y La Ancianidad	FV-TAN-MAY	-	23%	-	77%	-		-	PUELCHE	4	4,5	155,6%	15,0	< 1	< 1
FV033	Virgen del Valle y Río Pilcomayo	FV-TAN-MAY	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV034	Av Cacheuta y Boston	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-	TANQUE MAYOL	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	FV-TAN-MAY	-	11%	-	89%	-		-	PUELCHE	3	1,3	43,3%	2,0	< 1	< 1
FV053	Cacheuta 2701 y Calle 1353	FV-TAN-MAY	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
FV063	Av Eva Perón 5880	FV-TAN-MAY	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
FV038	Calle 1423 e/ 1422 y 1428	PCFV038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV046	Batalla de Ituzaingo 2780 e/ Contreras y C.214A	PCFV046	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV047	Boedo e/ Montserrat y Túnez	PCFV047	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV048	León XIII e/ Pte. Perón y Beirut	PCFV048	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	6,3	113,4%	16,0	< 1	< 1
FV049	San Antonio e/ Irala y Alvar Cabeza de Vaca	PCFV049	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV051	Cacheuta 3601 y 1371	PCFV051	-	31%	69%	-	-	-	X	PUELCHE	2	2,5	84,9%	4,0	< 1	< 1
FV055	Calle 832 e/M.Grass y Piedrabuena (V.A.)	PCFV055	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV057	Virgen del Valle N° 2599 y Chaco	PCFV057	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV058	Juan B. Justo y Arcasubi	PCFV058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV059	Av.Bosques y Ruta 36	PCFV059	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV060	Delgado y Cafferatas	PCFV060	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	3	2,0	86,6%	4,0	9,0	1,7
FV062	Calle 740 y El Clavel	PCFV062	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV067	Calle 1108 N° 1702 e/ 1131 y 1139	PCFV067-70	-	23%	77%	-	-	BATERIA ING. ALLAN	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV068	Calle 1108 N° 2280 esq. 1139	PCFV067-70	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
FV069	Diag. Los Quilmes N° 500	PCFV067-70	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV070	Calle 1108 N° 2300	PCFV067-70	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV148	Calle 153a 301	PCFV148	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV167	Calle 1145 y Calle 1122	PCFV067-70	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV071	San Nicolás N° 2501 y Chaco	PCFV071	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	< 1	< 1
FV072	Finochietto N° 1411 y Fracción V	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO CRUCE VARELA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV073	C.O.Cruce	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV074	Carlos Gardel N° 700 y Campichuelo	FV-TAN-CRU	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	5,8	165,2%	20,0	< 1	< 1
FV142	Dardo Rocha y Cerro Famatina	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	1,3	46,0%	2,0	< 1	< 1
FV078	Bruselas y Polonia	PCFV078	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV079	Bruselas y Bulgaria	PCFV079	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	6,0	1,4
FV080	517 N° 1700 y Portela	PCFV080	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV082	El Paisano N° 1899 e/445 (B° Don José Planificado)	FV-TAN-P82	-	1%	99%	-	-	BATERIA DON JOSE PLANIFICADO	-	PUELCHE	4	3,8	146,7%	12,0	18,0	2,7
FV131	El Malambo N° 105 esq. La Tranquera	PCFV131	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV165	Calle Monteverde e/445 y 449	PCFV165	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV090	Av. La Plata N° 1200 e/1327 y 1319a	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-	BATERIA LAS COLONIAS	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV093	1681 esq. 1608	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV094	1364 N° 2592 e/ 1371 Y 1357	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	2,8	85,9%	6,0	< 1	< 1
FV144	La Plata 1700	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV146	Calle 1353 4100	PCFV090-94	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV176	Calle 1608 entre 1671 y 1673	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	4,5	155,6%	15,0	< 1	< 1
FV095	Pisani N° 1101 esq. Suecia	PCFV095	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV096	Humahuaca N° 501 y 511	PCFV096	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV098	Cno. Touring Club N° 1499 y Canalejas	PCFV098	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV100	228-Gral Perón N° 1501 y Bs. As.	PCFV100	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV102	V.Abrille N° 975 casi esquina Calle 519	PCFV154	-	6%	94%	-	-	BATERIA SAN JORGE	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV154	La Paloma y calle 560	PCFV154	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV103	Cicilia N° 2020	PCFV103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV105	Calle 527 e/ 554 y 554A	PCFV105	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
FV106	Calle 554 N° 1103 e/ Diag. Jarilla	PCFV106	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	15,0	2,2
FV108	Calle 1348 N° 1003 e/ 1317 Ay 1319 A - (B° San Francisco Este)	PCFV108	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	4,0	1,3
FV109	Calle 1435 N° 1719 esq. 1434 - (B° San Francisco Oeste)	PCFV109	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV110	Las Lengas N° 2303 e/ El cardenal y El Zorzal - (B° Santa Inés)	FV01	-	7%	93%	-	-	BATERIA GOBERNADOR COSTA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV111	Los Alamos N° 2502 e/ Av. Blas Parera y El Homero - (B° Santa Inés)	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV150	El Ñandú e/ Las Casuarinas y Los Alamos	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	15,3	90,1%	28,0	< 1	< 1
FV151	Los Lapachos y Tinkunaku	FV01	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV161	Los Laureles y El Cardenal	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV162	La Paloma y Los Sauces	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV163	El Mirlo entre Los Olivos y Los Lapachos	FV01	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV113	Bonn N° 1203 y Austria	PCFV113	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV114	Calle 531 N° 2200	PCFV114	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	5	4,2	170,4%	17,0	< 1	< 1
FV115	Progreso 2190 e/ Intendente Jose Luis Cariboni y virgen de valle	PCFV115	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV117	Lourdes N° 402 y Ruta Prov. N° 53	PCFV117	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV119	Suecia N° 1601 esq. Lisboa	PCFV119	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV122	Copenhage N° 502 esq. Alemania	PCFV122	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV123	Calle 172 - Río Negro N° 1790 esq. Alvarado	PCFV123	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV125	Bourel y Chacabuco	PCFV125	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV126	Riobamba y Vías	PCFV126	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	3	4,0	129,9%	10,0	< 1	< 1
FV127	Calle 1151 Ay Calle 1130	PCFV127	-	46%	54%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	12,0	2,6
FV128	Río Diamante N° 3080 esquina Villegas	PCFV128	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV129	Río Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	PCFV129	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	3	3,7	126,0%	9,0	2,0	1,1
FV133	Calle 1151 y Calle 1118	PCFV133	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV137	San Geronimo 605	PCFV137	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV138	Campana y Esmeralda	PCFV138	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV139	Guamini 2711	PCFV139	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV140	San Martin y Monteagudo	PCFV140	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV141	Alfonsina Storni 74	PCFV153	-	2%	98%	-	-	BATERIA BARRIO ALTAMIRA	-	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
FV153	Florida y Miguel Cané	PCFV153	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV145	Av. Cacheuta entre Calle 1363 y Calle 1371	PCFV145	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV164	calle 1155 y 1138	PCFV164	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV168	Calle 1149 y Calle 1136	PCFV168	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV169	Calle Jacinto Benavente y E, D Amicis	PCFV059	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	1,3	40,0%	2,0	< 1	< 1
FV175	Santa Lucia y Aconquija	PCFV118	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV178	Av. Bosques y calle 819	PCFV178	-	50%	50%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV183	Remedios de Escalada esquina Carmen de Areco	PCFV183	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	2,0	1,1
FV184	Turquia, entre Bruselas y Milán	PCFV184	-	6%	94%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	-	-
FV191	Rumania entre París y Paysandú	-	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	4%	-	96%	-	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU002	Colombia 1007 e/Av. De las Americas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	3	1,7	69,3%	3,0	< 1	< 1
GU005	Bogado 800 e/Islas Malvinas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU007	Republica Argentina 578 e/Venezuela.	GU-TAN-PED	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	4	4,5	155,6%	15,0	< 1	< 1
GU008	Brasil 103 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU020	Remedios de Escalada e/Tomas Guido y Godoy Cruz	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU031	Brasil y Mesopotamia	GU-TAN-PED	-	17%	-	83%	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU032	Avenida 38 entre calle 5 y 6	GU-TAN-PED	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
GU010	Violeta Antier 5095 e/Santos Discepolo.	PCGU010	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	8,0	1,3
GU011	Alfonso Amat 4611 e/Jose Negiia.	PCGU011		100%					X	PUELCHE	-					
GU012	Calle 117 1000 / Av. C. Mereles 1050 e/calles 118 y 120.	GU-TAN-YA	3%	1%		96%			-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU013	Calle 118 N° 1633 e/calles 121 y 123.	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU014	Cjal. Capuano 490 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		2%		98%			-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU015	Calle 118 2041 e/calles 127 y 129.	GU-TAN-YA		2%		98%		TANQUE ESTE - LA YAYA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU016	Calle 118 2471 e/calles 133 y 135.	GU-TAN-YA	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	4,8	157,9%	16,0	< 1	< 1
GU017	Av. 139 N° 510 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		4%		96%			-	PUELCHE	4	1,8	85,7%	4,0	< 1	< 1
GU023	Calle 103 y Calle 124	GU-TAN-YA				100%			-	PUELCHE	4	3,0	133,3%	9,0	< 1	< 1
GU024	Calle 116 y Av. 99	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU018	Av. 21 N° 1099 e/calle 36.	GU01	-	3%	97%	-	-	BATERIA LAS LOMAS	-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU019	Cjal. Placido Bajo N° 901 e/ calle39.	GU01	-	-	100%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU006	Av. Nestor Kirchner 630 e/Avellaneda y Güemes.	GU02	1%	25%	74%	-	-		-	PUELCHE	3	22,3	78,6%	39,0	< 1	< 1
GU021	Roque Saenz Peña y Santa Elena	GU02	-	1%	99%			BATERIA B° SANTA MAGDALENA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU022	Dorrego y Luis A. Testa	GU02	2%	12%	86%	-	-		-	PUELCHE	4	8,3	138,3%	25,0	< 1	< 1
GU025	Calle 6 y Tte. Juan Domingo Baldini	PCGU025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU026	Kingston y Honduras		10%	89%	1%				-	PUELCHE						
GU027	Brasilia y Guayanas	-	2%	89%	9%			BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU028	Puerto España y Brasilia	-	10%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU029	Gral Paz esicalle 7 y Lib. Gral J. de S.Martin		11%	89%					-	PUELCHE						
GU030	La Rioja e/ Av. Hipólito Yrigoyen y Sarmiento	-	11%	89%				BATERIA NUMANCIA	-	PUELCHE						
JCP002	Wilde 4573 e/Corbeta Uruguay y Fragata Sarmiento	JCP-TAN-PR	-		-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
JCP003	Av. Deniue e/ Av. Pres. Hipólito Yrigoyen	JCP-TAN-PR				100%		TANQUE PRIMAVERA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
JCP005	Las 3 Marías 5700 e/ Av. Jose Alube y Jose C. Paz	JCP-TAN-PR	-	1%		99%			-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
JCP006	Calle Pampa de Junin a 50 m de Yrigoyen	JCP-TAN-PR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0046	Ferro Nuevo y Guanabara	LM003	100%						X	PUELCHE						
LM0047	Colect.R3 v Huillanimi B° Playa Lelior.	LM003	100%						X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
LM0049	Escribano y Colden B°El Pino.	LM027	100%						X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
LM0053	Haidi v Galileo - Haidi v Torres.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0054	Luciano Torres N° 600 y Sermón Perez B° San Enrique.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0056	Guanacache y Pino B° Recoleta.	LM007	72%		27%				X	PUELCHE	1	-	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0060	Huemul y Rodney B°Maria Elena	LM002		100%					X	PUELCHE						
LM0064	Urdaneta y Rodney B° Maria Elena	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	4	3,3	118,5%	10,0	< 1	< 1
LM0066	M.Garrido e/ y Colegiales (EC.Colegiales y M. Becerra)	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0070	M.Garrido e/ S. Favardo y Rocamora B° 17 de Octubre	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0072	J. De Alvarado y Solá. Favardo B° 24 de febrero	LM011		2%	98%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0073	J. De Alvarado y Solá. Favardo B° 24 de febrero	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	4	5,0	160,0%	17,0	< 1	< 1
LM0074	Echauri N° 3200 e/ J.B.Justo y Vidal	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0075	Lavalleja y Conde	LM026		2%	98%				X	PUELCHE	4	7,3	117,4%	19,0	< 1	< 1
LM0076	N de Balboa y Lujan.	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0077	Castañon y Rio Cuarto B° El Porvenir	LM009		2%	98%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	42,0	2,6
LM0078	Zequeira garcia E/ Favardo y Rocamora	LM002			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0079	Urdaneta y Rocamora (E/ T de Rocamora y Del Tejar)	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0081	Echauri e/ Ortega Zyrni Villa Scasso	LM014			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0083	Quiero N° 900 E/ Riva 21 /Cleno y Draqones.	LM024	10%	1%	89%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0085	Martinez y Lasalle.	LM024		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0087	Reseno e/Acaseuso y Alagon	LM011			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0094	A Vilela 700 y Guanabara E/ Guasayan y Morris B° Playa Lelior.	LM003	96%	2%	2%				X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
LM0095	Manteaguza N° 6100 e/Humanga y Acoda.	LM004		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0096	M.Herrera e/ Guanacache y Eder - B° el Tobin	LM003		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0098	E. Clay (e/ Meadow y Puerto.	LM024			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0099	Hugo West e/ Madreselva y milamores.	LM029	98%		2%				X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
LM0101	Scrivit y Gallardo.	LM001			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0108	Lavalleja N° 6100 e/ Alegria y Arcon	LM010		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0109	Gamay y Peridn.	LM024			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0112	Fernandez y y progreso B° Candiaci	LM008			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0118	El Reseno 3351/e/ Ortega v Zequeira.	LM046			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0121	L. Da Vinci 4000	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	42,0	2,6
LM0123	Tinogasta y Colegiales	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	42,0	2,6
LM0124	Marcos Paz y Colegiales	LM047	84%	16%					X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
LM0125	Corrales, Pte N° 1100 y Espejo	LM003			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0126	Ancon al 3584 esquina Zinny	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0127	Castin 4000 esq. J.B. Justo	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	42,0	2,6
LM0139	Caseravalle 3000 e/ Simon Perez y Rivas.	LM008		100%					X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
LM0140	Castro e/ Cepeda y Saraboa	LM026			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0143	Scrivit y Arcon	LM025	100%						X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
LM0146	Dragones y Fonvenido	LM008			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0158	Almacro y Agoge	LM046			100%				X	PUELCHE	4	5,8	165,2%	20,0	< 1	< 1
LM0161	Ayax, Mercuri y Bacon - Jones Fte N° 5900	LM016		2%	98%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0164	Saenz y Cepeda.	LM008		4%	96%				X	PUELCHE	3	5,7	142,6%	15,0	< 1	< 1
LM0170	Ancon y Alegria E/ Fournier	LM016		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0172	J.F.Echauri y Donuerb E/ Alagon	LM009		3%	97%				X	PUELCHE	4	35,1	111,1%	52,0	42,0	2,6
LM0175	Baez y Bavio	LM016			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0177	Baez y Barrientos	LM034		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0179	Coronel Conde e/ Martinez Villena y Martin Coronado	LM048			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0180	Machain esq. Puerto Argentino.	LM008		3%	97%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0187	Pte Argentino y Cono. del Valle	LM026			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0189	Leones Entre Gana y Conde.	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	2,2	120,0%	7,0	< 1	< 1
LM0191	Icalma esq. N. Arias	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	18,3	166,2%	36,0	< 1	< 1
LM0192	Tidoal entre Barrientos y Barataan.	LM048			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0193	Jachal esq. Juan Pio Gana.	LM048		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0195	Escuela entre Iobuno y Gallardo	LM026			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0197	Scarlatti e/ Villanueva y Monoeni	LM025		1%	99%				X	PUELCHE	4	9,4	178,5%	36,0	< 1	< 1
LM0198	Enrique Clay y M. Doello	LM051		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0957	Guevnos 127/16 E/ San Ignacio y San Juan	LM004			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO025	M. Piaggio y Olliden	LO05	64%	2%	33%				X	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO042	Santa Lucia e H.Yrigoyen	LO01	-	1%		99%		PLANTA - LO042	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO067	De la Peña y Moldes	LO04	-	-	-	100%	-	PLANTA - LO067	-	PUELCHE	4	3,0	133,3%	9,0	< 1	< 1
LO072	Timbó y Cap. Moyano	LOPC1		2%		98%		PLANTA - LO072		PUELCHE	4	1,3	40,0%	2,0	< 1	< 1
LO078	Arenales a 100m de J. Ingenieros	LOPC1	-	9%	91%				-	PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	< 1	< 1
LO079	Arenales a 300m de L.M.Drago	LOPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	4,3	152,9%	14,0	< 1	< 1
LO080	Juan xxiii 2400 entre L.M.Drago y Bahia Blanca	LOPC1	-	13%	87%				-	PUELCHE	4	1,8	85,7%	4,0	< 1	< 1
LO081	L.M.Drago y Melian	LOPC1	3%	77%	21%				-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO118	Martin Rodriguez y Timbó	LOPC1	1%	14%	85%	-	-		-	PUELCHE	4	6,0	65,3%	10,0	< 1	< 1
LO119	Tala y Pino	LOPC1	3%	3%	94%				-	PUELCHE	5	2,4	130,4%	8,0	< 1	< 1
LO121	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	4	2,5	120,0%	7,0	< 1	< 1
LO125	Av. Argentina y Guido	LOPC2	-	37%	63%	-	-		-	PUELCHE	3	11,3	150,3%	31,0	< 1	< 1
LO126	Av. Argentina	LOPC2		79%	21%			BATERIA LLAVALLOL	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO133	Av. Argentina y Junin	LOPC2		50%	50%				-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO138	Junin 170 entre Rodriguez y Las Heras	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO139	Arnat y Petinbi	LOPC1		11%	89%				-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO140	Av.Argentina 2950 y Peisbi	LOPC1	-	5%	95%				-	PUELCHE	3	13,3	160,2%	38,0	< 1	< 1
LO141	Rodriguez 3507 esq Mercedes	LOPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	4	6,0	166,7%	21,0	< 1	< 1
LO142	Jose Ingenieros 1668 e/ Calferata Norte y Juan XXIII	LOPC1		20%	80%				-	PUELCHE	3	9,7	155,3%	27,0	< 1	< 1
LO146	Calle Pintos 2007 e/ Viel y Florida	LOPC1	-	4%	96%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO147	Calle Magnolia 2099 e/ Moreno y V.Barbieri	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO148	Magallanes 2600 entre Ucrania y Duhalde	LOPC1		1%	99%				-	HPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
A8019	Combatientes MALVINAS ARGENTINAS y Pilar	LOPC2		1%	99%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
A8060	Tupiza y Paicacaro	LOPC2		8%	92%				-	PUELCHE	4	2,7	100,0%	5,0	< 1	< 1
LO083	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	3,0	133,3%	9,0	< 1	< 1
LO084	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO085	L.M.Drago e/Cno las Flores y Fonrouge	LOPC2	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	5,3	140,5%	17,0	< 1	< 1
LO086	Cno de las Flores a 500m de Drago	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO087	Cno de las Flores y MALVINAS ARGENTINAS	LOPC2		3%	97%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO093	Cno San Vte a 500m pozo 87	LOPC2	3%	12%	85%				-	PUELCHE	5	2,0	111,8%	6,0	< 1	< 1
LO106	J. B. Justo y Cuyo	LOPC2	65%	5%	30%	-	-	BATERIA BURZACO	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO117	Mendoza y N. Silva	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO122	J. Ingenieros	LOPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	3,3	138,5%	10,0	< 1	< 1
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	2%	23%	75%	-	-		-	PUELCHE	2	2,0	70,7%	3,0	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
LO144	Avenida Argentina y RP N° 16	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO145	Villarino y Avenida Argentina	LOPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO149	Rene Vallo y Jose Melián	LOPC2	67%	-	33%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO095	Larrea y Gardel	AB14	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO113	Letoir 432	LO38	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO120	Pino y el Cairo	LOPC1	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO127	Jose Marmol e/Allemandri y Anchorena	LO47	-	1%	-	99%	-	PLANTA - LO127	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO128	Martí y Av. Cabred	LO13	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	4,5	155,6%	15,0	< 1	< 1
LO134	Larrea y Colihue	AB14	-	6%	-	94%	-	PLANTA - LO134	-	PUELCHE	4	9,0	127,3%	26,0	< 1	< 1
LO135	Matienzo y Rodriguez	AB22	1%	2%	-	96%	-	PLANTA - LO135	-	PUELCHE	4	12,8	169,0%	45,0	< 1	< 1
LO152	Necochea esquina Lujan	-	-	100%	-	-	-	PLANTA - LO152	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA002	Ambrosetti 1900 e/Beltran y Martin Fierro.	MAPC1	-	21%	79%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA003	ALMIRANTE_BROWN 2500 e/Viena y Rep. Argentina.	MAPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA004	Asamblea 1800 e/d.1 de Septiembre.	MAPC1	1%	2%	98%	-	-	BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA006	Viena e/Canning.	MAPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA018	Olíden entre 11 de Septiembre y Juan Cruz Varela	MAPC1	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
MA009	Cangallo 1200 e/San Lorenzo y Uspallata.	PCMA009	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA010	Uspallata 1000 e/Soller y O´Brien.	PCMA010	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
MA011	Stoppler 900 e/Bat. de Maipu y Paso de los Andes.	PCMA011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA012	San Lorenzo y Seguí	PCMA012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	4,0	1,3
MA016	Canadá 748 y Seguí	MAPC2	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA017	Palacios y Seguí	MAPC2	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	1,8	85,7%	4,0	< 1	< 1
ME001	25 DE MAYO E/PUEYRREDON	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME003	25 MAYO E/ 9 DE JULIO	ME-TAN-CES	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME004	BROWN E/ CENTENARIO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME006	BROWN E/ CARLOS PELEGRINI	ME-TAN-CES	-	6%	-	94%	-	TANQUE MERLO	-	PUELCHE	4	11,3	182,2%	42,0	< 1	< 1
ME007	BROWN E/ M.BRAVO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME015	9 DE JULIO E/ SAN LORENZO	ME-TAN-CES	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME016	SAN LORENZO E/CANNING	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	8,3	138,3%	25,0	< 1	< 1
ME060	SAENZ PEÑA Y AV. CALLE REAL	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME005	25 MAYO E/ J.M.Castro ex Pearson	ME02	75%	-	25%	-	-	BATERIA PARQUE SAN MARTIN NORTE	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME014	BROWN E/PIZURNO	ME02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME008	LIBERTAD E/ ARGENTINA Y PUCHEU	PCME008	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
ME009	COVIPOL. EDIF 38. ROSSI Y ECHEVERRY	PCME009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	< 1	< 1
ME010	COVIPOL. EDIF 13. ROMAY Y ZUNDA	PCME010	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
ME017	DEFENSA E/BARAVINO Y HORTIGUERA	PCME017	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME018	OYUELA E/FRIAS Y RUTA 200	PCME018	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME019	PEDRIEL E/ TALA	PCME019	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME020	INDEPENDENCIA E/ SULLIVAN	PCME020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME021	ESNAOLA Y BOYACÁ	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME022	ESNAOLA Y BACH	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME023	AV.ARGENTINA Y CHOPIN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-	TANQUE LOMA GRANDE	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME025	AV.ARGENTINA E/GAVILAN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME081	Strauss y Juan Sebastian Bach	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME087	Av. Argentina y Lezama	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME090	Angel Rodriguez y Curapaligue	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME026	TUNUYÁN E/AREVALO	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME027	VIDT E/ FEBAL	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME028	VIDT E/DEMOCRACIA	ME-TAN-REC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	9,8	179,5%	56,0	< 1	< 1
ME029	VIDT E/CHAGAS	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-	TANQUE RECONQUISTA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME030	VIDT E/FAMATINA Y DESSY	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME063	FILIBERTO Y TARIJA	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME079	Antofagasta y Fraga	ME-TAN-REC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME082	Cacheuta y José Martí	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME031	GARDEL E/PAYRO	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME033	VIDT E/DISCEPOLO	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME034	VIDT E/ACCARCOS	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	7,3	172,4%	26,0	< 1	< 1
ME035	VIDT E/MEDMA	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-	TANQUE ARCO IRIS	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME068	JOSE MARTI Y DALTON	ME-TAN-ARC	-	6%	-	94%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME088	Lorenzini entre Delin Funes y Fraga	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	14,5	131,7%	28,0	< 1	< 1
ME091	P.Echague y P. Podestá	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME092	Carcavallo entre Cassaux y Orfilia Rico	ME-TAN-ARC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME102	Fraga y Davila	ME-TAN-ARC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	PCME036	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME037	AMADO NERVO E/ANCON Y AMPERE	ME-CIS-PSM	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME038	LOS ALELIES Y TILCARA	ME-CIS-PSM	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME039	LOS ALELIES E/TILCARA Y AGUARIBAY	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME040	LOS JACINTOS E/ETIOPIA	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	16,0	127,0%	44,0	< 1	< 1
ME041	ACHALA E/LAS RETAMAS	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME045	ALVAREZ JONTE E/ LOS ALELIES	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME046	LAS RETAMAS E/JURAMENTO	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME047	ALVAREZ JONTE E/ LOS GERANIOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME048	ALVAREZ JONTE E/LAS DALIAS	PCME048	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME049	GABRIELA MISTRAL E/ALTE BROWN	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME051	GENDARMERIA GURRUCHAGA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME053	ZARRAGA E/ GAGUERRE Y PEDERNERA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME054	ZARRAGA E/ GAVILAN	ME-CIS-PSM	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	3,0	133,3%	9,0	< 1	< 1
ME058	12DE FEBRERO	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	6,8	170,4%	24,0	< 1	< 1
ME076	El Hornero 3710	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	HIPO/PUELCHE	3	8,3	152,4%	23,0	< 1	< 1
ME086	Garmendia y Almte. Brown	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME042	GENDARMERIA E/ FLORES A.	PCME042	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME050	GABRIELA MISTRAL E/BENOIT	PCME050	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME055	PUEYRREDON Y O'BRIEN	PCME055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME056	SAN ANTONIO Y PARAGUAY	PCME056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
ME057	CHACO N° 310 E/DIRECTORIO Y NOGUERA	PCME057	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME059	GABRIELA MISTRAL Y ALPATACAL	PCME059	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME061	SAENZ PEÑA Y AV. RIVADAVIA	PCME061	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	PCME065	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA Y SOLANET	PCME066	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	15,3	161,9%	44,0	37,0	5,5
ME067	TRAFUL Y BLANCO ESCALADA	PCME067	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME069	ATAHUALPA Y PEDRO CHUTRO	PCME069	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	9,8	179,5%	36,0	< 1	< 1
ME070	TUCUMAN Y LA RIOJA	PCME070	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME073	SARMIENTO 2398 Y LA HABANA	PCME012-73	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	PCME074	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME075	MEDRANO 811 Y SANTA FE	PCME075	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME078	Garay 1753	PCME078	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME080	Federico Lacroze y Matorras	PCME080	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	ME01	-	-	100%	-	-	POI MERLO	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	ME01	2%	-	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME089	Curapaligüe y 25 de Mayo	PCME089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME093	Morse y Av. del Bicentenario	PCME093	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME094	Brasil y Guardia Vieja	PCME094	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME095	Sullivan y Sargento Cabral	PCME095	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME096	Gral Ocampo y T Saley	-	-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME097	Orán entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME098	Tasso y Oran	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME099	De Roma y Necochea	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME100	Republiquetas entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME101	Juan A Maza y Dr Ricardo Raúl Alfonsin	PCME101	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME103	Los Arreros y San Martin	PCME103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	6,0	1,4
ME113	EVA PERON E/PELLEGRINI	PCME113	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI001	Belgrano 400 e/Vicente Lopez y C. Malnatti.	MIPC2	-	-	-	100%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI020	Julio A. Roca 216 e/Dorrego y Roseti.	MIPC2	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI035	Pavon 1100 e/R. Peña y Sgto. Cabral.	MIPC2	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	4,5	155,6%	15,0	< 1	< 1
MI002	Julio A. Roca 800 e/Serrano y Muñoz.	PCMI002	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI003	Italia 1300 e/Francia y L. N. Alem.	PCMI003	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	15,0	149,4%	48,0	< 1	< 1
MI006	Pardo 400 e/San Luis y C. Malnatti.	PCMI006	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI007	Julio A. Roca 1900 e/Gelly Obes y Zuviria.	PCMI007	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI008	Conesa 2000 e/ Gelly Obes y J. M. Zapiola	PCMI008	1%	-	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI009	Serrano 800 e/Conesa y SAN_JOSE	PCMI009	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI010	Cjal. E. Tribulato 700 e/Serrano y Urquiza.	PCMI010	2%	27%	72%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI011	Int. J. Irigoin 700 e/Serrano y Stgo. Del Estero.	PCMI011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI013	J. B. Alberdi 200 e/Dorrego y Accuenaga.	PCMI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI014	Serrano 400 e/J. B. Alberdi y Haedo.	MIPC1	-	100%	-	-	-	CAG SAN MIGUEL CENTRO	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI046	Paunero 100 e/Pardo.	MIPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MI015	Cnel. Fraga 2300 e/Int. J. Irigoin y Marcos Sastre.	PCMI015	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI016	Cnel. M. Fraga e/Salerno y Tomas Edison.	PCMI016	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	5	5,4	182,2%	23,0	30,0	3,4
MI017	Vicente Lopez e/Marcos Sastre y Malvinas.	PCMI017	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI018	Pardo e/Libertad y J. M. Zapiola	PCMI008	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	4,0	150,0%	13,0	< 1	< 1
MI019	J. B. Alberdi e/J. Zapiola y Gelly Obes.	PCMI008	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
MI021	Cjal. E. Tribulato 2300 e/ G. Campos y Libertad.	PCMI021	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI022	Tomas Guido 4400 e/J. R. Lopez y El Zonda.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI023	Av. Alte. J. Lopez 4500 e/J. D. Solis y Eva Peron.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI025	T. Guido 5900 e/Uriarte.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI026	T. Guido 5301 e/La Pinta.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI032	Marchena 3256	MI_CIS_SAR	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI024	E. Ferreyra 4200 e/T. Guido.	MI_CIS_GUA	1%	2%	98%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI028	Santa Maria 5100 e/Vicente Fatome.	MI_CIS_GUA	1%	3%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI037	Cisterna La Guarida	MI_CIS_GUA	4%	4%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI065	Calle Defensa e Italia	MI_CIS_GUA	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI066	Dr. Enrique Finochietto e/Sta Maria y Fray Antonio Marchena	MI_CIS_GUA	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI033	Int. J. Irigoin 400 Gelly Obes y Granaderos.	PCMI033	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	5	1,8	99,4%	5,0	< 1	< 1
MI036	Cnel. M. Fraga 3400 e/Marconi.	PCMI036	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI038	Roca 1400 e/Alen.	PCMI038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI039	Belgrano 2000 Gelly Obes y R. S. Peña.	PCMI039	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	1,3	40,0%	2,0	< 1	< 1
MI040	Italia 2300 e/Gaspar Campos y J. M. Zapiola.	PCMI040	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI041	Belgrano 900 e/D´elia y Muñoz	PCMI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	8,5	176,5%	31,0	< 1	< 1
MI042	Pardo 10 e/Ruta 10.	PCMI042	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	7,5	173,3%	27,0	< 1	< 1
MI043	Conesa 416 e/San Luis.	PCMI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI045	Rodriguez Peña 2600 e/Williams.	PCMI040	-	8%	92%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI004	Conesa 1300 e/Martin Irigoyen.	MI_CIS_CEN	-	20%	80%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI034	Martin Irigoyen y Juan B Alberdi	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI047	Martin Irigoyen e/Obilitio y Francia.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI048	Av. Francia 500 e/Sta. Fe y Parana.	MI_CIS_CEN	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI049	Av. Francia 600 e/Moreno.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI051	Av. Francia 1100 e/Tucuman y Azpiardo.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI060	Conesa entre Martin Irigoyen y Sarmiento	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI067	Conesa e Irigoyen	MI_CIS_CEN	1%	14%	84%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI052	Rodrigo de Triana 1500 e/R. Balbin.	PCMI052	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI053	Defensa e/R. Balbin.	PCMI053	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI054	Cruz del Sur e/Tomas Espora.	PCMI062	-	1%	99%	-	-	BATERIA MI054-MI062	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI062	Calle Güemes e Isabel La Catolica	PCMI062	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI055	J. J. Paso 5500 e/La Niña y Isabel la Catolica.	PCMI055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI056	Juan J. Paso e/Beron de Estrada y Salguero.	PCMI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI057	Maestro Ferreyra y Charlone	PCMI057	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI058	José M. Zapiola y Güemes	PCMI058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	12,0	2,2
MI059	Concejal Tribulato y Monseñor Blois	PCMI059	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI061	Luis Salguero y Tomás Alba Edison	PCMI061	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI063	Egipto y Libertad	MI01	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI064	San Nicolás y Gral Las Heras	MI01	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN001	Lavalleja al 7100 E/ Conde y Achupallas	LMO19	-	1%	99%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN002	Armonia a 150 m de La Fuente.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	3,3	150,0%	10,0	< 1	< 1
MN003	Armonia y Billinghurst.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN004	Billinghurst 2800 y Armonia.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	5,5	142,8%	11,0	< 1	< 1
MN005	Billinghurst y Dobles/ Cespedes.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	3,8	146,7%	12,0	< 1	< 1
MN006	Int. Russo y Ramón Lista	LMO46	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN007	Billinghurst e Int Russo	MN24	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]			
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea		Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad								
MN008	Billinghurst y Las Flores	MN24	-	4%	96%					PUELCHE	4	3,8	80,8%	8,0	< 1	< 1
MN009	Billinghurst 5300 y Río Cuarto	MN24	-	1%	99%					PUELCHE	4	6,0	116,5%	14,0	< 1	< 1
MN010	Las Flores y Ramón Lista	MN24	-	-	100%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN011	Monte Egmont y Casanelas	LMO19	-	3%	97%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN032	Acassuso 1700 y Santa Rosa	MN23	-	-	100%					PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN033	Acassuso e Ituraeza	MN23	-	1%	99%					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MN034	Noruan y Zavala	MN16	-	-	100%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN036	Hucal y Fere	MN16	-	4%	96%			BATERIA RAFAEL CASTILLO		PUELCHE	6	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN037	Lavalle y Tres Cruces	MN23	-	4%	96%					PUELCHE	5	11,2	175,2%	46,0	< 1	< 1
MN039	E. Del campo y Aguirre	MN23	-	100%	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MN044	Huarpe y Lacar	MN23	-	-	100%					PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN043	Cassafous N° 2922 e/E. Echeverría	MN23	-	100%	-			POI MN043		PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MN099	Beethoven y La Gorina B°El Tonino	MN24	-	100%	-			-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MN106	Beethoven entre Aguirre y Mendez de Andes	MN24	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN110	V. de la Plaza E/ Dávila y Beazley	MN25	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	<1	100,0%	5,0	< 1	< 1
MN122	Santa Rosa y Aguirre	MN23	-	-	100%			-	X	PUELCHE	5	2,4	166,7%	7,0	< 1	< 1
MN147	Zamudio e/ Bravard y Aguirre	MN25	-	9%	91%			POI MN147		PUELCHE	3	1,7	69,3%	3,0	< 1	< 1
MN157	Beauchard y Heredia	MN25	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN173	Hucal 1700 e/ Vogel y Polledo	MN16	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN183	Lavalle y Sudamércia	MN23	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN186	M. T. de Alvear 1100 esq. Del colegio	MN23	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN211	Esquino y Eulates	MN19	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN212	Victorino de la plaza y Luis María Drago. RAFAEL CASTILLO	MN19	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO087	Cipriano y Vidalita	MOPC1	100%	-	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO088	De los Recuerdos y De los Pavaderos	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	< 1	< 1
MO089	Gaona y La Chacarera	MOPC1	100%	-	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO093	De los Reseros y E. Frers	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO094	La Esquerita y de los Reseros	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO095	De La Dorna Pte N° 1282 y El Ombu	MOPC1	100%	-	-			BATERIA PARQUE LELOIR - ITUZAINGO		PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO097	De La Vidalita y J. Hernández	MOPC1	81%	1%	18%					PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO146	N. Repetto y Del Palenque	MOPC1	4%	-	96%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO147	N. Repetto y De la Tradición	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	2,2	66,7%	3,0	< 1	< 1
MO148	Del Mensjulito y De las Cachuelas	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO149	N. Repetto a 180 mtsmts. de F. Ielosi	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO150	De la Conviccion y Colectora Acceso Oeste	MOPC1	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO100	Videla y Peredo	MOPC1	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
MO105	Fray J. S. M. de Oro y Figueroa Alcorta	MO03	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO106	Figueroa Alcorta y La Tribuna	MO21	95%	5%	-			BATERIA VII BRIGADA AEREA - MORON		PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO107	E. Lopez y Cnel. Arenas	MO30	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO108	Figueroa Alcorta y Montevideo	MO21	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO130	Lacarra y Cucha Cucha	MO21	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO137	Madrid y Jarry	MO32	95%	5%	-			BATERIA BARRIO SAN JUAN		PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO138	Paganini e/Pedro Diaz y Juan Gorriti	MO31	-	-	100%			BATERIA HURLINGHAM - INTA		PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO139	Amberes y Pedernera/v	MO31	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO140	Cuzco entre M. de Aviles y Tolivo	MO31	-	1%	99%					PUELCHE	4	1,3	40,0%	2,0	< 1	< 1
MO141	Cuzco y Arowe	MO31	-	100%	-					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO150	La Trilla a 1dm de Juramento	HU01	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM 2		PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MO151	Arotahal a 21.93m de Yerague	HU01	-	17%	83%					PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO152	Chamberá y Los Cerdales	HU01	-	1%	99%					PUELCHE	4	2,8	127,3%	8,0	< 1	< 1
MO142	Pavas esq. Lavalle	JT01	99%	1%	-			-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO144	Sta. Teresa y La Garcela	MO03	95%	5%	-			-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO154	Coronel Arevas esq. Andrade	MO21	95%	5%	-			BATERIA CASTELAR		PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MO155	Olivari esq. Palermo	MO21	95%	5%	-			-		PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MR001	J.V. González 2625 e/Balzak y Rodriguez Peña.	PCMR001	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR002	J.V. González 2435 e/Güemes y V. Alsina.	PCMR002	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR003	Güemes 901 e/Bolivia y Paraguay.	PCMR003	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	4	2,0	100,0%	5,0	< 1	< 1
MR004	Larralde 1341 e/J. Gonzalez y R. Gutierrez.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	TANQUE MORENO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR005	Int. Bossi 1080 e/Ecuador y Paraguay.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR006	Int. Bossi e/Venezuela y Ecuador.	MR-TAN-MOR	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	4	3,3	88,4%	7,0	< 1	< 1
MR007	Guatemala 2400 e/Güemes y Alsina.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR008	Guatemala 2700 e/marmol y Colectora Gaona	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR019	Int. Bossi e/Guatemala.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR011	P. Ansaldo e/Blas Parera y M. Melo.	PCMR011	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR012	M.Obarrio 2048 e/Iliberdi y Rafael.	MRPC1	-	3%	-	97%	-	PLANTA CAG MORENO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR046	Del Cañon/M. Obarrio e/San Carlos.	MRPC1	-	45%	-	55%	-		-	PUELCHE	3	14,3	67,8%	25,0	< 1	< 1
MR013	Av. Perón e/Del Cañon.	PCMR013	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR014	Alcorta 2500 e/Bouchard y Uruguay.	PCMR014	1%	2%	97%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR015	Ameghino e/Centenario y Argentina.	PCMR015	1%	2%	97%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR016	Callao e/Av. Alcorta y Mitre.	PCMR016	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR017	Alcorta e/Haedo y Ramos Mejia	PCMR017	-	7%	93%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR018	Misiones e/ Sta. Fe y D´errico.	PCMR018	-	3%	97%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR020	Alte. Brown e/25 de Mayo y Andrade.	MR01	-	2%	98%	-	-	BATERIA MR020-MR02	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR021	Alte. Brown e/Pio XII.	MR01	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	12,0	183,3%	45,0	< 1	< 1
MR022	Sanchez 4800 e/Ruta 25 y San Justo.	PCMR022-23	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	4	4,5	155,6%	15,0	< 1	< 1
MR023	Florencio Sanchez e/Gandhi y Solocles.	PCMR022-23	-	11%	89%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR024	Cosas Rica e/F. Sanchez y Solocles.	MR-TAN-PER	-	30%	-	70%	-	TANQUE LA PERLITA	-	PUELCHE	4	6,5	169,2%	23,0	< 1	< 1
MR025	A. Storni 5600 e/Danubio.	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR026	A. Storni 5900 e/Madariaga.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR027	Ecuador 5700 e/La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR029	La Plata e/Ruta23 y Camil.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR035	Gutierrez 5600 e/La Plata y Cost Rica.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR070	Honduras y Marquez	MR-TAN-PER	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR072	Honduras y Gral. Madariaga	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR028	El Salvador e/Chile y Mexico.	PCMR028	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR030	Pedrell e/Ascasubi y Carriega.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	TANQUE TRUJUI	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR031	R Rojas e/Libano y Gral. Pintos.	MR-TAN-TRU	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	7,3	172,4%	26,0	< 1	< 1
MR032	F. Sanchez e/Libano y Pitagoras.	MR-TAN-TRU	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR051	Tablada e/Oribe y Puccini.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR075	Diego de Villaroel y Celerino Namuncurá	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR036	Ruta 25 e/Cataliña.	PCMR036	83%	2%	15%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR037	Giralde e/Pastor Obligado y Lavarden.	PCMR037	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR040	Piovato 4132 e/Bochardo y Balcarce.	PCMR040	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR041	Dorrego e/Dorrego y Darat.	PCMR041	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	14,0	2,1
MR042	1 de Mayo e/Alcorta.	PCMR042	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	6,0	166,7%	21,0	< 1	< 1
MR043	San Pablo e/San Cayetano.	PCMR043	5%	2%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR044	Piovano e/El Salvador y Venezuela.	PCMR044	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR048	Echeverría e/Darwin y Peron.	PCMR048	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR049	Sarratea e/Victoria.	PCMR049	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR050	Marcos Paz 1116 e/Iarrea y J.J. Urquiza.	PCMR050	10%	2%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	4	5,5	163,6%	19,0	< 1	< 1
MR052	Arribeños e/Concordia.	PCMR052	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR009	V. Alsina e/Libertador.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR053	Córdoba E/Palo y Sheden.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR054	Alvear e/Rafael Arco.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR055	Córdoba e/V. Lopez y Linch.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR056	Corvalán 2733 e/B de Yrigoyen y Graham Beil.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR057	Uruguay e/E. Rios y colectora.	MR-CIS-MOR	2%	4%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR058	Misiones 1970 e/ Moron.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR059	Facundo Quiroga e/Moron y Yapeyu.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MR060	Facundo Quiroga e/ La Tropilla y Quilmes.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MORENO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR061	Corvalán e/La Tropilla.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	3,8	146,7%	12,0	< 1	< 1
MR062	SAN_JUAN_BAUTISTA 2026 e/ Int. Corvalan Dean Funes	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR063	Lincoln e/Soldado Derrico y E. Rios.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MR064	Intendente Corvalan 2302 e/ Alvear y Alejandro Graham Bell	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR095	Uruguay y Chictana	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR097	Entre Rios esquina Abraham Lincoln	MR-CIS-MOR	2%	3%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR100	Moron e/ Facundo Quiroga y Arribeños	MR-CIS-MOR	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR101	Lincoln N°1644	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR065	J.V. González e/ Ruta 25 y Brasil.	PCMR065	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR067	Lobos e/La Tablada y Manzana 36.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR068	Lalinur e/Lobos y 3 de Marzo.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR069	Tablada e/Democracia y Colectora	PCMR069	12%	4%	84%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR071	Shakespeare y Manuel Galvez	PCMR071	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	7,0	171,4%	25,0	< 1	< 1
MR073	Colombia y Ricardo Gutiérrez	MR-TAN-PER	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR074	Colectora Acceso Oeste y Ecuador	PCMR074	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR076	Hipólito Yrigoyen y San Luis	PCMR076	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR077	Teniente Ibañez 3224	PCMR077	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR078	Alberti entre Marcos Paz y Vera	PCMR078	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
MR079	Juana de Azurduy y San Cayetano	PCMR079	43%	2%	55%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR086	Ecuador y Marquez de Aguado	MR-TAN-PER	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR088	Lobos entre Misiones y José Hernández	PCMR088	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	24,0	2,9
MR089	Pavón y Gervasio de Posadas (Plaza del Estudiante)	PCMR089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	2,3	111,1%	6,0	< 1	< 1
MR093	Mendoza y Jose Ingenieros	PCMR093	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR098	Av. Luis Pasteur entre Facundo Quiroga y Arribeños	PCMR098	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR099	Marcos Paz entre J.J Urquiza y Larrea	PCMR050	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MR104	Marcos Paz entre Larrea y Justo Jose de Urquiza	PCMR050	-	36%	64%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MS025	Covaera y El Pindo	MS_CIS_MUN	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	< 1	< 1
MS026	Calle 200 y Rotonda	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-	BATERIA CIUDAD EVITA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS027	Av. Central y Calle 500	MS_CIS_MUN	-	0%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	10,7	85,1%	19,0	< 1	< 1
MS034	El Tapeti y El Sauce	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	8,8	107,4%	20,0	< 1	< 1
MS042	Av. Central y calle 900	MS_CIS_MUN	97%	3%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MS030	Las calas y Los balcanes	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS091	Las Orquideas y Las Gardenias	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS093	Cordoba y Las Dalias - R. 22 de Enero	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	3,0	150,0%	17,0	< 1	< 1
MS105	Guayraa y Torquino	MS34	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MS114	Magnasco y Av. Cristiania	MS32	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
PI001	J. B. Justo y Sanguinetti al 500.	PCPI001	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI002	J. B. Justo 615 y Posadas.	PCPI002	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI003	Av. Tratado de Pilar 242 y Sanguinetti.	PCPI003	25%	35%	39%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI004	Lagrave 84 (Yrigoyen y Pampa).	PCPI004	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI005	Planta Champagnat.	PCPI005	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI006	Rincón entre San Martín y Esteban Luca	PCPI006	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI007	José María Paz 873.	PCPI007	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI008	ITUZAINGO 331.	PCPI008	1%	3%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI009	Maipú y Vías F.F.C.C. San Martín.	PCPI009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI010	Gral. O'Higgins y Bergantín Congreso.	PCPI010	-	13%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI011	Juan Bautista Alberdi 1106 y 11 Septiembre	PCPI011	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	1,8	85,7%	4,0	< 1	< 1
PI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambrosetti.	PCPI012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Mapuche)	PCPI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI014	Las Araucarias y M. Acosta.	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI059	Ubicado dentro de predio Campo Suite II. frente a Parque Austral.	PIPC2	23%	77%	-	-	-	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
PI067	Mariano Acosta y Los Alamos	PIPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI089	Los Alamos y Av. Eva Perón	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI015	Dr. Ignacio Pirovano 728 esq. Costa Rica	PCPI015	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI016	Chacabuco 2130 e/Paraguay y Bolivia	PCPI016	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI017	Tortugas Country Club	PCPI017	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI018	Tortugas Country Club	PCPI018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI020	Tortugas Country Club	PCPI020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI021	Tortugas Country Club	PCPI021	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	12,0	1,8
PI022	Las Campanillas esq. Av. Highland Park	PCPI022	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI025	Country El Carmel	PCPI025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI026	Las Amapolas. Villahaus - Country Ayres del Pilar	PCPI026	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	1,5	66,7%	3,0	15,0	2,2
PI035	Country Ayres del Pilar	PCPI035	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI037	Country La Lomada	PCPI037	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI040	Las Margaritas 1100 e/ Los Claveles y Las Rosas	PCPI040	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI041	Las Glicinas 1080 (proximo a R8)	PCPI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI042	Mosladini 374. esquina Bergantin Independencia.	PCPI042	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI043	Segui esq. Colectora Este Ramal Pilar	PCPI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI044	Posadas 1635 e/J.V. Gonzalez y H. Ascasubi	PCPI044	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI045	Country B° Campo grande	PCPI045	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI048	Cjal. Dr. Martiegui 219. Plaza.	PCPI048	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI049	Bergantín República y Bergantín Independencia.	PCPI049	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI050	Av. Constitucion(R26) e/Nicaragua y San Salvador.	PCPI050	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI051	Guatemala y R26.	PCPI051	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	1,3	40,0%	2,0	< 1	< 1
PI052	Guatemala 4300 esq. Alemania (MANUEL_ALBERTI)	PCPI052	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	15,0	2,2
PI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ramón Gimenez.	PCPI053	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI054	Leguizamon e Iluzaingo	PCPI054	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI056	Ameghino y Colectora Oeste	PCPI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	3,0	133,3%	9,0	< 1	< 1
PI058	Nicaragua 1250 e/Haiti y Santo Domingo	PCPI058	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	6,5	169,2%	23,0	< 1	< 1
PI061	RN 25 y Chubut	PCPI061	4%	24%	71%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI062	Panamá y Alejandro Korn	PCPI062	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI063	Patagones y Tagle	PCPI063	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI064	Andes y Avda. Patricias Argentinas	PCPI064	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI065	Goleta Constitución y Fragata Sarmiento	PCPI065	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI066	Calle s/n e/ Haití y Santo Domingo	PCPI066	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI068	Alazan e/Overo y Picasso- Highland Park	PCPI068	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI070	Paraguay y Tierra del Fuego	PCPI070	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI075	Guatemala y Levene	PCPI075	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI076	Gallo y Vasco Da Gama	PCPI076	-	-	100%	-	-	BATERIA PERUZZOTTI	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI078	Vasco Da Gama entre Hermita y Camino Comercial	PCPI076	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI080	Monseñor D´Andrea y La Carreta	PCPI080	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI084	Chubut y San Ignacio	PCPI084	-	20%	80%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI100	Calle Sarmiento e/ Bahía Grande y Bahía Redonda	PIPC1	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI101	Ruta 234 y Bahía Darbel	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI102	Calle Henry Martin y Bahía Darbel	PIPC1	-	1%	99%	-	-	BATERIA DERQUI	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI103	Cerrito 3287 e Isla Gran Malvinas	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI105	Libertad e Isla Candelaria	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
CN037	345 y 283	CN037	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	COLIFORMES TOTALES [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
OU076	Cno. G. Belgrano y Av. Monteverde	OU38	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
OU139	Calle 869 Esq. D. Alvarez	OU07	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
OU141	Calle 867 Esq. Donato Alvarez	OU07	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
AB057	P. Echagüe y Serrano	AB14	-	1%	-	99%	-	PLANTA - AB057	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB061	Laprida Narciso 1900	AB23	5%	6%	89%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB063	Laprida Narciso 3001	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB064	Juan B. Justo 2050	AB23	17%	6%	77%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB065	Juan B. Justo 2700	AB23	8%	-	92%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB066	Juan B Justo 2101	AB23	19%	45%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB067	Juan B. Justo 2802	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB068	Av. Ceballos (400) a 700 mts. de Avda. República Argentina	AB23	21%	27%	52%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB070	Francisco N. Laprida y Muesca	AB23	8%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB071	Narciso Laprida 2301	AB23	17%	69%	14%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB073	República Argentina 6670	AB23	6%	8%	86%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB074	Rep. Argentina y Juan B. Justo	AB23	14%	8%	78%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	AB23	9%	34%	56%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB076	Republica Argentina 7570 e/ Juan Jose Castro y Alice	AB23	20%	29%	51%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB084	Espoile s/n	AB23	3%	48%	49%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB085	Leyes y Romero	AB23	36%	16%	48%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB086	Romero y Calderón	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB087	Calderon 1251	AB23	24%	25%	51%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB088	Calderón 1851	AB23	53%	36%	11%	-	-	BATERIA GLEW	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB089	Calderón 3000	AB23	1%	98%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB090	Calderon 3400 1848	AB23	10%	14%	76%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB091	Calderon 3650 1848	AB23	15%	49%	36%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB092	Brigadier Calderón e/ Lezica y Young	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB093	Brigadier Calderón e/ Young y Av. Eduardo Holmberg	AB23	13%	19%	68%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB094	Romero 3800	AB23	1%	9%	90%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB095	Lemos 3800	AB23	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB098	Rocha y J.A. Casacuberta	AB23	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB099	Fernando Lahille y M. Acosta	AB23	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB100	Gral. Cardenas y Almte. Irizar (Plaza)	AB23	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB101	Agustín Barrios y Virrey Cevallos	AB23	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB102	Martiniano Leguizamón entre 25 de Mayo y F. Alvarez	AB23	2%	1%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB105	Av. Juan B. Justo e/ AV. República Argentina y Av. Espora	AB23	4%	1%	95%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB106	Pablo Podesta y Orillia Rico	AB23	10%	85%	5%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB107	Fernando Ochoa y Juan Sarcione	AB23	19%	75%	6%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB108	Rufino Cordoba y Cesar Ratti	AB23	23%	75%	2%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
AB109	Luis Viale y Enrique de Rosas	AB23	12%	75%	13%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
AB110	Boulogne Sur Mer y Antonio Luis Beruti	AB23	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB601	King y Bouchard	AB04	55%	8%	37%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB728	B° Segba (D. Rocha y Paraguay)	PCAB728	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB103	MALVINAS_ARGENTINAS y Dr. Chiesa	PCAB103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
AB096	Manuela Pedraza 1209	ABPC1	-	1%	-	99%	-	PLANTA RAYO DE SOL	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
AB097	Santiago del Estero 3075	ABPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE001	Las Heras y Guillon	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE002	Rivadavia y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
EE003	Origone y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE004	Las Heras y Chacabuco	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE005	Terrarosa y Colon	EEPC1	-	14%	86%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
EE015	Dorrego y Dreyer	EEPC1	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE027	Maipú y Colón	EEPC1	-	30%	70%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE028	Lavalle y Maipú	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE029	Lavalle	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE030	Lavalle	EEPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE031	Lavalle	EEPC1	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE032	Lavalle	EEPC1	-	10%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE033	Lavalle	EEPC1	-	66%	34%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE034	Maipú	EEPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE035	Ventura Avila	EEPC1	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE036	Ventura Avila y Calle 13	EEPC1	-	9%	91%	-	-	BATERIA LA LATA	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE040	Ventura Avila	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE041	Ventura Avila	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE042	Ventura Avila	EEPC1	-	20%	80%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE043	Juana de Arco	EEPC1	2%	39%	59%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE044	Juana de Arco	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE045	Juana de Arco	EEPC1	4%	5%	91%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE046	Lavalle entre Tomquist y Bragado	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE047	Martin Fierro a 700mts de S6	EE21	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE048	Martin Fierro a 700 m de Vazquez	EE21	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE057	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EEPC1	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE058	Avila Ventura 3000	EEPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE059	Avila ventura 3400	EEPC1	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE060	Los Claveles y General Las Heras	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE070	Colon y Maipú	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE064	Puan y Pablo Pizzurno	PCEE064	25%	2%	73%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE013	Cap. Lozano y Ascasubi	EE05	-	3%	-	97%	-	PLANTA - EE013	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
EE065	Pedro Arocena y E. de Laperriere	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE066	Amado Nervo y San Pedrito	-	50%	20%	30%	-	-	BATERIA SANTA ISABEL	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	-	-
EE073	Villegas esq. Colón	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
EE049	Martin Fierro y Vazquez	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	<1	< 1
EE050	Vazquez a 700 m de Martin Fierro	EE21	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE051	Martin Fierro y Dolores	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE052	Martin Fierro a 1300m de E. Vazquez	EE21	-	46%	54%	-	-	BATERIA BAFICO	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	<1	< 1
EE054	Martin Fierro y Dreyer	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE055	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EE21	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE061	República de Costa Rica y Libertad	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE062	El Ceibo y Fraga	EE21	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EE063	Alvarez de Toledo y Miguel Angel	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
EE006	Almafuerte e/Andrare y Obligado	EE03	39%	1%	-	60%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE007	R. Dario y M. Cane	EE03	1%	1%	-	98%	-	PLANTA BARRIO UNO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE038	Av. Tte. Gral. Morillas a 1000 mts de La Horqueta	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EE039	Tte. Gral. Morillas s/n - Villa Ntra. Sra. Del Rosario	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
EEN001	Lago Garcia 3901 y Los Andes	EEPC4	-	1%	99%	-	-	POI 9 DE ABRIL	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN002	Pedro Coni 3401e/Oliver y sanciniena	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN003	Palleros 1700 /S. Nicolas y Mte. Grande	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN005	Sansinena 601 e/ Huergo y 9 de julio	EEPC4	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN006	Cayetano 580 e/Huergo y 9 de Julio	EEPC4	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEN007	Sarmiento 2700 e/Tricotti y Barros	EEPC4	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN008	Ing. Huergo 2500 e/Petraca y Sastre	EEPC4	5%	11%	84%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN009	Pto Deseado 601 e/Huergo y 9 de abril	EEPC4	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN010	Ing. Huergo 1600 1842	EEPC4	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN012	M.Alegre 992 e/Gomez y Vernet	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN013	Tricotti 10 e/Malvinas y Barros	EEPC4	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN014	Cnel. D° Elia 190 e/Palleros y Constanzo	EEPC4	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN015	Constanzo 2090 e/P. Argentino y Rivero	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN016	Tierra del Fuego 179 e/Constanzo	EEPC4	15%	1%	84%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN018	Constanzo 1229 e/Guarany y Crespo	EEPC4	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN019	Prayones 3150 entre Palleros y Lopez	EEPC4	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN021	Rebizo 1100 e/ Fair y Crespo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN026	M. Alegre 1720 e/Alegre y Urquiza	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN059	Enrique Banch y Rebizo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN020	Sansinena 105 e/ Doclout y Constanzo	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN022	Sansinena e Vernet y Benavidez	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN023	Benavidez 3190 e / F.Lopez y Scaglia	EEPC4	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN027	Fernadez y Dicio	EE23	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN028	Rivero y Chimondegui	EE23	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN029	Av. Fair y Primera Junta	EE34	-	22%	78%	-	-	BATERIA CORREO ARGENTINO	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN030	Cervetti y Av. Fair	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN031	Cervetti y La Horqueta	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN032	Av Fair e Islas Trinidad	EE34	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN033	Urbano González e Independencia	EE31	-	1%	99%	-	-	BATERIA SANTA CATALINA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN034	Alberto Grande a 38m de las vias	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN035	Casacubierta e/Valette y Gonzalez	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN036	Lima e/Valette y Francia	EE31	8%	2%	90%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN037	Cepeda y de los Constituyentes	EE31	-	46%	54%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN038	Lago Garcia y Cepeda	EE31	-	23%	77%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN039	Cepeda y Alberto Grande	EE31	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN040	Lago Garcia a 50m de Valette	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN041	9 de Abril e/Valette y Wieman	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN042	Las Talitas e/Sarmiento y M. Alegre	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN043	Avellaneda e/Trangoni y C. Monte Grande	EE31	64%	36%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEN044	Bruzzone e/Foz y Gonzalez	EE31	1%	1%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN045	Bruzzone e/Tte. Alberto Grande	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN046	Bourquet e/ Amaghino y Gabastón	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN047	Juan M. de Rosas t Tte. Gabaston	EE31	9%	13%	78%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN048	Robertson e/ J. Newbery y T. Matienzo	EE31	1%	4%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN049	J. A. Roca y Est. Los Remedios	EE29	-	4%	96%	-	-	BATERIA SAN IGNACIO	-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN050	Los Robles y T. A. Edison	EE29	30%	5%	65%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	EE29	27%	0%	73%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN052	20 de Junio y L. Lopez	EE29	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN053	Cichero 700 e/ Hipolito Bouchard y Julio Argentino Roca	EEPC5	-	1%	99%	-	-	BATERIA LA MORITA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN054	Destacamento Melchior 733	EEPC5	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEN056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEN058	Fray Luis Beltran 1415	EEPC5	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EET001	Falucho y Las Dalias	EEPC2	-	81%	19%	-	-	BATERIA TRISTAN SUAREZ	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EET004	Av. Saenz Peña y Bogado	EEPC2	-	75%	25%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU001	Maipu 800 e Bransen Hussay B.	EE20	-	25%	75%	-	-	BATERIA UNION	-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU002	San Bernardo 980 e/ Balcarce P Moreno	EE20	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU003	Los Robles al 5000	EE24	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU004	Los Robles al 5700	EE24	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU005	S.Cabral a 200mts de Lacarra	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU006	S.Cabral 3588 a 700 m de EEU005	EE26	-	62%	38%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU007	S.Cabral a 700mts de EEU006	EE26	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU008	Sgto Cabral 5149 e/ Gral. Antonio Gonzalez y Jose Alvarez Condarco	EE26	2%	2%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU011	Sgto. Cabral a 700 m de EEU010	EE32	-	45%	55%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU012	Calle s/n a 700 m de Sgto. Cabral	EE32	-	99%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	EE32	-	35%	65%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU014	Juana de Arco a 700 m de S20	EE24	-	51%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEU015	Lacarra y 9 de Julio	EE32	-	33%	67%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU016	Av. Maipu 40 esq. RP58	EE32	-	84%	16%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU017	Av. Maipu 40 esq. RP59	EE32	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU018	Andromaco 80 e/ Jose Champagnat	EE32	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU019	Montes de Oca 80 e/Ruta Prov 58 y Jose Champagnat	EE32	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU020	Vieytes 9 entre Mariano Castex y José Champagmat	EE32	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU021	Sobre Sargento Cabral a 700m del EEU011	EE32	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU022	Juana de Arco S/N	EE32	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU023	Los Robles 249	EE32	-	76%	24%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU025	Sgto. Cabral a 100 mts de Cáceres	EE32	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEU026	Juana de Arco N° 7100	EE32	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ001	Río Bermejo y Río Gualeguay	EE28	-	3%	-	97%	-	PLANTA LA CELIA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ002	Río Bermejo y La Atómica	EE28	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ003	Las Hortensias Norte	EE22	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EES001	25 de Mayo 2371	EZPC1	100%	-	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EES004	Rosario y Palacios	EZPC1	16%	4%	80%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ006	Caminito 1200	EZPC1	31%	52%	18%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ007	Caminito 1900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ010	Paso de los Libres 1800 e Islas Cook	EZPC1	41%	1%	58%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ011	Falucho y Paso de los Libres	EZPC1	24%	7%	68%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ012	Paso de los Libres a 700m de Falucho	EZPC1	18%	1%	81%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ013	Paso de los Libres 1400	EZPC1	39%	1%	61%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ014	Paso de los Libres 1500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ015	Paso de los Libres a 1700 mts de RP N°52	EZPC1	27%	1%	73%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

aysa

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEZ016	Mariano Moreno a 200m de Falucho	EZPC1	15%	48%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ017	Moreno 3500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ018	Paso de los Libres 900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ019	Ruta Provincial N°52 4000	EZPC1	25%	1%	75%	-	-	BATERIA EZEIZA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ020	RP N° 52 1000	EZPC1	34%	7%	59%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ021	RP N° 52 1200	EZPC1	25%	2%	73%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ022	RP N° 52 s/n	EZPC1	4%	23%	72%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ023	RP N° 52 1300	EZPC1	6%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ024	Ruta N°52 kilómetro 2	EZPC1	5%	3%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ025	Fariña 2000	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ026	Valle de Río Negro y América del Norte (PA Ezeiza)	EZPC1	-	-	100%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ027	Cañada de Gomez y 25 de Mayo	EZPC1	16%	17%	67%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ028	Quito y Arroyo	EZPC1	11%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ029	Valle de Río Negro y América del Norte	EZPC1	14%	9%	77%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ030	D. F. Sarmiento y Roger Balet	EZPC1	34%	18%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
EEZ031	Roger Balet y Sargento Cabral	EZPC1	14%	17%	69%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
EEZ032	Valle de Río Negro y 25 de Mayo	EZPC1	22%	52%	27%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
ES022	Scalabrini Ortiz e/Ing. Pablo Marin y 1° de Mayo.	PCES022-24	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ES023	Islas Malvinas e/Constituyentes y Pablo Marin.	PCES022-24	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ES024	Scalabrini Ortiz y Av. Patricias Argentinas.	PCES022-24	-	1%	-	99%	-	TANQUE FONAVI	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV002	San Martin y San Juan	FV-TAN-CEN	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV003	Constitución 198	FV-TAN-CEN	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV004	Carriego y Alem	FV-TAN-CEN	-	53%	-	47%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV005	San Martin y Defensa	PCFV005	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	PCFV006	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV007	Cariboni N° 2351 e/ Chaco y Rosario	PCFV007	-	14%	86%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV009	Cariboni y Rio Bermejo	PCFV009	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV011	Corrientes esq. 12 de Octubre	PCFV011	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV013	Av.Bélgica N° 1101 esq. Jorge Novak	PCFV013	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV014	J.D. Perón 535 y Pringles	PCFV014	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV018	Av. Eva Perón y Gral. Hornos	PCFV018	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV019	Río Caraguata n° 1401 y Directorio	PCFV019	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV020	Cabildo y Eva Perón	PCFV020	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV021	Mantovani y Calle 1407	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV022	Juan Mantovani 587 e/ C.1423 y C. 1409	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV023	Mantovani y Calle 1429	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV025	Calle 1423 (901) a 400 mts de Mantovani	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV040	1439 y Juan Mantovani.	FV-TAN-CRU	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV064	C. 1439 e/ C.1420 y a 300 mts de Juan Mantovani	FV-CIS-SAR	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV065	Eva Perón N° 9695 y C. 1423	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV066	Avenida Eva Perón y Calle 1352	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV084	1610 e/RP 53 y 1647	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV085	1653 e/Av. La Plata y A° Las Conchitas	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Suecia	PCFV112	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV120	Calle 1404 N° 498 e/ R.P. 53 y campo	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO SARMIENTO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV121	Av. Gral. Savio N° 598 esq. Sicilia	FV-TAN-MAY	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV124	E.B. SARMIENTO	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV132	Calle 1426 esq. 1437 – B° San Francisco Grande (oeste)	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV147	Av. La Plata 50	FV-CIS-SAR	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV149	Av. La Plata y Calle 1305	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV156	Calle 1433a y 1418	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV157	Calle 1443 y 1430	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV158	Calle 1440 a 400m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV159	calle 1440 a 1000m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV160	calle 1452 y RP53	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV166	Calle 1440 y 1455	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV024	Eva Peron y Calle 1409	FV-CIS-SL	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV036	Calle 1422 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV037	Calle 1432 N° 901 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV041	Calle 1335 N° 801 y 1328	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV042	Calle 1316 y 1333	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV045	Los Inmigrantes y Calle 1355	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV050	Av. Eva Perón N° 7700 e/1310 y Cacheuta	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV087	1364 N° 1082 esq. 1317a	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV088	1327 N° 3201 e/ 1364 y 1370	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO SAN LUIS	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV089	1356 N° 1700 e/ 1347 y 1349	FV-CIS-SL	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV086	1374 N° 900 esq. 1313	FV-CIS-SL	-	28%	72%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV092	1345 e/Av. La Plata y 1364	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV104	Calle 1363 N° 100 y Los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV116	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV130	Calle 1341 N° 511 esquina calle 1310	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV134	Los Inmigrantes y calle 1363	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV143	Calle 1328 y 1355	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV177	Calle 1347 a 58 mts de Av. De los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV026	Calle 77 y Posadas	FV02	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV027	El Zonda y El Gaucho	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV028	Riobamba N° 1501 y Olivero	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV029	Pte. Illia y Alvear	FV02	-	1%	99%	-	-	BATERIA SAN NICOLAS	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV097	Castelli N° 1001 esq. EE.UU	FV02	-	43%	57%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
FV152	El Apero entre Calle 437 y El Malambo	FV02	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV174	Castelli esquina EEUU de América	FV02	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	FV-TAN-MAY	-	12%	-	88%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV031	Virgen del Valle y El Clavel	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV032	Virgen del Valle y La Ancianidad	FV-TAN-MAY	-	23%	-	77%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV033	Virgen del Valle y Río Pilcomayo	FV-TAN-MAY	-	5%	-	95%	-	TANQUE MAYOL	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV034	Av Cacheuta y Boston	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	FV-TAN-MAY	-	11%	-	89%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV053	Cacheuta 2701 y Calle 1353	FV-TAN-MAY	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV063	Av Eva Perón 5880	FV-TAN-MAY	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudal									
FV038	Calle 1423 e/ 1422 y 1428	PCFV038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV046	Batalla de Ituzaingo 2780 e/ Conteras y C.214A	PCFV046	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV047	Boedo e/ Montserrat y Túnez	PCFV047	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV048	León XIII e/ Pte. Perón y Beirut	PCFV048	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV049	San Antonio e/ Irala y Alvar Cabeza de Vaca	PCFV049	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV051	Cacheuta 3601 y 1371	PCFV051	-	31%	69%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV055	Calle 832 e/M.Grass y Piedrabuena (V.A.)	PCFV055	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV057	Virgen del Valle N° 2599 y Chaco	PCFV057	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV058	Juan B. Justo y Arcasubi	PCFV058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV059	Av.Bosques y Ruta 36	PCFV059	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV060	Delgado y Cafferatas	PCFV060	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV062	Calle 740 y El Clavel	PCFV062	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV067	Calle 1108 N° 1702 e/ 1131 y 1139	PCFV067-70	-	23%	77%	-	-	BATERIA ING. ALLAN	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV068	Calle 1108 N° 2280 esq. 1139	PCFV067-70	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV069	Diag. Los Quilmes N° 500	PCFV067-70	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV070	Calle 1108 N° 2300	PCFV067-70	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV148	Calle 153a 301	PCFV148	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV167	Calle 1145 y Calle 1122	PCFV067-70	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV071	San Nicolás N° 2501 y Chaco	PCFV071	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV072	Finochietto N° 1411 y Fracción V	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO CRUCE VARELA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV073	C.O.Cruce	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV074	Carlos Gardel N° 700 y Campichuelo	FV-TAN-CRU	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV142	Dardo Rocha y Cerro Famatina	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV078	Bruselas y Polonia	PCFV078	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV079	Bruselas y Bulgaria	PCFV079	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV080	517 N° 1700 y Portela	PCFV080	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV082	El Paisano N° 1899 e/445 (B° Don José Planificado)	FV-TAN-P82	-	1%	99%	-	-	BATERIA DON JOSE PLANIFICADO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV131	El Malambo N° 105 esq. La Tranquera	PCFV131	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV165	Calle Monteverde e/445 y 449	PCFV165	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV090	Av. La Plata N° 1200 e/1327 y 1319a	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-	BATERIA LAS COLONIAS	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV093	1681 esq. 1608	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV094	1364 N° 2592 e/ 1371 Y 1357	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV144	La Plata 1700	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV146	Calle 1353 4100	PCFV090-94	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV176	Calle 1608 entre 1671 y 1673	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV095	Pisani N° 1101 esq. Suecia	PCFV095	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV096	Humahuaca N° 501 y 511	PCFV096	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV098	Cno. Touring Club N° 1499 y Canalejas	PCFV098	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV100	228-Gral Perón N° 1501 y Bs. As.	PCFV100	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV102	V.Abrille N° 975 casi esquina Calle 519	PCFV154	-	6%	94%	-	-	BATERIA SAN JORGE	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV154	La Paloma y calle 560	PCFV154	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV103	Cicilia N° 2020	PCFV103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV105	Calle 527 e/ 554 y 554A	PCFV105	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV106	Calle 554 N° 1103 e/ Diag. Jarilla	PCFV106	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV108	Calle 1348 N° 1003 e/ 1317 Ay 1319 A - (B° San Francisco Este)	PCFV108	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV109	Calle 1435 N° 1719 esq. 1434 - (B° San Francisco Oeste)	PCFV109	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV110	Las Lengas N° 2303 e/ El cardenal y El Zorzal - (B° Santa Inés)	FV01	-	7%	93%	-	-	BATERIA GOBERNADOR COSTA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV111	Los Alamos N° 2502 e/ Av. Blas Parera y El Homero - (B° Santa Inés)	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV150	El Ñandú e/ Las Casuarinas y Los Alamos	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV151	Los Lapachos y Tinkunaku	FV01	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV161	Los Laureles y El Cardenal	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV162	La Paloma y Los Sauces	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV163	El Mirlo entre Los Olivos y Los Lapachos	FV01	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV113	Bonn N° 1203 y Austria	PCFV113	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV114	Calle 531 N° 2200	PCFV114	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV115	Progreso 2190 e/ Intendente Jose Luis Cariboni y virgen de valle	PCFV115	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV117	Lourdes N° 402 y Ruta Prov. N° 53	PCFV117	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV119	Suecia N° 1601 esq. Lisboa	PCFV119	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV122	Copenhage N° 502 esq. Alemania	PCFV122	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV123	Calle 172 - Río Negro N° 1790 esq. Alvarado	PCFV123	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV125	Bourel y Chacabuco	PCFV125	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV126	Riobamba y Vías	PCFV126	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV127	Calle 1151 Ay Calle 1130	PCFV127	-	46%	54%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV128	Río Diamante N° 3080 esquina Villegas	PCFV128	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV129	Río Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	PCFV129	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV133	Calle 1151 y Calle 1118	PCFV133	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV137	San Geronimo 605	PCFV137	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV138	Campana y Esmeralda	PCFV138	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV139	Guamini 2711	PCFV139	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV140	San Martin y Monteagudo	PCFV140	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV141	Alfonsina Storni 74	PCFV153	-	2%	98%	-	-	BATERIA BARRIO ALTAMIRA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV153	Florida y Miguel Cané	PCFV153	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV145	Av. Cacheuta entre Calle 1363 y Calle 1371	PCFV145	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV164	calle 1155 y 1138	PCFV164	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV168	Calle 1149 y Calle 1136	PCFV168	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV169	Calle Jacinto Benavente y E, D Amicis	PCFV059	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV175	Santa Lucia y Aconquija	PCFV118	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV178	Av. Bosques y calle 819	PCFV178	-	50%	50%	-	-	-	X	PUELCHE						
FV183	Remedios de Escalada esquina Carmen de Areco	PCFV183	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV184	Turquia, entre, Bruselas y Milán	PCFV184	-	6%	94%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
FV191	Rumania entre Paris y Paysandú		-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE						
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	4%	-	96%	-	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU002	Colombia 1007 e/Av. De las Americas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU005	Bogado 800 e/Islas Malvinas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU007	Republica Argentina 578 e/Venezuela.	GU-TAN-PED	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU008	Brasil 103 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU020	Remedios de Escalada e/Tomas Guido y Godoy Cruz	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU031	Brasil y Mesopotamia	GU-TAN-PED	-	17%	-	83%	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU032	Avenida 38 entre calle 5 y 6	GU-TAN-PED	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
GU010	Violeta Antier 5095 e/Santos Discepolo.	PCGU010	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU011	Alfonso Amat 4611 e/Jose Negiba.	PCGU011		100%					X	PUELCHE	-					
GU012	Calle 117 1000 / Av. C. Mereles 1050 e/calles 118 y 120.	GU-TAN-YA	3%	1%		96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU013	Calle 118 N° 1633 e/calles 121 y 123.	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU014	Cjal. Capuano 490 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		2%		98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU015	Calle 118 2041 e/calles 127 y 129.	GU-TAN-YA		2%		98%	-	TANQUE ESTE - LA YAYA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU016	Calle 118 2471 e/calles 133 y 135.	GU-TAN-YA	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU017	Av. 139 N° 510 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		4%		96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU023	Calle 103 y Calle 124	GU-TAN-YA				100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU024	Calle 116 y Av. 99	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU018	Av. 21 N° 1099 e/calle 36.	GU01	-	3%	97%	-	-	BATERIA LAS LOMAS	-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU019	Cjal. Placido Bajo N° 901 e/ calle39.	GU01	-	-	100%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU006	Av. Nestor Kirchner 630 e/Avellaneda y Güemes.	GU02	1%	25%	74%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU021	Roque Saenz Peña y Santa Elena	GU02	-	1%	99%			BATERIA B° SANTA MAGDALENA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU022	Dorrego y Luis A. Testa	GU02	2%	12%	86%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU025	Calle 6 y Tte. Juan Domingo Baldini	PCGU025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
GU026	Kingston y Honduras		10%	89%	1%				-	PUELCHE						
GU027	Brasilia y Guayanas	-	2%	89%	9%			BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU028	Puerto España y Brasilia	-	10%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU029	Gral Paz esCalle 7 y Lib. Gral J. de S.Martin		11%	89%					-	PUELCHE						
GU030	La Rioja e/ Av. Hipólito Yrigoyen y Sarmiento	-	11%	89%				BATERIA NUMANCIA	-	PUELCHE						
JCP002	Wilde 4573 e/Corbeta Uruguay y Fragata Sarmiento	JCP-TAN-PR	-		-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
JCP003	Av. Deniue e/ Av. Pres. Hipólito Yrigoyen	JCP-TAN-PR				100%	-	TANQUE PRIMAVERA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
JCP005	Las 3 Marías 5700 e/ Av. Jose Alube y Jose C. Paz	JCP-TAN-PR	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
JCP006	Calle Pampa de Junin a 50 m de Yrigoyen	JCP-TAN-PR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0046	Ferro Nuevo y Guanabara	LM003	100%						X	PUELCHE	-					
LM0047	Colect.R3 y Huillanimi e B° Playa Lelior.	LM003	100%						X	PUELCHE	-					
LM0049	Escribano y Colden B°El Pino.	LM027	100%						X	PUELCHE	-					
LM0053	Haiti y Galileo - Haiti y Torres.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0054	Luciano Torres N° 600 y Sermón Perez B° San Enrique.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0056	Guanacache y Pino B° Recoleta.	LM007	72%		27%				X	PUELCHE	1		0,0%	<1	< 1	< 1
LM0060	Huemul y Rodney B°Maria Elena	LM002		100%					X	PUELCHE	-					
LM0064	Urdaneta y Rodney B° Maria Elena	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0066	M.Garrido e/ y Colegiales (EC/colegiales y M. Becerra)	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0070	M.Garrido e/ S. Favardo y Rocamora B° 17 de Octubre	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0072	J. De Atapón y Solid. Favardo B° 24 de febrero	LM011		2%	98%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0073	J. De Atapón y Solid. Favardo B° 24 de febrero	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0074	Echauri N° 3200 e/ J.B.Justo y Vidal	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0075	Lavalleja y Conde	LM026		2%	98%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0076	N de Balboa y Lujan.	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0077	Castañon y Rio Cuarto B° El Porvenir	LM009		2%	98%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0078	Zequeira garcia E/ Favardo y Rocamora	LM002			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0079	Urdaneta y Rocamora (E/ T de Rocamora y Del Tejar)	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0081	Echauri e/ Ortega Zyms Villa Scasso	LM014			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0083	Quiero N° 900 E/ Riva 21 /Cleno y Draqones.	LM024	10%	1%	89%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0085	Martinez y Lasalle.	LM024		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0087	Reseno e/Acasuso y Alagon	LM011			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0094	A. Vitez 700 y Guanabara E/ Guasayan y Morris B° Playa Lelior.	LM003	96%	2%	2%				X	PUELCHE	-					
LM0095	Manteguazo N° 6100 e/Humanao y Acode.	LM004		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0096	M.Herrero e/ Guanacache y Eder - B° el Tobin	LM003		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0098	E. Clay /e/ Meabry y Puerto.	LM024			100%				X	PUELCHE	-					
LM0099	Hugo West e/ Madreselva y milamores.	LM029	98%		2%				X	PUELCHE	-					
LM0101	Scrivit y Gallardo.	LM001			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0108	Lavalleja N° 6100 e/ Alegria y Arcon	LM010		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0109	Gamay y Perichi.	LM024			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0112	Fernandez y y progreso B° Candiati	LM008			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0118	El Reseno 3351/e1 Ortega v Zequeira.	LM046			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0121	L. Da Vinci 4000	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0123	Tinogasta y Colegiales	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0124	Mercos Pas y Colegiales	LM047	84%	16%					X	PUELCHE	-					
LM0125	Corrales, Pte N° 1100 y Espejo	LM003			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0126	Ancon al 3584 esquina Zinny	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0127	Castin 4000 esq. J.B. Justo	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0139	Caseravalle 3000 e/ Senori Perez y Rivas.	LM008		100%					X	PUELCHE	-					
LM0140	Castro e/ Cepeda y Saraboa	LM026			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0143	Scrivit y Arcos	LM025	100%						X	PUELCHE	-					
LM0146	Draqones, y Reseno.	LM008			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0158	Almacro y Apipe	LM045			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0161	Arias, Meovet y Bacon - Jones Fte N° 5900	LM016		2%	98%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0164	Saenz y Cepeda	LM008		4%	96%				X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0170	Ancon y Alegria E/ Fournier	LM016		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0172	J.C Echauri y Donuera E/ Alagon	LM009		2%	97%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0175	Baez y Bavio	LM016			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0177	Baez y Barrientos	LM034		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0179	Coronel Conde e/ Martinez Villena y Martin Coronado	LM048			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0180	Machain esq. Puerto Argentino.	LM008		3%	97%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0187	Pte Argentino y Cono. del Valle	LM026			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0189	Leones Entre Garay y Conde	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0191	Icalima esq. M. Arias	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0192	Tolosa entre Barrientos y Barataan.	LM026			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0193	Jachal esq. Juan Pio Gana.	LM048		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0195	Escauza entre Iguazu y Gallardo	LM026			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0197	Scarlatti e/ Villanueva y Moreno	LM001		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0198	Enrique Clay y M. Doello	LM051		1%	99%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LM0957	Guemes 127/16 E/ San Ignacio y San Juan	LM004			100%				X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO025	M. Piaggio y Olideri	LO05	64%	2%	33%				X	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO042	Santa Lucia e H.Yrigoyen	LO01	-	1%		99%	-	PLANTA - LO042	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO067	De la Peña y Moldes	LO04	-	-	-	100%	-	PLANTA - LO067	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO072	Timbó y Cap. Moyano	LOPC1		2%		98%	-	PLANTA - LO072	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO078	Arenales a 100m de J. Ingenieros	LOPC1	-	9%	91%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO079	Arenales a 300m de L.M.Drago	LOPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO080	Juan xxiii 2400 entre L.M.Drago y Bahia Blanca	LOPC1	-	13%	87%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO081	L.M.Drago y Melian	LOPC1	3%	77%	21%				-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO118	Martin Rodriguez y Timbó	LOPC1	1%	14%	85%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO119	Tala y Pino	LOPC1	3%	3%	94%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO121	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO125	Av. Argentina y Guido	LOPC2	-	37%	63%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO126	Av. Argentina	LOPC2		79%	21%			BATERIA LLAVALLOL	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO133	Av. Argentina y Junin	LOPC2		50%	50%				-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO138	Junin 170 entre Rodriguez y Las Heras	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO139	Arnat y Petinbi	LOPC1		11%	89%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO140	Av.Argentina 2950 y Peiribi	LOPC1	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO141	Rodriguez 3507 esq Mercedes	LOPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO142	Jose Ingenieros 1668 e/ Calferata Norte y Juan XXIII	LOPC1		20%	80%				-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO146	Calle Pintos 2007 e/ Viel y Florida	LOPC1	-	4%	96%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO147	Calle Magnolia 2099 e/ Moreno y V.Barbieri	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO148	Magallanes 2600 entre Ucrania y Duhalde	LOPC1		1%	99%				-	HPO/PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
A8019	Comisarenes MALVINAS ARGENTINAS y Pilar	LOPC2		1%	99%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
A8066	Tigre y Policastro	LOPC2		8%	92%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO083	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO084	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO085	L.M.Drago e/Cno las Flores y Fonrouge	LOPC2	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO086	Cno de las Flores a 500m de Drago	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO087	Cno de las Flores y MALVINAS_ARGENTINAS	LOPC2		3%	97%				-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO093	Cno San Vte a 500m pozo 87	LOPC2	3%	12%	85%				-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO106	J. B. Justo y Cuyo	LOPC2	65%	5%	30%	-	-	BATERIA BURZACO	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO117	Mendoza y N. Silva	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO122	J. Ingenieros	LOPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	2%	23%	75%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
LO144	Avenida Argentina y RP N° 16	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO145	Villarino y Avenida Argentina	LOPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO149	Rene Vallo y Jose Melián	LOPC2	67%	-	33%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO095	Larrea y Gardel	AB14	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO113	Letoir 432	LO38	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO120	Pino y el Cairo	LOPC1	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO127	Jose Marmol e/Allemandri y Anchorena	LO47	-	1%	-	99%	-	PLANTA - LO127	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO128	Martí y Av. Cabred	LO13	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO134	Larrea y Colihue	AB14	-	6%	-	94%	-	PLANTA - LO134	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO135	Matienzo y Rodriguez	AB22	1%	2%	-	96%	-	PLANTA - LO135	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
LO152	Necochea esquina Lujan	-	-	100%	-	-	-	PLANTA - LO152	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA002	Ambrosetti 1900 e/Beltran y Martin Fierro.	MAPC1	-	21%	79%	-	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA003	ALMIRANTE_BROWN 2500 e/Viena y Rep. Argentina.	MAPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA004	Asamblea 1800 e/J.t de Septiembre.	MAPC1	1%	2%	98%	-	-	BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA006	Viena e/Canning.	MAPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA018	Olíden entre 11 de Septiembre y Juan Cruz Varela	MAPC1	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA009	Cangallo 1200 e/San Lorenzo y Uspallata.	PCMA009	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA010	Uspallata 1000 e/Soller y O´Brien.	PCMA010	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA011	Stoppler 900 e/Bat. de Maipu y Paso de los Andes.	PCMA011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA012	San Lorenzo y Seguí	PCMA012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA016	Canadá 748 y Seguí	MAPC2	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MA017	Palacios y Seguí	MAPC2	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME001	25 DE MAYO E/PUEYRREDON	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME003	25 MAYO E/ 9 DE JULIO	ME-TAN-CES	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME004	BROWN E/ CENTENARIO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME006	BROWN E/ CARLOS PELEGRINI	ME-TAN-CES	-	6%	-	94%	-	TANQUE MERLO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME007	BROWN E/ M.BRAVO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME015	9 DE JULIO E/ SAN LORENZO	ME-TAN-CES	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME016	SAN LORENZO E/CANNING	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME060	SAENZ PEÑA Y AV. CALLE REAL	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME005	25 MAYO E/ J.M.Castro ex Pearson	ME02	75%	-	25%	-	-	BATERIA PARQUE SAN MARTIN NORTE	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME014	BROWN E/PIZURNO	ME02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME008	LIBERTAD E/ ARGENTINA Y PUCHEU	PCME008	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
ME009	COVIPOL. EDIF 38. ROSSI Y ECHEVERRY	PCME009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME010	COVIPOL. EDIF 13. ROMAY Y ZUNDA	PCME010	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
ME017	DEFENSA E/BARAVINO Y HORTIGUERA	PCME017	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME018	OYUELA E/FRIAS Y RUTA 200	PCME018	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME019	PEDRIEL E/ TALA	PCME019	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME020	INDEPENDENCIA E/ SULLIVAN	PCME020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME021	ESNAOLA Y BOYACÁ	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME022	ESNAOLA Y BACH	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME023	AV.ARGENTINA Y CHOPIN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-	TANQUE LOMA GRANDE	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME025	AV.ARGENTINA E/GAVILAN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME081	Strauss y Juan Sebastian Bach	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME087	Av. Argentina y Lezama	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME090	Angel Rodriguez y Curapaligue	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME026	TUNUYÁN E/AREVALO	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME027	VIDT E/ FEBAL	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME028	VIDT E/DEMOCRACIA	ME-TAN-REC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME029	VIDT E/CHAGAS	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-	TANQUE RECONQUISTA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME030	VIDT E/FAMATINA Y DESSY	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME063	FILIBERTO Y TARIJA	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME079	Antofagasta y Fraga	ME-TAN-REC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME082	Cacheuta y José Martí	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME031	GARDEL E/PAYRO	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME033	VIDT E/DISCEPOLO	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME034	VIDT E/ACCARCOS	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME035	VIDT E/MEDMA	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-	TANQUE ARCO IRIS	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME068	JOSE MARTI Y DALTON	ME-TAN-ARC	-	6%	-	94%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME088	Lorenzini entre Delin Funes y Fraga	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME091	P.Echague y P. Podestá	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME092	Carcavallo entre Cassaux y Orfilia Rico	ME-TAN-ARC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME102	Fraga y Davila	ME-TAN-ARC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	PCME036	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME037	AMADO NERVO E/ANCON Y AMPERE	ME-CIS-PSM	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME038	LOS ALELIES Y TILCARA	ME-CIS-PSM	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME039	LOS ALELIES E/TILCARA Y AGUARIBAY	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME040	LOS JACINTOS E/ETIOPIA	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME041	ACHALA E/LAS RETAMAS	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME045	ALVAREZ JONTE E/ LOS ALELIES	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME046	LAS RETAMAS E/JURAMENTO	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME047	ALVAREZ JONTE E/ LOS GERANIOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME048	ALVAREZ JONTE E/LAS DALIAS	PCME048	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME049	GABRIELA MISTRAL E/ALTE BROWN	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME051	GENDARMERIA GURRUCHAGA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME053	ZARRAGA E/ GAGUERRE Y PEDERNERA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME054	ZARRAGA E/ GAVILAN	ME-CIS-PSM	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME058	12DE FEBRERO	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME076	El Hornero 3710	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	HIPO/PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME086	Garmendia y Almte. Brown	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME042	GENDARMERIA E/ FLORES A.	PCME042	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME050	GABRIELA MISTRAL E/BENOIT	PCME050	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME055	PUEYRREDON Y O'BRIEN	PCME055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME056	SAN ANTONIO Y PARAGUAY	PCME056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
ME057	CHACO N° 310 E/DIRECTORIO Y NOGUERA	PCME057	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME059	GABRIELA MISTRAL Y ALPATACAL	PCME059	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME061	SAENZ PEÑA Y AV. RIVADAVIA	PCME061	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	PCME065	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA Y SOLANET	PCME066	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME067	TRAFUL Y BLANCO ESCALADA	PCME067	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME069	ATAHUALPA Y PEDRO CHUTRO	PCME069	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME070	TUCUMAN Y LA RIOJA	PCME070	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME073	SARMIENTO 2398 Y LA HABANA	PCME012-73	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	PCME074	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME075	MEDRANO 811 Y SANTA FE	PCME075	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME078	Garay 1753	PCME078	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME080	Federico Lacroze y Matorras	PCME080	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	ME01	-	-	100%	-	-	POI MERLO	-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	ME01	2%	-	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME089	Curapaligüe y 25 de Mayo	PCME089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME093	Morse y Av. del Bicentenario	PCME093	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME094	Brasil y Guardia Vieja	PCME094	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME095	Sullivan y Sargento Cabral	PCME095	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME096	Gral Ocampo y T Saley		-	100%				BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE						
ME097	Orán entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME098	Tasso y Oran	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME099	De Roma y Necochea		-	100%					-	PUELCHE						
ME100	Republiquetas entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%					-	PUELCHE						
ME101	Juan A Maza y Dr Ricardo Raúl Alfonsin	PCME101	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME103	Los Arneros y San Martin	PCME103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
ME113	EVA PERON E/PELLEGRINI	PCME113	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI001	Belgrano 400 e/Vicente Lopez y C. Malnatti.	MIPC2	-	-	-	100%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI020	Julio A. Roca 216 e/Dorrego y Roseti.	MIPC2	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI035	Pavon 1100 e/R. Peña y Sgto. Cabral.	MIPC2	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI002	Julio A. Roca 800 e/Serrano y Muñoz.	PCMI002	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI003	Italia 1300 e/Francia y L. N. Alem.	PCMI003	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI006	Pardo 400 e/San Luis y C. Malnatti.	PCMI006	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI007	Julio A. Roca 1900 e/Gelly Obes y Zuviria.	PCMI007	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI008	Conesa 2000 e/ Gelly Obes y J. M. Zapiola	PCMI008	1%	-	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI009	Serrano 800 e/Conesa y SAN_JOSE	PCMI009	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI010	Cjal. E. Tribulato 700 e/Serrano y Urquiza.	PCMI010	2%	27%	72%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI011	Int. J. Irigoin 700 e/Serrano y Stgo. Del Estero.	PCMI011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI013	J. B. Alberdi 200 e/Dorrego y Accuenaga.	PCMI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI014	Serrano 400 e/J. B. Alberdi y Haedo.	MIPC1	-	100%	-	-	-	CAG SAN MIGUEL CENTRO	-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI046	Paunero 100 e/Pardo.	MIPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MI015	Cnel. Fraga 2300 e/Int. J. Irigoin y Marcos Sastre.	PCMI015	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI016	Cnel. M. Fraga e/Salerno y Tomas Edison.	PCMI016	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI017	Vicente Lopez e/Marcos Sastre y Malvinas.	PCMI017	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI018	Pardo e/Libertad y J. M. Zapiola	PCMI008	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI019	J. B. Alberdi e/J. Zapiola y Gelly Obes.	PCMI008	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI021	Cjal. E. Tribulato 2300 e/ G. Campos y Libertad.	PCMI021	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI022	Tomas Guido 4400 e/J. R. Lopez y El Zonda.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI023	Av. Alte. J. Lopez 4500 e/J. D. Solis y Eva Peron.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI025	T. Guido 5900 e/Uriarte.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI026	T. Guido 5301 e/La Pinta.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI032	Marchena 3256	MI_CIS_SAR	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI024	E. Ferreyra 4200 e/T. Guido.	MI_CIS_GUA	1%	2%	98%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI028	Santa Maria 5100 e/Vicente Fatome.	MI_CIS_GUA	1%	3%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI037	Cisterna La Guarida	MI_CIS_GUA	4%	4%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI065	Calle Defensa e Italia	MI_CIS_GUA	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI066	Dr. Enrique Finochietto e/Sta Maria y Fray Antonio Marchena	MI_CIS_GUA	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI033	Int. J. Irigoin 400 Gelly Obes y Granaderos.	PCMI033	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI036	Cnel. M. Fraga 3400 e/Marconi.	PCMI036	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI038	Roca 1400 e/Alen.	PCMI038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI039	Belgrano 2000 Gelly Obes y R. S. Peña.	PCMI039	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI040	Italia 2300 e/Gaspar Campos y J. M. Zapiola.	PCMI040	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI041	Belgrano 900 e/D´elia y Muñoz	PCMI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI042	Pardo 10 e/Ruta 10.	PCMI042	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI043	Conesa 416 e/San Luis.	PCMI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI045	Rodriguez Peña 2600 e/Williams.	PCMI040	-	8%	92%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI004	Conesa 1300 e/Martin Irigoyen.	MI_CIS_CEN	-	20%	80%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI034	Martin Irigoyen y Juan B Alberdi	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI047	Martin Irigoyen e/Obilitio y Francia.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI048	Av. Francia 500 e/Sta. Fe y Parana.	MI_CIS_CEN	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI049	Av. Francia 600 e/Moreno.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI051	Av. Francia 1100 e/Tucuman y Azpiardo.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI060	Conesa entre Martin Irigoyen y Sarmiento	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI067	Conesa e Irigoyen	MI_CIS_CEN	1%	14%	84%	-	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI052	Rodrigo de Triana 1500 e/R. Balbin.	PCMI052	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI053	Defensa e/R. Balbin.	PCMI053	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI054	Cruz del Sur e/Tomas Espora.	PCMI062	-	1%	99%	-	-	BATERIA MI054-MI062	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI062	Calle Güemes e Isabel La Catolica	PCMI062	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI055	J. J. Paso 5500 e/La Niña y Isabel la Catolica.	PCMI055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI056	Juan J. Paso e/Beron de Estrada y Salguero.	PCMI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI057	Maestro Ferreyra y Charlone	PCMI057	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI058	José M. Zapiola y Güemes	PCMI058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI059	Concejal Tribulato y Monseñor Blois	PCMI059	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI061	Luis Salguero y Tomás Alba Edison	PCMI061	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI063	Egipto y Libertad	MI01	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MI064	San Nicolás y Gral Las Heras	MI01	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN001	Lavalleja al 7100 E/ Conde y Achupallas.	LMO19	-	1%	99%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN002	Armonia a 150 m de La Fuente.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN003	Armonia y Billinghurst.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN004	Billinghurst 2800 y Armonia.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN005	Billinghurst y Dobles/ Cespedes.	LMO19	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN006	Int. Russo y Ramón Lista	LMO46	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MN007	Billinghurst e Int Russo	MN24	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MN008	Billinghurst y Las Flores	MN24	-	4%	96%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN009	Billinghurst 5300 y Río Cuarto	MN24	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN010	Las Flores y Ramón Lista	MN24	-	-	100%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN011	Monte Egmont y Casaretes	LMO19	-	3%	97%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN032	Acassuso 1700 y Santa Rosa	MN23	-	-	100%					PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN033	Acassuso e Iturraspe	MN23	-	1%	99%					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MN034	Noruan y Zavala	MN18	-	-	100%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN036	Hucal y Fere	MN18	-	4%	96%			BATERIA RAFAEL CASTILLO		PUELCHE	6	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN037	Lavalle y Tres Cruces	MN23	-	4%	96%					PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN039	E. Del campo y Aguirre	MN23	-	100%	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MN044	Huarpe y Lacar	MN23	-	-	100%					PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN043	Castañon N° 2922 y E. Echeverria	MN23	-	100%	-			POI MN043		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MN099	Beethoven y La Gorina B°El Tonino	MN24	-	100%	-			-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MN106	Beethoven entre Aquirre y Mendez de Andes	MN24	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN110	V. de la Plaza E/ Dávila y Beadley	MN25	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN122	Santa Rosa y Aguirre	MN23	-	-	100%			-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN147	Zamudio e/ Bravard y Aguirre	MN25	-	9%	91%			POI MN147		PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN167	Beauchard y Heredia	MN25	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN173	Hucal 1700 e/ Vogel y Polledo	MN18	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN183	Lavalle y Sudamércia	MN23	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN186	M. T. de Alvear 1100 esq. Del colegio	MN23	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN211	Esquino y Eulates	MN18	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MN212	Victorino de la plaza y Luis Maria Drago. RAFAEL CASTILLO	MN18	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO087	Cirilo y Vidalia	MOPC1	100%	-	-					PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO088	De los Recuerdos y De los Pavadores	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO089	Gerena y La Chacarera	MOPC1	100%	-	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO093	De los Reseros y E. Frers.	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO094	La Esquerita y de los Reseros	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO095	De La Doma Pje N° 1282 y El Ombu	MOPC1	100%	-	-			BATERIA PARQUE LELOIR - ITUZAINGO		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO097	De La Vidalita y J. Hernández	MOPC1	81%	1%	18%					PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO146	N. Repetto y Del Palenque	MOPC1	4%	-	96%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO147	N. Repetto y De la Tradición	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO148	Del Mesquite y De las Cachilas	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO149	N. Repetto a 180 mtsmts. de F. Ielosi	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO153	De la Conviccion y Colectora Acceso Oeste	MOPC1	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO100	Videla y Peredo	MOPC1	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO105	Fray J. S. M. de Oro y Figueroa Alcorta	MO03	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO106	Figueroa Alcorta y La Tribuna	MO21	95%	5%	-			BATERIA VII BRIGADA AEREA - MORON		PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO107	E. Lopez y Cnel. Arenas	MO30	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO108	Figueroa Alcorta y Montevideo	MO21	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO130	Lacarra y Cucha Cucha	MO21	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO137	Madrid y Jarry	MO32	95%	5%	-			BATERIA BARRIO SAN JUAN		PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO138	Paganini e/Pedro Diaz y Juan Gorriti	MO31	-	-	100%			BATERIA HURLINGHAM - INTA		PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO139	Amberes y Pedernera/v	MO31	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO140	Cuzco entre M. de Aviles y Toivo	MO31	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO141	Cuzco y Azope	MO31	-	100%	-			-		PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO150	La Tribu a 1dm de Juramento	HU01	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM 2		PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO151	Arotahal a 21.93m de Veraguа	HU01	-	17%	83%					PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO152	Chamberá y Los Cerdales	HU01	-	1%	99%					PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	<1	< 1
MO142	Pavas esq. Lavalle.	JT01	99%	1%	-			-	X	PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO144	Sta. Teresa y La Garcela	MO03	95%	5%	-			-	X	PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO154	Coronel Arevas esq. Andrade	MO21	95%	5%	-			BATERIA CASTELAR		PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MO155	Olivari esq. Palermo	MO21	95%	5%	-			-		PUELCHE	-	-	-	-	<1	< 1
MR001	J.V. González 2625 e/Balzak y Rodriguez Peña.	PCMR001	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR002	J.V. González 2435 e/Güemes y V. Alsina.	PCMR002	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR003	Güemes 901 e/Bolivia y Paraguay.	PCMR003	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR004	Larralde 1341 e/J. Gonzalez y R. Gutierrez.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	TANQUE MORENO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR005	Int. Bossi 1080 e/Ecuador y Paraguay.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR006	Int. Bossi e/Venezuela y Ecuador.	MR-TAN-MOR	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR007	Guatemala 2400 e/Güemes y Alsina.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR008	Guatemala 2700 e/marmol y Colectora Gaona	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR019	Int. Bossi e/Guatemala.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR011	P. Ansaldo e/Blas Parera y M. Melo.	PCMR011	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR012	M.Obarrio 2048 e/Iliberdi y Rafael.	MRPC1	-	3%	-	97%	-	PLANTA CAG MORENO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR046	Del Cañon/M. Obarrio e/San Carlos.	MRPC1	-	45%	-	55%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR013	Av. Perón e/Del Cañon.	PCMR013	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR014	Alcorta 2500 e/Bouchard y Uruguay.	PCMR014	1%	2%	97%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR015	Ameghino e/Centenario y Argentina.	PCMR015	1%	2%	97%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR016	Callao e/Av. Alcorta y Mitre.	PCMR016	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR017	Alcorta e/Haedo y Ramos Mejia	PCMR017	-	7%	93%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR018	Misiones e/ Sta. Fe y D´errico.	PCMR018	-	3%	97%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR020	Alte. Brown e/25 de Mayo y Andrade.	MR01	-	2%	98%	-	-	BATERIA MR020-MR02	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR021	Alte. Brown e/Pio XII.	MR01	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR022	Sanchez 4800 e/Ruta 25 y San Justo.	PCMR022-23	-	4%	96%			-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR023	Florencio Sanchez e/Gandhi y Solocles.	PCMR022-23	-	11%	89%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR024	Costa Rica e/F. Sanchez y Solocles.	MR-TAN-PER	-	30%	-	70%	-	TANQUE LA PERLITA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR025	A. Storni 5600 e/Danubio.	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR026	A. Storni 5900 e/Madariaga.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR027	Ecuador 5700 e/La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR029	La Plata e/Ruta23 y Camil.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR035	Gutierrez 5600 e/La Plata y Cost Rica.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR070	Honduras y Marquez	MR-TAN-PER	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR072	Honduras y Gral. Madariaga	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR028	El Salvador e/Chile y Mexico.	PCMR028	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR030	Pedrell e/Ascasubi y Carriega.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	TANQUE TRUJUI	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR031	R Rojas e/Libano y Gral. Pintos.	MR-TAN-TRU	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR032	F. Sanchez e/Libano y Pitagoras.	MR-TAN-TRU	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR051	Tablada e/Oribe y Puccini.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR075	Diego de Villaroel y Celerino Namuncurá	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR036	Ruta 25 e/Cataliña.	PCMR036	83%	2%	15%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR037	Giralde e/Pastor Obligado y Lavarden.	PCMR037	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR040	Piovato 4132 e/Bochardo y Balcarce.	PCMR040	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR041	Dorrego e/Dorrego y Darat.	PCMR041	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR042	1 de Mayo e/Alcorta.	PCMR042	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR043	San Pablo e/San Cayetano.	PCMR043	5%	2%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR044	Piovano e/El Salvador y Venezuela.	PCMR044	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR048	Echeverria e/Darwin y Peron.	PCMR048	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR049	Sarratea e/Victoria.	PCMR049	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR050	Marcos Paz 1116 e/Iarrea y J.J. Urquiza.	PCMR050	10%	2%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR052	Arribeños e/Concordia.	PCMR052	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR009	V. Alsina e/Libertador.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MORENO	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR053	Córdoba E/Palo y Siheden.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR054	Alvear e/Rafael Arco.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR055	Córdoba e/V. Lopez y Linch.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR056	Corvalán 2733 e/B de Yrigoyen y Graham Beil.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR057	Uruguay e/E. Rios y colectora.	MR-CIS-MOR	2%	4%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR058	Misiones 1970 e/ Moron.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR059	Facundo Quiroga e/Moron y Yapeyu.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MR060	Facundo Quiroga e/ La Tropilla y Quilmes.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR061	Corvalán e/La Tropilla.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR062	SAN_JUAN_BAUTISTA 2026 e/ Int. Corvalan Dean Funes	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR063	Lincoln e/Soldado Derrico y E. Rios.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MR064	Intendente Corvalan 2302 e/ Alvear y Alejandro Graham Bell	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR095	Uruguay y Chictana	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR097	Entre Rios esquina Abraham Lincoln	MR-CIS-MOR	2%	3%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR100	Moron e/ Facundo Quiroga y Arribeños	MR-CIS-MOR	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR101	Lincoln N°1644	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR065	J.V. Gonzalez e/ Ruta 25 y Brasil.	PCMR065	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR067	Lobos e/La Tablada y Manzana 36.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR068	Lafinur e/Lobos y 3 de Marzo.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR069	Tablada e/Democracia y Colectora	PCMR069	12%	4%	84%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR071	Shakespeare y Manuel Galvez	PCMR071	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR073	Colombia y Ricardo Gutiérrez	MR-TAN-PER	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR074	Colectora Acceso Oeste y Ecuador	PCMR074	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR076	Hipólito Yrigoyen y San Luis	PCMR076	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR077	Teniente Ibañez 3224	PCMR077	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	5	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR078	Alberti entre Marcos Paz y Vera	PCMR078	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR079	Juana de Azurduy y San Cayetano	PCMR079	43%	2%	55%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR086	Ecuador y Manquez de Aguado	MR-TAN-PER	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR088	Lobos entre Misiones y José Hernández	PCMR088	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR089	Pavón y Gervasio de Posadas (Plaza del Estudiante)	PCMR089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR093	Mendoza y Jose Ingenieros	PCMR093	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR098	Av. Luis Pasteur entre Facundo Quiroga y Arribeños	PCMR098	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MR099	Marcos Paz entre J.J Urquiza y Larrea	PCMR050	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MR104	Marcos Paz entre Larrea y Justo Jose de Urquiza	PCMR050	-	36%	64%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MS025	Covarra y El Pindo	MS_CIS_MUN	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS026	Calle 200 y Rotonda	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-	BATERIA CIUDAD EVITA	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS027	Av. Central y Calle 500	MS_CIS_MUN	-	0%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS034	El Tapeti y El Sauce	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS042	Av. Central y calle 900	MS_CIS_MUN	97%	3%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MS030	Las calas y Los balcanes	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS091	Las Orquideas y Las Gardenias	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS092	Cordoba y Las Dalias - R. 22 de Enero	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
MS105	Guayraa y Torquins	MS34	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
MS114	Magnasco y Av. Cristiania	MS32	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
PI001	J. B. Justo y Sanguinetti al 500.	PCPI001	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI002	J. B. Justo 615 y Posadas.	PCPI002	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI003	Av. Tratado de Pilar 242 y Sanguinetti.	PCPI003	25%	35%	39%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI004	Lagrave 84 (Yrigoyen y Pampa).	PCPI004	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI005	Planta Champagnat.	PCPI005	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI006	Rincón entre San Martín y Esteban Luca	PCPI006	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI007	José María Paz 873.	PCPI007	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI008	ITUZAINGO 331.	PCPI008	1%	3%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI009	Maipú y Vías F.F.C.C. San Martín.	PCPI009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI010	Gral. O'Higgins y Bergantín Congreso.	PCPI010	-	13%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI011	Juan Bautista Alberdi 1106 y 11 Septiembre	PCPI011	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambrosetti.	PCPI012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Mapuche)	PCPI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI014	Las Araucarias y M. Acosta.	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI059	Ubicado dentro de predio Campo Suite II. frente a Parque Austral.	PIPC2	23%	77%	-	-	-	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 1	< 1
PI067	Mariano Acosta y Los Alamos	PIPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI089	Los Alamos y Av. Eva Perón	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI015	Dr. Ignacio Pirovano 728 esq. Costa Rica	PCPI015	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI016	Chacabuco 2130 e/Paraguay y Bolivia	PCPI016	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI017	Tortugas Country Club	PCPI017	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI018	Tortugas Country Club	PCPI018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI020	Tortugas Country Club	PCPI020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI021	Tortugas Country Club	PCPI021	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI022	Las Campanillas esq. Av. Highland Park	PCPI022	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI025	Country El Carmel	PCPI025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI026	Las Amapolas. Villahaus - Country Ayres del Pilar	PCPI026	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI035	Country Ayres del Pilar	PCPI035	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI037	Country La Lomada	PCPI037	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI040	Las Margaritas 1100 e/ Los Claveles y Las Rosas	PCPI040	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI041	Las Glicinas 1080 (proximo a R8)	PCPI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI042	Mosladini 374. esquina Bergantin Independencia.	PCPI042	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI043	Segui esq. Colectora Este Ramal Pilar	PCPI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI044	Posadas 1635 e/J.V. Gonzalez y H. Ascasubi	PCPI044	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI045	Country B° Campo grande	PCPI045	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI048	Cjal. Dr. Martiegui 219. Plaza.	PCPI048	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI049	Bergantín República y Bergantín Independencia.	PCPI049	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI050	Av. Constitucion(R26) e/Nicaragua y San Salvador.	PCPI050	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI051	Guatemala y R26.	PCPI051	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI052	Guatemala 4300 esq. Alemania (MANUEL_ALBERTI)	PCPI052	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ramón Gimenez.	PCPI053	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI054	Leguizamon e Iluzaingo	PCPI054	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI056	Ameghino y Colectora Oeste	PCPI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI058	Nicaragua 1250 e/Haiti y Santo Domingo	PCPI058	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI061	RN 25 y Chubut	PCPI061	4%	24%	71%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI062	Panamá y Alejandro Korn	PCPI062	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI063	Patagones y Tagle	PCPI063	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI064	Andes y Avda. Patricias Argentinas	PCPI064	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI065	Goleta Constitución y Fragata Sarmiento	PCPI065	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI066	Calle s/n e/ Haiti y Santo Domingo	PCPI066	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI068	Alazan e/Overo y Picasso- Highland Park	PCPI068	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI070	Paraguay y Tierra del Fuego	PCPI070	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI075	Guatemala y Levene	PCPI075	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI076	Gallo y Vasco Da Gama	PCPI076	-	-	100%	-	-	BATERIA PERUZZOTTI	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI078	Vasco Da Gama entre Hermita y Camino Comercial	PCPI076	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI080	Monseñor D´Andrea y La Carreta	PCPI080	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI084	Chubut y San Ignacio	PCPI084	-	20%	80%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI100	Calle Sarmiento e/ Bahía Grande y Bahía Redonda	PIPC1	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI101	Ruta 234 y Bahía Darbel	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI102	Calle Henry Martin y Bahía Darbel	PIPC1	-	1%	99%	-	-	BATERIA DERQUI	-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI103	Cerrito 3287 e Isla Gran Malvinas	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
PI105	Libertad e Isla Candelaria	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
CN037	345 y 283	CN37	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	ESCHERICHIA COLI [UFC/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
OU076	Cno. G. Belgrano y Av. Monteverde	OU38	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
OU139	Calle 869 Esq. D. Alvarez	OU07	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<1	0,0%	<1	< 1	< 1
OU141	Calle 867 Esq. Donato Alvarez	OU07	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	<1	0,0%	<1	< 1	< 1

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
AB057	P. Echagüe y Serrano	AB14	-	1%	-	99%	-	PLANTA - AB057	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB061	Laprida Narciso 1900	AB23	5%	6%	89%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB063	Laprida Narciso 3001	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
AB064	Juan B. Justo 2050	AB23	17%	6%	77%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB065	Juan B. Justo 2700	AB23	8%	-	92%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB066	Juan B Justo 2101	AB23	19%	45%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB067	Juan B. Justo 2802	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
AB068	Av. Ceballos (400) a 700 mts de Avda. República Argentina	AB23	21%	27%	52%	-	-		-	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB070	Francisco N. Laprida y Muesca	AB23	8%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB071	Narciso Laprida 2301	AB23	17%	69%	14%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB073	República Argentina 6670	AB23	6%	8%	86%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB074	Rep. Argentina y Juan B. Justo	AB23	14%	8%	78%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	AB23	9%	34%	56%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB076	Republica Argentina 7570 e/ Juan Jose Castro y Alice	AB23	20%	29%	51%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
AB084	Espoile s/n	AB23	3%	48%	49%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB085	Leyes y Romero	AB23	36%	16%	48%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB086	Romero y Calderón	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
AB087	Calderon 1251	AB23	24%	25%	51%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB088	Calderón 1851	AB23	53%	36%	11%	-	-	BATERIA GLEW	-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB089	Calderón 3000	AB23	1%	98%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
AB090	Calderon 3400 1848	AB23	10%	14%	76%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB091	Calderon 3650 1848	AB23	15%	49%	36%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB092	Brigadier Calderón e/ Lezica y Young	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
AB093	Brigadier Calderón e/ Young y Av. Eduardo Holmberg	AB23	13%	19%	68%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB094	Romero 3800	AB23	1%	9%	90%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB095	Lemos 3800	AB23	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB098	Rocha y J.A. Casacuberta	AB23	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB099	Fernando Lahille y M. Acosta	AB23	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB100	Gral. Cardenas y Almte. Irizar (Plaza)	AB23	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	Presencia	0,0%	Presencia	Presencia	Ausencia
AB101	Agustin Barrios y Virrey Cevallos	AB23	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB102	Martiniano Leguizamón entre 25 de Mayo y F. Alvarez	AB23	2%	1%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB105	Av. Juan B. Justo e/ AV. República Argentina y Av. Espora	AB23	4%	1%	95%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB106	Pablo Podesta y Orillia Rico	AB23	10%	85%	5%					PUELCHE					Presencia	Ausencia
AB107	Fernando Ochoa y Juan Sarciore	AB23	19%	75%	6%					PUELCHE					Presencia	Ausencia
AB108	Rufino Cordoba y Cesar Ratti	AB23	23%	75%	2%					PUELCHE					Presencia	Ausencia
AB109	Luis Viale y Enrique de Rosas	AB23	12%	75%	13%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
AB110	Boulogne Sur Mer y Antonio Luis Beruti	AB23	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB601	King y Bouchard	AB04	55%	8%	37%			-	X	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
AB728	B° Segba (D. Rocha y Paraguay)	PCAB728	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Ausencia	Ausencia
AB103	MALVINAS_ARGENTINAS y Dr. Chiesa	PCAB103	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
AB096	Manuela Pedraza 1209	ABPC1	-	1%	-	99%	-	PLANTA RAYO DE SOL	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
AB097	Santiago del Estero 3075	ABPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EE001	Las Heras y Guillon	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE002	Rivadavia y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE003	Origone y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE004	Las Heras y Chacabuco	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE005	Terrarosa y Colon	EEPC1	-	14%	86%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE015	Dorrego y Dreyer	EEPC1	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE027	Maipú y Colón	EEPC1	-	30%	70%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE028	Lavalle y Maipú	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EE029	Lavalle	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE030	Lavalle	EEPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE031	Lavalle	EEPC1	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EE032	Lavalle	EEPC1	-	10%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE033	Lavalle	EEPC1	-	66%	34%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE034	Maipú	EEPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE035	Ventura Avila	EEPC1	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE036	Ventura Avila y Calle 13	EEPC1	-	9%	91%	-	-	BATERIA LA LATA	-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE040	Ventura Avila	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EE041	Ventura Avila	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EE042	Ventura Avila	EEPC1	-	20%	80%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE043	Juana de Arco	EEPC1	2%	39%	59%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE044	Juana de Arco	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE045	Juana de Arco	EEPC1	4%	5%	91%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE046	Lavalle entre Tomquist y Bragado	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE047	Martin Fierro a 700mts de S6	EE21	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE048	Martin Fierro a 700 m de Vazquez	EE21	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE057	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EEPC1	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE058	Avila Ventura 3000	EEPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE059	Avila ventura 3400	EEPC1	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE060	Los Claveles y General Las Heras	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE070	Colon y Maipú	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE064	Puan y Pablo Pizzurno	PCEE064	25%	2%	73%	-	-	-	X	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EE013	Cap. Lozano y Ascasubi	EE05	-	3%	-	97%	-	PLANTA - EE013	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE065	Pedro Arocena y E. de Laperriere	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE066	Amado Nervo y San Pedrito	-	50%	20%	30%	-	-	BATERIA SANTA ISABEL	X	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	-	-
EE073	Villegas esq. Colón	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE049	Martin Fierro y Vazquez	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE050	Vazquez a 700 m de Martin Fierro	EE21	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE051	Martin Fierro y Dolores	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE052	Martin Fierro a 1300m de E. Vazquez	EE21	-	46%	54%	-	-	BATERIA BAFICO	-	PUELCHE	2	Ausencia	141,4%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE054	Martin Fierro y Dreyer	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE055	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EE21	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	5	Ausencia	223,6%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE061	República de Costa Rica y Libertad	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE062	El Ceibo y Fraga	EE21	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EE063	Alvarez de Toledo y Miguel Angel	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE006	Almafuerte e/Andrare y Obligado	EE03	39%	1%	-	60%	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE007	R. Dario y M. Cane	EE03	1%	1%	-	98%	-	PLANTA BARRIO UNO	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE038	Av. Tte. Gral. Morillas a 1000 mts de La Horqueta	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EE039	Tte. Gral. Morillas s/n - Villa Ntra. Sra. Del Rosario	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEN001	Lago García 3901 y Los Andes	EEPC4	-	1%	99%	-	-	POI 9 DE ABRIL	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN002	Pedro Coni 3401e/Oliver y sanciniena	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN003	Palleros 1700 /S. Nicolas y Mte. Grande	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN005	Sansinena 601 e/ Huergo y 9 de julio	EEPC4	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN006	Caseros 980 e/Huergo y 9 de Julio	EEPC4	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EEN007	Sarmiento 2700 e/Tricotti y Barros	EEPC4	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	Presencia	0,0%	Presencia	Ausencia	Ausencia
EEN008	Ing. Huergo 2500 e/Petraca y Sastre	EEPC4	5%	11%	84%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN009	Pto Deseado 601 e/Huergo y 9 de abril	EEPC4	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN010	Ing. Huergo 1600 1842	EEPC4	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN012	M.Alegre 992 e/Gomez y Vernet	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN013	Tricotti 10 e/Malvinas y Barros	EEPC4	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN014	Cnel. D° Elia 190 e/Palleros y Constanzo	EEPC4	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN015	Constanzo 2090 e/P. Argentino y Rivero	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN016	Tierra del Fuego 179 e/Constanzo	EEPC4	15%	1%	84%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN018	Constanzo 1229 e/Guarany y Crespo	EEPC4	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN019	Prayones 3150 entre Palleros y Lopez	EEPC4	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN021	Rebizo 1100 e/ Fair y Crespo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN026	M.Alegre 1720 e/Alegre y Urquiza	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN059	Enrique Banch y Rebiza	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN020	Sansinena 105 e/ Doclout y Constanzo	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN022	Sansinena e Vernet y Benavidez	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN023	Benavidez 3190 e / F.Lopez y Scaglia	EEPC4	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN027	Fernadez y Dicio	EE23	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN028	Rivero y Chimondegui	EE23	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN029	Av. Fair y Primera Junta	EE34	-	22%	78%	-	-	BATERIA CORREO ARGENTINO	-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN030	Cervetti y Av. Fair	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN031	Cervetti y La Horqueta	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN032	Av Fair e Islas Trinidad	EE34	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN033	Urbano González e Independencia	EE31	-	1%	99%	-	-	BATERIA SANTA CATALINA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN034	Alberto Grande a 38m de las vias	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN035	Cascabuenta e/Valette y Gonzalez	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN036	Lima e/Valette y Francia	EE31	8%	2%	90%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN037	Cepeda y de los Constituyentes	EE31	-	46%	54%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN038	Lago Garcia y Cepeda	EE31	-	23%	77%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN039	Cepeda y Alberto Grande	EE31	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN040	Lago Garcia a 50m de Valette	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN041	9 de Abril e/Valette y Wieman	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN042	Las Talitas e/Sarmiento y M. Alegre	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN043	Avellaneda e/Trangoni y C. Monte Grande	EE31	64%	36%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EEN044	Bruzzone e/Foz y Gonzalez	EE31	1%	1%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN045	Bruzzone e/Tte. Alberto Grande	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN046	Bourquet e/ Amoghino y Gabastion	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN047	Juan M. de Rosas t Tte. Gabaston	EE31	9%	13%	78%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN048	Robertson e/ J. Newbery y T. Matienzo	EE31	1%	4%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Ausencia	Ausencia
EEN049	J. A. Roca y Est. Los Remedios	EE29	-	4%	96%	-	-	BATERIA SAN IGNACIO	-	PUELCHE	5	Ausencia	223,6%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN050	Los Robles y T. A. Edison	EE29	30%	5%	65%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	EE29	27%	0%	73%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	141,4%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN052	20 de Junio y L. Lopez	EE29	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN053	Cichero 700 e/ Hipolito Bouchard y Julio Argentino Roca	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN054	Destacamento Melchior 733	EEPC5	-	-	100%	-	-	BATERIA LA MORITA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEN056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EEN058	Fray Luis Beltran 1415	EEPC5	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EET001	Falucho y Las Dalias	EEPC2	-	81%	19%	-	-	BATERIA TRISTAN SUAREZ	-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EET004	Av. Saenz Peña y Bogado	EEPC2	-	75%	25%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU001	Maipu 800 e Bransen Hussay B.	EE20	-	25%	75%	-	-	BATERIA UNION	-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU002	San Bernardo 980 e/ Balcarce P Moreno	EE20	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU003	Los Robles al 5000	EE24	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU004	Los Robles al 5700	EE24	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU005	S.Cabral a 200mts de Lacarra	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU006	S.Cabral 3588 a 700 m de EEU005	EE26	-	62%	38%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU007	S.Cabral a 700mts de EEU006	EE26	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU008	Sgto Cabral 5149 e/ Gral. Antonio Gonzalez y Jose Alvarez Condarco	EE26	2%	2%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU011	Sgto. Cabral a 700 m de EEU010	EE32	-	45%	55%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU012	Calle s/n a 700 m de Sgto. Cabral	EE32	-	99%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	EE32	-	35%	65%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU014	Juana de Arco a 700 m de S20	EE24	-	51%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
EEU015	Lacarra y 9 de Julio	EE32	-	33%	67%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	141,4%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU016	Av. Maipu 40 esq. RP58	EE32	-	84%	16%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU017	Av. Maipu 40 esq. RP59	EE32	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU018	Andromaco 80 e/ Jose Champagnat	EE32	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU019	Montes de Oca 80 e/Ruta Prov 58 y Jose Champagnat	EE32	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU020	Vieytes 9 entre Mariano Castex y José Champagmat	EE32	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU021	Sobre Sargento Cabral a 700m del EEU011	EE32	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU022	Juana de Arco S/N	EE32	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU023	Los Robles 249	EE32	-	76%	24%	-	-		-	PUELCHE	1	Presencia	0,0%	Presencia	Ausencia	Ausencia
EEU025	Sgto. Cabral a 100 mts de Cáceres	EE32	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEU026	Juana de Arco N° 7100	EE32	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEZ001	Río Bermejo y Río Gualeguay	EE28	-	3%	-	97%	-	PLANTA LA CELIA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEZ002	Río Bermejo y La Atlántica	EE28	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
EEZ003	Las Hortensias Norte	EE22	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EES001	25 de Mayo 2371	EZPC1	100%	-	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
EES004	Rosario y Palacios	EZPC1	16%	4%	80%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ006	Caminito 1200	EZPC1	31%	52%	18%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
EEZ007	Caminito 1900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
EEZ010	Paso de los Libres 1800 e Islas Cook	EZPC1	41%	1%	58%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ011	Falucho y Paso de los Libres	EZPC1	24%	7%	68%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ012	Paso de los Libres a 700m de Falucho	EZPC1	18%	1%	81%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ013	Paso de los Libres 1400	EZPC1	39%	1%	61%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ014	Paso de los Libres 1500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
EEZ015	Paso de los Libres a 1700 mts de RP N°52	EZPC1	27%	1%	73%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEZ016	Mariano Moreno a 200m de Falucho	EZPC1	15%	48%	37%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ017	Moreno 3500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
EEZ018	Paso de los Libres 900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
EEZ019	Ruta Provincial N°52 4000	EZPC1	25%	1%	75%	-	-	BATERIA EZEIZA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ020	RP N° 52 1000	EZPC1	34%	7%	59%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ021	RP N° 52 1200	EZPC1	25%	2%	73%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ022	RP N° 52 s/n	EZPC1	4%	23%	72%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ023	RP N° 52 1300	EZPC1	6%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ024	Ruta N°52 kilómetro 2	EZPC1	5%	3%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ025	Fariña 2000	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
EEZ026	Valle de Río Negro y América del Norte (PA.Ezeiza)	EZPC1	-	-	100%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ027	Cañada de Gomez y 25 de Mayo	EZPC1	16%	17%	67%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ028	Quito y Arroyo	EZPC1	11%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
EEZ029	Valle de Río Negro y América del Norte	EZPC1	14%	9%	77%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ030	D. F. Sarmiento y Roger Balet	EZPC1	34%	18%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
EEZ031	Roger Balet y Sargento Cabral	EZPC1	14%	17%	69%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
EEZ032	Valle de Río Negro y 25 de Mayo	EZPC1	22%	52%	27%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
ES022	Scalabrini Ortiz e/Ing. Pablo Marin y 1° de Mayo.	PCES022-24	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ES023	Islas Malvinas e/Constituyentes y Pablo Marin.	PCES022-24	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ES024	Scalabrini Ortiz y Av. Patricias Argentinas.	PCES022-24	-	1%	-	99%	-	TANQUE FONAVI	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV002	San Martin y San Juan	FV-TAN-CEN	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV003	Constitución 198	FV-TAN-CEN	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV004	Carriego y Alem	FV-TAN-CEN	-	53%	-	47%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV005	San Martin y Defensa	PCFV005	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	PCFV006	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV007	Cariboni N° 2351 e/ Chaco y Rosario	PCFV007	-	14%	86%	-	-	-	x	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV009	Cariboni y Rio Bermejo	PCFV009	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV011	Corrientes esq. 12 de Octubre	PCFV011	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV013	Av.Bélgica N° 1101 esq. Jorge Novak	PCFV013	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV014	J.D. Perón 535 y Pringles	PCFV014	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV018	Av. Eva Perón y Gral. Hornos	PCFV018	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV019	Río Caraguata n° 1401 y Directorio	PCFV019	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV020	Cabildo y Eva Perón	PCFV020	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV021	Mantovani y Calle 1407	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV022	Juan Mantovani 587 e/ C.1423 y C. 1409	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV023	Mantovani y Calle 1429	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV025	Calle 1423 (901) a 400 mts de Mantovani	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV040	1439 y Juan Mantovani.	FV-TAN-CRU	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Presencia	Ausencia
FV064	C. 1439 e/ C.1420 y a 300 mts de Juan Mantovani	FV-CIS-SAR	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV065	Eva Perón N° 9695 y C. 1423	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV066	Avenida Eva Perón y Calle 1352	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV084	1610 e/RP 53 y 1647	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV085	1653 e/Av. La Plata y A° Las Conchitas	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Suecia	PCFV112	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV120	Calle 1404 N° 498 e/ R.P. 53 y campo	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO SARMIENTO	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV121	Av. Gral. Savio N° 598 esq. Sicilia	FV-TAN-MAY	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV124	E.B. SARMIENTO	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV132	Calle 1426 esq. 1437 – B° San Francisco Grande (oeste)	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV147	Av. La Plata 50	FV-CIS-SAR	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV149	Av. La Plata y Calle 1305	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV156	Calle 1433a y 1418	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV157	Calle 1443 y 1430	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV158	Calle 1440 a 400m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV159	calle 1440 a 1000m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV160	calle 1452 y RP53	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV166	Calle 1440 y 1455	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV024	Eva Peron y Calle 1409	FV-CIS-SL	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	5	Ausencia	136,9%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV036	Calle 1422 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV037	Calle 1432 N° 901 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV041	Calle 1335 N° 801 y 1328	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV042	Calle 1316 y 1333	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV045	Los Inmigrantes y Calle 1355	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV050	Av. Eva Perón N° 7700 e/1310 y Cacheuta	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV087	1364 N° 1082 esq. 1317a	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV088	1327 N° 3201 e/ 1364 y 1370	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO SAN LUIS	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV089	1356 N° 1700 e/ 1347 y 1349	FV-CIS-SL	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV086	1374 N° 900 esq. 1313	FV-CIS-SL	-	28%	72%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV092	1345 e/Av. La Plata y 1364	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV104	Calle 1363 N° 100 y Los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV116	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV130	Calle 1341 N° 511 esquina calle 1310	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV134	Los Inmigrantes y calle 1363	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV143	Calle 1328 y 1355	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV177	Calle 1347 a 58 mts de Av. De los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Ausencia	Ausencia
FV026	Calle 77 y Posadas	FV02	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV027	El Zonda y El Gaucho	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV028	Riobamba N° 1501 y Olivero	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV029	Pte. Illia y Alvear	FV02	-	1%	99%	-	-	BATERIA SAN NICOLAS	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV097	Castelli N° 1001 esq. EE.UU	FV02	-	43%	57%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
FV152	El Apero entre Calle 437 y El Malambo	FV02	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV174	Castelli esquina EEUU de América	FV02	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	FV-TAN-MAY	-	12%	-	88%	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV031	Virgen del Valle y El Clavel	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV032	Virgen del Valle y La Ancianidad	FV-TAN-MAY	-	23%	-	77%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV033	Virgen del Valle y Río Pilcomayo	FV-TAN-MAY	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV034	Av Cacheuta y Boston	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-	TANQUE MAYOL	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	FV-TAN-MAY	-	11%	-	89%	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV053	Cacheuta 2701 y Calle 1353	FV-TAN-MAY	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Presencia	Ausencia
FV063	Av Eva Perón 5880	FV-TAN-MAY	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Presencia	Ausencia

aysa

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
FV038	Calle 1423 e/ 1422 y 1428	PCFV038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV046	Batalla de Ituzaingo 2780 e/ Conteras y C.214A	PCFV046	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV047	Boedo e/ Montserrat y Túnez	PCFV047	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV048	León XIII e/ Pte. Perón y Beirut	PCFV048	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV049	San Antonio e/ Irala y Alvar Cabeza de Vaca	PCFV049	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV051	Cacheuta 3601 y 1371	PCFV051	-	31%	69%	-	-	-	X	PUELCHE	2	Ausencia	141,4%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV055	Calle 832 e/M.Grass y Piedrabuena (V.A.)	PCFV055	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV057	Virgen del Valle N° 2599 y Chaco	PCFV057	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV058	Juan B. Justo y Arcasubi	PCFV058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV059	Av Bosques y Ruta 36	PCFV059	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	86,6%	Presencia	Ausencia	Ausencia
FV060	Delgado y Cafferatas	PCFV060	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV062	Calle 740 y El Clavel	PCFV062	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV067	Calle 1108 N° 1702 e/ 1131 y 1139	PCFV067-70	-	23%	77%	-	-	BATERIA ING. ALLAN	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV068	Calle 1108 N° 2280 esq. 1139	PCFV067-70	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV069	Diag. Los Quilmes N° 500	PCFV067-70	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Ausencia	Ausencia
FV070	Calle 1108 N° 2300	PCFV067-70	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV148	Calle 153a 301	PCFV148	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV167	Calle 1145 y Calle 1122	PCFV067-70	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV071	San Nicolás N° 2501 y Chaco	PCFV071	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV072	Finochietto N° 1411 y Fracción V	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO CRUCE VARELA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV073	C.O.Cruce	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV074	Carlos Gardel N° 700 y Campichuelo	FV-TAN-CRU	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV142	Dardo Rocha y Cerro Famatina	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV078	Bruselas y Polonia	PCFV078	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV079	Bruselas y Bulgaria	PCFV079	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV080	517 N° 1700 y Portela	PCFV080	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV082	El Paisano N° 1899 e/445 (B° Don José Planificado)	FV-TAN-P82	-	1%	99%	-	-	BATERIA DON JOSE PLANIFICADO	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV131	El Malambo N° 105 esq. La Tranquera	PCFV131	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV165	Calle Monteverde e/445 y 449	PCFV165	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV090	Av. La Plata N° 1200 e/1327 y 1319a	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-	BATERIA LAS COLONIAS	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV093	1681 esq. 1608	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV094	1364 N° 2592 e/ 1371 Y 1357	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV144	La Plata 1700	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV146	Calle 1353 4100	PCFV090-94	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV176	Calle 1608 entre 1671 y 1673	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV095	Pisani N° 1101 esq. Suecia	PCFV095	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV096	Humahuaca N° 501 y 511	PCFV096	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV098	Cno. Touring Club N° 1499 y Canalejas	PCFV098	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV100	228-Gral Perón N° 1501 y Bs. As.	PCFV100	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV102	V.Abrille N° 975 casi esquina Calle 519	PCFV154	-	6%	94%	-	-	BATERIA SAN JORGE	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV154	La Paloma y calle 560	PCFV154	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV103	Cicilia N° 2020	PCFV103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV105	Calle 527 e/ 554 y 554A	PCFV105	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV106	Calle 554 N° 1103 e/ Diag. Jarilla	PCFV106	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV108	Calle 1348 N° 1003 e/ 1317 A y 1319 A - (B° San Francisco Este)	PCFV108	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV109	Calle 1435 N° 1719 esq. 1434 - (B° San Francisco Oeste)	PCFV109	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV110	Las Lengas N° 2303 e/ El cardenal y El Zorzal - (B° Santa Inés)	FV01	-	7%	93%	-	-	BATERIA GOBERNADOR COSTA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV111	Los Alamos N° 2502 e/ Av. Blas Parera y El Homero - (B° Santa Inés)	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV150	El Nandú e/ Las Casuarinas y Los Alamos	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV151	Los Lapachos y Tinkunaku	FV01	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV161	Los Laureles y El Cardenal	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV162	La Paloma y Los Sauces	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV163	El Mirlo entre Los Olivos y Los Lapachos	FV01	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV113	Bonn N° 1203 y Austria	PCFV113	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV114	Calle 531 N° 2200	PCFV114	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV115	Progreso 2190 e/ Intendente Jose Luis Cariboni y virgen de valle	PCFV115	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV117	Lourdes N° 402 y Ruta Prov. N° 53	PCFV117	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV119	Suecia N° 1601 esq. Lisboa	PCFV119	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV122	Copenhage N° 502 esq. Alemania	PCFV122	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV123	Calle 172 - Río Negro N° 1790 esq. Alvarado	PCFV123	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV125	Bourel y Chacabuco	PCFV125	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV126	Riobamba y Vías	PCFV126	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV127	Calle 1151A y Calle 1130	PCFV127	-	46%	54%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV128	Río Diamante N° 3080 esquina Villegas	PCFV128	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV129	Río Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	PCFV129	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV133	Calle 1151 y Calle 1118	PCFV133	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV137	San Geronimo 605	PCFV137	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV138	Campana y Esmeralda	PCFV138	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV139	Guamini 2711	PCFV139	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV140	San Martin y Monteagudo	PCFV140	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV141	Alfonsina Storni 74	PCFV153	-	2%	98%	-	-	BATERIA BARRIO ALTAMIRA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV153	Florida y Miguel Cané	PCFV153	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	141,4%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV145	Av. Cacheuta entre Calle 1363 y Calle 1371	PCFV145	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV164	calle 1155 y 1138	PCFV164	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV168	Calle 1149 y Calle 1136	PCFV168	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV169	Calle Jacinto Benavente y E, D Amicis	PCFV059	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV175	Santa Lucia y Aconquija	PCFV118	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
FV178	Av. Bosques y calle 819	PCFV178	-	50%	50%	-	-	-	X	PUELCHE						
FV183	Remedios de Escalada esquina Carmen de Areco	PCFV183	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Presencia	Ausencia
FV184	Turquia, entre Bruselas y Milán	PCFV184	-	6%	94%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia		
FV191	Rumania entre París y Paysandú	-	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE						
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	4%	-	96%	-	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
GU002	Colombia 1007 e/Av. De las Americas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Presencia	Ausencia
GU005	Bogado 800 e/Islas Malvinas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
GU007	Republica Argentina 578 e/Venezuela.	GU-TAN-PED	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
GU008	Brasil 103 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
GU020	Remedios de Escalada e/Tomas Guido y Godoy Cruz	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
GU031	Brasil y Mesopotamia	GU-TAN-PED	-	17%	-	83%	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
GU032	Avenida 38 entre calle 5 y 6	GU-TAN-PED	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
GU010	Violeta Antier 5095 e/Santos Discepolo.	PCGU010	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
GU011	Alfonso Amat 4611 e/Jose Negiia.	PCGU011		100%					X	PUELCHE	-					
GU012	Calle 117 1000 / Av. C. Mereles 1050 e/calles 118 y 120.	GU-TAN-YA	3%	1%		96%			-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU013	Calle 118 N° 1633 e/calles 121 y 123.	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU014	Cjal. Capuano 490 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		2%		98%			-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU015	Calle 118 2041 e/calles 127 y 129.	GU-TAN-YA		2%		98%		TANQUE ESTE - LA YAYA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU016	Calle 118 2471 e/calles 133 y 135.	GU-TAN-YA	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU017	Av. 139 N° 510 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA		4%		96%			-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU023	Calle 103 y Calle 124	GU-TAN-YA				100%			-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU024	Calle 116 y Av. 99	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU018	Av. 21 N° 1099 e/calle 36.	GU01	-	3%	97%	-	-	BATERIA LAS LOMAS	-	PUELCHE	5	Ausencia	55,9%	Presencia	Ausencia	Ausencia
GU019	Cjal. Placido Bajo N° 901 e/ calle39.	GU01	-	-	100%				-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU006	Av. Nestor Kirchner 630 e/Avellaneda y Güemes.	GU02	1%	25%	74%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU021	Roque Saenz Peña y Santa Elena	GU02	-	1%	99%			BATERIA B° SANTA MAGDALENA	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU022	Dorrego y Luis A. Testa	GU02	2%	12%	86%	-			-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU025	Calle 6 y Tte. Juan Domingo Baldini	PCGU025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
GU026	Kingston y Honduras		10%	89%	1%				-	PUELCHE						
GU027	Brasilia y Guayanas	-	2%	89%	9%			BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	-	PUELCHE	-					
GU028	Puerto España y Brasilia	-	10%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU029	Gral Paz esicalle 7 y Lib. Gral J. de S.Martin		11%	89%					-	PUELCHE						
GU030	La Rioja e/ Av. Hipólito Yrigoyen y Sarmiento	-	11%	89%				BATERIA NUMANCIA	-	PUELCHE						
JCP002	Wilde 4573 e/Corbeta Uruguay y Fragata Sarmiento	JCP-TAN-PR	-		-	100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
JCP003	Av. Deniue e/ Av. Pres. Hipólito Yrigoyen	JCP-TAN-PR				100%		TANQUE PRIMAVERA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
JCP005	Las 3 Marias 5700 e/ Av. Jose Alube y Jose C. Paz	JCP-TAN-PR	-	1%		99%			-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
JCP006	Calle Pampa de Junin a 50 m de Yrigoyen	JCP-TAN-PR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0046	Ferro Nuevo y Guanabara	LM003	100%						X	PUELCHE					Ausencia	Ausencia
LM0047	Colect. R3 y Huillanimi B° Playa Lebor.	LM003	100%						X	PUELCHE					Ausencia	Ausencia
LM0049	Escribano y Colden B°El Pino.	LM003	100%						X	PUELCHE					Ausencia	Ausencia
LM0053	Haiti y Galileo - Haiti y Torres.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0054	Luciano Torres N° 600 y Sergio Perez B° San Enrique.	LM008		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0056	Guanacache y Pino B° Recoleta.	LM007	72%		28%				X	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0060	Huemul y Rodney B°Maria Elena	LM002		100%					X	PUELCHE					Ausencia	Ausencia
LM0064	Urdaneta y Rodney B° Maria Elena	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0066	M.Garrido4 y Colegiales (EC/colegiales y M. Becerra)	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0070	M.Garrido4 e/ S. Favardo y Rocamora B° 17 de Octubre	LM011		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0072	J. De Atapén y Solid. Favardo B° 24 de febrero	LM011		2%	98%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0073	J. De Atapén y Solid. Favardo B° 24 de febrero	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0074	Echauri N° 3200 e/ J.B.Justo y Vidal	LM014		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0075	Lavalleja y Conde	LM026		2%	98%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0076	N de Balboa y Lujan.	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0077	Castañon y Rio Cuarto B° El Porvenir	LM009		2%	98%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0078	Zequeira garcia E/ Favardo y Rocamora	LM002			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0079	Urdaneta y Rocamora (E/ T de Rocamora y Del Tejar)	LM002		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0081	Echauri e/ Ortega Zarini Villa Scasso	LM014			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0083	Quiero N° 900 E/ Riva 21 /Cleno y Draqones.	LM024	10%	1%	89%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0085	Martinez y Lasalle.	LM024		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0087	Reseno e/Acasuso y Alagon	LM011			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0094	A Vilela 700 y Guanabara E/ Guasayan y Morris B° Playa Lebor.	LM003	96%	2%	2%				X	PUELCHE					Ausencia	Ausencia
LM0095	Mantequazas N° 6100 e/Buenanoa y Acode.	LM004		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0096	M.Herrero e/ Guanacache y Eder - B° el Tobin	LM003		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0098	E. Clay (e/ Medrano y Pueyo.	LM024			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0099	Hugo West e/ Madreselva y milamores.	LM029	98%		2%				X	PUELCHE					Presencia	Ausencia
LM0101	Scarlati y Gallardo.	LM001			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0108	Lavalleja N° 6100 e/ Alegria y Arcon	LM010		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0109	Gamay y Peridn	LM024			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0112	Fernandez y propato B° Candiati	LM008			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0118	El Reseno 3351/e1 Ortega y Zequeira.	LM046			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0121	L. Da Vinci 4000	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0123	Tinogasta y Colegiales	LM009		1%	99%				X	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0124	Marcos Paz y Colegiales	LM047	84%	16%					X	PUELCHE					Presencia	Ausencia
LM0125	Corrales, Pte N° 1100 y Espejo	LM003			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0126	Ancon al 3564 esquina Zinny	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0127	Castin 4000 esq. J.B. Justo	LM009			99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0139	Caseravilla 3600 e/ Senori Perez y Rivas.	LM008		100%					X	PUELCHE					Presencia	Ausencia
LM0140	Castro e/ Cosecia y Saraboa	LM026			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0143	Scarlatti y Arcon	LM025	100%						X	PUELCHE					Ausencia	Ausencia
LM0146	Dragones y Rosendo.	LM008			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0158	Almacno y Apipe	LM046			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0161	Ayax, Meoveri y Bacon - Jones Eta N° 5900	LM016		2%	98%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0164	Saenz y Cosecia.	LM008		4%	96%				X	PUELCHE	3	Ausencia	86,6%	Presencia	Presencia	Ausencia
LM0170	Ancon y Alegria E/ Fournier	LM016		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0172	J.C Echauri y Donuerb E/ Alagon	LM009		2%	98%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0175	Baez y Bavio	LM016			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0177	Baez y Barrientos	LM034		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0179	Coronel Conde e/ Martinez Villena y Martin Coronado	LM048			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0180	Machain esq. Puerto Argentino.	LM008		3%	97%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0187	Dto Argentino y Cono. del Valle	LM026			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0189	Leones Entre Gana y Conde	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0191	Icalma esq. N. Arias	LM026		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0192	Tolosa entre Barrientos y Barataari.	LM048			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0193	Jachal esq. Juan Pio Gana.	LM048		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0195	Escuela entre Iguazu y Gallardo	LM008			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LM0197	Scarlatti e/ Villanueva y Monroe.	LM025		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0198	Enrique Clay y M. Doello	LM051		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LM0957	Guevnos 127/16 E/ San Ignacio y San Juan	LM004			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO025	M. Piaggio y Olden	LO05	64%	2%	33%				X	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO042	Santa Lucia e H.Yrigoyen	LO01	-	1%		99%		PLANTA - LO042	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO067	De la Peña y Moldes	LO04	-	-	-	100%	-	PLANTA - LO067	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO072	Timbó y Cap. Moyano	LOPC1		2%		98%		PLANTA - LO072	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO078	Arenales a 100m de J. Ingenieros	LOPC1	-	9%	91%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO079	Arenales a 300m de L.M.Drago	LOPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO080	Juan witi 2400 entre L.M.Drago y Bahia Blanca	LOPC1	-	13%	87%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO081	L.M.Drago y Melian	LOPC1	3%	77%	21%				-	PUELCHE	1	Presencia	0,0%	Presencia	Ausencia	Ausencia
LO118	Martin Rodriguez y Timbó	LOPC1	1%	14%	85%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO119	Tala y Pino	LOPC1	3%	3%	94%				-	PUELCHE	5	Ausencia	223,6%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO121	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO125	Av. Argentina y Guido	LOPC2	-	37%	63%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO126	Av. Argentina	LOPC2		79%	21%			BATERIA LLAVALLOL	-	PUELCHE	2	Ausencia	141,4%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO133	Av. Argentina y Junin	LOPC2		50%	50%				-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO138	Junin 170 entre Rodriguez y Las Heras	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO139	Arnat y Petinbi	LOPC1		11%	89%				-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO140	Av.Argentina 2950 y Peiribi	LOPC1	-	5%	95%				-	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO141	Rodriguez 3507 esq Mercedes	LOPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO142	Jose Ingenieros 1668 e/ Calferata Norte y Juan XXIII	LOPC1		20%	80%				-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO146	Calle Pintos 2007 e/ Viel y Florida	LOPC1	-	4%	96%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO147	Calle Magnolia 2099 e/ Moreno y V.Barbieri	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO148	Magallanes 2600 entre Ucrania y Duhalde	LOPC1		1%	99%				-	HPOPUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
A8019	Combatientes MALVINAS ARGENTINAS y Pilar	LOPC2		1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
A8066	Tigre y Feicacaro	LOPC2		8%	92%				-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO083	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO084	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO085	L.M.Drago e/Cno las Flores y Fonrouge	LOPC2	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO086	Cno de las Flores a 500m de Drago	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO087	Cno de las Flores y MALVINAS ARGENTINAS	LOPC2		3%	97%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO093	Cno San Vte a 500m pozo 87	LOPC2	3%	12%	85%				-	PUELCHE	5	Ausencia	223,6%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO106	J. B. Justo y Cuyo	LOPC2	65%	5%	30%	-	-	BATERIA BURZACO	-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO117	Mendoza y N. Silva	LOPC2		2%	98%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO122	J. Ingenieros	LOPC2	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	2%	23%	75%	-	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
LO144	Avenida Argentina y RP N° 16	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO145	Villarino y Avenida Argentina	LOPC2	-	-	100%		-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO149	Rene Vallo y Jose Melián	LOPC2	67%	-	33%		-		-	PUELCHE	2	Ausencia	141,4%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO095	Larrea y Gardel	AB14	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LO113	Letoir 432	LO38	-	3%	97%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO120	Pino y el Cairo	LOPC1	-	2%	98%		-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO127	Jose Marmol e/Allemandri y Anchorena	LO47	-	1%		99%	-	PLANTA - LO127	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO128	Martí y Av. Cabred	LO13	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
LO134	Larrea y Colihue	AB14	-	6%		94%	-	PLANTA - LO134	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LO135	Matienzo y Rodriguez	AB22	1%	2%	-	96%	-	PLANTA - LO135	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
LO152	Necochea esquina Lujan	-	-	100%				PLANTA - LO152	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA002	Ambrosetti 1900 e/Beltran y Martin Fierro.	MAPC1	-	21%	79%		-		-	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA003	ALMIRANTE_BROWN 2500 e/Viena y Rep. Argentina.	MAPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA004	Asamblea 1800 e/J.1 de Septiembre.	MAPC1	1%	2%	98%			BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	-	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA006	Viena e/Canning.	MAPC1	-	3%	97%				-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA018	Olíden entre 11 de Septiembre y Juan Cruz Varela	MAPC1	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA009	Cangallo 1200 e/San Lorenzo y Uspallata.	PCMA009	-	100%	-			-	X	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA010	Uspallata 1000 e/Soller y O´Brien.	PCMA010	-	3%	97%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA011	Stoppler 900 e/Bat. de Maipu y Paso de los Andes.	PCMA011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA012	San Lorenzo y Seguí	PCMA012	-	3%	97%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA016	Canadá 748 y Seguí	MAPC2	-	7%	93%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MA017	Palacios y Seguí	MAPC2	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME001	25 DE MAYO E/PUEYRREDON	ME-TAN-CES	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	ME-TAN-CES	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME003	25 MAYO E/ 9 DE JULIO	ME-TAN-CES	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME004	BROWN E/ CENTENARIO	ME-TAN-CES	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME006	BROWN E/ CARLOS PELEGRINI	ME-TAN-CES	-	6%		94%	-	TANQUE MERLO	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME007	BROWN E/ M.BRAVO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME015	9 DE JULIO E/ SAN LORENZO	ME-TAN-CES	-	2%		98%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME016	SAN LORENZO E/CANNING	ME-TAN-CES	-	1%		99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME060	SAENZ PEÑA Y AV. CALLE REAL	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Presencia	Ausencia
ME005	25 MAYO E/ J.M.Castro ex Pearson	ME02	75%		25%			BATERIA PARQUE SAN MARTIN NORTE	-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME014	BROWN E/PIZURNO	ME02	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME008	LIBERTAD E/ ARGENTINA Y PUCHEU	PCME008	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
ME009	COVIPOL. EDIF 38. ROSSI Y ECHEVERRY	PCME009	-		100%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME010	COVIPOL. EDIF 13. ROMAY Y ZUNDA	PCME010	100%					-	X	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
ME017	DEFENSA E/BARAVINO Y HORTIGUERA	PCME017	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME018	OYUELA E/FRIAS Y RUTA 200	PCME018			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME019	PEDRIEL E/ TALA	PCME019			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME020	INDEPENDENCIA E/ SULLIVAN	PCME020	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME021	ESNAOLA Y BOYACÁ	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME022	ESNAOLA Y BACH	ME-TAN-LOM		1%		99%	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME023	AV.ARGENTINA Y CHOPIN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-	TANQUE LOMA GRANDE	-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME025	AV.ARGENTINA E/GAVILAN	ME-TAN-LOM				100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME081	Strauss y Juan Sebastian Bach	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME087	Av. Argentina y Lezama	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME090	Angel Rodriguez y Curapaligue	ME-TAN-LOM		1%		99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME026	TUNUYÁN E/AREVALO	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME027	VIDT E/ FEBAL	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME028	VIDT E/DEMOCRACIA	ME-TAN-REC		4%		96%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME029	VIDT E/CHACAS	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-	TANQUE RECONQUISTA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME030	VIDT E/FAMATINA Y DESSY	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME063	FILIBERTO Y TARIJA	ME-TAN-REC		1%		99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME079	Antofagasta y Fraga	ME-TAN-REC	-	3%		97%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME082	Cacheuta y José Martí	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME031	GARDEL E/PAYRO	ME-TAN-ARC		1%		99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	ME-TAN-ARC	-			100%	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME033	VIDT E/DISCEPOLO	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME034	VIDT E/ACCARCOS	ME-TAN-ARC		1%		99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME035	VIDT E/MEDMA	ME-TAN-ARC	-	-		100%	-	TANQUE ARCO IRIS	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME068	JOSE MARTI Y DALTON	ME-TAN-ARC	-	6%	-	94%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Ausencia	Ausencia
ME088	Lorenzini entre Delin Funes y Fraga	ME-TAN-ARC		1%		99%	-		-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME091	P.Echague y P. Podestá	ME-TAN-ARC	-	-		100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME092	Carcavallo entre Cassaux y Orfilia Rico	ME-TAN-ARC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME102	Fraga y Dávila	ME-TAN-ARC		3%		97%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	PCME036	-	2%	98%			-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME037	AMADO NERVO E/ANCON Y AMPERE	ME-CIS-PSM	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME038	LOS ALELIES Y TILCARA	ME-CIS-PSM		4%	96%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME039	LOS ALELIES E/TILCARA Y AGUARIBAY	ME-CIS-PSM	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME040	LOS JACINTOS E/ETIOPIA	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME041	ACHALA E/LAS RETAMAS	ME-CIS-PSM		2%	98%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%				-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME045	ALVAREZ JONTE E/ LOS ALELIES	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME046	LAS RETAMAS E/JURAMENTO	ME-CIS-PSM		2%	98%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME047	ALVAREZ JONTE E/ LOS GERANIOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%			REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME048	ALVAREZ JONTE E/LAS DALIAS	PCME048	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME049	GABRIELA MISTRAL E/ALTE BROWN	ME-CIS-PSM	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME051	GENDARMERIA GURRUCHAGA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME053	ZARRAGA E/ GAGUERRE Y PEDERNERA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME054	ZARRAGA E/ GAVILAN	ME-CIS-PSM	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME058	12DE FEBRERO	ME-CIS-PSM	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME076	El Hornero 3710	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	ME-CIS-PSM	-	1%	99%				-	HIPO/PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME086	Garmendia y Almte. Brown	ME-CIS-PSM	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME042	GENDARMERIA E/ FLORES A.	PCME042	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME050	GABRIELA MISTRAL E/BENOIT	PCME050	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME055	PUEYRREDON Y O'BRIEN	PCME055	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME056	SAN ANTONIO Y PARAGUAY	PCME056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
ME057	CHACO N° 310 E/DIRECTORIO Y NOGUERA	PCME057	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME059	GABRIELA MISTRAL Y ALPATACAL	PCME059	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME061	SAENZ PEÑA Y AV. RIVADAVIA	PCME061	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	PCME065	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA Y SOLANET	PCME066	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME067	TRAFUL Y BLANCO ESCALADA	PCME067	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME069	ATAHUALPA Y PEDRO CHUTRO	PCME069	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME070	TUCUMAN Y LA RIOJA	PCME070	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME073	SARMIENTO 2398 Y LA HABANA	PCME012-73	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	PCME074	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME075	MEDRANO 811 Y SANTA FE	PCME075	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME078	Garay 1753	PCME078	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME080	Federico Lacroze y Matorras	PCME080	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	ME01	-	-	100%			POI MERLO	-	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	ME01	2%	-	98%				-	PUELCHE	2	Presencia	0,0%	Presencia	Ausencia	Ausencia
ME089	Curapaligüe y 25 de Mayo	PCME089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME093	Morse y Av. del Bicentenario	PCME093	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME094	Brasil y Guardia Vieja	PCME094	-	-	100%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME095	Sullivan y Sargento Cabral	PCME095	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME096	Gral Ocampo y T Saley		-	100%					-	PUELCHE						
ME097	Orán entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%				BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE						
ME098	Tasso y Oran	-	-	100%	-		-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME099	De Roma y Necochea		-	100%					-	PUELCHE						
ME100	Republiquetas entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%					-	PUELCHE						
ME101	Juan A Maza y Dr Ricardo Raúl Alfonsin	PCME101	-		100%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
ME103	Los Arneros y San Martin	PCME103		1%	99%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
ME113	EVA PERON E/PELLEGRINI	PCME113	-	1%	99%			-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M001	Belgrano 400 e/Vicente Lopez y C. Malnatti.	MIPC2	-		-	100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M020	Julio A. Roca 216 e/Dorrego y Roseti.	MIPC2	-	1%	-	99%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M035	Pavon 1100 e/R. Peña y Sgto. Cabral.	MIPC2	-		-	100%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M002	Julio A. Roca 800 e/Serrano y Muñoz.	PCM002	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M003	Italia 1300 e/Francia y L. N. Alem.	PCM003	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M006	Pardo 400 e/San Luis y C. Malnatti.	PCM006	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M007	Julio A. Roca 1900 e/Gelly Obes y Zuviria.	PCM007	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
M008	Conesa 2000 e/ Gelly Obes y J. M. Zapiola	PCM008	1%	-	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M009	Serrano 800 e/Conesa y SAN_JOSE	PCM009	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M010	Cjal. E. Tribulato 700 e/Serrano y Urquiza.	PCM010	2%	27%	72%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M011	Int. J. Irigoin 700 e/Serrano y Stgo. Del Estero.	PCM011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M013	J. B. Alberdi 200 e/Dorrego y Arcuenaga.	PCM013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M014	Serrano 400 e/J. B. Alberdi y Haedo.	MIPC1	-	100%	-	-	-	CAG SAN MIGUEL CENTRO	-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M046	Paunero 100 e/Pardo.	MIPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
M015	Cnel. Fraga 2300 e/Int. J. Irigoin y Marcos Sastre.	PCM015	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M016	Cnel. M. Fraga e/Salerno y Tomas Edison.	PCM016	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M017	Vicente Lopez e/Marcos Sastre y Malvinas.	PCM017	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
M018	Pardo e/Libertad y J. M. Zapiola	PCM008	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M019	J. B. Alberdi e/J. Zapiola y Gelly Obes.	PCM008	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M021	Cjal. E. Tribulato 2300 e/ G. Campos y Libertad.	PCM021	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
M022	Tomas Guido 4400 e/J. R. Lopez y El Zonda.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M023	Av. Alte. J. Lopez 4500 e/J. D. Solis y Eva Peron.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M025	T. Guido 5900 e/Uriarte.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M026	T. Guido 5301 e/La Pinta.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M032	Marchena 3256	MI_CIS_SAR	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M024	E. Ferreyra 4200 e/T. Guido.	MI_CIS_GUA	1%	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M028	Santa Maria 5100 e/Vicente Fatome.	MI_CIS_GUA	1%	3%	96%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M037	Cisterna La Guarida	MI_CIS_GUA	4%	4%	92%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M065	Calle Defensa e Italia	MI_CIS_GUA	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M066	Dr. Enrique Finochietto e/Sta Maria y Fray Antonio Marchena	MI_CIS_GUA	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M033	Int. J. Irigoin 400 Gelly Obes y Granaderos.	PCM033	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	5	Ausencia	223,6%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M036	Cnel. M. Fraga 3400 e/Marconi.	PCM036	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M038	Roca 1400 e/Alen.	PCM038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
M039	Belgrano 2000 Gelly Obes y R. S. Peña.	PCM039	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
M040	Italia 2300 e/Gaspar Campos y J. M. Zapiola.	PCM040	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M041	Belgrano 900 e/D' elia y Muñoz	PCM041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M042	Pardo 10 e/Ruta 10.	PCM042	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M043	Conesa 416 e/San Luis.	PCM043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M045	Rodriguez Peña 2600 e/Williams.	PCM040	-	8%	92%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M004	Conesa 1300 e/Martin Irigoyen.	MI_CIS_CEN	-	20%	80%	-	-	-	-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M034	Martin Irigoyen y Juan B Alberdi	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M047	Martin Irigoyen e/Obilido y Francia.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-	-	-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M048	Av. Francia 500 e/Sta. Fe y Parana.	MI_CIS_CEN	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M049	Av. Francia 600 e/Moreno.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M051	Av. Francia 1100 e/Tucuman y Azpiardo.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M060	Conesa entre Martin Irigoyen y Sarmiento	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M067	Conesa e Irigoyen	MI_CIS_CEN	1%	14%	84%	-	-		-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M052	Rodrigo de Triana 1500 e/R. Balbin.	PCM052	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M053	Defensa e/R. Balbin.	PCM053	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M054	Cruz del Sur e/Tomas Espora.	PCM062	-	1%	99%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M062	Calle Güemes e Isabel La Catolica	PCM062	-	2%	98%	-	-	BATERIA MI054-MI062	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M055	J. J. Paso 5500 e/La Niña y Isabel la Catolica.	PCM055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M056	Juan J. Paso e/Beron de Estrada y Salguero.	PCM056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M057	Maestro Ferreyra y Charlone	PCM057	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M058	José M. Zapiola y Güemes	PCM058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
M059	Concejal Tribulato y Monseñor Blois	PCM059	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M061	Luis Salguero y Tomás Alba Edison	PCM061	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M063	Egipto y Libertad	M01	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
M064	San Nicolás y Gral Las Heras	M01	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MN001	Lavalleja al 7100 E/ Conde y Achupallas.	LM019	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN002	Armonia a 150 m de La Fuente.	LM019	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN003	Armonia y Billinghurst.	LM019	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN004	Billinghurst 2800 y Armonia.	LM019	-	2%	98%				-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN005	Billingurst y Dobleu / Cespedes.	LM019	-	2%	98%	-	-	BATERIA GONZALEZ CATAN	-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN006	Int. Russo y Ramón Lista	LM046	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN007	Billinguru e Int Russo	MN24	-	1%	99%				-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Presencia	Ausencia

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MN008	Billinghurst y Las Flores	MN24	-	4%	96%					PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN009	Billinghurst 5300 y Río Cuarto	MN24	-	1%	99%					PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN010	Las Flores y Ramón Lista	MN24	-	-	100%					PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN011	Monte Egmont y Casanelas	LMO19	-	3%	97%					PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN032	Acassuso 1700 y Santa Rosa	MN23	-	-	100%					PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MN033	Acassuso e Ituraraza	MN23	-	1%	99%					PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MN034	Noruan y Zavala	MN16	-	-	100%					PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN036	Hucal y Fene	MN16	-	4%	96%			BATERIA RAFAEL CASTILLO		PUELCHE	6	Ausencia	154,9%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN037	Lavalle y Tres Cruces	MN23	-	4%	96%					PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MN039	E. Del campo y Aguirre	MN23	-	100%	-					PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MN044	Huarpe y Lacar	MN23	-	-	100%					PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MN043	Casarbon N° 2922 y E. Echeverria	MN23	-	100%	-			POI MN043		PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MN058	Beethoven y La Donna B°El Tonino	MN24	-	100%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
MN106	Beethoven entre Aguirre y Mendez de Andes	MN24	-	-	100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN110	V. de la Plaza E/ Dávila y Beadley	MN25	-	1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN122	Santa Rosa y Aguirre	MN23	-	-	100%				X	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MN147	Zamudio e/ Brayard y Aguirre	MN25	-	9%	91%			POI MN147		PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN157	Beauchard y Heredia	MN25	-	1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN173	Hucal 1700 e/ Vogel y Polledo	MN16	-	1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MN183	Lavalle y Sudamérica	MN23	-	2%	98%				X	PUELCHE	5	Ausencia	136,9%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MN186	M. T. de Alvear 1190 esq. Del colegio	MN23	-	1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MN211	Esquiu y Eulates	MN19	-	4%	96%				X	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MN212	Victorino de la plaza y Luis Maria Drago. RAFAEL CASTILLO	MN19	-	1%	99%				X	PUELCHE	5	Ausencia	223,6%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO087	Cipriano y Vidalita	MOPC1	100%	-	-					PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO088	De los Recuerdos y De los Pavadores	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO089	Correo y La Chacarera	MOPC1	100%	-	-					PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MO093	De los Reseros y E. Frers	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO094	La Esquina de los Reseros	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO095	De La Donna Pje N° 1282 y El Ombu	MOPC1	100%	-	-			BATERIA PARQUE LELOIR - ITUZAINGO		PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MO097	De La Vidalita y J. Hernández	MOPC1	81%	1%	18%					PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO146	N. Repetto y Del Palenque	MOPC1	4%	-	96%					PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO147	N. Repetto y De la Tradición	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO148	Del Mensjulito y De las Cachuelas	MOPC1	-	2%	98%					PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO149	N. Repetto a 180 metros de F. Ielpo	MOPC1	-	1%	99%					PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO150	De la Condición y Colectora Acceso Oeste	MOPC1	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MO100	Videla y Peredo	MOPC1	-	-	100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO105	Fray J. S. M. de Oro y Figueroa Alcorta	MO01	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
MO106	Figueroa Alcorta y La Tribuna	MO01	95%	5%	-			BATERIA VII BRIGADA AEREA - MORON		PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
MO107	E. Lopez y Crsel. Arenas	MO30	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MO108	Figueroa Alcorta y Montevideo	MO01	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
MO130	Lacarra y Cucha Cucha	MO01	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
MO137	Madrid y Jarry	MO32	95%	5%	-			BATERIA BARRIO SAN JUAN		PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MO138	Paganini e/Pedro Diaz y Juan Gorriti	MO01	-	-	100%					PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO139	Amberes y Pedernera/v	MO01	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM - INTA		PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO140	Cuzco entre M. de Aveles y Tolivo	MO01	-	1%	99%					PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO141	Cuzco y Arowe	MO01	-	100%	-					PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MO150	La Trilla a 1dm de Juramento	HU01	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM 2		PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO151	Arotahal a 21.93m de Veragua	HU01	-	17%	83%					PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MO152	Chimborá y Las Cerdales	HU01	-	1%	99%					PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MO142	Pinos esq. Lavalle	T01	99%	1%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MO144	Sta. Teresa y La Garzela	MO03	95%	5%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MO154	Coronel Arenas esq. Andrade	MO03	95%	5%	-			BATERIA CASTELAR		PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
MO155	Olivari esq. Palermo	MO03	95%	5%	-					PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MR001	J.V. González 2625 e/Balzak y Rodriguez Peña.	PCMR001	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR002	J.V. González 2435 e/Güemes y V. Alsina.	PCMR002	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR003	Güemes 901 e/Bolivia y Paraguay.	PCMR003	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR004	Larralde 1341 e/J. Gonzalez y R. Gutierrez.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR005	Int. Bossi 1080 e/Ecuador y Paraguay.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR006	Int. Bossi e/Venezuela y Ecuador.	MR-TAN-MOR	-	8%	-	92%	-	TANQUE MORENO	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR007	Guatemala 2400 e/Güemes y Alsina.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR008	Guatemala 2700 e/marmol y Colectora Gaona	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR019	Int. Bossi e/Guatemala.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR011	P. Ansaldo e/Blas Parera y M. Melo.	PCMR011	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR012	M.Obarrio 2048 e/Iliberdi y Rafael.	MRPC1	-	3%	-	97%	-	PLANTA CAG MORENO	-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR046	Del Cañon/M. Obarrio e/San Carlos.	MRPC1	-	45%	-	55%	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR013	Av. Perón e/Del Cañon.	PCMR013	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR014	Alcorta 2500 e/Bouchard y Uruguay.	PCMR014	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR015	Ameghino e/Centenario y Argentina.	PCMR015	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR016	Callao e/Av. Alcorta y Mitre.	PCMR016	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR017	Alcorta e/Haedo y Ramos Mejia.	PCMR017	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR018	Misiones e/ Sta. Fe y D´errico.	PCMR018	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR020	Alte. Brown e/25 de Mayo y Andrade.	MR01	-	2%	98%	-	-	BATERIA MR020-MR02	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR021	Alte. Brown e/Pio XII.	MR01	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR022	Sanchez 4800 e/Ruta 25 y San Justo.	PCMR022-23	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR023	Florencio Sanchez e/Gandhi y Sofocles.	PCMR022-23	-	11%	89%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR024	Costa Rica e/F. Sanchez y Sofocles.	MR-TAN-PER	-	30%	-	70%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR025	A. Storni 5600 e/Danubio.	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR026	A. Storni 5900 e/Madariaga.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR027	Ecuador 5700 e/La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR029	La Plata e/Ruta23 y Camil.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-	TANQUE LA PERLITA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR035	Gutierrez 5600 e/La Plata y Cost Rica.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR070	Honduras y Marquez	MR-TAN-PER	-	5%	-	95%	-	-	-	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR072	Honduras y Gral. Madariaga	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR028	El Salvador e/Chile y Mexico.	PCMR028	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR030	Pedrell e/Ascasubi y Carriega.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR031	R Rojas e/Libano y Gral. Pintos.	MR-TAN-TRU	-	3%	-	97%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR032	F. Sanchez e/Libano y Pitagoras.	MR-TAN-TRU	-	4%	-	96%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	TANQUE TRUJUI	-	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR051	Tablada e/Oribe y Puccini.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR075	Diego de Villaroel y Celerino Namuncurá	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR036	Ruta 25 e/Cataliña.	PCMR036	83%	2%	15%	-	-	-	X	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR037	Giralde e/Pastor Obligado y Lavarden.	PCMR037	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR040	Piovato 4132 e/Bochardo y Balcarce.	PCMR040	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR041	Dorrego e/Dorrego y Darat.	PCMR041	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR042	1 de Mayo e/Alcorta.	PCMR042	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR043	San Pablo e/San Cayetano.	PCMR043	5%	2%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR044	Piovano e/El Salvador y Venezuela.	PCMR044	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR048	Echeverría e/Darwin y Peron.	PCMR048	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR049	Sarratea e/Victoria.	PCMR049	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR050	Marcos Paz 1116 e/Iarrea y J.J. Urquiza.	PCMR050	10%	2%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR052	Arribeños e/Concordia.	PCMR052	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR009	V. Alsina e/Libertador.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR053	Córdoba E/Palo y Sheden.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR054	Alvear e/Rafael Arco.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR055	Córdoba e/V. Lopez y Linch.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR056	Corvalán 2733 e/B de Yrigoyen y Graham Beil.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR057	Uruguay e/E. Rios y colectora.	MR-CIS-MOR	2%	4%	94%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR058	Misiones 1970 e/ Moron.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR059	Facundo Quiroga e/Moron y Yapeyu.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-	-	-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MR060	Facundo Quiroga e/ La Tropilla y Quilmes.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MORENO	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR061	Corvalán e/La Tropilla.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR062	SAN_JUAN_BAUTISTA 2026 e/ Int. Corvalan Dean Funes	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-	-	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR063	Lincoln e/Soldado Derrico y E. Rios.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-	-	-	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia

aysa

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
					Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MR064	Intendente Corvalan 2302 e/ Alvear y Alejandro Graham Bell	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR095	Uruguay y Chicliana	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR097	Entre Rios esquina Abraham Lincoln	MR-CIS-MOR	2%	3%	95%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR100	Moron e/ Facundo Quiroga y Arribeños	MR-CIS-MOR	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR101	Lincoln N°1644	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR065	J.V. Gonzalez e/ Ruta 25 y Brasil.	PCMR065	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR067	Lobos e/La Tablada y Manzana 36.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR068	Lafinur e/Lobos y 3 de Marzo.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR069	Tablada e/Democracia y Colectora	PCMR069	12%	4%	84%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR071	Shakespeare y Manuel Galvez	PCMR071	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR073	Colombia y Ricardo Gutiérrez	MR-TAN-PER	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR074	Colectora Acceso Oeste y Ecuador	PCMR074	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR076	Hipólito Yrigoyen y San Luis	PCMR076	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR077	Teniente Ibañez 3224	PCMR077	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	5	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR078	Alberti entre Marcos Paz y Vera	PCMR078	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Ausencia	Ausencia
MR079	Juana de Azurduy y San Cayetano	PCMR079	43%	2%	55%	-	-	-	X	PUELCHE	2	Presencia	0,0%	Presencia	Presencia	Ausencia
MR086	Ecuador y Marquez de Aguado	MR-TAN-PER	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR088	Lobos entre Misiones y José Hernández	PCMR088	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR089	Pavón y Gervasio de Posadas (Plaza del Estudiante)	PCMR089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR093	Mendoza y Jose Ingenieros	PCMR093	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MR098	Av. Luis Pasteur entre Facundo Quiroga y Arribeños	PCMR098	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
MR099	Marcos Paz entre J.J Urquiza y Larrea	PCMR050	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MR104	Marcos Paz entre Larrea y Justo Jose de Urquiza	PCMR050	-	36%	64%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
MS025	Covara y El Pindo	MS_CIS_MUN	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Presencia	Ausencia
MS026	Calle 200 y Rotonda	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-	BATERIA CIUDAD EVITA	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MS027	Av. Central y Calle 500	MS_CIS_MUN	-	0%	99%	-	-		-	PUELCHE	3	Ausencia	86,6%	Presencia	Presencia	Ausencia
MS034	El Tapeti y El Sauce	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	66,7%	Presencia	Presencia	Ausencia
MS042	Av. Central y calle 900	MS_CIS_MUN	97%	3%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
MS030	Las calas y Los balcanes	MS32	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MS091	Las Orquideas y Las Gardenias	MS32	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MS092	Costanera y Las Palmas - R. 22 de Enero	MS32	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
MS105	Guaycuru y Torquino	MS34	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
MS114	Magnasco y Av. Circlania	MS32	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	Ausencia	Ausencia
PI001	J. B. Justo y Sanguinetti al 500.	PCPI001	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI002	J. B. Justo 615 y Posadas.	PCPI002	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI003	Av. Tratado de Pilar 242 y Sanguinetti.	PCPI003	25%	35%	39%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI004	Lagrave 84 (Yrigoyen y Pampa).	PCPI004	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI005	Planta Champagnat.	PCPI005	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI006	Rincón entre San Martín y Esteban Luca	PCPI006	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI007	José María Paz 873.	PCPI007	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI008	ITUZAINGO 331.	PCPI008	1%	3%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI009	Maipú y Vías F.F.C.C. San Martín.	PCPI009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI010	Gral. O'Higgins y Bergantín Congreso.	PCPI010	-	13%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI011	Juan Bautista Alberdi 1106 y 11 Septiembre	PCPI011	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambrosetti.	PCPI012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Mapuche)	PCPI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI014	Las Araucarias y M. Acosta.	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI059	Ubicado dentro de predio Campo Suite II. frente a Parque Austral.	PIPC2	23%	77%	-	-	-	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	-	PUELCHE	-	-	-	-	Presencia	Ausencia
PI067	Mariano Acosta y Los Alamos	PIPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI089	Los Alamos y Av. Eva Perón	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI015	Dr. Ignacio Pirovano 728 esq. Costa Rica	PCPI015	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI016	Chacabuco 2130 e/Paraguay y Bolivia	PCPI016	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	115,5%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI017	Tortugas Country Club	PCPI017	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI018	Tortugas Country Club	PCPI018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI020	Tortugas Country Club	PCPI020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI021	Tortugas Country Club	PCPI021	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI022	Las Campanillas esq. Av. Highland Park	PCPI022	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI025	Country El Carmel	PCPI025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI026	Las Amapolas. Villahaus - Country Ayres del Pilar	PCPI026	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI035	Country Ayres del Pilar	PCPI035	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI037	Country La Lomada	PCPI037	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI040	Las Margaritas 1100 e/ Los Claveles y Las Rosas	PCPI040	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI041	Las Glicinas 1080 (proximo a R8)	PCPI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI042	Mosladini 374. esquina Bergantin Independencia.	PCPI042	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI043	Segui esq. Colectora Este Ramal Pilar	PCPI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI044	Posadas 1635 e/J.V. Gonzalez y H. Ascasubi	PCPI044	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI045	Country B° Campo grande	PCPI045	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI048	Cjal. Dr. Martiegui 219. Plaza.	PCPI048	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI049	Bergantín República y Bergantín Independencia.	PCPI049	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI050	Av. Constitucion(R26) e/Nicaragua y San Salvador.	PCPI050	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI051	Guatemala y R26.	PCPI051	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI052	Guatemala 4300 esq. Alemania (MANUEL_ALBERTI)	PCPI052	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ramón Gimenez.	PCPI053	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI054	Leguizamon e Iluzaingo	PCPI054	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI056	Ameghino y Colectora Oeste	PCPI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI058	Nicaragua 1250 e/Haiti y Santo Domingo	PCPI058	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI061	RN 25 y Chubut	PCPI061	4%	24%	71%	-	-	-	X	PUELCHE	1	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI062	Panamá y Alejandro Korn	PCPI062	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI063	Patagones y Tagle	PCPI063	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI064	Andes y Avda. Patricias Argentinas	PCPI064	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI065	Goleta Constitución y Fragata Sarmiento	PCPI065	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI066	Calle s/n e/ Haiti y Santo Domingo	PCPI066	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI068	Alazan e/Overo y Picasso- Highland Park	PCPI068	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI070	Paraguay y Tierra del Fuego	PCPI070	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI075	Guatemala y Levene	PCPI075	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI076	Gato y Vasco Da Gama	PCPI076	-	-	100%	-	-	BATERIA PERUZZOTTI	-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI078	Vasco Da Gama entre Hermita y Camino Comercial	PCPI076	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	200,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
PI080	Monseñor D' Andrea y La Carreta	PCPI080	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI084	Chubut y San Ignacio	PCPI084	-	20%	80%	-	-	-	X	PUELCHE	3	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI100	Calle Sarmiento e/ Bahia Grande y Bahia Redonda	PIPC1	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI101	Ruta 234 y Bahía Darbel	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI102	Calle Henry Martin y Bahia Darbel	PIPC1	-	1%	99%	-	-	BATERIA DERQUI	-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI103	Cerrito 3287 e Isla Gran Malvinas	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
PI105	Libertad e Isla Candelaria	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
CN037	345 y 283	CN37	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	2	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	PSEUDOMONA AERUGINOSA [P-A/100ml]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudal									
OU076	Cno. G. Belorano y Av. Monteverde	OU36		1%	99%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Ausencia	Ausencia
OU139	Calle 866 Esq. D. Alvarez	OU07			100%				X	PUELCHE	4	Ausencia	0,0%	Ausencia	Presencia	Ausencia
OU141	Calle 867 Esq. Donato Alvarez	OU07		1%	99%				X	PUELCHE	3	Ausencia	173,2%	Presencia	Presencia	Ausencia

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
AB057	P. Echagüe y Serrano	AB14	-	1%	-	99%	-	PLANTA - AB057	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB061	Laprida Narciso 1900	AB23	5%	6%	89%	-	-		-	PUELCHE	2	4,2	83,5%	6,6	< 0,5	< 0,5
AB063	Laprida Narciso 3001	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB064	Juan B. Justo 2050	AB23	17%	6%	77%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB065	Juan B. Justo 2700	AB23	8%	-	92%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB066	Juan B Justo 2101	AB23	19%	45%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB067	Juan B. Justo 2802	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB068	Av. Ceballos (400) a 700 mts. de Avda. República Argentina	AB23	21%	27%	52%	-	-		-	PUELCHE	3	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB070	Francisco N. Laprida y Muesca	AB23	8%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB071	Narciso Laprida 2301	AB23	17%	69%	14%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB073	República Argentina 6670	AB23	6%	8%	86%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB074	Rep. Argentina y Juan B. Justo	AB23	14%	8%	78%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	AB23	9%	34%	56%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB076	Republica Argentina 7570 e/ Juan Jose Castro y Alice	AB23	20%	29%	51%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB084	Espoile s/n	AB23	3%	48%	49%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB085	Leyes y Romero	AB23	36%	16%	48%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB086	Romero y Calderón	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB087	Calderon 1251	AB23	24%	25%	51%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB088	Calderón 1851	AB23	53%	36%	11%	-	-	BATERIA GLEW	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB089	Calderón 3000	AB23	1%	98%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB090	Calderon 3400 1848	AB23	10%	14%	76%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB091	Calderon 3650 1848	AB23	15%	49%	36%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB092	Brigadier Calderón e/ Lezica y Young	AB23	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB093	Brigadier Calderón e/ Young y Av. Eduardo Holmberg	AB23	13%	19%	68%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB094	Romero 3800	AB23	1%	9%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB095	Lemos 3800	AB23	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB098	Rocha y J.A. Casacuberta	AB23	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB099	Fernando Lahille y M. Acosta	AB23	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB100	Gral. Cardenas y Almte. Irizar (Plaza)	AB23	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB101	Agustín Barrios y Virrey Cevallos	AB23	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB102	Martiniano Leguizamón entre 25 de Mayo y F. Alvarez	AB23	2%	1%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB105	Av. Juan B. Justo e/ AV. República Argentina y Av. Espora	AB23	4%	1%	95%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB106	Pablo Podesta y Orillia Rico	AB23	10%	85%	5%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB107	Fernando Ochoa y Juan Sarciore	AB23	19%	75%	6%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB108	Rufino Cordoba y Cesar Ratti	AB23	23%	75%	2%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB109	Luis Viale y Enrique de Rosas	AB23	12%	75%	13%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
AB110	Boulogne Sur Mer y Antonio Luis Beruti	AB23	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB601	King y Bouchard	AB04	55%	8%	37%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
AB728	B° Segba (D. Rocha y Paraguay)	PCAB728	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB103	MALVINAS ARGENTINAS y Dr. Chiesa	PCAB103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
AB096	Manuela Pedraza 1209	ABPC1	-	1%	-	99%	-	PLANTA RAYO DE SOL	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB097	Santiago del Estero 3075	ABPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE001	Las Heras y Guillon	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE002	Rivadavia y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE003	Origone y Arana	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE004	Las Heras y Chacabuco	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE005	Terrarosa y Colon	EEPC1	-	14%	86%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE015	Dorrego y Dreyer	EEPC1	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE027	Maipú y Colón	EEPC1	-	30%	70%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE028	Lavalle y Maipú	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE029	Lavalle	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE030	Lavalle	EEPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE031	Lavalle	EEPC1	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE032	Lavalle	EEPC1	-	10%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE033	Lavalle	EEPC1	-	66%	34%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE034	Maipú	EEPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE035	Ventura Avila	EEPC1	-	5%	95%	-	-	BATERIA LA LATA	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE036	Ventura Avila y Calle 13	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE040	Ventura Avila	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE041	Ventura Avila	EEPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE042	Ventura Avila	EEPC1	-	20%	80%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE043	Juana de Arco	EEPC1	2%	39%	59%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE044	Juana de Arco	EEPC1	-	11%	89%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE045	Juana de Arco	EEPC1	4%	5%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE046	Lavalle entre Tomquist y Brasgado	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE047	Martin Fierro a 700mts de S6	EE21	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE048	Martin Fierro a 700 m de Vazquez	EE21	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE057	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EEPC1	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE058	Avila Ventura 3000	EEPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE059	Avila ventura 3400	EEPC1	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE060	Los Claveles y General Las Heras	EEPC1	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE070	Colon y Maipú	EEPC1	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE064	Puan y Pablo Pizzurno	PCEE064	25%	2%	73%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE013	Cap. Lozano y Ascasubi	EE05	-	3%	-	97%	-	PLANTA - EE013	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EE065	Pedro Arocena y E. de Laperriere	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE066	Amado Nervo y San Pedrito	-	50%	20%	30%	-	-	BATERIA SANTA ISABEL	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EE073	Villegas esq. Colón	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE049	Martin Fierro y Vazquez	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE050	Vazquez a 700 m de Martin Fierro	EE21	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE051	Martin Fierro y Dolores	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE052	Martin Fierro a 1300m de E. Vazquez	EE21	-	46%	54%	-	-	BATERIA BAFICO	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE054	Martin Fierro y Dreyer	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE055	Dolores a 700 metros de Chiriguano	EE21	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE061	República de Costa Rica y Libertad	EE21	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE062	El Ceibo y Fraga	EE21	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EE063	Alvarez de Toledo y Miguel Angel	EE21	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EE006	Almafuerte e/Andrare y Obligado	EE03	39%	1%	-	60%	-	PLANTA BARRIO UNO	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EE007	R. Dario y M. Cane	EE03	1%	1%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EE038	Av. Tte. Gral. Morillas a 1000 mts de La Horqueta	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EE039	Tte. Gral. Morillas s/n - Villa Ntra. Sra. Del Rosario	EE03	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Caudal									
EEN001	Lago Garcia 3901 y Los Andes	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN002	Pedro Coni 3401e/Oliver y sanciniena	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN003	Palleros 1700 /S. Nicolas y Mte. Grande	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN005	Sansinena 601 e/ Huergo y 9 de julio	EEPC4	-	9%	91%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN006	Caseros 980 e/Huergo y 9 de Julio	EEPC4	3%	2%	95%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	1,4	1,4
EEN007	Sarmiento 2700 e/Tricotti y Barros	EEPC4	-	63%	37%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN008	Ing. Huergo 2500 e/Petraca y Sastre	EEPC4	5%	11%	84%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN009	Pto Deseado 601 e/Huergo y 9 de abril	EEPC4	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN010	Ing. Huergo 1600 1842	EEPC4	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN012	M.Alegre 992 e/Gomez y Vernet	EEPC4	-	1%	99%	-	-	POI 9 DE ABRIL	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN013	Tricotti 10 e/Malvinas y Barros	EEPC4	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	6,9	63,0%	9,9	1,4	1,4
EEN014	Cnel. D° Elia 190 e/Palleros y Constanzo	EEPC4	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	0,8	14,0%	0,8	1,4	1,4
EEN015	Constanzo 2090 e/P. Argentino y Rivero	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN016	Tierra del Fuego 179 e/Constanzo	EEPC4	15%	1%	84%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN018	Constanzo 1229 e/Guarany y Crespo	EEPC4	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	2	4,0	123,5%	7,4	1,4	1,4
EEN019	Prayones 3150 entre Palleros y Lopez	EEPC4	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN021	Rebizo 1100 e/ Fair y Crespo	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	0,5	4,1%	0,5	1,4	1,4
EEN026	M.Alegre 1720 e/Alegre y Urquiza	EEPC4	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN059	Enrique Banch y Rebiza	EEPC4	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	0,7	45,2%	1,0	1,4	1,4
EEN020	Sansinena 105 e/ Doclout y Constanzo	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN022	Sansinena e Vernet y Benavidez	EEPC4	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	1,8	44,4%	2,3	1,4	1,4
EEN023	Benavidez 3190 e / F.Lopez y Scaglia	EEPC4	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	1,4	1,4
EEN027	Fernadez y Dicio	EE23	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN028	Rivero y Chimondegui	EE23	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN029	Av. Fair y Primera Junta	EE34	-	22%	78%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEN030	Cervetti y Av. Fair	EE34	-	1%	99%	-	-	BATERIA CORREO ARGENTINO	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEN031	Cervetti y La Horqueta	EE34	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEN032	Av Fair e Islas Trinidad	EE34	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEN033	Urbano González e Independencia	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN034	Alberto Grande a 38m de las vias	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN035	Casacubierta e/Valette y Gonzalez	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN036	Lima e/Valette y Francia	EE31	8%	2%	90%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN037	Cepeda y de los Constituyentes	EE31	-	46%	54%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN038	Lago Garcia y Cepeda	EE31	-	23%	77%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN039	Cepeda y Alberto Grande	EE31	1%	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN040	Lago Garcia a 50m de Valette	EE31	-	1%	99%	-	-	BATERIA SANTA CATALINA	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN041	9 de Abril e/Valette y Wieman	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN042	Las Talitas e/Sarmiento y M. Alegre	EE31	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN043	Avellaneda e/Trangoni y C. Monte Grande	EE31	64%	36%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEN044	Bruzzone e/Foz y Gonzalez	EE31	1%	1%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	15,0	56,6%	21,0		
EEN045	Bruzzone e/Tte. Alberto Grande	EE31	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5		
EEN046	Bourguet e/ Amoghino y Gabaston	EE31	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	0,5	4,1%	0,5		
EEN047	Juan M. de Rosas t Tte. Gabaston	EE31	9%	13%	78%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5		
EEN048	Robertson e/ J. Newbery y T. Matienzo	EE31	1%	4%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	0,5	6,7%	0,6	-	-
EEN049	J. A. Roca y Est. Los Remedios	EE29	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEN050	Los Robles y T. A. Edison	EE29	30%	5%	65%	-	-	BATERIA SAN IGNACIO	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5		
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	EE29	27%	0%	73%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5		
EEN052	20 de Junio y L. Lopez	EE29	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5		
EEN053	Cichero 700 e/ Hipolito Bouchard y Julio Argentino Roca	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEN054	Destacamento Melchior 733	EEPC5	-	-	100%	-	-	BATERIA LA MORITA	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEN056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	EEPC5	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEN058	Fray Luis Beltran 1415	EEPC5	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	0,5	4,1%	0,5	< 0,5	< 0,5
EET001	Falucho y Las Dalias	EEPC2	-	81%	19%	-	-	BATERIA TRISTAN SUAREZ	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EET004	Av. Saenz Peña y Bogado	EEPC2	-	75%	25%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEU001	Maipu 800 e Bransen Hussay B.	EE20	-	25%	75%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEU002	San Bernardo 980 e/ Balcarce P Moreno	EE20	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEU003	Los Robles al 5000	EE24	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEU004	Los Robles al 5700	EE24	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEU005	S.Cabral a 200mts de Lacarra	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEU006	S.Cabral 3588 a 700 m de EEU005	EE26	-	62%	38%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEU007	S.Cabral a 700mts de EEU006	EE26	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEU008	Sgto Cabral 5149 e/ Gral. Antonio Gonzalez y Jose Alvarez Condarco	EE26	2%	2%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	EE26	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEU011	Sgto. Cabral a 700 m de EEU010	EE32	-	45%	55%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEU012	Calle s/n a 700 m de Sgto. Cabral	EE32	-	99%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	EE32	-	35%	65%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEU014	Juana de Arco a 700 m de S20	EE24	-	51%	49%	-	-	BATERIA UNION	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEU015	Lacarra y 9 de Julio	EE32	-	33%	67%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEU016	Av. Maipu 40 esq. RP58	EE32	-	84%	16%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEU017	Av. Maipu 40 esq. RP59	EE32	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEU018	Andromaco 80 e/ Jose Champagnat	EE32	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEU019	Montes de Oca 80 e/Ruta Prov 58 y Jose Champagnat	EE32	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEU020	Vieytes 9 entre Mariano Castex y José Champagmat	EE32	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEU021	Sobre Sargento Cabral a 700m del EEU011	EE32	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEU022	Juana de Arco S/N	EE32	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEU023	Los Robles 249	EE32	-	76%	24%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
EEU025	Sgto. Cabral a 100 mts de Cáceres	EE32	-	19%	81%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEU026	Juana de Arco N° 7100	EE32	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
EEZ001	Río Bermejo y Río Gualeguay	EE28	-	3%	-	97%	-	PLANTA LA CELIA	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ002	Río Bermejo y La Atómica	EE28	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ003	Las Hortensias Norte	EE22	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EES001	25 de Mayo 2371	EZPC1	100%	-	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EES004	Rosario y Palacios	EZPC1	16%	4%	80%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ006	Caminito 1200	EZPC1	31%	52%	18%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ007	Caminito 1900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ010	Paso de los Libres 1800 e Islas Cook	EZPC1	41%	1%	58%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ011	Falucho y Paso de los Libres	EZPC1	24%	7%	68%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ012	Paso de los Libres a 700m de Falucho	EZPC1	18%	1%	81%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ013	Paso de los Libres 1400	EZPC1	39%	1%	61%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ014	Paso de los Libres 1500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ015	Paso de los Libres a 1700 mts de RP N°52	EZPC1	27%	1%	73%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
EEZ016	Mariano Moreno a 200m de Falucho	EZPC1	15%	48%	37%	-	-	BATERIA EZEIZA	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ017	Moreno 3500	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ018	Paso de los Libres 900	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ019	Ruta Provincial N°52 4000	EZPC1	25%	1%	75%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ020	RP N° 52 1000	EZPC1	34%	7%	59%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ021	RP N° 52 1200	EZPC1	25%	2%	73%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ022	RP N° 52 s/n	EZPC1	4%	23%	72%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ023	RP N° 52 1300	EZPC1	6%	1%	91%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ024	Ruta N°52 kilómetro 2	EZPC1	5%	3%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ025	Fariña 2000	EZPC1	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ026	Valle de Río Negro y América del Norte (PA.Ezeiza)	EZPC1	-	-	100%	-	-		-	HIPOPUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ027	Cañada de Gomez y 25 de Mayo	EZPC1	16%	17%	67%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ028	Quito y Arroyo	EZPC1	11%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ029	Valle de Río Negro y América del Norte	EZPC1	14%	9%	77%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ030	D. F. Sarmiento y Roger Balet	EZPC1	34%	18%	49%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
EEZ031	Roger Balet y Sargento Cabral	EZPC1	14%	17%	69%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
EEZ032	Valle de Río Negro y 25 de Mayo	EZPC1	22%	52%	27%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
ES022	Scalabrini Ortiz e/Ing. Pablo Marin y 1° de Mayo.	PCES022-24	-	4%	-	96%	-	TANQUE FONAVI	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ES023	Islas Malvinas e/Constituyentes y Pablo Marin.	PCES022-24	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ES024	Scalabrini Ortiz y Av. Patricias Argentinas.	PCES022-24	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV002	San Martin y San Juan	FV-TAN-CEN	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV003	Constitución 198	FV-TAN-CEN	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV004	Carriego y Alem	FV-TAN-CEN	-	53%	-	47%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV005	San Martin y Defensa	PCFV005	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	PCFV006	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV007	Caribonti N° 2351 e/ Chaco y Rosario	PCFV007	-	14%	86%	-	-	-	x	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV009	Caribonti y Rio Bermejo	PCFV009	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV011	Corrientes esq. 12 de Octubre	PCFV011	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV013	Av.Bélgica N° 1101 esq. Jorge Novak	PCFV013	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV014	J.D. Perón 535 y Pringles	PCFV014	-	-	100%	-	-	-	x	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV018	Av. Eva Perón y Gral. Hornos	PCFV018	-	3%	97%	-	-	-	x	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV019	Río Caraguata n° 1401 y Directorio	PCFV019	-	2%	98%	-	-	-	x	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV020	Cabildo y Eva Perón	PCFV020	-	1%	99%	-	-	-	x	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV021	Mantovani y Calle 1407	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO SARMIENTO	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV022	Juan Mantovani 587 e/ C.1423 y C. 1409	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV023	Mantovani y Calle 1429	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV025	Calle 1423 (901) a 400 mts de Mantovani	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV040	1439 y Juan Mantovani.	FV-TAN-CRU	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV064	C. 1439 e/ C.1420 y a 300 mts de Juan Mantovani	FV-CIS-SAR	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV065	Eva Perón N° 9695 y C. 1423	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV066	Avenida Eva Perón y Calle 1352	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV084	1610 e/RP 53 y 1647	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV085	1653 e/Av. La Plata y A° Las Conchitas	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Suecia	PCFV112	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV120	Calle 1404 N° 498 e/ R.P. 53 y campo	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV121	Av. Gral. Savio N° 598 esq. Sicilia	FV-TAN-MAY	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV124	E.B. SARMIENTO	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV132	Calle 1426 esq. 1437 – B° San Francisco Grande (oeste)	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV147	Av. La Plata 50	FV-CIS-SAR	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV149	Av. La Plata y Calle 1305	FV-CIS-SAR	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV156	Calle 1433a y 1418	FV-CIS-SAR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV157	Calle 1443 y 1430	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV158	Calle 1440 a 400m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV159	calle 1440 a 1000m de 1430	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV160	calle 1452 y RP53	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV166	Calle 1440 y 1455	FV-CIS-SAR	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV024	Eva Peron y Calle 1409	FV-CIS-SL	-	22%	78%	-	-	REBOMBEO SAN LUIS	-	PUELCHE	3	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV036	Calle 1422 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV037	Calle 1432 N° 901 y Eva Perón	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV041	Calle 1335 N° 801 y 1328	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV042	Calle 1316 y 1333	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV045	Los Inmigrantes y Calle 1355	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV050	Av. Eva Perón N° 7700 e/1310 y Cacheuta	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV087	1364 N° 1082 esq. 1317a	FV-CIS-SL	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV088	1327 N° 3201 e/ 1364 y 1370	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV089	1356 N° 1700 e/ 1347 y 1349	FV-CIS-SL	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV086	1374 N° 900 esq. 1313	FV-CIS-SL	-	28%	72%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV092	1345 e/Av. La Plata y 1364	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV104	Calle 1363 N° 100 y Los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV116	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	FV-CIS-SAR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV130	Calle 1341 N° 511 esquina calle 1310	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV134	Los Inmigrantes y calle 1363	FV-CIS-SL	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV143	Calle 1328 y 1355	FV-CIS-SL	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV177	Calle 1347 a 58 mts de Av. De los Inmigrantes	FV-CIS-SL	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV026	Calle 77 y Posadas	FV02	-	2%	98%	-	-	BATERIA SAN NICOLAS	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV027	El Zonda y El Gaucho	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV028	Riobamba N° 1501 y Olivero	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV029	Pte. Illia y Alvear	FV02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV097	Castelli N° 1001 esq. EE.UU	FV02	-	43%	57%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV152	El Apero entre Calle 437 y El Malambo	FV02	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV174	Castelli esquina EEUU de América	FV02	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	FV-TAN-MAY	-	12%	-	88%	-	TANQUE MAYOL	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV031	Virgen del Valle y El Clavel	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV032	Virgen del Valle y La Ancianidad	FV-TAN-MAY	-	23%	-	77%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV033	Virgen del Valle y Río Pilcomayo	FV-TAN-MAY	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV034	Av Cacheuta y Boston	FV-TAN-MAY	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	FV-TAN-MAY	-	11%	-	89%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV053	Cacheuta 2701 y Calle 1353	FV-TAN-MAY	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV063	Av Eva Perón 5880	FV-TAN-MAY	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
FV038	Calle 1423 e/ 1422 y 1428	PCFV038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV046	Batalla de Ituzaingo 2780 e/ Contreras y C.214A	PCFV046	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV047	Boedo e/ Montserrat y Túnez	PCFV047	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV048	León XIII e/ Pte. Perón y Beirut	PCFV048	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV049	San Antonio e/ Irala y Alvar Cabeza de Vaca	PCFV049	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV051	Cacheuta 3601 y 1371	PCFV051	-	31%	69%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV055	Calle 832 e/M.Grass y Piedrabuena (V.A.)	PCFV055	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV057	Virgen del Valle N° 2599 y Chaco	PCFV057	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV058	Juan B. Justo y Arcasubi	PCFV058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV059	Av.Bosques y Ruta 36	PCFV059	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV060	Delgado y Cafferatas	PCFV060	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV062	Calle 740 y El Clavel	PCFV062	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV067	Calle 1108 N° 1702 e/ 1131 y 1139	PCFV067-70	-	23%	77%	-	-	BATERIA ING. ALLAN	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV068	Calle 1108 N° 2280 esq. 1139	PCFV067-70	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV069	Diag. Los Quilmes N° 500	PCFV067-70	-	27%	73%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV070	Calle 1108 N° 2300	PCFV067-70	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV148	Calle 153a 301	PCFV148	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV167	Calle 1145 y Calle 1122	PCFV067-70	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV071	San Nicolás N° 2501 y Chaco	PCFV071	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV072	Finochietto N° 1411 y Fracción V	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO CRUCE VARELA	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV073	C.O.Cruce	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV074	Carlos Gardel N° 700 y Campichuelo	FV-TAN-CRU	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV142	Dardo Rocha y Cerro Famatina	FV-TAN-CRU	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV078	Bruselas y Polonia	PCFV078	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV079	Bruselas y Bulgaria	PCFV079	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV080	517 N° 1700 y Portela	PCFV080	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV082	El Paisano N° 1899 e/445 (B° Don José Planificado)	FV-TAN-P82	-	1%	99%	-	-	BATERIA DON JOSE PLANIFICADO	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV131	El Malambo N° 105 esq. La Tranquera	PCFV131	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV165	Calle Monteverde e/445 y 449	PCFV165	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV090	Av. La Plata N° 1200 e/1327 y 1319a	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-	BATERIA LAS COLONIAS	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV093	1681 esq. 1608	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV094	1364 N° 2592 e/ 1371 Y 1357	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV144	La Plata 1700	PCFV090-94	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV146	Calle 1353 4100	PCFV090-94	-	7%	93%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV176	Calle 1608 entre 1671 y 1673	PCFV090-94	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV095	Pisani N° 1101 esq. Suecia	PCFV095	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV096	Humahuaca N° 501 y 511	PCFV096	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV098	Cno. Touring Club N° 1499 y Canalejas	PCFV098	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV100	228-Gral Perón N° 1501 y Bs. As.	PCFV100	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV102	V.Abrille N° 975 casi esquina Calle 519	PCFV154	-	6%	94%	-	-	BATERIA SAN JORGE	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV154	La Paloma y calle 560	PCFV154	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV103	Cicilia N° 2020	PCFV103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV105	Calle 527 e/ 554 y 554A	PCFV105	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV106	Calle 554 N° 1103 e/ Diag. Jarilla	PCFV106	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV108	Calle 1348 N° 1003 e/ 1317 Ay 1319 A - (B° San Francisco Este)	PCFV108	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV109	Calle 1435 N° 1719 esq. 1434 - (B° San Francisco Oeste)	PCFV109	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV110	Las Lengas N° 2303 e/ El cardenal y El Zorzal - (B° Santa Inés)	FV01	-	7%	93%	-	-	BATERIA GOBERNADOR COSTA	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV111	Los Alamos N° 2502 e/ Av. Blas Parera y El Homero - (B° Santa Inés)	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV150	El Ñandú e/ Las Casuarinas y Los Alamos	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV151	Los Lapachos y Tinkunaku	FV01	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV161	Los Laureles y El Cardenal	FV01	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV162	La Paloma y Los Sauces	FV01	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV163	El Mirlo entre Los Olivos y Los Lapachos	FV01	-	6%	94%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV113	Bonn N° 1203 y Austria	PCFV113	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV114	Calle 531 N° 2200	PCFV114	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV115	Progreso 2190 e/ Intendente Jose Luis Cariboni y virgen de valle	PCFV115	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV117	Lourdes N° 402 y Ruta Prov. N° 53	PCFV117	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV119	Suecia N° 1601 esq. Lisboa	PCFV119	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV122	Copenhage N° 502 esq. Alemania	PCFV122	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV123	Calle 172 - Río Negro N° 1790 esq. Alvarado	PCFV123	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,6	1,6
FV125	Bourel y Chacabuco	PCFV125	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV126	Riobamba y Vías	PCFV126	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV127	Calle 1151 Ay Calle 1130	PCFV127	-	46%	54%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV128	Río Diamante N° 3080 esquina Villegas	PCFV128	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV129	Río Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	PCFV129	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV133	Calle 1151 y Calle 1118	PCFV133	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV137	San Geronimo 605	PCFV137	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV138	Campana y Esmeralda	PCFV138	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV139	Guamini 2711	PCFV139	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV140	San Martin y Monteagudo	PCFV140	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	0,8	0,8
FV141	Alfonsina Storni 74	PCFV153	-	2%	98%	-	-	BATERIA BARRIO ALTAMIRA	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV153	Florida y Miguel Cané	PCFV153	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV145	Av. Cacheuta entre Calle 1363 y Calle 1371	PCFV145	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV164	calle 1155 y 1138	PCFV164	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV168	Calle 1149 y Calle 1136	PCFV168	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV169	Calle Jacinto Benavente y E, D Amicis	PCFV059	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV175	Santa Lucia y Aconquija	PCFV118	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
FV178	Av. Bosques y calle 819	PCFV178	-	50%	50%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
FV183	Remedios de Escalada esquina Carmen de Areco	PCFV183	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV184	Turquia, entre Bruselas y Milán	PCFV184	-	6%	94%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
FV191	Rumania entre París y Paysandú	-	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	4%	-	96%	-	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU002	Colombia 1007 e/Av. De las Americas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU005	Bogado 800 e/Islas Malvinas.	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU007	Republica Argentina 578 e/Venezuela.	GU-TAN-PED	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU008	Brasil 103 e/Pedraza.	GU-TAN-PED	-	7%	-	93%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU020	Remedios de Escalada e/Tomas Guido y Godoy Cruz	GU-TAN-PED	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU031	Brasil y Mesopotamia	GU-TAN-PED	-	17%	-	83%	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
GU032	Avenida 38 entre calle 5 y 6	GU-TAN-PED	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
GU010	Violeta Antier 5095 e/Santos Discepolo.	PCGU010	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU011	Alfonso Amat 4611 e/Jose Negiia.	PCGU011		100%					X	PUELCHE	-					
GU012	Calle 117 1000 / Av. C. Mereles 1050 e/calles 118 y 120.	GU-TAN-YA	3%	1%	-	96%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU013	Calle 118 N° 1633 e/calles 121 y 123.	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU014	Cjal. Capuano 490 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU015	Calle 118 2041 e/calles 127 y 129.	GU-TAN-YA	-	2%	-	98%	-	TANQUE ESTE - LA YAYA	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU016	Calle 118 2471 e/calles 133 y 135.	GU-TAN-YA	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU017	Av. 139 N° 510 e/Cjal. Bracco.	GU-TAN-YA	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU023	Calle 103 y Calle 124	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU024	Calle 116 y Av. 99	GU-TAN-YA	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU018	Av. 21 N° 1099 e/calle 36.	GU01	-	3%	97%	-	-	BATERIA LAS LOMAS	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU019	Cjal. Placido Bajo N° 901 e/ calle39.	GU01	-	-	100%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU006	Av. Nestor Kirchner 630 e/Avellaneda y Güemes.	GU02	1%	25%	74%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU021	Roque Saenz Peña y Santa Elena	GU02	-	1%	99%			BATERIA B° SANTA MAGDALENA	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU022	Dorrego y Luis A. Testa	GU02	2%	12%	86%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
GU025	Calle 6 y Tte. Juan Domingo Baldini	PCGU025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
GU026	Kingston y Honduras		10%	89%	1%					PUELCHE						
GU027	Brasilia y Guayanas	-	2%	89%	9%			BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	-	PUELCHE	-				-	-
GU028	Puerto España y Brasilia	-	10%	89%	1%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
GU029	Gral Paz esicalle 7 y Lib. Gral J. de S.Martin		11%	89%						PUELCHE						
GU030	La Rioja e/ Av. Hipólito Yrigoyen y Sarmiento	-	11%	89%				BATERIA NUMANCIA		PUELCHE						
JCP002	Wilde 4573 e/Corbeta Uruguay y Fragata Sarmiento	JCP-TAN-PR	-		-	100%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
JCP003	Av. Deqiue e/ Av. Pres. Hipólito Yrigoyen	JCP-TAN-PR				100%		TANQUE PRIMAVERA	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
JCP005	Las 3 Marías 5700 e/ Av. Jose Alube y Jose C. Paz	JCP-TAN-PR	-	1%		99%			-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
JCP006	Calle Pampa de Junin a 50 m de Yrigoyen	JCP-TAN-PR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0046	Ferro Nuevo y Guanabara	LM003	100%						X	PUELCHE						
LM0047	Colect.R3 v Huillanimv.B° Playa Lebor.	LM003	100%						X	PUELCHE						
LM0049	Escribano y Colden B°El Pino	LM027	100%						X	PUELCHE						
LM0053	Haidi v Galileo - Haidi v Torres	LM008	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0054	Luciano Torres N° 600 y Sermón Perez B° San Enrique	LM008	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0056	Guanacache y Pino B° Recoleta	LM007	72%		27%				X	PUELCHE					< 0,5	< 0,5
LM0060	Huemul y Rodney B° Maria Elena	LM002	-	100%	-				X	PUELCHE						
LM0064	Urdaneta y Rodney B° Maria Elena	LM002	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0066	M.Garrido e/ Colegiales (Ec.Colegiales y M. Becerra)	LM011	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0070	M.Garrido e/ S. Favardo y Rocamora B° 17 de Octubre	LM011	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0072	J. De Alvado y Solá. Favardo B° 24 de febrero	LM011	-	2%	98%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0073	J. De Alvado y Solá. Favardo B° 24 de febrero	LM014	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0074	Echauri N° 3200 e/ J.B.Justo y Vidal	LM014	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0075	Lavalleja y Conde	LM026	-	2%	98%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0076	N de Balboa y Lujan.	LM026	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0077	Castellon y Rio Cuarto B° El Porvenir	LM009	-	2%	98%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0078	Zequeira garcia E/ Favardo y Rocamora	LM002	-	-	100%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0079	Urdaneta y Rocamora (E/ T de Rocamora y Del Tejar)	LM002	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0081	Echauri e/ Ortega Zarini Villa Scasso	LM014	-	-	100%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0083	Quiero N° 900 E/ Riva 21 /Cleno V/Draqones	LM024	10%	1%	89%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0085	Martinez y Lasalle	LM024	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0087	Reseno e/Acaseso y Alagon	LM011	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0094	A. Vivas 700 y Guanabara E/ Guasayan y Morris B° Playa Lebor.	LM003	96%	2%	2%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0095	Mantequeras N° 6100 e/Huenanco y Acode	LM004	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0096	M.Herrero e/ Guanacache y Eder - B° el Tobin	LM003	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0098	E. Clay del Miradory Pueyo.	LM024			100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0099	Hugo West e/ Madreselva y milamores.	LM029	98%		2%				X	PUELCHE	-				< 0,5	< 0,5
LM0101	Scavia y Gallardo.	LM027	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0108	Lavalleja N° 6100 e/ Alegria y Arcon	LM010	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0109	Gamay y Peron	LM024	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0112	Fernandez y Leguiza B° Candiles	LM008	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0118	El Reseno 3351/e1 Ortega v Zequeira.	LM046	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0121	L. Da Vinci 4000	LM009	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	1,0	23,0%	1,0	< 0,5	< 0,5
LM0123	Tinogasta y Colegiales	LM009	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0124	Mercos Pacy Colegiales	LM047	84%	16%	-				X	PUELCHE	-				-	-
LM0125	Corrales Pte N° 1100 y Espejo	LM003	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0126	Ancon al 3564 esquina Jinny	LM026	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0127	Castin 4000 esq. J.B. Justo	LM009	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0139	Caseravalle 3000 e/ Simoni Perez y Rivas	LM008	-	100%	-				X	PUELCHE	-				< 0,5	< 0,5
LM0140	Castro e/ Cepeda y Saraboa	LM026			100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0143	Scavia y Arcon	LM025	100%						X	PUELCHE	-				< 0,5	< 0,5
LM0146	Draqones y Reseneno	LM008	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0158	Almacro y Agoge	LM045	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0161	Ayax, Mouvet y Bacon - Lopez Fte N° 5900	LM016	-	2%	98%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0164	Saenz y Oviedo	LM008	-	4%	96%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0170	Ancon y Alegria E/ Fournier	LM016	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	0,6	18,4%	0,7	-	-
LM0172	J.F.Echauri y Donuerb E/ Alagon	LM009	-	3%	97%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0175	Baez v Bavio	LM016	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LM0177	Baez y Barrientos	LM034	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	0,6	14,0%	0,6	0,8	0,8
LM0179	Coronel Conde e/ Martinez Villena y Martin Coronado	LM048	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	1,9	1,9
LM0180	Machain esq. Puerto Argentino.	LM008	-	3%	97%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0187	Dpto Argentino y Cons. del Valle	LM026	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0189	Leones Entre Garay y Conde	LM026	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0191	Icalma esq. M. Arias	LM026	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0192	Tidoal entre Barrientos y Baranaan.	LM048	-	-	100%				X	PUELCHE	2	0,9	9,8%	0,9	1,8	1,8
LM0193	Jachal esq. Juan Pio Gana.	LM048	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,9	1,9
LM0195	Escauza entre Iguazu y Gallardo	LM026	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0197	Scavias e/ Villanueva y Monoeo	LM025	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0198	Enrique Clay y M. Doello	LM051	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LM0957	Guevnos 127/16 E/ San Ignacio y San Juan	LM004			100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LO025	M. Piaggio y Olideri	LO05	64%	2%	33%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5		
LO042	Santa Lucia e H.Yrigoyen	LO01	-	1%		99%		PLANTA - LO042	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO067	De la Peña y Moldes	LO04	-	-	-	100%	-	PLANTA - LO067	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO072	Timbó y Cap. Moyano	LOPC1	-	2%	-	98%	-	PLANTA - LO072	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO078	Arenales a 100m de J. Ingenieros	LOPC1	-	9%	91%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO079	Arenales a 300m de L.M.Drago	LOPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO080	Juan xxiii 2400 entre L.M.Drago y Bahia Blanca	LOPC1	-	13%	87%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO081	L.M.Drago y Melian	LOPC1	3%	77%	21%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO118	Martin Rodriguez y Timbó	LOPC1	1%	14%	85%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO119	Tala y Pino	LOPC1	3%	3%	94%				-	PUELCHE	3	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO121	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	-	19%	81%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO125	Av. Argentina y Guido	LOPC2	-	37%	63%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO126	Av. Argentina	LOPC2		79%	21%			BATERIA LLAVALLOL	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO133	Av. Argentina y Junin	LOPC2		50%	50%				-	PUELCHE	-				16,0	16,0
LO138	Junin 170 entre Rodriguez y Las Heras	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO139	Amat y Petinbi	LOPC1		11%	89%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO140	Av.Argentina 2950 y Peiribi	LOPC1	-	5%	95%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO141	Rodriguez 3507 esq Mercedes	LOPC1	-	12%	88%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO142	Jose Ingenieros 1668 e/ Calferata Norte y Juan XXIII	LOPC1		20%	80%				-	PUELCHE					< 0,5	< 0,5
LO146	Calle Pintos 2007 e/ Viel y Florida	LOPC1	-	4%	96%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO147	Calle Magnolia 2099 e/ Moreno y V.Barbieri	LOPC1	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO148	Magallanes 2600 entre Ucrania y Duhalde	LOPC1		1%	99%				-	HPOPUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
AB019	Combatientes MALVINAS_ARGENTINAS y Pilar	LOPC2	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
AB060	Tiglio y Policastro	LOPC2	-	8%	92%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO083	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	1%	1%	99%				-	PUELCHE					16,0	16,0
LO084	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	LOPC2	-	2%	98%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO085	L.M.Drago e/Cno las Flores y Fonrouge	LOPC2	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO086	Cno de las Flores a 500m de Drago	LOPC2		2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO087	Cno de las Flores y MALVINAS_ARGENTINAS	LOPC2	-	3%	97%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO093	Cno San Vte a 500m pozo 87	LOPC2	3%	12%	85%	-	-	BATERIA BURZACO	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO106	J. B. Justo y Cuyo	LOPC2	65%	5%	30%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO117	Mendoza y N. Silva	LOPC2	-	2%	98%				-	PUELCHE	2	0,5	9,3%	0,6	16,0	16,0
LO122	J. Ingenieros	LOPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	LOPC2	2%	23%	75%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	16,0	16,0
LO144	Avenida Argentina y RP N° 16	LOPC2	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO145	Villarino y Avenida Argentina	LOPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO149	Rene Vallo y Jose Melián	LOPC2	67%	-	33%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	16,0	16,0
LO095	Larrea y Gardel	AB14	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO113	Leloir 432	LO38	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LO120	Pino y el Cairo	LOPC1	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO127	Jose Marmol e/Allemandi y Anchorena	LO47	-	1%	-	99%	-	PLANTA - LO127	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO128	Marti y Av. Cabred	LO13	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
LO134	Larrea y Colihue	AB14	-	6%	-	94%	-	PLANTA - LO134	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO135	Matienzo y Rodriguez	AB22	1%	2%	-	96%	-	PLANTA - LO135	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
LO152	Necochea esquina Lujan	-	-	100%	-	-	-	PLANTA - LO152	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA002	Ambrosetti 1900 e/Beltran y Martin Fierro.	MAPC1	-	21%	79%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MA003	ALMIRANTE_BROWN 2500 e/Viena y Rep. Argentina.	MAPC1	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MA004	Asamblea 1800 e/11 de Septiembre.	MAPC1	1%	2%	98%	-	-	BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MA006	Viena e/Canning.	MAPC1	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MA018	Olden entre 11 de Septiembre y Juan Cruz Varela	MAPC1	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MA009	Cangallo 1200 e/San Lorenzo y Uspallata.	PCMA009	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MA010	Uspallata 1000 e/Soller y O´Brien.	PCMA010	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MA011	Stoppler 800 e/Bat. de Maipu y Paso de los Andes.	PCMA011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MA012	San Lorenzo y Seguí	PCMA012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MA016	Canadá 748 y Seguí	MAPC2	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MA017	Palacios y Seguí	MAPC2	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME001	25 DE MAYO E/PUEYRREDON	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME003	25 MAYO E/ 9 DE JULIO	ME-TAN-CES	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME004	BROWN E/ CENTENARIO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME006	BROWN E/ CARLOS PELEGRINI	ME-TAN-CES	-	6%	-	94%	-	TANQUE MERLO	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME007	BROWN E/ M.BRAVO	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME015	9 DE JULIO E/ SAN LORENZO	ME-TAN-CES	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME016	SAN LORENZO E/CANNING	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME060	SAENZ PEÑA Y AV. CALLE REAL	ME-TAN-CES	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME005	25 MAYO E/ J.M Castro ex Pearson	ME02	75%	-	25%	-	-	BATERIA PARQUE SAN MARTIN NORTE	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME014	BROWN E/PIZURNO	ME02	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME008	LIBERTAD E/ ARGENTINA Y PUCHEU	PCME008	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
ME009	COVIPOL. EDIF 38. ROSSI Y ECHEVERRY	PCME009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME010	COVIPOL. EDIF 13. ROMAY Y ZUNDA	PCME010	100%	-	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME017	DEFENSA E/BARAVINO Y HORTIGUERA	PCME017	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME018	OYUELA E/FRIAS Y RUTA 200	PCME018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME019	PEDRIEL E/ TALA	PCME019	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME020	INDEPENDENCIA E/ SULLIVAN	PCME020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME021	ESNAOLA Y BOYACA	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME022	ESNAOLA Y BACH	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME023	AV.ARGENTINA Y CHOPIN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-	TANQUE LOMA GRANDE	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME025	AV.ARGENTINA E/GAVILAN	ME-TAN-LOM	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME081	Strauss y Juan Sebastian Bach	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME087	Av. Argentina y Lezama	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME090	Angel Rodriguez y Curapaligue	ME-TAN-LOM	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME026	TUNUYÁN E/AREVALO	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME027	VIDT E/ FEBAL	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME028	VIDT E/DEMOCRACIA	ME-TAN-REC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME029	VIDT E/CHAGAS	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-	TANQUE RECONQUISTA	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME030	VIDT E/F.AMATINA Y DESSY	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME063	FILIBERTO Y TARIJA	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME079	Antofagasta y Fraga	ME-TAN-REC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME082	Cacheuta y José Marti	ME-TAN-REC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME031	GARDEL E/PAYRÓ	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME033	VIDT E/DISCEPOLO	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME034	VIDT E/VACCAROS	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME035	VIDT E/MEDMA	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-	TANQUE ARCO IRIS	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME068	JOSE MARTI Y DALTON	ME-TAN-ARC	-	6%	-	94%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME088	Lorenzini entre Deán Funes y Fraga	ME-TAN-ARC	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME091	P.Echague y P. Podestá	ME-TAN-ARC	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME092	Carcaselio entre Cassaux y Orfila Rico	ME-TAN-ARC	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME102	Fraga y Dávila	ME-TAN-ARC	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	PCME036	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	0,8	0,8
ME037	AMADO NERVO E/ANCON Y AMPERE	ME-CIS-PSM	-	18%	82%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME038	LOS ALELIES Y TILCARA	ME-CIS-PSM	-	4%	96%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME039	LOS ALELIES E/TILCARA Y AGUARIBAY	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME040	LOS JACINTOS E/ETIOPIA	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME041	ACHALA E/ LAS RETAMAS	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME045	ALVAREZ JONTE E/ LOS ALELIES	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME046	LAS RETAMAS E/JURAMENTO	ME-CIS-PSM	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME047	ALVAREZ JONTE E/ LOS GERANIOS	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME048	ALVAREZ JONTE E/LAS DALIAS	PCME048	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME049	GABRIELA MISTRAL E/ALTE BROWN	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME051	GENDARMERIA GURRUCHAGA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME053	ZARRAGA E/ GAGUERRE Y PEDERNERA	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME054	ZARRAGA E/ GAVILAN	ME-CIS-PSM	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME058	12DE FEBRERO	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME076	El Hornero 3710	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	HP/PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME086	Garmendia y Almte. Brown	ME-CIS-PSM	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME042	GENDARMERIA E/ FLORES A.	PCME042	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME050	GABRIELA MISTRAL E/BENOIT	PCME050	-	2%	98%	-	-		X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME055	PUEYRREDON Y O'BRIEN	PCME055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
ME056	SAN ANTONIO Y PARAGUAY	PCME056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME057	CHACO N° 310 E/DIRECTORIO Y NOGUERA	PCME057	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME059	GABRIELA MISTRAL Y ALPATACAL	PCME059	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME061	SAENZ PEÑA Y AV. RIVADAVIA	PCME061	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	PCME065	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA T SOLANET	PCME066	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
ME067	TRAFUL Y BLANCO ESCALADA	PCME067	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME069	ATAHUALPA Y PEDRO CHUTRO	PCME069	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME070	TUCUMAN Y LA RIOJA	PCME070	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME073	SARMIENTO 2398 Y LA HABANA	PCME012-73	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	PCME074	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME075	MEDRANO 811 Y SANTA FE	PCME075	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME078	Garay 1753	PCME078	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME080	Federico Lacroze y Matterras	PCME080	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	ME01	-	-	100%	-	-	POI MERLO	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	ME01	2%	-	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME089	Curapaligüe y 25 de Mayo	PCME089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME093	Morse y Av. del Bicentenario	PCME093	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME094	Brasil y Guardia Vieja	PCME094	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME095	Sullivan y Sargento Cabral	PCME095	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME096	Gral Ocampo y T Saley	-	-	100%	-	-	-	BATERIA PONTEVEDRA	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME097	Orán entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME098	Tasso y Oran		-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME099	De Roma y Necochea		-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME100	Republiquetas entre Av. de La Union y De Roma	-	-	100%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
ME101	Juan A Maza y Dr Ricardo Raúl Alfonsin	PCME101	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
ME103	Los Arrieros y San Martin	PCME103	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
ME113	EVA PERON E/PELLEGRINI	PCME113	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M001	Belgrano 400 e/Vicente Lopez y C. Malnatti.	MIPC2	-	-	-	100%	-	CAG SAN MIGUEL ESTE	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	0,9	0,9
M020	Julio A. Roca 216 e/Dorrego y Roseti.	MIPC2	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	0,9	0,9
M035	Pavon 1100 e/R. Peña y Sgto. Cabral.	MIPC2	-	-	-	100%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	0,9	0,9
M002	Julio A. Roca 800 e/Serrano y Muñoz.	PCM0002	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M003	Italia 1300 e/Francia y L. N. Alem.	PCM0003	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	8,6	21,6%	9,7	1,3	1,3
M006	Pardo 400 e/San Luis y C. Malnatti.	PCM0006	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M007	Julio A. Roca 1900 e/Gelly Obes y Zuviria.	PCM0007	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M008	Conesa 2000 e/ Gelly Obes y J. M. Zapiola	PCM0008	1%	-	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M009	Serrano 800 e/Conesa y SAN_JOSE	PCM0009	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,0	1,0
M010	Cjal. E. Tribulato 700 e/Serrano y Urquiza.	PCM0010	2%	27%	72%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M011	Int. J. Irigoin 700 e/Serrano y Sgo. Del Estero.	PCM0011	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M013	J. B. Alberdi 200 e/Dorrego y Azcuenaga.	PCM0013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M014	Serrano 400 e/J. B. Alberdi y Haedo.	MIPC1	-	100%	-	-	-	CAG SAN MIGUEL CENTRO	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
M046	Paunero 100 e/Pardo.	MIPC1		100%						PUELCHE						
M015	Cnel. Fraga 2300 e/Int. J. Irigoin y Marcos Sastre.	PCM0015	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M016	Cnel. M. Fraga e/Salerno y Tomas Edison.	PCM0016	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M017	Vicente Lopez e/Marcos Sastre y Malvinas.	PCM0017	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,9	1,9
M018	Pardo e/Libertad y J. M. Zapiola	PCM0008	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M019	J. B. Alberdi e/J. Zapiola y Gelly Obes.	PCM0008	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M021	Cjal. E. Tribulato 2300 e/ G. Campos y Libertad.	PCM0021	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M022	Tomas Guido 4400 e/J. R. Lopez y El Zonda.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-	TANQUE SARMIENTO	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M023	Av. Alte. J. Lopez 4500 e/J. D. Solis y Eva Peron.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M025	T. Guido 5900 e/Linarte.	MI_CIS_SAR	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M026	T. Guido 5301 e/La Pinta.	MI_CIS_SAR	-	1%	-	99%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M032	Marchena 3256	MI_CIS_SAR	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M024	E. Ferreyra 4200 e/T. Guido.	MI_CIS_GUA	1%	2%	98%	-	-	REBOMBEO GUARIDA	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M028	Santa Maria 5100 e/Vicente Fatome.	MI_CIS_GUA	1%	3%	96%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M037	Cisterna La Guarida	MI_CIS_GUA	4%	4%	92%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M065	Calle Defensa e Italia	MI_CIS_GUA	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M066	Dr. Enrique Finochietto e/Sta Maria y Fray Antonio Marchena	MI_CIS_GUA	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M033	Int. J. Irigoin 400 Gelly Obes y Granaderos.	PCM0033	1%	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M036	Cnel. M. Fraga 3400 e/Marconi.	PCM0036	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M038	Roca 1400 e/Alen.	PCM0038	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M039	Belgrano 2000 Gelly Obes y R. S. Peña.	PCM0039	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M040	Italia 2300 e/Gaspar Campos y J. M. Zapiola.	PCM0040	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M041	Belgrano 900 e/D`elia y Muñoz.	PCM0041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M042	Pardo 10 e/Ruta 10.	PCM0042	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M043	Conesa 416 e/San Luis.	PCM0043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M045	Rodriguez Peña 2600 e/Williams.	PCM0040	-	8%	92%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M004	Conesa 1300 e/Martin Irigoyen.	MI_CIS_CEN	-	20%	80%	-	-	REBOMBEO MUÑIZ	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M034	Martin Irigoyen y Juan B Alberdi	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M047	Martin Irigoyen e/Obilitio y Francia.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M048	Av. Francia 500 e/Sta. Fe y Parana.	MI_CIS_CEN	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M049	Av. Francia 600 e/Moreno.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M051	Av. Francia 1100 e/Tucuman y Azopardo.	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M060	Conesa entre Martin Irigoyen y Sarmiento	MI_CIS_CEN	-	1%	99%	-	-		-	HIPOPUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M067	Conesa e Irigoyen	MI_CIS_CEN	1%	14%	84%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
M052	Rodrigo de Triana 1500 e/R. Balbin.	PCM0052	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M053	Defensa e/R. Balbin.	PCM0053	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M054	Cruz del Sur e/Tomas Espora.	PCM0062	-	1%	99%	-	-	BATERIA M054-M062	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M062	Calle Güemes e Isabel La Catolica	PCM0062	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M055	J. J. Paso 5500 e/La Niña y Isabel la Catolica.	PCM0055	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M056	Juan J. Paso e/Beron de Estrada y Salguero.	PCM0056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M057	Maestro Ferreyra y Charlone	PCM0057	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
M058	José M. Zapiola y Güemes	PCM0058	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M059	Concejal Tribulato y Monseñor Blois	PCM0059	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M061	Luis Salguero y Tomás Alba Edison	PCM0061	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M063	Egipto y Libertad	M01	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
M064	San Nicolás y Gral Las Heras	M01	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN001	Lavalleja al 7100 El Conde y Achupallas.	LM019	-	1%	99%	-	-	BATERIA GONZALEZ	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MN002	Armonia a 150 m de La Fuente.	LM019	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MN003	Armonia y Billinghurst.	LM019	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MN004	Billinghurst 2800 y Armonia.	LM019	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MN005	Billinguru y Doblas / Cesaedes	LM019	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MN006	Int. Russo y Ramón Lista	LMO46	-	1%	99%			CATAN	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN007	Billinghurst e Int Russo	MN24	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN008	Billinghurst y Las Flores	MN24	-	2%	98%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN009	Billinghurst 5300 y Río Cuarto	MN24	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN010	Las Flores y Ramón Lista	MN24	-	-	100%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN011	Monte Egmont y Cisnetes	LMO19	-	2%	97%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MN012	Acassuso 1700 y Santa Rosa	MN23	-	-	100%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN013	Acassuso e Iporanga	MN22	-	1%	99%				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MN034	Noruan y Zarate	MN16	-	-	100%			BATERIA RAFAEL CASTILLO	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN036	Hucal y Fere	MN16	-	4%	96%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN037	Lavalle y Tres Cruces	MN23	-	4%	96%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN039	E. Del campo y Anuevo	MN23	-	100%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MN044	Huallin y Lacar	MN23	-	-	100%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN043	Castañon N°. 2922 y E. Echeverria	MN23	-	100%	-			POI MN043	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MN059	Beethoven y La Doma B°El Torero	MN24	-	100%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MN106	Beethoven entre. Aguirre y Mendez de Andes	MN24	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN110	V. de la Plaza E/ Davila y Beadley	MN25	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN132	Santa Rosa y Anuevo	MN22	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN147	Zamudio e/ Boyacá y Aeuvre	MN25	-	9%	91%			POI MN147	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN157	Bouchard y Heredia	MN25	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN173	Hucal 1700 e/ Vogel y Folledo	MN16	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN183	Lavalle y Sudamérica	MN23	-	2%	98%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN186	M. T. de Alvear 1100 esq. Del colegio	MN27	-	1%	99%				X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MN211	Escuyro y Euhanes	MN19	-	4%	96%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MN212	Victorino de la plaza y Luis María Drago. RAFAEL CASTILLO	MN19	-	1%	99%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MO087	Cisneo y Vuelata	MOPC1	100%	-	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO088	De los Recuerdos y De los Pavadores	MOPC1	-	2%	98%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MO089	Gaona y La Chacarera	MOPC1	100%	-	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO093	De los Reseros y E. Frers	MOPC1	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MO094	La Esquela y de los Reseros	MOPC1	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MO095	De La Doma Nº. 1282 y El Ombu	MOPC1	100%	-	-			BATERIA PARQUE LELOIR - ITUZAINGO	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO097	De La Vuelata y J. Hernandez	MOPC1	81%	1%	18%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MO146	N. Repetto y Del Palenque	MOPC1	4%	-	96%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MO147	N. Repetto y De la Tradición	MOPC1	-	2%	98%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MO148	Del Menoyllo y De las Cachuñas	MOPC1	-	2%	98%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MO149	N. Repetto a 130 metros de F. Ielpo	MOPC1	-	1%	99%				-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MO153	De la Condición. y Colectora Acceso Oeste	MOPC1	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO100	Vuelta y Provido	MOPC1	-	-	100%				X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MO105	Fray J. S. M. de Oro y Figueroa Alcorta	MO21	95%	5%	-			BATERIA VII BRIGADA AEREA - MORON	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO106	Figueroa Alcorta y La Tribuna	MO22	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO107	E. Lopez y Cnel. Arenas	MO30	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO108	Figueroa Alcorta y Montevideo	MO21	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO130	Lacarra y Cucha Cucha	MO22	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO137	Madrid y Jarry	MO32	95%	5%	-			BATERIA BARRIO SAN JUAN	-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MO138	Pasaroni e/Pedro Diaz y Juan Gorriti	MO31	-	-	100%			BATERIA HURLINGHAM - INTA	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MO139	Amberes y Pedernesky	MO31	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MO140	Cuero entre M. de Aviles y Tolvo	MO31	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MO141	Cuero y Acuve	MO31	-	100%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MO150	La Tolilla a 14m de Juramento	DU01	-	1%	99%			BATERIA HURLINGHAM 2	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MO151	Andalsbali a 21,53m de Veronese	DU01	-	17%	83%				-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MO152	Chemborá y Los Cardales	DU01	-	1%	99%				-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MO142	Rivao esq. Lavalle	7001	99%	1%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO144	Sta Teresa y La Galeota	MO33	95%	5%	-				X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MO154	Coronel Arenas esq. Andrade	MO23	95%	5%	-			BATERIA CASTELAR	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MO155	Oruay esq. Palermo	MO33	95%	5%	-				-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR001	J.V. González 2625 e/Balzak y Rodriguez Peña.	PCMR001	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR002	J.V. González 2435 e/Güemes y V. Alsina.	PCMR002	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR003	Güemes 901 e/Bolivia y Paraguay.	PCMR003	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR004	Larralde 1341 e/J. Gonzalez y R. Gutierrez.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-	TANQUE MORENO	-	PUELCHE	2	5,2	37,8%	5,8	2,6	2,6
MR005	Int. Bossi 1080 e/Ecuador y Paraguay.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	10,3	65,5%	15,0	2,6	2,6
MR006	Int. Bossi e/Venezuela y Ecuador.	MR-TAN-MOR	-	8%	-	92%	-		-	PUELCHE	2	1,7	38,6%	2,1	2,6	2,6
MR007	Guatemala 2400 e/Güemes y Alsina.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	2,6	2,6
MR008	Guatemala 2700 e/marmol y Colectora Gaona	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	2,6	2,6
MR019	Int. Bossi e/Guatemala.	MR-TAN-MOR	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	2,6	2,6
MR011	P. Ansaldo e/Blas Parera y M. Melo.	PCMR011	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR012	M. Obarrio 2048 e/Alberdi y Rafael.	MRPC1	-	3%	-	97%	-	PLANTA CAG MORENO	-	PUELCHE	2	4,6	12,3%	5,0	-	-
MR046	Del Cañon/M. Obarrio e/San Carlos.	MRPC1	-	45%	-	55%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR013	Av. Perón e/Del Cañon.	PCMR013	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR014	Alcorta 2500 e/Bouchard y Uruguay.	PCMR014	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	3,2	3,2
MR015	Ameghino e/Centenario y Argentina.	PCMR015	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR016	Callao e/Av. Alcorta y Mitre.	PCMR016	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR017	Alcorta e/Haedo y Ramos Mejia.	PCMR017	-	7%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR018	Misiones e/ Sta. Fe y D´errico.	PCMR018	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR020	Alte. Brown e/25 de Mayo y Andrade	MR01	-	2%	98%	-	-	BATERIA MR020-MR021	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR021	Alte. Brown e/Pio XII.	MR01	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR022	Sanchez 4800 e/Ruta 25 y San Justo.	PCMR022-23	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR023	Florencio Sanchez e/Sandhi y Sofocles	PCMR022-23	-	11%	89%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR024	Costa Rica e/F. Sanchez y Sofocles.	MR-TAN-PER	-	30%	-	70%	-	TANQUE LA PERLITA	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR025	A. Storni 5600 e/Danubio.	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR026	A. Storni 5900 e/Madariaga.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR027	Ecuador 5700 e/La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR029	La Plata e/Ruta23 y Camil.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR035	Gutierrez 5600 e/La Plata y Cost Rica.	MR-TAN-PER	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	MR-TAN-PER	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR070	Honduras y Marquez	MR-TAN-PER	-	5%	-	95%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR072	Honduras y Gral. Madariaga	MR-TAN-PER	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR028	El Salvador e/Chile y Mexico.	PCMR028	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR030	Pedrell e/Ascasubi y Carriega.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-	TANQUE TRUJUI	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR031	R Rojas e/Libano y Gral. Pintos.	MR-TAN-TRU	-	3%	-	97%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR032	F. Sanchez e/Libano y Pitagoras.	MR-TAN-TRU	-	4%	-	96%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR051	Tablada e/Oribe y Puccini.	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR075	Diego de Villaroel y Celerino Namuncurá	MR-TAN-TRU	-	2%	-	98%	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR036	Ruta 25 e/Castiña.	PCMR036	83%	2%	15%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR037	Giralde e/Pastor Obligado y Lavarden.	PCMR037	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR040	Piovato 4132 e/Bochardo y Balcarce.	PCMR040	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR041	Dorrego e/Dorrego y Darat.	PCMR041	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR042	1 de Mayo e/Alcorta.	PCMR042	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR043	San Pablo e/San Cayetano.	PCMR043	5%	2%	93%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR044	Piovano e/El Salvador y Venezuela.	PCMR044	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR048	Echeverria e/Darwin y Peron.	PCMR048	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR049	Sarratea e/Victoria.	PCMR049	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR050	Marcos Paz 1116 e/larrea y J.J. Urquiza.	PCMR050	10%	2%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR052	Ambeños e/Concordia.	PCMR052	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	0,8	0,8
MR009	V. Alsina e/Libertador.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-	REBOMBEO MORENO	-	PUELCHE	2	2,5	113,1%	4,5	-	-
MR053	Córdoba E/Palo y Sthedeh.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	0,8	20,4%	1,0	-	-
MR054	Alvear e/Rafael Arco.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR055	Córdoba e/V. Lopez y Linch.	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR056	Corvalán 2733 e/B de Yrigoyen y Graham Bell.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR057	Uruguay e/E. Rios y colectora.	MR-CIS-MOR	2%	4%	94%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR058	Misiones 1970 e/ Moron.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR059	Facundo Quiroga e/Moron y Yapeyu.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR060	Facundo Quiroga e/ La Tropilla y Quilmes.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR061	Corvalán e/La Tropilla.	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR062	SAN_JUAN_BAUTISTA 2026 e/ Int. Corvalan Dean Funes	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
MR063	Lincoln e/Soldado Derrico y E. Rios.	MR-CIS-MOR	99%	1%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR064	Intendente Corvalan 2302 e/ Alvear y Alejandro Graham Bell	MR-CIS-MOR	-	3%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR095	Uruguay y Chiclana	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR097	Entre Rios esquina Abraham Lincoln	MR-CIS-MOR	2%	3%	95%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR100	Moron e/ Facundo Quiroga y Arribeños	MR-CIS-MOR	1%	2%	97%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR101	Lincoln N°1644	MR-CIS-MOR	-	2%	98%	-	-		-	HIPOPUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR065	J.V. González e/ Ruta 25 y Brasil.	PCMR065	-	5%	95%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR067	Lobos e/La Tablada y Manzana 36.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR068	Lafinur e/Lobos y 3 de Marzo.	PCMR067-68	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR069	Tablada e/Democracia y Colectora	PCMR069	12%	4%	84%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR071	Shakespeare y Manuel Galvez	PCMR071	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR073	Colombia y Ricardo Gutiérrez	MR-TAN-PER	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR074	Colectora Acceso Oeste y Ecuador	PCMR074	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR076	Hipólito Yrigoyen y San Luis	PCMR076	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR077	Teniente Ibañez 3224	PCMR077	1%	2%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	3	13,8	99,5%	28,0	-	-
MR078	Alberti entre Marcos Paz y Vera	PCMR078	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR079	Juana de Asurduy y San Cayetano	PCMR079	43%	2%	55%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR086	Ecuador y Marquez de Aguado	MR-TAN-PER	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR088	Lobos entre Misiones y José Hernández	PCMR088	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR089	Pavón y Gervasio de Posadas (Plaza del Estudiante)	PCMR089	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR093	Mendoza y Jose Ingenieros	PCMR093	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MR098	Av. Luis Pasteur entre Facundo Quiroga y Arribeños	PCMR098	-	10%	90%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
MR099	Marcos Paz entre J.J Urquiza y Larrea	PCMR050	-	100%	-	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MR104	Marcos Paz entre Larrea y Justo Jose de Urquiza	PCMR050	-	36%	64%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MS025	Crovara y El Pindo	MS_CIS_MUN	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MS026	Calle 200 y Rotonda	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-	BATERIA CIUDAD EVITA	-	PUELCHE	2	2,4	11,3%	2,8	-	-
MS027	Av. Central y Calle 500	MS_CIS_MUN	-	5%	95%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
MS034	El Tapeil y El Sauce	MS_CIS_MUN	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	0,6	26,4%	0,7	-	-
MS042	Av. Central y calle 900	MS_CIS_MUN	97%	3%	-	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MS030	Las calas y Los balnearios	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	0,6	0,6
MS091	Las Orquideas y Las Gardenias	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	0,6	0,6
MS092	Costanera y Las Dalias - Bº 22 de Enero	MS32	-	-	100%	-	-		X	PUELCHE	2	15,5	50,2%	21,0	0,6	0,6
MS105	Gaviotas y Torquinis	MS34	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
MS114	Magnasco y Av. Costanera	MS33	100%	-	-	-	-		X	PUELCHE	-	-	-	-	1,0	1,0
PI001	J. B. Justo y Sanguinetti al 500.	PCPI001	-	4%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI002	J. B. Justo 615 y Posadas.	PCPI002	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI003	Av. Tratado de Pilar 242 y Sanguinetti.	PCPI003	25%	35%	39%	-	-		X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI004	Lagrave 84 (Yrigoyen y Pampa).	PCPI004	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI005	Planta Champagnat.	PCPI005	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI006	Rincón entre San Martín y Esteban Luca	PCPI006	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI007	José María Paz 873.	PCPI007	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI008	ITUZAINGO 331.	PCPI008	1%	3%	96%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI009	Maipú y Vías F.F.C.C. San Martín.	PCPI009	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI010	Gral. O´Higgins y Bergantín Congreso.	PCPI010	-	13%	87%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI011	Juan Bautista Alberdi 1106 y 11 Septiembre	PCPI011	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambrosetti.	PCPI012	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Mapuche)	PCPI013	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI014	Las Araucarias y M. Acosta.	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI059	Ubicado dentro de predio Campo Suite II. frente a Parque Austral.	PIPC2	23%	77%	-	-	-	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	-	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI067	Mariano Acosta y Los Alamos	PIPC2	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI089	Los Alamos y Av. Eva Perón	PIPC2	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI015	Dr. Ignacio Pirovano 728 esq. Costa Rica	PCPI015	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI016	Chacabuco 2130 e/Paraguay y Bolivia	PCPI016	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI017	Tortugas Country Club	PCPI017	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
PI018	Tortugas Country Club	PCPI018	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI020	Tortugas Country Club	PCPI020	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI021	Tortugas Country Club	PCPI021	1%	1%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI022	Las Campanillas esq. Av. Highland Park	PCPI022	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI025	Country El Carmel	PCPI025	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI026	Las Amapolas. Villahaus - Country Ayres del Pilar	PCPI026	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI035	Country Ayres del Pilar	PCPI035	-	3%	97%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI037	Country La Lomada	PCPI037	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI040	Las Margaritas 1100 e/ Los Claveles y Las Rosas	PCPI040	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI041	Las Glicinas 1080 (proximo a R8)	PCPI041	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	1,2	1,2
PI042	Musladini 374. esquina Bergantín Independencia.	PCPI042	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI043	Sequi esq. Colectora Este Ramal Pilar	PCPI043	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI044	Posadas 1635 e/J.V. Gonzalez y H. Ascasubi	PCPI044	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI045	Country B° Campo grande	PCPI045	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI048	Cjal. Dr. Martitegui 219. Plaza.	PCPI048	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI049	Bergantín República y Bergantín Independencia.	PCPI049	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI050	Av. Constitucion(R26) e/Nicaragua y San Salvador.	PCPI050	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI051	Guatemala y R26.	PCPI051	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI052	Guatemala 4300 esq. Alemania (MANUEL ALBERTI)	PCPI052	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ramón Gimenez	PCPI053	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI054	Leguizamon e Ituzaingo	PCPI054	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI056	Ameghino y Colectora Oeste	PCPI056	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	4,9	4,9
PI058	Nicaragua 1250 e/Haití y Santo Domingo	PCPI058	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI061	RN 25 y Chubut	PCPI061	4%	24%	71%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	-	-
PI062	Panamá y Alejandro Korn	PCPI062	-	2%	98%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI063	Patagones y Tagle	PCPI063	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI064	Andes y Avda. Patricias Argentinas	PCPI064	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI065	Goleta Constitución y Fragata Sarmiento	PCPI065	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI066	Calle s/n e/ Haití y Santo Domingo	PCPI066	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI068	Alazan e/Overo y Picasso- Highland Park	PCPI068	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI070	Paraguay y Tierra del Fuego	PCPI070	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI075	Guatemala y Levene	PCPI075	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	2	0,6	30,1%	0,8	-	-
PI076	Gatti y Vasco Da Gama	PCPI076	-	-	100%	-	-	BATERIA PERUZZOTTI	-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI078	Vasco Da Gama entre Hermita y Camino Comercial	PCPI076	-	1%	99%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	-	-
PI080	Monseñor D´Andrea y La Carreta	PCPI080	-	1%	99%	-	-		X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI084	Chubut y San Ignacio	PCPI084	-	20%	80%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI100	Calle Sarmiento e/ Bahía Grande y Bahía Redonda	PIPC1	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI101	Ruta 234 y Bahía Darbel	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI102	Calle Henry Martin y Bahía Darbel	PIPC1	-	1%	99%	-	-	BATERIA DERQUI	-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
PI103	Cerrito 3287 e Isla Gran Malvinas	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	2	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRÁNEA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

020-INS-A-CA-CRU-PS-01 (Ex 08)

Código de Pozo	Localización	Puntos Cercanos	TIEMPO EN SERVICIO (% del tiempo)					Sistema	Impulsión directa a la red	Acuífero	NUMERO DE MUESTRAS DE POZOS	TRICLOROETILENO [µg/l]				
			Reserva	Fuera de Servicio/ Parado	Funcionamiento							Agua Subterránea			Agua de primer punto de red abastecido	
					Continuo		A Demanda					Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Concentración Máxima	Concentración Máxima	Concentración Promedio
					Red/Mezcla	Cisterna/Tanque	Refuerzo Ciudad									
PI105	Libertad e Isla Candelaria	PIPC1	-	-	100%	-	-		-	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
OU037	145 y 28-3	OU37	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	-	-	-	-	< 0,5	< 0,5
OU076	Cno. G. Belgrano y Av. Monteverde	OU38	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
OU139	Calle 866 Esq. D. Alvarez	OU07	-	-	100%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5
OU141	Calle 86-3 Esq. Donato Alvarez	OU07	-	1%	99%	-	-	-	X	PUELCHE	1	<0,5	0,0%	<0,5	< 0,5	< 0,5

aysa	**CALIDAD DE AGUA CRUDA SUBTERRANEA** **CAPTADA EN AREA DE CONCESIÓN [4]** **Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **030-INS-A-CA-CRU-PS-02 (Ex 09)**

Región	Total pozos [1]	Arsénico ≤50 ug/l	Arsénico >50 ug/l	Tricloroetileno ≤ 20 ug/l [3]	Tricloroetileno >20 ug/l
Oeste	261	261	0	258	2
Norte	133	132	1	124	0
Sudoeste	215	202	13	206	1
Sudeste	151	151	0	146	0
Total Concesión	**760**	**746**	**14**	**734**	**3**
% del total	**100%**	**98,2%**	**1,8%**	**99,6%**	**0,4%**

Región	Total pozos [2]	NO3 ≤ 45 mg/l	45 mg/l<NO3 ≤100 mg/l	NO3>100 mg/l	Sales disueltas >1000 mg/l
Oeste	261	63	179	19	5
Norte	133	32	97	4	5
Sudoeste	215	124	84	7	4
Sudeste	151	67	81	3	5
Total Concesión	**760**	**286**	**441**	**33**	**19**
% del total	**100%**	**37,63%**	**58,03%**	**4,34%**	**2,50%**

aysa

CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA
LISTADO DE POZOS CON MUESTREO INCOMPLETO
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
040-INS-A-CA-CRU-PS-03 (Ex N° 69)

Pozo N°	Dirección	Partido	Tipo de muestreo	Cantidad de muestras realizadas	Muestras Teóricas Según Marco Regulatorios	Motivos por los cuales no se completó el programa de muestreo
AB065	Juan B. Justo 2700	Almirante Brown	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA GLEW; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red AB23, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	Almirante Brown	Bac/Qco	1	2	Pozo perteneciente a BATERIA GLEW; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red AB23, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
AB076	Republica Argentina 7570 e/ Juan Jose Castro y Alice	Almirante Brown	Bac/Qco	0	2	Pozo perteneciente a BATERIA GLEW; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red AB23, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
AB093	Brigadier Calderón e/ Young y Av. Eduardo Holmberg	Almirante Brown	Bac/Qco	1	3	Pozo perteneciente a BATERIA GLEW; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red AB23, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
AB100	Gral. Cardenas y Almte. Irizar (Plaza)	Almirante Brown	Bac/Qco	1	4	Pozo perteneciente a BATERIA GLEW; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red AB23, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
AB102	Martiniano Leguizamòn entre 25 de Mayo y F. Alvarez	Almirante Brown	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA GLEW; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red AB23, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
AB110	Boulogne Sur Mer y Antonio Luis Beruti	Almirante Brown	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA GLEW; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red AB23, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE004	Las Heras y Chacabuco	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE015	Dorrego y Dreyer	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE027	Maipú y Colón	Esteban Echeverría	Bac/Qco	1	3	Pozo perteneciente a Batería La Lata; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE028	Lavalle y Maipú	Esteban Echeverría	Bac/Qco	0	4	Pozo perteneciente a Batería La Lata; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE029	Lavalle	Esteban Echeverría	Bac/Qco	1	4	Pozo perteneciente a Batería La Lata; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE030	Lavalle	Esteban Echeverría	Bac/Qco	1	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE031	Lavalle	Esteban Echeverría	Bac/Qco	0	3	Pozo perteneciente a Batería La Lata; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE032	Lavalle	Esteban Echeverría	Bac/Qco	1	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE034	Maipú	Esteban Echeverría	Bac/Qco	1	3	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE035	Ventura Avila	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE036	Ventura Avila y Calle 13	Esteban Echeverría	Bac/Qco	1	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE040	Ventura Avila	Esteban Echeverría	Bac/Qco	0	4	Pozo perteneciente a Batería La Lata; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE041	Ventura Avila	Esteban Echeverría	Bac/Qco	0	4	Pozo perteneciente a Batería La Lata; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE042	Ventura Avila	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	3	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por Intervencion por terceros. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE044	Juana de Arco	Esteban Echeverría	Bac/Qco	1	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE045	Juana de Arco	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE046	Lavalle entre Tornquist y Bragado	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por tapa antivandalica. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE049	Martín Fierro y Vazquez	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA BAFICO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE21, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE051	Martín Fierro y Dolores	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA BAFICO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE21, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE054	Martín Fierro y Dreyer	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA BAFICO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE21, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE058	Avila Ventura 3000	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE064	Puan y Pablo Pizzurno	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	3	Pozo perteneciente a BATERIA SANTA ISABEL; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red PCEE064, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EE070	Colon y Maipú	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA LA LATA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEN006	Caceres 580 e/Huergo y 9 de Julio	Esteban Echeverría	Bac/Qco	0	4	Pozo perteneciente a Rebombeo 9 de abril; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC4, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEN012	M. Alegre 992 e/Gomez y Vernet	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a REBOMBEO 9 DE ABRIL; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC4, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEN029	Av. Fair y Priemra Junta	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	3	Pozo perteneciente a BATERIA CORREO ARGENTINO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE34, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEN031	Cervetti y La Horqueta	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA CORREO ARGENTINO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE34, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEN047	Juan M. de Rosas t Tte. Gabaston	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	3	Pozo perteneciente a BATERIA SANTA CATALINA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE31, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	3	Pozo perteneciente a BATERIA SAN IGNACIO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por automatismo. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE29, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEN056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	Esteban Echeverría	Bac/Qco	0	4	Pozo perteneciente a Batería La Morita; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC5, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEN059	Enrique Banch y Rebizo	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a REBOMBEO 9 DE ABRIL; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EEPC4, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEU002	San Bernardo 980 e/ Balcarce P Moreno	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA UNION; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por estar en Reserva. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE20, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEU003	Los Robles al 5000	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA UNION; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE24, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEU004	Los Robles al 5700	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA UNION; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE24, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA UNION; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE26 , cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	3	Pozo perteneciente a BATERIA UNION; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicimiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE32, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.

aysa

CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA
LISTADO DE POZOS CON MUESTREO INCOMPLETO
Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
040-INS-A-CA-CRU-PS-03 (Ex N° 69)

Pozo N°	Dirección	Partido	Tipo de muestreo	Cantidad de muestras realizadas	Muestras Teóricas Según Marco Regulatorios	Motivos por los cuales no se completó el programa de muestreo
EEU014	Juana de Arco a 700 m de S20	Esteban Echeverría	Bac/Qco	0	2	Pozo perteneciente a Batería Unión; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por estar fuera de servicio la mayor cantidad de tiempo. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE24, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEU015	Lacarra y 9 de Julio	Esteban Echeverría	Bac/Qco	2	3	Pozo perteneciente a BATERIA UNION; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE32, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEU017	Av. Maipu 40 esq. RP59	Esteban Echeverría	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA UNION; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE32, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEZ002	Río Bermejo y La Atómica	Ezeiza	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a PLANTA LA CELIA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red EE28, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
EEZ006	Caminito 1200	Ezeiza	Bac/Qco	0	1	Pozo perteneciente a Batería Ezeiza; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por estar fuera de servicio la mayor cantidad de tiempo. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red EZPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCFV006, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV009	Cariboni y Rio Bermejo	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCFV009, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a TANQUE MAYOL; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red FV-TAN-MAY, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a TANQUE MAYOL; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red FV-TAN-MAY, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV060	Delgado y Cañuelas	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCFV060, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV126	Riobamba y Vías	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCFV126, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV129	Rio Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCFV129, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV140	San Martin y Monteagudo	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCFV140, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV153	Florida y Miguel Cané	Florencio Varela	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA BARRIO ALTAMIRA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red PCFV153, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV161	Los Laureles y El Cardenal	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA GOBERNADOR COSTA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red FV01, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
FV162	La Paloma y Los Sauces	Florencio Varela	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA GOBERNADOR COSTA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red FV01, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	Presidente Peron	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a TANQUE OESTE - SAN MARTIN; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red GU-TAN-PED, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	Presidente Peron	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a TANQUE OESTE - SAN MARTIN; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red GU-TAN-PED, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
LMO123	Tinogasta y Colegiales	La Matanza Oeste	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red LMO09, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
LMO164	Saenz y Croacia.	La Matanza Oeste	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red LMO08, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	Lomas de Zamora	Bac/Qco	2	3	Pozo perteneciente a BATERIA BURZACO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red LOPC2, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
LO133	Av. Argentina y Junín	Lomas de Zamora	Bac/Qco	1	2	Pozo perteneciente a BATERIA LLAVALLOL; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por estar Parado p/ falta de tensión.. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red LOPC2, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
LO138	Junín 170 entre Rodriguez y Las Heras	Lomas de Zamora	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA LLAVALLOL; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red LOPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
LO139	Amat y Petiribí	Lomas de Zamora	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a BATERIA LLAVALLOL; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red LOPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
LO140	Av.Argentina 2950 y Petirbi	Lomas de Zamora	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA LLAVALLOL; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red LOPC1, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	Merlo	Bac/Qco	1	4	Pozo perteneciente a TANQUE MERLO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red ME-TAN-CES, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME022	ESNAOLA Y BACH	Merlo	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a TANQUE LOMA GRANDE; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red ME-TAN-LOM, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	Merlo	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a TANQUE LOMA GRANDE; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red ME-TAN-LOM, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	Merlo	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a TANQUE ARCO IRIS; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red ME-TAN-ARC, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	Merlo	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCME036, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	Merlo	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red ME-CIS-PSM, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	Merlo	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCME065, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA T SOLANET	Merlo	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCME066, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	Merlo	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCME074, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	Merlo	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a POI MERLO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red ME01, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	Merlo	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a POI MERLO; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red ME01, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	Merlo	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red ME-CIS-PSM , cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
ME088	Lorenzini entre Deàn Funes y Fraga	Merlo	Bac/Qco	2	4	Pozo perteneciente a TANQUE ARCO IRIS; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red ME-TAN-ARC, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
MI047	Martin Irigoyen e/Oblifdo y Francia.	San Miguel	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a REBOMBEO MUÑIZ; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red MI-CIS-CEN, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
MN033	Acassuso e Ipiranga	La Matanza Norte	Bac/Qco	0	4	Pozo perteneciente a Batería Rafael Castillo; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red MN23, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
MN147	Zamudio e/ Bravard y Aguirre	La Matanza Norte	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a POI MN147; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red MN25, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
MR023	Florencio Sanchez e/Gandhi y Sofocles.	Moreno	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED - TANQUE LA PERLITA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red PCMR022-23, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	Moreno	Bac/Qco	1	4	Pozo perteneciente a TANQUE TRUJUI; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteicemiento de la batería es monitoreado por el punto de red MR-TAN-TRU, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.

aysa	**CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA** **LISTADO DE POZOS CON MUESTREO INCOMPLETO** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **040-INS-A-CA-CRU-PS-03 (Ex N° 69)**

Pozo N°	Dirección	Partido	Tipo de muestreo	Cantidad de muestras realizadas	Muestras Teóricas Según Marco Regulatorios	Motivos por los cuales no se completó el programa de muestreo
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	Moreno	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a TANQUE TRUJUI; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteiciemiento de la batería es monitoreado por el punto de red MR-TAN-TRU, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	Moreno	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a TANQUE LA PERLITA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el abasteiciemiento de la batería es monitoreado por el punto de red MR-TAN-PER, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
MS027	Av. Central y Calle 500	La Matanza Sur	Bac/Qco	3	4	Pozo perteneciente a BATERIA CIUDAD EVITA; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por zona peligrosa. Aun asi, el abasteiciemiento de la batería es monitoreado por el punto de red MS_CIS_MUN, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
QU037	345 y 383	Quilmes	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red QU37, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.
QU141	Calle 863 Esq. Donato Alvarez	Quilmes	Bac/Qco	3	4	Esta perforación abastece directo a RED; debido a inconvenientes en la coordinación y teniendo en cuenta que estas perforaciones se encuentran en zonas alejadas no se pudo extraer la muestra por falla en la programación. Aun asi, el suministro es monitoreado por el punto de red QU07, cuyos valores se encuentran dentro de los rangos habituales.

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
AB007	Bouchard al 2600 e/King y Ferre	-34.7930210000	-58.3705260000		POZO A RED	POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB009	Erezcano Agustin 1200	-34.7989450000	-58.3778190000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB019	Combatientes Malvinas Argentinas y P	-34.8076287927	-58.4042710765	RED	POZO A RED	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB028	B° Segba (D. Rocha y Paraguay)	-34.8145972520	-58.3875037024	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	AB028PC	Dardo Rocha 600-Tanque	ALMTE BROWN	Sudoeste
AB052	Av, Republica Argentina y Adolfo Alsin	-34.8158574500	-58.3661097600			POZO INACTIVO / SELLADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB056	Arenales y soler	-34.8196823100	-58.3986128700			POZO INACTIVO / SELLADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB057	P. Echagüe y Serrano	-34.8167886151	-58.4177499124	PLANTA - AB057	TRATAMIENTO	**SERVICIO**	AB14		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB058	Espora 6000	-34.8565700000	-58.3687570000			POZO INACTIVO / SELLADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB060	Tiglio y Policastro	-34.8104984583	-58.4067720366	RED	POZO A RED	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB061	Laprida Narciso 1900	-34.8430227403	-58.3515573879	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB062	Laprida Narciso 2401 1848	-34.8368980757	-58.3395006797	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB063	Laprida Narciso 3001	-34.8335715142	-58.3331095305	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	TERCEROS	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB064	Juan B. Justo 2050	-34.8549820000	-58.3516420000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	RESERVA	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB065	Juan B. Justo 2700	-34.8518379214	-58.3447532956	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB066	Juan B Justo 2101	-34.8480700000	-58.3368610000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	RESERVA	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB067	Juan B. Justo 2802	-34.8416820000	-58.3236890000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	PARADO P/FALTA TENSIÓN	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB068	Av. Zeballos (400) a 700 mts de Avda.	-34.8602700000	-58.3521980000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	TERCEROS	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB069	Rivera a 700 m de Espora	-34.8669260000	-58.3505010000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB070	Francisco N. Laprida y Muesca	-34.8459027193	-58.3589432662	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB071	Narciso Laprida 2301	-34.8400610684	-58.3455325484	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	TERCEROS	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB072	Francisco N. Laprida a 600 mts. de Co	-34.8285580000	-58.3232800000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB073	República Argentina 6670	-34.8523360000	-58.3594030000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB074	Rep. Argentina y Juan B. Justo	-34.8592280000	-58.3576770000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB075	Juan B. Justo a 300 mts. de Chivilcoy	-34.8443280000	-58.3290560000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB076	Republica Argentina 7570 e/ Juan Jos	-34.8656410000	-58.3575960000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB077	Rivera y Espora	-34.8703620000	-58.3566680000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB078	Rivera a 1400 m de Espora	-34.8638750000	-58.3439510000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB079	Rivera a 2100 m de Espora	-34.8604340000	-58.3373840000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB080	Rivera a 2800 m de Espora	-34.8569920000	-58.3311320000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB081	Rivera a 3500 m de Espora	-34.8540400000	-58.3248930000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB082	Rivera a 4200 m de Espora	-34.8504040000	-58.3181660000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB083	Rivera a 4900 m de Espora	-34.8468970000	-58.3116770000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB084	Espoile s/n	-34.8753200451	-58.3528750152	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB085	Leyes y Romero	-34.8725801032	-58.3473178818	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB086	Romero y Calderón	-34.8764756510	-58.3443768902	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	PARADO P/FALTA TENSIÓN	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB087	Calderon 1251	-34.8720725303	-58.3370110264	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	RESERVA	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB088	Calderón 1851	-34.8677455737	-58.3290662855	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	PARADO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB089	Calderón 3000	-34.8656076000	-58.3240930000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	PARADO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB090	Calderon 3400 1848	-34.8623028252	-58.3173486283	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB091	Calderon 3650 1848	-34.8594856898	-58.3131491678	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB092	Brigadier Calderón e/ Lezica y Young	-34.8550280000	-58.3042540000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	TERCEROS	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB093	Brigadier Calderón e/ Young y Av. Edu	-34.8516850000	-58.2980010000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB094	Romero 3800	-34.8797109588	-58.3419074913	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB095	Lemos 3800	-34.8766930000	-58.3342050000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB096	Manuela Pedraza 1209	-34.8715018543	-58.4034203652	PLANTA RAYO DE SOL	TRATAMIENTO	SERVICIO	ABPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB097	Santiago del Estero 3075	-34.8708445991	-58.4073060577	PLANTA RAYO DE SOL	TRATAMIENTO	TERCEROS	ABPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB098	Rocha y J.A. Casacuberta	-34.8405860000	-58.3705890000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB099	Fernando Lahille y M. Acosta	-34.8423970000	-58.3643420000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB100	Gral. Cardenas y Almte. Irizar (Plaza)	-34.8458890000	-58.3651110000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB101	Agustín Barrios y Virrey Cevallos	-34.8522970000	-58.3683390000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB102	Martiniano Leguizamòn entre 25 de M	-34.8346110000	-58.3551640000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB103	Malvinas Argentinas y Dr. Chiesa	-34.8541640000	-58.3877400000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCAB103	Dr.L.Chiesa 332 e/B.Sur Mer y Mal. Argentinas (Acople en vereda a metros del pozo)	ALMTE BROWN	Sudoeste
AB104	Pasaje Ibera entre Pcia de Catamarca	-34.8626940000	-58.3879440000	RED	POZO A RED	STAND BY			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB105	Av. Juan B. Justo e/ Av. República Argentina y Av. Espora, Almirante Brown			BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB106	Pablo Podesta y Orfilia Rico	-34.8335640000	-58.3711110000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	STAND BY			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB107	Fernando Ochoa y Juan Sarciore	-34.8399680000	-58.3757060000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	STAND BY			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB108	Rufino Cordoba y Cesar Ratti	-34.8380110000	-58.3688940000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	STAND BY			ALMTE BROWN	Sudoeste
AB109	Luis Viale y Enrique de Rosas	-34.8288250000	-58.3705320000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB110	Boulogne Sur Mer y Antonio Luis Beru	-34.8497440000	-58.3756890000	BATERIA GLEW	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB23		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB116	Rauch y silva	-34.8096369000	-58.4179910100			POZO INACTIVO / SELLADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
AB601	King y Bouchard	-34.7931160895	-58.3705604323	RED	POZO A RED	RESERVA	AB04		ALMTE BROWN	Sudoeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
AB728	B° Segba (D. Rocha y Paraguay)	-34.8147220000	-58.3877510000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCAB728	B° Segba (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barrio canilla metálica cercana al pozo).	ALMTE BROWN	Sudoeste
AB914	Ceferino Rodriguez 3000 Esq. R. Arge	-34.7922514802	-58.3627629478	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	AB20		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB919	R. Argentina y El Maestro	-34.7976678473	-58.3637905521	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	AB20		ALMTE BROWN	Sudoeste
AB920	Corrientes 400 1846	-34.7770650000	-58.3618220000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			ALMTE BROWN	Sudoeste
EE001	Las Heras y Guillon	-34.8136804244	-58.4678344518	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE002	Rivadavia y Arana	-34.8119589845	-58.4644584846	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE003	Origone y Arana	-34.8101622667	-58.4607825451	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE004	Las Heras y Chacabuco	-34.8278403569	-58.4570464945	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE005	Terrarosa y Colon	-34.8308287607	-58.4685673898	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE006	Almafuerte e/Andrare y Obligado	-34.7929620733	-58.5271244916	PLANTA BARRIO UNO	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE03		EZEIZA	Sudoeste
EE007	R. Dario y M. Cane	-34.7940928766	-58.5261285983	PLANTA BARRIO UNO	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE03		EZEIZA	Sudoeste
EE011	Correa y Reconquista	-34.8148640100	-58.4430993200			POZO INACTIVO / SELLADO			ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE012	Jujuy y Robertson	-34.8108418800	-58.4471498100			POZO INACTIVO / SELLADO			ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE013	Cap. Lozano y Ascasubi	-34.8189326293	-58.4454389493	PLANTA - EE013	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE05		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE014	Madariaga y Gabaston	-34.8059359400	-58.4485861300			POZO INACTIVO / SELLADO			ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE015	Dorrego y Dreyer	-34.8318537361	-58.4601107662	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE027	Maipú y Colón	-34.8550769549	-58.4501396826	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE028	Lavalle y Maipú	-34.8533277978	-58.4466518479	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE029	Lavalle	-34.8567484612	-58.4442299693	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE030	Lavalle	-34.8600923601	-58.4417825392	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE031	Lavalle	-34.8650973916	-58.4383571500	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE032	Lavalle	-34.8696954658	-58.4350929159	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE033	Lavalle	-34.8741281811	-58.4316728483	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE034	Maipú	-34.8571658009	-58.4542689849	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE035	Ventura Avila	-34.8619525473	-58.4557254658	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE036	Ventura Avila	-34.8639512389	-58.4544627990	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE037	Tte Gral Monillas (hacia hangar aerop	-34.8008738225	-58.5237147346	PLANTA BARRIO UNO	TRATAMIENTO	POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO	EE03		EZEIZA	Sudoeste
EE038	Av. Tte. Gral. Morillas a 1000 mts de L	-34.8025190000	-58.5199390000	PLANTA BARRIO UNO	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE03		EZEIZA	Sudoeste
EE039	Tte. Gral. Monillas	-34.8000393076	-58.5214634311	PLANTA BARRIO UNO	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE03		EZEIZA	Sudoeste
EE040	Ventura Avila	-34.8703060000	-58.4503610000	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE041	Ventura Avila	-34.8758880000	-58.4465520000	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE042	Ventura Avila	-34.8808790000	-58.4429420000	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	TERCEROS	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE043	Juana de Arco	-34.8782300000	-58.4507940000	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE044	Juana de Arco	-34.8823410000	-58.4585670000	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE045	Juana de Arco	-34.8847470000	-58.4639010000	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE046	Lavalle	-34.8816475606	-58.4258326842	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE047	Martín Fierro a 700mts de S6	-34.8810759449	-58.4665137063	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE048	Martín Fierro a 700 m de Vazquez	-34.8730364005	-58.4722523973	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE049	Martín Fierro y Vazquez	-34.8668921989	-58.4766960635	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE050	Vazquez a 700 m de Martín Fierro	-34.8692349915	-58.4830153888	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE051	Martín Fierro y Dolores	-34.8610438603	-58.4810730800	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE052	Martin Fierro a 1300m de E. Vazquez	-34.8579100000	-58.4841160000	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE053	Martín Fierro 2100 esquina Neuquen	-34.8530820000	-58.4876890000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE054	Martín Fierro y Dreyer	-34.8477951081	-58.4906080783	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE055	Dolores a 700 metros de Chiriguano	-34.8558891362	-58.4710768650	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE056	Chiriguano y Gral. Villegas	-34.8542700000	-58.4637380000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE057	Dolores a 700 metros de Chiriguano	-34.8573957201	-58.4622266546	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE058	Avila Ventura 3000	-34.8856210000	-58.4393030000	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE059	Avila ventura 3400	-34.8913960000	-58.4351150000	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE060	Los Claveles y General Las Heras	-34.8386850000	-58.4495740000	BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE061	República de Costa Rica y Libertad	-34.8534210000	-58.4947460000	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE062	El Ceibo y Fraga	-34.8520770000	-58.4817080000	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	TERCEROS	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE063	Alvarez de Toledo y Miguel Angel	-34.8566070000	-58.4980240000	BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE064	Puan y Pablo Pizzurno	-34.8520440000	-58.4783280000	BATERIA SANTA ISABEL	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	PCEE064	Puan y Pablo Pizurno, partido de Esteban Echeverría	STEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE065				BATERIA SANTA ISABEL		STAND BY				Sudoeste
EE066	Amado Nervo y San Pedrito, Monte Grande, Esteban Echeverría			RED B° SANTA ISABEL	POZO A RED	SERVICIO			ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE070	Colon y Maipú, Esteban Echeverría			BATERIA LA LATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE073	Villegas esq. Colón, Esteban Echeverría			BATERIA BAFICO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE21 Consulta 24-9-24		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EE911	Hogar Escuela N 11	-34.7807394344	-58.5191760055	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	EE03		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN001	Lago García 3901 y Los Andes	-34.7738983969	-58.4758332929	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN002	Pedro Coni 3401e/Oliver y sancinena	-34.7788962835	-58.4769349643	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN003	Palleros 1700 /S. Nicolas y Mte. Gran	-34.7811050604	-58.4757919919	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Direcció del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
EEN004	Ing. Huergo 3885 e/Los Andes	-34.7799295096	-58.4863681478	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN005	Sansinena 601 e/ Huergo y 9 de julio	-34.7819618514	-58.4848642801	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN006	Caceres 580 e/Huergo y 9 de Julio	-34.7860117809	-58.4818768609	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN007	Sarmiento 2700 e/Tricotti y Barros	-34.7892250000	-58.4840120000	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	PARADO P/INT. DE 3°	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN008	Ing. Huergo 2500 e/Petraca y Sastre	-34.7887448906	-58.4799094218	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN009	Pto Deseado 601 e/Huergo y 9 de abr	-34.7914535444	-58.4771242041	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN010	Ing. Huergo 1600 1842	-34.7940698392	-58.4751808297	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN012	M. Alegre 992 e/Gomez y Vernet	-34.7927532528	-58.4832816001	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN013	Tricotti 10 e/Malvinas y Barros	-34.7908390399	-58.4875575961	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN014	Cnel. D' Elía 190 e/Palleros y Constan	-34.7898864578	-58.4915747678	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN015	Constanzo 2090 e/P. Argentino y Rive	-34.7962601448	-58.4876098861	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN016	Tierra del Fuego 179 e/Constanzo	-34.8003118288	-58.4836636035	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN018	Constanzo 1229 e/Guarany y Crespo	-34.8038197644	-58.4820401889	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN019	Prayones 3150. entre Palleros y Lópe	-34.7818886267	-58.4777480901	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN020	Sansinena 105 e/ Doclout y Constanz	-34.7862604122	-58.4931145348	RED	POZO A RED	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN021	Rebizo 1100 e/ Fair y Crespo	-34.8058323176	-58.4833863909	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN022	Sansinena e Vernet y Benavidez	-34.7872357766	-58.4885945243	RED	POZO A RED	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN023	Benavidez 3190 e / F Lopez y Scaglia	-34.7840712573	-58.4890462111	RED	POZO A RED	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN024	Los Andes y Nuestras Malvinas	-34.7827439431	-58.4932789011	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	POZO INACTIVO / SELLADO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN025	San Javier y Benavidez	-34.7793670319	-58.4937232053	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN026	M. Alegre 1720 e/Alegre y Urquiza	-34.7980918312	-58.4794001037	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN027	Fernadez y Dicio	-34.7902450429	-58.4958953509	RED	POZO A RED	SERVICIO	EE23		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN028	Rivero y Chimondegui	-34.7984064734	-58.4907273983	RED	POZO A RED	SERVICIO	EE23		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN029	Av. Fair y Priemra Junta	-34.8075360000	-58.4854550000	ERIA CORREO ARGENT	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE34		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN030	Cerveti y Av. Fair	-34.8101204359	-58.4923116340	ERIA CORREO ARGENT	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE34		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN031	Cervetti y La Horqueta	-34.8031295424	-58.4980744838	ERIA CORREO ARGENT	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE34		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN032	Av Fair e Islas Trinidad	-34.8122600000	-58.4960280000	ERIA CORREO ARGENT	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE34		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN033	Urbano González e Independencia	-34.8041356770	-58.4514902291	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN034	Alberto Grande a 38m de las vias	-34.8015704377	-58.4462275474	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN035	Casacuberta e/Valette y Gonzalez	-34.7972380000	-58.4666940000	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN036	Lima e/Valette y Francia	-34.7912870490	-58.4555481519	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN037	Cepeda y de los Constituyentes	-34.7918684352	-58.4680961568	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	PARADO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN038	Lago Garcia y Cepeda	-34.7902514779	-58.4637551694	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN039	Cepeda y Alberto Grande	-34.7865185478	-58.4569818767	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN040	Lago Garcia a 50m de Valette	-34.7940796860	-58.4612719110	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN041	9 de Abril e/Valette y Wieman	-34.7994610000	-58.4688990000	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN042	Las Talitas e/Sarmiento y M. Alegre	-34.8001520025	-58.4765117293	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN043	Avellaneda e/Trangoni y C. Monte Gra	-34.8022548484	-58.4594861648	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	RESERVA	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN044	Bruzzone e/Foz y Gonzalez	-34.7983051834	-58.4567716040	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN045	Bruzzone e/Tte. Alberto Grande	-34.7954035725	-58.4514176070	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN046	Bourquet e/ Ameghino y Gabaston	-34.8042977921	-58.4440439300	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN047	Juan M. de Rosas t Tte. Gabaston	-34.8076335744	-58.4520177015	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN048	Robertson e/ J. Newbery y T. Matienz	-34.8135226319	-58.4523850076	ATERIA SANTA CATALIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE31		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN049	J. A. Roca y Est. Los Remedios	-34.8228769210	-58.5061631851	BATERIA SAN IGNACIO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE29		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN050	Los Robles y T. A. Edison	-34.8243045168	-58.4984777712	BATERIA SAN IGNACIO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	EE29		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN051	T. A. Edison y 20 de Junio	-34.8282019525	-58.5068251157	BATERIA SAN IGNACIO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE29		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN052	20 de Junio y L. Lopez	-34.8326886542	-58.5038939466	BATERIA SAN IGNACIO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE29		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN053	Cichero 700 e/ Hipolito Bouchard y Ju	-34.8172770000	-58.4957610000	BATERIA LA MORITA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EEPC5		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN054	Destacamento Melchior 733	-34.8165848000	-58.4916248000	BATERIA LA MORITA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EEPC5		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN055	25 de Mayo 1542	-34.8196595000	-58.4938669000	BATERIA LA MORITA	TRATAMIENTO	POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO	EEPC5		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN056	Narciso de Laprida e Isla Trinidad	-34.8219106329	-58.4878464160	BATERIA LA MORITA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EEPC5		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN057	La Rioja 280 1805	-34.8234720000	-58.4929050000	BATERIA LA MORITA	TRATAMIENTO	RESERVA	EEPC5		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN058	Fray Luis Beltran 1415	-34.8253710000	-58.4864470000	BATERIA LA MORITA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EEPC5		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEN059	Enrique Banch y Rebizo	-34.7926800000	-58.4928070000	REBOMBEO 9 DE ABRIL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	EEPC4		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EES001	25 de Mayo 2371	-34.9317150000	-58.5764400000	PLANTA SPEGAZZINI	TRATAMIENTO	SERVICIO	EEPC3		EZEIZA	Sudoeste
EES004	Rosario y Palacios	-34.9127288158	-58.5865603542	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EET001	Falucho y Las Dalias	-34.9130747558	-58.5500658320	ATERIA TRISTAN SUARE	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC2		EZEIZA	Sudoeste
EET004	Av. Saenz Peña y Bogado	-34.8978501311	-58.5693799538	ATERIA TRISTAN SUARE	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EEPC2		EZEIZA	Sudoeste
EEU001	Maipu 800 e Bransen Hussay B.	-34.8712985974	-58.5163791829	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE20		EZEIZA	Sudoeste
EEU002	San Bernardo 980 e/ Balcarce P More	-34.8723951775	-58.5212669321	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	EE20		EZEIZA	Sudoeste
EEU003	Los Robles al 5000	-34.8991550000	-58.5199580000	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE24		EZEIZA	Sudoeste
EEU004	Los Robles al 5700	-34.9039720976	-58.5167289898	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE24		EZEIZA	Sudoeste
EEU005	S.Cabral a 200mts de Lacarra	-34.8635499469	-58.4975270525	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE26		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU006	S.Cabral 3588 a 700 m de EEU005	-34.8675157475	-58.4949442332	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE26		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU007	S.Cabral a 700mts de EEU006	-34.8752240000	-58.4886750000	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE26		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU008	Sgto Cabral 5149 e/ Gral. Antonio Gor	-34.8806530000	-58.4846630000	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE26		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
EEU009	Sgto Cabral 5800 e/ Gral. Antonio Gor	-34.8856610000	-58.4810310000	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	EE26		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU010	S.Cabral a 700mts de EEU009	-34.8921257370	-58.4773344577	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE26		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU011	Sgto. Cabral a 700 m de EEU010	-34.8977068657	-58.4724481755	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU012	Calle s/n a 700 m de Sgto. Cabral	-34.8974563405	-58.4832237647	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	PARADO P/INT. DE 3°	EE32		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU013	Juana de Arco a 700 m de S19	-34.8985282996	-58.4871528843	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU014	Calle Robles y Ruta 52	-34.9109435452	-58.5114851541	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE24		EZEIZA	Sudoeste
EEU015	Lacarra y 9 de Julio	-34.8678861647	-58.5097344197	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		EZEIZA	Sudoeste
EEU016	Av. Maipu 40 esq. RP58	-34.8640584322	-58.5031433745	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	PARADO	EE32		EZEIZA	Sudoeste
EEU017	Av. Maipu 40 esq. RP59	-34.8762932436	-58.5035446813	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		EZEIZA	Sudoeste
EEU018	Andromaco 80 e/ Jose Champagnat	-34.8837380000	-58.5065490000	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		EZEIZA	Sudoeste
EEU019	Montes de Oca 80 e/Ruta Prov 58 y J	-34.8898350000	-58.5072690000	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		EZEIZA	Sudoeste
EEU020	Vieytes 9	-34.8932380976	-58.5081179390	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		EZEIZA	Sudoeste
EEU021	Sobre Sargento Cabral a 700m del EE	-34.9027303199	-58.4687526138	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU022	Juana de Arco S/N	-34.9072810000	-58.5051450000	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU023	Los Robles 249	-34.9147083777	-58.5092533403	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		EZEIZA	Sudoeste
EEU025	Sgto. Cabral a 100 mts de Cáceres	-34.9074640000	-58.4650080000	BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEU026	Juana de Arco N° 7100, localidad de Canning			BATERIA UNION	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	EE32		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
EEZ001	Río Bermejo y Río Gualeguay	-34.8197794876	-58.5900884680	PLANTA LA CELIA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE28		EZEIZA	Sudoeste
EEZ002	Río Bermejo y La Atómica	-34.8216880495	-58.5935831963	PLANTA LA CELIA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EE28		EZEIZA	Sudoeste
EEZ003	Las Hortensias Norte	-34.8864399696	-58.5538350598	RED	POZO A RED	SERVICIO	EE22		EZEIZA	Sudoeste
EEZ006	Caminito 1200 (Ver dirección)	-34.9372980000	-58.5719340000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ007	Caminito 1900 (Ver dirección)	-34.9411666000	-58.5763055600	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	PARADO P/FALTA TENSIÓN	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ008	Gibraltar, 600 metros al Norte de Cam	-34.9426420000	-58.5912750000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			EZEIZA	Sudoeste
EEZ009	Gibraltar, 600 metros al Sur de Camin	-34.9505080000	-58.5821580000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			EZEIZA	Sudoeste
EEZ010	Paso de los Libres 1800	-34.9516770000	-58.5409620000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ011	Falucho y Paso de los Libres	-34.9224400000	-58.5680460000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ012	Paso de los Libres a 700m de Falucho	-34.9272140000	-58.5633040000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ013	Paso de los Libres 1400	-34.9330700000	-58.5583620000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ014	Paso de los Libres 1500	-34.9375700000	-58.5541280000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	TERCEROS	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ015	Paso de los Libres a 1700 mts de RP	-34.9427680000	-58.5496700000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ016	Mariano Moreno a 200m de Falucho	-34.9132000000	-58.5438650000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ017	Moreno 3500	-34.9183620000	-58.5401000000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	PARADO P/INT. DE 3°	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ018	Paso de los Libres 900	-34.9569760000	-58.5358190000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	PARADO P/INT. DE 3°	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ019	Ruta Provincial N°52 4000	-34.9601470000	-58.5406880000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ020	RP N° 52 1000	-34.9487030000	-58.5330280000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ021	RP N° 52 1200	-34.9335950000	-58.5227380000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ022	RP N° 52 s/n	-34.9275780000	-58.5192800000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ023	RP N° 52 1300	-34.9222990000	-58.5160440000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ024	Ruta N°52 kilómetro 2	-34.9163090000	-58.5140760000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ025	Fariña 2000	-34.9131920000	-58.5265030000	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	PARADO P/INT. DE 3°	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ026	Valle de Río Negro y América del Nort	-34.9218244388	-58.5752981738	BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ027	Cañada de Gomez y 25 de Mayo, Carlos Spegazzini, Ezeiza			BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ028	Quito y Arroyo, Carlos Spegazzini, Ezeiza			BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	STAND BY	EZPC2		EZEIZA	Sudoeste
EEZ029	Valle de Rio Negro y América del Norte, Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza			BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ030	D. F. Sarmiento y Roger Balet, Carlos Spegazzini, Ezeiza			BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ031	Roger Balet y Sargento Cabral, Carlos Spegazzini, Ezeiza			BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	SERVICIO	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
EEZ032	Valle de Río Negro y 25 de Mayo,Carlos Spegazzini, Ezeiza			BATERIA EZEIZA	TRATAMIENTO	PARADO P/FALTA TENSIÓN	EZPC1		EZEIZA	Sudoeste
LO004	Italia 600	-34.7676650000	-58.4028150000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO023	Esmeralda 1189	-34.7660920000	-58.3829790000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO025	M. Piaggio y Oliden	-34.7680401184	-58.4101665659	RED	POZO A RED	RESERVA	PCLO025	Bustamante 1068	LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO031	Coronel Bermudez 1700	-34.7736291000	-58.4204443000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO032	Santander 1982 1832	-34.7792620000	-58.4206720000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO033	Av. Frias 2000 1958	-34.7808380000	-58.4232350000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO034	Garibaldi 2500	-34.7828870000	-58.4277650000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO038	J.Rosso y Santamaria de Oro	-34.7825972481	-58.3934562587	REBOMBEO TEMPERLEY	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	RESERVA	LO_CIS_TEMP		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO042	Santa Lucia e H.Yrigoyen	-34.7944673340	-58.4097421458	PLANTA - LO042	TRATAMIENTO	SERVICIO	LO01		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO043	-	-34.7734560000	-58.3568980000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
LO044	San Luis 610	-34.7885980000	-58.4087810000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO053	Esmeralda y Colon	-34.7707224196	-58.3908416753	REBOMBEO TEMPERLEY	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	RESERVA	LO_CIS_TEMP		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO055	Correa y Santa Ana	-34.7854024874	-58.3901303466	REBOMBEO TEMPERLEY	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	RESERVA	LO_CIS_TEMP		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO057	San Agustin e/Fiedrichs y Luzuriaga	-34.7883278400	-58.4359200200			POZO INACTIVO / SELLADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO061	Frias 2298	-34.7836580469	-58.4218803362			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO067	De la Peña y Moldes	-34.7885941684	-58.4290034650	PLANTA - LO067	TRATAMIENTO	SERVICIO	LO04		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO070	Davila al 708	-34.8139199142	-58.4315023125			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO071	Santo vega y camino de cintura y Bahi	-34.8102787738	-58.4345102189	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LOPC1		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO072	Timbó y Cap. Moyano	-34.8202182309	-58.4354132261	PLANTA - LO072	TRATAMIENTO	SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
LO073	Monte Verde y Díaz Velez	-34.8180107652	-58.4303739463	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO074	Policastro 2400	-34.8210541715	-58.4273962234	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	RESERVA	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO075	Pino 2250 Camino de cintura y Bahia	-34.8243609400	-58.4237170408	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	RESERVA	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO076	Pino2781	-34.8267785352	-58.4284667607	RED	POZO A RED	POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
LO078	Arenales a 100m de J. Ingenieros	-34.8328608521	-58.4267915784	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO079	Arenales a 300m de L.M.Drago	-34.8314435723	-58.4239252942	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO080	Juan xxIII 2400 entre L.M.Drago y Bal	-34.8328777169	-58.4197000959	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO081	L.M.Drago y Melian	-34.8352175390	-58.4180613967	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	PARADO P/INT. DE 3°	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO082	Drago e/Castex y Cuip	-34.8405388700	-58.4146599100			POZO INACTIVO / SELLADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
LO083	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	-34.8439158349	-58.4118606632	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO084	L.M. Drago e/Cuyo y Fonrouge	-34.8469452428	-58.4098756745	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO085	L.M.Drago e/Cno las Flores y Fonrou	-34.8507490665	-58.4068249983	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO086	Cno de las Flores a 500m de Drago	-34.8588110000	-58.4058240000	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO087	Cno de las Flores y Malvinas Argentina	-34.8636760000	-58.4069720000	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO093	Cno San Vte a 500m pozo 87	-34.8678850000	-58.4086590000	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO094	San Juan al 900 e/ 30 de setiembre y	-34.7711990000	-58.3587460000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			ALMTE BROWN	Sudoeste
LO095	Larrea y Gardel	-34.8190855485	-58.4200971408	PLANTA - AB057	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB14		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO104	Gibson e/Esperanza y Bahia Blanca	-34.8050981300	-58.4371449100			POZO INACTIVO / SELLADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO105	-	-34.8071517885	-58.4303225297			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO106	J. B. Justo y Cuyo	-34.8032689558	-58.4112543868	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	LOPC2		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO107	Pobladora e/ Sarratea y Necochea	-34.8075794976	-58.4247614474	PLANTA - LO107	TRATAMIENTO	RESERVA	PCLO107	- Necochea 861	LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO113	Leloir 432	-34.7854586524	-58.3952703867	RED	O CON MEZCLA CON AGUA SUPERFI	SERVICIO	PCLO113	- Leloir 608	LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO115	-	-34.8135414760	-58.4245736329			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO117	Mendoza y N. Silva	-34.8066658062	-58.4103295412	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO118	Martin Rodriguez y Timbó	-34.8244378794	-58.4326271192	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO119	Tala y Pino	-34.8300783780	-58.4348957794	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	RESERVA	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO120	Pino y el Cairo	-34.8318009414	-58.4402895933	RED	POZO A RED	SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO121	J. Ingenieros y Fonrouge	-34.8423487886	-58.4240956914	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO122	J. Ingenieros	-34.8494593194	-58.4189727445	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO125	Av. Argentina y Guido	-34.8531200365	-58.4268826838	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO126	Av. Argentina	-34.8588373880	-58.4226171404	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	PARADO P/FALTA TENSIÓN	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO127	Jose Marmol e/Allemandri y Anchoren	-34.7644503702	-58.3766727564	PLANTA - LO127	TRATAMIENTO	SERVICIO	LO47		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO128	Marti y Av. Cabred	-34.7728564754	-58.3780917701	RED	O CON MEZCLA CON AGUA SUPERFI	SERVICIO	LO13		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO130	Chubut 199	-34.7601740000	-58.3566330000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO131	La Calandria 3995	-34.7564160000	-58.3487070000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO132	J. Ingenieros y Fonrouge	-34.8526881104	-58.4169056510	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO133	Av. Argentina y Junín	-34.8483674264	-58.4312606492	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	PARADO P/FALTA TENSIÓN	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO134	Larrea y Colihue	-34.8210474518	-58.4229262670	PLANTA - LO134	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB14		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO135	Matienzo y Rodriguez	-34.8289668102	-58.4417292052	PLANTA - LO135	TRATAMIENTO	SERVICIO	AB22		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO136	Predio Santa Catalina	-34.7820309327	-58.4368832134	RED	O CON MEZCLA CON AGUA SUPERFI	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	---		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO137	J. Ingenieros al 3400 a 600 mts pozo	-34.8547768629	-58.4153116778	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO138	Junín 170 entre Rodriguez y Las Hera	-34.8516282004	-58.4382708963	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
LO139	Amat y Petiribí	-34.8421828223	-58.4362840977	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
LO140	Av.Argentina 2950 y Petirbi	-34.8365300505	-58.4400382476	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
LO141	Rodriguez 3507 esq Mercedes	-34.8452615382	-58.4424719504	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
LO142	Jose Ingenieros 1668 e/ Cafferata No	-34.8387970000	-58.4275930000	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO143	Jose Ingenieros a 1000 mts. de la RP	-34.8624420000	-58.4107080000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			ALMTE BROWN	Sudoeste
LO144	Avenida Argentina y RP N° 16	-34.8700193367	-58.4150213021	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO145	Villarino y Avenida Argentina	-34.8692130000	-58.4239570000	BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LOPC2		ESTEBAN ECHEVERR	Sudoeste
LO146	Calle Pintos 2007 e/ Viel y Florida	-34.8376080000	-58.4084530000	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO147	Calle Magnolia 2099 e/ Moreno y V.Ba	-34.8430900000	-58.4171080000	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO148	Magallanes 2600 entre Ucrania y Duh	-34.8055480000	-58.4333890000	BATERIA LLAVALLOL	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	LOPC1		LOMAS DE ZAMORA	Sudoeste
LO149	Rene Vallo y Jose Melián, Almirante Brown			BATERIA BURZACO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	LOPC2		ALMTE BROWN	Sudoeste
LO152				PLANTA - LO152		STAND BY				Sudoeste
GU001	Malvinas 201 e/Pedraza.	-34.9241837707	-58.3825897814	NQUE OESTE - SAN MAR	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	GU-TAN-PED	Manuela Pedraza 854	Presedente Perón	Sudoeste
GU002	Colombia 1007 e/Av. De las Americas.	-34.9283775478	-58.3835947860	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-PED	Manuela Pedraza 854	Presedente Perón	Sudoeste
GU003	Haiti 896 e/Remedios de Escalada.	-34.9283840000	-58.3869580000	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-PED	Manuela Pedraza 854	Presedente Perón	Sudoeste
GU004	Tomas Guido 800 e/Remedios de Escalada.	-34.9301147676	-58.3905722124	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Presedente Perón	Sudoeste
GU005	Bogado 800 e/Islas Malvinas.	-34.9325350000	-58.3954280000	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-PED	Manuela Pedraza 854	Presedente Perón	Sudoeste
GU006	Av. Nestor Kirchner 630 e/Avellaneda y Güemes.	-34.9105574351	-58.3970436486	RED	POZO A RED	SERVICIO	GU02	Av. Nestor Kirchner 504	Presedente Perón	Sudoeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Direcció̲n del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
GU007	Republica Argentina 578 e/Venezuela.	-34.9241727416	-58.3870045947	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-PED	Manuela Pedraza 854	Presedente Perón	Sudoeste
GU008	Brasil 103 e/Pedraza.	-34.9215769370	-58.3827327443	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-PED	Manuela Pedraza 854	Presedente Perón	Sudoeste
GU010	Violeta Antier 5095 e/Santos Discepolo.	-34.8802341309	-58.4145621500	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCGU010	Violeta Antier 5095	Presedente Perón	Sudoeste
GU011	Alfonso Amat 4611 e/Jose Neglia.	-34.8744646197	-58.4126061825	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCGU011	José Negua 3515	Presedente Perón	Sudoeste
GU012	Calle 117 1000	-34.9061637109	-58.3782992793	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	RESERVA	GU-TAN-YA	Av. Carlos Mereles 1050	Presedente Perón	Sudoeste
GU013	Calle 118 N° 1633 e/calles 121 y 123.	-34.9044670062	-58.3737777548	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-YA	Av. Carlos Mereles 1050	Presedente Perón	Sudoeste
GU014	Cjal. Capuano 490 e/Cjal. Bracco.	-34.9061941840	-58.3694852461	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-YA	Av. Carlos Mereles 1050	Presedente Perón	Sudoeste
GU015	Calle 118 2041 e/calles 127 y 129.	-34.9021124068	-58.3691721523	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-YA	Av. Carlos Mereles 1050	Presedente Perón	Sudoeste
GU016	Calle 118 2471 e/calles 133 y 135.	-34.8995825196	-58.3652709657	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-YA	Av. Carlos Mereles 1050	Presedente Perón	Sudoeste
GU017	Av. 139 N° 510 e/Cjal. Bracco.	-34.9019006870	-58.3597727263	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-YA	Av. Carlos Mereles 1050	Presedente Perón	Sudoeste
GU018	Av. 21 N° 1099 e/calle 36.	-34.9133277441	-58.3512674167	BATERIA LAS LOMAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU01	DOLORES E/ FLORENCIO VA	Presedente Perón	Sudoeste
GU019	Cjal. Placido Bajo N° 901 e/ calle39.	-34.9234170639	-58.3753469257	BATERIA LAS LOMAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU01	DOLORES E/ FLORENCIO VA	Presedente Perón	Sudoeste
GU020	Remedios de Escalada e/Tomas Guido y Godoy Cruz	-34.9311910000	-58.3919690000	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-PED	Manuela Pedraza 854	Presedente Perón	Sudoeste
GU021	Roque Saenz Peña y Santa Elena	-34.9148640000	-58.3880450000	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU02	Av. Nestor Kirchner 504	Presedente Perón	Sudoeste
GU022	Dorrego y Luis A. Testa	-34.9190740000	-58.3887420000	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU02	Av. Nestor Kirchner 504	Presedente Perón	Sudoeste
GU023	Calle 103 y Calle 124	-34.9079790000	-58.3860840000	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-YA	Av. Nestor Kirchner 504	Presedente Perón	Sudoeste
GU024	Calle 116 y Av. 99	-34.9087060000	-58.3812580000	TANQUE ESTE - LA YAYA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-YA	Av. Carlos Mereles 1050	Presedente Perón	Sudoeste
GU025	Calle 6 y Tte. Juan Domingo Baldini	-34.9262300000	-58.3760920000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCGU025	Baldini 53, Guernica	Presedente Perón	Sudoeste
GU026	Kingston y Honduras	-34.9289860000	-58.3777240000	BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	STAND BY			Presedente Perón	Sudoeste
GU027	Brasilia y Guayanas	-34.9319330000	-58.3762060000	BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	STAND BY			Presedente Perón	Sudoeste
GU028	Puerto España y Brasilia	-34.9362210000	-58.3750540000	BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	STAND BY			Presedente Perón	Sudoeste
GU029	Gral Paz e/calle 7 y Lib. Gral J. de S.Martín	-34.9331500000	-58.3708750000	BATERIA BARRIO PARQUE AMERICANO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	STAND BY			Presedente Perón	Sudoeste
GU030	La Rioja e/ Av. Hipólito Yrigoyen y Sarmiento	-34.9112280000	-58.3900330000	BATERIA NUMANCIA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	STAND BY			Presedente Perón	Sudoeste
GU031	Brasil y Mesopotamia,Guernica, Presidente Perón	-34.9216310000	-58.3889080000	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-PED	Manuela Pedraza 854	Presedente Perón	Sudoeste
GU032	Avenida 38 entre calle 5 y 6	-34.9211670000	-58.3785280000	TANQUE OESTE - SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	GU-TAN-PED	Manuela Pedraza 854	Presedente Perón	Sudoeste
QU002	Urquiza. (Calle361) 2	-34.7187240000	-58.2795350000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste
QU004	uriburu y Illanes	-34.7366524000	-58.2316459400			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste
QU009	Madame Curie 3898	-34.7550466499	-58.2656794369			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste
QU010	Craviotto y L, M, Campos	-34.7566805600	-58.2705142500			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste
QU012	C, Rivadavia yTriunvirato	-34.7458881600	-58.2763780600			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste
QU015	Urquiza 572	-34.7233740000	-58.2782857000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste
QU016	Laprida Y urquiza	-34.7431643900	-58.2610671500			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste
QU018	M. Rodriguez. (Calle 365)1500	-34.7336700000	-58.2759417000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste
QU021	Colon (Calle 9)408	-34.7171102456	-58.2551567782			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste
QU024	Brown y Dorrego	-34.7357852800	-58.2460000700			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste
QU030	Franklin. (Calle 381) 3700	-34.7559941744	-58.2838726848			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste
QU032	Calchaqui y 402	-34.7639932400	-58.2747767900			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste
QU033	Esquel (Calle 417)628	-34.7435539992	-58.2338127081			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste
QU035	F. Amoedo. (calle 320) 3499	-34.7478520000	-58.2918060000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste
QU037	345 y 383	-34.7662181827	-58.2791181315	RED	O CON MEZCLA CON AGUA SUPERFI	SERVICIO	QU37	QU037PCP - Calle 383 Blanco Jose N° 4216.	QUILMES	Sudeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**										**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**
Pozo N°	**Direcció del pozo**	**Coordnadas GPS Latitud**	**Coordnadas GPS Longuitud**	**Sistema de distribución del pozo**	**Tipo de sistema**	**Estado del pozo**	**Punto de control (PMA o PC del pozo)**	**Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)**	**Distrito/Partido**	**Región**	
QU042	Hernandez 50	-34.7422135371	-58.2458216211			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU047	Centenario e/Schweitzer y 401 y 339	-34.7435489900	-58.2446623100			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU053	Avelina Huisi de Seguí 1637	-34.7461490000	-58.2959170000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU058	Centenario y R, De Cuba	-34.7486961900	-58.2388121100			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU059	uruguay y Gral, Acha	-34.7632857800	-58.2704437300			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU060	Calchaqui y Venezuela	-34.7701382300	-58.2696215000			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU061	Casares y Mexico	-34.7628365600	-58.2648057200			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU062	C, Casares y Brasil	-34.7592723900	-58.2675075000			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU066	Av, La Plata Y Paraguay	-34.7575486600	-58.2559914900			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU067	unamuno y Beriti	-34.7503483400	-58.2826739500			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU068	E, Minuto e/Florida y R, De Cuba	-34.7560714600	-58.2417864200			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU069	Craviotto 3624	-34.7655904801	-58.2853925386			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU071	Zapiola. (Calle 131) 1401	-34.7245650000	-58.3004470000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU076	Cno. G. Belgrano y Av. Monteverde	-34.7722439812	-58.2782265523	RED	O CON MEZCLA CON AGUA SUPERFI	SERVICIO	QU36		QUILMES	Sudeste	
QU077	Calle 874 5011	-34.7732325014	-58.2864924899			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU078	Calle 838 515	-34.7644590000	-58.2936120000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU079	-	-34.7643112606	-58.3005223552			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU081	Calle 881 4490	-34.7713937941	-58.2956717243			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU083	P. Mallorca (Calle 384) 3600	-34.7604705639	-58.2854906850			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU085	Esquel 1225 -	-34.7467006735	-58.2232881827			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU087	Unamuno (Calle 379) 1302	-34.7388930000	-58.2898600000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU088	Av. Guillermo Enrique Hudson 4398	-34.7778902488	-58.3087033414			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU089	Calle 818 795 1881	-34.7531231000	-58.3089666000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU08BIS	Gutierrez y Calle 379	-34.7560948700	-58.2785740900			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			QUILMES	Sudeste	
QU090	R, De Francia y Condarco	-34.7620369100	-58.2590324300			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU091	R, De Francia y B, BlancaCondarco	-34.7534725000	-58.2489968500			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU092	F, Amoedo y V, Gonzalez	-34.7422383300	-58.2787565100			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU093	A, Baranda y 401 bis	-34.7493959400	-58.2510667800			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU098	893 y 844	-34.7572648900	-58.2612984100			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU107	Elustondo y Craviotto	-34.7610975900	-58.2763999300			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU112	Tierra del Fuego 902	-34.7459299357	-58.2278011918			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU113	M, Cane y Gutierrez	-34.7552350100	-58.2749279800			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU114	839 e/ 894 y 895	-34.7769551123	-58.3129444421			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU115	Jose Andres Lopez 1802	-34.7746587611	-58.3036080807			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU116	Av,Jose Hernandez E/ Pringles y Gral	-34.7384583000	-58.2355109400			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU117	Yapeyu. (Calle 149) 195	-34.7176820000	-58.2880304000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU118	Pedemonte. (Calle 131)1770	-34.7406588811	-58.3293031823			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU119	Monseñor Angeleli. (Calle 806) 2201	-34.7511570000	-58.3288300000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU120	898 y 864	-34.7933104945	-58.3052589187	RED	POZO A RED	RESERVA			QUILMES	Sudeste	
QU121	Calle 893 4993	-34.7822517100	-58.3048139330			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU123	827 y 895	-34.7698321100	-58.3191293300			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			QUILMES	Sudeste	
QU126	Marconi (calle 371)901	-34.7289841606	-58.2849868877			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU128	Calle 889 2802 -	-34.7663444470	-58.3108561311			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU129	Hugo del Carril 2502	-34.7751325930	-58.3181908667			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			QUILMES	Sudeste	
QU130	Posadas y Venezuela	-34.7586118900	-58.2473872700			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU131	E, Iglesias y Alvear	-34.7423420800	-58.2380858600			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU133	Mar del Palta y Sobral	-34.7596849200	-58.2418052800			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU134	L, De la Torre y Venezuela	-34.7673529400	-58.2642025300			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU135	Moreno y Gel y Obes	-34.7351898500	-58.2486217000			POZO INACTIVO / SELLADO			QUILMES	Sudeste	
QU136	General Acha (Calle 496) 5100	-34.7668470733	-58.2668173907			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU137	Calle 896 1651 1844	-34.7587820000	-58.3306184000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU138	Calle 866 Esq. D. Alvarez	-34.7963455182	-58.3069735253	RED	O CON MEZCLA CON AGUA SUPERFI	SERVICIO	QU07		QUILMES	Sudeste	
QU139	Rio Desagüadero. (Calle 444)4500	-34.7371950925	-58.2231009944			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			QUILMES	Sudeste	
QU140	Calle 857 Bis y Calle 899	-34.7906979402	-58.3106394527	RED	POZO A RED	RESERVA	QU31		QUILMES	Sudeste	
QU141	Calle 863 Esq. Donato Alvarez	-34.7944319403	-58.3081985652	RED	O CON MEZCLA CON AGUA SUPERFI	SERVICIO	QU07		QUILMES	Sudeste	
FV001	Chacabuco 180	-34.8040750000	-58.2815620000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV-TAN-CEN	Batalla de Chacabuco 180, Florencio Varela, Buenos Aires	Florencio Varela	Sudeste	
FV002	San Martin y San Juan	-34.8073185643	-58.2787543949	TANQUE CENTRO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-CEN	Batalla de Chacabuco 180, Florencio Varela, Buenos Aires	Florencio Varela	Sudeste	
FV003	Constitución 198	-34.8042030000	-58.2716690000	TANQUE CENTRO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-CEN	Batalla de Chacabuco 180, Flor	Florencio Varela	Sudeste	
FV004	Carriego y Alem	-34.8035242186	-58.2671514614	TANQUE CENTRO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-CEN	Batalla de Chacabuco 180, Flor	Florencio Varela	Sudeste	
FV005	San Martin y Defensa	-34.7988825659	-58.2791473591	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV005	San Martin 2209	Florencio Varela	Sudeste	

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Direcció̲n del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
FV006	Aniceto Diaz y Basualdo	-34.8142616109	-58.2832148394	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV006	Basualdo 3616	Florencio Varela	Sudeste
FV007	Cariboni N° 2351 e/ Chaco y Rosario	-34.8307630000	-58.2568110000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV007	Cariboni e/Progreso y Rosario	Florencio Varela	Sudeste
FV008	Cariboni y Progreso	-34.8329427400	-58.2619636100			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			Florencio Varela	Sudeste
FV009	Cariboni y Rio Bermejo	-34.8357148856	-58.2659537933	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV009	Cariboni 1934	Florencio Varela	Sudeste
FV010	Calle 742 Cariboni	-34.8388270154	-58.2733845837			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Florencio Varela	Sudeste
FV011	Corrientes esq. 12 de Octubre	-34.8178530000	-58.2756100000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV011	Mar Chiquita 19	Florencio Varela	Sudeste
FV012	CEGADO	-34.8418260000	-58.2782660000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			Florencio Varela	Sudeste
FV013	Av Bélgica N° 1101 esq. Jorge Novak	-34.8224048825	-58.2832875146	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV013	AV PADRE OBISPO J NOVAK	Florencio Varela	Sudeste
FV014	J.D. Perón 535 y Pringles	-34.8109975621	-58.2679961810	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV014	JUAN DOMINGO PERON 530	Florencio Varela	Sudeste
FV015	CEGADO	-34.8329523276	-58.2320701851			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV016	CEGADO	-34.8354220000	-58.2289980000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV017	Tandil y Las Rosas	-34.8369615619	-58.2262861969			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV018	Av. Eva Perón y Gral. Hornos	-34.8301246858	-58.2771460769	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV018	Gral. Hornos 999	Florencio Varela	Sudeste
FV019	Río Caraguata n° 1401 y Directorio	-34.8325605333	-58.2728757635	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV019	Río Caraguata 1452	Florencio Varela	Sudeste
FV020	Cabildo y Eva Perón	-34.8243175201	-58.2767820242	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV020	Eva Perón 4576	Florencio Varela	Sudeste
FV021	Mantovani y Calle 1407	-34.8531952743	-58.2803366318	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV022	Juan Mantovani 587 e/ C.1423 y C. 1409	-34.8561390000	-58.2855360000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV023	Mantovani y Calle 1429	-34.8580380952	-58.2895082067	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV024	Eva Peron y Calle 1409	-34.8583095585	-58.2783582291	REBOMBEO SAN LUIS y RED	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV025	Calle 1423 (901) a 400 mts de Mantovani	-34.8607050000	-58.2839200000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV026	Calle 77 y Posadas	-34.7975641108	-58.2965602827	BATERIA SAN NICOLAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV02	Presidente Arturo Illia 1338 entr	Florencio Varela	Sudeste
FV027	El Zonda y El Gaucho	-34.8055477448	-58.3010246875	BATERIA SAN NICOLAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV02	Presidente Arturo Illia 1338 entr	Florencio Varela	Sudeste
FV028	Riobamba N° 1501 y Olivero	-34.8036061523	-58.2951529025	BATERIA SAN NICOLAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV02	Presidente Arturo Illia 1338 entr	Florencio Varela	Sudeste
FV029	Pte. Illia y Alvear	-34.8000480000	-58.2871320000	BATERIA SAN NICOLAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV02	Presidente Arturo Illia 1338 entr	Florencio Varela	Sudeste
FV030	Virgen del Valle y San Andrés	-34.8473306947	-58.2775792518	TANQUE MAYOL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-MAY	Av. Eva Peron 5798 entre calle	Florencio Varela	Sudeste
FV031	Virgen del Valle y El Clavel	-34.8446149027	-58.2735852609	TANQUE MAYOL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-MAY	Av. Eva Peron 5798 entre calle	Florencio Varela	Sudeste
FV032	Virgen del Valle y La Ancianidad	-34.8415885189	-58.2680594123	TANQUE MAYOL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-MAY	Av. Eva Peron 5798 entre calle	Florencio Varela	Sudeste
FV033	Virgen del Valle y Río Pilcomayo	-34.8396272193	-58.2630031426	TANQUE MAYOL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-MAY	Av. Eva Peron 5798 entre calle	Florencio Varela	Sudeste
FV034	Av Cacheuta y Boston	-34.8503732546	-58.2746791584	TANQUE MAYOL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-MAY	Av. Eva Peron 5798 entre calle	Florencio Varela	Sudeste
FV035	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	-34.8654862480	-58.2710228307			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV036	Calle 1422 y Eva Perón	-34.8637657636	-58.2770032651	REBOMBEO SAN LUIS RED	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV037	Calle 1432 N° 901 y Eva Perón	-34.8684340000	-58.2759590000	REBOMBEO SAN LUIS RED	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV038	Calle 1423 e/ 1422 y 1428	-34.8672910295	-58.2792900522	RED - Villa Brown	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV038	Calle 1423 y Calle 1422	Florencio Varela	Sudeste
FV039	Calle 1423 entre 1418 y 1420	-34.8638280000	-58.2821170000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Florencio Varela	Sudeste
FV040	1439 y Juan Mantovani.	-34.8617750000	-58.2949630000	REBOMBEO SARMIENTO consulta 16/01/25	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-CRU	Sgto Juan Bautista Cabral 1101	Florencio Varela	Sudeste
FV041	Calle 1335 N° 801 y 1328	-34.8617806566	-58.2688055489	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
FV042	Calle 1316 y 1333	-34.8583519925	-58.2720497654	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV043	Calle 1328 N° 2401 y 1347	-34.8578071031	-58.2614587428	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV044	Calle 1347 y Los Inmigrantes	-34.8523564966	-58.2653023768	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV045	Los Inmigrantes y Calle 1355	-34.8508486285	-58.2604360835	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV046	Batalla de Ituzaingo 2780 e/ Contreras y C.214A	-34.8039320000	-58.2643370000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV046	BATALLA DE ITUZAINGO 276(	Florencio Varela	Sudeste
FV047	Boedo e/ Montserrat y Túnez	-34.8064453754	-58.2464573771	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV047	MONSERRAT 178	Florencio Varela	Sudeste
FV048	León XIII e/ Pte. Perón y Beirut	-34.8047553117	-58.2435392159	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV048	León XIII N° 467	Florencio Varela	Sudeste
FV049	San Antonio e/ Irala y Alvar Cabeza de Vaca	-34.8102604617	-58.2173280997	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV049	CALLE 1023 N° 1323	Florencio Varela	Sudeste
FV050	Av. Eva Perón N° 7700 e/1310 y Cacheuta	-34.8554703572	-58.2773819525	REBOMBEO SAN LUIS RED	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV051	Cacheuta 3601 y 1371	-34.8403733001	-58.2540004176	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV051	Cacheuta 3601 y Calle 1371	Florencio Varela	Sudeste
FV052	Av. Cacheuta y El Jazmín	-34.8473895072	-58.2693467558	TANQUE MAYOL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-MAY	Av. Eva Peron 5798 entre calle	Florencio Varela	Sudeste
FV053	Cacheuta 2701 y Calle 1353	-34.8462082668	-58.2650740431	TANQUE MAYOL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-MAY	Av. Eva Peron 5798 entre calle	Florencio Varela	Sudeste
FV054	1323 y 1344	-34.8689060000	-58.2689440000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Florencio Varela	Sudeste
FV055	Calle 832 e/M.Grass y Piedrabuena (V.A.)	-34.8206332639	-58.2466341134	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV055	CALLE 832 N°339	Florencio Varela	Sudeste
FV056	Calle 1393 N° 602 Y Av. Inmigrantes	-34.8389356233	-58.2395059986	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV057	Vírgen del Valle N° 2599 y Chaco	-34.8355092291	-58.2551635913	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV057	Vírgen del Valle N° 2599 y Chac	Florencio Varela	Sudeste
FV058	Juan B. Justo y Ascasubi	-34.8134355377	-58.2254175780	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV058	ASCASUBI 737	Florencio Varela	Sudeste
FV059	Av Bosques y Ruta 36	-34.8108142112	-58.2303906916	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV059	O´GORMAN 289	Florencio Varela	Sudeste
FV060	Delgado y Cañuelas	-34.8007719070	-58.2450062577	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV060	DELGADO 4241	Florencio Varela	Sudeste
FV061	R.Escalada 4099 Esq C.Tejedor	-34.8008020000	-58.2489650000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCFV061	Remedio de Escalada 4025	Florencio Varela	Sudeste
FV062	Calle 740 y El Clavel	-34.8389035952	-58.2772670225	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV062	Calle 740 A N° 926	Florencio Varela	Sudeste
FV063	Av Eva Perón 5880	-34.8352603106	-58.2776377387	TANQUE MAYOL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-MAY	Av. Eva Peron 5798 entre calle	Florencio Varela	Sudeste
FV064	C. 1439 e/ C.1420 y a 300 mts de Juan Mantovani	-34.8653410000	-58.2916670000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV065	Eva Perón N° 9695 y C. 1423	-34.8722711900	-58.2755205100	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV066	Avenida Eva Perón y Calle 1352	-34.8765460000	-58.2763090000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV067	Calle 1108 N° 1702 e/ 1131 y 1139	-34.8634006099	-58.2203647703	BATERIA ING. ALLAN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV067-70	La Huella 651	Florencio Varela	Sudeste
FV068	Calle 1108 N° 2280 esq. 1139	-34.8606910293	-58.2176012760	BATERIA ING. ALLAN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV067-70	La Huella 651	Florencio Varela	Sudeste
FV069	Diag. Los Quilmes N° 500	-34.8579952708	-58.2143989721	BATERIA ING. ALLAN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV067-70	La Huella 651	Florencio Varela	Sudeste
FV070	Calle 1108 N° 2300	-34.8581119321	-58.2106925919	BATERIA ING. ALLAN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV067-70	La Huella 651	Florencio Varela	Sudeste
FV071	San Nicolás N° 2501 y Chaco	-34.8210400000	-58.2658770000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV071	CHACO 576	Florencio Varela	Sudeste
FV072	Finochietto N° 1411 y Fracción V	-34.7832663061	-58.2721488305	REBOMBEO CRUCE VARELA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-CRU	Sgto Juan Bautista Cabral 1101	Florencio Varela	Sudeste
FV073	C.O.Cruce	-34.7826998862	-58.2743038846	REBOMBEO CRUCE VARELA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-CRU	Sgto Juan Bautista Cabral 1101	Florencio Varela	Sudeste
FV074	Carlos Gardel N° 700 y Campichuelo	-34.7808701565	-58.2778560416	REBOMBEO CRUCE VARELA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-CRU	Sgto Juan Bautista Cabral 1101	Florencio Varela	Sudeste
FV075	1° de Mayo 800 e/ Lisandro de la torre y El Chocon	-34.8210520000	-58.2138220000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCFV075	1° DE Mayo 601 esq. L.de la To	Florencio Varela	Sudeste
FV076	1216 Azurduy 2400	-34.8257497428	-58.1990176887	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCFV076	1216 Azurduy 2400 e/ Haedo y	Florencio Varela	Sudeste
FV077	Rumania N° 1001	-34.8357459962	-58.2906802423	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCFV077	Rumania 1147	Florencio Varela	Sudeste
FV078	Bruselas y Polonia	-34.8318890000	-58.2915580000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV078	Bruselas 1692	Florencio Varela	Sudeste
FV079	Bruselas y Bulgaria	-34.8351600000	-58.2978560000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV079	Bruselas 2281	Florencio Varela	Sudeste
FV080	517 N° 1700 y Portela	-34.8101371843	-58.3032614115	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV080	Calle 517 N° 1726	Florencio Varela	Sudeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
FV081	1° de Mayo y Hernandarias	-34.8155097412	-58.2083113458			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			Florencio Varela	Sudeste
FV082	El Paisano N° 1899 e/445 (B° Don José Planificado)	-34.8034730000	-58.3206340000	RED	POZO A RED	SERVICIO	FV-TAN-P82	El Paisano y Calle 445 (Centro	Florencio Varela	Sudeste
FV083	Catamarca 910 e/ San Nicolás y Jáchal	-34.8203794194	-58.2632637643	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCFV083	Catamarca 910 e/ San Nicolás	Florencio Varela	Sudeste
FV084	1610 e/RP 53 y 1647	-34.9028991556	-58.2652412096	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV085	1653 e/Av. La Plata y A° Las Conchitas	-34.8930801460	-58.2644774191	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV086	1374 N° 900 esq. 1313	-34.8851416204	-58.2650925017	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV087	1364 N° 1082 esq. 1317a	-34.8784764608	-58.2664669150	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV088	1327 N° 3201 e/ 1364 y 1370	-34.8769434792	-58.2601839707	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV089	1356 N° 1700 e/ 1347 y 1349	-34.8669530961	-58.2540929859	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV090	Av. La Plata N° 1200 e/1327 y 1319a	-34.8828778055	-58.2547778771	BATERIA LAS COLONIAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV090-94	Logia Lautaro 119	Florencio Varela	Sudeste
FV091	1608 entre 1671 y 1673	-34.8824402787	-58.2430290732	BATERIA LAS COLONIAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCFV090-94	Logia Lautaro 119	Florencio Varela	Sudeste
FV092	1345 e/Av. La Plata y 1364	-34.8738043469	-58.2502808471	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV090-94	Logia Lautaro 119	Florencio Varela	Sudeste
FV093	1681 esq. 1608	-34.8761900161	-58.2361010781	BATERIA LAS COLONIAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV090-94	Logia Lautaro 119	Florencio Varela	Sudeste
FV094	1364 N° 2592 e/ 1371 Y 1357	-34.8646098539	-58.2411587222	BATERIA LAS COLONIAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV090-94	Logia Lautaro 119	Florencio Varela	Sudeste
FV095	Pisani N° 1101 esq. Suecia	-34.8472230687	-58.2882158007	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV095	Pisani 2165	Florencio Varela	Sudeste
FV096	Humahuaca N° 501 y 511	-34.8242938089	-58.2902606689	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV096	CALLE 511 N° 4078	Florencio Varela	Sudeste
FV097	Castelli N° 1001 esq. EE.UU	-34.8041724343	-58.2885724458	BATERIA SAN NICOLAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV02	Presidente Arturo Illia 1338 entr	Florencio Varela	Sudeste
FV098	Cno. Touring Club N° 1499 y Canalejas	-34.8080527153	-58.2196524499	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV098	TOURING 1561	Florencio Varela	Sudeste
FV099	Av. Vergara N° 3201 y Martínez	-34.8309820640	-58.1927489256	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCFV099	Martínez 1280	Florencio Varela	Sudeste
FV100	228-Gral Perón N° 1501 y Bs. As.	-34.8101972741	-58.2587158381	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV100	J D. Perón 1536	Florencio Varela	Sudeste
FV101	Tirana N° 1373 casi esquina 627-(ex Yugoslavia)	-34.8329640493	-58.2891482222			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Florencio Varela	Sudeste
FV102	V.Abrille N° 975 casi esquina Calle 519	-34.8155539275	-58.2998551396	BATERIA SAN JORGE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV154	Calle 517 n°2434	Florencio Varela	Sudeste
FV103	Cicilia N° 2020	-34.8449181267	-58.2823948595	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV103	Sicilia 2005	Florencio Varela	Sudeste
FV104	Calle 1363 N° 100 y Los Inmigrantes	-34.8461010000	-58.2566030000	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV105	Calle 527 e/ 554 y 554A	-34.8186910000	-58.3016650000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV105	Calle 554 N° 1357	Florencio Varela	Sudeste
FV106	Calle 554 N° 1103 e/ Diag. Jarilla	-34.8224813806	-58.3081244760	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV106	Calle 554 N° 1103	Florencio Varela	Sudeste
FV107	Bourel N° 2710 esq. Chacabuco	-34.8042647081	-58.2814751520	TANQUE CENTRO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	FV-TAN-CEN	Batalla de Chacabuco 180, Flor	Florencio Varela	Sudeste
FV108	Calle 1348 N° 1003	-34.8715032678	-58.2710065266	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV108	Calle 1348 n° 1018	Florencio Varela	Sudeste
FV109	Calle 1435 N° 1719 esq. 1434	-34.8732407244	-58.2816780115	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV109	Calle 1435 N° 1756	Florencio Varela	Sudeste
FV110	Las Lengas N° 2303 e/ El cardenal y El zorzal	-34.8169340000	-58.3201700000	BATERIA GOBERNADOR COSTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV01	El Cardenal esquina Los Olmos	Florencio Varela	Sudeste
FV111	Los Alamos N° 2502	-34.8107028357	-58.3285785146	BATERIA GOBERNADOR COSTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV01	El Cardenal esquina Los Olmos	Florencio Varela	Sudeste
FV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Suecia	-34.8371608053	-58.2948299705	REBOMBEO SARMIENTO consulta 16/01/25	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV112	618-Paysandú N° 2202 esq. Su	Florencio Varela	Sudeste
FV113	Bonn N° 1203 y Austria	-34.8283747114	-58.2910516664	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV113	Austria 190	Florencio Varela	Sudeste
FV114	Calle 531 N° 2200	-34.8165876110	-58.3057589029	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV114	Calle 531 n 2144	Florencio Varela	Sudeste
FV115	Progreso 2190 e/ Intendente Jose Luis Cariboni y virgen de valle	-34.8332890000	-58.2612040000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV115	Cariboni y El progreso	Florencio Varela	Sudeste
FV116	Calle 1323 N° 1601 e/ 1334 y 1332	-34.8659720013	-58.2715854777	RED Villa San Luis	POZO A RED	SERVICIO			Florencio Varela	Sudeste
FV117	Lourdes N° 402 y Ruta Prov. N° 53	-34.8450844512	-58.2781516509	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV117	Lourdes 451	Florencio Varela	Sudeste
FV118	Santa Lucía N° 1002 y Aconquija	-34.8147291658	-58.2168198122	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCFV118	Santa Lucía N° 1016 y Aconquij	Florencio Varela	Sudeste
FV119	Suecia N° 1601 esq. Lisboa	-34.8435887979	-58.2901827918	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV119	Suecia 1622	Florencio Varela	Sudeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Direcció del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
FV120	Calle 1404 N° 498 e/ R.P. 53 y campo	-34.8518542012	-58.2812028915	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV121	Av. Gral. Savio N° 598 esq. Sicilia	-34.8484729325	-58.2799396766	REBOMBEO SARMIENTO consulta 16/01/25	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-MAY	Av. Eva Peron 5798 entre calle	Florencio Varela	Sudeste
FV122	Copenhage N° 502 esq. Alemania	-34.8315839702	-58.2797521451	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV122	COPENHAGUE 556	Florencio Varela	Sudeste
FV123	Calle 172 - Río Negro N° 1790 esq. Alvarado	-34.7993059592	-58.2549953107	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV123	RIO NEGRO 1698	Florencio Varela	Sudeste
FV124	E.B. SARMIENTO	-34.8520872795	-58.2830618210	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV125	Bourel y Chacabuco	-34.8038488319	-58.2821034595	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV125	BATALLA DE CHACABUCO 18	Florencio Varela	Sudeste
FV126	Riobamba y Vías	-34.7957903310	-58.2797871410	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV126	San Martin 1955	Florencio Varela	Sudeste
FV127	Calle 1151A y Calle 1130	-34.8641750000	-58.1980630000	RED	POZO A RED	PARADO P/FALTA TENSIÓN	PCFV127	Calle 1130 N° 2839	Florencio Varela	Sudeste
FV128	Rio Diamante N° 3080 esquina Villegas	-34.8234495477	-58.2581312831	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV128	VILLEGAS 1385	Florencio Varela	Sudeste
FV129	Rio Diamante N° 2680 esquina Avellaneda	-34.8252528952	-58.2617915822	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV129	AVELLANEDA 1323	Florencio Varela	Sudeste
FV130	Calle 1341 N° 511 esquina calle 1310	-34.8532070000	-58.2701900000	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV131	El Malambo N° 105 esq. La Tranquera	-34.7983498409	-58.3163282393	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV131	La tranquera 1633	Florencio Varela	Sudeste
FV132	Calle 1426 esq. 1437	-34.8705487322	-58.2858612582	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV133	Calle 1151 y Calle 1118	-34.8592240000	-58.2058310000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV133	Calle 1118 N° 2841	Florencio Varela	Sudeste
FV134	Los Inmigrantes y calle 1363	-34.8474805466	-58.2555883106	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV135	Planta La Hormiga	-34.8357440000	-58.3071230000	PLANTA LA HORMIGA		POZO ACTIVO NO PROD / RESERVA			Florencio Varela	Sudeste
FV136	Planta La Hormiga	-34.8352630000	-58.3072150000	PLANTA LA HORMIGA		POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			Florencio Varela	Sudeste
FV137	San Geronimo 605	-34.8219770000	-58.2120430000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV137	San Geronimo 650	Florencio Varela	Sudeste
FV138	Campana y Esmeralda	-34.8269730000	-58.2143100000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV138	Campana 2930	Florencio Varela	Sudeste
FV139	Guaminí 2711	-34.8276220000	-58.2183720000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV139	La esmeralda y Guamini (modifi	Florencio Varela	Sudeste
FV140	San Martin y Monteagudo	-34.7972430000	-58.2755160000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV140	Granaderos 144	Florencio Varela	Sudeste
FV141	Alfonsina Storni 74	-34.7702470000	-58.2723030000	BATERIA BARRIO ALTAMIRA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV153	Libres del Sud esq. Calchaquí	Florencio Varela	Sudeste
FV142	Dardo Rocha y Cerro Famatina	-34.7901470000	-58.2733250000	REBOMBEO CRUCE VARELA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-TAN-CRU	Sgto Juan Bautista Cabral 1101	Florencio Varela	Sudeste
FV143	Calle 1328 y 1355	-34.8543010000	-58.2548370000	REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV144	La Plata 1700	-34.8800730000	-58.2500960000	BATERIA LAS COLONIAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV090-94	Logia Lautaro 119	Florencio Varela	Sudeste
FV145	Cacheuta y Calle 1363	-34.8427022000	-58.2595795000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV145	Cacheuta y Hornos	Florencio Varela	Sudeste
FV146	Calle 1353 4100	-34.8525900000	-58.2273610000	BATERIA LAS COLONIAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV090-94	Logia Lautaro 119	Florencio Varela	Sudeste
FV147	Av. La Plata 50	-34.8999410000	-58.2739480000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV148	Calle 153a 301	-34.8529130000	-58.2102080000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV148	CALLE 153 A Y CALLE 1112	Florencio Varela	Sudeste
FV149	Av. La Plata y Calle 1305	-34.8957340000	-58.2686270000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV150	El Ñandú e/ Las Casuarinas y Los Alamos	-34.8067550000	-58.3222420000	BATERIA GOBERNADOR COSTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV01	El Cardenal esquina Los Olmos	Florencio Varela	Sudeste
FV151	Los Lapachos y Tinkunaku	-34.8130920000	-58.3152670000	BATERIA GOBERNADOR COSTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV01	El Cardenal esquina Los Olmos	Florencio Varela	Sudeste
FV152	El Apero entre Calle 437 y El Malambo	-34.8016550000	-58.3147350000	BATERIA SAN NICOLAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV02	Presidente Arturo Illia 1338 entr	Florencio Varela	Sudeste
FV153	Florida y Miguel Cané	-34.7687440000	-58.2643720000	BATERIA BARRIO ALTAMIRA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV153	Libres del Sud esq. Calchaquí	Florencio Varela	Sudeste
FV154	Calle 560 y La Paloma	-34.8227310000	-58.3047650000	BATERIA SAN JORGE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV154	Calle 517 n°2434	Florencio Varela	Sudeste
FV155	Alfonsina Storni y Av. Del Trabajo	-34.7746930000	-58.2687240000	RED - fuera del radio servido	POZO A RED	STAND BY	PCFV155 fuefa del radio servido	Av. Del Trabajo y Alfonsina Stor	Florencio Varela	Sudeste
FV156	Calle 1433a y 1418	-34.8653040000	-58.2872680000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV157	Calle 1443 y 1430	-34.8746480000	-58.2886330000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
FV158	Calle 1440 a 400m de 1430	-34.8778920000	-58.2823220000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV159	calle 1440 a 1000m de 1430	-34.8822690000	-58.2904890000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV160	calle 1452 y RP53	-34.8846390000	-58.2775830000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV161	Los Laureles y El Cardenal	-34.8046330000	-58.3288500000	BATERIA GOBERNADOR COSTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV01	El Cardenal esquina Los Olmos	Florencio Varela	Sudeste
FV162	La Paloma y Los Sauces	-34.8087830000	-58.3159810000	BATERIA GOBERNADOR COSTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV01	El Cardenal esquina Los Olmos	Florencio Varela	Sudeste
FV163	El Mirlo entre Los Olivos y Los Lapachos	-34.8156330000	-58.3240890000	BATERIA GOBERNADOR COSTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV01	El Cardenal esquina Los Olmos	Florencio Varela	Sudeste
FV164	calle 1155 y 1138	-34.8664140000	-58.1914970000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV164	Calle 1155 y Diag. Los Guaraní	Florencio Varela	Sudeste
FV165	Monteverde e/447 y 449, Claypole, Florencio			RED Zona Gobernador Costa	POZO A RED	SERVICIO	PCFV165	Av. Gdor. Monteverde 5583 ent	Florencio Varela	Sudeste
FV166	Calle 1440 y 1455	-34.8847690000	-58.2952830000	REBOMBEO SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SAR	Calle 1404 Nro 498, Villa Brown	Florencio Varela	Sudeste
FV167	Calle 1145 y Calle 1122, Florencio Varela			BATERIA ING. ALLAN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV067-70	La Huella 651	Florencio Varela	Sudeste
FV168	Calle 1149 y Calle 1136 Florencio Varela			Red Zona Ing Allan	POZO A RED	SERVICIO	PCFV168	Calle 1149 y Calle 1136 Florencio Varela	Florencio Varela	Sudeste
FV169	Jacinto Benavente y E, D Amicis, Florencio Varela			RED Zona Bosques Centro	POZO A RED	SERVICIO	PCFV059	O´GORMAN 289	Florencio Varela	Sudeste
FV170						STAND BY			Florencio Varela	Sudeste
FV171						STAND BY			Florencio Varela	Sudeste
FV172						STAND BY			Florencio Varela	Sudeste
FV173						STAND BY			Florencio Varela	Sudeste
FV174	Castelli esquina EEUU de América, Florencio Varela			BATERIA SAN NICOLAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV02	Presidente Arturo Illia 1338 entr	Florencio Varela	Sudeste
FV175	Santa Lucia y Aconquija, Florencio Varela			RED	POZO A RED	SERVICIO	PCFV118	Santa Lucía N° 1016 y Aconquij	Florencio Varela	Sudeste
FV176	Calle 1608 Entre calles 1671 y 1673, Florencio Varela			BATERIA LAS COLONIAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCFV090-94	Logia Lautaro 119	Florencio Varela	Sudeste
FV177	Dirección: Calle 1347 a una distancia de 58 metros aproximadamente de Avenida de los Inmigrantes, Florencio Varela			REBOMBEO SAN LUIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	FV-CIS-SL	Los Inmigrantes y calle 1363	Florencio Varela	Sudeste
FV178	Av. Bosques y calle 819, Florencio Varela			RED Bosques	POZO A RED	SERVICIO	PCFV178	Av. Bosques Esq. Calle 811	Florencio Varela	Sudeste
FV183	Remedios de Escalada esq Carlos Tejedor, Florencio Varela			RED San Juan Bautista	POZO A RED	SERVICIO	PCFV183	Remedios de Escalada esq Car	Florencio Varela	Sudeste
FV184	Turquía entre Bruselas y Milán, Florencio Varela			RED Santa Rosa II	POZO A RED	SERVICIO	PCFV184			
FV191				RED		STAND BY			Florencio Varela	Sudeste
LMO046	Fortín Yunke y Guanabara.	-34.8441687280	-58.6387196662	RED	POZO A RED	RESERVA	LMO03		LA MATANZA	Oeste
LMO047	Colect. R3 y Huillapima B° Pque Leloir	-34.8432739537	-58.6523433371	RED	POZO A RED	RESERVA	LMO03		LA MATANZA	Oeste
LMO049	Escribano y Cullen B°El Pino.	-34.8672624105	-58.6579461814	RED	POZO A RED	RESERVA	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO053	Haití y Gallego - Haiti y Torren.	-34.7838830783	-58.6420485048	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO08		LA MATANZA	Oeste
LMO054	Luciano Torrent N° 600 y Simón Perez	-34.7773650080	-58.6409529993	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO08		LA MATANZA	Oeste
LMO056	Guanacache y Pino B° Recoleta.	-34.8773599284	-58.6704880034	RED	POZO A RED	RESERVA	LMO07		LA MATANZA	Oeste
LMO062	Russo y Larsen (Russo E/ Larsen y L	-34.7371407793	-58.6363136479	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO11		LA MATANZA	Oeste
LMO063	Huemul y Rodney B°María Elena	-34.7386334574	-58.6102215753	RED	POZO A RED	PARADO P/INT. DE 3°	LMO02		LA MATANZA	Oeste
LMO064	Urdaneta y Rodney B° María Elena	-34.7362867372	-58.6128512936	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO02		LA MATANZA	Oeste
LMO065	La Bastilla y Recuero B° María Elena	-34.7345972574	-58.6198362047		POZO A RED	POZO IRRECUPERABLE / CEGADO	LMO09		LA MATANZA	Oeste
LMO068	M. Gamboa y Colegiales	-34.7342543184	-58.6353051458	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO11		LA MATANZA	Oeste
LMO070	M. Gamboa e/ S Fajardo y Rocamora	-34.7302937458	-58.6311606393	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO11		LA MATANZA	Oeste
LMO071	Roney e/ Larraya y Lavalleja B° 24 de	-34.7312770900	-58.6255895900			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
LMO072	J. De Alagón y Sold. Fajardo B° 24 de	-34.7343289577	-58.6259190874	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO11		LA MATANZA	Oeste
LMO073	J. De Alagón y Sold. Fajardo B° 24 de	-34.7491630551	-58.6257007923	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO14		LA MATANZA	Oeste
LMO074	Echauri N° 3200 e/ J.B.Justo y Vidal	-34.7522437735	-58.6221300275	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO14		LA MATANZA	Oeste
LMO075	Lavalleja y Conde.	-34.7566607793	-58.6538912950	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO26		LA MATANZA	Oeste
LMO076	N de Balboa y Luján.	-34.7562210729	-58.6492815158	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO26		LA MATANZA	Oeste
LMO077	Castañon y Río Cuarto B° El Porvenir	-34.7325468013	-58.6215014049	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO09		LA MATANZA	Oeste
LMO078	Zequeira garcia E/ Fajardo y Rocamor	-34.7385106397	-58.6214153667	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO02		LA MATANZA	Oeste
LMO079	Urdaneta y Rocamora	-34.7414970948	-58.6190037830	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO02		LA MATANZA	Oeste
LMO080	Russo e/ Fourner y Dinizetti B° el Fort	-34.7543204212	-58.6153142217	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO14		LA MATANZA	Oeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
LMO081	Echauri e/ Ortega Zynni Villa Scasso	-34.7459453252	-58.6287266222	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO14		LA MATANZA	Oeste
LMO082	Hilarión Plaza y Nueva York.	-34.8780279526	-58.6745244210	PLANTA - LMO082	TRATAMIENTO	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO07		LA MATANZA	Oeste
LMO083	Durero N° 900 E/ Ruta 21 (Otero) y D	-34.7622083068	-58.6584922818	RED	POZO A RED	RESERVA	LMO24		LA MATANZA	Oeste
LMO085	Martinez y Lasalle.	-34.7694410778	-58.6529200520	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO24		LA MATANZA	Oeste
LMO086	Int, F Russo e/E Spilimberg y Vogel	-34.7322126900	-58.6424316000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LA MATANZA	Oeste
LMO087	Resero e/Acasusso y Alagon	-34.7380477463	-58.6300767102	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO11		LA MATANZA	Oeste
LMO088	De La Fuente E. 3600. Lanza y Rodne	-34.7265722777	-58.6250511901	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO09		LA MATANZA	Oeste
LMO094	A. Vives 700 y Guanabara	-34.8473574689	-58.6450337444	RED	POZO A RED	RESERVA	LMO03		LA MATANZA	Oeste
LMO095	Mantegazza N° 6100 e/Numancia y Al	-34.8981352396	-58.6979972329	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO04		LA MATANZA	Oeste
LMO096	M. Herrera e/ Guancache y Eder - B°	-34.8589333804	-58.6483995846	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO03		LA MATANZA	Oeste
LMO098	E. Clay (e) Mirador y Purero.	-34.7650859061	-58.6657242023	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO24		LA MATANZA	Oeste
LMO099	Hugo Wast e/ Madreselva y milamores	-34.8365508650	-58.6464122132	RED	POZO A RED	RESERVA	LMO29		LA MATANZA	Oeste
LMO101	Scarlati y Gallardo.	-34.7895294009	-58.6357748250	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO01		LA MATANZA	Oeste
LMO103	Santo Tome y Tomas Argentino Valle	-34.7791211400	-58.6102660000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LA MATANZA	Oeste
LMO108	Lavalleja N° 6100 e/ Alegría y Ancon	-34.7444859703	-58.6406097911	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO19		LA MATANZA	Oeste
LMO109	Gamay y Pericón.	-34.7584968450	-58.6603698331	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO24		LA MATANZA	Oeste
LMO112	Fernandez y Leopardi B° Caridad.	-34.7824881267	-58.6498067468	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO08		LA MATANZA	Oeste
LMO118	El Resero 3351(e) Ortega y Zequeira.	-34.7418606340	-58.6242771481	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO46		LA MATANZA	Oeste
LMO120	Zeppelin y Del Tejar	-34.7454263842	-58.6145043263	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO09		LA MATANZA	Oeste
LMO121	L. Da Vinci 4000	-34.7447772840	-58.6172992362	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO09		LA MATANZA	Oeste
LMO123	Tinogasta y Colegiales	-34.7480422608	-58.6154126932	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO09		LA MATANZA	Oeste
LMO124				RED	POZO A RED	RESERVA				
LMO125	Corrales Fte N° 1100 y Espejo.	-34.8530775383	-58.6447803861	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO03		LA MATANZA	Oeste
LMO126	Ancón al 3584 esquina Zinny	-34.7516266919	-58.6331297838	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO26		LA MATANZA	Oeste
LMO127	Cazón 4000 esq. J.B. Justo	-34.7467082195	-58.6226944106	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO09		LA MATANZA	Oeste
LMO131	Victor Martínez y Da Vinci	-34.7526590119	-58.6071517827	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	---		LA MATANZA	Oeste
LMO134	R. Patron y Varela.	-34.7600923089	-58.5862476634	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO22		LA MATANZA	Oeste
LMO135	Garzon y Benjamin Gatienzo	-34.7793106200	-58.6158278500			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LA MATANZA	Oeste
LMO139	Caxaraville 900 e/ Simon Perez y Riva	-34.7737407499	-58.6451190942	RED	POZO A RED	TERCEROS	LMO08		LA MATANZA	Oeste
LMO140	Castro e/ Cepeda y Sanabria.	-34.7608437756	-58.6530512352	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO26		LA MATANZA	Oeste
LMO141	Leonardo Da Vinci al 3000 e/ Juan C.	-34.7372854000	-58.6259495600			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
LMO143	Scarlatti y Areco.	-34.8013396691	-58.6268737717	RED	POZO A RED	RESERVA	LMO25		LA MATANZA	Oeste
LMO146	Dragones y Figueredo.	-34.7814760000	-58.6385030000	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO08		LA MATANZA	Oeste
LMO153	Elizalde 4280.	-34.7643650000	-58.5855750000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO22		LA MATANZA	Oeste
LMO154	Elizalde 4280.	-34.7643650000	-58.5855750000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
LMO158	Almagro y Apipe	-34.7566455326	-58.6289396414	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO45		LA MATANZA	Oeste
LMO160	Urien y Areco.	-34.8231170000	-58.6596610000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO161	Arias Manuel y Bacon - Urien Fte N° 5	-34.7658990533	-58.6230020799	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO16		LA MATANZA	Oeste
LMO163	Comodoro Py y Riglos.	-34.7600436517	-58.6142810619	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO23		LA MATANZA	Oeste
LMO164	Saenz y Croacia.	-34.7770420671	-58.6536332381	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO08		LA MATANZA	Oeste
LMO165	Fajardo y Encina	-34.7516936932	-58.6030369844	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	---		LA MATANZA	Oeste
LMO170	Ancon y Alegria E/ Fournier	-34.7602610000	-58.6221720000	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO16		LA MATANZA	Oeste
LMO172	J.F Echauri y Donizetti E/ Alagón	-34.7415581577	-58.6344296376	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO09		LA MATANZA	Oeste
LMO175	Baez y Bavio	-34.7684086037	-58.6232073623	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO16		LA MATANZA	Oeste
LMO177	Ibera y Barrientos.	-34.7667817865	-58.6390535682	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO34		LA MATANZA	Oeste
LMO179	Coronel Conde e/ Villena y Coronado	-34.7755628808	-58.6310498278	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO48		LA MATANZA	Oeste
LMO180	Machain esq. Puerto Argentino.	-34.7760738410	-58.6371280254	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO08		LA MATANZA	Oeste
LMO187	Pto Argentino y Conc. del Valle.	-34.7686500784	-58.6478190752	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO26		LA MATANZA	Oeste
LMO189	Leones Entre Gana y Conde.	-34.7628493694	-58.6474560887	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO26		LA MATANZA	Oeste
LMO191	Icalma esq. M. Arias	-34.7588300811	-58.6342536992	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO26		LA MATANZA	Oeste
LMO192	Totoral entre Barrientos y Barragan.	-34.7692696214	-58.6367200666	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO48		LA MATANZA	Oeste
LMO193	Jachal esq. Juan Pio Gana.	-34.7730766531	-58.6352060634	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO48		LA MATANZA	Oeste
LMO195	Esquiza entre totoral y Gallardo.	-34.7736850994	-58.6427719887	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO08		LA MATANZA	Oeste
LMO197	Scarlatti e/ Villanueva y Monzoni.	-34.7980519262	-58.6297450479	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO25		LA MATANZA	Oeste
LMO198	Enrique Clay y M. Doello	-34.7629690000	-58.6680500000	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO51		LA MATANZA	Oeste
LMO301	Saenz 400 a 400 mts de Aroma.	-34.8169554820	-58.6982578723	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO302	Saenz e/ aroma y Salvador del Carril.	-34.8136102675	-58.6942510986	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO303	Saenz e/ Salvador del Carril y Carbaja	-34.8082230314	-58.6878202723	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO304	Urien y Saenz.	-34.8041752064	-58.6839463451	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO305	Urien s/n.	-34.8079157867	-58.6776973681	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO307	Curamalal y Vilela.	-34.8068393768	-58.6448599544	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO308	Areco y Ballerini.	-34.8133952104	-58.6468726957	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO309	Areco y California.	-34.8168174739	-58.6500934938	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO310	Ballerini y Chivilcoy.	-34.8094337365	-58.6521419844	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO311	California y Chivilcoy.	-34.8129552023	-58.6558165407	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO312	Urien s/n.	-34.8183940327	-58.6647337199	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
LMO314	Areco esq. Garcia del rio.	-34.8309930000	-58.6678120000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO315	Areco esq. Giradot.	-34.8361286214	-58.6742546763	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO316	Areco y Avalos.	-34.8406625956	-58.6792962643	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	TERCEROS	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO317	Esperanza y Villaroel.	-34.8436262873	-58.6827946538	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO318	Esperanza entre Esparza y N. Huapi.	-34.8417794069	-58.6882167187	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO319	Esperanza 4000 e/ N. Huapi y Villaroe	-34.8371620601	-58.6936501751	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO320	Esperanza entre Esparza y N. Huapi.	-34.8326132924	-58.6978002303	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO321	Querandies y Caldas.	-34.8260124445	-58.7161713316	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO322	Querandies e/ Caldas y N. Huapi.	-34.8280493348	-58.7119392008	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO323	N. Huapi 77100 e/Peña y Echenagulla	-34.8391452478	-58.7093466816	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO324	Caldas e/ Echenagulla y Peña.	-34.8299119158	-58.7206935751	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO325	Caldas 9050 Esq. Planes.	-34.8350754079	-58.7258154092	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO326	Areco e/Querandies y Massotti.	-34.8489136295	-58.6885327746	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO327	Areco a 5500 y Pavón.	-34.8524533616	-58.6936322051	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO328	Areco N° 9900 e/ Portela y Plaza Hilar	-34.8590617071	-58.7004477521	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO329	Areco y Loefler.	-34.8628986631	-58.7065415335	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO330	Loefler e/Villaroel y Fernandez.	-34.8555341571	-58.7133619627	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO331	Loefler e/N. Huapi y Fernandez.	-34.8521128903	-58.7180472866	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO332	Loefler e/N. Huapi y Nuñez.	-34.8457815477	-58.7255811937	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO333	Pedro de Angelis y Caldas.	-34.8440416828	-58.7353770977	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO334	Pedro de Angelis y Nuñez.	-34.8473561536	-58.7295494497	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO335	Pedro de Angelis y Nuñez.	-34.8520262963	-58.7249120158	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO336	Pedro de Angelis y Nuñez.	-34.8572337214	-58.7178528943	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO337	Angelis e/Villarroel y Fernandez.	-34.8623246345	-58.7127345536	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO338	Areco y Remedios.	-34.8682502586	-58.7126536864	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO P/INT. DE 3°	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO339	Areco 11300 entre Paraná y San Juar	-34.8736362943	-58.7184415666	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO340	Areco entre San Antonio y San Juan	-34.8781140000	-58.7240800000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO341	Areco Esq. Paraná.	-34.8794395489	-58.7265005595	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO342	San Juan 3510 entre Areco y Paraná.	-34.8707791350	-58.7227809094	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO343	San Juan 4200 a 1400 mts de Areco.	-34.8655272769	-58.7297111309	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO344	San Juan 4900 a 2100 mts de Areco.	-34.8615871517	-58.7344450518	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO345	San Juan 5100 a 2800 mts de Areco.	-34.8567650000	-58.7408080000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO346	San Cayetano s/n.	-34.8694955012	-58.7396540368	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO347	Areco (sin N°).	-34.8619519659	-58.7433866188	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO348	Areco Esq. Paraná.	-34.8601729883	-58.7517422635	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO349	-	-34.8876586656	-58.7237063752	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	TERCEROS	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO350	-	-34.8780725251	-58.7365747877	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	TERCEROS	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO351	Nazarre Alejo y Paraná.	-34.8725462561	-58.7434121520	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO352	Paraná y Navarro.	-34.8679046569	-58.7493434880	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO353	Paraná al 15000.	-34.8632062924	-58.7556317876	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO354	Paraná al 15500.	-34.8574966782	-58.7617365971	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO355	Monasterio a 300mts de Paraná.	-34.8532050595	-58.7563786843	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO356	N. Huapi e/Planes y Arata.	-34.8445164956	-58.7155322051	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO358	Urien y Villaroel.	-34.8139141630	-58.6702896073	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO360	California e/ Libres y Solom.	-34.8070398477	-58.6637025064	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO P/INT. DE 3°	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO361	California (4600) a 100 mts de Luis Bu	-34.8019390000	-58.6695270000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO362	Esperanza e/ Villaroel y N. Huapi.	-34.8392701687	-58.6909748439	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO363	Caldas entre Mason y Echeganocia.	-34.8267764954	-58.7171584695	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO364	Caldas S/N.	-34.8319615226	-58.7240437247	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO365	Massotti y Mirave.	-34.8661706935	-58.6697685285	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO366	Santiago del Estero y Massotti.	-34.8611542788	-58.6756915495	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO367	Colastine y Escribano	-34.8588757227	-58.6659101620	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO368	Arengreen y Colastine	-34.8555253384	-58.6619478030	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO369	Jose Arismendi y Santiago del Estero	-34.8500336223	-58.6664740241	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO370	Gorostiaga y Colastine	-34.8499150000	-58.6571130000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO371	Cañada de Gómez 6698	-34.8434966284	-58.6606132146	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO372	Bragado 1290 1763	-34.8393079189	-58.6658007629	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO373	Rio Orinoco y Morales (Manzana 48 C	-34.8357260000	-58.6642050000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO374	El Calden 5700	-34.8316440000	-58.6572000000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO375	Santiago del Estero y Ferrari.	-34.8573235033	-58.6730359998	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	PARADO P/INT. DE 3°	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO376	El Naranjo 7800	-34.8265068123	-58.6460032306	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO377	Tonelero 7150	-34.8259500000	-58.6509930000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO378	Cañuelas 3104	-34.8159420000	-58.6422320000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO379	Cañuelas 2300	-34.8091394322	-58.6387681416	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO380	Planta Virrey del Pino	-34.8548230000	-58.6754790000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste
LMO381	Cañada de Gómez y Gelly	-34.8434860000	-58.6603370000	LANTA VIRREY DEL PIN	TRATAMIENTO	SERVICIO	LMO27		LA MATANZA	Oeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**										**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**
Pozo N°	**Dirección del pozo**	**Coordnadas GPS Latitud**	**Coordnadas GPS Longuitud**	**Sistema de distribución del pozo**	**Tipo de sistema**	**Estado del pozo**	**Punto de control (PMA o PC del pozo)**	**Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)**	**Distrito/Partido**	**Región**
LMO957	Guamini 12710 E/ San Ignacio y San J	-34.8994717067	-58.7058666999	RED	POZO A RED	SERVICIO	LMO04		LA MATANZA	Oeste
MN001	Lavalleja al 7100 E/ Conde y Achupalla	-34.7527730133	-58.6495421288	RIA GONZALEZ CATAN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LMO19		LA MATANZA	Oeste
MN002	Armonia a 150 m de La Fuente.	-34.7444380499	-58.6497024079	RIA GONZALEZ CATAN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LMO19		LA MATANZA	Oeste
MN003	Armonía y Billinghurst.	-34.7404291105	-58.6547303407	RIA GONZALEZ CATAN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LMO19		LA MATANZA	Oeste
MN004	Billinghurst 3800 y Armonía.	-34.7377842943	-58.6517521436	RIA GONZALEZ CATAN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LMO19		LA MATANZA	Oeste
MN005	Billingurts y Doblas/ Céspedes.	-34.7335893967	-58.6508997793	RIA GONZALEZ CATAN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LMO19		LA MATANZA	Oeste
MN006	Int. Russo y Ramón Lista	-34.7289600920	-58.6462465794	ATERIA GONZALEZ CATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
MN007	Billingurts e Int Russo	-34.7259119898	-58.6484124455	ATERIA GONZALEZ CATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN24		LA MATANZA	Oeste
MN008	Billingurts y Las Flores	-34.7227327609	-58.6448143342	ATERIA GONZALEZ CATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN24		LA MATANZA	Oeste
MN009	Billinghurst 5300 y Río Cuarto	-34.7186813429	-58.6401924631	ATERIA GONZALEZ CATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN24		LA MATANZA	Oeste
MN010	Las Flores y Ramón Lista	-34.7259107142	-58.6420841266	ATERIA GONZALEZ CATA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN24		LA MATANZA	Oeste
MN011	Céspedes al 2100 a 500 mts de Billing	-34.7408839738	-58.6425221617	RIA GONZALEZ CATAN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	LMO19		LA MATANZA	Oeste
MN032	Acassuso(1700) y Santa Rosa	-34.7163613256	-58.6066657663	ATERIA RAFAEL CASTILL	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN23		LA MATANZA	Oeste
MN033	Acassuso e Ipiranga	-34.7187858856	-58.6093275036	ATERIA RAFAEL CASTILL	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN23		LA MATANZA	Oeste
MN034	Norquin y Zarate	-34.7157583117	-58.6193964534	ATERIA RAFAEL CASTILL	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN16		LA MATANZA	Oeste
MN036	Hucal y Ferré	-34.7110218701	-58.6117383218	ATERIA RAFAEL CASTILL	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN16		LA MATANZA	Oeste
MN037	Lavallol y Tres Cruces	-34.7204806075	-58.6035375258	ATERIA RAFAEL CASTILL	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN23		LA MATANZA	Oeste
MN039	E. Del campo y Aguapey	-34.7215374738	-58.6164602508	ATERIA RAFAEL CASTILL	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	TERCEROS	MN23		LA MATANZA	Oeste
MN041	Castañon y Beethoven	-34.7280185100	-58.6172020900			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LA MATANZA	Oeste
MN042	L. Beethoven N° 3090 y Lavalol	-34.7302592820	-58.6151786592		POZO A RED	POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LA MATANZA	Oeste
MN043	Castañon N° 2922 y E. Echeverría	-34.7259603283	-58.6142842505	POI MN043	TRATAMIENTO	SERVICIO	MN23		LA MATANZA	Oeste
MN044	Hualfin y Lacar	-34.7148327011	-58.6134638387	ATERIA RAFAEL CASTILL	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MN23		LA MATANZA	Oeste
MN059	Beethoven y La Doma B°El Torero	-34.7117552965	-58.6382775364	RED	POZO A RED	TERCEROS	MN24		LA MATANZA	Oeste
MN106	Beethoven entre Aguirre y Mendez de	-34.7142860191	-58.6356436891	RED	POZO A RED	SERVICIO	MN24		LA MATANZA	Oeste
MN110	V. de la Plaza E/ Dávila y Beazley	-34.6997063689	-58.6303748834	RED	POZO A RED	SERVICIO	MN25		LA MATANZA	Oeste
MN122	Santa Rosa y Aguirre	-34.7035596578	-58.6286906777	RED	POZO A RED	SERVICIO	MN24		LA MATANZA	Oeste
MN147	Zamudio e/ Bravard y Aguirre	-34.7096420013	-58.6309616117	POI MN147	TRATAMIENTO	SERVICIO	MN25		LA MATANZA	Oeste
MN148	Hipolito Bouchard y Coronel Montt	-34.7018137900	-58.6346806700	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
MN157	Bouchard y Heredia	-34.6987189577	-58.6336210460	RED	POZO A RED	SERVICIO	MN25		LA MATANZA	Oeste
MN173	Hucal 1700 e/ Vogel y Polledo	-34.7090211403	-58.6151861148	RED	POZO A RED	SERVICIO	MN16		LA MATANZA	Oeste
MN183	Lavallol y Sudamércia	-34.7232049031	-58.6063229717	RED	POZO A RED	SERVICIO	MN23		LA MATANZA	Oeste
MN186	M. T. de Alvear 1100 esq. Del colegio	-34.7012108297	-58.6178219560	RED	POZO A RED	SERVICIO	MN27		LA MATANZA	Oeste
MN211	Esquiro y Eufrates	-34.6951770000	-58.6241260000	RED	POZO A RED	SERVICIO	MN19		LA MATANZA	Oeste
MN212	Victorino de la plaza y Luis María Drag	-34.7004290000	-58.6239780000	RED	POZO A RED	SERVICIO	MN19		LA MATANZA	Oeste
MO017	Juan B. Justo 98 1706	-34.6435560000	-58.5951830000			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			MORON	Oeste
MO024	M, Piedras y M, de Sarratea	-34.6541720500	-58.6127450000			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO028	Vuelta de Obligado 1781 1706	-34.6387529672	-58.6004013734			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			MORON	Oeste
MO042	Belgrano y Santa Maria	-34.6649358400	-58.6253571400			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO044	Rio Piedras 205 1708	-34.6509059401	-58.6126978012			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			MORON	Oeste
MO045	French y Ramella	-34.6617145800	-58.5993937100			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO047	Pellegrini 990 1708	-34.6549949253	-58.6224720603			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			MORON	Oeste
MO050	O´ Farrell y Beiro	-34.6335088300	-58.6053047800			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO053	Gral. E. Murilla 842 1708	-34.6446898993	-58.6201683586			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			MORON	Oeste
MO056	Boqueron y Sta, Teresa	-34.6665086300	-58.6054379700			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO062	Juan Jose Valle 186 1708	-34.6499701745	-58.6251871858			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			MORON	Oeste
MO063	Falucho y Berutti	-34.6399466500	-58.6205696300			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO068	Sta, Teresa y Pola	-34.6729680300	-58.6137045600			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO077	Murillo 585 1684	-34.6239300000	-58.5833930000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			MORON	Oeste
MO079	Int, Agüero y Belgrano	-34.6629174600	-58.6216391900			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO083	Sarmiento 500 1708	-34.6481414623	-58.6160077359			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			MORON	Oeste
MO084	Francisco Moraga 1136 1685	-34.6265210000	-58.5981300000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			MORON	Oeste
MO087	Cielito y Vidalita	-34.6256050004	-58.6931879651	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO088	De los Recuerdos y De los Payadores	-34.6147706634	-58.6915722940	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO089	Gaona y La Chacarera	-34.6286396726	-58.6863521852	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO090	Los Payadores y Martín Fierro	-34.6216992824	-58.6980920096	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO092	udaondo y La Doma	-34.6146144700	-58.6847121900			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ITUZAINGO	Oeste
MO093	De los Reseros y E. Frers	-34.6153120496	-58.6778227868	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO094	La Espuela y de los Reseros	-34.6195966736	-58.6818906785	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO095	De La Doma Fte N° 1282 y El Ombu	-34.6206343095	-58.6921695428	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO096	De la zamba y El Remedio	-34.6228539000	-58.6875232200			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			ITUZAINGO	Oeste
MO097	De La Vidalita y J. Hernández	-34.6252673278	-58.6817552791	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO099	Alcántara y Tigre	-34.6158531101	-58.6533477609	RED	POZO A RED	POZO IRRECUPERABLE / CEGADO	MO23		HURLINGHAM	Oeste
MO100	Videla y Peredo	-34.6447503443	-58.6953786378	RED	POZO A RED	SERVICIO			ITUZAINGO	Oeste
MO103	Gonzalez Barbosa y Maza	-34.6695163300	-58.6135033500			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO105	Fray J. S. M. de Oro y Figueroa Alcort	-34.6624138918	-58.6434142329	A VII BRIGADA AEREA -	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MO21		MORON	Oeste
MO106	Figueroa Alcorta y La Tribuna	-34.6659518419	-58.6508256399	A VII BRIGADA AEREA -	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MO21		MORON	Oeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
MO107	E. López y Cnel. Arenas	-34.6690582958	-58.6563533913	A VII BRIGADA AEREA - I	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MO30		MORON	Oeste
MO108	Figueroa Alcorta y Montevideo	-34.6633168367	-58.6470531954	A VII BRIGADA AEREA - I	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MO21		MORON	Oeste
MO109	Gral. López y Bufano	-34.6618249129	-58.6549904756			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MO21		MORON	Oeste
MO110	Bufano y Blas Parera	-34.6607329591	-58.6606144187	BATERIA CASTELAR	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MO21		MORON	Oeste
MO113	Avellaneda y Aguado	-34.6676854500	-58.6075856200			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO115	Don Bosco y Pte, Alessandri	-34.6780434800	-58.6146274900			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO116	Monseñor Tomas Solari 2507 1708	-34.6732349794	-58.6205348662			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			MORON	Oeste
MO117	Pierrestegui y Cnel, Arena	-34.6733926700	-58.6302763100			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO118	Monseñor Tomas Solari 2999 1708	-34.6778870000	-58.6258640000			POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO			MORON	Oeste
MO119	Cnel, Arena y Virgilio	-34.6828678200	-58.6203562100			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO127	C, Patagones y S, Teresa	-34.6840617600	-58.6259991700			POZO ACTIVO NO PROD / FUERA SERVICIO			MORON	Oeste
MO128	Avenida Eva Perón 2900 y Cartagena	-34.6806092390	-58.6339370736			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			MORON	Oeste
MO130	Lacarra y Cucha Cucha	-34.6707556135	-58.6605144521	A VII BRIGADA AEREA - I	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MO21		MORON	Oeste
MO131	Avenida Eva Perón 2900 y Cartagena	-34.6806092390	-58.6339370736			POZO ACTIVO NO PROD / PARADO			MORON	Oeste
MO134	Cuzco y el Zorzal	-34.6109870000	-58.6493800000	BATERIA HURLINGHAM	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MO23		HURLINGHAM	Oeste
MO135	Lacarra y Cucha Cucha	-34.6070158352	-58.6473475184	BATERIA HURLINGHAM	N MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MO23		HURLINGHAM	Oeste
MO136	Ferre y Jarry	-34.6825397424	-58.6473223001	ATERIA BARRIO SAN JUA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MO32		MORON	Oeste
MO137	Madrid y Jarry	-34.6808785728	-58.6553367473	ATERIA BARRIO SAN JUA	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MO32		MORON	Oeste
MO138	Paganini e/Pedro Diaz y Juan Gorriti	-34.6001164972	-58.6546522555	TERIA HURLINGHAM - IN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MO31		HURLINGHAM	Oeste
MO139	Amberes y Pederewsky	-34.6021890834	-58.6617697944	TERIA HURLINGHAM - IN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MO31		HURLINGHAM	Oeste
MO140	Cuzco entre M. de Aviles y Tokio.	-34.5990118456	-58.6647484590	TERIA HURLINGHAM - IN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MO31		HURLINGHAM	Oeste
MO141	Cuzco y Acoyte	-34.5961019443	-58.6680244961	TERIA HURLINGHAM - IN	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	PARADO P/INT. DE 3°	MO31		HURLINGHAM	Oeste
MO142	Piran esq. Lavalle	-34.6570610000	-58.6720010000	PLANTA ITUZAINGO	TRATAMIENTO	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	IT01		ITUZAINGO	Oeste
MO143	Pje Vilanova entre Las heras y Soler	-34.6593495977	-58.6666082013	PLANTA ITUZAINGO	TRATAMIENTO	RESERVA	IT01		ITUZAINGO	Oeste
MO144	Sta Teresa y La Gaceta	-34.6895504791	-58.6322908177	RED	POZO A RED	RESERVA	MO33		MORON	Oeste
MO146	N. Repetto y Del Palenque	-34.6291434374	-58.6758275882	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO147	N. Repetto y De la Tradición	-34.6102726534	-58.6784788246	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO148	Del Mangrullo y De las Cachirlas	-34.6048850114	-58.6850234538	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO149	N. Repetto a 130 metros de F. leloir	-34.6172985337	-58.6690949394	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	MOPC1		HURLINGHAM	Oeste
MO150	LaTrilla a 14m de Juramento	-34.6195070000	-58.6604280000	BATERIA HURLINGHAM 2	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	HU01		HURLINGHAM	Oeste
MO151	Aristiabal a 21.53m de Veragua	-34.6205450000	-58.6560720000	BATERIA HURLINGHAM 2	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	TERCEROS	HU01		HURLINGHAM	Oeste
MO152	Chimborá y Los Cardales	-34.6251370000	-58.6611660000	BATERIA HURLINGHAM 2	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	HU01		ITUZAINGO	Oeste
MO153	De la Condición y Colectora Acceso (	-34.6295240000	-58.6821330000	A PARQUE LELOIR - ITU	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MOPC1		ITUZAINGO	Oeste
MO154	Coronel Arenas esq. Andrade	-34.6697060000	-58.6502920000	BATERIA CASTELAR	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MO21		MORON	Oeste
MO155	Ortuzar esq. Palermo	-34.6745499411	-58.6555355645	BATERIA CASTELAR	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	RESERVA	MO21		MORON	Oeste
MS024	Av, Cristiania y Central	-34.7225062900	-58.5672946000			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LA MATANZA	Oeste
MS025	Crovara y El Pindo	-34.7123675794	-58.5578972983	BATERIA CIUDAD EVITAN	MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	MS_CIS_MUN		LA MATANZA	Oeste
MS026	Calle 200 y Rotonda	-34.7165169137	-58.5542608258	BATERIA CIUDAD EVITAN	MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	MS_CIS_MUN		LA MATANZA	Oeste
MS027	Av. Central y Calle 500	-34.7157570965	-58.5598886560	BATERIA CIUDAD EVITAN	MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	SERVICIO	MS_CIS_MUN		LA MATANZA	Oeste
MS029	Calle 800 y Av, Central	-34.7195207000	-58.5621795300			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			LA MATANZA	Oeste
MS030	Las calas y Los tulipanes	-34.7220748598	-58.5567354799	RED	POZO A RED	SERVICIO	MS32		LA MATANZA	Oeste
MS031	J. I. Rucci 4780	-34.7128976222	-58.5638589910	BATERIA CIUDAD EVITA		POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
MS032	J. I. Rucci 4780	-34.7128976222	-58.5638589910	BATERIA CIUDAD EVITA		POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
MS034	El Tapetí y El Sauce	-34.7145487944	-58.5514860820	RED	POZO A RED	SERVICIO	MS19		LA MATANZA	Oeste
MS042	Av. Central y calle 900	-34.7199682852	-58.5642337154	BATERIA CIUDAD EVITAN	MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	RESERVA	MS26		LA MATANZA	Oeste
MS043	Calle 600 y Los Tulipanes	-34.7207881574	-58.5598653565	BATERIA CIUDAD EVITAN	MEZCLA DE AGUA SUP. EN CISTER	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MS_CIS_MUN		LA MATANZA	Oeste
MS090	Las Camelias y las Gardenias	-34.7242327858	-58.5492635563	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MS32		LA MATANZA	Oeste
MS091	Las Orquidias y Las Gardenias	-34.7185441993	-58.5566749580	RED	POZO A RED	SERVICIO	MS32		LA MATANZA	Oeste
MS092	Cristiania y Las Dalias - B° 22 de Ene	-34.7277891308	-58.5603694063	RED	POZO A RED	SERVICIO	MS32		LA MATANZA	Oeste
MS104	Saturnino Saraza 2146	-34.7479260000	-58.5704030000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
MS105	Guaviravi y Torquins	-34.7344781917	-58.5690920449	RED	POZO A RED	RESERVA	MS34		LA MATANZA	Oeste
MS114	Magnasco y Av. Cristiania	-34.7260872433	-58.5637017986	RED	POZO A RED	RESERVA	MS33		LA MATANZA	Oeste
MS115	Luján y Céspedes	-34.7458120000	-58.6369330000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
MS124	Marcos Paz y Colegiales	-34.7655680000	-58.5935600000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
MS176	Cnel Conde 6438	-34.7829250000	-58.6218040000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			LA MATANZA	Oeste
MR001	J.V. González 2625 e/Balzak y Rodrig	-34.6308607135	-58.8038099993	RED - TANQUE MORENO	POZO A RED	SERVICIO	PCMR001	J. V. GONZÁLEZ 2567	Moreno	Oeste
MR002	J.V. González 2435 e/Güemes y V. Alsina.	-34.6356161823	-58.8059508957	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR002	J. V. GONZALEZ 2435	Moreno	Oeste
MR003	Güemes 901 e/Bolivia y Paraguay.	-34.6369800737	-58.8008351115	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR003	Guemes 896	Moreno	Oeste
MR004	Larralde 1341 e/J. Gonzalez y R. Gutierrez.	-34.6395648627	-58.8075046479	TANQUE MORENO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-MOR	Int Bossi 533	Moreno	Oeste
MR005	Int. Bossi 1080 e/Ecuador y Paraguay.	-34.6417830213	-58.8041979894	TANQUE MORENO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-MOR	Int Bossi 533	Moreno	Oeste
MR006	Int. Bossi e/Venezuela y Ecuador.	-34.6427856671	-58.8007361473	TANQUE MORENO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-MOR	Int Bossi 533	Moreno	Oeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
MR007	Guatemala 2400 e/Güemes y Alsina.	-34.6377192051	-58.7959956527	TANQUE MORENO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-MOR	Int Bossi 533	Moreno	Oeste
MR008	Guatemala 2700 e/marmol y Colectora Gaona	-34.6348618110	-58.7946818428	TANQUE MORENO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-MOR	Int Bossi 533	Moreno	Oeste
MR009	V. Alsina e/Libertador.	-34.6393755277	-58.7878555482	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR010	Ibañez e/9 de Julio y J.B. Alberdi.	-34.6500873354	-58.7971417503	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCMR010	Zeballos 512	Moreno	Oeste
MR011	P. Ansaldo e/Blas Parera y M. Melo.	-34.6565613067	-58.7989869831	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR011	ANSALDO 1116	Moreno	Oeste
MR012	M. Obarrio 2048 e/Alberdi y Rafael.	-34.6569354685	-58.8085825777	PLANTA CAG MORENO	TRATAMIENTO	SERVICIO	MRPC1	OBARRIO 1195	Moreno	Oeste
MR013	Av. Perón e/Del Cañon.	-34.6610262020	-58.8042748101	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR013	BVARD PTE PERON 2027	Moreno	Oeste
MR014	Alcorta 2500 e/Bouchard y Uruguay.	-34.6509835493	-58.7862933545	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR014	ALCORTA 2509	Moreno	Oeste
MR015	Ameghino e/Centenario y Argentina.	-34.6592921853	-58.7842250096	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR015	CENTENARIO 596	Moreno	Oeste
MR016	Callao e/Av. Alcorta y Mitre.	-34.6554857865	-58.7696521595	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR016	Corrientes 27	Moreno	Oeste
MR017	Alcorta e/Haedo y Ramos Mejia.	-34.6550890923	-58.7733863881	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR017	Alcorta 1558	Moreno	Oeste
MR018	Misiones e/ Sta. Fe y D´errico.	-34.6510186912	-58.7643143881	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR018	Misiones 447	Moreno	Oeste
MR019	Int. Bossi e/Guatemala.	-34.6434820732	-58.7979374592	TANQUE MORENO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-MOR	Int Bossi 533	Moreno	Oeste
MR020	Alte. Brown e/25 de Mayo y Andrade.	-34.6464081910	-58.7487313001	RED	POZO A RED	SERVICIO	MR01	Almirante Brown 689	Moreno	Oeste
MR021	Alte. Brown e/Pio XII.	-34.6431675852	-58.7506678867	RED	POZO A RED	SERVICIO	MR01	Almirante Brown 689	Moreno	Oeste
MR022	Sanchez 4800 e/Ruta 25 y San Justo.	-34.6096696434	-58.8139705215	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR022-23	Sanchez 4949	Moreno	Oeste
MR023	Florencio Sanchez e/Gandhi y Sofocles.	-34.6075017844	-58.8107222842	RED - TANQUE LA PERLITA	POZO A RED	SERVICIO	PCMR022-23	Sanchez 4949	Moreno	Oeste
MR024	Costa Rica e/F. Sanchez y Sofocles.	-34.6043792380	-58.8059925026	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR025	A. Storni 5600 e/Danubio.	-34.6080788665	-58.8005441088	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR026	A. Storni 5900 e/Madariaga.	-34.6063699651	-58.7968879734	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR027	Ecuador 5700 e/La Plata.	-34.6195164656	-58.7895101119	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR028	El Salvador e/Chile y Mexico.	-34.6257532520	-58.7885571149	RED - B° Lomas de San José	POZO A RED	SERVICIO	PCMR028	México 384	Moreno	Oeste
MR029	La Plata e/Ruta23 y Camil.	-34.6277510368	-58.7806774507	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR030	Pedrell e/Ascasubi y Carriega.	-34.5914199649	-58.7749938817	TANQUE TRUJUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-TRU	TABLADA 10437	Moreno	Oeste
MR031	R Rojas e/Libano y Gral. Pintos.	-34.5883432206	-58.7807430306	TANQUE TRUJUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-TRU	TABLADA 10437	Moreno	Oeste
MR032	F. Sanchez e/Libano y Pitagoras.	-34.5862447242	-58.7806161347	TANQUE TRUJUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-TRU	TABLADA 10437	Moreno	Oeste
MR033	F. Sanchez e/Gral. Pintos y Lord Byron.	-34.5887356758	-58.7833440708	TANQUE TRUJUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-TRU	TABLADA 10437	Moreno	Oeste
MR034	V. Vertiz e/Gral. Pintos.	-34.5863555556	-58.7840820119	TANQUE TRUJUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MR-TAN-TRU	TABLADA 10437	Moreno	Oeste
MR035	Gutierrez 5600 e/La Plata y Cost Rica.	-34.6171930000	-58.7915510000	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR036	Ruta 25 e/Cataliña.	-34.6160263361	-58.8082681828	RED	POZO A RED	RESERVA	PCMR036	Pasaponti 2108	Moreno	Oeste
MR037	Giralde e/Pastor Obligado y Lavarden.	-34.6014417329	-58.8101991673	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR037	F. Rivera 532	Moreno	Oeste
MR038	-	-34.5910012113	-58.7662007675			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MR-TAN-TRU	TABLADA 10437	Moreno	Oeste
MR039	Barker e/E. Larreta y M. Vedia.	-34.5886582369	-58.7641385915	TANQUE TRUJUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-TRU	TABLADA 10437	Moreno	Oeste
MR040	Piovato 4132 e/Bochardo y Balcarce.	-34.6458492213	-58.8086765566	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR040	PIOVANO 4114	Moreno	Oeste
MR041	Dorrego e/Dorrego y Darat.	-34.6494981914	-58.7762946887	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR041	Dorrego 1977	Moreno	Oeste
MR042	1 de Mayo e/Alcorta.	-34.6542527853	-58.7786078384	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR042	1° DE MAYO 17	Moreno	Oeste
MR043	San Pablo e/San Cayetano.	-34.6664910203	-58.8241034449	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR043	SAN PABLO casa 161	Moreno	Oeste
MR044	Piovano e/El Salvador y Venezuela.	-34.6451076460	-58.8007438085	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR044	El Salvador 2282	Moreno	Oeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Direcció del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
MR045	San Cayetano e/San Lorenzo y Monteagudo.	-34.6722588554	-58.8263644320	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCMR045	San Lorenzo 553	Moreno	Oeste
MR046	Del Cañon/M. Obarrio e/San Carlos.	-34.6549507152	-58.8118087700	PLANTA CAG MORENO	TRATAMIENTO	SERVICIO	MRPC1	OBARRIO 1195	Moreno	Oeste
MR047		-34.6569047406	-58.8141993510			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Moreno	Oeste
MR048	Echeverría e/Darwin y Peron.	-34.6065411090	-58.7812364792	RED	POZO A RED	PARADO P/INT. DE 3°	PCMR048	ECHEVERRIA 7041	Moreno	Oeste
MR049	Sarratea e/Victoria.	-34.6413738924	-58.7937720415	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR049	Sarratea 358	Moreno	Oeste
MR050	Marcos Paz 1116 e/larrea y J.J. Urquiza.	-34.6580748255	-58.7916983932	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR050	Marcos Paz 1123	Moreno	Oeste
MR051	Tablada e/Oribe y Puccini.	-34.5829122602	-58.7571839844	TANQUE TRUJUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-TRU	TABLADA 10437	Moreno	Oeste
MR052	Arribeños e/Concordia.	-34.6510458176	-58.7702475559	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR052	CONCORDIA 1617	Moreno	Oeste
MR053	Córdoba E/Palo y Stheden.	-34.6379247318	-58.7836383679	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR054	Alvear e/Rafael Arco.	-34.6374627161	-58.7688960454	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR055	Córdoba e/V. Lopez y Linch.	-34.6448477940	-58.7777646507	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR056	Corvalán 2733 e/B de Yrigoyen y Graham Bell.	-34.6371960194	-58.7601946194	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR057	Uruguay e/E. Rios y colectora.	-34.6372177369	-58.7775748723	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR058	Misiones 1970 e/ Moron.	-34.6478073782	-58.7615827130	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR059	Facundo Quiroga e/Moron y Yapeyu.	-34.6440322207	-58.7643886130	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	RESERVA	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR060	Facundo Quiroga e/ La Tropilla y Quilmes.	-34.6464926092	-58.7689120479	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR061	Corvalán e/La Tropilla.	-34.6445372710	-58.7724681890	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR062	San Juan Bautista 2026 e/ Int. Corvalan Dean Funes	-34.6424180000	-58.7694270000	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR063	Lincoln e/Soldado Derrico y E. Rios.	-34.6417279148	-58.7746094875	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	RESERVA	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR064	Intendente Corvalan 2302 e/ Alvear y Alejandro Graham Bell	-34.6389910000	-58.7638660000	REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR065	J.V. González e/ Ruta 25 y Brasil.	-34.6227273879	-58.8008071620	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCMR065	Passaponti 1321	Moreno	Oeste
MR066	Venezuela e/ Nicaragua y La Plata.	-34.6224131876	-58.7856948649	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR067	Lobos e/La Tablada y Manzana 36.	-34.6034649675	-58.7795295017	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR067-68	Jose Ing. Mz 33 Casa 15	Moreno	Oeste
MR068	Lafinur e/Lobos y 3 de Marzo.	-34.6021638644	-58.7852728613	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR067-68	Jose Ing. Mz 33 Casa 15	Moreno	Oeste
MR069	Tablada e/ Democracia y Colectora	-34.6260150000	-58.8069290000	RED - Jardines de Moreno	POZO A RED	SERVICIO	PCMR069	Democracia 1566	Moreno	Oeste
MR070	Honduras y Marquez	-34.6121380000	-58.7863220000	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR071	Shakespeare y Manuel Galvez	-34.6101540000	-58.7810050000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR071	Galvez 7038	Moreno	Oeste
MR072	Honduras y Gral. Madariaga	-34.6135140000	-58.7891160000	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR073	Colombia y Ricardo Gutiérrez	-34.6215960000	-58.7967890000	TANQUE LA PERLITA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	Moreno	Oeste
MR074	Colectora Acceso Oeste y Ecuador	-34.6296240000	-58.7995270000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR074	Passaponti y Ecuador	Moreno	Oeste
MR075	Diego de Villaroel y Ceferino Namuncurá, Moreno			TANQUE TRUJUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-TAN-TRU	TABLADA 10437	Moreno	Oeste
MR076	Hipólito Yrigoyen y San Luis	-34.6677220000	-58.8117220000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR076	Hipólito Yrigoyen 2670, Moreno	Moreno	Oeste
MR077	Teniente Ibañez 3224	-34.6506410000	-58.7967710000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR077	Zeballos 512	Moreno	Oeste
MR078	Alberti entre Marcos Paz y Vera	-34.6616060000	-58.7994970000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMR078	Manuel Alberti 2649	Moreno	Oeste
MR079	Juana de Azurduy y San Cayetano, Moreno			RED Barrio Casasco Nuevo	POZO A RED	SERVICIO			Moreno	Oeste
MR080				BATERIA LA REJA		STAND BY			Moreno	Oeste
MR081				BATERIA LA REJA		STAND BY			Moreno	Oeste
MR082				BATERIA LA REJA		STAND BY			Moreno	Oeste
MR083				BATERIA LA REJA		STAND BY			Moreno	Oeste
MR084						STAND BY			Moreno	Oeste
MR085						STAND BY			Moreno	Oeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Direcció del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
MR086	Ecuador y Márquez de Aguado, Moreno			RED Los Paraisos II		SERVICIO			Moreno	Oeste
MR088	Lobos entre Misiones y José Hernández, Moreno			RED Paso del Rey		SERVICIO	PCMR088	Lobos 1150 Paso del Rey, Mor	Moreno	Oeste
MR089	Pavón y Gervasio de Posadas, Moreno			RED Paso del Rey		SERVICIO	PCMR089	Pavón 1768, Moreno	Moreno	Oeste
MR090						STAND BY			Moreno	Oeste
MR091						STAND BY			Moreno	Oeste
MR093	Mendoza y Jose Ingenieros, Moreno			RED Paso del Rey		SERVICIO	PCMR093	Jose Ingenieros 1120, Paso del	Moreno	Oeste
MR095	Uruguay y Chiclana, partido de Moreno			REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR097	Entre Ríos esquina Abraham Lincoln, Moreno			REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR098	Av. Luis Pasteur entre Facundo Quiroga y Arribeños, Moreno			RED Paso del Rey	POZO A RED	SERVICIO	PCMR098	Pasteur Dr L 1644, entre Quiro	Moreno	Oeste
MR099	Marcos Paz entre J.J Urquiza y Larrea, Moreno			RED	POZO A RED	TERCEROS	PCMR050	Marcos Paz 1123	Moreno	Oeste
MR100	Morón e/ Facundo Quiroga y Arribeños, Moreno			REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
MR101	Abraham Lincoln 1644, Moreno			REBOMBEO MORENO 1	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MR-CIS-MOR	LINCOLN 1623	Moreno	Oeste
ME001	25 DE MAYO E/PUEYRREDON	-34.6697349354	-58.7163944530	TANQUE MERLO	ATERIA CON PTO. DE CONVERGENC	SERVICIO	ME-TAN-CES	25 de Mayo 712	Merlo	Oeste
ME002	ALMAFUERTE Y MAIPU	-34.6672150000	-58.7204430000	TANQUE MERLO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-CES	25 de Mayo 712	Merlo	Oeste
ME003	25 MAYO E/ 9 DE JULIO	-34.6740395300	-58.7190332204	TANQUE MERLO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-CES	25 de Mayo 712	Merlo	Oeste
ME004	BROWN E/ CENTENARIO	-34.6685465156	-58.7100044901	TANQUE MERLO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-CES	25 de Mayo 712	Merlo	Oeste
ME005	25 MAYO E/ J.M Castro ex Pearson	-34.6814083336	-58.7235597654	RED	POZO A RED	RESERVA	ME02	Yapeyu 1185 esq Alte Brown, P	Merlo	Oeste
ME006	BROWN E/ CARLOS PELEGRINI	-34.6728347323	-58.7134019225	TANQUE MERLO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-CES	25 de Mayo 712	Merlo	Oeste
ME007	BROWN E/ M.BRAVO	-34.6796882600	-58.7166547558	TANQUE MERLO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-CES	25 de Mayo 712	Merlo	Oeste
ME008	LIBERTAD E/ ARGENTINA Y PUCHEU	-34.6748250000	-58.7252060000	RED	POZO A RED	PARADO P/INT. DE 3°	PCME008	Libertad 45	Merlo	Oeste
ME009	COVIPOL. EDIF 38. ROSSI Y ETCHEVERRY	-34.6514736908	-58.7102512597	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME009	Etcheverry Edif. 38, entre Ross	Merlo	Oeste
ME010	COVIPOL. EDIF 13. ROMAY Y ZUNDA	-34.6537284492	-58.7135664014	RED	POZO A RED	PARADO	PCME010	Mariano Acosta y Reconquista	Merlo	Oeste
ME011	EVA PERON E/SOLER	-34.6828035065	-58.6809145628			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCME011	Ruta 21 (Eva Perón) 3194	Merlo	Oeste
ME012	EVA PERON E/PELLEGRINI	-34.6852078786	-58.6844768621	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCME012-73	Sarmiento 2433	Merlo	Oeste
ME013	CORDOBA Y CHACABUCO	-34.6718895602	-58.7299571815			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Merlo	Oeste
ME014	BROWN E/PIZURNO	-34.6859102154	-58.7200910423	RED	POZO A RED	SERVICIO	ME02	Yapeyu 1185 esq Alte Brown, P	Merlo	Oeste
ME015	9 DE JULIO E/ SAN LORENZO (CAMARA A MITAD DE CUADRA)	-34.6792244997	-58.7042832916	TANQUE MERLO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-CES	25 de Mayo 712	Merlo	Oeste
ME016	SAN LORENZO E/CANNING	-34.6852061219	-58.7068203600	TANQUE MERLO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-CES	25 de Mayo 712	Merlo	Oeste
ME017	DEFENSA E/BARAVINO Y HORTIGUERA	-34.6697092589	-58.6884926797	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME017	Defensa 285	Merlo	Oeste
ME018	OYUELA E/FRIAS Y RUTA 200	-34.6646799629	-58.7406828128	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME018	Frias 1669	Merlo	Oeste
ME019	PEDRIEL E/ TALA	-34.6538000151	-58.7258312190	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME019	Hipólito Yrigoyen 784 esquina S	Merlo	Oeste
ME020	INDEPENDENCIA E/ SULLIVAN	-34.6641549095	-58.7016257459	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME020	Sullivan 416	Merlo	Oeste
ME021	ESNAOLA Y BOYACÁ	-34.6895610000	-58.7607650000	TANQUE LOMA GRANDE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-LOM	Esnaola 301	Merlo	Oeste
ME022	ESNAOLA Y BACH	-34.6917925781	-58.7568611936	TANQUE LOMA GRANDE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-LOM	Esnaola 301	Merlo	Oeste
ME023	AV.ARGENTINA Y CHOPIN	-34.6947109944	-58.7519731153	TANQUE LOMA GRANDE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-LOM	Esnaola 301	Merlo	Oeste
ME024	AV.ARGENTINA E/GARMENDIA	-34.6992280819	-58.7588010900	TANQUE LOMA GRANDE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-LOM	Esnaola 301	Merlo	Oeste
ME025	AV.ARGENTINA E/GAVILAN	-34.7035585148	-58.7653149925	TANQUE LOMA GRANDE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-LOM	Esnaola 301	Merlo	Oeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
ME026	TUNUYÁN E/AREVALO	-34.6825352238	-58.7634717159	TANQUE RECONQUISTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-REC	Filiberto 1268	Merlo	Oeste
ME027	VIDT E/ FEBAL	-34.6868760000	-58.7657750000	TANQUE RECONQUISTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-REC	Filiberto 1268	Merlo	Oeste
ME028	VIDT E/DEMOCRACIA	-34.6908295575	-58.7689725420	TANQUE RECONQUISTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-REC	Filiberto 1268	Merlo	Oeste
ME029	VIDT E/CHAGAS	-34.6941629895	-58.7713167562	TANQUE RECONQUISTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-REC	Filiberto 1268	Merlo	Oeste
ME030	VIDT E/FAMATINA Y DESSY	-34.6974412822	-58.7736313759	TANQUE RECONQUISTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-REC	Filiberto 1268	Merlo	Oeste
ME031	GARDEL E/PAYRÓ	-34.6937872014	-58.7790249708	TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME032	VIDT E/RUTA 200 JM 37.5	-34.7022173082	-58.7775339260	TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME033	VIDT E/DISCEPOLO	-34.7064960000	-58.7802470000	TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME034	VIDT E/VACCAROS	-34.7098898481	-58.7829485151	TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME035	VIDT E/VIEDMA	-34.7138550000	-58.7855680000	TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME036	AMPERE E/GARMENDIA	-34.7085241926	-58.7456924804	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME036	Leandro N Alem 6095	Merlo	Oeste
ME037	AMADO NERVO E/ANCON Y AMPERE	-34.7130958252	-58.7503350139	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME038	LOS ALELIES Y TILCARA	-34.7155517020	-58.7547992394	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME039	LOS ALELIES E/TILCARA Y AGUARIBAY	-34.7125768590	-58.7585658276	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME040	LOS JACINTOS E/ETIOPIA	-34.7106379333	-58.7640424822	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME041	ACHALA E/ LAS RETAMAS	-34.7152707979	-58.7642256217	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME042	GENDARMERIA E/ FLORES A.	-34.7016710000	-58.7545750000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME042	Avenida Jose de San Martin 60	Merlo	Oeste
ME043	ARGENTINA E/PEDERNERA	-34.7010108361	-58.7616109875			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME044	J.NEWBERY E/LOS PENSAMIENTOS	-34.7068473320	-58.7653272719	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME045	ALVAREZ JONTE E/ LOS ALELIES	-34.7077775325	-58.7694368924	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME046	LAS RETAMAS E/JURAMENTO	-34.7116808136	-58.7680240977	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME047	ALVAREZ JONTE E/ LOS GERANIOS	-34.7114936166	-58.7734077833	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME048	ALVAREZ JONTE E/LAS DALIAS	-34.7146032797	-58.7768153011	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCME048	Los Tulipanes 625	Merlo	Oeste
ME049	GABRIELA MISTRAL E/ALTE BROWN	-34.7103246828	-58.7358019639	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME050	GABRIELA MISTRAL E/BENOIT	-34.7085047196	-58.7312432621	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME050	Gabriela Mistral 3665	Merlo	Oeste
ME051	GENDARMERIA GURRUCHAGA	-34.7165324472	-58.7338530465	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME052	GAVILAN E/J.NEWERY	-34.7063571208	-58.7628140659	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME053	ZARRAGA E/ GAGUERRE Y PEDERNERA	-34.7193355719	-58.7364530355	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME054	ZARRAGA E/ GAVILAN	-34.7224390766	-58.7398117674	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME055	PUEYRREDON Y O'BRIEN	-34.6750933254	-58.7004728644	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME055	Pueyrredón 1499	Merlo	Oeste
ME056	SAN ANTONIO Y PARAGUAY	-34.6562604692	-58.7368251991	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME056	San Antonio 785	Merlo	Oeste
ME057	CHACO N° 310 E/DIRECTORIO Y NOGUERA	-34.6677795814	-58.6973847798	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME057	Noguera 256	Merlo	Oeste
ME058	12DE FEBRERO	-34.6973924655	-58.7333743608	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME059	GABRIELA MISTRAL Y ALPATACAL	-34.6991665161	-58.7092108171	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME059	Gabriela Mistral 1535	Merlo	Oeste
ME060	SAENZ PEÑA Y AV. CALLE REAL	-34.6789738314	-58.7103083146	TANQUE MERLO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-CES	25 de Mayo 712	Merlo	Oeste
ME061	SAENZ PEÑA Y AV. RIVADAVIA	-34.6670727728	-58.7043677869	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME061	Saenz Peña 183	Merlo	Oeste

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Direcció̲n del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
ME062	GARMENDIA Y BROWN	-34.7136834843	-58.7389261222			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME063	FILIBERTO Y TARIJA	-34.6701019352	-58.7614757033	TANQUE RECONQUISTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-REC	Filiberto 1268	Merlo	Oeste
ME064	Los Tulipanes esq/Las Mangolias	-34.7111000000	-58.7780470000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCME064	Pendiente por definición	Merlo	Oeste
ME065	NOGUERA Y ENTRE RIOS	-34.6715043735	-58.6928887337	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME065	Entre Ríos 400, esq. Noguera, M	Merlo	Oeste
ME066	AV 2°DA. RIVADAVIA T SOLANET	-34.6636188189	-58.7307074635	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME066	Solanet 54	Merlo	Oeste
ME067	TRAFUL Y BLANCO ESCALADA	-34.6935273296	-58.7141387306	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME067	Traful 1836	Merlo	Oeste
ME068	JOSE MARTI Y DALTON	-34.6924607755	-58.7751297777	TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME069	ATAHUALPA Y PEDRO CHUTRO	-34.6958935094	-58.6604172282	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME069	Atahualpa 1744	Merlo	Oeste
ME070	TUCUMAN Y LA RIOJA	-34.6667437076	-58.7343872756	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME070	Tucuman 1246	Merlo	Oeste
ME073	SARMIENTO 2398 Y LA HABANA	-34.6815926304	-58.6883529787	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME012-73	Sarmiento 2433	Merlo	Oeste
ME074	CORDOBA 390 Y CHACABUCO	-34.6722459022	-58.7306538980	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME074	CORDOBA 369	Merlo	Oeste
ME075	MEDRANO 811 Y SANTA FE	-34.6585723666	-58.7155903248	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME075	Navarro 684	Merlo	Oeste
ME076	El Hornero 3710	-34.7189927316	-58.7411696273	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME077	Luis Viale a 500m de Gavilán	-34.7248820000	-58.7452570000		BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO IRRECUPERABLE / CEGADO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME078	Garay 1753	-34.6638000000	-58.7195810000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME078	Belgrano 1635	Merlo	Oeste
ME079	Antofagasta y Fraga	-34.6755340000	-58.7675930000	TANQUE RECONQUISTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-REC	Filiberto 1268	Merlo	Oeste
ME080	Federico Lacroze y Matorras	-34.6970250000	-58.7647060000	TANQUE LOMA GRANDE RED	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA POZO A RED	SERVICIO	PCME080	Matorras 3213	Merlo	Oeste
ME081	Strauss y Juan Manuel Bach	-34.6959660000	-58.7606550000	TANQUE LOMA GRANDE RED	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA POZO A RED	SERVICIO	PCME081	Bach 2989	Merlo	Oeste
ME082	Cacheuta y José Martí	-34.6770440000	-58.7603650000	TANQUE RECONQUISTA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-REC	Filiberto 1268	Merlo	Oeste
ME083	Guiraldes entre Olaya y Ara San Juan	-34.6881390000	-58.7431210000	POI MERLO	TRATAMIENTO	SERVICIO	ME01	Machado N° 1341 entre Olaya y	Merlo	Oeste
ME084	Enrique de la Carcova y José San Chocano	-34.6885830000	-58.7488610000	POI MERLO	TRATAMIENTO	SERVICIO	ME01	Machado N° 1341 entre Olaya y	Merlo	Oeste
ME085	Caaguazu entre Fleming y Aristobulo del Valle	-34.6977730000	-58.7332980000	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME086	Garmendia y Almte. Brown	-34.7138660000	-58.7382340000	REBOMBEO PARQUE SAN MARTIN	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-CIS-PSM	Aristobulo del Valle 4059	Merlo	Oeste
ME087	Av. Argentina y Lezama	-34.6914110000	-58.7459810000	TANQUE LOMA GRANDE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-LOM	Esnaola 301	Merlo	Oeste
ME088	Lorenzini entre Deàn Funes y Fraga	-34.6811940000	-58.7706110000	TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME089	Curapaligüe y 25 de Mayo, Merlo	-34.6986120000	-58.7396720000	RED - PARQUE PARQUE SAN MARTIN	POZO A RED	SERVICIO	PCME089	Arisóbulo del valle 4692 eq Cura	Merlo	Oeste
ME090	Angel Rodriguez y Curapaligue	-34.6953330000	-58.7448080000	TANQUE LOMA GRANDE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-LOM	Esnaola 301	Merlo	Oeste
ME091	P.Echague y P. Podestá	-34.6992140000	-58.7775000000	TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME092	Carcavallo entre Cassaux y Orfilia Rico	-34.6974670000	-58.7815170000	TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME093	Morse y Av. del Bicentenario	-34.6765500000	-58.7336250000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME093	Morse 390 Merlo	Merlo	Oeste
ME094	Brasil y Guardia Vieja	-34.6569080000	-58.7213280000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME094	Reconquista 1978(Guarda Vieg	Merlo	Oeste
ME095	SULLIVAN Y SARGENTO CABRAL, Merlo			RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME095	SANTIAGO DEL ESTERO 882,	Merlo	Oeste
ME096				BATERIA PONTEVEDRA		STAND BY			Merlo	Oeste
ME097				BATERIA PONTEVEDRA		STAND BY			Merlo	Oeste
ME098	Tasso y Oran	-34.7490280000	-58.7108330000	BATERIA PONTEVEDRA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	STAND BY			Merlo	Oeste
ME099						STAND BY			Merlo	Oeste
ME100				BATERIA PONTEVEDRA		STAND BY			Merlo	Oeste
ME101	JUAN MAZA Y DR. RAÚL ALFONSÍN, Merlo			RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME101	RICARDO ALFONSIN 1163, Sa	Merlo	Oeste

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Direcció̲n del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
ME102	Fraga y Dávila, partido de Merlo			TANQUE ARCO IRIS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	ME-TAN-ARC	Carlos Gardel 395 Barrio Arco I	Merlo	Oeste
ME103	Los Arrieros y San Martin, partido de Merlo			RED PARQUE SAN MARTIN	POZO A RED	SERVICIO	PCME103	Rawson 2350 e/ Los Arrieros y	Merlo	Oeste
ME113	EVA PERON E/PELLEGRINI, Merlo			RED	POZO A RED	SERVICIO	PCME113	Zapiola 567, Merlo	Merlo	Oeste
SF005	Necochea y Lavalle	-34.4452692708	-58.5536170703			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	SF09		SAN FERNANDO	Norte
SF011	Lavalle e/ M. Cne y A. Brown	-34.4473675027	-58.5525428032			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	SF09		SAN FERNANDO	Norte
SF015	Av. del Libertador y uruguay	-34.4522711200	-58.5277161900			POZO INACTIVO / SELLADO			SAN FERNANDO	Norte
SF017	A, Palacios y Zanocchi	-34.4545598400	-58.5320508600			POZO INACTIVO / SELLADO			SAN FERNANDO	Norte
SF027	Rodriguez Peña y uruguay	-34.4501307600	-58.5334785500			POZO INACTIVO / SELLADO			SAN FERNANDO	Norte
SF028	Av. Del Libertador 3300	-34.4510319307	-58.5294746646			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	SF01		SAN FERNANDO	Norte
SF029	Belgrano 1100 (e) 9 de julio y Alsina	-34.4427728311	-58.5588448153			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	SF09		SAN FERNANDO	Norte
SF040	Uruguay y Sucre	-34.4657666512	-58.5555008607			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	SF07		SAN FERNANDO	Norte
SF041	Mansilla y Avellaneda	-34.4497748062	-58.5517613153			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	SF09		SAN FERNANDO	Norte
SF042	Juncal y Malvinas Argentinas	-34.4673896023	-58.5628008839			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	SF10		SAN FERNANDO	Norte
SI001	M Estrada N° 868 Esq. Alfaro	-34.4776962540	-58.5007823653			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	SI11		SAN ISIDRO	Norte
SI010	R. Indarte y L. y Planes	-34.4717388610	-58.5010234140			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	SI01		SAN ISIDRO	Norte
SI066	Espora e/ Rivera y Jose C Paz	-34.4744311400	-58.4971305500			POZO INACTIVO / SELLADO			SAN ISIDRO	Norte
TI005	Chile y Güemes	-34.4648116005	-58.6515656218			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI006	Ricardo Gutierrez y Comandante Calz	-34.4519912300	-58.6933637000			POZO INACTIVO / SELLADO			TIGRE	Norte
TI007	Mendoza y Bibilone	-34.4492826972	-58.6892533634			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI008	La Paloma y Las Azucenas	-34.4622779285	-58.6587018637			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI009	Azucenas y Cruz del Sur	-34.4571594768	-58.6585528149			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI010	Cruz del Sur y 9 de Julio	-34.4595180400	-58.6638055500			POZO IRRECUPERABLE / CEGADO			TIGRE	Norte
TI011	Avellaneda y Quintana	-34.4548969136	-58.6665058089			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI012	Sarmiento y Roca	-34.4575274466	-58.6708692926			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI013	Uriburu y Groussac	-34.4495792545	-58.6758442268			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI014	Sgto. Díaz y Romero	-34.4504165726	-58.6802876427			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI015	Groussac y De Luca	-34.4455186665	-58.6816928272			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI016	25 de Mayo y Francia	-34.4678636425	-58.6588266615			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI017	Groussac y M. Curie	-34.4427536795	-58.6861961596			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI018	25 de Mayo y Perú	-34.4665686471	-58.6563592504			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI019	Viamonte y H'oggins	-34.4603053173	-58.6487074429			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI020	25 de Mayo y Uruguay	-34.4651493782	-58.6531977794			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI021	Groussac y Marmol	-34.4465766754	-58.6788709451			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI11		TIGRE	Norte
TI022	Santiago del Estero y E. Ríos	-34.4552713397	-58.6343129816			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI16		TIGRE	Norte
TI023	A. Volta 2145 e/ Junin y Emilio la Marc	-34.4475390000	-58.6640710000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI17		TIGRE	Norte
TI024	Junin y Pichincha	-34.4445685585	-58.6630055265			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI17		TIGRE	Norte
TI025	Mansilla y Fleming	-34.4419869966	-58.6653857981			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI17		TIGRE	Norte
TI026	Callao e/ Mansilla y Tejedor	-34.4381931260	-58.6665039906			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI17		TIGRE	Norte
TI027	Constituyentes y Castelar	-34.4453565610	-58.6766501810			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	TI17		TIGRE	Norte
ES002	SARMIENTO 824	-34.3483195282	-58.8004137549			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES003	GELVES MATEO JUAN 456	-34.3447981572	-58.7892359024	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	GELVES MATEO JUAN 472	Escobar	Norte
ES004	TAPIA DE CRUZ 524	-34.3463780000	-58.7940890000	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES005	MORENO 825	-34.3424360532	-58.7946965462	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES006	ISLAS ORCADAS 142	-34.3406668819	-58.7888236782	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	ISLAS ORCADAS 153	Escobar	Norte
ES007	LOS LAZARISTAS 800	-34.3457239815	-58.7994359640	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES008	LAS PERGOLAS 2518	-34.3552036993	-58.8134344038	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES008	Callao 2542	Escobar	Norte
ES009	LAS ORQUIDEAS y ESTRADA	-34.3587937865	-58.8121835035	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES009	ORQUIDEAS 1079	Escobar	Norte
ES011	LOS TULIPANES 349	-34.3640057853	-58.8094073871	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES011-25	ORQUIDEAS 973	Escobar	Norte
ES012	LOS JUNQUILLOS y LAS ORQUIDEAS	-34.3513740221	-58.8179863698	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES012	LOS JUNQUILLOS 2656	Escobar	Norte
ES014	MENDOZA 750	-34.3560818523	-58.8073199843	RED - TANQUE ESCOBAR	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES014	ALMIRANTE BROWN 2582	Escobar	Norte
ES015	RIO GRANDE 113	-34.3612853762	-58.7781431801	BATERIA BARRIO STONE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES15-033	SAN GENARO 21 Y SARGENT	Escobar	Norte
ES017	DE LOS INMIGRANTES e INDEPENDENCIA	-34.3480759715	-58.8071163155	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES018	DE LOS INMIGRANTES y CARLOS PELEGRINI	-34.3467958903	-58.8053730908			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Escobar	Norte

R-CAL-AGU-003
Versión 02

Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)

050-INS-A-CA-CRU-PS 04

Pozo N°	Dirección del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
ES019	BOERO FELIPE 235	-34.3437276169	-58.7808793134	RED - TANQUE COPROVI	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES019	ZANGUINETTI 143	Escobar	Norte
ES020	JOSE HERNADEZ 1932	-34.3269528101	-58.7876562854	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES020	SABIN 700	Escobar	Norte
ES021	LIBERTAD y Sanguinetti	-34.3377261879	-58.7822399011	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES021	LIBERTAD 685	Escobar	Norte
ES022	MARIN y SCALABRINI ORTIZ	-34.4536748539	-58.7384552700	TANQUE FONAVI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCES022-24	FONAVI - VEREDA DE TANQU	Escobar	Norte
ES023	MARIN E ISLAS MALVINAS	-34.4540045742	-58.7341511227	TANQUE FONAVI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCES022-24	FONAVI - VEREDA DE TANQU	Escobar	Norte
ES024	ESCALABRINI ORTIZ S/N y CIRCULACIÓN 12	-34.4545329382	-58.7369771835	TANQUE FONAVI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PCES022-24	FONAVI - VEREDA DE TANQU	Escobar	Norte
ES025	SAN ANTONIO 3188					POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES011-25	ORQUIDEAS 973	Escobar	Norte
ES026	DE LOS INMIGRANTES 3000	-34.3547236637	-58.8214743028	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES026	INMIGRANTES 2687	Escobar	Norte
ES027	JOSE HERNANDEZ 18	-34.3680745566	-58.8097040557	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES027	JOSE HERNANDEZ 32	Escobar	Norte
ES028	COLECTORA ESTE KM 53	-34.3328626993	-58.8276741159	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES029	COLECTORA ESTE KM 52	-34.3353351126	-58.8220796524	HOSPITAL FLENI	TRATAMIENTO	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES029	FLENI COLECTORA ESTE KM	Escobar	Norte
ES030	DE LOS INMIGRANTES 1752	-34.3504216033	-58.8108228990	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES031	SARMIENTO 1391	-34.3432788169	-58.8042610162	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES032	SARMIENTO 1390 y PASO A NIVEL	-34.3407521966	-58.8078539113	TANQUE ESCOBAR	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES033	SARGENTO CABRAL 710 (dentro de Barrio Privado)	-34.3550161743	-58.7815377839	BATERIA BARRIO STONE	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES15-033	SAN GENARO 21 Y SARGENT	Escobar	Norte
ES034	SARMIENTO 824	-34.3482377378	-58.7999974785			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ES-TAN-CD	TANQUE CESAR DIAZ 1025	Escobar	Norte
ES035	Calle Bomberos Voluntarios a 30mts de calle Peirano	-34.3583210000	-58.8177040000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES035	Cesar Diaz 2699	Escobar	Norte
ES036	Constitucion 65, Escobar	-34.3554320000	-58.7920010000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES036	Constitución 65 E Italia y Fray M	Escobar	Norte
ES037	Galileo 487, Escobar	-34.3334560000	-58.8039600000	BATERIA LA CHECHELA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ESPC1	calle Formosa Nº 725 esquina F	Escobar	Norte
ES038	San Lorenzo 1901	-34.3319810000	-58.7996600000	BATERIA LA CHECHELA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	ESPC1	calle Formosa Nº 725 esquina F	Escobar	Norte
ES039	JOSE HERNADEZ 1934	-34.3271303517	-58.7875389629	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCES020	SABIN 700	Escobar	Norte
MI001	BELGRANO 400 y VICENTE LÓPEZ	-34.5365408437	-58.7037500662	CAG SAN MIGUEL ESTE	TRATAMIENTO	SERVICIO	MIPC2	Belgrano 333	San Miguel	Norte
MI002	SERRANO Y ROCA	-34.5368341259	-58.7128519207	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI002	JULIO ROCA 822	San Miguel	Norte
MI003	ITALIA Y LAS VIAS DEL FE.RR. SAN MARTIN	-34.5461784017	-58.7101796076	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI003	SARMIENTO 1280	San Miguel	Norte
MI004	CONESA 1400 y FRANCIA	-34.5494620062	-58.7055966564	REBOMBEO MUÑIZ	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-CEN	CONESA 1418	San Miguel	Norte
MI005	FRAGA Y TRIBULATO	-34.5437060936	-58.7156442347			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCMI005	TRIBULATO 1784	San Miguel	Norte
MI006	PARDO 547	-34.5470328457	-58.6906561494	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI006	SAN LUIS 18	San Miguel	Norte
MI007	ROCA Y GELLY OBES	-34.5447854075	-58.7223562120	RED	POZO A RED	PARADO	PCMI007	GELLY OBES 1928	San Miguel	Norte
MI008	GELLY OBES Y CONESA	-34.5538395766	-58.7112768580	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI008	GELLY OBES 901	San Miguel	Norte
MI009	SERRANO Y CONESA	-34.5448399808	-58.7010682159	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI009 MIPC1	CONESA 755	San Miguel	Norte
MI010	TRIBULATO Y SERRANO	-34.5376392501	-58.7101271637	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI010	CJAL. TRIBULATO 868	San Miguel	Norte
MI011	SERRANO E IRIGOIN 794	-34.5328879983	-58.7173241548	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI011	IRIGOIN 859	San Miguel	Norte
MI012	SERRANO 3200 Y CALLAO	-34.5268430133	-58.7264083345			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			San Miguel	Norte
MI013	DORREGO 405 Y ALBERDI, MUÑIZ	-34.5430438745	-58.6920366965	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI013 MIPC1	ALBERDI 36	San Miguel	Norte
MI014	ALBERDI Y SERRANO	-34.5480777990	-58.6965862813	CAG SAN MIGUEL CENTRO	TRATAMIENTO	PARADO P/INT. DE 3°	MIPC1	JD Peron 388	San Miguel	Norte
MI015	FRAGA 2301 (IRIGOIN 1492)	-34.5376896248	-58.7224926198	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI015	IRIGOIN 1494	San Miguel	Norte
MI016	FRAGA Y SALERNO 1499	-34.5339770909	-58.7285797260	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI016	SALERNO 1431	San Miguel	Norte
MI017	VICENTE LOPEZ 2400 Y MARCOS SASTRE	-34.5284376490	-58.7140388457	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI017	Vicente Lopez 2237	San Miguel	Norte
MI018	RECONQUISTA Y PARDO, BELLA VISTA	-34.5611099867	-58.7057753505	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI008	GELLY OBES 901	San Miguel	Norte
MI019	ZAPIOLA Y BAUTISTA ALBERDI	-34.5579100505	-58.7077529565	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI008	GELLY OBES 901	San Miguel	Norte

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Direcció̲n del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
MI020	JULIO A ROCA 221 Y PAVÓN	-34.5312502996	-58.7075736127	CAG SAN MIGUEL ESTE	TRATAMIENTO	SERVICIO	MIPC2	Belgrano 333	San Miguel	Norte
MI021	TRIBULATO Y GASPAR CAMPOS	-34.5503039981	-58.7226914483	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI021	TRIBULATO 2387	San Miguel	Norte
MI022	TOMAS GUIDO Y SARMIENTO	-34.5475735977	-58.7651720850	TANQUE SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-SAR	REMIGIO LÓPEZ 2479	San Miguel	Norte
MI023	AV. ALMTE. J.R.LÓPEZ (Ex Sarmiento) 4575	-34.5448003068	-58.7677082878	TANQUE SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-SAR	REMIGIO LÓPEZ 2479	San Miguel	Norte
MI024	TOMAS GUIDO Y MAESTRO FERREYRA	-34.5501876648	-58.7683804070	REBOMBEO GUARIDA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-GUA	J. J. PASO 4330	San Miguel	Norte
MI025	TOMAS GUIDO Y URIARTE	-34.5534389450	-58.7718836046	TANQUE SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-SAR	REMIGIO LÓPEZ 2479	San Miguel	Norte
MI026	TOMAS GUIDO Y DERQUI, José C. Paz	-34.5569960804	-58.7757716439	TANQUE SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-SAR	REMIGIO LÓPEZ 2479	San Miguel	Norte
MI027	FINOCHIETTO ENTRE DERQUI Y SANTA MARÍA, JOSÉ C. PAZ	-34.5450223552	-58.7861271546	REBOMBEO GUARIDA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MI-CIS-GUA	REMIGIO LÓPEZ 2479	San Miguel	Norte
MI028	SANTA MARÍA Y FATONE, JOSÉ C. PAZ	-34.5471620000	-58.7816680000	REBOMBEO GUARIDA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-GUA	J. J. PASO 4330	San Miguel	Norte
MI032	DERQUI 3234, José C. Paz, VII BASE AÉREA	-34.5533130000	-58.7792430000	TANQUE SARMIENTO	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-SAR	REMIGIO LÓPEZ 2479	San Miguel	Norte
MI033	IRIGOIN 1902 Y GRANADEROS	-34.5423927376	-58.7265909234	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI033	IRIGOIN 1926	San Miguel	Norte
MI034	MARTÍN IRIGIYEN 418, MUÑIZ	-34.5530393209	-58.7019785324	REBOMBEO MUÑIZ	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-CEN	CONESA 1418	San Miguel	Norte
MI035	R. PEÑA Y PAVON	-34.5364729851	-58.6977584811	CAG SAN MIGUEL ESTE	TRATAMIENTO	SERVICIO	MIPC2	Belgrano 333	San Miguel	Norte
MI036	FRAGA Y MARCONI	-34.5310416800	-58.7323780068	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI036	ALEM 3124	San Miguel	Norte
MI037	USTARROS Y PASO	-34.5727896177	-58.7295091734	REBOMBEO GUARIDA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-GUA	J. J. PASO 4330	San Miguel	Norte
MI038	ROCA Y ALEM	-34.5409259238	-58.7176468426	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI038	ALEM 1976	San Miguel	Norte
MI039	GELLY OBES Y BELGRANO	-34.5490592546	-58.7177756326	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI039	GELLY OBES 1588	San Miguel	Norte
MI040	ITALIA Y GASPAR CAMPOS	-34.5534752295	-58.7184435666	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI040	ITALIA 2381	San Miguel	Norte
MI041	DELIA Y BELGRANO	-34.5415473397	-58.7091733909	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI041	BELGRANO 859	San Miguel	Norte
MI042	RUTA 8 Y PARDO	-34.5435983569	-58.6864333809	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI042 MIPC1	PARDO 141	San Miguel	Norte
MI043	CONESA Y SAN LUIS	-34.5417489766	-58.6977221810	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI043 MIPC1	SAN JOSÉ 429	San Miguel	Norte
MI044	SARMIENTO 2487 ENTRE IRIGOIN Y LAS MALVINAS	-34.5604690000	-58.7481950000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MI-CIS-SAR	REMIGIO LÓPEZ 2479	San Miguel	Norte
MI045	R. PEÑA Y WILLIAMS	-34.5571422778	-58.7197545368	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI040	ITALIA 2381	San Miguel	Norte
MI046	PAUNERO Y PARDO	-34.5524458900	-58.6966658051	CAG SAN MIGUEL CENTRO	TRATAMIENTO	PARADO P/INT. DE 3°	MIPC1	JD Peron 388	San Miguel	Norte
MI047	MARÍN IRIGOYEN ENTRE OBLIGADO Y SAN JUAN, BELLA VISTA	-34.5559840114	-58.6977818240	REBOMBEO MUÑIZ	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-CEN	CONESA 1418	San Miguel	Norte
MI048	AV. FRANCIA 499, BELLA VISTA	-34.5594586653	-58.6928847808	REBOMBEO MUÑIZ	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-CEN	CONESA 1418	San Miguel	Norte
MI049	AV. FRANCIA 708, BELLA VISTA	-34.5625298909	-58.6894594712	REBOMBEO MUÑIZ	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-CEN	CONESA 1418	San Miguel	Norte
MI050	AV. FRANCIA 911, BELLA VISTA	-34.5648844619	-58.6861807428	REBOMBEO MUÑIZ	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	MI-CIS-CEN	CONESA 1418	San Miguel	Norte
MI051	AV. FRANCIA 1189 BELLA VISTA	-34.5679845776	-58.6821231033	REBOMBEO MUÑIZ	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-CEN	CONESA 1418	San Miguel	Norte
MI052	R. TRIANA (1600) Y BALBIN	-34.5699743637	-58.7426383412	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI052	BALBIN 4811	San Miguel	Norte
MI053	DEFENSA (1713) Y BALBIN	-34.5641324909	-58.7380543430	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI053	BALBIN 4255	San Miguel	Norte
MI054	TOMÁS ESPORA Y CRUZ DEL SUR	-34.5738894247	-58.7462022552	Batería MI054-MI062	POZO A RED	SERVICIO	PCMI062	Argüero 5354, Santa María, Sa	San Miguel	Norte
MI055	JUAN JOSÉ PASO 5587	-34.5826242155	-58.7383630313	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI055	JUAN JOSÉ PASO 5251	San Miguel	Norte
MI056	JUAN JOSE PASO entre BERON DE ASTRADA y SALGUERO	-34.5775615099	-58.7338531944	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI056	Juan Jose Paso 4825	San Miguel	Norte
MI057	Maestro Ferreyra y Charlone	-34.5720137848	-58.7384746599	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI057	Albarracin 1360	San Miguel	Norte
MI058	Guemes y Roque Saenz Peña	-34.5457320000	-58.7258580000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI058	Agüero 2030	San Miguel	Norte
MI059	Monseñor Blois y Consejal Tribulato	-34.5444960000	-58.7168320000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI059	TRIBULATO 1784	San Miguel	Norte
MI060	Conesa 1390 entre Martin Irigoyen y ferocarril San martin	-34.5490060000	-58.7061570000	REBOMBEO MUÑIZ	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-CEN	CONESA 1418	San Miguel	Norte
MI061	Luis Salguero y Tomás Alba Edison, partido de San Miguel	-34.5605000000	-58.7585280000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMI061	Primera Junta 4727, San Migue	San Miguel	Norte

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**
Pozo N°	**Direcció del pozo**	**Coordnadas GPS Latitud**	**Coordnadas GPS Longuitud**	**Sistema de distribución del pozo**	**Tipo de sistema**	**Estado del pozo**	**Punto de control (PMA o PC del pozo)**	**Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)**	**Distrito/Partido**	**Región**
MI062	Güemes e Isabel La Católica, San Miguel			Batería MI054-MI062		SERVICIO	PCMI062	Argüero 5354, Santa María, Sa	San Miguel	Norte
MI063	Egipto y Libertad, Muñiz, San Miguel	-34.5567780000	-58.7115750000	RED	POZO A RED	SERVICIO	MI01	Gelly Obes 1052.	San Miguel	Norte
MI064	San Nicolas y Gral Las Heras.	-34.5564560000	-58.7164080000	RED	POZO A RED	SERVICIO	MI01	Gelly Obes 1052.	San Miguel	Norte
MI065	Defensa e Italia, partido San Miguel			REBOMBEO GUARIDA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-GUA	J. J. PASO 4330	San Miguel	Norte
MI066	Dr. Enrique Finochietto e/Sta María y Fray Antonio Marchena, José C. Paz	-34.5448080000	-58.7863170000	REBOMBEO GUARIDA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-GUA	J. J. PASO 4330	San Miguel	Norte
MI067	Conesa e Irigoyen, Muñiz, San Miguel			REBOMBEO MUÑIZ	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MI-CIS-CEN	CONESA 1418	San Miguel	Norte
MA001	MONTES DE OCA N°15 Y JOSÉ HER	-34.4960338785	-58.7416440627	A PLUVIAL	A PLUVIAL	POZO ACTIVO NO PROD / SERVICIO	PCMA001	MONTES DE OCA N° 85	Malvinas Argentinas	Norte
MA002	AMBROSETTI 1980	-34.4899804250	-58.7442797675	BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MAPC1	Fray Luis Beltrán y Alfredo L. Pa	Malvinas Argentinas	Norte
MA003	ALMIRANTE BROWN 2697	-34.4853353942	-58.7469728788	BATERIA MALVINAS ARGENTINAS	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	MAPC1	Fray Luis Beltrán y Alfredo L. Pa	Malvinas Argentinas	Norte
MA004	ASAMBLEA Y 11 DE SEPTIEMBRE	-34.4953924332	-58.7497056031	RED	POZO A RED	SERVICIO	MAPC1	Fray Luis Beltrán y Alfredo L. Pa	Malvinas Argentinas	Norte
MA005	OLIDEN 1921 Y RUTA 8	-34.4975894203	-58.7535433533	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	- -	- -	Malvinas Argentinas	Norte
MA006	VIENA Y CANNING	-34.4924707700	-58.7556999596	RED	POZO A RED	SERVICIO	MAPC1	Fray Luis Beltrán y Alfredo L. Pa	Malvinas Argentinas	Norte
MA007	QUITO Y BLANCO ESCALADA	-34.4890384381	-58.7569931198			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	- -	- -	Malvinas Argentinas	Norte
MA008	QUITO Y LIBERTADOR	-34.4914413190	-58.7621414663			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	- -	- -	Malvinas Argentinas	Norte
MA009	CANGALLO 1200 Y SAN LORENZO	-34.4966795459	-58.7213341138	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMA009	San Lorenzo 1355	Malvinas Argentinas	Norte
MA010	USPALLATA Y SOLER	-34.4918154466	-58.7245668488	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMA010	USPALLATA 1058	Malvinas Argentinas	Norte
MA011	STOPLER 902 Y PASO DE LOS ANDES	-34.4921969375	-58.7306131971	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMA011	PASO DE LOS ANDES 1139	Malvinas Argentinas	Norte
MA012	COMBATE DE SAN LORENZO Y SEGUI	-34.4820180000	-58.7335260000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCMA012	San Lorenzo 2135	Malvinas Argentinas	Norte
MA016	Canadá y Seguí	-34.4764200000	-58.7461390000	RED	POZO A RED	SERVICIO	MAPC2	Canadá y Llavallol, Malvinas Arg	Malvinas Argentinas	Norte
MA017	Palacios y Seguí	-34.4736200000	-58.7522890000	RED	POZO A RED	SERVICIO	MAPC2	Canadá y Llavallol, Malvinas Arg	Malvinas Argentinas	Norte
MA018	Oliden entre 11 de Septiembre y Juan Cruz Varela	-34.4979720000	-58.7538920000	RED	POZO A RED	SERVICIO	MAPC1	Fray Luis Beltrán y Alfredo L. Pa	Malvinas Argentinas	Norte
JCP001	Corbeta uruguay e/ Roosevelt y Agrelo	-34.5218229600	-58.7925975700			POZO INACTIVO / SELLADO	JCP01	ACERBONI 5854, José C. Paz	José C. Paz	Norte
JCP002	Wilde 4573 e/Corbeta Uruguay y Fragata Sarmiento	-34.5252229314	-58.7896199661	TANQUE PRIMAVERA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	JCP01	ACERBONI 5854, José C. Paz	José C. Paz	Norte
JCP003	AV. Derqui e/ Av. Pres. Hipolito Yrigoyen	-34.5380689594	-58.7944710292	TANQUE PRIMAVERA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	JCP01	ACERBONI 5854, José C. Paz	José C. Paz	Norte
JCP004	Av. Derqui 5024 e/ Teodoro Roca y Blanco Maciel	-34.5412784981	-58.7910880233	TANQUE PRIMAVERA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	JCP01	ACERBONI 5854, José C. Paz	José C. Paz	Norte
JCP005	Las 3 Marías 5700 e/ Av. Jose Altube y Jose C. Paz	-34.5411450000	-58.7848130000	TANQUE PRIMAVERA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	JCP01	ACERBONI 5854, José C. Paz	José C. Paz	Norte
JCP006	Calle Pampa de Junin a 50 m de Yrigoyen	-34.5346450000	-58.7905060000	TANQUE PRIMAVERA	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	JCP01	ACERBONI 5854, José C. Paz	José C. Paz	Norte
PI100	Calle Sarmiento e/ Bahía Grande y Bahía Redonda	-34.5082690000	-58.8304860000	BATERIA DERQUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PIPC1	Av. Saavedra Lamas 3575, Cua	José C. Paz	Norte
PI101	Ruta 234 y Bahía Darbel	-34.5069610000	-58.8250920000	BATERIA DERQUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PIPC1	Av. Saavedra Lamas 3575, Cua	José C. Paz	Norte
PI102	Calle Henry Martin y Bahía Darbel	-34.5121300000	-58.8344360000	BATERIA DERQUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PIPC1	Av. Saavedra Lamas 3575, Cua	José C. Paz	Norte
PI103	Cerrito 3287 e Isla Gran Malvinas	-34.5125930000	-58.8284080000	BATERIA DERQUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PIPC1	Av. Saavedra Lamas 3575, Cua	José C. Paz	Norte
PI001	J. B. Justo y Sanguinetti al 500.	-34.4541027172	-58.9049599128	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI001	Gimnasio en la calle Sanquinetti 518	Pilar	Norte
PI002	J. B. Justo 615 y Posadas.	-34.4514731238	-58.9000033075	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI002	Vivienda en Posadas 473	Pilar	Norte
PI003	Av. Tratado de Pilar 242 y Sanguinetti.	-34.4513375766	-58.9072780407	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI003	Colegio "Madre del divino pasto	Pilar	Norte
PI004	Lagrave 84 (Yrigoyen y Pampa).	-34.4570907896	-58.9071709306	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI004	Empresa "Sudamericanda de Av	Pilar	Norte
PI005	Planta Champagnat.	-34.4466032931	-58.9215019495	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI005	Planta Champagnat	Pilar	Norte

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Direcció del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
PI006	Rincón entre San Martín y Esteban Luca	-34.4517625013	-58.9156698757	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI006	Rincón entre San Martín y Estab	Pilar	Norte
PI007	José María Paz 873.	-34.4562859647	-58.9010469855	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI007	Taller mecánico sobre calle Jos	Pilar	Norte
PI008	Ituzaingó 331.	-34.4547535101	-58.9121540798	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI008	Destacamento de Policia y Bom	Pilar	Norte
PI009	Maipú y Vías F.F.C.C. San Martín.	-34.4699416588	-58.9050316858	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI009	Predio Municipal sobre calle Ma	Pilar	Norte
PI010	Gral. O´Higgins y Bergantín Congreso.	-34.4768980541	-58.9145898059	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI010	Vivienda en Bergantin Congreso	Pilar	Norte
PI011	Juan Bautista Alberdi 1106 y 11 Septiembre	-34.4641304807	-58.9157156858	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI011	Remisería en la intersección de	Pilar	Norte
PI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambrosetti.	-34.4450185366	-58.8758539743	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y	Pilar	Norte
PI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Mapuche)	-34.4431378694	-58.8478791317	RED - COUNTRY MAPUCHE	POZO A RED	SERVICIO	PCPI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui	Pilar	Norte
PI014	Las Araucarias y M. Acosta.	-34.4530180817	-58.8609994307	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PIPC2	Las Araucarias 1600, Pilar	Pilar	Norte
PI015	Dr. Ignacio Pirovano 728 esq. Costa Rica	-34.4420283680	-58.9070151984	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI015	Colegio "Nuestra Sra de la Paz"	Pilar	Norte
PI016	Chacabuco 2130 e/Paraguay y Bolivia	-34.4820092399	-58.8349196416	RED - B? AYRES VILLAGE	POZO A RED	SERVICIO	PCPI016	Centro de Salud Monterrey sobr	Pilar	Norte
PI017	Tortugas Country Club	-34.4541170000	-58.7568030000	RED - TORTUGAS COUNTRY CLUB	POZO A RED	SERVICIO	PCPI017	Panamericana Ramal Pilar km 3	Pilar	Norte
PI018	Tortugas Country Club	-34.4545832340	-58.7558222747	RED - TORTUGAS COUNTRY CLUB	POZO A RED	SERVICIO	PCPI018	Vivienda Lote 56	Pilar	Norte
PI019	Tortugas Country Club	-34.4609578520	-58.7496439041			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Pilar	Norte
PI020	Tortugas Country Club	-34.4549977151	-58.7526828841	RED - TORTUGAS COUNTRY CLUB	POZO A RED	SERVICIO	PCPI020	Panamericana Ramal Pilar km 3	Pilar	Norte
PI021	Tortugas Country Club	-34.4490549372	-58.7488004148	RED - TORTUGAS COUNTRY CLUB	POZO A RED	SERVICIO	PCPI021	Vivienda Lote 322	Pilar	Norte
PI022	Las Campanillas esq. Av. Highland Park	-34.4257072547	-58.7896761074	RED - COUNTRY HIGHLAND	POZO A RED	SERVICIO	PCPI022	Canilla de servicio de la porteria	Pilar	Norte
PI025	Country El Carmel	-34.4417282874	-58.9304637708	RED - COUNTRY EL CARMEL	POZO A RED	SERVICIO	PCPI025	Galpon del country lindero al poz	Pilar	Norte
PI040	Las Margaritas 1100 e/ Los Claveles y Las Rosas	-34.4330865447	-58.7880199484	RED - COUNTRY AYRES DEL PILAR	POZO A RED	SERVICIO	PCPI040	Unidad Sanitaria de la municipal	Pilar	Norte
PI041	Las Glicinas 1080 (proximo a R8)	-34.4528700000	-58.8873370000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI041	Local "Oxipilar" sobre ruta 8 esq	Pilar	Norte
PI042	Musladini 374. esquina Bergantín Independencia.	-34.4680850000	-58.9120150000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI042	Vivienda Calle Muslandini 1323	Pilar	Norte
PI043	Segui esq. Colectora Este Ramal Pilar	-34.4406533607	-58.8415767251	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI043	Segui esq. Colectora Este Ramal	Pilar	Norte
PI044	Posadas 1635 e/J.V. Gonzalez y H. Ascasubi	-34.4629957482	-58.8915092213	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI044	Vivienda sobre calle Posadas 1	Pilar	Norte
PI045	Country B° Campo grande	-34.4053839501	-58.8273156517	RED - COUNTRY B? CAMPO GRANDE	POZO A RED	SERVICIO	PCPI045	Barrio Campo Grande + Los Pila	Pilar	Norte
PI048	Cjal. Dr. Martitegui 219. Plaza.	-34.4647770592	-58.9050029551	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI048	Vvienda sobre calle Chubut 133	Pilar	Norte
PI049	Bergantín República y Bergantín Independencia.	-34.4688443505	-58.9147443304	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI049	Vivienda sobre calle Republica I	Pilar	Norte
PI050	Av. Constitucion(R26) e/Nicaragua y San Salvador.	-34.4171813444	-58.7758454649	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI050	Remiseria "Autos Ya" sobre Av.	Pilar	Norte
PI051	Guatemala y R26.	-34.4219723919	-58.7775951235	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI051	Guatemala 3951 (Garita de Seg	Pilar	Norte
PI052	Guatemala 4300 esq. Alemania (Manuel Alberti)	-34.4172457685	-58.7820061972	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI052	Guatemala el 4200 [Chicote ant	Pilar	Norte
PI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ramón Gimenez.	-34.4643253979	-58.8036436731	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI053	RP 8 - Av. Arturo Illia y Juan Ra	Pilar	Norte
PI054	Leguizamon e Ituzaingo	-34.4690212778	-58.7874924906	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI054	Leguizamon e Ituzaingo	Pilar	Norte
PI056	Ameghino y Colectora Oeste	-34.4484171928	-58.8945656971	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI056	Ameghino y Colectora Oeste	Pilar	Norte
PI057	Country B° Santa Catalina	-34.4415948064	-58.8996897836	RED - COUNTRY B? SANTA SILVINA	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCPI057	Garita de vigilancia del Barrio "	Pilar	Norte
PI058	Nicaragua 1250 e/Haiti y Santo Domingo	-34.4371883790	-58.9131501208	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI058	1- En verduleria sobre la calle N	Pilar	Norte
PI059	Ubicado dentro de predio Campo Suite II	-34.4519020000	-58.8603970000	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	TERCEROS	PIPC2	Las Araucarias 1600, Pilar	Pilar	Norte
PI061	RN 25 y Chubut	-34.4302390000	-58.8827470000	RED	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCPI061	Chubut 1353	Pilar	Norte
PI062	Panamá y Alejandro Korn	-34.4283960000	-58.7635860000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI062	Panamá y Alejandro Korn, Pilar	Pilar	Norte
PI063	Patagones y Tagle	-34.4201580000	-58.8261410000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI063	Calle Sin Nombre entre Tagle y	Pilar	Norte

R-CAL-AGU-003 Versión 02	**Listado de Puntos Cercanos de Pozos (Total Concesión)**									**050-INS-A-CA-CRU-PS 04**

Pozo N°	Direcció̲n del pozo	Coordnadas GPS Latitud	Coordnadas GPS Longuitud	Sistema de distribución del pozo	Tipo de sistema	Estado del pozo	Punto de control (PMA o PC del pozo)	Ubicación del PC (PMA o PC del pozo)	Distrito/Partido	Región
PI064	Andes y Avda. Patricias Argentinas	-34.4335250000	-58.7548170000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI064	Patricias Argentinas 3301	Pilar	Norte
PI065	Goleta Constitución y Fragata Sarmiento	-34.4737600000	-58.9188360000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI065	Calle Goleta Constitución 1455,	Pilar	Norte
PI066	Calle s/n e/ Haití y Santo Domingo	-34.4159610000	-58.7706340000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI066	BO COPROVI PJE 3418 (casa	Pilar	Norte
PI067	Mariano Acosta y Los Alamos	-34.4617200000	-58.8543000000	BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PIPC2	Las Araucarias 1600, Pilar	Pilar	Norte
PI068	Alazan e/Overo y Picasso- Highland Park	-34.4162540000	-58.7947770000	RED - COUNTRY HIGHLAND	POZO A RED	SERVICIO	PCPI068	AV. ALAZAN, E/ OVERO Y PIC	Pilar	Norte
PI069	Country Ayres del Pilar	-34.4275940000	-58.8081560000	RED - COUNTRY AYRES DEL PILAR	POZO A RED	POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO			Pilar	Norte
PI070	Paraguay y Tierra del Fuego	-34.4762010000	-58.8375990000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI070	Tierra del Fuego 2218, Derqui	Pilar	Norte
PI073	Paraguay entre Salta y Araoz Alfaro	-34.4860330000	-58.8309470000	BATERIA MONTERREY	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	STAND BY			Pilar	Norte
PI074	Francia y Las Gardenias	-34.4795000000	-58.8452780000	BATERIA MONTERREY	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	STAND BY			Pilar	Norte
PI075	Guatemala y Levene, Pilar	-34.4384030000	-58.9048720000	RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI075	Guatemala y Levene, Pilar	Pilar	Norte
PI076	Gatti y Vasco Da Gama, Pilar			BATERIA PERUZZOTTI		SERVICIO	PCPI076	Domenech J D AV y Pasteur Luis Dr	Pilar	Norte
PI077	Vicecomodoro H. Meinsner e Hipólito Vieytes	-34.4903220000	-58.8374580000	BATERIA MONTERREY	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	STAND BY			Pilar	Norte
PI078	Vasco Da Gama entre Hermita y Camino Comercial, Pilar			BATERIA PERUZZOTTI		SERVICIO	PCPI076	Domenech J D AV y Pasteur Luis Dr	Pilar	Norte
PI080	Monseñor D`Andrea y La Carreta, Pilar			RED - BARRIO CARAMEL	POZO A RED	SERVICIO	PCPI080	Monseñor D' Andrea y La Tape	Pilar	Norte
PI084	Chubut 1720, esq San Ignacio, Villa Rosa, Pilar			RED	POZO A RED	SERVICIO	PCPI084	Chubut y San Ignacio, Villa Rosa, Pilar	Pilar	Norte
PI089	Los Álamos y Av. Eva Perón, Pilar			BATERIA HOSPITAL AUSTRAL	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PIPC2	Las Araucarias 1600, Pilar	Pilar	Norte
PI105	Libertad e Isla Candelaria, partido de Pilar			BATERIA DERQUI	BATERIA CON PTO. DE CONVERGENCIA	SERVICIO	PIPC1	Av. Saavedra Lamas 3575, Cua	Pilar	Norte
PI026	Las Amapolas. Villahaus - Country Ayr	-34.4334260000	-58.7963480000	COUNTRY AYRES DEL	POZO A RED	SERVICIO	PCPI026	Ayres del Pilar	Pilar Mixtos	Norte
PI035	Country Ayres del Pilar	-34.4276020000	-58.7995950000	RED - COUNTRY AYRES DEL PILAR	POZO A RED	SERVICIO	PCPI035	Ayres del Pilar	Pilar Mixtos	Norte
PI036	Country Ayres del Pilar	-34.4291290000	-58.8072180000			POZO INACTIVO / FUERA SERVICIO	PCPI036	Ayres del Pilar	Pilar Mixtos	Norte
PI037	Country La Lomada	-34.4289309839	-58.8150388803	RED - COUNTRY LA LOMADA	POZO A RED	SERVICIO	PCPI037	vivienda Lote 480	Pilar Mixtos	Norte

1.1.2 Calidad Agua Cruda Superficial

	CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 060-INS-A-CA-CRU-PSM-00-A (Ex 02)

PLANTA SAN MARTIN

Meses		Selenio µg/l	Cinc mg/l	Hierro mg/l	Manganeso mg/l	Aluminio mg/l	Sodio mg/l	Potasio mg/l	Cromo µg/l	Plomo µg/l	Cadmio µg/l	Niquel µg/l	Mercurio µg/l	Arsénico µg/l	Silicio mg/l
Enero	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*3,5*	*0,06*	*4,9*	*25*	*4,9*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<5*	*15*
Febrero	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*9,2*	*0,23*	*14,0*	*26*	*8,1*	*15,0*	*6,3*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Marzo	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,07*	*2,5*	*0,05*	*2,8*	*21*	*4,2*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Abril	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*0,11*	*8,6*	*0,33*	*6,4*	*31*	*5,7*	*7,4*	*5,8*	*0,11*	*7,50*	*<0,5*	*<5*	*19*
Mayo	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,03*	*2,5*	*0,09*	*4,2*	*42*	*6,2*	*<5*	*<5*	*0,12*	-	*<0,5*	*<5*	-
Junio	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,09*	*2,7*	*0,08*	*3,2*	*35*	*6,4*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Julio	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*0,08*	*9,2*	*0,22*	*7,2*	*21*	*5,5*	*11,0*	*6,6*	*<0,1*	*5,80*	*<0,5*	*<5*	*16*
Agosto	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,06*	*2,1*	*0,05*	*2,8*	*31*	*4,6*	*<5*	*<5*	*0,12*	-	*<0,5*	*<5*	-
Septiembre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,05*	*4,1*	*0,10*	*4,5*	*43*	*5,7*	*<5*	*5,6*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Octube	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*2,6*	*0,11*	*1,3*	*44*	*5,2*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<5*	*9,30*
Noviembre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,07*	*1,4*	*<0,04*	*2,0*	*26*	*4,4*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Diciembre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,10*	*2,5*	*0,09*	*2,0*	*25*	*3,4*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Total año :															
N° de muestras general		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**4**	**12**	**12**	**4**
Promedio Anual		<5	*0,06*	*4,2*	*0,1*	*4,6*	*31*	*5,4*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<5*	*15*
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,03*	*2,95*	*0,09*	*3,46*	*8,38*	*1,22*	*4,23*	*2,96*	*0,00*	*2,49*	*0,00*	*0,00*	*4,06*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
060-INS-A-CA-CRU-PSM-00-B (Ex 02)

PLANTA SAN MARTIN

Meses		Color	Sustancias Fenólicas	Cobre	Conductividad (*)	Residuo Conduct. (*)	Alcalinidad Total	Oxidabilidad	Oxígeno Disuelto (*)	Cloruros	Nitratos	Sulfatos	Calcio	Magnesio	Dureza Total
		u.c.	µg/l	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Enero	N° de muestras	1	1	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*18*	*0,01*	*<0,05*	---	---	*48*	*3,4*	---	*19,9*	*3,1*	*16,2*	*10,7*	*4,8*	*47*
Febrero	N° de muestras	1	1	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*20*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	-	*2,4*	---	*18,6*	*5,2*	*16,1*	*13,2*	*6,2*	*59*
Marzo	N° de muestras	1	1	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*7*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	-	*2,6*	---	*16,3*	*3,0*	*16,0*	*10,8*	*3,9*	*43*
Abril	N° de muestras	1	1	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*12*	*<0,01*	*0,06*	---	---	*36,40*	*2,2*	---	*23,1*	*2,2*	*28,6*	*14,3*	*6,4*	*62*
Mayo	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*24*	-	*<0,05*	---	---	-	*1,6*	---	*31,8*	*2,9*	*29,6*	*16,2*	*6,0*	*65*
Junio	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*46*	-	*<0,05*	---	---	-	*3,3*	---	*27,4*	*3,1*	*32,1*	*13,3*	*5,3*	*55*
Julio	N° de muestras	1	0	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*5*	-	*<0,05*	---	---	*38*	*2,6*	---	*19,0*	*2,0*	*18,7*	*11,1*	*4,8*	*48*
Agosto	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*34*	-	*<0,05*	---	---	-	*3,8*	---	*30,0*	*2,9*	*27,3*	*11,7*	*4,7*	*49*
Septiembre	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*14*	-	*0,06*	---	---	-	*4,1*	---	*35,5*	*2,9*	*32,4*	*15,7*	*5,5*	*62*
Octube	N° de muestras	1	0	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*26*	-	*<0,05*	---	---	*54,80*	*3,2*	---	*33,9*	*2,4*	*34,1*	*12,2*	*5,2*	*52*
Noviembre	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*29*	-	*<0,05*	---	---	-	*3,8*	---	*20,9*	*3,6*	*24,4*	*8,0*	*3,3*	*34*
Diciembre	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*41*	-	*<0,05*	---	---	-	*2,0*	---	*19,9*	*2,2*	*19,8*	*7,1*	*3,7*	*33*
Total año :															
N° de muestras general		**12**	**4**	**12**	**---**	**---**	**4**	**12**	**---**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Promedio Anual		*23*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	*44*	*2,9*	---	*24,7*	*3,0*	*24,6*	*12,0*	*5,0*	*51*
Desvío Standard Anual		*12,92*	*0,00*	*0,01*	---	---	*8,71*	*0,80*	---	*6,68*	*0,85*	*6,94*	*2,76*	*0,99*	*10,55*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(*) Los parámetros Amonio, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Residuo Conductimétrico y UV 254 dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que las determinaciones de Amonio, Conductividad y Oxígeno Disuelto continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
060-INS-A-CA-CRU-PSM-00-C (Ex 02)

PLANTA SAN MARTIN

Meses		Fluoruros mg/l	Nitritos mg/l	Amonio (*) mg/l	M.B.A.S. mg/l	Cloroformo (por Head Space) µg/l	Diclorobromo metano (por Head Space) µg/l	Dibromocloro metano (por Head Space) µg/l	Bromoformo (por Head Space) µg/l	Trihalo metanos (por Head Space) µg/l	DDT (Total Isómeros) µg/l	Clordano µg/l	Heptacloro µg/l	Heptacloro epóxido µg/l	ALFA HCH µg/l
Enero	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,5*	*0,11*	---	*<0,2*	*2,70*	*<2*	*<1*	*<1*	*<6*	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Febrero	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*0,08*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	*<2*	*<2*	*<1*	*<1*	*<6*	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Mayo	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*0,20*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	*<2*	*<2*	*<1*	*<1*	*<6*	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Agosto	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*0,38*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octube	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,5*	*0,24*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Noviembre	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total año :															
N° de muestras general		**12**	**12**	**---**	**12**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Promedio Anual		<0,5	*0,09*	---	*<0,2*	*<2*	*<2*	*<1*	*<1*	*<6*	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,12*	---	*0,00*	*1,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(*) Los parámetros Amonio, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Residuo Conductimétrico y UV 254 dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que las determinaciones de Amonio, Conductividad y Oxígeno Disuelto continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

	CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 060-INS-A-CA-CRU-PSM-00-D (Ex 02)

PLANTA SAN MARTIN

Meses		Lindano µg/l	Metoxicloro µg/l	2,4-D (**) µg/l	Aldrín µg/l	Dieldrín µg/l	Hexacloro benceno µg/l	Cloruro de Vinilo µg/l	1.1 Dicloroeteno µg/l	1.1.1 Tricloro etano µg/l	Tetracloruro de Carbono µg/l	1.2 Dicloro etano µg/l	Tricloro etileno µg/l	Tetracloroetano µg/l	Benceno µg/l
Enero	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,02*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Febrero	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,02*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Mayo	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,02*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Agosto	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octube	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total año :															
N° de muestras general		**4**	**4**	**---**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Promedio Anual		<0,04	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,2*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,00*	---	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(**) El parámetro 2,4-D no pudo ser analizado debido a la falta de disponibilidad operativa de los equipos del Laboratorio Central, situación que fue oportunamente comunicada al ERAS mediante la Nota N° NO-2025-00000579-AYSA-DMA#AYSA.

Cabe señalar que este compuesto se encuentra alcanzado por las restricciones establecidas en el Convenio de Estocolmo, incorporado a la normativa nacional a través de la Ley 26.011 y la Resolución 451/2019, actualizada por la Resolución 291/2020, que regulan su uso, importación y exportación.

Asimismo, se destaca que AySA cuenta, desde el año 2013, con registros históricos trazables que evidencian la ausencia de detecciones de este compuesto en el área de concesión.

aysa	**CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **060-INS-A-CA-CRU-PSM-00-E (Ex 02)**

PLANTA SAN MARTIN

Meses		Tolueno	Monocloro benceno	Etilbenceno	Estireno	1,4-Dicloro benceno	1,2-Dicloro benceno	Temperatura in situ	DBO (líquido bruto)	Cianuros	Benzo[a] pireno	Hidrocarburos Totales	Bario	U.V. 254 (*)
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	ºC	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	m-1
Enero	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	---	1	1	1	1	1	---
	Promedio	*<5*	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*<2*	*<0,05*	*<0,01*	*<0,4*	*<0,2*	---
Febrero	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Marzo	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Abril	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	---	1	1	0	1	1	---
	Promedio	*<5*	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	*<0,2*	---
Mayo	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Junio	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*2,50*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Julio	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	---	1	1	1	1	1	---
	Promedio	*<5*	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*3,10*	*<0,05*	*<0,01*	*<0,4*	*<0,2*	---
Agosto	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Septiembre	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Octube	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	1	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*2,50*	*<0,05*	-	*<0,4*	*<0,2*	---
Noviembre	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Diciembre	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Total año :														
N° de muestras general		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**---**	**12**	**12**	**2**	**12**	**4**	**---**
Promedio Anual		<5	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*<2*	*<0,05*	*<0,01*	*<0,4*	*<0,2*	---
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	*0,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(*) Los parámetros Amonio, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Residuo Conductimétrico y UV 254 dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que las determinaciones de Amonio, Conductividad y Oxígeno Disuelto continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

PLANTA SAN MARTIN

VALORES MAXIMOS, MINIMOS Y PROMEDIOS DE AGUA CRUDA Y CONSUMO

NUMERO DE ANALISIS Y DETERMINACIONES

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

070-INS-A-CA-CRU-PSM-01
(Ex 57-60-63)

	AGUA CRUDA					IMPELENTES				SALIDA NORTE				SALIDA CENTRO				SALIDA SUR				SALIDA PLANTA (20+34+34+12)			
	Turb	Alcal.	Amonio	UV254	Coef. Var.	Turb	Alcal.	pH	Cloro L	Turb	Alcal.	pH	Cloro L	Turb	Alcal.	pH	Cloro L	Turb	Alcal.	pH	Cloro L	Turb	Alcal.	pH	Cloro L
	UNT	mg/l	mg/l	1/m		UNT	mg/l	UpH	mg/l	UNT	mg/l	UpH	mg/l	UNT	mg/l	UpH	mg/l	UNT	mg/l	UpH	mg/l	UNT	mg/l	UpH	mg/l
Determin.	372	372	372	372		372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	1116	1116	1116	1116
MAX	196	53	0,46	15,6		0,96	44	9,1	3,07	1,20	45	9,1	3,40	1,37	46	9,4	2,90	1,14	45	9,3	3,20	1,20	45	9,2	3,14
MIN	33	28	0,025	7,8		0,18	28	7,0	1,40	0,10	29	7,0	1,03	0,14	27	6,9	0,78	0,17	26	7,0	0,71	0,14	28	7,0	0,98
PROM	95	35	0,08	9,7		0,61	36	8,2	2,22	0,42	35	7,9	2,15	0,47	36	8,2	1,84	0,40	34	7,9	1,91	0,47	35	8,1	2,03
Determin.	336	336	336	336		336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	1008	1008	1008	1008
MAX	536	76	1,66	15,6		0,98	59	8,9	3,90	0,90	55	9,1	6,90	1,24	59	8,8	3,66	0,92	56	9,2	6,09	1,03	57	9,0	5,10
MIN	55	31	0,025	6,8		0,21	28	6,6	1,60	0,12	27	6,7	0,90	0,12	28	6,6	0,22	0,15	27	6,4	0,90	0,14	28	6,6	0,81
PROM	130	40	0,13	10,0		0,57	39	7,9	2,24	0,38	38	7,8	2,34	0,43	38	7,8	2,02	0,45	38	7,9	2,11	0,44	38	7,8	2,18
Determin.	372	372	372	372		372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	1116	1116	1116	1116
MAX	435	95	0,00	22,0		1,50	64	8,9	6,89	3,33	63	8,7	6,00	1,99	66	8,8	3,31	3,50	63	8,8	5,90	2,53	64	8,8	5,25
MIN	49	34	0,000	8,0		0,24	32	6,6	1,33	0,15	30	6,7	1,03	0,13	28	6,4	0,28	0,17	24	6,4	0,24	0,16	29	6,5	0,74
PROM	123	48	0,15	14,7		0,67	44	7,6	2,31	0,59	43	7,5	2,52	0,54	42	7,3	2,07	0,53	42	7,6	2,17	0,58	43	7,5	2,28
Determin.	360	360	360	360		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	357	357	357	357	1077	1077	1077	1077
MAX	790	86	1,28	14,2		2,28	62	8,9	3,40	0,98	62	8,8	4,73	1,50	62	8,6	4,10	2,67	58	8,9	4,90	1,62	62	8,8	4,27
MIN	67	36	0,025	8,1		0,24	32	6,4	1,33	0,12	31	6,8	1,08	0,12	29	6,4	0,74	0,10	18	6,0	1,11	0,14	29	6,5	1,02
PROM	205	50	0,13	11,0		0,63	45	7,8	2,26	0,49	44	7,7	2,32	0,37	40	7,2	2,38	0,34	35	7,0	2,20	0,46	42	7,5	2,31
Determin.	372	372	372	372		372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	1116	1116	1116	1116
MAX	397	128	3,30	23,6		2,71	68	9,1	4,91	3,20	76	8,8	6,92	3,80	69	8,6	5,66	1,42	63	8,7	7,28	3,09	70	8,8	6,13
MIN	65	39	0,025	9,1		0,32	31	6,5	1,21	0,13	20	6,4	0,15	0,11	30	6,4	0,05	0,14	19	6,0	0,71	0,16	25	6,4	0,40
PROM	153	55	0,28	14,7		0,76	47	7,5	2,42	0,78	46	7,4	2,30	0,76	44	7,1	2,15	0,50	38	6,9	2,35	0,74	45	7,3	2,28
Determin.	360	360	360	360		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	1080	1080	1080	1080
MAX	383	87	1,11	26,8		4,52	62	9,0	3,83	4,56	67	9,2	4,40	5,96	63	9,3	4,78	2,90	61	9,3	4,99	4,83	64	9,2	4,49
MIN	40	36	0,025	18,7		0,31	24	6,4	1,51	0,13	20	6,2	0,68	0,20	25	6,3	0,90	0,17	22	6,5	0,85	0,19	23	6,3	0,94
PROM	83	56	0,20	22,5		1,06	43	7,2	2,38	1,21	44	7,3	2,27	1,61	43	7,2	2,27	0,65	45	7,5	2,33	1,25	44	7,3	2,30
Determin.	372	372	372	372		372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	1116	1116	1116	1116
MAX	215	71	1,10	27,0		2,86	64	9,2	3,60	5,06	64	9,4	4,60	4,18	66	9,2	3,60	0,90	63	9,1	4,41	3,82	65	9,3	4,04
MIN	30	36	0,025	18,4		0,35	30	6,4	1,61	0,27	26	6,4	0,80	0,26	22	6,0	0,93	0,17	31	6,8	1,06	0,27	26	6,3	1,04
PROM	66	46	0,16	22,7		0,74	44	7,8	2,38	1,17	44	7,9	2,11	1,20	41	7,5	2,33	0,42	43	7,9	2,16	1,00	43	7,7	2,24
Determin.	372	372	372	372		372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	1116	1116	1116	1116
MAX	180	103	2,94	27,6		1,89	81	8,9	5,41	6,56	88	9,6	6,26	4,48	83	8,8	5,76	0,91	80	8,9	8,73	4,24	84	9,1	6,22
MIN	21	37	0,025	15,8		0,25	26	6,3	1,60	0,20	29	6,5	0,94	0,30	24	6,1	0,94	0,15	32	6,8	0,75	0,24	27	6,4	1,05
PROM	61	52	0,21	21,3		0,73	48	7,7	2,49	1,39	47	7,6	2,34	1,23	45	7,5	2,38	0,44	48	7,8	2,36	1,09	47	7,6	2,39
Determin.	360	360	360	360		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	1080	1080	1080,0	1080
MAX	206	117	1,94	22,8		2,51	76	8,5	5,40	7,83	74	9,4	4,91	5,07	69	8,8	4,80	1,40	71	8,7	5,41	5,06	72	8,9	5,03
MIN	28	40	0,025	14,7		0,30	30	6,3	1,48	0,19	27	6,4	0,78	0,20	28	6,0	0,27	0,18	20	6,2	0,80	0,21	27	6,2	0,75
PROM	72	59	0,20	18,3		0,86	49	7,4	2,60	1,23	46	7,3	2,45	1,30	46	7,2	2,44	0,42	45	7,2	2,51	1,08	46	7,3	2,48
Determin.	372	372	372	372		372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	1116	1116	1116	1116
MAX	140	107	2,80	19,2		1,67	70	9,3	6,18	2,38	71	8,9	9,06	3,48	72	9,2	9,51	0,79	68	8,8	7,15	2,42	71	9,1	8,41
MIN	28	34	0,025	11,8		0,26	25	6,3	1,66	0,19	20	6,4	0,80	0,18	22	6,5	1,09	0,15	17	6,3	0,39	0,20	21	6,4	1,02
PROM	61	51	0,20	16,0		0,67	45	7,5	2,48	0,52	41	7,3	2,50	0,67	42	7,3	2,33	0,34	42	7,4	2,33	0,58	42	7,4	2,42
Determin.	360	360	360	360		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	1080	1080	1080	1080
MAX	138	69	0,65	19,9		1,56	59	9,5	3,71	1,96	58	9,5	3,68	2,20	58	9,2	3,88	0,61	59	8,9	4,33	1,80	58	9,3	3,83
MIN	13	35	0,025	10,6		0,14	30	6,3	1,65	0,16	29	6,4	0,94	0,19	30	6,5	0,75	0,14	30	6,3	0,90	0,16	30	6,4	1,01
PROM	66	46	0,11	14,5		0,61	44	7,9	2,37	0,52	43	7,8	2,34	0,56	43	7,6	2,14	0,24	42	7,7	2,10	0,52	43	7,7	2,25
Determin.	372	372	372	372		372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	1116	1116	1116	1116
MAX	141	74	1,06	18,0		1,55	62	9,3	4,12	1,48	68	9,6	5,10	1,90	60	9,2	4,55	0,72	61	9,0	3,81	1,55	63	9,3	4,56
MIN	22	25	0,025	10,0		0,16	32	6,6	1,48	0,13	34	6,7	1,06	0,12	28	6,4	0,84	0,11	33	6,7	0,74	0,13	31	6,6	1,03
PROM	51	44	0,16	12,7		0,57	43	7,9	2,29	0,35	43	7,9	2,26	0,56	41	7,5	2,02	0,22	43	7,9	1,92	0,45	42	7,8	2,14
Determin.	**4380**	**4380**	**4380**	**4380**		**4380**	**4380**	**4380**	**4380**	**4380**	**4380**	**4380**	**4380**	**4380**	**4380**	**4380**	**4380**	**4377**	**4377**	**4377**	**4377**	**13137**	**13137**	**13137**	**13137**
MAX	**790**	**128**	**3,30**	**27,6**		**4,52**	**81**	**9,5**	**6,89**	**7,83**	**88**	**9,6**	**9,06**	**5,96**	**83**	**9,4**	**9,51**	**3,50**	**80**	**9,3**	**8,73**	**5,06**	**84**	**9,3**	**8,41**
MIN	**13**	**25**	**0,000**	**6,8**		**0,14**	**24**	**6,3**	**1,21**	**0,10**	**20**	**6,2**	**0,15**	**0,11**	**22**	**6,0**	**0,05**	**0,10**	**17**	**6,0**	**0,24**	**0,13**	**21**	**6,2**	**0,40**
PROM	**97**	**49**	**0,17**	**15,7**		**0,71**	**44**	**7,7**	**2,37**	**0,75**	**43**	**7,6**	**2,33**	**0,81**	**42**	**7,5**	**2,20**	**0,41**	**41**	**7,6**	**2,20**	**0,72**	**42**	**7,6**	**2,28**

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
080-INS-A-CA-CRU-PMB-00-A (Ex 03)

PLANTA MANUEL BELGRANO

Meses		Selenio µg/l	Cinc mg/l	Hierro mg/l	Manganeso mg/l	Aluminio mg/l	Sodio mg/l	Potasio mg/l	Cromo µg/l	Plomo µg/l	Cadmio µg/l	Niquel µg/l	Mercurio µg/l	Arsénico µg/l	Silicio mg/l
Enero	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*1,80*	*0,08*	*1,9*	*33,0*	*4,4*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<5*	*11*
Febrero	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*4,00*	*0,07*	*7,2*	*22,00*	*5,0*	*6,90*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Marzo	N° de muestras	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,15*	*5,00*	*0,09*	*6,5*	-	*5,2*	*6,4*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Abril	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*0,10*	*5,40*	*0,17*	*5,6*	*37,00*	*5,9*	*8*	*8,1*	*<0,1*	*5,3*	*<0,5*	*<5*	*20*
Mayo	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,08*	*7,50*	*0,12*	*14,0*	*64,0*	*10,7*	*11,0*	*6,2*	*<0,1*	-	*<0,5*	*5,5*	-
Junio	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,05*	*3,50*	*0,08*	*4,8*	*36,00*	*6,8*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Julio	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*0,05*	*4,70*	*0,09*	*8,0*	*37,0*	*6,8*	*6,0*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<5*	*18*
Agosto	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,37*	*1,60*	*0,05*	*2,3*	*55,00*	*7,7*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Septiembre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*2,90*	*0,12*	*3,1*	*48,0*	*6,3*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Octube	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*0,07*	*2,40*	*0,05*	*4,0*	*37,00*	*4,8*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<5*	*11*
Noviembre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,07*	*2,00*	*0,05*	*2,3*	*43,0*	*5,3*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Diciembre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,08*	*2,80*	*0,09*	*4,1*	*26,00*	*4,0*	*5,2*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<5*	-
Total año :															
N° de muestras general		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**	**4**	**12**	**12**	**4**
Promedio Anual		*<5*	*0,09*	*3,63*	*0,09*	*5,3*	*39,8*	*6,1*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<5*	*15*
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,09*	*1,76*	*0,04*	*3,38*	*12,19*	*1,82*	*2,80*	*1,78*	*0,00*	*1,40*	*0,00*	*0,87*	*4,69*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

	CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL	Informe de Niveles de Servicio
aysa		Año 2025
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	080-INS-A-CA-CRU-PMB-00-B (Ex 03)

PLANTA MANUEL BELGRANO

Meses		Color	Sustancias Fenólicas	Cobre	Conductividad (*)	Residuo Conduct. (*)	Alcalinidad Total	Oxidabilidad	Oxígeno Disuelto (*)	Cloruros	Nitratos	Sulfatos	Calcio	Magnesio	Dureza Total
		u.c.	µg/l	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Enero	N° de muestras	1	1	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*18*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	*67,2*	*2,3*	---	*32,5*	*3,9*	*23,1*	*11*	*4,4*	*45*
Febrero	N° de muestras	1	1	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*10*	*0,01*	*<0,05*	---	---	-	*1,9*	---	*19,6*	*3,9*	*16,1*	*10*	*4,3*	*44*
Marzo	N° de muestras	1	1	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*25*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	-	*3,3*	---	*17,5*	*3,0*	*16,8*	*10*	*4,2*	*43*
Abril	N° de muestras	1	1	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*19*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	*50,10*	*2,1*	---	*29,3*	*5,0*	*27,3*	*15*	*6,0*	*62*
Mayo	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*12*	-	*0,05*	---	---	-	*1,9*	---	*33,4*	*4,8*	*31,5*	*26*	*12,1*	*115*
Junio	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*35*	-	*<0,05*	---	---	-	*3,8*	---	*27,6*	*3,9*	*25,5*	*14*	*5,6*	*58*
Julio	N° de muestras	1	0	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*43*	-	*<0,05*	---	---	*52,3*	*3,3*	---	*25,4*	*3,6*	*22,0*	*14*	*5,9*	*58*
Agosto	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*21*	-	*<0,05*	---	---	-	*3,4*	---	*43,0*	*6,3*	*33,8*	*19*	*7,0*	*76*
Septiembre	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*26*	-	*<0,05*	---	---	-	*3,9*	---	*38,5*	*6,1*	*34,9*	*14*	*6,1*	*61*
Octube	N° de muestras	1	0	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	-	*<0,05*	---	---	*37,30*	*3,0*	---	*31,7*	*3,1*	*32,4*	*10*	*4,5*	*44*
Noviembre	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*8*	-	*<0,05*	---	---	-	*2,7*	---	*29,1*	*4,7*	*27,1*	*13*	*5,5*	*54*
Diciembre	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*76*	-	*<0,05*	---	---	-	*1,7*	---	*22,2*	*2,7*	*20,4*	*9*	*3,9*	*38*
Total año :															
N° de muestras general		**12**	**4**	**12**	**---**	**---**	**4**	**12**	**---**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Promedio Anual		25	*<0,01*	*<0,05*	---	---	*51,7*	*2,8*	---	*29,2*	*4,3*	*25,9*	*14*	*5,8*	*58*
Desvío Standard Anual		*19,80*	*0,00*	*0,01*	---	---	*12,25*	*0,78*	---	*7,43*	*1,16*	*6,42*	*4,75*	*2,20*	*20,89*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(*) Los parámetros Amonio, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Residuo Conductimétrico y UV 254 dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que las determinaciones de Amonio, Conductividad y Oxígeno Disuelto continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
080-INS-A-CA-CRU-PMB-00-C (Ex 03)

PLANTA MANUEL BELGRANO

Meses		Fluoruros mg/l	Nitritos mg/l	Amonio (*) mg/l	M.B.A.S. mg/l	Cloroformo (por Head Space) µg/l	Diclorobromo metano (por Head Space) µg/l	Dibromocloro metano (por Head Space) µg/l	Bromoformo (por Head Space) µg/l	Trihalo metanos (por Head Space) µg/l	DDT (Total Isómeros) µg/l	Clordano µg/l	Heptacloro µg/l	Heptacloro epóxido µg/l	ALFA HCH µg/l
Enero	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Promedio	<0,5	<0,01	---	<0,2	-	-	-	-	-	<1	<0,1	<0,04	<0,04	<0,04
Febrero	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	<0,5	<0,01	---	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	<0,5	<0,01	---	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	<0,5	<0,01	---	<0,2	<2	<2	<1	<1	<6	<1	<0,1	<0,04	<0,04	<0,04
Mayo	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	<0,5	0,10	---	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	<0,5	<0,01	---	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	<0,5	<0,01	---	<0,2	<2	<2	<1	<1	<6	<1	<0,1	<0,04	<0,04	<0,04
Agosto	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	<0,5	0,50	---	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	<0,5	0,36	---	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octube	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Promedio	<0,5	<0,01	---	<0,2	-	-	-	-	-	<1	<0,1	<0,04	<0,04	<0,04
Noviembre	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	<0,5	0,04	---	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	<0,5	<0,01	---	<0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total año :															
N° de muestras general		**12**	**12**	**---**	**12**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Promedio Anual		<0,5	*0,09*	---	*<0,2*	*<2*	*<2*	*<1*	*<1*	*<6*	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Desvío Standard Anual		0,00	0,17	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(*) Los parámetros Amonio, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Residuo Conductimétrico y UV 254 dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que las determinaciones de Amonio, Conductividad y Oxígeno Disuelto continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
080-INS-A-CA-CRU-PMB-00-D (Ex 03)

PLANTA MANUEL BELGRANO

Meses		Lindano µg/l	Metoxicloro µg/l	2,4D (**) µg/l	Aldrín µg/l	Dieldrín µg/l	Hexacloro benceno µg/l	Cloruro de Vinilo µg/l	1,1 Dicloroeteno µg/l	1,1,1 Tricloro etano µg/l	Tetracloruro de Carbono µg/l	1,2-Dicloro etano µg/l	Tricloro etileno µg/l	Tetracloroetano µg/l	Benceno µg/l
Enero	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	-	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,02*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Mayo	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,02*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Agosto	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octube	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total año :															
N° de muestras general		**4**	**4**	**---**	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Promedio Anual		<0,04	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,2*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,00*	---	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(**) El parámetro 2,4-D no pudo ser analizado debido a la falta de disponibilidad operativa de los equipos del Laboratorio Central, situación que fue oportunamente comunicada al ERAS mediante la Nota N° NO-2025-00000579-AYSA-DMA#AYSA.
Cabe señalar que este compuesto se encuentra alcanzado por las restricciones establecidas en el Convenio de Estocolmo, incorporado a la normativa nacional a través de la Ley 26.011 y la Resolución 451/2019, actualizada por la Resolución 291/2020, que regulan su uso, importación y exportación.
Asimismo, se destaca que AySA cuenta, desde el año 2013, con registros históricos trazables que evidencian la ausencia de detecciones de este compuesto en el área de concesión.

	CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL	Informe de Niveles de Servicio
aysa		Año 2025
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	080-INS-A-CA-CRU-PMB-00-E (Ex 03)

PLANTA MANUEL BELGRANO

Meses		Tolueno µg/l	Monocloro benceno µg/l	Etilbenceno µg/l	Estireno µg/l	1,4 Dicloro benceno µg/l	1,2 Dicloro benceno µg/l	Temperatura "in situ" ºC	DBO (líquido bruto) mg/l	Cianuros mg/l	Benzo[a] pireno µg/l	Hidrocarburos Totales mg/l	Bario mg/l	U.V. 254 (*) m-1
Enero	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	1	1	1	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*3,50*	*<0,05*	*<0,01*	*<0,4*	*<0,2*	---
Febrero	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Marzo	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Abril	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	---	1	1	0	1	1	---
	Promedio	*<5*	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	*<0,2*	---
Mayo	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*5,0*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Junio	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	0	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	-	-	---
Julio	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	---	1	1	1	1	1	---
	Promedio	*<5*	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*4,20*	*<0,05*	*<0,01*	*<0,4*	*<0,2*	---
Agosto	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*5,10*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Septiembre	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*6,80*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Octube	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	1	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	*<0,2*	---
Noviembre	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Diciembre	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*2,10*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Total año :														
N° de muestras general		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**---**	**12**	**12**	**2**	**11**	**4**	**---**
Promedio Anual		<5	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*2,7*	*<0,05*	*<0,01*	*<0,4*	*<0,2*	---
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	*2,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

(*) Los parámetros Amonio, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Residuo Conductimétrico y UV 254 dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que las determinaciones de Amonio, Conductividad y Oxígeno Disuelto continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

PLANTA MANUEL BELGRANO

VALORES MAXIMOS, MINIMOS Y PROMEDIOS DE AGUA CRUDA Y CONSUMO

NUMERO DE ANALISIS Y DETERMINACIONES

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

090-INS-A-CA-CRU-PMB-01 (Ex 58-61-64)

		AGUA CRUDA				SALIDA RIO SUBTERRANEO				SALIDA BERNAL IV				SALIDA BERNAL I				SALIDA PLANTA			
		Turb	Alcal.	Amonio	UV254	Turb	Alcal.	pH	Cloro L	Turb	Alcal.	pH	Cloro L	Turb	Alcal.	pH	Cloro L	Turb	Alcal.	pH	Cloro L
		UNT	mg/l	mg/l	1/m	UNT	mg/l	UpH	mg/l	UNT	mg/l	UpH	mg/l	UNT	mg/l	UpH	mg/l	UNT	mg/l	UpH	mg/l
ENERO	Determin.	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	369	369	369	369				
	MAX	120	83	2,77	15,7	1,62	69	8,7	3,20	0,88	76	8,7	2,80	1,54	72	8,9	2,70	1,57	70	8,7	3,12
	MIN	34	24	0,05	6,7	0,60	32	7,1	1,10	0,27	33	7,0	1,10	0,20	33	7,1	1,00	0,53	32	7,1	1,09
	PROM	64	45	0,25	11,6	0,86	45	7,8	1,97	0,50	46	7,9	1,79	0,56	46	7,9	1,69	0,80	45	7,8	1,93
FEBRERO	Determin.	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336				
	MAX	171	390	3,46	15,6	1,59	64	8,7	3,60	1,03	66	8,7	3,20	1,16	68	8,6	3,30	1,50	65	8,7	3,54
	MIN	35	33	0,05	6,6	0,61	29	7,2	1,20	0,38	31	7,0	0,60	0,26	32	7,0	0,70	0,55	29	7,2	1,10
	PROM	87	48	0,26	10,5	0,95	45	7,7	2,02	0,62	46	7,8	1,89	0,60	46	7,9	1,80	0,89	45	7,7	1,99
MARZO	Determin.	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372				
	MAX	182	95	3,04	22,0	2,20	80	8,2	4,90	2,14	79	8,4	5,40	1,60	80	8,4	4,90	2,12	80	8,2	4,93
	MIN	35	30	0,05	9,0	0,58	37	7,0	0,60	0,26	37	7,0	0,90	0,24	38	7,0	0,70	0,52	37	7,0	0,63
	PROM	82	59	0,25	15,4	1,00	53	7,6	1,94	0,75	53	7,6	1,86	0,60	53	7,6	1,81	0,94	53	7,6	1,92
ABRIL	Determin.	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360				
	MAX	288	110	2,53	17,0	2,18	99	8,8	3,10	1,65	98	8,8	3,70	1,13	99	8,2	3,40	2,02	99	8,7	3,17
	MIN	45	44	0,05	6,5	0,58	44	6,8	1,20	0,30	40	6,9	1,10	0,27	37	6,9	1,00	0,53	43	6,8	1,17
	PROM	127	67	0,35	9,6	0,99	63	7,5	2,06	0,70	64	7,7	2,04	0,56	64	7,7	1,89	0,92	63	7,5	2,04
MAYO	Determin.	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372				
	MAX	207	138	3,44	22,3	2,57	119	8,4	5,60	2,00	120	8,1	4,70	3,57	119	8,1	3,50	2,66	119	8,3	5,29
	MIN	20	50	0,05	7,0	0,71	45	6,7	0,20	0,39	45	6,8	0,20	0,22	45	6,8	0,80	0,63	45	6,7	0,27
	PROM	97	73	0,55	12,1	1,10	67	7,4	2,08	0,79	67	7,5	1,99	0,64	67	7,5	1,84	1,03	67	7,4	2,05
JUNIO	Determin.	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357				
	MAX	199	110	3,16	26,6	4,53	76	8,6	3,80	2,72	74	8,1	3,90	2,99	74	8,1	4,20	4,24	76	8,5	3,85
	MIN	45	38	0,05	19,5	0,96	35	6,7	0,20	0,42	35	6,7	1,10	0,30	33	6,8	1,20	0,85	35	6,7	0,37
	PROM	83	64	0,33	23,4	1,44	58	7,5	2,07	0,73	57	7,5	1,92	0,78	58	7,6	1,88	1,32	58	7,5	2,04
JULIO	Determin.	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372				
	MAX	177	101	2,84	27,7	2,82	110	8,3	4,10	1,55	112	8,6	3,30	3,08	116	8,4	4,60	2,78	111	8,3	4,11
	MIN	41	37	0,05	15,3	0,93	35	7,0	0,90	0,45	34	7,1	0,70	0,46	33	7,1	0,80	0,84	35	7,0	0,88
	PROM	75	55	0,28	20,5	1,31	53	7,6	2,00	0,66	53	7,7	1,82	0,81	52	7,7	2,06	1,21	53	7,6	2,00
AGOSTO	Determin.	369	369	369	369	370	370	370	370	369	369	369	369	369	369	369	369				
	MAX	140	120	3,20	27,6	5,51	106	8,4	4,90	1,73	100	8,6	5,00	2,83	112	8,3	4,90	4,96	106	8,4	4,91
	MIN	28	36	0,05	11,8	0,70	37	6,6	1,00	0,40	41	6,8	0,40	0,40	40	6,8	0,20	0,65	38	6,6	0,87
	PROM	59	63	0,49	18,4	1,06	61	7,6	2,04	0,70	61	7,5	1,89	0,76	60	7,5	2,07	1,00	61	7,6	2,03
SEPTIEMBRE	Determin.	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357				
	MAX	180	128	2,46	19,9	2,46	123	8,6	5,00	1,46	119	8,1	5,00	1,21	128	8,1	4,90	2,25	123	8,5	4,99
	MIN	32	42	0,05	11,4	0,75	49	7,1	0,10	0,50	47	6,9	0,20	0,29	47	6,9	0,10	0,68	49	7,1	0,11
	PROM	72	75	0,61	16,6	1,15	69	7,6	2,25	0,74	69	7,5	1,88	0,60	69	7,4	2,06	1,06	69	7,6	2,21
OCTUBRE	Determin.	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372				
	MAX	123	115	2,50	16,8	2,00	86	8,6	3,40	1,31	82	8,8	3,10	1,25	91	8,5	4,00	1,87	86	8,6	3,45
	MIN	30	40	0,05	10,1	0,71	41	7,0	1,00	0,38	39	7,0	0,60	0,24	39	7,0	0,80	0,63	41	7,0	0,95
	PROM	59	60	0,45	13,4	1,08	58	7,7	2,04	0,72	58	7,7	1,77	0,51	57	7,6	2,01	0,99	58	7,7	2,02
NOVIEMBRE	Determin.	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360				
	MAX	134	90	1,88	17,7	2,07	80	8,7	3,30	1,48	76	8,4	3,40	1,33	80	8,5	4,70	1,95	80	8,7	3,47
	MIN	37	41	0,05	9,5	0,67	41	7,2	0,90	0,41	40	6,9	1,00	0,31	40	6,9	0,90	0,61	41	7,1	0,91
	PROM	63	55	0,25	13,6	1,07	52	7,8	1,97	0,86	52	7,7	1,79	0,62	52	7,6	2,04	1,00	52	7,8	1,97
DICIEMBRE	Determin.	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370				
	MAX	121	75	0,95	15,6	2,79	65	8,6	3,20	3,10	71	8,6	3,00	2,36	70	8,5	3,70	2,76	66	8,6	3,25
	MIN	34	32	0,05	10,1	0,42	27	6,8	1,00	0,43	32	6,7	0,90	0,26	32	6,7	0,90	0,40	28	6,8	0,98
	PROM	56	49	0,19	12,7	0,94	47	7,7	1,89	0,87	48	7,8	1,91	0,67	48	7,7	2,07	0,90	47	7,7	1,91
ANUAL	**Determin.**	**4369**	**4369**	**4369**	**4369**	**4370**	**4370**	**4370**	**4370**	**4369**	**4369**	**4369**	**4369**	**4366**	**4366**	**4366**	**4366**				
	MAX	**288**	**390**	**3,46**	**27,7**	**5,51**	**123**	**8,8**	**5,60**	**3,10**	**120**	**8,8**	**5,40**	**3,57**	**128**	**8,9**	**4,90**	**5,13**	**123**	**8,8**	**5,50**
	MIN	**20**	**24**	**0,05**	**6,5**	**0,42**	**27**	**6,6**	**0,10**	**0,26**	**31**	**6,7**	**0,20**	**0,20**	**32**	**6,7**	**0,10**	**0,38**	**28**	**6,6**	**0,11**
	PROM	**77**	**59**	**0,35**	**14,8**	**1,08**	**56**	**7,6**	**2,03**	**0,72**	**56**	**7,7**	**1,88**	**0,64**	**56**	**7,6**	**1,94**	**1,01**	**56**	**7,6**	**2,01**

Nota: Los datos provienen de Laboratorio de Planta

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

120-INS-A-CA-CRU-PJMR-00-A

PLANTA JUAN MANUEL DE ROSAS

Meses		Selenio µg/l	Cinc mg/l	Hierro mg/l	Manganeso mg/l	Aluminio mg/l	Sodio mg/l	Potasio mg/l	Cromo µg/l	Plomo µg/l	Cadmio µg/l	Niquel µg/l	Mercurio µg/l	Arsénico µg/l	Silicio mg/l
Enero	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*1,9*	*0,05*	*1,3*	*15*	*2,8*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<0,5*	*6*
Febrero	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*5,2*	*0,11*	*6,2*	*14*	*4,6*	*5,80*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<0,5*	-
Marzo	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,05*	*11,0*	*0,21*	*21,0*	*27*	*9,9*	*16,00*	*9,20*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<0,5*	-
Abril	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*2,5*	*0,06*	*2,3*	*24*	*3,9*	*<5*	*5,10*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<0,5*	*9*
Mayo	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*3,2*	*0,06*	*3,9*	*32*	*4,7*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<0,5*	-
Junio	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,06*	*4,5*	*0,07*	*7,1*	*26*	*5,8*	*5,20*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<0,5*	-
Julio	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*0,09*	*2,1*	*0,04*	*2,6*	*27*	*5,0*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<0,5*	*10*
Agosto	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,05*	*2,9*	*0,05*	*7,1*	*28*	*5,2*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<0,5*	-
Septiembre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*<0,05*	*3,8*	*0,08*	*4,9*	*26*	*5,1*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<0,5*	-
Octubre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*0,06*	*2,8*	*0,07*	*3,8*	*55*	*6,6*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<0,5*	*17*
Noviembre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,05*	*2,0*	*0,05*	*2,0*	*25*	*3,9*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<0,5*	-
Diciembre	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	Promedio	*<5*	*0,20*	*3,3*	*0,06*	*5,1*	*29*	*4,2*	*<5*	*<5*	*<0,1*	-	*<0,5*	*<0,5*	-
Total año :															
N° de muestras general		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**4**	**12**	**12**	**4**
Promedio Anual		*<5*	*0,06*	*3,8*	*0,08*	*5,6*	*27*	*5,1*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<5*	*<0,5*	*<0,5*	*10,3*
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,05*	*2,49*	*0,05*	*5,22*	*10,18*	*1,79*	*3,92*	*2,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,87*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

120-INS-A-CA-CRU-PJMR-00-B

PLANTA JUAN MANUEL DE ROSAS

Meses		Color	Sustancias Fenólicas	Cobre	Conductividad (*)	Residuo Conduct. (*)	Alcalinidad Total	Oxidabilidad	Oxígeno Disuelto (*)	Cloruros	Nitratos	Sulfatos	Calcio	Magnesio	Dureza Total
		u.c.	µg/l	mg/l	µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Enero	N° de muestras	1	1	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*26*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	*32,6*	*2,0*	---	*15,1*	*2,4*	*13,7*	*7,2*	*2,8*	*29*
Febrero	N° de muestras	1	1	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	-	*1,9*	---	*14,7*	*2,9*	*15,4*	*8,2*	*4,2*	*38*
Marzo	N° de muestras	1	1	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*9*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	-	*1,7*	---	*20,4*	*2,9*	*23,4*	*13,3*	*6,5*	*60*
Abril	N° de muestras	1	1	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*45*	*<0,01*	*<0,05*	---	---	*52,80*	*2,1*	---	*25,8*	*3,2*	*31,6*	*11,5*	*4,1*	*46*
Mayo	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*21*	-	*<0,05*	---	---	-	*2,0*	---	*25,1*	*2,5*	*27,5*	*12,7*	*5,1*	*53*
Junio	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*38*	-	*<0,05*	---	---	-	*3,4*	---	*24,0*	*4,90*	*21,0*	*10,6*	*4,6*	*45*
Julio	N° de muestras	1	0	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*45*	-	*<0,05*	---	---	*43,6*	*2,4*	---	*20,7*	*2,1*	*20,8*	*10,4*	*4,4*	*44*
Agosto	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*71*	-	*<0,05*	---	---	-	*2,6*	---	*23,1*	*2,6*	*23,5*	*11,4*	*4,8*	*48*
Septiembre	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*21*	-	*<0,05*	---	---	-	*3,4*	---	*22,0*	*2,9*	*25,7*	*9,4*	*4,1*	*40*
Octube	N° de muestras	1	0	1	---	---	1	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	-	*<0,05*	---	---	*30,80*	*3,1*	---	*27,3*	*2,20*	*31,7*	*14,9*	*7,0*	*66*
Noviembre	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<5*	-	*<0,05*	---	---	-	*3,5*	---	*17,5*	*1,0*	*20,3*	*7,6*	*3,5*	*34*
Diciembre	N° de muestras	1	0	1	---	---	0	1	---	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*13*	-	*<0,05*	---	---	-	*2,3*	---	*20,1*	*3,10*	*20,7*	*8,0*	*4,1*	*37*
Total año :															
N° de muestras general		**12**	**4**	**12**	**---**	**---**	**4**	**12**	**---**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Promedio Anual		25	*<0,01*	*<0,05*	---	---	*40,0*	*2,5*	---	*21,3*	*2,7*	*22,9*	*10,4*	*4,6*	*45*
Desvío Standard Anual		*21,40*	*0,00*	*0,00*	---	---	*10,27*	*0,65*	---	*4,05*	*0,90*	*5,59*	*2,45*	*1,17*	*10,69*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(*) Los parámetros Amonio, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Residuo Conductimétrico y UV 254 dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que las determinaciones de Amonio, Conductividad y Oxígeno Disuelto continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

120-INS-A-CA-CRU-PJMR-00-C

PLANTA JUAN MANUEL DE ROSAS

Meses		Fluoruros mg/l	Nitritos mg/l	Amonio (*) mg/l	M.B.A.S. mg/l	Cloroformo (por Head Space) µg/l	Diclorobromo metano (por Head Space) µg/l	Dibromocloro metano (por Head Space) µg/l	Bromoformo (por Head Space) µg/l	Trihalo metanos (por Head Space) µg/l	DDT (Total Isómeros) µg/l	Clordano µg/l	Heptacloro µg/l	Heptacloro epóxido µg/l	ALFA HCH µg/l
Enero	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Febrero	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	*<2*	*<2*	*<1*	*<1*	*<6*	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Mayo	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	*<2*	*<2*	*<1*	*<1*	*<6*	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Agosto	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*0,04*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octube	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Noviembre	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	N° de muestras	1	1	---	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,5*	*<0,01*	---	*<0,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total año :															
N° de muestras general		**12**	**12**	**---**	**12**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Promedio Anual		<0,5	*<0,01*	---	*<0,2*	*<2*	*<2*	*<1*	*<1*	*<6*	*<1*	*<0,1*	*<0,04*	*<0,04*	*<0,04*
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,01*	---	*0,00*	*0,0*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(*) Los parámetros Amonio, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Residuo Conductimétrico y UV 254 dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que las determinaciones de Amonio, Conductividad y Oxígeno Disuelto continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

120-INS-A-CA-CRU-PJMR-00-D

PLANTA JUAN MANUEL DE ROSAS

Meses		Lindano µg/l	Metoxicloro µg/l	2,4D (**) µg/l	Aldrín µg/l	Dieldrín µg/l	Hexacloro benceno µg/l	Cloruro de Vinilo µg/l	1,1 Dicloro eteno µg/l	1,1,1 Tricloro etano µg/l	Tetracloruro de Carbono µg/l	1,2-Dicloro etano µg/l	Tricloro etileno µg/l	Tetracloroetano µg/l	Benceno µg/l
Enero	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	-	-	-	-	-	-	-	-
Febrero	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marzo	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,02*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Mayo	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julio	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,02*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Agosto	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octube	N° de muestras	1	1	---	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	*<0,04*	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	N° de muestras	0	0	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio	-	-	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total año :															
N° de muestras general		**4**	**4**	**---**	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Promedio Anual		<0,04	*<5*	---	*<0,01*	*<0,01*	*<0,01*	*<2*	*<0,2*	*<0,5*	*<0,5*	*<1*	*<0,5*	*<0,5*	*<2,5*
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,00*	---	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(**) El parámetro 2,4-D no pudo ser analizado debido a la falta de disponibilidad operativa de los equipos del Laboratorio Central, situación que fue oportunamente comunicada al ERAS mediante la Nota N° NO-2025-00000579-AYSA-DMA#AYSA.
Cabe señalar que este compuesto se encuentra alcanzado por las restricciones establecidas en el Convenio de Estocolmo, incorporado a la normativa nacional a través de la Ley 26.011 y la Resolución 451/2019, actualizada por la Resolución 291/2020, que regulan su uso, importación y exportación.
Asimismo, se destaca que AySA cuenta, desde el año 2013, con registros históricos trazables que evidencian la ausencia de detecciones de este compuesto en el área de concesión.

	CALIDAD DE AGUA CRUDA SUPERFICIAL	Informe de Niveles de Servicio
aysa		Año 2025
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	120-INS-A-CA-CRU-PJMR-00-E

PLANTA JUAN MANUEL DE ROSAS

Meses		Tolueno	Monocloro benceno	Etilbenceno	Estireno	1,4 Dicloro benceno	1,2 Dicloro benceno	Temperatura "in situ"	DBO (líquido bruto)	Cianuros	Benzo[a] pireno	Hidrocarburos Totales	Bario	U.V. 254 (*)
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	ºC	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	m-1
Enero	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	1	1	1	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	*<0,01*	*<0,4*	*<0,2*	---
Febrero	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Marzo	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*4,00*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Abril	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	---	1	1	0	1	1	---
	Promedio	*<5*	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	*<0,2*	---
Mayo	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*2,20*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Junio	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Julio	N° de muestras	1	1	1	1	1	1	---	1	1	1	1	1	---
	Promedio	*<5*	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*2,90*	*<0,05*	*<0,01*	*<0,4*	*<0,2*	---
Agosto	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Septiembre	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Octube	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	1	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	*<0,2*	---
Noviembre	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Diciembre	N° de muestras	0	0	0	0	0	0	---	1	1	0	1	0	---
	Promedio	-	-	-	-	-	-	---	*<2*	*<0,05*	-	*<0,4*	-	---
Total año :														
N° de muestras general		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**---**	**12**	**12**	**2**	**12**	**4**	**---**
Promedio Anual		<5	*<2,5*	*<5*	*<5*	*<0,1*	*<0,3*	---	*<2*	*<0,05*	*<0,01*	*<0,4*	*<0,2*	---
Desvío Standard Anual		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(*) Los parámetros Amonio, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Residuo Conductimétrico y UV 254 dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que las determinaciones de Amonio, Conductividad y Oxígeno Disuelto continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

PLANTA JUAN MANUEL de ROSAS

VALORES MAXIMOS, MINIMOS Y PROMEDIOS DE AGUA CRUDA Y CONSUMO

NUMERO DE ANALISIS Y DETERMINACIONES

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

130-INS-A-CA-CRU-PJMR-01

		AGUA CRUDA				SALIDA PLANTA			
		Turbiedad	**Alcalinidad**	**Amonio**	**UV254**	**Turbiedad**	**Alcalinidad**	**pH**	**Cloro Libre**
		UNT	mg/l	mg/l	1/m	UNT	mg/l	UpH	mg/l
	Determinaciones	**371**	**371**	**371**	**371**	**372**	**372**	**372**	**372**
	PROM	**90**	**32**	**0,05**	**8,7**	**0,41**	**31**	**8,1**	**1,54**
ENERO	MAX	**164**	**38**	**0,12**	**12,6**	**0,75**	**37**	**8,5**	**1,93**
	MIN	**44**	**29**	**0,01**	**5,0**	**0,20**	**28**	**7,6**	**1,25**
	Determinaciones	**334**	**334**	**334**	**334**	**336**	**336**	**336**	**336**
	PROM	**159**	**34**	**0,04**	**7,1**	**0,45**	**33**	**8,0**	**1,65**
FEBRERO	MAX	**226**	**43**	**0,17**	**10,2**	**1,70**	**42**	**8,4**	**1,93**
	MIN	**108**	**29**	**0,02**	**5,1**	**0,14**	**27**	**7,6**	**1,33**
	Determinaciones	**367**	**367**	**367**	**367**	**372**	**372**	**372**	**372**
	PROM	**172**	**42**	**0,05**	**10,2**	**0,29**	**39**	**7,9**	**1,62**
MARZO	MAX	**328**	**51**	**0,15**	**16,0**	**1,14**	**44**	**8,6**	**1,88**
	MIN	**93**	**37**	**0,02**	**6,4**	**0,12**	**30**	**7,6**	**1,30**
	Determinaciones	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**
	PROM	**239**	**46**	**0,04**	**8,1**	**0,30**	**42**	**7,9**	**1,55**
ABRIL	MAX	**360**	**52**	**0,09**	**11,2**	**0,84**	**48**	**8,4**	**2,86**
	MIN	**161**	**38**	**0,02**	**6,1**	**0,13**	**36**	**7,6**	**1,32**
	Determinaciones	**369**	**369**	**369**	**369**	**372**	**372**	**372**	**372**
	PROM	**181**	**46**	**0,08**	**13,5**	**0,39**	**42**	**7,9**	**1,58**
MAYO	MAX	**440**	**57**	**0,40**	**20,6**	**3,44**	**49**	**8,4**	**2,66**
	MIN	**107**	**32**	**0,01**	**6,2**	**0,16**	**31**	**7,5**	**1,26**
	Determinaciones	**356**	**356**	**356**	**356**	**360**	**360**	**360**	**360**
	PROM	**89**	**46**	**0,04**	**21,7**	**0,36**	**42**	**7,9**	**1,53**
JUNIO	MAX	**246**	**53**	**0,06**	**26,6**	**1,54**	**48**	**8,3**	**1,96**
	MIN	**47**	**41**	**0,01**	**16,3**	**0,17**	**36**	**6,5**	**1,20**
	Determinaciones	**370**	**370**	**370**	**370**	**371**	**371**	**371**	**371**
	PROM	**55**	**42**	**0,05**	**21,8**	**0,42**	**39**	**8,0**	**1,53**
JULIO	MAX	**95**	**53**	**0,28**	**25,7**	**1,56**	**47**	**8,5**	**2,30**
	MIN	**35**	**36**	**0,01**	**15,8**	**0,17**	**32**	**7,4**	**1,28**
	Determinaciones	**365**	**365**	**365**	**365**	**372**	**372**	**372**	**372**
	PROM	**57**	**44**	**0,05**	**18,9**	**0,44**	**41**	**7,9**	**1,55**
AGOSTO	MAX	**106**	**55**	**0,14**	**23,6**	**2,50**	**49**	**8,5**	**2,22**
	MIN	**38**	**38**	**0,01**	**15,4**	**0,17**	**35**	**7,6**	**1,27**
	Determinaciones	**358**	**358**	**358**	**358**	**360**	**360**	**360**	**360**
	PROM	**52**	**49**	**0,04**	**16,4**	**0,44**	**44**	**7,9**	**1,55**
SEPTIEMBRE	MAX	**103**	**58**	**0,09**	**21,2**	**1,29**	**52**	**8,4**	**1,86**
	MIN	**25**	**41**	**0,01**	**12,0**	**0,20**	**38**	**7,4**	**1,30**
	Determinaciones	**372**	**372**	**372**	**372**	**372**	**372**	**372**	**372**
	PROM	**49**	**43**	**0,03**	**13,3**	**0,43**	**40**	**8,0**	**1,62**
OCTUBRE	MAX	**83**	**52**	**0,07**	**19,0**	**0,95**	**51**	**8,4**	**1,92**

PLANTA JUAN MANUEL de ROSAS

VALORES MAXIMOS, MINIMOS Y PROMEDIOS DE AGUA CRUDA Y CONSUMO

NUMERO DE ANALISIS Y DETERMINACIONES

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

130-INS-A-CA-CRU-PJMR-01

		AGUA CRUDA				SALIDA PLANTA			
		Turbiedad	**Alcalinidad**	**Amonio**	**UV254**	**Turbiedad**	**Alcalinidad**	**pH**	**Cloro Libre**
		UNT	mg/l	mg/l	1/m	UNT	mg/l	UpH	mg/l
	MIN	**31**	**34**	**0,01**	**8,8**	**0,18**	**34**	**7,3**	**1,33**
NOVIEMBRE	Determinaciones	**359**	**359**	**359**	**359**	**359**	**359**	**359**	**359**
	PROM	**56**	**40**	**0,03**	**12,3**	**0,41**	**37**	**8,0**	**1,59**
	MAX	**87**	**51**	**0,06**	**17,5**	**0,91**	**44**	**8,4**	**2,04**
	MIN	**37**	**31**	**0,01**	**8,0**	**0,18**	**29**	**7,7**	**1,29**
DICIEMBRE	Determinaciones	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**	**384**
	PROM	**56**	**36**	**0,04**	**10,8**	**0,48**	**32**	**7,9**	**1,56**
	MAX	**116**	**47**	**0,13**	**15,1**	**1,70**	**38**	**8,4**	**1,93**
	MIN	**32**	**28**	**0,01**	**5,4**	**0,16**	**23**	**6,4**	**1,21**
ANUAL	**Determin.**	**4362**	**4362**	**4362**	**4362**	**4387**	**4387**	**4387**	**4387**
	PROM	**105**	**42**	**0,05**	**13,6**	**0,40**	**39**	**7,9**	**1,57**
	MAX	**440**	**58**	**0,40**	**26,6**	**3,44**	**52**	**8,6**	**2,86**
	MIN	**25**	**28**	**0,01**	**5,0**	**0,12**	**23**	**6,4**	**1,20**

NOTAS:


Datos provienentes del Laboratorio de Planta.


Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:


Rango de "No detectad	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)


Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-


Para los casos donde el
100% de las muestras

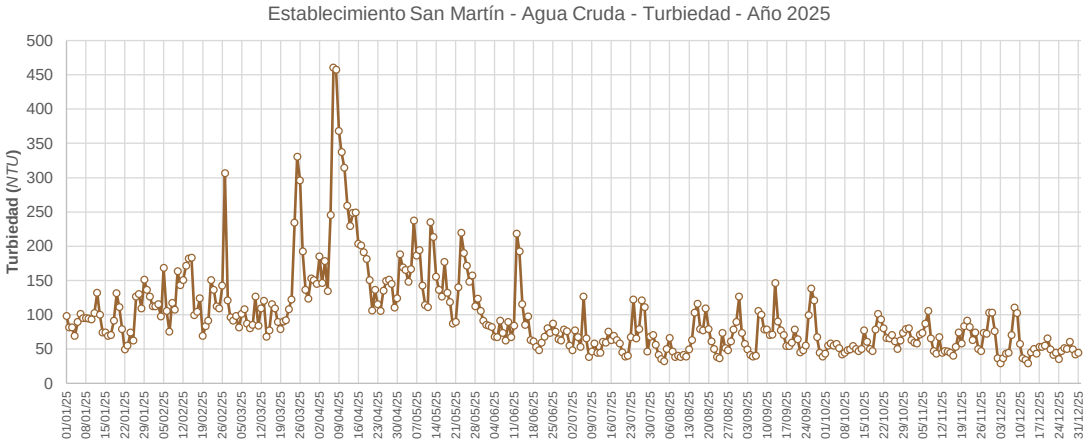

Establecimiento San Martín - Agua Cruda - Turbiedad - Año 2025
Turbiedad (NTU)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

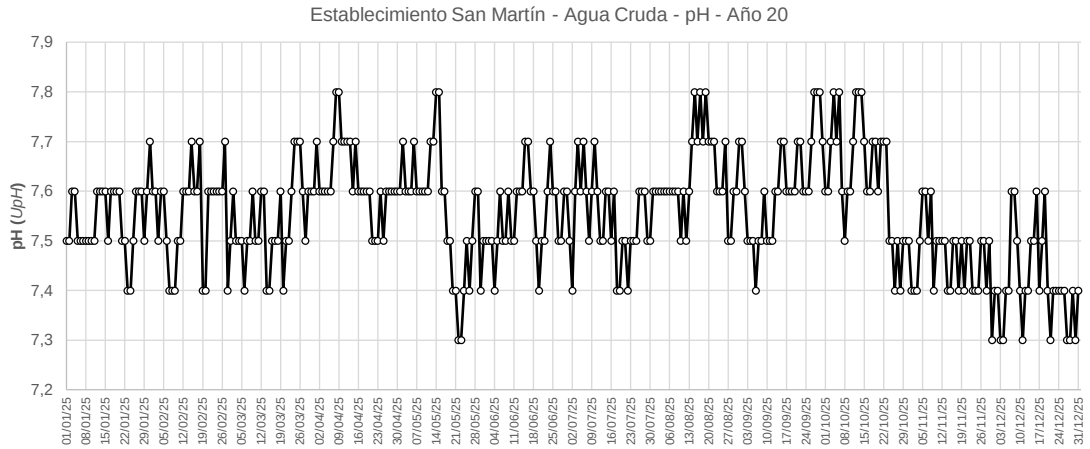

Establecimiento San Martín - Agua Cruda - pH - Año 20
pH (UpH)
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

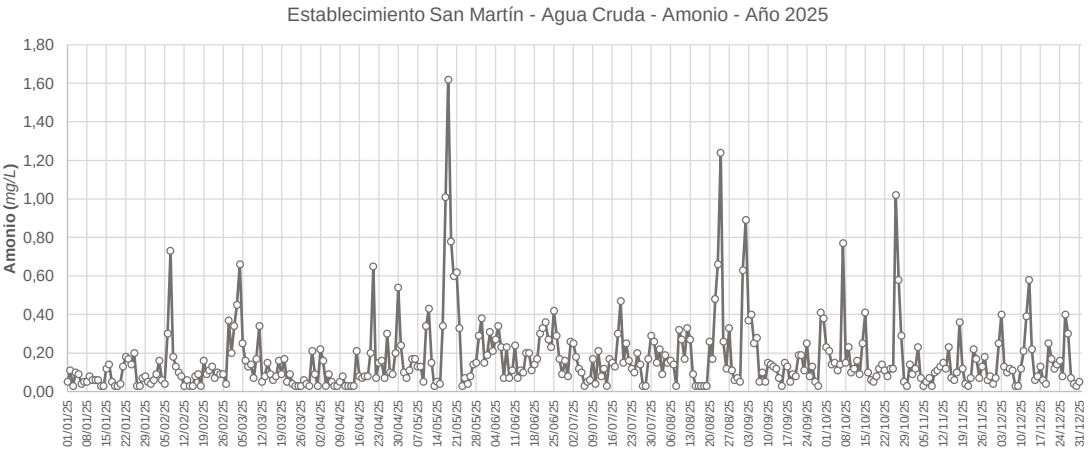

Establecimiento San Martín - Agua Cruda - Amonio - Año 2025
Amonio (mg/L)
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

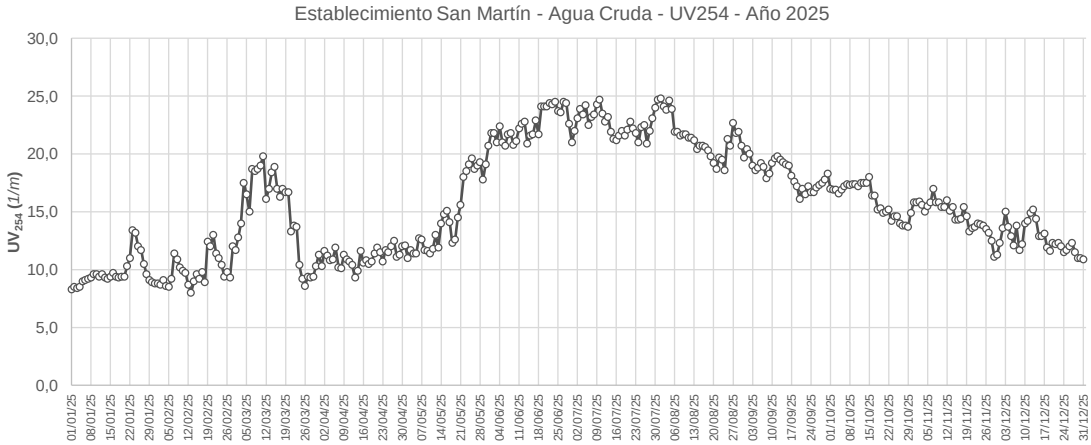

Establecimiento San Martín - Agua Cruda - UV254 - Año 2025
UV254 (1/m)
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

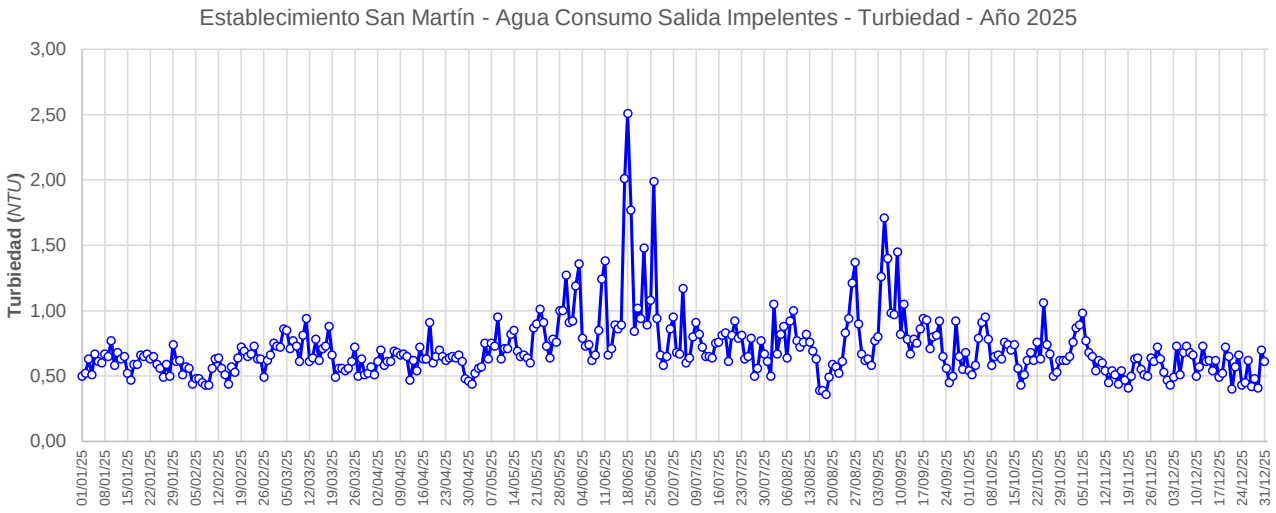

Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Impelentes - Turbiedad - Año 2025
Turbiedad (NTU)
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

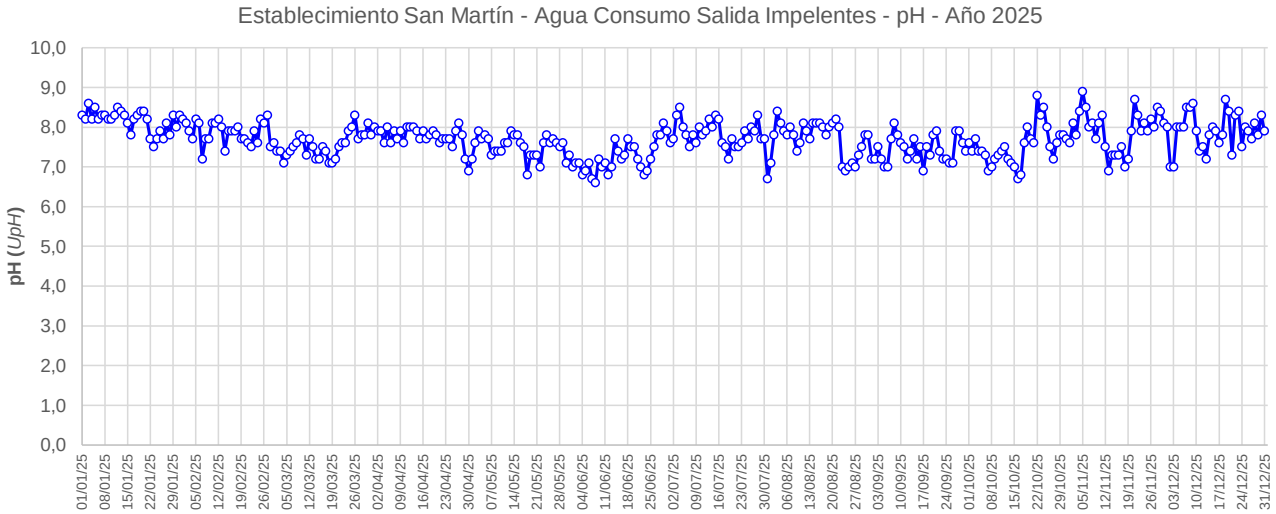

Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Impelentes - pH - Año 2025
pH (UpH)
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

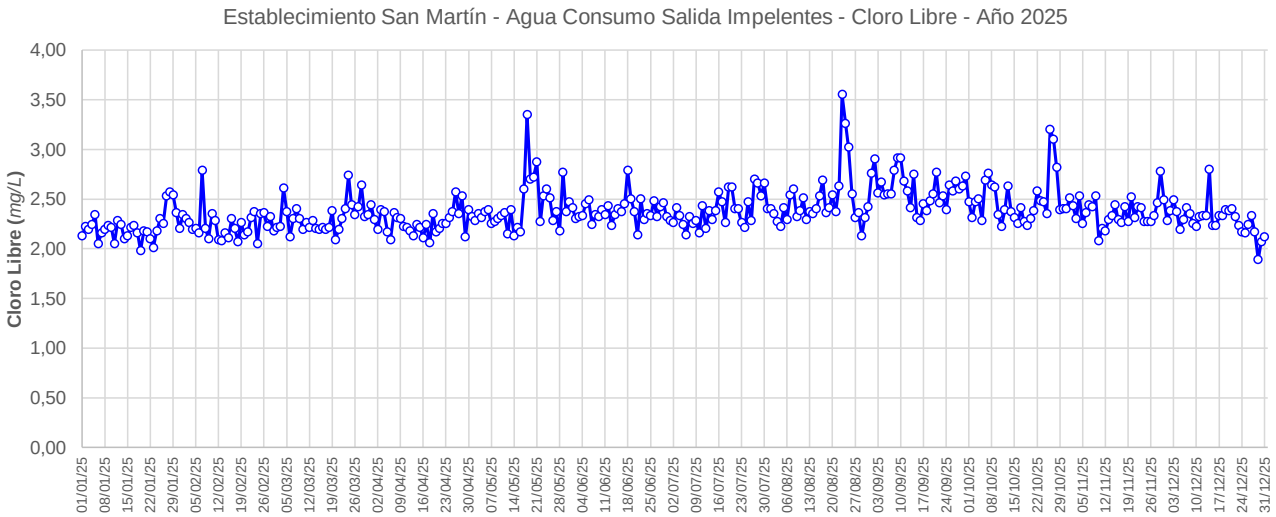

Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Impelentes - Cloro Libre - Año 2025
Cloro Libre (mg/L)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

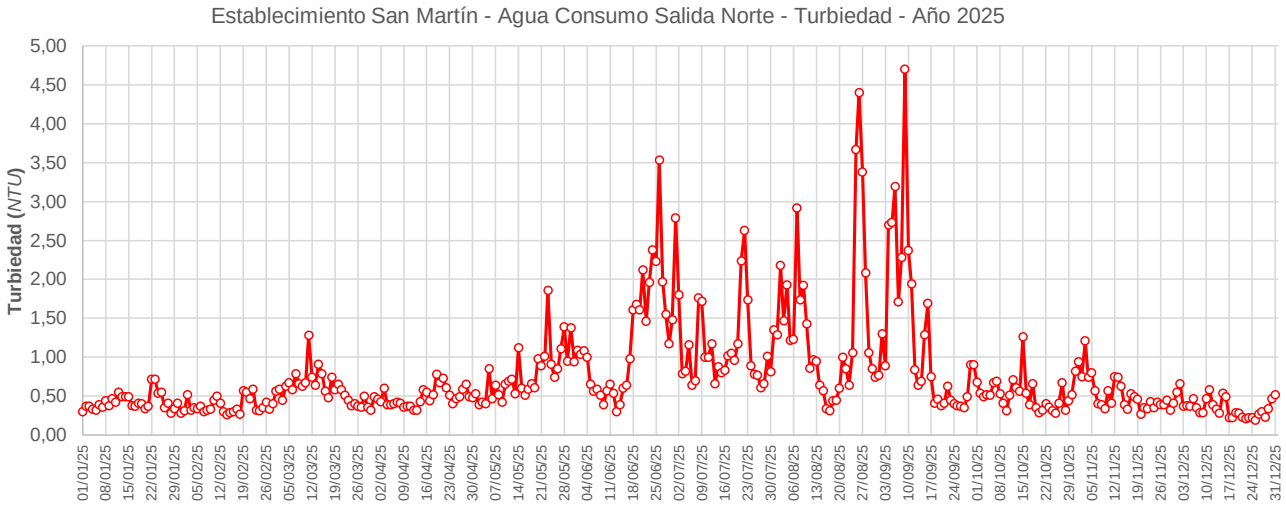

Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Norte - Turbiedad - Año 2025
Turbiedad (NTU)
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

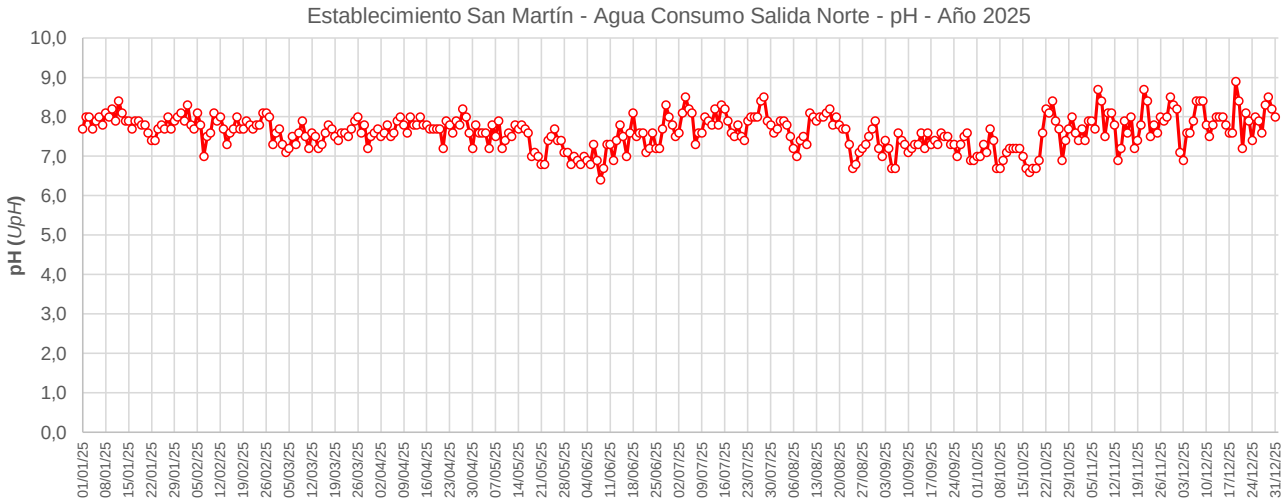

Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Norte - pH - Año 2025
pH (UpH)
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

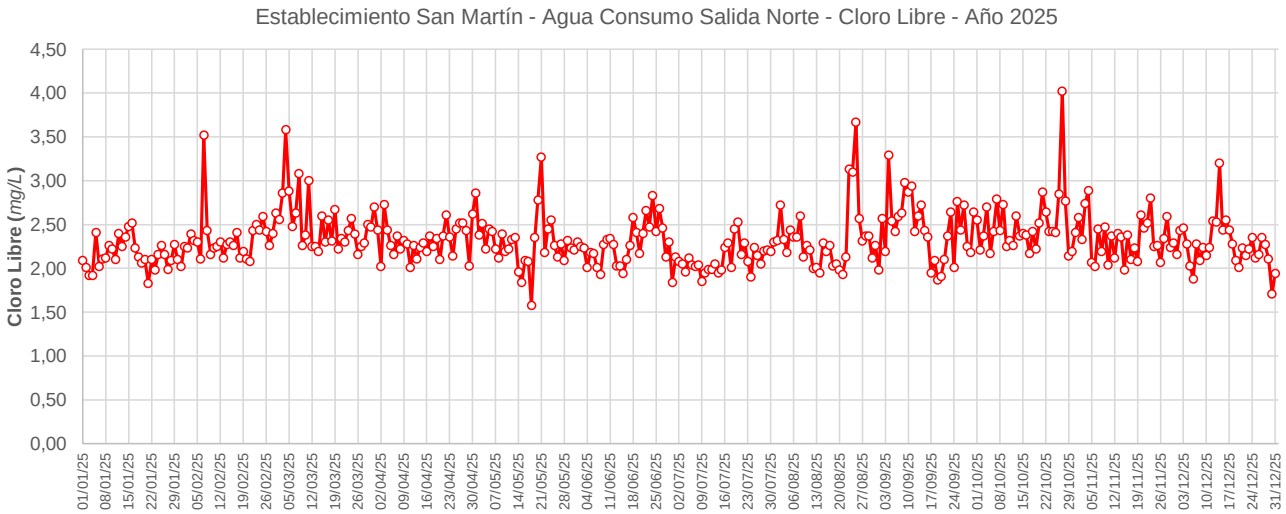

Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Norte - Cloro Libre - Año 2025
Cloro Libre (mg/L)
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

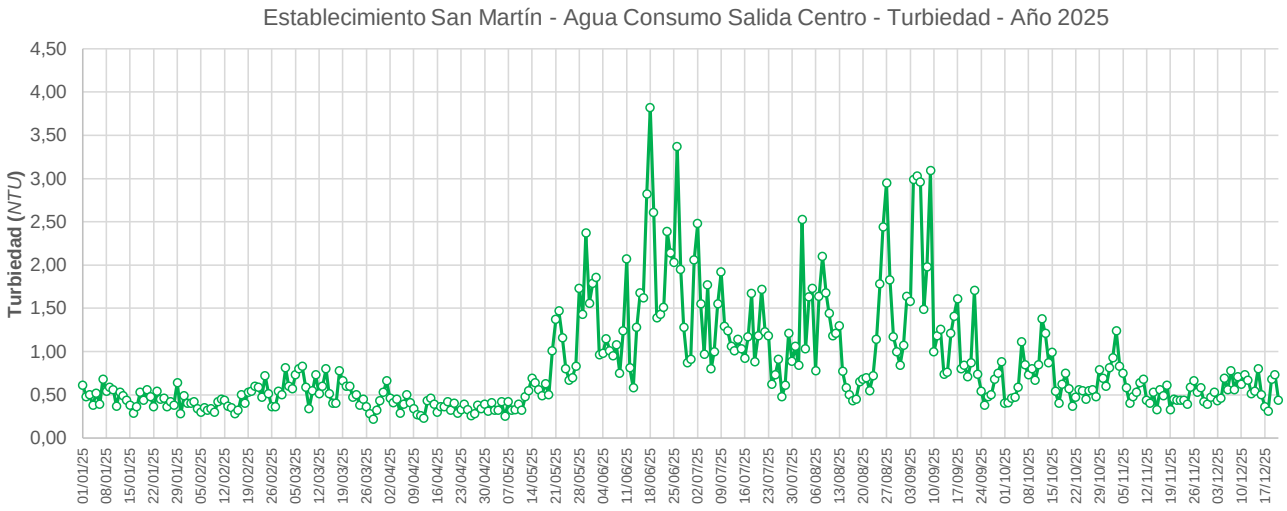

Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Centro - Turbiedad - Año 2025
Turbiedad (NTU)
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25

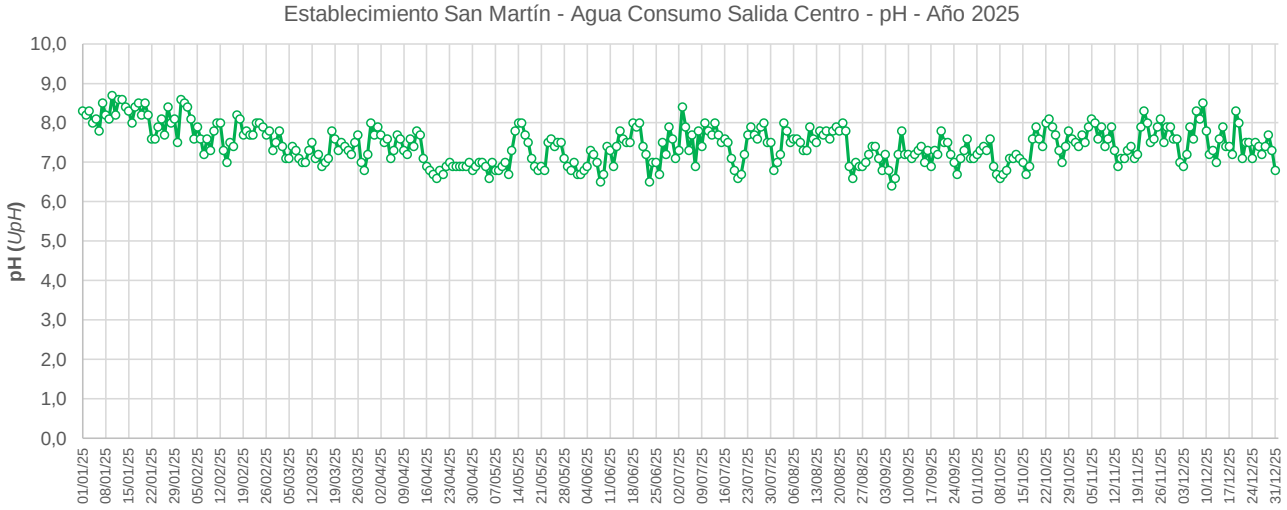
Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Centro - pH - Año 2025
pH (UpH)
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

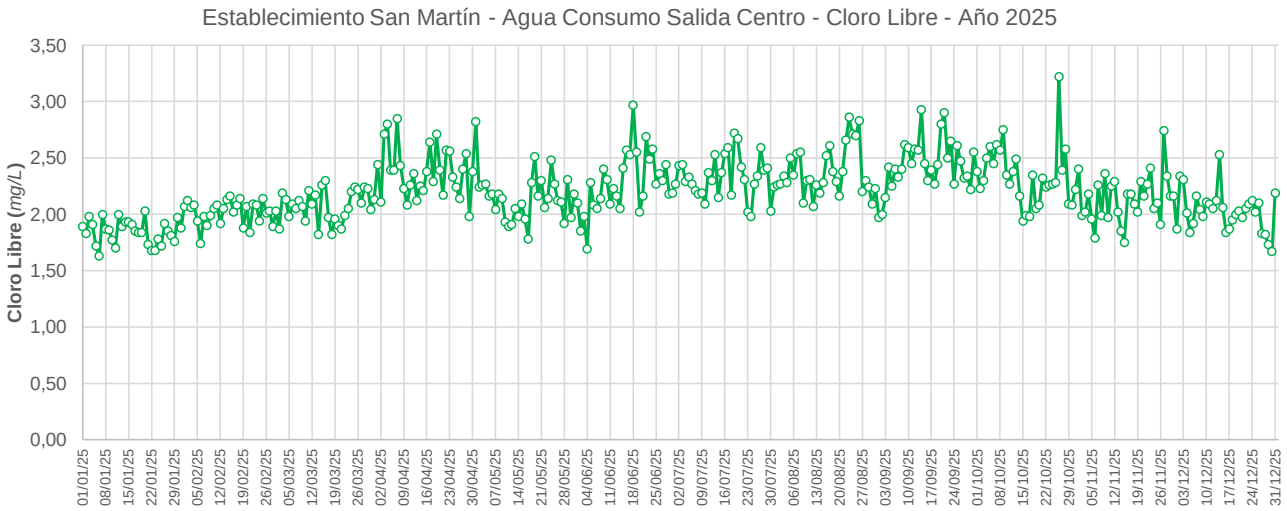
Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Centro - Cloro Libre - Año 2025
Cloro Libre (mg/L)
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

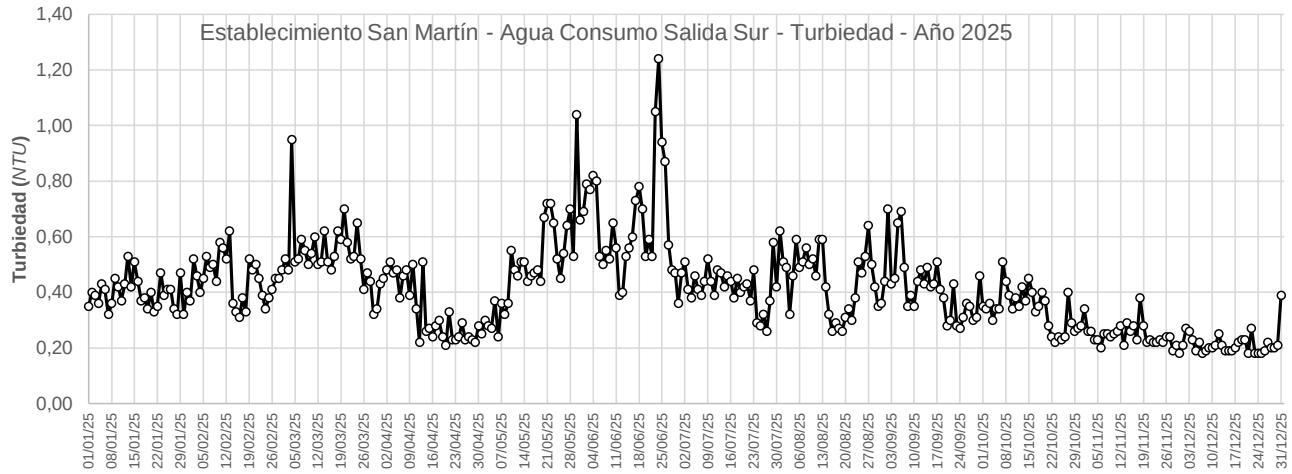
Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Sur - Turbiedad - Año 2025
Turbiedad (NTU)
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

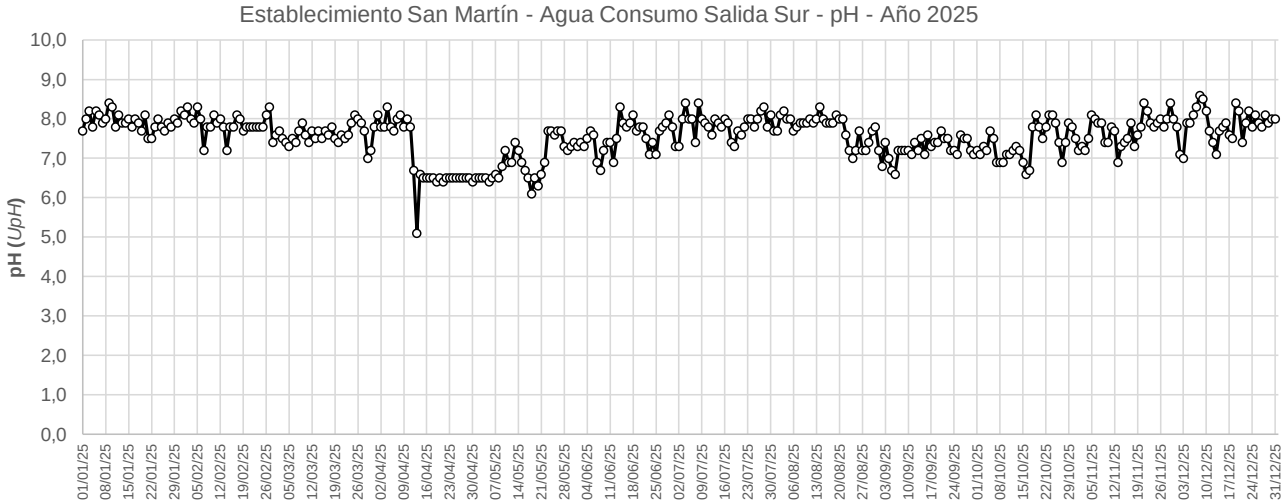
Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Sur - pH - Año 2025
pH (UpH)
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

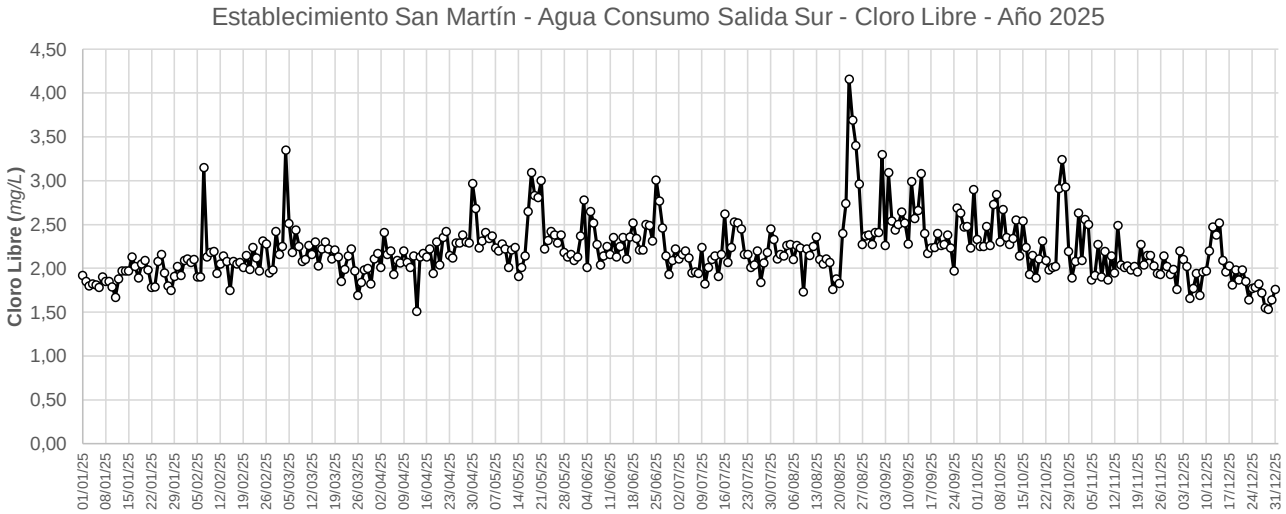
Establecimiento San Martín - Agua Consumo Salida Sur - Cloro Libre - Año 2025
Cloro Libre (mg/L)
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
01/01/25
08/01/25
15/01/25
22/01/25
29/01/25
05/02/25
12/02/25
19/02/25
26/02/25
05/03/25
12/03/25
19/03/25
26/03/25
02/04/25
09/04/25
16/04/25
23/04/25
30/04/25
07/05/25
14/05/25
21/05/25
28/05/25
04/06/25
11/06/25
18/06/25
25/06/25
02/07/25
09/07/25
16/07/25
23/07/25
30/07/25
06/08/25
13/08/25
20/08/25
27/08/25
03/09/25
10/09/25
17/09/25
24/09/25
01/10/25
08/10/25
15/10/25
22/10/25
29/10/25
05/11/25
12/11/25
19/11/25
26/11/25
03/12/25
10/12/25
17/12/25
24/12/25
31/12/25

Fecha	AGUA CRUDA				CONSUMO BERNAL 1			CONSUMO BERNAL 4			CONSUMO R.SUB.		
	pH	Turb.	NH4+	UV254	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.
	UpH	UNT	mg/l	(1/m)	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l
1/1/2025	7,3	64,75	0,43	9,9	7,6	0,384	2,2	7,8	0,36	2,3	7,9	0,876	2,4
2/1/2025	7,3	67,167	0,25	8,4	7,9	0,403	1,8	8,1	0,383	1,8	8	0,835	2
3/1/2025	7,4	57,7	0,31	9,3	7,8	0,442	1,8	7,9	0,404	1,9	7,7	0,885	2,1
4/1/2025	7,5	60,5	0,14	8,7	7,9	0,398	1,8	8,1	0,383	1,8	7,8	0,808	2,1
5/1/2025	7,4	52,833	0,17	9,1	8	0,453	1,9	8	0,394	2	7,8	0,793	2,2
6/1/2025	7,5	61,583	0,16	9,6	8	0,608	1,9	8	0,527	2	7,7	0,852	2,1
7/1/2025	7,5	64,917	0,18	10	7,9	0,578	1,7	8	0,516	1,8	7,9	0,88	1,9
8/1/2025	7,4	62,833	0,28	11,1	7,7	0,608	2	7,8	0,544	2,2	7,7	0,998	2,1
9/1/2025	7,5	69,75	0,13	11,2	7,7	0,551	1,7	7,9	0,478	1,8	7,8	0,833	2
10/1/2025	7,5	67,25	0,1	11	8,2	0,671	1,4	8,1	0,515	1,5	8	0,833	1,9
11/1/2025	7,5	71,667	0,11	11,8	7,8	0,489	1,4	7,7	0,415	1,5	7,8	0,862	1,6
12/1/2025	7,5	76	0,09	11,2	7,8	0,604	1,6	7,7	0,49	1,7	7,9	0,945	1,7
13/1/2025	7,5	71,917	0,12	11,8	7,7	0,7	1,6	7,6	0,592	1,7	7,7	0,972	1,8
14/1/2025	7,5	70	0,12	12	8	0,66	1,6	8	0,559	1,7	8	1,013	1,9
15/1/2025	7,5	69,5	0,11	12,2	7,9	0,519	1,7	7,7	0,529	1,8	7,7	0,964	2
16/1/2025	7,5	63,917	0,16	12,3	8,1	0,53	1,6	8,1	0,529	1,6	7,7	0,78	2,1
17/1/2025	7,5	59,75	0,17	12	7,9	0,522	1,7	7,9	0,504	1,8	7,7	0,786	2,2
18/1/2025	7,5	60,75	0,21	12,3	8,1	0,523	1,5	8,1	0,475	1,5	7,9	0,803	1,9
19/1/2025	7,6	63,5	0,15	11,7	8,2	0,539	1,6	8,1	0,442	1,7	8	0,766	1,9
20/1/2025	7,6	66,25	0,14	12,2	7,9	0,534	1,8	7,8	0,414	1,9	7,9	0,816	2,1
21/1/2025	7,6	60,75	0,24	12,3	8	0,578	1,6	7,9	0,428	1,9	7,9	0,893	2
22/1/2025	7,5	60,917	0,15	12	7,9	0,59	1,5	7,8	0,63	1,6	7,8	0,838	1,8
23/1/2025	7,5	58,167	0,4	11,6	7,8	0,513	1,6	7,7	0,438	1,7	7,8	0,763	2
24/1/2025	7,5	55,75	0,12	12,2	8	0,613	1,7	7,9	0,554	1,8	7,7	0,769	1,8
25/1/2025	7,3	48,583	1,19	12,5	7,8	0,71	1,8	7,8	0,628	1,9	7,8	0,908	2
26/1/2025	7,5	57	0,21	12,7	8	0,55	1,4	8,1	0,543	1,6	7,8	0,765	1,8
27/1/2025	7,5	58	0,41	13,9	7,8	0,498	1,6	7,8	0,473	1,7	7,7	0,753	2
28/1/2025	7,5	55,417	0,74	13,9	7,8	0,591	1,7	7,9	0,534	1,9	7,7	0,832	2
29/1/2025	7,5	67,083	0,21	13,5	7,6	0,525	1,6	7,5	0,428	1,7	7,7	0,95	1,8
30/1/2025	7,5	85	0,2	13,7	7,6	0,828	1,7	7,6	0,675	1,8	7,7	0,84	2,1
31/1/2025	7,4	76	0,26	13,1	7,7	0,666	1,9	7,6	0,621	2,1	7,7	0,897	2,1
1/2/2025	7,4	57,333	0,38	13,2	7,9	0,626	1,9	7,8	0,659	2,2	7,8	0,802	2,4
2/2/2025	7,4	70,25	0,25	11,7	7,8	0,805	1,8	7,8	0,805	2,1	7,7	0,853	1,9
3/2/2025	7,4	69,833	0,16	11,1	7,7	0,68	1,6	7,6	0,753	1,8	7,7	0,741	1,9
4/2/2025	7,5	66,25	0,38	10,8	7,9	0,756	1,9	7,8	0,766	2,1	7,7	0,778	2,3
5/2/2025	7,5	86,75	0,61	11,3	7,9	0,773	1,8	7,9	0,788	2	7,7	0,958	2,1
6/2/2025	7,5	67	0,65	10,8	7,6	0,688	2,2	7,8	0,575	2,1	7,6	0,873	2,3
7/2/2025	7,4	61,417	0,41	9,8	7,7	0,628	1,9	7,7	0,611	2,1	7,9	0,903	2,3
8/2/2025	7,6	81,25	0,19	10,1	7,8	0,509	1,9	8	0,579	2	8,3	0,924	2,2
9/2/2025	7,6	84,917	0,18	10,1	7,8	0,575	1,8	8	0,535	1,8	7,9	0,998	1,9
10/2/2025	7,5	79,75	0,41	10,5	7,6	0,717	1,8	7,6	0,661	2	7,5	1,071	2
11/2/2025	7,5	83,583	0,22	10,2	7,6	0,736	2,1	7,7	0,77	2,1	7,6	1,035	2,1
12/2/2025	7,5	136,417	0,09	8,9	8	0,643	1,5	8,1	0,746	1,6	7,8	1,067	1,8
13/2/2025	7,5	117,917	0,15	9,3	7,8	0,512	1,7	7,8	0,531	1,8	7,6	0,985	1,9
14/2/2025	7,5	100,75	0,12	10,1	8	0,598	2	8,1	0,611	2	7,7	0,968	2,1
15/2/2025	7,5	115,833	0,1	9,2	8,2	0,726	1,8	8,1	0,72	1,9	7,7	1,048	2,2
16/2/2025	7,4	112,167	0,15	9,9	7,8	0,508	1,7	7,7	0,603	1,7	7,7	0,99	2
17/2/2025	7,4	118,417	0,09	8,9	7,9	0,457	1,8	7,8	0,548	1,9	7,6	0,923	2,1
18/2/2025	7,3	105,5	0,21	9,1	8,1	0,473	1,9	7,9	0,527	2	7,8	0,961	2
19/2/2025	7,3	78,333	0,12	10,7	7,8	0,545	1,5	7,7	0,578	1,6	7,6	0,95	1,8

Fecha	AGUA CRUDA				CONSUMO BERNAL 1			CONSUMO BERNAL 4			CONSUMO R.SUB.		
	pH	Turb.	NH4+	UV254	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.
	UpH	UNT	mg/l	(1/m)	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l
20/2/2025	7,4	81,583	0,11	10,1	7,9	0,543	1,8	7,8	0,564	1,9	7,7	0,899	2
21/2/2025	7,4	81,75	0,1	9,8	8	0,474	1,7	7,9	0,538	1,8	7,8	0,902	1,9
22/2/2025	7,4	97,833	0,1	10,1	7,9	0,427	1,7	7,8	0,511	1,8	7,9	0,863	1,9
23/2/2025	7,4	81	0,17	12	8,2	0,598	1,7	8,1	0,598	1,8	8	0,901	1,9
24/2/2025	7,4	72,667	0,13	11,7	8	0,573	2	7,9	0,521	2	7,8	0,898	2
25/2/2025	7,5	74,083	0,13	11,1	7,9	0,429	1,8	7,8	0,473	1,9	7,8	0,862	2
26/2/2025	7,4	68,675	0,65	11	7,9	0,523	1,6	7,8	0,502	1,5	7,7	1,137	1,8
27/2/2025	7,4	111,083	0,47	11,1	7,8	0,565	1,7	7,7	0,554	1,8	7,6	1,08	2
28/2/2025	7,3	80,833	0,47	11,9	7,9	0,603	1,8	7,8	0,592	1,8	7,6	1,117	1,9
1/3/2025	7,4	103,75	0,2	11	7,9	0,503	2,3	7,9	0,666	2,3	7,8	1,081	2,4
2/3/2025	7,5	108,417	0,18	10,5	7,9	0,338	2	7,8	0,622	2,1	7,9	0,872	2,2
3/3/2025	7,4	90,25	0,72	11,3	7,9	0,463	2	7,8	0,743	2,1	7,7	0,929	2,2
4/3/2025	7,3	68,417	0,53	12	7,5	0,778	1,9	7,3	0,931	2,1	7,4	0,977	1,9
5/3/2025	7,3	69,25	0,49	13,8	7,7	0,763	2,1	7,6	0,891	2,2	7,4	1,035	2,3
6/3/2025	7,3	63,333	0,27	14,6	7,6	0,635	2	7,5	0,801	2,1	7,6	0,798	2
7/3/2025	7,3	63,417	0,16	14,9	7,5	0,78	1,6	7,6	0,806	1,6	7,4	1,013	2
8/3/2025	7,4	59,667	0,27	14,5	7,7	0,667	2	7,9	0,932	1,9	7,7	0,957	2
9/3/2025	7,3	61,583	0,79	13,7	7,7	0,605	2,5	7,8	0,844	2,5	7,7	0,98	2,2
10/3/2025	7,4	72,833	0,09	15,3	7,6	0,498	1,8	7,6	0,71	1,8	7,6	1,028	1,9
11/3/2025	7,4	65,083	0,12	18,5	7,4	0,53	1,9	7,3	0,81	1,9	7,5	1,186	2
12/3/2025	7,5	77,25	0,23	15,8	7,4	0,493	1,9	7,4	0,731	1,9	7,5	0,857	2,2
13/3/2025	7,5	93,75	0,07	16	7,7	0,666	1,6	7,8	0,743	1,6	7,8	1,004	1,8
14/3/2025	7,4	73,333	0,1	18,4	7,6	0,785	1,6	7,6	0,903	1,6	7,7	1,088	1,7
15/3/2025	7,4	61,583	0,13	20,5	7,4	0,539	1,8	7,4	0,699	1,8	7,5	0,813	1,8
16/3/2025	7,4	79	0,17	19,5	7,4	0,632	1,9	7,4	0,644	2	7,6	0,719	2
17/3/2025	7,4	68,583	0,23	19	7,5	0,775	1,5	7,6	1,038	1,5	7,7	1,095	1,7
18/3/2025	7,4	58	0,19	20,3	7,5	0,712	1,4	7,6	1,03	1,4	7,7	1,148	1,7
19/3/2025	7,4	58,333	0,22	20,8	7,6	0,634	1,5	7,8	0,777	1,5	7,7	1,091	1,7
20/3/2025	7,4	55,333	0,13	19	7,5	0,653	1,7	7,6	0,773	1,7	7,6	1,14	1,6
21/3/2025	7,4	55,917	0,13	17,3	7,6	0,573	1,6	7,7	0,627	1,7	7,8	0,968	1,8
22/3/2025	7,4	57,5	0,14	16,9	7,6	0,563	1,7	7,6	0,646	1,7	7,8	0,976	1,6
23/3/2025	7,5	73,917	0,14	18,1	7,6	0,524	1,5	7,6	0,647	1,5	7,8	0,923	1,6
24/3/2025	7,5	64,25	0,17	15,6	7,6	0,569	2	7,5	0,674	2	7,4	1,094	2,2
25/3/2025	7,4	64,583	0,24	15,4	7,6	0,583	1,7	7,6	0,598	1,8	7,4	1,068	1,8
26/3/2025	7,5	105,833	0,09	12,9	7,7	0,621	1,7	7,8	0,752	1,7	7,5	0,942	2
27/3/2025	7,5	117,583	0,29	13	7,6	0,695	1,7	7,6	0,772	1,8	7,5	1,148	1,9
28/3/2025	7,5	128,417	0,18	11,7	7,6	0,506	1,8	7,6	0,62	1,9	7,6	1,203	2
29/3/2025	7,5	149,833	0,16	11,7	7,6	0,581	1,9	7,7	0,66	2	7,8	1,141	2,4
30/3/2025	7,4	130,75	0,26	12,3	7,6	0,49	2	7,6	0,578	2,1	7,6	0,953	1,9
31/3/2025	7,5	133,25	0,66	11,4	7,6	0,585	1,6	7,6	0,681	1,8	7,5	1,051	2
1/4/2025	7,4	127,833	0,83	11,2	7,5	0,705	2	7,5	0,708	2,2	7,5	1,18	2,2
2/4/2025	7,5	112,5	0,13	10,7	7,6	0,382	1,9	7,7	0,521	2	7,6	0,943	2
3/4/2025	7,4	90,833	0,17	10,8	7,6	0,501	1,9	7,7	0,66	1,9	7,5	0,887	1,9
4/4/2025	7,4	107,417	0,8	9,6	7,4	0,767	1,9	7,4	0,973	2,2	7,2	1,151	1,9
5/4/2025	7,4	92,5	0,18	9,3	7,7	0,482	1,7	7,8	0,728	2	7,6	1,123	1,9
6/4/2025	7,5	138,5	0,24	9,4	8	0,423	1,5	7,9	0,65	1,7	7,6	0,923	1,8
7/4/2025	7,5	169,917	0,18	9,9	7,8	0,549	2	7,7	0,773	2,1	7,5	1,043	2,1
8/4/2025	7,5	174,417	0,25	10,1	7,7	0,559	2,1	7,6	0,823	2,2	7,5	1,058	2,2

Fecha	AGUA CRUDA				CONSUMO BERNAL 1			CONSUMO BERNAL 4			CONSUMO R.SUB.		
	pH	Turb.	NH4+	UV254	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.
	UpH	UNT	mg/l	(1/m)	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l
9/4/2025	7,5	167,25	0,23	10,2	7,7	0,522	2	7,6	0,696	2,2	7,3	0,97	2,2
10/4/2025	7,4	141,083	0,54	11,8	7,8	0,667	1,7	7,7	0,775	1,9	7,4	1,132	1,9
11/4/2025	7,5	160,167	0,38	11,1	7,8	0,632	1,8	7,8	0,877	2	7,5	0,971	2,1
12/4/2025	7,5	169,833	0,42	10,8	7,7	0,515	1,9	7,7	0,648	2	7,4	1,008	2
13/4/2025	7,5	159,75	0,32	9,8	7,7	0,428	1,9	7,7	0,591	2,1	7,5	0,998	2,2
14/4/2025	7,4	152	0,56	9,9	7,5	0,465	2,2	7,4	0,66	2,4	7,4	1,098	2,3
15/4/2025	7,5	190,417	0,08	9,1	7,8	0,463	1,8	7,9	0,535	1,9	7,5	1,028	2
16/4/2025	7,4	138,833	0,1	9,4	7,6	0,415	1,6	7,8	0,528	1,7	7,4	0,987	1,9
17/4/2025	7,5	158,833	0,07	8,8	7,6	0,465	1,7	7,9	0,629	1,7	7,6	0,978	2,1
18/4/2025	7,5	162,75	0,14	8,6	7,8	0,425	1,7	8,1	0,568	1,9	7,7	0,989	2
19/4/2025	7,5	126,333	0,48	10,3	7,7	0,503	1,9	7,9	0,534	2	7,5	0,949	2,1
20/4/2025	7,6	130,5	0,24	10,3	7,9	0,588	1,9	8	0,614	2	7,7	0,908	2,2
21/4/2025	7,4	97,25	0,76	9,2	7,4	0,731	1,9	7,5	0,677	2	7,4	0,948	1,9
22/4/2025	7,4	99	0,24	9	7,7	0,729	1,8	7,8	0,704	2,1	7,6	0,945	2
23/4/2025	7,5	96,75	0,12	8,7	7,8	0,764	1,7	7,9	0,779	1,8	7,7	0,954	2
24/4/2025	7,5	96,333	0,32	8,5	7,7	0,63	1,9	7,7	0,71	2	7,7	0,934	2,1
25/4/2025	7,5	97,417	0,21	8,5	7,9	0,701	1,9	7,9	0,803	2,1	7,7	0,952	2,1
26/4/2025	7,4	76,25	0,87	9,2	7,6	0,68	2,1	7,6	0,755	2,1	7,4	0,869	2,1
27/4/2025	7,4	84,667	0,78	8,6	7,2	0,746	2,5	7,3	0,858	2,7	7,3	1,03	2,3
28/4/2025	7,4	109,167	0,26	8,1	7,4	0,503	2,1	7,4	0,793	2,3	7,5	0,985	2,2
29/4/2025	7,6	105,5	0,2	8,1	7,5	0,402	1,9	7,5	0,763	2	7,6	0,904	2,1
30/4/2025	7,5	79,083	0,24	8,7	7,8	0,47	1,8	7,9	0,757	2	7,8	0,916	2,3
1/5/2025	7,6	93,667	0,11	8,4	7,8	0,555	1,4	7,7	0,872	1,7	7,7	0,949	2,1
2/5/2025	7,6	95,75	0,09	9,1	7,6	0,552	1,5	7,5	0,847	1,7	7,6	1,005	2,2
3/5/2025	7,6	104,667	0,1	8,9	7,7	0,438	1,7	7,6	0,835	2,1	7,7	1,02	2
4/5/2025	7,5	123,583	0,1	8,8	7,5	0,312	1,6	7,5	0,732	2	7,6	0,948	1,9
5/5/2025	7,5	118,083	0,4	8,4	7,7	0,546	1,7	7,6	0,854	2,1	7,7	1,007	2,1
6/5/2025	7,5	120,333	0,26	9,5	7,7	0,535	1,9	7,7	0,861	2,3	7,9	1,003	2,3
7/5/2025	7,4	92,25	1,06	9,6	7,4	0,588	2	7,5	0,839	2,5	7,4	1,006	2,9
8/5/2025	7,4	106,333	0,65	9,6	7,5	0,463	1,9	7,5	0,806	2	7,5	0,952	2
9/5/2025	7,4	87	0,55	9,8	7,6	0,635	2,3	7,7	0,905	2,4	7,6	1,024	2,5
10/5/2025	7,5	55,167	1,69	10,3	7,4	0,592	2,3	7,6	0,941	2,4	7,5	0,991	2,3
11/5/2025	7,5	70,833	0,58	9,8	7,4	0,522	2,1	7,5	0,916	2,1	7,4	1,042	2,3
12/5/2025	7,5	134,833	0,14	9,4	7,5	0,573	1,8	7,6	0,723	1,8	7,5	1,19	1,8
13/5/2025	7,6	132,167	0,14	10	7,6	0,61	1,9	7,8	0,683	2	7,4	1,111	1,9
14/5/2025	7,6	117,75	0,09	10	7,7	0,671	1,7	7,6	0,701	1,8	7,6	1,233	2,1
15/5/2025	7,5	119,583	0,08	9,8	7,6	0,659	1,7	7,5	0,678	1,8	7,3	1,056	2,2
16/5/2025	7,6	106,333	0,15	10,7	7,4	0,635	1,7	7,4	0,713	1,7	7,3	1,114	1,9
17/5/2025	7,6	110,583	0,86	9,9	7,6	0,593	1,6	7,5	0,775	1,8	7,4	1,043	2,1
18/5/2025	7,5	74,333	1,46	10,5	7,3	0,779	2,2	7,2	0,863	2,2	7,1	1,063	1,7
19/5/2025	7,5	83,667	0,66	11,5	7,5	0,713	1,9	7,5	0,893	2	7,3	1,121	2,1
20/5/2025	7,4	55,25	0,94	11,1	7,4	0,811	2	7,3	0,849	2,1	7,1	0,967	2,4
21/5/2025	7,4	65,417	0,46	10,8	7,4	0,644	1,9	7,4	0,718	2	7,4	0,971	2,1
22/5/2025	7,4	60,333	0,89	14	7,2	1,096	1,7	7,2	0,914	1,7	7	1,325	1,8
23/5/2025	7,3	94,167	0,67	13,3	7,2	0,725	1,8	7,2	0,76	1,7	7,2	1,333	1,9
24/5/2025	7,3	125,583	0,44	16,7	7,3	0,972	1,7	7,4	1,082	1,7	7,3	1,682	1,8
25/5/2025	7,3	106,417	0,34	16,3	7,5	0,698	1,8	7,6	0,67	1,8	7,6	1,153	1,9
26/5/2025	7,4	101,083	0,23	17,6	7,5	0,713	1,7	7,5	0,871	1,8	7,4	1,137	2


Fecha	AGUA CRUDA				CONSUMO BERNAL 1			CONSUMO BERNAL 4			CONSUMO R.SUB.		
	pH	Turb.	NH4+	UV254	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.
	UpH	UNT	mg/l	(1/m)	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l
27/5/2025	7,4	97,083	0,52	17,2	7,5	0,463	2	7,5	0,55	2,2	7,5	1,009	2,1
28/5/2025	7,3	83,917	1,45	16,1	7,2	0,65	1,9	7,1	0,606	2,2	7,1	1,181	2,1
29/5/2025	7,3	68	1,35	18,8	7,2	0,759	2,1	7,1	0,699	2,3	7	1,173	2,2
30/5/2025	7,4	80,666	0,38	19,1	7,5	0,756	1,9	7,4	0,737	2	7,3	1,194	2
31/5/2025	7,4	105,666	0,23	19,9	7,6	0,633	1,9	7,6	0,678	2,1	7,3	1,074	2
1/6/2025	7,4	95,333	0,18	20,9	7,3	1,219	2,1	7,3	1,108	2,4	7,2	2,447	2,2
2/6/2025	7,3	76,917	0,31	20,8	7,5	0,633	1,9	7,4	0,6	2,1	7,1	1,217	2,2
3/6/2025	7,4	70	0,26	21,6	7,7	0,963	1,8	7,5	1,009	1,8	7,2	1,386	2,2
4/6/2025	7,4	71,25	0,07	22,2	7,6	0,663	1,9	7,5	0,688	2,1	7,4	1,18	2,2
5/6/2025	7,4	70,333	0,33	22,3	7,5	0,777	2	7,4	0,693	2,1	7,3	1,288	2,1
6/6/2025	7,4	69,167	0,13	23,1	7,6	0,84	1,7	7,5	0,723	1,7	7,6	1,248	2,1
7/6/2025	7,4	64,917	0,16	23,4	7,8	0,843	1,7	7,7	0,823	1,8	7,5	1,196	2
8/6/2025	7,4	76,417	0,15	22,4	7,5	0,788	1,8	7,4	0,752	1,9	7,4	1,206	2
9/6/2025	7,3	69,917	0,22	22,7	7,5	0,82	1,8	7,5	0,772	1,8	7,5	1,338	2
10/6/2025	7,3	68,25	0,36	22,2	7,4	0,944	1,8	7,4	0,847	1,9	7,4	1,436	2
11/6/2025	7,3	71,5	0,24	23,3	7,6	0,73	1,6	7,5	0,738	1,6	7,4	1,305	1,7
12/6/2025	7,4	136,167	0,27	23	7,6	0,791	1,9	7,5	0,77	2	7,5	1,374	2,3
13/6/2025	7,4	166,833	0,24	23,1	7,7	0,813	1,9	7,6	0,773	2	7,5	1,512	2,2
14/6/2025	7,4	120,416	0,25	23,9	7,6	0,72	1,8	7,6	0,729	2	7,8	1,268	2,1
15/6/2025	7,5	114,25	0,27	23,7	7,6	0,753	2,1	7,5	0,768	2,4	7,5	1,2	2,3
16/6/2025	7,5	146,833	0,13	23,8	7,7	0,71	1,9	7,6	0,733	2,1	7,5	1,218	2
17/6/2025	7,5	106,333	0,11	25	7,7	0,783	1,7	7,6	0,726	1,8	7,5	1,275	1,9
18/6/2025	7,6	86,917	0,19	24,6	7,6	0,751	1,5	7,6	0,679	1,6	7,6	1,371	2,1
19/6/2025	7,5	72,333	0,13	25,6	7,7	0,748	1,5	7,6	0,656	1,5	7,9	1,444	2
20/6/2025	7,4	59,75	0,22	24,9	7,8	0,712	1,6	7,7	0,618	1,6	7,8	1,35	1,9
21/6/2025	7,4	60,75	0,12	25	7,9	0,703	1,8	7,8	0,616	1,9	7,7	1,333	2,3
22/6/2025	7,5	57	0,18	24,7	7,8	0,69	1,7	7,8	0,632	1,8	7,9	1,37	2,1
23/6/2025	7,5	70,583	0,6	23,8	7,6	0,681	2,1	7,5	0,667	2,2	7,5	1,559	2
24/6/2025	7,4	73	1,51	23,7	7	0,751	2,5	6,9	0,729	2,7	6,9	2,162	1,7
25/6/2025	7,5	83,5	1	24,2	7,2	0,79	2	7,1	0,784	2,1	7,1	2,022	2,4
26/6/2025	7,4	59,333	1,05	23,8	7,3	0,773	2,2	7,2	0,732	1,9	7,3	1,585	2,1
27/6/2025	7,6	63,417	0,33	22,8	7,6	0,798	2,2	7,5	0,743	1,8	7,7	1,598	2
28/6/2025	7,6	67,75	0,18	24,9	7,7	0,733	2,1	7,7	0,673	1,8	7,6	1,42	2,2
29/6/2025	7,6	67,833	0,21	23,5	7,7	0,668	2	7,6	0,635	1,7	7,7	1,473	1,9
30/6/2025	7,5	64	0,34	22,9	7,5	0,768	1,9	7,4	0,702	1,7	7,3	1,678	2
1/7/2025	7,5	61,417	0,28	23,9	7,5	0,832	2,1	7,6	0,778	1,8	7,7	1,74	2
2/7/2025	7,5	54,75	0,4	20,9	7,6	0,767	2	7,7	0,705	1,7	7,6	1,742	2
3/7/2025	7,5	75,083	0,15	20,3	7,6	0,665	1,9	7,8	0,578	1,6	7,6	1,916	2
4/7/2025	7,5	75,583	0,32	21,6	7,7	0,668	1,9	7,8	0,634	1,7	7,6	1,596	2
5/7/2025	7,6	64,583	0,19	22,3	7,8	0,688	1,6	7,9	0,659	1,3	7,8	1,52	1,8
6/7/2025	7,6	90,5	0,19	21,2	7,7	0,692	1,9	7,8	0,649	1,6	7,8	1,503	1,9
7/7/2025	7,5	71,667	0,51	20,7	7,5	0,857	2,6	7,5	0,74	2,2	7,5	1,755	2,6
8/7/2025	7,4	60	0,28	20,4	7,7	0,808	2,2	7,7	0,73	1,8	7,7	1,307	2
9/7/2025	7,4	76	0,24	21	7,9	0,827	2,1	8,1	0,685	1,8	7,9	1,23	2
10/7/2025	7,4	70,333	0,11	19,8	7,7	0,722	2	7,8	0,643	1,8	7,7	1,165	2,1
11/7/2025	7,4	61	0,15	20,1	7,7	0,798	2,3	7,8	0,683	2	7,6	1,117	2,2
12/7/2025	7,4	56,75	0,16	22,3	7,9	0,864	2,3	7,8	0,691	1,9	7,7	1,103	2,2


Fecha	AGUA CRUDA				CONSUMO BERNAL 1			CONSUMO BERNAL 4			CONSUMO R.SUB.		
	pH	Turb.	NH4+	UV254	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.
	UpH	UNT	mg/l	(1/m)	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l
13/7/2025	7,4	59,25	0,29	22,4	7,9	0,861	2	7,9	0,637	1,7	7,9	1,073	1,9
14/7/2025	7,4	63,917	0,34	23,4	7,7	0,891	2	7,7	0,696	1,7	7,7	1,115	2,1
15/7/2025	7,3	62,917	0,32	22,1	7,7	0,934	2,1	7,6	0,753	2	7,7	1,07	1,9
16/7/2025	7,4	62,083	0,22	20,8	7,8	0,964	2,1	7,7	0,705	1,9	7,7	1,058	2
17/7/2025	7,4	66,417	0,2	20,9	7,7	0,716	2,2	7,6	0,613	2	7,5	1,023	2,1
18/7/2025	7,4	63,083	0,55	20,1	7,6	0,819	2,5	7,6	0,574	2,2	7,5	1,187	2,2
19/7/2025	7,5	94,25	0,13	19	7,9	0,653	2,1	7,9	0,518	1,9	7,7	1,139	2
20/7/2025	7,5	82,167	0,13	19,3	7,8	0,699	1,9	7,8	0,584	1,6	7,9	1,345	1,9
21/7/2025	7,4	77,25	0,1	18,9	7,8	0,754	1,9	7,7	0,614	1,7	7,5	1,348	1,8
22/7/2025	7,4	71,417	0,06	18,8	7,8	0,674	2	7,7	0,557	1,7	7,4	1,205	1,9
23/7/2025	7,4	60,25	0,11	19	7,6	1,094	2,3	7,6	0,813	1,9	7,3	1,384	2
24/7/2025	7,4	83,25	0,33	19,5	7,6	0,779	2,3	7,5	0,646	2,1	7,2	1,342	2,2
25/7/2025	7,4	81,917	0,58	18,9	7,6	0,894	2,2	7,6	0,628	2,1	7,2	1,209	2,2
26/7/2025	7,3	66,5	1,06	18,6	7,6	0,853	2	7,5	0,614	1,9	7,2	1,075	2,1
27/7/2025	7,4	115,583	0,48	19,1	7,5	1,023	2	7,5	0,688	1,9	7,5	1,167	1,8
28/7/2025	7,5	119,417	0,12	19,1	7,6	0,976	1,9	7,5	0,7	1,7	7,5	1,382	1,8
29/7/2025	7,5	93,333	0,1	18,9	7,6	0,794	1,7	7,6	0,666	1,5	7,5	1,3	1,7
30/7/2025	7,5	90,917	0,17	19,1	7,6	0,833	2	7,6	0,607	1,8	7,7	1,322	1,9
31/7/2025	7,5	76,417	0,14	22,7	7,7	0,659	1,8	7,7	0,538	1,7	7,9	1,179	1,9
1/8/2025	7,4	72,833	0,16	20,8	7,7	0,861	1,9	7,6	0,577	1,8	7,7	1,129	1,8
2/8/2025	7,4	60,5	0,13	22	7,7	0,775	2,2	7,6	0,553	2	7,6	1,049	1,9
3/8/2025	7,4	53,583	0,21	20,4	7,7	0,767	2,2	7,6	0,556	2	7,6	1,027	2
4/8/2025	7,4	49,083	0,1	19,5	7,7	0,883	2,2	7,6	0,598	2	7,6	1,037	2,1
5/8/2025	7,4	44,167	0,42	20,2	7,7	0,86	2,2	7,6	0,608	2,1	7,7	1,019	1,9
6/8/2025	7,4	51,5	0,46	21,1	7,4	1,053	1,9	7,5	0,786	1,8	7,4	1,231	2
7/8/2025	7,4	50,333	0,18	21,1	7,5	0,823	2,4	7,6	0,627	2,1	7,6	1,068	2
8/8/2025	7,5	47,5	0,12	20,7	7,5	0,949	2,2	7,7	0,689	2	7,9	1,151	2
9/8/2025	7,5	39,75	0,3	20,4	7,5	0,737	2,1	7,6	0,534	1,9	7,7	1,105	2
10/8/2025	7,4	41,417	0,41	20,5	7,5	0,842	2	7,6	0,569	1,8	7,5	1,102	1,8
11/8/2025	7,4	43,583	0,1	18,2	7,7	0,766	2	8	0,52	1,8	7,6	1,052	1,8
12/8/2025	7,5	49,083	0,15	18,2	7,6	0,679	2	7,7	0,547	1,8	7,9	1,073	2
13/8/2025	7,4	48	0,38	19,4	7,5	0,711	2	7,6	0,559	1,9	7,6	0,918	2,1
14/8/2025	7,5	52,333	0,18	18,6	7,6	0,743	2,1	7,7	0,601	2	7,8	0,933	1,9
15/8/2025	7,5	65,333	0,23	20,1	7,4	0,857	2,3	7,5	0,578	2,1	7,7	0,998	2,2
16/8/2025	7,5	116,833	0,32	18,6	7,7	0,838	2,3	7,8	0,592	2,1	7,9	1,078	2,2
17/8/2025	7,4	95,083	0,69	13,3	7,3	0,899	2,7	7,3	0,57	2,6	7,4	1,031	2,6
18/8/2025	7,4	78,25	0,7	18,3	7,4	0,771	1,9	7,4	0,728	1,8	7,5	1,065	2,2
19/8/2025	7,4	99,167	1,06	18,6	7,3	0,789	2	7,3	0,931	1,9	7,5	1,085	2,4
20/8/2025	7,4	84,667	0,82	19,4	7,3	0,833	1,9	7,3	0,927	1,8	7,5	1,229	1,8
21/8/2025	7,3	66,667	0,89	17,4	7,4	0,644	2	7,4	0,85	1,7	7,5	1,093	2,4
22/8/2025	7,4	59,583	0,82	17,7	7,4	0,704	1,9	7,4	0,862	1,8	7,6	1,004	2,1
23/8/2025	7,4	53,833	0,92	18,1	7,3	0,648	2,8	7,4	0,774	2,4	7,6	0,926	2,4
24/8/2025	7,5	63,917	0,5	17,4	7,5	0,611	1,9	7,5	0,864	1,7	7,8	0,968	1,8
25/8/2025	7,4	64,083	0,34	15,4	7,6	0,586	2,1	7,6	0,79	1,9	7,6	0,962	2
26/8/2025	7,3	44,818	0,97	16,3	7,3	0,728	2,6	7,3	0,949	2,2	7,5	1,619	2,5
27/8/2025	7,4	46,75	0,2	14,5	7,6	0,563	2,2	7,7	0,698	2,2	7,7	0,955	2,2
28/8/2025	7,3	36,25	0,9	15,7	7,5	0,765	1,5	7,5	0,938	1,4	7,5	1,064	1,8


Fecha	AGUA CRUDA				CONSUMO BERNAL 1			CONSUMO BERNAL 4			CONSUMO R.SUB.		
	pH	Turb.	NH4+	UV254	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.
	UpH	UNT	mg/l	(1/m)	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l
29/8/2025	7,3	38,917	1,02	16,6	7,3	0,653	1,5	7,3	0,869	1,3	7,4	1,076	1,9
30/8/2025	7,3	43,75	0,62	16,9	7,3	0,725	1,6	7,4	0,772	1,4	7,5	1,004	1,7
31/8/2025	7,4	68	0,75	17	7,3	0,631	1,7	7,3	0,709	1,6	7,4	0,97	1,9
1/9/2025	7,3	73,833	0,82	17,7	7,4	0,74	1,7	7,4	0,933	1,4	7,5	1,333	1,8
2/9/2025	7,4	83,833	0,31	17	7,4	0,624	1,9	7,4	0,787	1,8	7,6	1,377	2,3
3/9/2025	7,3	78,583	0,38	17,2	7,4	0,593	1,9	7,5	0,678	1,7	7,6	1,325	2
4/9/2025	7,4	72,083	0,5	17	7,4	0,604	1,9	7,5	0,683	1,8	7,6	1,159	2,1
5/9/2025	7,4	54,917	0,78	16,3	7,4	0,614	1,8	7,5	0,742	1,5	7,7	1,146	2,2
6/9/2025	7,4	42,417	0,64	16,6	7,2	0,574	1,7	7,2	0,693	1,4	7,4	1,243	2
7/9/2025	7,4	53,833	0,37	17	7,5	0,611	2,1	7,6	0,647	2	7,7	1,178	2
8/9/2025	7,4	53,333	0,66	15,9	7,4	0,714	1,4	7,4	0,818	1,4	7,5	1,253	1,8
9/9/2025	7,3	53,417	0,27	16	7,5	0,666	2	7,6	0,779	1,9	7,7	1,144	2,1
10/9/2025	7,3	60	0,26	17	7,6	0,584	1,9	7,6	0,819	1,8	7,7	1,184	2
11/9/2025	7,3	61,667	0,36	17,4	7,6	0,566	1,8	7,5	0,74	1,8	7,6	1,215	2,2
12/9/2025	7,3	68,417	0,19	17,2	7,5	0,574	2,2	7,4	0,787	2	7,5	1,334	2,2
13/9/2025	7,4	102,917	0,55	17	7,6	0,726	1,9	7,6	0,792	1,8	7,7	1,344	2
14/9/2025	7,4	73,667	0,83	18,1	7,3	0,788	2,3	7,2	0,972	2,4	7,3	1,552	2,5
15/9/2025	7,4	67,833	0,69	18,3	7,4	0,708	2,1	7,4	0,828	1,9	7,4	1,157	2,2
16/9/2025	7,4	69,833	0,66	18,2	7,1	0,389	2	7,1	0,65	1,9	7,4	1,086	2
17/9/2025	7,3	59,75	0,78	17	7,2	0,492	2,2	7,2	0,741	2	7,4	1,153	2,4
18/9/2025	7,3	65,667	0,47	17	7,6	0,551	2,1	7,5	0,648	1,9	7,7	1,103	2,2
19/9/2025	7,3	67,167	0,57	16,3	7,6	0,552	2,1	7,5	0,617	1,9	7,7	1,008	2,3
20/9/2025	7,3	93,417	0,58	16,2	7,7	0,752	2,3	7,6	0,778	2	7,7	1,106	2,5
21/9/2025	7,3	83,75	0,79	16,7	7,6	0,788	2,1	7,6	0,728	1,9	7,6	1,002	2,3
22/9/2025	7,3	65,583	0,83	16,8	7,6	0,609	2	7,5	0,741	1,8	7,6	0,903	2,3
23/9/2025	7,4	61	0,99	17	7,6	0,601	2,8	7,6	0,693	2,6	7,7	1,018	2,6
24/9/2025	7,5	59,167	0,71	17,2	7,6	0,475	2,5	7,6	0,677	2	7,7	0,818	2,7
25/9/2025	7,4	99,833	0,75	14,9	7,4	0,503	2,6	7,4	0,672	2,4	7,7	0,967	2,8
26/9/2025	7,4	113,917	0,84	14,6	7,3	0,545	2,2	7,3	0,748	1,9	7,5	1,14	2,6
27/9/2025	7,4	118,417	0,54	14,6	7,3	0,523	2,3	7,4	0,688	2,1	7,5	1,138	2,7
28/9/2025	7,4	78,417	0,88	14,7	7,4	0,488	1,9	7,5	0,698	1,7	7,5	1,067	2,4
29/9/2025	7,4	60,083	0,7	14,8	7,3	0,521	2,1	7,5	0,638	2	7,5	1,041	2,4
30/9/2025	7,4	48,333	0,62	15,1	7,4	0,563	2,1	7,5	0,768	1,8	7,6	1,082	2,1
1/10/2025	7,4	45,417	0,59	15	7,4	0,634	1,7	7,5	0,788	1,5	7,5	1,288	1,9
2/10/2025	7,4	51,917	0,5	14	7,4	0,543	2	7,4	0,718	1,8	7,4	1,027	2
3/10/2025	7,3	49,083	0,48	14,4	7,5	0,521	2	7,6	0,773	1,8	7,6	1,118	2,1
4/10/2025	7,4	50,333	0,3	13,9	7,7	0,413	2	7,8	0,704	1,8	7,6	0,844	2,1
5/10/2025	7,3	52,917	0,46	14,4	7,7	0,487	2,1	7,9	0,701	1,8	7,7	0,941	2,2
6/10/2025	7,4	48,75	0,79	13,6	7,7	0,485	2,2	7,8	0,753	2	7,7	0,916	2,2
7/10/2025	7,4	47,167	0,82	14,6	7,6	0,442	2,2	7,7	0,766	2	7,6	1,051	2,3
8/10/2025	7,4	50,667	0,41	14,2	7,7	0,402	1,9	7,9	0,679	1,7	7,8	0,847	2,2
9/10/2025	7,4	58,917	0,34	13,4	7,7	0,409	2,3	7,9	0,613	2	7,9	0,877	2,1
10/10/2025	7,4	56,417	0,58	13,6	7,6	0,529	2,1	7,6	0,754	1,8	7,8	1,03	2,3
11/10/2025	7,4	50	0,34	12,7	7,6	0,467	2,1	7,6	0,683	1,9	7,9	0,98	2,2
12/10/2025	7,4	51,333	0,22	13,3	7,6	0,416	2,2	7,6	0,658	2	7,8	0,958	2,2
13/10/2025	7,5	46,5	0,33	13,8	7,6	0,548	2,2	7,6	0,713	2	7,6	1,005	2,1
14/10/2025	7,4	41	0,36	12,8	7,6	0,474	2	7,6	0,725	1,7	7,7	1,095	2,2


Fecha	AGUA CRUDA				CONSUMO BERNAL 1			CONSUMO BERNAL 4			CONSUMO R.SUB.		
	pH	Turb.	NH4+	UV254	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.
	UpH	UNT	mg/l	(1/m)	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l
15/10/2025	7,4	62	0,64	14,4	7,7	0,518	2	7,6	0,765	1,8	7,8	0,946	2
16/10/2025	7,5	52,25	0,43	14,6	7,5	0,604	2,2	7,5	0,818	1,9	7,6	1,047	2
17/10/2025	7,5	49,25	0,22	14,2	7,7	0,606	2	7,7	0,843	1,7	7,8	1,196	2
18/10/2025	7,5	53,083	0,41	14,4	7,7	0,55	1,9	7,7	0,788	1,7	7,9	1,221	1,9
19/10/2025	7,6	70,167	0,79	13,8	7,5	0,609	2,1	7,5	0,857	1,9	7,5	1,283	2,2
20/10/2025	7,6	95,583	0,22	12,5	7,4	0,434	2,1	7,6	0,688	1,8	7,6	1,308	2,1
21/10/2025	7,7	89,333	0,06	11,3	7,6	0,363	1,9	8	0,617	1,6	7,9	1,204	1,8
22/10/2025	7,6	74,25	0,06	10,9	7,6	0,374	2	8	0,635	1,8	8	1,262	1,8
23/10/2025	7,6	61,833	0,14	11,8	7,5	0,358	1,9	7,9	0,632	1,7	7,9	1,242	1,8
24/10/2025	7,5	76,833	0,23	12,8	7,3	0,405	2,2	7,7	0,62	1,9	7,9	1,374	2
25/10/2025	7,5	71,583	0,46	12,7	7,5	0,453	2,3	7,9	0,618	2	8	1,025	2
26/10/2025	7,5	55,083	0,63	12,1	7,4	0,559	2	7,8	0,688	1,8	7,7	1,097	2,1
27/10/2025	7,6	44,5	0,95	12,6	7,3	0,666	1,6	7,7	0,791	1,3	7,5	1,104	1,9
28/10/2025	7,6	61,417	0,41	12	7,5	0,588	2	7,8	0,678	1,7	7,6	1,091	2
29/10/2025	7,5	70,917	0,65	12,2	7,4	0,577	1,7	7,8	0,678	1,5	7,6	0,884	1,8
30/10/2025	7,5	75,167	0,65	13,9	7,4	0,582	1,8	7,5	0,751	1,5	7,6	1,018	2
31/10/2025	7,5	75,75	0,34	15,1	7,7	0,809	1,8	7,6	0,873	1,5	7,7	1,158	2
1/11/2025	7,6	62,833	0,16	15,3	7,6	0,551	2,2	7,7	0,766	1,8	7,8	1,159	2,3
2/11/2025	7,5	54,917	0,21	15,2	7,6	0,62	2,1	7,8	0,781	1,8	7,9	1,29	2
3/11/2025	7,6	56,833	0,13	14,9	7,7	0,727	2,1	7,8	0,833	1,9	7,8	1,143	1,9
4/11/2025	7,5	62,333	0,36	14,7	7,5	0,699	2	7,6	0,783	1,8	7,7	1,268	2
5/11/2025	7,6	60,583	0,17	14,3	7,7	0,708	2,2	7,7	0,881	1,9	7,6	1,509	2,2
6/11/2025	7,6	71,25	0,52	15	7,6	0,635	1,9	7,6	0,826	1,7	7,6	1,322	2,1
7/11/2025	7,5	93,75	0,42	15,8	7,6	0,746	2,3	7,6	0,922	2,1	7,7	1,298	2,2
8/11/2025	7,6	72,917	0,22	15,9	7,5	0,534	2,2	7,6	0,758	2	7,7	0,978	2,1
9/11/2025	7,5	65,917	0,23	15,9	7,6	0,598	2,2	7,7	0,757	2	7,6	1,14	2,3
10/11/2025	7,5	59,833	0,18	16,3	7,6	0,588	1,9	7,7	0,93	1,7	7,7	1,218	2,1
11/11/2025	7,5	66,583	0,3	15,9	7,8	0,487	1,8	7,8	0,735	1,6	7,8	1,078	1,7
12/11/2025	7,5	53,167	0,24	14,9	7,7	0,712	1,7	7,8	0,967	1,5	7,7	1,126	2,2
13/11/2025	7,5	49,833	0,3	13,1	7,8	0,69	1,9	7,6	0,906	1,6	7,8	1,003	2
14/11/2025	7,6	42,75	0,26	12,3	7,7	0,589	1,9	7,4	0,804	1,6	7,8	0,834	1,8
15/11/2025	7,5	45,167	0,27	11,6	7,7	0,527	1,9	7,4	0,707	1,6	7,8	0,864	1,6
16/11/2025	7,6	48,333	0,22	11,9	7,7	0,531	2	7,4	0,703	1,8	7,9	0,951	1,8
17/11/2025	7,5	45,917	0,89	12,3	7,4	0,639	2,2	7,2	0,841	2	7,7	1,048	2,1
18/11/2025	7,6	67,417	0,2	13,5	7,6	0,44	2	7,6	0,705	1,8	7,8	0,913	2
19/11/2025	7,5	60,167	0,32	13	7,7	0,698	2,2	7,8	0,912	2	7,9	1,146	1,9
20/11/2025	7,6	76,25	0,11	12,1	7,8	0,628	2,2	7,9	0,866	1,9	8	0,933	2
21/11/2025	7,5	70,083	0,23	11,9	7,6	0,596	2,1	7,9	0,8	1,8	8	0,998	2,1
22/11/2025	7,5	68,833	0,27	12,2	7,5	0,553	2,1	7,7	0,893	1,8	7,9	1,068	1,9
23/11/2025	7,4	75,083	0,18	11,8	7,5	0,473	2,2	7,8	0,79	2	7,8	1,013	2,3
24/11/2025	7,4	74,083	0,14	12,5	7,5	0,548	1,8	7,7	0,863	1,7	8	1,062	1,8
25/11/2025	7,5	52,833	0,12	12,4	7,6	0,63	2,3	7,9	0,974	2	7,9	1,003	1,8
26/11/2025	7,5	49,167	0,11	12,2	7,7	0,767	2	7,9	1,124	1,8	7,9	1,029	1,8
27/11/2025	7,5	59,75	0,14	12,8	7,4	0,713	1,9	7,5	1,088	1,6	7,9	0,999	1,9
28/11/2025	7,4	54,167	0,19	12,8	7,5	0,749	1,7	7,7	1,07	1,5	8	0,955	1,7
29/11/2025	7,5	74,25	0,19	12,4	7,8	0,715	2	8	0,908	1,7	8,1	0,833	1,8
30/11/2025	7,5	101,417	0,21	12,7	7,7	0,547	2,1	7,7	0,753	1,9	7,9	0,857	2,1


Fecha	AGUA CRUDA				CONSUMO BERNAL 1			CONSUMO BERNAL 4			CONSUMO R.SUB.		
	pH	Turb.	NH4+	UV254	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.	pH	Turb.	Cloro L.
	UpH	UNT	mg/l	(1/m)	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l	UpH	UNT	mg/l
1/12/2025	7,5	83,667	0,35	12,8	7,7	0,477	2	7,8	0,728	2	7,8	0,896	1,8
2/12/2025	7,4	48,917	0,29	13,1	7,5	0,533	1,8	7,6	0,928	1,6	7,7	1,012	1,6
3/12/2025	7,4	54,25	0,16	12,3	7,7	0,594	2,1	7,8	0,877	1,8	7,9	0,963	1,8
4/12/2025	7,5	51,083	0,15	12,6	7,8	0,539	1,9	7,9	0,81	1,7	8	0,856	1,7
5/12/2025	7,6	52,417	0,13	13,1	7,9	0,581	2	7,9	0,893	1,8	8	0,846	1,8
6/12/2025	7,5	49,667	0,18	13,5	7,7	0,509	2,3	7,8	0,773	2	8	0,845	1,7
7/12/2025	7,6	63,833	0,16	13,4	8	0,662	2,6	8,2	0,974	2,3	7,6	0,983	2
8/12/2025	7,6	78,583	0,18	13,6	7,5	0,532	2	7,8	0,749	1,8	7,5	0,847	1,8
9/12/2025	7,5	79,75	0,14	13,2	7,7	0,675	2,1	7,8	0,818	1,8	7,6	0,928	1,9
10/12/2025	7,5	67,917	0,24	13,7	7,8	0,858	2,2	7,9	1,037	2,1	7,6	1,104	1,9
11/12/2025	7,6	62,333	0,19	13,5	7,6	0,688	2,2	7,7	1,028	2,1	7,5	1,085	1,9
12/12/2025	7,6	59,167	0,21	13,1	7,8	0,533	1,8	7,9	0,875	1,7	7,6	1,018	1,6
13/12/2025	7,5	52,083	0,15	13,3	7,5	0,575	1,7	7,6	0,816	1,5	7,6	0,909	1,6
14/12/2025	7,4	52,5	0,12	13,2	7,6	0,541	2	7,7	0,83	1,8	7,6	0,869	1,9
15/12/2025	7,5	45,583	0,13	13,5	7,5	0,745	1,9	7,7	1,113	1,8	7,5	1,101	1,9
16/12/2025	7,5	45,25	0,1	13,2	7,1	0,55	1,9	7,4	0,941	1,8	7,3	1,013	1,8
17/12/2025	7,5	49,083	0,19	13,3	7,7	0,719	1,5	7,9	1,074	1,4	7,8	1,184	1,6
18/12/2025	7,5	59,667	0,18	12,3	7,8	0,698	2	7,9	0,995	1,8	7,8	1,083	1,8
19/12/2025	7,5	66,833	0,11	11,9	7,7	0,585	2	7,8	0,931	1,8	7,5	0,973	1,8
20/12/2025	7,5	67,167	0,29	12,7	7,7	0,463	2,2	7,7	0,712	2,2	7,5	0,938	2,2
21/12/2025	7,6	63,917	0,12	12,1	7,9	0,721	2,2	7,9	0,843	1,9	7,7	1,018	2,1
22/12/2025	7,6	57,75	0,13	12	7,9	0,828	2,3	7,9	0,841	2,1	7,8	1,046	2,1
23/12/2025	7,5	46,083	0,3	12,3	7,7	0,898	2,1	7,8	0,813	1,9	7,8	0,873	2
24/12/2025	7,5	42,167	0,24	12,6	7,7	0,882	2	7,8	0,827	1,9	7,8	0,794	2
25/12/2025	7,5	48,25	0,28	11,9	7,6	0,773	2,3	7,7	0,779	2,2	7,7	0,787	2,1
26/12/2025	7,3	42,417	0,34	12,5	7,6	0,898	2,1	7,6	0,903	2	7,7	0,927	2
27/12/2025	7,3	42,667	0,26	12,3	7,5	0,791	2,3	7,6	0,799	2,2	7,6	0,778	2,1
28/12/2025	7,3	54,583	0,21	11,5	7,6	0,833	2,3	7,6	0,827	2,2	7,7	0,831	2,1
29/12/2025	7,4	50,75	0,12	12	7,7	0,824	2,1	7,8	0,82	2	7,6	0,865	2,1
30/12/2025	7,3	45,917	0,14	11,7	7,5	0,803	1,8	7,7	0,784	1,7	7,4	0,904	1,8
31/12/2025	7,4	42,2	0,14	10,9	7,2	0,577	2,5	7,2	0,805	2,4	7	0,989	2,3

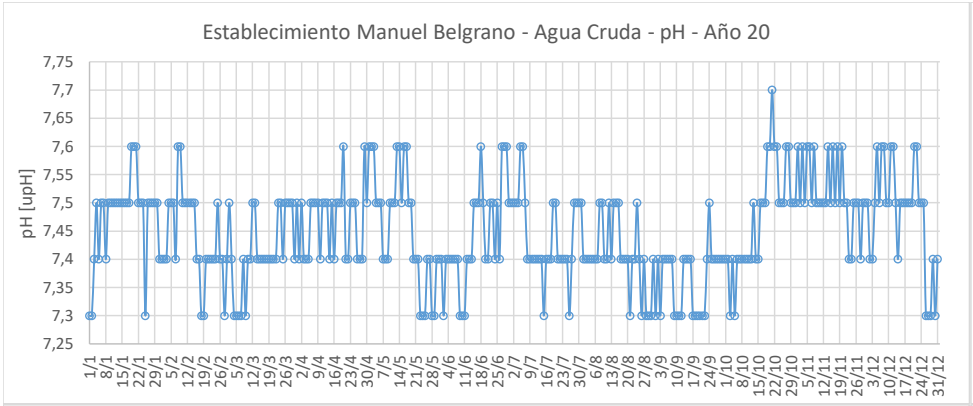

Establecimiento Manuel Belgrano - Agua Cruda - pH - Año 20
pH [upH]
7,75
7,7
7,65
7,6
7,55
7,5
7,45
7,4
7,35
7,3
7,25

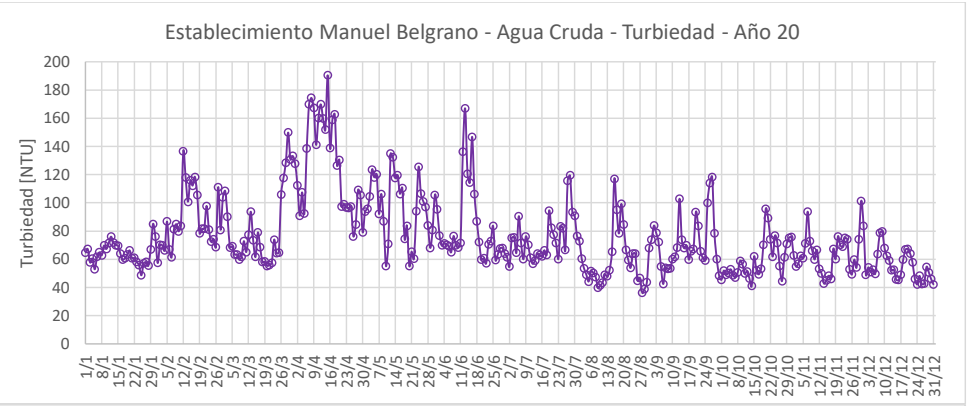

Establecimiento Manuel Belgrano - Agua Cruda - Turbiedad - Año 20
Turbiedad [NTU]
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

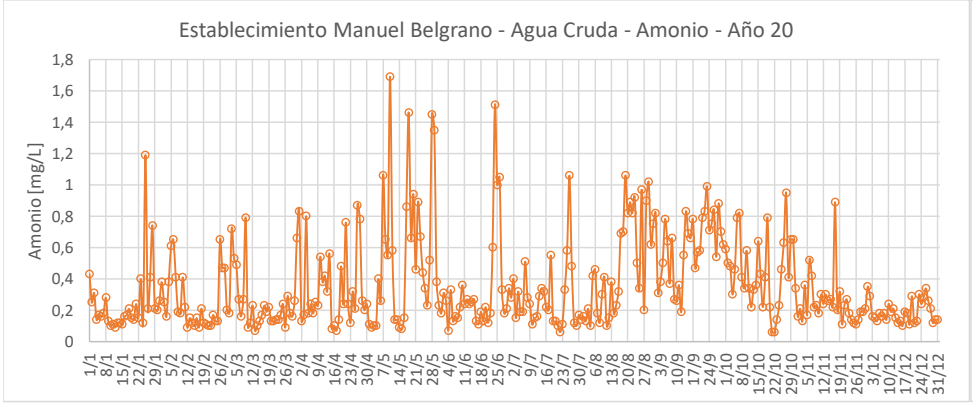

Establecimiento Manuel Belgrano - Agua Cruda - Amonio - Año 20
Amonio [mg/L]
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

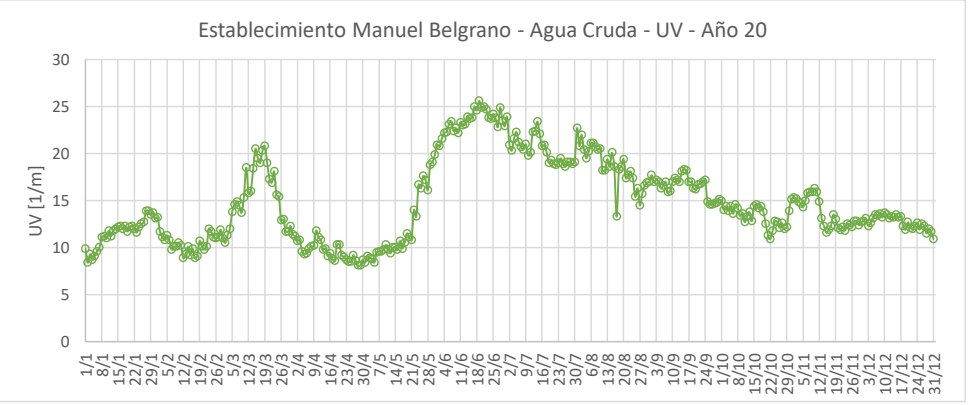

Establecimiento Manuel Belgrano - Agua Cruda - UV - Año 20
UV [1/m]
30
25
20
15
10
5
0

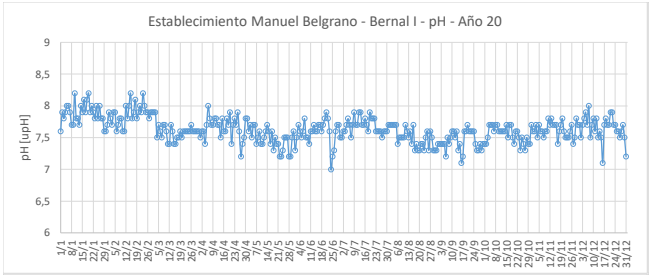

Establecimiento Manuel Belgrano - Bernal I - pH - Año 20
pH [upH]

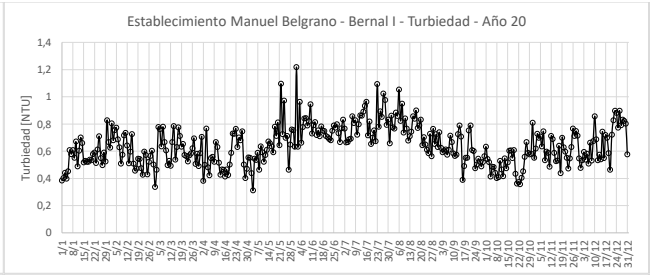

Establecimiento Manuel Belgrano - Bernal I - Turbiedad - Año 20
Turbiedad [NTU]

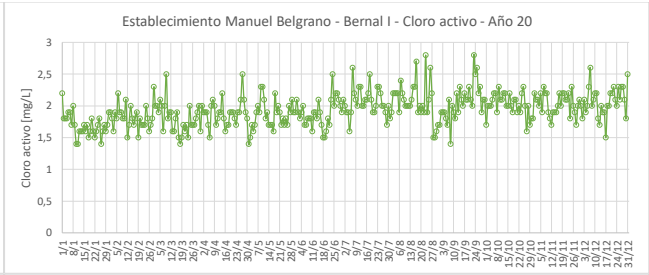

Establecimiento Manuel Belgrano - Bernal I - Cloro activo - Año 20
Cloro activo [mg/L]

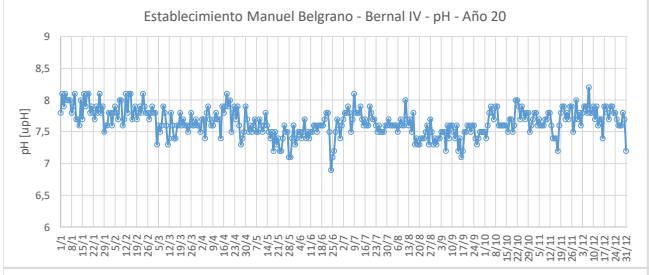

Establecimiento Manuel Belgrano - Bernal IV - pH - Año 20
pH [upH]

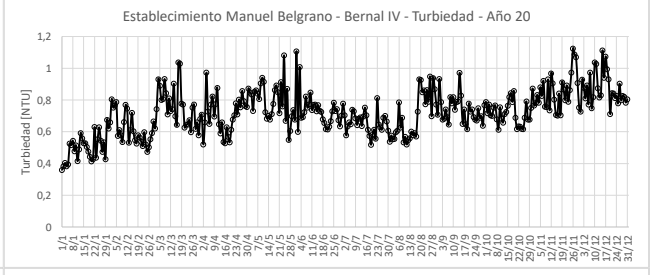
Establecimiento Manuel Belgrano - Bernal IV - Turbiedad - Año 20
Turbiedad [NTU]

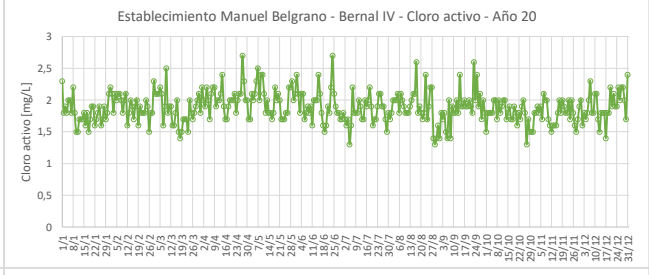
Establecimiento Manuel Belgrano - Bernal IV - Cloro activo - Año 20
Cloro activo [mg/L]

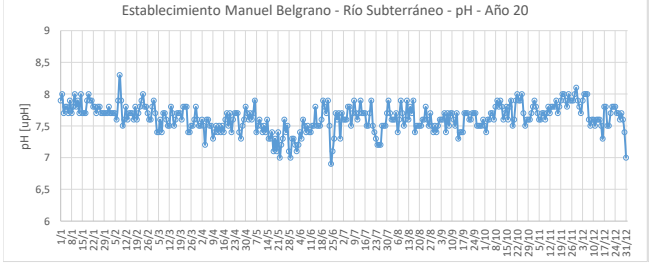

Establecimiento Manuel Belgrano - Río Subterráneo - pH - Año 20
pH [upH]

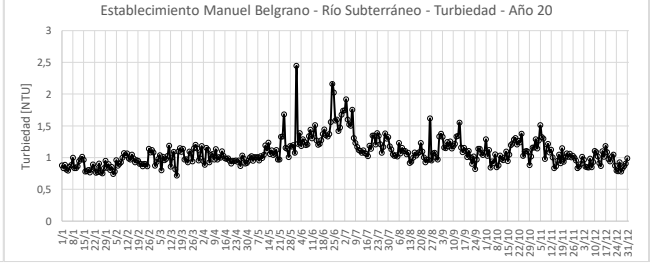

Establecimiento Manuel Belgrano - Río Subterráneo - Turbiedad - Año 20
Turbiedad [NTU]

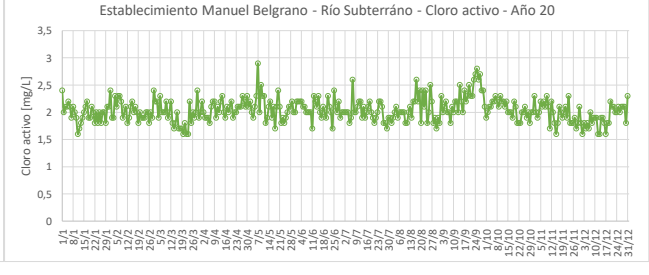

Establecimiento Manuel Belgrano - Río Subterráno - Cloro activo - Año 20
Cloro activo [mg/L]

DIRECCIÓN DE AGUA - GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS - CALIDAD PJMR
DATOS PARA GRÁFICOS DE INFORME ANUAL

	PROMEDIOS DIARIOS - FUENTE: BASE LIMS						
	AGUA CRUDA				AGUA A CONSUMO		
	TURB	pH	NH4+	UV254	pH	TURB	Cl2 L
	NTU	*UpH*	*mg/L*	*1/m*	*UpH*	*NTU*	*mg/L*
1/1/2025	77	7,3	0,04	7,8	8,2	0,34	1,39
2/1/2025	71	7,3	0,03	8,1	8,1	0,40	1,48
3/1/2025	71	7,2	0,02	8,2	8,1	0,40	1,48
4/1/2025	70	7,2	0,04	8,8	8,1	0,39	1,48
5/1/2025	66	7,2	0,04	9,1	8,0	0,39	1,47
6/1/2025	73	7,2	0,04	9,1	8,0	0,42	1,45
7/1/2025	75	7,3	0,04	9,3	8,0	0,49	1,42
8/1/2025	68	7,3	0,07	9,3	8,0	0,41	1,45
9/1/2025	70	7,3	0,06	8,8	8,1	0,37	1,46
10/1/2025	61	7,3	0,05	7,8	8,2	0,48	1,40
11/1/2025	57	7,3	0,06	8,3	8,1	0,37	1,50
12/1/2025	53	7,3	0,09	9,1	8,0	0,27	1,38
13/1/2025	57	7,3	0,05	8,7	8,0	0,35	1,40
14/1/2025	65	7,3	0,07	9,2	8,2	0,52	1,42
15/1/2025	67	7,3	0,08	9,7	8,0	0,44	1,38
16/1/2025	76	7,3	0,10	9,2	8,1	0,39	1,44
17/1/2025	83	7,3	0,06	9,2	8,0	0,40	1,56
18/1/2025	83	7,3	0,05	9,2	8,2	0,35	1,59
19/1/2025	84	7,3	0,04	9,5	8,2	0,37	1,60
20/1/2025	93	7,3	0,03	9,9	8,0	0,35	1,63
21/1/2025	109	7,4	0,04	9,7	8,0	0,42	1,67
22/1/2025	131	7,4	0,06	9,3	8,0	0,57	1,60
23/1/2025	141	7,4	0,05	9,4	8,0	0,56	1,64
24/1/2025	142	7,4	0,05	9,3	8,0	0,42	1,66
25/1/2025	119	7,4	0,05	8,7	8,1	0,37	1,70
26/1/2025	121	7,4	0,03	8,0	8,0	0,42	1,72
27/1/2025	113	7,4	0,04	7,5	8,0	0,37	1,74
28/1/2025	118	7,4	0,04	7,2	8,0	0,43	1,72
29/1/2025	120	7,4	0,04	7,4	8,2	0,39	1,71
30/1/2025	136	7,5	0,03	7,1	8,0	0,55	1,69
31/1/2025	129	7,5	0,03	6,5	8,0	0,46	1,63
1/2/2025	123	7,50	0,04	6,3	8,0	0,42	1,67
2/2/2025	123	7,40	0,05	6,7	7,9	0,41	1,69
3/2/2025	133	7,40	0,03	6,8	8,0	0,58	1,65
4/2/2025	150	7,40	0,04	6,4	8,1	0,42	1,73
5/2/2025	170	7,50	0,04	6,4	8,0	0,44	1,72
6/2/2025	178	7,40	0,03	6,8	8,0	0,54	1,70
7/2/2025	178	7,40	0,03	6,3	8,0	0,40	1,76
8/2/2025	166	7,40	0,03	5,9	8,0	0,36	1,78
9/2/2025	164	7,50	0,05	6,6	8,0	0,54	1,57
10/2/2025	150	7,40	0,04	6,6	7,9	0,54	1,68
11/2/2025	183	7,30	0,03	7,3	7,9	0,51	1,69
12/2/2025	158	7,30	0,05	7,0	8,0	0,32	1,72
13/2/2025	154	7,30	0,03	6,7	8,0	0,41	1,65

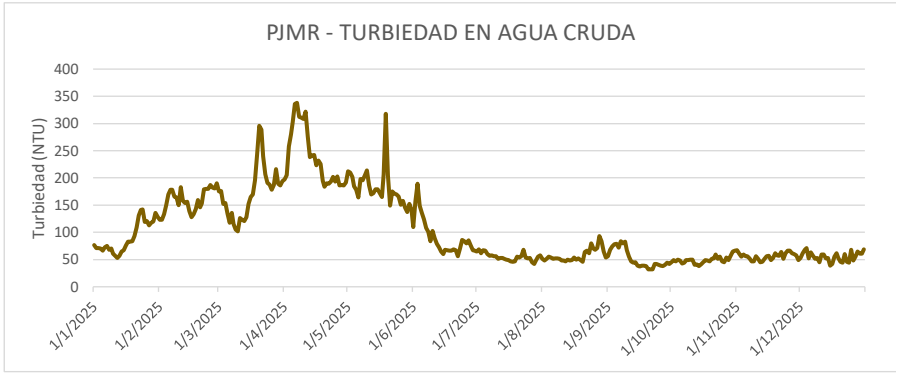


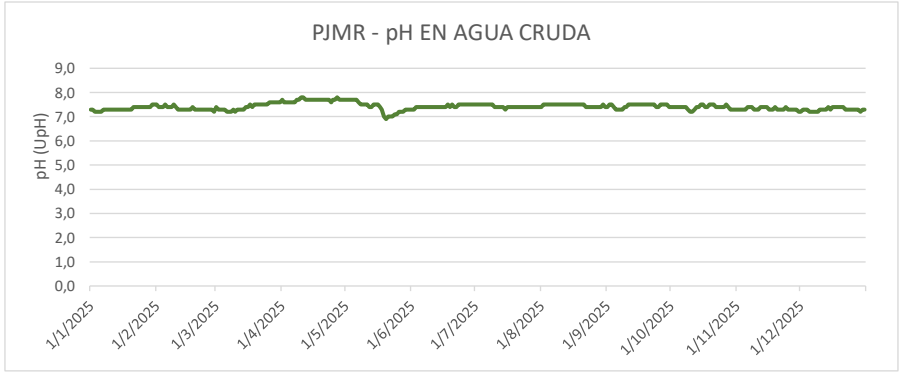


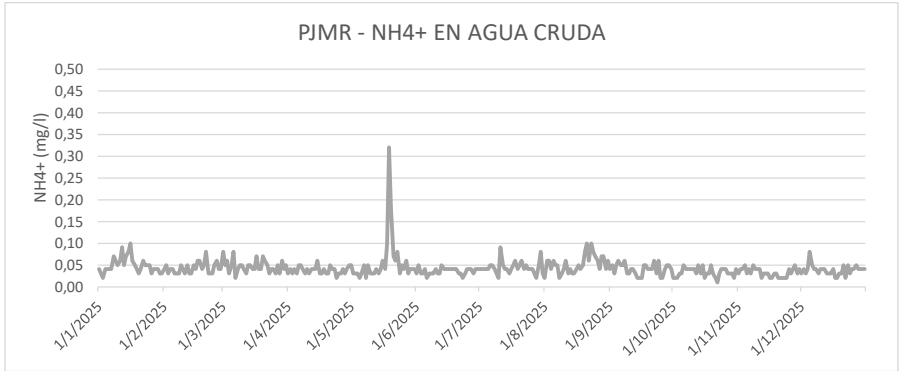


DIRECCIÓN DE AGUA - GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS - CALIDAD PJMR
DATOS PARA GRÁFICOS DE INFORME ANUAL

14/2/2025	156	7,30	0,03	6,9	8,0	0,54	1,61
15/2/2025	139	7,30	0,05	6,6	8,0	0,42	1,63
16/2/2025	128	7,30	0,04	6,8	8,0	0,38	1,56
17/2/2025	133	7,30	0,06	7,0	8,1	0,37	1,66
18/2/2025	143	7,40	0,06	7,0	8,2	0,47	1,72
19/2/2025	159	7,30	0,04	7,7	8,0	0,42	1,61
20/2/2025	146	7,30	0,05	8,0	8,1	0,48	1,60
21/2/2025	153	7,30	0,08	7,2	8,0	0,46	1,64
22/2/2025	179	7,30	0,03	7,4	8,0	0,34	1,61
23/2/2025	180	7,30	0,03	7,4	8,0	0,39	1,59
24/2/2025	180	7,30	0,03	7,7	7,9	0,49	1,54
25/2/2025	187	7,30	0,05	8,1	7,9	0,68	1,58
26/2/2025	182	7,30	0,06	8,4	8,0	0,65	1,61
27/2/2025	181	7,30	0,04	8,2	7,9	0,30	1,67
28/2/2025	190	7,20	0,04	9,2	7,8	0,37	1,63
1/3/2025	175	7,40	0,08	8,7	7,9	0,38	1,65
2/3/2025	176	7,30	0,05	9,0	7,8	0,32	1,68
3/3/2025	152	7,30	0,06	8,9	8,0	0,26	1,62
4/3/2025	154	7,30	0,03	11,8	8,0	0,53	1,58
5/3/2025	134	7,30	0,05	12,4	7,9	0,27	1,62
6/3/2025	118	7,20	0,08	13,0	7,9	0,34	1,43
7/3/2025	136	7,20	0,02	14,2	7,9	0,52	1,50
8/3/2025	115	7,20	0,04	14,9	7,9	0,38	1,56
9/3/2025	105	7,30	0,05	12,6	7,9	0,22	1,58
10/3/2025	102	7,20	0,05	12,4	7,9	0,26	1,56
11/3/2025	126	7,30	0,04	12,9	7,9	0,28	1,54
12/3/2025	123	7,30	0,03	12,3	7,9	0,26	1,51
13/3/2025	121	7,30	0,05	11,5	8,0	0,30	1,62
14/3/2025	128	7,30	0,05	11,2	8,0	0,49	1,59
15/3/2025	152	7,40	0,04	11,3	7,9	0,33	1,56
16/3/2025	165	7,40	0,04	11,0	7,9	0,21	1,64
17/3/2025	170	7,50	0,07	9,7	8,0	0,25	1,59
18/3/2025	196	7,40	0,04	9,5	8,0	0,24	1,63
19/3/2025	244	7,50	0,04	8,8	7,9	0,23	1,66
20/3/2025	296	7,50	0,07	8,7	7,9	0,20	1,63
21/3/2025	289	7,50	0,06	8,8	8,0	0,25	1,59
22/3/2025	240	7,50	0,05	9,5	8,0	0,20	1,70
23/3/2025	207	7,50	0,03	8,5	8,1	0,23	1,72
24/3/2025	191	7,50	0,04	7,3	8,0	0,19	1,70
25/3/2025	188	7,50	0,04	8,2	7,9	0,34	1,61
26/3/2025	178	7,60	0,03	7,3	7,9	0,22	1,72
27/3/2025	187	7,60	0,05	8,5	8,0	0,30	1,70
28/3/2025	216	7,60	0,03	7,8	7,8	0,29	1,63
29/3/2025	189	7,60	0,06	8,0	7,9	0,21	1,71
30/3/2025	186	7,60	0,04	8,0	7,9	0,20	1,70
31/3/2025	194	7,60	0,05	10,0	7,9	0,28	1,66
1/4/2025	197	7,70	0,03	7,3	8,0	0,20	1,61
2/4/2025	205	7,60	0,04	8,3	7,9	0,23	1,66

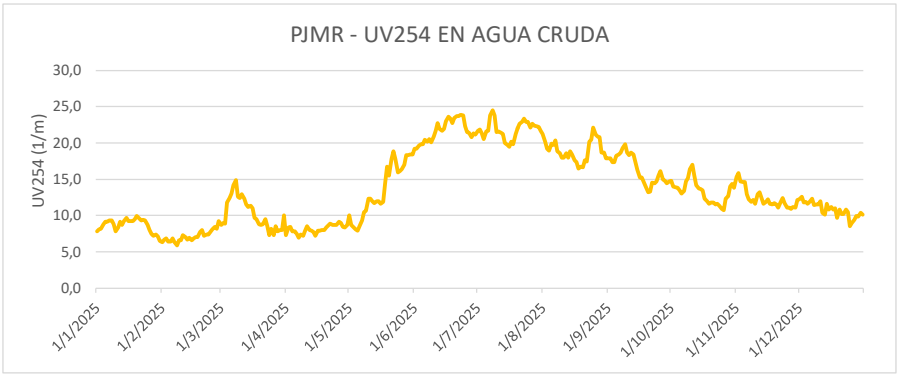


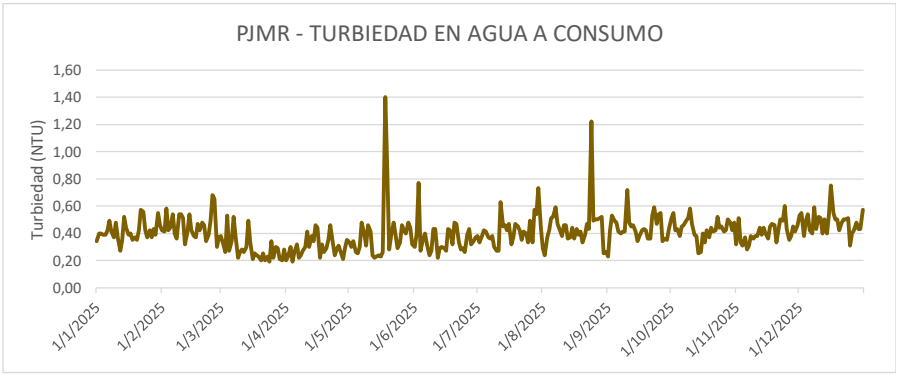

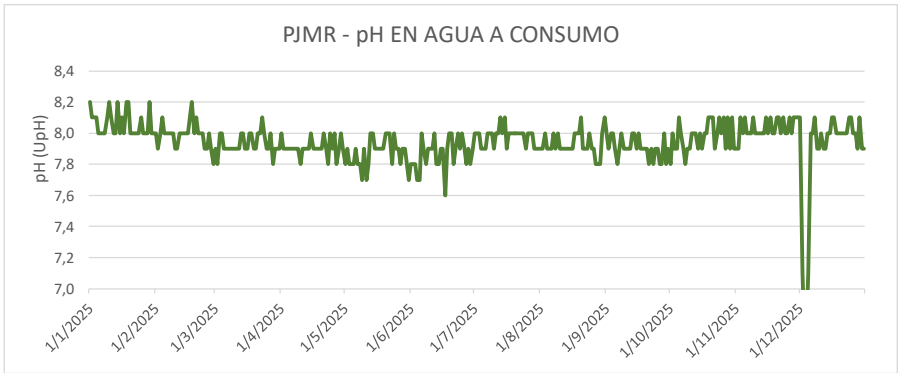

DIRECCIÓN DE AGUA - GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS - CALIDAD PJMR
DATOS PARA GRÁFICOS DE INFORME ANUAL

3/4/2025	258	7,60	0,03	8,4	7,9	0,30	1,57
4/4/2025	280	7,60	0,04	7,8	7,9	0,19	1,61
5/4/2025	303	7,60	0,03	7,8	7,9	0,26	1,62
6/4/2025	336	7,60	0,05	7,5	7,9	0,32	1,52
7/4/2025	338	7,60	0,05	6,9	7,9	0,22	1,50
8/4/2025	312	7,70	0,04	7,4	7,9	0,24	1,53
9/4/2025	311	7,70	0,03	7,2	7,9	0,27	1,64
10/4/2025	308	7,80	0,04	7,9	7,8	0,30	1,54
11/4/2025	322	7,80	0,03	8,5	7,9	0,41	1,48
12/4/2025	277	7,70	0,04	8,0	7,9	0,30	1,45
13/4/2025	238	7,70	0,04	7,9	7,9	0,38	1,49
14/4/2025	241	7,70	0,04	7,7	7,9	0,34	1,59
15/4/2025	242	7,70	0,06	7,2	8,0	0,46	1,54
16/4/2025	223	7,70	0,03	7,9	7,9	0,44	1,54
17/4/2025	232	7,70	0,03	7,9	7,9	0,22	1,51
18/4/2025	226	7,70	0,04	8,0	7,9	0,32	1,53
19/4/2025	195	7,70	0,03	8,0	7,9	0,26	1,61
20/4/2025	184	7,70	0,03	8,3	7,9	0,29	1,49
21/4/2025	190	7,70	0,05	8,6	8,0	0,35	1,52
22/4/2025	189	7,70	0,04	8,9	7,9	0,46	1,46
23/4/2025	193	7,70	0,04	8,7	7,8	0,36	1,47
24/4/2025	202	7,60	0,02	8,7	8,0	0,24	2,06
25/4/2025	193	7,70	0,03	8,7	7,9	0,28	1,50
26/4/2025	203	7,70	0,03	9,1	8,0	0,31	1,44
27/4/2025	186	7,80	0,04	9,0	7,8	0,25	1,49
28/4/2025	187	7,70	0,03	8,4	7,9	0,21	1,56
29/4/2025	186	7,70	0,04	8,3	8,0	0,29	1,55
30/4/2025	192	7,70	0,05	8,7	7,9	0,35	1,43
1/5/2025	212	7,70	0,05	10,0	7,8	0,33	1,49
2/5/2025	210	7,70	0,03	8,7	7,9	0,30	1,58
3/5/2025	202	7,70	0,03	8,3	7,8	0,34	1,58
4/5/2025	185	7,70	0,03	8,1	7,8	0,26	1,60
5/5/2025	178	7,70	0,02	7,9	7,8	0,25	1,62
6/5/2025	164	7,70	0,03	8,5	7,9	0,30	1,55
7/5/2025	198	7,60	0,05	9,3	7,8	0,48	1,53
8/5/2025	196	7,50	0,02	10,5	7,8	0,40	1,57
9/5/2025	204	7,50	0,05	10,6	7,7	0,31	1,67
10/5/2025	214	7,50	0,03	12,3	7,9	0,46	1,55
11/5/2025	186	7,50	0,03	12,3	7,7	0,41	1,50
12/5/2025	170	7,40	0,03	12,0	7,8	0,24	1,61
13/5/2025	172	7,40	0,04	11,7	8,0	0,22	1,65
14/5/2025	179	7,50	0,03	12,0	8,0	0,23	1,60
15/5/2025	179	7,50	0,04	12,0	7,9	0,24	1,57
16/5/2025	172	7,50	0,06	11,6	7,9	0,23	1,59
17/5/2025	165	7,40	0,04	11,9	7,9	0,26	1,57
18/5/2025	207	7,30	0,10	14,4	7,9	1,40	1,51
19/5/2025	318	7,00	0,32	16,7	7,9	0,88	1,68
20/5/2025	204	6,90	0,18	15,5	8,0	0,28	2,12

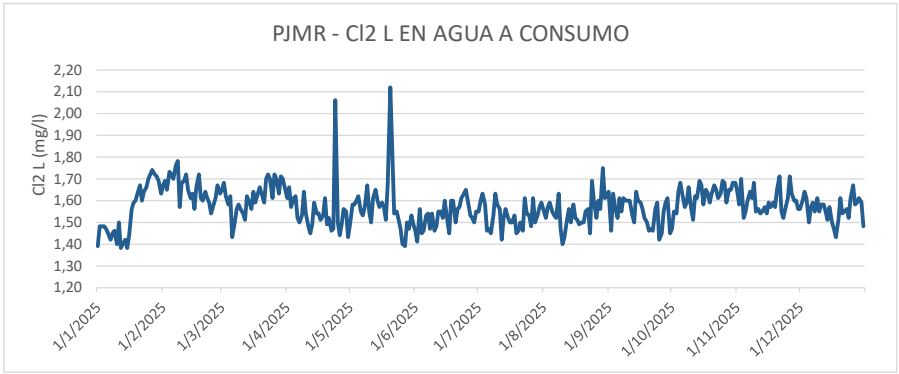

DIRECCIÓN DE AGUA - GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS - CALIDAD PJMR
DATOS PARA GRÁFICOS DE INFORME ANUAL

21/5/2025	149	7,00	0,07	17,8	8,0	0,38	1,83
22/5/2025	175	7,00	0,06	18,8	8,0	0,48	1,54
23/5/2025	171	7,00	0,08	17,8	7,8	0,39	1,55
24/5/2025	170	7,10	0,03	15,9	8,0	0,29	1,51
25/5/2025	166	7,10	0,05	16,1	7,9	0,33	1,47
26/5/2025	151	7,20	0,04	16,4	7,9	0,46	1,40
27/5/2025	158	7,20	0,06	17,0	7,8	0,42	1,39
28/5/2025	145	7,20	0,03	18,3	7,9	0,40	1,50
29/5/2025	137	7,30	0,04	18,3	7,9	0,48	1,47
30/5/2025	152	7,30	0,04	18,4	7,8	0,44	1,53
31/5/2025	141	7,30	0,04	18,4	7,7	0,32	1,49
1/6/2025	110	7,30	0,03	19,2	7,8	0,30	1,46
2/6/2025	157	7,30	0,05	19,2	7,8	0,40	1,41
3/6/2025	189	7,40	0,03	19,6	7,8	0,77	1,56
4/6/2025	149	7,40	0,03	19,8	7,7	0,27	1,45
5/6/2025	136	7,40	0,04	19,8	7,7	0,36	1,46
6/6/2025	124	7,40	0,02	20,4	8,0	0,40	1,53
7/6/2025	108	7,40	0,03	20,2	7,9	0,32	1,54
8/6/2025	101	7,40	0,03	20,5	7,8	0,24	1,47
9/6/2025	84	7,40	0,03	20,1	7,9	0,27	1,54
10/6/2025	103	7,40	0,04	20,9	7,9	0,43	1,46
11/6/2025	89	7,40	0,03	21,7	7,9	0,43	1,48
12/6/2025	79	7,40	0,03	22,7	8,0	0,22	1,55
13/6/2025	73	7,40	0,05	21,9	7,8	0,29	1,55
14/6/2025	65	7,40	0,04	21,7	7,8	0,30	1,52
15/6/2025	60	7,40	0,04	21,9	7,9	0,29	1,60
16/6/2025	68	7,40	0,04	23,0	7,9	0,27	1,53
17/6/2025	67	7,40	0,04	23,6	7,6	0,43	1,45
18/6/2025	66	7,50	0,04	23,3	7,9	0,42	1,60
19/6/2025	66	7,40	0,04	22,7	8,0	0,32	1,60
20/6/2025	69	7,50	0,04	23,4	8,0	0,48	1,50
21/6/2025	67	7,40	0,03	23,7	7,8	0,47	1,56
22/6/2025	56	7,40	0,03	23,7	7,9	0,33	1,57
23/6/2025	70	7,50	0,02	23,9	8,0	0,28	1,61
24/6/2025	86	7,50	0,03	23,8	7,9	0,29	1,63
25/6/2025	84	7,50	0,04	22,3	8,0	0,26	1,65
26/6/2025	80	7,50	0,04	21,5	7,9	0,39	1,60
27/6/2025	85	7,50	0,04	21,4	7,8	0,43	1,53
28/6/2025	76	7,50	0,03	20,8	7,9	0,32	1,52
29/6/2025	67	7,50	0,04	21,3	7,8	0,34	1,50
30/6/2025	66	7,50	0,04	21,1	7,9	0,37	1,55
1/7/2025	65	7,50	0,04	21,7	8,0	0,38	1,55
2/7/2025	69	7,50	0,04	21,8	8,0	0,33	1,60
3/7/2025	62	7,50	0,04	21,3	8,0	0,38	1,63
4/7/2025	67	7,50	0,04	20,5	7,9	0,42	1,58
5/7/2025	66	7,50	0,04	21,6	7,9	0,41	1,46
6/7/2025	60	7,50	0,05	21,7	7,9	0,37	1,47
7/7/2025	57	7,50	0,05	23,8	8,0	0,36	1,45

DIRECCIÓN DE AGUA - GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS - CALIDAD PJMR
DATOS PARA GRÁFICOS DE INFORME ANUAL

8/7/2025	58	7,50	0,04	24,5	8,0	0,38	1,53
9/7/2025	56	7,50	0,03	23,8	8,0	0,30	1,63
10/7/2025	56	7,40	0,02	21,5	7,9	0,27	1,58
11/7/2025	51	7,40	0,09	21,6	8,0	0,27	1,56
12/7/2025	53	7,40	0,05	21,4	8,0	0,63	1,42
13/7/2025	53	7,40	0,04	21,2	8,1	0,45	1,52
14/7/2025	51	7,40	0,04	20,0	8,0	0,46	1,56
15/7/2025	50	7,30	0,03	19,7	8,1	0,42	1,52
16/7/2025	49	7,40	0,04	19,5	7,9	0,47	1,50
17/7/2025	47	7,40	0,05	20,2	8,0	0,32	1,50
18/7/2025	46	7,40	0,06	19,8	8,0	0,37	1,53
19/7/2025	47	7,40	0,04	21,2	8,0	0,47	1,45
20/7/2025	55	7,40	0,05	22,0	8,0	0,45	1,46
21/7/2025	54	7,40	0,06	22,6	8,0	0,42	1,50
22/7/2025	56	7,40	0,04	22,9	8,0	0,35	1,46
23/7/2025	68	7,40	0,05	23,3	8,0	0,41	1,61
24/7/2025	54	7,40	0,04	22,9	8,0	0,40	1,54
25/7/2025	52	7,40	0,04	22,9	7,9	0,33	1,53
26/7/2025	53	7,40	0,04	22,1	8,0	0,49	1,48
27/7/2025	45	7,40	0,03	22,6	8,0	0,33	1,61
28/7/2025	42	7,40	0,02	22,4	8,0	0,57	1,50
29/7/2025	48	7,40	0,05	22,3	7,9	0,54	1,53
30/7/2025	55	7,40	0,08	22,2	7,9	0,73	1,57
31/7/2025	58	7,40	0,03	21,7	7,9	0,44	1,59
1/8/2025	51	7,40	0,02	21,2	7,9	0,29	1,55
2/8/2025	48	7,50	0,06	20,2	7,9	0,24	1,52
3/8/2025	51	7,50	0,06	19,2	8,0	0,37	1,57
4/8/2025	55	7,50	0,04	18,9	7,9	0,42	1,59
5/8/2025	54	7,50	0,06	19,9	7,9	0,51	1,55
6/8/2025	51	7,50	0,05	19,7	7,9	0,52	1,53
7/8/2025	52	7,50	0,05	20,3	8,0	0,59	1,52
8/8/2025	52	7,50	0,02	18,8	7,9	0,47	1,63
9/8/2025	51	7,50	0,03	18,6	8,0	0,43	1,47
10/8/2025	48	7,50	0,04	18,0	7,9	0,38	1,40
11/8/2025	48	7,50	0,06	18,0	7,9	0,46	1,43
12/8/2025	47	7,50	0,03	18,6	7,9	0,46	1,51
13/8/2025	50	7,50	0,04	18,0	7,9	0,36	1,56
14/8/2025	48	7,50	0,03	18,8	7,9	0,37	1,50
15/8/2025	49	7,50	0,03	18,4	7,9	0,44	1,58
16/8/2025	54	7,50	0,04	17,6	7,9	0,36	1,52
17/8/2025	50	7,50	0,05	17,3	8,0	0,43	1,51
18/8/2025	52	7,50	0,04	16,5	8,0	0,39	1,49
19/8/2025	49	7,50	0,05	16,7	8,0	0,41	1,50
20/8/2025	46	7,50	0,08	16,6	8,1	0,33	1,50
21/8/2025	64	7,50	0,10	17,6	7,9	0,39	1,55
22/8/2025	66	7,40	0,06	17,4	7,9	0,47	1,56
23/8/2025	62	7,40	0,10	20,2	7,9	0,43	1,45
24/8/2025	80	7,40	0,08	20,4	8,0	1,22	1,69

DIRECCIÓN DE AGUA - GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS - CALIDAD PJMR
DATOS PARA GRÁFICOS DE INFORME ANUAL

25/8/2025	70	7,40	0,07	22,1	7,9	0,49	1,60
26/8/2025	68	7,40	0,06	21,1	7,9	0,50	1,52
27/8/2025	71	7,40	0,04	20,9	7,8	0,50	1,60
28/8/2025	93	7,40	0,07	20,8	7,8	0,51	1,56
29/8/2025	84	7,40	0,07	18,7	7,8	0,52	1,75
30/8/2025	65	7,50	0,04	18,7	8,0	0,25	1,61
31/8/2025	54	7,40	0,06	17,9	8,1	0,26	1,62
1/9/2025	56	7,40	0,04	17,9	8,0	0,23	1,64
2/9/2025	68	7,50	0,05	17,9	7,9	0,42	1,46
3/9/2025	74	7,50	0,03	17,3	8,0	0,53	1,63
4/9/2025	78	7,40	0,05	17,3	8,0	0,49	1,57
5/9/2025	79	7,30	0,06	18,2	7,9	0,48	1,52
6/9/2025	72	7,30	0,05	18,4	7,8	0,41	1,61
7/9/2025	84	7,30	0,05	18,7	7,9	0,40	1,55
8/9/2025	80	7,30	0,06	19,3	8,0	0,41	1,61
9/9/2025	83	7,40	0,03	19,8	7,9	0,41	1,60
10/9/2025	67	7,40	0,03	18,7	7,9	0,72	1,60
11/9/2025	55	7,50	0,04	18,3	7,9	0,48	1,60
12/9/2025	47	7,50	0,04	18,7	7,9	0,45	1,53
13/9/2025	44	7,50	0,03	18,4	8,0	0,46	1,50
14/9/2025	45	7,50	0,02	17,3	8,0	0,41	1,64
15/9/2025	39	7,50	0,02	16,3	7,9	0,34	1,60
16/9/2025	37	7,50	0,02	15,2	8,0	0,38	1,59
17/9/2025	39	7,50	0,05	15,2	7,9	0,42	1,56
18/9/2025	39	7,50	0,05	14,6	7,9	0,43	1,52
19/9/2025	38	7,50	0,04	14,0	7,9	0,42	1,50
20/9/2025	32	7,50	0,04	13,2	7,9	0,36	1,46
21/9/2025	32	7,50	0,04	13,3	7,8	0,36	1,47
22/9/2025	32	7,50	0,06	14,5	7,9	0,53	1,46
23/9/2025	42	7,50	0,03	14,4	7,8	0,59	1,56
24/9/2025	42	7,40	0,06	14,7	7,9	0,47	1,59
25/9/2025	40	7,40	0,02	15,5	7,9	0,54	1,42
26/9/2025	39	7,50	0,02	16,1	7,8	0,55	1,45
27/9/2025	38	7,50	0,04	15,0	7,8	0,34	1,55
28/9/2025	40	7,50	0,05	14,8	8,0	0,36	1,59
29/9/2025	44	7,50	0,05	14,4	7,8	0,35	1,61
30/9/2025	42	7,40	0,04	14,7	7,9	0,43	1,45
1/10/2025	45	7,40	0,02	14,8	7,8	0,51	1,47
2/10/2025	49	7,40	0,02	14,0	8,0	0,55	1,55
3/10/2025	47	7,40	0,02	13,9	7,9	0,42	1,54
4/10/2025	50	7,40	0,03	13,8	7,9	0,43	1,64
5/10/2025	48	7,40	0,03	13,5	8,1	0,38	1,68
6/10/2025	43	7,40	0,05	13,0	8,0	0,45	1,63
7/10/2025	44	7,40	0,04	13,4	7,9	0,46	1,57
8/10/2025	49	7,40	0,04	14,7	7,8	0,49	1,59
9/10/2025	49	7,30	0,04	15,1	7,9	0,51	1,66
10/10/2025	50	7,20	0,04	16,4	7,9	0,58	1,56
11/10/2025	50	7,20	0,04	17,0	8,0	0,47	1,51

DIRECCIÓN DE AGUA - GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS - CALIDAD PJMR
DATOS PARA GRÁFICOS DE INFORME ANUAL

12/10/2025	40	7,30	0,03	15,5	8,0	0,39	1,62
13/10/2025	41	7,40	0,05	14,2	8,0	0,38	1,61
14/10/2025	38	7,40	0,03	13,7	7,9	0,25	1,69
15/10/2025	41	7,50	0,05	13,6	8,0	0,26	1,67
16/10/2025	45	7,50	0,02	13,5	7,9	0,40	1,58
17/10/2025	49	7,40	0,03	12,3	8,0	0,33	1,65
18/10/2025	48	7,40	0,03	12,0	8,0	0,42	1,63
19/10/2025	47	7,50	0,05	11,6	8,1	0,37	1,59
20/10/2025	51	7,50	0,03	11,8	8,1	0,44	1,63
21/10/2025	52	7,50	0,02	11,8	8,1	0,41	1,67
22/10/2025	59	7,40	0,01	11,5	7,9	0,42	1,65
23/10/2025	51	7,40	0,03	11,6	8,0	0,52	1,61
24/10/2025	55	7,40	0,04	11,3	8,1	0,44	1,63
25/10/2025	47	7,40	0,04	10,9	8,0	0,45	1,69
26/10/2025	45	7,40	0,04	10,7	8,1	0,41	1,68
27/10/2025	54	7,50	0,03	12,3	7,9	0,42	1,59
28/10/2025	49	7,40	0,03	12,7	8,1	0,50	1,65
29/10/2025	57	7,30	0,03	14,0	7,9	0,48	1,65
30/10/2025	65	7,30	0,02	14,3	8,1	0,42	1,68
31/10/2025	66	7,30	0,04	13,8	7,9	0,48	1,68
1/11/2025	67	7,30	0,03	15,3	7,9	0,32	1,64
2/11/2025	61	7,30	0,04	15,8	7,9	0,51	1,58
3/11/2025	55	7,30	0,04	14,7	8,1	0,33	1,70
4/11/2025	59	7,30	0,05	14,6	8,0	0,31	1,52
5/11/2025	56	7,30	0,03	14,6	8,1	0,37	1,55
6/11/2025	56	7,40	0,04	12,9	8,0	0,28	1,60
7/11/2025	52	7,40	0,03	12,2	8,0	0,31	1,64
8/11/2025	47	7,40	0,05	11,9	8,0	0,38	1,61
9/11/2025	47	7,30	0,04	12,1	8,1	0,36	1,68
10/11/2025	56	7,30	0,04	11,6	8,0	0,38	1,55
11/11/2025	51	7,30	0,04	12,9	8,0	0,38	1,56
12/11/2025	45	7,40	0,02	13,2	8,0	0,44	1,54
13/11/2025	46	7,40	0,03	12,4	8,0	0,39	1,55
14/11/2025	51	7,40	0,03	11,6	8,0	0,44	1,57
15/11/2025	56	7,40	0,03	11,9	8,1	0,40	1,54
16/11/2025	57	7,30	0,02	12,2	8,0	0,36	1,59
17/11/2025	49	7,30	0,02	11,6	8,1	0,45	1,57
18/11/2025	53	7,30	0,03	11,5	8,0	0,47	1,59
19/11/2025	62	7,40	0,03	11,7	8,0	0,46	1,57
20/11/2025	58	7,30	0,02	11,5	8,1	0,33	1,65
21/11/2025	57	7,30	0,02	11,1	8,1	0,42	1,71
22/11/2025	64	7,30	0,02	11,9	8,0	0,50	1,55
23/11/2025	51	7,30	0,02	12,4	8,1	0,49	1,52
24/11/2025	62	7,40	0,02	11,7	8,0	0,60	1,56
25/11/2025	66	7,30	0,04	11,1	8,0	0,43	1,61
26/11/2025	66	7,30	0,03	11,1	8,1	0,35	1,71
27/11/2025	62	7,30	0,04	10,9	8,0	0,38	1,63
28/11/2025	60	7,30	0,05	11,2	8,1	0,45	1,60

DIRECCIÓN DE AGUA - GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS - CALIDAD PJMR
DATOS PARA GRÁFICOS DE INFORME ANUAL

29/11/2025	58	7,30	0,03	11,1	8,1	0,41	1,60
30/11/2025	49	7,20	0,04	12,1	8,1	0,46	1,56
1/12/2025	53	7,20	0,03	12,2	8,1	0,53	1,56
2/12/2025	62	7,30	0,04	12,6	7,1	0,55	1,60
3/12/2025	68	7,30	0,03	11,8	6,7	0,38	1,64
4/12/2025	71	7,30	0,04	11,9	6,7	0,49	1,61
5/12/2025	52	7,20	0,08	11,6	7,1	0,54	1,50
6/12/2025	63	7,20	0,05	12,0	8,0	0,42	1,57
7/12/2025	57	7,20	0,04	12,3	8,0	0,40	1,59
8/12/2025	51	7,20	0,04	11,4	8,1	0,59	1,55
9/12/2025	53	7,20	0,03	11,5	7,9	0,43	1,61
10/12/2025	45	7,30	0,04	11,5	7,9	0,52	1,55
11/12/2025	59	7,30	0,04	12,0	8,0	0,51	1,58
12/12/2025	59	7,30	0,04	10,4	7,9	0,40	1,58
13/12/2025	52	7,30	0,03	10,1	7,9	0,50	1,55
14/12/2025	53	7,40	0,03	11,6	8,0	0,40	1,51
15/12/2025	39	7,30	0,03	10,8	8,0	0,54	1,57
16/12/2025	42	7,40	0,04	11,2	8,1	0,75	1,50
17/12/2025	55	7,40	0,02	10,8	8,1	0,55	1,47
18/12/2025	62	7,40	0,02	11,0	8,0	0,50	1,43
19/12/2025	53	7,40	0,03	9,7	8,0	0,50	1,51
20/12/2025	46	7,40	0,03	10,8	8,0	0,42	1,61
21/12/2025	44	7,40	0,05	10,2	8,0	0,48	1,54
22/12/2025	60	7,30	0,02	10,2	8,0	0,50	1,55
23/12/2025	46	7,30	0,05	10,8	8,0	0,50	1,56
24/12/2025	44	7,30	0,03	10,5	8,1	0,51	1,52
25/12/2025	68	7,30	0,04	8,5	8,1	0,31	1,61
26/12/2025	48	7,30	0,04	9,0	8,0	0,40	1,67
27/12/2025	55	7,30	0,05	9,4	8,0	0,42	1,58
28/12/2025	65	7,30	0,04	9,9	7,9	0,48	1,59
29/12/2025	61	7,20	0,04	9,8	8,1	0,43	1,61
30/12/2025	61	7,30	0,04	10,4	7,9	0,43	1,59
31/12/2025	69	7,30	0,04	10,1	7,9	0,57	1,48

1.1.3 Calidad Agua Producida

Cod. Viejo	Cod. Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Promedio Mensual	Observaciones/Justificaciones
	CA-PR-01	PLANTA SAN MARTIN																
	CA-PR-01.01	TURBIEDAD																
CA-PR-01.01	CA-PR-01.01.01	% de tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU PSM - Salida IMPELENTES	% de Tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU Def: (N° muestras con Turb. < 1 NTU cada 10 minutos / N° de muestras totales)*100 Valor ref: >=95%	%	100,00	100,00	96,60	99,20	92,00	70,20	96,40	88,20	80,70	95,40	96,10	95,40	92,52	
CA-PR-01.02	CA-PR-01.01.02	% de tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU PSM - Salida NORTE	% de Tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU Def: (N° muestras con Turb. < 1 NTU cada 10 minutos / N° de muestras totales)*100 Valor ref: >=95%	%	99,40	100,00	93,90	100,00	84,60	53,40	57,50	53,40	66,60	95,90	93,90	95,90	82,88	
CA-PR-01.03	CA-PR-01.01.03	% de tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU PSM - Salida SUR	% de Tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU Def: (N° muestras con Turb. < 1 NTU cada 10 minutos / N° de muestras totales)*100 Valor ref: >=95%	%	99,80	100,00	99,70	99,00	98,70	95,30	100,00	100,00	99,50	100,00	100,00	100,00	99,33	
Nuevo	CA-PR-01.01.04	% de tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU PSM - CENTRO	% de Tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU Def: (N° muestras con Turb. < 1 NTU cada 10 minutos / N° de muestras totales)*100 Valor ref: >=95%	%	98,70	100,00	96,40	99,20	81,10	41,80	50,80	56,30	55,80	88,10	93,80	88,10	79,18	
	CA-PR-01.02	pH																
CA-PR-02.01	CA-PR-01.02.01	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM Def: (en %) 100xN° muestras con pH = pHsat +/- 1 / N° muestras totales Valor ref: >=90%	%	89,83	84,13	62,90	56,38	37,40	38,90	71,93	66,28	38,75	41,63	70,25	41,63	58,33	Diciembre: El incumplimiento se atribuye a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua de cal como consecuencia de aumentos en la dosificación de solución clorógena que produce una
CA-PR-02.02	CA-PR-01.02.02	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM - Salida IMPELENTES	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM Def: (en %) 100 x N° muestras con pH = pHsat +/- 1 / N° muestras totales Valor ref: >=90%	%	93,10	84,80	68,30	83,60	57,60	29,30	77,90	74,90	53,40	56,50	74,50	56,50	67,53	Diciembre: El incumplimiento se atribuye a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua
CA-PR-02.03	CA-PR-01.02.03	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM - Salida NORTE	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM Def: (en %) 100xN° muestras con pH = pHsat +/- 1/ N° muestras totales Valor ref: >=90%	%	89,40	86,10	66,50	82,60	48,10	36,60	78,70	62,10	35,40	30,70	71,90	30,70	59,90	Diciembre: El incumplimiento se atribuye a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua
CA-PR-02.04	CA-PR-01.02.04	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM - Salida SUR	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM Def: (en %) 100xN° muestras con pH = pHsat +/- 1/ N° muestras totales Valor ref: >=90%	%	87,50	89,60	73,20	32,00	18,00	54,60	80,10	81,80	37,20	42,60	68,50	42,60	58,98	Diciembre: El incumplimiento se atribuye a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua de cal como consecuencia de
CA-PR-02.05	CA-PR-01.02.05	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM - Salida CENTRO	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PSM Def: (en %) 100xN° muestras con pH = pHsat +/- 1/ N° muestras totales Valor ref: >=90%	%	89,30	76,00	43,60	27,30	25,90	35,10	51,00	46,30	29,00	36,70	66,10	36,70	46,92	Diciembre: El incumplimiento se atribuye a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua de cal como consecuencia de
	CA-PR-01.04	BACTERIOLOGÍA																
	CA-PR-01.04.01	Número de muestras	Total de muestras (CT-EC-BHA-PA)	N°	370	334	366	357	367	359	371	370	357	369	360	369		
CA-PR-10.02	CA-PR-01.04.02	% Muestras bacteriológicamente conformes PSM	% Muestras bacteriológicamente conformes PSM Def: (en %) 100 x N° muestras conform (CT-EC-BHA-PA) / N° muestras (CT-EC-BHA-PA) totales Valor ref: 100%"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
	CA-PR-01.05	ALUMINIO																
CA-PR-14.01	CA-PR-01.05.01	Número de Muestras	Número de muestras totales	N°	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124		
	CA-PR-01.05.02	% Muestras medidas por LP-PSM con Al <= 0,20 mg/l	% Muestras medidas por LP-PSM con Al <=0,20 mg/l Def: (en %) 100 x N° muestras con Al <=0,20 mg/l / N° muestras totales Valor ref: 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	

Cod. Viejo	Cod. Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Promedio Mensual	Observaciones/Justificaciones
	CA-PR-01.08	DATOS BÁSICOS																
CA-PR-27	CA-PR-01.08.01	Datos básicos en PSM (*1)	"Datos básicos en PSM (*1) Def: 100 x Cantidad total de muestras con ensayos de datos básicos exigidos realizados / Cantidad total de muestras con ensayos de datos básicos exigidos Valor ref: 100% "	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
	CA-PR-02	PLANTA MANUEL BELGRANO																
	CA-PR-02.01	TURBIEDAD																
CA-PR-02.01	CA-PR-02.01.01	% de tiempo con turbiedad de agua producida PMB - Salida RÍO SUBTERRÁNEO	% de Tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU Def: (N° muestras con Turb. < 1 NTU cada 10 minutos / N° de muestras totales)*100 Valor ref: 95%	%	87,63	66,42	49,31	51,50	28,20	0,00	3,76	32,71	20,86	39,34	39,65	66,57	40,50	CA-PR-02.01.01: % de tiempo con turbiedad de agua producida PMB - Salida RÍO SUBTERRÁNEO El 31,8% de los datos se encontraron por encima de 1 NTU en salida Río Subterráneo debido a una baja remoción en la batería de filtros de
CA-PR-02.02	CA-PR-02.01.02	% de tiempo con turbiedad de agua producida PMB - Salida BERNAL I	% de Tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU Def: (N° muestras con Turb. < 1 NTU cada 10 minutos / N° de muestras totales)*100 Valor ref: 95%	%	99,41	98,34	96,59	98,59	93,86	93,32	87,50	91,11	96,22	98,86	96,48	91,99	95,19	CA-PR-02.01.02: % de tiempo con turbiedad de agua producida PMB - Salida BERNAL I El 4,5% de los datos se encontraron por encima de 1 NTU en salida Bernal I debido a problemas operativos en la unidad de decantación C del Módulo Superpulsator. El 1,5% de los desvíos corresponde a un descenso de la
CA-PR-02.03	CA-PR-02.01.03	% de tiempo con turbiedad de agua producida PMB - Salida BERNAL IV	% de Tiempo con turbiedad de agua producida < 1NTU Def: (N° muestras con Turb. < 1 NTU cada 10 minutos / N° de muestras totales)*100 Valor ref: 95%	%	100,00	99,16	86,81	96,74	89,94	97,29	99,17	92,62	94,11	98,01	79,03	81,50	92,86	CA-PR-02.01.03: % de tiempo con turbiedad de agua producida PMB - Salida BERNAL IV El 7,6% de los datos se encontraron por encima de 1 NTU en salida Bernal IV debido a problemas operativos en la unidad de decantación C del Módulo Superpulsator. El 6,8% de los desvíos corresponde a un descenso
	CA-PR-02.02	pH																
CA-PR-03.01	CA-PR-02.02.01	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PMB	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PMB Def: (en %) 100xN° muestras con pH = pHsat +/- 1 / N° muestras totales Valor ref: 90%	%	94,83	96,68	93,11	86,85	75,43	76,43	83,95	83,59	86,07	92,93	93,16	91,78	87,90	
CA-PR-03.02	CA-PR-02.02.02	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PMB - Salida RÍO SUBTERRÁNEO	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PMB RS Def: (en %) 100xN° muestras con pH = pHsat +/- 1 / N° muestras totales Valor ref: 90%	%	96,73	97,32	94,58	81,55	63,22	66,46	73,72	93,92	97,01	99,28	99,42	94,67	88,16	
CA-PR-03.03	CA-PR-02.02.03	"% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PMB - Salida BERNAL I"	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PMB BI Def: (en %) 100xN° muestras con pH = pHsat +/- 1 / N° muestras totales Valor ref: 90%	%	94,91	96,88	93,20	88,40	83,67	85,33	89,00	76,31	78,81	81,88	88,36	85,97	86,89	CA-PR-02.02.03: % Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PMB - Salida Bernal I El 5,9% de los datos se encontraron fuera del rango de pH en salida Bernal I debido a ajustes imprecisos de la dosis de cal. El 5,4% de los desvíos corresponde a insuficiencia
CA-PR-03.04	CA-PR-02.02.04	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PMB - Salida BERNAL IV	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PMB BIV Def: (en %) 100xN° muestras con pH = pHsat +/- 1 / N° muestras totales Valor ref: >=90%	%	92,85	95,86	91,55	90,60	79,39	77,52	89,14	80,53	82,36	97,63	91,69	94,69	88,65	
	CA-PR-02.04	BACTERIOLOGÍA																
CA-PR-09.01	CA-PR-02.04.01	Número de muestras	Total de muestras (CT-EC-BHA-PA)	N°	275	245	279	270	275	270	279	279	270	279	270	279		
CA-PR-09.02	CA-PR-02.04.02	% Muestras bacteriológicamente conformes PMB	"% Muestras bacteriológicamente conformes PMB Def: (en %) 100 x N° muestras conform (CT-EC-BHA-PA) / N° muestras (CT-EC-BHA-PA) totales Valor ref: 100% "	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
	CA-PR-02.05	ALUMINIO																
CA-PR-13.01	CA-PR-02.05.01	Número de muestras	Número de muestras totales	N°	93	84	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93		

Cod. Viejo	Cod. Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Promedio Mensual	Observaciones/Justificaciones
CA-PR-13.02	CA-PR-02.05.02	% Muestras medidas por LP-PMB con Al <= 0,20 mg/l	"% Muestras medidas por LP-PMB con Al <= 0,20 mg/l Def: (en %) 100 x N° muestras con Al <= 0,20 mg/l / N° muestras totales Valor ref: 100%"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
	CA-PR-02.08	DATOS BÁSICOS																
CA-PR-26	CA-PR-02.08.01	Datos básicos en PMB(*1)	"Datos básicos en PMB(*1) Def: 100 x Cantidad total de muestras con ensayos de datos básicos exigidos realizados / Cantidad total de muestras con ensayos de datos básicos exigidos Valor ref: 100% "	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
	CA-PR-03	PLANTA JUAN MANUEL DE ROSAS																
	CA-PR-03.01	TURBIEDAD																
CA-PR-03.01	CA-PR-03.01.01	% de tiempo con turbiedad de agua producida PJMR	% de Tiempo con turbiedad de agua producida PJMR sobre muestras reportadas cada 10 minutos validadas. Def: (N° muestras con Turb. < 1 NTU cada 10 minutos validadas / N° de muestras totales)*100 Valor ref: >=95%	%	100	99,33	98,70	100,00	97,54	99,68	99,60	98,72	99,40	100,00	99,98	99,64	99,38	
	CA-PR-03.02	pH																
CA-PR-05	CA-PR-03.02.01	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1	% Tiempo con pH = pHsat +/- 1 PJMR sobre muestras reportadas cada 10 minutos validadas. Def: (N° muestras con pH = pHsat +/- 1/ N° muestras totales)*100 Valor ref: >=90%	%	99,01	99,6	99,71	95,78	98,52	95,81	97,55	99,28	99,49	97,99	98,66	88,64	97,50	
	CA-PR-03.04	BACTERIOLOGIA																
CA-PR-12.01	CA-PR-03.04.01	Número de muestras	Total de muestras (CT-EC-BHA-PA)	N°	93	84	93	90	93	90	93	93	90	93	90	100		
CA-PR-12.02	CA-PR-03.04.02	% Muestras bacteriológicamente conformes PJMR	"% Muestras bacteriológicamente conformes PJMR Def: (en %) 100 x N° muestras conforme (CT-EC-BHA-PA) / N° muestras (CT-EC-BHA-PA) totales Valor ref: 100% "	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CA-PR-03.05	ALUMINIO																
CA-PR-15.01	CA-PR-03.05.01	Muestras del PMA	Número de muestras totales	N°	31	28	33	30	33	31	31	31	30	31	30	32		
CA-PR-15.02	CA-PR-03.05.02	% Muestras medidas por LC-PJMR con Al <= 0,20 mg/l	% Muestras medidas por LC-PPJMR con Al <= 0,20 mg/l Def: (en %) 100 x N° muestras con Al <= 0,20 mg/l / N° muestras totales Valor ref: 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CA-PR-03.08	DATOS BÁSICOS																
	CA-PR-03.08.1	Datos básicos en PJMR(*1)	"Datos básicos en PJMR (*1) Def: 100 x Cantidad total de muestras con ensayos de datos básicos exigidos realizados / Cantidad total de muestras con ensayos de datos básicos exigidos Valor ref: 100% "	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CA-PR-04	PLANTAS- INDICADORES CONJUNTO																
		ALUMINIO																
CA-PR-16.01	CA-PR-04.05.01	Número de muestras	Número de muestras totales	N°	248	224	250	241	250	241	248	248	240	248	240	249		
CA-PR-16.02	CA-PR-04.05.02	% Muestras medidas con Al <= 0,20 mg/l	% Muestras medidas por LP de PMB y PSM y PJMR con Al <= 0,20 mg/l Def: (en %) 100 x N° muestras con Al <=0,20 mg/l /N° muestras totales Valor ref: 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
	CA-PR-04.08	DATOS BÁSICOS																
CA-PR-29	CA-PR-04.08.01	Datos básicos en PLANTAS (*1=pH, Turbiedad, Alcalinidad, Cloro Residual Libre)	Datos básicos en PLANTAS (*1) Def: 100 x Cantidad total de muestras con ensayos de datos básicos exigidos realizados / Cantidad total de muestras con ensayos de datos básicos exigidos Valor ref: 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Cod. Viejo	Cod. Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Promedio Mensual	Observaciones/Justificaciones
CA-PR-30	CA-PR-04.10	Bacteriológico diario - Salidas Plantas (*2)	"Bacteriológico diario - Salidas Plantas (*2) Def: 100 x Cantidad total de muestras con parámetros bacteriológicos exigidos realizados / Cantidad total de muestras con parámetros bacteriológicos exigidos Valor ref: 100%"	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL TRATADA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-A-CA-PR-01 "A" (ex PL 05/A)

Parámetro	Color (U. de Color)	Olor y Sabor	Alcalinidad total (CO3Ca) [mg/l]	Arsénico total [µg/l]	Cadmio [µg/l]	Cianuros totales [mg/l]	Cloruros [mg/l]	Cobre [mg/l]	Cromo [µg/l]	Dureza total (CO3Ca) [mg/l]	Fluoruros [mg/l]	Hierro [mg/l]	Manganeso [mg/l]
Est. Gral. San Martín													
N° de muestras	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	100,0
N° de no conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Valor Promedio	<5	-	39,3	<5	<0,1	<0,05	41,0	<0,05	<5	62,7	<0,5	<0,05	<0,04
Valor Máximo	<5	-	72,0	<5	<0,1	<0,05	71,1	<0,05	<5	91,0	<0,5	0,11	0,05
Coeficiente de Variación	0%	-	31,3%	0,0%	0,0%	0,0%	30,5%	0,0%	0,0%	19,3%	0,0%	49,8%	41,1%
Est. Gral. M. Belgrano													
N° de muestras	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° de no conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Promedio	<5	-	53,4	<5	<0,1	<0,05	44,1	<0,05	<5	63,1	<0,5	<0,05	<0,04
Valor Máximo	<5	-	88,6	<5	<0,1	<0,05	70,8	<0,05	<5	94,0	<0,5	0,05	0,04
Coeficiente de Variación	0%	-	27,4%	0,0%	0,0%	0,0%	25,5%	0,0%	0,0%	18,9%	0,0%	21,7%	16,0%
Planta J.M. de Rosas													
N° de muestras	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° de no conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Promedio	<5	-	38,8	<5	<0,1	<0,05	32,9	<0,05	<5	49,3	<0,5	<0,05	<0,04
Valor Máximo	<5	-	65,3	<5	<0,1	<0,05	40,1	<0,05	<5	58,0	<0,5	<0,05	<0,04
Coeficiente de Variación	0%	-	33,2%	0,0%	0,0%	0,0%	18,5%	0,0%	0,0%	18,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Parámetro	Mercurio [µg/l]	Nitratos (NO3) [mg/l]	Plomo [µg/l]	Selenio [µg/l]	Residuo conductimétrico [mg/l]	Sulfatos [mg/l]	Cinc [mg/l]	Trihalometanos totales [µg/l]	Aldrin [µg/l]	Dieldrin [µg/l]	Clordano [µg/l]	DDT (total isómeros) [µg/l]	M.B.A.S. [mg/l]
Est. Gral. San Martín													
N° de muestras	48	48	48	48	48	48	48	44	16	16	16	16	48
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° de no conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Promedio	<0,5	3,0	<5	<5	205	31,9	<0,05	44,2	<0,01	<0,01	<0,1	<1	<0,2
Valor Máximo	<0,5	4,8	<5	<5	303	72,9	<0,05	82,9	<0,01	<0,01	<0,1	<1	<0,2
Coeficiente de Variación	0%	23%	0,0%	0,0%	24,7%	45,5%	0,0%	43,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Est. Gral. M. Belgrano													
N° de muestras	37	37	37	37	37	37	37	28	12	12	12	12	37
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° de no conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Promedio	<0,5	4,9	<5	<5	216	25,4	<0,05	52,4	<0,01	<0,01	<0,1	<1	<0,2
Valor Máximo	<0,5	8,7	<5	<5	336	36,3	0,25	87,3	<0,01	<0,01	<0,1	<1	<0,2
Coeficiente de Variación	0%	32%	0,0%	0,0%	24,7%	23,7%	119,0%	36,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Planta J.M. de Rosas													
N° de muestras	12	12	12	12	12	12	12	9	4	4	4	4	12
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° de no conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Promedio	<0,5	3,18	<5	<5	175	21,7	<0,05	52,3	<0,01	<0,01	<0,1	<1	<0,2
Valor Máximo	<0,5	8,3	<5	<5	251	31,2	<0,05	96,2	<0,01	<0,01	<0,1	<1	<0,2
Coeficiente de Variación	0%	63%	0,0%	0,0%	25,2%	25,3%	0,0%	51,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL TRATADA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-A-CA-PR-01 "B" (ex PL 05/B)

Parámetro	Heptacloro [µg/l]	Heptacloroepóxido [µg/l]	Lindano (gammaHCH) [µg/l]	Metoxicloro [µg/l]	2,4-D [µg/l] (*)	Benceno [µg/l]	Hexaclorobenceno [µg/l]	Monoclorobenceno [µg/l]	1,2-diclorobenceno [µg/l]	1,4-diclorobenceno [µg/l]	Clorofenoles totales [µg/l]	Tetracloruro de carbono [µg/l]
Est. Gral. San Martín												
N° de muestras	16	16	16	16	-	12	16	12	12	12	48	12
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° de no conformes	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Valor Promedio	<0,04	<0,04	<0,04	<5	-	<2,5	<0,01	<2,5	<0,3	<0,1	<1	<0,5
Valor Máximo	<0,04	<0,04	<0,04	<5	-	<2,5	<0,01	<2,5	<0,3	<0,1	<1	<0,5
Coeficiente de Variación	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Est. Gral. M. Belgrano												
N° de muestras	12	12	12	12	-	6	12	6	6	6	37	6
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° de no conformes	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Valor Promedio	<0,04	<0,04	<0,04	<5	-	<2,5	<0,01	<2,5	<0,3	<0,1	<1	<0,5
Valor Máximo	<0,04	<0,04	<0,04	<5	-	<2,5	<0,01	<2,5	<0,3	<0,1	<1	<0,5
Coeficiente de Variación	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Planta J.M. de Rosas												
N° de muestras	4	4	4	4	-	5	6	2	2	2	12	2
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° de no conformes	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Valor Promedio	<0,04	<0,04	<0,04	<5	-	<2,5	<0,01	<2,5	<0,3	<0,1	<1	<0,5
Valor Máximo	<0,04	<0,04	<0,04	<5	-	<2,5	<0,01	<2,5	<0,3	<0,1	<1	<0,5
Coeficiente de Variación	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Parámetro	1,1-dicloroeteno [µg/l]	Tricloroetileno [µg/l]	1,2-dicloroetano [µg/l]	1,1,1-tricloroetano [µg/l]	Cloruro de Vinilo [µg/l]	Benzo(a)pireno [µg/l]	Tolueno [µg/l]	Etilbenceno [µg/l]	Estireno [µg/l]	Tetracloroetano [µg/l]	Bacterias heterótrofas viables a 36°C [UFC/ml] (**)	Pseudomonas aeruginosa [PA/100 ml] (**)
Est. Gral. San Martín												
N° de muestras	12	12	12	12	4	16	12	12	12	12	-	-
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
N° de no conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Valor Promedio	<0,2	<0,5	<1	<0,5	<2	<0,01	<5	<5	<5	<0,5	-	-
Valor Máximo	<0,2	<0,5	<1	<0,5	<2	<0,01	<5	<5	<5	<0,5	-	-
Coeficiente de Variación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
Est. Gral. M. Belgrano												
N° de muestras	15	6	6	6	6	11	6	6	6	6	-	-
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
N° de no conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Valor Promedio	<0,2	<0,5	<1	<0,5	<2	<0,01	<5	<5	<5	<0,5	-	-
Valor Máximo	<0,2	<0,5	<1	<0,5	<2	<0,01	<5	<5	<5	<0,5	-	-
Coeficiente de Variación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
Planta J.M. de Rosas												
N° de muestras	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	-	-
% conformes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
N° de no conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Valor Promedio	<0,2	<0,5	<1	<0,5	<2	<0,01	<5	<5	<5	<0,5	-	-
Valor Máximo	<0,2	<0,5	<1	<0,5	<2	<0,01	<5	<5	<5	<0,5	-	-
Coeficiente de Variación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-

(*) El parámetro 2,4-D no pudo ser analizado debido a la falta de disponibilidad operativa de los equipos del Laboratorio Central, situación que fue oportunamente comunicada al ERAS mediante la Nota N° NO-2025-00000579-AYSA-DMA#AYSA.
Cabe señalar que este compuesto se encuentra alcanzado por las restricciones establecidas en el Convenio de Estocolmo, incorporado a la normativa nacional a través de la Ley 26.011 y la Resolución 451/2019, actualizada por la Resolución 291/2020, que regulan su uso, importación y exportación.
Asimismo, se destaca que AySA cuenta, desde el año 2013, con registros históricos trazables que evidencian la ausencia de detecciones de este compuesto en el área de concesión.

(**) Los parámetros Bacterias heterótrofas viables a 36°C y Pseudomonas aeruginosa dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL TRATADA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-A-CA-PR-01 "C" (ex PL 05/C)

Parámetro	Dibromoclorometano [µg/l]	Bromodiclorometano [µg/l]	Cloroformo [µg/l]	Bromoformo [µg/l]	Calcio [mg/l]	Magnesio [mg/l]	Sodio [mg/l]	Potasio [mg/l]	Oxidabilidad al KMnO4 (O2) [mg/l]
Est. Gral. San Martín									
N° de muestras	44	44	44	43	48	48	48	48	-
% conformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de no conformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor Promedio	2,4	9,6	32,2	<1	18,1	4,2	30,9	4,2	-
Valor Máximo	4,6	19,8	61,3	<1	27,7	5,9	54,0	6,2	-
Coeficiente de Variación	47,2%	45,0%	45,0%	0,0%	20,6%	19,5%	32,2%	23,5%	-
Est. Gral. M. Belgrano									-
N° de muestras	28	28	28	28	37	37	37	37	-
% conformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de no conformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor Promedio	3,8	12,1	36,5	<1	17,5	4,7	35,2	4,5	-
Valor Máximo	7,9	21,9	60,5	<1	26,5	6,8	64,0	7,3	-
Coeficiente de Variación	58,3%	43,9%	38,8%	0,0%	19,2%	19,5%	29,6%	25,2%	-
Planta J.M. de Rosas									-
N° de muestras	9	9	9	9	12	12	12	12	-
% conformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de no conformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor Promedio	3,1	12,1	36,8	<1	13,7	3,6	26,3	3,6	-
Valor Máximo	7,4	22,0	70,0	<1	16,2	4,5	39,0	4,4	-
Coeficiente de Variación	65,4%	56,6%	55,3%	0,0%	20,7%	16,0%	28,1%	19,0%	-

Parámetro	Silicio (mg/l)	Oxigeno disuelto (O2) [mg/l] (***)	Nitritos (NO2) [mg/l]	Amonio (NH4+) [mg/l] (***)	Conductividad [µS/cm]	Temperatura in situ [°C]	pH de saturación [unidades]	Cloro residual Total (mg/l) (***)	Fosfatos (mg/l)	U,V, 254 (m-1) (***)
Est. Gral. San Martín										
N° de muestras	16	-	48	-	48	-	48	-	48	-
% conformes	-	-	100,0	-	-	-	56,3	-	-	-
N° de no conformes	-	-	0	-	-	-	21	-	-	-
Valor Promedio	5,9	-	<0,01	-	304	-	8,5	-	<0,5	-
Valor Máximo	7,1	-	<0,01	-	449	-	9,0	-	<0,5	-
Coeficiente de Variación	7,9%	-	0,0%	-	24,7%	-	2,4%	-	0,0%	-
Est. Gral. M. Belgrano		-		-		-		-		-
N° de muestras	12	-	37	-	37	-	37	-	37	-
% conformes	-	-	100,0	-	-	-	62,2	-	-	-
N° de no conformes	-	-	0	-	-	-	14	-	-	-
Valor Promedio	6,9	-	<0,01	-	320	-	8,4	-	<0,5	-
Valor Máximo	7,4	-	<0,01	-	498	-	8,7	-	<0,5	-
Coeficiente de Variación	7,4%	-	0,0%	-	24,7%	-	2,0%	-	0,0%	-
Planta J.M. de Rosas		-		-		-		-		-
N° de muestras	4	-	12	-	12	-	12	-	12	-
% conformes	-	-	100,0	-	-	-	83,3	-	-	-
N° de no conformes	-	-	0	-	-	-	2	-	-	-
Valor Promedio	5,7	-	<0,01	-	259	-	8,6	-	<0,5	-
Valor Máximo	6,5	-	<0,01	-	372	-	9,1	-	<0,5	-
Coeficiente de Variación	9,5%	-	0,0%	-	25,3%	-	2,6%	-	0,0%	-

NOTA GENERAL: Para el cálculo de los promedios con valores no detectados (nondetects) se utilizaron las metodologías conforme los siguientes rangos:

Rango de "No detectados"	***Forma de cálculo:***
< 15%	Reemplazar los "nondetects" por "DL/2"
15% - 50 %	Ajuste de Cohen y desviación estándar
> 50% - 90%	Test de Proporciones (percentiles)

Bibliografía: Guidance for Data Quality Assesment: A Reviewer´s Guide - EPA QA/G-9R. February 2006.-

Para los casos donde el 100% de las muestras son nondetects, se determina el promedio de la concesión como menor al límite de cuantificación. Para el caso donde las muestras nondetects son mayores al 90% pero menores al 100%, se utilizó para el cálculo de los promedios de la concesión, la media estadística del rango comprendido de aquellos valores menores al límite de detección. Si el promedio obtenido para el total de la concesión es menor que el límite de cuantificación, se expresa como menor al límite de cuantificación.

(***) Los parámetros Oxígeno Disuelto, amonio, cloro residual y UV 254 se dejaron de analizarse en el programa anual de monitoreo a partir de julio de 2024, en el marco de la adecuación de los planes al Marco Regulatorio vigente.
Cabe aclarar que continúan realizándose a través del control operativo de Plantas.

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

ÁREA DE ACCIÓN

CÓD Nº	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**Nº**	1112	1104	1108	1110	1109	1118	1115	1109	1118	1107	1109	1110	
CA-RE-01.02	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	99,55	99,64	99,82	99,82	99,82	99,91	99,73	99,73	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**Nº**	1112	1104	1108	1110	1108	1120	1115	1109	1118	1107	1108	1110	
CA-RE-02.02	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	99,37	100,00	99,82	99,55	99,64	99,46	99,91	99,83	99,64	100,00	99,91	99,82	Ver detalles en SM-EE
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**Nº**	1112	1104	1108	1110	1108	1089	1115	1109	1118	1107	1108	1110	
CA-RE-03.02	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	99,91	99,64	99,37	99,37	96,78	96,32	95,67	95,71	95,66	96,03	95,59	Ver detalles en CE-LMO-MN
CA-RE-03.03	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	95,00	95,05	88,47	93,27	88,74	76,99	78,00	80,36	68,44	74,24	68,44	73,54	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**Nº**	247	239	237	241	230	243	243	239	251	236	244	244	
CA-RE-04.02	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	**%**	95,95	95,38	95,76	95,45	95,67	98,77	97,53	97,49	96,81	97,47	97,95	95,49	Ver detalles en EE-LMO-MN-MO
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**Nº**	247	239	236	240	230	244	243	239	252	237	244	244	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

ÁREA DE ACCIÓN

CÓD Nº	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05.02	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90%** **Valor límite: pH sat +/-1**	%	93,12	81,09	95,76	97,93	77,92	77,05	88,48	82,01	67,06	43,04	64,75	53,06	Ver detalles en AV-CA-CE-CO-DE-FL-LA-LMO-MN-MO-MS-QU-SA-SF-SI-TI-TR-VL
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	Nº	245	235	235	240	230	244	243	239	251	237	244	244	
CA-RE-06.02	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	Nº	247	238	236	242	231	244	243	239	251	237	244	242	
CA-RE-07.02	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	%	99,19	100,00	97,46	99,59	99,57	100,00	99,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08	**OTROS**															
CA-RE-08.01	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	99,91	99,72	99,58	99,90	99,19	93,36	99,90	99,82	99,64	99,72	99,81	99,91	Ver detalles en EE
CA-RE-08.02	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	99,91	99,72	99,58	99,90	99,19	93,36	99,90	99,82	99,64	99,72	99,81	99,91	Ver detalles en EE
CA-RE-08.03	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CABALLITO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-ca	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-ca	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	87	87	87	88	87	87	88	87	88	87	87	88	
CA-RE-01.02-ca	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,86	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-ca	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-ca	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	87	87	87	88	87	87	88	87	88	87	87	88	
CA-RE-02.02-ca	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-ca	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-ca	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	87	87	87	87	87	82	88	87	88	87	87	88	
CA-RE-03.02-ca	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	98,85	100,00	100,00	100,00	96,34	100,00	97,70	96,59	93,10	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-ca	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80%** **Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	98,00	94,94	80,00	84,00	59,00	36,68	60,00	63,15	55,48	37,70	57,00	55,48	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a
CA-RE-04-ca	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-ca	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	20	19	20	19	17	19	20	19	20	19	19	20	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CABALLITO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04.02-ca	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-ca	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-ca	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	N°	20	19	20	19	17	19	20	19	20	19	19	20	
CA-RE-05.02-ca	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	84,21	73,68	78,95	58,82	42,11	55,00	68,42	33,00	21,05	31,58	61,90	CA02-CA03-CA10-CA14-CA15-CA22-CA36-CA40: Valores de pH fuera de norma debido a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua de cal como consecuencia de aumentos en la dosificación de solución clorógena que produce una disminución en el pH del agua tratada.
CA-RE-06-ca	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-ca	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	20	18	19	19	17	19	20	19	20	19	19	20	
CA-RE-06.02-ca	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-ca	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-ca	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	20	19	20	19	17	19	20	19	20	19	19	20	
CA-RE-07.02-ca	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-ca	**OTROS**															
CA-RE-08.01-ca	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-ca	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - **2025**

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CABALLITO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-08.03-ca	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-ca	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-ca	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CENTRO - CONSTITUCION

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-ce	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-ce	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	73	73	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
CA-RE-01.02-ce	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	98,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,61	100,00	
CA-RE-02-ce	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-ce	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	73	73	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
CA-RE-02.02-ce	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-ce	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-ce	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	73	73	72	72	72	59	72	72	72	72	72	72	
CA-RE-03.02-ce	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	95,83	97,22	88,14	93,06	93,06	97,22	91,67	98,61	97,22	CE01: Desvío momentáneo debido a variaciones en la calidad del agua cruda.
CA-RE-03.03-ce	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	89,00	96,00	79,00	87,48	82,51	51,21	50,57	78,51	52,69	45,45	53,35	52,69	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CENTRO - CONSTITUCION

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04-ce	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-ce	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
CA-RE-04.02-ce	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 45 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-ce	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-ce	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**N°**	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
CA-RE-05.02-ce	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90%** **Valor límite: pH sat +/-1**	**%**	100,00	82,35	75,00	68,75	56,25	43,75	100,00	87,50	75,00	75,00	50,00	37,50	CE09-CE15-CE16-CE08-CE17-CE13-CE04-CO07-CO10-CO04: Desvío momentaneo.
CA-RE-06-ce	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-ce	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	**N°**	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
CA-RE-06.02-ce	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 50 ug/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-ce	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-ce	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	**N°**	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
CA-RE-07.02-ce	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-ce	**OTROS**															
CA-RE-08.01-ce	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-ce	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - **2025**

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CENTRO - CONSTITUCION

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-08.03-ce	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-ce	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-ce	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

DEVOTO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-de	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-de	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	42	42	42	42	42	41	42	42	45	43	42	42	
CA-RE-01.02-de	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-de	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-de	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	42	42	42	42	42	41	42	42	45	43	42	42	
CA-RE-02.02-de	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-de	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-de	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	42	42	42	42	42	41	42	42	45	43	42	42	
CA-RE-03.02-de	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	97,62	97,62	87.80	95,24	90,48	68,89	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-de	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	77,00	96,93	88,73	60,14	63,25	69,05	40,48	85,00	38,50	38,50	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04-de	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-de	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

DEVOTO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04.02-de	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-de	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-de	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	N°	10	9	9	10	9	9	9	9	10	9	9	9	
CA-RE-05.02-de	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	80,00	88,89	100,00	100,00	66,67	66,67	88.89	77,78	50,00	44,44	77,78	66,67	DE08-DE11-DE13: Valores de pH fuera de norma debido a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua de cal como consecuencia de aumentos en la dosificación de solución clorógena que produce una disminución en el pH del agua tratada.
CA-RE-06-de	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-de	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	10	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9	
CA-RE-06.02-de	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-de	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-de	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	10	9	9	10	9	9	9	9	10	9	9	9	
CA-RE-07.02-de	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-de	**OTROS**															
CA-RE-08.01-de	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,34	100,00	100,00	100,00	95,45	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-de	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,34	100,00	100,00	100,00	95,45	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-de	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

DEVOTO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-08.04-de	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-de	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

FLORES

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-fl	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-fl	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	58	57	57	58	58	56	58	57	57	57	57	58	
CA-RE-01.02-fl	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	98,25	98,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,25	100,00	100,00	
CA-RE-02-fl	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-fl	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	58	57	57	58	57	56	58	57	57	57	57	58	
CA-RE-02.02-fl	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-fl	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-fl	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	58	57	57	58	58	53	58	57	57	57	57	58	
CA-RE-03.02-fl	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	94,83	96,23	91,38	100,00	92,98	92,98	92,98	100,00	
CA-RE-03.03-fl	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80%** **Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	87,00	91,00	70,00	85,00	68,36	63,63	58,42	80,00	51,60	65,58	51,60	51,67	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04-fl	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-fl	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	14	12	13	13	12	13	13	12	12	13	13	13	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

FLORES

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04.02-fl	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-fl	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-fl	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	N°	14	12	13	13	12	13	13	12	12	13	13	13	
CA-RE-05.02-fl	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	76,92	75,00	61,54	100,00	58,33	83,33	23,08	46,15	15,38	FL02-FL03-FL05-FL06-FL08-FL09-FL10-FL11-FL12-FL16-FL22: Valores de pH fuera de norma debido a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua de cal como consecuencia de aumentos en la dosificación de solución clorógena que produce una disminución en el pH del agua tratada.
CA-RE-06-fl	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-fl	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	14	12	13	13	12	13	13	12	12	13	13	13	
CA-RE-06.02-fl	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-fl	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-fl	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	14	12	13	13	12	13	12	12	12	13	13	13	
CA-RE-07.02-fl	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **De**f: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	92.86	100,00	76,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-fl	**OTROS**															
CA-RE-08.01-fl	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-fl	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

FLORES

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-08.03-fl	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-fl	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-fl	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

BELGRANO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-be	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-be	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	59	54	58	57	57	60	57	57	57	56	57	57	
CA-RE-01.02-be	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-be	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-be	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	59	57	58	57	57	61	57	57	57	56	57	57	
CA-RE-02.02-be	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-be	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-be	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	59	54	58	57	57	51	57	57	57	56	57	57	
CA-RE-03.02-be	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	94,74	100,00	98,04	96,49	100,00	87,72	87,50	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-be	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	94,00	94,00	81,00	76,78	84,00	66,34	67,87	64,00	60,10	97,71	60,10	60,10	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04-be	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-be	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	13	11	13	13	12	13	12	12	13	12	13	13	
CA-RE-04.02-be	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-be	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-be	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**N°**	13	11	13	13	12	13	12	12	13	12	13	13	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

BELGRANO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05.02-be	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90%** **Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	81,82	76,92	84,62	83,33	53,85	66,67	75,00	23,08	16,67	76,92	61,54	SA23-SA25-SA20: Los valores de pH fuera de norma en las salidas estan asociados a cuestiones operativas de la planta San Martin.
CA-RE-06-be	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-be	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	13	11	13	13	12	13	12	12	13	12	13	13	
CA-RE-06.02-be	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-be	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-be	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	13	11	13	13	12	13	12	12	13	12	13	13	
CA-RE-07.02-be	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	84,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-be	**OTROS**															
CA-RE-08.01-be	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-be	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-be	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-be	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-be	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

BELGRANO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

SAN FERNANDO - TIGRE

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-sf	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-sf	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	56	56	57	56	56	56	57	56	57	56	56	56	
CA-RE-01.02-sf	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,25	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-sf	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-sf	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	56	56	57	56	56	56	57	56	57	56	56	56	
CA-RE-02.02-sf	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-sf	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-sf	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	56	56	57	56	56	56	57	56	57	56	56	56	
CA-RE-03.02-sf	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,49	100,00	98,21	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-sf	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67,87	100,00	97,96	100,00	100,00	
CA-RE-04-sf	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-sf	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	13	14	12	13	12	13	12	11	15	13	12	12	
CA-RE-04.02-sf	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-sf	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-sf	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**N°**	13	14	12	13	12	13	12	11	15	13	12	12	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

SAN FERNANDO - TIGRE

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05.02-sf	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	66,67	100,00	80,00	76,92	75,00	33,33	SF01-SF05-SF13-TI02-TI03-TI07-TI10-TI20: Valores de pH no conforme debido a la interrupción en la dosificación de agua de cal por operativo de limpieza en cisterna de agua de cal.
CA-RE-06-sf	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-sf	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	12	14	12	13	12	13	12	11	15	13	12	12	
CA-RE-06.02-sf	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-sf	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-sf	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	13	14	12	13	12	13	12	11	15	13	12	12	
CA-RE-07.02-sf	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-sf	**OTROS**															
CA-RE-08.01-sf	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-sf	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-sf	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-sf	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-sf	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

SAN FERNANDO - TIGRE

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES

SAN ISIDRO

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN
ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-si	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-si	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	34	34	33	35	35	33	34	34	34	34	34	34	
CA-RE-01.02-si	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-si	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-si	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	34	34	33	35	35	33	34	34	34	34	34	34	
CA-RE-02.02-si	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-si	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-si	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	34	34	33	35	35	32	34	34	34	34	34	34	
CA-RE-03.02-si	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71,88	100,00	71,88	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-si	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80%** **Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	69,39	100,00	69,39	100,00	92,00	100,00	100,00	
CA-RE-04-si	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-si	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	8	6	7	7	7	7	7	5	8	8	7	7	
CA-RE-04.02-si	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 45 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-si	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-si	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**N°**	8	6	7	7	7	7	7	5	8	8	7	7	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

SAN ISIDRO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05.02-si	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90%** **Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	83,33	100,00	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	85,71	71,43	SI07-SI13: Valores de pH no conforme debido a la interrupción en la dosificación de agua de cal por operativo de limpieza en cisterna de agua de cal.
CA-RE-06-si	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-si	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	7	6	7	7	7	7	7	5	8	8	7	7	
CA-RE-06.02-si	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-si	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-si	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	8	6	7	7	7	7	7	5	8	8	7	7	
CA-RE-07.02-si	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-si	**OTROS**															
CA-RE-08.01-si	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	94,44	97,21	100,00	97,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-si	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	94,44	97,21	100,00	97,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-si	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-si	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-si	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

SAN MARTIN

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-sm	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	40	40	40	41	40	41	44	41	40	41	42	41	
CA-RE-01.02-sm	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-sm	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	40	40	40	41	40	41	41	41	40	41	42	41	
CA-RE-02.02-sm	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,56	SM13:Anomalía cerrada con valores dentro de especificación: Cloro libre: 1,60 mg/l; Cl total: 2,10 mg/l.
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-sm	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	40	40	40	41	40	41	41	41	40	41	42	41	
CA-RE-03.02-sm	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	97,50	100,00	100,00	97,56	86,36	82,93	87,50	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-sm	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	95,00	94,00	88,00	91,00	75,00	49,78	54,84	63,82	56,57	63,00	56,86	56,72	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-sm	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	9	9	9	9	9	8	12	10	9	9	9	9	

SAN MARTIN

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN
ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04.02-sm	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-sm	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-sm	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	N°	9	9	9	9	9	8	12	10	9	9	9	9	
CA-RE-05.02-sm	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	88,89	87,50	100,00	100,00	77,78	44,44	100,00	100,00	
CA-RE-06-sm	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-sm	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	9	9	9	9	9	8	12	10	9	9	9	9	
CA-RE-06.02-sm	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-sm	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-sm	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	9	9	9	9	9	8	12	10	9	9	9	9	
CA-RE-07.02-sm	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-sm	**OTROS**															
CA-RE-08.01-sm	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	97,56	95,23	95,23	100,00	95,34	97,67	100,00	100,00	95,23	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-sm	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	97,56	95,23	95,23	100,00	95,34	97,67	100,00	100,00	95,23	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-sm	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-sm	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - **2025**

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

SAN MARTIN

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-08.05-sm	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

VICENTE LOPEZ

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-vl	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-vl	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	32	32	32	32	32	32	32	32	39	32	32	32	
CA-RE-01.02-vl	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-vl	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-vl	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	32	32	32	32	32	32	32	32	39	32	32	32	
CA-RE-02.02-vl	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-vl	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-vl	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	32	32	32	32	32	32	32	32	39	32	32	32	
CA-RE-03.02-vl	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,88	96,88	71,88	94,87	96,88	93,75	100,00	
CA-RE-03.03-vl	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80%** **Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	96,00	94,00	91,00	97,00	95,00	76,26	66,27	59,65	61,00	78,32	60,53	60,53	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04-vl	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-vl	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	

aysa

VICENTE LOPEZ

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04.02-vl	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-vl	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-vl	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	N°	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	
CA-RE-05.02-vl	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	85.71	57,14	57,14	85,71	100,00	14,29	71,43	71,43	85,71	28,57	50,00	85,71	VL03: Valores de pH fuera de norma debido a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua de cal como consecuencia de aumentos en la dosificación de solución clorógena que produce una disminución en el pH del agua tratada.
CA-RE-06-vl	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-vl	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	
CA-RE-06.02-vl	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-vl	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-vl	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	
CA-RE-07.02-vl	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-vl	**OTROS**															
CA-RE-08.01-vl	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-vl	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-vl	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-vl	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

VICENTE LOPEZ

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-08.05-vl	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LA MATANZA OESTE

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-lmo	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-lmo	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	114	110	112	114	113	113	113	111	112	112	112	112	
CA-RE-01.02-lmo	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	99,11	99,12	99,12	100,00	99,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-lmo	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-lmo	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	114	110	112	114	113	113	113	111	112	112	112	112	
CA-RE-02.02-lmo	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	99,22	100,00	100,00	99,12	99,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-lmo	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-lmo	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	114	110	112	114	113	113	113	111	112	112	112	112	
CA-RE-03.02-lmo	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,11	LMO08: Anomalía cerrada con valores dentro de especificación: Turbiedad: 0,25 NTU.
CA-RE-03.03-lmo	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-04-lmo	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-lmo	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	23	23	24	25	26	25	25	27	25	25	25	25	
CA-RE-04.02-lmo	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	**%**	82.61	60.87	79,17	76,00	85,19	72,00	88,00	81,48	88,00	80,00	96,00	72,00	LMO02-LMO09-LMO14-LMO16-LMO34-LMO45-LMO48: Dadas las características del acuífero en la Provincia de Buenos Aires en zonas urbanas, la mayoría de las perforaciones superan el valor límite establecido de Nitratos en las reglamentaciones vigentes. La Organización Mundial de la Salud (Addendum a la 3ra. Edición de las Guías de Calidad de Agua Potable, Nitratos y Nitritos: documento específico del panel de expertos, editado en 2011) refieren que el agua que posea una concentración de Nitratos de 50 a 100 mg/l podría utilizarse siempre que se sepa y se haya confirmado que el agua es microbiológicamente inocua.

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LA MATANZA OESTE

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05-lmo	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-lmo	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**N°**	23	23	24	24	27	25	25	27	25	25	25	25	
CA-RE-05.02-lmo	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90%** **Valor límite: pH sat +/-1**	**%**	100,00	91,30	100,00	96,00	96,30	100,00	100,00	100,00	96,00	88,00	92,00	84,00	LMO01-LMO22-LMO23-LMO39: Desvío momentaneo.
CA-RE-06-lmo	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-lmo	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	**N°**	23	23	24	25	26	25	25	27	25	25	25	25	
CA-RE-06.02-lmo	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 50 ug/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-lmo	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-lmo	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	**N°**	23	23	24	25	27	25	25	27	27	25	25	25	
CA-RE-07.02-lmo	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	95.65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-lmo	**OTROS**															
CA-RE-08.01-lmo	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	**%**	100,00	99,01	100,00	100,00	98,26	100,00	100,00	99,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-lmo	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	99,01	100,00	100,00	98,26	100,00	100,00	99,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-lmo	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-lmo	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-lmo	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LA MATANZA OESTE

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES

Notas:

MATANZA NORTE

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN
ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CÓD Nº	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-mn	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-mn	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**Nº**	47	48	47	47	49	50	49	49	49	49	49	49	
CA-RE-01.02-mn	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,12	100,00	100,00	97,96	97,96	100,00	100,00	
CA-RE-02-mn	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-mn	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**Nº**	47	48	47	47	49	50	49	49	49	49	49	49	
CA-RE-02.02-mn	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0,2 mg/l**	**%**	95.74	100,00	93,62	97,87	100,00	100,00	97,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-mn	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-mn	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**Nº**	47	48	47	47	49	50	49	49	49	49	49	49	
CA-RE-03.02-mn	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	97,96	100,00	97,96	100,00	100,00	95,92	97,96	97,96	MN14: Anomalía cerrada con valores dentro de especificación: Turbiedad: 0,70 NTU.
CA-RE-03.03-mn	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	98,00	97,00	98,00	73,00	75,50	74,00	67,33	87,00	73,00	80,19	73,00	73,00	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04-mn	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-mn	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**Nº**	11	10	10	10	10	12	10	10	11	10	11	11	
CA-RE-04.02-mn	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	**%**	63.64	100,00	100,00	90,91	70,00	83,33	90,00	100,00	81,82	90,91	90,91	81,82	MN16-MN25: Rehabilitación POI MN147 a la espera de ejecución de trabajos por parte de la DAL. En estudio por DRO posibilidad de revinculación Batería Gonzalez Catán o aumento de caudal Booster Rafael Castillo.
CA-RE-05-mn	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-mn	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**Nº**	11	10	10	10	10	12	10	10	11	10	11	11	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

MATANZA NORTE

CÓD Nº	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05.02-mn	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90%** **Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	100,00	54,55	30,00	81,82	54,55	MN04-MN14-MN21-MN24-MN27: Desvío momentaneo.
CA-RE-06-mn	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-mn	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	Nº	11	10	10	11	10	12	10	10	11	10	11	11	
CA-RE-06.02-mn	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-mn	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-mn	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	Nº	11	10	10	11	10	12	10	10	11	11	11	11	
CA-RE-07.02-mn	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-mn	**OTROS**															
CA-RE-08.01-mn	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-mn	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-mn	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-mn	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-mn	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

MATANZA NORTE

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

CÓD Nº	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

MORON - ITUZAINGO - HURLINGHAM

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-mo	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-mo	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	61	60	60	60	60	60	60	60	59	60	60	61	
CA-RE-01.02-mo	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	98,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-mo	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-mo	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	61	60	60	60	60	60	60	60	59	60	60	61	
CA-RE-02.02-mo	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	98.36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-mo	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-mo	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	61	60	60	60	60	60	60	60	59	60	60	61	
CA-RE-03.02-mo	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-mo	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	96,00	100,00	100,00	100,00	94,00	95,86	94,00	95,00	96,00	97,00	96,00	96,00	
CA-RE-04-mo	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-mo	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	13	13	13	13	11	13	13	12	13	12	13	13	
CA-RE-04.02-mo	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	**%**	100,00	100,00	92,31	100,00	81,82	100,00	92,31	100,00	84,62	100,00	100,00	92,31	MO31: Dadas las características del acuífero en la Provincia de Buenos Aires en zonas urbanas, la mayoría de las perforaciones superan el valor límite establecido de Nitratos en las reglamentaciones vigentes. La Organización Mundial de la Salud (Addendum a la 3ra. Edición de las Guías de Calidad de Agua Potable, Nitratos y Nitritos: documento específico del panel de expertos, editado en 2011) refieren que el agua que posea una concentración de Nitratos de 50 a 100 mg/l podría utilizarse siempre que se sepa y se haya confirmado que el agua es microbiológicamente inocua.

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

MORON - ITUZAINGO - HURLINGHAM

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05-mo	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-mo	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**N°**	13	13	13	13	11	13	13	12	13	12	13	13	
CA-RE-05.02-mo	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90%** **Valor límite: pH sat +/-1**	**%**	92.31	30.77	84,62	69,23	36,36	61,54	61,54	25,00	30,77	25,00	23,08	23,08	MO14-MO15-MO24-MO25-MO26-MO28-MO29-MO30-MO32-MOPC1: Desvío momentaneo.
CA-RE-06-mo	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-mo	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	**N°**	13	13	13	13	11	13	13	12	13	12	13	13	
CA-RE-06.02-mo	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 50 ug/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-mo	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-mo	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	**N°**	13	13	13	13	11	13	13	12	13	12	13	12	
CA-RE-07.02-mo	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-mo	**OTROS**															
CA-RE-08.01-mo	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,33	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-mo	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,33	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-mo	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-mo	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-mo	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

MORON - ITUZAINGO - HURLINGHAM

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

MATANZA SUR

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-ms	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-ms	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	54	53	53	54	54	55	55	55	56	55	54	55	
CA-RE-01.02-ms	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	96,30	100,00	100,00	100,00	98,18	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-ms	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-ms	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	54	53	53	54	54	55	55	55	56	55	54	55	
CA-RE-02.02-ms	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-ms	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-ms	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	54	53	53	54	54	55	55	55	55	55	54	55	
CA-RE-03.02-ms	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	96,23	100,00	100,00	98,18	89,09	100,00	98,21	98,18	98,15	100,00	
CA-RE-03.03-ms	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80%** **Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	96,00	87,00	87,53	92,00	92,00	61,30	56,22	83,00	61,31	73,52	61,28	61,30	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04-ms	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-ms	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	12	12	10	11	12	13	11	12	13	12	11	12	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

MATANZA SUR

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04.02-ms	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-ms	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-ms	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	N°	12	12	10	11	12	13	11	12	13	12	11	12	
CA-RE-05.02-ms	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	63,64	83,33	100,00	81,82	91,67	92,31	33,33	72,73	50,00	MS03-MS12-MS25-MS33-MS35-MS37: Desvío momentaneo.
CA-RE-06-ms	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-ms	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	12	12	10	11	12	13	11	12	13	12	11	12	
CA-RE-06.02-ms	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-ms	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-ms	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	12	12	10	11	12	13	11	12	12	12	11	12	
CA-RE-07.02-ms	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-ms	**OTROS**															
CA-RE-08.01-ms	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	98,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,07	100,00	
CA-RE-08.02-ms	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	98,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,07	100,00	
CA-RE-08.03-ms	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-ms	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - **2025**

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

MATANZA SUR

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-08.05-ms	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

TRES DE FEBRERO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-tr	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-tr	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	32	32	32	32	32	30	32	32	32	32	32	32	
CA-RE-01.02-tr	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	96,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-tr	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-tr	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	32	32	32	32	32	30	32	32	32	32	32	32	
CA-RE-02.02-tr	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-tr	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-tr	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	32	32	32	32	32	30	32	32	32	32	32	32	
CA-RE-03.02-tr	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,33	53,13	71,88	68,75	98,88	68,75	100,00	
CA-RE-03.03-tr	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80%** **Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	98,00	97,00	95,00	97,00	91,00	74,29	41,65	55,48	62,10	76,26	62,18	62,18	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04-tr	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-tr	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

TRES DE FEBRERO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04.02-tr	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-tr	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-tr	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	N°	8	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
CA-RE-05.02-tr	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	50,00	71.43	33,33	100,00	85,71	42,86	100,00	57,14	14,29	0,00	42,86	14,29	TR10-TR14-TR15-TR17-TR20: Valores de pH fuera de norma debido a dificultades en el ajuste de dosis a partir de pruebas de puesta en marcha de la planta de agua de cal, y a una mayor demanda de agua de cal como consecuencia de aumentos en la dosificación de solución clorógena que produce una disminución en el pH del agua tratada.
CA-RE-06-tr	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-tr	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	8	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
CA-RE-06.02-tr	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-tr	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-tr	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	8	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
CA-RE-07.02-tr	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-tr	**OTROS**															
CA-RE-08.01-tr	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-tr	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-tr	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

TRES DE FEBRERO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-08.04-tr	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-tr	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

AVELLANEDA

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-av	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-av	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	40	40	40	40	40	43	41	40	40	40	42	40	
CA-RE-01.02-av	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-av	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-av	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	40	40	40	40	40	43	41	40	40	40	42	40	
CA-RE-02.02-av	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-av	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-av	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	40	40	40	40	40	43	41	40	40	40	42	40	
CA-RE-03.02-av	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-av	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	86,00	86,00	92,00	100,00	91,00	97,00	99,00	100,00	91,00	78,00	91,00	91,00	
CA-RE-04-av	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-av	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	8	9	8	9	5	10	10	8	9	7	9	8	
CA-RE-04.02-av	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

AVELLANEDA

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05-av	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-av	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**N°**	8	9	8	9	5	10	10	8	9	7	9	8	
CA-RE-05.02-av	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	**%**	75,00	33.33	37,50	100,00	100,00	90,00	90,00	62,50	66,67	14,29	22,22	12,50	AV01-AV04-AV06-AV08-AV13-AV14-AV24: Valor de pH no conforme debido a un ajuste impreciso del caudal de lechada de cal a reservas.
CA-RE-06-av	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-av	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	**N°**	8	9	8	9	5	10	10	8	9	7	9	8	
CA-RE-06.02-av	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-av	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-av	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	**N°**	8	9	8	9	5	10	10	8	9	7	9	8	
CA-RE-07.02-av	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-av	**OTROS**															
CA-RE-08.01-av	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-av	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-av	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-av	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-av	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LANUS

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-la	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-la	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	48	48	48	48	48	49	48	48	48	48	48	48	
CA-RE-01.02-la	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-la	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-la	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	48	48	48	48	48	49	48	48	47	47	47	47	
CA-RE-02.02-la	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-la	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-la	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	48	48	48	48	48	49	48	48	48	48	48	48	
CA-RE-03.02-la	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,92	100,00	
CA-RE-03.03-la	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80%** **Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	91,00	94,00	87,00	100,00	90,00	95,00	100,00	100,00	94,00	86,00	94,00	94,00	
CA-RE-04-la	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-la	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	10	11	9	10	10	10	10	10	10	9	11	10	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LANUS

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04.02-la	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05-la	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-la	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	N°	10	11	9	10	10	10	10	10	10	9	11	10	
CA-RE-05.02-la	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	70,00	81.82	66,67	100,00	50,00	90,00	100,00	100,00	30,00	11,11	54,55	20,00	LA08-LA09-LA25-LA28-LA29-LA30-LA31-LA33: Valor de pH no conforme debido a un ajuste impreciso del caudal de lechada de cal a reservas.
CA-RE-06-la	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-la	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	10	11	9	10	10	10	10	10	10	9	11	10	
CA-RE-06.02-la	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-la	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-la	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	10	11	9	10	10	10	10	10	10	9	11	10	
CA-RE-07.02-la	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-la	**OTROS**															
CA-RE-08.01-la	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-la	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-la	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LANUS

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-08.04-la	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-la	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

QUILMES

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-qu	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-qu	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	66	66	66	65	66	66	67	65	65	66	66	65	
CA-RE-01.02-qu	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-qu	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-qu	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	66	66	66	65	66	66	67	65	65	66	66	65	
CA-RE-02.02-qu	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	98,48	100,00	98,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-qu	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-qu	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	66	66	66	65	66	66	67	65	65	66	66	65	
CA-RE-03.02-qu	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-qu	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	97,00	100,00	92,00	100,00	100,00	100,00	98,00	99,00	96,00	87,00	96,00	96,00	
CA-RE-04-qu	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-qu	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**N°**	16	14	13	12	14	14	14	14	14	13	14	16	
CA-RE-04.02-qu	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	**%**	87.50	100,00	84,62	100,00	92,86	100,00	100,00	92,86	100,00	100,00	92,86	100,00	
CA-RE-05-qu	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-qu	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**N°**	16	14	13	12	14	14	14	14	14	14	14	16	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

QUILMES

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05.02-qu	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	93.75	71.43	76,92	83,33	78,57	78,57	78,57	71,43	57,14	57,14	71,43	50,00	QU02-QU10-QU17-QU24-QU26-QU30-QU32-QU37: Valor de pH no conforme debido a un ajuste impreciso del caudal de lechada de cal a reservas.
CA-RE-06-qu	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-qu	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	N°	16	14	13	12	14	14	14	14	14	14	14	16	
CA-RE-06.02-qu	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-qu	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-qu	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	N°	16	14	13	12	14	14	14	14	14	14	14	16	
CA-RE-07.02-qu	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-qu	**OTROS**															
CA-RE-08.01-qu	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	95,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-qu	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	95,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-qu	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-qu	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-qu	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRIA - EZEIZA

CÓD Nº	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-ab	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-ab	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**Nº**	101	101	103	101	100	104	99	103	100	99	99	99	
CA-RE-01.02-ab	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	99,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02-ab	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-ab	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**Nº**	101	101	103	101	100	104	99	104	100	99	99	99	
CA-RE-02.02-ab	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0,2 mg/l**	**%**	97.03	100,00	100,00	98.02	98,00	94,23	100,00	98,06	97,00	100,00	98,99	98,99	EE32: Anomalía cerrada con valores dentro de especificación: Cloro libre: 0,38 mg/l; Cl total: 0,61 mg/l.
CA-RE-03-ab	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-ab	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**Nº**	101	101	103	103	103	104	104	103	100	99	99	99	
CA-RE-03.02-ab	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.03-ab	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	92,00	91,00	89,00	92,00	99,00	99,00	93,00	95,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
CA-RE-04-ab	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-ab	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**Nº**	21	22	22	22	20	21	20	23	24	21	22	21	
CA-RE-04.02-ab	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 45 mg/l**	**%**	100,00	95.24	95.45	90,91	100,00	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	95,45	95,24	EE34: Dadas las características del acuífero en la Provincia de Buenos Aires en zonas urbanas, la mayoría de las perforaciones superan el valor límite establecido de Nitratos en las reglamentaciones vigentes. La Organización Mundial de la Salud (Addendum a la 3ra. Edición de las Guías de Calidad de Agua Potable, Nitratos y Nitritos: documento específico del panel de expertos, editado en 2011) refieren que el agua que posea una concentración de Nitratos de 50 a 100 mg/l podría utilizarse siempre que se sepa y se haya confirmado que el agua es microbiológicamente inocua.

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRIA - EZEIZA

CÓD Nº	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05-ab	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-ab	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**Nº**	21	22	22	22	20	21	20	23	24	21	22	21	
CA-RE-05.02-ab	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90%** **Valor límite: pH sat +/-1**	**%**	90.48	85.71	95,45	100,00	100,00	95,24	100,00	95,65	100,00	80,95	81,82	90,48	
CA-RE-06-ab	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-ab	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	**Nº**	21	21	22	22	20	21	20	23	24	21	22	21	
CA-RE-06.02-ab	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 50 ug/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-ab	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-ab	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	**Nº**	21	21	22	22	20	21	20	23	24	21	22	21	
CA-RE-07.02-ab	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **D**ef: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	100,00	100,00	100,00	95,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-ab	**OTROS**															
CA-RE-08.01-ab	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	99,01	100,00	98,38	98,03	98,97	98,97	98,96	98,96	Muestra faltante en EEPC2
CA-RE-08.02-ab	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	99,01	100,00	98,38	98,03	98,97	98,97	98,96	98,96	Muestra faltante en EEPC2
CA-RE-08.03-ab	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-ab	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-ab	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LOMAS DE ZAMORA

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-01-lz	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.01-lz	Calidad microbiológica de agua potable abastecida	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA	**N°**	68	68	68	68	68	70	68	68	68	68	68	69	
CA-RE-01.02-lz	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMA **Valor ref: 95%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,53	100,00	100,00	
CA-RE-02-lz	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.01-lz	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA	**N°**	68	68	68	68	68	70	68	68	68	68	68	69	
CA-RE-02.02-lz	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Cloro residual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	100,00	100,00	100,00	98,53	100,00	100,00	100,00	100,00	98,53	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03-lz	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.01-lz	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA	**N°**	68	68	68	68	68	70	68	68	68	68	68	69	
CA-RE-03.02-lz	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	100,00	100,00	98,55	100,00	100,00	98,57	100,00	100,00	100,00	100,00	98,53	100,00	
CA-RE-03.03-lz	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMA **Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	92,00	90,00	73,62	100,00	100,00	96,96	82,00	76,00	55,00	74,00	55,00	55,00	Los desvíos en los distritos alimentados por Planta Potabilizadora San Martín y Planta Manuel Belgrano, se debieron principalmente a un desmejoramiento de la calidad del agua cruda ingresada a planta, la cual presenta condiciones de baja turbiedad, y alta materia orgánica que genera flocs livianos que decantan dificultosamente y no logran ser retenidos por los filtros, sumado a sobrecarga hidráulica en decantadores y filtros, por exigencia de la demanda.
CA-RE-04-lz	**Control de nitratos en SD**															
CA-RE-04.01-lz	Control de nitratos en SD	**Control de nitratos en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA	**%**	14	14	15	15	14	13	15	15	15	14	15	15	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - **2025**

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LOMAS DE ZAMORA

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-04.02-lz	Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de nitratos regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Nitratos conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Nitratos por PMA **Valor ref: 100%** **Valor límite: 45 mg/l**	N°	100,00	92.86	93,33	86,67	100,00	92,31	100,00	100,00	93,33	100,00	93,33	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - 2025

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LOMAS DE ZAMORA

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-RE-05-lz	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.01-lz	Control de pH en SD	**Control de pH en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA	**%**	14	14	15	15	14	14	15	15	15	14	15	15	
CA-RE-05.02-lz	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMA **Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	**N°**	92.86	71.43	93,33	93,33	71,43	92,86	100,00	86,67	80,00	64,29	60,00	26,67	LO01-LO14-LO37-LO38-LO39-LO43-LO44-LO45-LO46-LO48-LO50: Valor de pH no conforme debido a un ajuste impreciso del caudal de lechada de cal a reservas.
CA-RE-06-lz	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.01-lz	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA	**%**	14	13	15	15	14	14	15	15	15	14	15	15	
CA-RE-06.02-lz	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)** Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	**N°**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07-lz	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.01-lz	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA	**%**	14	14	15	15	14	14	15	15	15	14	15	14	
CA-RE-07.02-lz	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **De**f: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMA **Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	**N°**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08-lz	**OTROS**															
CA-RE-08.01-lz	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.02-lz	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.03-lz	Analítica R2	**Analítica R2** Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.04-lz	Analítica R3	**Analítica R3** Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-08.05-lz	Analítica R4	**Analítica R4** Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR **Valor ref: 100%**	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - CONCESIÓN

ERAS - **2025**

SIT-AG-CALIDAD-REDES 2025

LOMAS DE ZAMORA

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES

(NOTAS)

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - NUEVAS ÁREAS

ERAS - **2025**

ÁREA DE ACCIÓN NUEVAS ÁREAS

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	**N°**	**271**	**267**	**268**	**268**	**268**	**271**	**268**	**265**	**269**	**270**	**268**	**270**	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	**%**	**98,89**	**98,88**	**98,51**	**98,88**	**99,62**	**99,63**	**99,63**	**100,00**	**99,63**	**99,63**	**99,63**	**100,00**	
CA-RE-02																
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	**N°**	**271**	**267**	**268**	**268**	**268**	**271**	**268**	**265**	**269**	**270**	**268**	**270**	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	**%**	**98,15**	**93,63**	**98,88**	**99,25**	**98,49**	**95,94**	**98,88**	**99,62**	**96,65**	**96,68**	**96,64**	**99,26**	Ver detalles en ME
CA-RE-03																
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	**N°**	**271**	**267**	**268**	**268**	**268**	**271**	**268**	**265**	**269**	**270**	**268**	**270**	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-05																
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	**N°**	**68**	**72**	**66**	**69**	**65**	**73**	**68**	**66**	**68**	**76**	**70**	**67**	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98,55**	**100,00**	**100,00**	**98,53**	**98,53**	**98,53**	**100,00**	**100,00**	**98,51**	
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															

CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	**N°**	**68**	**71**	**65**	**69**	**65**	**73**	**68**	**66**	**68**	**76**	**70**	**67**	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-07	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	**N°**	**68**	**72**	**66**	**69**	**65**	**73**	**68**	**66**	**68**	**76**	**70**	**67**	
CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	**%**	**98,53**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**OTROS**															
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1) Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR**	**%**	**99,63**	**98,52**	**97,78**	**98,16**	**100,00**	**100,00**	**98,18**	**97,68**	**98.89**	**98,30**	**98,52**	**99,26**	Ver detalles en FV
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1) Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**99,63**	**98,52**	**97,78**	**98,16**	**100,00**	**100,00**	**98,18**	**97,68**	**98.89**	**98,30**	**98,52**	**99,26**	Ver detalles en FV
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2 Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3 Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4 Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

Nota: Mediante la Nota 336.034/18, AySA informa al ERAS sobre el Plan de Regularización de la Calidad del Agua en Nuevas Áreas Incorporadas, el cual contiene el Programa de Regularización de la Calidad del Servicio del Agua Potable, incluyendo las obras para la regularización del contenido de nitratos en las redes de los nuevos partidos. En base a esto, se define incluir en detalle, con la actualización del SIT, una hoja de seguimiento de todas las acciones y obras vinculadas al parámetro de Nitratos

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
CALIDAD DE AGUA EN REDES - NUEVAS ÁREAS
ERAS - 2025

ESCOBAR

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	N°	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	N°	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	N°	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	N°	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	66,67	100,00	100,00	66,67	ES05: Desvío ocasionado por inconvenientes en el ajuste de la dosis de cal en planta.
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	N°	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07	**Control de Color en SD**															

CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	**N°**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	
CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**OTROS**																
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1) Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1) Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2 Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3 Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4 Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
CALIDAD DE AGUA EN REDES - NUEVAS ÁREAS
ERAS - 2025

MALVINAS ARGENTINAS

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	N°	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	N°	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	N°	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CA-RE-07	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** **Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	**N°**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	
CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**Control de muestreo**															
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - NUEVAS ÁREAS

ERAS - 2025

SAN MIGUEL

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	N°	35	35	35	36	36	36	36	36	37	36	36	36	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	%	94,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	N°	35	35	35	36	36	36	36	36	37	36	36	36	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	N°	35	36	36	36	36	36	36	36	37	36	36	36	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	N°	8	9	7	11	9	11	9	8	10	10	10	8	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	N°	8	9	7	11	9	11	9	8	10	10	10	8	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07	**Control de Color en SD**															

CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** **Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	**N°**	**8**	**9**	**7**	**11**	**9**	**11**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**8**	
CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**Control de muestreo**															
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR**	**%**	**97,22**	**97,22**	**97,29**	**97,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**97,22**	**97,22**	**97,29**	**97,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - NUEVAS ÁREAS

ERAS - 2025

JOSÉ C. PAZ

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	N°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	N°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	N°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07	**Control de Color en SD**															

CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD** **Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	**N°**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**Control de muestreo**															
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
CALIDAD DE AGUA EN REDES - NUEVAS ÁREAS
ERAS - 2025

PTE. PERON

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	N°	6	6	7	7	7	7	8	6	7	7	7	7	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	%	100,00	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	N°	6	6	7	7	7	7	8	6	7	7	7	7	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0,2 mg/l**	%	100,00	83,33	100,00	85,71	85,71	28,57	87,50	100,00	71,43	100,00	85,71	100,00	
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	N°	7	7	7	7	8	6	7	7	7	7	7	7	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	N°	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	N°	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	N°	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**Control de muestreo**															
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR**	**%**	**100,00**	**85,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**85,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**85,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**85,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
CALIDAD DE AGUA Enamado
ERAS - 2025

PILAR

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	N°	52	51	50	51	50	51	51	51	51	52	50	51	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	%	98,08	100,00	98,00	100,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	N°	52	51	50	51	50	51	51	51	51	52	50	51	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0,2 mg/l**	%	100,00	96,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	N°	50	51	50	51	51	51	51	51	51	52	50	51	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	N°	13	15	12	14	12	13	13	11	14	16	10	13	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	N°	13	15	12	14	12	13	13	11	14	16	10	13	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	N°	13	15	12	14	12	13	13	13	14	14	10	13	

CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**Control de muestreo**															
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR**	**%**	**100,00**	**98,07**	**91,37**	**98,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98,07**	**100,00**	
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**98,07**	**91,37**	**98,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98,07**	**100,00**	
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
CALIDAD DE AGUA EN REDES - NUEVAS ÁREAS
ERAS - 2025

FLORENCIO VARELA

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	N°	75	74	74	73	74	75	70	70	72	74	73	74	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	%	100,00	98,65	98,65	95,89	100,00	88,00	100,00	100,00	98,61	98,65	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	N°	75	74	74	73	74	75	70	70	72	74	73	74	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	98,61	90,67	97,14	100,00	93,06	97,30	98,63	100,00	
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	N°	75	74	74	73	74	75	70	70	72	74	73	74	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	N°	18	20	18	19	17	20	19	18	17	23	20	17	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	N°	18	20	18	19	17	20	19	18	17	23	20	17	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07	**Control de Color en SD**															

CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	**N°**	**18**	**20**	**18**	**19**	**17**	**20**	**19**	**18**	**17**	**23**	**20**	**17**	
CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**Control de muestreo**															
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1) Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR**	**%**	**100,00**	**98,66**	**97.40**	**98.64**	**100,00**	**100,00**	**93,33**	**93,15**	**96,00**	**98,66**	**96,05**	**97,36**	Muestras faltantes en PCFV009 y PCFV051
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1) Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**98,66**	**97,40**	**98,64**	**100,00**	**100,00**	**93,33**	**93,15**	**96,00**	**98,66**	**96,05**	**97,36**	Muestras faltantes en PCFV009 y PCFV051
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2 Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3 Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4 Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE AGUA EN REDES - NUEVAS ÁREAS

ERAS - 2025

MERLO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	N°	41	41	42	41	41	41	42	41	41	40	41	41	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	%	100,00	97,56	97,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,56	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	N°	41	41	42	41	41	41	42	41	41	40	41	41	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0.2 mg/l**	%	92,68	85,37	100,00	97,56	95,12	68,29	100,00	97,56	97,56	90,00	97,56	95,12	PCME050: Anomalía cerrada con valores dentro de especificación: Cloro libre: 0,73 mg/l; Cl total: 0,88 mg/l. PCME055: Anomalía cerrada con valores dentro de especificación: Cloro libre: 0,65 mg/l; Cl total: 0,79 mg/l.
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	N°	41	41	42	41	41	41	42	41	41	40	41	41	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1.0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	N°	13	11	12	8	10	10	10	10	9	11	11	10	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	87,50	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	N°	13	11	11	8	10	10	10	10	9	11	11	10	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CA-RE-07	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	**N°**	**13**	**11**	**12**	**11**	**10**	**10**	**10**	**10**	**9**	**11**	**11**	**10**	
CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 10 UC**	**%**	**92,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**Control de muestreo**															
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1) Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**97,56**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1) Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**97,56**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2 Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3 Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4 Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
CALIDAD DE AGUA EN REDES - NUEVAS ÁREAS
ERAS - 2025

MORENO

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	U.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
CA-RE-01	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida**															
CA-RE-01.03	Calidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Número de muestras para Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA**	N°	42	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	
CA-RE-01.04	Conformidad microbiológica de Agua Potable abastecida - Muestras con ausencia de Coliformes Totales	**Calidad microbiológica de agua potable abastecida Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con ausencia de Coliformes Totales / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Coliformes Totales por PMANA Valor ref: 95%**	%	100,00	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00	97,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-02	**Control de niveles de cloro residual libre para SD**															
CA-RE-02.03	Control de niveles de cloro residual libre para SD	**Control de niveles de cloro residual libre en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA**	N°	42	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	
CA-RE-02.04	Conformidad con niveles de cloro regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de cloro residual libre regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Cloro resiual Libre conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Cloro Residual Libre por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 0,2 mg/l**	%	95,24	80,00	92,50	100,00	100,00	63,41	100,00	100,00	97,56	92,68	95,12	100,00	
CA-RE-03	**Control de turbiedad para SD**															
CA-RE-03.04	Control de turbiedad para SD	**Control de turbiedad en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA**	N°	42	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	
CA-RE-03.05	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 3,0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-03.06	Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD	**Conformidad con valores de turbiedad regulados para SD Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Turbiedad <1UNT / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Turbiedad por PMANA Valor ref: 80% Valor límite: 1,0 UNT**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-05	**Control de pH en SD**															
CA-RE-05.03	Control de pH en SD	**Control de pH en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA**	N°	9	10	10	10	10	11	10	11	10	9	11	11	
CA-RE-05.04	Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%)	**Conformidad con niveles de pH regulado para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con pH conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para pH por PMANA Valor ref: 90% Valor límite: pH sat +/-1**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-06	**Control de Arsénico en SD**															
CA-RE-06.03	Control de Arsénico en SD	**Control de Arsénico en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA**	N°	9	9	10	10	10	11	10	11	10	9	11	11	
CA-RE-06.04	Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de arsénico regulados para SD (%) Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Arsénico conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Arsénico por PMANA Valor ref: 100% Valor límite: 50 ug/l**	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CA-RE-07	**Control de Color en SD**															
CA-RE-07.03	Control de Color en SD	**Control de Color en SD Def: Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA**	N°	9	10	10	10	10	11	10	10	10	9	11	11	

CA-RE-07.04	Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)	**Conformidad con niveles de color regulados para SD (%)** **Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en redes por PMANA con Color conforme / Cantidad total de muestras extraídas en redes para Color por PMANA Valor ref: 100%** **Valor límite: 10 UC**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08	**Control de muestreo**															
CA-RE-08.06	Bacteriológicos (R1)	**Bacteriológicos (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con total de bacteriológico exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.07	Parámetros de medición in situ (R1)	**Parámetros de medición in situ (R1)** **Def: 100 x Cantidad de muestras con cloro residual libre y turbiedad in situ exigidos realizados / Cantidad de muestras de PMANA redes de acuerdo al MR Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.08	Analítica R2	**Analítica R2** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R2 realizados / Cantidad total de muestras R2 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.09	Analítica R3	**Analítica R3** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R3 realizadas / Cantidad total de muestras R3 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
CA-RE-08.10	Analítica R4	**Analítica R4** **Def: 100 x Cantidad de muestras con R4 realizados / Cantidad total de muestras R4 de acuerdo al MR** **Valor ref: 100%**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

Se informan las acciones proyectadas o en curso tendientes a mejorar la calidad en las áreas más afectadas. Estado de Situación a diciembre 2025.

ESCOBAR

A partir de enero de 2022 se habilitó acueducto de vinculación entre la Planta Juan Manuel de Rosas y la zona de los barrios Lambertuchi y Lucchetti, Escobar. En marzo de 2022, se completó la distribución con agua superficial en dichos barrios, por lo que se desactivaron ocho perforaciones. Las concentraciones de nitratos en la zona mencionada se encuentran dentro de norma.

Respecto a la zona de Escobar Centro, en marzo de 2023 se habilitaron las válvulas reguladoras que permiten el abastecimiento con agua superficial al resto del Distrito. Las perforaciones de dicha zona quedaron desafectadas.

Al día de la fecha, el área del barrio FONAVI queda abastecida por agua de origen subterránea mediante una batería conformada por los pozos ES022, ES023 y ES024, cuyo tenor de nitratos se encuentra dentro de lo establecido en el Marco Regulatorio del Servicio.

FLORENCIO VARELA

Pozos FV028, FV029, FV097 y FV102:

La zona de influencia de las perforaciones FV028, FV029, FV097 y FV102 está abordada por el proyecto de interconexión de las perforaciones, que se desarrolla en varias etapas. La nueva perforación FV152 mezcla en impulsión con el pozo FV027 y la zona de influencia, monitoreada por el punto de red PCFV152, presenta valores en nitratos levemente superiores al límite. Se habilitó la nueva perforación FV162, que se vincula con los pozos FV152 y FV027, para conformar la Batería San Nicolas.
Esta conexión se desarrolló en dos etapas:
ETAPA 1: conexión entre la perforación FV152 con la FV027, con una longitud de 2100 m. Finalizada y habilitada en Febrero 2022.
ETAPA 2: Interconexión de 4100 m aproximadamente, incluidos en SA70268. Obra finalizada.
Con la ejecución de esta vinculación se logró establecer concentaciones inferiores a 100 mg/l en nitratos. El punto de monitoreo para este sistema esta definido como FV02.
Por su parte, la vinculación del pozo FV154 con la perforación FV102, logró regularizar la concentracion de nitratos dentro de norma (Punto de control en RED: PCFV154 representa la mezcla de ambas perforaciones)

Pozos FV048, FV060 y FV061:

Se continúa con el análisis de la opción de mezclar en impulsión en cada pozo a través de conexiones con la cañería denominada Villa Del Plata (DN400) proveniente del sistema tanque Cruce de Florencio Varela, cuya dinámica tendería a mejorar la calidad de la zona de Zeballos, Florencio Varela.

MALVINAS ARGENTINAS

Se encuentra finalizada la impulsión Grand Bourg, que aportará agua superficial a la Cisterna de Malvinas Argentinas; resta la puesta en servicio de dicha impulsión, mientras se ejecuta la obra de la cisterna mencionada, donde se mezclará con los pozos locales a partir de una cañería de interconexión, cuyas obras están en ejecución, y una nueva perforación al Hipopuelche. A partir de una nueva red primaria que se está desarrollando, se distribuirá al actual radio servido.
Por otro lado, se finalizó la ejecución del nuevo pozo MA017, cuya concentración de nitratos se encuentra dentro de norma; una vez vinculado al sistema, se logrará una mejora en la calidad de la red abastecida.
Con la ejecución de la vinculación entre las perforaciones MA016 y MA017, se logra, en esta primera etapa, reducir la concentración de nitratos por debajo de 100 mg/l. El punto de monitoreo en RED es MAPC2

SAN MIGUEL

Pozos MI017:

Se continúa el proyecto de interconexión del pozo MI017 al sistema San Miguel Centro, que luego se direccionará hacia el Centro de Mezcla Muñiz. Esta obra mejorará la calidad de la red abastecida por ambos sistemas.

Pozo MI056:

Se continúa con el proyecto para la interconexión del pozo MI056 con el Rebombeo Guarida, ubicado en las cercanías.

PILAR

En el caso de Pilar se proyecta la ejecución de la Impulsión de Agua Pilar 1 y las impulsiones Pilar 2 y 4, la construcción de un centro de mezcla y nuevas perforaciones e interconexiones de pozos para regularizar el servicio.

ASPECTOS GENERALES

Está prevista la Impulsión Noroeste, para transportar agua superficial de la planta Juan Manuel de Rosas, desde las Impulsiones Pilar 1 y Pilar Grand Bourg, pasando por el partido de José C. Paz, para finalmente llegar hasta los Centros de Mezcla previstos en Moreno y Loma Grande en Merlo.

Para el caso del Partido de Moreno y resto del Partido de Merlo a regularizar, se implementarán soluciones de regularización de la calidad del servicio mediante los centros de mezcla Moreno I, que ya se encuentra en ejecución, así como los centros de mezcla Moreno II, La Perlita en Moreno, y Loma Grande en Merlo, a partir de agua superficial transportada por la nueva Impulsión Noroeste. Adicionalmente, se planifican nuevas perforaciones de explotación tanto del acuífero Puelche como del Hipopuelche, cañerías de vinculación de los pozos en batería y las cañerías primarias de distribución a la red.

La ejecución de nuevas perforaciones en la zona de La Reja en el Partido de Moreno y las zonas de Pontevedra y Mariano Acosta en el Partido de Merlo permitirá mejorar la calidad del servicio y la incorporación de habitantes al servicio sujeto al resultado de los estudios hidrogeológicos a realizar en estas zonas.

Las obras se detallan en el PMOEM 2024-2028, aprobado por la Agencia de Planificación (APLA) mediante la Resolución N°29/2023 de fecha 28/9/23 y por la Secretaría de Obras Públicas bajo la Resolución N°526/2023 publicada el 25/10/2023.

aysa

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
170-INS-A-CA-RED-01-A (Ex 10)

Región // Distrito	Color u.c.						Turbiedad NTU						Alcalinidad mg/l						Aluminio mg/l					
	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de Conformidad		Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de Conformidad		Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de Conformidad		Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de Conformidad		Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)
Belgrano	150	2	98,7%	<	5	25,6%	681	14	97,9%	=	1,10	84,1%	150	0	100,0%	=	47	27,1%	150	9	94,0%	=	0,12	48,3%
Caballito	231	0	100,0%	<	5	0,0%	1.043	15	98,6%	=	1,03	68,7%	231	0	100,0%	=	49	26,9%	229	15	93,4%	=	0,12	44,5%
Centro	122	0	100,0%	<	5	12,5%	536	15	97,2%	=	1,00	73,7%	122	0	100,0%	=	46	25,3%	122	8	93,4%	=	0,13	43,3%
Constitucion	72	0	100,0%	<	5	0,0%	317	14	95,6%	=	1,30	60,1%	72	0	100,0%	=	53	27,2%	72	6	91,7%	=	0,13	39,6%
Devoto	111	0	100,0%	<	5	0,0%	507	27	94,7%	=	1,26	76,7%	111	0	100,0%	=	59	24,2%	109	13	88,1%	=	0,14	52,1%
Flores	153	4	97,4%	<	5	31,1%	684	18	97,4%	=	1,16	60,8%	153	0	100,0%	=	58	23,4%	153	12	92,2%	=	0,13	37,3%
CAPITAL	**839**	**6**	**99,3%**	**<**	**5**	**18,4%**	**3.768**	**103**	**97,3%**	**=**	**1,12**	**72,1%**	**839**	**0**	**100,0%**	**=**	**51**	**27,4%**	**835**	**63**	**92,5%**	**=**	**0,13**	**44,7%**
Escobar	30	0	100,0%	<	5	0,0%	120	0	100,0%	=	0,56	21,7%	30	1	96,7%	=	73	144,3%	30	0	100,0%	<	0,10	16,0%
Jose C Paz	12	0	100,0%	<	5	0,0%	48	0	100,0%	=	0,44	38,7%	12	9	25,0%	=	418	8,0%	12	0	100,0%	<	0,10	0,0%
Malvinas Argentinas	24	0	100,0%	<	5	0,0%	72	0	100,0%	=	0,56	24,6%	24	19	20,8%	=	464	12,6%	24	0	100,0%	<	0,10	0,0%
Pilar	156	0	100,0%	<	5	0,0%	611	0	100,0%	=	0,48	34,6%	153	107	30,1%	=	419	13,9%	156	0	100,0%	<	0,10	0,0%
San Fernando	61	0	100,0%	<	5	0,0%	265	1	99,6%	=	0,55	55,8%	61	0	100,0%	=	51	39,2%	60	6	90,0%	=	0,13	47,9%
San Isidro	84	1	98,8%	<	5	23,4%	407	20	95,1%	=	0,80	110,6%	84	0	100,0%	=	76	20,1%	83	10	88,0%	=	0,14	53,0%
San Martin	111	0	100,0%	<	5	0,0%	490	20	95,9%	=	1,33	62,5%	111	0	100,0%	=	73	22,5%	111	17	84,7%	=	0,14	56,7%
San Miguel	110	0	100,0%	<	5	0,0%	430	0	100,0%	=	0,52	31,2%	110	98	10,9%	=	467	15,3%	110	0	100,0%	<	0,10	0,0%
Tigre	91	1	98,9%	<	5	20,5%	409	1	99,8%	=	0,56	42,6%	91	0	100,0%	=	38	23,6%	91	0	100,0%	<	0,10	2,1%
Vicente Lopez	85	1	98,8%	<	5	41,4%	391	38	90,3%	=	1,39	82,9%	85	0	100,0%	=	57	33,4%	85	6	92,9%	=	0,13	55,0%
NORTE	**764**	**3**	**99,6%**	**<**	**5**	**17,9%**	**3.243**	**80**	**97,5%**	**=**	**0,78**	**92,2%**	**761**	**234**	**69,3%**	**=**	**209**	**91,5%**	**762**	**39**	**94,9%**	**=**	**0,12**	**45,5%**
La Matanza Norte	126	0	100,0%	<	5	8,8%	582	5	99,1%	=	1,00	60,4%	126	15	88,1%	=	127	106,2%	126	12	90,5%	=	0,14	56,9%
La Matanza Oeste	298	1	99,7%	<	5	11,5%	1.348	2	99,9%	=	0,49	48,2%	298	74	75,2%	=	284	56,3%	298	7	97,7%	=	0,11	46,5%
La Matanza Sur	141	0	100,0%	<	5	0,0%	653	13	98,0%	=	1,11	81,9%	141	0	100,0%	=	83	51,4%	141	4	97,2%	=	0,12	44,0%
Moreno	122	0	100,0%	<	5	0,0%	489	0	100,0%	=	0,36	36,2%	122	115	5,7%	=	489	12,2%	121	0	100,0%	<	0,10	0,0%
Merlo	125	1	99,2%	<	5	17,6%	493	0	100,0%	=	0,39	35,9%	125	98	21,6%	=	456	22,9%	124	0	100,0%	<	0,10	0,0%
Moron	151	0	100,0%	<	5	8,1%	721	2	99,7%	=	0,62	62,8%	152	13	91,4%	=	81	148,8%	152	11	92,8%	=	0,12	41,9%
Tres de Febrero	85	0	100,0%	<	5	0,0%	382	39	89,8%	=	1,48	80,8%	85	0	100,0%	=	46	30,7%	84	17	79,8%	=	0,15	54,1%
OESTE	**1.048**	**2**	**99,8%**	**<**	**5**	**9,7%**	**4.668**	**61**	**98,7%**	**=**	**0,72**	**92,7%**	**1.049**	**315**	**70,0%**	**=**	**234**	**83,7%**	**1.046**	**51**	**95,1%**	**=**	**0,12**	**46,6%**
Avellaneda	100	0	100,0%	<	5	0,0%	486	0	100,0%	=	0,96	37,6%	100	0	100,0%	=	58	26,4%	100	17	83,0%	=	0,18	76,7%
Florencio Varela	226	0	100,0%	<	5	0,0%	878	0	100,0%	=	0,38	15,1%	226	148	34,5%	=	444	18,2%	226	0	100,0%	<	0,10	0,0%
Lanus	120	0	100,0%	<	5	0,0%	578	1	99,8%	=	0,93	40,8%	120	0	100,0%	=	59	26,7%	120	30	75,0%	=	0,18	42,1%
Quilmes	169	0	100,0%	<	5	7,6%	789	0	100,0%	=	0,78	31,4%	168	9	94,6%	=	81	122,1%	169	17	89,9%	=	0,13	55,1%
SUDESTE	**615**	**0**	**100,0%**	**<**	**5**	**4,0%**	**2.731**	**1**	**100,0%**	**=**	**0,72**	**50,1%**	**614**	**157**	**74,4%**	**=**	**207**	**94,5%**	**615**	**64**	**89,6%**	**=**	**0,14**	**59,7%**
Almte Brown	97	0	100,0%	<	5	0,0%	439	0	100,0%	=	0,64	75,8%	97	16	83,5%	=	196	80,3%	97	8	91,8%	=	0,13	43,0%
Esteban Echeverria	89	0	100,0%	<	5	0,0%	420	0	100,0%	=	0,42	62,7%	89	35	60,7%	=	323	43,1%	89	0	100,0%	<	0,10	10,3%
Ezeiza	73	1	98,6%	<	5	22,8%	350	1	99,7%	=	0,45	65,7%	73	51	30,1%	=	416	19,2%	72	0	100,0%	<	0,10	0,0%
Lomas de Zamora	174	0	100,0%	<	5	0,0%	820	3	99,6%	=	0,79	71,4%	174	8	95,4%	=	120	98,7%	174	11	93,7%	=	0,14	38,7%
Presidente Peron	23	0	100,0%	<	5	0,0%	82	0	100,0%	=	0,32	56,2%	23	6	73,9%	=	368	11,5%	23	0	100,0%	<	0,10	0,0%
SUDOESTE	**456**	**1**	**99,8%**	**<**	**5**	**9,3%**	**2.111**	**4**	**99,8%**	**=**	**0,61**	**78,4%**	**456**	**116**	**74,6%**	**=**	**168**	**71,6%**	**455**	**19**	**95,8%**	**=**	**0,12**	**38,2%**
TOTAL	**3.722**	**12**	**99,7%**	**<**	**5**	**13,6%**	**16.521**	**249**	**98,5%**	**=**	**0,81**	**83,6%**	**3.719**	**822**	**77,9%**	**=**	**183**	**99,6%**	**3.713**	**236**	**93,6%**	**=**	**0,12**	**48,4%**

aysa

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

170-INS-A-CA-RED-01-B (Ex 10)

Región // Distrito	Nitratos mg/l					Cloro Libre mg/l					Hierro mg/l					pH u.pH				
	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de Conformidad	Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de Conformidad	Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de Conformidad	Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de Conformidad	Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)
Belgrano	150	0	100,0%	= 3,5	31,6%	690	0	100,0%	= 1,82	0,0%	150	2	98,7%	< 0,05	43,2%	150	0	100,0%	= 7,5	4,6%
Caballito	231	1	99,6%	= 4,3	112,4%	1.048	0	100,0%	= 1,92	0,0%	229	2	99,1%	< 0,05	16,6%	231	0	100,0%	= 7,4	5,1%
Centro	122	0	100,0%	= 3,5	28,6%	542	0	100,0%	= 1,99	0,0%	122	2	98,4%	< 0,05	20,0%	122	0	100,0%	= 7,5	5,4%
Constitucion	72	0	100,0%	= 4,5	32,6%	324	0	100,0%	= 1,75	0,0%	72	0	100,0%	< 0,05	9,4%	72	0	100,0%	= 7,4	3,2%
Devoto	111	0	100,0%	= 5,1	22,3%	507	0	100,0%	= 1,85	0,0%	109	1	99,1%	< 0,05	18,2%	110	0	100,0%	= 7,4	3,9%
Flores	153	0	100,0%	= 5,0	24,4%	687	0	100,0%	= 1,50	0,0%	153	2	98,7%	< 0,05	26,0%	153	0	100,0%	= 7,3	3,6%
CAPITAL	**839**	**1**	**99,9%**	**= 4,3**	**64,4%**	**3.798**	**0**	**100,0%**	**= 1,81**	**35,2%**	**835**	**9**	**98,9%**	**< 0,05**	**25,9%**	**838**	**0**	**100,0%**	**= 7,4**	**4,6%**
Escobar	30	0	100,0%	= 6,2	165,8%	120	0	100,0%	= 1,14	0,0%	30	1	96,7%	< 0,05	27,7%	30	0	100,0%	= 7,8	3,0%
Jose C Paz	12	3	75,0%	= 35,1	51,7%	48	0	100,0%	= 1,02	0,0%	12	0	100,0%	< 0,05	0,0%	12	0	100,0%	= 7,5	1,0%
Malvinas Argentinas	24	24	0,0%	= 88,2	16,5%	72	0	100,0%	= 1,02	0,0%	24	0	100,0%	< 0,05	0,0%	24	0	100,0%	= 7,3	2,1%
Pilar	153	73	52,3%	= 45,6	35,1%	611	2	99,7%	= 1,07	0,0%	156	0	100,0%	< 0,05	8,0%	156	0	100,0%	= 7,5	2,1%
San Fernando	61	0	100,0%	= 4,6	52,4%	265	0	100,0%	= 1,13	0,0%	60	0	100,0%	< 0,05	19,7%	61	0	100,0%	= 7,6	4,8%
San Isidro	84	0	100,0%	= 7,5	19,9%	408	0	100,0%	= 1,23	0,0%	83	1	98,8%	< 0,05	27,6%	84	0	100,0%	= 7,3	2,9%
San Martin	111	0	100,0%	= 7,1	24,3%	490	1	99,8%	= 1,65	0,0%	111	3	97,3%	< 0,05	26,8%	111	0	100,0%	= 7,4	3,2%
San Miguel	110	109	0,9%	= 72,6	16,9%	430	0	100,0%	= 1,04	0,0%	110	0	100,0%	< 0,05	0,0%	110	0	100,0%	= 7,3	2,4%
Tigre	91	0	100,0%	= 2,9	27,3%	409	0	100,0%	= 1,19	0,0%	91	0	100,0%	< 0,05	0,0%	91	0	100,0%	= 7,8	3,5%
Vicente Lopez	85	0	100,0%	= 4,9	42,3%	391	0	100,0%	= 1,88	0,0%	85	6	92,9%	= 0,06	56,0%	85	0	100,0%	= 7,4	4,7%
NORTE	**761**	**209**	**72,5%**	**= 26,4**	**111,3%**	**3.244**	**3**	**99,9%**	**= 1,29**	**39,3%**	**762**	**11**	**98,6%**	**< 0,05**	**27,7%**	**764**	**0**	**100,0%**	**= 7,5**	**4,0%**
La Matanza Norte	126	22	82,5%	= 22,1	152,2%	582	8	98,6%	= 1,51	0,0%	126	2	98,4%	= 0,06	89,0%	126	0	100,0%	= 7,3	3,1%
La Matanza Oeste	298	65	78,2%	= 34,4	71,4%	1.348	3	99,8%	= 1,14	0,0%	298	1	99,7%	< 0,05	18,9%	298	0	100,0%	= 7,5	2,6%
La Matanza Sur	141	0	100,0%	= 10,1	86,6%	653	0	100,0%	= 1,56	0,0%	141	1	99,3%	< 0,05	23,1%	141	0	100,0%	= 7,3	2,6%
Moreno	122	88	27,9%	= 60,0	32,4%	489	21	95,7%	= 1,04	0,0%	121	0	100,0%	< 0,05	0,0%	122	0	100,0%	= 7,5	1,9%
Merlo	125	109	12,8%	= 67,0	24,1%	493	22	95,5%	= 0,92	0,0%	124	0	100,0%	< 0,05	0,0%	125	0	100,0%	= 7,4	2,6%
Moron	152	10	93,4%	= 7,4	175,7%	721	1	99,9%	= 1,21	0,0%	152	2	98,7%	< 0,05	19,0%	152	0	100,0%	= 7,4	4,8%
Tres de Febrero	85	0	100,0%	= 3,4	36,3%	382	0	100,0%	= 1,75	0,0%	84	0	100,0%	< 0,05	14,1%	85	0	100,0%	= 7,4	4,6%
OESTE	**1.049**	**294**	**72,0%**	**= 30,1**	**98,6%**	**4.668**	**55**	**98,8%**	**= 1,27**	**47,0%**	**1.046**	**6**	**99,4%**	**< 0,05**	**37,0%**	**1.049**	**0**	**100,0%**	**= 7,4**	**3,4%**
Avellaneda	100	0	100,0%	= 5,1	26,0%	486	0	100,0%	= 1,80	0,0%	100	1	99,0%	= 0,06	60,1%	100	0	100,0%	= 7,3	3,1%
Florencio Varela	226	160	29,2%	= 59,7	39,5%	878	17	98,1%	= 1,43	0,0%	226	0	100,0%	< 0,05	5,5%	226	0	100,0%	= 7,5	2,6%
Lanus	120	0	100,0%	= 5,5	27,2%	578	0	100,0%	= 1,85	0,0%	120	0	100,0%	< 0,05	17,2%	120	0	100,0%	= 7,4	3,5%
Quilmes	168	7	95,8%	= 7,9	126,8%	789	2	99,7%	= 1,73	0,0%	169	5	97,0%	< 0,05	36,7%	169	0	100,0%	= 7,4	3,9%
SUDESTE	**614**	**167**	**72,8%**	**= 26,0**	**114,9%**	**2.731**	**19**	**99,3%**	**= 1,67**	**47,5%**	**615**	**6**	**99,0%**	**< 0,05**	**33,6%**	**615**	**0**	**100,0%**	**= 7,4**	**3,4%**
Almte Brown	97	5	94,8%	= 19,3	84,2%	439	5	98,9%	= 1,44	0,0%	97	1	99,0%	< 0,05	16,1%	97	0	100,0%	= 7,4	3,3%
Esteban Echeverria	89	4	95,5%	= 30,9	30,1%	420	12	97,1%	= 1,29	0,0%	89	1	98,9%	< 0,05	12,7%	89	0	100,0%	= 7,5	3,1%
Ezeiza	73	0	100,0%	= 13,8	78,5%	350	5	98,6%	= 1,16	0,0%	72	0	100,0%	< 0,05	0,0%	73	0	100,0%	= 7,7	2,3%
Lomas de Zamora	174	12	93,1%	= 12,5	113,3%	820	2	99,8%	= 1,42	0,0%	174	0	100,0%	< 0,05	16,6%	175	0	100,0%	= 7,4	2,8%
Presidente Peron	23	0	100,0%	= 23,9	40,1%	82	9	89,0%	= 1,10	0,0%	23	0	100,0%	< 0,05	0,0%	23	0	100,0%	= 7,6	1,4%
SUDOESTE	**456**	**21**	**95,4%**	**= 18,3**	**81,1%**	**2.111**	**33**	**98,4%**	**= 1,34**	**40,1%**	**455**	**2**	**99,6%**	**< 0,05**	**14,1%**	**457**	**0**	**100,0%**	**= 7,4**	**3,2%**
TOTAL	**3.719**	**692**	**81,4%**	**= 21,4**	**123,5%**	**16.552**	**110**	**99,3%**	**= 1,48**	**44,9%**	**3.713**	**34**	**99,1%**	**< 0,05**	**30,1%**	**3.723**	**0**	**100,0%**	**= 7,4**	**3,8%**

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

170-INS-A-CA-RED-01-C (Ex 10)

Región // Distrito	Residuo Conductimétrico mg/l						Bacterias Heterótrofas (*) UFC/ml						Coliformes Totales (*) UFC/100ml						Escherichia Coli (*) UFC/100ml						Pseudomonas Aeruginosas (*) P-A/100ml					
	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de Conformidad		Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de Conformidad				Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de Conformidad				Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de Conformidad				Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de Conformidad			
Belgrano	150	0	100,0%	=	199	17,1%	690	1	99,9%				690	0	100,0%				690	0	100,0%				690	10	98,6%			
Caballito	231	0	100,0%	=	209	33,7%	1.048	11	99,0%				1.048	1	99,9%				1.048	0	100,0%				1.048	7	99,3%			
Centro	122	0	100,0%	=	199	15,8%	542	4	99,3%				542	2	99,6%				542	0	100,0%				542	11	98,0%			
Constitucion	72	0	100,0%	=	213	14,2%	324	0	100,0%				324	0	100,0%				324	0	100,0%				324	3	99,1%			
Devoto	111	0	100,0%	=	216	28,7%	507	1	99,8%				507	1	99,8%				507	0	100,0%				507	11	97,8%			
Flores	153	0	100,0%	=	224	24,4%	686	2	99,7%				687	3	99,6%				687	0	100,0%				686	14	98,0%			
CAPITAL	**839**	**0**	**100,0%**	**=**	**210**	**25,7%**	**3.797**	**19**	**99,5%**				**3.798**	**7**	**99,8%**				**3.798**	**0**	**100,0%**				**3.797**	**56**	**98,5%**			
Escobar	30	0	100,0%	=	214	63,3%	120	1	99,2%				120	0	100,0%				120	0	100,0%				120	0	100,0%			
Jose C Paz	12	0	100,0%	=	589	19,4%	48	0	100,0%				48	0	100,0%				48	0	100,0%				48	0	100,0%			
Malvinas Argentinas	24	0	100,0%	=	754	12,1%	72	1	98,6%				72	1	98,6%				72	0	100,0%				72	0	100,0%			
Pilar	155	0	100,0%	=	616	12,5%	611	3	99,5%				611	3	99,5%				611	0	100,0%				611	19	96,9%			
San Fernando	61	0	100,0%	=	194	23,5%	265	3	98,9%				265	0	100,0%				265	0	100,0%				265	1	99,6%			
San Isidro	84	0	100,0%	=	242	17,1%	408	1	99,8%				408	0	100,0%				408	0	100,0%				408	2	99,5%			
San Martin	111	0	100,0%	=	238	17,4%	490	3	99,4%				490	1	99,8%				490	0	100,0%				490	12	97,6%			
San Miguel	110	9	91,8%	=	773	20,5%	430	6	98,6%				430	3	99,3%				430	0	100,0%				430	8	98,1%			
Tigre	91	0	100,0%	=	163	16,4%	409	3	99,3%				409	1	99,8%				409	0	100,0%				409	3	99,3%			
Vicente Lopez	85	0	100,0%	=	216	28,1%	391	2	99,5%				391	0	100,0%				391	0	100,0%				391	6	98,5%			
NORTE	**763**	**9**	**98,8%**	**=**	**398**	**63,0%**	**3.244**	**23**	**99,3%**				**3.244**	**9**	**99,7%**				**3.244**	**0**	**100,0%**				**3.244**	**51**	**98,4%**			
La Matanza Norte	126	0	100,0%	=	315	62,2%	582	1	99,8%				582	2	99,7%				582	0	100,0%				582	16	97,3%			
La Matanza Oeste	298	1	99,7%	=	591	43,7%	1.348	4	99,7%				1.348	4	99,7%				1.348	0	100,0%				1.348	43	96,8%			
La Matanza Sur	141	0	100,0%	=	266	28,8%	653	2	99,7%				653	3	99,5%				653	0	100,0%				653	18	97,2%			
Moreno	122	0	100,0%	=	743	13,0%	489	8	98,4%				489	2	99,6%				489	0	100,0%				489	32	93,5%			
Merlo	125	2	98,4%	=	737	21,2%	493	1	99,8%				493	3	99,4%				493	0	100,0%				493	9	98,2%			
Moron	152	0	100,0%	=	239	63,8%	721	1	99,9%				721	1	99,9%				721	0	100,0%				721	3	99,6%			
Tres de Febrero	85	0	100,0%	=	200	22,2%	382	0	100,0%				382	1	99,7%				382	0	100,0%				382	9	97,6%			
OESTE	**1.049**	**3**	**99,7%**	**=**	**467**	**58,8%**	**4.668**	**17**	**99,6%**				**4.668**	**16**	**99,7%**				**4.668**	**0**	**100,0%**				**4.668**	**130**	**97,2%**			
Avellaneda	100	0	100,0%	=	234	21,5%	486	0	100,0%				486	0	100,0%				486	0	100,0%				486	0	100,0%			
Florencio Varela	225	3	98,7%	=	715	20,0%	878	35	96,0%				878	11	98,7%				878	0	100,0%				878	42	95,2%			
Lanus	120	0	100,0%	=	234	30,9%	578	4	99,3%				578	0	100,0%				578	0	100,0%				578	0	100,0%			
Quilmes	169	0	100,0%	=	250	55,0%	789	4	99,5%				789	1	99,9%				789	0	100,0%				789	2	99,7%			
SUDESTE	**614**	**3**	**99,5%**	**=**	**415**	**62,1%**	**2.731**	**43**	**98,4%**				**2.731**	**12**	**99,6%**				**2.731**	**0**	**100,0%**				**2.731**	**44**	**98,4%**			
Almte Brown	97	9	90,7%	=	462	66,4%	439	0	100,0%				439	0	100,0%				439	0	100,0%				439	6	98,6%			
Esteban Echeverria	89	1	98,9%	=	589	39,9%	420	1	99,8%				420	0	100,0%				420	0	100,0%				420	7	98,3%			
Ezeiza	73	25	65,8%	=	807	31,8%	350	0	100,0%				350	2	99,4%				350	0	100,0%				350	9	97,4%			
Lomas de Zamora	174	9	94,8%	=	335	67,5%	819	1	99,9%				820	2	99,8%				820	0	100,0%				819	5	99,4%			
Presidente Peron	23	0	100,0%	=	519	15,3%	82	1	98,8%				82	1	98,8%				82	0	100,0%				82	2	97,6%			
SUDOESTE	**456**	**44**	**90,4%**	**=**	**497**	**59,8%**	**2.110**	**3**	**99,9%**				**2.111**	**5**	**99,8%**				**2.111**	**0**	**100,0%**				**2.110**	**29**	**98,6%**			
TOTAL	**3.721**	**59**	**98,4%**	**=**	**390**	**66,4%**	**16.550**	**105**	**99,4%**				**16.552**	**49**	**99,7%**				**16.552**	**0**	**100,0%**				**16.550**	**310**	**98,1%**			

Nota:

(*) Dado que éstos parámetros poseen unidades de medida que hacen que el cálculo del promedio y el coeficiente de variación carezcan de valor estadístico, no se consignan los mismos.

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

170-INS-A-CA-RED-01-D (Ex 10)

Región // Distrito	Arsénico µg/l					
	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de Conformidad		Concentración Promedio	Coeficiente de Variación (%)
Belgrano	150	0	100,0%	<	5	0,0%
Caballito	229	0	100,0%	<	5	0,0%
Centro	122	0	100,0%	<	5	0,0%
Constitucion	72	0	100,0%	<	5	0,0%
Devoto	109	0	100,0%	<	5	0,0%
Flores	153	0	100,0%	<	5	0,0%
CAPITAL	**835**	**0**	**100,0%**	**<**	**5**	**0,0%**
Escobar	30	0	100,0%	=	6	61,7%
Jose C Paz	12	0	100,0%	=	35	6,5%
Malvinas Argentinas	24	0	100,0%	=	16	11,4%
Pilar	156	0	100,0%	=	24	24,8%
San Fernando	60	0	100,0%	<	5	0,0%
San Isidro	83	0	100,0%	<	5	0,0%
San Martin	111	0	100,0%	<	5	0,0%
San Miguel	110	0	100,0%	=	18	38,6%
Tigre	91	0	100,0%	<	5	0,0%
Vicente Lopez	85	0	100,0%	<	5	0,0%
NORTE	**762**	**0**	**100,0%**	**=**	**12**	**80,0%**
La Matanza Norte	126	0	100,0%	=	7	62,7%
La Matanza Oeste	298	0	100,0%	=	19	56,8%
La Matanza Sur	141	0	100,0%	<	5	6,5%
Moreno	121	0	100,0%	=	23	26,0%
Merlo	124	0	100,0%	=	17	35,8%
Moron	152	0	100,0%	=	6	50,9%
Tres de Febrero	84	0	100,0%	<	5	0,0%
OESTE	**1.046**	**0**	**100,0%**	**=**	**13**	**75,7%**
Avellaneda	100	0	100,0%	<	5	0,0%
Florencio Varela	226	0	100,0%	=	22	28,9%
Lanus	120	0	100,0%	<	5	0,0%
Quilmes	169	0	100,0%	<	5	38,1%
SUDESTE	**615**	**0**	**100,0%**	**=**	**12**	**80,2%**
Almte Brown	97	0	100,0%	=	15	75,4%
Esteban Echeverria	89	0	100,0%	=	21	56,8%
Ezeiza	72	0	100,0%	=	33	31,6%
Lomas de Zamora	174	0	100,0%	=	8	87,9%
Presidente Peron	23	0	100,0%	=	34	25,8%
SUDOESTE	**455**	**0**	**100,0%**	**=**	**17**	**78,5%**
TOTAL	**3.713**	**0**	**100,0%**	**=**	**11**	**87,2%**

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
180-INS-A-CA-RED-02-A (Ex 11)

Región // Distrito	Dureza Total mg/l					Olor (*)					Sabor (*)					Cadmio µg/l					Cianuro mg/l				
	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (ug/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	150	0	100,0%	= 63,7	17,0%	75	0	100,0%			75	0	100,0%			150	0	100,0%	< 0,10	0,0%	75	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Caballito	229	0	100,0%	= 63,8	15,9%	114	0	100,0%			114	0	100,0%			229	0	100,0%	< 0,10	0,0%	114	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Centro	122	0	100,0%	= 61,9	15,4%	60	0	100,0%			60	0	100,0%			122	0	100,0%	< 0,10	0,0%	60	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Constitucion	72	0	100,0%	= 64,7	14,4%	36	0	100,0%			36	0	100,0%			72	0	100,0%	< 0,10	0,0%	36	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Devoto	109	0	100,0%	= 70,9	17,5%	58	0	100,0%			58	0	100,0%			109	0	100,0%	< 0,10	0,0%	58	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Flores	153	0	100,0%	= 69,3	15,6%	77	0	100,0%			77	0	100,0%			153	0	100,0%	< 0,10	0,0%	77	0	100,0%	< 0,05	0,0%
REGION CAPITAL FEDERAL	**835**	**0**	**100,0%**	**= 65,5**	**16,8%**	**420**	**0**	**100,0%**			**420**	**0**	**100,0%**			**835**	**0**	**100,0%**	**< 0,10**	**0,0%**	**420**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**
Escobar	30	0	100,0%	= 60,1	54,3%	20	0	100,0%			20	0	100,0%			30	0	100,0%	< 0,10	0,0%	20	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Jose C Paz	12	0	100,0%	= 90,3	19,5%	12	0	100,0%			12	0	100,0%			12	0	100,0%	< 0,10	0,0%	12	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Malvinas Argentinas	24	0	100,0%	= 251,6	18,3%	12	0	100,0%			12	0	100,0%			24	0	100,0%	< 0,10	0,0%	12	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Pilar	156	0	100,0%	= 155,7	40,5%	106	1	99,1%			106	0	100,0%			156	0	100,0%	< 0,10	0,0%	106	0	100,0%	< 0,05	0,0%
San Fernando	60	0	100,0%	= 63,3	27,0%	36	0	100,0%			36	0	100,0%			60	0	100,0%	< 0,10	0,0%	36	0	100,0%	< 0,05	0,0%
San Isidro	83	0	100,0%	= 82,7	16,6%	50	0	100,0%			50	0	100,0%			83	0	100,0%	< 0,10	0,0%	50	0	100,0%	< 0,05	0,0%
San Martin	111	0	100,0%	= 81,0	15,2%	62	0	100,0%			62	0	100,0%			111	0	100,0%	< 0,10	0,0%	62	0	100,0%	< 0,05	0,0%
San Miguel	110	2	98,2%	= 249,7	31,8%	74	0	100,0%			74	0	100,0%			110	0	100,0%	< 0,10	0,0%	74	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Tigre	91	0	100,0%	= 49,2	17,8%	52	0	100,0%			52	0	100,0%			91	0	100,0%	< 0,10	0,0%	52	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Vicente Lopez	85	0	100,0%	= 67,9	22,4%	49	0	100,0%			49	0	100,0%			85	0	100,0%	< 0,10	0,0%	49	0	100,0%	< 0,05	0,0%
REGION NORTE	**762**	**2**	**99,7%**	**= 118,9**	**69,6%**	**473**	**1**	**99,8%**			**473**	**0**	**100,0%**			**762**	**0**	**100,0%**	**< 0,10**	**0,0%**	**473**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**
La Matanza Norte	126	0	100,0%	= 95,1	56,8%	71	0	100,0%			71	0	100,0%			126	0	100,0%	< 0,10	0,0%	71	0	100,0%	< 0,05	0,0%
La Matanza Oeste	298	0	100,0%	= 117,0	47,4%	155	0	100,0%			155	0	100,0%			298	0	100,0%	< 0,10	0,0%	155	0	100,0%	< 0,05	0,0%
La Matanza Sur	141	0	100,0%	= 79,9	22,2%	81	0	100,0%			81	0	100,0%			141	0	100,0%	< 0,10	0,0%	81	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Merlo	124	0	100,0%	= 184,4	32,6%	82	0	100,0%			82	0	100,0%			124	0	100,0%	< 0,10	0,0%	82	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Moreno	121	0	100,0%	= 138,6	28,6%	80	0	100,0%			80	0	100,0%			121	0	100,0%	< 0,10	0,0%	80	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Moron	152	0	100,0%	= 67,3	45,0%	88	0	100,0%			88	0	100,0%			152	0	100,0%	< 0,10	0,0%	87	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Tres de Febrero	84	0	100,0%	= 59,2	18,8%	48	0	100,0%			48	0	100,0%			84	0	100,0%	< 0,10	0,0%	48	0	100,0%	< 0,05	0,0%
REGION OESTE	**1.046**	**0**	**100,0%**	**= 108,0**	**54,0%**	**605**	**0**	**100,0%**			**605**	**0**	**100,0%**			**1.046**	**0**	**100,0%**	**< 0,10**	**0,0%**	**604**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**
Avellaneda	100	0	100,0%	= 67,5	20,0%	60	0	100,0%			60	0	100,0%			100	0	100,0%	< 0,10	0,0%	60	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Florencio Varela	226	0	100,0%	= 161,8	44,3%	151	0	100,0%			151	0	100,0%			226	0	100,0%	< 0,10	0,0%	151	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Lanus	120	0	100,0%	= 67,5	18,8%	72	0	100,0%			72	0	100,0%			120	0	100,0%	< 0,10	0,0%	72	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Quilmes	169	0	100,0%	= 72,0	55,5%	96	0	100,0%			96	0	100,0%			169	0	100,0%	< 0,10	0,0%	96	0	100,0%	< 0,05	0,0%
REGION SUDESTE	**615**	**0**	**100,0%**	**= 103,4**	**63,9%**	**379**	**0**	**100,0%**			**379**	**0**	**100,0%**			**615**	**0**	**100,0%**	**< 0,10**	**0,0%**	**379**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**
Almte Brown	97	0	100,0%	= 87,7	42,0%	55	0	100,0%			55	0	100,0%			97	0	100,0%	< 0,10	0,0%	55	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Esteban Echeverria	89	0	100,0%	= 99,4	29,8%	54	0	100,0%			54	0	100,0%			89	0	100,0%	< 0,10	0,0%	54	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Ezeiza	72	0	100,0%	= 97,6	17,1%	44	0	100,0%			44	0	100,0%			72	0	100,0%	< 0,10	0,0%	44	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Lomas de Zamora	174	0	100,0%	= 81,2	36,3%	105	0	100,0%			105	0	100,0%			174	0	100,0%	< 0,10	2,3%	104	0	100,0%	< 0,05	0,0%
Presidente Peron	23	0	100,0%	= 103,4	20,2%	13	0	100,0%			13	0	100,0%			23	0	100,0%	< 0,10	0,0%	13	0	100,0%	< 0,05	0,0%
REGION SUDOESTE	**455**	**0**	**100,0%**	**= 89,9**	**33,7%**	**271**	**0**	**100,0%**			**271**	**0**	**100,0%**			**455**	**0**	**100,0%**	**< 0,10**	**1,4%**	**270**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**
Total general	**3.713**	**2**	**99,9%**	**= 97,7**	**61,3%**	**2.148**	**1**	**100,0%**			**2.148**	**0**	**100,0%**			**3.713**	**0**	**100,0%**	**< 0,10**	**0,5%**	**2.146**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor a

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
180-INS-A-CA-RED-02-B (Ex 11)

Región // Distrito	Cloruros mg/l					Cobre mg/l					Cromo µg/l					Fluoruro mg/l				
	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	150	0	100,0%	=	40,3	17,4%	150	0	100,0%	<	0,05	0,0%	150	0	100,0%	<	5,0	0,0%	150	0	100,0%	<	0,5	0,0%
Caballito	231	0	100,0%	=	40,4	21,2%	229	0	100,0%	<	0,05	9,2%	229	0	100,0%	<	5,0	0,0%	231	0	100,0%	<	0,5	0,0%
Centro	122	0	100,0%	=	40,1	17,7%	122	0	100,0%	<	0,05	18,2%	122	0	100,0%	<	5,0	0,0%	122	0	100,0%	<	0,5	0,0%
Constitucion	72	0	100,0%	=	42,3	15,5%	72	0	100,0%	<	0,05	0,0%	72	0	100,0%	<	5,0	0,0%	72	0	100,0%	<	0,5	0,0%
Devoto	111	0	100,0%	=	40,7	24,9%	109	0	100,0%	<	0,05	0,0%	109	0	100,0%	<	5,0	0,0%	111	0	100,0%	<	0,5	0,0%
Flores	153	0	100,0%	=	42,4	16,2%	153	0	100,0%	<	0,05	0,0%	153	0	100,0%	<	5,0	0,0%	153	0	100,0%	<	0,5	0,0%
REGION CAPITAL FEDERAL	**839**	**0**	**100,0%**	**=**	**40,9**	**19,3%**	**835**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**8,6%**	**835**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**839**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,5**	**0,0%**
Escobar	30	0	100,0%	=	32,1	20,6%	30	0	100,0%	<	0,05	0,0%	30	0	100,0%	=	5,2	13,6%	30	0	100,0%	<	0,5	8,5%
Jose C Paz	12	0	100,0%	=	35,1	9,9%	12	0	100,0%	<	0,05	0,0%	12	0	100,0%	<	5,0	0,0%	12	0	100,0%	=	0,9	11,4%
Malvinas Argentinas	24	0	100,0%	=	54,0	20,1%	24	0	100,0%	<	0,05	0,0%	24	0	100,0%	<	5,0	0,0%	24	0	100,0%	=	0,5	10,1%
Pilar	153	0	100,0%	=	29,6	34,0%	156	0	100,0%	<	0,05	0,0%	156	0	100,0%	=	5,4	41,5%	153	0	100,0%	=	0,8	16,7%
San Fernando	61	0	100,0%	=	37,6	22,7%	60	0	100,0%	<	0,05	0,0%	60	0	100,0%	=	5,1	11,9%	61	0	100,0%	<	0,5	0,0%
San Isidro	84	0	100,0%	=	42,5	19,8%	83	0	100,0%	<	0,05	0,0%	83	0	100,0%	=	5,2	12,9%	84	0	100,0%	<	0,5	0,0%
San Martin	111	0	100,0%	=	42,8	23,9%	111	0	100,0%	<	0,05	0,0%	111	0	100,0%	=	5,2	12,0%	111	0	100,0%	<	0,5	1,9%
San Miguel	110	0	100,0%	=	57,1	63,2%	110	0	100,0%	<	0,05	0,0%	110	0	100,0%	<	5,0	0,0%	110	0	100,0%	=	0,5	14,8%
Tigre	91	0	100,0%	=	33,1	19,1%	91	0	100,0%	<	0,05	0,0%	91	0	100,0%	<	5,0	0,0%	91	0	100,0%	<	0,5	0,0%
Vicente Lopez	85	0	100,0%	=	41,0	20,1%	85	0	100,0%	<	0,05	0,0%	85	0	100,0%	=	5,1	6,1%	85	0	100,0%	<	0,5	0,0%
REGION NORTE	**761**	**0**	**100,0%**	**=**	**40,2**	**45,5%**	**762**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**0,0%**	**762**	**0**	**100,0%**	**=**	**5,2**	**21,1%**	**761**	**0**	**100,0%**	**=**	**0,6**	**24,2%**
La Matanza Norte	126	0	100,0%	=	45,8	21,7%	126	0	100,0%	<	0,05	0,0%	126	0	100,0%	<	5,0	0,0%	126	0	100,0%	<	0,5	5,2%
La Matanza Oeste	298	0	100,0%	=	68,5	58,6%	298	0	100,0%	<	0,05	0,0%	298	0	100,0%	<	5,0	0,0%	298	0	100,0%	=	0,7	29,3%
La Matanza Sur	141	0	100,0%	=	47,4	20,4%	141	0	100,0%	<	0,05	0,0%	141	0	100,0%	<	5,0	0,0%	141	0	100,0%	<	0,5	0,0%
Merlo	125	0	100,0%	=	51,2	44,7%	124	0	100,0%	<	0,05	0,0%	124	0	100,0%	=	5,1	9,0%	125	0	100,0%	=	0,7	23,4%
Moreno	122	0	100,0%	=	40,5	32,5%	121	0	100,0%	<	0,05	0,0%	121	0	100,0%	<	5,0	0,0%	122	0	100,0%	=	0,8	17,8%
Moron	152	0	100,0%	=	40,9	18,8%	152	0	100,0%	<	0,05	0,0%	152	0	100,0%	<	5,0	0,0%	152	0	100,0%	=	0,5	15,3%
Tres de Febrero	85	0	100,0%	=	43,2	24,9%	84	0	100,0%	<	0,05	0,0%	84	0	100,0%	<	5,0	0,0%	85	0	100,0%	<	0,5	0,0%
REGION OESTE	**1.049**	**0**	**100,0%**	**=**	**51,6**	**51,5%**	**1.046**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**0,0%**	**1.046**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**3,2%**	**1.049**	**0**	**100,0%**	**=**	**0,6**	**29,1%**
Avellaneda	100	0	100,0%	=	48,7	21,4%	100	0	100,0%	<	0,05	0,0%	100	0	100,0%	<	5,0	0,0%	100	0	100,0%	<	0,5	0,0%
Florencio Varela	226	1	99,6%	=	49,5	64,8%	226	0	100,0%	<	0,05	0,0%	226	0	100,0%	<	5,0	0,4%	226	0	100,0%	=	0,6	19,2%
Lanus	120	0	100,0%	=	48,0	22,3%	120	0	100,0%	<	0,05	0,0%	120	0	100,0%	<	5,0	0,0%	120	0	100,0%	<	0,5	0,0%
Quilmes	168	0	100,0%	=	44,8	22,6%	169	0	100,0%	<	0,05	0,0%	169	0	100,0%	<	5,0	0,0%	168	0	100,0%	<	0,5	0,0%
REGION SUDESTE	**614**	**1**	**99,8%**	**=**	**47,8**	**44,3%**	**615**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**0,0%**	**615**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,2%**	**614**	**0**	**100,0%**	**=**	**0,6**	**18,1%**
Almte Brown	97	0	100,0%	=	66,1	73,4%	97	0	100,0%	<	0,05	0,0%	97	0	100,0%	<	5,0	0,0%	97	0	100,0%	=	0,6	16,0%
Esteban Echeverria	89	0	100,0%	=	58,6	65,1%	89	0	100,0%	<	0,05	0,0%	89	0	100,0%	=	6,1	53,8%	89	0	100,0%	=	0,6	22,7%
Ezeiza	73	0	100,0%	=	96,8	72,0%	72	0	100,0%	<	0,05	0,0%	72	0	100,0%	<	5,0	0,0%	73	0	100,0%	=	0,9	17,4%
Lomas de Zamora	174	0	100,0%	=	55,5	55,7%	174	0	100,0%	<	0,05	0,0%	174	0	100,0%	<	5,0	0,0%	174	0	100,0%	=	0,5	14,7%
Presidente Peron	23	0	100,0%	=	28,5	36,3%	23	0	100,0%	<	0,05	0,0%	23	0	100,0%	<	5,0	0,0%	23	0	100,0%	=	0,8	14,3%
REGION SUDOESTE	**456**	**0**	**100,0%**	**=**	**63,6**	**73,5%**	**455**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**0,0%**	**455**	**0**	**100,0%**	**=**	**5,2**	**29,0%**	**456**	**0**	**100,0%**	**=**	**0,6**	**27,4%**
Total general	**3.719**	**1**	**100,0%**	**=**	**47,7**	**54,7%**	**3.713**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**4,1%**	**3.713**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**14,5%**	**3.719**	**0**	**100,0%**	**=**	**0,6**	**25,2%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al li

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

180-INS-A-CA-RED-02-C (Ex 11)

Región // Distrito	Manganeso (mg/l)						Mercurio µg/l						Plomo µg/l						Selenio µg/l						Sulfato (mg/l)					
	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	150	5	96,7%	=	0,04	16,0%	150	0	100,0%	<	0,5	0,0%	150	0	100,0%	<	5,0	0,0%	150	0	100,0%	<	5,0	0,0%	150	0	100,0%	=	27,5	34,8%
Caballito	229	12	94,8%	=	0,04	17,0%	229	0	100,0%	<	0,5	0,0%	229	0	100,0%	<	5,0	0,0%	229	0	100,0%	<	5,0	0,0%	231	0	100,0%	=	29,8	29,6%
Centro	122	3	97,5%	<	0,04	9,8%	122	0	100,0%	<	0,5	0,0%	122	0	100,0%	<	5,0	0,0%	122	0	100,0%	<	5,0	0,0%	122	0	100,0%	=	29,4	25,8%
Constitucion	72	1	98,6%	<	0,04	9,5%	72	0	100,0%	<	0,5	0,0%	72	0	100,0%	<	5,0	0,0%	72	0	100,0%	<	5,0	0,0%	72	0	100,0%	=	29,7	22,2%
Devoto	109	1	99,1%	<	0,04	10,0%	109	0	100,0%	<	0,5	0,0%	109	0	100,0%	<	5,0	0,0%	109	0	100,0%	<	5,0	0,0%	111	0	100,0%	=	27,1	34,5%
Flores	153	7	95,4%	=	0,04	22,8%	153	0	100,0%	<	0,5	0,0%	153	0	100,0%	<	5,0	0,0%	153	0	100,0%	<	5,0	0,0%	153	0	100,0%	=	30,1	23,5%
REGION CAPITAL FEDERAL	**835**	**29**	**96,5%**	**=**	**0,04**	**16,1%**	**835**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,5**	**0,0%**	**835**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**835**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**839**	**0**	**100,0%**	**=**	**29,0**	**29,1%**
Escobar	30	1	96,7%	<	0,04	30,2%	30	0	100,0%	<	0,5	0,0%	30	0	100,0%	<	5,0	0,0%	30	0	100,0%	<	5,0	0,0%	30	0	100,0%	=	20,7	25,8%
Jose C Paz	12	0	100,0%	<	0,04	0,0%	12	0	100,0%	<	0,5	0,0%	12	0	100,0%	<	5,0	0,0%	12	0	100,0%	<	5,0	0,0%	12	0	100,0%	=	20,3	22,6%
Malvinas Argentinas	24	0	100,0%	<	0,04	0,0%	24	0	100,0%	<	0,5	0,0%	24	0	100,0%	<	5,0	0,0%	24	0	100,0%	<	5,0	0,0%	24	0	100,0%	=	18,1	28,4%
Pilar	156	0	100,0%	<	0,04	0,0%	156	0	100,0%	<	0,5	0,0%	156	0	100,0%	<	5,0	0,0%	156	0	100,0%	<	5,0	0,0%	153	0	100,0%	=	15,5	33,8%
San Fernando	60	1	98,3%	<	0,04	10,0%	60	0	100,0%	<	0,5	0,0%	60	0	100,0%	<	5,0	0,0%	60	0	100,0%	<	5,0	0,0%	61	0	100,0%	=	25,3	35,0%
San Isidro	83	3	96,4%	=	0,04	25,4%	83	0	100,0%	<	0,5	0,0%	83	0	100,0%	<	5,0	0,0%	83	0	100,0%	<	5,0	0,0%	84	0	100,0%	=	28,6	29,0%
San Martin	111	7	93,7%	=	0,04	16,4%	111	0	100,0%	<	0,5	0,0%	111	0	100,0%	<	5,0	0,0%	111	0	100,0%	<	5,0	0,0%	111	0	100,0%	=	27,8	30,0%
San Miguel	110	2	98,2%	=	0,04	38,2%	110	0	100,0%	<	0,5	0,0%	110	0	100,0%	<	5,0	0,0%	110	0	100,0%	=	5,1	7,4%	110	0	100,0%	=	36,8	105,6%
Tigre	91	0	100,0%	<	0,04	0,0%	91	0	100,0%	<	0,5	0,0%	91	0	100,0%	<	5,0	0,0%	91	0	100,0%	<	5,0	0,0%	91	0	100,0%	=	21,8	24,9%
Vicente Lopez	85	0	100,0%	<	0,04	3,8%	85	0	100,0%	<	0,5	0,0%	85	0	100,0%	<	5,0	0,0%	85	0	100,0%	<	5,0	0,0%	85	0	100,0%	=	27,6	30,2%
REGION NORTE	**762**	**14**	**98,2%**	**=**	**0,04**	**19,7%**	**762**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,5**	**0,0%**	**762**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**762**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**2,9%**	**761**	**0**	**100,0%**	**=**	**25,1**	**69,7%**
La Matanza Norte	126	3	97,6%	=	0,04	20,4%	126	0	100,0%	<	0,5	0,0%	126	0	100,0%	<	5,0	0,0%	126	0	100,0%	<	5,0	0,0%	126	0	100,0%	=	28,3	28,3%
La Matanza Oeste	298	1	99,7%	=	0,04	14,5%	298	0	100,0%	<	0,5	0,0%	298	0	100,0%	<	5,0	0,0%	298	0	100,0%	<	5,0	0,0%	298	0	100,0%	=	49,7	72,5%
La Matanza Sur	141	1	99,3%	<	0,04	10,9%	141	0	100,0%	<	0,5	0,0%	141	0	100,0%	<	5,0	0,0%	141	0	100,0%	<	5,0	0,0%	141	0	100,0%	=	31,0	20,5%
Merlo	124	0	100,0%	<	0,04	0,0%	124	0	100,0%	<	0,5	0,0%	124	0	100,0%	<	5,0	0,0%	124	0	100,0%	<	5,0	0,0%	125	1	99,2%	=	28,0	91,6%
Moreno	121	0	100,0%	<	0,04	0,0%	121	0	100,0%	<	0,5	0,0%	121	0	100,0%	<	5,0	0,0%	121	0	100,0%	<	5,0	0,0%	122	0	100,0%	=	22,8	33,0%
Moron	152	1	99,3%	<	0,04	5,6%	152	0	100,0%	<	0,5	0,0%	152	0	100,0%	<	5,0	0,0%	152	0	100,0%	<	5,0	0,0%	152	0	100,0%	=	25,6	26,0%
Tres de Febrero	84	1	98,8%	<	0,04	6,5%	84	0	100,0%	<	0,5	0,0%	84	0	100,0%	<	5,0	0,0%	84	0	100,0%	<	5,0	0,0%	85	0	100,0%	=	27,1	32,7%
REGION OESTE	**1.046**	**7**	**99,3%**	**<**	**0,04**	**11,7%**	**1.046**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,5**	**0,0%**	**1.046**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**1.046**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**1.049**	**1**	**99,9%**	**=**	**33,6**	**72,1%**
Avellaneda	100	1	99,0%	=	0,04	58,6%	100	0	100,0%	<	0,5	0,0%	100	0	100,0%	<	5,0	0,0%	100	0	100,0%	<	5,0	0,0%	100	0	100,0%	=	27,9	25,6%
Florencio Varela	226	0	100,0%	<	0,04	0,0%	226	0	100,0%	<	0,5	0,0%	226	0	100,0%	<	5,0	0,0%	226	0	100,0%	<	5,0	0,0%	226	0	100,0%	=	24,9	78,9%
Lanus	120	0	100,0%	<	0,04	3,9%	120	0	100,0%	<	0,5	0,0%	120	0	100,0%	<	5,0	0,0%	120	0	100,0%	<	5,0	0,0%	120	0	100,0%	=	27,5	23,5%
Quilmes	169	2	98,8%	<	0,04	7,5%	169	0	100,0%	<	0,5	0,0%	169	0	100,0%	<	5,0	0,0%	169	0	100,0%	<	5,0	0,0%	168	0	100,0%	=	26,8	26,2%
REGION SUDESTE	**615**	**3**	**99,5%**	**=**	**0,04**	**25,2%**	**615**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,5**	**0,0%**	**615**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**615**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**614**	**0**	**100,0%**	**=**	**26,4**	**49,8%**
Almte Brown	97	0	100,0%	<	0,04	0,0%	97	0	100,0%	<	0,5	0,0%	97	0	100,0%	<	5,0	0,0%	97	0	100,0%	<	5,0	0,0%	97	0	100,0%	=	42,5	112,5%
Esteban Echeverria	89	0	100,0%	<	0,04	2,6%	89	0	100,0%	<	0,5	0,0%	89	0	100,0%	<	5,0	0,0%	89	0	100,0%	<	5,0	0,0%	89	0	100,0%	=	42,4	90,2%
Ezeiza	72	0	100,0%	<	0,04	0,0%	72	0	100,0%	<	0,5	0,0%	72	0	100,0%	<	5,0	0,0%	72	0	100,0%	<	5,0	0,0%	73	0	100,0%	=	70,7	69,9%
Lomas de Zamora	174	1	99,4%	<	0,04	4,2%	174	0	100,0%	<	0,5	0,0%	174	0	100,0%	<	5,0	0,0%	174	0	100,0%	<	5,0	0,0%	174	0	100,0%	=	33,3	86,4%
Presidente Peron	23	0	100,0%	<	0,04	0,0%	23	0	100,0%	<	0,5	0,0%	23	0	100,0%	<	5,0	0,0%	23	0	100,0%	<	5,0	0,0%	23	0	100,0%	=	11,3	33,6%
REGION SUDOESTE	**455**	**1**	**99,8%**	**<**	**0,04**	**2,9%**	**455**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,5**	**0,0%**	**455**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**455**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**456**	**0**	**100,0%**	**=**	**41,9**	**97,7%**
Total general	**3.713**	**54**	**98,5%**	**<**	**0,04**	**16,9%**	**3.713**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,5**	**0,0%**	**3.713**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**0,0%**	**3.713**	**0**	**100,0%**	**<**	**5,0**	**1,3%**	**3.719**	**1**	**100,0%**	**=**	**30,6**	**73,3%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
180-INS-A-CA-RED-02-D (Ex 11)

Región // Distrito	Zinc (mg/l)					Trihalometanos totales µg/l					Aldrín µg/l					Dieldrín µg/l					Clordano µg/l				
	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (µg /l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (µg /l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (µg /l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad		Concentración Promedio (µg /l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	150	0	100,0%	<	0,05	0,0%	114	5	95,6%	=	64,2	32,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caballito	229	0	100,0%	<	0,05	2,6%	174	10	94,3%	=	62,2	38,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro	122	0	100,0%	<	0,05	0,0%	91	1	98,9%	=	62,6	37,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitucion	72	0	100,0%	<	0,05	0,0%	60	5	91,7%	=	73,6	33,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devoto	109	0	100,0%	<	0,05	0,0%	80	1	98,8%	=	62,5	30,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flores	153	0	100,0%	<	0,05	0,0%	111	3	97,3%	=	69,7	27,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION CAPITAL FEDERAL	**835**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**1,4%**	**630**	**25**	**96,0%**	**=**	**65,1**	**34,3%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Escobar	30	0	100,0%	<	0,05	0,0%	26	3	88,5%	=	70,2	46,0%	1	0	100,0%	<	0,01	0,0%	1	0	100,0%	<	0,01	0,0%	1	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Jose C Paz	12	0	100,0%	<	0,05	0,0%	8	0	100,0%	=	6,3	11,3%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Malvinas Argentinas	24	0	100,0%	<	0,05	0,0%	17	0	100,0%	=	6,7	14,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilar	156	0	100,0%	<	0,05	6,4%	103	0	100,0%	=	9,5	123,1%	55	0	100,0%	<	0,01	0,0%	55	0	100,0%	<	0,01	0,0%	55	0	100,0%	<	0,01	0,0%
San Fernando	60	0	100,0%	<	0,05	0,0%	43	2	95,3%	=	69,6	32,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Isidro	83	0	100,0%	<	0,05	0,0%	63	0	100,0%	=	70,4	27,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Martin	111	0	100,0%	<	0,05	8,4%	83	1	98,8%	=	56,4	41,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Miguel	110	0	100,0%	<	0,05	79,3%	72	0	100,0%	=	8,6	100,2%	37	0	100,0%	<	0,01	0,0%	37	0	100,0%	<	0,01	0,0%	37	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Tigre	91	0	100,0%	<	0,05	0,0%	65	6	90,8%	=	69,6	32,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicente Lopez	85	0	100,0%	<	0,05	0,0%	66	1	98,5%	=	58,8	42,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION NORTE	**762**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**32,4%**	**546**	**13**	**97,6%**	**=**	**44,1**	**76,2%**	**105**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**	**105**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**	**105**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**
La Matanza Norte	126	0	100,0%	<	0,05	17,5%	93	0	100,0%	=	56,3	55,9%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%
La Matanza Oeste	298	0	100,0%	<	0,05	0,0%	207	2	99,0%	=	31,7	103,1%	60	0	100,0%	<	0,01	0,0%	60	0	100,0%	<	0,01	0,0%	60	0	100,0%	<	0,01	0,0%
La Matanza Sur	141	0	100,0%	<	0,05	0,0%	108	8	92,6%	=	71,2	30,0%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Merlo	124	0	100,0%	<	0,05	0,0%	91	0	100,0%	=	13,6	139,7%	42	0	100,0%	<	0,01	0,0%	42	0	100,0%	<	0,01	0,0%	42	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Moreno	121	0	100,0%	<	0,05	0,0%	90	0	100,0%	=	7,7	72,0%	40	0	100,0%	<	0,01	0,0%	40	0	100,0%	<	0,01	0,0%	40	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Moron	152	0	100,0%	<	0,05	0,0%	114	5	95,6%	=	59,4	45,9%	16	0	100,0%	<	0,01	0,0%	16	0	100,0%	<	0,01	0,0%	16	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Tres de Febrero	84	0	100,0%	<	0,05	0,0%	68	0	100,0%	=	68,2	28,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION OESTE	**1.046**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**6,2%**	**771**	**15**	**98,1%**	**=**	**42,6**	**80,2%**	**182**	**0**	**100,0%**	**<**			**182**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**	**182**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**
Avellaneda	100	0	100,0%	<	0,05	16,7%	77	4	94,8%	=	68,5	40,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Florencio Varela	226	0	100,0%	<	0,05	0,0%	157	0	100,0%	=	10,3	133,5%	73	0	100,0%	<	0,01	0,0%	73	0	100,0%	<	0,01	0,0%	73	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Lanus	120	0	100,0%	<	0,05	0,0%	88	3	96,6%	=	64,7	38,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quilmes	169	0	100,0%	<	0,05	0,0%	134	5	96,3%	=	63,4	41,1%	8	0	100,0%	<	0,01	0,0%	8	0	100,0%	<	0,01	0,0%	8	0	100,0%	<	0,01	0,0%
REGION SUDESTE	**615**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**6,9%**	**456**	**12**	**97,4%**	**=**	**46,2**	**74,7%**	**81**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**	**81**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**	**81**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**
Almte Brown	97	0	100,0%	<	0,05	0,0%	68	1	98,5%	=	45,0	79,4%	14	0	100,0%	<	0,01	0,0%	14	0	100,0%	<	0,01	0,0%	14	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Esteban Echeverria	89	0	100,0%	<	0,05	0,0%	53	1	98,1%	=	24,7	112,5%	35	0	100,0%	<	0,01	0,0%	35	0	100,0%	<	0,01	0,0%	35	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Ezeiza	72	0	100,0%	<	0,05	0,0%	50	0	100,0%	=	8,0	98,3%	28	0	100,0%	<	0,01	0,0%	28	0	100,0%	<	0,01	0,0%	28	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Lomas de Zamora	174	0	100,0%	<	0,05	13,5%	123	8	93,5%	=	67,6	41,8%	20	0	100,0%	<	0,01	0,0%	20	0	100,0%	<	0,01	0,0%	20	0	100,0%	<	0,01	0,0%
Presidente Peron	23	0	100,0%	<	0,05	0,0%	14	0	100,0%	=	6,6	14,3%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%	12	0	100,0%	<	0,01	0,0%
REGION SUDOESTE	**455**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**8,4%**	**308**	**10**	**96,8%**	**=**	**42,8**	**84,2%**	**109**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**	**109**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**	**109**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**
Total general	**3.713**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,05**	**15,7%**	**2.711**	**75**	**97,2%**	**=**	**48,8**	**86,2%**	**477**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**	**477**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**	**477**	**0**	**100,0%**	**<**	**0,01**	**0,0%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.

Nota 3: Los componenetes orgánicos son analizados solamente en sistemas abastecidos por agua de origen subterráneo.

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
180-INS-A-CA-RED-02-E (Ex 11)

Región // Distrito	DDT Total de Isómeros µg/l					M.B.A.S. mg/l					Heptacloroepóxido µg/l					Heptacloro µg/l					Lindano µg/l				
	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	-	-	-	-	-	75	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caballito	-	-	-	-	-	114	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro	-	-	-	-	-	60	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitucion	-	-	-	-	-	36	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devoto	-	-	-	-	-	58	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flores	-	-	-	-	-	77	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION CAPITAL FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**420**	**0**	**100,0%**	**< 0,2**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Escobar	1	0	100,0%	< 1,0	0,0%	20	0	100,0%	< 0,2	0,0%	1	0	100,0%	< 0,04	0,0%	1	0	100,0%	< 0,04	0,0%	1	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Jose C Paz	12	0	100,0%	< 1,0	0,0%	12	0	100,0%	< 0,2	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Malvinas Argentinas	-	-	-	-	-	12	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilar	55	0	100,0%	< 1,0	0,0%	106	0	100,0%	< 0,2	0,0%	55	0	100,0%	< 0,04	0,0%	55	0	100,0%	< 0,04	0,0%	55	0	100,0%	< 0,04	0,0%
San Fernando	-	-	-	-	-	36	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Isidro	-	-	-	-	-	50	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Martin	-	-	-	-	-	62	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Miguel	37	0	100,0%	< 1,0	0,0%	74	0	100,0%	< 0,2	0,0%	37	0	100,0%	< 0,04	0,0%	37	0	100,0%	< 0,04	0,0%	37	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Tigre	-	-	-	-	-	52	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicente Lopez	-	-	-	-	-	49	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION NORTE	**105**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**473**	**0**	**100,0%**	**< 0,2**	**0,0%**	**105**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**105**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**105**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**
La Matanza Norte	12	0	100,0%	< 1,0	0,0%	71	0	100,0%	< 0,2	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%
La Matanza Oeste	60	0	100,0%	< 1,0	0,0%	155	0	100,0%	< 0,2	0,0%	60	0	100,0%	< 0,04	0,0%	60	0	100,0%	< 0,04	0,0%	60	0	100,0%	< 0,04	0,0%
La Matanza Sur	12	0	100,0%	< 1,0	0,0%	81	0	100,0%	< 0,2	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Merlo	42	0	100,0%	< 1,0	0,0%	82	0	100,0%	< 0,2	0,0%	42	0	100,0%	< 0,04	0,0%	42	0	100,0%	< 0,04	0,0%	42	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Moreno	40	0	100,0%	< 1,0	0,0%	80	0	100,0%	< 0,2	0,0%	40	0	100,0%	< 0,04	0,0%	40	0	100,0%	< 0,04	0,0%	40	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Moron	16	0	100,0%	< 1,0	0,0%	87	0	100,0%	< 0,2	0,0%	16	0	100,0%	< 0,04	0,0%	16	0	100,0%	< 0,04	0,0%	16	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Tres de Febrero	-	-	-	-	-	48	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION OESTE	**182**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**604**	**0**	**100,0%**	**< 0,2**	**0,0%**	**182**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**182**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**182**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**
Avellaneda	-	-	-	-	-	60	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Florencio Varela	73	0	100,0%	< 1,0	0,0%	151	0	100,0%	< 0,2	0,0%	73	0	100,0%	< 0,04	0,0%	73	0	100,0%	< 0,04	0,0%	73	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Lanus	-	-	-	-	-	72	0	100,0%	< 0,2	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quilmes	8	0	100,0%	< 1,0	0,0%	96	0	100,0%	< 0,2	0,0%	8	0	100,0%	< 0,04	0,0%	8	0	100,0%	< 0,04	0,0%	8	0	100,0%	< 0,04	0,0%
REGION SUDESTE	**81**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**379**	**0**	**100,0%**	**< 0,2**	**0,0%**	**81**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**81**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**81**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**
Almte Brown	14	0	100,0%	< 1,0	0,0%	55	0	100,0%	< 0,2	0,0%	14	0	100,0%	< 0,04	0,0%	14	0	100,0%	< 0,04	0,0%	14	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Esteban Echeverria	35	0	100,0%	< 1,0	0,0%	54	0	100,0%	< 0,2	0,0%	35	0	100,0%	< 0,04	0,0%	35	0	100,0%	< 0,04	0,0%	35	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Ezeiza	28	0	100,0%	< 1,0	0,0%	44	0	100,0%	< 0,2	0,0%	28	0	100,0%	< 0,04	0,0%	28	0	100,0%	< 0,04	0,0%	28	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Lomas de Zamora	20	0	100,0%	< 1,0	0,0%	104	0	100,0%	< 0,2	0,0%	20	0	100,0%	< 0,04	0,0%	20	0	100,0%	< 0,04	0,0%	20	0	100,0%	< 0,04	0,0%
Presidente Peron	12	0	100,0%	< 1,0	0,0%	13	0	100,0%	< 0,2	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%	12	0	100,0%	< 0,04	0,0%
REGION SUDOESTE	**109**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**270**	**0**	**100,0%**	**< 0,2**	**0,0%**	**109**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**109**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**109**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**
Total general	**477**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**2.146**	**0**	**100,0%**	**< 0,2**	**0,0%**	**477**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**477**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**	**477**	**0**	**100,0%**	**< 0,04**	**0,0%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.

Nota 3: Los componenetes orgánicos son analizados solamente en sistemas abastecidos por agua de origen subterráneo.

aysa

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

180-INS-A-CA-RED-02-F (Ex 11)

Región // Distrito	Metoxicloro µg/l					2,4 D (5) µg/l					Benceno µg/l					Hexaclorobenceno µg/l					Monoclorobenceno µg/l				
	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caballito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitucion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION CAPITAL FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Escobar	1	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	100,0%	< 0,01	0,0%	-	-	-	-	-
Jose C Paz	12	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	7	0	100,0%	< 2,5	0,0%	12	0	100,0%	< 0,01	0,0%	7	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Malvinas Argentinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilar	55	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	22	0	100,0%	< 2,5	0,0%	55	0	100,0%	< 0,01	0,0%	22	0	100,0%	< 2,5	0,0%
San Fernando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Isidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Martin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Miguel	37	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	15	0	100,0%	< 2,5	0,0%	37	0	100,0%	< 0,01	0,0%	15	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Tigre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicente Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION NORTE	**105**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**	**105**	**0**	**100,0%**	**< 0,10**	**0,0%**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**
La Matanza Norte	12	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	5	0	100,0%	< 2,5	0,0%	12	0	100,0%	< 0,01	0,0%	5	0	100,0%	< 2,5	0,0%
La Matanza Oeste	60	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	22	0	100,0%	< 2,5	0,0%	60	0	100,0%	< 0,01	0,0%	22	0	100,0%	< 2,5	0,0%
La Matanza Sur	12	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	4	0	100,0%	< 2,5	0,0%	12	0	100,0%	< 0,01	0,0%	4	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Merlo	42	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	23	0	100,0%	< 2,5	0,0%	42	0	100,0%	< 0,01	0,0%	23	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Moreno	40	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	18	0	100,0%	< 2,5	0,0%	40	0	100,0%	< 0,01	0,0%	18	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Moron	16	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	8	0	100,0%	< 2,5	0,0%	16	0	100,0%	< 0,01	0,0%	8	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Tres de Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION OESTE	**182**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**	**182**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**0,0%**	**80**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**
Avellaneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Florencio Varela	73	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	35	0	100,0%	< 2,5	0,0%	73	0	100,0%	< 0,01	0,0%	35	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Lanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quilmes	8	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	4	0	100,0%	< 2,5	0,0%	8	0	100,0%	< 0,01	0,0%	4	0	100,0%	< 2,5	0,0%
REGION SUDESTE	**81**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**	**81**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**0,0%**	**39**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**
Almte Brown	14	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	6	0	100,0%	< 2,5	0,0%	14	0	100,0%	< 0,01	0,0%	6	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Esteban Echeverria	35	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	12	0	100,0%	< 2,5	0,0%	35	0	100,0%	< 0,01	0,0%	12	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Ezeiza	28	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	13	0	100,0%	< 2,5	0,0%	28	0	100,0%	< 0,01	0,0%	13	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Lomas de Zamora	20	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	9	0	100,0%	< 2,5	0,0%	20	0	100,0%	< 0,01	0,0%	9	0	100,0%	< 2,5	0,0%
Presidente Peron	12	0	100,0%	< 5,0	0,0%	-	-	-	-	-	5	0	100,0%	< 2,5	0,0%	12	0	100,0%	< 0,01	0,0%	5	0	100,0%	< 2,5	0,0%
REGION SUDOESTE	**109**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**	**109**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**0,0%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**
Total general	**477**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**208**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**	**477**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**0,0%**	**208**	**0**	**100,0%**	**< 2,5**	**0,0%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.

Nota 3: Los componenetes orgánicos son analizados solamente en sistemas abastecidos por agua de origen subterráneo.

Nota 5: El parámetro 2,4 D no se pudo analizar debido a falta de disponibilidad en los equipos del Laboratorio Central, tal com es comunicado al ERAS mediante la NOTA: NO-2025-00000579-AYSA-DMA#AYSA.
Esto se basa en que dicho componente está prohibido su uso, importación y exportación en el Convenio de Estocolmo (Ley 26011 y Res 451/219 actualizada por Res 291/2020). Es importante aclarar que AySA tiene desde el año 2013, registros históricos y trazables de ausencia de estos compuestos en el área de la concesión.

aysa

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

180-INS-A-CA-RED-02-G (Ex 11)

Región // Distrito	1,2 Dicloroben... µg/l					1,4 Diclorobenceno µg/l					Clorofenoles µg/l					Tetracloruro de Carbono µg/l					1,1 Dicloroeteno µg/l				
	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Nº Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano																									
Caballito																									
Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitucion																									
Devoto																									
Flores																									
REGION CAPITAL FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jose C Paz	7	0	100,0%	< 0,3	0,0%	7	0	100,0%	< 0,1	0,0%	12	0	100,0%	< 1,0	0,0%	7	0	100,0%	< 0,5	0,0%	7	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Malvinas Argentinas																									
Pilar	22	0	100,0%	< 0,3	0,0%	22	0	100,0%	< 0,1	0,0%	55	0	100,0%	< 1,0	0,0%	22	0	100,0%	< 0,5	0,0%	22	0	100,0%	< 0,2	0,0%
San Fernando																									
San Isidro																									
San Martin																									
San Miguel	15	0	100,0%	< 0,3	0,0%	15	0	100,0%	< 0,1	0,0%	37	0	100,0%	< 1,0	0,0%	15	0	100,0%	< 0,5	33,1%	15	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Tigre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicente Lopez																									
REGION NORTE	**44**	**0**	**100,0%**	**< 0,3**	**0,0%**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 0,1**	**0,0%**	**104**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**20,5%**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 0,2**	**0,0%**
La Matanza Norte	5	0	100,0%	< 0,3	0,0%	5	0	100,0%	< 0,1	0,0%	12	0	100,0%	< 1,0	0,0%	5	0	100,0%	< 0,5	0,0%	5	0	100,0%	< 0,2	0,0%
La Matanza Oeste	22	0	100,0%	< 0,3	0,0%	22	0	100,0%	< 0,1	0,0%	60	0	100,0%	< 1,0	0,0%	22	0	100,0%	< 0,5	0,0%	22	0	100,0%	< 0,2	72,2%
La Matanza Sur	4	0	100,0%	< 0,3	0,0%	4	0	100,0%	< 0,1	0,0%	12	0	100,0%	< 1,0	0,0%	4	0	100,0%	< 0,5	0,0%	4	1	75,0%	< 0,2	0,0%
Merlo	23	0	100,0%	< 0,3	0,0%	23	0	100,0%	< 0,1	0,0%	41	0	100,0%	< 1,0	0,0%	23	0	100,0%	< 0,5	0,0%	23	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Moreno	18	0	100,0%	< 0,3	0,0%	18	0	100,0%	< 0,1	0,0%	39	0	100,0%	< 1,0	0,0%	18	0	100,0%	< 0,5	0,0%	18	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Moron	8	0	100,0%	< 0,3	0,0%	8	0	100,0%	< 0,1	0,0%	16	0	100,0%	< 1,0	0,0%	8	0	100,0%	< 0,5	0,0%	8	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Tres de Febrero																									
REGION OESTE	**80**	**0**	**100,0%**	**< 0,3**	**0,0%**	**80**	**0**	**100,0%**	**< 0,1**	**0,0%**	**180**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**80**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**0,0%**	**80**	**1**	**98,8%**	**< 0,2**	**43,6%**
Avellaneda																									
Florencio Varela	35	0	100,0%	< 0,3	0,0%	35	0	100,0%	< 0,1	0,0%	71	0	100,0%	< 1,0	0,0%	35	0	100,0%	< 0,5	0,0%	35	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Lanus																									
Quilmes	4	0	100,0%	< 0,3	0,0%	4	0	100,0%	< 0,1	0,0%	8	0	100,0%	< 1,0	0,0%	4	0	100,0%	< 0,5	0,0%	4	0	100,0%	< 0,2	0,0%
REGION SUDESTE	**39**	**0**	**100,0%**	**< 0,3**	**0,0%**	**39**	**0**	**100,0%**	**< 0,1**	**0,0%**	**79**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**39**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**0,0%**	**39**	**0**	**100,0%**	**< 0,2**	**0,0%**
Almte Brown	6	0	100,0%	< 0,3	0,0%	6	0	100,0%	< 0,1	0,0%	13	0	100,0%	< 1,0	0,0%	6	0	100,0%	< 0,5	0,0%	6	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Esteban Echeverria	12	0	100,0%	< 0,3	0,0%	12	0	100,0%	< 0,1	0,0%	35	0	100,0%	< 1,0	0,0%	12	0	100,0%	< 0,5	0,0%	12	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Ezeiza	13	0	100,0%	< 0,3	0,0%	13	0	100,0%	< 0,1	0,0%	28	0	100,0%	< 1,0	0,0%	13	0	100,0%	< 0,5	0,0%	13	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Lomas de Zamora	9	0	100,0%	< 0,3	0,0%	9	0	100,0%	< 0,1	0,0%	20	0	100,0%	< 1,0	0,0%	9	0	100,0%	< 0,5	0,0%	9	0	100,0%	< 0,2	0,0%
Presidente Peron	5	0	100,0%	< 0,3	0,0%	5	0	100,0%	< 0,1	0,0%	12	0	100,0%	< 1,0	0,0%	5	0	100,0%	< 0,5	0,0%	5	0	100,0%	< 0,2	0,0%
REGION SUDOESTE	**45**	**0**	**100,0%**	**< 0,3**	**0,0%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 0,1**	**0,0%**	**108**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**0,0%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 0,2**	**0,0%**
Total general	**208**	**0**	**100,0%**	**< 0,3**	**0,0%**	**208**	**0**	**100,0%**	**< 0,1**	**0,0%**	**471**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**208**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**9,6%**	**208**	**1**	**99,5%**	**< 0,2**	**27,2%**

Nota 3: Los componenetes orgánicos son analizados solamente en sistemas abastecidos por agua de origen subterráneo.

Nota 4

Cabe señalar que en la primera adenda a la 4ta edición de las Guías de la OMS (2018) se indica que no se establece un valor de referencia para el compuesto 1,1 dicloroeteno debido a las bajas concentraciones en las que se encuentra en el agua subterránea. En este sentido indican también que se puede calcular un valor basado en la salud de 140 µg/l, significativamente mayor que las concentraciones de 1,1-dicloroeteno presentes habitualmente en el agua de consumo humano y en las perforaciones de la concesionaria.

Guías para la calidad del agua de consumo humano
CUARTA EDICIÓN QUE INCORPORA LA PRIMERA ADENDA 2018
12. FICHAS INFORMATIVAS SOBRE SUSTANCIAS QUIMICAS
1,1-Dicloroeteno

El 1,1-dicloroeteno, o cloruro de vinilideno, se utiliza principalmente como monómero en la producción de copolimeros de policloruro de vinilideno y como sustancia intermedia en la síntesis de otras sustancias orgánicas. Es un contaminante ocasional del agua de consumo humano y suele estar presente junto a otros hidrocarburos clorados. No hay datos sobre sus concentraciones en los alimentos, pero en el aire son generalmente inferiores a 40 ng/m3, salvo en algunos centros de producción. El 1,1-dicloroeteno se detecta en el agua de consumo humano tratada procedente de fuentes de aguas subterráneas en concentraciones medianas de 0.28-1.2 µg/l y en sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano en concentraciones que oscilan entre ≤ 0.2 y 0.5 µg/l.

Motivo para no establecer un valor de referencia	Sus concentraciones en el agua de consumo humano están muy por debajo de las que representan una preocupación para la salud.
Fecha de la evaluación	2004
Referencia principal	IPCS (2003) *1,1-Dichloroethene (vinylidene chloride)* OMS (2005) *1,1-Dichloroethene in drinking-water*

El 1,1-dicloroeteno es un depresor del sistema nervioso central y puede producir efectos tóxicos en el hígado y los riñones de personas expuestas por motivos laborales. Produce daños hepáticos y renales en animales de laboratorio. El CIIC ha incluido el 1,1-dicloroeteno en el Grupo 3 (no clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos). En varios sistemas de análisis in vitro demostró ser genotóxico, pero no mostró actividad en las pruebas in vivo de dominancia letal y de micronúcleos. En un estudio de inhalación en ratones indujo tumores renales, pero en otros estudios, en varios de los cuales se administró 1,1-dicloroeteno en el agua de consumo humano, se determinó que no era cancerígeno.

Se puede calcular un valor basado en la salud de 140 µg/l (valor redondeado) a partir de una IDT de 0.046 mg/kg de peso corporal, obtenido mediante el método de la dosis de referencia de un estudio en el que el efecto crítico de la exposición oral fue un cambio mínimo en la grasa hepatocelular de la zona media en ratas hembra. Sin embargo, este valor es significativamente mayor que las concentraciones de 1,1-dicloroeteno presentes habitualmente en el agua de consumo humano. Por consiguiente, se considera innecesario fijar un valor de referencia expreso para el 1,1-dicloroeteno en el agua de consumo humano.

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
180-INS-A-CA-RED-02-H (Ex 11)

Región // Distrito	Tricloroetileno µg/l					1,2 Dicloroetano µg/l					1,1,1 Tricloroetano µg/l					Cloruro de Vinilo µg/l					Tetracloroeteno µg/l					Benzopireno µg/l				
	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caballito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitucion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION CAPITAL FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Escobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Jose C Paz	7	0	100,0%	< 0,5	0,0%	7	0	100,0%	< 1,0	0,0%	7	0	100,0%	< 0,5	0,0%	7	0	100,0%	< 2,0	0,0%	7	0	100,0%	< 0,5	0,0%	10	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Malvinas Argentinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilar	22	0	100,0%	= 0,7	128,8%	22	0	100,0%	< 1,0	0,0%	22	0	100,0%	< 0,5	0,0%	22	0	100,0%	< 2,0	0,0%	22	0	100,0%	= 0,9	180,1%	41	0	100,0%	< 0,01	0,0%
San Fernando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Isidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Martin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Miguel	15	0	100,0%	= 0,7	58,0%	15	0	100,0%	< 1,0	0,0%	15	0	100,0%	< 0,5	0,0%	15	0	100,0%	< 2,0	0,0%	15	0	100,0%	= 0,7	86,6%	29	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Tigre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicente Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION NORTE	**44**	**0**	**100,0%**	**= 0,7**	**102,6%**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**0,0%**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 2,0**	**0,0%**	**44**	**0**	**100,0%**	**= 0,8**	**151,7%**	**81**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**0,0%**
La Matanza Norte	5	0	100,0%	< 0,5	0,0%	5	0	100,0%	< 1,0	0,0%	5	0	100,0%	< 0,5	0,0%	5	0	100,0%	< 2,0	0,0%	5	0	100,0%	< 0,5	0,0%	9	0	100,0%	< 0,01	0,0%
La Matanza Oeste	22	0	100,0%	= 0,6	52,3%	22	0	100,0%	< 1,0	0,0%	22	0	100,0%	< 0,5	0,0%	22	0	100,0%	< 2,0	0,0%	22	0	100,0%	< 0,5	0,0%	49	0	100,0%	< 0,01	0,0%
La Matanza Sur	4	0	100,0%	= 0,7	32,1%	4	0	100,0%	< 1,0	0,0%	4	0	100,0%	< 0,5	0,0%	4	0	100,0%	< 2,0	0,0%	4	0	100,0%	< 0,5	9,5%	10	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Merlo	23	0	100,0%	= 0,5	12,6%	23	0	100,0%	< 1,0	0,0%	23	0	100,0%	< 0,5	0,0%	23	0	100,0%	< 2,0	0,0%	23	0	100,0%	= 0,5	20,8%	35	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Moreno	18	0	100,0%	= 0,8	99,4%	18	0	100,0%	< 1,0	0,0%	18	0	100,0%	< 0,5	0,0%	18	0	100,0%	< 2,0	0,0%	18	0	100,0%	= 0,6	83,3%	32	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Moron	8	0	100,0%	= 0,5	0,0%	8	0	100,0%	< 1,0	0,0%	8	0	100,0%	< 0,5	0,0%	8	0	100,0%	< 2,0	0,0%	8	0	100,0%	< 0,5	0,0%	12	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Tres de Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGION OESTE	**80**	**0**	**100,0%**	**= 0,6**	**69,0%**	**80**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**80**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**0,0%**	**80**	**0**	**100,0%**	**< 2,0**	**0,0%**	**80**	**0**	**100,0%**	**= 0,5**	**46,9%**	**147**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**0,0%**
Avellaneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Florencio Varela	35	0	100,0%	< 0,5	35,4%	35	0	100,0%	< 1,0	1,7%	35	0	100,0%	< 0,5	0,0%	35	0	100,0%	< 2,0	0,0%	35	0	100,0%	= 0,5	14,4%	60	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Lanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quilmes	4	0	100,0%	< 0,5	0,0%	4	0	100,0%	< 1,0	0,0%	4	0	100,0%	< 0,5	0,0%	3	0	100,0%	< 2,0	0,0%	4	0	100,0%	< 0,5	0,0%	6	0	100,0%	< 0,01	0,0%
REGION SUDESTE	**39**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**33,8%**	**39**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**1,6%**	**39**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**0,0%**	**38**	**0**	**100,0%**	**< 2,0**	**0,0%**	**39**	**0**	**100,0%**	**= 0,5**	**13,7%**	**66**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**0,0%**
Almte Brown	6	0	100,0%	= 1,8	176,9%	6	0	100,0%	< 1,0	0,0%	6	0	100,0%	< 0,5	0,0%	6	0	100,0%	< 2,0	0,0%	6	0	100,0%	< 0,5	0,0%	10	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Esteban Echeverria	12	0	100,0%	= 0,7	69,2%	12	0	100,0%	< 1,0	0,0%	12	0	100,0%	< 0,5	0,0%	12	0	100,0%	< 2,0	0,0%	12	0	100,0%	< 0,5	0,0%	28	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Ezeiza	13	0	100,0%	< 0,5	0,0%	13	0	100,0%	< 1,0	0,0%	13	0	100,0%	< 0,5	0,0%	13	0	100,0%	< 2,0	0,0%	13	0	100,0%	< 0,5	0,0%	24	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Lomas de Zamora	9	0	100,0%	= 2,2	232,5%	9	0	100,0%	< 1,0	0,0%	9	0	100,0%	< 0,5	0,0%	9	0	100,0%	< 2,0	0,0%	9	0	100,0%	< 0,5	0,0%	16	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Presidente Peron	5	0	100,0%	< 0,5	0,0%	5	0	100,0%	< 1,0	0,0%	5	0	100,0%	< 0,5	0,0%	5	0	100,0%	< 2,0	0,0%	5	0	100,0%	< 0,5	0,0%	10	0	100,0%	< 0,01	0,0%
REGION SUDOESTE	**45**	**0**	**100,0%**	**= 1,1**	**239,5%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,0%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**0,0%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 2,0**	**0,0%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**0,0%**	**88**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**0,0%**
Total general	**208**	**0**	**100,0%**	**= 0,7**	**179,5%**	**208**	**0**	**100,0%**	**< 1,0**	**0,7%**	**208**	**0**	**100,0%**	**< 0,5**	**0,0%**	**207**	**0**	**100,0%**	**< 2,0**	**0,0%**	**208**	**0**	**100,0%**	**= 0,6**	**98,6%**	**382**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**0,0%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.

Nota 3: Los componenetes orgánicos son analizados solamente en sistemas abastecidos por agua de origen subterráneo.

aysa

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
180-INS-A-CA-RE-02-I (Ex 11)

Región // Distrito	Tolueno µg/l					Etilbenceno µg/l					Estireno µg/l					Amonio mg/l					Nitritos mg/l				
	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	N° Fuera de Norma	% de conformidad	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Caballito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	0	100,0%	< 0,01	13,0%
Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Constitucion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Devoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	0	100,0%	< 0,01	0,0%
REGION CAPITAL FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**839**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**6,9%**
Escobar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	100,0%	< 0,05	0,0%	30	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Jose C Paz	7	0	100,0%	< 5,0	0,0%	7	0	100,0%	< 5,0	0,0%	7	0	100,0%	< 5,0	0,0%	12	0	100,0%	< 0,05	0,0%	12	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Malvinas Argentinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	100,0%	< 0,01	37,7%
Pilar	22	0	100,0%	< 5,0	0,0%	22	0	100,0%	< 5,0	0,0%	22	0	100,0%	< 5,0	0,0%	55	0	100,0%	< 0,05	0,0%	153	0	100,0%	< 0,01	0,0%
San Fernando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	0	100,0%	< 0,01	0,0%
San Isidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	0	100,0%	< 0,01	0,0%
San Martin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	0	100,0%	< 0,01	0,0%
San Miguel	15	0	100,0%	< 5,0	0,0%	15	0	100,0%	< 5,0	0,0%	15	0	100,0%	< 5,0	0,0%	37	0	100,0%	< 0,05	0,0%	110	1	99,1%	< 0,01	414,9%
Tigre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Vicente Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	0	100,0%	< 0,01	51,2%
REGION NORTE	**44**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**44**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**105**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**	**761**	**1**	**99,9%**	**< 0,01**	**237,1%**
La Matanza Norte	5	0	100,0%	< 5,0	0,0%	5	0	100,0%	< 5,0	0,0%	5	0	100,0%	< 5,0	0,0%	12	0	100,0%	< 0,05	0,0%	126	0	100,0%	< 0,01	0,0%
La Matanza Oeste	22	0	100,0%	< 5,0	0,0%	22	0	100,0%	< 5,0	0,0%	22	0	100,0%	< 5,0	0,0%	60	0	100,0%	< 0,05	0,0%	298	0	100,0%	< 0,01	69,5%
La Matanza Sur	4	0	100,0%	< 5,0	0,0%	4	0	100,0%	< 5,0	0,0%	4	0	100,0%	< 5,0	0,0%	12	0	100,0%	< 0,05	0,0%	141	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Merlo	23	0	100,0%	< 5,0	0,0%	23	0	100,0%	< 5,0	0,0%	23	0	100,0%	< 5,0	0,0%	42	0	100,0%	< 0,05	0,0%	125	0	100,0%	< 0,01	44,6%
Moreno	18	0	100,0%	< 5,0	0,0%	18	0	100,0%	< 5,0	0,0%	18	0	100,0%	< 5,0	0,0%	39	0	100,0%	< 0,05	0,0%	122	0	100,0%	< 0,01	70,3%
Moron	8	0	100,0%	< 5,0	0,0%	8	0	100,0%	< 5,0	0,0%	8	0	100,0%	< 5,0	0,0%	16	0	100,0%	< 0,05	0,0%	151	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Tres de Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	0	100,0%	< 0,01	14,9%
REGION OESTE	**80**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**80**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**80**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**181**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**	**1.048**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**49,0%**
Avellaneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Florencio Varela	35	0	100,0%	< 5,0	0,0%	35	0	100,0%	< 5,0	0,0%	35	0	100,0%	< 5,0	0,0%	73	0	100,0%	< 0,05	0,0%	226	0	100,0%	< 0,01	47,5%
Lanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Quilmes	4	0	100,0%	< 5,0	0,0%	4	0	100,0%	< 5,0	0,0%	4	0	100,0%	< 5,0	0,0%	8	0	100,0%	< 0,05	0,0%	168	0	100,0%	< 0,01	0,0%
REGION SUDESTE	**39**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**39**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**39**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**81**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**	**614**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**30,0%**
Almte Brown	6	0	100,0%	< 5,0	0,0%	6	0	100,0%	< 5,0	0,0%	6	0	100,0%	< 5,0	0,0%	15	0	100,0%	< 0,05	0,0%	97	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Esteban Echeverria	12	0	100,0%	< 5,0	0,0%	12	0	100,0%	< 5,0	0,0%	12	0	100,0%	< 5,0	0,0%	35	0	100,0%	< 0,05	0,0%	89	0	100,0%	< 0,01	59,6%
Ezeiza	13	0	100,0%	< 5,0	0,0%	13	0	100,0%	< 5,0	0,0%	13	0	100,0%	< 5,0	0,0%	28	0	100,0%	< 0,05	0,0%	73	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Lomas de Zamora	9	0	100,0%	< 5,0	0,0%	9	0	100,0%	< 5,0	0,0%	9	0	100,0%	< 5,0	0,0%	20	0	100,0%	< 0,05	0,0%	173	0	100,0%	< 0,01	0,0%
Presidente Peron	5	0	100,0%	< 5,0	0,0%	5	0	100,0%	< 5,0	0,0%	5	0	100,0%	< 5,0	0,0%	12	0	100,0%	< 0,05	0,0%	23	0	100,0%	< 0,01	0,0%
REGION SUDOESTE	**45**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**45**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**110**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**	**455**	**0**	**100,0%**	**< 0,01**	**27,8%**
Total general	**208**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**208**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**208**	**0**	**100,0%**	**< 5,0**	**0,0%**	**477**	**0**	**100,0%**	**< 0,05**	**0,0%**	**3.717**	**1**	**100,0%**	**< 0,01**	**117,7%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.

Nota 3: Los componenetes orgánicos son analizados solamente en sistemas abastecidos por agua de origen subterráneo.

Región // Distrito	Tetracloroetano µg/l				Diclorobromometano µg/l				Dibromoclorometano µg/l				Bromoformo µg/l				Cloroformo µg/l			
	Nº de Muestras	Concentración Máxima (µg/l)	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (µg/l)	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (µg/l)	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (µg/l)	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (µg/l)	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	-	-	-	-	114	25,2	15,1	30,1%	114	9,7	4,3	41,0%	114	1	< 1,0	0,0%	114	85	44,8	37,0%
Caballito	-	-	-	-	174	40,4	14,9	41,8%	174	14,8	4,0	53,2%	174	2	< 1,0	11,6%	174	96	43,5	42,5%
Centro	-	-	-	-	91	28,1	14,4	38,8%	91	12,1	4,1	46,5%	91	1	< 1,0	0,0%	91	87	44,1	39,8%
Constitucion	-	-	-	-	60	39,9	18,2	35,6%	60	12,0	4,9	45,3%	60	1	< 1,0	0,0%	60	100	50,3	36,2%
Devoto	-	-	-	-	80	49,0	15,5	42,0%	80	10,2	4,4	52,4%	80	1	< 1,0	0,0%	80	87	42,7	35,0%
Flores	-	-	-	-	111	28,3	17,4	32,2%	111	10,6	5,3	38,8%	111	17	= 1,1	132,0%	111	84	46,9	29,3%
REGION CAPITAL FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**630**	**49,0**	**15,7**	**37,8%**	**630**	**14,8**	**4,4**	**47,4%**	**630**	**16,9**	**= 1,0**	**61,8%**	**630**	**100,0**	**45,0**	**37,5%**
Escobar	-	-	-	-	26	30,1	15,6	46,1%	26	8,6	3,8	60,7%	26	1	< 1,0	0,0%	26	100	50,2	49,0%
Jose C Paz	7	0,5	< 0,5	0,0%	8	2,0	2,0	0,0%	8	1,0	1,0	0,0%	8	1	< 1,0	0,0%	8	4	2,3	31,4%
Malvinas Argentinas	-	-	-	-	17	2,0	2,0	0,0%	17	1,0	1,0	0,0%	17	3	= 1,1	37,1%	17	4	2,9	36,3%
Pilar	22	0,5	< 0,5	0,0%	103	16,1	2,7	103,4%	103	6,1	1,2	65,6%	103	1	< 1,0	2,8%	103	48	4,7	181,1%
San Fernando	-	-	-	-	43	32,2	16,3	39,6%	43	13,0	4,6	53,8%	43	1	< 1,0	0,0%	43	76	48,7	36,5%
San Isidro	-	-	-	-	63	33,1	17,4	31,5%	63	15,5	5,5	51,1%	63	2	< 1,0	7,2%	63	74	47,5	31,9%
San Martin	-	-	-	-	83	29,7	13,6	44,3%	83	10,2	4,2	48,9%	83	1	< 1,0	0,0%	83	95	38,6	43,4%
San Miguel	15	0,5	< 0,5	0,0%	72	10,7	2,2	50,5%	72	19,9	1,5	165,1%	72	53	= 2,3	278,8%	72	32	3,2	117,0%
Tigre	-	-	-	-	65	43,6	16,6	38,3%	65	8,6	3,3	50,6%	65	1	< 1,0	1,2%	65	100	49,5	32,6%
Vicente Lopez	-	-	-	-	66	38,0	14,2	43,9%	66	8,9	3,8	49,6%	66	2	< 1,0	8,5%	66	87	40,7	45,8%
REGION NORTE	**44**	**0,5**	**< 0,5**	**0,0%**	**546**	**43,6**	**10,7**	**76,3%**	**546**	**19,9**	**3,1**	**79,7%**	**546**	**52,5**	**= 1,2**	**198,8%**	**546**	**100,0**	**29,8**	**82,9%**
La Matanza Norte	5	0,5	< 0,5	0,0%	93	26,5	14,5	55,9%	93	12,2	4,1	59,2%	93	1	< 1,0	4,6%	93	70	37,6	59,4%
La Matanza Oeste	22	0,5	< 0,5	0,0%	207	38,9	8,4	102,2%	207	34,1	2,9	114,9%	207	25	= 1,6	133,4%	207	80	19,4	115,4%
La Matanza Sur	4	0,5	< 0,5	0,0%	108	30,6	18,1	30,8%	108	13,0	5,3	44,3%	108	1	< 1,0	2,1%	108	89	47,8	33,1%
Merlo	23	0,5	< 0,5	0,0%	91	24,8	3,5	128,2%	91	20,2	1,7	149,6%	91	8	= 1,2	73,4%	91	58	7,4	177,4%
Moreno	18	0,5	< 0,5	0,0%	90	11,5	2,3	67,5%	90	10,3	1,2	91,0%	90	3	= 1,1	31,0%	90	32	3,3	109,9%
Moron	8	0,5	< 0,5	0,0%	114	36,8	13,7	47,7%	114	9,6	3,6	56,2%	114	2	< 1,0	9,0%	114	100	42,1	49,2%
Tres de Febrero	-	-	-	-	68	35,2	17,0	32,9%	68	10,6	4,3	52,5%	68	1	< 1,0	0,0%	68	73	47,0	34,1%
REGION OESTE	**80**	**0,5**	**< 0,5**	**0,0%**	**771**	**38,9**	**10,8**	**79,8%**	**771**	**34,1**	**3,3**	**86,7%**	**771**	**25,0**	**= 1,2**	**97,4%**	**771**	**100,0**	**28,1**	**87,6%**
Avellaneda	-	-	-	-	77	33,0	17,3	42,7%	77	15,0	5,0	55,3%	77	1	< 1,0	4,5%	77	90	46,1	41,6%
Florencio Varela	35	0,5	< 0,5	0,0%	157	20,0	2,8	110,5%	157	5,2	1,2	62,2%	157	6	= 1,1	43,7%	157	58	5,5	188,3%
Lanus	-	-	-	-	88	26,5	16,4	39,2%	88	20,3	5,1	65,4%	88	1	< 1,0	4,5%	88	74	43,2	41,7%
Quilmes	4	0,5	< 0,5	0,0%	134	37,0	16,0	47,8%	134	11,8	4,4	54,1%	134	3	= 1,0	17,5%	134	78	43,0	42,1%
REGION SUDESTE	**39**	**0,5**	**< 0,5**	**0,0%**	**456**	**37,0**	**11,8**	**75,9%**	**456**	**20,3**	**3,5**	**80,7%**	**456**	**6,4**	**= 1,0**	**28,5%**	**456**	**90,0**	**30,6**	**79,2%**
Almte Brown	6	0,5	< 0,5	0,0%	68	38,9	11,8	81,1%	68	15,6	3,9	77,5%	68	7	= 1,3	70,9%	68	80	28,7	88,0%
Esteban Echeverria	12	0,5	< 0,5	0,0%	53	27,9	5,4	118,7%	53	10,7	2,2	102,0%	53	5	= 1,3	57,3%	53	96	16,6	129,0%
Ezeiza	13	0,5	< 0,5	0,0%	50	12,3	2,2	66,0%	50	4,0	1,2	48,2%	50	7	= 1,7	71,9%	50	44	3,7	165,2%
Lomas de Zamora	9	0,5	< 0,5	0,0%	123	38,8	17,9	45,6%	123	14,6	5,2	51,7%	123	5	= 1,2	55,7%	123	78	44,3	45,3%
Presidente Peron	5	0,5	< 0,5	0,0%	14	2,0	2,0	0,0%	14	1,6	1,1	16,3%	14	1	< 1,0	0,0%	14	4	2,6	36,5%
REGION SUDOESTE	**45**	**0,5**	**< 0,5**	**0,0%**	**308**	**38,9**	**11,1**	**87,4%**	**308**	**15,6**	**3,6**	**81,6%**	**308**	**6,7**	**= 1,3**	**65,9%**	**308**	**95,5**	**27,6**	**91,5%**
Total general	**208**	**0,5**	**< 0,5**	**0,0%**	**2.711**	**49,0**	**12,1**	**69,5%**	**2.711**	**34,1**	**3,6**	**74,3%**	**2.711**	**52,5**	**= 1,1**	**114,1%**	**2.711**	**100,0**	**32,7**	**73,5%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.

Nota 3: Los componenetes orgánicos son analizados solamente en sistemas abastecidos por agua de origen subterráneo.

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PARAMETROS NO CONTEMPLADOS EN EL MARCO REGULATORIO

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

180-INS-A-CA-RED-02-K (Ex 11)

Región // Distrito	Calcio mg/l				Magnesio mg/l				Temperatura °C				Indice de Langelier -			
	Nº de Muestras	Concentración Máxima (mg/l)	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (mg/l)	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Valor Máximo (°C)	Valor Promedio (°C)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (u.de.pH)	Concentración Promedio (u.de.pH)	Coeficiente de Variación
Belgrano	150	27	18,2	17,3%	150	7	4,4	19,2%	152	29	19,1	23,0%	150	0,0	-0,9	37,6%
Caballito	229	28	18,2	16,7%	229	7	4,4	16,9%	235	30	19,4	23,5%	231	0,1	-1,0	38,8%
Centro	122	27	17,9	16,4%	122	6	4,2	16,4%	123	29	19,4	22,5%	122	0,3	-0,9	40,0%
Constitucion	72	24	18,4	15,4%	72	6	4,6	14,1%	72	29	19,1	22,9%	72	-0,1	-0,9	28,3%
Devoto	109	30	19,9	18,0%	109	9	5,1	18,8%	114	28	20,0	19,7%	110	0,0	-0,9	34,3%
Flores	153	26	19,5	16,3%	153	7	5,0	15,5%	154	27	19,1	23,5%	153	0,0	-0,9	31,1%
REGION CAPITAL FEDERAL	**835**	**30,1**	**18,6**	**17,2%**	**835**	**8,5**	**4,6**	**18,4%**	**850**	**30,0**	**19,3**	**22,7%**	**838**	**0,3**	**-0,9**	**36,2%**
Escobar	30	38	16,2	43,6%	30	16	4,7	77,2%	30	21	17,4	7,8%	30	0,5	-0,6	66,2%
Jose C Paz	12	27	19,1	19,8%	12	14	10,3	19,7%	12	21	17,2	12,4%	12	0,2	0,0	1397,4%
Malvinas Argentinas	24	74	58,3	18,5%	24	33	25,7	18,2%	24	20	17,7	8,7%	24	0,6	0,3	41,7%
Pilar	156	80	36,2	42,8%	156	33	15,9	38,8%	156	20	17,0	9,3%	156	0,8	0,2	87,4%
San Fernando	60	30	17,7	26,7%	60	8	4,6	28,8%	64	20	17,4	9,5%	61	-0,2	-0,8	34,1%
San Isidro	83	31	23,0	17,2%	83	9	6,2	17,1%	89	22	17,2	12,3%	84	-0,1	-0,8	29,2%
San Martin	111	32	22,6	15,1%	111	9	6,0	17,0%	112	29	19,8	23,6%	111	0,1	-0,7	35,6%
San Miguel	110	102	58,0	36,1%	110	41	25,4	27,1%	111	20	17,2	10,3%	110	0,9	0,3	-67,8%
Tigre	91	23	13,8	19,0%	91	5	3,6	17,4%	91	26	17,9	13,6%	91	-0,1	-0,7	43,6%
Vicente Lopez	85	28	19,0	22,5%	85	7	4,9	24,3%	92	30	19,4	21,1%	85	0,2	-0,9	40,1%
REGION NORTE	**762**	**101,7**	**29,5**	**63,5%**	**762**	**41,4**	**11,0**	**81,6%**	**781**	**30,0**	**17,9**	**16,5%**	**764**	**0,9**	**-0,4**	**153.4%**
La Matanza Norte	126	64	25,5	50,9%	126	23	7,6	69,2%	127	29	19,5	24,2%	126	0,7	-0,7	75,5%
La Matanza Oeste	298	95	27,4	47,7%	298	35	11,8	50,4%	303	21	17,2	7,5%	298	1,0	-0,1	356,1%
La Matanza Sur	141	35	21,9	19,2%	141	13	6,1	29,5%	141	28	19,8	22,0%	141	0,2	-0,8	38,4%
Merlo	124	87	43,9	33,4%	124	35	18,1	32,3%	125	23	18,7	8,8%	125	1,1	0,3	111,1%
Moreno	121	57	29,9	31,2%	121	28	15,5	26,4%	122	24	19,1	8,0%	122	0,7	0,3	69,7%
Moron	152	42	18,6	36,5%	152	17	5,1	65,2%	154	24	18,9	8,7%	152	0,7	-0,9	56,8%
Tres de Febrero	84	26	16,7	18,7%	84	8	4,2	21,1%	85	28	20,1	23,0%	85	0,3	-1,1	33,3%
REGION OESTE	**1.046**	**95,3**	**26,5**	**49,3%**	**1.046**	**35,3**	**10,1**	**64,5%**	**1.057**	**29,0**	**18,7**	**16,3%**	**1.049**	**1,1**	**-0,4**	**164,9%**
Avellaneda	100	28	18,8	20,5%	100	8	4,9	20,0%	106	24	18,3	6,3%	100	-0,3	-1,0	27,3%
Florencio Varela	226	82	36,8	45,5%	226	39	17,0	43,4%	226	21	18,7	2,8%	226	0,9	0,3	73,5%
Lanus	120	29	18,8	19,5%	120	7	5,0	18,4%	122	23	18,5	6,4%	120	-0,1	-0,9	31,6%
Quilmes	169	67	19,2	43,3%	169	33	5,8	81,8%	175	24	18,7	9,2%	169	0,5	-0,8	46,2%
REGION SUDESTE	**615**	**82,0**	**25,6**	**55,5%**	**615**	**39,0**	**9,6**	**79,3%**	**629**	**24,0**	**18,6**	**6,4%**	**615**	**0,9**	**-0,5**	**135,8%**
Almte Brown	97	49	21,9	36,9%	97	18	8,0	54,1%	102	19	18,0	3,8%	97	0,8	-0,5	124,4%
Esteban Echeverria	89	45	21,5	29,9%	89	25	11,1	32,4%	89	19	17,8	4,7%	89	0,5	-0,2	303,9%
Ezeiza	72	33	18,9	21,5%	72	17	12,2	14,4%	73	19	17,9	4,9%	73	0,6	0,1	211,9%
Lomas de Zamora	174	44	21,3	29,3%	174	19	6,8	52,3%	178	19	18,0	3,7%	175	0,4	-0,7	65,3%
Presidente Peron	23	31	21,8	22,6%	23	18	11,9	20,5%	23	19	18,0	3,4%	23	0,3	0,1	76,4%
REGION SUDOESTE	**455**	**44,8**	**21,1**	**30,5%**	**455**	**24,5**	**9,0**	**45,9%**	**465**	**19,0**	**17,9**	**4,1%**	**457**	**0,8**	**-0,4**	**148,9%**
Total general	**3.713**	**101,7**	**24,5**	**54,1%**	**3.713**	**41,4**	**8,8**	**76,7%**	**3.782**	**30,0**	**18,6**	**16,4%**	**3.723**	**1,1**	**-0,5**	**116,2%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PARAMETROS NO CONTEMPLADOS EN EL MARCO REGULATORIO

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

180-INS-A-CA-RED-02-L (Ex 11)

Región // Distrito	Níquel µg/l				Silicio mg/l				Antimonio µg/l				Sodio mg/l			
	Nº de Muestras	Concentración Máxima (µg/l)	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (mg/l)	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (µg/l)	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (mg/l)	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	63,0	30,5	26,5%
Caballito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	53,0	31,0	25,0%
Centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	50,0	30,2	23,8%
Constitucion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	48,0	33,2	21,7%
Devoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	70,0	32,2	28,8%
Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	52,0	35,1	20,5%
REGION CAPITAL FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**835**	**70,0**	**31,9**	**25,0%**
Escobar	1	5,0	< 5,0	0,0%	1	32,0	= 32,0	0,0%	1	5,0	< 5,0	0,0%	30	139,0	= 36,2	90,5%
Jose C Paz	12	5,0	< 5,0	0,0%	12	33,0	= 29,0	8,8%	12	5,0	< 5,0	0,0%	12	195,0	= 180,0	5,8%
Malvinas Argentinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	217,0	= 154,7	17,8%
Pilar	55	5,0	< 5,0	0,0%	55	38,0	= 31,7	7,5%	55	5,0	< 5,00	0,0%	156	238,0	= 151,6	17,0%
San Fernando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	51,0	= 30,0	27,3%
San Isidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	69,0	= 37,0	22,2%
San Martin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	73,0	= 35,3	24,8%
San Miguel	37	5,0	< 5,0	0,0%	37	42,0	= 33,5	9,8%	37	5,0	< 5,0	0,0%	110	310,0	= 164,3	27,4%
Tigre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	41,0	= 25,2	26,4%
Vicente Lopez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	48,0	= 32,5	26,5%
REGION NORTE	**105**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**	**105**	**42,0**	**= 32,1**	**9,5%**	**105**	**5,0**	**< 0,1**	**0,0%**	**762**	**310,0**	**= 82,0**	**80,0%**
La Matanza Norte	12	5,0	< 5,0	0,0%	12	34,0	= 19,2	60,5%	12	5,0	< 5,0	0,0%	126	194,0	= 57,9	82,8%
La Matanza Oeste	61	5,0	< 5,0	0,0%	61	34,0	= 24,8	32,5%	61	5,0	< 5,0	0,0%	298	322,0	= 151,3	54,4%
La Matanza Sur	12	5,0	< 5,0	0,0%	12	16,0	= 11,3	29,1%	12	5,0	< 5,0	0,0%	141	99,0	= 45,5	42,5%
Merlo	42	5,0	< 5,0	0,0%	42	39,0	= 31,0	19,0%	42	5,0	< 5,0	0,0%	124	350,0	= 180,3	26,0%
Moreno	40	5,0	< 5,0	0,0%	40	37,0	= 31,1	7,4%	40	5,0	< 5,0	0,0%	121	264,0	= 201,1	14,5%
Moron	16	5,0	< 5,0	0,0%	16	36,0	= 15,3	80,3%	16	5,0	< 5,0	0,0%	152	184,0	= 42,4	99,1%
Tres de Febrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	71,0	= 31,3	31,3%
REGION OESTE	**183**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**	**183**	**39,0**	**= 25,5**	**37,3%**	**183**	**5,0**	**< 0,1**	**0,0%**	**1.046**	**350,0**	**= 109,5**	**76,1%**
Avellaneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	69,0	= 38,8	28,1%
Florencio Varela	73	5,0	< 5,0	0,0%	73	38,0	= 31,6	7,9%	73	5,0	< 5,0	0,0%	226	270,0	= 181,1	20,5%
Lanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	62,0	= 38,6	25,2%
Quilmes	8	5,0	< 5,0	0,0%	8	40,0	= 19,6	77,5%	8	5,0	< 5,0	0,0%	169	258,0	= 44,1	83,1%
REGION SUDESTE	**81**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**	**81**	**40,0**	**= 30,4**	**20,5%**	**81**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**	**615**	**270,0**	**= 92,5**	**80,0%**
Almte Brown	14	5,0	< 5,0	0,0%	14	34,0	= 26,5	29,8%	14	5,0	< 5,0	0,0%	97	341,0	= 114,4	86,3%
Esteban Echeverria	35	5,0	< 5,0	0,0%	35	34,0	= 22,3	39,2%	35	5,0	< 5,0	0,0%	89	267,0	= 157,1	46,8%
Ezeiza	28	5,0	< 5,0	0,0%	28	33,0	= 24,8	16,0%	28	5,0	< 5,0	0,0%	72	383,0	= 235,2	36,5%
Lomas de Zamora	20	5,0	< 5,0	0,0%	20	36,0	= 20,1	51,6%	20	5,0	< 5,0	0,0%	174	322,0	= 70,4	97,9%
Presidente Peron	12	5,0	< 5,0	0,0%	12	32,0	= 30,0	4,3%	12	5,0	< 5,0	0,0%	23	165,0	= 137,0	13,7%
REGION SUDOESTE	**109**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**	**109**	**36,0**	**= 23,9**	**33,3%**	**109**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**	**455**	**383,0**	**= 126,2**	**76,8%**
Total general	**478**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**	**478**	**42,0**	**= 27,4**	**30,1%**	**478**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**	**3.713**	**383,0**	**= 85,7**	**89,9%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.

CALIDAD DE AGUA POTABILIZADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION

PARAMETROS NO CONTEMPLADOS EN EL MARCO REGULATORIO

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

180-INS-A-CA-RED-02-M (Ex 11)

Región // Distrito	Potasio mg/l				Bario mg/l				Plata mg/l				Cobalto µg/l			
	Nº de Muestras	Concentración Máxima (mg/l)	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (mg/l)	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (mg/l)	Concentración Promedio (mg/l)	Coeficiente de Variación	Nº de Muestras	Concentración Máxima (µg/l)	Concentración Promedio (µg/l)	Coeficiente de Variación
Belgrano	150	6,7	= 4,1	22,3%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
Caballito	229	6,6	= 4,2	21,6%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
Centro	122	6,5	= 4,1	22,5%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
Constitucion	72	6,0	= 4,2	19,3%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
Devoto	109	8,2	= 4,5	22,0%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
Flores	153	6,7	= 4,5	18,2%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
REGION CAPITAL FEDERAL	**835**	**8,2**	**= 4,3**	**21,4%**	**-**	**-**	**- -**	**-**	**-**	**-**	**- -**	**-**	**-**	**-**	**- -**	**-**
Escobar	30	9,0	= 4,1	43,0%	1	0,2	< 0,2	0,0%	1	0,05	< 0,05	#¡DIV/0!	1	5,0	< 5,0	0,0%
Jose C Paz	12	10,0	= 8,3	13,0%	12	0,2	< 0,2	0,0%	12	0,05	< 0,05	0,0%	12	5,0	< 5,0	0,0%
Malvinas Argentinas	24	12,9	= 11,1	8,8%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
Pilar	156	14,2	= 9,2	15,8%	55	0,3	< 0,2	4,7%	55	0,05	< 0,05	0,0%	55	5,0	< 5,0	0,0%
San Fernando	60	7,0	= 4,0	24,4%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
San Isidro	83	7,5	= 4,7	19,3%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
San Martin	111	7,9	= 4,7	19,1%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
San Miguel	110	17,2	= 12,1	16,2%	37	0,4	< 0,2	15,5%	37	0,05	< 0,05	0,0%	37	5,0	< 5,0	0,0%
Tigre	91	5,5	= 3,6	23,6%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
Vicente Lopez	85	6,5	= 4,2	23,5%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
REGION NORTE	**762**	**17,2**	**= 6,7**	**50,6%**	**105**	**0,4**	**< 0,2**	**10,7%**	**105**	**0,05**	**< 0,05**	**0,0%**	**105**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**
La Matanza Norte	126	12,4	= 5,8	41,7%	12	0,2	< 0,2	0,0%	12	0,05	< 0,05	0,0%	12	5,0	< 5,0	0,0%
La Matanza Oeste	298	13,4	= 7,4	29,0%	61	0,3	< 0,2	3,8%	61	0,05	< 0,05	0,0%	61	5,0	< 5,0	0,0%
La Matanza Sur	141	7,2	= 5,1	18,9%	12	0,2	< 0,2	0,0%	12	0,05	< 0,05	0,0%	12	5,0	< 5,0	0,0%
Merlo	124	14,1	= 10,1	20,1%	42	0,2	< 0,2	1,5%	42	0,05	< 0,05	0,0%	42	5,0	< 5,0	0,0%
Moreno	121	12,6	= 9,8	12,9%	40	0,2	< 0,2	0,0%	40	0,05	< 0,05	0,0%	40	5,0	< 5,0	0,0%
Moron	152	10,0	= 4,5	38,4%	16	0,2	< 0,2	0,0%	16	0,05	< 0,05	0,0%	16	5,0	< 5,0	0,0%
Tres de Febrero	84	7,6	= 4,0	25,6%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
REGION OESTE	**1.046**	**14,1**	**= 6,8**	**40,8%**	**183**	**0,3**	**< 0,2**	**2,3%**	**183**	**0,05**	**< 0,00**	**0,0%**	**183**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**
Avellaneda	100	8,6	= 4,7	22,2%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
Florencio Varela	226	15,3	= 10,0	22,1%	73	0,4	< 0,2	19,5%	73	0,05	< 0,05	0,0%	73	5,0	< 5,0	0,0%
Lanus	120	7,0	= 4,7	22,3%	-	-	- -	-	-	-	- -	-	-	-	- -	-
Quilmes	169	13,3	= 4,9	41,0%	8	0,2	< 0,2	0,0%	8	0,05	< 0,05	0,0%	8	5,0	< 5,0	0,0%
REGION SUDESTE	**615**	**15,3**	**= 6,7**	**45,8%**	**81**	**0,4**	**< 0,2**	**18,7%**	**81**	**0,05**	**< 0,05**	**0,0%**	**81**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**
Almte Brown	97	11,9	= 6,3	37,0%	14	0,2	< 0,2	0,0%	14	0,05	< 0,05	0,0%	14	5,0	< 5,0	0,0%
Esteban Echeverria	89	10,8	= 7,6	28,7%	35	0,2	< 0,2	0,0%	35	0,05	< 0,05	0,0%	35	5,0	< 5,0	0,0%
Ezeiza	72	10,6	= 8,8	13,7%	28	0,2	< 0,2	0,0%	28	0,05	< 0,05	0,0%	28	5,0	< 5,0	0,0%
Lomas de Zamora	174	10,1	= 5,4	32,3%	20	0,2	< 0,2	0,0%	20	0,05	< 0,05	0,0%	20	5,0	< 5,0	0,0%
Presidente Peron	23	10,8	= 9,0	9,7%	12	0,2	< 0,2	0,0%	12	0,05	< 0,05	0,0%	12	5,0	< 5,0	0,0%
REGION SUDOESTE	**455**	**10,8**	**= 6,7**	**33,9%**	**109**	**0,2**	**< 0,2**	**0,0%**	**109**	**0,05**	**< 0,05**	**0,0%**	**109**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**
Total general	**3.713**	**17,2**	**= 6,2**	**45,7%**	**478**	**0,4**	**< 0,2**	**10,0%**	**478**	**0,05**	**< 0,05**	**0,0%**	**478**	**5,0**	**< 5,0**	**0,0%**

Nota 1: (*) Los valores promedio y coeficiente de variación, no poseen significado estadístico sobre este parámetro.

Nota 2: En los casos en los que no se indica el Coeficiente de Variación, la desviación estándar no es representativa dado que el valor promedio es menor al límite de detección.










INFORME DE NIVELES DE SERVICIO 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 1.2

aysa

Índice General del
Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 1.1

1 Agua

1.1 Calidad de Agua

1.1.1 Calidad Agua Cruda Subterránea

1.1.2 Calidad Agua Cruda Superficial

1.1.3 Calidad Agua Producida

1.1.4 Calidad Agua en Redes de Distribución

TOMO 1.2

1.2 Producción

1.3 Transporte

1.4 Insumos Químicos

1.4.1 Consumo Plantas

1.4.2 Consumo Elevadoras + Pozos + Plantas Tratamiento

1.5 Información General

1.5.1 Continuidad del Abastecimiento – Reclamos

1.5.2 Conexiones

1.5.3 Fuentes Alternativas

1.5.4 Contactos con los Usuarios

1.6 Presión del Servicio

1.7 Reducción de Agua No Contabilizada

Índice General del
Informe Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 2

2 Saneamiento

2.1 Calidad de los Efluentes

2.1.1 Redes Cloacales

2.1.2 Plantas Depuradoras

2.1.3 Descarga a Cuerpo Receptor

2.1.4 Efluentes Industriales

2.1.5 Biosólidos

2.2 Depuración

2.3 Transporte

2.4 Información General

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 1.1

1 AGUA

1.1 CALIDAD DE AGUA

1.1.1 Calidad de Agua Cruda Subterránea

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 07	**010-INS-A-CA-CRU-PS-00**	Calidad de Agua Cruda Subterránea.
PL INS 08	**020-INS-A-CA-CRU-PS-01**	Calidad de Agua Cruda Subterránea (parque de PSS - parámetros: Nitratos, Arsénico, Escherichia Coli, Pseudomonas, Coliformes Totales, Bacterias Heterótrofas, Tetracloruro de Carbono y Tricloroetileno).
PL INS 09	**030-INS-A-CA-CRU-PS-02**	Evolución Calidad Agua Subterránea producida Area Concesión.
		Gráfico de la evolución del número de pozos en funcionamiento.
		Gráfico Evolución de los Nitratos y de Sales disueltos.
		Gráfico Evolución de Arsénico y Tricloroetileno.
PL INS 69	**040-INS-A-CA-CRU-PS-03**	Listado de pozos con muestreo incompleto.
	050-INS-A-CA-CRU-PS-04	Listado puntos cercanos.

1.1.2 Calidad de Agua Cruda Superficial

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 02	**060-INS-A-CA-CRU-PSM-00**	Calidad de agua cruda superficial Planta San Martín.
PL INS 57/60/63	**070-INS-A-CA-CRU-PSM-01**	Planta San Martín: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global y por salida - número de determinaciones.
PL INS 03	**080-INS-A-CA-CRU-PMB-00**	Calidad de Agua Cruda Superficial Planta Manuel Belgrano.
PL INS 58/61/64	**090-INS-A-CA-CRU-PMB-01**	Planta Belgrano: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global y por salida - número de determinaciones.
	120-INS-A-CA-CRU-PJMR-00	Calidad de agua cruda superficial Planta Juan Manuel de Rosas
	130-INS-A-CA-CRU-PJMR-01	Planta Juan Manuel del Rosas: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global y por salida - número de determinaciones
	135-Gráficos PSM	Gráficos Planta San Martín - Agua Cruda y de Consumo. Parámetros: Turbiedad, pH, Amonio y UV254.-
	136-Gráficos PMB	Gráficos Planta Manuel Belgrano - Agua Cruda y de Consumo. Parámetros: Turbiedad, pH, Amonio y UV254.-
	137-Gráficos PJMR	Gráficos Planta Juan Manuel de Rosas - Agua Cruda y de Consumo. Parámetros: Turbiedad, pH, Amonio y UV254.-

1.1.3 Calidad de Agua Producida

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 01	**140-INS-A-CA-PR-00**	Calidad de agua producida - SIT Anual.
PL INS 05	**150-INS-A-CA-PR-01**	Calidad de agua superficial tratada (Plantas: San Martín, M. Belgrano y J.M. Rosas).

1.1.4 Calidad de Agua en Redes de Distribución (PARTE 1)

Código Anterior	Código Actual	Título
SIT REDES	**160-INS-A-CA-RED-00**	Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución.
PL INS 10	**170-INS-A-CA-RED-01**	Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución.
PL INS 11	**180-INS-A-CA-RED-02**	Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución.

TOMO 1.2

1.1.4 Calidad de Agua en Redes de Distribución (PARTE 2)

Código Anterior	Código Actual	Título
	200-INS-A-CA-RED-03	Análisis y seguimiento anomalías en Red.
	210-INS-A-CA-RED-04	Análisis y seguimiento anomalías en puntos cercanos a PSS.

1.2 PRODUCCION

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 55	**220-INS-A-PR-00**	SIT - Producción de Agua.
PL INS 70	**230-INS-A-PR-01**	Almacenamiento de agua potable - instalaciones en uso.

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

1.3 TRANSPORTE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 56	**240-INS-A-TR-00**	SIT - Transporte Agua.

1.4 INSUMOS QUIMICOS

1.4.1 Consumo Plantas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 66	**250-INS-A-IQ-PSM**	Planta San Martín: Evolución de Consumos de Insumos Químicos.
PL INS 67	**260-INS-A-IQ-PMB**	Planta Manuel Belgrano: Evolución de Consumos de Insumos Químicos.
	280-INS-A-IQ-PJMR	Planta Juan Manuel Rosas: Evolución de Consumos de Insumos Químicos.

1.4.2 Consumo Elevadoras + Pozos + Plantas Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
	290-INS-A-IQ-TR-00	Estaciones Elevadoras - Pozos de Agua - Evolución de insumos químicos.
	291-INS-A-IQ-TR-01	Plantas de Tratamiento de Agua Subterránea - Evolución de insumos químicos.

1.5 INFORMACION GENERAL

1.5.1 Continuidad del Abastecimiento - Reclamos

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 12/13/14/15 /16/17/18/40/41/42	**300-INS-A-IG-SIT-DDRR**	Continuidad del abastecimiento de Agua - Cortes Programados en el Servicio (Identificación del número y de la magnitud de los cortes).

1.5.2 Conexiones

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 19	**310-INS-A-IG-CON-00**	Agua - Solicitudes de Conexión, Reconexión y Desconexión.

1.5.3 Fuentes Alternativas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 20	**320-INS-A-IG-FA-00**	Mantenimiento de Fuentes Alternativas (Resumen de MFA por Región y Partido).

1.5.4 Contactos con los Usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 52	**330-INS-IG-USU-00**	Clasificación de los contactos con los usuarios.
PL INS 53	**340-INS-IG-USU-01**	Contactos personales y telefónicos con usuarios.
PL INS 54	**350-INS-IG-USU-02**	Telemarketing: Nivel de Servicio.

1.6 PRESIÓN DEL SERVICIO

Código Anterior	Código Actual	Título
	360-INS 1.6	Presión del Servicio.
Planos		Presiones Máximas, Mínimas y Promedio anual. Curvas de Presión AySA y regionales.

1.7 REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

Código Anterior	Código Actual	Título
	370-INS 1.7	Reducción de Agua No Contabilizada.

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 2

2.1 CALIDAD DE LOS EFLUENTES

2.1.1 Redes Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 22/30/37	**2010-INS-S-CS-RED-00**	Calidad en Redes Cloacales por áreas de tratamiento.

2.1.2 Plantas Depuradoras

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 23/24/25/26/27	**2020-INS-S-CS-PD-00**	Calidad en Plantas Depuradoras: Caudal, DBO, DQO, SS 10', MES, Barros Bombeados, Biosólidos evacuados y % de eliminación de DBO, DQO, SS10' y MES. Se exponen Gráficos de DBO por planta.

2.1.3 Descarga a cuerpo receptor

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/39	**2030-INS-S-CS-CR-00**	Calidad de Efluentes - Descarga de los Establecimientos Depuradores: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. **Datos Lab. Plantas.**
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/39	**2040-INS-S-CS-CR-01**	Calidad de Efluentes - Descarga de los Establecimientos Depuradores: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. **Datos Lab. Central.**
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/39	**2050-INS-S-CS-CR-02**	Calidad de Efluentes - Descarga de Wilde - Radio Antiguo - Berazategui: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. **Datos Lab. Central.**
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/40	**2060-INS-S-CS-CR-03**	Calidad de Efluentes - Descarga Radio Antiguo - Berazategui: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. DETALLE - **Datos Lab. Central.**

2.1.4 Efluentes Industriales

Código Anterior	Código Actual	Título
	2070-2.1.4 INS-CIC-2024	Control Integral de la Contaminación (CIC).
S/N	**2070-INS-S-CS-CIC-00**	SIT - Efluentes industriales - Anual.
PL INS 71	**2071-INS-S-CS-CIC-01**	Control de Industrias.
PL INS 72	**2072-INS-S-CS-CIC-02**	Efluentes industriales a colectoras - Operativos.
PL INS 72	**2073-INS-S-CS-CIC-03**	Efluentes industriales a colectoras - Control Directo Programado.
PL INS 72	**2074-INS-S-CS-CIC-04**	Efluentes industriales a colectoras - Control Directo No Programado.

2.1.5 Biosólidos

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 76 y 77	**2080-INS-S-CS-BS-00**	Planta Depuradora Norte - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2081-INS-S-CS-BS-02	PD Sudoeste - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2084-INS-S-CS-BS-04	PDH - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2086-INS-S-CS-BS-06	PSC - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2088-INS-S-CS-BS-08	PDEJ2 - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2090-INS-S-CS-BS-10	PDBU - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2091-INS-S-CS-BS-14	PDBV - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2092-INS-S-CS-BS-15	PDE - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2093-INS-S-CS-BS-17	PDFe - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2094-INS-S-CS-BS-20	PDG - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2095-INS-S-CS-BS-21	PDCAT - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2096-INS-S-CS-BS-19	PDL - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

2.2 DEPURACIÓN

Código Anterior	Código Actual	Título
S/N	**2100-INS-S-DP-00**	SIT - Tratamiento.
PL INS 74	**2110-INS-S-DP-01**	Volúmenes de Líquidos Cloacales Bombeados y Tratados.

2.3 TRANSPORTE

Código Anterior	Código Actual	Título
S/N	**2120-INS-S-TR-00**	SIT - Transporte.
PL INS 75	**2121-INS-S-TR-01**	Estaciones de Bombeo de Líquidos Cloacales (Región Centro, Región Norte, Región Sur).

2.4 INFORMACIÓN GENERAL

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 43	**2130-INS-S-IG-CON-00**	Conexiones - Conexión, reconexión, desconexión.
PL INS 45	**2140-INS-S-IG-MDA-00**	Mantenimiento de Fuentes Alternativas (Resumen de MFA por Región y Partido).
PL INS 49/50/51	**2150-INS-S-IG-DBC-00**	Instalaciones de desborde de seguridad en red y en estaciones de bombeo.
PL INS 46/47/48	**2151-INS-S-DBC-01**	Instalaciones de desborde de seguridad.
	2160-INS-S-RES-00	Residuos de Rejas y/o Tamices
Plano		Red de Cloaca - Desbordes de Seguridad - Concesión.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Capital Federal.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Norte.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Oeste.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Sudoeste.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Sudeste.

1.1.4 Calidad Agua en Redes de Distribución (PARTE 2)

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
AB14	ECHAGUE PEDRO 422	PMA	RED	5/1/2025	7889750	=	481
AB14	ECHAGUE PEDRO 478	PMA	RED	29/3/2025	8025181	=	481
AB14	ECHAGUE PEDRO 478	PMA	RED	7/5/2025	8059771	=	503
AB14	ECHAGUE PEDRO 422	PMA	RED	1/8/2025	8184824	=	519
AB14	ECHAGUE PEDRO 422	PMA	RED	22/10/2025	8292361	=	407
AB19	SPIRO SAMUEL MIGUEL 517	PMA	RED	17/2/2025	7940809	=	149
AB19	SPIRO SAMUEL MIGUEL 517	PMA	RED	22/5/2025	8060154	=	57
AB19	SPIRO SAMUEL MIGUEL 517	PMA	RED	11/7/2025	8154205	=	414
AB19	SPIRO SAMUEL MIGUEL 517	PMA	RED	17/10/2025	8291785	=	352
AB19	SPIRO SAMUEL MIGUEL 517	PMA	RED	2/12/2025	8375949	=	416
AB24	ARENALES 2264	PMA	RED	20/2/2025	7941309	=	429
AB24	ARENALES 2264	PMA	RED	25/4/2025	8023515	=	402
AB24	ARENALES 2264	PMA	RED	27/6/2025	8151305	=	353
AB24	ARENALES 2260	PMA	RED	10/9/2025	8242596	=	421
AB24	ARENALES 2264	PMA	RED	10/11/2025	8324180	=	353
EE02	TORO FERNANDO DE 160	PMA	RED	2/1/2025	7889166	=	478
EE02	TORO FERNANDO DE 160	PMA	RED	14/3/2025	7981426	=	418
EE02	TORO FERNANDO DE 160	PMA	RED	1/5/2025	8059317	=	87
EE02	TORO FERNANDO DE 160	PMA	RED	11/8/2025	8184366	=	404
EE02	TORO FERNANDO DE 160	PMA	RED	13/10/2025	8291790	=	320
EE03	LUGONES LEOPOLDO (EZ) 22	PMA	RED	29/3/2025	8025182	=	452
EE03	LUGONES LEOPOLDO (EZ) 22	PMA	RED	7/5/2025	8059318	=	427
EE03	LUGONES LEOPOLDO (EZ) 22	PMA	RED	2/7/2025	8153065	=	473
EE03	LUGONES LEOPOLDO (EZ) 22	PMA	RED	2/9/2025	8241466	=	432
EE03	LUGONES LEOPOLDO (EZ) 22	PMA	RED	3/11/2025	8323721	=	392
EE05	NEWBERY JORGE 1270	PMA	RED	8/1/2025	7890305	=	399
EE05	NEWBERY JORGE 1270	PMA	RED	5/3/2025	7980722	=	418
EE05	NEWBERY JORGE 1456	PMA	RED	11/6/2025	8110192	=	398
EE05	NEWBERY JORGE 1456	PMA	RED	14/8/2025	8185213	=	403
EE05	NEWBERY JORGE 1456	PMA	RED	6/11/2025	8323722	=	329
EE06	MILES JORGE 1320	PMA	RED	2/1/2025	7889169	=	482
EE06	MILES JORGE 1320	PMA	RED	19/4/2025	8022870	=	425
EE06	MILES JORGE 1320	PMA	RED	3/6/2025	8109480	=	401
EE06	MILES JORGE 1320	PMA	RED	1/9/2025	8241468	=	451
EE06	MILES JORGE 1320	PMA	RED	11/11/2025	8324582	=	321
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 140	PMA	RED	13/1/2025	7890194	=	503
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 140	PMA	RED	20/3/2025	7981961	=	512
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 140	PMA	RED	22/5/2025	8060769	=	450
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 160	PMA	RED	9/9/2025	8242714	=	463
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 160	PMA	RED	19/11/2025	8325275	=	396
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	21/1/2025	7904479	=	425
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	13/5/2025	8060086	=	426
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	1/7/2025	8154100	=	524
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	4/9/2025	8242112	=	433
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	12/12/2025	8375886	=	406
EE18	LEGARRETA MELITON 450	PMA	RED	13/2/2025	7940818	=	489
EE18	LEGARRETA MELITON 488	PMA	RED	8/4/2025	8021715	=	434
EE18	LEGARRETA MELITON 464	PMA	RED	11/6/2025	8110194	=	442
EE18	LEGARRETA MELITON 464	PMA	RED	11/9/2025	8242185	=	405
EE18	LEGARRETA MELITON 450	PMA	RED	6/11/2025	8323729	=	399
EE19	ROTTA ANGEL 437	PMA	RED	13/2/2025	7939979	=	421
EE19	ROTTA ANGEL 469	PMA	RED	19/4/2025	8022872	=	399
EE19	ROTTA ANGEL 437	PMA	RED	2/7/2025	8153073	=	372
EE19	ROTTA ANGEL 437	PMA	RED	1/9/2025	8241471	=	440
EE19	ROTTA ANGEL 437	PMA	RED	15/12/2025	8375959	=	373
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	15/1/2025	7890309	=	425
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	18/3/2025	7981432	=	388
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	15/5/2025	8060165	=	498
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	10/7/2025	8154216	=	440
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	23/10/2025	8291796	=	377
EE21	ALEM LEANDRO N 3171	PMA	RED	20/2/2025	7940821	=	452

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
EE21	ALEM LEANDRO N 3171	PMA	RED	1/5/2025	8059328	=	94
EE21	ALEM LEANDRO N 3171	PMA	RED	10/7/2025	8154217	=	422
EE21	ALEM LEANDRO N 3171	PMA	RED	13/10/2025	8291797	=	350
EE21	ALEM LEANDRO N 3171	PMA	RED	2/12/2025	8375244	=	402
EE22	LOS TULIPANES 570	PMA	RED	7/1/2025	7889174	=	430
EE22	LOS TULIPANES 570	PMA	RED	5/6/2025	8109486	=	457
EE22	LOS TULIPANES 450	PMA	RED	1/8/2025	8184378	=	441
EE22	LOS TULIPANES 570	PMA	RED	3/10/2025	8290654	=	300
EE22	LOS TULIPANES 590	PMA	RED	4/12/2025	8375245	=	419
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	8/1/2025	7890196	=	461
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	21/4/2025	8023753	=	462
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	7/7/2025	8154101	=	436
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	4/9/2025	8242113	=	447
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	13/11/2025	8325351	=	414
EE24	RAYO DE SOL 1731	PMA	RED	20/3/2025	7981963	=	442
EE24	RAYO DE SOL 1731	PMA	RED	22/5/2025	8060771	=	458
EE24	RAYO DE SOL 1731	PMA	RED	18/8/2025	8185826	=	469
EE24	RAYO DE SOL 1731	PMA	RED	14/10/2025	8292508	=	347
EE24	RAYO DE SOL 1731	PMA	RED	17/12/2025	8376491	=	354
EE25	TUCUMAN 131	PMA	RED	15/1/2025	7890312	=	395
EE25	TUCUMAN 131	PMA	RED	15/4/2025	8022876	=	412
EE25	TUCUMAN 131	PMA	RED	12/6/2025	8110199	=	449
EE25	TUCUMAN 171	PMA	RED	5/8/2025	8185220	=	462
EE25	TUCUMAN 131	PMA	RED	9/12/2025	8375963	=	371
EE26	LAURE 415	PMA	RED	4/2/2025	7939984	=	413
EE26	LAURE 465	PMA	RED	7/4/2025	8021721	=	423
EE26	LAURE 465	PMA	RED	5/6/2025	8109488	=	422
EE26	LAURE 419	PMA	RED	1/8/2025	8184380	=	434
EE26	LAURE 419	PMA	RED	3/10/2025	8290656	=	317
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	17/2/2025	7940825	=	464
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	15/4/2025	8022878	=	486
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	12/6/2025	8110201	=	439
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	12/9/2025	8242192	=	449
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	17/11/2025	8324590	=	347
EE29	17 DE AGOSTO 2869	PMA	RED	18/3/2025	7981439	=	443
EE29	17 DE AGOSTO 2869	PMA	RED	15/5/2025	8060172	=	448
EE29	17 DE AGOSTO 2869	PMA	RED	10/7/2025	8154223	=	423
EE29	17 DE AGOSTO 2879	PMA	RED	12/9/2025	8242194	=	276
EE29	17 DE AGOSTO 2879	PMA	RED	17/11/2025	8324592	=	397
EE32	Dreyer 4278	PMA	RED	20/2/2025	7942940	=	440
EE32	Dreyer 4300	PMA	RED	11/4/2025	8022761	=	419
EE32	Dreyer 4300	PMA	RED	12/8/2025	8185141	=	472
EE32	Dreyer 4300	PMA	RED	8/10/2025	8291682	=	332
EE32	Dreyer 4278	PMA	RED	12/12/2025	8375892	=	391
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y	PMA	RED	2/1/2025	7889181	=	546
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y	PMA	RED	13/2/2025	7940829	=	480
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y	PMA	RED	1/4/2025	8021726	=	483
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y	PMA	RED	3/6/2025	8109493	=	469
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y	PMA	RED	17/12/2025	8375252	=	360
EE35	GARREADOR 199	PMA	RED	2/1/2025	7889182	=	635
EE35	GARREADOR 199	PMA	RED	14/3/2025	7981442	=	529
EE35	GARREADOR 199	PMA	RED	2/7/2025	8153084	=	545
EE35	GARREADOR 199	PMA	RED	12/9/2025	8242197	=	545
EE35	GARREADOR 199	PMA	RED	13/10/2025	8291685	=	351
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	6/3/2025	7980737	=	412
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	15/5/2025	8060177	=	399
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	1/7/2025	8153086	=	478
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	1/10/2025	8290663	=	341
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	15/12/2025	8375972	=	364
EEPC2	SAENZ PEÑA ROQUE	PMA	RED	12/2/2025	7940748	=	535
EEPC2	SAENZ PEÑA ROQUE	PMA	RED	22/4/2025	8023661	=	451

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
EEPC2	SAENZ PEÑA ROQUE	PMA	RED	17/6/2025	8110732	=	471
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	19/2/2025	7942942	=	545
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	11/4/2025	8022766	=	478
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	6/6/2025	8110131	=	521
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	12/8/2025	8185146	=	491
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	5/11/2025	8324512	=	394
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	12/2/2025	7940752	=	474
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	22/4/2025	8023668	=	462
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	28/7/2025	8199379	=	428
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	9/9/2025	8242720	=	452
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	19/11/2025	8325281	=	400
FV01	EL CARDENAL esq. LOS OLMOS	PMA	RED	22/1/2025	7890672	=	506
FV01	EL CARDENAL esq. LOS OLMOS	PMA	RED	20/5/2025	8060507	=	503
FV01	EL CARDENAL esq. LOS OLMOS	PMA	RED	14/8/2025	8185554	=	585
FV02	PRESIDENTE ARTURO ILLIA	PMA	RED	10/2/2025	7941167	=	568
FV02	PRESIDENTE ARTURO ILLIA	PMA	RED	2/6/2025	8110485	=	590
FV02	PRESIDENTE ARTURO ILLIA	PMA	RED	9/9/2025	8242477	=	559
FV-TAN-	BATALLA DE CHACBUCO 180	PMA	RED	4/2/2025	7940123	=	550
FV-TAN-	BATALLA DE CHACBUCO 180	PMA	RED	9/5/2025	8059462	=	533
FV-TAN-	BATALLA DE CHACBUCO 180	PMA	RED	3/9/2025	8241570	=	584
FV-TAN-	SGTO. JUAN BAUTISTA	PMA	RED	7/3/2025	7980820	=	422
FV-TAN-	SGTO. JUAN BAUTISTA	PMA	RED	6/6/2025	8109578	=	404
FV-TAN-	SGTO. JUAN BAUTISTA	PMA	RED	8/9/2025	8241571	=	422
FV-TAN-	AV. EVA PERON, E/ CALLE 734 Y	PMA	RED	15/1/2025	7890013	=	433
FV-TAN-	AV. EVA PERON, E/ CALLE 734 Y	PMA	RED	4/7/2025	8153920	=	439
FV-TAN-	AV. EVA PERON, E/ CALLE 734 Y	PMA	RED	7/10/2025	8291502	=	325
FV-TAN-	calles 445 y Calle 443	PMA	RED	3/1/2025	7889562	=	505
FV-TAN-	calles 445 y Calle 443	PMA	RED	28/5/2025	8091679	=	548
FV-TAN-	calles 445 y Calle 443	PMA	RED	5/8/2025	8184688	=	585
GU01	FLORENCIO VARELA 2920	PMA	RED	6/1/2025	7889427	=	350
GU01	FLORENCIO VARELA 2920	PMA	RED	6/5/2025	8059537	=	364
GU01	FLORENCIO VARELA 2920	PMA	RED	7/8/2025	8184595	=	415
GU01	FLORENCIO VARELA 2920	PMA	RED	16/12/2025	8375402	=	350
GU02	AV. NESTOR KIRCHNER 562	PMA	RED	6/2/2025	7940199	=	390
GU02	AV. NESTOR KIRCHNER 562	PMA	RED	5/6/2025	8109638	=	373
GU02	AV. NESTOR KIRCHNER 562	PMA	RED	2/9/2025	8241631	=	405
GU-TAN-YA	AV. CARLOS MERELES 1050	PMA	RED	3/4/2025	8021999	=	422
GU-TAN-YA	AV. CARLOS MERELES 1050	PMA	RED	7/8/2025	8184598	=	447
GU-TAN-YA	AV. CARLOS MERELES 1050	PMA	RED	7/11/2025	8323953	=	331
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	PMA	RED	15/1/2025	7889431	=	454
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	PMA	RED	18/3/2025	7980882	=	474
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	PMA	RED	4/6/2025	8109641	=	435
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	PMA	RED	11/9/2025	8241634	=	488
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	PMA	RED	3/12/2025	8375406	=	407
JCP01	ACERBONI 5854	PMA	RED	16/1/2025	7889563	=	423
JCP01	ACERBONI 5854	PMA	RED	13/5/2025	8059641	=	427
JCP01	ACERBONI 5854	PMA	RED	9/9/2025	8241718	=	427
JCP-TAN-	CORBETA URUGUAY 981	PMA	RED	10/2/2025	7940298	=	437
JCP-TAN-	CORBETA URUGUAY 981	PMA	RED	13/6/2025	8109727	=	428
JCP-TAN-	CORBETA URUGUAY 981	PMA	RED	9/10/2025	8291066	=	348
LMO01	BUSTOS JUAN B 6062	PMA	RED	7/1/2025	7889565	=	408
LMO01	BUSTOS JUAN B 6062	PMA	RED	25/2/2025	7941266	=	54
LMO01	BUSTOS JUAN B 6062	PMA	RED	23/4/2025	8023470	=	103
LMO01	BUSTOS JUAN B 6062	PMA	RED	10/6/2025	8110057	=	129
LMO01	BUSTOS JUAN B 6062	PMA	RED	7/8/2025	8184695	=	69
LMO01	BUSTOS JUAN B 6062	PMA	RED	4/9/2025	8241720	=	76
LMO01	BUSTOS JUAN B 6062	PMA	RED	6/10/2025	8291067	=	53
LMO01	BUSTOS JUAN B 6062	PMA	RED	4/12/2025	8375492	=	56
LMO02	SALVIGNY 4469	PMA	RED	8/1/2025	7899770	=	165
LMO02	SALVIGNY 4243	PMA	RED	12/3/2025	7981123	=	303
LMO02	SALVIGNY 4469	PMA	RED	15/4/2025	8022374	=	425

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
LMO02	SALVIGNY 4469	PMA	RED	21/5/2025	8059814	=	477
LMO02	SALVIGNY 4469	PMA	RED	10/6/2025	8109887	=	484
LMO02	SALVIGNY 4469	PMA	RED	14/8/2025	8184867	=	132
LMO02	SALVIGNY 4469	PMA	RED	7/10/2025	8291304	=	245
LMO02	SALVIGNY 4469	PMA	RED	4/12/2025	8375645	=	288
LMO04	SAN CARLOS 6181	PMA	RED	2/1/2025	7889203	=	562
LMO04	SAN CARLOS 6181	PMA	RED	12/2/2025	7940475	=	417
LMO04	SAN CARLOS 6181	PMA	RED	20/3/2025	7981558	=	456
LMO04	SAN CARLOS 6181	PMA	RED	21/5/2025	8060333	=	463
LMO04	SAN CARLOS 6179	PMA	RED	4/8/2025	8184400	=	486
LMO04	SAN CARLOS 6179	PMA	RED	1/10/2025	8290687	=	369
LMO04	SAN CARLOS 6179	PMA	RED	3/11/2025	8323755	=	401
LMO04	SAN CARLOS 6179	PMA	RED	1/12/2025	8375260	=	430
LMO07	PINTO MANUEL GUILLERMO	PMA	RED	2/1/2025	7889204	=	576
LMO07	PINTO MANUEL GUILLERMO	PMA	RED	5/3/2025	7980741	=	500
LMO07	PINTO MANUEL GUILLERMO	PMA	RED	1/4/2025	8021751	=	510
LMO07	PINTO MANUEL GUILLERMO	PMA	RED	5/5/2025	8059352	=	338
LMO07	PINTO MANUEL GUILLERMO	PMA	RED	28/5/2025	8091681	=	387
LMO07	PINTO MANUEL GUILLERMO	PMA	RED	1/7/2025	8153111	=	369
LMO07	PINTO MANUEL GUILLERMO	PMA	RED	4/8/2025	8184401	=	330
LMO07	PINTO MANUEL GUILLERMO	PMA	RED	1/10/2025	8290688	=	310
LMO07	PINTO MANUEL GUILLERMO	PMA	RED	1/12/2025	8375261	=	349
LMO08	JACHAL 1025	PMA	RED	20/1/2025	7899901	=	483
LMO08	JACHAL 1025	PMA	RED	11/3/2025	7981293	=	510
LMO08	JACHAL 1025	PMA	RED	16/4/2025	8022683	=	458
LMO08	JACHAL 1025	PMA	RED	21/5/2025	8059645	=	478
LMO08	JACHAL 1025	PMA	RED	18/6/2025	8110559	=	519
LMO08	JACHAL 1025	PMA	RED	12/8/2025	8185655	=	502
LMO08	JACHAL 1025	PMA	RED	20/10/2025	8292319	=	393
LMO08	JACHAL 1025	PMA	RED	17/11/2025	8324429	=	410
LMO09	RECUERO 3620	PMA	RED	10/1/2025	7890017	=	462
LMO09	RECUERO 3620	PMA	RED	10/3/2025	7981260	=	557
LMO09	RECUERO 3620	PMA	RED	14/4/2025	8022577	=	506
LMO09	RECUERO 3620	PMA	RED	24/6/2025	8147160	=	560
LMO09	RECUERO 3620	PMA	RED	22/7/2025	8191149	=	512
LMO09	RECUERO 3620	PMA	RED	14/8/2025	8185019	=	545
LMO09	RECUERO 3620	PMA	RED	5/9/2025	8242013	=	445
LMO09	RECUERO 3620	PMA	RED	13/10/2025	8291506	=	391
LMO09	RECUERO 3620	PMA	RED	9/12/2025	8375786	=	422
LMO11	GAMBOA MARCELO 5041	PMA	RED	10/1/2025	7899789	=	380
LMO11	GAMBOA MARCELO 5041	PMA	RED	7/2/2025	7940627	=	345
LMO11	GAMBOA MARCELO 5041	PMA	RED	10/3/2025	7981261	=	421
LMO11	GAMBOA MARCELO 5041	PMA	RED	7/5/2025	8059962	=	403
LMO11	GAMBOA MARCELO 5041	PMA	RED	8/7/2025	8153926	=	382
LMO11	GAMBOA MARCELO 5041	PMA	RED	13/10/2025	8291508	=	332
LMO11	GAMBOA MARCELO 5041	PMA	RED	7/11/2025	8324377	=	349
LMO11	GAMBOA MARCELO 5041	PMA	RED	9/12/2025	8375787	=	380
LMO14	ECHAURI JUAN F M DE 4794	PMA	RED	10/1/2025	7899790	=	432
LMO14	ECHAURI JUAN F M DE 4794	PMA	RED	7/2/2025	7940628	=	408
LMO14	ECHAURI JUAN F M DE 4740	PMA	RED	10/3/2025	7981262	=	485
LMO14	ECHAURI JUAN F M DE 4794	PMA	RED	7/5/2025	8059963	=	474
LMO14	ECHAURI JUAN F M DE 4794	PMA	RED	8/7/2025	8153929	=	446
LMO14	ECHAURI JUAN F M DE 4794	PMA	RED	14/8/2025	8185021	=	498
LMO14	ECHAURI JUAN F M DE 4794	PMA	RED	5/9/2025	8242015	=	450
LMO14	ECHAURI JUAN F M DE 4794	PMA	RED	9/12/2025	8375788	=	423
LMO16	ARMONIA 5753	PMA	RED	13/3/2025	7981794	=	486
LMO16	ARMONIA 5753	PMA	RED	18/6/2025	8110560	=	504
LMO16	ARMONIA 5753	PMA	RED	16/9/2025	8242553	=	360
LMO16	ARMONIA 5753	PMA	RED	16/10/2025	8292320	=	280
LMO16	ARMONIA 5753	PMA	RED	17/12/2025	8376326	=	273
LMO19	LAVALLEJA (LMO) 6141	PMA	RED	10/1/2025	7890029	=	378

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
LMO19	LAVALLEJA (LMO) 6141	PMA	RED	26/3/2025	7981374	=	452
LMO19	LAVALLEJA (LMO) 6141	PMA	RED	14/4/2025	8022589	=	436
LMO19	LAVALLEJA (LMO) 6141	PMA	RED	7/5/2025	8059964	=	399
LMO19	LAVALLEJA (LMO) 6141	PMA	RED	8/7/2025	8153936	=	438
LMO19	LAVALLEJA (LMO) 6141	PMA	RED	17/10/2025	8291707	=	329
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	20/1/2025	7899904	=	57
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5874	PMA	RED	13/3/2025	7981796	=	57
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	20/5/2025	8060611	=	496
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	18/6/2025	8110562	=	93
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	11/7/2025	8154771	=	70
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	16/9/2025	8242555	=	76
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	19/11/2025	8325117	=	63
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	17/12/2025	8376328	=	34
LMO24	DOELLO 842	PMA	RED	10/1/2025	7899792	=	419
LMO24	DOELLO 842	PMA	RED	10/3/2025	7981264	=	469
LMO24	DOELLO 848	PMA	RED	8/7/2025	8153938	=	427
LMO24	DOELLO 848	PMA	RED	5/9/2025	8242017	=	467
LMO24	DOELLO 848	PMA	RED	7/11/2025	8324380	=	383
LMO26	Barrientos 3119	PMA	RED	10/2/2025	7940304	=	391
LMO26	Barrientos 3137	PMA	RED	14/4/2025	8022592	=	420
LMO26	Barrientos 3137	PMA	RED	28/4/2025	8025186	=	455
LMO26	Barrientos 3137	PMA	RED	11/6/2025	8109733	=	451
LMO26	Barrientos 3119	PMA	RED	11/7/2025	8153487	=	401
LMO26	Barrientos 3137	PMA	RED	9/9/2025	8241725	=	452
LMO26	Barrientos 3137	PMA	RED	13/10/2025	8291521	=	356
LMO26	Barrientos 3137	PMA	RED	7/11/2025	8324055	=	386
LMO34	TOAY 6672	PMA	RED	28/4/2025	8023351	=	556
LMO34	TOAY 6672	PMA	RED	11/6/2025	8110486	=	532
LMO34	TOAY 6672	PMA	RED	21/8/2025	8185556	=	549
LMO34	TOAY 6672	PMA	RED	16/12/2025	8376252	=	447
LMO45	JUAN B JUSTO 6267	PMA	RED	7/2/2025	7940632	=	362
LMO45	JUAN B JUSTO 6239	PMA	RED	14/4/2025	8022593	=	396
LMO45	JUAN B JUSTO 6265	PMA	RED	5/6/2025	8110031	=	454
LMO45	JUAN B JUSTO 6265	PMA	RED	8/7/2025	8153940	=	388
LMO45	JUAN B JUSTO 6239	PMA	RED	14/8/2025	8185025	=	420
LMO45	JUAN B JUSTO 6265	PMA	RED	5/9/2025	8242019	=	418
LMO45	JUAN B JUSTO 6265	PMA	RED	4/11/2025	8324382	=	364
LMO45	JUAN B JUSTO 6265	PMA	RED	16/12/2025	8375905	=	396
LMO46	ACASUSO 5270	PMA	RED	10/1/2025	7899795	=	386
LMO46	ACASUSO 5260	PMA	RED	21/4/2025	8022791	=	417
LMO46	ACASUSO 5260	PMA	RED	8/7/2025	8153941	=	397
LMO46	ACASUSO 5260	PMA	RED	14/8/2025	8185158	=	447
LMO46	ACASUSO 5260	PMA	RED	10/11/2025	8324524	=	377
LMO48	CONDE 5081	PMA	RED	8/1/2025	7899740	=	499
LMO48	CONDE 5019	PMA	RED	18/2/2025	7941174	=	534
LMO48	CONDE 5055	PMA	RED	28/4/2025	8023357	=	556
LMO48	CONDE 5055	PMA	RED	11/6/2025	8110492	=	534
LMO48	CONDE 5055	PMA	RED	13/8/2025	8184411	=	543
LMO48	CONDE 5055	PMA	RED	9/9/2025	8241499	=	543
LMO48	CONDE 5055	PMA	RED	2/10/2025	8290699	=	277
LMO48	CONDE 5055	PMA	RED	4/12/2025	8375271	=	411
LMO51	JUAN B. BUSTOS Y DOELLO,C/	PMA	RED	7/2/2025	7940015	=	382
LMO51	JUAN B. BUSTOS Y DOELLO,C/	PMA	RED	21/5/2025	8059364	=	429
LMO51	JUAN B. BUSTOS Y DOELLO,C/	PMA	RED	24/6/2025	8110336	=	470

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
LMO51	JUAN B. BUSTOS Y DOELLO,C/	PMA	RED	14/8/2025	8185390	=	479
LMO51	JUAN B. BUSTOS Y DOELLO,C/	PMA	RED	7/11/2025	8323768	=	407
LO01	SUIPACHA 480	PMA	RED	16/1/2025	7890719	=	179
LO01	SUIPACHA 480	PMA	RED	17/3/2025	7981727	=	237
LO01	YRIGOYEN HIPOLITO AV 11493	PMA	RED	16/6/2025	8110494	=	468
LO01	YRIGOYEN HIPOLITO AV 11493	PMA	RED	18/8/2025	8185564	=	70
LO01	YRIGOYEN HIPOLITO AV 11493	PMA	RED	16/12/2025	8375723	=	55
LO03	MENDOZA 1144	PMA	RED	6/1/2025	7889911	=	442
LO03	MENDOZA 1144	PMA	RED	9/4/2025	8022470	=	439
LO03	MENDOZA 1144	PMA	RED	9/6/2025	8109965	=	500
LO03	MENDOZA 1144	PMA	RED	3/9/2025	8241952	=	515
LO03	MENDOZA 1144	PMA	RED	3/11/2025	8324299	=	426
LOPC2	RUTA PROVINCIAL 16	PMA	RED	9/1/2025	7890498	=	394
LOPC2	RUTA PROVINCIAL 16	PMA	RED	5/3/2025	7980764	=	406
LOPC2	RUTA PROVINCIAL 16	PMA	RED	4/5/2025	8059378	=	392
LOPC2	RUTA PROVINCIAL 16	PMA	RED	7/8/2025	8184427	=	423
LOPC2	RUTA PROVINCIAL 16	PMA	RED	6/10/2025	8290713	=	305
LOPC2	RUTA PROVINCIAL 16	PMA	RED	4/12/2025	8375285	=	365
MAPC1	FRAY LUIS BELTRÁN Y ALFREI	PMA	RED	10/1/2025	7890234	=	393
MAPC1	FRAY LUIS BELTRÁN Y ALFREI	PMA	RED	21/5/2025	8060109	=	427
MAPC1	FRAY LUIS BELTRÁN Y ALFREI	PMA	RED	14/7/2025	8154140	=	392
MAPC1	FRAY LUIS BELTRÁN 410	PMA	RED	19/11/2025	8324528	=	444
MAPC2	CANADÁ Y LLAVALLOL	PMA	RED	17/2/2025	7940766	=	438
MAPC2	CANADÁ Y LLAVALLOL	PMA	RED	17/6/2025	8110148	=	504
MAPC2	CANADÁ Y LLAVALLOL	PMA	RED	14/8/2025	8185163	=	498
MAPC2	CANADÁ Y LLAVALLOL	PMA	RED	11/12/2025	8375911	=	394
ME02	YAPEYU 1185	PMA	RED	16/1/2025	7890124	=	505
ME02	YAPEYU 1185	PMA	RED	18/6/2025	8110620	=	516
ME02	YAPEYU 1185	PMA	RED	11/11/2025	8324439	=	416
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA	RED	10/1/2025	7889228	=	346
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA	RED	6/5/2025	8059390	=	405
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA	RED	4/8/2025	8184439	=	420
ME-TAN-ARC	CARLOS GARDEL (B° ARCO IR	PMA	RED	17/2/2025	7968668	=	521
ME-TAN-ARC	CARLOS GARDEL (B° ARCO IR	PMA	RED	18/6/2025	8109523	=	516
ME-TAN-ARC	CARLOS GARDEL (B° ARCO IR	PMA	RED	1/9/2025	8241515	=	505
ME-TAN-LON	ESNAOLA 301	PMA	RED	10/3/2025	7980769	=	539
ME-TAN-LON	ESNAOLA 301	PMA	RED	3/7/2025	8153149	=	538
ME-TAN-LON	ESNAOLA 301	PMA	RED	3/11/2025	8323796	=	434
ME-TAN-REC	FILIBERTO 1268	PMA	RED	14/4/2025	8021781	=	511
ME-TAN-REC	FILIBERTO 1268	PMA	RED	4/8/2025	8184442	=	530
ME-TAN-REC	FILIBERTO 1268	PMA	RED	2/12/2025	8375289	=	421
MI_CIS_CEN	CONESA 1418	PMA	RED	2/1/2025	7889232	=	625
MI_CIS_CEN	CONESA 1418	PMA	RED	11/6/2025	8129031	=	551
MI_CIS_CEN	CONESA 1418	PMA	RED	3/9/2025	8241518	=	466
MI_CIS_GUA	J J PASOS 4330	PMA	RED	20/2/2025	7940047	=	447
MI_CIS_GUA	J J PASOS 4330	PMA	RED	5/6/2025	8109527	=	429
MI_CIS_GUA	J J PASOS 4330	PMA	RED	17/9/2025	8241519	=	413
MI_CIS_GUA	J J PASOS 4330	PMA	RED	8/10/2025	8290729	=	325

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
MI_CIS_SAR	REMIGIO LOPEZ 2479	PMA	RED	25/3/2025	7980773	=	408
MI_CIS_SAR	REMIGIO LOPEZ 2479	PMA	RED	15/7/2025	8153153	=	393
MI_CIS_SAR	REMIGIO LOPEZ 2551	PMA	RED	12/11/2025	8323800	=	426
MI01	GELLY OBES 1052	PMA	RED	6/5/2025	8077387	=	482
MI01	GELLY OBES 1052	PMA	RED	16/6/2025	8109529	=	561
MI01	GELLY OBES 1052	PMA	RED	8/10/2025	8290731	=	385
MIPC1	JUAN D PERON 388	PMA	RED	1/4/2025	8021803	=	523
MIPC1	JUAN D PERON 388	PMA	RED	14/8/2025	8184451	=	500
MIPC1	JUAN D PERON 388	PMA	RED	3/12/2025	8375294	=	367
MIPC2	BELGRANO 333	PMA	RED	11/4/2025	8039439	=	409
MIPC2	BELGRANO 333	PMA	RED	6/5/2025	8059402	=	547
MIPC2	BELGRANO 333	PMA	RED	3/9/2025	8241523	=	552
MN15	VENEZUELA 5995	PMA	RED	17/1/2025	7890767	=	53
MN15	VENEZUELA 5995	PMA	RED	14/3/2025	7981737	=	65
MN15	VENEZUELA 5995	PMA	RED	4/6/2025	8109754	=	71
MN15	VENEZUELA 5995	PMA	RED	14/8/2025	8185574	=	451
MN15	VENEZUELA 5995	PMA	RED	14/10/2025	8292243	=	49
MN16	PITA MARIA 2585	PMA	RED	17/1/2025	7890770	=	433
MN16	PITA MARIA 2585	PMA	RED	14/3/2025	7981738	=	458
MN16	PITA MARIA 2585	PMA	RED	21/5/2025	8060528	=	477
MN16	PITA MARIA 2585	PMA	RED	14/8/2025	8185575	=	449
MN16	PITA MARIA 2585	PMA	RED	16/12/2025	8376271	=	413
MN24	BARCENA 3148	PMA	RED	6/1/2025	7899754	=	457
MN24	BARCENA 3148	PMA	RED	11/1/2025	7889829	=	357
MN24	BARCENA 3148	PMA	RED	11/3/2025	7981133	=	438
MN24	BARCENA 3148	PMA	RED	9/5/2025	8059824	=	307
MN24	BARCENA 3148	PMA	RED	3/7/2025	8153531	=	390
MN24	BARCENA 3148	PMA	RED	6/8/2025	8184877	=	448
MN24	BARCENA 3148	PMA	RED	8/10/2025	8291318	=	133
MN24	BARCENA 3148	PMA	RED	7/11/2025	8324231	=	246
MN24	BARCENA 3115	PMA	RED	5/12/2025	8375655	=	73
MN25	BAZURCO 1936	PMA	RED	11/1/2025	7889830	=	442
MN25	BAZURCO 1936	PMA	RED	13/4/2025	8022389	=	426
MN25	BAZURCO 1936	PMA	RED	9/5/2025	8059825	=	458
MN25	BAZURCO 1936	PMA	RED	24/6/2025	8147162	=	492
MN25	BAZURCO 1936	PMA	RED	6/8/2025	8184878	=	476
MN25	BAZURCO 1936	PMA	RED	4/9/2025	8241885	=	436
MN25	BAZURCO 1936	PMA	RED	8/10/2025	8291319	=	307
MN25	BAZURCO 1918	PMA	RED	5/12/2025	8375656	=	398
MO23	PLASS ERNESTO L 3837	PMA	RED	15/1/2025	7904349	=	223
MO23	PLASS ERNESTO L 3837	PMA	RED	6/2/2025	7940694	=	426
MO23	PLASS ERNESTO L 3837	PMA	RED	25/5/2025	8060032	=	491
MO23	PLASS ERNESTO L 3837	PMA	RED	7/7/2025	8154037	=	443
MO23	PLASS ERNESTO L 3837	PMA	RED	11/9/2025	8242064	=	487
MO31	EL JAGUEL 3160	PMA	RED	18/3/2025	7981315	=	497
MO31	EL JAGUEL 3160	PMA	RED	25/5/2025	8060037	=	490
MO31	EL JAGUEL 3158	PMA	RED	7/8/2025	8185093	=	491
MO31	EL JAGUEL 3160	PMA	RED	15/10/2025	8291624	=	352

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
MO31	EL JAGUEL 3160	PMA	RED	3/12/2025	8375842	=	415
MR01	ALMIRANTE BROWN 689	PMA	RED	14/1/2025	7889945	=	472
MR01	ALMIRANTE BROWN 689	PMA	RED	10/5/2025	8059900	=	517
MR01	ALMIRANTE BROWN 689	PMA	RED	1/8/2025	8184955	=	503
MR-CIS-MOR	LINCOLN, Moreno 1623	PMA	RED	14/1/2025	7889476	=	458
MR-CIS-MOR	LINCOLN, Moreno 1623	PMA	RED	4/4/2025	8022037	=	561
MR-CIS-MOR	LINCOLN, Moreno 1623	PMA	RED	11/9/2025	8241650	=	461
MRPC1	O'BARRIO 1195	PMA	RED	13/2/2025	7940561	=	509
MRPC1	O'BARRIO 1195	PMA	RED	3/6/2025	8109974	=	508
MRPC1	O'BARRIO 1195	PMA	RED	1/10/2025	8291442	=	373
MR-TAN-MOR	INT. BOSSI 533	PMA	RED	14/1/2025	7890367	=	534
MR-TAN-MOR	INT. BOSSI 533	PMA	RED	4/6/2025	8110229	=	528
MR-TAN-MOR	INT. BOSSI 533	PMA	RED	1/9/2025	8242218	=	577
MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	PMA	RED	29/1/2025	7904427	=	525
MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	PMA	RED	21/5/2025	8060723	=	536
MR-TAN-PER	RICARDO GUTIERREZ 5600	PMA	RED	2/9/2025	8242668	=	532
MR-TAN-TRU	LA TABLADA 10437	PMA	RED	25/2/2025	7942892	=	460
MR-TAN-TRU	LA TABLADA 10437	PMA	RED	17/6/2025	8110683	=	467
MR-TAN-TRU	LA TABLADA 10437	PMA	RED	2/9/2025	8242669	=	446
PCAB103	DR. L. CHIESA (Acople en vereda a m	PMA	RED	2/3/2025	7980776	=	449
PCAB103	DR. L. CHIESA (Acople en vereda a m	PMA	RED	12/6/2025	8130724	=	437
PCAB103	DR. L. CHIESA (Acople en vereda a m	PMA	RED	21/8/2025	7335495	=	448
PCAB103	DR. L. CHIESA (Acople en vereda a m	PMA	RED	1/9/2025	8241525	=	461
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (De	PMA	RED	3/4/2025	8021843	=	441
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (De	PMA	RED	1/7/2025	8153209	=	469
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (De	PMA	RED	24/9/2025	8256046	=	232
PCEE064	PUAN Y PABLO PIZURNO	PMA	RED	29/3/2025	7981394	=	424
PCEE064	PUAN Y PABLO PIZURNO	PMA	RED	6/8/2025	8185179	=	404
PCEE064	PUAN Y PABLO PIZURNO	PMA	RED	2/12/2025	8375299	=	372
PCES022-24	FONAVI- VEREDA DE TANQUE PABL	PMA	RED	9/1/2025	7890070	=	400
PCES022-24	FONAVI- VEREDA DE TANQUE PABL	PMA	RED	13/6/2025	8110033	=	423
PCES022-24	FONAVI- VEREDA DE TANQUE PABL	PMA	RED	7/10/2025	8291558	=	314
PCFV005	SAN MARTIN 2209	PMA	RED	9/4/2025	8021938	=	541
PCFV005	SAN MARTIN 2209	PMA	RED	3/9/2025	8241581	=	570
PCFV005	SAN MARTIN 2209	PMA	RED	3/11/2025	8323902	=	432
PCFV006	BASUALDO 3616	PMA	RED	24/1/2025	7889844	=	544
PCFV006	BASUALDO 3616	PMA	RED	2/7/2025	8153747	=	602
PCFV006	BASUALDO 3616	PMA	RED	10/10/2025	8291333	=	395
PCFV009	CARIBONI N° 1934	PMA	RED	19/3/2025	7981571	=	414
PCFV009	CARIBONI N° 1934	PMA	RED	11/7/2025	8154432	=	245
PCFV011	MAR CHIQUITA 19	PMA	RED	30/1/2025	7889845	=	517
PCFV011	MAR CHIQUITA 19	PMA	RED	6/5/2025	8059840	=	578
PCFV011	MAR CHIQUITA 19	PMA	RED	17/9/2025	8241900	=	523
PCFV013	AV. PADRE OBISPO J. NOVAK 2498	PMA	RED	6/2/2025	7940501	=	472
PCFV013	AV. PADRE OBISPO J. NOVAK 2498	PMA	RED	8/8/2025	8184894	=	581
PCFV013	AV. PADRE OBISPO J. NOVAK 2498	PMA	RED	3/10/2025	8291335	=	384
PCFV014	JUAN DOMINGO PERON 530	PMA	RED	7/3/2025	7980831	=	545
PCFV014	JUAN DOMINGO PERON 530	PMA	RED	4/8/2025	8184548	=	533

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCFV014	JUAN DOMINGO PERON 530	PMA	RED	2/12/2025	8375356	=	419
PCFV018	GRAL. HORNOS 999	PMA	RED	8/4/2025	8022406	=	493
PCFV018	GRAL. HORNOS 999	PMA	RED	8/8/2025	8184895	=	553
PCFV018	GRAL. HORNOS 999	PMA	RED	6/11/2025	8324249	=	427
PCFV019	RIO CARAGUATA 1452	PMA	RED	25/4/2025	8013251	=	446
PCFV019	RIO CARAGUATA 1452	PMA	RED	21/5/2025	8060347	=	399
PCFV019	RIO CARAGUATA 1452	PMA	RED	7/11/2025	8324765	=	418
PCFV020	EVA PERON 4576	PMA	RED	24/4/2025	8022407	=	491
PCFV020	EVA PERON 4576	PMA	RED	4/6/2025	8109916	=	496
PCFV020	EVA PERON 4576	PMA	RED	2/12/2025	8375674	=	429
PCFV046	BATALLA DE ITUZAINGO 2760	PMA	RED	16/4/2025	8023406	=	522
PCFV046	BATALLA DE ITUZAINGO 2760	PMA	RED	14/8/2025	8185585	=	554
PCFV046	BATALLA DE ITUZAINGO 2760	PMA	RED	15/10/2025	8292254	=	405
PCFV047	MONSERRAT 178	PMA	RED	20/2/2025	7940363	=	527
PCFV047	MONSERRAT 178	PMA	RED	25/4/2025	8022197	=	516
PCFV047	MONSERRAT 178	PMA	RED	28/10/2025	8241772	=	415
PCFV048	LEON XIII 467	PMA	RED	7/3/2025	7981022	=	557
PCFV048	LEON XIII 467	PMA	RED	5/8/2025	8184760	=	582
PCFV048	LEON XIII 467	PMA	RED	2/10/2025	8291136	=	332
PCFV049	CALLE 1023 N° 1323	PMA	RED	17/2/2025	7940783	=	585
PCFV049	CALLE 1023 N° 1323	PMA	RED	7/8/2025	8185180	=	549
PCFV049	CALLE 1023 N° 1323	PMA	RED	19/11/2025	8324547	=	443
PCFV055	CALLE 832 N°339	PMA	RED	14/1/2025	7899911	=	380
PCFV055	CALLE 832 N°339	PMA	RED	10/2/2025	7941277	=	446
PCFV055	CALLE 832 N°339	PMA	RED	11/9/2025	8242562	=	395
PCFV058	ASCASUBI 737	PMA	RED	14/1/2025	7890273	=	456
PCFV058	ASCASUBI 737	PMA	RED	17/3/2025	7981396	=	502
PCFV058	ASCASUBI 737	PMA	RED	10/9/2025	8242150	=	522
PCFV059	O´GORMAN 289	PMA	RED	22/4/2025	8022837	=	463
PCFV059	O´GORMAN 289	PMA	RED	7/8/2025	8185182	=	502
PCFV059	O´GORMAN 289	PMA	RED	14/10/2025	8291760	=	380
PCFV060	DELGADO 4285	PMA	RED	4/2/2025	7940365	=	534
PCFV060	DELGADO 4241	PMA	RED	7/5/2025	8059709	=	538
PCFV060	DELGADO 4241	PMA	RED	28/10/2025	8301187	=	411
PCFV062	CALLE 740 A N° 926	PMA	RED	17/1/2025	7890618	=	335
PCFV062	CALLE 740 A N° 926	PMA	RED	23/6/2025	8110429	=	529
PCFV062	CALLE 740 A N° 926	PMA	RED	5/9/2025	8242422	=	531
PCFV067-70	LA HUELLA 651	PMA	RED	6/5/2025	8060539	=	415
PCFV067-70	LA HUELLA 651	PMA	RED	7/7/2025	8154706	=	383
PCFV067-70	LA HUELLA 651	PMA	RED	4/11/2025	8325042	=	377
PCFV071	CHACO 576	PMA	RED	20/2/2025	7971411	=	505
PCFV071	CHACO 576	PMA	RED	6/8/2025	8185028	=	515
PCFV071	CHACO 576	PMA	RED	3/10/2025	8291559	=	354
PCFV077	PAYSANDÚ CASI RUMANIA 1776	PMA	RED	28/4/2025	8022838	=	450
PCFV077	PAYSANDÚ CASI RUMANIA 1776	PMA	RED	11/9/2025	8242152	=	447
PCFV077	PAYSANDÚ CASI RUMANIA 1776	PMA	RED	25/11/2025	8324550	=	397
PCFV078	BRUSELAS 1692	PMA	RED	28/4/2025	8022641	=	461
PCFV078	BRUSELAS 1692	PMA	RED	6/8/2025	8185029	=	455

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCFV078	BRUSELAS 1692	PMA	RED	9/10/2025	8291560	=	360
PCFV079	BRUSELAS 2281	PMA	RED	3/1/2025	7889371	=	423
PCFV079	BRUSELAS 2281	PMA	RED	9/5/2025	8059492	=	448
PCFV079	BRUSELAS 2281	PMA	RED	3/11/2025	8323904	=	392
PCFV080	CALLE 517 1726	PMA	RED	28/4/2025	8023483	=	664
PCFV080	CALLE 517 1726	PMA	RED	28/10/2025	8292331	=	387
PCFV080	CALLE 517 1726	PMA	RED	17/12/2025	8376338	=	469
PCFV095	PISANI 2165	PMA	RED	17/2/2025	7941112	=	435
PCFV095	PISANI 2165	PMA	RED	2/6/2025	8110430	=	428
PCFV095	PISANI 2165	PMA	RED	5/9/2025	8242423	=	441
PCFV096	CALLE 511 4078	PMA	RED	13/3/2025	7981153	=	558
PCFV096	CALLE 511 4078	PMA	RED	4/6/2025	8109917	=	516
PCFV096	CALLE 511 4078	PMA	RED	12/12/2025	8375676	=	427
PCFV098	TOURING 1561	PMA	RED	22/4/2025	8022839	=	551
PCFV098	TOURING 1561	PMA	RED	10/9/2025	8242153	=	567
PCFV098	TOURING 1561	PMA	RED	19/11/2025	8324551	=	429
PCFV099	MARTINEZ 1280	PMA	RED	18/3/2025	7981751	=	359
PCFV099	MARTINEZ 1280	PMA	RED	26/5/2025	8060541	=	445
PCFV099	MARTINEZ 1280	PMA	RED	19/11/2025	8325044	=	399
PCFV100	J. D. PERON 1536	PMA	RED	4/2/2025	7940366	=	501
PCFV100	J. D. PERON 1536	PMA	RED	3/6/2025	8109783	=	503
PCFV100	J. D. PERON 1536	PMA	RED	1/12/2025	8375547	=	424
PCFV103	SICILIA 2005	PMA	RED	17/2/2025	7941113	=	507
PCFV103	SICILIA 2005	PMA	RED	7/7/2025	8154550	=	464
PCFV103	SICILIA 2005	PMA	RED	9/10/2025	8292107	=	365
PCFV105	CALLE 554 N° 1357	PMA	RED	21/3/2025	7981154	=	528
PCFV105	CALLE 554 N° 1357	PMA	RED	6/6/2025	8109918	=	576
PCFV105	CALLE 554 N° 1357	PMA	RED	8/8/2025	8184898	=	589
PCFV106	CALLE 554 N°1103	PMA	RED	28/4/2025	8023484	=	487
PCFV106	CALLE 554 N°1103	PMA	RED	11/9/2025	8242565	=	485
PCFV106	CALLE 554 N°1103	PMA	RED	18/12/2025	8376339	=	348
PCFV112	PAYSANDU N° 2202	PMA	RED	11/3/2025	7981271	=	446
PCFV112	PAYSANDU N° 2202	PMA	RED	4/7/2025	8153979	=	426
PCFV112	PAYSANDU N° 2202	PMA	RED	4/12/2025	8375798	=	382
PCFV113	AUSTRIA 190	PMA	RED	21/1/2025	7890074	=	474
PCFV113	AUSTRIA 190	PMA	RED	28/4/2025	8022643	=	532
PCFV113	AUSTRIA 190	PMA	RED	14/5/2025	8059973	=	496
PCFV113	AUSTRIA 190	PMA	RED	7/11/2025	8324389	=	424
PCFV114	CALLE 531 N° 2144	PMA	RED	24/2/2025	7974586	=	509
PCFV114	CALLE 531 N° 2144	PMA	RED	2/7/2025	8153754	=	535
PCFV114	CALLE 531 N° 2144	PMA	RED	17/10/2025	8291340	=	404
PCFV115	Cariboni y El progreso.	PMA	RED	19/3/2025	7981809	=	336
PCFV115	Cariboni y El progreso.	PMA	RED	13/8/2025	8185671	=	412
PCFV115	Cariboni y El progreso.	PMA	RED	10/12/2025	8376342	=	337
PCFV117	LOURDES 451	PMA	RED	21/4/2025	8023185	=	435
PCFV117	LOURDES 451	PMA	RED	5/9/2025	8242425	=	479
PCFV117	LOURDES 451	PMA	RED	6/11/2025	8324887	=	382
PCFV118	SANTA LUCIA N° 1016	PMA	RED	12/5/2025	8060132	=	584

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCFV118	SANTA LUCIA N° 1016	PMA	RED	10/9/2025	8242154	=	570
PCFV118	SANTA LUCIA N° 1016	PMA	RED	5/12/2025	8375928	=	411
PCFV122	COPENHAGUE 556	PMA	RED	13/5/2025	8059974	=	473
PCFV122	COPENHAGUE 556	PMA	RED	4/7/2025	8153981	=	495
PCFV122	COPENHAGUE 556	PMA	RED	4/12/2025	8375800	=	347
PCFV123	RIO NEGRO 1698	PMA	RED	6/3/2025	7981025	=	463
PCFV123	RIO NEGRO 1698	PMA	RED	3/6/2025	8109784	=	428
PCFV123	RIO NEGRO 1698	PMA	RED	5/8/2025	8184763	=	464
PCFV125	BATALLA DE CHACABUCO 180	PMA	RED	23/4/2025	8022841	=	540
PCFV125	BATALLA DE CHACABUCO 180	PMA	RED	10/6/2025	8110165	=	452
PCFV125	BATALLA DE CHACABUCO 180	PMA	RED	8/9/2025	8242155	=	572
PCFV126	SAN MARTIN 1955	PMA	RED	8/4/2025	8021941	=	366
PCFV126	SAN MARTIN 1955	PMA	RED	6/6/2025	8109591	=	425
PCFV126	SAN MARTIN 1955	PMA	RED	6/10/2025	8290884	=	264
PCFV128	VILLEGAS 1385	PMA	RED	20/2/2025	7940640	=	448
PCFV128	VILLEGAS 1385	PMA	RED	12/6/2025	8110039	=	395
PCFV128	VILLEGAS 1385	PMA	RED	5/12/2025	8375801	=	402
PCFV131	LA TRANQUERA 1633	PMA	RED	13/2/2025	7940368	=	524
PCFV131	LA TRANQUERA 1633	PMA	RED	3/7/2025	8153555	=	528
PCFV131	LA TRANQUERA 1633	PMA	RED	17/10/2025	8291140	=	417
PCFV137	SAN GERONIMO 650	PMA	RED	22/4/2025	8023490	=	492
PCFV137	SAN GERONIMO 650	PMA	RED	11/7/2025	8154787	=	469
PCFV137	SAN GERONIMO 650	PMA	RED	13/11/2025	8325133	=	432
PCFV138	CAMPANA 2930	PMA	RED	22/5/2025	8060628	=	527
PCFV138	CAMPANA 2930	PMA	RED	11/7/2025	8154788	=	445
PCFV138	CAMPANA 2930	PMA	RED	5/12/2025	8376346	=	422
PCFV139	LA ESMERALDA Y GUAMINI	PMA	RED	17/3/2025	7981402	=	470
PCFV139	LA ESMERALDA Y GUAMINI	PMA	RED	9/6/2025	8110166	=	472
PCFV139	LA ESMERALDA Y GUAMINI	PMA	RED	20/10/2025	8291765	=	361
PCFV140	GRANADEROS DE SAN MARTIN 118	PMA	RED	14/1/2025	7890368	=	516
PCFV140	GRANADEROS DE SAN MARTIN 118	PMA	RED	7/7/2025	8154278	=	494
PCFV140	GRANADEROS DE SAN MARTIN 118	PMA	RED	8/9/2025	8242219	=	552
PCFV148	CALLE 153 A Y CALLE 1112	PMA	RED	18/3/2025	7981464	=	354
PCFV148	CALLE 153 A Y CALLE 1112	PMA	RED	9/6/2025	8110233	=	433
PCFV148	CALLE 153 A Y CALLE 1112	PMA	RED	5/9/2025	8242221	=	441
PCFV153	LIBRES DEL SUD Esq. CALCHAQUI	PMA	RED	20/3/2025	7981752	=	410
PCFV153	LIBRES DEL SUD Esq. CALCHAQUI	PMA	RED	19/6/2025	8110519	=	422
PCFV153	LIBRES DEL SUD Esq. CALCHAQUI	PMA	RED	14/7/2025	8154709	=	418
PCFV153	LIBRES DEL SUD Esq. CALCHAQUI	PMA	RED	15/10/2025	8292258	=	319
PCFV154	CALLE 517 2434	PMA	RED	17/2/2025	7941202	=	538
PCFV154	CALLE 517 2434	PMA	RED	14/7/2025	8154710	=	451
PCFV154	CALLE 517 2434	PMA	RED	10/11/2025	8325046	=	440
PCFV164	CALLE 1155 y DIAG. LOS GUARANÍES	PMA	RED	13/1/2025	7899863	=	407
PCFV164	CALLE 1155 y DIAG. LOS GUARANÍES	PMA	RED	17/6/2025	8110521	=	433
PCFV164	CALLE 1155 y DIAG. LOS GUARANÍES	PMA	RED	10/7/2025	8154711	=	395
PCFV164	CALLE 1155 y DIAG. LOS GUARANÍES	PMA	RED	9/12/2025	8376287	=	381
PCFV165	AV. GDOR. MONTEVERDE 5583	PMA	RED	22/1/2025	7899864	=	519
PCFV165	AV. GDOR. MONTEVERDE 5583	PMA	RED	28/5/2025	8060545	=	557

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCFV165	AV. GDOR. MONTEVERDE 5583	PMA	RED	10/11/2025	8325048	=	423
PCFV183	REMEDIOS DE ESCALADA e/ CARLOS	PMA	RED	10/2/2025	7941206	=	556
PCFV183	REMEDIOS DE ESCALADA e/ CARLOS	PMA	RED	14/8/2025	8185593	=	545
PCFV183	REMEDIOS DE ESCALADA e/ CARLOS	PMA	RED	1/12/2025	8376289	=	501
PCGU025	BALDINI 53	PMA	RED	6/2/2025	7940221	=	387
PCGU025	BALDINI 53	PMA	RED	3/4/2025	8022039	=	418
PCGU025	BALDINI 53	PMA	RED	4/7/2025	8153396	=	415
PCGU025	BALDINI 53	PMA	RED	7/11/2025	8323972	=	361
PCJCP002-5	Wilde 4720	PMA	RED	15/3/2025	7981027	=	439
PCJCP002-5	Wilde 4720	PMA	RED	8/7/2025	8153556	=	414
PCJCP002-5	Wilde 4720	PMA	RED	12/11/2025	8324120	=	375
PCMA009	SAN LORENZO 1355	PMA	RED	10/1/2025	7890280	=	454
PCMA009	SAN LORENZO 1355	PMA	RED	7/3/2025	7981403	=	584
PCMA009	SAN LORENZO 1355	PMA	RED	14/7/2025	8154187	=	517
PCMA009	SAN LORENZO 1355	PMA	RED	12/9/2025	8242158	=	517
PCMA010	USPALLATA 1058	PMA	RED	17/2/2025	7940792	=	501
PCMA010	USPALLATA 1058	PMA	RED	11/4/2025	8022845	=	459
PCMA010	USPALLATA 1058	PMA	RED	14/8/2025	8185190	=	493
PCMA010	USPALLATA 1058	PMA	RED	9/10/2025	8291768	=	385
PCMA011	PASO DE LOS ANDES 1139	PMA	RED	7/3/2025	7981405	=	513
PCMA011	PASO DE LOS ANDES 1115	PMA	RED	21/5/2025	8060138	=	495
PCMA011	PASO DE LOS ANDES 1139	PMA	RED	12/9/2025	8242160	=	409
PCMA011	PASO DE LOS ANDES 1139	PMA	RED	19/11/2025	8324558	=	450
PCMA012	AV. SEGUI 2303	PMA	RED	11/4/2025	8022847	=	497
PCMA012	AV. SEGUI 2303	PMA	RED	17/6/2025	8110170	=	576
PCMA012	AV. SEGUI 2303	PMA	RED	9/10/2025	8291770	=	373
PCMA012	AV. SEGUI 2303	PMA	RED	11/12/2025	8375934	=	428
PCME009	INSP. A. ROSSI Y GRAL. CESAR ETCHE	PMA	RED	6/2/2025	7940871	=	445
PCME009	ETCHEVERRY - EDIF. 38 - B° POLICIAL	PMA	RED	11/6/2025	8110235	=	470
PCME009	ETCHEVERRY - EDIF. 38 - B° POLICIAL	PMA	RED	9/10/2025	8291860	=	353
PCME010	MARIANO ACOSTA esq. RECONQUIS	PMA	RED	13/3/2025	7981467	=	271
PCME010	MARIANO ACOSTA esq. RECONQUIS	PMA	RED	10/7/2025	8154283	=	617
PCME010	MARIANO ACOSTA esq. RECONQUIS	PMA	RED	5/12/2025	8375998	=	311
PCME012-73	SARMIENTO 2433	PMA	RED	14/4/2025	8022939	=	451
PCME012-73	SARMIENTO 2433	PMA	RED	2/7/2025	8154284	=	476
PCME012-73	SARMIENTO 2433	PMA	RED	3/12/2025	8375999	=	396
PCME017	DEFENSA 285	PMA	RED	20/1/2025	7899958	=	468
PCME017	DEFENSA 285	PMA	RED	8/4/2025	8023542	=	471
PCME017	DEFENSA 285	PMA	RED	4/9/2025	8242612	=	505
PCME018	FRIAS 1669	PMA	RED	10/2/2025	7940701	=	574
PCME018	FRIAS 1669	PMA	RED	12/5/2025	8060039	=	577
PCME018	FRIAS 1669	PMA	RED	2/10/2025	8291635	=	334
PCME019	HIPÓLITO YRIGOYEN 784	PMA	RED	13/3/2025	7981318	=	272
PCME019	HIPÓLITO YRIGOYEN 784	PMA	RED	10/7/2025	8154054	=	617
PCME019	HIPÓLITO YRIGOYEN 784	PMA	RED	11/11/2025	8324456	=	299
PCME020	SULLIVAN 416	PMA	RED	13/1/2025	7899959	=	531
PCME020	SULLIVAN 416	PMA	RED	10/2/2025	7942837	=	467
PCME020	SULLIVAN 416	PMA	RED	11/6/2025	8110622	=	503

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCME036	LEANDRO N. ALEM 6095	PMA	RED	14/2/2025	7940073	=	476
PCME036	LEANDRO N. ALEM 6095	PMA	RED	6/5/2025	8059421	=	486
PCME036	LEANDRO N. ALEM 6095	PMA	RED	3/11/2025	8323827	=	407
PCME042	AV. JOSE DE SAN MARTIN 6032	PMA	RED	10/3/2025	7981469	=	506
PCME042	AV. JOSE DE SAN MARTIN 6032	PMA	RED	11/6/2025	8110238	=	518
PCME042	AV. JOSE DE SAN MARTIN 6032	PMA	RED	2/12/2025	8376000	=	417
PCME048	LOS TULIPANES 625	PMA	RED	1/4/2025	8022717	=	461
PCME048	LOS TULIPANES 625	PMA	RED	1/9/2025	8242073	=	462
PCME048	LOS TULIPANES 625	PMA	RED	2/12/2025	8375847	=	398
PCME050	MISTRAL 3665	PMA	RED	1/4/2025	8023544	=	566
PCME050	ECHEVERRI Y CHAPERRAUGE	PMA	RED	5/8/2025	8185719	=	587
PCME050	MISTRAL 3665	PMA	RED	12/12/2025	8376388	=	439
PCME055	PUEYRREDON 1499	PMA	RED	12/5/2025	8060671	=	558
PCME055	PUEYRREDON 1499	PMA	RED	4/9/2025	8242615	=	570
PCME055	PUEYRREDON 1499	PMA	RED	12/12/2025	8376389	=	426
PCME056	SAN ANTONIO 785	PMA	RED	13/1/2025	7890150	=	571
PCME056	SAN ANTONIO 785	PMA	RED	22/5/2025	8060042	=	606
PCME056	SAN ANTONIO 785	PMA	RED	9/10/2025	8291638	=	397
PCME057	NOGUERA 256	PMA	RED	20/1/2025	7899962	=	527
PCME057	NOGUERA 256	PMA	RED	10/6/2025	8110625	=	535
PCME057	NOGUERA 256	PMA	RED	2/10/2025	8292394	=	362
PCME059	GABRIELA MISTRAL 1535	PMA	RED	13/2/2025	7940074	=	462
PCME059	GABRIELA MISTRAL 1535	PMA	RED	11/6/2025	8109536	=	470
PCME059	GABRIELA MISTRAL 1535	PMA	RED	14/11/2025	8323828	=	399
PCME061	SAENZ PEÑA 181	PMA	RED	20/1/2025	7899963	=	502
PCME061	R. SAENZ PEÑA 183	PMA	RED	2/7/2025	8154843	=	575
PCME061	R. SAENZ PEÑA 183	PMA	RED	5/11/2025	8325179	=	434
PCME065	ENTRE RIOS 400	PMA	RED	15/1/2025	7890151	=	497
PCME065	ENTRE RIOS 400	PMA	RED	12/5/2025	8060043	=	522
PCME065	ENTRE RIOS 400	PMA	RED	5/11/2025	8324459	=	422
PCME066	SOLANET 54	PMA	RED	6/2/2025	7940706	=	536
PCME066	SOLANET 54	PMA	RED	8/7/2025	8154058	=	506
PCME066	SOLANET 54	PMA	RED	9/10/2025	8291640	=	412
PCME067	TRAFUL 1836	PMA	RED	16/1/2025	7889292	=	451
PCME067	TRAFUL 1836	PMA	RED	8/7/2025	8153212	=	435
PCME067	TRAFUL 1836	PMA	RED	14/10/2025	8290789	=	372
PCME069	ATAHUALPA 1736	PMA	RED	20/1/2025	7890153	=	429
PCME069	ATAHUALPA 1744	PMA	RED	17/3/2025	7981323	=	422
PCME069	ATAHUALPA 1744	PMA	RED	5/8/2025	8185101	=	412
PCME070	TUCUMAN 1246	PMA	RED	7/3/2025	7981324	=	558
PCME070	TUCUMAN 1246	PMA	RED	6/8/2025	8185102	=	556
PCME070	TUCUMAN 1246	PMA	RED	3/11/2025	8324462	=	424
PCME074	CORDOBA 369	PMA	RED	10/2/2025	7940076	=	505
PCME074	CORDOBA 369	PMA	RED	6/8/2025	8184475	=	552
PCME074	CORDOBA 369	PMA	RED	3/11/2025	8323830	=	420
PCME075	NAVARRO 684	PMA	RED	13/3/2025	7981470	=	512
PCME075	NAVARRO 684	PMA	RED	14/8/2025	8185270	=	542
PCME075	NAVARRO 684	PMA	RED	11/11/2025	8324639	=	439

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCME078	BELGRANO 1635	PMA	RED	19/2/2025	7942842	=	588
PCME078	BELGRANO 1635	PMA	RED	10/7/2025	8154844	=	558
PCME078	BELGRANO 1635	PMA	RED	10/9/2025	8242618	=	528
PCME080	MATORRAS 3213	PMA	RED	10/3/2025	7981858	=	504
PCME080	MATORRAS 3213	PMA	RED	26/3/2025	8013252	=	498
PCME080	MATORRAS 3213	PMA	RED	11/6/2025	8110628	=	536
PCME080	MATORRAS 3213	PMA	RED	4/8/2025	8185724	=	489
PCME080	MATORRAS 3213	PMA	RED	2/12/2025	8376393	=	420
PCME081	BACH 2989	PMA	RED	1/4/2025	8023550	=	527
PCME081	BACH 2989	PMA	RED	3/7/2025	8154846	=	551
PCME081	BACH 2989	PMA	RED	8/10/2025	8292398	=	357
PCME089	ARISTÓBULO DEL VALLE 4692	PMA	RED	10/3/2025	7981860	=	450
PCME089	ARISTÓBULO DEL VALLE 4692	PMA	RED	9/9/2025	8242228	=	424
PCME089	ARISTÓBULO DEL VALLE 4692	PMA	RED	14/11/2025	8324463	=	341
PCME093	Morse 390	PMA	RED	6/2/2025	7940078	=	541
PCME093	Morse 390	PMA	RED	12/5/2025	8060048	=	548
PCME093	Morse 390	PMA	RED	2/10/2025	8292400	=	385
PCME094	RECONQUISTA 1978	PMA	RED	12/4/2025	8023553	=	602
PCME094	RECONQUISTA 1978	PMA	RED	11/6/2025	8110632	=	624
PCME094	RECONQUISTA 1978	PMA	RED	9/10/2025	8292401	=	406
PCME095	SANTIAGO DEL ESTERO 882	PMA	RED	13/1/2025	7890158	=	467
PCME095	SANTIAGO DEL ESTERO 882	PMA	RED	22/5/2025	8060050	=	464
PCME095	SANTIAGO DEL ESTERO 882	PMA	RED	10/9/2025	8242231	=	487
PCME101	RICARDO ALFONSÍN 1163	PMA	RED	8/4/2025	8023555	=	517
PCME101	RICARDO ALFONSÍN 1163	PMA	RED	6/8/2025	8185730	=	560
PCME101	RICARDO ALFONSÍN 1163	PMA	RED	3/12/2025	8376006	=	422
PCME103	RAWSON 2350	PMA	RED	13/2/2025	7940082	=	561
PCME103	RAWSON 2350	PMA	RED	18/6/2025	8109539	=	564
PCME103	RAWSON 2350	PMA	RED	9/10/2025	8290791	=	394
PCME113	ZAPIOLA 567	PMA	RED	17/3/2025	7981865	=	456
PCME113	ZAPIOLA 567	PMA	RED	8/7/2025	8154066	=	434
PCME113	ZAPIOLA 567	PMA	RED	9/10/2025	8292404	=	379
PCMI002	JULIO ROCA 822	PMA	RED	12/2/2025	7940084	=	496
PCMI002	JULIO ROCA 822	PMA	RED	18/6/2025	8109540	=	518
PCMI002	JULIO ROCA 822	PMA	RED	6/10/2025	8290792	=	405
PCMI003	SARMIENTO 1280	PMA	RED	4/3/2025	7980784	=	555
PCMI003	SARMIENTO 1280	PMA	RED	14/7/2025	8153216	=	538
PCMI003	SARMIENTO 1280	PMA	RED	17/11/2025	8323833	=	460
PCMI006	SAN LUIS 18	PMA	RED	1/4/2025	8021852	=	550
PCMI006	SAN LUIS 18	PMA	RED	14/8/2025	8184479	=	564
PCMI006	SAN LUIS 18	PMA	RED	3/12/2025	8375308	=	419
PCMI007	GELLY OBES 1928	PMA	RED	2/1/2025	7889297	=	583
PCMI007	GELLY OBES 1928	PMA	RED	20/5/2025	8059429	=	470
PCMI007	GELLY OBES 1928	PMA	RED	3/9/2025	8241535	=	516
PCMI008	GELLY OBES 965	PMA	RED	8/2/2025	7940088	=	538
PCMI008	GELLY OBES 901	PMA	RED	16/6/2025	8109544	=	572
PCMI008	GELLY OBES 901	PMA	RED	8/10/2025	8290796	=	369
PCMI009	CONESA 755	PMA	RED	4/3/2025	7981028	=	529

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCMI009	CONESA 755	PMA	RED	8/7/2025	8153557	=	463
PCMI009	CONESA 755	PMA	RED	17/11/2025	8324121	=	419
PCMI010	TRIBULATO 868	PMA	RED	1/4/2025	8022205	=	547
PCMI010	TRIBULATO 868	PMA	RED	5/8/2025	8184767	=	506
PCMI010	TRIBULATO 868	PMA	RED	3/12/2025	8375552	=	423
PCMI011	IRIGOIN 859	PMA	RED	14/1/2025	7889645	=	514
PCMI011	IRIGOIN 859	PMA	RED	6/5/2025	8059716	=	545
PCMI011	IRIGOIN 859	PMA	RED	17/9/2025	8241781	=	498
PCMI013	ALBERDI 36	PMA	RED	14/2/2025	7940373	=	474
PCMI013	ALBERDI 36	PMA	RED	19/6/2025	8109790	=	127
PCMI013	ALBERDI 36	PMA	RED	6/10/2025	8291145	=	323
PCMI015	IRIGOIN 1494	PMA	RED	14/3/2025	7981032	=	481
PCMI015	IRIGOIN 1494	PMA	RED	14/7/2025	8153561	=	487
PCMI015	IRIGOIN 1494	PMA	RED	13/11/2025	8324125	=	437
PCMI016	SALERNO 1431	PMA	RED	1/4/2025	8022209	=	491
PCMI016	SALERNO 1431	PMA	RED	5/8/2025	8184771	=	517
PCMI016	SALERNO 1481	PMA	RED	3/12/2025	8375556	=	409
PCMI017	VICENTE LOPEZ 2237	PMA	RED	14/1/2025	7889649	=	499
PCMI017	VICENTE LOPEZ 2237	PMA	RED	6/5/2025	8059720	=	469
PCMI017	VICENTE LOPEZ 2237	PMA	RED	17/9/2025	8241785	=	425
PCMI021	TRIBULATO 2387	PMA	RED	8/2/2025	7940377	=	520
PCMI021	TRIBULATO 2387	PMA	RED	16/6/2025	8109794	=	560
PCMI021	TRIBULATO 2387	PMA	RED	8/10/2025	8291149	=	369
PCMI033	IRIGOIN 1926	PMA	RED	12/3/2025	7981036	=	504
PCMI033	IRIGOIN 1926	PMA	RED	14/7/2025	8153565	=	477
PCMI033	IRIGOIN 1926	PMA	RED	17/11/2025	8324129	=	416
PCMI036	ALEM 3124, SAN MIGUEL	PMA	RED	1/4/2025	8022213	=	509
PCMI036	ALEM 3124, SAN MIGUEL	PMA	RED	5/8/2025	8184775	=	512
PCMI036	ALEM 3124, SAN MIGUEL	PMA	RED	3/12/2025	8375560	=	412
PCMI038	ALEM 1976, SAN MIGUEL	PMA	RED	14/1/2025	7890284	=	518
PCMI038	ALEM 1976, SAN MIGUEL	PMA	RED	6/5/2025	8060140	=	505
PCMI038	ALEM 1976, SAN MIGUEL	PMA	RED	17/9/2025	8242162	=	489
PCMI039	GELLY OBES 1588, SAN MIGUEL	PMA	RED	8/2/2025	7940796	=	513
PCMI039	GELLY OBES 1588, SAN MIGUEL	PMA	RED	16/6/2025	8110172	=	498
PCMI039	GELLY OBES 1588, SAN MIGUEL	PMA	RED	8/10/2025	8291772	=	356
PCMI040	ITALIA 2381	PMA	RED	7/4/2025	8022850	=	466
PCMI040	ITALIA 2381	PMA	RED	8/7/2025	8154193	=	440
PCMI040	ITALIA 2381	PMA	RED	20/11/2025	8324562	=	433
PCMI041	BELGRANO 859, SAN MIGUEL	PMA	RED	1/4/2025	8022851	=	530
PCMI041	BELGRANO 859, SAN MIGUEL	PMA	RED	5/8/2025	8185196	=	576
PCMI041	BELGRANO 859, SAN MIGUEL	PMA	RED	3/12/2025	8375938	=	410
PCMI042	PARDO 141	PMA	RED	14/1/2025	7890288	=	415
PCMI042	PARDO 141	PMA	RED	6/5/2025	8060144	=	486
PCMI042	PARDO 141	PMA	RED	3/9/2025	8242166	=	500
PCMI043	SAN JOSE 429	PMA	RED	14/2/2025	7940800	=	544
PCMI043	SAN JOSE 429	PMA	RED	19/6/2025	8110176	=	529
PCMI043	SAN JOSE 429	PMA	RED	6/10/2025	8291776	=	284
PCMI052	BALBIN 4811, SAN MIGUEL	PMA	RED	20/3/2025	7981413	=	457

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCMI052	BALBIN 4811, SAN MIGUEL	PMA	RED	14/7/2025	8154197	=	432
PCMI052	BALBIN 4811, SAN MIGUEL	PMA	RED	20/11/2025	8324566	=	445
PCMI053	BALBIN 4255, SAN MIGUEL	PMA	RED	19/4/2025	8023415	=	440
PCMI053	BALBIN 4255, SAN MIGUEL	PMA	RED	18/8/2025	8185594	=	423
PCMI053	BALBIN 4255, SAN MIGUEL	PMA	RED	12/12/2025	8376290	=	419
PCMI055	PASO 5251, SAN MIGUEL	PMA	RED	20/2/2025	7941208	=	463
PCMI055	PASO 5251, SAN MIGUEL	PMA	RED	5/6/2025	8110525	=	438
PCMI055	PASO 5251, SAN MIGUEL	PMA	RED	8/10/2025	8292264	=	401
PCMI055	PASO 5251, SAN MIGUEL	PMA	RED	12/11/2025	8325051	=	421
PCMI056	JUAN JOSE PASO 4825	PMA	RED	20/3/2025	7981759	=	536
PCMI056	JUAN JOSE PASO 4825	PMA	RED	14/7/2025	8154714	=	414
PCMI056	JUAN JOSE PASO 4825	PMA	RED	12/11/2025	8325052	=	418
PCMI057	ALBARRACIN 1360	PMA	RED	19/4/2025	8023418	=	538
PCMI057	ALBARRACIN 1360	PMA	RED	18/8/2025	8185597	=	523
PCMI057	ALBARRACIN 1360	PMA	RED	12/12/2025	8376293	=	446
PCMI058	Aguero 2030	PMA	RED	2/1/2025	7899870	=	525
PCMI058	Aguero 2030	PMA	RED	20/5/2025	8060551	=	479
PCMI058	Aguero 2030	PMA	RED	3/9/2025	8242520	=	520
PCMI059	TRIBULATO 1784	PMA	RED	8/2/2025	7941212	=	472
PCMI059	TRIBULATO 1784	PMA	RED	16/6/2025	8110529	=	492
PCMI059	TRIBULATO 1784	PMA	RED	8/10/2025	8292268	=	341
PCMI061	PRIMERA JUNTA 4727	PMA	RED	19/4/2025	8023421	=	367
PCMI061	PRIMERA JUNTA 4727	PMA	RED	8/7/2025	8154718	=	440
PCMI061	PRIMERA JUNTA 4727	PMA	RED	12/11/2025	8325056	=	404
PCMI062	ARGÜERO 5354	PMA	RED	2/1/2025	7899873	=	506
PCMI062	ARGÜERO 5354	PMA	RED	23/5/2025	8060554	=	490
PCMI062	ARGÜERO 5354	PMA	RED	17/9/2025	8242523	=	453
PCMR001	J. V. GONZÁLEZ 2567	PMA	RED	6/3/2025	7981929	=	469
PCMR001	J. V. GONZÁLEZ 2617	PMA	RED	3/7/2025	8154910	=	523
PCMR001	J. V. GONZÁLEZ 2567	PMA	RED	1/11/2025	8325243	=	402
PCMR002	J. V. GONZALEZ 2435	PMA	RED	16/4/2025	8023620	=	461
PCMR002	J. V. GONZALEZ 2435	PMA	RED	22/8/2025	8185793	=	506
PCMR002	J. V. GONZALEZ 2435	PMA	RED	1/12/2025	8376458	=	429
PCMR003	GüEMES 896	PMA	RED	16/4/2025	8023621	=	482
PCMR003	GüEMES 896	PMA	RED	22/8/2025	8185794	=	502
PCMR003	GüEMES 896	PMA	RED	1/12/2025	8376459	=	431
PCMR011	PADRE ANSALDO 1116	PMA	RED	18/3/2025	7981471	=	554
PCMR011	PADRE ANSALDO 1116	PMA	RED	1/7/2025	8154288	=	602
PCMR011	PADRE ANSALDO 1116	PMA	RED	19/11/2025	8324640	=	440
PCMR013	BVARD PTE. PERON 2027	PMA	RED	9/4/2025	8022943	=	500
PCMR013	BVARD PTE. PERON 2027	PMA	RED	2/8/2025	8185272	=	527
PCMR013	BVARD PTE. PERON 2027	PMA	RED	16/12/2025	8376009	=	442
PCMR014	ALCORTA 2509	PMA	RED	11/3/2025	7981211	=	561
PCMR014	ALCORTA 2509	PMA	RED	3/7/2025	8153861	=	574
PCMR014	ALCORTA 2509	PMA	RED	8/10/2025	8291443	=	405
PCMR015	CENTENARIO 596	PMA	RED	2/1/2025	7889480	=	633
PCMR015	CENTENARIO 596	PMA	RED	3/6/2025	8109660	=	569
PCMR015	CENTENARIO 596	PMA	RED	1/10/2025	8290982	=	456

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCMR016	CORRIENTES 27	PMA	RED	10/2/2025	7940223	=	518
PCMR016	CORRIENTES 27	PMA	RED	10/5/2025	8059562	=	556
PCMR016	CORRIENTES 27	PMA	RED	8/10/2025	8290983	=	396
PCMR017	ALCORTA 1558	PMA	RED	9/4/2025	8022042	=	509
PCMR017	ALCORTA 1558	PMA	RED	2/9/2025	8241655	=	573
PCMR017	ALCORTA 1558	PMA	RED	1/11/2025	8323975	=	418
PCMR018	MISIONES 447	PMA	RED	10/5/2025	8059564	=	612
PCMR018	MISIONES 1365	PMA	RED	3/7/2025	8153400	=	616
PCMR018	MISIONES 447	PMA	RED	8/10/2025	8290985	=	416
PCMR022-23	SANCHEZ 4949	PMA	RED	16/4/2025	8022514	=	432
PCMR022-23	SANCHEZ 4949	PMA	RED	26/8/2025	8184959	=	505
PCMR022-23	SANCHEZ 4949	PMA	RED	10/12/2025	8375735	=	429
PCMR028	MÉXICO 384	PMA	RED	29/1/2025	7904675	=	523
PCMR028	MÉXICO 384	PMA	RED	21/5/2025	8059565	=	525
PCMR028	MÉXICO 384	PMA	RED	1/8/2025	8184622	=	541
PCMR036	PASAPONTI 2108	PMA	RED	6/3/2025	7981932	=	446
PCMR036	PASAPONTI 2108	PMA	RED	2/6/2025	8110699	=	476
PCMR036	PASAPONTI 2108	PMA	RED	3/9/2025	8242685	=	495
PCMR037	F. RIVERA 532	PMA	RED	19/3/2025	7981933	=	465
PCMR037	F. RIVERA 532	PMA	RED	4/7/2025	8154914	=	437
PCMR037	F. RIVERA 532	PMA	RED	12/11/2025	8325247	=	415
PCMR040	PIOVANO 4114	PMA	RED	2/1/2025	7890379	=	594
PCMR040	PIOVANO 4114	PMA	RED	5/5/2025	8060223	=	506
PCMR040	PIOVANO 4114	PMA	RED	2/9/2025	8242236	=	521
PCMR041	DORREGO 1977	PMA	RED	4/4/2025	8022046	=	540
PCMR041	DORREGO 1977	PMA	RED	5/6/2025	8109665	=	537
PCMR041	DORREGO 1977	PMA	RED	8/10/2025	8290987	=	376
PCMR042	1° de MAYO 17	PMA	RED	7/2/2025	7940228	=	485
PCMR042	1° de MAYO 17	PMA	RED	3/7/2025	8153403	=	592
PCMR042	1° de MAYO 17	PMA	RED	1/11/2025	8323979	=	417
PCMR043	SAN PABLO - CASA 1 61	PMA	RED	25/2/2025	7940879	=	479
PCMR043	SAN CAYETANO 374	PMA	RED	25/3/2025	8001128	=	486
PCMR043	SAN CAYETANO 374	PMA	RED	17/6/2025	8110243	=	473
PCMR043	SAN CAYETANO 374	PMA	RED	12/11/2025	8324643	=	411
PCMR044	EL SALVADOR, Moreno 2282	PMA	RED	6/3/2025	7981475	=	539
PCMR044	EL SALVADOR, Moreno 2282	PMA	RED	7/7/2025	8154292	=	520
PCMR044	EL SALVADOR, Moreno 2282	PMA	RED	1/12/2025	8376012	=	440
PCMR049	SARRATEA 358	PMA	RED	6/3/2025	7981476	=	543
PCMR049	SARRATEA 350	PMA	RED	3/7/2025	8154293	=	558
PCMR049	SARRATEA 358	PMA	RED	1/11/2025	8324645	=	427
PCMR050	MARCOS PAZ , Moreno 1123	PMA	RED	7/2/2025	7940229	=	498
PCMR050	MARCOS PAZ , Moreno 1123	PMA	RED	1/7/2025	8153404	=	618
PCMR050	MARCOS PAZ , Moreno 1123	PMA	RED	1/11/2025	8323980	=	424
PCMR052	CONCORDIA 1617	PMA	RED	13/2/2025	7940230	=	513
PCMR052	CONCORDIA 1617	PMA	RED	8/8/2025	8184626	=	539
PCMR052	CONCORDIA 1617	PMA	RED	1/12/2025	8375433	=	411
PCMR065	PASSAPONTI 1321	PMA	RED	15/5/2025	8059570	=	489
PCMR065	PASSAPONTI 1321	PMA	RED	1/8/2025	8184627	=	482

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCMR067-68	JOSE ING. MZ 33 CASA 23	PMA	RED	21/4/2025	8023624	=	477
PCMR067-68	JOSE ING. MZ 33 CASA 23	PMA	RED	26/8/2025	8185797	=	502
PCMR067-68	JOSE ING. MZ 33 CASA 23	PMA	RED	10/12/2025	8376462	=	420
PCMR069	DEMOCRACIA 1566	PMA	RED	7/2/2025	7940564	=	396
PCMR069	DEMOCRACIA 1566	PMA	RED	15/5/2025	8059904	=	480
PCMR069	DEMOCRACIA 1566	PMA	RED	12/11/2025	8324311	=	390
PCMR071	Galvez 7038	PMA	RED	19/3/2025	7981214	=	577
PCMR071	Galvez 7038	PMA	RED	2/6/2025	8109979	=	577
PCMR071	Galvez 7038	PMA	RED	19/12/2025	8397905	=	347
PCMR074	PASSAPONTI Y ECUADOR	PMA	RED	7/2/2025	7940566	=	467
PCMR074	PASSAPONTI Y ECUADOR	PMA	RED	15/5/2025	8059906	=	550
PCMR074	PASSAPONTI Y ECUADOR	PMA	RED	14/10/2025	8291447	=	412
PCMR076	YRIGOYEN HIPÓLITO 2670	PMA	RED	11/3/2025	7981216	=	531
PCMR076	YRIGOYEN HIPÓLITO 2670	PMA	RED	2/8/2025	8184963	=	519
PCMR076	YRIGOYEN HIPÓLITO 2670	PMA	RED	16/12/2025	8375739	=	433
PCMR077	ZEBALLOS 512	PMA	RED	3/6/2025	8109982	=	554
PCMR077	ZEBALLOS 512	PMA	RED	7/10/2025	8291449	=	387
PCMR078	MANUEL ALBERTI 2649	PMA	RED	9/4/2025	8022520	=	494
PCMR078	MANUEL ALBERTI 2649	PMA	RED	2/9/2025	8241969	=	497
PCMR078	MANUEL ALBERTI 2649	PMA	RED	16/12/2025	8375741	=	442
PCMR079	SAN LORENZO (rotonda) 553	PMA	RED	23/4/2025	8021855	=	459
PCMR079	SAN LORENZO (rotonda) 553	PMA	RED	26/8/2025	8184966	=	513
PCMR079	SAN LORENZO (rotonda) 553	PMA	RED	10/12/2025	8375742	=	432
PCMR088	LOBOS 1150	PMA	RED	14/1/2025	7889962	=	455
PCMR088	LOBOS 1150	PMA	RED	10/5/2025	8059910	=	491
PCMR088	LOBOS 1150	PMA	RED	1/9/2025	8241971	=	531
PCMR089	PAVON 1768	PMA	RED	14/1/2025	7889963	=	494
PCMR089	PAVON 1768	PMA	RED	4/6/2025	8109985	=	487
PCMR089	PAVON 1768	PMA	RED	1/10/2025	8291453	=	472
PCMR093	JOSÉ INGENIEROS 1120	PMA	RED	13/2/2025	7940573	=	488
PCMR093	JOSÉ INGENIEROS 1120	PMA	RED	1/7/2025	8153872	=	505
PCMR093	JOSÉ INGENIEROS 1120	PMA	RED	7/11/2025	8324320	=	401
PCMR098	PASTEUR DR. LUIS L 1644	PMA	RED	12/6/2025	8120863	=	481
PCMR098	PASTEUR DR. LUIS L 1644	PMA	RED	1/9/2025	8241974	=	484
PCMR098	PASTEUR DR. LUIS L 1644	PMA	RED	1/11/2025	8324321	=	412
PCPI001	JUAN B. JUSTO 145	PMA	RED	4/1/2025	7889489	=	436
PCPI001	Gimnasio en la calle SANGUINETTI 5	PMA	RED	7/7/2025	8153407	=	432
PCPI001	Gimnasio en la calle SANGUINETTI 5	PMA	RED	3/10/2025	8290992	=	315
PCPI002	VIVIENDA EN POSADAS 473	PMA	RED	7/2/2025	7940233	=	390
PCPI002	VIVIENDA EN POSADAS 473	PMA	RED	7/5/2025	8059572	=	419
PCPI002	VIVIENDA EN POSADAS 473	PMA	RED	4/9/2025	8241664	=	446
PCPI003	AV. TRATADO DE PILAR 240	PMA	RED	11/3/2025	7980914	=	489
PCPI003	AV. TRATADO DE PILAR 240	PMA	RED	7/5/2025	8059573	=	479
PCPI003	AV. TRATADO DE PILAR 240	PMA	RED	3/10/2025	8290994	=	290
PCPI004	PEDRO LAGRAVE 57	PMA	RED	3/4/2025	8022054	=	543
PCPI004	PEDRO LAGRAVE 57	PMA	RED	4/9/2025	8241666	=	42
PCPI004	PEDRO LAGRAVE 57	PMA	RED	7/11/2025	8323986	=	420
PCPI005	PLANTA CHAMPAGNAT	PMA	RED	7/5/2025	8059575	=	524

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCPI005	PLANTA CHAMPAGNAT	PMA	RED	6/8/2025	8184632	=	480
PCPI005	PLANTA CHAMPAGNAT	PMA	RED	4/12/2025	8375439	=	418
PCPI006	RINCON E/ SAN MARTIN Y ESTABAN	PMA	RED	4/1/2025	7889494	=	492
PCPI006	RINCON E/ SAN MARTIN Y ESTABAN	PMA	RED	10/6/2025	8109675	=	522
PCPI006	RINCON E/ SAN MARTIN Y ESTABAN	PMA	RED	4/12/2025	8375440	=	418
PCPI007	JOSE MARIA PAZ, CASI ESQ. RUTO 8	PMA	RED	11/3/2025	7980918	=	512
PCPI007	JOSE MARIA PAZ, CASI ESQ. RUTO 8	PMA	RED	10/6/2025	8109676	=	458
PCPI008	ITUZAINGO 353	PMA	RED	5/4/2025	8022058	=	537
PCPI008	ITUZAINGO 353	PMA	RED	7/7/2025	8153414	=	490
PCPI009	PREDIO MUNICIPAL S/ CALLE MAIPU	PMA	RED	13/1/2025	7889699	=	422
PCPI009	PREDIO MUNICIPAL S/ CALLE MAIPU	PMA	RED	7/7/2025	8153608	=	422
PCPI009	PREDIO MUNICIPAL S/ CALLE MAIPU	PMA	RED	8/9/2025	8241803	=	480
PCPI010	Vivienda en Bergantín Congreso 178	PMA	RED	13/1/2025	7889700	=	443
PCPI010	Vivienda en Bergantín Congreso 178	PMA	RED	12/5/2025	8059745	=	464
PCPI010	Vivienda en Bergantín Congreso 178	PMA	RED	8/8/2025	8184797	=	488
PCPI011	Moreno 700 700	PMA	RED	7/2/2025	7940402	=	454
PCPI011	Moreno 700 700	PMA	RED	7/7/2025	8153610	=	447
PCPI011	Moreno 700 700	PMA	RED	2/10/2025	8291195	=	305
PCPI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambro	PMA	RED	12/2/2025	7940709	=	405
PCPI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambro	PMA	RED	12/4/2025	8022723	=	383
PCPI012	Colectora R8 e/Los Narcisos y Ambro	PMA	RED	8/8/2025	8185103	=	455
PCPI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Map	PMA	RED	13/1/2025	7890162	=	427
PCPI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Map	PMA	RED	19/3/2025	7981326	=	452
PCPI013	Colectora Oeste y Pres. Derqui. (Map	PMA	RED	15/9/2025	8242080	=	387
PCPI016	Centro de Salud Monterrey sobre ca	PMA	RED	16/1/2025	7890516	=	441
PCPI016	Centro de Salud Monterrey sobre ca	PMA	RED	12/5/2025	8060349	=	470
PCPI016	Centro de Salud Monterrey sobre ca	PMA	RED	6/8/2025	8185396	=	479
PCPI017	Panamericana Ramal Pilar km 38.5	PMA	RED	8/1/2025	7890623	=	399
PCPI017	Panamericana Ramal Pilar km 38.5	PMA	RED	24/6/2025	8110434	=	440
PCPI017	Panamericana Ramal Pilar km 38.5	PMA	RED	13/10/2025	8292110	=	344
PCPI017	Panamericana Ramal Pilar km 38.5	PMA	RED	26/11/2025	8324893	=	392
PCPI018	Lote 56	PMA	RED	19/2/2025	7941117	=	424
PCPI018	Lote 56	PMA	RED	4/9/2025	8242428	=	431
PCPI018	Lote 56	PMA	RED	16/12/2025	8376202	=	381
PCPI020	Lote 107	PMA	RED	9/4/2025	8023189	=	415
PCPI020	Lote 107	PMA	RED	15/7/2025	8154555	=	422
PCPI020	Lote 107	PMA	RED	26/11/2025	8324900	=	403
PCPI021	Lote 322	PMA	RED	9/4/2025	8023190	=	398
PCPI021	Lote 322	PMA	RED	15/7/2025	8154556	=	414
PCPI021	Lote 322	PMA	RED	13/10/2025	8292113	=	336
PCPI022	Canilla de Servicio Porteria H Park	PMA	RED	9/4/2025	8039440	=	394
PCPI022	LAS CAMPANILLAS 1057	PMA	RED	22/5/2025	8060461	=	407
PCPI022	Canilla de Servicio Porteria H Park	PMA	RED	2/9/2025	8242431	=	451
PCPI025	Country El Carmel	PMA	RED	7/2/2025	7940240	=	387
PCPI025	Country El Carmel	PMA	RED	6/8/2025	8184636	=	449
PCPI025	Country El Carmel	PMA	RED	2/10/2025	8291000	=	252
PCPI026	Ayres del Pilar	PMA	RED	15/1/2025	7890517	=	414
PCPI026	Ayres del Pilar	PMA	RED	19/3/2025	7981575	=	422

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCPI026	Ayres del Pilar	PMA	RED	8/8/2025	8185676	=	458
PCPI035	Ayres del Pilar	PMA	RED	21/2/2025	7941008	=	420
PCPI035	Ayres del Pilar	PMA	RED	8/7/2025	8154791	=	404
PCPI035	Ayres del Pilar	PMA	RED	24/9/2025	8242574	=	402
PCPI037	La Lomada lote 480	PMA	RED	19/3/2025	7981814	=	423
PCPI037	La Lomada lote 480	PMA	RED	8/8/2025	8185397	=	459
PCPI037	La Lomada lote 480	PMA	RED	21/10/2025	8292342	=	335
PCPI040	Las Margaritas 1130	PMA	RED	28/4/2025	8023495	=	537
PCPI040	Las Margaritas 1130	PMA	RED	24/9/2025	8242576	=	408
PCPI040	Las Margaritas 1130	PMA	RED	14/11/2025	8325138	=	429
PCPI041	l "Oxipilar" Las Glicinas 1282	PMA	RED	12/2/2025	7940711	=	409
PCPI041	l "Oxipilar" Las Glicinas 1282	PMA	RED	14/5/2025	8060055	=	421
PCPI041	l "Oxipilar" Las Glicinas 1282	PMA	RED	15/9/2025	8242081	=	401
PCPI042	Vivienda Calle Muslandini 1323	PMA	RED	3/4/2025	8022258	=	473
PCPI042	Vivienda Calle Muslandini 1323	PMA	RED	7/7/2025	8153611	=	406
PCPI042	Vivienda Calle Muslandini 1323	PMA	RED	13/11/2025	8324154	=	409
PCPI043	Seguí esq. Colectora Este Ramal Pila	PMA	RED	14/2/2025	7940883	=	431
PCPI043	Seguí esq. Colectora Este Ramal Pila	PMA	RED	22/5/2025	8060228	=	411
PCPI044	Vivienda sobre calle Posadas 1655	PMA	RED	11/3/2025	7981328	=	440
PCPI044	Vivienda sobre calle Posadas 1655	PMA	RED	21/6/2025	8110094	=	420
PCPI044	Vivienda sobre calle Posadas 1655	PMA	RED	20/11/2025	8324472	=	390
PCPI045	Barrio Campo Grande	PMA	RED	19/3/2025	7981816	=	407
PCPI045	Barrio Campo Grande	PMA	RED	26/5/2025	8060633	=	419
PCPI045	Barrio Campo Grande	PMA	RED	24/9/2025	8242577	=	321
PCPI048	Vivienda sobre calle Chubut 1330	PMA	RED	12/2/2025	7940713	=	375
PCPI048	Vivienda sobre calle Chubut 1330	PMA	RED	14/5/2025	8060057	=	478
PCPI048	Vivienda sobre calle Chubut 1330	PMA	RED	10/12/2025	8375857	=	365
PCPI049	Republica Bergantín 1287	PMA	RED	13/1/2025	7890166	=	443
PCPI049	Republica Bergantín 1287	PMA	RED	21/6/2025	8110096	=	432
PCPI049	Republica Bergantín 1287	PMA	RED	10/12/2025	8375858	=	417
PCPI050	Av constitucion 2939	PMA	RED	21/1/2025	7904446	=	489
PCPI050	Av constitucion 2939	PMA	RED	8/7/2025	8154916	=	494
PCPI050	Av constitucion 2939	PMA	RED	30/10/2025	8292474	=	417
PCPI051	GUATEMALA (GARITA SEG) 3951	PMA	RED	21/2/2025	7942912	=	440
PCPI051	GUATEMALA (GARITA SEG) 3951	PMA	RED	26/4/2025	8023626	=	422
PCPI051	GUATEMALA (GARITA SEG) 3951	PMA	RED	8/8/2025	8185799	=	470
PCPI052	Guatemala 4200	PMA	RED	21/2/2025	7942913	=	446
PCPI052	Guatemala 4200	PMA	RED	17/3/2025	7981937	=	450
PCPI052	Guatemala 4200	PMA	RED	8/8/2025	8185800	=	481
PCPI052	Guatemala 4200	PMA	RED	30/10/2025	8292476	=	375
PCPI053	Ruta 8 y Juan R Gimenez	PMA	RED	26/4/2025	8023628	=	423
PCPI053	Ruta 8 y Juan R Gimenez	PMA	RED	15/7/2025	8154919	=	417
PCPI053	Ruta 8 y Juan R Gimenez	PMA	RED	30/10/2025	8292477	=	369
PCPI054	Leguizamon e Intuzaingo	PMA	RED	21/2/2025	7942915	=	433
PCPI054	Leguizamon e Intuzaingo	PMA	RED	24/5/2025	8060747	=	421
PCPI054	Leguizamon e Intuzaingo	PMA	RED	26/11/2025	8325253	=	388
PCPI056	Ameghino y Colectora Oeste	PMA	RED	14/2/2025	7940884	=	394
PCPI056	Ameghino y Colectora Oeste	PMA	RED	23/6/2025	8110248	=	470

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
PCPI056	Ameghino y Colectora Oeste	PMA	RED	15/10/2025	8291873	=	330
PCPI056	Ameghino y Colectora Oeste	PMA	RED	16/12/2025	8376016	=	369
PCPI062	PANAMA Y ALEJANDR	PMA	RED	13/3/2025	7981673	=	427
PCPI062	PANAMA Y ALEJANDR	PMA	RED	24/6/2025	8110439	=	443
PCPI062	PANAMA Y ALEJANDR	PMA	RED	2/9/2025	8242432	=	422
PCPI063	CALLE S/N E/ TAGLE Y PATAGONES	PMA	RED	19/3/2025	7981817	=	379
PCPI063	CALLE S/N E/ TAGLE Y PATAGONES	PMA	RED	8/8/2025	8185680	=	471
PCPI063	CALLE S/N E/ TAGLE Y PATAGONES	PMA	RED	21/10/2025	8292345	=	344
PCPI064	PATRICIAS ARGENTINAS 3301	PMA	RED	15/1/2025	7890629	=	394
PCPI064	PATRICIAS ARGENTINAS 3301	PMA	RED	24/6/2025	8110440	=	440
PCPI064	PATRICIAS ARGENTINAS 3301	PMA	RED	13/10/2025	8292116	=	336
PCPI065	GOLETA CONSTITUCION 1455	PMA	RED	11/3/2025	7981056	=	465
PCPI065	GOLETA CONSTITUCION 1455	PMA	RED	7/7/2025	8153612	=	420
PCPI065	GOLETA CONSTITUCION 1455	PMA	RED	10/12/2025	8375579	=	405
PCPI066	SANTO DOMINGO BARRIO COPROV	PMA	RED	26/4/2025	8023630	=	467
PCPI066	SANTO DOMINGO BARRIO COPROV	PMA	RED	12/6/2025	8110707	=	493
PCPI066	SANTO DOMINGO BARRIO COPROV	PMA	RED	18/12/2025	8376468	=	383
PCPI068	AV. ALAZAN, E/ OVERO Y PICAZO (LC	PMA	RED	19/2/2025	7941123	=	502
PCPI068	AV. ALAZAN, E/ OVERO Y PICAZO (LC	PMA	RED	15/7/2025	8154561	=	402
PCPI068	AV. ALAZAN, E/ OVERO Y PICAZO (LC	PMA	RED	16/12/2025	8376208	=	442
PCPI070	TIERRA DEL FUEGO, DERQUI 2218	PMA	RED	15/3/2025	7981577	=	438
PCPI070	TIERRA DEL FUEGO, DERQUI 2218	PMA	RED	9/9/2025	8242339	=	461
PCPI070	TIERRA DEL FUEGO, DERQUI 2218	PMA	RED	4/12/2025	8376110	=	374
PCPI075	GUATEMALA, Y LEVENE	PMA	RED	12/4/2025	8022953	=	385
PCPI075	GUATEMALA, Y LEVENE	PMA	RED	23/6/2025	8110251	=	428
PCPI075	GUATEMALA, Y LEVENE	PMA	RED	15/10/2025	8291875	=	323
PCPI076	AV. JOSÉ DALCO DOMENECH Y LUIS	PMA	RED	7/2/2025	7940888	=	391
PCPI076	AV. JOSÉ DALCO DOMENECH Y LUIS	PMA	RED	10/6/2025	8109546	=	449
PCPI076	AV. JOSÉ DALCO DOMENECH Y LUIS	PMA	RED	13/11/2025	8323837	=	395
PCPI080	MONSEÑOR D' ANDREA Y LA TAPERA	PMA	RED	3/4/2025	8023195	=	467
PCPI080	MONSEÑOR D' ANDREA Y LA TAPERA	PMA	RED	8/8/2025	8184801	=	436
PCPI080	MONSEÑOR D' ANDREA Y LA TAPERA	PMA	RED	15/10/2025	8291876	=	323
PCPI084	CHUBUT 1720	PMA	RED	23/6/2025	8120864	=	406
PCPI084	CHUBUT 1720	PMA	RED	8/9/2025	8241538	=	477
PCPI084	CHUBUT 1720	PMA	RED	16/12/2025	8375312	=	358
PIPC1	AV. SAAVEDRA LAMAS 3575 - CUART	PMA	RED	4/4/2025	8022214	=	479
PIPC1	AV. SAAVEDRA LAMAS 3575 - CUART	PMA	RED	25/8/2025	8184776	=	425
PIPC1	AV. SAAVEDRA LAMAS 3575 - CUART	PMA	RED	4/12/2025	8375561	=	392
PIPC2	LAS ARAUCARIAS 1600	PMA	RED	4/4/2025	8023083	=	445
PIPC2	LAS ARAUCARIAS 1600	PMA	RED	13/6/2025	8110345	=	429
PIPC2	LAS ARAUCARIAS 1600	PMA	RED	4/12/2025	8376111	=	381
QU07	CALLE 898 6280	PMA	RED	23/1/2025	7904749	=	471
QU07	898-CALLE 898 6280	PMA	RED	27/1/2025	7914387	=	491
QU07	CALLE 898 6280	PMA	RED	11/3/2025	7981484	=	546
QU07	898-CALLE 898 6280	PMA	RED	24/6/2025	8110763	=	535
QU07	898-CALLE 898 6280	PMA	RED	5/8/2025	8185307	=	513
QU07	CALLE 898 6280	PMA	RED	26/11/2025	8325309	=	404
QU36	CNO. GRAL. BELGRANO 4814	PMA	RED	27/3/2025	7981685	=	463

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Alcalinidad	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Alcalinidad (mg/L)
QU36	CNO. GRAL. BELGRANO 4814	PMA	RED	6/5/2025	8059600	=	447
QU36	CNO. GRAL. BELGRANO 4814	PMA	RED	28/8/2025	8230252	=	493
QU36	CNO. GRAL. BELGRANO 4814	PMA	RED	12/12/2025	8376219	=	195

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
AB05	SEAVER BENJAMIN 140	PMA	RED	9/1/2025	7890292	=	0,13
AB05	SEAVER BENJAMIN 140	PMA	RED	4/4/2025	8021684	=	0,12
AB05	SEAVER BENJAMIN 140	PMA	RED	1/6/2025	8109450	=	0,24
AB05	SEAVER BENJAMIN 140	PMA	RED	22/8/2025	8233398	=	0,20
AB05	SEAVER BENJAMIN 140	PMA	RED	12/11/2025	8324568	=	0,31
AB15	DIOMEDE MIGUEL 222	PMA	RED	9/1/2025	7890296	=	0,11
AB15	DIOMEDE MIGUEL 222	PMA	RED	4/4/2025	8021688	=	0,10
AB15	DIOMEDE MIGUEL 252	PMA	RED	29/8/2025	8244509	=	0,43
AB15	DIOMEDE MIGUEL 298	PMA	RED	1/9/2025	8241442	<	0,10
AB15	DIOMEDE MIGUEL 252	PMA	RED	16/9/2025	8245854	=	0,23
AB15	DIOMEDE MIGUEL 252	PMA	RED	2/12/2025	8375947	<	0,10
AB18	BYNON SANTIAGO JORGE 5060	PMA	RED	15/1/2025	7890181	=	0,13
AB18	BYNON SANTIAGO JORGE 5060	PMA	RED	16/4/2025	8022742	<	0,10
AB18	BYNON SANTIAGO JORGE 5060	PMA	RED	12/6/2025	8110110	=	0,22
AB18	BYNON SANTIAGO JORGE 5060	PMA	RED	23/10/2025	8290626	=	0,17
AB18	BYNON SANTIAGO JORGE 5049	PMA	RED	1/12/2025	8375217	<	0,10
AB20	ROCHA DARDO 2840	PMA	RED	17/2/2025	7940810	<	0,10
AB20	ROCHA DARDO 2840	PMA	RED	7/5/2025	8059297	=	0,14
AB20	ROCHA DARDO 2840	PMA	RED	3/7/2025	8153046	=	0,24
AB20	ROCHA DARDO 2840	PMA	RED	14/8/2025	8185208	=	0,13
AB20	ROCHA DARDO 2840	PMA	RED	16/10/2025	8291786	=	0,17
AB20	ROCHA DARDO 2840	PMA	RED	3/12/2025	8375950	=	0,13
AB21	EL CHIRIPA 1336	PMA	RED	10/2/2025	7939951	<	0,10
AB21	EL CHIRIPA 1336	PMA	RED	14/3/2025	7981423	=	0,14
AB21	EL CHIRIPA 1313	PMA	RED	22/5/2025	8060156	=	0,11
AB21	EL CHIRIPA 1313	PMA	RED	24/7/2025	8192674	=	0,27
AB21	EL CHIRIPA 1313	PMA	RED	16/10/2025	8291787	=	0,10
AB21	EL CHIRIPA 1313	PMA	RED	3/12/2025	8375951	=	0,15
AV02	ENTRE RIOS 298	PMA	RED	22/1/2025	7904399	=	0,12
AV02	ENTRE RIOS 298	PMA	RED	25/3/2025	7981891	<	0,10
AV02	ENTRE RIOS 298	PMA	RED	9/6/2025	8122444	=	0,37
AV02	ENTRE RIOS 323	PMA	RED	25/8/2025	8185753	=	0,17
AV02	ENTRE RIOS 323	PMA	RED	17/10/2025	8292426	=	0,31
AV04	AMEGHINO FLORENTINO 870	PMA	RED	22/1/2025	7904401	<	0,10
AV04	AMEGHINO FLORENTINO 870	PMA	RED	21/4/2025	8023580	=	0,10
AV04	AMEGHINO FLORENTINO 870	PMA	RED	23/6/2025	8110659	=	0,26
AV04	AMEGHINO FLORENTINO 870	PMA	RED	25/8/2025	8185755	=	0,19
AV04	AMEGHINO FLORENTINO 870	PMA	RED	15/12/2025	8375608	<	0,10
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1167	PMA	RED	7/4/2025	8022316	=	0,10
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1167	PMA	RED	4/6/2025	8109846	=	0,20
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1167	PMA	RED	4/8/2025	8184831	=	0,16
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1145	PMA	RED	7/10/2025	8291250	=	1,30
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1145	PMA	RED	2/12/2025	8375609	=	0,12
AV08	DONOVAN 1471	PMA	RED	16/1/2025	7890182	<	0,10
AV08	DONOVAN 1447	PMA	RED	14/3/2025	7981345	=	0,13
AV08	DONOVAN 1471	PMA	RED	7/7/2025	8154087	=	0,20
AV08	DONOVAN 1471	PMA	RED	7/10/2025	8291663	=	0,27
AV08	DONOVAN 1471	PMA	RED	10/12/2025	8376129	=	0,12
AV10	CNEL. ESPORA 325	PMA	RED	6/2/2025	7940437	=	0,14
AV10	CNEL. ESPORA 335	PMA	RED	7/4/2025	8022318	=	0,13
AV10	CNEL. ESPORA 335	PMA	RED	4/6/2025	8109848	=	0,17
AV10	CNEL. ESPORA 325	PMA	RED	9/9/2025	8241840	=	0,21
AV10	CNEL. ESPORA 325	PMA	RED	4/11/2025	8324187	=	0,15
AV14	CASACUBERTA CNEL 5827	PMA	RED	16/1/2025	7890184	<	0,10
AV14	CASACUBERTA CNEL 5848	PMA	RED	14/3/2025	7981347	=	0,12
AV14	CASACUBERTA CNEL 5848	PMA	RED	9/6/2025	8110113	=	0,19
AV14	CASACUBERTA CNEL 5853	PMA	RED	7/10/2025	8291665	=	0,24
AV14	CASACUBERTA CNEL 5853	PMA	RED	10/12/2025	8376131	=	0,12
AV16	ELIZALDE 2064	PMA	RED	7/2/2025	7940733	=	0,17
AV16	ELIZALDE 2064	PMA	RED	8/4/2025	8022747	=	0,17
AV16	ELIZALDE 2064	PMA	RED	9/6/2025	8110115	=	0,22
AV16	ELIZALDE 2064	PMA	RED	11/8/2025	8185127	=	0,22
AV16	ELIZALDE 2064	PMA	RED	7/10/2025	8291667	=	0,31
AV17	O'HIGGINS GRAL 824	PMA	RED	20/2/2025	7941030	=	0,16
AV17	O'HIGGINS GRAL 824	PMA	RED	21/4/2025	8023103	=	0,13
AV17	O'HIGGINS GRAL 840	PMA	RED	22/7/2025	8191148	=	0,40
AV17	O'HIGGINS GRAL 840	PMA	RED	14/8/2025	8185419	=	0,19
AV17	O'HIGGINS GRAL 840	PMA	RED	18/11/2025	8324789	=	0,18
AV19	SAN CARLOS 1149	PMA	RED	7/2/2025	7940735	=	0,16
AV19	SAN CARLOS 1149	PMA	RED	8/4/2025	8022749	=	0,22
AV19	SAN CARLOS 1149	PMA	RED	26/6/2025	8147158	=	0,28
AV19	SAN CARLOS 1149	PMA	RED	11/9/2025	8242105	=	0,33
AV19	SAN CARLOS 1149	PMA	RED	6/11/2025	8324495	=	0,27
AV20	MAGAN TTE CNEL 1919	PMA	RED	20/2/2025	7941032	=	0,16

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
AV20	MAGAN TTE CNEL 1919	PMA	RED	21/4/2025	8023105	=	0,15
AV20	MAGAN TTE CNEL 1921	PMA	RED	11/7/2025	8154461	=	0,21
AV20	MAGAN TTE CNEL 1919	PMA	RED	16/9/2025	8242362	=	0,14
AV20	MAGAN TTE CNEL 1919	PMA	RED	18/11/2025	8324791	=	0,16
AV25	OCANTOS 1054	PMA	RED	21/3/2025	7981604	=	0,10
AV25	OCANTOS 1072	PMA	RED	15/5/2025	8060376	=	0,14
AV25	OCANTOS 1072	PMA	RED	11/7/2025	8154464	=	0,16
AV25	OCANTOS 1010	PMA	RED	16/9/2025	8242364	=	0,67
AV25	OCANTOS 1054	PMA	RED	4/12/2025	8375882	=	0,13
CA03	COSTA RICA 4942	PMA	RED	13/1/2025	7890079	=	0,20
CA03	COSTA RICA 4942	PMA	RED	8/2/2025	7940175	=	0,14
CA03	COSTA RICA 4942	PMA	RED	3/4/2025	8021963	<	0,10
CA03	COSTA RICA 4942	PMA	RED	7/5/2025	8059514	<	0,10
CA03	COSTA RICA 4942	PMA	RED	3/7/2025	8153324	=	0,11
CA03	COSTA RICA 4942	PMA	RED	5/9/2025	8241606	=	0,28
CA03	COSTA RICA 4942	PMA	RED	3/10/2025	8290906	=	0,10
CA03	COSTA RICA 4942	PMA	RED	2/12/2025	8375379	<	0,10
CA09	BEAUCHEF 571	PMA	RED	15/1/2025	7899945	<	0,10
CA09	BEAUCHEF 587	PMA	RED	21/2/2025	7942823	=	0,15
CA09	BEAUCHEF 571	PMA	RED	14/4/2025	8023518	<	0,10
CA09	BEAUCHEF 571	PMA	RED	22/6/2025	8110606	=	0,16
CA09	BEAUCHEF 571	PMA	RED	24/7/2025	8154816	<	0,10
CA09	BEAUCHEF 571	PMA	RED	5/8/2025	8184505	=	0,17
CA09	BEAUCHEF 571	PMA	RED	15/9/2025	8242599	=	0,24
CA09	BEAUCHEF 571	PMA	RED	14/10/2025	8292366	<	0,10
CA09	BEAUCHEF 571	PMA	RED	16/12/2025	8376373	<	0,10
CA16	PUAN 360	PMA	RED	2/1/2025	7889318	<	0,10
CA16	PUAN 360	PMA	RED	5/3/2025	7980809	<	0,10
CA16	PUAN 360	PMA	RED	1/4/2025	8021876	<	0,10
CA16	PUAN 360	PMA	RED	3/5/2025	8059452	<	0,10
CA16	PUAN 360	PMA	RED	2/6/2025	8109567	=	0,46
CA16	PUAN 360	PMA	RED	5/8/2025	8184509	=	0,12
CA16	PUAN 360	PMA	RED	2/9/2025	8241560	<	0,10
CA16	PUAN 360	PMA	RED	1/11/2025	8323864	<	0,10
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	13/1/2025	7890082	=	0,11
CA18	GODOY CRUZ 2984	PMA	RED	6/3/2025	7980858	=	0,16
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	3/4/2025	8021966	<	0,10
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	4/6/2025	8109616	=	0,14
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	24/7/2025	8153327	<	0,10
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	5/9/2025	8241609	=	0,26
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	14/11/2025	8323930	<	0,10
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	2/12/2025	8375382	<	0,10
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	20/1/2025	7904413	<	0,10
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	12/3/2025	7981281	<	0,10
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	9/4/2025	8022652	<	0,10
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	26/6/2025	8110046	=	0,28
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	8/8/2025	8185040	=	0,13
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1322	PMA	RED	8/9/2025	8242035	<	0,10
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	20/11/2025	8324398	<	0,10
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	7/12/2025	8375808	=	0,10
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	5/1/2025	7889398	=	0,12
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	17/3/2025	7981906	<	0,10
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	15/4/2025	8023593	<	0,10
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	21/6/2025	8110672	=	0,14
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	5/8/2025	8185768	=	0,33
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	15/9/2025	8242658	<	0,10
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	21/11/2025	8325219	<	0,10
CA22	DIAZ VELEZ AV 5151	PMA	RED	13/12/2025	8376433	<	0,10
CA29	SALCEDO 3465	PMA	RED	21/1/2025	7899951	<	0,10
CA29	SALCEDO 3571	PMA	RED	21/2/2025	7942829	=	0,12
CA29	SALCEDO 3465	PMA	RED	17/3/2025	7981844	=	0,11
CA29	SALCEDO 3465	PMA	RED	23/5/2025	8060661	=	0,11
CA29	SALCEDO 3465	PMA	RED	22/6/2025	8110612	=	0,22
CA29	SALCEDO 3465	PMA	RED	17/8/2025	8185708	<	0,10
CA29	SALCEDO 3429	PMA	RED	14/10/2025	8292372	=	0,10
CA29	SALCEDO 3465	PMA	RED	16/11/2025	8325167	<	0,10
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	3/2/2025	7940116	<	0,10
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	3/5/2025	8059455	=	0,27
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 167	PMA	RED	18/6/2025	8109570	=	0,44
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	5/8/2025	8184512	=	0,31
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	2/10/2025	8290826	<	0,10
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	1/11/2025	8323867	<	0,10
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	6/12/2025	8375767	<	0,10
CA37	PERON JUAN D TTE GRAL 4002	PMA	RED	3/2/2025	7940119	<	0,10

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
CA37	PERON JUAN D TTE GRAL 4002	PMA	RED	5/3/2025	7980815	<	0,10
CA37	PERON JUAN D TTE GRAL 4002	PMA	RED	1/4/2025	8021882	<	0,10
CA37	PERON JUAN D TTE GRAL 3920	PMA	RED	3/5/2025	8059458	<	0,10
CA37	PERON JUAN D TTE GRAL 4002	PMA	RED	18/7/2025	8153252	=	0,14
CA37	PERON JUAN D TTE GRAL 4002	PMA	RED	5/8/2025	8184515	=	0,36
CA37	PERON JUAN D TTE GRAL 4002	PMA	RED	2/10/2025	8290829	<	0,10
CA37	PERON JUAN D TTE GRAL 3920	PMA	RED	1/12/2025	8375340	<	0,10
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	2/1/2025	7889325	=	0,10
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	7/2/2025	7940612	<	0,10
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	11/4/2025	8022548	<	0,10
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	14/5/2025	8059947	=	0,10
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	18/7/2025	8153898	=	0,22
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	8/8/2025	8185005	=	0,13
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	8/10/2025	8291480	<	0,10
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	6/12/2025	8375771	<	0,10
CA40	YERBAL 765	PMA	RED	25/2/2025	7974597	=	0,13
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	19/3/2025	7981850	=	0,10
CA40	YERBAL 765	PMA	RED	16/4/2025	8023530	<	0,10
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	23/5/2025	8060667	=	0,16
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	24/7/2025	8154828	=	0,23
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	15/9/2025	8242611	=	0,34
CA40	YERBAL 765	PMA	RED	14/10/2025	8292378	=	0,27
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	16/12/2025	8376385	<	0,10
CE05	CORDOBA AV 2316	PMA	RED	4/1/2025	7889766	=	0,10
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	8/2/2025	7940444	<	0,10
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	12/4/2025	8023111	=	0,10
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	20/5/2025	8060380	=	0,10
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	12/7/2025	8155028	=	0,21
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	12/9/2025	8241847	<	0,10
CE05	CORDOBA AV 2316	PMA	RED	5/10/2025	8291259	<	0,10
CE05	CORDOBA AV 2316	PMA	RED	3/12/2025	8375618	<	0,10
CE07	RODRIGUEZ PEÑA 2036	PMA	RED	11/1/2025	7890550	=	0,17
CE07	RODRIGUEZ PEÑA 2036	PMA	RED	15/2/2025	7941039	<	0,10
CE07	CALLAO 2059	PMA	RED	18/4/2025	8023740	<	0,10
CE07	RODRIGUEZ PEÑA 2036	PMA	RED	2/6/2025	8109856	=	0,37
CE07	RODRIGUEZ PEÑA 2036	PMA	RED	5/7/2025	8153674	<	0,10
CE07	RODRIGUEZ PEÑA 2036	PMA	RED	12/9/2025	8241848	<	0,10
CE07	RODRIGUEZ PEÑA 2036	PMA	RED	11/10/2025	8292035	<	0,10
CE07	RODRIGUEZ PEÑA 2036	PMA	RED	11/12/2025	8376143	<	0,10
CE12	AV. LEANDRO N ALEM 651	PMA	RED	11/1/2025	7890553	=	0,13
CE12	AV. LEANDRO N ALEM 651	PMA	RED	15/3/2025	7981612	=	0,11
CE12	AV. LEANDRO N ALEM 661	PMA	RED	18/4/2025	8023743	<	0,10
CE12	AV. LEANDRO N ALEM 651	PMA	RED	2/6/2025	8109863	=	0,36
CE12	AV. LEANDRO N ALEM 651	PMA	RED	5/7/2025	8153677	=	0,12
CE12	AV. LEANDRO N ALEM 651	PMA	RED	12/9/2025	8241851	<	0,10
CE12	AV. LEANDRO N ALEM 651	PMA	RED	9/11/2025	8324801	<	0,10
CE12	AV. LEANDRO N ALEM 651	PMA	RED	11/12/2025	8376146	<	0,10
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	18/1/2025	7904782	<	0,10
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	22/2/2025	7943004	=	0,17
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1119	PMA	RED	8/3/2025	7981101	=	0,12
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	2/4/2025	8022330	=	0,31
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1119	PMA	RED	2/6/2025	8109864	=	0,20
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	15/8/2025	8185432	<	0,10
CE13	AV SAN JUAN 1569	PMA	RED	20/9/2025	8242373	=	0,11
CE13	AV SAN JUAN 1569	PMA	RED	15/11/2025	8325342	=	0,12
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	14/12/2025	8376557	<	0,10
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	15/2/2025	7941045	<	0,10
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	15/3/2025	7981615	=	0,15
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	24/5/2025	8060846	=	0,12
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	19/6/2025	8110798	=	0,27
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	2/8/2025	8184847	=	0,25
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	12/9/2025	8241854	=	0,38
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	9/11/2025	8324804	<	0,10
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	11/12/2025	8376149	=	0,12
CE17	MORENO 1749	PMA	RED	11/1/2025	7894940	=	0,20
CE17	MORENO 1749	PMA	RED	22/3/2025	7982032	=	0,10
CE17	MORENO 1749	PMA	RED	1/5/2025	8059795	<	0,10
CE17	MORENO 1749	PMA	RED	2/6/2025	8109867	=	0,24
CE17	MORENO 1749	PMA	RED	15/8/2025	8185435	<	0,10
CE17	MORENO 1749	PMA	RED	20/9/2025	8242376	<	0,10
CE17	MORENO 1749	PMA	RED	15/11/2025	8325345	<	0,10

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
CE17	MORENO 1749	PMA	RED	14/12/2025	8376560	=	0,17
CO04	PERU 1669	PMA	RED	15/1/2025	7890436	<	0,10
CO04	PERU 1669	PMA	RED	14/2/2025	7940964	<	0,10
CO04	PERU 1669	PMA	RED	17/4/2025	8023647	<	0,10
CO04	PERU 1669	PMA	RED	28/5/2025	8060761	=	0,12
CO04	PERU 1669	PMA	RED	3/7/2025	8153445	=	0,25
CO04	PERU 1669	PMA	RED	3/9/2025	8241701	=	0,19
CO04	PERU 1669	PMA	RED	13/10/2025	8291924	=	0,16
CO04	PERU 1669	PMA	RED	22/12/2025	8376067	=	0,15
CO07	SUAREZ 1157	PMA	RED	26/1/2025	7904469	=	0,10
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	24/2/2025	7942930	=	0,11
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	4/4/2025	8022091	=	0,11
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	5/6/2025	8109710	=	0,15
CO07	SUAREZ 1157	PMA	RED	13/7/2025	8154352	=	0,17
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	9/9/2025	8242296	=	0,34
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	15/10/2025	8292497	=	0,14
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	17/12/2025	8376482	=	0,10
CO08	SUAREZ 586	PMA	RED	3/1/2025	7889530	=	0,13
CO08	SUAREZ 586	PMA	RED	7/3/2025	7980952	=	0,21
CO08	SUAREZ 586	PMA	RED	11/4/2025	8023003	<	0,10
CO08	SUAREZ 586	PMA	RED	9/6/2025	8110301	=	0,15
CO08	SUAREZ 586	PMA	RED	13/7/2025	8154940	=	0,17
CO08	SUAREZ 586	PMA	RED	16/9/2025	8242708	<	0,10
CO08	SUAREZ 586	PMA	RED	3/11/2025	8324029	=	0,18
CO08	SUAREZ 586	PMA	RED	3/12/2025	8375475	<	0,10
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	15/1/2025	7890439	<	0,10
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	16/3/2025	7981535	<	0,10
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	17/4/2025	8023650	<	0,10
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	20/6/2025	8110723	=	0,22
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 81	PMA	RED	6/8/2025	8184675	=	0,12
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 81	PMA	RED	3/9/2025	8241704	=	0,13
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	12/11/2025	8324728	<	0,10
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	22/12/2025	8376070	=	0,10
CO13	LUZURIAGA 1571	PMA	RED	14/2/2025	7940970	<	0,10
CO13	LUZURIAGA 1571	PMA	RED	16/3/2025	7981538	=	0,10
CO13	LUZURIAGA 1571	PMA	RED	28/5/2025	8060767	<	0,10
CO13	LUZURIAGA 1571	PMA	RED	20/6/2025	8110726	=	0,14
CO13	LUZURIAGA 1571	PMA	RED	3/7/2025	8153451	=	0,18
CO13	LUZURIAGA 1571	PMA	RED	5/8/2025	8184678	=	0,35
CO13	LUZURIAGA 1571	PMA	RED	13/10/2025	8291930	=	0,13
CO13	LUZURIAGA 1571	PMA	RED	12/11/2025	8324731	=	0,27
DE03	CARRIL SALVADOR MARIA DEL AV 4301	PMA	RED	16/1/2025	7899876	<	0,10
DE03	CARRIL SALVADOR MARIA DEL AV 4301	PMA	RED	12/2/2025	7940537	=	0,10
DE03	CARRIL SALVADOR MARIA DEL AV 4301	PMA	RED	1/4/2025	8021699	<	0,10
DE03	CARRIL SALVADOR MARIA DEL AV 4301	PMA	RED	21/5/2025	8060557	=	0,17
DE03	CARRIL SALVADOR MARIA DEL AV 4301	PMA	RED	15/7/2025	8153785	=	0,18
DE03	CARRIL SALVADOR MARIA DEL AV 4301	PMA	RED	2/9/2025	8241453	=	0,35
DE03	CARRIL SALVADOR MARIA DEL AV 4301	PMA	RED	20/10/2025	8292283	=	0,15
DE03	CARRIL SALVADOR MARIA DEL AV 4301	PMA	RED	5/12/2025	8375709	<	0,10
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	2/1/2025	7889155	=	0,11
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	17/2/2025	7941218	=	0,34
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	11/4/2025	8022442	<	0,10
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	2/6/2025	8109466	<	0,10
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	15/7/2025	8154733	=	0,18
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	22/9/2025	8275243	<	0,10
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	1/10/2025	8290635	<	0,10
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	15/12/2025	8376301	<	0,10
DE07	CALDERON DE LA BARCA PEDRO 3045	PMA	RED	10/1/2025	7889884	=	0,17

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
DE07	CALDERON DE LA BARCA PEDRO 3045	PMA	RED	2/3/2025	7980710	=	0,30
DE07	CALDERON DE LA BARCA PEDRO 3045	PMA	RED	14/4/2025	8023437	=	0,10
DE07	CALDERON DE LA BARCA PEDRO 3045	PMA	RED	7/6/2025	8109952	=	0,10
DE07	CALDERON DE LA BARCA PEDRO 3045	PMA	RED	2/7/2025	8153054	=	0,29
DE07	CALDERON DE LA BARCA PEDRO 3056	PMA	RED	15/9/2025	8242529	=	0,15
DE07	CALDERON DE LA BARCA PEDRO 3056	PMA	RED	16/10/2025	8291373	=	0,16
DE07	CALDERON DE LA BARCA PEDRO 3045	PMA	RED	1/12/2025	8375227	<	0,10
DE11	SEGUROLA AV 1845	PMA	RED	2/1/2025	7889158	<	0,10
DE11	SEGUROLA AV 1845	PMA	RED	14/3/2025	7981771	<	0,10
DE11	SEGUROLA AV 1845	PMA	RED	11/4/2025	8022445	<	0,10
DE11	SEGUROLA AV 1845	PMA	RED	2/6/2025	8109469	=	0,27
DE11	SEGUROLA AV 1845	PMA	RED	15/7/2025	8154736	<	0,10
DE11	SEGUROLA AV 1845	PMA	RED	22/9/2025	8275244	=	0,19
DE11	SEGUROLA AV 1845	PMA	RED	10/11/2025	8323712	=	0,10
DE11	SEGUROLA AV 1845	PMA	RED	15/12/2025	8376304	<	0,10
DE12	BAHIA BLANCA 2530	PMA	RED	10/1/2025	7889887	<	0,10
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	2/3/2025	7980713	=	0,15
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	14/4/2025	8023440	<	0,10
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	7/6/2025	8109955	<	0,10
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	4/8/2025	8184359	=	0,40
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	15/9/2025	8242532	=	0,15
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	11/11/2025	8324289	=	0,11
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	1/12/2025	8375230	<	0,10
DE13	MISTRAL GABRIELA 3392	PMA	RED	16/1/2025	7899882	<	0,10
DE13	MISTRAL GABRIELA 3403	PMA	RED	10/3/2025	7981192	<	0,10
DE13	MISTRAL GABRIELA 3392	PMA	RED	2/5/2025	8059311	<	0,10
DE13	MISTRAL GABRIELA 3392	PMA	RED	12/8/2025	8184936	=	0,13
DE13	MISTRAL GABRIELA 3392	PMA	RED	2/9/2025	8241459	=	0,34
DE13	MISTRAL GABRIELA 3392	PMA	RED	18/11/2025	8325066	<	0,10
DE13	MISTRAL GABRIELA 3392	PMA	RED	5/12/2025	8375715	<	0,10
DE16	ALBARELLOS AV 2578	PMA	RED	2/1/2025	7889162	=	0,10
DE16	ALBARELLOS AV 2578	PMA	RED	12/2/2025	7940545	<	0,10
DE16	ALBARELLOS AV 2640	PMA	RED	1/3/2025	7980716	=	0,10
DE16	ALBARELLOS AV 2578	PMA	RED	21/5/2025	8060565	=	0,27
DE16	ALBARELLOS AV 2578	PMA	RED	7/6/2025	8109958	<	0,10
DE16	ALBARELLOS AV 2578	PMA	RED	4/8/2025	8184362	=	0,40
DE16	ALBARELLOS AV 2578	PMA	RED	15/9/2025	8242535	=	0,25
DE16	ALBARELLOS AV 2578	PMA	RED	11/11/2025	8324292	<	0,10
DE17	FAGNANO JOSE AV 3565	PMA	RED	10/3/2025	7981195	<	0,10
DE17	FAGNANO JOSE AV 3579	PMA	RED	2/5/2025	8059314	<	0,10
DE17	FAGNANO JOSE AV 3579	PMA	RED	12/6/2025	8110543	<	0,10
DE17	FAGNANO JOSE AV 3579	PMA	RED	12/8/2025	8184939	=	0,20
DE17	FAGNANO JOSE AV 3579	PMA	RED	1/10/2025	8290643	=	0,24
DE17	FAGNANO JOSE AV 3579	PMA	RED	18/11/2025	8325069	<	0,10
DE18	SAN MARTIN AV 3165	PMA	RED	2/2/2025	7939968	<	0,10
DE18	SAN MARTIN AV 3253	PMA	RED	14/3/2025	7981777	<	0,10
DE18	SAN MARTIN AV 3165	PMA	RED	12/5/2025	8059887	=	0,12
DE18	SAN MARTIN AV 3165	PMA	RED	7/6/2025	8109960	<	0,10
DE18	SAN MARTIN AV 3165	PMA	RED	2/7/2025	8153062	=	0,31
DE18	SAN MARTIN AV 3165	PMA	RED	16/8/2025	8185614	<	0,10
DE18	SAN MARTIN AV 3165	PMA	RED	10/11/2025	8323718	<	0,10
DE19	ARGERICH 1662	PMA	RED	12/2/2025	7940548	<	0,10
DE19	ARGERICH 1662	PMA	RED	1/4/2025	8021710	<	0,10
DE19	ARGERICH 1626	PMA	RED	21/5/2025	8060568	=	0,19
DE19	ARGERICH 1662	PMA	RED	15/7/2025	8153796	=	0,14
DE19	ARGERICH 1662	PMA	RED	4/8/2025	8184365	=	0,39
DE19	ARGERICH 1662	PMA	RED	12/9/2025	8241948	=	0,14
DE19	ARGERICH 1662	PMA	RED	20/10/2025	8292294	<	0,10

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
DE19	ARGERICH 1626	PMA	RED	11/11/2025	8324295	=	0,14
FL02	RABANAL FRANCISCO INT 2765	PMA	RED	3/1/2025	7889540	=	0,13
FL02	RABANAL FRANCISCO INT 2765	PMA	RED	8/2/2025	7940288	=	0,10
FL02	RABANAL FRANCISCO INT 2765	PMA	RED	4/4/2025	8022103	=	0,10
FL02	RABANAL FRANCISCO INT 2765	PMA	RED	19/5/2025	8059632	=	0,18
FL02	RABANAL FRANCISCO INT 2765	PMA	RED	3/7/2025	8153457	=	0,19
FL02	RABANAL FRANCISCO INT 2723	PMA	RED	5/8/2025	8184684	=	0,26
FL02	RABANAL FRANCISCO INT 2765	PMA	RED	3/10/2025	8291042	<	0,10
FL02	RABANAL FRANCISCO INT 2765	PMA	RED	3/12/2025	8375485	=	0,11
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	15/1/2025	7890445	=	0,33
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	14/2/2025	7940973	=	0,11
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	23/4/2025	8056557	<	0,10
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	26/5/2025	8060314	<	0,10
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	11/7/2025	8154360	=	0,15
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	9/9/2025	8242304	=	0,21
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	12/10/2025	8291933	=	0,12
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	21/12/2025	8376076	=	0,16
FL11	BERG CARLOS 3440	PMA	RED	28/1/2025	7938761	=	0,12
FL11	BERG CARLOS 3440	PMA	RED	31/1/2025	7938160	=	0,11
FL11	BERG CARLOS 3440	PMA	RED	25/2/2025	7942946	=	0,11
FL11	BERG CARLOS 3440	PMA	RED	17/4/2025	8023671	<	0,10
FL11	BERG CARLOS 3440	PMA	RED	20/6/2025	8110737	=	0,21
FL11	BERG CARLOS 3440	PMA	RED	11/7/2025	8154962	=	0,13
FL11	BERG CARLOS 3440	PMA	RED	16/9/2025	8242724	=	0,16
FL11	BERG CARLOS 3466	PMA	RED	16/10/2025	8292520	=	0,14
FL11	BERG CARLOS 3440	PMA	RED	18/12/2025	8376498	<	0,10
FL12	BARROS PAZOS JOSE 6570	PMA	RED	3/1/2025	7889543	=	0,10
FL12	BARROS PAZOS JOSE 6570	PMA	RED	7/3/2025	7980965	=	0,16
FL12	BARROS PAZOS JOSE 6570	PMA	RED	16/4/2025	8042379	<	0,10
FL12	BARROS PAZOS JOSE 6570	PMA	RED	5/6/2025	8109724	=	0,13
FL12	BARROS PAZOS JOSE 6570	PMA	RED	3/7/2025	8153460	=	0,19
FL12	BARROS PAZOS JOSE 6570	PMA	RED	3/9/2025	8241716	=	0,17
FL12	BARROS PAZOS JOSE 6570	PMA	RED	3/11/2025	8324042	=	0,22
FL12	BARROS PAZOS JOSE 6570	PMA	RED	12/12/2025	8389391	=	0,14
FL13	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV 2135	PMA	RED	16/1/2025	7890664	<	0,10
FL13	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV 2135	PMA	RED	14/3/2025	7981709	=	0,13
FL13	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV 2135	PMA	RED	23/5/2025	8060499	=	0,19
FL13	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV 2135	PMA	RED	11/6/2025	8110476	=	0,15
FL13	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV 2135	PMA	RED	13/8/2025	8185546	=	0,14
FL13	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV 2135	PMA	RED	14/9/2025	8242468	=	0,19
FL13	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV 2135	PMA	RED	15/10/2025	8292152	=	0,30
FL13	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV 2135	PMA	RED	17/11/2025	8325002	<	0,10
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	25/2/2025	7943051	=	0,10
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	19/3/2025	7982074	=	0,20
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	25/5/2025	8060889	<	0,10
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	20/6/2025	8110841	=	0,23
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	22/8/2025	8185937	<	0,10
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	17/9/2025	8242831	=	0,14
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	15/10/2025	8292153	=	0,12
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	19/11/2025	8325389	<	0,10
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	12/2/2025	7940465	=	0,11
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	10/3/2025	7981117	<	0,10
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	7/5/2025	8059808	=	0,10
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	5/6/2025	8109881	=	0,12
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	6/8/2025	8184861	=	0,26
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	14/9/2025	8242470	=	0,18
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	5/11/2025	8324215	=	0,14
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4380	PMA	RED	4/12/2025	8375639	<	0,10

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	26/2/2025	7941161	=	0,13
FL17	CARHUE 2171	PMA	RED	14/3/2025	7981712	=	0,13
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	23/5/2025	8060502	=	0,19
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	11/6/2025	8110479	=	0,37
FL17	CARHUE 2087	PMA	RED	11/7/2025	8154600	=	0,13
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	12/8/2025	8185549	=	0,11
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	15/10/2025	8292155	=	0,31
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	17/11/2025	8325005	=	0,10
FL21	ARGENTINA AV. 5236	PMA	RED	23/2/2025	7941164	=	0,10
FL21	ARGENTINA AV. 5236	PMA	RED	14/3/2025	7981715	=	0,13
FL21	ARGENTINA AV. 5236	PMA	RED	23/4/2025	8056559	<	0,10
FL21	ARGENTINA AV. 5236	PMA	RED	23/5/2025	8060505	=	0,16
FL21	ARGENTINA AV. 5236	PMA	RED	11/7/2025	8154604	=	0,14
FL21	ARGENTINA AV. 5236	PMA	RED	13/8/2025	8185552	=	0,25
FL21	ARGENTINA AV. 5236	PMA	RED	15/10/2025	8292158	=	0,15
FL21	ARGENTINA AV. 5236	PMA	RED	17/11/2025	8325008	<	0,10
FL22	ZUVIRIA 5133	PMA	RED	19/1/2025	7904842	=	0,10
FL22	ZUVIRIA 5133	PMA	RED	25/2/2025	7943057	=	0,16
FL22	ZUVIRIA 5133	PMA	RED	21/4/2025	8023795	=	0,17
FL22	ZUVIRIA 5133	PMA	RED	25/5/2025	8060895	=	0,10
FL22	ZUVIRIA 5133	PMA	RED	11/7/2025	8155084	=	0,22
FL22	ZUVIRIA 5133	PMA	RED	22/8/2025	8185943	=	0,10
FL22	ZUVIRIA 5133	PMA	RED	17/10/2025	8292648	<	0,10
FL22	ZUVIRIA 5133	PMA	RED	21/12/2025	8376608	=	0,13
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	15/1/2025	7904340	<	0,10
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	24/3/2025	7981290	<	0,10
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	12/4/2025	8022002	<	0,10
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	23/6/2025	8110055	=	0,14
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	10/7/2025	8153359	=	0,32
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	6/8/2025	8185068	=	0,19
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	23/10/2025	8291599	<	0,10
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	10/11/2025	8323955	<	0,10
LA01	AYACUCHO 735	PMA	RED	20/1/2025	7899888	=	0,16
LA01	AYACUCHO 735	PMA	RED	5/3/2025	7981779	=	0,16
LA01	AYACUCHO 735	PMA	RED	12/5/2025	8060595	=	0,22
LA01	AYACUCHO 735	PMA	RED	21/8/2025	8185642	=	0,30
LA01	AYACUCHO 735	PMA	RED	25/11/2025	8365588	=	0,26
LA02	LAS PIEDRAS 2565	PMA	RED	24/1/2025	7904797	=	0,12
LA02	LAS PIEDRAS 2565	PMA	RED	17/3/2025	7982044	=	0,17
LA02	LAS PIEDRAS 2565	PMA	RED	25/6/2025	8110811	=	0,32
LA02	LAS PIEDRAS 2565	PMA	RED	26/8/2025	8185907	=	0,37
LA02	LAS PIEDRAS 2565	PMA	RED	23/10/2025	8292605	=	0,16
LA04	RODRIGUEZ MARTIN GDOR BLVD 2536	PMA	RED	24/1/2025	7904799	=	0,10
LA04	RODRIGUEZ MARTIN GDOR BLVD 2532	PMA	RED	24/4/2025	8023761	=	0,11
LA04	RODRIGUEZ MARTIN GDOR BLVD 2532	PMA	RED	25/6/2025	8110813	=	0,27
LA04	PRESIDENTE RAUL ALFONSIN 2532	PMA	RED	26/8/2025	8185909	=	0,22
LA04	PRESIDENTE RAÚL ALFONSÍN 2532	PMA	RED	25/11/2025	8325359	=	0,19
LA06	AGUAPEY 2844	PMA	RED	24/2/2025	7943023	=	0,16
LA06	AGUAPEY 2840	PMA	RED	24/4/2025	8023763	=	0,36
LA06	AGUAPEY 2840	PMA	RED	25/6/2025	8110815	=	0,27
LA06	AGUAPEY 2840	PMA	RED	18/9/2025	8242803	=	0,32
LA06	AGUAPEY 2840	PMA	RED	25/11/2025	8325361	=	0,19
LA12	BRIN MTRO 2973	PMA	RED	9/1/2025	7889677	=	0,26
LA12	BRIN MTRO 2973	PMA	RED	28/3/2025	7981545	=	0,32
LA12	BRIN MTRO 2973	PMA	RED	15/5/2025	8060320	<	0,10
LA12	BRIN MTRO 2973	PMA	RED	22/8/2025	8185366	=	0,22
LA12	BRIN MTRO 2973	PMA	RED	9/10/2025	8291937	=	0,19
LA13	COLOMBIA 1229	PMA	RED	9/1/2025	7889678	=	0,15

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
LA13	COLOMBIA 1225	PMA	RED	12/3/2025	8002419	<	0,10
LA13	COLOMBIA 1229	PMA	RED	3/6/2025	8109800	=	0,25
LA13	COLOMBIA 1229	PMA	RED	7/8/2025	8184779	=	0,38
LA13	COLOMBIA 1225	PMA	RED	2/10/2025	8291173	=	0,41
LA14	PLAUL SANTIAGO 1846	PMA	RED	20/1/2025	7890451	=	0,16
LA14	PLAUL SANTIAGO 1832	PMA	RED	28/3/2025	7981547	=	0,20
LA14	PLAUL SANTIAGO 1852	PMA	RED	25/6/2025	8147159	=	0,38
LA14	PLAUL SANTIAGO 1852	PMA	RED	22/8/2025	8185368	=	0,34
LA14	PLAUL SANTIAGO 1852	PMA	RED	12/11/2025	8324740	=	0,20
LA16	TEJEDOR CARLOS GDOR 1185	PMA	RED	9/1/2025	7889681	=	0,14
LA16	TEJEDOR CARLOS GDOR 1185	PMA	RED	3/4/2025	8022237	=	0,11
LA16	TEJEDOR CARLOS GDOR 1185	PMA	RED	3/6/2025	8109802	=	0,20
LA16	TEJEDOR CARLOS GDOR 1185	PMA	RED	7/8/2025	8184781	=	0,27
LA16	TEJEDOR CARLOS GDOR 1185	PMA	RED	5/11/2025	8324136	=	0,25
LA21	SAYOS CNEL 913	PMA	RED	4/2/2025	7940387	<	0,10
LA21	SAYOS CNEL 913	PMA	RED	4/4/2025	8022239	<	0,10
LA21	SAYOS CNEL 913	PMA	RED	3/6/2025	8109804	=	0,27
LA21	SAYOS CNEL 913	PMA	RED	3/9/2025	8241796	=	0,14
LA21	SAYOS CNEL 913	PMA	RED	5/11/2025	8324138	=	0,23
LA25	VILLEGAS 450	PMA	RED	24/2/2025	7943027	=	0,15
LA25	VILLEGAS 450	PMA	RED	28/5/2025	8060867	=	0,10
LA25	VILLEGAS 450	PMA	RED	14/7/2025	8155056	=	0,20
LA25	VILLEGAS 450	PMA	RED	23/10/2025	8292613	=	0,14
LA25	VILLEGAS 450	PMA	RED	22/12/2025	8376580	=	0,22
LA31	YATAY 473	PMA	RED	4/2/2025	7940391	<	0,10
LA31	YATAY 473	PMA	RED	7/5/2025	8059735	=	0,11
LA31	YATAY 473	PMA	RED	2/7/2025	8153596	=	0,22
LA31	YATAY 473	PMA	RED	2/10/2025	8291181	=	0,12
LA31	YATAY 473	PMA	RED	3/12/2025	8375572	<	0,10
LA32	EREZCANO CNEL 2185	PMA	RED	28/3/2025	7981555	=	0,17
LA32	EREZCANO CNEL 2185	PMA	RED	15/5/2025	8060330	=	0,23
LA32	EREZCANO CNEL 2185	PMA	RED	14/7/2025	8154375	=	0,34
LA32	EREZCANO CNEL 2161	PMA	RED	9/10/2025	8291947	=	0,14
LA32	EREZCANO CNEL 2185	PMA	RED	11/12/2025	8376090	=	0,21
LA33	OLIDEN GDOR 2941	PMA	RED	4/2/2025	7940393	<	0,10
LA33	OLIDEN GDOR 2941	PMA	RED	7/5/2025	8059737	=	0,11
LA33	OLIDEN GDOR 2941	PMA	RED	7/8/2025	8184789	=	0,23
LA33	OLIDEN GDOR 2941	PMA	RED	2/10/2025	8291183	=	0,13
LA33	OLIDEN GDOR 2941	PMA	RED	3/12/2025	8375574	<	0,10
LA34	PICHINCHA 3670	PMA	RED	17/3/2025	7982054	=	0,14
LA34	PICHINCHA 3670	PMA	RED	26/5/2025	8060869	<	0,10
LA34	PICHINCHA 3670	PMA	RED	26/8/2025	8185917	=	0,25
LA34	PICHINCHA 3670	PMA	RED	23/10/2025	8292615	=	0,15
LA34	PICHINCHA 3670	PMA	RED	22/12/2025	8376582	=	0,28
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	20/1/2025	7899904	<	0,10
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5874	PMA	RED	13/3/2025	7981796	<	0,10
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	20/5/2025	8060611	<	0,10
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	18/6/2025	8110562	=	0,37
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	11/7/2025	8154771	=	0,13
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	16/9/2025	8242555	=	0,13
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	19/11/2025	8325117	<	0,10
LMO23	CORONADO MARTIN (LMO) 5882	PMA	RED	17/12/2025	8376328	=	0,12
LMO25	BORDOY 1286	PMA	RED	3/1/2025	7889352	=	0,13
LMO25	BORDOY 1286	PMA	RED	4/2/2025	7940125	=	0,15
LMO25	BORDOY 1191	PMA	RED	3/4/2025	8021916	=	0,12
LMO25	BORDOY 1191	PMA	RED	21/5/2025	8060017	=	0,15
LMO25	BORDOY 1191	PMA	RED	17/6/2025	8110209	=	0,14
LMO25	BORDOY 1191	PMA	RED	6/8/2025	8184521	=	0,32

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Aluminio (mg/L)
LMO25	BORDOY 1191	PMA	RED	2/10/2025	8290861	=	0,11
LMO25	BORDOY 1191	PMA	RED	2/12/2025	8375346	<	0,10
LMO31	SPIRO 3659	PMA	RED	25/2/2025	7941271	=	0,14
LMO31	SPIRO 3659	PMA	RED	13/3/2025	7981797	=	0,14
LMO31	SPIRO 3659	PMA	RED	20/5/2025	8060612	=	0,10
LMO31	SPIRO 3659	PMA	RED	18/6/2025	8110563	=	0,28
LMO31	SPIRO 3659	PMA	RED	11/7/2025	8154772	=	0,13
LMO31	SPIRO 3659	PMA	RED	16/9/2025	8242556	=	0,12
LMO31	SPIRO 3659	PMA	RED	16/10/2025	8292323	=	0,10
LMO31	SPIRO 3659	PMA	RED	19/11/2025	8325118	<	0,10
LMO32	DEL CAMPO ESTANISLAO 6006	PMA	RED	25/2/2025	7941272	=	0,13
LMO32	DEL CAMPO ESTANISLAO 6022	PMA	RED	23/4/2025	8023476	<	0,10
LMO32	DEL CAMPO ESTANISLAO 6022	PMA	RED	20/5/2025	8060613	=	0,16
LMO32	DEL CAMPO ESTANISLAO 6022	PMA	RED	18/6/2025	8110564	=	0,23
LMO32	DEL CAMPO ESTANISLAO 6022	PMA	RED	11/7/2025	8154773	=	0,17
LMO32	DEL CAMPO ESTANISLAO 6022	PMA	RED	12/8/2025	8185660	=	0,15
LMO32	DEL CAMPO ESTANISLAO 6022	PMA	RED	16/9/2025	8242557	=	0,12
LMO32	DEL CAMPO ESTANISLAO 6022	PMA	RED	19/11/2025	8325119	=	0,12
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	21/1/2025	7899848	<	0,10
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	17/2/2025	7941170	=	0,11
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	17/3/2025	7981721	=	0,13
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	15/5/2025	8060511	<	0,10
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	11/7/2025	8154651	=	0,16
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	15/9/2025	8242480	=	0,15
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	15/10/2025	8292201	=	0,85
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	16/12/2025	8376254	=	0,11
LMO39	GARCIA MERAO 4951	PMA	RED	18/2/2025	7941173	<	0,10
LMO39	GARCIA MERAO 4835	PMA	RED	15/5/2025	8060514	=	0,13
LMO39	GARCIA MERAO 4835	PMA	RED	11/6/2025	8109737	=	0,25
LMO39	GARCIA MERAO 4835	PMA	RED	7/8/2025	8184704	=	0,19
LMO39	GARCIA MERAO 4835	PMA	RED	6/10/2025	8291076	=	0,11
LMO39	GARCIA MERAO 4835	PMA	RED	11/11/2025	8324059	=	0,10
LMO39	GARCIA MERAO 4835	PMA	RED	5/12/2025	8375501	<	0,10
LMO44	Manzanares 1775	PMA	RED	18/2/2025	7940856	<	0,10
LMO44	Manzanares 1775	PMA	RED	25/4/2025	8022910	<	0,10
LMO44	Manzanares 1769	PMA	RED	15/5/2025	8060201	<	0,10
LMO44	Manzanares 1769	PMA	RED	11/6/2025	8110219	<	0,10
LMO44	Manzanares 1775	PMA	RED	11/7/2025	8154253	=	0,22
LMO44	Manzanares 1769	PMA	RED	21/8/2025	8185388	<	0,10
LMO44	Manzanares 1769	PMA	RED	14/10/2025	8291970	<	0,10
LMO44	Manzanares 1769	PMA	RED	2/12/2025	8375270	<	0,10
LO_CI_TEMP	MOLINA ARROTEA CARLOS 249	PMA	RED	6/1/2025	7889909	=	0,16
LO_CI_TEMP	MOLINA ARROTEA CARLOS 249	PMA	RED	11/3/2025	7981199	=	0,30
LO_CI_TEMP	MOLINA ARROTEA CARLOS 249	PMA	RED	19/4/2025	8023358	<	0,10
LO_CI_TEMP	MOLINA ARROTEA CARLOS 249	PMA	RED	10/6/2025	8109963	=	0,19
LO_CI_TEMP	MOLINA ARROTEA CARLOS 249	PMA	RED	4/8/2025	8184945	=	0,20
LO_CI_TEMP	MOLINA ARROTEA CARLOS 249	PMA	RED	3/10/2025	8291398	=	0,20
LO13	ROSSO JACINTO 1370	PMA	RED	2/1/2025	7889217	=	0,14
LO13	ROSSO JACINTO 1370	PMA	RED	1/4/2025	8021767	=	0,10
LO13	ROSSO JACINTO 1370	PMA	RED	16/6/2025	8133653	=	0,19
LO13	ROSSO JACINTO 1370	PMA	RED	6/8/2025	8184415	=	0,31
LO13	ROSSO JACINTO 1370	PMA	RED	10/11/2025	8323770	=	0,12
LO14	AVELLANEDA NICOLAS 1060	PMA	RED	18/2/2025	7941180	=	0,16
LO14	AVELLANEDA NICOLAS 1041	PMA	RED	19/4/2025	8023363	<	0,10
LO14	AVELLANEDA NICOLAS 1041	PMA	RED	14/7/2025	8154662	=	0,26
LO14	AVELLANEDA NICOLAS 1060	PMA	RED	15/9/2025	8242490	=	0,17
LO14	AVELLANEDA NICOLAS 1060	PMA	RED	10/12/2025	8376264	=	0,20
LO18	COSQUIN 2648	PMA	RED	13/1/2025	7890581	=	0,13

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
LO18	COSQUIN 2672	PMA	RED	17/3/2025	7981625	<	0,10
LO18	COSQUIN 2648	PMA	RED	29/3/2025	8025183	=	0,55
LO18	COSQUIN 2672	PMA	RED	13/6/2025	8110392	<	0,10
LO18	COSQUIN 2672	PMA	RED	21/8/2025	8228821	<	0,10
LO18	COSQUIN 2613	PMA	RED	19/11/2025	8324837	<	0,10
LO24	SICILIANO LUIS 1638	PMA	RED	7/1/2025	7889598	=	0,17
LO24	SICILIANO LUIS 1638	PMA	RED	11/3/2025	7980983	=	0,20
LO24	SICILIANO LUIS 1638	PMA	RED	4/5/2025	8059657	=	0,12
LO24	SICILIANO LUIS 1638	PMA	RED	8/8/2025	8184709	=	0,29
LO24	SICILIANO LUIS 1638	PMA	RED	8/10/2025	8291097	=	0,10
LO24	SICILIANO LUIS 1638	PMA	RED	14/11/2025	8324064	=	0,15
LO38	TRIUNVIRATO 326	PMA	RED	13/4/2025	8022916	=	0,17
LO38	TRIUNVIRATO 322	PMA	RED	12/7/2025	8154259	=	0,15
LO38	TRIUNVIRATO 326	PMA	RED	9/9/2025	8242212	=	0,31
LO38	TRIUNVIRATO 322	PMA	RED	30/12/2025	8426567	=	0,11
LO39	SCHELL ALEJANDRO MONS 1456	PMA	RED	14/2/2025	7940863	<	0,10
LO39	SCHELL ALEJANDRO MONS 1421	PMA	RED	14/5/2025	8060208	=	0,17
LO39	SCHELL ALEJANDRO MONS 1471	PMA	RED	12/7/2025	8154260	=	0,26
LO39	SCHELL ALEJANDRO MONS 1471	PMA	RED	14/10/2025	8291840	=	0,25
LO39	SCHELL ALEJANDRO MONS 1421	PMA	RED	12/12/2025	8375986	=	0,14
LO41	BRAVO MARIO 418	PMA	RED	10/2/2025	7940316	<	0,10
LO41	BRAVO MARIO 450	PMA	RED	9/4/2025	8022162	<	0,10
LO41	BRAVO MARIO 450	PMA	RED	22/6/2025	8139109	<	0,10
LO41	BRAVO MARIO 418	PMA	RED	3/9/2025	8241737	=	0,11
LO41	BRAVO MARIO 418	PMA	RED	14/11/2025	8324067	=	0,22
LO48	LARREA JUAN 925	PMA	RED	17/3/2025	7981633	=	0,20
LO48	LARREA JUAN 925	PMA	RED	20/5/2025	8060423	=	0,17
LO48	LARREA JUAN 911	PMA	RED	14/7/2025	8154516	=	0,14
LO48	LARREA JUAN 925	PMA	RED	20/10/2025	8292076	=	0,21
LO48	LARREA JUAN 911	PMA	RED	11/12/2025	8376167	=	0,12
LO50	NUEVA YORK 796	PMA	RED	13/3/2025	7981460	=	0,11
LO50	NUEVA YORK 796	PMA	RED	14/5/2025	8060210	=	0,18
LO50	NUEVA YORK 424	PMA	RED	11/8/2025	8185259	=	0,27
LO50	NUEVA YORK 796	PMA	RED	14/10/2025	8291842	<	0,10
LO50	NUEVA YORK 796	PMA	RED	12/12/2025	8375988	<	0,10
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	13/1/2025	7890262	<	0,10
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	18/3/2025	7981972	=	0,72
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	26/5/2025	8060780	<	0,10
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	21/7/2025	8154976	=	0,18
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	6/8/2025	8184453	=	0,13
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	9/10/2025	8291745	<	0,10
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	7/11/2025	8323808	=	0,11
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	8/12/2025	8375912	<	0,10
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	20/1/2025	7904725	<	0,10
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	13/3/2025	7981385	=	0,11
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	12/5/2025	8060112	=	0,14
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	9/10/2025	8291746	=	0,35
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	18/12/2025	8376501	<	0,10
MN06	MARMOL 470	PMA	RED	13/1/2025	7890264	=	0,19
MN06	MARMOL 470	PMA	RED	13/3/2025	7981386	<	0,10
MN06	MARMOL 470	PMA	RED	7/6/2025	8110151	=	0,13
MN06	MARMOL 470	PMA	RED	9/10/2025	8291747	=	0,16
MN06	MARMOL 470	PMA	RED	8/12/2025	8375914	=	0,22
MN07	ALMAFUERTE 2737	PMA	RED	13/1/2025	7890265	=	0,12
MN07	ALMAFUERTE 2737	PMA	RED	3/4/2025	8022826	=	0,12
MN07	ALMAFUERTE 2737	PMA	RED	7/6/2025	8110152	=	0,12
MN07	ALMAFUERTE 2737	PMA	RED	11/8/2025	8185167	=	0,16
MN07	ALMAFUERTE 2737	PMA	RED	7/9/2025	8242141	=	0,25

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
MN08	COTAGAITA 3121	PMA	RED	27/2/2025	7982271	=	0,14
MN08	COTAGAITA 3121	PMA	RED	16/4/2025	8023689	<	0,10
MN08	COTAGAITA 3121	PMA	RED	13/6/2025	8110743	<	0,10
MN08	COTAGAITA 3121	PMA	RED	18/8/2025	8185839	<	0,10
MN08	COTAGAITA 3121	PMA	RED	17/10/2025	8292538	=	0,27
MN08	COTAGAITA 3121	PMA	RED	8/12/2025	8375916	=	0,10
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	26/2/2025	7942954	=	0,14
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	16/4/2025	8023691	<	0,10
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	13/6/2025	8110745	=	0,17
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	17/9/2025	8242732	=	0,49
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	3/11/2025	8325292	=	0,21
MN18	LYNCH 2845	PMA	RED	6/2/2025	7940340	=	0,32
MN18	LYNCH 2825	PMA	RED	5/4/2025	8022174	<	0,10
MN18	LYNCH 2845	PMA	RED	4/6/2025	8109757	=	0,14
MN18	LYNCH 2845	PMA	RED	5/8/2025	8184736	=	0,28
MN18	LYNCH 2825	PMA	RED	11/11/2025	8324091	=	0,10
MN21	ONCATIVO 556	PMA	RED	11/1/2025	7889828	=	0,13
MN21	ONCATIVO 556	PMA	RED	11/3/2025	7981132	=	0,21
MN21	ONCATIVO 556	PMA	RED	9/5/2025	8059823	<	0,10
MN21	ONCATIVO 556	PMA	RED	9/6/2025	8109896	=	0,19
MN21	ONCATIVO 556	PMA	RED	4/7/2025	8153731	=	0,16
MN21	ONCATIVO 556	PMA	RED	17/9/2025	8242735	=	0,21
MN21	ONCATIVO 556	PMA	RED	8/10/2025	8291317	=	0,12
MN21	ONCATIVO 556	PMA	RED	5/12/2025	8375654	=	0,10
MN22	CARABOBO 4654	PMA	RED	6/2/2025	7940342	<	0,10
MN22	CARABOBO 4590	PMA	RED	5/4/2025	8022176	<	0,10
MN22	CARABOBO 4654	PMA	RED	3/7/2025	8153529	=	0,23
MN22	CARABOBO 4590	PMA	RED	5/9/2025	8241751	=	0,17
MN22	CARABOBO 4590	PMA	RED	11/11/2025	8324093	<	0,10
MO09	BIANCO JOSE 1680	PMA	RED	17/1/2025	7904736	<	0,10
MO09	BIANCO JOSE 1680	PMA	RED	22/4/2025	8023697	<	0,10
MO09	BIANCO JOSE 1680	PMA	RED	22/6/2025	8110752	=	0,22
MO09	BIANCO JOSE 1680	PMA	RED	11/9/2025	8242739	=	0,12
MO09	BIANCO JOSE 1680	PMA	RED	6/11/2025	8325298	<	0,10
MO10	LOS ANDES 1144	PMA	RED	15/1/2025	7890129	<	0,10
MO10	LOS ANDES 1144	PMA	RED	22/4/2025	8022696	<	0,10
MO10	LOS ANDES 1144	PMA	RED	4/6/2025	8110071	=	0,10
MO10	LOS ANDES 1144	PMA	RED	11/9/2025	8242060	=	0,36
MO10	LOS ANDES 1144	PMA	RED	6/11/2025	8324444	<	0,10
MO13	LAS FLORES 381	PMA	RED	19/2/2025	7942962	<	0,10
MO13	LAS FLORES 343	PMA	RED	22/4/2025	8023699	<	0,10
MO13	LAS FLORES 343	PMA	RED	22/6/2025	8110754	=	0,39
MO13	LAS FLORES 343	PMA	RED	11/9/2025	8242741	=	0,32
MO13	LAS FLORES 343	PMA	RED	6/11/2025	8325300	<	0,10
MO14	FALUCHO 674	PMA	RED	6/2/2025	7940692	<	0,10
MO14	FALUCHO 674	PMA	RED	22/4/2025	8022698	<	0,10
MO14	FALUCHO 674	PMA	RED	7/7/2025	8154035	<	0,10
MO14	FALUCHO 674	PMA	RED	11/9/2025	8242062	=	0,25
MO14	FALUCHO 674	PMA	RED	3/12/2025	8375835	=	0,12
MO16	MITRE BARTOLOME GRAL 1301	PMA	RED	17/1/2025	7904361	<	0,10
MO16	MITRE BARTOLOME GRAL 1333	PMA	RED	12/4/2025	8023158	<	0,10
MO16	MITRE BARTOLOME GRAL 1333	PMA	RED	23/6/2025	8110405	=	0,18
MO16	MITRE BARTOLOME GRAL 1333	PMA	RED	6/8/2025	8185475	=	0,21
MO16	MITRE BARTOLOME GRAL 1301	PMA	RED	10/11/2025	8324850	=	0,11
MO21	BUFFANO A R 3275	PMA	RED	12/2/2025	7940210	=	0,12
MO21	BUFFANO A R 3275	PMA	RED	12/4/2025	8022018	<	0,10
MO21	BUFFANO A R 3275	PMA	RED	10/7/2025	8153375	=	0,23
MO21	BUFFANO A R 3275	PMA	RED	4/9/2025	8241642	=	0,12

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Aluminio (mg/L)
MO21	BUFFANO A R 3275	PMA	RED	7/11/2025	8323962	<	0,10
MO25	GRITO DE ALCORTA 3156	PMA	RED	12/2/2025	7940212	<	0,10
MO25	GRITO DE ALCORTA 3180	PMA	RED	12/4/2025	8022020	<	0,10
MO25	GRITO DE ALCORTA 3156	PMA	RED	10/7/2025	8153377	=	0,27
MO25	GRITO DE ALCORTA 3180	PMA	RED	4/9/2025	8241644	=	0,15
MO25	GRITO DE ALCORTA 3156	PMA	RED	4/12/2025	8375416	<	0,10
MO30	GASCON 46	PMA	RED	24/3/2025	7980894	=	0,18
MO30	RIVADAVIA AV (I) 215502	PMA	RED	22/5/2025	8059553	=	0,16
MO30	RIVADAVIA AV (I) 215502	PMA	RED	10/7/2025	8153379	=	0,22
MO30	RIVADAVIA AV (I) 215502	PMA	RED	6/10/2025	8290964	=	0,11
MO30	RIVADAVIA AV (I) 215502	PMA	RED	4/12/2025	8375418	<	0,10
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	12/2/2025	7940217	=	0,10
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	24/3/2025	7981648	<	0,10
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	6/5/2025	8060438	=	0,11
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	7/7/2025	8154043	=	0,10
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	6/8/2025	8185485	=	0,31
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	15/10/2025	8292091	<	0,10
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	6/11/2025	8324860	<	0,10
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	3/12/2025	8375843	<	0,10
MS02	QUINTANA 3213	PMA	RED	8/1/2025	7889831	=	0,19
MS02	QUINTANA 3213	PMA	RED	18/3/2025	7981918	=	0,15
MS02	QUINTANA 3213	PMA	RED	26/5/2025	8060726	=	0,11
MS02	QUINTANA 3213	PMA	RED	18/8/2025	8185781	=	0,10
MS02	QUINTANA 3213	PMA	RED	15/10/2025	8292457	=	0,21
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	17/1/2025	7904432	=	0,10
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	15/4/2025	8023611	<	0,10
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	13/6/2025	8110688	=	0,10
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	18/8/2025	8185784	=	0,12
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	15/10/2025	8292460	=	0,66
MS18	EL MACURU 162	PMA	RED	15/1/2025	7890607	<	0,10
MS18	EL MACURU 162	PMA	RED	17/3/2025	7981652	=	0,13
MS18	EL MACURU 154	PMA	RED	22/5/2025	8059695	=	0,21
MS18	EL MACURU 162	PMA	RED	10/6/2025	8110418	=	0,16
MS18	EL MACURU 162	PMA	RED	13/8/2025	8185488	=	0,10
MS18	EL MACURU 162	PMA	RED	21/10/2025	8312642	<	0,10
MS23	GUATEMALA 4486	PMA	RED	18/2/2025	7941103	<	0,10
MS23	GUATEMALA 4486	PMA	RED	22/4/2025	8056563	=	0,10
MS23	GUATEMALA 4486	PMA	RED	18/6/2025	8129449	<	0,10
MS23	GUATEMALA 4486	PMA	RED	15/9/2025	8242414	=	0,25
MS23	GUATEMALA 4486	PMA	RED	13/11/2025	8324866	<	0,10
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barri	PMA	RED	3/4/2025	8021843	<	0,10
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barri	PMA	RED	1/7/2025	8153209	<	0,10
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barri	PMA	RED	24/9/2025	8256046	=	0,32
QU01	185-CALLE 185 880	PMA	RED	2/1/2025	7889498	=	0,16
QU01	185-CALLE 185 899	PMA	RED	19/3/2025	7981676	=	0,22
QU01	185-CALLE 185 899	PMA	RED	6/5/2025	8059585	=	0,29
QU01	185-CALLE 185 899	PMA	RED	12/8/2025	8185512	=	0,23
QU01	185-CALLE 185 899	PMA	RED	1/10/2025	8291001	=	0,23
QU02	815-CALLE 815 2860	PMA	RED	17/1/2025	7890632	<	0,10
QU02	815-CALLE 815 2860	PMA	RED	6/3/2025	7980922	=	0,19
QU02	815-CALLE 815 2860	PMA	RED	25/4/2025	8023707	=	0,15
QU02	815-CALLE 815 2860	PMA	RED	17/6/2025	8110443	=	0,14
QU02	815-CALLE 815 2860	PMA	RED	6/8/2025	8184638	=	0,35
QU02	815-CALLE 815 2860	PMA	RED	14/10/2025	8292119	=	0,23
QU02	815-CALLE 815 2860	PMA	RED	26/11/2025	8324918	=	0,12
QU02	815-CALLE 815 2860	PMA	RED	15/12/2025	8376395	=	0,15
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	3/2/2025	7940247	=	0,14
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	23/5/2025	8067747	=	0,49

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	6/8/2025	8184643	=	0,26
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	15/9/2025	8242439	<	0,10
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	3/11/2025	8323998	=	0,14
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	10/2/2025	7940511	<	0,10
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	21/4/2025	8023561	<	0,10
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	6/6/2025	8109924	=	0,15
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	23/9/2025	8242625	<	0,10
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	6/11/2025	8324258	=	0,32
QU17	115-MONTEVIDEO 1621	PMA	RED	17/2/2025	7941129	=	0,18
QU17	115-MONTEVIDEO 1621	PMA	RED	19/2/2025	7971410	<	0,10
QU17	115-MONTEVIDEO 1621	PMA	RED	1/4/2025	8022065	=	0,31
QU17	115-MONTEVIDEO 1621	PMA	RED	11/7/2025	8154567	=	0,30
QU17	115-MONTEVIDEO 1621	PMA	RED	2/9/2025	8241677	=	0,25
QU17	115-MONTEVIDEO 1621	PMA	RED	12/12/2025	8397502	=	0,17
QU29	412-FLORIDA 776	PMA	RED	17/2/2025	7940920	=	0,26
QU29	412-FLORIDA 776	PMA	RED	24/4/2025	8023714	=	0,13
QU29	412-FLORIDA 776	PMA	RED	22/7/2025	8189822	=	0,66
QU29	412-FLORIDA 776	PMA	RED	24/9/2025	8242754	<	0,10
QU29	412-FLORIDA 782	PMA	RED	28/11/2025	8378063	=	0,12
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3772	PMA	RED	6/3/2025	7980929	=	0,15
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3814	PMA	RED	26/5/2025	8106608	=	0,10
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3814	PMA	RED	1/7/2025	8153424	=	0,25
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3772	PMA	RED	14/10/2025	8292127	=	0,47
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3722	PMA	RED	19/11/2025	8347176	=	0,12
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3722	PMA	RED	1/12/2025	8375452	=	0,10
QU35	MENDOZA 1586	PMA	RED	12/3/2025	7981492	<	0,10
QU35	MENDOZA 1586	PMA	RED	23/5/2025	8060816	=	0,10
QU35	MENDOZA 1586	PMA	RED	10/7/2025	8154309	=	0,12
QU35	MENDOZA 1556	PMA	RED	20/10/2025	8292564	<	0,10
QU35	MENDOZA 1556	PMA	RED	10/12/2025	8376028	=	0,21
SA02	HUMBOLDT 573	PMA	RED	7/1/2025	7889860	<	0,10
SA02	HUMBOLDT 486	PMA	RED	10/2/2025	7941011	=	0,11
SA02	HUMBOLDT 486	PMA	RED	7/4/2025	8022419	<	0,10
SA02	HUMBOLDT 486	PMA	RED	23/5/2025	8060896	=	0,12
SA02	HUMBOLDT 486	PMA	RED	9/7/2025	8154439	=	0,31
SA02	HUMBOLDT 486	PMA	RED	6/8/2025	8184908	=	0,20
SA02	HUMBOLDT 486	PMA	RED	19/10/2025	8292650	<	0,10
SA02	HUMBOLDT 421	PMA	RED	12/12/2025	8376115	<	0,10
SA06	AZURDUY JUANA 2525	PMA	RED	7/1/2025	7889863	=	0,11
SA06	AZURDUY JUANA 2525	PMA	RED	15/3/2025	7981584	=	0,14
SA06	AZURDUY JUANA 2505	PMA	RED	7/4/2025	8022422	<	0,10
SA06	AZURDUY JUANA 2525	PMA	RED	20/6/2025	8141719	=	0,29
SA06	AZURDUY JUANA 2525	PMA	RED	27/7/2025	8195605	=	0,10
SA06	AZURDUY JUANA 2525	PMA	RED	3/9/2025	8241918	=	0,10
SA06	AZURDUY JUANA 2525	PMA	RED	24/11/2025	8325399	<	0,10
SA06	AZURDUY JUANA 2525	PMA	RED	12/12/2025	8376118	<	0,10
SA07	DONADO 1494	PMA	RED	12/1/2025	7890526	<	0,10
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	21/3/2025	7982085	=	0,11
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	9/4/2025	8023088	<	0,10
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	5/6/2025	8109932	=	0,17
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	22/8/2025	8185954	=	0,20
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	11/9/2025	8242345	=	0,21
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	3/11/2025	8324266	=	0,23
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	20/12/2025	8376613	=	0,10
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	23/1/2025	7904817	<	0,10
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	22/2/2025	7943032	<	0,10
SA17	CONGRESO AV 5754	PMA	RED	13/3/2025	7981497	<	0,10
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	2/4/2025	8022289	<	0,10

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Aluminio (mg/L)
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	30/6/2025	8155480	=	0,57
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	27/7/2025	8195607	=	0,10
SA17	CONGRESO AV 5754	PMA	RED	1/9/2025	8241811	<	0,10
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	20/10/2025	8317064	=	0,11
SA17	CONGRESO AV 5754	PMA	RED	11/12/2025	8376033	<	0,10
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	14/1/2025	7890404	=	0,13
SA19	BLANCO ENCALADA 3140	PMA	RED	11/3/2025	7981062	=	0,13
SA19	BLANCO ENCALADA 3140	PMA	RED	20/4/2025	8023774	<	0,10
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	8/6/2025	8110267	=	0,10
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	3/8/2025	8184806	=	0,37
SA19	BLANCO ENCALADA 3140	PMA	RED	17/9/2025	8242814	=	0,21
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	12/11/2025	8324693	=	0,10
SA19	BLANCO ENCALADA 3170	PMA	RED	7/12/2025	8375584	=	0,10
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	12/2/2025	7940935	=	0,16
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	11/3/2025	7981065	=	0,17
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	19/5/2025	8060877	<	0,10
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	9/7/2025	8154320	=	0,31
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	3/8/2025	8184809	=	0,34
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	8/9/2025	8242266	=	0,12
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	17/10/2025	8292628	=	0,13
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	12/11/2025	8324696	<	0,10
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	6/1/2025	7889739	<	0,10
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	25/3/2025	7981507	<	0,10
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	8/5/2025	8059760	<	0,10
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	18/7/2025	8154324	=	0,12
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	8/9/2025	8241820	=	0,25
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	9/12/2025	8375591	<	0,10
SF03	CANE MIGUEL 3049	PMA	RED	6/1/2025	7889741	<	0,10
SF03	CANE MIGUEL 3039	PMA	RED	25/3/2025	7981509	<	0,10
SF03	CANE MIGUEL 3039	PMA	RED	8/5/2025	8059762	<	0,10
SF03	CANE MIGUEL 3039	PMA	RED	19/9/2025	8274178	<	0,10
SF03	CANE MIGUEL 3039	PMA	RED	7/10/2025	8291234	=	0,21
SF03	CANE MIGUEL 3039	PMA	RED	9/12/2025	8375593	<	0,10
SF07	RODRIGUEZ MARTIN 1958	PMA	RED	18/2/2025	7940944	<	0,10
SF07	RODRIGUEZ MARTIN 1958	PMA	RED	7/4/2025	8022303	<	0,10
SF07	RODRIGUEZ MARTIN 1958	PMA	RED	23/6/2025	8110279	=	0,36
SF07	RODRIGUEZ MARTIN 1958	PMA	RED	12/8/2025	8184818	=	0,18
SF07	RODRIGUEZ MARTIN 1958	PMA	RED	14/10/2025	8291904	=	0,14
SF10	GUIDO SPANO 3640	PMA	RED	13/2/2025	7940425	=	0,17
SF10	GUIDO SPANO 3650	PMA	RED	14/4/2025	8022984	=	0,10
SF10	GUIDO SPANO 3650	PMA	RED	11/7/2025	8153654	=	0,15
SF10	GUIDO SPANO 3650	PMA	RED	13/9/2025	8242278	=	0,35
SF10	GUIDO SPANO 3650	PMA	RED	14/11/2025	8324175	=	0,12
SF12	AVELLANEDA NICOLAS AV 5845	PMA	RED	18/2/2025	7940948	<	0,10
SF12	AVELLANEDA NICOLAS AV 5701	PMA	RED	8/5/2025	8059769	<	0,10
SF12	AVELLANEDA NICOLAS AV 5625	PMA	RED	18/7/2025	8154333	=	0,10
SF12	AVELLANEDA NICOLAS AV 5701	PMA	RED	9/9/2025	8241829	=	0,34
SF12	AVELLANEDA NICOLAS AV 5845	PMA	RED	19/11/2025	8324709	<	0,10
SF13	DEL ARCA 702	PMA	RED	2/3/2025	7981079	=	0,15
SF13	DEL ARCA 702	PMA	RED	15/5/2025	8060290	<	0,10
SF13	DEL ARCA 702	PMA	RED	11/7/2025	8153656	=	0,14
SF13	DEL ARCA 853	PMA	RED	13/9/2025	8242280	=	0,18
SF13	DEL ARCA 702	PMA	RED	14/11/2025	8324177	=	0,22
SF13	DEL ARCA 702	PMA	RED	17/12/2025	8376052	<	0,10
SI01	CORONADO MARTIN 1021	PMA	RED	6/1/2025	7890167	=	0,10
SI01	CORONADO MARTIN 1021	PMA	RED	2/3/2025	7981331	=	0,17
SI01	CORONADO MARTIN 1021	PMA	RED	19/6/2025	8110097	=	0,24
SI01	CORONADO MARTIN 1021	PMA	RED	13/8/2025	8185109	=	0,27

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Aluminio (mg/L)
SI01	CORONADO MARTIN 1021	PMA	RED	11/10/2025	8291649	<	0,10
SI03	SARMIENTO 1492	PMA	RED	6/1/2025	7890169	<	0,10
SI03	SARMIENTO 1391	PMA	RED	14/4/2025	8022731	<	0,10
SI03	SARMIENTO 1391	PMA	RED	19/6/2025	8110099	=	0,14
SI03	SARMIENTO 1391	PMA	RED	13/8/2025	8185111	=	0,32
SI03	SARMIENTO 1391	PMA	RED	18/11/2025	8324477	<	0,10
SI13	BRASIL 535	PMA	RED	15/2/2025	7940721	<	0,10
SI13	BRASIL 535	PMA	RED	15/5/2025	8060065	=	0,16
SI13	BRASIL 535	PMA	RED	3/7/2025	8154079	=	0,26
SI13	BRASIL 511	PMA	RED	11/9/2025	8242091	=	0,14
SI13	BRASIL 511	PMA	RED	11/12/2025	8375865	<	0,10
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	2/3/2025	7981339	=	0,17
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	15/5/2025	8060067	=	0,15
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	3/7/2025	8154081	=	0,46
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	11/10/2025	8291657	<	0,10
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	11/12/2025	8375867	<	0,10
SI20	RODRIGUEZ MARTIN 348	PMA	RED	24/1/2025	7890533	<	0,10
SI20	RODRIGUEZ MARTIN 348	PMA	RED	17/4/2025	8023095	<	0,10
SI20	RODRIGUEZ MARTIN 348	PMA	RED	22/6/2025	8110359	=	0,30
SI20	RODRIGUEZ MARTIN 337	PMA	RED	19/9/2025	8242352	<	0,10
SI20	RODRIGUEZ MARTIN 348	PMA	RED	27/11/2025	8324781	<	0,10
SI21	AZCUENAGA 2863	PMA	RED	2/3/2025	7981341	=	0,34
SI21	AZCUENAGA 2783	PMA	RED	15/5/2025	8060069	=	0,19
SI21	AZCUENAGA 2863	PMA	RED	13/8/2025	8185119	=	0,19
SI21	AZCUENAGA 2863	PMA	RED	11/10/2025	8291659	<	0,10
SI21	AZCUENAGA 2863	PMA	RED	11/12/2025	8375869	<	0,10
SI22	MISIONES 984	PMA	RED	6/1/2025	7890179	=	0,11
SI22	MISIONES 1006	PMA	RED	28/3/2025	7982017	<	0,10
SI22	MISIONES 1006	PMA	RED	29/8/2025	8185880	=	0,31
SI22	MISIONES 1006	PMA	RED	22/10/2025	8292578	<	0,10
SI23	BATALLA DEL PAGO LARGO 2750	PMA	RED	1/2/2025	7940159	<	0,10
SI23	BATALLA DEL PAGO LARGO 2750	PMA	RED	2/4/2025	8021947	<	0,10
SI23	BATALLA DEL PAGO LARGO 2750	PMA	RED	2/7/2025	8153308	=	0,36
SI23	BATALLA DEL PAGO LARGO 2750	PMA	RED	2/9/2025	8241590	=	0,34
SI23	BATALLA DEL PAGO LARGO 2750	PMA	RED	6/11/2025	8323911	=	0,15
SM01	214-HERNANDEZ 1370	PMA	RED	9/1/2025	7889868	<	0,10
SM01	214-HERNANDEZ 1370	PMA	RED	17/3/2025	7981878	<	0,10
SM01	214-HERNANDEZ 1370	PMA	RED	10/5/2025	8059863	<	0,10
SM01	214-HERNANDEZ 1370	PMA	RED	11/7/2025	8154855	=	0,20
SM01	214-HERNANDEZ 1343	PMA	RED	2/9/2025	8241923	=	0,30
SM03	51-REPUBLICA 7390	PMA	RED	16/1/2025	7899976	<	0,10
SM03	51-REPUBLICA 7390	PMA	RED	10/3/2025	7981173	<	0,10
SM03	51-REPUBLICA 7390	PMA	RED	18/5/2025	8060686	<	0,10
SM03	51-REPUBLICA 7390	PMA	RED	5/7/2025	8163563	<	0,10
SM03	51-REPUBLICA 7390	PMA	RED	10/7/2025	8162345	=	0,26
SM03	51-REPUBLICA 7464	PMA	RED	14/10/2025	8292414	=	0,10
SM03	51-REPUBLICA 746	PMA	RED	4/12/2025	8375696	<	0,10
SM05	122-PAZ GRAL 1343	PMA	RED	16/1/2025	7899978	<	0,10
SM05	122-PAZ GRAL 1343	PMA	RED	10/3/2025	7981175	<	0,10
SM05	122-PAZ GRAL 1343	PMA	RED	7/8/2025	8184919	=	0,36
SM05	122-PAZ GRAL 1343	PMA	RED	14/10/2025	8292416	=	0,28
SM05	122-PAZ GRAL 1434	PMA	RED	4/12/2025	8375698	<	0,10
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	9/1/2025	7889872	=	0,10
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	14/4/2025	8023569	=	0,24
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	4/6/2025	8109940	=	0,11
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	21/8/2025	8185744	=	0,11
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	6/10/2025	8291361	=	0,21
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	4/12/2025	8375699	<	0,10

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Aluminio (mg/L)
SM10	75-CONGRESO 4402	PMA	RED	7/2/2025	7940529	<	0,10
SM10	75-CONGRESO 4402	PMA	RED	14/4/2025	8023571	<	0,10
SM10	75-CONGRESO 4402	PMA	RED	4/6/2025	8109942	<	0,10
SM10	75-CONGRESO 4402	PMA	RED	11/9/2025	8242636	=	0,24
SM10	75-CONGRESO 4402	PMA	RED	10/11/2025	8324276	<	0,10
SM11	152-BIARRITZ 3244	PMA	RED	17/1/2025	7904457	<	0,10
SM11	152-BIARRITZ 3244	PMA	RED	10/3/2025	7981223	=	0,11
SM11	152-BIARRITZ 3244	PMA	RED	21/5/2025	8060750	=	0,12
SM11	152-BIARRITZ 3244	PMA	RED	10/8/2025	8184972	=	0,36
SM11	152-BIARRITZ 3244	PMA	RED	16/10/2025	8292485	<	0,10
SM11	152-BIARRITZ 3244	PMA	RED	6/12/2025	8375748	=	0,10
SM13	62-FALCON R 3443	PMA	RED	17/1/2025	7904459	<	0,10
SM13	62-FALCON R 3443	PMA	RED	6/4/2025	8022527	<	0,10
SM13	62-FALCON R 3443	PMA	RED	17/6/2025	8110711	=	0,15
SM13	62-FALCON R 3443	PMA	RED	10/8/2025	8184974	=	0,23
SM13	62-FALCON R 3443	PMA	RED	16/10/2025	8292487	<	0,10
SM13	62-FALCON R 3443	PMA	RED	6/12/2025	8375750	<	0,10
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	21/2/2025	7942922	=	0,43
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	6/4/2025	8022529	<	0,10
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	17/6/2025	8110713	<	0,10
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	10/8/2025	8184976	=	0,30
SM15	106-PELLEGRINI 5535	PMA	RED	27/11/2025	8325260	<	0,10
SM17	45-GUIRALDES 1489	PMA	RED	20/2/2025	7942860	=	0,11
SM17	45-GUIRALDES 1489	PMA	RED	10/5/2025	8059870	=	0,13
SM17	45-GUIRALDES 1489	PMA	RED	5/7/2025	8163564	=	0,17
SM17	45-GUIRALDES 1489	PMA	RED	10/7/2025	8162351	=	0,16
SM17	45-GUIRALDES 1428	PMA	RED	2/9/2025	8241930	=	0,30
SM17	45-GUIRALDES 1489	PMA	RED	22/11/2025	8325198	<	0,10
SM19	52-BELGRANO 4840	PMA	RED	10/2/2025	7940584	<	0,10
SM19	52-BELGRANO 4840	PMA	RED	21/4/2025	8023641	<	0,10
SM19	52-BELGRANO 4854	PMA	RED	25/6/2025	8147163	=	0,46
SM19	52-BELGRANO 4840	PMA	RED	12/9/2025	8242700	=	0,14
SM19	52-BELGRANO 4840	PMA	RED	12/11/2025	8324332	<	0,10
SM22	D 172-SOTO Y CALVO 3476	PMA	RED	10/2/2025	7940586	=	0,11
SM22	D 172-SOTO Y CALVO 3439	PMA	RED	6/4/2025	8022532	<	0,10
SM22	D 172-SOTO Y CALVO 3439	PMA	RED	21/5/2025	8060757	=	0,12
SM22	D 172-SOTO Y CALVO 3439	PMA	RED	3/7/2025	8153882	=	0,25
SM22	D 172-SOTO Y CALVO 3439	PMA	RED	10/8/2025	8184489	=	0,30
SM22	D 172-SOTO Y CALVO 3439	PMA	RED	12/9/2025	8242702	=	0,14
SM22	D 172-SOTO Y CALVO 3439	PMA	RED	12/11/2025	8324334	<	0,10
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	19/3/2025	7981950	=	0,17
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	11/5/2025	8059922	=	0,10
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	11/7/2025	8154935	=	0,48
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	5/9/2025	8241984	=	0,32
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	8/10/2025	8291465	=	0,19
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	27/11/2025	8325264	<	0,10
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	3/1/2025	7889379	=	0,10
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	14/3/2025	7981686	=	0,12
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	3/6/2025	8109599	=	0,18
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	12/8/2025	8185523	=	0,27
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	2/10/2025	8290892	=	0,16
TR02	TRES LOMAS 531	PMA	RED	14/1/2025	7890642	=	0,12
TR02	TRES LOMAS 531	PMA	RED	13/3/2025	7980842	=	0,11
TR02	TRES LOMAS 531	PMA	RED	15/5/2025	8060477	<	0,10
TR02	TRES LOMAS 531	PMA	RED	4/8/2025	8184559	=	0,48
TR02	TRES LOMAS 531	PMA	RED	14/11/2025	8324945	=	0,19
TR03	BESARES 2416	PMA	RED	3/1/2025	7889381	=	0,12
TR03	BESARES 2416	PMA	RED	14/2/2025	7941136	<	0,10

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Aluminio (mg/L)
TR03	BESARES 2416	PMA	RED	11/4/2025	8023212	<	0,10
TR03	BESARES 2416	PMA	RED	3/6/2025	8109601	=	0,11
TR03	BESARES 2416	PMA	RED	10/9/2025	8242447	=	0,29
TR03	BESARES 2416	PMA	RED	3/11/2025	8323915	=	0,21
TR09	MORENO MARIANO 5725	PMA	RED	6/2/2025	7940165	<	0,10
TR09	MORENO MARIANO 5725	PMA	RED	11/4/2025	8023214	<	0,10
TR09	MORENO MARIANO 5725	PMA	RED	2/7/2025	8153314	=	0,26
TR09	MORENO MARIANO 5725	PMA	RED	18/9/2025	8242449	<	0,10
TR09	MORENO MARIANO 5725	PMA	RED	3/11/2025	8323917	=	0,20
TR14	CUELI 1973	PMA	RED	4/2/2025	7940167	<	0,10
TR14	CUELI 1973	PMA	RED	11/4/2025	8023216	<	0,10
TR14	CUELI 1973	PMA	RED	2/7/2025	8153316	=	0,23
TR14	CUELI 1973	PMA	RED	10/9/2025	8242451	=	0,35
TR14	CUELI 1973	PMA	RED	2/12/2025	8375371	=	0,10
TR15	LARRALDE G INT 1547	PMA	RED	14/2/2025	7941142	<	0,10
TR15	LARRALDE G INT 1547	PMA	RED	4/5/2025	8059507	<	0,10
TR15	LARRALDE G INT 1547	PMA	RED	11/7/2025	8154580	=	0,15
TR15	LARRALDE G INT 1547	PMA	RED	2/9/2025	8241599	=	0,30
TR15	LARRALDE G INT 1547	PMA	RED	3/11/2025	8323920	=	0,15
TR15	LARRALDE G INT 1547	PMA	RED	11/12/2025	8376227	<	0,10
TR17	POGGIO 1320	PMA	RED	6/2/2025	7940169	<	0,10
TR17	POGGIO 1320	PMA	RED	15/5/2025	8060484	=	0,12
TR17	POGGIO 1320	PMA	RED	2/7/2025	8153318	=	0,23
TR17	POGGIO 1320	PMA	RED	13/10/2025	8292137	=	0,19
TR17	POGGIO 1320	PMA	RED	2/12/2025	8375373	<	0,10
TR19	JUAN XXIII 1045	PMA	RED	14/1/2025	7899845	<	0,10
TR19	JUAN XXIII 1061	PMA	RED	14/2/2025	7941144	<	0,10
TR19	JUAN XXIII 1045	PMA	RED	11/4/2025	8023219	<	0,10
TR19	JUAN XXIII 1045	PMA	RED	11/7/2025	8154582	=	0,27
TR19	JUAN XXIII 1045	PMA	RED	2/10/2025	8290901	=	0,15
TR19	JUAN XXIII 1045	PMA	RED	11/12/2025	8376229	<	0,10
TR20	BEAZLEY 775	PMA	RED	21/3/2025	8010458	<	0,10
TR20	BEAZLEY 775	PMA	RED	15/5/2025	8060486	=	0,22
TR20	BEAZLEY 775	PMA	RED	2/7/2025	8153320	=	0,20
TR20	BEAZLEY 712	PMA	RED	13/10/2025	8292139	=	0,17
TR20	BEAZLEY 775	PMA	RED	2/12/2025	8375375	=	0,10
TR21	PELLEGRINI CARLOS 4465	PMA	RED	14/3/2025	7981697	=	0,17
TR21	PELLEGRINI CARLOS 4465	PMA	RED	4/5/2025	8059511	<	0,10
TR21	PELLEGRINI CARLOS 4465	PMA	RED	11/6/2025	8110464	=	0,12
TR21	PELLEGRINI CARLOS 4465	PMA	RED	12/8/2025	8185534	=	0,26
TR21	PELLEGRINI CARLOS 4465	PMA	RED	2/10/2025	8290903	<	0,10
TR21	PELLEGRINI CARLOS 4465	PMA	RED	11/12/2025	8376231	<	0,10
TR22	VILLEGAS GRAL 4468	PMA	RED	5/3/2025	7980853	=	0,10
TR22	VILLEGAS GRAL 4468	PMA	RED	15/5/2025	8060488	=	0,10
TR22	VILLEGAS GRAL 4468	PMA	RED	4/8/2025	8184570	=	0,43
TR22	VILLEGAS GRAL 4468	PMA	RED	26/9/2025	8283781	=	0,22
TR22	VILLEGAS GRAL 4468	PMA	RED	13/10/2025	8292141	=	0,21
TR23	THOMPSON MARIQUITA 835	PMA	RED	21/1/2025	7889523	<	0,10
TR23	THOMPSON MARIQUITA 835	PMA	RED	13/3/2025	7980946	=	0,12
TR23	THOMPSON MARIQUITA 835	PMA	RED	21/5/2025	8060833	=	0,15
TR23	THOMPSON MARIQUITA 835	PMA	RED	10/8/2025	8184668	=	0,40
TR23	THOMPSON MARIQUITA 835	PMA	RED	16/10/2025	8292579	<	0,10
TR25	EVA PERON 10167	PMA	RED	21/1/2025	7889525	<	0,10
TR25	EVA PERON 10167	PMA	RED	6/4/2025	8022088	<	0,10
TR25	EVA PERON 10167	PMA	RED	17/6/2025	8110787	<	0,10
TR25	EVA PERON 10189	PMA	RED	10/8/2025	8184670	=	0,35
TR25	EVA PERON 10167	PMA	RED	19/11/2025	8325333	<	0,10
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	13/1/2025	7890423	<	0,10

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Aluminio	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Aluminio (mg/L)
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	5/3/2025	7980791	<	0,10
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	10/6/2025	8110286	<	0,10
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	4/8/2025	8184491	=	0,46
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	1/12/2025	8375316	<	0,10
VL06	SAN LORENZO 3224	PMA	RED	13/1/2025	7890425	=	0,10
VL06	SAN LORENZO 3224	PMA	RED	3/4/2025	8021859	<	0,10
VL06	SAN LORENZO 3224	PMA	RED	10/6/2025	8110288	<	0,10
VL06	SAN LORENZO 3218	PMA	RED	4/8/2025	8184493	=	0,42
VL06	SAN LORENZO 3224	PMA	RED	13/11/2025	8324714	<	0,10
VL10	SANTA ROSA 3241	PMA	RED	13/2/2025	7940957	<	0,10
VL10	SANTA ROSA 3241	PMA	RED	3/4/2025	8021863	<	0,10
VL10	SANTA ROSA 3241	PMA	RED	10/7/2025	8154343	=	0,17
VL10	SANTA ROSA 3241	PMA	RED	22/9/2025	8275247	=	0,16
VL10	SANTA ROSA 3241	PMA	RED	13/11/2025	8324718	=	0,21
VL12	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE 2566	PMA	RED	13/2/2025	7940959	<	0,10
VL12	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE 2566	PMA	RED	6/5/2025	8059442	=	0,11
VL12	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE 2566	PMA	RED	10/7/2025	8154345	=	0,21
VL12	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE 2566	PMA	RED	22/9/2025	8275248	=	0,16
VL12	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE 2566	PMA	RED	1/10/2025	8290813	=	0,11
VL12	LAPRIDA FRANCISCO NARCISO DE 2566	PMA	RED	13/11/2025	8324720	<	0,10
VL14	QUERIDO NATALIO CJAL 2310	PMA	RED	18/1/2025	7889879	<	0,10
VL14	QUERIDO NATALIO CJAL 2310	PMA	RED	10/3/2025	7981183	<	0,10
VL14	QUERIDO NATALIO CJAL 2310	PMA	RED	12/6/2025	8110655	<	0,10
VL14	QUERIDO NATALIO CJAL 2310	PMA	RED	7/8/2025	8184927	=	0,37
VL14	QUERIDO NATALIO CJAL 2310	PMA	RED	14/10/2025	8292424	=	0,11
VL14	QUERIDO NATALIO CJAL 2310	PMA	RED	22/11/2025	8325202	<	0,10
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	13/3/2025	7981529	=	0,10
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	6/5/2025	8059444	=	0,17
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	10/7/2025	8154347	=	0,45
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	22/9/2025	8275250	=	0,20
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	16/12/2025	8397949	=	0,15

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Color aparente	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Color aparente (unidades)
EE26	LAURE 415	PMA	RED	4/2/2025	7939984	<	5
EE26	LAURE 465	PMA	RED	7/4/2025	8021721	=	15
EE26	LAURE 465	PMA	RED	5/6/2025	8109488	<	5
EE26	LAURE 419	PMA	RED	1/8/2025	8184380	<	5
EE26	LAURE 419	PMA	RED	3/10/2025	8290656	<	5
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	6/1/2025	7889803	<	5
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	11/3/2025	7981111	=	15
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	3/4/2025	8022362	<	5
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	5/6/2025	8109874	<	5
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	4/7/2025	8153706	<	5
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	3/9/2025	8241862	<	5
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	5/11/2025	8324209	<	5
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	4/12/2025	8375633	<	5
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	19/1/2025	7904833	<	5
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	19/3/2025	7982071	=	15
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	21/4/2025	8023786	<	5
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	17/6/2025	8110838	<	5
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	22/8/2025	8185934	<	5
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	17/9/2025	8242828	<	5
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	19/11/2025	8325386	<	5
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	21/12/2025	8376599	<	5
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	15/1/2025	7890445	=	15
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	14/2/2025	7940973	<	5
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	23/4/2025	8056557	<	5
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	26/5/2025	8060314	<	5
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	11/7/2025	8154360	<	5
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	9/9/2025	8242304	<	5
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	12/10/2025	8291933	<	5
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	21/12/2025	8376076	<	5
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	25/2/2025	7943051	<	5
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	19/3/2025	7982074	=	15
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	25/5/2025	8060889	<	5
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	20/6/2025	8110841	<	5
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	22/8/2025	8185937	<	5
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	17/9/2025	8242831	<	5
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	15/10/2025	8292153	<	5
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	19/11/2025	8325389	<	5
LMO03	EL DORADO 935	PMA	RED	2/1/2025	7889202	=	15
LMO03	EL DORADO 935	PMA	RED	3/2/2025	7940001	<	5
LMO03	EL DORADO 935	PMA	RED	25/4/2025	8056666	<	5
LMO03	EL DORADO 935	PMA	RED	24/6/2025	8110324	<	5
LMO03	EL DORADO 935	PMA	RED	10/7/2025	8154377	<	5
LMO03	EL DORADO 935	PMA	RED	22/8/2025	8234571	<	5
LMO03	EL DORADO 1030	PMA	RED	14/10/2025	8291949	<	5
LMO03	EL DORADO 935	PMA	RED	15/12/2025	8376092	<	5
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA_NP	RED	10/1/2025	7889228	=	15
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA_NP	RED	6/5/2025	8059390	<	5
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA_NP	RED	4/8/2025	8184439	<	5
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	10/1/2025	7889731	<	5
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	21/3/2025	7982058	=	15
SA18	SAN ISIDRO AV 4384	PMA	RED	8/4/2025	8022968	<	5
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	6/6/2025	8109820	<	5
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	12/7/2025	8155062	<	5
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	8/9/2025	8242262	<	5
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	7/11/2025	8324159	<	5
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	22/12/2025	8376586	<	5
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	12/2/2025	7940935	=	5

	CALIDAD DE AGUA	Informe de Niveles de Servicio
aysa	Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes	Año 2025
	Parámetro: Color aparente	INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Color aparente (unidades)
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	11/3/2025	7981065	=	15
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	19/5/2025	8060877	<	5
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	9/7/2025	8154320	<	5
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	3/8/2025	8184809	<	5
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	8/9/2025	8242266	<	5
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	17/10/2025	8292628	<	5
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	12/11/2025	8324696	<	5
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	2/3/2025	7981339	<	5
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	15/5/2025	8060067	<	5
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	3/7/2025	8154081	=	15
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	11/10/2025	8291657	<	5
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	11/12/2025	8375867	<	5
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 964	PMA	RED	18/1/2025	7899926	<	5
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 883	PMA	RED	10/3/2025	7980932	<	5
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 964	PMA	RED	24/5/2025	8060636	=	15
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 964	PMA	RED	12/8/2025	8184654	<	5
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 964	PMA	RED	28/10/2025	8292347	<	5
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 964	PMA	RED	5/12/2025	8375455	<	5
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	13/3/2025	7981529	=	25
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	6/5/2025	8059444	<	5
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	10/7/2025	8154347	<	5
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	22/9/2025	8275250	<	5
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	16/12/2025	8397949	<	5

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Hierro Total**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Hierro Total (mg/L)
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1167	PMA	RED	7/4/2025	8022316	<	0,05
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1167	PMA	RED	4/6/2025	8109846	=	0,07
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1167	PMA	RED	4/8/2025	8184831	<	0,05
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1145	PMA	RED	7/10/2025	8291250	=	0,38
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1145	PMA	RED	2/12/2025	8375609	<	0,05
CA16	PUAN 360	PMA	RED	2/1/2025	7889318	<	0,05
CA16	PUAN 360	PMA	RED	5/3/2025	7980809	<	0,05
CA16	PUAN 360	PMA	RED	1/4/2025	8021876	<	0,05
CA16	PUAN 360	PMA	RED	3/5/2025	8059452	<	0,05
CA16	PUAN 360	PMA	RED	2/6/2025	8109567	=	0,11
CA16	PUAN 360	PMA	RED	5/8/2025	8184509	<	0,05
CA16	PUAN 360	PMA	RED	2/9/2025	8241560	<	0,05
CA16	PUAN 360	PMA	RED	1/11/2025	8323864	<	0,05
CA36	LAS HERAS GRAL AV 3357	PMA	RED	8/2/2025	7940186	<	0,05
CA36	LAS HERAS GRAL AV 3483	PMA	RED	17/3/2025	7981912	<	0,05
CA36	LAS HERAS GRAL AV 3483	PMA	RED	22/5/2025	8060719	<	0,05
CA36	LAS HERAS GRAL AV 3483	PMA	RED	22/7/2025	8154889	=	0,14
CA36	LAS HERAS GRAL AV 3483	PMA	RED	5/8/2025	8185774	<	0,05
CA36	LAS HERAS GRAL AV 3483	PMA	RED	15/9/2025	8242664	<	0,05
CA36	LAS HERAS GRAL AV 3483	PMA	RED	14/10/2025	8292447	<	0,05
CA36	LAS HERAS GRAL AV 3345	PMA	RED	13/12/2025	8376439	<	0,05
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	18/1/2025	7904782	<	0,05
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	22/2/2025	7943004	<	0,05
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1119	PMA	RED	8/3/2025	7981101	<	0,05
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	2/4/2025	8022330	=	0,12
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1119	PMA	RED	2/6/2025	8109864	=	0,06
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	15/8/2025	8185432	<	0,05
CE13	AV SAN JUAN 1569	PMA	RED	20/9/2025	8242373	<	0,05
CE13	AV SAN JUAN 1569	PMA	RED	15/11/2025	8325342	<	0,05
CE13	SAENZ PEÑA LUIS PRES 1147	PMA	RED	14/12/2025	8376557	<	0,05
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	15/2/2025	7941045	<	0,05
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	15/3/2025	7981615	<	0,05
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	24/5/2025	8060846	<	0,05
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	19/6/2025	8110798	=	0,05
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	2/8/2025	8184847	=	0,07
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	12/9/2025	8241854	=	0,11
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	9/11/2025	8324804	<	0,05
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	11/12/2025	8376149	<	0,05
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	2/1/2025	7889155	<	0,05
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	17/2/2025	7941218	=	0,12
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	11/4/2025	8022442	<	0,05
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	2/6/2025	8109466	<	0,05
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	15/7/2025	8154733	=	0,05
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	22/9/2025	8275243	<	0,05
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	1/10/2025	8290635	<	0,05
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	15/12/2025	8376301	<	0,05
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	6/3/2025	7980737	=	0,06
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	15/5/2025	8060177	<	0,05
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	1/7/2025	8153086	<	0,05
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	1/10/2025	8290663	=	0,11
EEPC1	LAS HERAS GRAL	PMA	RED	15/12/2025	8375972	=	0,05
ES03	RUTA N° 9 KM53 (FLENI)	PMA_NP	RED	12/3/2025	7981251	=	0,13
ES03	RUTA N° 9 KM53 (FLENI)	PMA_NP	RED	10/7/2025	8153913	<	0,05
ES03	RUTA N° 9 KM53 (FLENI)	PMA_NP	RED	6/11/2025	8324365	<	0,05
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	15/1/2025	7890445	=	0,18
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	14/2/2025	7940973	<	0,05
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	23/4/2025	8056557	=	0,05
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	26/5/2025	8060314	<	0,05
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	11/7/2025	8154360	=	0,07
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	9/9/2025	8242304	=	0,05
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	12/10/2025	8291933	<	0,05
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	21/12/2025	8376076	=	0,07
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	12/2/2025	7940465	<	0,05
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	10/3/2025	7981117	<	0,05
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	7/5/2025	8059808	<	0,05
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	5/6/2025	8109881	<	0,05
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	6/8/2025	8184861	=	0,07
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	14/9/2025	8242470	=	0,13
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4368	PMA	RED	5/11/2025	8324215	<	0,05
FL16	GARZON EUGENIO GRAL 4380	PMA	RED	4/12/2025	8375639	=	0,08

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Hierro Total**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Hierro Total (mg/L)
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	21/1/2025	7899848	<	0,05
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	17/2/2025	7941170	<	0,05
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	17/3/2025	7981721	<	0,05
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	15/5/2025	8060511	<	0,05
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	11/7/2025	8154651	<	0,05
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	15/9/2025	8242480	<	0,05
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	15/10/2025	8292201	=	0,2
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	16/12/2025	8376254	<	0,05
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	13/1/2025	7890262	<	0,05
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	18/3/2025	7981972	=	0,6
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	26/5/2025	8060780	<	0,05
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	21/7/2025	8154976	<	0,05
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	6/8/2025	8184453	<	0,05
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	9/10/2025	8291745	<	0,05
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	7/11/2025	8323808	<	0,05
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	8/12/2025	8375912	<	0,05
MN18	LYNCH 2845	PMA	RED	6/2/2025	7940340	=	0,14
MN18	LYNCH 2825	PMA	RED	5/4/2025	8022174	<	0,05
MN18	LYNCH 2845	PMA	RED	4/6/2025	8109757	<	0,05
MN18	LYNCH 2845	PMA	RED	5/8/2025	8184736	=	0,05
MN18	LYNCH 2825	PMA	RED	11/11/2025	8324091	<	0,05
MO13	LAS FLORES 381	PMA	RED	19/2/2025	7942962	<	0,05
MO13	LAS FLORES 343	PMA	RED	22/4/2025	8023699	<	0,05
MO13	LAS FLORES 343	PMA	RED	22/6/2025	8110754	=	0,14
MO13	LAS FLORES 343	PMA	RED	11/9/2025	8242741	=	0,11
MO13	LAS FLORES 343	PMA	RED	6/11/2025	8325300	<	0,05
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	17/1/2025	7904432	<	0,05
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	15/4/2025	8023611	<	0,05
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	13/6/2025	8110688	<	0,05
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	18/8/2025	8185784	<	0,05
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	15/10/2025	8292460	=	0,19
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barr	PMA	RED	3/4/2025	8021843	<	0,05
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barr	PMA	RED	1/7/2025	8153209	<	0,05
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barr	PMA	RED	24/9/2025	8256046	=	0,11
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	3/2/2025	7940247	<	0,05
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	23/5/2025	8067747	=	0,23
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	6/8/2025	8184643	=	0,05
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	15/9/2025	8242439	<	0,05
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	3/11/2025	8323998	<	0,05
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	10/2/2025	7940511	<	0,05
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	21/4/2025	8023561	<	0,05
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	6/6/2025	8109924	=	0,14
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	23/9/2025	8242625	<	0,05
QU15	134-LINIERS 363	PMA	RED	6/11/2025	8324258	=	0,16
QU29	412-FLORIDA 776	PMA	RED	17/2/2025	7940920	=	0,08
QU29	412-FLORIDA 776	PMA	RED	24/4/2025	8023714	<	0,05
QU29	412-FLORIDA 776	PMA	RED	22/7/2025	8189822	=	0,12
QU29	412-FLORIDA 776	PMA	RED	24/9/2025	8242754	<	0,05
QU29	412-FLORIDA 782	PMA	RED	28/11/2025	8378063	<	0,05
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3772	PMA	RED	6/3/2025	7980929	=	0,05
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3814	PMA	RED	26/5/2025	8106608	<	0,05
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3814	PMA	RED	1/7/2025	8153424	<	0,05
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3772	PMA	RED	14/10/2025	8292127	=	0,12
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3722	PMA	RED	19/11/2025	8347176	<	0,05
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3722	PMA	RED	1/12/2025	8375452	<	0,05
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	23/1/2025	7904817	<	0,05

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Hierro Total**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Hierro Total (mg/L)
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	22/2/2025	7943032	<	0,05
SA17	CONGRESO AV 5754	PMA	RED	13/3/2025	7981497	<	0,05
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	2/4/2025	8022289	<	0,05
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	30/6/2025	8155480	=	0,27
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	27/7/2025	8195607	<	0,05
SA17	CONGRESO AV 5754	PMA	RED	1/9/2025	8241811	<	0,05
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	20/10/2025	8317064	<	0,05
SA17	CONGRESO AV 5754	PMA	RED	11/12/2025	8376033	<	0,05
SA25	MATIENZO BENJAMIN TTE 2537	PMA	RED	12/2/2025	7940938	<	0,05
SA25	MATIENZO BENJAMIN TTE 2537	PMA	RED	2/4/2025	8022297	=	0,06
SA25	MATIENZO BENJAMIN TTE 2537	PMA	RED	19/5/2025	8060880	=	0,05
SA25	MATIENZO BENJAMIN TTE 2537	PMA	RED	27/7/2025	8195608	<	0,05
SA25	MATIENZO BENJAMIN TTE 2537	PMA	RED	14/8/2025	8184812	<	0,05
SA25	MATIENZO BENJAMIN TTE 2537	PMA	RED	17/10/2025	8292631	=	0,08
SA25	MATIENZO BENJAMIN TTE 2537	PMA	RED	12/11/2025	8324699	=	0,22
SA25	MATIENZO BENJAMIN TTE 2537	PMA	RED	11/12/2025	8376041	<	0,05
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	2/3/2025	7981339	<	0,05
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	15/5/2025	8060067	=	0,05
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	3/7/2025	8154081	=	0,16
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	11/10/2025	8291657	<	0,05
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	11/12/2025	8375867	<	0,05
SM01	214-HERNANDEZ 1370	PMA	RED	9/1/2025	7889868	<	0,05
SM01	214-HERNANDEZ 1370	PMA	RED	17/3/2025	7981878	<	0,05
SM01	214-HERNANDEZ 1370	PMA	RED	10/5/2025	8059863	<	0,05
SM01	214-HERNANDEZ 1370	PMA	RED	11/7/2025	8154855	<	0,05
SM01	214-HERNANDEZ 1343	PMA	RED	2/9/2025	8241923	=	0,13
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	9/1/2025	7889872	<	0,05
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	14/4/2025	8023569	=	0,12
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	4/6/2025	8109940	<	0,05
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	21/8/2025	8185744	<	0,05
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	6/10/2025	8291361	<	0,05
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	4/12/2025	8375699	<	0,05
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	19/3/2025	7981950	=	0,06
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	11/5/2025	8059922	<	0,05
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	11/7/2025	8154935	=	0,14
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	5/9/2025	8241984	<	0,05
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	8/10/2025	8291465	<	0,05
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	27/11/2025	8325264	<	0,05
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	13/1/2025	7890423	=	0,13
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	5/3/2025	7980791	=	0,26
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	10/6/2025	8110286	=	0,21
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	4/8/2025	8184491	=	0,14
VL02	25 DE MAYO 525	PMA	RED	1/12/2025	8375316	=	0,16
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	13/3/2025	7981529	<	0,05
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	6/5/2025	8059444	<	0,05
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	10/7/2025	8154347	=	0,13
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	22/9/2025	8275250	=	0,05
VL15	OBLIGADO RAFAEL 5680	PMA	RED	16/12/2025	8397949	<	0,05

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Manganeso**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Manganeso (mg/L)
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1167	PMA	RED	07/04/2025	8022316	<	0,04
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1167	PMA	RED	04/06/2025	8109846	=	0,05
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1167	PMA	RED	04/08/2025	8184831	<	0,04
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1145	PMA	RED	07/10/2025	8291250	=	0,29
AV06	AVELLANEDA NICOLAS DR 1145	PMA	RED	02/12/2025	8375609	<	0,04
CA06	BOEDO AV 563	PMA	RED	22/01/2025	7889977	<	0,04
CA06	BOEDO AV 563	PMA	RED	07/02/2025	7940600	<	0,04
CA06	BOEDO AV 563	PMA	RED	23/04/2025	8056555	<	0,04
CA06	BOEDO AV 531	PMA	RED	09/06/2025	8109999	<	0,04
CA06	BOEDO AV 563	PMA	RED	07/07/2025	8153886	<	0,04
CA06	BOEDO AV 563	PMA	RED	10/09/2025	8241987	<	0,04
CA06	BOEDO AV 563	PMA	RED	08/10/2025	8291468	=	0,07
CA06	BOEDO AV 563	PMA	RED	19/12/2025	8409475	<	0,04
CA16	PUAN 360	PMA	RED	02/01/2025	7889318	<	0,04
CA16	PUAN 360	PMA	RED	05/03/2025	7980809	<	0,04
CA16	PUAN 360	PMA	RED	01/04/2025	8021876	=	0,05
CA16	PUAN 360	PMA	RED	03/05/2025	8059452	<	0,04
CA16	PUAN 360	PMA	RED	02/06/2025	8109567	=	0,07
CA16	PUAN 360	PMA	RED	05/08/2025	8184509	<	0,04
CA16	PUAN 360	PMA	RED	02/09/2025	8241560	<	0,04
CA16	PUAN 360	PMA	RED	01/11/2025	8323864	<	0,04
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	13/01/2025	7890082	<	0,04
CA18	GODOY CRUZ 2984	PMA	RED	06/03/2025	7980858	<	0,04
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	03/04/2025	8021966	<	0,04
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	04/06/2025	8109616	=	0,07
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	24/07/2025	8153327	<	0,04
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	05/09/2025	8241609	<	0,04
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	14/11/2025	8323930	<	0,04
CA18	GODOY CRUZ 3102	PMA	RED	02/12/2025	8375382	<	0,04
CA30	ARMENIA 2126	PMA	RED	08/02/2025	7940183	<	0,04
CA30	ARMENIA 2268	PMA	RED	17/03/2025	7981909	=	0,06
CA30	ARMENIA 2268	PMA	RED	22/05/2025	8060716	<	0,04
CA30	ARMENIA 2268	PMA	RED	21/06/2025	8110675	<	0,04
CA30	ARMENIA 2268	PMA	RED	22/07/2025	8154886	<	0,04
CA30	ARMENIA 2268	PMA	RED	05/08/2025	8185771	<	0,04
CA30	ARMENIA 2268	PMA	RED	14/10/2025	8292444	<	0,04
CA30	ARMENIA 2268	PMA	RED	21/11/2025	8325222	<	0,04
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	03/02/2025	7940116	<	0,04
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	03/05/2025	8059455	=	0,07
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 167	PMA	RED	18/06/2025	8109570	=	0,04
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	45874,444	8184512	=	0,05
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	45932,417	8290826	<	0,04
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	45962,444	8323867	<	0,04
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	45997,427	8375767	<	0,04
CA32	PAGANO JOSE LEON 2649	PMA	RED	45677,507	7904418	<	0,04
CA32	PAGANO JOSE LEON 2649	PMA	RED	45700,479	7940652	<	0,04
CA32	PAGANO JOSE LEON 2649	PMA	RED	45720,458	7980864	=	0,07
CA32	PAGANO JOSE LEON 2649	PMA	RED	45812,51	8109622	=	0,05
CA32	PAGANO JOSE LEON 2657	PMA	RED	45876,337	8184581	<	0,04
CA32	PAGANO JOSE LEON 2649	PMA	RED	45933,41	8290915	<	0,04
CA32	PAGANO JOSE LEON 2649	PMA	RED	45972,34	8323936	<	0,04
CA34	SAN JOSE DE CALASANZ 974	PMA	RED	45709,455	7942832	<	0,04
CA34	SAN JOSE DE CALASANZ 914	PMA	RED	45733,472	7981847	<	0,04
CA34	SAN JOSE DE CALASANZ 914	PMA	RED	45800,434	8060664	=	0,07
CA34	SAN JOSE DE CALASANZ 914	PMA	RED	45830,389	8110615	<	0,04
CA34	SAN JOSE DE CALASANZ 914	PMA	RED	45862,406	8154825	<	0,04
CA34	SAN JOSE DE CALASANZ 914	PMA	RED	45886,417	8185711	<	0,04
CA34	SAN JOSE DE CALASANZ 914	PMA	RED	45944,469	8292375	<	0,04
CA34	SAN JOSE DE CALASANZ 914	PMA	RED	45977,424	8325170	<	0,04
CA35	VERA 107	PMA	RED	45707,441	7942886	<	0,04
CA35	VERA 107	PMA	RED	45728,441	7981287	=	0,06
CA35	VERA 107	PMA	RED	45790,472	8059988	<	0,04
CA35	VERA 107	PMA	RED	45846,385	8153995	<	0,04

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Manganeso**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Manganeso (mg/L)
CA35	VERA 107	PMA	RED	45877,476	8185046	<	0,04
CA35	VERA 107	PMA	RED	45922,5	8273885	=	0,04
CA35	VERA 107	PMA	RED	45939,438	8291577	<	0,04
CA35	VERA 107	PMA	RED	45974,486	8324404	<	0,04
CA40	YERBAL 765	PMA	RED	45713,427	7974597	<	0,04
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	45735,431	7981850	=	0,06
CA40	YERBAL 765	PMA	RED	45763,476	8023530	<	0,04
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	45800,479	8060667	=	0,07
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	45862,424	8154828	=	0,05
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	45915,403	8242611	=	0,08
CA40	YERBAL 765	PMA	RED	45944,524	8292378	=	0,09
CA40	YERBAL 667	PMA	RED	46007,465	8376385	<	0,04
CE05	CORDOBA AV 2316	PMA	RED	45661,521	7889766	<	0,04
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	45696,438	7940444	<	0,04
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	45759,458	8023111	<	0,04
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	45797,497	8060380	=	0,06
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	45850,444	8155028	=	0,07
CE05	CORDOBA AV 2390	PMA	RED	45912,469	8241847	<	0,04
CE05	CORDOBA AV 2316	PMA	RED	45935,396	8291259	<	0,04
CE05	CORDOBA AV 2316	PMA	RED	45994,372	8375618	<	0,04
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	45703,427	7941045	<	0,04
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	45731,427	7981615	<	0,04
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	45801,479	8060846	<	0,04
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	45827,438	8110798	<	0,04
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	45871,403	8184847	<	0,04
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	45912,424	8241854	=	0,06
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	45970,458	8324804	<	0,04
CE16	SANTIAGO DEL ESTERO 1363	PMA	RED	46002,406	8376149	<	0,04
CO07	SUAREZ 1157	PMA	RED	45683,389	7904469	<	0,04
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	45712,469	7942930	<	0,04
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	45751,431	8022091	<	0,04
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	45813,403	8109710	=	0,05
CO07	SUAREZ 1157	PMA	RED	45851,365	8154352	<	0,04
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	45909,424	8242296	=	0,07
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	45945,458	8292497	<	0,04
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	46008,427	8376482	<	0,04
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	45659,42	7889155	<	0,04
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	45705,448	7941218	=	0,08
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	45758,434	8022442	<	0,04
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	45810,455	8109466	<	0,04
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	45853,493	8154733	<	0,04
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	45922,427	8275243	<	0,04
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	45931,413	8290635	<	0,04
DE04	BRUSELAS 667	PMA	RED	46006,431	8376301	<	0,04
ES03	RUTA N° 9 KM53 (FLENI)	PMA_NP	RED	45728,413	7981251	=	0,11
ES03	RUTA N° 9 KM53 (FLENI)	PMA_NP	RED	45848,455	8153913	<	0,04
ES03	RUTA N° 9 KM53 (FLENI)	PMA_NP	RED	45967,479	8324365	<	0,04
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	45663,378	7889803	<	0,04
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	45727,448	7981111	=	0,12
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	45750,41	8022362	<	0,04
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	45813,399	8109874	<	0,04
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	45842,361	8153706	<	0,04
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	45903,424	8241862	<	0,04
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	45966,361	8324209	<	0,04
FL06	BACACAY 2050	PMA	RED	45995,389	8375633	=	0,05

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Manganeso**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Manganeso (mg/L)
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	45676,424	7904833	<	0,04
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	45735,417	7982071	=	0,08
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	45768,413	8023786	<	0,04
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	45825,42	8110838	<	0,04
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	45891,431	8185934	<	0,04
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	45917,417	8242828	<	0,04
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	45980,403	8325386	<	0,04
FL08	ACOSTA MARIANO 128	PMA	RED	46012,41	8376599	<	0,04
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	45672,517	7890445	=	0,07
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	45702,517	7940973	<	0,04
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	45770,444	8056557	<	0,04
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	45803,469	8060314	<	0,04
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	45849,406	8154360	<	0,04
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	45909,497	8242304	=	0,06
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	45942,451	8291933	<	0,04
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	46012,451	8376076	<	0,04
FL10	CARABOBO AV 585	PMA	RED	45663,41	7889806	<	0,04
FL10	CARABOBO AV 585	PMA	RED	45727,462	7981114	=	0,08
FL10	CARABOBO AV 585	PMA	RED	45784,413	8059805	<	0,04
FL10	CARABOBO AV 585	PMA	RED	45813,438	8109877	<	0,04
FL10	CARABOBO AV 585	PMA	RED	45875,434	8184858	<	0,04
FL10	CARABOBO AV 585	PMA	RED	45903,441	8241865	<	0,04
FL10	CARABOBO AV 585	PMA	RED	45966,396	8324212	<	0,04
FL10	CARABOBO AV 585	PMA	RED	45995,399	8375636	<	0,04
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	45713,413	7943051	<	0,04
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	45735,438	7982074	=	0,09
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	45802,427	8060889	<	0,04
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	45828,444	8110841	=	0,04
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	45891,455	8185937	<	0,04
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	45917,444	8242831	<	0,04
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	45945,403	8292153	<	0,04
FL15	VARELA 1674	PMA	RED	45980,424	8325389	<	0,04
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	45714,389	7941161	<	0,04
FL17	CARHUE 2171	PMA	RED	45730,49	7981712	<	0,04
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	45800,424	8060502	=	0,04
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	45819,503	8110479	=	0,07
FL17	CARHUE 2087	PMA	RED	45849,455	8154600	<	0,04
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	45881,438	8185549	<	0,04
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	45945,5	8292155	=	0,05
FL17	CARHUE 2141	PMA	RED	45978,444	8325005	<	0,04
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	45678,378	7899848	<	0,04
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	45705,451	7941170	<	0,04
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	45733,354	7981721	<	0,04
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	45792,403	8060511	<	0,04
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	45849,42	8154651	<	0,04
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	45915,41	8242480	<	0,04
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	45945,403	8292201	=	0,14
LMO36	MANUEL ARIAS 7138	PMA	RED	46007,417	8376254	<	0,04
LO38	TRIUNVIRATO 326	PMA	RED	45760,417	8022916	<	0,04
LO38	TRIUNVIRATO 322	PMA	RED	45850,365	8154259	<	0,04
LO38	TRIUNVIRATO 326	PMA	RED	45909,476	8242212	=	0,06
LO38	TRIUNVIRATO 322	PMA	RED	46021,389	8426567	<	0,04
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	45670,403	7890262	<	0,04
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	45734,396	7981972	=	0,12
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	45803,431	8060780	<	0,04

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Manganeso**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Manganeso (mg/L)
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	45859,41	8154976	<	0,04
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	45875,444	8184453	<	0,04
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	45939,354	8291745	<	0,04
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	45968,375	8323808	<	0,04
MN01	LAPRIDA 648	PMA	RED	45999,351	8375912	<	0,04
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	45677,476	7904725	<	0,04
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	45729,497	7981385	<	0,04
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	45789,486	8060112	<	0,04
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	45939,431	8291746	=	0,07
MN04	CABRAL SGTO 871	PMA	RED	46009,472	8376501	<	0,04
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	45714,42	7942954	<	0,04
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	45763,465	8023691	<	0,04
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	45821,403	8110745	=	0,04
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	45917,444	8242732	=	0,08
MN10	GUIDO GRAL 1164	PMA	RED	45964,431	8325292	<	0,04
MO30	GASCON 46	PMA	RED	45740,403	7980894	=	0,06
MO30	RIVADAVIA AV (I) 215502	PMA	RED	45799,403	8059553	<	0,04
MO30	RIVADAVIA AV (I) 215502	PMA	RED	45848,41	8153379	<	0,04
MO30	RIVADAVIA AV (I) 215502	PMA	RED	45936,424	8290964	<	0,04
MO30	RIVADAVIA AV (I) 215502	PMA	RED	45995,431	8375418	<	0,04
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	45674,465	7904432	<	0,04
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	45762,462	8023611	<	0,04
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	45821,448	8110688	<	0,04
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	45887,507	8185784	<	0,04
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	45945,438	8292460	=	0,09
PCMI010	TRIBULATO 868	PMA_NP	RED	45748,424	8022205	<	0,04
PCMI010	TRIBULATO 868	PMA_NP	RED	45874,458	8184767	<	0,04
PCMI010	TRIBULATO 868	PMA_NP	RED	45994,462	8375552	=	0,16
PCMI015	IRIGOIN 1494	PMA_NP	RED	45730,417	7981032	<	0,04
PCMI015	IRIGOIN 1494	PMA_NP	RED	45852,458	8153561	<	0,04
PCMI015	IRIGOIN 1494	PMA_NP	RED	45974,438	8324125	=	0,16
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	45691,375	7940247	<	0,04
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	45800,385	8067747	=	0,07
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	45875,424	8184643	<	0,04
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	45915,434	8242439	<	0,04
QU11	110-FORMOSA 3837	PMA	RED	45964,429	8323998	<	0,04
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3772	PMA	RED	45722,472	7980929	<	0,04
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3814	PMA	RED	45803,396	8106608	<	0,04
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3814	PMA	RED	45839,448	8153424	<	0,04
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3772	PMA	RED	45944,424	8292127	=	0,06
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3722	PMA	RED	45980,415	8347176	<	0,04
QU34	307 BIS-CALLE 307 BIS 3722	PMA	RED	45992,438	8375452	<	0,04
SA15	14 DE JULIO 1262	PMA	RED	45664,521	7889867	<	0,04
SA15	14 DE JULIO 1262	PMA	RED	45737,472	7982088	<	0,04
SA15	14 DE JULIO 1262	PMA	RED	45792,417	8060360	<	0,04
SA15	14 DE JULIO 1262	PMA	RED	45813,431	8109935	=	0,06
SA15	14 DE JULIO 1262	PMA	RED	45891,42	8185957	<	0,04
SA15	14 DE JULIO 1262	PMA	RED	45942,385	8292014	<	0,04
SA15	14 DE JULIO 1262	PMA	RED	45964,396	8324269	<	0,04
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	45680,431	7904817	<	0,04
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	45710,424	7943032	<	0,04
SA17	CONGRESO AV 5754	PMA	RED	45729,472	7981497	<	0,04
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	45749,438	8022289	<	0,04
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	45838,417	8155480	=	0,08
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	45865,424	8195607	<	0,04

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Manganeso**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Manganeso (mg/L)
SA17	CONGRESO AV 5754	PMA	RED	45901,5	8241811	<	0,04
SA17	CONGRESO AV 5766	PMA	RED	45950,438	8317064	<	0,04
SA17	CONGRESO AV 5754	PMA	RED	46002,462	8376033	<	0,04
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	45667,497	7889731	<	0,04
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	45737,406	7982058	=	0,09
SA18	SAN ISIDRO AV 4384	PMA	RED	45755,406	8022968	<	0,04
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	45814,497	8109820	<	0,04
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	45850,469	8155062	<	0,04
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	45908,49	8242262	=	0,04
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	45968,385	8324159	<	0,04
SA18	SAN ISIDRO AV 4468	PMA	RED	46013,413	8376586	<	0,04
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	45671,382	7890404	<	0,04
SA19	BLANCO ENCALADA 3140	PMA	RED	45727,514	7981062	=	0,06
SA19	BLANCO ENCALADA 3140	PMA	RED	45767,396	8023774	<	0,04
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	45816,479	8110267	<	0,04
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	45872,479	8184806	<	0,04
SA19	BLANCO ENCALADA 3140	PMA	RED	45917,403	8242814	<	0,04
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	45973,455	8324693	<	0,04
SA19	BLANCO ENCALADA 3170	PMA	RED	45998,399	8375584	<	0,04
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	45700,424	7940935	<	0,04
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	45727,535	7981065	=	0,08
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	45796,448	8060877	<	0,04
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	45847,42	8154320	<	0,04
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	45872,465	8184809	<	0,04
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	45908,444	8242266	<	0,04
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	45947,458	8292628	<	0,04
SA22	COMBATIENTES DE MALVINAS 3866	PMA	RED	45973,441	8324696	<	0,04
SF10	GUIDO SPANO 3640	PMA	RED	45701,392	7940425	=	0,04
SF10	GUIDO SPANO 3650	PMA	RED	45761,431	8022984	<	0,04
SF10	GUIDO SPANO 3650	PMA	RED	45849,476	8153654	<	0,04
SF10	GUIDO SPANO 3650	PMA	RED	45913,444	8242278	=	0,07
SF10	GUIDO SPANO 3650	PMA	RED	45975,41	8324175	<	0,04
SI10	CASTILLO JOSE M CNEL 834	PMA	RED	45681,444	7890531	<	0,04
SI10	CASTILLO JOSE M CNEL 834	PMA	RED	45738,444	7981590	=	0,06
SI10	CASTILLO JOSE M CNEL 834	PMA	RED	45830,396	8110357	<	0,04
SI10	CASTILLO JOSE M CNEL 828	PMA	RED	45919,476	8242350	=	0,05
SI10	CASTILLO JOSE M CNEL 834	PMA	RED	45988,413	8324779	<	0,04
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	45718,417	7981339	=	0,04
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	45792,424	8060067	<	0,04
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	45841,417	8154081	=	0,07
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	45941,431	8291657	<	0,04
SI15	MARCONI ING 3008	PMA	RED	46002,469	8375867	<	0,04
SI21	AZCUENAGA 2863	PMA	RED	45718,458	7981341	=	0,13
SI21	AZCUENAGA 2783	PMA	RED	45792,476	8060069	<	0,04
SI21	AZCUENAGA 2863	PMA	RED	45882,448	8185119	<	0,04
SI21	AZCUENAGA 2863	PMA	RED	45941,469	8291659	<	0,04
SI21	AZCUENAGA 2863	PMA	RED	46002,424	8375869	<	0,04
SM06	68-LIBERTAD 5343	PMA	RED	45666,42	7889965	<	0,04
SM06	68-LIBERTAD 5343	PMA	RED	45735,417	7981941	<	0,04
SM06	68-LIBERTAD 5343	PMA	RED	45849,438	8154926	<	0,04
SM06	68-LIBERTAD 5343	PMA	RED	45938,403	8291456	=	0,07
SM06	68-LIBERTAD 5343	PMA	RED	46006,438	8376469	<	0,04
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	45666,368	7889872	<	0,04
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	45761,406	8023569	=	0,07
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	45812,396	8109940	<	0,04

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Manganeso**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Manganeso (mg/L)
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	45890,385	8185744	<	0,04
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	45936,396	8291361	=	0,05
SM08	54-MITRE 2571	PMA	RED	45995,385	8375699	<	0,04
SM12	134-CHACABUCO 4047	PMA	RED	45666,455	7889967	<	0,04
SM12	134-CHACABUCO 4047	PMA	RED	45735,448	7981943	=	0,04
SM12	134-CHACABUCO 4047	PMA	RED	45815,472	8109989	=	0,06
SM12	134-CHACABUCO 4147	PMA	RED	45887,451	8185806	<	0,04
SM12	134-CHACABUCO 4147	PMA	RED	46006,469	8376471	<	0,04
SM14	44-JUAREZ 5587	PMA	RED	45698,396	7940582	<	0,04
SM14	44-JUAREZ 5587	PMA	RED	45768,41	8023639	<	0,04
SM14	44-JUAREZ 5587	PMA	RED	45815,396	8109991	<	0,04
SM14	44-JUAREZ 5587	PMA	RED	45887,368	8185808	<	0,04
SM14	44-JUAREZ 5587	PMA	RED	45938,372	8291460	=	0,06
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	45709,417	7942922	=	0,07
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	45753,483	8022529	<	0,04
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	45825,427	8110713	<	0,04
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	45879,417	8184976	<	0,04
SM15	106-PELLEGRINI 5535	PMA	RED	45988,434	8325260	<	0,04
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	45735,368	7981950	=	0,07
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	45788,41	8059922	<	0,04
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	45849,385	8154935	=	0,05
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	45905,396	8241984	<	0,04
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	45938,358	8291465	=	0,07
SM24	6-ROSALES 4165	PMA	RED	45988,382	8325264	<	0,04
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	45660,427	7889379	<	0,04
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	45730,368	7981686	<	0,04
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	45811,448	8109599	=	0,06
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	45881,476	8185523	<	0,04
TR01	RUCCI JOSE IGNACIO 120	PMA	RED	45932,361	8290892	=	0,04

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Residuo conductimétrico	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Residuo conductimétrico [mg/l]
AB10	BERUTI 276	PMA	RED	11/2/2025	7939937	=	1023
AB10	BERUTI 276	PMA	RED	3/4/2025	8021686	=	1022
AB10	BERUTI 276	PMA	RED	1/6/2025	8109452	=	1025
AB10	BERUTI 311	PMA	RED	11/7/2025	8154201	=	1018
AB10	BERUTI 276	PMA	RED	22/10/2025	8290621	=	948
AB10	BERUTI 311	PMA	RED	12/11/2025	8324570	=	1110
AB22	MADARIAGA GRAL 47	PMA	RED	19/1/2025	7899941	=	1013
AB22	MADARIAGA GRAL 47	PMA	RED	20/3/2025	7981834	=	1052
AB22	MADARIAGA GRAL 47	PMA	RED	16/6/2025	8110602	=	233
AB22	MADARIAGA GRAL 77	PMA	RED	7/8/2025	8185697	=	933
AB22	MADARIAGA GRAL 77	PMA	RED	12/11/2025	8325157	=	693
AB23	LAPRIDA FRANCISCO N 854	PMA	RED	14/3/2025	7981424	=	981
AB23	LAPRIDA FRANCISCO N 854	PMA	RED	11/5/2025	8060157	=	1039
AB23	LAPRIDA FRANCISCO N 854	PMA	RED	14/8/2025	8185210	=	1034
AB23	LAPRIDA FRANCISCO N 854	PMA	RED	16/10/2025	8291788	=	559
AB23	LAPRIDA FRANCISCO N 854	PMA	RED	1/12/2025	8375221	=	988
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 140	PMA	RED	13/1/2025	7890194	=	859
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 140	PMA	RED	20/3/2025	7981961	=	822
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 140	PMA	RED	22/5/2025	8060769	=	1027
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 160	PMA	RED	9/9/2025	8242714	=	1133
EE11	GOMEZ DR EUSTAQUIO 160	PMA	RED	19/11/2025	8325275	=	1099
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	21/1/2025	7904479	=	1113
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	13/5/2025	8060086	=	1011
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	1/7/2025	8154100	=	992
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	4/9/2025	8242112	=	1148
EE15	ITALIA (LU) 464	PMA	RED	12/12/2025	8375886	=	986
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	15/1/2025	7890309	=	1079
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	18/3/2025	7981432	=	1193
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	15/5/2025	8060165	=	1048
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	10/7/2025	8154216	=	984
EE20	LA MERCED 152	PMA	RED	23/10/2025	8291796	=	558
EE22	LOS TULIPANES 570	PMA	RED	7/1/2025	7889174	=	1102
EE22	LOS TULIPANES 570	PMA	RED	5/6/2025	8109486	=	1028
EE22	LOS TULIPANES 450	PMA	RED	1/8/2025	8184378	=	1063
EE22	LOS TULIPANES 570	PMA	RED	3/10/2025	8290654	=	1133
EE22	LOS TULIPANES 590	PMA	RED	4/12/2025	8375245	=	1131
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	8/1/2025	7890196	=	651
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	21/4/2025	8023753	=	662
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	7/7/2025	8154101	=	672
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	4/9/2025	8242113	=	1027
EE23	RECARTE JUAN 2121	PMA	RED	13/11/2025	8325351	=	652
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	17/2/2025	7940825	=	1024
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	15/4/2025	8022878	=	965
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	12/6/2025	8110201	=	961
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	12/9/2025	8242192	=	954
EE27	LOS QUEBRACHOS 1075	PMA	RED	17/11/2025	8324590	=	1147
EEPC2	SAENZ PEÑA ROQUE	PMA	RED	12/2/2025	7940748	=	855
EEPC2	SAENZ PEÑA ROQUE	PMA	RED	22/4/2025	8023661	=	1020
EEPC2	SAENZ PEÑA ROQUE	PMA	RED	17/6/2025	8110732	=	1025
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	19/2/2025	7942942	=	772
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	11/4/2025	8022766	=	1016
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	6/6/2025	8110131	=	969
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	12/8/2025	8185146	=	1071
EEPC3	PALACIOS (plaza) 699	PMA	RED	5/11/2025	8324512	=	1129
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	12/2/2025	7940752	=	1060
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	22/4/2025	8023668	=	1000
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	28/7/2025	8199379	=	1180
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	9/9/2025	8242720	=	1228
EZPC1	Punta del Este y América Central	PMA	RED	19/11/2025	8325281	=	1013

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Residuo conductimétrico	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Residuo conductimétrico [mg/l]
LMO42	SAN FRANCISCO JAVIER MODULO 1	PMA	RED	20/2/2025	7940997	=	835
LMO42	SAN FRANCISCO JAVIER MODULO 1	PMA	RED	22/4/2025	8023045	=	832
LMO42	SAN FRANCISCO JAVIER MODULO 1	PMA	RED	22/8/2025	8234578	=	944
LMO42	SAN FRANCISCO JAVIER MODULO 1	PMA	RED	15/9/2025	8242328	=	873
LMO42	SAN FRANCISCO JAVIER MODULO 1	PMA	RED	14/10/2025	8291968	=	1260
LMO42	SAN FRANCISCO JAVIER MODULO 1	PMA	RED	14/11/2025	8324758	=	836
LO04	PEÑA NESTOR DE LA 883	PMA	RED	16/1/2025	7890721	=	1041
LO04	PEÑA NESTOR DE LA 883	PMA	RED	19/4/2025	8023361	=	992
LO04	PEÑA NESTOR DE LA 883	PMA	RED	13/6/2025	8110496	=	1021
LO04	PEÑA NESTOR DE LA 883	PMA	RED	15/9/2025	8242488	=	680
LO04	PEÑA NESTOR DE LA 883	PMA	RED	13/11/2025	8325022	=	614
LO34	DUHALDE 368	PMA	RED	11/2/2025	7940557	=	1028
LO34	DUHALDE 368	PMA	RED	9/5/2025	8059897	=	1022
LO34	DUHALDE 368	PMA	RED	11/7/2025	8153830	=	998
LO34	DUHALDE 368	PMA	RED	4/8/2025	8184952	=	1019
LO34	DUHALDE 368	PMA	RED	3/10/2025	8291413	=	622
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	PMA	RED	17/3/2025	7981735	=	1006
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	PMA	RED	15/5/2025	8060525	=	1097
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	PMA	RED	11/7/2025	8153832	=	1014
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	PMA	RED	18/8/2025	8185572	=	1045
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	PMA	RED	17/10/2025	8292215	=	748
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA_NP	RED	10/1/2025	7889228	=	1261
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA_NP	RED	6/5/2025	8059390	=	934
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA_NP	RED	4/8/2025	8184439	=	801
MI_CIS_CEN	CONESA 1418	PMA_NP	RED	2/1/2025	7889232	=	785
MI_CIS_CEN	CONESA 1418	PMA_NP	RED	11/6/2025	8129031	=	793
MI_CIS_CEN	CONESA 1418	PMA_NP	RED	3/9/2025	8241518	=	1234
MIPC1	JUAN D PERON 388	PMA_NP	RED	1/4/2025	8021803	=	1218
MIPC1	JUAN D PERON 388	PMA_NP	RED	14/8/2025	8184451	=	1199
MIPC1	JUAN D PERON 388	PMA_NP	RED	3/12/2025	8375294	=	1299
PCFV062	CALLE 740 A N° 926	PMA_NP	RED	17/1/2025	7890618	=	1004
PCFV062	CALLE 740 A N° 926	PMA_NP	RED	23/6/2025	8110429	=	747
PCFV062	CALLE 740 A N° 926	PMA_NP	RED	5/9/2025	8242422	=	763
PCFV080	CALLE 517 1726	PMA_NP	RED	28/4/2025	8023483	=	1010
PCFV080	CALLE 517 1726	PMA_NP	RED	28/10/2025	8292331	=	967
PCFV080	CALLE 517 1726	PMA_NP	RED	17/12/2025	8376338	=	1014
PCME089	ARISTÓBULO DEL VALLE 4692	PMA_NP	RED	10/3/2025	7981860	=	701
PCME089	ARISTÓBULO DEL VALLE 4692	PMA_NP	RED	9/9/2025	8242228	=	975
PCME089	ARISTÓBULO DEL VALLE 4692	PMA_NP	RED	14/11/2025	8324463	=	1041
PCMI003	SARMIENTO 1280	PMA_NP	RED	4/3/2025	7980784	=	1125
PCMI003	SARMIENTO 1280	PMA_NP	RED	14/7/2025	8153216	=	847
PCMI003	SARMIENTO 1280	PMA_NP	RED	17/11/2025	8323833	=	1010
PCMI009	CONESA 755	PMA_NP	RED	4/3/2025	7981028	=	724
PCMI009	CONESA 755	PMA_NP	RED	8/7/2025	8153557	=	1197
PCMI009	CONESA 755	PMA_NP	RED	17/11/2025	8324121	=	770
PCMI010	TRIBULATO 868	PMA_NP	RED	1/4/2025	8022205	=	784
PCMI010	TRIBULATO 868	PMA_NP	RED	5/8/2025	8184767	=	1170
PCMI010	TRIBULATO 868	PMA_NP	RED	3/12/2025	8375552	=	796
PCMI042	PARDO 141	PMA_NP	RED	14/1/2025	7890288	=	576
PCMI042	PARDO 141	PMA_NP	RED	6/5/2025	8060144	=	664
PCMI042	PARDO 141	PMA_NP	RED	3/9/2025	8242166	=	1218

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Sulfatos**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Sulfatos [mg/l]
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA_NP	RED	10/1/2025	7889228	=	229
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA_NP	RED	6/5/2025	8059390	=	95,5
ME-CIS-PSM	ARISTOBULO DEL VALLE 4059	PMA_NP	RED	4/8/2025	8184439	=	73,3

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Trihalometanos totales**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Trihalometanos totales [µg/l]
AB21	EL CHIRIPA 1336	PMA	RED	10/2/2025	7939951	=	73,6
AB21	EL CHIRIPA 1313	PMA	RED	22/5/2025	8060156	=	73,2
AB21	EL CHIRIPA 1313	PMA	RED	24/7/2025	8192674	=	90,4
AB21	EL CHIRIPA 1313	PMA	RED	16/10/2025	8291787	=	102,6
AB21	EL CHIRIPA 1313	PMA	RED	3/12/2025	8375951	=	65,4
AV04	AMEGHINO FLORENTINO 870	PMA	RED	22/1/2025	7904401	=	89,5
AV04	AMEGHINO FLORENTINO 870	PMA	RED	23/6/2025	8110659	=	70,0
AV04	AMEGHINO FLORENTINO 870	PMA	RED	25/8/2025	8185755	=	82,3
AV04	AMEGHINO FLORENTINO 870	PMA	RED	15/12/2025	8375608	=	100,3
AV16	ELIZALDE 2064	PMA	RED	7/2/2025	7940733	=	90,6
AV16	ELIZALDE 2064	PMA	RED	9/6/2025	8110115	<	6,0
AV16	ELIZALDE 2064	PMA	RED	11/8/2025	8185127	=	130,3
AV16	ELIZALDE 2064	PMA	RED	7/10/2025	8291667	=	64,0
AV21	LAMADRID 621	PMA	RED	19/2/2025	7942872	=	80,6
AV21	LAMADRID 621	PMA	RED	11/7/2025	8154874	=	71,8
AV21	LAMADRID 621	PMA	RED	25/9/2025	8242649	=	116,4
AV24	SAN ISIDRO 4022	PMA	RED	9/6/2025	8122459	<	6,0
AV24	SAN ISIDRO 4022	PMA	RED	11/7/2025	8154876	=	60,3
AV24	SAN ISIDRO 4022	PMA	RED	25/9/2025	8242651	=	107,9
AV24	SAN ISIDRO 4022	PMA	RED	18/12/2025	8376426	=	89,9
CA04	ROJAS 1532	PMA	RED	20/1/2025	7904410	=	27,3
CA04	ROJAS 1532	PMA	RED	12/2/2025	7940644	=	55,6
CA04	ROJAS 1522	PMA	RED	24/6/2025	8110043	=	44,0
CA04	ROJAS 1532	PMA	RED	8/7/2025	8153986	=	33,3
CA04	ROJAS 1532	PMA	RED	8/9/2025	8242032	=	59,8
CA04	ROJAS 1532	PMA	RED	9/10/2025	8291568	=	89,4
CA04	ROJAS 1532	PMA	RED	7/12/2025	8375805	=	120,1
CA15	SARMIENTO 2991	PMA	RED	19/2/2025	7942878	=	53,8
CA15	SARMIENTO 2991	PMA	RED	21/6/2025	8110669	=	60,5
CA15	SARMIENTO 2991	PMA	RED	24/7/2025	8154880	=	89,1
CA15	SARMIENTO 2991	PMA	RED	15/9/2025	8242655	=	23,8
CA15	ECUADOR 339	PMA	RED	13/12/2025	8376430	=	104,4
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	20/1/2025	7904413	=	36,1
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	26/6/2025	8110046	=	26,8
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	8/8/2025	8185040	=	56,8
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1322	PMA	RED	8/9/2025	8242035	=	48,6
CA19	SCALABRINI ORTIZ RAUL AV 1350	PMA	RED	7/12/2025	8375808	=	114,0
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	21/6/2025	8110672	=	42,0
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	5/8/2025	8185768	=	55,1
CA22	DIAZ VELEZ AV 5153	PMA	RED	15/9/2025	8242658	=	59,7
CA22	DIAZ VELEZ AV 5151	PMA	RED	13/12/2025	8376433	=	103,4
CA27	OLAYA 1265	PMA	RED	13/1/2025	7890085	=	73,8
CA27	OLAYA 1265	PMA	RED	4/6/2025	8109619	=	46,5
CA27	OLAYA 1315	PMA	RED	7/8/2025	8184578	=	83,8
CA27	OLAYA 1265	PMA	RED	12/9/2025	8241612	=	37,4
CA27	OLAYA 1265	PMA	RED	7/12/2025	8375810	=	121,4
CA28	CORDOBA AV 3166	PMA	RED	20/1/2025	7904416	=	15,9
CA28	CORDOBA AV 3186	PMA	RED	24/6/2025	8110049	=	40,7
CA28	CORDOBA AV 3166	PMA	RED	8/8/2025	8185043	=	105,0
CA28	CORDOBA AV 3186	PMA	RED	8/9/2025	8242038	=	57,7
CA28	CORDOBA AV 3166	PMA	RED	9/10/2025	8291574	=	84,1
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	3/2/2025	7940116	=	80,6
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	5/3/2025	7980812	=	85,6
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	3/5/2025	8059455	=	34,8
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 167	PMA	RED	18/6/2025	8109570	<	6,0
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	5/8/2025	8184512	=	32,0
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	2/10/2025	8290826	=	62,2
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	1/11/2025	8323867	=	59,6
CA31	TREINTA Y TRES ORIENTALES 157	PMA	RED	6/12/2025	8375767	=	120,0
CA33	EL MAESTRO 137	PMA	RED	7/2/2025	7940609	=	76,0
CA33	EL MAESTRO 137	PMA	RED	14/5/2025	8059944	=	64,6
CA33	EL MAESTRO 137	PMA	RED	7/7/2025	8153895	=	58,1
CA33	EL MAESTRO 137	PMA	RED	8/8/2025	8185002	=	114,0
CA33	EL MAESTRO 137	PMA	RED	8/10/2025	8291477	=	44,7
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	7/2/2025	7940612	=	93,6
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	14/5/2025	8059947	=	69,3
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	18/7/2025	8153898	=	66,7
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	8/8/2025	8185005	=	119,4
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	8/10/2025	8291480	=	57,3
CA39	SAN JOSE DE CALASANZ 182	PMA	RED	6/12/2025	8375771	=	113,5
CE08	PASCO 252	PMA	RED	18/1/2025	7904779	=	70,5

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Trihalometanos totales	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Trihalometanos totales [µg/l]
CE08	PASCO 252	PMA	RED	22/2/2025	7943001	=	61,1
CE08	PASCO 252	PMA	RED	8/3/2025	7981098	=	120,5
CE08	PASCO 252	PMA	RED	2/6/2025	8109857	=	72,5
CE08	PASCO 252	PMA	RED	12/7/2025	8154471	=	86,6
CE08	PASCO 252	PMA	RED	20/9/2025	8242370	=	86,8
CE08	PASCO 252	PMA	RED	18/10/2025	8292587	=	87,1
CE08	PASCO 252	PMA	RED	14/12/2025	8376554	=	81,4
CO07	SUAREZ 1157	PMA	RED	26/1/2025	7904469	=	145,1
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	24/2/2025	7942930	=	93,1
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	4/4/2025	8022091	=	65,1
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	5/6/2025	8109710	=	88,1
CO07	SUAREZ 1157	PMA	RED	13/7/2025	8154352	=	69,2
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	9/9/2025	8242296	=	64,1
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	15/10/2025	8292497	=	89,8
CO07	SUAREZ 1145	PMA	RED	17/12/2025	8376482	=	74,1
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	15/1/2025	7890439	=	47,4
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	16/3/2025	7981535	=	73,0
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	20/6/2025	8110723	=	58,3
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 81	PMA	RED	6/8/2025	8184675	>	150,0
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 81	PMA	RED	3/9/2025	8241704	=	127,9
CO09	PEREZ GALDOS BENITO AV 61	PMA	RED	22/12/2025	8376070	=	85,9
CO10	ALCORTA AMANCIO AV 2276	PMA	RED	26/1/2025	7904472	=	103,6
CO10	ALCORTA AMANCIO AV 2116	PMA	RED	25/3/2025	8018334	=	58,1
CO10	ALCORTA AMANCIO AV 2276	PMA	RED	9/5/2025	8059624	=	48,6
CO10	ALCORTA AMANCIO AV 2116	PMA	RED	5/6/2025	8109713	=	63,9
CO10	ALCORTA AMANCIO AV 2276	PMA	RED	11/8/2025	8185357	=	91,6
CO10	ALCORTA AMANCIO AV 2276	PMA	RED	9/9/2025	8242299	=	60,8
CO10	ALCORTA AMANCIO AV 2276	PMA	RED	17/12/2025	8376485	=	72,9
CO15	Av Francisco Fernández de la Cruz 1569	PMA	RED	25/2/2025	7978336	=	94,2
CO15	Av Francisco Fernández de la Cruz 1569	PMA	RED	9/5/2025	8059627	=	73,3
CO15	Av Francisco Fernández de la Cruz 1569	PMA	RED	13/7/2025	8154358	=	55,0
CO15	Av Francisco Fernández de la Cruz 1569	PMA	RED	11/8/2025	8185360	=	119,0
CO15	Av Francisco Fernández de la Cruz 1569	PMA	RED	15/10/2025	8292503	=	73,6
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	2/3/2025	7980713	=	118,8
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	7/6/2025	8109955	=	59,4
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	4/8/2025	8184359	=	54,1
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	15/9/2025	8242532	=	32,1
DE12	BAHIA BLANCA 2535	PMA	RED	1/12/2025	8375230	=	54,7
EE30	Olimpo 1867	PMA	RED	24/2/2025	7943014	=	97,8
EE30	Olimpo 1867	PMA	RED	19/6/2025	8110806	=	125,7
EE30	Olimpo 1867	PMA	RED	12/9/2025	8242794	=	56,2
ES02	LAS ORQUÍDEAS 973	PMA_NP	RED	11/1/2025	7890003	=	54,7
ES02	LAS ORQUÍDEAS 973	PMA_NP	RED	12/6/2025	8110015	=	91,9
ES02	LAS ORQUÍDEAS 973	PMA_NP	RED	10/12/2025	8375775	=	114,9
ES03	RUTA N° 9 KM53 (FLENI)	PMA_NP	RED	12/3/2025	7981251	=	71,2
ES03	RUTA N° 9 KM53 (FLENI)	PMA_NP	RED	10/7/2025	8153913	=	144,9
ES04	SABIN 640	PMA_NP	RED	13/2/2025	7940618	=	19,5
ES04	SABIN 640	PMA_NP	RED	10/7/2025	8153914	=	107,1
ES04	SABIN 640	PMA_NP	RED	7/10/2025	8291496	=	84,9
FL03	ARTIGAS MANUEL 5430	PMA	RED	16/1/2025	7890658	=	65,3
FL03	ARTIGAS MANUEL 5430	PMA	RED	26/2/2025	7941152	=	94,5
FL03	ARTIGAS MANUEL 5430	PMA	RED	11/6/2025	8110470	=	80,5
FL03	ARTIGAS MANUEL 5430	PMA	RED	11/7/2025	8154591	=	53,1
FL03	ARTIGAS MANUEL 5430	PMA	RED	15/10/2025	8292146	=	80,8
FL03	ARTIGAS MANUEL 5430	PMA	RED	12/12/2025	8376236	=	120,2
FL05	LAFERRERE GREGORIO DE 7473	PMA	RED	19/1/2025	7904830	=	82,9
FL05	LAFERRERE GREGORIO DE 7473	PMA	RED	17/6/2025	8110835	=	91,4
FL05	LAFERRERE GREGORIO DE 7473	PMA	RED	11/7/2025	8155072	=	64,9
FL05	LAFERRERE GREGORIO DE 7473	PMA	RED	19/9/2025	8242825	=	65,4
FL05	LAFERRERE GREGORIO DE 7473	PMA	RED	17/10/2025	8292636	=	80,2
FL05	LAFERRERE GREGORIO DE 7473	PMA	RED	21/12/2025	8376596	=	103,3
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	15/1/2025	7890445	=	61,4
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	14/2/2025	7940973	=	87,4
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	26/5/2025	8060314	=	54,8

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Trihalometanos totales**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Trihalometanos totales [µg/l]
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	11/7/2025	8154360	=	39,4
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	9/9/2025	8242304	=	59,0
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	12/10/2025	8291933	=	96,4
FL09	SUAREZ JOSE LEON 5624	PMA	RED	21/12/2025	8376076	=	104,5
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	15/1/2025	7904340	=	53,0
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	24/3/2025	7981290	=	91,2
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	23/6/2025	8110055	=	42,6
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	10/7/2025	8153359	=	105,3
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	6/8/2025	8185068	=	98,0
IT01	ALVEAR 528	PMA	RED	23/10/2025	8291599	=	91,0
LA08	MENDEZ CNEL 2439	PMA	RED	24/2/2025	7943025	=	86,7
LA08	MENDEZ CNEL 2439	PMA	RED	14/7/2025	8155054	=	87,5
LA08	MENDEZ CNEL 2439	PMA	RED	18/9/2025	8242805	=	108,1
LA08	MENDEZ CNEL 2439	PMA	RED	22/12/2025	8376578	=	106,3
LA32	EREZCANO CNEL 2185	PMA	RED	15/5/2025	8060330	=	51,2
LA32	EREZCANO CNEL 2185	PMA	RED	14/7/2025	8154375	=	80,3
LA32	EREZCANO CNEL 2161	PMA	RED	9/10/2025	8291947	=	101,7
LA32	EREZCANO CNEL 2185	PMA	RED	11/12/2025	8376090	=	82,7
LMO22	SALVIGNY 7781	PMA	RED	20/1/2025	7899903	=	67,8
LMO22	SALVIGNY 7768	PMA	RED	20/5/2025	8060610	=	34,4
LMO22	SALVIGNY 7768	PMA	RED	11/7/2025	8154770	=	66,8
LMO22	SALVIGNY 7768	PMA	RED	16/9/2025	8242554	=	105,6
LMO22	SALVIGNY 7768	PMA	RED	20/10/2025	8292321	=	92,0
LMO22	SALVIGNY 7768	PMA	RED	17/12/2025	8376327	=	75,3
LMO47	G GOMEZ 5027	PMA	RED	14/2/2025	7940685	<	6,0
LMO47	G GOMEZ 5027	PMA	RED	10/6/2025	8110066	=	72,0
LMO47	G GOMEZ 5027	PMA	RED	12/8/2025	8185079	=	118,9
LMO47	G GOMEZ 5027	PMA	RED	8/9/2025	8242055	=	60,3
LMO47	G GOMEZ 5027	PMA	RED	16/10/2025	8292327	=	90,2
LO18	COSQUIN 2648	PMA	RED	13/1/2025	7890581	=	56,5
LO18	COSQUIN 2672	PMA	RED	13/6/2025	8110392	=	91,5
LO18	COSQUIN 2672	PMA	RED	21/8/2025	8228821	=	102,4
LO26	SERRANO 430	PMA	RED	5/6/2025	8109743	=	89,3
LO26	SERRANO 430	PMA	RED	8/8/2025	8184710	=	114,2
LO38	TRIUNVIRATO 326	PMA	RED	14/2/2025	7940862	=	92,1
LO38	TRIUNVIRATO 322	PMA	RED	12/7/2025	8154259	=	70,1
LO38	TRIUNVIRATO 326	PMA	RED	9/9/2025	8242212	=	76,7
LO38	TRIUNVIRATO 322	PMA	RED	30/12/2025	8426567	=	104,9
LO45	ESPRONCEDA JOSE DE 56	PMA	RED	18/2/2025	7941080	=	81,7
LO45	ESPRONCEDA JOSE DE 34	PMA	RED	20/5/2025	8060421	=	78,2
LO45	ESPRONCEDA JOSE DE 56	PMA	RED	15/7/2025	8154514	=	84,5
LO45	ESPRONCEDA JOSE DE 34	PMA	RED	10/9/2025	8242391	=	77,0
LO45	ESPRONCEDA JOSE DE 34	PMA	RED	11/12/2025	8376165	=	112,9
LO46	FALLIERES 1044	PMA	RED	18/2/2025	7941081	=	99,7
LO46	FALLIERES 1054	PMA	RED	20/5/2025	8060422	=	77,6
LO46	FALLIERES 1054	PMA	RED	14/7/2025	8154515	=	88,9
LO46	FALLIERES 1054	PMA	RED	20/10/2025	8292075	=	104,1
LO46	FALLIERES 1044	PMA	RED	11/12/2025	8376166	=	91,7
LO48	LARREA JUAN 925	PMA	RED	20/5/2025	8060423	=	63,5
LO48	LARREA JUAN 911	PMA	RED	14/7/2025	8154516	=	85,2
LO48	LARREA JUAN 925	PMA	RED	20/10/2025	8292076	=	122,1
LO48	LARREA JUAN 911	PMA	RED	11/12/2025	8376167	=	88,1
LO49	SAENZ ANTONIO 2579	PMA	RED	20/5/2025	8060424	=	77,4
LO49	SAENZ ANTONIO 2573	PMA	RED	20/10/2025	8292077	=	114,3
LO49	SAENZ ANTONIO 2517	PMA	RED	11/12/2025	8376168	=	113,4
MO19	CASTAÑOS JUAN JOSE 1328	PMA	RED	21/1/2025	7890596	=	34,1

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Trihalometanos totales	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Trihalometanos totales [µg/l]
MO19	CASTAÑOS JUAN JOSE 1328	PMA	RED	24/6/2025	8110407	=	45,5
MO19	CASTAÑOS JUAN JOSE 1328	PMA	RED	21/8/2025	8185477	=	71,8
MO19	CASTAÑOS JUAN JOSE 1328	PMA	RED	23/10/2025	8292083	=	108,8
MO27	CASARES CARLOS GDOR 1385	PMA	RED	19/2/2025	7941093	=	91,7
MO27	CASARES CARLOS GDOR 1370	PMA	RED	12/4/2025	8022021	=	60,8
MO27	CASARES CARLOS GDOR 1370	PMA	RED	6/5/2025	8060434	<	6,0
MO27	CASARES CARLOS GDOR 1370	PMA	RED	23/6/2025	8110077	=	42,4
MO27	CASARES CARLOS GDOR 1328	PMA	RED	11/7/2025	8154527	=	59,0
MO27	CASARES CARLOS GDOR 1370	PMA	RED	18/9/2025	8242404	=	64,8
MO27	CASARES CARLOS GDOR 1370	PMA	RED	15/10/2025	8292087	=	57,1
MO27	CASARES CARLOS GDOR 1370	PMA	RED	30/12/2025	8426568	=	101,0
MO29	BUSTILLO JOSE M GRAL 526	PMA	RED	18/3/2025	7981992	=	61,1
MO29	BUSTILLO JOSE M GRAL 526	PMA	RED	25/5/2025	8060800	=	59,8
MO29	BUSTILLO JOSE M GRAL 526	PMA	RED	7/8/2025	8185856	=	90,6
MO29	BUSTILLO JOSE M GRAL 526	PMA	RED	15/10/2025	8292554	=	64,6
MO29	BUSTILLO JOSE M GRAL 526	PMA	RED	12/12/2025	8376520	=	103,0
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	24/3/2025	7981648	=	83,8
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	6/5/2025	8060438	<	6,0
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	7/7/2025	8154043	=	73,0
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	6/8/2025	8185485	>	150,0
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	15/10/2025	8292091	=	85,1
MOPC1	MUÑIZ EDUARDO J 887	PMA	RED	3/12/2025	8375843	=	87,1
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	17/1/2025	7904432	=	40,8
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	13/6/2025	8110688	=	114,5
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	18/8/2025	8185784	=	82,4
MS07	AGUERO 119	PMA	RED	15/10/2025	8292460	=	85,0
MS12	PASO DE LOS ANDES 528	PMA	RED	21/1/2025	7890605	=	85,9
MS12	PASO DE LOS ANDES 528	PMA	RED	20/5/2025	8060439	=	66,5
MS12	PASO DE LOS ANDES 528	PMA	RED	25/7/2025	8154533	=	65,2
MS12	PASO DE LOS ANDES 528	PMA	RED	27/8/2025	8185486	=	79,7
MS12	PASO DE LOS ANDES 528	PMA	RED	13/10/2025	8292092	=	86,1
MS12	PASO DE LOS ANDES 528	PMA	RED	11/12/2025	8376183	=	111,9
MS17	EL IRUCHO Casa 4	PMA	RED	15/1/2025	7890606	=	57,4
MS17	EL IRUCHO Casa 4	PMA	RED	10/6/2025	8110417	=	77,6
MS17	EL IRUCHO Casa 4	PMA	RED	13/10/2025	8292093	=	122,7
MS17	EL IRUCHO Casa 4	PMA	RED	11/12/2025	8376184	=	107,6
MS19	Circ. 4 Secc. 8 Manzana 5 Casa 2	PMA	RED	15/1/2025	7890608	=	42,5
MS19	CIRC 4 SECC 8 MANZ 5 Casa 6	PMA	RED	22/4/2025	8056561	=	60,3
MS19	CIRC 4 SECC 8 MANZ 5 Casa 6	PMA	RED	29/5/2025	8108245	=	87,3
MS19	CIRC 4 SECC 8 MANZ 5 Casa 6	PMA	RED	10/6/2025	8110419	=	107,4
MS19	Circ. 4 Secc. 8 Manzana 5 Casa 2	PMA	RED	13/8/2025	8185489	=	47,9
MS19	CIRC 4 SECC 8 MANZ 5 Casa 6	PMA	RED	18/9/2025	8242021	=	116,2
MS34	MARCONI GUILLERMO (LMS) 6381	PMA	RED	20/5/2025	8060449	=	48,0
MS34	MARCONI GUILLERMO (LMS) 6365	PMA	RED	18/7/2025	8154544	=	99,6
MS34	MARCONI GUILLERMO (LMS) 6365	PMA	RED	11/12/2025	8376193	=	113,9
MS36	MURGIONDO 1617	PMA	RED	20/5/2025	8060451	=	60,2
MS36	MURGIONDO 1617	PMA	RED	18/7/2025	8154547	=	64,4
MS36	MURGIONDO 1617	PMA	RED	13/10/2025	8292104	=	86,4
MS36	MURGIONDO 1617	PMA	RED	11/12/2025	8376195	=	101,4
QU06	835-MENDELEVICH A 2019	PMA	RED	20/1/2025	7890389	=	77,6
QU06	835-MENDELEVICH A 2019	PMA	RED	27/3/2025	7981994	=	86,7
QU06	835-MENDELEVICH A 2019	PMA	RED	20/5/2025	8060468	=	59,0
QU06	835-MENDELEVICH A 2019	PMA	RED	11/6/2025	8110252	=	81,7
QU06	835-MENDELEVICH A 2019	PMA	RED	10/7/2025	8154301	=	43,5
QU06	835-MENDELEVICH A 2019	PMA	RED	27/8/2025	8185858	=	34,9
QU06	835-MENDELEVICH A 2019	PMA	RED	8/10/2025	8291877	=	63,4

aysa	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes Parámetro: Trihalometanos totales	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-03

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Trihalometanos totales [µg/l]
QU06	835-MENDELEVICH A 2019	PMA	RED	15/12/2025	8376212	=	112,8
QU10	881-CALLE 881 1142	PMA	RED	17/1/2025	7890634	=	78,4
QU10	881-CALLE 881 1142	PMA	RED	24/1/2025	7904811	=	71,0
QU10	881-CALLE 881 1142	PMA	RED	6/5/2025	8059590	<	6,0
QU10	881-CALLE 881 1142	PMA	RED	17/6/2025	8110446	=	76,0
QU10	881-CALLE 881 1142	PMA	RED	2/9/2025	8241675	=	69,6
QU10	881-CALLE 881 1870	PMA	RED	1/10/2025	8291004	=	99,6
QU10	881-CALLE 881 1870	PMA	RED	12/12/2025	8397501	=	106,1
QU33	313-ENTRE RIOS 928	PMA	RED	19/2/2025	7942852	=	65,7
QU33	313-ENTRE RIOS 928	PMA	RED	13/5/2025	8059854	=	99,7
QU33	313-ENTRE RIOS 928	PMA	RED	11/7/2025	8154854	=	69,8
QU33	313-ENTRE RIOS 928	PMA	RED	12/9/2025	8242255	=	74,1
QU33	313-ENTRE RIOS 928	PMA	RED	20/10/2025	8315619	=	102,5
QU33	313-ENTRE RIOS 928	PMA	RED	23/12/2025	8376404	=	101,7
QU35	MENDOZA 1586	PMA	RED	23/5/2025	8060816	=	52,2
QU35	MENDOZA 1586	PMA	RED	10/7/2025	8154309	<	6,0
QU35	MENDOZA 1556	PMA	RED	20/10/2025	8292564	=	66,0
QU35	MENDOZA 1556	PMA	RED	10/12/2025	8376028	=	104,3
SA04	NAHUEL HUAPI 4560	PMA	RED	12/1/2025	7890523	=	48,8
SA04	NAHUEL HUAPI 4560	PMA	RED	24/2/2025	7943059	=	73,0
SA04	NAHUEL HUAPI 4560	PMA	RED	10/5/2025	8059856	=	41,7
SA04	NAHUEL HUAPI 4560	PMA	RED	12/7/2025	8155086	=	64,0
SA04	NAHUEL HUAPI 4560	PMA	RED	11/9/2025	8242342	=	44,3
SA04	NAHUEL HUAPI 4560	PMA	RED	4/10/2025	8291350	=	57,7
SA04	NAHUEL HUAPI 4560	PMA	RED	20/12/2025	8376610	=	100,4
SA05	CARRANZA ANGEL JUSTINIANO 1983	PMA	RED	25/1/2025	7904845	=	71,1
SA05	CARRANZA ANGEL JUSTINIANO 1983	PMA	RED	2/2/2025	7940517	=	94,8
SA05	CARRANZA ANGEL JUSTINIANO 1983	PMA	RED	8/6/2025	8110350	=	62,8
SA05	CARRANZA ANGEL JUSTINIANO 1983	PMA	RED	4/7/2025	8153765	=	45,2
SA05	CARRANZA ANGEL JUSTINIANO 1983	PMA	RED	23/9/2025	8242842	=	48,0
SA05	CARRANZA ANGEL JUSTINIANO 1983	PMA	RED	12/10/2025	8292009	=	76,0
SA05	CARRANZA ANGEL JUSTINIANO 1983	PMA	RED	8/12/2025	8375689	=	100,1
SA07	DONADO 1494	PMA	RED	12/1/2025	7890526	=	67,2
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	5/6/2025	8109932	=	31,9
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	22/8/2025	8185954	=	69,4
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	11/9/2025	8242345	=	58,2
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	3/11/2025	8324266	=	77,5
SA07	DONADO 1422	PMA	RED	20/12/2025	8376613	=	100,5
SA09	LACROZE FEDERICO AV 2963	PMA	RED	25/1/2025	7904848	=	60,1
SA09	LACROZE FEDERICO AV 2963	PMA	RED	6/3/2025	7981169	=	69,7
SA09	LACROZE FEDERICO AV 2981	PMA	RED	23/5/2025	8060901	=	54,3
SA09	LACROZE FEDERICO AV 2963	PMA	RED	8/6/2025	8110353	=	75,8
SA09	LACROZE FEDERICO AV 2981	PMA	RED	6/8/2025	8184913	=	61,9
SA09	LACROZE FEDERICO AV 2981	PMA	RED	23/9/2025	8242845	=	42,3
SA09	LACROZE FEDERICO AV 2963	PMA	RED	8/12/2025	8375692	=	100,3
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	14/1/2025	7890404	=	44,8
SA19	BLANCO ENCALADA 3140	PMA	RED	11/3/2025	7981062	=	86,9
SA19	BLANCO ENCALADA 3140	PMA	RED	20/4/2025	8023774	=	37,3
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	8/6/2025	8110267	=	51,4
SA19	BLANCO ENCALADA 3154	PMA	RED	3/8/2025	8184806	=	55,9
SA19	BLANCO ENCALADA 3140	PMA	RED	17/9/2025	8242814	=	91,6
SA19	BLANCO ENCALADA 3170	PMA	RED	7/12/2025	8375584	=	113,2
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	8/5/2025	8059760	=	55,9
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	18/7/2025	8154324	=	53,7
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	8/9/2025	8241820	=	67,3
SF01	RODRIGUEZ MARTIN 728	PMA	RED	9/12/2025	8375591	=	101,0

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de verificaciones de correcciones y seguimiento de anomalías en Redes** **Parámetro: Trihalometanos totales**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-03**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Causa Extraccion	Entidad	Fecha Muestreo	Muestra N°		Trihalometanos totales [µg/l]
SF06	URQUIZA 3910	PMA	RED	20/1/2025	7890415	=	85,7
SF06	URQUIZA 3910	PMA	RED	13/2/2025	7940421	=	62,4
SF06	URQUIZA 3910	PMA	RED	9/6/2025	8109832	=	102,6
SF06	URQUIZA 3910	PMA	RED	9/9/2025	8241824	=	73,1
SF06	URQUIZA 3910	PMA	RED	7/10/2025	8291236	=	63,3
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	21/2/2025	7942922	=	74,1
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	17/6/2025	8110713	=	45,5
SM15	106-PELLEGRINI 5538	PMA	RED	10/8/2025	8184976	=	132,3
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 964	PMA	RED	18/1/2025	7899926	=	29,3
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 964	PMA	RED	24/5/2025	8060636	=	47,6
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 964	PMA	RED	28/10/2025	8292347	=	102,7
TI03	INDEPENDENCIA (TT) 964	PMA	RED	5/12/2025	8375455	=	72,3
TI04	LINIERS (T) 1024	PMA	RED	14/6/2025	8109692	=	97,4
TI04	LINIERS (T) 1024	PMA	RED	26/8/2025	8185683	=	49,9
TI04	LINIERS (T) 1024	PMA	RED	1/10/2025	8291013	=	102,9
TI04	LINIERS (T) 1024	PMA	RED	29/12/2025	8376355	=	72,8
TI11	TORRE LISANDRO DE LA (DT) 3065	PMA	RED	18/1/2025	7899930	=	53,3
TI11	TORRE LISANDRO DE LA (DT) 3115	PMA	RED	25/6/2025	8110591	=	78,6
TI11	TORRE LISANDRO DE LA (DT) 3065	PMA	RED	12/8/2025	8184658	=	141,0
TI16	CALLE 1 (GP) 55	PMA	RED	22/2/2025	7941301	=	46,2
TI16	CALLE 1 (GP) 35	PMA	RED	15/7/2025	8154805	=	109,0
TI16	CALLE 1 (GP) 55	PMA	RED	5/9/2025	8241691	=	65,5
TI19	RIOBAMBA 848	PMA	RED	6/2/2025	7952781	<	6,0
TI19	RIOBAMBA 848	PMA	RED	24/5/2025	8060647	=	81,2
TI19	RIOBAMBA 848	PMA	RED	4/7/2025	8153438	=	50,3
TI19	RIOBAMBA 848	PMA	RED	19/9/2025	8242591	=	100,6
TI21	SAN ROQUE 2314	PMA	RED	22/4/2025	8023512	=	73,2
TI21	SAN ROQUE 2314	PMA	RED	24/5/2025	8060649	=	54,3
TI21	SAN ROQUE 2314	PMA	RED	4/7/2025	8153440	=	33,0
TI21	SAN ROQUE 2314	PMA	RED	12/8/2025	8184667	=	121,6
TI21	SAN ROQUE 2314	PMA	RED	19/9/2025	8242593	=	86,4
TI21	SAN ROQUE 2317	PMA	RED	29/10/2025	8292360	=	72,6
TI21	SAN ROQUE 2300	PMA	RED	9/12/2025	8375468	=	80,3
VL01	ROSALES LEONARDO COMTE 3971	PMA	RED	6/5/2025	8059433	<	6,0
VL01	ROSALES LEONARDO COMTE 3971	PMA	RED	11/8/2025	8185339	=	126,8
VL01	ROSALES LEONARDO COMTE 3971	PMA	RED	1/10/2025	8290804	=	80,8
VL01	ROSALES LEONARDO COMTE 3971	PMA	RED	10/12/2025	8376053	=	100,0

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en Pozos LO095, AB057 y LO134**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
AB14	ECHAGUE PEDRO 478	05/01/2025	7889750	=	31,8	
AB14	ECHAGUE PEDRO 478	29/03/2025	8025181	=	35,1	
AB14	ECHAGUE PEDRO 478	07/05/2025	8059771	=	31,8	
AB14	ECHAGUE PEDRO 478	01/08/2025	8184824	=	23,5	
AB14	ECHAGUE PEDRO 478	22/10/2025	8292361	=	32,0	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en Pozos EEZ001 y EEZ002**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/l)	Observaciones
EE28	PALACIOS 459	10/02/2025	7939986	=	33	
EE28	PALACIOS 459	07/05/2025	8059333	=	36	
EE28	PALACIOS 459	02/07/2025	8153080	=	34	
EE28	PALACIOS 459	02/09/2025	8241478	=	35	
EE28	PALACIOS 459	03/11/2025	8323737	=	38	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en Pozos EEU011, EEU012, EEU013, EEU015, EEU016, EEU017, EEU018, EEU019, EEU020, EEU021, EEU022, EEU023, EEU025.**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/l)	Observaciones
EE32	Dreyer 4300	20/02/2025	7942940	=	12,8	
EE32	Dreyer 4300	11/04/2025	8022761	=	14,4	
EE32	Dreyer 4300	12/08/2025	8185141	=	14,7	
EE32	Dreyer 4300	08/10/2025	8291682	=	15,0	
EE32	Dreyer 4300	12/12/2025	8375892	=	16,6	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en pozos MO150, MO151, MO152.**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	15/01/2025	7889431	=	41,4	
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	18/03/2025	7980882	=	42,3	
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	04/06/2025	8109641	=	38,5	
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	11/09/2025	8241634	=	46,2	
HU01	JUAN FERNANDEZ 555	03/12/2025	8375406	=	47,7	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en Pozos LMO063, LMO064, LMO078 y LMO079**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
LMO02	SALVIGNY 4469	08/01/2025	7899770	=	27	
LMO02	SALVIGNY 4469	12/03/2025	7981123	=	50	
LMO02	SALVIGNY 4469	15/04/2025	8022374	=	75	
LMO02	SALVIGNY 4469	21/05/2025	8059814	=	107	
LMO02	SALVIGNY 4469	10/06/2025	8109887	=	80	
LMO02	SALVIGNY 4469	14/08/2025	8184867	=	19	
LMO02	SALVIGNY 4469	07/10/2025	8291304	=	74	
LMO02	SALVIGNY 4469	04/12/2025	8375645	=	59	

aysa	**CALIDAD DE AGUA**	**Informe de Niveles de Servicio**
	Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS	**Año 2025**
	Nitratos en Pozos LMO053, LMO054, LMO112, LMO139, LMO146, LMO164, LMO180 y LMO195	**INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
LMO08	JACHAL 1025	20/01/2025	7899901	=	84,0	
LMO08	JACHAL 1025	11/03/2025	7981293	=	84,9	
LMO08	JACHAL 1025	16/04/2025	8022683	=	62,5	
LMO08	JACHAL 1025	21/05/2025	8059645	=	82,2	
LMO08	JACHAL 1025	18/06/2025	8110559	=	83,5	
LMO08	JACHAL 1025	12/08/2025	8185655	=	79,8	
LMO08	JACHAL 1025	20/10/2025	8292319	=	80,0	
LMO08	JACHAL 1025	17/11/2025	8324429	=	84,6	

CALIDAD DE AGUA

Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS

Nitratos en Pozos LMO120, LMO121, LMO123, LMO172, LMO077 y LMO127.

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-A-CA-RED-04

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
LMO09	RECUERO 3620	10/01/2025	7890017	=	65,3	
LMO09	RECUERO 3620	10/03/2025	7981260	=	83,1	
LMO09	RECUERO 3620	14/04/2025	8022577	=	79,9	
LMO09	RECUERO 3620	24/06/2025	8147160	=	79,3	
LMO09	RECUERO 3620	22/07/2025	8191149	=	82,3	
LMO09	RECUERO 3620	14/08/2025	8185019	=	79,9	
LMO09	RECUERO 3620	05/09/2025	8242013	=	82,3	
LMO09	RECUERO 3620	13/10/2025	8291506	=	86,4	
LMO09	RECUERO 3620	09/12/2025	8375786	=	78,9	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en pozos LMO161, LMO170, LMO175,**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
LMO16	ARMONIA 5753	13/03/2025	7981794	=	91,2	
LMO16	ARMONIA 5753	18/06/2025	8110560	=	98,2	
LMO16	ARMONIA 5753	16/09/2025	8242553	=	96,8	
LMO16	ARMONIA 5753	16/10/2025	8292320	=	72,9	
LMO16	ARMONIA 5753	17/12/2025	8376326	=	87,7	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en Pozo LMO177**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
LMO34	TOAY 6672	28/04/2025	8023351	=	80,9	
LMO34	TOAY 6672	11/06/2025	8110486	=	79,1	
LMO34	TOAY 6672	21/08/2025	8185556	=	81,8	
LMO34	TOAY 6672	16/12/2025	8376252	=	79,5	

CALIDAD DE AGUA

Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS

Nitratos en Pozo LMO158

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-A-CA-RED-04

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
LMO45	JUAN B JUSTO 6265	07/02/2025	7940632	=	31,7	
LMO45	JUAN B JUSTO 6267	14/04/2025	8022593	=	30,3	
LMO45	JUAN B JUSTO 6267	05/06/2025	8110031	=	48,9	
LMO45	JUAN B JUSTO 6267	08/07/2025	8153940	=	30,5	
LMO45	JUAN B JUSTO 6267	14/08/2025	8185025	=	32,8	
LMO45	JUAN B JUSTO 6267	05/09/2025	8242019	=	30,0	
LMO45	JUAN B JUSTO 6267	04/11/2025	8324382	=	41,1	
LMO45	JUAN B JUSTO 6267	16/12/2025	8375905	=	53,9	

CALIDAD DE AGUA

Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS

Nitratos en Pozos LMO179, LMO192 y LMO193

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-A-CA-RED-04

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
LMO48	CONDE 5055	08/01/2025	7899740	=	96	
LMO48	CONDE 5081	18/02/2025	7941174	=	97,8	
LMO48	CONDE 5055	28/04/2025	8023357	=	95,9	
LMO48	CONDE 5055	11/06/2025	8110492	=	93,2	
LMO48	CONDE 5055	13/08/2025	8184411	=	93,4	
LMO48	CONDE 5055	09/09/2025	8241499	=	95,0	
LMO48	CONDE 5055	02/10/2025	8290699	=	76,3	
LMO48	CONDE 5055	04/12/2025	8375271	=	75	

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS Nitratos en Pozos MN034, MN036 y MN173					Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-04
Punto Muestreo	**Domicilio Extracción**	**Fecha Muestreo**	**Muestra N°**		**Nitratos (mg/L)**	**Observaciones**
MN16	PITA MARIA 2585	17/01/2025	7890770	=	77,2	
MN16	PITA MARIA 2585	14/03/2025	7981738	=	77,3	
MN16	PITA MARIA 2585	21/05/2025	8060528	=	77,2	
MN16	PITA MARIA 2585	14/08/2025	8185575	=	111,0	
MN16	PITA MARIA 2585	16/12/2025	8376271	=	80,0	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en Batería Rafael Castillo**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
MN23	CAMPO ESTANISLAO DEL (LMN) 2971	19/02/2025	7941192	=	20,8	
MN23	CAMPO ESTANISLAO DEL (LMN) 2971	21/05/2025	8060533	=	13,4	
MN23	CAMPO ESTANISLAO DEL (LMN) 2971	24/06/2025	8110749	=	15,0	
MN23	CAMPO ESTANISLAO DEL (LMN) 2971	21/07/2025	8154700	=	26,0	
MN23	CAMPO ESTANISLAO DEL (LMN) 2971	22/09/2025	8242502	=	12,9	
MN23	CAMPO ESTANISLAO DEL (LMN) 2971	17/11/2025	8325036	=	10,5	
MN23	CAMPO ESTANISLAO DEL (LMN) 2971	08/12/2025	8375922	=	8,9	

CALIDAD DE AGUA

Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS

Nitratos en Pozos MN007, MN008, MN009, MN010, MN059, MN106, MN122

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-A-CA-RED-04

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
MN24	BARCENA 3148	06/01/2025	7899754	=	113,0	
MN24	BARCENA 3148	11/01/2025	7889829	=	86,8	
MN24	BARCENA 3148	11/03/2025	7981133	=	113,0	
MN24	BARCENA 3148	09/05/2025	8059824	=	67,3	
MN24	BARCENA 3148	03/07/2025	8153531	=	87	
MN24	BARCENA 3148	06/08/2025	8184877	=	106,0	
MN24	BARCENA 3148	08/10/2025	8291318	=	47,7	
MN24	BARCENA 3148	07/11/2025	8324231	=	62,2	
MN24	BARCENA 3148	05/12/2025	8375655	=	15,0	

CALIDAD DE AGUA

Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS

Nitratos en los pozos MN110, MN147 y MN157

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-A-CA-RED-04

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
MN25	BAZURCO 1936	11/01/2025	7889830	=	105,0	
MN25	BAZURCO 1936	13/04/2025	8022389	=	106,0	
MN25	BAZURCO 1936	09/05/2025	8059825	=	103,0	
MN25	BAZURCO 1936	24/06/2025	8147162	=	107,0	
MN25	BAZURCO 1936	06/08/2025	8184878	=	109,0	
MN25	BAZURCO 1936	04/09/2025	8241885	=	109,0	
MN25	BAZURCO 1936	08/10/2025	8291319	=	110,0	
MN25	BAZURCO 1936	05/12/2025	8375656	=	105,0	

CALIDAD DE AGUA

Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS

Nitratos en Pozos MO138, MO139, MO140, MO141.

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-A-CA-RED-04

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
MO31	EL JAGUEL 3160	18/03/2025	7981315	=	53,3	
MO31	EL JAGUEL 3160	25/05/2025	8060037	=	51,0	
MO31	EL JAGUEL 3160	07/08/2025	8185093	=	49,9	
MO31	EL JAGUEL 3160	15/10/2025	8291624	=	48,1	
MO31	EL JAGUEL 3160	03/12/2025	8375842	=	53,9	

	CALIDAD DE AGUA Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS Nitratos en Pozos QU138 y QU141					Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-A-CA-RED-04
Punto Muestreo	**Domicilio Extracción**	**Fecha Muestreo**	**Muestra N°**		**Nitratos (mg/L)**	**Observaciones**
QU07	CALLE 898 6280	23/01/2025	7904749	=	46,1	
QU07	CALLE 898 6280	27/01/2025	7914387	=	45,1	
QU07	CALLE 898 6280	11/03/2025	7981484	=	46,1	
QU07	CALLE 898 6280	24/06/2025	8110763	=	42,5	
QU07	CALLE 898 6280	05/08/2025	8185307	=	43,8	
QU07	CALLE 898 6280	26/11/2025	8325309	=	51,2	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en Pozo QU076**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
QU36	CNO. GRAL. BELGRANO 4814	27/03/2025	7981685	=	54	
QU36	CNO. GRAL. BELGRANO 4814	06/05/2025	8059600	=	52	
QU36	CNO. GRAL. BELGRANO 4814	28/08/2025	8230252	=	54	
QU36	CNO. GRAL. BELGRANO 4814	12/12/2025	8376219	=	24	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en Pozo AB728**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barrio	03/04/2025	8021843	=	61,5	
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barrio	01/07/2025	8153209	=	60,2	
PCAB728	B° SEGBA (D. Rocha y Paraguay) (Dentro del barrio	24/09/2025	8256046	=	31,3	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en Pozo LO135, LO072, LO078, LO079, LO081, LO118, LO119, LO120, LO138, LO139, LO140, LO141, LO142**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
AB22	MADARIAGA GRAL 47	19/01/2025	7899941	=	44,4	
AB22	MADARIAGA GRAL 47	20/03/2025	7981834	=	50,9	
AB22	MADARIAGA GRAL 47	16/06/2025	8110602	=	5,7	
AB22	MADARIAGA GRAL 47	07/08/2025	8185697	=	42,5	
AB22	MADARIAGA GRAL 47	12/11/2025	8325157	=	56,9	

aysa	**CALIDAD DE AGUA** **Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS** **Nitratos en pozos EEN029, EEN030, EEN031, EEN032**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-CA-RED-04**

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y CRESPO	02/01/2025	7889181	=	44,6	
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y CRESPO	13/02/2025	7940829	=	45,2	
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y CRESPO	01/04/2025	8021726	=	45,3	
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y CRESPO	03/06/2025	8109493	=	43,2	
EE34	ESQUINA EUGENIO REBIZO Y CRESPO	17/12/2025	8375252	=	50,4	

CALIDAD DE AGUA

Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS

Nitratos en pozo LMO099

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-A-CA-RED-04

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra N°		Nitratos (mg/L)	Observaciones
LMO29	WAST HUGO 579	03/02/2025	7940007	=	50	
LMO29	WAST HUGO 579	05/03/2025	7980744	=	45	
LMO29	WAST HUGO 579	05/05/2025	8059356	=	38	
LMO29	WAST HUGO 579	04/06/2025	8109501	=	41	
LMO29	WAST HUGO 579	01/07/2025	8153116	=	43	
LMO29	WAST HUGO 579	01/09/2025	8241493	=	43	
LMO29	WAST HUGO 579	03/11/2025	8323760	=	40	
LMO29	WAST HUGO 579	01/12/2025	8375265	=	46	

CALIDAD DE AGUA

Planilla de análisis de correcciones y seguimiento de anomalías en Puntos de la Red Cercanos a los PSS

Nitratos en Batería Llavallol

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-A-CA-RED-04

Punto Muestreo	Domicilio Extracción	Fecha Muestreo	Muestra Nº		Nitratos [mg/l]	Observaciones
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	17/03/2025	7981735	=	45,3	
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	15/05/2025	8060525	=	43,0	
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	11/07/2025	8153832	=	44,4	
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	18/08/2025	8185572	=	48,4	
LOPC1	MAGALLANES (REBOMBEO LLAVALLOL) 1976	17/10/2025	8292215	=	47,8	

1.2 PRODUCCIÓN

SIT Producción Eras

R-AGU-SIT-001 v01

2025

CÓD Anterior N°	CÓD N°	Cod. AGUA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero 31	Febrero 28	Marzo 31	Abril 30	Mayo 31	Junio 30	Julio 31	Agosto 31	Septiembre 30	Octubre 31	Noviembre 30	Diciembre 31	OBSERVACIONES
PA04	PA01	PA01	Volumen mensual de agua cruda superficial elevada	Es el volumen total mensual elevado de agua cruda Superficial	m^3	174.936.578	154.528.433	168.808.158	165.481.888	170.811.688	166.906.813	174.001.855	170.339.059	161.970.542	169.705.744	166.366.812	172.531.900	
PA08	PA02	PA02	Volumen mensual de agua cruda subterránea Total	Es el volumen total mensual elevado de agua cruda Subterránea	m^3	14.318.083	13.080.739	14.698.967	13.942.224	13.920.265	13.213.145	13.895.512	13.954.113	13.353.281	13.980.902	13.197.898	13.944.111	
		PA168	Volumen mensual de agua subterránea a red	Es el volumen mensual de agua subterránea entregada a la red.	m^3	13.960.908	12.743.201	14.308.033	13.554.770	13.551.894	12.865.388	13.536.085	13.591.726	13.014.375	13.645.393	12.873.971	13.617.675	
PA20	PA06	PA06	Producción promedio diario Plantas Concesión Original	Es el volumen total de agua producida por PSM, PMB, PJMR	m^3/d	5.185.706	5.236.702	5.177.582	5.174.942	5.094.482	5.075.155	5.084.410	4.983.775	4.937.029	4.978.708	5.006.864	5.115.239	
PA24	PA07	PA07	Producción promedio diario Pozos Concesión Original	Es el promedio del agua de salida de todos los Pozos	m^3/d	461.874	467.169	474.160	464.741	449.041	440.438	448.242	450.133	445.109	450.997	439.930	449.810	
PA12	PA08	PA08	Caudal total diario promedio de agua producida en Plantas y Pozos	Es el volumen promedio diario de agua producida por PSM, PMB, PJMR y Pozos	m^3/d	5.647.579	5.703.871	5.651.743	5.639.683	5.543.523	5.515.593	5.532.652	5.433.908	5.382.139	5.429.705	5.446.794	5.565.049	
PA17	PA18	PA18	Caudal de Producción promedio diario PSM	Es el volumen producido promedio diario del mes de PSM	m^3/d	2.894.267	2.933.386	2.898.391	2.916.203	2.880.408	2.838.529	2.871.678	2.820.409	2.777.845	2.803.808	2.814.953	2.886.078	
PA48	PA25	PA25	m3 producidos por unidad de consumo energético PSM	Es el cociente entre el volumen producido y el consumo de energía de producción en PSM	m3/kWh	15,37	15,47	15,55	16,02	15,69	14,74	15,04	14,91	14,41	14,73	14,72	15,09	
PA18	PA42	PA38	Caudal de Producción promedio diario PMB	Es el volumen producido promedio diario del mes en PMB	m^3/d	1.960.819	1.971.015	1.957.213	1.952.661	1.931.954	1.950.110	1.934.009	1.885.811	1.881.900	1.891.088	1.903.456	1.917.249	
PA49	PA47	PA43	m3 producidos por unidad de consumo energético PMB	Es el cociente entre el volumen producido y el consumo de energía de producción en PMB	m3/kWh	21,05	20,93	21,37	21,14	20,72	20,60	20,44	20,79	20,54	20,22	20,54	20,23	
PA19.1	PA64	PA57	Caudal de Producción promedio diario PJMR	Es el volumen producido promedio diario del mes en PJMR	m^3/d	330.619	332.301	321.978	306.078	282.120	286.516	278.722	277.555	277.283	283.812	288.456	311.912	
PA50.1	PA69	PA62	m3 producidos por unidad de consumo energético - PJMR	Es el cociente entre el volumen producido y el consumo de energía de producción en PJMR	m3/kWh	12,63	12,48	12,36	12,40	11,72	11,39	11,58	11,22	11,47	11,64	12,09	12,34	
PA21	PA101	-	Producción promedio diaria Pozos Norte	Es el promedio del agua de salida de los pozos NORTE	m3/d	Se discontinua este indicador por no haber pozos en funcionamiento												
PA22	PA102	PA73	Producción promedio diario Pozos Sur	Es el promedio del agua de salida de los pozos SUR	m^3/d	281.112	282.442	285.966	277.658	263.761	259.154	265.440	267.085	263.052	263.504	253.321	264.016	
PA23	PA103	PA74	Producción promedio diario Pozos Oeste	Es el promedio del agua de salida de los pozos OESTE	m^3/d	180.762	184.727	188.194	187.082	185.280	181.285	182.802	183.048	182.057	187.493	186.609	185.795	
PA51	PA110	-	m3 de agua subterránea producida por unidad de consumo energético - Pozos NORTE AMBA	Es el cociente entre el consumo de energía de los pozos y el volumen	m3/kWh	Se discontinua este indicador por no haber pozos en funcionamiento												
PA52	PA111	PA79	m3 de agua subterránea producida por unidad de consumo energético - Pozos SUR AMBA	Es el cociente entre el volumen producido y el consumo de energía de los pozos SUR	m3/kWh	3,59	3,62	3,56	3,64	3,66	3,76	3,64	3,72	3,71	3,63	3,73	3,76	
PA53	PA112	PA80	m3 de agua subterránea producida por unidad de consumo energético - Pozos OESTE AMBA	Es el cociente entre el volumen producido y el consumo de energía de los pozos OESTE	m3/kWh	3,84	3,81	3,88	3,94	3,97	3,93	3,97	3,96	3,88	4,02	3,98	4,03	

Datos AMBA (Nuevas Jurisdicciones)

CÓD Anterior N°	CÓD N°	COD. AGUA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
	PA135	PA104	Volumen mensual de agua cruda subterránea Total (AMBA)	Es el volumen total mensual elevado de agua cruda Subterránea	m3	19.659.659	17.650.991	19.514.822	18.741.708	19.182.697	18.383.780	19.096.821	19.129.082	18.461.523	18.935.661	18.444.133	18.994.760	
		PA174	Volumen mensual de agua cruda subterránea a red Total (AMBA)	Volumen total mensual producido de agua subterránea a red en AMBA	m3	19.652.992	17.645.598	19.508.597	18.736.260	19.176.337	18.378.567	19.090.145	19.123.379	18.456.267	18.930.270	18.438.811	18.987.999	
	PA144	PA112	Producción promedio diaria Pozos OESTE AMBA	Es el promedio del agua de salida de los pozos OESTE AMBA	m3/d	235.599	234.894	232.359	226.394	223.154	222.371	227.934	224.101	223.700	222.922	224.632	223.779	
	PA145	PA113	Producción promedio diario Pozos NORTE AMBA	Es el promedio del agua de salida de los pozos NORTE AMBA	m3/d	173.312	169.295	169.999	170.372	172.594	166.579	168.454	166.917	170.262	166.978	165.726	165.534	
	PA147	PA114	Producción promedio diario Pozos SUR AMBA	Es el promedio del agua de salida de los pozos SUR AMBA	m3/d	225.272	226.204	227.153	227.957	223.049	223.842	219.639	226.050	221.422	220.928	224.446	223.421	
	PA156	PA121	m3 de agua subt. producida por unidad de consumo energético - Pozos OESTE AMBA	Es el cociente entre el consumo de energía y el volumen producido Pozos OESTE AMBA	m3/kWh	3,78	3,77	3,76	3,69	3,77	3,84	3,77	3,73	3,74	3,77	3,70	3,71	
	PA157	PA122	m3 de agua subterránea producida por unidad de consumo energético - Pozos NORTE AMBA	Es el cociente entre el consumo de energía y el volumen producido Pozos NORTE AMBA	m3/kWh	3,61	3,59	3,57	3,62	3,62	3,69	3,70	3,66	3,62	3,60	3,60	3,63	
	PA159	PA123	m3 de agua subterránea producida por unidad de consumo energético - Pozos SUR AMBA/Presidente Perón	Es el cociente entre el consumo de energía y el volumen producido Pozos SUR AMBA	m3/kWh	3,42	3,44	3,43	3,53	3,55	3,54	3,51	3,56	3,49	3,35	3,37	3,38	

aysa	**ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE** **INSTALACIONES EN USO** **Período: 1 de enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **230-INS-A-PR-01 (Ex 70)**

Ubicación		**Capacidad de Almacenamiento (m^3)**
Planta Pot. Gral San Martín	Av. De los Ombúes 209 (CABA)	**300.000**
Planta Pot. Gral Manuel Belgrano	Caseros 269 Bernal (Quilmes)	**278.890**
Planta Pot Juan Manuel de Rosas	Ruta Provincial N° 26 y Brasil (Dique Luján)	**120.000**
Estación Elevadora Caballito	José M. Moreno 520 (CABA)	**48.000**
Estación Elevadora Devoto	Navarro 4150 (CABA)	**48.000**
Estación Elevadora Constitución	Pavón 1958 (CABA)	**72.000**
Tanque de Batería La Lata	Guillón, Arana, Gral Las Heras y Alem (Esteban Echeverría)	**500**
Tanque de Spegazzini	Saénz Peña y Bogado, Spegazzini (Ezeiza)	**1.000**
Tanque de Tristán Suárez	Palacios y Rosario, Tristán Súarez (Ezeiza)	**1.000**
Cisterna de 9 de Abril	Prayones 3150 (Esteban Echeverría)	**2.000**
Cisterna Temperley	M.Arrotea e Hipólito Irigoyen (Lomas de Zamora)	**6.000**
Cisterna Banfield	11 de Setiembre 1302 (Lomas de Zamora)	**500**
Cisterna Rebombeo Llavallol	Magallanes 1950 entre Ucrania y Duhalde (Lomas de Zamora)	**500**
Cisterna Reb. Quinta Presidencial	Carlos Villate 1000 y Hernán Wineberg (Olivos)	**340**
Barrio Municipal	Avenida Central entre calle 660 y 700 La Matanza	**450**
Planta La Celia	Calle Río Bermejo (esquina Río Gualeguay) - Barrio La Celia - Partido de Ezeiza	**52**
Planta Santa Catalina	Calle Castex 1680 (esquina Zuviría) - Barrio 9 de Abril - Partido de Esteban Echeverría	**200**
Planta La Morita	Máximo Paz 2071, Jagüel (Ezeiza)	**600**
Planta Barrio Uno	Av. De los Chivatos esquina Almafuerte - Barrio Uno (Ezeiza)	**120**
Planta Ezeiza	América del Norte / Esquina Valle de Rio Negro (Ezeiza)	**2.000**
Planta Glew	Juan B. Justo N° 400 / Esquina Av. República Argentina (Almirante Brown)	**3.600**
Planta Rayo de sol	Provincia de Santiago del Estero entre Álvarez de Santa Clara y Rosario (Almirante Brown)	**72**
Planta MN043	Luján y Estanislao Del Campo - Rafael Castillo (La Matanza)	**30**
Planta MN147	Beazley y Zamudio - Rafael Castillo (La Matanza)	**30**
TOTAL RESERVA		**885.884**

aysa	**ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE** **INSTALACIONES EN USO - NUEVAS ÁREAS** **Período: 1 de enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **230-INS-A-PR-01 (Ex 70)**

Ubicación		**Capacidad de Almacenamiento (m^3)**
Tanque La Yaya	Pedraza 854, (Presidente Perón)	**1.000**
Tanque San Martin	Av Carlos Mereles 1050 (Presidente Perón)	**1.000**
Tanque El Cruce	Sargento Cabral N° 1222 Ex 872 (Florencio Varela)	**1.000**
Cisterna El Cruce	Sargento Cabral N° 1222 Ex 872 (Florencio Varela)	**5.200**
Cisterna San Luis	Av. Los inmigrantes y calle N° 1363 (Florencio Varela)	**4.400**
Cisterna Sarmiento	Calle 1404-498 (Florencio Varela)	**4.400**
Tanque Barrio Fonavi	1° de Mayo entre Pablo Marín y Malvinas Argentinas (Garín)	**800**
Cisterna Barrio Coprovi	Sanguineti entre Irupé y Gral Alvarado (Escobar)	**50**
Tanque Barrio Coprovi	Sanguineti entre Irupé y Gral Alvarado (Escobar)	**50**
Cisterna Rebombeo La Guarida	Juan José Paso y Padre Ustarroz (San Miguel)	**5.000**
Cisterna Rebombeo Muñiz	Conesa 1300 (San Miguel)	**5.000**
Cisterna Rebombeo Moreno 1	Lincoln entre Necochea y Entre Ríos (Moreno)	**5.000**
Cisterna Rebombeo Parque San Martín	12 de Febrero entre Del Valle A. y Fleming (Merlo)	**8.000**
Planta Fleni Escobar	12 de Febrero entre Del Valle A. y Fleming (Merlo)	**30**
Planta Merlo	Olaya esquina Güiraldes. Barrio Procrear (Merlo)	**36**
TOTAL RESERVA		**40.966**

Descropción de Cambios: Cisterna El Cruce: Se actualizaron datos, corresponde 5200

1.3 TRANSPORTE

CÓD Viejo Nº	Cod. Anterior	Cod. AGUA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
TA01	TA01	TA01	Caudal mensual bombeado en las 14 EE + Impulsiones + Bernales	Es el agua impulsada por las EEAA a red, incluye impulsadas (PSM y JMR), Bernal I y IV	m^3/mes	158.244.414	144.506.963	158.537.257	152.407.967	154.769.904	148.446.665	153.997.424	150.870.062	144.825.496	150.714.612	146.294.152	155.454.106	
		TA02	Consumo energía Mensual en las 14 EEAA + Iimpulsión **(PSM y PJMR)** + Bernales	Consumo de energía eléctrica de las 14 EEAA , Impulsión **(PSM y PJMR)**, BI, y BIV	MWh	35.372,02	32.363,41	35.062,51	33.396,90	33.947,07	32.688,03	34.063,49	33.383,11	31.825,76	32.880,44	31.910,12	33.858,59	
		TA04	Consumo de energía mensual de las 14 EEAA	Consumo de energía en función del caudal bombeado **(solo las 14 EEAA)**	MWh	26.046,09	23.778,28	25.816,71	24.671,10	25.170,59	24.224,62	25.341,07	24.731,66	23.567,64	24.282,54	23.461,57	24.934,75	
TA02	TA06	TA08	Caudal mensual bombeado EE Caballito	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	13.293.113	11.993.153	13.368.912	12.861.264	13.277.695	13.127.742	14.078.399	13.601.037	13.051.495	12.673.619	11.521.193	12.086.706	
TA91	TA08	TA10	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Caballito	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	5,20	5,20	5,24	5,25	5,25	5,23	5,13	5,20	5,20	5,21	5,23	5,21	
TA20	TA14	TA16	Tasa de Mantenimiento EE Caballito	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	100,00	98,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,56	100,00	100,00	100,00	
TA04	TA15	TA17	Caudal mensual bombeado EE Centro	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	3.271.921	4.231.636	4.442.250	4.243.520	4.423.117	4.308.941	4.745.675	4.429.665	4.353.528	4.426.587	4.272.188	4.491.860	
TA93	TA17	TA19	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Centro	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	6,53	6,46	6,17	6,05	6,06	6,14	6,39	6,09	6,15	6,10	6,07	6,10	
TA22	TA23	TA25	Tasa de Mantenimiento EE Centro	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	80,00	62,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	75,00	75,00	75,00	67,80	
TA05	TA24	TA26	Caudal mensual bombeado EE Constitución	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	9.037.015	8.078.173	9.086.710	8.847.607	9.102.436	8.852.930	9.124.861	8.959.976	8.518.898	8.887.705	8.787.944	9.090.149	
TA94	TA26	TA28	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Constitución	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	5,28	5,29	5,36	5,34	5,34	5,31	5,30	5,31	5,33	5,31	5,33	5,34	
TA23	TA32	TA34	Tasa de Mantenimiento EE Constitución	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	100,00	100,00	84,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
TA03	TA33	TA35	Caudal mensual bombeado EE Devoto	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m^3/día	9.220.763	8.347.922	9.180.507	8.783.996	9.039.506	8.652.737	9.474.924	9.242.306	8.982.516	9.128.560	8.701.215	8.823.563	
TA92	TA35	TA37	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Devoto	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	3,98	4,01	4,08	3,97	3,95	3,98	3,98	3,96	4,00	3,96	3,94	3,88	
TA21	TA41	TA43	Tasa de Mantenimiento EE Devoto	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	83,33	83,33	83,33	83,33	85,00	100,00	98,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TA07	TA42	TA44	Caudal mensual bombeado EE Floresta	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m^3/día	7.112.043	6.578.658	7.378.473	7.063.718	7.381.867	7.301.657	7.482.584	7.298.665	6.994.531	7.319.934	7.179.452	7.689.147	
TA96	TA44	TA46	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Floresta	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	5,51	5,51	5,43	5,54	5,62	5,63	5,49	5,52	5,45	5,47	5,49	5,53	
TA25	TA50	TA52	Tasa de Mantenimiento EE Floresta	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	97,40	82,14	100,00	100,00	96,00	82,60	99,40	100,00	89,33	80,00	80,00	80,00	
TA08	TA51	TA53	Caudal mensual bombeado EE Lanus	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	19.726.315	17.892.594	19.359.888	18.484.815	18.790.674	18.136.090	18.792.820	18.542.625	17.925.068	18.597.096	18.109.594	18.701.879	
TA97	TA53	TA55	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Lanus	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	5,16	5,23	5,12	5,09	4,96	5,00	4,89	4,92	4,93	4,95	4,98	4,96	
TA26	TA59	TA61	Tasa de Mantenimiento EE Lanus	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	77,88	75,45	81,00	87,50	88,25	90,88	88,25	95,63	87,50	87,50	87,50	100,00	
TA11	TA60	TA62	Caudal mensual bombeado EE La Matanza	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	18.238.664	16.342.621	18.027.726	17.392.574	18.064.680	17.204.370	18.064.854	17.799.479	17.148.300	17.827.195	17.264.526	18.080.668	
TA100	TA62	TA64	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE La Matanza	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	5,43	5,28	5,53	5,61	5,73	5,62	5,67	5,64	5,74	5,78	5,78	5,90	
TA29	TA68	TA70	Tasa de Mantenimiento EE La Matanza	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,33	100,00	83,83	83,33	83,33	85,56	100,00	
TA12	TA69	TA71	Caudal mensual bombeado EE Moron	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m^3/día	8.538.123	7.767.040	8.151.525	7.280.982	6.963.073	6.623.171	6.663.344	6.434.957	6.132.618	6.436.239	6.419.056	7.652.678	
TA101	TA71	TA73	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Moron	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	3,71	3,74	3,75	3,74	3,66	3,60	3,55	3,62	3,58	3,62	3,64	3,73	
TA30	TA77	TA79	Tasa de Mantenimiento EE Moron	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	81,25	85,71	87,50	87,50	87,50	88,38	90,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
TA09	TA78	TA80	Caudal mensual bombeado EE Quilmes	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	5.439.642	4.896.996	5.276.545	5.108.329	5.186.199	4.739.542	4.865.718	4.794.079	4.556.395	4.732.224	4.642.191	5.651.846	
TA98	TA80	TA82	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Quilmes	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	2,58	2,54	2,55	2,52	2,54	2,51	2,53	2,51	2,51	2,47	2,48	2,86	
TA27	TA86	TA88	Tasa de Mantenimiento EE Quilmes	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,80	89,00	97,33	100,00	96,00	86,40	
TA06	TA87	TA89	Caudal mensual bombeado EE Saavedra	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	7.100.197	6.324.823	7.205.369	6.909.877	7.164.635	7.013.948	7.180.273	7.198.690	6.804.987	7.109.421	6.657.645	7.099.614	
TA95	TA89	TA91	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Saavedra	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	4,95	4,91	5,06	5,04	5,03	5,03	4,97	4,98	4,99	4,95	4,86	5,01	
TA24	TA95	TA97	Tasa de Mantenimiento EE Saavedra	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	83,33	83,33	67,17	61,17	60,17	82,17	83,33	83,33	83,33	83,83	83,33	83,33	
TA13	TA96	TA98	Caudal mensual bombeado EE Tres de Febrero	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	6.299.617	5.762.779	6.295.631	6.020.062	5.791.435	5.619.771	5.614.900	5.626.978	5.420.926	5.524.086	5.519.452	6.148.213	
TA102	TA98	TA100	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Tres de Febrero	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	3,69	3,69	3,67	3,65	3,57	3,65	3,59	3,57	3,58	3,59	3,63	3,71	
TA31	TA104	TA106	Tasa de Mantenimiento EE Tres de Febrero	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,83	100,00	100,00	79,00	
TA10	TA105	TA107	Caudal mensual bombeado EEVilla Adelina	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	9.489.565	8.399.435	9.223.152	8.514.968	9.085.159	8.195.750	8.514.809	8.628.476	8.173.641	8.608.916	8.686.168	8.897.675	
TA99	TA107	TA109	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Villa Adelina	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	4,91	4,93	5,07	5,16	5,36	5,28	5,20	5,38	5,44	5,28	5,32	5,26	

CÓD Viejo Nº	Cod. Anterior	Cod. AGUA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
TA28	TA113	TA115	Tasa de Mantenimiento EE Villa Adelina	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	100,00	100,00	82,33	62,83	66,67	66,67	59,17	50,00	50,00	51,00	50,00	74,67	
TA117	TA114	TA116	Caudal mensual bombeado EEVilla Adelina 2	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	1.781.269	1.925.109	1.978.810	2.024.897	1.868.360	2.019.434	1.868.705	1.562.212	1.212.598	1.541.628	1.298.864	1.671.907	
TA122	TA116	TA118	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Villa Adelina 2	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	3,95	6,21	5,37	5,63	4,64	6,02	5,48	4,56	3,52	7,88	5,86	4,60	
TA118	TA122	TA122	Tasa de Mantenimiento EE Villa Adelina 2	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	96,00	100,00	96,75	93,25	100,00	98,25	76,50	75,00	75,00	75,00	96,67	100,00	
-	TA123	TA123	Caudal mensual bombeado EEVilla Adelina 1	Es el promedio mensual de agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	1.296.356	892.146	1.063.910	1.046.918	1.191.802	1.008.665	1.026.271	1.046.441	1.014.543	773.815	791.581	1.062.213	
-	TA125	TA125	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE Villa Adelina 1	m3 bombeados por consumo unitario de energía	m3/kWh	2,35	1,44	1,70	1,65	2,09	1,61	1,79	2,24	2,90	1,65	2,06	2,03	
		TA129	Tasa de Mantenimiento EE Villa Adelina 1	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	90,50	57,14	100,00	85,00	100,00	65,00	50,00	50,00	50,00	30,50	48,33	50,00	
-	TA132	TA130	Caudal mensual Impulsada EE JMR	Es el agua impulsada por la EEAA a red en PJMR	m3/mes	10.249.203	9.304.436	9.981.318	9.182.329	8.745.733	8.595.475	8.640.372	8.604.209	8.318.503	8.798.166	8.653.677	9.669.276	
		TA131	Consumo energía mensual para impulsion PJMR	Es el consumo de energía eléctrica utilizada para la impulsión	MWh	2.730,29	2.548,85	2.651,84	2.298,38	2.179,67	2.008,37	2.024,05	2.025,75	1.961,26	2.084,35	2.040,59	2.287,60	
-	TA134	TA132	Caudal bombeado en función del consumo de energía EE JMR	m3 bombeados por consumo unitario de energía en PJMR	m3/kWh	3,75	3,65	3,76	4,00	4,01	4,28	4,27	4,25	4,24	4,22	4,24	4,23	
		TA136	Tasa de mantenimiento bombas de impulsion PJMR	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado	%	95,00	85,00	86,25	75,00	87,38	86,25	87,50	93,00	72,50	75,38	80,05	98,75	
TA14	TA141	TA137	Caudal total mensual bombeado Impelentes Principales	Es el agua impulsada por la EEAA IMPELENTES PRINCIPALES a red en PSM	m3/mes	16.719.231	15.334.537	16.984.932	17.425.913	17.194.340	16.101.415	16.664.157	16.234.135	15.756.394	17.364.009	17.061.264	17.364.009	
		TA138	Consumo energía Mensual Impelentes Principales	Consumo de energía eléctrica de la EEAA	MWh	3.462,0	3.114,9	3.389,5	3.287,1	3.335,2	3.336,9	3.489,9	3.473,1	3.255,8	3.364,9	3.332,4	3.463,5	
TA103	TA143	TA139	Caudal bombeado en función del consumo de energía Impelentes Principales.	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	4,83	4,92	5,01	5,30	5,16	4,83	4,77	4,67	4,84	5,16	5,12	5,01	
TA32	TA147	TA143	Tasa de Mantenimiento EE Impelentes	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	77,78	83,33	76,67	76,67	63,33	65,56	75,56	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	
TA16	TA152	TA144	Caudal mensual bombeado Bernal I	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	6.996.485	6.377.180	7.029.300	6.826.933	7.047.826	6.692.466	6.811.492	6.577.465	6.346.325	6.625.712	6.516.781	6.847.111	
		TA145	Consumo de energía Bernal I	Consumo de energía eléctrica de la EEAA	MWh	1.894,9	1.733,3	1.885,4	1.859,9	1.950,9	1.859,6	1.892,7	1.852,4	1.792,1	1.838,3	1.807,7	1.860,2	
TA104	TA154	TA146	Caudal bombeado en función del consumo de energía de Bernal I	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	3,69	3,68	3,73	3,67	3,61	3,60	3,60	3,55	3,54	3,60	3,61	3,68	
TA34	TA158	TA150	Tasa de Mantenimiento EE Bernal I	Contempla la disponibilidad de equipos en condiciones de funcionar frente a la totalidad del parque instalado.	%	100,00	100,00	99,43	100,00	85,71	85,14	99,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	TA173	TA151	Caudal mensual bombeado Bernal IV	Es el agua impulsada por la EEAA a red	m3/mes	4.434.892	4.057.725	4.502.300	4.389.264	4.451.367	4.252.560	4.383.267	4.288.668	4.114.229	4.339.698	4.211.362	4.425.592	
-	TA173	TA152	Consumo de energía Bernal IV	Consumo de energía eléctrica de la EEAA	MWh	1.239	1.188	1.319	1.280	1.311	1.259	1.316	1.300	1.249	1.310	1.268	1.313	
-	TA174	TA153	Caudal bombeado en función del consumo de energía Bernal IV	m3 bombeados por consumo unitario de energía	m3/kWh	3,58	3,42	3,41	3,43	3,40	3,38	3,33	3,30	3,29	3,31	3,32	3,37	
-	TA175	TA154	Consumo específico de energía Bernal IV	Consumo de energía en función del caudal bombeado	Wh/m3	279,30	292,81	292,97	291,71	294,46	295,95	300,18	303,16	303,56	301,94	301,07	296,59	
-	TA177	TA155	Cantidad de bombas Totales Bernal IV	Nº de bombas totales instaladas	Nº	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
-	TA178	TA156	Cantidad de bombas Disponibles Bernal IV	Nº de bombas Disponibles totales	Nº	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	
TA19	TA180	TA158	Caudal mensual bombeado por Rebombeos **(Concesión Original)**	Caudal de agua a la salida del rebombeo	m3/mes	7.836.235	7.044.213	7.950.675	6.780.416	6.847.132	6.636.534	7.086.929	7.632.829	7.263.137	7.536.068	7.207.330	7.340.513	21/08/2025 El motivo de la rectificación de los valores de producción de 9 de abril, se
		TA159	Consumo de energía Rebombeos **(Concesión Original)**	Consumo de energía eléctrica de rebombeos	MWh	663,53	595,62	666,85	546,49	553,34	540,22	616,87	840,87	771,12	774,80	760,18	713,74	
TA107	TA183	TA160	Caudal bombeado en función del consumo de energía Rebombeos **(Concesión Original)**	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	11,81	11,83	11,92	12,41	12,37	12,28	11,49	9,08	9,42	9,73	9,48	10,28	
		TA163	Caudal mensual bombeado por Rebombeos (**AMBA**)	Caudal de agua a la salida del rebombeo	m^3/mes	4.924.276	4.194.968	4.565.527	4.516.483	4.528.203	4.531.787	4.638.183	4.698.944	4.452.714	4.558.647	4.546.276	4.628.601	
		TA164	Consumo de energía Rebombeos (**AMBA**)	Consumo de energía eléctrica de rebombeos	MWh	605,98	528,97	557,20	472,87	484,63	467,92	486,95	489,22	462,75	479,59	480,22	475,66	
		TA165	Caudal bombeado en función del consumo de energía Rebombeos (**AMBA**)	m^3 bombeados por consumo unitario de energía	m^3/kWh	8,13	7,93	8,19	9,55	9,34	9,69	9,52	9,60	9,62	9,51	9,47	9,73	

1.4 INSUMOS QUÍMICOS

1.4.1 Consumo Plantas

PLANTA SAN MARTIN

EVOLUCION DE CONSUMOS DE INSUMOS QUIMICOS

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Planilla INS-A-IQ-PSM (Ex 66)

MES	Agua Elevada	Consumo de Coagulante	Dosis de Coagulante al 6%	Dosis de Coagulante al 18%	Consumo de Cal	Dosis de Cal	Consumo de Cloro	Dosis de Cloro	Consumo de Polielectrolito	Dosis de Polielectrolito	Agua producida
	m³	Tn 6% o.ut.	g/m³	g/m³	T	g/m³	Kg	g/m³	Kg	g/m³	m³
ENERO	101.662.954	13.065	129	43,0	928,8	10,40	408.840	4,6	2.925	0,03	89.722.290
FEBRERO	87.909.759	12.466	142	47,3	859,30	10,50	421.845	5,1	3.350	0,04	82.134.804
MARZO	95.519.692	19.064	200	66,7	1.100,2	12,20	514.960	5,7	5.140	0,05	89.850.130
ABRIL	94.941.361	19.313	203	67,7	897,0	10,30	432.000	4,9	4.185	0,04	87.486.100
MAYO	99.380.233	20.543	207	69,0	970,4	10,90	598.165	6,7	5.390	0,05	89.292.633
JUNIO	97.407.135	22.140	227	75,7	1.285,6	15,10	558.565	6,6	7.910	0,08	85.155.875
JULIO	102.454.631	17.179	168	56,0	1.251,1	14,10	524.705	5,9	8.780	0,09	89.022.030
AGOSTO	100.323.984	18.676	186	62,0	1.256,0	14,40	606.910	6,9	6.895	0,07	87.432.683
SEPTIEMBRE	94.601.241	21.533	228	76,0	1.182,8	14,20	638.475	7,7	6.895	0,07	83.335.364
OCTUBRE	99.483.631	20.292	204	68,0	983,5	11,30	598.415	6,9	5.660	0,06	86.918.039
NOVIEMBRE	97.851.358	17.680	181	60,3	1.213,4	14,40	474.835	5,6	4.215	0,04	84.448.588
DICIEMBRE	100.579.665	16.263	162	54,0	1.256,8	14,00	571.290	6,4	4.455	0,04	89.468.432

PLANTA MANUEL BELGRANO

EVOLUCION DE CONSUMOS DE INSUMOS QUIMICOS

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Informe Anual de Niveles de Servicio

20° Año de Concesión

Planilla INS-A-IQ-PMB (Ex 67)

MES	Agua Elevada	Consumo de Coagulante*	Dosis de Coagulante al 6%	Dosis de Coagulante al 18%	Consumo de Cal	Dosis de Cal	Consumo de Cloro	Dosis de Cloro	Consumo de Polielectrolito	Dosis de Polielectrolito	Agua producida
	m³	t 6% O.U.T	g/m³	g/m³	t	g/m³	kg	g/m³	kg	g/m³	m³
ENERO	62.872.090	6.103	97,1	32,4	744	12,2	254.500	4,2	2.925	0,047	60.785.380
FEBRERO	57.238.940	5.967	104,2	34,7	575	10,4	213.500	3,9	2.725	0,048	55.188.412
MARZO	63.201.650	8.702	137,7	45,9	668	11,0	237.600	3,9	3.775	0,060	60.673.606
ABRIL	61.183.170	7.744	126,6	42,2	760	13,0	273.000	4,7	3.375	0,055	58.579.832
MAYO	62.565.780	8.660	138,4	46,1	712	11,9	351.300	5,9	3.675	0,059	59.890.582
JUNIO	60.694.530	9.856	162,4	54,1	672	11,5	319.500	5,5	3.000	0,049	58.503.310
JULIO	62.711.880	9.226	147,1	49,0	722	12,0	292.500	4,9	3.350	0,053	59.954.293
AGOSTO	61.134.700	8.796	143,9	48,0	691	11,8	349.000	6,0	3.175	0,052	58.460.131
SEPTIEMBRE	58.817.200	9.881	168,0	56,0	754	13,4	414.600	7,3	3.100	0,053	56.457.011
OCTUBRE	61.250.570	8.763	143,1	47,7	789	13,5	340.400	5,8	2.800	0,046	58.623.735
NOVIEMBRE	59.645.280	7.743	129,8	43,3	647	11,3	255.300	4,5	2.775	0,047	57.103.667
DICIEMBRE	62.103.260	7.448	119,9	40,0	498	8,4	239.300	4,0	3.050	0,049	59.434.712

Nota: Los datos provienen de Laboratorio de Planta

* Coagulante: suma de PAC y Sulfato de Aluminio

PLANTA JUAN MANUEL DE ROSAS

EVOLUCION DE CONSUMOS DE INSUMOS QUIMICOS

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Planilla INS-A-IQ-PJMR

MES	Agua Elevada	Consumo de Coagulante	Dosis de Coagulante al 6%	Dosis de Coagulante al 18%	Consumo de Cal	Dosis de Cal	Consumo de Cloro	Dosis de Cloro	Consumo de Polielectrolito	Dosis de Polielectrolito	Agua a Consumo
	m³	t 6% oxi.utiles	g/m³	g/m³	t	g/m³	t	g/m³	t	g/m³	m³
ENERO	10.401.534	808,680	78	25,9	85,450	8,3	33,188	3,2	0,2193	0,02	10.249.203
FEBRERO	9.379.734	711,930	76	25,3	77,200	8,3	28,429	3,1	0,2286	0,02	9.304.436
MARZO	10.086.816	1.204,310	119	39,8	99,620	10,0	32,465	3,3	0,3484	0,03	9.981.318
ABRIL	9.357.357	876,840	94	31,2	74,140	8,1	26,798	2,9	0,3583	0,04	9.182.329
MAYO	8.865.675	1.263,320	143	47,5	82,520	9,4	29,537	3,4	0,3598	0,04	8.745.733
JUNIO	8.806.148	1.494,330	170	56,6	93,950	10,9	31,944	3,7	0,2079	0,02	8.595.475
JULIO	8.835.344	1.288,570	146	48,6	90,310	10,5	31,594	3,7	0,2097	0,02	8.640.372
AGOSTO	8.880.375	1.373,710	155	51,6	93,790	10,9	33,651	3,9	0,2102	0,02	8.604.209
SEPTIEMBRE	8.552.101	1.270,260	149	49,5	84,500	10,2	30,185	3,6	0,2633	0,03	8.318.503
OCTUBRE	8.971.543	1.151,190	128	42,8	80,940	9,2	31,590	3,6	0,2606	0,03	8.798.166
NOVIEMBRE	8.870.174	1.046,250	118	39,3	81,590	9,4	31,644	3,7	0,2680	0,03	8.653.677
DICIEMBRE	9.848.975	993,370	101	33,6	70,630	7,3	32,912	3,4	0,2730	0,03	9.669.276

1.4.2 Consumo Elevadoras + Pozos + Plantas Tratamiento

aysa	**ESTACIONES ELEVADORAS - POZOS** **EVOLUCIÓN DE CONSUMOS DE INSUMOS QUÍMICOS** **Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **290-INS-A-IQ-TR-00**

MES / ESTABLECIMIENTO				**POZOS DE AGUA**		
				Agua Elevada	**Hipoclorito de sodio**	**Dosis de hipoclorito**
				m³	kg	mg/l
ENERO				19.652.992	397.666	20,23
FEBRERO				17.645.598	368.723	20,90
MARZO				19.508.597	361.359	18,52
ABRIL				18.736.260	336.695	17,97
MAYO				19.176.337	290.783	15,16
JUNIO				18.378.567	255.993	13,93
JULIO				19.090.145	239.779	12,56
AGOSTO				19.123.379	257.405	13,46
SEPTIEMBRE				18.456.267	228.840	12,40
OCTUBRE				18.930.270	239.522	12,65
NOVIEMBRE				18.438.811	241.166	13,08
DICIEMBRE				18.987.999	272.141	14,33
TOTAL	**0**	**0**		**226.125.222**	**3.490.072**	**15,43**

Nota 1 **En el consumo de hipoclorito de Pozos de Agua se contabilizan las intervenciones por desinfección.**

Nota 2 **Se considera el consumo de hipoclorito de pozos, rebombeos y plantas de agua subterranea**

aysa	**PLANTAS DE TRATAMIENTO** **EVOLUCION DE CONSUMOS DE INSUMOS QUIMICOS** **Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-A-IQ-TR-01**

MES / ESTABLECIMIENTO	OSMOSIS INVERSA		INTERCAMBIO IONICO		
	Agua tratada	Antiescalante	Agua tratada	Sal	Hipoclorito
	m³	kg	m³	kg	Tn
ENERO	1.150.805	3.734	324.943	387.674	45,592
FEBRERO	1.056.177	3.422	290.881	378.572	45,106
MARZO	1.173.681	3.961	309.210	370.384	52,592
ABRIL	1.179.424	3.962	321.878	392.380	48,118
MAYO	1.058.355	3.614	318.855	353.088	49,517
JUNIO	1.104.442	3.722	315.836	372.680	43,680
JULIO	1.140.976	3.819	307.894	412.897	32,870
AGOSTO	1.143.287	3.664	299.725	374.009	39,090
SEPTIEMBRE	1.079.195	3.556	310.785	373.904	39,010
OCTUBRE	1.119.208	3.771	330.097	394.319	42,510
NOVIEMBRE	1.078.564	3.664	311.350	355.600	35,534
DICIEMBRE	1.104.957	3.708	319.757	352.800	39,216
TOTAL	**13.389.071**	**44.599**	**3.761.212**	**4.518.307**	**512,835**

aysa	**PLANTAS DE TRATAMIENTO** **EVOLUCION DE CONSUMOS DE INSUMOS QUIMICOS** **Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio**

MES / ESTABLECIMIENTO	ADSORCIÓN		INTERCAMBIO IONICO		ÓSMOSIS INVERSA	
	Agua tratada	Carbón Activado Granular	Agua tratada	Sal	Agua tratada	Antiincrustante
	m³	kg	m³	kg	m³	kg
ENERO	160.704	-			20.563	68,0
FEBRERO	145.152	-			14.919	62,0
MARZO	212.784	-			16.287	88,4
ABRIL	205.920	-			14.675	72,0
MAYO	182.544	-			14.862	79,6
JUNIO	211.700	-			14.307	73,0
JULIO	218.756	-			20.082	71,0
AGOSTO	218.756	-			15.624	61,0
SEPTIEMBRE	211.700	-			13.786	48,0
OCTUBRE	218.756	-			14.094	53,0
NOVIEMBRE	157.200	-			14.002	55,0
DICIEMBRE	160.704	-			19.100	66,0
TOTAL	**2.304.676**	**0**	**0**	**0**	**192.301**	**797**

Agua Tratada Intercambio Iónico: PLANTA DESHABILITADA desde 22/03/23

1.5 INFORMACIÓN GENERAL

1.5.1 Continuidad del Abastecimiento – Reclamos

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO CABALLITO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	1	4	2	2	3	14	6	4	4	4	2	1	**47**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	**3**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	1	4	2	2	3	14	6	4	4	1	2	1	**44**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	1	4	2	2	3	14	6	4	4	1	2	1	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	**6,38%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	500	417	445	523	474	655	757	480	488	459	386	400	**5.984**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	466	410	446	520	484	562	766	505	557	465	359	418	**5.958**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	24	22	15	35	28	62	66	16	16	12	13	11	**320**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	29	33	34	33	37	35	44	48	45	20	30	25	**35,18**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	333	368	343	469	474	655	640	334	373	394	372	446	**5.201**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	347	336	374	454	453	631	663	337	386	399	367	422	**5.169**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	7	8	6	18	24	29	21	13	7	13	5	8	**159**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	29	33	34	33	37	35	44	48	45	20	30	25	**34,69**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	102	148	214	278	273	426	505	186	156	157	248	205	**2.898**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	115	125	228	277	264	403	537	190	153	161	242	200	**2.895**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	4	9	5	7	8	25	5	2	3	7	2	3	**80**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	19	22	23	24	23	18	24	24	24	17	19	18	**21,45**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	535	490	638	623	527	784	768	467	499	640	519	614	**7.104**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	512	528	574	652	524	696	730	561	512	612	568	599	**7.068**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	21	14	39	23	21	65	29	12	25	40	19	14	**322**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17	24	26	34	25	33	42	43	29	34	32	25	**30,79**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	333	368	343	469	474	655	640	334	373	394	372	446	**5.201**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	347	336	374	454	453	631	663	337	386	399	367	422	**5.169**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	7	8	6	18	24	29	21	13	7	13	5	8	**159**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18	17	23	22	20	19	24	27	23	16	17	17	**20,28**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	935	933	1.002	1.270	1.221	1.736	1.902	1.000	1.017	1.010	1.006	1.051	**14.083**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-5,56%	-10,20%	-22,39%	-10,94%	-50,65%	11,14%	-47,46%	-25,60%	-6,35%	27,36%	17,11%	25,42%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-16,28%	-21,10%	-6,45%	-9,71%	-39,98%	53,42%	-23,05%	-43,33%	-20,41%	2,40%	-3,35%	28,72%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO CABALLITO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	564	513	658	731	826	870	1.085	902	796	745	715	642	**9.047**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	545	527	637	729	794	903	967	1.009	770	737	743	674	**9.035**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	18	9	17	26	17	25	47	16	21	26	2	5	**229**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15	16	18	17	24	21	28	22	16	15	17	15	**19,28**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	33	37	51	54	56	54	80	51	45	48	54	39	**602**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	32	38	49	56	50	59	73	56	47	41	58	42	**601**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	1	0	0	1	2	1	0	2	0	0	**8**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10	10	14	14	16	16	21	13	10	11	12	11	**13,69**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	23	34	34	42	38	53	55	32	35	35	43	33	**457**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	163	183	288	288	242	596	755	144	209	227	148	171	**3.414**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	144	192	263	301	231	595	739	172	219	218	157	170	**3.401**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	8	6	14	12	11	18	9	1	4	10	2	3	**98**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	67,0	79,0	68,9	111,0	141,9	170,5	132,6	113,5	80,4	56,4	46,3	83,7	**111,58**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	9,075	5,155	7,245	5,490	9,342	7,330	19,800	6,390	15,000	20,155	27,547	12,220	**144,749**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	727	696	946	1.019	1.068	1.466	1.840	1.046	1.005	972	863	813	**12.461**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	26,22%	8,41%	20,05%	52,32%	-0,56%	75,57%	1,32%	1,65%	0,50%	27,39%	24,53%	23,18%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	140	177	189	193	160	171	186	156	276	231	324	203	**2.406**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	143	137	204	214	178	183	165	176	202	274	290	271	**2.437**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	31	57	37	31	40	22	28	18	82	59	52	25	**482**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	207,3	135,4	160,2	139,8	137,2	119,7	102,0	157,2	120,5	150,4	156,4	184,0	**148,71**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-9,09%	32,09%	42,11%	34,03%	50,94%	56,88%	23,18%	9,86%	117,32%	61,54%	88,37%	31,82%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAT															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU	N°	3.197	2.635	2.345	2.787	2.762	2.827	2.974	2.962	3.249	3.010	2.313	2.942	**34.003**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	728	809	786	840	946	872	937	2.562	2.838	2.783	2.336	2.537	**18.974**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	716	802	732	866	879	913	1.003	2.217	2.800	2.738	2.305	2.781	**18.752**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	128	135	189	163	230	189	123	468	506	551	582	338		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,21	6,77	5,01	5,74	5,90	4,32	4,51	6,75	4,47	5,55	5,46	4,61	**5,31**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO CENTRO-CONSTITUCION

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	10	4	4	5	17	22	7	9	11	11	5	7	**112**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	**4**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	10	2	4	5	16	22	7	9	10	11	5	7	**108**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	9	2	4	5	16	22	7	9	10	11	5	7	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%	**3,57%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	463	437	518	497	453	555	677	489	433	472	394	368	**5.756**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	437	430	532	479	460	531	692	518	438	467	412	358	**5.754**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	21	36	20	38	23	41	28	20	29	22	6	15	**299**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	29,3	38,9	31,6	29,4	25,8	33,2	46,0	40,7	35,4	24,1	26,5	25,4	**32,96**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	349	304	356	389	372	669	815	436	325	372	324	399	**5.110**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	357	304	357	373	352	658	847	447	338	337	350	401	**5.121**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	18	11	5	13	13	28	16	10	3	23	9	8	**157**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,9	22,5	19,8	24,1	21,1	17,6	28,3	23,4	19,1	16,1	20,3	16,6	**21,22**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	126	113	201	136	188	416	581	178	133	128	135	126	**2.461**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	130	112	192	134	173	384	622	190	142	123	132	135	**2.469**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	5	9	2	6	6	30	7	6	1	5	6	3	**86**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	19,8	21,4	20,6	22,7	17,6	18,6	24,8	21,8	22,7	19,2	20,5	16,3	**21,15**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	8	6	27	5	21	25	21	22	27	20	15	13	**210**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	9	6	27	5	13	33	21	22	26	21	14	14	**211**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,8	8,7	11,8	7,4	3,8	8,3	12,1	6,5	10,2	6,8	9,5	8,8	**8,89**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	140	141	134	188	182	175	216	163	148	113	110	112	**1.822**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	123	118	158	163	174	175	226	160	174	115	97	132	**1.815**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	22	35	22	34	40	49	27	36	13	19	22	13	**332**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	57,5	103,4	123,3	132,9	102,4	145,4	196,4	163,6	144,4	126,8	113,1	118,6	**132,54**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	938	854	1.075	1.022	1.013	1.640	2.073	1.103	891	972	853	893	**13.327**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-40,37%	-40,61%	-22,27%	-23,04%	-44,13%	32,79%	-47,94%	-26,95%	-17,27%	-8,73%	-4,59%	4,57%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-85,71%	-82,86%	-59,09%	-87,50%	-56,25%	150,00%	-56,25%	100,00%	200,00%	17,65%	150,00%	160,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO CENTRO-CONSTITUCION

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	726	715	798	850	1.198	992	1.127	1.078	961	835	749	648	**10.677**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	720	687	826	811	1.138	1.052	1.127	1.041	992	842	783	628	**10.647**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	13	32	21	48	23	27	24	14	16	24	5	5	**252**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,6	20,1	18,3	19,6	19,4	21,3	25,5	21,4	20,5	19,6	20,3	18,7	**20,23**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	50	72	72	68	95	61	62	84	68	49	41	44	**766**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	47	70	76	66	82	71	65	76	73	51	42	45	**764**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	2	0	4	1	1	1	1	1	1	0	1	**14**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,9	16,0	15,5	15,1	17,2	18,9	18,0	16,9	19,6	15,3	10,6	17,4	**16,30**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	37	47	53	43	49	50	39	45	53	31	36	26	**509**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	26	30	23	21	22	22	22	29	32	19	44	27	**317**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	23	25	29	17	25	24	20	23	34	18	46	32	**316**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	5	2	4	0	0	0	7	5	4	2	1	**32**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	63,5	55,0	86,5	67,7	74,6	58,1	116,8	74,2	101,4	136,7	66,9	75,4	**79,74**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	14,280	12,620	8,720	4,430	31,363	22,450	17,530	19,795	15,945	1,850	11,165	28,760	**188,908**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	752	745	821	871	1.220	1.014	1.149	1.107	993	854	793	675	**10.994**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	36,23%	13,05%	-26,63%	6,09%	54,82%	49,34%	21,97%	6,85%	-8,31%	-3,39%	-8,11%	-15,73%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	164	142	136	198	180	147	218	201	190	209	165	130	**2.080**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	146	143	133	171	208	136	221	210	159	248	133	154	**2.062**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	23	29	29	54	25	30	37	30	50	19	41	23	**390**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	87,7	101,8	107,5	110,4	114,4	120,5	121,8	127,9	138,9	134,5	97,2	194,4	**122,58**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-45,33%	-39,83%	-45,16%	-21,12%	2,86%	13,95%	35,40%	4,69%	-6,86%	27,44%	-12,23%	-11,56%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	11.439	9.788	8.918	9.049	8.231	9.094	10.545	9.077	10.016	10.539	7.981	7.926	**112.603**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	737	799	759	688	658	551	634	561	577	688	591	532	**7.775**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	683	691	730	767	809	825	954	1.936	2.102	2.090	1.797	1.948	**15.332**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	620	680	721	801	706	875	922	1.668	2.137	2.078	1.711	2.217	**15.136**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	241	252	261	227	330	280	312	581	546	558	644	375		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	8,95	10,07	11,89	7,23	8,08	8,42	10,22	11,41	12,03	11,01	13,47	12,59	**11,09**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO BELGRANO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	21	16	15	15	18	37	47	19	28	21	13	16	**266**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	4	2	**13**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	4	2	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	21	16	14	15	18	37	47	19	28	15	9	14	**253**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	21	16	14	15	18	37	47	19	28	15	8	13	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	0,00%	0,00%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,57%	30,77%	12,50%	**4,89%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	535	490	638	623	527	784	768	467	499	640	519	614	**7.104**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	512	528	574	652	524	696	730	561	512	612	568	599	**7.068**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	21	14	39	23	21	65	29	12	25	40	19	14	**322**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,2	24,0	26,4	33,6	24,7	33,0	42,4	42,7	28,8	33,5	32,0	24,8	**30,79**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	331	294	416	452	422	797	863	254	303	443	384	376	**5.335**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	308	315	393	445	396	826	855	269	315	407	415	338	**5.282**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	13	6	14	10	23	22	11	4	4	20	8	15	**150**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,7	16,7	24,6	22,3	20,2	16,0	21,8	19,9	20,3	17,0	20,2	17,6	**19,17**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	163	183	288	288	242	596	755	144	209	227	148	171	**3.414**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	144	192	263	301	231	595	739	172	219	218	157	170	**3.401**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	8	6	14	12	11	18	9	1	4	10	2	3	**98**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,4	20,0	22,3	27,5	21,2	15,6	18,7	27,5	20,8	17,3	19,8	22,9	**20,03**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	10	10	26	5	10	41	29	43	72	256	29	24	**555**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	9	10	27	4	11	39	29	45	69	257	31	23	**554**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	**5**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,6	11,5	12,3	13,0	5,8	8,2	12,8	11,1	7,9	6,1	9,3	9,3	**8,04**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	59	68	81	83	83	100	121	69	97	69	66	58	**954**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	49	70	81	70	95	94	108	88	90	76	61	67	**949**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	3	2	4	9	8	5	14	0	6	7	4	1	**63**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	52,5	32,8	37,9	51,1	58,1	52,8	81,9	79,5	38,2	59,8	55,4	57,0	**55,88**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.029	967	1.342	1.363	1.191	2.177	2.386	865	1.011	1.310	1.051	1.161	**15.853**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-9,82%	-11,45%	18,13%	13,49%	-34,02%	96,13%	-17,58%	-48,82%	-28,95%	12,83%	4,27%	32,99%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-75,61%	-56,52%	-75,47%	-92,31%	-69,70%	215,38%	-21,62%	138,89%	323,53%	782,76%	314,29%	140,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO BELGRANO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	535	514	682	738	903	862	1.076	911	874	841	613	606	**9.155**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	517	500	640	758	909	848	1.011	965	892	823	655	618	**9.136**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	4	28	33	31	32	43	62	18	25	25	3	5	**309**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,1	18,0	23,5	25,0	26,7	30,3	31,6	28,3	22,6	22,0	20,6	16,3	**24,05**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	30	24	28	47	39	53	77	50	44	53	26	32	**503**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	29	23	30	45	39	52	75	53	46	51	30	30	**503**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	2	2	2	1	1	3	2	0	0	0	0	**13**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	9,1	14,2	11,3	17,9	18,6	16,3	23,7	15,7	14,8	15,4	15,7	10,7	**16,28**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	21	14	8	24	17	29	35	15	19	23	15	9	**229**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	13	9	19	14	14	7	12	15	10	12	13	16	**154**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	13	7	18	14	13	10	10	16	10	10	15	14	**150**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	**10**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	24,8	60,1	29,7	43,7	63,3	57,8	93,4	79,4	65,7	67,6	56,1	56,6	**56,40**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	3,915	9,245	9,540	5,600	5,640	6,195	6,850	25,225	11,150	10,770	16,955	5,170	**116,255**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	548	523	701	752	917	869	1.088	926	884	853	626	622	**9.309**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	26,56%	11,75%	-15,85%	16,05%	18,78%	38,82%	41,12%	4,04%	2,55%	10,64%	-6,01%	-0,32%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	109	111	81	92	101	83	92	108	104	124	108	125	**1.238**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	94	102	100	85	114	81	94	103	104	115	121	111	**1.224**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	20	33	18	27	12	7	10	14	14	9	7	12	**183**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	94,4	116,4	135,7	102,7	100,6	83,0	104,9	87,9	108,6	85,7	99,3	70,6	**98,98**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-22,70%	-17,16%	-35,20%	-16,36%	-9,82%	1,22%	-12,38%	2,86%	-18,75%	5,08%	-15,63%	38,89%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.291	1.320	897	1.129	1.520	1.180	1.215	1.238	1.342	1.289	1.044	1.054	**14.519**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	754	629	771	831	954	793	1.009	2.047	2.310	2.279	1.985	2.035	**16.397**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	704	639	743	814	816	924	1.011	1.859	2.281	2.229	1.903	2.245	**16.168**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	175	165	193	210	348	217	215	403	432	482	564	354		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,84	4,87	5,32	5,83	7,90	8,24	5,73	6,64	5,85	5,78	6,90	7,83	**6,50**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO DEVOTO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	3	1	7	1	0	3	2	5	4	1	0	3	**30**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	1	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	**7**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	2	1	7	1	0	3	2	1	3	0	0	3	**23**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	2	1	7	1	0	3	2	0	1	0	0	3	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	80,00%	25,00%	100,00%	N/A	0,00%	**23,33%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	386	370	451	398	357	741	695	403	442	413	340	357	**5.353**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	345	363	465	425	333	694	701	462	439	419	344	322	**5.312**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	12	42	10	17	23	27	7	5	4	12	7	11	**177**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,5	33,7	36,4	36,1	31,8	32,2	42,0	29,5	15,0	11,7	18,2	20,0	**28,57**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	328	294	375	405	364	842	581	255	365	314	383	394	**4.900**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	326	298	363	419	334	837	602	259	376	317	365	392	**4.888**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	6	7	9	15	12	18	1	12	2	5	8	7	**102**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,7	19,7	21,2	21,3	20,6	22,7	23,0	16,9	13,7	10,8	8,8	15,6	**18,32**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	187	166	262	352	320	579	327	145	204	185	148	197	**3.072**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	184	165	249	358	294	604	334	148	212	189	143	188	**3.068**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	6	5	15	13	8	17	5	8	1	3	5	2	**88**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,9	23,1	22,9	22,1	25,8	19,3	27,1	21,1	14,3	11,6	12,9	17,9	**20,26**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	19	9	25	18	10	32	32	37	102	75	15	23	**397**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	18	8	25	18	12	32	31	32	101	81	14	23	**395**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	1	1	2	0	0	1	2	1	0	0	0	**8**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	7,7	8,1	11,2	13,8	11,0	13,1	11,0	9,3	8,7	10,0	9,3	11,7	**10,15**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	7	4	9	14	27	16	21	12	15	16	18	9	**168**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	8	3	8	14	27	14	21	14	13	16	22	8	**168**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	**5**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	22,4	8,9	21,0	34,4	21,6	34,7	33,2	30,3	31,3	28,3	29,9	10,0	**27,64**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	901	830	1.088	1.155	1.041	2.162	1.603	803	1.011	912	871	948	**13.325**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-43,33%	-39,90%	-9,71%	0,70%	-21,37%	114,91%	-13,77%	-19,05%	4,23%	10,28%	-13,85%	-2,17%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-73,24%	-81,25%	-68,35%	-70,97%	-74,36%	52,38%	-36,00%	105,56%	363,64%	212,50%	66,67%	-46,51%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO DEVOTO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	294	316	346	395	512	596	704	619	576	514	436	395	**5.703**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	290	290	359	409	474	571	629	663	642	515	426	420	**5.688**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	3	19	9	6	12	37	64	4	16	21	6	4	**201**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,8	15,3	23,5	18,5	22,5	25,8	38,3	23,5	21,0	22,0	13,6	20,2	**22,56**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	9	8	22	14	21	22	42	20	19	22	19	14	**232**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	9	6	23	15	20	21	41	19	23	20	18	15	**230**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	**3**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	9,3	11,6	25,0	10,1	19,8	21,1	29,6	18,8	20,9	16,8	8,1	16,5	**19,57**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	7	3	9	4	11	8	22	7	11	7	11	11	**111**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	11	8	28	8	10	14	5	8	10	19	17	23	**161**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	11	6	28	8	11	10	10	8	10	15	17	22	**156**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	**10**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,8	13,2	15,7	101,0	23,7	43,0	179,8	15,5	21,7	12,1	48,3	16,5	**36,03**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	7,040	2,260	1,640	2,470	0,000	4,435	3,550	1,290	0,000	5,190	0,000	4,620	**32,495**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	305	324	374	403	522	610	709	627	586	533	453	418	**5.864**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-14,80%	4,18%	-9,22%	7,18%	31,16%	35,25%	27,98%	-2,94%	-1,01%	7,03%	12,97%	6,91%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	88	98	87	78	85	96	94	95	97	85	94	86	**1.083**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	64	95	95	92	63	96	105	99	88	104	82	77	**1.060**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	11	21	25	14	20	29	13	21	23	6	13	6	**202**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	222,6	109,9	141,8	147,8	140,1	127,5	127,8	125,7	147,0	144,4	98,1	121,3	**135,88**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-43,23%	-19,01%	-12,12%	-32,17%	3,66%	65,52%	20,51%	43,94%	10,23%	-3,41%	-12,96%	-10,42%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	2.244	1.764	2.328	2.366	3.204	2.992	3.216	2.597	3.033	2.516	1.942	2.504	**30.706**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	602	482	545	665	626	655	713	1.119	1.246	1.285	1.044	1.060	**10.042**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	594	500	496	633	582	667	702	1.085	1.235	1.184	1.111	1.120	**9.909**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	174	156	205	237	281	269	280	314	325	426	359	299		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	7,15	9,12	5,58	8,87	8,64	10,33	9,43	9,28	7,87	8,96	8,38	10,19	**8,76**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO FLORES

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	4	0	2	3	4	0	2	0	0	4	3	0	**22**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	4	0	2	3	3	0	2	0	0	4	3	0	**21**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	4	0	2	3	2	0	1	0	0	2	3	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	25,00%	N/A	0,00%	N/A	N/A	0,00%	0,00%	N/A	**4,55%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	427	560	590	560	479	733	821	482	394	433	375	371	**6.225**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	396	542	551	552	483	675	880	539	403	424	394	365	**6.204**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	56	63	68	65	51	81	121	60	68	64	25	31	**753**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,3	33,7	42,3	41,2	44,8	41,8	48,5	44,7	29,3	28,0	26,2	24,2	**37,37**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	544	625	643	749	744	865	667	371	310	637	314	542	**7.011**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	513	614	637	734	747	867	722	387	308	618	324	515	**6.986**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	21	20	24	17	20	56	14	7	5	14	2	14	**214**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,5	20,7	25,6	20,6	19,5	20,9	28,5	25,3	20,1	11,3	18,9	16,0	**20,51**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	220	260	319	441	588	653	421	160	202	291	155	213	**3.923**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	202	248	315	414	601	644	459	178	195	287	154	224	**3.921**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	8	19	11	11	14	46	11	2	8	5	3	4	**142**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,4	21,9	25,2	24,8	20,4	18,5	24,2	26,8	20,8	16,6	18,4	20,1	**21,32**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	36	13	26	18	34	21	27	19	50	81	25	23	**373**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	35	15	25	17	34	20	27	22	45	83	27	24	**374**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,0	13,2	14,5	12,6	12,9	15,7	14,9	13,3	12,3	8,9	11,5	9,0	**11,82**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	19	23	28	27	58	40	43	37	31	26	26	17	**375**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	18	15	33	18	37	52	47	43	36	28	28	19	**374**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	4	3	13	33	19	17	9	5	1	3	4	**113**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	58,3	59,0	129,8	105,3	189,0	368,9	364,8	231,8	198,3	77,5	131,2	95,9	**203,75**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.191	1.445	1.552	1.750	1.811	2.251	1.909	1.013	906	1.361	844	1.126	**17.159**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-29,61%	-20,43%	26,18%	-5,56%	-18,64%	64,07%	-31,11%	-26,70%	-33,19%	31,37%	-11,81%	-10,99%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	16,13%	-63,89%	-63,89%	-78,57%	-46,03%	-32,26%	-49,06%	-20,83%	78,57%	350,00%	31,58%	-20,69%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL - DISTRITO FLORES

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	788	772	761	852	1.310	1.111	1.491	1.334	1.256	1.156	922	746	**12.499**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	755	785	748	781	1.226	1.081	1.308	1.695	1.158	1.237	954	773	**12.501**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	22	34	24	62	70	135	101	13	27	37	6	12	**543**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,8	18,5	21,8	22,7	27,2	37,3	45,9	36,1	20,0	17,1	16,2	16,5	**26,42**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	62	59	72	68	88	67	108	59	74	91	62	53	**863**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	61	57	77	57	93	59	108	71	65	96	65	58	**867**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	3	0	6	1	5	4	1	1	1	1	0	**23**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,2	13,7	18,5	20,3	25,1	37,5	40,2	28,4	16,5	15,6	15,2	16,2	**22,71**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	59	40	57	48	60	51	81	36	54	75	49	50	**660**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	20	21	44	38	38	42	27	32	44	23	35	26	**390**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	19	19	36	43	40	39	27	39	38	23	38	29	**390**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	3	1	5	4	4	8	10	0	2	4	3	0	**44**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	62,3	134,7	102,7	63,6	52,7	74,9	62,1	184,4	42,1	59,2	39,2	55,2	**77,25**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	15,965	9,180	7,575	22,270	3,300	17,895	10,360	2,695	12,275	26,300	11,850	19,020	**158,685**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	808	793	805	890	1.348	1.153	1.518	1.366	1.300	1.179	957	772	**12.889**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	11,14%	26,48%	-22,82%	6,71%	43,10%	20,48%	22,12%	4,75%	0,78%	14,47%	6,45%	-9,50%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	222	146	177	219	223	225	160	220	224	183	151	108	**2.258**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	190	165	160	219	227	203	210	193	225	186	178	106	**2.262**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	6	15	28	20	0	20	5	2	12	5	1	0	**114**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	39,3	29,9	36,7	36,2	45,7	28,1	38,2	30,5	31,0	28,9	28,3	27,3	**33,80**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	48,99%	6,57%	0,00%	19,67%	39,38%	82,93%	31,15%	65,41%	54,48%	31,65%	-20,11%	-42,55%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	986	574	445	469	515	337	715	606	529	438	286	320	**6.220**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	453	431	492	512	515	545	559	1.126	1.295	1.251	1.060	1.086	**9.325**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	438	411	423	524	501	546	545	1.026	1.292	1.205	1.051	1.221	**9.183**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	92	112	181	169	183	182	196	296	299	345	354	219		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	7,04	8,15	6,88	7,99	8,39	8,52	8,40	10,68	10,47	11,43	9,88	10,39	**9,61**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL (Distritos: Belgrano, Caballito, Centro-Constitución, Devoto y Flores)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	39	25	30	26	42	76	64	37	47	41	23	27	**477**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	1	2	1	0	2	0	0	4	2	10	4	2	**28**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	2	0	0	2	0	0	0	2	4	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	1	0	1	0	0	0	0	4	0	6	4	2	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	38	23	29	26	40	76	64	33	45	31	19	25	**449**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	37	23	29	26	39	76	63	32	43	29	18	24	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	2,56%	8,00%	3,33%	0,00%	4,76%	0,00%	0,00%	10,81%	4,26%	24,39%	17,39%	7,41%	**5,87%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2.311	2.274	2.642	2.601	2.290	3.468	3.718	2.321	2.256	2.417	2.014	2.110	**30.422**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2.156	2.273	2.568	2.628	2.284	3.158	3.769	2.585	2.349	2.387	2.077	2.062	**30.296**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	96	146	135	164	136	285	190	64	81	104	51	66	**1.518**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	23	32	34	35	33	35	45	41	31	24	27	24	**33,02**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.885	1.885	2.133	2.464	2.376	3.828	3.566	1.650	1.676	2.160	1.777	2.157	**27.557**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.851	1.867	2.124	2.425	2.282	3.819	3.689	1.699	1.723	2.078	1.821	2.068	**27.446**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	65	52	58	73	92	153	63	46	21	75	32	52	**782**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,2	19,5	23,1	21,8	20,2	19,4	25,2	22,9	19,3	14,0	17,1	16,5	**19,95**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	798	870	1.284	1.495	1.611	2.670	2.589	813	904	988	834	912	**15.768**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	775	842	1.247	1.484	1.563	2.630	2.691	878	921	978	828	917	**15.754**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	31	48	47	49	47	136	37	19	17	30	18	15	**494**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,4	21,9	25,2	24,8	20,4	18,5	24,2	26,8	20,8	16,6	18,4	20,1	**21,53**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	80	50	133	59	105	143	133	141	263	454	92	103	**1.756**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	78	50	131	59	100	145	136	139	255	463	93	104	**1.753**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	1	2	3	3	0	3	2	2	1	2	1	0	**20**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	9,8	10,1	12,6	12,0	11,0	11,1	12,7	10,4	9,5	7,4	10,0	9,7	**9,86**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	353	344	378	456	525	487	616	450	437	336	339	294	**5.015**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	334	318	399	407	485	500	535	547	473	357	332	335	**5.022**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	36	52	42	77	112	113	152	67	41	41	40	29	**802**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	70,3	77,2	91,3	105,5	95,2	150,7	198,8	184,3	120,4	86,3	89,5	91,0	**120,28**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	4.994	5.029	6.059	6.560	6.277	9.966	9.873	4.784	4.836	5.565	4.625	5.179	**73.747**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-28,51%	-25,67%	-2,98%	-5,68%	-34,90%	58,57%	-34,73%	-30,85%	-18,20%	13,99%	-2,20%	7,92%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-70,26%	-70,93%	-71,64%	-82,60%	-54,35%	45,92%	-43,88%	53,26%	195,51%	368,04%	76,92%	-2,83%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL (Distritos: Belgrano, Caballito, Centro-Constitución, Devoto y Flores)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2.907	2.830	3.245	3.566	4.749	4.431	5.483	4.844	4.463	4.091	3.435	3.037	**47.081**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2.827	2.789	3.210	3.488	4.541	4.455	5.042	5.373	4.454	4.154	3.561	3.113	**47.007**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	60	122	104	173	154	267	298	65	105	133	22	31	**1.534**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,0	18,1	20,6	20,8	24,1	27,4	34,2	27,7	20,0	18,7	17,8	17,1	**22,72**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	184	200	245	251	299	257	369	264	250	263	202	182	**2.966**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	178	194	255	239	284	262	362	275	254	259	213	190	**2.965**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	8	3	12	3	9	11	5	2	5	1	1	**61**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,9	13,8	16,6	16,3	19,9	22,0	27,8	18,9	16,3	14,9	12,9	14,4	**17,90**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	147	138	161	161	175	191	232	135	172	171	154	129	**1.966**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	93	79	157	129	117	111	96	113	127	95	144	126	**1.387**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	98	63	137	141	122	114	93	114	128	86	141	142	**1.379**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	5	11	15	13	17	13	17	10	11	16	12	3	**143**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	53,1	77,9	65,5	84,1	79,8	93,1	109,6	118,1	68,9	67,5	52,4	62,9	**76,80**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	50,275	38,460	34,720	40,260	49,645	58,305	58,090	55,395	54,370	64,265	67,517	69,790	**641,092**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	3.000	2.909	3.402	3.695	4.866	4.542	5.579	4.957	4.590	4.186	3.579	3.163	**48.468**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	20,97%	15,57%	-15,77%	17,56%	38,75%	38,52%	31,49%	7,39%	-0,26%	9,84%	4,37%	-2,29%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	723	674	670	780	749	722	750	780	891	832	842	652	**9.065**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	637	642	692	781	790	699	795	781	778	927	804	719	**9.045**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	91	155	137	146	97	108	93	85	181	98	114	66	**1.371**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	114,6	94,0	115,5	101,2	99,9	90,1	94,4	104,9	99,8	113,1	103,7	138,9	**105,78**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-19,58%	-11,55%	-14,32%	-2,86%	17,95%	44,11%	21,56%	22,26%	28,76%	27,61%	7,26%	-3,41%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	20.744	17.140	15.980	16.759	17.270	17.269	19.604	17.201	19.546	19.531	15.049	16.334	**212.427**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	737	799	759	688	658	551	634	561	577	688	586	532	**7.770**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	3.220	3.042	3.324	3.615	3.850	3.690	4.172	8.790	9.791	9.688	8.222	8.666	**70.070**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	3.072	3.032	3.115	3.638	3.484	3.925	4.183	7.855	9.745	9.434	8.081	9.584	**69.148**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	810	820	1.029	1.006	1.372	1.137	1.126	2.062	2.108	2.362	2.503	1.585		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	7,14	8,07	7,70	7,09	7,82	7,99	7,96	9,33	8,67	8,77	9,43	9,63	**8,63**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO SAN FERNANDO-TIGRE (Partido de San Fernando + Partido de Tigre)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	2	7	1	1	2	0	1	1	1	13	6	9	**44**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	3	0	0	0	0	0	0	1	10	5	4	**23**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	**8**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	**7**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	**8**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	2	4	1	1	2	0	1	1	0	3	1	5	**21**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	**5**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	1	1	0	1	0	0	1	1	0	2	0	3	**10**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	**6**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	0,00%	42,86%	0,00%	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	100,00%	76,92%	83,33%	44,44%	**52,27%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	484	440	517	499	520	576	598	388	450	429	373	471	**5.745**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	423	450	470	518	538	511	646	405	451	421	414	410	**5.657**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	20	32	25	28	23	52	9	4	23	10	19	21	**266**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	31,8	39,4	36,0	39,9	35,0	31,4	44,5	28,3	28,1	27,9	32,4	47,0	**35,54**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.234	495	331	426	389	327	539	340	249	369	443	935	**6.077**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.244	529	319	401	419	284	569	350	245	379	434	759	**5.932**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	15	4	3	5	11	15	4	8	7	6	10	31	**119**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,5	15,3	17,4	15,7	15,9	18,0	15,5	14,2	16,6	13,9	13,4	19,4	**15,34**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	791	196	291	246	289	279	500	159	121	192	196	612	**3.872**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	801	216	275	258	285	256	512	173	124	194	187	519	**3.800**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	8	3	7	2	4	10	9	2	3	0	3	23	**74**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,8	14,7	17,7	22,0	19,2	17,9	16,5	15,7	16,6	17,5	13,6	19,5	**16,65**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	10	18	9	4	64	15	11	4	9	15	17	13	**189**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	10	18	8	5	64	12	13	4	10	15	16	13	**188**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	27,7	19,3	18,9	16,8	16,9	10,6	5,6	1,7	12,4	15,0	15,9	12,7	**15,52**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	4	5	5	10	17	16	9	4	6	5	2	6	**89**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	5	6	3	10	16	18	9	5	4	7	2	5	**90**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	**4**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	23,2	17,9	33,8	36,4	21,5	41,0	20,6	20,5	30,6	16,7	3,2	24,2	**26,94**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	2.509	1.131	1.139	1.171	1.198	1.182	1.637	887	820	990	1.012	2.018	**15.694**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	129,55%	2,63%	9,52%	-37,65%	-16,34%	-0,34%	0,55%	-24,06%	-22,71%	-42,64%	-30,78%	23,05%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	0,00%	63,64%	-70,97%	-87,10%	276,47%	150,00%	10,00%	-20,00%	-10,00%	36,36%	142,86%	160,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO SAN FERNANDO-TIGRE (Partido de San Fernando + Partido de Tigre)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	486	538	621	570	793	637	749	793	898	668	484	582	**7.819**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	496	524	628	559	771	652	746	779	899	686	503	567	**7.810**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	6	19	14	11	23	18	16	33	11	7	11	10	**179**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,3	20,2	18,1	20,1	19,2	16,4	20,4	20,4	20,8	15,0	15,0	18,9	**18,37**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	66	61	76	67	110	98	101	112	131	95	77	95	**1.089**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	66	59	79	62	111	95	100	115	127	98	81	90	**1.083**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	1	3	2	1	3	3	2	0	1	1	**17**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,5	13,8	17,3	14,1	16,9	11,2	15,0	19,1	17,4	12,5	12,7	11,9	**14,69**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	58	43	68	54	96	83	85	90	98	99	100	101	**975**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	7	11	8	9	12	14	19	16	9	13	19	23	**160**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	7	11	7	7	15	10	21	14	13	10	19	22	**156**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	2	1	0	2	0	0	0	2	3	1	**11**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	30,8	15,2	30,1	27,2	54,7	28,5	25,0	35,7	48,0	13,5	18,2	77,9	**36,76**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	12,910	2,745	0,000	3,665	7,910	11,330	16,555	10,135	11,760	9,125	16,545	13,205	**115,885**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	493	549	629	579	805	651	768	809	907	681	503	605	**7.979**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	8,35%	34,23%	2,78%	-6,16%	55,71%	10,90%	30,39%	19,85%	21,74%	1,49%	-9,53%	16,57%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	59	49	63	65	64	51	56	68	47	62	55	51	**690**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	49	54	57	69	64	57	57	61	46	59	58	45	**676**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	6	9	10	9	5	7	5	6	5	9	11	9	**91**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	75,4	80,0	83,9	97,0	85,7	100,1	93,6	76,1	134,9	104,5	112,4	183,8	**100,33**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-41,00%	-38,75%	-27,59%	-25,29%	-40,19%	-16,39%	-3,45%	-8,11%	-22,95%	8,77%	1,85%	6,25%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.262	1.486	935	1.152	1.065	1.108	1.625	1.131	1.298	1.245	1.051	928	**14.286**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	409	372	363	430	419	409	474	466	532	557	485	473	**5.389**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	405	366	376	412	403	401	497	454	494	578	504	467	**5.357**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	50	56	43	61	77	85	62	74	112	91	72	78		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	4,31	4,50	4,72	5,09	5,62	4,21	5,08	6,71	5,68	5,94	5,72	5,39	**5,31**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO SAN ISIDRO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	2	4	2	2	0	1	4	0	0	5	12	4	**36**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	12	2	**19**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	12	2	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	2	4	2	2	0	1	3	0	0	1	0	2	**17**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	3	0	2	0	0	3	0	0	1	0	2	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	25,00%	N/A	N/A	80,00%	100,00%	50,00%	**52,78%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	549	518	572	628	558	670	650	429	407	377	380	349	**6.087**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	533	529	556	614	536	674	689	465	434	368	385	348	**6.131**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	19	17	26	23	44	38	45	12	20	23	25	25	**317**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	54,7	47,6	31,5	42,1	37,4	43,7	41,1	36,4	24,7	35,1	33,0	43,6	**39,81**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	386	207	213	247	449	289	245	206	193	215	226	349	**3.225**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	393	219	215	244	444	279	258	219	188	212	227	358	**3.256**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	13	1	3	5	10	12	7	3	4	12	7	4	**81**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	24,4	27,3	22,7	27,3	13,0	19,5	23,2	19,2	19,1	16,7	18,3	23,1	**20,88**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	313	119	147	212	520	159	172	156	152	146	125	244	**2.465**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	321	144	138	206	529	149	184	162	147	150	129	229	**2.488**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	9	2	2	6	4	12	5	0	3	2	0	10	**55**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	29,4	28,9	24,1	25,2	11,4	21,9	21,5	16,9	11,6	18,0	22,5	16,0	**19,71**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	9	11	16	29	25	37	25	19	38	33	20	26	**288**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	11	11	16	23	29	24	38	20	38	27	26	27	**290**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	4	2	2	0	1	0	1	1	0	**11**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	46,4	41,5	41,2	17,6	24,7	28,7	29,2	26,1	40,1	26,2	19,3	20,4	**28,79**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	4	5	5	10	17	16	9	4	6	5	2	6	**89**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	5	6	3	10	16	18	9	5	4	7	2	5	**90**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	**4**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	23,2	17,9	33,8	36,4	21,5	41,0	20,6	20,5	30,6	16,7	3,2	24,2	**26,94**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.248	844	932	1.087	1.527	1.118	1.067	791	752	738	731	942	**11.777**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	34,19%	-22,71%	31,27%	53,10%	82,44%	47,49%	-2,56%	4,49%	20,32%	11,14%	-47,03%	-2,79%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-76,32%	-31,25%	-61,90%	-25,64%	56,25%	117,65%	-7,41%	-54,76%	72,73%	266,67%	66,67%	36,84%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO SAN ISIDRO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	360	295	395	396	485	618	544	575	646	577	490	473	**5.854**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	357	301	392	384	441	644	533	591	648	595	497	463	**5.846**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	18	5	11	24	30	9	25	23	18	14	8	9	**194**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,2	25,7	19,4	24,3	31,8	32,8	22,6	25,9	27,2	19,1	16,5	25,9	**24,54**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	57	46	52	33	66	52	64	67	80	67	79	74	**737**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	53	45	57	32	62	54	58	76	76	69	78	69	**729**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	2	0	2	2	0	3	0	0	0	2	1	**14**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	7,5	8,4	17,2	11,1	14,9	26,1	14,6	17,8	16,3	11,7	7,6	21,6	**14,76**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	49	39	47	31	47	34	37	61	54	55	56	57	**567**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	3	1	21	10	7	6	3	5	5	5	7	4	**77**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	3	0	22	9	8	5	4	3	7	4	6	5	**76**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	**7**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,6	#DIV/0	43,3	14,9	34,3	36,5	12,6	54,0	50,2	12,1	28,5	55,1	**N/A**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	2,150	6,890	0,260	1,915	3,765	2,115	5,400	5,590	3,900	5,390	3,250	5,345	**45,970**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	363	296	416	406	492	624	547	580	651	582	497	477	**5.931**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	31,52%	17,00%	13,66%	40,97%	20,29%	54,07%	14,20%	4,13%	40,00%	32,27%	37,67%	72,20%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	46	60	68	48	49	50	53	43	40	38	38	48	**581**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	29	60	76	46	43	53	59	35	38	40	35	37	**551**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	8	13	8	10	9	8	10	5	13	11	7	10	**112**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	79,5	75,2	123,3	149,5	106,0	129,2	117,1	144,7	99,7	114,3	98,8	93,8	**112,05**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	15,00%	57,89%	38,78%	-7,69%	-9,26%	35,14%	12,77%	-12,24%	-2,44%	-26,92%	-17,39%	41,18%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.421	1.083	985	1.243	1.432	1.262	1.089	1.509	1.233	1.358	1.080	1.057	**14.752**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	204	75	119	255	128	73	387	60	98	366	172	297	**2.234**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	562	499	489	618	550	512	600	731	779	754	687	596	**7.377**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	525	493	529	550	572	445	597	676	781	859	683	631	**7.341**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	133	139	99	167	145	212	215	270	268	163	167	132		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	6,91	6,17	6,84	5,20	4,60	6,35	6,10	8,93	7,61	8,80	7,23	7,10	**6,97**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO SAN MARTIN

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	4	0	1	0	1	5	1	1	2	6	6	**27**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	1	0	0	0	0	5	1	0	2	5	4	**18**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	1	0	0	0	0	5	0	0	2	5	4	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	**9**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	25,00%	N/A	0,00%	N/A	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	83,33%	66,67%	**66,67%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	577	524	675	694	604	691	840	561	555	599	529	495	**7.344**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	522	531	673	637	641	613	894	629	564	572	521	490	**7.287**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	20	39	33	35	35	72	66	49	32	21	43	31	**476**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	28,2	41,3	43,3	43,6	47,4	46,7	71,4	59,6	48,4	30,3	32,4	49,1	**46,59**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	607	1.121	434	581	391	375	736	318	413	411	487	780	**6.654**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	605	1.133	425	550	429	324	797	317	415	408	483	752	**6.638**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	11	11	12	15	17	22	13	22	14	12	18	33	**200**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,7	12,9	23,3	18,9	26,9	24,5	18,0	29,7	23,0	21,5	18,5	19,3	**19,57**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	470	368	276	370	195	205	248	146	276	250	216	489	**3.509**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	456	384	281	328	237	178	288	129	272	264	201	494	**3.512**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	15	6	7	15	15	12	3	27	11	5	10	14	**140**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,3	16,6	24,8	20,6	27,8	29,1	24,5	27,8	26,5	21,7	16,2	21,0	**21,52**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	14	13	17	5	7	20	11	45	35	22	26	8	**223**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	14	13	16	6	6	15	17	39	38	21	29	9	**223**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	**3**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,9	9,8	12,3	4,6	12,8	25,0	15,7	19,5	15,9	33,4	31,9	16,2	**19,43**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	3	6	0	5	2	5	4	3	6	3	3	**42**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1	3	6	1	5	1	4	6	3	5	3	4	**42**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	**4**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,1	111,2	21,4	116,9	33,3	18,1	29,6	19,7	24,1	25,1	69,0	68,7	**40,47**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.654	2.013	1.385	1.645	1.190	1.271	1.824	1.025	1.244	1.260	1.232	1.764	**17.507**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-15,48%	26,05%	3,05%	2,88%	-23,77%	31,03%	42,72%	12,39%	53,39%	61,13%	43,42%	47,86%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-67,44%	-56,67%	-50,00%	-85,71%	-72,00%	233,33%	-54,17%	462,50%	250,00%	144,44%	62,50%	-20,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO SAN MARTIN

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	689	568	710	670	863	957	1.162	1.051	1.116	992	800	813	**10.391**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	649	556	760	660	854	881	1.176	1.084	1.130	968	848	785	**10.351**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	18	67	17	15	15	79	50	43	51	36	28	15	**434**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	21,0	28,2	28,3	27,2	44,1	25,4	33,7	31,2	29,4	31,9	27,0	32,0	**30,37**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	47	36	69	48	61	56	101	76	88	68	67	69	**786**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	43	36	72	49	60	56	90	85	86	69	71	67	**784**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	4	1	0	2	2	2	2	6	2	1	0	**24**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	27,4	21,8	23,3	18,7	37,9	20,2	26,8	28,0	25,5	22,2	17,0	24,1	**24,61**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	35	29	63	41	37	41	73	64	55	56	57	58	**609**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	7	2	3	2	10	13	3	7	18	12	4	10	**91**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	11	2	4	1	7	13	4	8	16	14	6	9	**95**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	1	0	0	2	2	2	2	0	1	0	1	**12**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	88,8	935,7	112,8	3,8	19,7	95,6	41,4	261,8	59,3	87,1	35,4	17,5	**99,82**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	3,515	0,000	12,750	6,670	10,610	1,230	11,385	5,710	10,075	9,960	8,390	0,000	**80,295**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	696	570	713	672	873	970	1.165	1.058	1.134	1.004	804	823	**10.482**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	5,30%	-1,89%	-22,84%	9,80%	14,57%	15,75%	7,87%	-1,86%	13,06%	34,05%	-0,25%	12,59%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	61	57	64	51	62	67	56	72	92	99	92	135	**908**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	62	47	53	63	75	53	69	72	75	82	94	83	**828**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	10	19	29	20	9	12	9	7	23	42	40	78	**298**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	122,7	#¡VALOR!	138,5	128,3	475,7	97,5	231,0	72,8	85,9	111,7	169,2	88,0	**N/A**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-69,80%	-63,92%	-73,55%	-75,12%	-62,87%	-62,15%	-63,40%	-49,65%	-30,83%	23,75%	55,93%	107,69%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.052	761	822	1.143	893	1.128	1.263	1.028	1.291	1.159	955	861	**12.356**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	330	330	319	355	404	448	532	520	569	526	487	453	**5.273**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	316	314	300	377	420	373	574	482	571	560	462	415	**5.164**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	61	77	96	74	58	133	91	129	127	93	118	156		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	4,24	5,65	4,73	5,11	4,82	4,08	6,22	5,83	3,92	7,14	5,54	6,66	**5,41**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO VICENTE LOPEZ

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	0	4	0	3	1	4	0	1	5	7	4	**29**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	5	4	**17**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	4	4	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	4	0	3	1	1	0	1	0	2	0	**12**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	N/A	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	75,00%	N/A	0,00%	100,00%	71,43%	100,00%	**58,62%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	380	403	370	405	360	567	564	347	323	288	247	283	**4.537**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	385	395	357	443	349	459	606	427	339	299	256	273	**4.588**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	24	17	19	27	16	61	29	15	13	9	10	27	**267**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	43,4	37,6	41,0	43,2	38,4	42,7	67,4	56,2	42,6	29,5	37,4	36,4	**44,89**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	350	392	318	321	330	374	369	272	195	216	265	311	**3.713**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	349	392	359	308	335	333	388	302	219	212	253	303	**3.753**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	16	4	2	8	10	22	8	4	5	4	6	17	**106**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	23,2	18,3	24,9	20,0	17,4	21,1	24,0	23,5	20,4	16,4	13,6	17,7	**20,35**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	251	183	321	245	316	316	276	181	105	93	94	163	**2.544**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	243	207	315	263	283	293	319	175	122	95	100	145	**2.560**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	3	1	3	9	7	9	3	0	4	0	0	1	**40**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,6	19,9	13,2	17,7	14,3	19,3	15,2	23,1	21,9	18,2	22,1	19,6	**17,59**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	6	5	24	6	10	43	27	12	28	14	22	22	**219**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	6	3	23	7	12	29	35	17	28	14	23	22	**219**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	2	2	1	0	1	3	0	1	0	0	0	**10**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,5	20,2	43,8	24,9	33,0	23,7	24,5	24,8	25,2	23,9	28,2	27,8	**27,45**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	11	11	16	14	33	24	25	13	18	18	14	8	**205**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	11	8	16	14	31	23	23	16	22	18	13	8	**203**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	**9**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	19,9	35,2	28,4	49,3	31,6	28,4	45,0	23,9	51,1	31,6	28,0	62,7	**35,74**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	981	978	1.009	971	1.006	1.257	1.209	800	623	597	606	757	**10.794**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-28,50%	-19,64%	44,76%	52,43%	-19,13%	45,49%	-35,49%	-19,44%	-5,46%	-21,03%	-21,40%	-35,90%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-82,35%	-86,11%	-31,43%	-89,09%	-68,75%	59,26%	-15,63%	-42,86%	460,00%	-17,65%	266,67%	69,23%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO VICENTE LOPEZ

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	596	532	697	703	798	936	1.146	1.073	1.023	1.008	770	691	**9.973**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	555	543	649	748	788	894	1.029	1.094	1.141	1.018	803	727	**9.989**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	12	35	21	18	22	62	45	46	24	24	19	14	**342**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	22,6	24,8	24,7	30,6	26,4	25,9	32,7	35,2	26,3	26,3	22,3	24,4	**27,38**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	58	53	55	66	72	53	102	52	73	79	51	51	**765**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	51	54	57	74	73	50	91	62	69	81	56	49	**767**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	8	3	0	1	3	5	0	0	0	1	2	**25**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	23,7	17,2	20,6	24,2	17,4	24,1	28,3	23,9	18,7	24,0	18,4	20,2	**22,03**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	32	22	41	53	60	34	58	27	30	31	32	33	**453**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	5	6	3	8	20	10	13	6	10	14	6	4	**105**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	6	6	1	9	18	9	11	10	12	10	9	5	**106**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	**7**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	30,8	36,0	11,8	58,0	33,1	50,8	44,5	77,7	40,3	18,3	56,7	70,1	**45,10**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	6,250	2,470	6,770	7,135	8,855	9,280	4,015	11,860	9,225	12,135	5,755	2,630	**86,380**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	601	538	700	711	818	946	1.159	1.079	1.033	1.022	776	695	**10.078**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	13,40%	26,89%	11,82%	17,33%	3,54%	16,50%	15,55%	5,17%	3,71%	11,69%	12,95%	27,76%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	79	65	68	76	68	59	69	64	63	62	50	42	**765**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	76	53	78	78	70	67	56	79	67	52	62	36	**774**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	23	38	17	16	17	11	26	11	10	10	3	11	**193**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	100,3	229,4	338,3	249,9	110,7	170,4	133,3	314,2	148,2	101,8	87,3	89,6	**182,16**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-4,82%	8,33%	-25,27%	-25,49%	-27,66%	-19,18%	-6,76%	-21,95%	-13,70%	14,81%	-9,09%	-19,23%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.326	796	906	1.101	947	1.129	1.152	1.047	1.055	1.096	799	711	**12.065**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	409	418	419	471	476	432	523	616	768	688	644	545	**6.409**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	424	410	402	480	443	457	507	593	762	727	646	550	**6.401**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	56	64	81	72	105	80	96	119	125	86	84	79		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,98	5,83	5,34	5,59	5,44	6,63	5,69	5,64	7,31	6,47	6,01	6,60	**6,13**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE (Distritos: San Fernando-Tigre, San Isidro, San Martín y Vicente López)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	5	15	7	4	7	4	16	2	3	26	31	23	**143**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	4	0	0	0	0	10	1	1	21	27	14	**78**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	**9**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	4	0	0	0	0	7	0	0	9	18	7	**45**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	3	0	1	12	4	4	**24**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	5	11	7	4	7	4	6	1	2	5	4	9	**65**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	**6**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	2	5	2	4	4	2	5	1	1	4	1	5	**36**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	3	3	5	0	3	2	1	0	1	1	2	2	**23**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	0,00%	26,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,50%	50,00%	33,33%	80,77%	87,10%	60,87%	**54,55%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.990	1.885	2.134	2.226	2.042	2.504	2.652	1.725	1.735	1.693	1.529	1.598	**23.713**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.863	1.905	2.056	2.212	2.064	2.257	2.835	1.926	1.788	1.660	1.576	1.521	**23.663**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	83	105	103	113	118	223	149	80	88	63	97	104	**1.326**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	39,7	41,9	38,0	42,3	40,0	41,5	57,1	46,7	36,4	30,6	33,4	45,0	**41,86**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2.577	2.215	1.296	1.575	1.559	1.365	1.889	1.136	1.050	1.211	1.421	2.375	**19.669**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2.591	2.273	1.318	1.503	1.627	1.220	2.012	1.188	1.067	1.211	1.397	2.172	**19.579**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	55	20	20	33	48	71	32	37	30	34	41	85	**506**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,7	15,8	22,2	19,6	18,3	20,9	19,1	21,6	20,3	17,4	16,0	19,7	**18,65**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.825	866	1.035	1.073	1.320	959	1.196	642	654	681	631	1.508	**12.390**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.821	951	1.009	1.055	1.334	876	1.303	639	665	703	617	1.387	**12.360**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	35	12	19	32	30	43	20	29	21	7	13	48	**309**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,6	18,8	19,1	21,1	16,6	21,3	18,7	20,5	20,5	19,3	17,7	19,5	**18,84**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	39	47	66	44	106	115	74	80	110	84	85	69	**919**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	41	45	63	41	111	80	103	80	114	77	94	71	**920**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	2	2	5	2	4	3	2	2	2	1	0	**25**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	24,8	22,1	32,0	16,8	20,5	23,5	22,4	21,4	25,9	25,6	24,8	20,7	**23,49**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	21	20	27	26	60	47	41	22	27	30	20	17	**358**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	20	19	25	27	55	48	39	28	29	31	19	17	**357**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	0	3	1	4	1	3	1	1	1	2	1	**19**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	19,0	40,3	27,4	43,7	28,7	34,4	35,5	21,6	45,5	26,2	32,7	52,8	**33,28**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	6.392	4.966	4.465	4.874	4.921	4.828	5.737	3.503	3.439	3.585	3.581	5.481	**55.772**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	19,43%	-0,84%	17,78%	1,04%	-3,02%	27,79%	-2,35%	-8,54%	8,97%	-8,73%	-19,92%	9,99%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-68,80%	-49,46%	-53,52%	-72,50%	17,78%	105,36%	-20,43%	5,26%	134,04%	82,61%	107,32%	46,81%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE (Distritos: San Fernando-Tigre, San Isidro, San Martín y Vicente López)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2.131	1.933	2.423	2.339	2.939	3.148	3.601	3.492	3.683	3.245	2.544	2.559	**34.037**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2.057	1.924	2.429	2.351	2.854	3.071	3.484	3.548	3.818	3.267	2.651	2.542	**33.996**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	54	126	63	68	90	168	136	145	104	81	66	48	**1.149**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	19,4	24,7	23,3	26,1	30,6	25,2	28,8	29,2	26,1	24,3	21,3	25,8	**25,73**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	228	196	252	214	309	259	368	307	372	309	274	289	**3.377**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	213	194	265	217	306	255	339	338	358	317	286	275	**3.363**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	6	14	5	5	7	6	13	5	8	2	5	4	**80**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,3	15,0	19,6	18,1	20,7	18,8	21,6	21,9	19,3	17,4	13,5	18,8	**18,69**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	174	133	219	179	240	192	253	242	237	238	239	240	**2.586**	Se corrigió la serie ENERO a SEPTIEMBRE de 2025.
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	22	20	35	29	49	43	38	34	42	44	36	41	**433**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	27	19	34	26	48	37	40	35	48	38	40	41	**433**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	2	3	2	2	7	3	3	0	7	4	3	**37**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	52,7	118,7	47,8	32,7	38,1	58,6	30,8	100,9	50,2	41,7	31,0	60,9	**52,30**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	24,825	12,105	19,780	19,385	31,140	23,955	37,355	33,295	34,960	36,610	33,940	21,180	**328,530**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el [illegible]	N°	2.153	1.953	2.458	2.368	2.988	3.191	3.639	3.526	3.725	3.289	2.580	2.600	**34.470**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	12,02%	17,16%	-2,77%	11,54%	20,58%	20,78%	15,49%	5,70%	16,08%	18,52%	7,05%	25,54%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	245	231	263	240	243	227	234	247	242	261	235	276	**2.944**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	216	214	264	256	252	230	241	247	226	233	249	201	**2.829**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	47	79	64	55	40	38	50	29	51	72	61	108	**694**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	98,3	122,4	181,4	160,7	212,2	126,7	147,9	161,0	116,7	108,1	125,7	110,8	**141,25**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-42,35%	-31,25%	-43,92%	-46,19%	-42,42%	-34,77%	-29,52%	-29,02%	-21,43%	7,41%	9,81%	38,69%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	6.534	5.123	5.119	6.110	4.944	5.278	6.011	5.576	5.664	5.578	4.603	4.470	**65.010**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	204	75	119	255	128	83	387	60	98	366	172	297	**2.244**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	1.710	1.619	1.590	1.874	1.849	1.801	2.129	2.333	2.648	2.525	2.303	2.067	**24.448**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	1.670	1.583	1.607	1.819	1.838	1.676	2.175	2.205	2.608	2.724	2.295	2.063	**24.263**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	300	336	319	374	385	510	464	592	632	433	441	445		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,20	5,38	5,30	5,21	5,19	5,12	5,67	6,82	6,06	6,94	6,07	6,28	**5,86**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO LA MATANZA NORTE

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	0	4	3	4	7	11	8	8	10	10	11	**76**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	3	2	4	7	8	7	7	10	8	9	**65**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	3	1	4	6	6	4	4	4	3	3	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	1	0	1	2	3	3	6	5	6	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	1	1	0	0	3	1	1	0	2	2	**11**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	1	2	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	N/A	75,00%	66,67%	100,00%	100,00%	72,73%	87,50%	87,50%	100,00%	80,00%	81,82%	**85,53%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	480	529	595	592	544	710	667	597	611	591	423	354	**6.693**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	488	488	628	562	517	713	715	574	602	616	428	378	**6.709**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	10	16	6	11	29	27	28	27	32	27	13	3	**229**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	19,7	28,8	16,9	21,0	21,2	27,7	30,3	29,2	34,8	23,0	25,4	22,9	**25,31**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	834	495	429	394	429	443	407	422	379	312	598	1.459	**6.601**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	889	487	437	386	395	481	420	405	379	309	606	1.371	**6.565**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	8	11	3	9	21	10	3	12	10	22	3	102	**214**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,7	13,0	12,7	12,5	15,1	17,8	21,5	15,5	21,9	15,0	14,5	9,2	**13,49**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	396	176	200	219	181	224	170	171	110	116	194	423	**2.580**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	402	180	201	218	165	239	169	171	111	114	189	421	**2.580**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	8	3	2	0	12	3	4	4	2	6	2	13	**59**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	9,3	13,0	13,6	13,9	13,2	17,9	20,4	17,5	29,0	13,8	14,9	11,3	**14,39**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	7	3	17	6	20	13	16	18	11	9	12	74	**206**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	7	3	17	6	19	14	16	18	11	9	12	73	**205**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	**2**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	6,3	11,4	9,2	10,6	11,7	12,1	11,8	14,6	8,1	10,8	15,6	8,9	**10,57**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	1	10	6	13	9	4	7	11	3	6	3	**75**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2	1	10	5	14	9	4	6	12	3	6	3	**75**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,9	1,6	9,4	9,4	9,3	10,5	19,1	26,7	11,4	13,2	6,4	8,8	**11,50**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.710	1.200	1.224	1.205	1.154	1.377	1.244	1.190	1.100	1.019	1.215	2.236	**15.874**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-40,06%	-51,57%	-34,44%	-8,99%	-44,55%	-5,62%	-40,19%	-18,88%	-11,15%	5,05%	3,85%	65,38%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-68,18%	-82,35%	-19,05%	-77,78%	-13,04%	225,00%	-38,46%	5,88%	10,00%	-18,18%	100,00%	572,73%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO LA MATANZA NORTE

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	915	882	1.103	1.039	1.866	1.497	1.943	2.103	1.933	1.660	1.246	1.152	**17.339**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	904	887	1.099	968	1.882	1.529	1.930	2.135	1.868	1.711	1.274	1.160	**17.347**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	24	12	20	38	68	37	52	20	80	41	10	3	**405**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	9,8	13,2	13,9	18,6	15,5	19,2	25,9	26,8	25,2	20,4	16,9	19,3	**19,92**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	75	68	95	86	151	113	146	157	147	151	90	71	**1.350**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	75	64	96	80	157	113	143	162	144	149	96	71	**1.350**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	1	2	2	3	5	1	2	5	0	0	**22**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	4,9	8,4	5,8	9,7	8,4	9,8	13,4	18,1	15,9	11,3	11,3	10,4	**11,35**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	64	49	80	70	118	90	106	116	109	98	168	50	**1.118**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	7	2	7	11	3	7	6	12	9	9	16	11	**100**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	7	2	5	13	3	7	5	8	13	10	16	11	**100**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	21,9	1,8	6,7	19,0	10,4	3,5	14,9	4,6	20,4	31,4	41,8	35,5	**22,42**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	10,310	16,676	18,027	10,773	17,666	13,431	19,096	16,965	41,006	17,696	15,540	7,930	**205,116**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	922	884	1.110	1.050	1.869	1.504	1.949	2.115	1.942	1.669	1.262	1.163	**17.439**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-1,81%	34,96%	-36,43%	15,51%	55,88%	14,63%	17,34%	19,29%	11,03%	30,90%	8,61%	14,47%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	116	108	96	86	99	71	85	93	88	115	93	122	**1.172**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	126	87	95	106	80	97	87	81	81	116	96	135	**1.187**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	18	37	38	19	34	12	14	23	25	23	21	12	**276**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	127,4	96,9	224,0	222,7	211,8	221,2	137,0	106,3	143,4	142,4	94,2	119,0	**152,93**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-67,14%	-55,37%	-65,34%	-63,87%	-59,26%	-56,17%	-54,30%	-43,98%	-42,86%	-27,67%	-31,62%	7,02%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.663	1.438	1.616	1.130	1.431	1.525	1.316	1.623	1.443	1.352	997	953	**16.487**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	462	415	453	516	530	532	606	581	734	696	661	563	**6.749**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	466	405	432	580	489	564	597	579	727	736	627	573	**6.775**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	162	172	193	129	170	138	147	149	156	116	150	140		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	9,39	9,84	14,54	8,07	6,56	6,14	8,26	7,26	7,47	6,87	8,15	8,44	**8,20**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO LA MATANZA SUR

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	**2**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	**2**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	**100,00%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	542	432	428	500	516	698	781	649	537	642	551	399	**6.675**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	569	429	448	454	475	647	821	656	575	554	667	394	**6.689**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	3	23	11	17	36	56	49	36	5	12	10	9	**267**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	22,3	32,4	20,1	20,0	30,6	31,0	42,8	42,9	23,4	17,9	27,5	29,3	**29,27**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.179	593	381	467	518	506	511	503	493	647	470	1.079	**7.347**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.238	619	397	419	513	512	523	481	517	556	550	965	**7.290**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	23	10	4	15	17	14	18	25	10	41	8	113	**298**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,2	17,9	14,4	12,9	20,1	22,6	27,1	25,3	24,1	27,4	36,9	18,8	**21,14**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	415	190	190	165	187	212	155	169	115	147	103	364	**2.412**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	431	197	192	162	176	216	155	169	129	116	125	331	**2.399**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	10	3	1	5	5	3	12	9	1	11	3	29	**92**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,5	16,4	12,9	14,6	20,0	21,7	31,7	29,7	30,5	31,9	35,4	20,5	**21,22**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	18	9	12	13	17	13	9	13	27	21	2	9	**163**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	15	11	13	13	17	13	9	13	27	21	2	8	**162**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	6,0	9,3	8,5	8,9	9,5	9,8	11,2	11,7	10,2	13,0	9,7	5,1	**9,68**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	0	0	0	2	2	3	1	1	1	0	0	**10**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	0	0	0	1	2	4	1	1	1	0	0	**10**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**2**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	44,9	69,9	41,7	42,1	20,6	0,0	0,0	**47,86**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	2.136	1.215	999	1.132	1.221	1.416	1.447	1.321	1.145	1.436	1.124	1.842	**16.434**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-25,83%	-40,88%	-5,13%	-1,91%	-11,07%	26,09%	-26,81%	-1,56%	4,57%	26,19%	-10,22%	12,66%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-55,00%	-47,06%	-50,00%	-45,83%	13,33%	30,00%	-64,00%	-18,75%	200,00%	200,00%	-86,67%	125,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO LA MATANZA SUR

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.140	981	1.224	1.227	1.828	1.543	1.970	2.126	1.964	1.506	1.251	1.270	**18.030**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.181	952	1.260	1.194	1.732	1.591	1.771	2.243	2.074	1.438	1.341	1.284	**18.061**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	23	41	19	17	63	50	100	117	44	72	29	7	**582**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,2	22,5	18,0	19,0	17,0	23,5	24,6	26,9	23,6	21,8	23,8	22,4	**22,15**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	96	95	118	99	144	147	149	183	182	148	164	142	**1.667**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	98	92	117	98	140	153	140	178	194	137	169	152	**1.668**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	2	3	1	3	1	5	9	1	6	0	0	**31**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,2	15,2	13,1	12,3	12,7	16,2	16,6	19,1	19,3	14,8	14,3	13,4	**15,43**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	85	75	92	86	106	133	106	123	125	106	227	132	**1.396**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	4	5	10	9	7	6	9	15	11	15	10	**103**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2	5	3	10	6	10	7	4	16	11	16	13	**103**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	0	1	1	3	2	0	2	2	2	1	0	**15**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	24,8	56,6	39,6	50,5	50,1	172,0	268,6	32,1	74,2	31,3	50,2	52,4	**77,67**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	17,488	17,127	14,471	20,537	8,755	18,704	19,098	23,736	26,827	29,353	18,087	4,340	**218,523**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	1.142	985	1.229	1.237	1.837	1.550	1.976	2.135	1.979	1.517	1.266	1.280	**18.133**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	12,51%	-3,24%	-27,54%	11,54%	44,99%	6,97%	21,45%	5,22%	0,15%	8,20%	8,39%	13,37%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	58	49	40	44	43	43	53	60	48	64	69	63	**634**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	52	54	37	47	39	47	52	56	52	61	60	67	**624**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	15	13	14	15	13	10	12	9	8	11	16	18	**154**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	125,8	138,7	164,0	221,3	214,7	249,5	100,3	151,8	101,8	109,8	82,2	148,7	**146,16**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-38,95%	-44,94%	-50,00%	-37,14%	-37,68%	-21,82%	8,16%	9,09%	6,67%	48,84%	60,47%	75,00%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	986	1.055	1.392	1.281	1.091	1.097	1.482	1.555	1.046	873	1.124	977	**13.959**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	Se informan aquí los pagos tomados en San Justo, informados hasta julio/2015 en la planilla del Distrito La Matanza Oeste.
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	187	139	169	178	136	170	194	196	259	269	274	270	**2.441**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	227	133	156	192	141	174	193	209	264	257	262	231	**2.439**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	70	76	89	75	70	66	67	54	49	61	73	112		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	14,81	6,70	11,41	13,68	14,12	7,69	8,52	6,36	6,62	6,34	6,27	6,64	**8,82**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO LA MATANZA SUR

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Áreas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO LA MATANZA OESTE

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	0	0	1	2	3	3	0	6	5	2	1	**23**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	0	2	3	3	0	6	5	2	1	**22**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	2	3	3	0	6	5	2	1	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	N/A	N/A	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**95,65%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	278	284	364	415	347	438	443	381	367	338	285	232	**4.172**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	287	271	367	394	350	441	441	369	374	344	295	238	**4.171**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	4	10	5	14	16	10	13	19	17	5	5	6	**124**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,3	23,0	24,6	20,5	26,3	27,0	21,3	21,4	27,5	19,2	20,3	20,1	**22,82**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	541	264	72	81	66	124	108	104	88	95	114	383	**2.040**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	562	267	76	75	70	124	104	108	90	93	115	289	**1.973**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	7	2	1	2	2	1	2	2	0	1	1	72	**93**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,7	11,6	11,3	15,4	16,5	12,7	11,4	11,4	14,4	8,8	10,8	9,2	**11,28**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	217	80	33	33	48	34	39	33	34	34	44	100	**729**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	221	84	31	31	51	33	41	30	37	34	44	82	**719**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	3	0	2	3	0	1	1	0	0	0	0	13	**23**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,5	12,9	13,4	13,5	15,1	15,5	11,8	11,9	10,4	9,1	9,1	10,1	**11,52**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	5	1	10	4	5	4	7	10	5	8	3	9	**71**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	5	1	10	4	5	4	6	11	5	8	3	9	**71**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,4	1,2	9,7	8,7	6,1	1,4	9,5	8,5	2,0	5,4	7,9	6,3	**6,98**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,00**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.036	628	469	529	461	596	590	518	489	467	443	715	**6.941**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	20,33%	-48,48%	-10,84%	-10,79%	-41,65%	-9,97%	-20,05%	8,37%	-2,00%	-19,34%	4,73%	8,83%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-61,54%	-87,50%	-23,08%	-42,86%	-44,44%	0,00%	-22,22%	25,00%	0,00%	14,29%	-40,00%	0,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO LA MATANZA OESTE

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**N/A**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**N/A**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**N/A**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período.	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	4	3	8	7	4	6	5	5	5	7	4	4	**62**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	4	2	6	9	4	6	5	5	4	4	8	4	**61**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	1	0	1	1	0	1	0	2	3	1	1	**11**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	56,7	37,1	78,4	104,8	124,1	47,8	31,9	63,5	108,5	#¡VALOR!	150,5	85,1	**N/A**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-20,00%	200,00%	-27,27%	-46,15%	-63,64%	100,00%	-54,55%	150,00%	-16,67%	-12,50%	0,00%	0,00%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	338	239	252	194	214	210	269	317	180	210	256	217	**2.896**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	Los pagos tomados en San Justo, informados aquí hasta julio/2015, se reportan en la planilla del Distrito La Matanza Sur.
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	154	80	114	142	102	77	106	110	111	131	135	96	**1.358**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	167	83	100	148	97	93	95	113	103	132	131	107	**1.369**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	13	10	24	18	23	7	18	15	23	22	26	15		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	4,61	4,57	3,86	3,89	5,55	3,08	4,67	3,53	4,05	3,55	4,34	4,91	**4,21**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO MORON (Partido de Morón + Partido de Hurlingham + Partido de Ituzaingó)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	3	1	3	6	2	6	4	0	4	7	3	12	**51**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	2	0	0	4	2	3	2	0	4	7	3	10	**37**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	2	0	0	4	0	3	2	0	4	7	3	7	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	1	1	3	2	0	3	2	0	0	0	0	2	**14**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0	1	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	66,67%	0,00%	0,00%	66,67%	100,00%	50,00%	50,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	83,33%	**72,55%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	538	534	692	569	531	616	763	527	433	375	321	374	**6.273**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	504	498	652	591	567	592	776	572	458	358	327	382	**6.277**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	17	22	17	44	13	56	23	15	13	14	12	11	**257**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	22,2	24,0	23,8	27,2	39,1	27,9	34,2	36,4	24,0	17,7	20,6	20,6	**27,51**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	546	373	690	413	504	400	691	548	271	260	253	1.030	**5.979**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	539	387	689	402	505	404	690	558	282	253	239	989	**5.937**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	16	6	5	12	11	13	16	7	3	4	10	63	**166**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,6	14,9	14,5	16,2	19,0	15,3	13,7	13,2	12,2	10,3	11,5	11,4	**13,86**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	290	169	785	360	510	339	558	394	180	157	139	779	**4.660**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	278	179	783	353	512	345	551	408	184	155	135	751	**4.634**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	6	4	5	16	10	11	16	3	2	3	4	33	**113**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,4	16,0	13,3	16,1	17,4	14,7	13,1	13,4	12,3	11,5	13,7	11,2	**13,87**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	24	20	34	20	23	44	61	45	53	40	32	29	**425**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	24	20	34	18	25	41	64	45	53	40	32	29	**425**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	**5**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,7	8,9	8,2	16,0	14,9	8,1	9,4	10,6	7,8	9,4	10,0	10,3	**9,92**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	7	1	2	15	6	10	4	5	0	4	1	**57**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1	8	1	2	15	6	9	4	6	0	4	1	**57**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	24,4	16,5	2,1	9,8	25,6	15,9	5,6	18,5	12,0	0,0	10,9	2,8	**15,81**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.374	1.076	2.167	1.342	1.545	1.355	2.012	1.469	884	792	713	2.183	**16.912**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-4,98%	-31,42%	53,04%	16,29%	-0,58%	-17,73%	11,34%	-16,86%	-25,59%	0,76%	-21,82%	99,00%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-66,20%	-67,74%	-87,86%	-84,25%	-68,06%	-37,14%	8,93%	28,57%	140,91%	37,93%	52,38%	-29,27%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO MORON (Partido de Morón + Partido de Hurlingham + Partido de Ituzaingó)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	495	483	599	556	860	834	999	845	859	686	582	497	**8.295**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	483	472	591	562	846	846	976	834	887	714	566	526	**8.303**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	11	23	10	7	15	24	25	52	34	9	10	4	**224**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,8	19,5	21,0	20,3	22,0	19,2	20,8	17,6	16,6	15,4	15,2	13,2	**18,26**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	40	43	56	20	65	45	63	43	44	33	24	25	**501**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	40	43	55	24	61	45	62	44	45	35	25	24	**503**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	3	2	0	1	1	4	4	2	0	0	0	**17**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,8	21,1	18,6	21,1	21,9	17,7	20,2	18,1	16,7	14,0	15,2	15,1	**18,45**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	31	40	47	21	49	40	52	37	40	33	58	21	**469**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	12	11	3	7	9	2	4	5	3	9	8	5	**78**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	8	13	3	6	11	2	3	6	3	9	8	6	**78**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	3	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	**9**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	37,4	25,1	144,2	23,0	52,2	21,7	102,7	38,1	168,0	16,8	103,5	44,8	**52,59**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	11,411	9,583	8,322	#¡VALOR!	#¡VALOR!	22,287	13,004	#¡VALOR!	23,527	11,616	11,901	7,280	**#¡VALOR!**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el [illegible]	N°	507	494	602	563	869	836	1.003	850	862	695	590	502	**8.373**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-10,90%	24,75%	-20,16%	12,38%	30,48%	14,05%	15,82%	-8,99%	-8,40%	11,02%	4,06%	-0,59%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	68	60	68	58	64	61	82	81	91	82	59	61	**835**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	77	47	69	56	72	61	80	90	87	70	70	70	**849**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	12	25	13	10	7	11	15	9	10	20	14	8	**154**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	120,8	100,5	123,4	181,7	132,5	104,6	80,7	118,8	89,7	67,4	115,5	100,6	**110,05**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-39,82%	-25,93%	-36,45%	-48,21%	-43,86%	-26,51%	-11,83%	-6,90%	3,41%	17,14%	-13,24%	-8,96%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.880	1.669	1.596	1.955	1.563	1.533	1.842	1.614	1.732	1.605	1.751	1.493	**20.233**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	579	485	465	604	518	640	595	615	753	739	675	623	**7.291**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	602	502	448	552	542	629	656	610	753	715	673	681	**7.363**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	158	141	158	210	186	197	136	141	141	165	167	109		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	7,77	8,36	6,25	7,85	8,13	7,43	6,98	5,29	6,60	5,70	6,51	6,75	**6,92**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO TRES DE FEBRERO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	385	347	369	344	405	554	530	389	407	358	357	322	**4.767**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	359	357	367	351	373	494	618	388	420	357	357	342	**4.783**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	20	17	11	15	29	93	32	26	18	16	17	0	**294**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	31,0	31,2	30,9	24,1	30,8	44,4	81,8	65,5	39,6	26,5	31,6	38,8	**42,25**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	591	357	352	266	845	491	474	298	352	404	349	637	**5.416**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	590	377	350	267	833	494	477	284	358	364	397	604	**5.395**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	27	9	5	9	20	17	14	28	14	43	5	46	**237**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,0	16,9	16,9	16,5	15,2	21,5	26,0	30,9	28,8	18,7	16,9	17,8	**19,51**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	443	264	281	215	861	379	400	141	133	236	137	318	**3.808**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	449	280	278	218	839	384	406	133	150	218	162	291	**3.808**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	20	6	3	7	27	21	14	20	6	22	1	22	**169**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,9	16,3	16,8	17,0	15,5	19,6	25,1	41,0	30,1	18,6	19,5	19,4	**19,21**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	7	3	13	11	19	22	10	14	24	37	7	18	**185**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	7	3	13	9	21	22	10	14	22	39	7	12	**179**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	**3**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	6,8	12,5	12,2	7,0	9,9	13,2	19,9	12,2	13,1	13,7	12,7	7,8	**12,17**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	4	2	0	12	4	3	4	4	2	2	2	**41**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1	4	3	0	12	4	3	4	4	2	2	2	**41**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	26,0	94,2	112,4	0,0	10,4	9,6	7,0	26,3	31,0	2,2	12,0	18,3	**29,72**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.419	968	1.002	825	2.111	1.424	1.404	828	892	998	843	1.277	**13.991**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	19,85%	-5,74%	-25,78%	-49,07%	-0,05%	6,83%	19,39%	-33,60%	1,59%	6,85%	10,05%	18,68%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-63,16%	-72,73%	-72,34%	-80,00%	-9,52%	83,33%	-37,50%	75,00%	300,00%	208,33%	0,00%	50,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO TRES DE FEBRERO

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	706	538	781	772	1.041	1.111	1.394	1.257	1.171	1.038	769	810	**11.388**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	682	548	782	778	1.009	1.084	1.402	1.206	1.228	1.066	779	832	**11.396**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	39	29	20	19	34	70	65	116	62	29	15	6	**504**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	22,9	24,0	22,8	25,2	29,1	30,7	66,7	53,6	43,1	24,8	19,1	22,3	**35,07**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	27	15	41	19	51	25	46	39	49	35	25	53	**425**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	29	14	42	17	53	26	42	37	52	35	28	52	**427**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	2	1	3	0	0	4	6	3	1	0	0	**21**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,6	18,4	20,2	32,6	30,5	25,4	69,1	36,8	38,6	20,3	17,8	13,1	**29,40**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	21	7	25	12	37	7	16	11	31	15	34	30	**246**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	8	1	3	10	11	1	2	3	7	5	3	6	**60**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	9	1	2	10	10	3	2	2	8	4	3	7	**61**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	**4**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	24,9	15,2	10,4	23,4	44,9	86,1	99,9	49,6	66,2	12,7	96,8	63,7	**46,18**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	18,105	10,854	18,947	21,158	11,968	2,772	14,100	19,136	17,449	21,956	20,000	19,260	**195,705**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	714	539	784	782	1.052	1.112	1.396	1.260	1.178	1.043	772	816	**11.448**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-18,31%	0,37%	-27,94%	3,85%	15,60%	12,10%	25,43%	9,66%	-4,54%	8,53%	-6,88%	19,12%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	30	24	36	32	42	30	35	42	43	49	43	39	**445**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	28	23	36	36	41	30	27	51	44	41	46	40	**443**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	4	5	5	0	4	2	9	2	2	2	6	4	**45**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	94,9	#¡VALOR!	72,8	64,9	50,4	51,6	108,5	134,0	50,5	43,7	51,9	71,3	**N/A**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-37,50%	-14,29%	-14,29%	-33,33%	-26,32%	-33,33%	40,00%	5,00%	53,57%	32,43%	-10,42%	2,63%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.002	738	783	924	860	944	997	903	886	972	790	715	**10.514**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	206	177	232	290	255	298	308	385	486	440	382	318	**3.777**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	206	179	217	297	243	288	301	365	536	415	396	341	**3.784**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	37	35	50	43	55	65	72	92	42	67	53	30		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	4,50	4,86	6,50	4,28	6,02	5,98	13,30	8,57	8,39	5,71	6,90	5,09	**6,90**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE (Distritos: La Matanza Norte, La Matanza Sur, La Matanza Oeste, Morón y Tres de Febrero)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	12	15	16	10	10	20	20	10	20	23	16	24	**196**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	11	14	12	6	9	16	15	9	19	23	14	20	**168**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	2	0	3	5	7	15	11	6	16	17	9	11	**102**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	9	14	9	1	2	1	4	3	3	6	5	9	**66**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	1	1	4	4	1	4	5	1	1	0	2	4	**28**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	1	1	1	2	0	0	2	0	0	0	1	1	**9**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	3	2	1	4	3	1	1	0	1	3	**19**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	91,67%	93,33%	75,00%	60,00%	90,00%	80,00%	75,00%	90,00%	95,00%	100,00%	87,50%	83,33%	**85,71%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	2.223	2.126	2.448	2.420	2.343	3.016	3.184	2.543	2.355	2.304	1.937	1.681	**28.580**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	2.207	2.043	2.462	2.352	2.282	2.887	3.371	2.559	2.429	2.229	2.074	1.734	**28.629**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	54	88	50	101	123	242	145	123	85	74	57	29	**1.171**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	22,8	28,1	22,5	22,8	30,0	31,2	42,5	38,7	29,8	20,9	25,7	26,6	**29,19**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	3.691	2.082	1.924	1.621	2.362	1.964	2.191	1.875	1.583	1.718	1.784	4.588	**27.383**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	3.818	2.137	1.949	1.549	2.316	2.015	2.214	1.836	1.626	1.575	1.907	4.218	**27.160**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	81	38	18	47	71	55	53	74	37	111	27	396	**1.008**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,6	15,3	14,4	14,4	17,1	19,1	20,9	19,5	22,0	19,1	20,9	13,1	**16,66**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	1.761	879	1.489	992	1.787	1.188	1.322	908	572	690	617	1.984	**14.189**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	1.781	920	1.485	982	1.743	1.217	1.322	911	611	637	655	1.876	**14.140**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	47	16	13	31	54	39	47	36	11	42	10	110	**456**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,8	15,3	14,0	15,5	16,3	18,1	19,9	21,2	23,4	17,9	19,3	14,1	**16,53**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	61	36	86	54	84	96	103	100	120	115	56	139	**1.050**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	58	38	87	50	87	94	105	101	118	117	56	131	**1.042**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	Nº	1	1	0	4	1	3	1	0	1	0	0	1	**13**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,7	9,3	9,2	11,3	11,4	9,8	10,9	11,4	9,1	11,3	11,4	8,7	**10,20**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	6	12	13	8	43	21	20	16	21	6	12	6	**184**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	4	13	14	7	43	21	20	15	23	6	12	6	**184**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	**6**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,1	39,3	30,9	9,5	15,0	15,1	21,4	25,4	16,3	10,8	8,8	11,0	**18,82**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	Nº	7.675	5.087	5.861	5.033	6.492	6.168	6.697	5.326	4.510	4.712	4.338	8.253	**70.152**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-16,79%	-39,06%	-5,65%	-13,89%	-17,93%	-0,90%	-13,90%	-15,47%	-7,92%	6,92%	-4,09%	41,88%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-63,03%	-68,70%	-77,66%	-77,50%	-40,00%	-4,00%	-21,97%	19,05%	130,77%	74,24%	3,70%	80,52%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE (Distritos: La Matanza Norte, La Matanza Sur, La Matanza Oeste, Morón y Tres de Febrero)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	3.256	2.884	3.707	3.594	5.595	4.985	6.306	6.331	5.927	4.890	3.848	3.729	**55.052**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	3.250	2.859	3.732	3.502	5.469	5.050	6.079	6.418	6.057	4.929	3.960	3.802	**55.107**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	97	105	69	81	180	181	242	305	220	151	64	20	**1.715**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,5	19,4	18,3	20,5	19,5	23,0	34,1	30,7	27,0	21,0	19,4	20,2	**23,53**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	238	221	310	224	411	330	404	422	422	367	303	291	**3.943**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	242	213	310	219	411	337	387	421	435	356	318	299	**3.948**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	8	7	6	6	5	18	20	8	12	0	0	**91**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,9	14,6	12,8	13,9	14,7	14,9	21,7	20,2	20,2	13,8	13,8	12,8	**15,93**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	201	171	244	189	310	270	280	287	305	252	487	233	**3.229**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	29	18	18	38	32	17	18	29	34	34	42	32	**341**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	26	21	13	39	30	22	17	20	40	34	43	37	**342**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	4	1	3	2	3	2	3	4	2	3	3	0	**30**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	27,9	29,9	46,6	28,8	45,2	93,0	144,9	24,7	62,2	25,3	60,2	48,3	**50,18**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	57,314	54,240	59,767	65,603	55,665	57,194	65,298	69,560	108,809	80,621	65,528	38,810	**778,409**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	3.285	2.902	3.725	3.632	5.627	5.002	6.324	6.360	5.961	4.924	3.890	3.761	**55.393**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-3,30%	11,36%	-29,50%	11,00%	39,21%	11,50%	20,07%	8,07%	1,03%	15,48%	4,40%	12,77%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	276	244	248	227	252	211	260	281	275	317	268	289	**3.148**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	287	213	243	254	236	241	251	283	268	292	280	316	**3.164**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	49	81	70	45	59	35	51	43	47	59	58	43	**640**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	121,2	108,5	160,3	186,8	158,6	171,8	106,3	123,5	102,1	103,2	91,6	114,7	**127,74**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-55,05%	-44,67%	-52,03%	-52,81%	-48,99%	-39,37%	-28,57%	-19,71%	-14,33%	0,00%	-10,37%	11,58%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	5.963	5.177	5.705	5.553	5.413	5.768	6.364	6.516	5.509	5.315	5.425	4.519	**67.227**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	1.588	1.296	1.433	1.730	1.541	1.717	1.809	1.887	2.343	2.275	2.127	1.870	**21.616**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	1.668	1.302	1.353	1.769	1.512	1.748	1.842	1.876	2.383	2.255	2.089	1.933	**21.730**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	440	434	514	475	504	473	440	451	411	431	469	406		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	8,70	7,20	9,01	7,80	8,18	6,33	8,54	6,57	6,83	5,75	6,56	6,46	**7,21**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE - DISTRITO AVELLANEDA

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	2	3	5	2	15	14	6	7	20	20	5	6	**105**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	2	3	4	2	12	13	6	3	19	17	5	3	**89**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	1	3	4	0	10	8	6	0	8	9	5	1	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	1	0	0	2	2	5	0	3	11	8	0	2	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	1	0	3	1	0	4	1	3	0	3	**16**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	1	0	2	1	0	4	1	2	0	2	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%	92,86%	100,00%	42,86%	95,00%	85,00%	100,00%	50,00%	**84,76%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	302	261	271	299	334	404	432	318	314	296	280	287	**3.798**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	317	260	267	292	305	407	413	370	299	310	264	294	**3.798**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	10	10	11	17	14	22	16	15	21	7	10	5	**158**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	19,2	22,4	28,9	23,1	21,2	30,2	41,5	23,7	21,4	23,6	19,0	25,6	**25,61**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	293	181	187	178	199	253	253	128	164	218	174	329	**2.557**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	308	183	185	173	193	257	233	154	173	209	160	278	**2.506**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	4	5	5	2	6	8	6	2	4	4	4	**52**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,4	12,4	17,2	13,6	16,6	16,4	22,2	18,8	13,6	13,3	11,2	16,2	**15,63**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	179	133	164	142	121	168	160	74	99	109	124	219	**1.692**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	188	141	163	126	130	180	146	84	100	111	101	184	**1.654**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	6	0	3	6	1	2	0	4	3	0	2	0	**27**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,0	13,2	14,7	16,3	12,3	15,7	22,9	18,3	14,4	13,3	12,2	15,0	**15,21**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	9	10	8	12	20	19	14	10	27	39	11	23	**202**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	13	10	7	12	17	23	11	11	29	38	9	19	**199**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**2**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,7	9,7	5,7	5,8	5,7	8,7	9,2	4,6	7,2	5,4	2,2	8,4	**7,03**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	3	1	3	1	4	1	1	2	1	0	1	**18**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	2	2	3	0	5	1	1	2	1	0	1	**18**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	38,3	25,2	7,7	0,0	21,7	28,6	22,1	3,5	5,1	0,0	27,0	**19,36**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	774	575	622	619	654	825	845	520	577	623	578	835	**8.047**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	0,52%	-14,81%	11,47%	-0,32%	0,31%	61,13%	-21,90%	-28,08%	-6,79%	-11,88%	15,14%	45,22%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	12,50%	25,00%	-11,11%	-42,86%	100,00%	58,33%	-6,67%	-37,50%	58,82%	178,57%	-8,33%	91,67%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE - DISTRITO AVELLANEDA

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	490	538	601	608	865	697	881	879	736	660	533	518	**8.006**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	564	507	614	584	862	703	708	997	791	666	536	511	**8.043**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	6	16	14	26	16	31	18	23	19	24	12	6	**211**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,7	19,2	19,6	17,8	21,7	24,2	28,1	25,2	23,0	16,1	14,9	20,8	**21,26**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	18	25	31	22	54	27	41	48	43	40	23	36	**408**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	19	25	31	21	55	26	30	57	49	36	24	32	**405**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	2	2	0	3	2	0	0	4	0	0	**14**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	27,3	17,9	16,2	16,3	19,0	26,5	21,5	21,1	22,4	13,5	18,5	18,0	**19,75**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	3	4	5	4	10	1	6	9	13	5	6	8	**74**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	5	3	1	3	6	8	7	6	4	9	4	12	**68**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	5	4	1	3	6	8	5	7	5	5	7	8	**64**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	**7**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	63,7	94,7	0,9	10,9	20,3	28,5	15,6	13,8	8,7	5,8	206,5	28,3	**46,87**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	10,665	8,150	9,225	13,725	8,545	3,745	14,300	14,035	5,595	6,775	3,520	4,765	**103,045**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	495	541	602	611	871	705	888	885	740	669	537	530	**8.074**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	22,83%	-11,75%	-41,67%	3,91%	56,09%	23,68%	30,21%	10,63%	-2,76%	3,88%	-3,59%	3,52%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	57	53	30	49	33	36	37	46	63	53	50	40	**547**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	53	56	28	47	39	35	39	46	61	63	44	44	**555**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	15	15	16	18	10	12	10	10	14	3	5	3	**131**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	29,6	112,1	43,2	32,5	1.006,2	25,5	151,6	36,6	21,7	727,1	337,0	74,1	**222,58**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-16,18%	-44,21%	-74,79%	-31,94%	-37,74%	-18,18%	-33,93%	-4,17%	1,61%	20,45%	38,89%	-20,00%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.382	1.109	804	980	773	1.018	977	854	1.127	743	603	570	**10.940**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	566	412	141	867	57	324	326	51	539	248	36	99	**3.666**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	298	272	243	284	278	297	317	337	406	411	338	331	**3.812**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	297	280	251	272	289	302	307	338	420	417	335	336	**3.844**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	46	38	30	42	31	27	37	36	22	16	19	14		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	7,55	5,07	5,85	4,03	5,06	4,24	4,68	5,92	4,12	3,32	2,73	3,38	**4,57**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error).

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE - DISTRITO LANUS

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	1	1	6	6	8	1	7	13	15	12	9	**79**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	6	6	6	1	5	12	14	11	7	**68**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	6	6	5	1	5	12	14	11	7	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	1	1	0	0	2	0	2	1	1	1	2	**11**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	71,43%	92,31%	93,33%	91,67%	77,78%	**86,08%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	453	378	461	379	485	624	692	488	466	396	329	346	**5.497**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	453	368	458	378	446	590	691	500	502	412	341	353	**5.492**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	8	24	15	15	26	44	23	21	25	11	2	6	**220**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,9	26,2	22,0	22,5	26,7	26,5	30,8	29,7	25,3	20,3	18,4	19,0	**24,66**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	332	230	244	201	241	271	274	372	359	300	289	598	**3.711**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	324	234	245	204	230	269	272	376	353	299	284	612	**3.702**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	9	9	6	5	12	10	7	7	5	6	1	6	**83**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,4	17,2	16,8	17,2	16,7	18,0	14,0	12,6	12,0	12,0	11,1	12,3	**14,06**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	198	143	180	141	128	198	192	205	149	132	134	392	**2.192**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	188	146	184	135	132	198	183	216	148	140	119	399	**2.188**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	3	8	3	7	7	7	6	1	3	3	2	2	**52**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,8	15,2	14,9	20,9	18,6	16,1	14,1	14,9	12,7	14,4	9,8	12,7	**14,75**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	14	5	11	19	10	14	37	81	35	40	16	21	**303**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	16	5	11	17	12	14	28	88	37	40	16	21	**305**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	**9**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,6	5,5	8,6	11,7	11,2	9,0	7,7	6,0	6,0	6,6	5,6	7,5	**7,20**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	3	4	6	3	2	1	0	2	0	3	2	0	**26**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	4	4	6	3	2	1	0	2	0	3	2	0	**27**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	55,2	12,7	14,2	15,3	27,0	21,8	0,0	10,0	0,0	12,6	7,7	0,0	**20,43**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	983	751	885	721	854	1.093	1.158	1.065	974	828	752	1.336	**11.400**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-15,19%	-15,05%	18,95%	-3,09%	-16,36%	43,25%	-13,90%	-2,11%	1,99%	-24,86%	-10,48%	68,26%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-63,16%	-58,33%	-50,00%	18,75%	-54,55%	75,00%	94,74%	138,24%	75,00%	233,33%	-11,11%	75,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE - DISTRITO LANUS

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	598	494	598	545	801	606	666	708	655	619	477	430	**7.197**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	587	501	576	533	799	624	643	685	701	608	499	439	**7.195**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	12	7	21	29	12	18	12	8	17	17	3	2	**158**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,6	17,4	18,3	19,7	16,0	20,2	15,5	18,6	14,5	16,9	14,5	12,3	**16,69**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	43	34	35	30	54	36	42	40	41	78	27	21	**481**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	43	32	34	27	56	40	39	39	40	80	30	18	**478**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	2	3	5	0	0	0	0	4	1	0	0	**15**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,7	13,8	15,5	15,4	19,8	11,6	8,5	13,7	18,1	14,3	13,8	10,1	**14,11**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	4	2	1	1	1	2	2	2	1	2	0	1	**19**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	8	5	4	4	7	3	11	10	6	6	5	6	**75**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	9	4	4	3	7	5	8	12	5	7	6	4	**74**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	1	2	2	0	3	0	1	1	0	0	**11**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	39,1	11,3	38,4	479,2	24,0	27,9	12,2	37,3	16,7	20,0	40,0	14,9	**45,46**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	19,465	5,185	10,776	17,495	9,250	6,460	9,970	7,580	11,155	7,280	7,615	7,320	**119,551**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	606	499	602	549	808	609	677	718	661	625	482	436	**7.272**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	34,37%	12,90%	-44,97%	-3,00%	45,06%	8,17%	-3,70%	-9,57%	-11,87%	0,16%	-21,37%	-20,58%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	78	51	56	51	47	39	53	61	53	48	54	48	**639**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	106	77	57	86	51	40	45	55	55	47	50	44	**713**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	254	227	231	199	192	193	196	197	203	206	207	212	**2.517**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	4.393,2	3.242,5	421,3	5.731,7	454,2	404,0	375,4	105,5	400,5	173,7	245,7	227,2	**1.888,91**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-39,53%	-39,29%	-71,57%	-55,65%	-35,62%	-49,35%	-22,06%	-18,67%	-24,29%	-15,79%	-11,48%	14,29%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.487	1.345	872	922	866	1.051	1.466	1.119	1.097	1.143	778	648	**12.794**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	314	315	317	328	355	358	423	352	446	403	362	351	**4.324**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	307	319	298	358	348	358	389	363	443	418	355	366	**4.322**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	40	36	55	25	32	32	65	54	57	42	49	34		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,77	3,56	5,18	5,29	3,81	4,55	3,29	4,25	4,09	4,50	3,84	3,58	**4,28**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE - DISTRITO QUILMES

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	4	2	4	8	7	7	9	6	9	14	11	16	**97**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	3	1	1	6	6	6	7	3	4	12	7	11	**67**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	3	1	1	6	6	6	6	3	4	12	7	10	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	1	1	3	2	1	1	2	3	5	2	4	5	**30**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	1	0	3	2	1	1	2	3	5	2	4	3	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	75,00%	50,00%	25,00%	75,00%	85,71%	85,71%	77,78%	50,00%	44,44%	85,71%	63,64%	68,75%	**69,07%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	481	436	551	515	413	767	726	599	467	405	285	326	**5.971**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	444	382	559	557	402	661	756	663	391	481	253	300	**5.849**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	20	17	41	39	50	109	70	23	53	26	38	29	**515**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	26,6	31,7	24,5	45,5	41,2	53,9	64,0	47,4	35,6	66,2	47,2	69,4	**46,75**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2.829	1.831	794	804	632	1.222	1.204	819	480	350	253	657	**11.875**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2.683	2.056	832	773	609	1.215	1.227	850	306	447	235	337	**11.570**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	273	9	22	35	25	36	40	22	21	9	24	89	**605**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,9	22,6	18,5	23,0	24,1	19,2	22,4	23,7	38,2	27,0	26,8	28,2	**22,55**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	854	680	434	386	397	599	432	283	186	170	119	234	**4.774**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	823	723	433	372	363	626	455	288	162	171	114	141	**4.671**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	69	9	17	25	16	27	15	5	6	4	6	18	**217**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,5	21,8	19,5	23,1	23,1	20,5	23,8	23,0	34,5	31,0	27,4	34,2	**22,94**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	35	7	8	10	7	15	10	10	16	10	17	24	**169**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	32	10	8	8	7	16	8	13	14	11	4	37	**168**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,5	22,3	11,1	13,4	7,0	10,7	21,4	9,3	17,2	19,8	13,7	16,5	**15,55**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	6	2	3	1	13	5	7	11	1	5	3	1	**58**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	5	3	2	2	10	7	6	12	2	3	3	1	**56**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	**4**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,5	18,6	20,5	24,1	27,2	45,4	62,1	61,5	8,7	17,8	108,8	240,9	**45,89**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	4.164	2.947	1.779	1.705	1.442	2.588	2.362	1.701	1.133	925	657	1.217	**22.620**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	146,54%	75,52%	67,99%	12,32%	-37,71%	52,32%	21,56%	48,69%	8,63%	-29,23%	-47,90%	-40,49%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	84,21%	75,00%	-33,33%	-37,50%	-41,67%	7,14%	-52,38%	-64,29%	14,29%	-33,33%	183,33%	41,18%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE - DISTRITO QUILMES

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	975	788	880	1.035	1.499	1.319	1.749	1.766	1.599	1.273	968	825	**14.676**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	952	810	834	1.002	1.267	1.547	1.691	1.697	1.593	1.136	1.044	910	**14.483**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	34	15	31	35	15	78	91	37	74	81	67	18	**576**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,5	21,4	18,2	21,0	21,3	25,6	31,3	30,8	40,9	35,1	31,8	40,1	**28,83**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	85	72	87	96	139	107	115	153	167	104	98	83	**1.306**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	77	82	82	96	116	132	112	138	158	107	103	82	**1.285**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	11	2	4	1	0	3	4	4	12	10	7	3	**61**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	22,4	20,2	16,9	16,5	20,9	27,7	29,8	31,1	45,2	37,7	37,0	60,0	**31,11**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	34	34	37	44	38	26	37	48	44	39	40	34	**455**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	14	8	18	19	12	10	16	10	9	9	11	14	**150**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	11	11	11	20	12	10	16	9	11	10	14	1	**136**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	0	6	4	3	2	3	6	1	1	0	0	**27**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	58,4	14,6	17,5	48,0	64,2	241,2	32,6	54,5	56,4	967,2	56,3	27,1	**126,91**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	14,450	10,225	14,065	6,100	11,885	8,610	9,410	10,805	7,560	8,915	6,995	5,520	**114,540**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	989	796	898	1.054	1.511	1.329	1.765	1.776	1.608	1.282	979	839	**14.826**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	18,30%	-36,62%	-52,26%	7,11%	38,12%	25,14%	33,01%	8,03%	4,15%	5,78%	-15,53%	-19,40%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	57	61	65	51	68	63	65	81	67	56	60	35	**729**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	62	48	61	60	57	68	63	68	76	73	43	38	**717**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	4	11	7	9	19	19	19	16	25	12	18	16	**175**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	76,9	56,8	71,3	81,2	94,0	94,1	100,9	110,4	73,8	137,0	93,1	164,3	**95,11**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-49,11%	-38,38%	-42,98%	-51,89%	9,68%	-10,00%	-18,75%	-14,74%	-22,99%	7,69%	33,33%	-20,45%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	2.178	2.047	1.442	1.541	1.591	1.694	1.591	1.272	1.324	1.610	1.278	1.082	**18.650**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	434	412	399	459	405	434	421	479	492	464	381	396	**5.176**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	433	417	389	471	413	441	391	466	428	530	421	361	**5.161**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	63	58	68	56	48	41	71	84	148	82	42	77		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,37	5,75	4,88	7,22	5,83	6,90	5,36	5,51	8,86	10,13	8,47	5,36	**6,74**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE (Distritos: Avellaneda, Lanús y Quilmes)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	6	6	10	16	28	29	16	20	42	49	28	31	**281**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	5	4	5	14	24	25	14	11	35	43	23	21	**224**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	4	4	5	12	22	19	13	8	24	35	23	18	**187**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	1	0	0	2	2	6	1	3	11	8	0	3	**37**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	1	2	5	2	4	4	2	9	7	6	5	10	**57**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	**4**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	1	0	4	2	3	4	2	8	6	4	4	5	**43**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	1	3	**10**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	83,33%	66,67%	50,00%	87,50%	85,71%	86,21%	87,50%	55,00%	83,33%	87,76%	82,14%	67,74%	**79,72%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	1.236	1.075	1.283	1.193	1.232	1.795	1.850	1.405	1.247	1.097	894	959	**15.266**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	1.214	1.010	1.284	1.227	1.153	1.658	1.860	1.533	1.192	1.203	858	947	**15.139**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	38	51	67	71	90	175	109	59	99	44	50	40	**893**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	22,5	27,3	24,5	33,1	30,3	38,4	46,7	35,9	27,7	39,5	27,1	37,0	**33,43**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	3.454	2.242	1.225	1.183	1.072	1.746	1.731	1.319	1.003	868	716	1.584	**18.143**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	3.315	2.473	1.262	1.150	1.032	1.741	1.732	1.380	832	955	679	1.227	**17.778**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	284	22	33	45	39	52	55	35	28	19	29	99	**740**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	19,6	21,3	18,0	20,6	21,1	18,6	21,1	20,1	22,0	19,3	16,6	17,6	**19,80**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	1.231	956	778	669	646	965	784	562	434	411	377	845	**8.658**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	1.199	1.010	780	633	625	1.004	784	588	410	422	334	724	**8.513**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	78	17	23	38	24	36	21	10	12	7	10	20	**296**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,7	19,7	17,4	21,3	19,9	18,7	21,3	19,4	21,7	20,8	16,5	17,4	**19,33**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	58	22	27	41	37	48	61	101	78	89	44	68	**674**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	61	25	26	37	36	53	47	112	80	89	29	77	**672**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	Nº	3	0	0	1	0	0	9	2	0	0	0	0	**15**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,9	13,9	8,6	10,2	7,8	9,4	10,4	6,2	8,4	7,7	5,6	12,0	**9,24**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	9	9	10	7	16	10	8	14	3	9	5	2	**102**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	9	9	10	8	12	13	7	15	4	7	5	2	**101**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	**4**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	34,2	20,3	17,7	14,7	27,1	34,4	57,3	52,0	6,1	13,7	68,3	133,9	**34,36**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	Nº	5.921	4.273	3.286	3.045	2.950	4.506	4.365	3.286	2.684	2.376	1.987	3.388	**42.067**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	63,65%	31,96%	39,18%	5,62%	-26,03%	51,51%	-0,11%	11,20%	2,56%	-23,75%	-23,67%	-0,76%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-10,77%	-8,33%	-37,21%	-22,64%	-15,91%	41,18%	10,91%	29,49%	52,94%	117,07%	22,22%	65,85%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE (Distritos: Avellaneda, Lanús y Quilmes)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2.063	1.820	2.079	2.188	3.165	2.622	3.296	3.353	2.990	2.552	1.978	1.773	**29.879**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2.103	1.818	2.024	2.119	2.928	2.874	3.042	3.379	3.085	2.410	2.079	1.860	**29.721**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	52	38	66	90	43	127	121	68	110	122	82	26	**945**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,7	19,7	18,6	19,8	20,0	24,1	27,2	26,7	30,3	25,3	23,3	28,3	**23,84**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	146	131	153	148	247	170	198	241	251	222	148	140	**2.195**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	139	139	147	144	227	198	181	234	247	223	157	132	**2.168**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	11	5	9	8	0	6	6	4	16	15	7	3	**90**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	19,4	18,3	16,4	16,3	20,1	24,3	23,8	25,8	36,3	25,4	29,7	43,0	**25,24**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	41	40	43	49	49	29	45	59	58	46	46	43	**548**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	27	16	23	26	25	21	34	26	19	24	20	32	**293**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	25	19	16	26	25	23	29	28	21	22	27	13	**274**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	1	7	6	5	2	7	6	2	4	1	3	**45**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	52,5	30,8	21,7	93,5	42,4	120,8	24,0	37,0	35,6	447,3	91,6	24,1	**86,22**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	44,580	23,560	34,066	37,320	29,680	18,815	33,680	32,420	24,310	22,970	18,130	17,605	**337,136**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	2.090	1.836	2.102	2.214	3.190	2.643	3.330	3.379	3.009	2.576	1.998	1.805	**30.172**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	23,67%	-20,55%	-47,54%	3,55%	44,41%	20,41%	22,79%	4,35%	-1,51%	3,87%	-14,21%	-14,13%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	192	165	151	151	148	138	155	188	183	157	164	123	**1.915**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	221	181	146	193	147	143	147	169	192	183	137	126	**1.985**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	273	253	254	226	221	224	225	223	242	221	230	231	**2.823**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	2.135,8	1.429,2	202,5	2.587,2	461,0	164,0	198,4	88,7	150,8	349,6	227,1	154,7	**775,07**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-37,86%	-40,65%	-64,88%	-48,46%	-21,28%	-27,75%	-24,02%	-13,76%	-16,44%	2,61%	15,49%	-9,56%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	5.877	5.185	3.515	3.988	3.424	4.079	4.634	3.502	3.948	3.816	2.884	2.517	**47.369**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	566	412	141	141	57	324	326	51	539	248	36	99	**2.940**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	1.046	999	959	1.071	1.038	1.089	1.161	1.168	1.344	1.278	1.081	1.078	**13.312**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	1.037	1.016	938	1.101	1.050	1.101	1.087	1.167	1.291	1.365	1.111	1.063	**13.327**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	149	132	153	123	111	100	173	174	227	140	110	125		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	6,18	4,82	5,30	5,60	4,97	5,31	4,48	5,24	5,83	5,90	5,17	4,16	**5,27**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDOESTE - DISTRITO ALTE BROWN-E. ECHEVERRIA-EZEIZA (Pdo. Alte. Brown+Pdo. E. Echeverría+ Pdo. Ezeiza)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	12	17	20	26	16	30	33	19	32	22	33	25	**285**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	8	10	16	22	12	17	30	16	29	16	26	22	**224**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	**4**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	7	9	16	22	12	17	30	15	22	15	23	22	**210**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	3	0	**10**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	4	7	4	4	4	13	3	3	3	6	7	3	**61**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	2	5	1	2	0	3	1	2	0	0	3	0	**19**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	2	2	3	2	4	10	2	1	3	6	4	3	**42**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	66,67%	58,82%	80,00%	84,62%	75,00%	56,67%	90,91%	84,21%	90,63%	72,73%	78,79%	88,00%	**78,60%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	703	632	827	757	639	894	883	845	857	704	534	521	**8.796**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	651	663	695	799	534	904	918	894	897	708	599	551	**8.813**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	39	37	53	29	30	51	64	31	47	39	14	14	**448**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	38,5	37,3	37,7	38,1	36,4	37,3	41,3	40,9	41,5	39,4	40,6	29,9	**38,57**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.042	403	506	377	324	416	246	242	279	243	382	908	**5.368**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.160	533	381	422	304	453	275	238	311	246	345	636	**5.304**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	17	4	12	8	38	4	12	2	4	6	6	23	**136**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,9	17,1	15,1	18,3	17,7	15,6	19,6	21,5	16,0	15,9	18,9	15,9	**17,09**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	380	141	207	128	107	115	138	89	100	81	146	285	**1.917**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	410	177	128	198	108	110	125	108	102	85	132	214	**1.897**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	5	1	6	4	5	6	5	2	0	2	0	13	**49**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,5	19,2	16,9	18,1	16,9	17,1	21,5	17,9	19,2	19,0	15,2	15,5	**17,69**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	56	22	55	50	22	38	28	48	46	27	40	42	**474**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	58	30	9	84	29	30	23	48	59	27	41	25	**463**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	**5**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,1	6,1	4,5	9,4	6,0	8,2	7,6	10,5	7,9	5,5	7,9	7,3	**7,99**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	2	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	**10**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2	1	1	0	0	3	0	1	1	1	0	0	**10**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,3	0,5	47,2	0,0	0,0	25,1	0,0	21,4	3,9	22,2	0,0	0,0	**19,49**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	2.125	1.176	1.540	1.262	1.070	1.425	1.267	1.176	1.236	1.028	1.062	1.714	**16.081**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	6,04%	-41,14%	23,40%	17,07%	-22,13%	41,93%	-11,89%	14,40%	3,69%	-2,37%	-4,75%	17,64%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	143,48%	10,00%	205,56%	51,52%	-18,52%	245,45%	33,33%	23,08%	119,05%	22,73%	5,26%	90,91%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDOESTE - DISTRITO ALTE BROWN-E. ECHEVERRIA-EZEIZA (Pdo. Alte. Brown+Pdo. E. Echeverría+ Pdo. Ezeiza)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	489	419	457	511	801	575	713	690	624	637	522	504	**6.942**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	557	430	438	493	643	699	657	725	637	687	524	507	**6.997**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	7	6	12	23	19	23	25	7	12	24	8	9	**175**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,8	15,9	17,9	19,7	23,5	21,7	23,0	19,4	18,5	16,7	18,4	18,4	**19,51**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	65	50	80	92	111	72	84	80	75	80	78	69	**936**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	62	53	71	97	95	85	81	90	73	83	77	64	**931**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	0	1	1	1	2	4	1	0	1	1	0	**13**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,2	9,8	13,4	9,8	18,1	14,8	18,1	16,4	21,2	14,3	12,1	17,5	**15,10**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	33	24	29	26	36	30	35	36	26	27	27	24	**353**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	14	4	6	7	23	23	23	17	11	21	7	6	**162**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	14	5	6	11	18	21	26	21	18	15	11	9	**175**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	13	10	10	9	8	10	11	6	0	6	2	1	**86**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	86,8	143,5	304,8	2.548,4	65,4	100,7	138,3	3.149,5	118,5	65,0	208,0	196,3	**639,91**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	6,031	8,480	1,250	6,315	13,719	16,564	6,269	4,864	18,309	8,723	10,609	0,589	**101,722**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	503	423	463	518	824	598	736	707	635	658	529	510	**7.104**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	26,07%	24,05%	-28,66%	13,10%	100,49%	24,32%	53,97%	26,48%	4,96%	32,13%	9,75%	-3,95%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	35	29	34	20	21	44	27	35	31	41	27	26	**370**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	31	24	39	24	35	44	27	40	30	47	34	36	**411**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	65	69	64	62	49	48	48	40	42	31	31	23	**572**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	1.928,1	647,2	120,6	740,5	4.857,7	3.548,5	133,1	4.215,8	207,0	3.278,7	275,3	744,9	**1.928,58**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-32,69%	-34,09%	-12,82%	-35,48%	-48,78%	15,79%	-20,59%	-18,60%	-20,51%	36,67%	0,00%	36,84%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.177	1.158	773	1.233	965	922	1.135	1.163	938	1.149	976	1.138	**12.727**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	423	474	361	407	400	415	487	429	482	530	412	473	**5.293**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	417	448	387	424	379	414	497	410	484	540	410	457	**5.267**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	69	95	69	52	73	74	64	83	81	71	73	89		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,59	5,08	5,14	4,56	4,15	4,66	4,55	4,69	6,45	5,48	5,78	5,51	**5,16**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDOESTE - DISTRITO LOMAS DE ZAMORA

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	0	0	5	2	1	6	10	16	27	11	15	**93**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	4	2	0	5	10	16	27	11	15	**90**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	4	2	0	5	10	16	27	11	15	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	**3**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	N/A	N/A	80,00%	100,00%	0,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**96,77%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	379	394	549	481	495	607	636	542	497	399	299	290	**5.568**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	354	391	498	425	488	681	594	519	485	482	326	322	**5.565**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	17	26	15	36	21	30	57	29	21	25	11	17	**305**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	42,6	38,3	45,8	40,5	41,0	40,5	39,6	39,4	44,1	44,4	45,9	42,9	**41,92**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	671	386	325	249	248	308	320	259	283	276	371	971	**4.667**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	668	455	312	243	253	304	310	258	282	294	349	713	**4.441**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	8	3	6	4	4	10	10	7	7	5	3	15	**82**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,3	14,3	13,1	14,2	14,0	10,9	8,9	15,8	21,9	14,3	13,6	11,9	**13,58**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	277	144	136	95	98	123	139	102	121	97	120	309	**1.761**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	258	178	123	109	101	120	135	100	109	109	96	295	**1.733**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	5	2	3	2	2	1	3	2	1	4	5	2	**32**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,0	16,7	14,3	17,4	18,4	10,0	9,9	12,0	13,0	17,8	9,1	19,3	**15,00**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	27	20	19	18	21	22	23	29	41	44	30	38	**332**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	25	17	22	14	22	20	24	27	38	48	34	40	**331**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	**6**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	2,6	5,5	4,0	4,8	4,3	6,7	5,9	4,7	5,2	7,1	4,5	4,0	**5,03**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1	0	0	0	11	1	6	0	2	0	1	0	**22**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1	1	0	0	9	3	6	0	1	1	1	0	**23**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	2,1	192,6	0,0	0,0	13,5	75,2	14,3	0,0	4,0	22,8	2,6	0,0	**28,54**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.327	924	1.010	825	841	1.038	1.095	903	901	772	790	1.570	**11.996**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-19,28%	-29,20%	21,39%	-2,48%	-13,21%	33,59%	-13,78%	-13,42%	-13,61%	-17,08%	-1,00%	77,00%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-32,50%	-16,67%	18,75%	-10,00%	40,00%	144,44%	-20,69%	-50,00%	-10,87%	69,23%	50,00%	216,67%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDOESTE - DISTRITO LOMAS DE ZAMORA

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	404	405	424	458	778	565	639	590	630	487	446	395	**6.221**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	441	387	411	467	570	674	638	595	573	625	432	379	**6.192**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	3	9	12	14	12	3	9	9	15	29	5	2	**122**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,6	17,5	17,4	20,5	15,8	32,7	19,7	18,6	20,4	22,9	20,2	20,0	**20,77**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	62	44	58	50	102	95	71	82	101	61	65	41	**832**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	60	47	48	56	77	99	87	84	91	68	67	43	**827**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	2	0	1	3	0	0	2	1	6	0	1	**16**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	6,1	16,7	11,3	26,7	12,9	24,3	7,1	12,6	12,6	17,0	16,6	14,0	**14,85**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	9	3	12	7	19	12	12	44	29	15	21	3	**186**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	2	1	12	4	5	9	1	2	3	1	4	**46**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	4	2	1	7	8	5	7	2	3	3	1	3	**46**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	**6**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	52,1	22,0	25,3	12,4	124,6	100,1	41,8	4,6	344,9	9,5	26,9	36,2	**73,08**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	9,612	2,348	14,717	10,027	3,613	12,833	18,957	10,355	5,023	34,996	22,523	16,996	**162,000**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	406	407	425	470	782	570	648	591	632	490	447	399	**6.267**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-1,22%	47,46%	-24,91%	20,82%	74,94%	50,00%	37,29%	4,42%	16,82%	10,86%	10,10%	-9,11%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	51	67	42	58	49	37	48	59	66	56	61	54	**648**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	44	54	54	58	50	59	69	52	76	60	53	68	**697**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	72	77	63	70	70	50	26	34	20	16	22	15	**535**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	368,6	188,1	489,8	242,9	739,6	1.907,4	3.078,4	146,3	2.544,1	208,6	185,2	245,9	**959,61**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-56,78%	-12,99%	-52,27%	-36,26%	-24,62%	-13,95%	-2,04%	-9,23%	-19,51%	7,69%	74,29%	68,75%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	1.457	1.388	1.731	1.092	1.387	1.412	1.805	1.453	1.405	1.320	1.250	1.236	**16.936**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	113	29	9	12	22	5	6	9	6	11	13	15	**250**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	292	285	307	334	320	330	357	367	422	361	316	306	**3.997**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	283	281	287	369	318	333	374	345	450	379	310	304	**4.033**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	94	98	118	83	85	82	65	87	59	41	47	49		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	9,84	7,52	17,42	15,68	8,57	9,08	8,86	6,35	7,44	5,93	5,83	6,60	**9,01**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDOESTE (Distritos: Alte. Brown-E. Echeverría-Ezeiza y Lomas de Zamora)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	12	17	20	31	18	31	39	29	48	49	44	40	**378**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	8	10	16	26	14	17	35	26	45	43	37	37	**314**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	**4**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	7	9	16	26	14	17	35	25	38	42	34	37	**300**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	3	0	**10**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	4	7	4	5	4	14	4	3	3	6	7	3	**64**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	2	5	1	2	0	3	1	2	0	0	3	0	**19**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	2	2	3	3	4	11	2	1	3	6	4	3	**44**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	66,67%	58,82%	80,00%	83,87%	77,78%	54,84%	89,74%	89,66%	93,75%	87,76%	84,09%	92,50%	**83,07%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	1.082	1.026	1.376	1.238	1.134	1.501	1.519	1.387	1.354	1.103	833	811	**14.364**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	1.005	1.054	1.193	1.224	1.022	1.585	1.512	1.413	1.382	1.190	925	873	**14.378**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	56	63	68	65	51	81	121	60	68	64	25	31	**753**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	39,9	37,7	41,0	38,9	38,6	38,7	40,7	40,3	42,5	41,4	42,5	34,7	**39,87**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	1.713	789	831	626	572	724	566	501	562	519	753	1.879	**10.035**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	1.828	988	693	665	557	757	585	496	593	540	694	1.349	**9.745**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	25	7	18	12	42	14	22	9	11	11	9	38	**218**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,6	15,8	14,2	16,8	16,0	13,7	13,9	18,5	18,8	15,1	16,3	13,8	**15,49**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	657	285	343	223	205	238	277	191	221	178	266	594	**3.678**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	668	355	251	307	209	230	260	208	211	194	228	509	**3.630**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	10	3	9	6	7	7	8	4	1	6	5	15	**81**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,5	17,9	15,6	17,9	17,6	13,4	15,5	15,1	16,0	18,3	12,6	17,7	**16,41**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	83	42	74	68	43	60	51	77	87	71	70	80	**806**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	83	47	31	98	51	50	47	75	97	75	75	65	**794**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	Nº	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	1	0	**11**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	6,4	5,9	4,2	8,7	5,3	7,6	6,7	8,4	6,8	6,5	6,4	5,3	**6,75**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	3	2	0	0	14	1	7	0	3	1	1	0	**32**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	3	2	1	0	9	6	6	1	2	2	1	0	**33**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,9	96,5	47,2	0,0	13,5	50,1	14,3	21,4	3,9	22,5	2,6	0,0	**25,80**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	Nº	3.452	2.100	2.550	2.087	1.911	2.463	2.362	2.079	2.137	1.800	1.852	3.284	**28.077**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-5,37%	-36,42%	22,60%	8,47%	-18,44%	38,29%	-12,78%	0,39%	-4,38%	-9,27%	-3,19%	40,10%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	31,75%	-4,55%	117,65%	28,30%	2,38%	200,00%	2,00%	-20,62%	29,85%	47,92%	20,69%	135,29%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDOESTE (Distritos: Alte. Brown-E. Echeverría-Ezeiza y Lomas de Zamora)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	893	824	881	969	1.579	1.140	1.352	1.280	1.254	1.124	968	899	**13.163**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	998	817	849	960	1.213	1.373	1.295	1.320	1.210	1.312	956	886	**13.189**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	10	15	24	37	31	26	34	16	27	53	13	11	**297**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,8	16,7	17,6	20,1	19,9	27,1	21,4	19,1	19,4	19,6	19,2	19,0	**20,10**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	127	94	138	142	213	167	155	162	176	141	143	110	**1.768**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	122	100	119	153	172	184	168	174	164	151	144	107	**1.758**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	2	1	2	4	2	4	3	1	7	1	1	**29**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,7	13,0	12,6	16,0	15,8	19,9	12,4	14,5	16,4	15,5	14,2	16,1	**14,98**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	42	27	41	33	55	42	47	80	55	42	48	27	**539**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	16	6	7	19	27	28	32	18	13	24	8	10	**208**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	18	7	7	18	26	26	33	23	21	18	12	12	**221**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	13	10	10	13	8	10	12	6	0	6	2	2	**92**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	79,1	108,8	264,9	1.562,2	83,6	100,6	117,8	2.876,0	150,8	55,8	192,9	156,3	**521,93**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	15,643	10,828	15,967	16,342	17,332	29,397	25,226	15,219	23,332	43,719	33,132	17,585	**263,722**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el [illegible]	N°	909	830	888	988	1.606	1.168	1.384	1.298	1.267	1.148	976	909	**13.371**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	12,22%	34,52%	-26,91%	16,65%	87,18%	35,66%	45,68%	15,38%	10,56%	22,13%	9,91%	-6,29%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	86	96	76	78	70	81	75	94	97	97	88	80	**1.018**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	75	78	93	82	85	103	96	92	106	107	87	104	**1.108**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	137	146	127	132	119	98	74	74	62	47	53	38	**1.107**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	1.013,2	329,4	335,0	388,5	2.435,3	2.608,5	2.250,0	1.915,7	1.882,7	1.557,2	220,4	418,6	**1.319,04**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-49,41%	-20,66%	-40,16%	-36,07%	-33,96%	0,00%	-9,64%	-12,96%	-19,83%	18,29%	41,94%	56,86%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	3.190	3.118	3.073	2.648	2.629	2.604	3.258	3.070	2.851	2.895	2.608	2.650	**34.594**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	113	29	9	12	22	5	5	9	6	11	12	15	**248**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	715	759	668	741	720	745	844	796	904	891	728	779	**9.290**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	700	729	674	793	697	747	871	755	934	919	720	761	**9.300**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	163	193	187	135	158	156	129	170	140	112	120	138		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	6,82	5,75	8,97	7,62	5,30	5,93	5,71	5,17	6,74	5,61	5,79	5,79	**6,24**	

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO GENERAL DE LA CONCESION

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	117	111	133	139	178	234	198	151	221	242	201	215	**2.140**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	26	37	36	56	61	79	80	65	119	156	113	101	**929**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	2	2	1	7	9	18	5	11	18	10	10	7	**100**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	13	21	25	46	47	54	67	43	81	112	85	75	**669**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	11	14	10	3	5	7	8	11	20	34	18	19	**160**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	91	74	97	83	117	155	118	86	102	86	88	114	**1.211**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	13	7	6	11	17	19	8	13	21	9	11	25	**160**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	24	31	37	34	40	31	37	30	25	33	39	38	**399**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	54	36	54	38	60	105	73	43	56	44	38	51	**652**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	22,22%	33,33%	27,07%	40,29%	34,27%	33,76%	40,40%	43,05%	53,85%	64,46%	56,22%	46,98%	**43,41%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	8.842	8.386	9.883	9.678	9.041	12.284	12.923	9.381	8.947	8.614	7.207	7.159	**112.345**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	8.445	8.285	9.563	9.643	8.805	11.545	13.347	10.016	9.140	8.669	7.510	7.137	**112.105**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	327	453	423	514	518	1.006	714	386	421	349	280	270	**5.661**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	28,6	33,5	31,6	33,9	34,1	36,4	46,6	40,7	33,1	29,1	29,9	32,1	**34,84**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	13.320	9.213	7.409	7.469	7.941	9.627	9.943	6.481	5.874	6.476	6.451	12.583	**102.787**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	13.403	9.738	7.346	7.292	7.814	9.552	10.232	6.599	5.841	6.359	6.498	11.034	**101.708**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	510	139	147	210	292	345	225	201	127	250	138	670	**3.254**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,05	17,79	18,91	19,13	18,71	18,92	21,70	20,84	20,57	16,78	17,82	15,63	**18,37**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	6.272	3.856	4.929	4.452	5.569	6.020	6.168	3.116	2.785	2.948	2.725	5.843	**54.683**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	6.244	4.078	4.772	4.461	5.474	5.957	6.360	3.224	2.818	2.934	2.662	5.413	**54.397**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	201	96	111	156	162	261	133	98	62	92	56	208	**1.636**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,14	18,79	18,64	20,92	18,00	18,68	21,45	21,84	21,08	18,25	17,73	17,28	**18,94**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	321	197	386	266	375	462	422	499	658	813	347	459	**5.205**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	321	205	338	285	385	422	438	507	664	821	347	448	**5.181**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	5	5	5	13	4	10	22	6	6	4	3	1	**84**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,43	12,09	14,25	11,22	12,77	12,53	13,66	11,14	11,72	9,60	13,07	10,93	**11,79**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	392	387	428	497	658	566	692	502	491	382	377	319	**5.691**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	370	361	449	449	604	588	607	606	531	403	369	360	**5.697**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	38	53	45	79	118	116	157	69	42	42	42	30	**831**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	65,55	72,56	84,15	98,64	80,90	132,79	179,00	169,30	110,50	78,99	83,47	88,08	**109,49**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	28.434	21.455	22.221	21.599	22.551	27.931	29.034	18.978	17.606	18.038	16.383	25.585	**269.815**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-1,37%	-19,53%	7,40%	-3,71%	-22,12%	32,74%	-19,03%	-14,03%	-6,44%	-1,52%	-10,18%	19,80%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-53,28%	-56,03%	-64,03%	-68,52%	-31,32%	50,00%	-25,57%	16,86%	115,03%	172,82%	43,98%	50,49%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO GENERAL DE LA CONCESION

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	11.250	10.291	12.335	12.656	18.027	16.326	20.038	19.300	18.317	15.902	12.773	11.997	**179.212**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	11.235	10.207	12.244	12.420	17.005	16.823	18.942	20.038	18.624	16.072	13.207	12.203	**179.020**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	273	406	326	449	498	769	831	599	566	540	247	136	**5.640**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,08	19,85	19,89	21,50	22,68	25,10	31,17	28,18	25,21	21,61	19,97	21,69	**23,54**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	923	842	1.098	979	1.479	1.183	1.494	1.396	1.471	1.302	1.070	1.012	**14.249**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	894	840	1.096	972	1.400	1.236	1.437	1.442	1.458	1.306	1.118	1.003	**14.202**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	20	37	25	33	20	28	52	37	35	41	14	9	**351**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,97	14,94	15,79	16,10	18,10	19,49	22,41	20,58	21,61	17,05	15,82	19,07	**18,30**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	605	509	708	611	829	724	857	803	827	749	974	672	**8.868**	Se corrigió la serie ENERO a SEPTIEMBRE de 2025.
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	187	139	240	241	250	220	218	220	235	221	250	241	**2.662**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	194	129	207	250	251	222	212	220	258	198	263	245	**2.649**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	24	25	38	36	35	34	42	29	15	36	22	11	**347**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	52,02	70,83	64,76	177,51	64,37	91,07	87,13	384,90	68,32	96,46	60,85	62,89	**107,47**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	192,64	139,19	164,30	178,91	183,46	187,67	219,65	205,89	245,78	248,19	218,25	164,97	**2348,889**	Se corrigió mes de abril (metros por km).
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	11.437	10.430	12.575	12.897	18.277	16.546	20.256	19.520	18.552	16.123	13.023	12.238	**181.874**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	11,05%	7,33%	-26,35%	11,92%	39,58%	22,90%	24,09%	7,25%	3,57%	12,99%	1,89%	4,46%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.522	1.410	1.408	1.476	1.462	1.379	1.474	1.590	1.688	1.664	1.597	1.420	**18.090**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	1.436	1.328	1.438	1.566	1.510	1.416	1.530	1.572	1.570	1.742	1.557	1.466	**18.131**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	597	714	652	604	536	503	493	454	583	497	516	486	**6.635**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	471,47	296,70	158,18	446,26	294,41	300,58	250,03	221,29	229,23	224,29	122,42	151,06	**262,57**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-37,03%	-27,24%	-39,44%	-31,19%	-20,76%	-6,13%	-7,88%	-4,33%	1,63%	15,00%	6,32%	7,58%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas	N°	87.735	73.246	82.829	79.423	80.546	82.644	91.956	82.651	86.158	89.312	82.992	84.270	**1.003.762**	
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU	N°	38.472	31.579	30.563	34.856	34.149	33.521	37.823	36.088	41.086	44.441	43.722	45.941	**452.241**	
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line	N°	10.008	6.311	5.227	6.662	6.828	6.006	7.250	6.137	6.356	7.428	6.501	6.284	**80.998**	
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (*)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	42.953	36.377	34.014	35.168	34.242	35.430	40.225	35.829	38.090	37.641	30.793	30.768	**431.530**	*Incluyen 241 contactos acumulados generados por UMA (Unidades de Asistencia Movil).
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web	N°	1.867.251	1.517.804	1.534.556	1.489.292	1.567.929	1.501.308	1.669.294	1.631.419	1.639.425	1.685.569	1.556.922	1.600.148	**19.260.917**	
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	1.620	1.315	1.028	1.822	865	963	1.353	681	1.220	1.313	806	943	**13.929**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	8.279	7.715	7.974	9.031	8.998	9.042	10.115	14.974	17.030	16.657	14.461	14.460	**138.736**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	8.147	7.662	7.687	9.120	8.581	9.197	10.158	13.858	16.961	16.697	14.296	15.404	**137.768**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	1.862	1.915	2.202	2.113	2.530	2.376	2.332	3.449	3.518	3.478	3.643	2.699		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	6,88	6,45	7,38	6,72	6,51	6,32	6,72	6,95	7,01	6,84	6,91	6,83	**6,82**	

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO ESCOBAR

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	1	0	0	1	1	0	1	3	2	0	1	0	**10**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	**3**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	0	**7**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	0,00%	N/A	N/A	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	100,00%	0,00%	N/A	0,00%	N/A	**30,00%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	120	112	154	111	131	150	188	235	186	95	123	84	**1.689**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	115	112	164	97	126	153	179	246	198	103	109	99	**1.701**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	7	4	2	6	10	2	5	4	7	3	12	2	**64**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	42,9	36,4	31,0	24,3	28,3	30,3	28,9	19,6	15,5	21,2	19,5	23,6	**26,08**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	62	61	65	117	177	53	101	51	63	65	55	110	**980**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	62	58	70	78	207	60	97	52	64	70	45	86	**949**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	0	2	0	6	1	1	0	2	1	0	8	15	**36**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	18,3	20,9	16,4	17,9	23,9	23,8	18,4	14,5	16,0	16,2	13,6	20,1	**19,29**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	49	30	48	60	120	46	80	15	26	39	22	87	**622**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	46	31	46	56	120	50	78	22	21	43	22	62	**597**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	0	0	0	2	1	1	2	0	3	0	0	16	**25**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,3	19,1	12,2	17,7	21,0	14,8	17,5	12,8	14,7	11,3	13,3	23,3	**17,29**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	5	2	7	12	10	4	7	0	3	0	6	3	**59**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	5	2	7	11	11	4	7	0	3	0	6	3	**59**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	9,4	12,1	39,1	5,8	14,7	9,4	13,2	0,0	16,0	0,0	15,6	19,8	**15,26**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	Nº	3	3	1	1	3	2	1	0	1	0	0	0	**15**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	Nº	3	4	1	0	3	2	2	0	1	0	0	0	**16**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	Nº	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	23,5	37,4	1,4	0,0	58,8	47,6	48,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	**36,89**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	Nº	231	203	267	288	428	249	369	301	275	199	200	281	**3.291**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	15,50%	-13,25%	-20,06%	23,08%	116,16%	38,33%	33,70%	-9,61%	30,33%	10,56%	-11,50%	53,55%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-58,33%	-33,33%	-30,00%	140,00%	233,33%	-20,00%	250,00%	-100,00%	-25,00%	-100,00%	-53,85%	-82,35%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO ESCOBAR

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	54	65	77	68	115	81	88	100	115	102	99	68	**1.032**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	54	55	80	67	112	86	80	109	116	103	98	67	**1.027**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	7	0	0	3	3	2	0	0	0	2	0	**18**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,7	12,5	13,9	7,4	21,2	13,8	11,0	10,6	11,2	9,9	7,8	11,4	**12,36**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	6	5	13	4	11	15	15	11	23	15	10	9	**137**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	6	4	12	6	11	14	13	13	24	14	11	8	**136**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	32,2	12,0	8,5	1,4	14,4	13,5	17,4	9,1	12,3	9,7	6,5	18,9	**12,47**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	3	4	9	5	4	8	8	9	9	10	11	12	**92**	Se corrigió la serie ENERO a SEPTIEMBRE de 2025.
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1	1	1	0	1	1	5	1	4	5	4	1	**25**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1	0	2	0	0	2	3	3	3	5	5	1	**25**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	93,8	#DIV/0	85,5	0,0	#DIV/0	47,2	24,7	40,5	30,2	50,7	67,2	19,8	**N/A**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	3,1	3,0	4,9	4,8	1,4	3,7	0,8	2,0	5,4	9,5	4,6	1,2	**44,522**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	55	66	78	68	116	82	93	101	119	107	103	69	**1.057**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-48,60%	73,68%	-16,13%	-18,07%	152,17%	-7,87%	43,08%	-4,72%	60,81%	7,00%	63,49%	-8,00%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	4	5	2	16	4	8	7	4	10	8	4	**74**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	4	4	2	2	9	14	6	8	3	8	10	6	**76**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	1	1	6	0	0	0	1	0	1	0	**10**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,0	12,9	27,9	79,2	72,1	301,8	65,7	11,3	67,8	17,4	#¡VALOR!	34,0	**N/A**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-71,43%	-69,23%	-66,67%	-90,48%	33,33%	-55,56%	0,00%	-22,22%	-33,33%	150,00%	0,00%	-60,00%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	206	238	204	160	205	207	286	201	134	210	131	151	**2.333**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	57	55	65	68	82	78	106	96	122	119	97	71	**1.016**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	46	61	54	82	74	73	101	96	124	126	92	82	**1.011**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	14	8	19	5	13	18	23	23	21	14	19	8		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	3,78	5,43	3,61	5,40	4,55	4,15	5,78	5,92	5,82	5,21	5,47	4,47	**5,13**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO PILAR

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	9	9	8	8	8	8	8	8	8	9	10	8	**101**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	**98**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**3**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	88,89%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,89%	100,00%	100,00%	**97,03%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	393	412	413	436	355	298	366	380	317	378	278	219	**4.245**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	370	390	426	456	362	302	362	393	315	359	292	238	**4.265**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	21	20	22	12	17	17	7	10	6	9	14	5	**160**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	27,1	20,4	22,8	19,1	26,2	27,9	20,1	22,4	14,9	17,6	17,4	28,8	**21,89**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	470	323	159	143	231	415	249	130	139	116	113	379	**2.867**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	450	334	164	154	220	413	260	132	133	120	108	341	**2.829**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	4	6	1	4	3	2	2	2	2	8	17	**53**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,7	9,5	15,5	9,9	12,7	11,5	13,7	13,9	12,0	11,7	9,6	13,2	**12,00**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	293	117	97	136	150	428	153	102	127	77	138	242	**2.060**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	291	125	97	135	144	423	165	105	125	71	138	228	**2.047**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	1	2	3	0	3	0	0	1	0	3	4	**18**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,3	12,4	10,8	8,3	11,2	9,7	11,5	10,2	8,5	7,3	6,1	12,3	**10,38**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	9	10	7	11	10	9	11	10	9	8	10	9	**113**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	9	9	7	9	13	8	12	10	9	8	10	9	**113**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	4,8	3,5	4,3	2,6	4,6	2,0	11,5	1,6	2,6	3,9	1,5	2,3	**3,96**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	**6**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	**6**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	20,4	0,0	0,0	66,6	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**51,70**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	1.156	852	669	715	736	1.141	768	612	583	571	529	840	**9.172**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	32,27%	-11,34%	18,41%	20,57%	-0,81%	45,35%	3,50%	13,75%	-4,43%	-2,56%	12,08%	92,66%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	350,00%	233,33%	0,00%	120,00%	233,33%	50,00%	450,00%	900,00%	#¡DIV/0!	100,00%	0,00%	12,50%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO PILAR

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	289	229	232	282	300	275	307	276	294	368	256	256	**3.364**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	288	206	243	282	309	272	303	290	278	374	266	247	**3.358**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	4	17	12	3	0	5	3	2	6	5	2	0	**59**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,3	15,0	23,4	11,5	21,2	11,4	15,1	9,7	8,9	8,3	9,4	10,5	**12,70**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	33	33	36	38	50	49	49	38	43	68	48	38	**523**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	34	29	37	38	52	45	51	40	40	69	51	36	**522**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	2	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	**7**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,5	12,1	19,5	10,3	18,8	8,1	14,0	7,4	5,7	7,1	9,6	4,2	**10,71**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	31	27	33	27	38	37	45	36	24	25	26	27	**376**	Se corrigió la serie ENERO a SEPTIEMBRE de 2025.
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1	4	5	0	2	0	1	2	0	1	1	3	**20**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1	4	4	1	2	0	0	3	0	0	2	3	**20**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	3,5	5,2	20,5	141,3	14,0	0,0	#DIV/0	21,7	0,0	#DIV/0	7,7	5,6	**N/A**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	5,6	1,0	0,0	1,5	7,2	5,5	9,0	5,4	5,1	0,0	5,9	0,0	**46,107**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	290	233	237	282	302	275	308	278	294	369	257	259	**3.384**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	15,54%	-6,80%	-10,57%	28,77%	33,63%	11,34%	16,23%	-16,52%	-12,24%	77,40%	5,33%	30,15%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	10	13	10	9	21	15	22	19	21	11	8	11	**170**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	9	8	15	8	20	9	25	23	18	10	10	13	**168**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	1	6	1	0	3	2	2	1	2	5	0	0	**23**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,6	73,2	96,2	48,6	73,5	50,4	#¡VALOR!	48,2	51,1	102,1	74,4	33,9	**N/A**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-23,08%	62,50%	-28,57%	-50,00%	250,00%	7,14%	-15,38%	111,11%	162,50%	0,00%	-69,23%	57,14%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	476	467	316	442	580	205	167	262	533	566	453	427	**4.894**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	98	103	104	122	167	167	142	140	178	182	151	129	**1.683**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	88	112	103	111	153	170	153	141	165	180	157	145	**1.678**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	29	20	21	32	46	43	32	31	44	46	40	24		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	4,98	6,55	6,22	5,02	5,95	6,29	6,35	5,38	6,84	6,76	5,93	6,20	**6,11**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO SAN MIGUEL, JOSÉ C. PAZ y MALVINAS ARGENTINAS

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	2	16	3	7	6	9	0	11	22	19	18	21	**134**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	2	12	3	6	6	7	0	10	20	13	18	20	**117**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	2	12	3	6	3	4	0	10	20	13	18	20	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	4	0	1	0	2	0	1	2	6	0	1	**17**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	4	0	1	0	2	0	1	2	6	0	1	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	100,00%	75,00%	100,00%	85,71%	100,00%	77,78%	N/A	90,91%	90,91%	68,42%	100,00%	95,24%	**87,31%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	270	276	343	301	240	230	278	234	262	289	256	214	**3.193**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	274	261	269	358	273	233	274	208	277	274	228	279	**3.208**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	9	14	13	14	7	6	14	17	27	28	14	7	**170**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	39,0	35,8	32,5	33,4	31,7	45,9	29,2	35,7	41,1	50,7	44,0	42,3	**38,23**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	125	202	99	78	54	113	82	75	76	68	79	147	**1.198**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	122	208	96	77	64	109	81	75	78	57	74	126	**1.167**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	2	0	4	0	0	2	2	0	3	1	12	**26**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	16,4	9,4	11,8	20,1	21,9	16,0	12,6	21,2	23,9	22,0	21,8	22,0	**17,04**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	68	56	26	32	25	48	34	38	25	22	29	76	**479**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	68	57	23	38	24	45	40	23	38	22	27	59	**464**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	**6**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,2	12,2	11,0	12,8	14,1	30,4	13,1	27,1	21,2	20,4	12,5	16,2	**16,66**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	1	5	8	7	4	2	0	0	2	2	3	**36**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2	1	5	8	7	4	0	2	0	2	2	3	**36**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	2,9	19,3	5,5	5,6	5,1	11,4	#DIV/0	11,3	0,0	11,2	5,0	13,8	**N/A**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2	2	0	0	2	2	3	0	0	0	2	1	**14**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	4	0	0	0	3	1	4	1	0	0	2	1	**16**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	164,5	#DIV/0	0,0	0,0	66,8	3,0	55,4	19,9	0,0	0,0	21,5	5,3	**N/A**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	463	534	468	411	319	391	394	347	363	379	364	437	**4.870**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-39,79%	-9,80%	-21,87%	-12,55%	-43,34%	2,09%	-7,73%	-8,68%	-20,57%	-2,32%	-7,14%	6,07%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-71,43%	-50,00%	-37,50%	14,29%	16,67%	-20,00%	100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-33,33%	200,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL NORTE - DISTRITO SAN MIGUEL, JOSÉ C. PAZ y MALVINAS ARGENTINAS

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	280	268	271	296	317	344	409	354	353	378	343	329	**3.942**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	250	282	239	332	322	339	388	379	318	410	320	342	**3.921**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	4	12	8	1	11	9	19	7	17	7	7	3	**105**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	17,2	13,1	13,8	15,5	19,7	19,2	22,2	23,8	24,9	29,0	21,9	26,1	**21,08**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	18	27	34	25	22	26	38	37	34	39	37	46	**383**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	19	27	27	30	24	26	35	38	32	42	35	44	**379**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	**4**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,8	9,0	11,7	8,5	10,3	12,1	15,1	17,8	21,6	34,0	14,3	17,2	**16,36**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	14	24	24	25	20	21	24	26	28	29	30	31	**296**	Se corrigió la serie ENERO a SEPTIEMBRE de 2025.
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	3	4	4	2	4	4	7	0	3	2	5	1	**39**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2	4	3	4	3	5	5	3	3	0	4	4	**40**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	**3**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	393,5	44,4	62,5	54,7	16,3	52,4	22,2	31,3	69,6	#DIV/0	83,7	58,6	**N/A**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	0,0	0,0	0,0	3,4	1,6	1,4	2,3	1,8	4,7	2,5	1,2	17,3	**36,270**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	283	272	275	298	321	348	416	354	356	380	348	330	**3.981**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-27,62%	-12,54%	-32,43%	10,37%	1,58%	8,07%	18,86%	-1,39%	-3,78%	22,19%	11,90%	29,92%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	15	23	10	22	11	15	7	22	19	18	18	8	**188**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	27	16	4	66	6	17	18	43	120	27	13	15	**372**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	185	193	195	154	158	156	145	119	27	22	17	16	**1.387**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	1.002,2	256,2	756,3	6.337,7	3.455,0	1.783,0	969,0	9.851,9	8.882,5	4.565,3	320,1	486,9	**5.766,70**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-79,17%	-64,62%	-82,76%	-40,54%	-75,00%	-34,78%	-74,07%	-8,33%	-32,14%	12,50%	-5,26%	-33,33%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	437	575	442	406	390	392	715	425	564	513	456	435	**5.750**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	104	100	95	91	112	119	137	178	190	215	182	172	**1.695**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	120	99	92	80	113	112	143	167	176	222	183	172	**1.679**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	7	7	9	19	17	23	16	26	39	31	29	28		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,00	4,02	4,08	4,76	5,26	5,51	4,67	4,34	4,09	5,10	3,83	4,17	**4,54**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO Moreno

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	0	3	3	3	4	1	2	0	1	4	4	**25**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	2	3	3	4	1	1	0	1	3	4	**22**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	1	3	2	4	0	1	0	1	2	3	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	**3**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	N/A	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	N/A	100,00%	75,00%	100,00%	**88,00%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	303	294	409	360	281	350	338	255	308	315	262	244	**3.719**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	302	262	369	394	327	331	315	268	303	320	268	255	**3.714**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	12	36	52	16	14	15	12	6	17	18	12	2	**212**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	30,3	32,6	65,7	77,6	29,1	29,1	26,0	27,3	24,5	28,0	35,0	36,0	**38,27**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	419	248	141	85	122	142	111	77	102	212	104	666	**2.429**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	437	248	141	90	127	127	122	80	105	186	116	611	**2.390**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	8	10	6	1	2	5	2	1	3	12	2	70	**122**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,7	11,7	17,4	28,5	15,0	12,5	14,8	17,2	12,7	11,9	13,8	12,5	**13,95**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	152	55	38	42	49	70	55	37	21	120	44	130	**813**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	152	61	38	39	47	70	55	37	26	101	55	129	**810**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	1	1	0	1	2	0	1	0	13	2	10	**33**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,0	10,9	13,8	13,5	8,4	10,0	12,0	13,6	12,8	9,8	10,9	10,8	**11,43**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	5	5	3	4	1	1	1	2	1	1	1	3	**28**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	6	5	3	4	1	1	1	2	1	1	1	3	**29**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	8,2	6,0	13,2	1,0	13,2	18,1	0,8	8,8	13,6	0,9	19,3	11,3	**8,27**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	9,0	10,0	**7,00**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	874	597	588	487	452	562	504	369	431	647	410	1.040	**6.961**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	26,12%	-43,30%	-19,45%	9,93%	-19,43%	-8,77%	-16,97%	-4,65%	-30,26%	-13,62%	-25,18%	98,10%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-37,50%	25,00%	-40,00%	-20,00%	-87,50%	-80,00%	-80,00%	#¡DIV/0!	-50,00%	-75,00%	-66,67%	-40,00%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO Moreno

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	273	301	282	287	404	277	387	307	337	352	286	223	**3.716**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	283	277	302	284	403	294	367	292	353	361	279	233	**3.728**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	5	34	11	12	2	8	8	9	19	8	6	4	**126**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,5	21,3	21,5	23,8	19,7	19,7	17,0	22,4	16,3	23,2	16,7	14,1	**19,71**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	55	66	76	70	77	49	63	65	47	83	62	38	**751**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	55	59	79	70	78	50	61	63	51	82	62	40	**750**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	6	2	2	0	2	1	2	2	1	0	2	**21**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,0	21,9	16,3	21,1	16,0	19,6	12,9	12,2	13,6	20,3	13,3	12,6	**16,38**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	45	50	71	53	57	47	38	52	43	67	113	39	**675**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	3	4	4	3	7	4	6	1	6	13	2	3	**56**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	5	3	3	5	6	5	6	0	4	14	3	4	**58**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	**5**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	66,9	24,9	28,7	106,4	16,2	56,4	38,9	#DIV/0	61,2	159,2	236,6	124,1	**N/A**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	4,280	8,508	9,339	2,780	3,570	5,548	10,942	9,265	16,642	9,555	12,105	9,850	**102,384**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	276	305	286	290	411	281	393	308	343	365	288	226	**3.772**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-16,11%	5,54%	-20,56%	20,83%	80,26%	3,31%	45,56%	12,00%	12,09%	28,07%	-13,51%	-19,29%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	19	9	9	12	12	8	6	7	9	13	7	2	**113**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	15	10	10	11	13	3	10	9	6	12	9	5	**113**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	3	0	1	3	2	5	4	1	3	2	0	1	**25**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	32,6	150,1	154,1	81,9	120,1	60,8	317,0	179,7	82,6	85,0	#¡VALOR!	54,8	**N/A**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-32,14%	-68,97%	-72,73%	-61,29%	-42,86%	-33,33%	-68,42%	-56,25%	-52,63%	62,50%	-41,67%	-66,67%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	331	283	328	452	269	318	322	334	324	323	286	288	**3.858**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	58	97	51	53	52	63	71	86	109	96	113	72	**921**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	61	84	57	59	60	57	64	93	97	104	107	77	**920**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	16	29	23	17	9	15	22	15	27	19	25	20		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	6,30	5,90	6,17	6,18	5,97	6,14	4,58	5,21	5,15	4,57	4,85	5,70	**5,45**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO Merlo

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	**3**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	**100,00%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	398	371	534	421	263	292	373	293	272	299	263	265	**4.044**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	383	375	504	464	290	270	359	278	296	289	290	242	**4.040**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	35	29	10	5	7	14	12	17	12	5	10	**158**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	23,9	24,8	29,5	25,3	24,4	20,3	29,2	23,1	23,8	29,4	21,3	23,6	**25,24**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	172	83	92	133	114	107	108	127	90	122	84	182	**1.414**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	177	81	93	131	121	95	120	119	93	126	74	169	**1.399**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	3	2	6	2	4	0	4	4	2	5	12	**45**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,8	12,6	15,3	12,0	12,9	10,1	12,6	11,2	13,2	10,7	8,0	10,4	**11,85**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	93	41	45	100	97	91	79	60	48	56	61	117	**888**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	93	44	43	93	102	94	77	62	48	55	56	109	**876**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	1	2	5	2	2	3	0	3	2	3	2	**25**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,0	16,7	13,5	12,3	14,0	11,9	13,3	12,0	12,7	11,9	11,6	10,7	**12,75**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	28	4	10	9	5	2	8	5	3	4	5	5	**88**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	28	4	9	10	5	2	7	6	2	5	5	5	**88**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	**3**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	7,3	1,3	8,2	6,0	4,8	2,3	6,6	7,2	8,8	10,1	10,0	9,7	**7,14**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	**6**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	**6**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	4,2	0,0	0,0	21,3	1,7	0,0	0,0	0,0	11,9	2,0	0,0	**8,83**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	663	495	671	654	474	490	560	480	410	477	408	564	**6.346**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	10,50%	-21,55%	20,04%	22,47%	-16,55%	-4,11%	-14,89%	-21,82%	-25,32%	2,80%	-14,11%	11,46%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	211,11%	-75,00%	-16,67%	0,00%	-66,67%	-66,67%	33,33%	-50,00%	50,00%	300,00%	-44,44%	-68,75%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL OESTE - DISTRITO Merlo

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	278	285	282	255	405	308	423	388	381	352	313	287	**3.957**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	282	262	300	260	410	296	408	385	401	364	302	286	**3.956**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	5	15	11	5	2	12	18	17	8	1	3	4	**101**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,5	19,5	20,9	15,0	14,0	18,3	20,7	20,0	18,3	18,6	11,7	15,0	**17,35**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	45	37	41	36	40	39	53	55	50	64	58	39	**557**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	44	37	43	36	40	37	50	57	51	66	57	39	**557**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	**9**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,2	13,4	17,7	10,4	13,8	13,3	14,1	16,1	12,8	12,8	8,6	10,8	**12,84**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	30	25	34	19	26	23	33	34	35	42	77	25	**403**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1	0	1	3	4	7	5	2	5	5	4	3	**40**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1	0	1	3	3	8	5	2	5	5	4	3	**40**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	120,0	0,0	0,8	1,1	109,2	29,7	10,3	3,9	4,1	19,7	14,1	30,6	**25,39**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	9,020	2,410	1,470	0,560	0,000	8,980	5,065	2,120	10,154	8,105	2,785	5,900	**56,569**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el	N°	279	285	283	258	409	315	428	390	386	357	317	290	**3.997**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-1,41%	48,44%	-23,31%	13,66%	59,77%	12,50%	28,14%	40,29%	12,54%	27,96%	22,87%	12,84%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	11	18	12	12	9	5	11	12	8	15	14	9	**136**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	12	15	15	11	9	5	10	13	8	14	14	11	**137**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	3	0	1	1	1	2	1	0	2	0	0	**11**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	48,1	44,9	92,6	32,0	#¡VALOR!	#¡VALOR!	34,3	109,5	74,4	67,0	62,2	72,2	**N/A**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-66,67%	-28,00%	-36,84%	-25,00%	-50,00%	-50,00%	-50,00%	-47,83%	-50,00%	50,00%	0,00%	-25,00%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	680	612	344	370	326	358	522	408	355	377	321	277	**4.950**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	220	337	657	111	96	452	326	48	441	88	641	562	**3.979**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	151	96	111	115	114	103	146	116	126	146	106	105	**1.435**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	127	100	106	129	118	104	132	129	132	127	111	113	**1.428**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	40	36	41	27	23	22	36	23	17	36	31	23		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	6,41	7,81	5,92	6,17	4,83	5,03	6,81	6,85	4,88	5,63	5,49	5,75	**5,96**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE - DISTRITO Fcio Varela

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	4	10	5	2	1	3	8	6	4	7	8	8	**66**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	5	6	**16**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	6	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	4	10	4	2	1	2	6	5	4	7	3	2	**50**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	2	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	3	7	4	2	1	2	4	4	2	5	2	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	33,33%	25,00%	16,67%	0,00%	0,00%	62,50%	75,00%	**24,24%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	413	423	524	491	355	430	437	385	428	523	388	370	**5.167**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	400	414	512	469	407	424	452	382	414	507	381	412	**5.174**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	13	39	28	38	14	32	18	9	15	19	8	11	**244**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	23,9	24,0	32,9	33,6	33,4	31,4	28,7	26,6	27,2	28,5	23,6	25,5	**28,49**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	2.376	873	359	204	141	254	366	218	277	140	198	1.650	**7.056**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2.317	989	371	189	139	252	372	227	270	150	183	1.274	**6.733**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	14	5	1	4	9	12	2	4	6	2	3	50	**112**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,3	10,1	12,8	17,7	18,1	15,5	14,2	18,6	13,4	15,2	14,1	13,6	**12,44**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	372	148	82	112	57	82	144	63	71	74	62	226	**1.493**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	355	162	86	104	68	74	144	73	64	72	61	207	**1.470**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	1	3	2	1	6	1	0	2	2	1	2	**22**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	10,9	9,7	15,3	19,9	18,9	19,0	15,2	20,5	15,5	16,6	13,3	13,3	**14,24**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	10	5	6	3	1	3	6	5	2	4	3	2	**50**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	8	7	6	2	2	3	5	6	2	4	3	2	**50**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	6,2	12,4	9,2	8,6	1,9	6,8	7,5	6,9	2,5	7,4	2,7	1,6	**7,16**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**3**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**3**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	0,0	42,1	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**20,27**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	3.161	1.444	965	807	553	766	947	666	776	737	648	2.246	**13.716**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	38,10%	-42,19%	4,44%	1,00%	-36,51%	15,71%	0,32%	-2,92%	-1,65%	-9,46%	-9,62%	155,23%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-37,50%	-28,57%	-40,00%	-57,14%	-92,86%	-40,00%	200,00%	0,00%	-80,00%	-42,86%	-72,73%	-33,33%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDESTE - DISTRITO Fcio Varela

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	450	515	486	510	590	420	549	632	557	576	542	438	**6.265**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	433	512	506	498	580	438	537	644	541	548	567	453	**6.257**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	11	9	16	15	15	8	17	7	26	4	14	5	**147**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,8	18,7	20,2	23,3	19,7	19,3	30,5	25,7	18,9	27,6	20,2	16,2	**21,53**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	30	41	40	46	61	35	50	44	51	62	51	32	**543**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	30	37	44	43	60	39	50	43	50	60	51	34	**541**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	2	0	3	1	1	0	0	1	0	1	0	**9**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,8	18,0	21,4	22,2	19,2	18,3	33,9	23,6	16,4	24,2	20,7	13,7	**20,98**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	**4**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	5	7	6	1	9	9	8	9	9	10	3	6	**82**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	5	6	6	1	10	8	9	6	6	12	7	6	**82**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	1	1	0	1	0	2	1	1	0	0	**7**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,9	16,7	17,4	1,1	180,5	78,6	52,0	88,5	77,5	115,7	129,9	128,3	**88,24**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	19,6	12,0	16,2	8,3	17,5	9,2	5,9	6,1	11,0	9,7	7,7	7,5	**130,805**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	455	522	492	511	599	429	557	641	566	586	545	444	**6.347**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	8,08%	-34,34%	-24,77%	10,13%	36,14%	-4,67%	-7,01%	17,83%	-0,70%	22,34%	10,32%	-10,12%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	23	11	18	9	9	12	7	12	12	14	15	12	**154**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	15	15	18	10	10	11	8	10	11	13	14	15	**150**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	4	4	3	1	2	3	1	1	2	3	4	3	**31**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	48,0	68,1	99,5	104,7	114,8	59,4	50,0	36,8	146,3	115,3	104,1	98,0	**87,89**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-4,17%	-31,25%	-33,33%	-70,00%	-70,00%	20,00%	-50,00%	20,00%	33,33%	55,56%	-6,25%	100,00%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	600	966	1.181	905	872	983	965	875	930	1.087	605	869	**10.838**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	83	85	83	95	109	106	111	120	119	130	98	89	**1.228**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	83	94	80	86	113	107	122	114	114	131	101	93	**1.238**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	16	7	10	19	15	14	3	9	14	13	10	6		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,08	3,91	4,08	3,92	4,37	3,59	4,15	4,15	4,33	4,57	3,73	6,61	**4,36**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDOESTE - DISTRITO Pte. Perón

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	0	1	**8**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	**3**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**0**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	**5**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	**0**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**0**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	N/A	100,00%	**37,50%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	72	77	135	94	71	75	78	76	107	83	87	74	**1.029**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	71	77	122	89	83	90	69	78	98	92	73	97	**1.039**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	5	5	3	3	6	3	7	3	12	6	7	0	**60**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	30,5	32,5	44,8	33,5	26,3	42,7	18,6	24,5	36,2	39,4	35,5	37,8	**34,42**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	33	48	45	12	26	21	11	38	50	20	33	28	**365**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	27	46	52	15	15	28	16	34	50	20	29	19	**351**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	**5**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,1	14,0	21,9	13,8	9,2	15,7	13,1	12,1	31,2	21,1	21,3	17,9	**18,38**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	15	11	7	9	8	8	7	15	8	5	9	10	**112**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	13	10	10	8	6	9	7	11	13	5	8	7	**107**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	**5**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	6,7	21,4	9,0	16,7	8,0	16,6	7,5	9,5	30,7	31,9	19,9	25,4	**16,59**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	**4**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	**4**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0,0	0,0	11,7	0,0	#DIV/0	17,4	0,0	15,8	4,5	0,0	0,0	0,0	**N/A**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**20,82**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	120	136	187	115	105	104	96	129	165	108	129	112	**1.506**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-8,40%	3,03%	16,15%	-0,86%	-25,53%	0,00%	-15,79%	43,33%	63,37%	25,58%	38,71%	0,00%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-94,12%	-100,00%	-100,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-100,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS
DIRECCIONES REGIONALES
REGISTRO DIRECCION REGIONAL SUDOESTE - DISTRITO Pte. Perón

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	54	55	60	59	72	59	90	71	85	71	61	75	**812**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	57	40	71	52	59	75	76	92	88	74	53	78	**815**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	3	2	0	3	1	2	1	4	0	1	1	**18**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,2	19,3	19,2	21,7	15,1	15,7	13,6	19,1	38,3	23,9	27,0	17,4	**20,75**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1	2	8	6	6	5	5	5	7	10	4	6	**65**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	2	2	3	9	5	8	3	6	7	10	3	7	**65**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	**3**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	14,5	10,1	25,5	23,0	5,6	16,1	27,5	59,8	32,9	23,5	38,9	20,6	**25,48**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	0	1	0	1	2	1	0	0	3	0	0	0	**8**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	**4**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	**4**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**2**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	0	#DIV/0	166	0	0	0	#DIV/0	429	167	0	17	0	**N/A**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,975**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	54	56	60	59	72	59	91	72	85	72	61	75	**816**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-21,74%	27,27%	-4,76%	7,27%	-2,70%	5,36%	0,00%	-2,70%	19,72%	26,32%	7,02%	8,70%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1	1	0	1	0	1	2	0	5	1	0	1	**13**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	0	1	1	2	0	1	2	0	4	1	1	1	**14**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**2**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	#DIV/0	523,6	204,1	326,2	0,0	93,2	127,6	0,0	189,8	160,8	136,0	5,6	**N/A**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados - Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-50,00%	#¡DIV/0!	-100,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	#¡DIV/0!	-50,00%	#¡DIV/0!	-80,00%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas															
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU															
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line															
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	33	58	31	349	79	70	83	80	100	85	46	32	**1.046**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web															
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	12	21	7	13	13	22	34	16	23	15	19	19	**214**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	10	15	12	15	13	19	28	18	25	14	27	17	**213**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	4	10	5	3	3	6	12	10	8	9	1	3		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,28	3,71	5,45	4,69	4,16	3,79	5,20	7,88	8,63	6,57	5,88	8,18	**5,93**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por error)

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO GENERAL DE LA CONCESION - NUEVAS AREAS (partidos incorporados a partir del año 2016)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR01	Cortes de Servicio Totales	Total de cortes realizados en forma programada y de emergencia.	Nº	16	35	20	22	20	24	19	32	39	37	41	42	**347**	
ISR02	Cortes de Servicio Programados	Total de cortes realizados en forma programada.	Nº	10	20	15	18	18	20	11	25	28	22	36	39	**262**	
ISR02.1	Cortes de Servicio Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma programada según su orden de afectación.	Nº	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	**5**	
ISR02.2	Cortes de Servicio Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	10	20	13	18	14	16	10	23	28	22	33	37	**244**	
ISR02.3	Cortes de Servicio Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	0	0	2	0	4	3	0	1	0	0	2	1	**13**	
ISR03	Cortes de Servicio No Programado o de Emergencia	Total de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia.	Nº	6	15	5	4	2	4	8	7	11	15	5	3	**85**	
ISR03.1	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 1 (más de 500 manzanas)	Detalle del número de cortes realizados en forma No Programada o de emergencia según su orden de afectación.	Nº	1	0	1	0	0	0	2	1	2	1	0	2	**10**	
ISR03.2	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 2 (entre 51 y hasta 500 manzanas)		Nº	4	12	4	3	1	4	5	5	7	12	3	1	**61**	
ISR03.3	Cortes de Servicio No Programado ORDEN 3 (hasta 50 manzanas)		Nº	1	3	0	1	1	0	1	1	2	2	2	0	**14**	
ISR04	Eficiencia en la gestión de cortes	Porcentaje de cortes de servicio programados sobre el total de cortes registrados en el mes informado	%	62,50%	57,14%	75,00%	81,82%	90,00%	83,33%	57,89%	78,13%	71,79%	59,46%	87,80%	92,86%	**75,50%**	
ISR05	**RECLAMOS AGUA**																
ISR05.1	Reclamos por Escapes en la Vía Pública	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.969	1.965	2.512	2.214	1.696	1.825	2.058	1.858	1.880	1.982	1.657	1.470	**23.086**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.915	1.891	2.366	2.327	1.868	1.803	2.010	1.853	1.901	1.944	1.641	1.622	**23.141**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	69	153	149	99	73	82	77	61	101	95	72	37	**1.068**	
ISR05.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	29,1	27,3	35,9	36,2	28,9	31,1	26,6	25,3	25,5	29,8	27,0	30,9	**29,72**	
ISR05.3	Reclamos por Falta de Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	3.657	1.838	960	772	865	1.105	1.028	716	797	743	666	3.162	**16.309**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	3.592	1.964	987	734	893	1.084	1.068	719	793	729	629	2.626	**15.818**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	7	8	6	18	24	29	21	13	7	13	5	8	**159**	
ISR05.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	11,40	10,64	14,77	16,57	17,09	13,65	14,21	16,03	15,43	13,81	13,74	13,70	**13,42**	
ISR05.5	Reclamos por Baja Presión	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.042	458	343	491	506	773	552	330	326	393	365	888	**6.467**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.018	490	343	473	511	765	566	333	335	369	367	801	**6.371**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	5	4	8	12	7	14	6	5	10	18	9	36	**134**	
ISR05.6		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	12,23	12,32	12,75	13,68	14,93	12,56	13,62	14,47	13,46	12,05	10,07	13,34	**12,94**	
ISR05.7	Reclamos por Calidad del Agua	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	59	27	39	47	35	23	35	23	19	19	27	25	**378**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	58	28	38	44	39	23	32	27	18	20	27	25	**379**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	**6**	
ISR05.8		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	6,88	7,05	13,46	4,85	#¡VALOR!	6,94	#¡VALOR!	5,79	6,24	6,73	7,24	8,28	**N/A**	
ISR05.9	Reclamos por Filtración en Sótanos y Concesionarios	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	6	7	2	1	11	6	4	2	1	2	3	1	**46**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	8	6	2	0	11	6	6	3	1	2	3	1	**49**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**	
ISR05.10		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	93,68	#¡VALOR!	21,76	#¡DIV/0!	60,39	19,78	53,02	16,79	0,96	11,93	15,00	5,35	**N/A**	
ISR05.11	Reclamos Técnicos **Ingresados - Agua**	Es la sumatoria de Reclamos Ingresados por Escapes de Agua en la Vía Pública, Faltas de Agua y Baja Presión en el período.	N°	6.668	4.261	3.815	3.477	3.067	3.703	3.638	2.904	3.003	3.118	2.688	5.520	**45.862**	
ISR05.12		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	20%	-30%	-1%	9%	-16%	14%	-3%	-4%	-10%	-5%	-8%	81%		
ISR05.13	Reclamos Técnicos **Ingresados - Calidad**	Es la variación de los Reclamos por Calidad del Agua con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	9%	-23%	-25%	24%	-47%	-30%	84%	-4%	-14%	-5%	-45%	-50%		

aysa

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO GENERAL DE LA CONCESION - NUEVAS AREAS (partidos incorporados a partir del año 2016)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES
ISR06	**RECLAMOS CLOACA**																
ISR06.1	Reclamos por Taponamientos Cloacales	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	1.678	1.718	1.690	1.757	2.203	1.764	2.253	2.128	2.122	2.199	1.900	1.676	**23.088**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	1.647	1.634	1.741	1.775	2.195	1.800	2.159	2.191	2.095	2.234	1.885	1.706	**23.062**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	30	97	60	36	36	46	69	43	80	25	35	17	**574**	
ISR06.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	15,41	17,62	19,78	18,17	18,82	17,56	21,38	20,77	18,31	21,52	16,62	16,74	**18,72**	
ISR06.3	Reclamos por Desbordes Cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	188	211	248	225	267	218	273	255	255	341	270	208	**2.959**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	190	195	245	232	270	219	263	260	255	343	270	208	**2.950**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	2	13	3	6	2	6	3	6	8	2	1	3	**55**	
ISR06.4		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	13,27	15,97	17,15	15,81	16,15	14,51	18,01	15,95	14,17	18,20	13,15	12,49	**15,57**	
ISR06.5	Intervención de Desbordes Cloacales en Vía Pública con Tiempo Seco	Es la cantidad de desbordes cloacales en la Vía Pública con Tiempo Seco resueltos en el mes que se informa.	N°	123	132	172	130	147	138	148	158	142	173	257	134	**1.854**	
ISR06.6	Reclamos por Deficiencias en BR (falta de tapa, etc.)	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	14	21	21	9	27	25	33	16	27	37	19	17	**266**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos en el mes	N°	15	17	20	14	24	28	28	18	22	36	26	21	**269**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de intervención hidráulica	N°	1	1	4	1	1	1	1	3	3	3	0	0	**19**	
ISR06.7		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	93,54	#¡VALOR!	39,92	64,03	#¡VALOR!	53,74	#¡VALOR!	#¡VALOR!	54,38	#¡VALOR!	91,49	77,56	**N/A**	
ISR06.8	Rastreo programado redes finas (ø 150mm a ø 400mm)	Es la cantidad de kilómetros rastreados en el periodo considerado.	Km.	42	27	33	21	31	34	34	27	53	39	34	42	**417,631**	
ISR06.9	Reclamos Técnicos **Ingresados - Cloaca**	Es la suma de Reclamos Ingresados por Taponamientos Cloacales y los Reclamos por Deficiencias en Bocas de Registro en el período	N°	1.692	1.739	1.711	1.766	2.230	1.789	2.286	2.144	2.149	2.236	1.919	1.693	**23.354**	
ISR06.10		Es la variación de la sumatoria precitada con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-9%	-9%	-23%	13%	41%	4%	16%	9%	4%	30%	9%	4%		
ISR07	**RECLAMOS VARIOS**																
ISR07.1	Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas	Es la cantidad de reclamos Ingresados netos (sin desestimados)	N°	81	79	64	67	78	60	63	79	78	82	70	47	**848**	
		Es la cantidad de reclamos Resueltos	N°	82	69	65	110	67	60	79	106	170	85	71	66	**1.030**	
		Es la cantidad de reclamos Pendientes de resolución	N°	194	206	201	160	172	167	154	123	36	34	22	20	**1.489**	
ISR07.2		Es el Plazo Medio de resolución de un reclamo	Horas	#¡VALOR!	122,54	145,36	3.834,45	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	4.040,01	6.296,92	1.506,37	#¡VALOR!	158,94	**N/A**	
ISR07.3	Reclamos Técnicos **Ingresados** - **Otros**	Es la variación de los Reclamos por Reparación de Veredas y Calzadas con relación a los reclamos registrados en el mismo mes del año anterior.	%	-55%	-49%	-62%	-56%	-41%	-24%	-47%	-16%	-9%	37%	-26%	-19%		
ISR08	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR08.1	Atención al Usuario: Total llamadas Telefónicas Recibidas	Es el total de llamadas telefónicas Técnicas y Comerciales recibidas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR08.2	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención telefónica	Es el total de contactos de resolución inmediata Comerciales recibidos y resueltos por el CAIU	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR08.3	Atención al Usuario: pagos on-line	Es el total de pagos realizados on-line	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR08.4	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención personalizada (**)	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos por Atención Personalizada	N°	2.763	3.199	2.846	3.084	2.721	2.533	3.060	2.585	2.940	3.161	2.298	2.479	**33.669**	
ISR08.4b	Atención al Usuario: contactos resueltos por atención web	Es el total de contactos Comerciales de resolución inmediata recibidos y resueltos mediante la web	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
ISR08.5	Atención al Usuario: Pagos en Caja	Es el total de pagos realizados por el Usuario por Atención Personalizada	N°	220	337	657	111	96	452	326	48	441	88	641	562	**3.979**	
ISR09	**ATENCION AL USUARIO**																
ISR09.1	Atención Trámites Comerciales (Servicio Medido+Renta Fija+Otros)	Es el total de Trámites de Resolución Diferida Ingresados Netos (sin anulados)	N°	563	557	516	557	649	658	747	752	867	903	766	657	**8.192**	
ISR09.2		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Resueltos	N°	535	565	504	562	644	642	743	758	833	904	778	699	**8.167**	
ISR09.3		Es el total de Trámites de Resolución Diferida Pendientes	N°	126	117	128	122	126	141	144	137	170	168	155	112		
ISR09.4		Es el Tiempo Promedio de Resolución de Trámites de Resolución Diferida	Días	5,39	5,60	5,12	5,25	5,15	5,17	5,47	5,32	5,31	5,41	4,88	5,47	**5,30**	Rectificación enero a mayo (se promediaron valores cero por

La información a nivel Región y Total Concesión no contiene los datos de Nuevas Areas (partidos incorporados desde 2016).

SISTEMA DE INDICADORES TECNICOS

DIRECCIONES REGIONALES

REGISTRO GENERAL DE LA CONCESION - NUEVAS AREAS (partidos incorporados a partir del año 2016)

SIT-DDRR - AÑO 2025

CODIGO N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCION	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	OBSERVACIONES

1.5.2 Conexiones

AGUA

TRAMITES DE SOLICITUDES DE CONEXION, RECONEXION Y DESCONEXION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-A-IG-CON-00 (Ex 19)

REGIONES (Partidos / Distritos)	Conexión de Agua						Reconexión de Agua						Desconexión de Agua					
	Pedidos Ingresados	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >30 días	Pedidos Ingresados	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >10 días	Pedidos	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >10 días
Caballito	153	6	149	7	10,3	9	3	1	2	0	5,0	0	13	2	11	0	9,7	8
Centro-Constitución	173	9	163	12	9,6	24	1	0	1	0	14,0	1	27	1	26	1	12,5	25
Belgrano	433	10	423	15	7,1	26	0	0	0	0	0,0	0	11	2	9	0	*5,2*	*2*
Devoto	241	6	231	16	9,7	7	1	0	1	0	18,0	1	0	0	0	0	0,0	0
Flores	113	8	101	7	17,5	6	2	1	1	0	21,0	0	13	5	8	0	10,5	3
CAPITAL FEDERAL	**1.113**	**39**	**1.067**	**57**	**9,5**	**72**	**7**	**2**	**5**	**0**	**12,6**	**2**	**64**	**10**	**54**	**1**	**10,4**	**38**
San Fernando-Tigre	195	21	166	98	12,9	15	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
San Isidro	185	9	173	97	11,6	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
San Martín	178	11	156	75	6,2	1	0	0	0	0	0,0	0	7	0	7	1	5,9	1
Vicente López	121	5	117	95	12,5	18	0	0	0	0	0,0	0	1	1	0	0	0,0	0
NORTE	**679**	**46**	**612**	**365**	**10,8**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**8**	**1**	**7**	**1**	**5,9**	**1**
La Matanza	148	4	153	4	6,3	2	1	0	0	1	0,0	0	7	0	6	1	13,5	
Morón-Hurlingham-Ituzaingó	161	12	147	8	8,4	6	1	0	1	0	4,0	0	3	0	3	0	6,3	
Tres de Febrero	83	9	72	4	9,0	2	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	
OESTE	**392**	**25**	**372**	**16**	**7,6**	**10**	**2**	**0**	**1**	**1**	**4,0**	**0**	**10**	**0**	**9**	**1**	**11,1**	**0**
Pdo. A. Browm	44	7	36	3	10,9	0	0	0	0	0	0,0	0	14	0	14	0	4,6	0
Pdo. E. Echeverría	56	7	47	3	12,1	0	0	0	0	0	0,0	0	1	0	1	0	7,0	0
Pdo. Ezeiza	31	3	29	0	11,3	0	0	0	0	0	0,0	0	1	0	1	0	4,0	0
A. Brown-E. Echeverría	131	17	112	6	11,5	0	0	0	0	0	0,0	0	16	0	16	0	4,7	0
Lomas de Zamora	81	7	71	5	11,7	0	0	0	0	0	0,0	0	1	0	2	0	17,0	1
SUDOESTE	**212**	**24**	**183**	**11**	**11,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**17**	**0**	**18**	**0,0**	**21,7**	**1**
Avellaneda	73	4	70	1	10,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
Lanús	76	6	68	3	10,4	0	0	0	0	0	0,0	0	7	0	7	0	3,3	0
Quilmes	110	4	103	4	13,9	0	1	0	1	0	15,0	1	3	0	3	0	16,7	1
SUDESTE	**259**	**14**	**241**	**8**	**11,8**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**15,0**	**1**	**10**	**0**	**10**	**0**	**7,3**	**1**
GRANDES CLIENTES	**39**	**3**	**34**	**2**	**21,8**	**10**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**12**	**2**	**8**	**2**	**15,0**	**7**
TOTAL CONCESION	**2.694**	**151**	**2.509**	**459**	**10,1**	**126**	**11**	**3**	**7**	**1**	**11,7**	**3**	**121**	**13**	**106**	**5**	**12,2**	**48**

AGUA

TRAMITES DE SOLICITUDES DE CONEXION, RECONEXION Y DESCONEXION - NUEVAS ÁREAS

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2024

310-INS-A-IG-CON-00 (Ex 19) - NA

REGIONES (Partidos / Distritos)	Conexión de Agua						Reconexión de Agua						Desconexión de Agua					
	Pedidos Ingresados	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >30 días	Pedidos Ingresados	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >10 días	Pedidos	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >10 días
SMI-JCP-MA	51	5	46	20	8,8	2	0	0	0	0	0,0	0	4	1	4	3	17,5	4
ESCOBAR	46	2	43	23	11,6	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
PILAR	108	4	99	63	8,6	3	0	0	0	0	0,0	0	5	2	3	2	5,7	3
NORTE	**205**	**11**	**188**	**106**	**9,3**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**3**	**7**	**5**	**12,4**	**7**
Merlo	34	0	33	2	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moreno	76	3	71	6	14,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OESTE	**110**	**3**	**104**	**8**	**11,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Presidente Perón	13	3	10	0	12,1	0	0	0	0	0	0,0	0	1	0	1	0	7,0	0
SUDOESTE	**13**	**3**	**10**	**0**	**12,1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**7,0**	**0**
Florencio Varela	44	1	41	3	9,63	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,0	0
SUDESTE	**44**	**1**	**41**	**3**	**9,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**
TOTAL NUEVAS ÁREAS	**372**	**18**	**343**	**117**	**10,2**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**N/A**	**0**	**10**	**3**	**8**	**5**	**11,8**	**7**

1.5.3 Fuentes Alternativas

aysa	**AGUA** **MANTENIMIENTO DE FUENTES ALTERNATIVAS (MFA)** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **320-INS-A-IG-FA-00 (Ex Nº 20)**

REGION	Solicitud de MFA			Observaciones
	Cantidad de solicitudes	Autorizadas	En trámite	
CAPITAL FEDERAL	0	0	0	
NORTE	2	2	0	
OESTE	0	0	0	
SUDESTE	0	0	0	
SUDOESTE	0	0	0	
TOTAL	**2**	**2**	**0**	

1.5.4 Contactos con los Usuarios

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL N° 52**

Tipo de Contactos		Año 2024												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	3	1	4	4	9	1	1	1	1	6	2	4	**37**
	Cobro Indebido	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	2	7	**16**
	Pagos Duplicados	637	489	443	421	445	467	784	625	631	478	315	449	**6.184**
	Reiteración Errores de Factura	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	1	3	**10**
	Bloqueo de Interes	3	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	**10**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	Modificación de plan de pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Venta de Servicios Eventuales	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Corte de Servicio Erróneo	2	3	8	3	2	5	11	14	24	42	27	27	**168**
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo por Intereses	4	2	1	1	1	2	0	1	0	3	3	5	**23**
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Remesas de Pago	101	121	97	145	130	154	196	158	168	153	102	106	**1.631**
	Generación Plan de Pagos	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	**3**
	Cartas a Usuarios	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	1	**6**
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**750**	**621**	**554**	**577**	**588**	**634**	**995**	**806**	**825**	**686**	**453**	**602**	**8.091**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	53	36	32	34	23	44	37	42	54	150	167	71	**743**
	Estado de Cuenta	6.835	5.483	5.616	6.580	6.615	7.099	6.540	5.727	5.546	6.115	5.311	4.282	**71.749**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Estado de Cuenta Pagadero	1	7	1	3	1	4	8	7	5	5	2	2	**46**
	Persona de Contacto	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	**7**
	Bloqueo de Reclamación	538	516	617	701	637	646	652	578	665	518	713	690	**7.471**
	ABM Débito Automático	1.949	1.410	1.272	1.401	1.558	1.361	1.562	1.648	1.578	1.468	1.012	1.243	**17.462**
	Concurso, Quiebra y Subasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Propter Rem	14	29	8	19	17	30	18	76	75	39	57	71	**453**
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	5	1	4	3	6	7	13	6	8	10	7	5	**75**
	Factura Digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Libro ERAS	3	0	1	3	1	1	0	1	2	0	1	0	**13**
	TOTAL	**9.399**	**7.482**	**7.551**	**8.744**	**8.859**	**9.192**	**8.830**	**8.085**	**7.933**	**8.308**	**7.271**	**6.365**	**98.019**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	41.812	32.996	29.086	34.029	33.816	31.955	37.927	36.145	40.555	42.790	38.238	38.259	**437.608**
	Cambio de titularidad	1.195	924	691	831	987	761	983	991	977	1.251	1.002	827	**11.420**
	Consulta Débito Automático	451	399	325	377	401	330	419	421	482	688	454	477	**5.224**
	Consorcio	158	116	128	114	111	85	115	104	120	146	112	129	**1.438**
	Consultas de conexión	1.753	1.347	1.228	1.120	1.142	1.109	1.380	1.350	1.515	1.575	1.423	1.355	**16.297**
	Consulta de pagos	28.644	22.037	18.618	21.943	22.627	21.647	25.445	23.792	27.748	29.123	25.616	25.387	**292.627**
	Consultas SISEME	0	1	0	0	1	0	1	1	1	2	0	3	**10**
	Desvío Postal	88	62	54	57	47	40	77	71	62	55	52	54	**719**
	Facturación General	3.112	2.553	2.639	3.659	2.789	2.378	2.947	3.074	2.887	2.814	2.191	2.537	**33.580**
	Consultas en general	2.918	2.353	2.127	2.168	2.300	2.321	3.132	3.054	3.194	3.735	4.299	4.698	**36.299**
	Medición General	2.140	2.181	2.477	2.829	2.552	2.572	2.545	2.339	2.632	2.599	2.172	1.957	**28.995**
	Consultas oficina virtual	1.020	730	514	543	574	468	629	634	699	607	658	628	**7.704**
	Parámetros de Facturación	148	141	104	149	114	134	141	135	126	102	97	79	**1.470**
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL N° 52**

Tipo de Contactos		Año 2024												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	No recepción de factura	185	152	181	239	171	110	113	179	112	93	162	128	**1.825**
	Planos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficio de Tarifa Social	3.985	3.403	2.998	3.246	2.696	3.012	3.392	2.964	3.389	3.067	2.569	2.339	**37.060**
	Agregado Texto en OdeS	91	61	77	74	80	68	108	81	55	79	55	61	**890**
	Nota Técnica	2	0	1	1	0	0	0	0	4	1	1	0	**10**
	Certificado de Factibilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	155	129	**292**
	RANT	81	40	20	17	15	12	7	13	4	0	0	2	**211**
	Modificación Tarifaria	101	97	119	112	72	49	111	107	84	21	7	25	**905**
	Subsidio	55	16	10	35	2	2	1	4	3	3	0	0	**131**
	TOTAL	**46.127**	**36.613**	**32.311**	**37.514**	**36.681**	**35.098**	**41.546**	**39.314**	**44.094**	**45.969**	**41.025**	**40.815**	**477.107**
Cobros en Caja Distrito // Cobros por Tarjeta (On line) CAT		10.008	6.311	5.227	6.662	6.828	6.006	7.250	6.137	6.356	7.428	6.501	6.284	**80.998**
TOTAL CONTACTOS (A)		**66.284**	**51.027**	**45.643**	**53.497**	**52.956**	**50.930**	**58.621**	**54.342**	**59.208**	**62.391**	**55.250**	**54.066**	**664.215**

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcio + No recepción de factura (solicitud) + Gestión no categorizado + Llamadas sin contacto

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: GRANDES USUARIOS

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	0	0	1	1	1	11	1	0	0	0	5	12	**32**
	Cobro Indebido	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	**2**
	Pagos Duplicados	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	**5**
	Reiteración Errores de Factura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Bloqueo de Interes	33	159	33	28	35	35	27	19	38	38	30	39	**514**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Modificación de plan de pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Venta de Servicios Eventuales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**2**
	Corte de Servicio Erróneo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo por Intereses	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**2**
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Remesas de Pago	7	1	3	5	7	2	1	4	1	0	3	5	**39**
	Generación Plan de Pagos	0	0	0	0	3	12	22	12	12	16	22	14	**113**
	Cartas a Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	94	94	106	73	136	99	93	
	TOTAL	**42**	**160**	**37**	**38**	**47**	**155**	**145**	**141**	**124**	**190**	**160**	**165**	**1.404**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	10	16	54	26	19	173	65	109	118	84	88	103	**865**
	Estado de Cuenta	162	110	146	249	176	389	484	417	556	413	298	351	**3.751**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	9.737	10.981	11.426	11.307	11.749	10.253	11.115	**76.568**
	Estado de Cuenta Pagadero	43	177	35	34	33	62	72	79	91	99	54	86	**865**
	Persona de Contacto	0	9	2	7	0	0	3	2	1	6	4	0	**34**
	Bloqueo de Reclamación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	ABM Débito Automático	25	22	184	20	34	26	11	28	47	38	23	23	**481**
	Concurso, Quiebra y Subasta	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
	Propter Rem	0	0	0	0	0	2	0	7	12	23	9	16	**69**
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Factura Digital	1	0	1	0	0	89	90	136	141	86	133	73	**750**
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Libro ERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**241**	**334**	**422**	**336**	**263**	**10.478**	**11.706**	**12.204**	**12.274**	**12.498**	**10.862**	**11.767**	**83.385**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	106	124	145	163	140	521	571	520	571	661	473	538	**4.533**
	Cambio de titularidad	5	7	5	11	3	4	5	10	16	36	8	4	**114**
	Consulta Débito Automático	1	1	2	4	5	4	1	3	0	5	2	0	**28**
	Consorcio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
	Consultas de conexión	13	14	8	15	14	5	6	6	9	15	4	6	**115**
	Consulta de pagos	31	43	44	51	53	83	107	90	117	160	88	72	**939**
	Consultas SISEME	3	3	9	8	3	4	0	3	4	4	2	1	**44**
	Desvío Postal	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	**4**
	Facturación General	11	10	9	13	7	346	397	350	347	362	320	405	**2.577**
	Consultas en general	11	5	14	8	14	9	7	13	19	16	12	6	**134**
	Medición General	7	14	17	27	16	21	11	12	10	14	3	5	**157**
	Consultas oficina virtual	19	25	33	23	21	40	30	31	46	44	29	32	**373**
	Parámetros de Facturación	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	**3**
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	No recepción de factura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Planos	4	2	3	2	4	4	4	2	3	5	4	7	**44**

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: GRANDES USUARIOS

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Beneficio de Tarifa Social	0	1	0	0	0	1	1	0	2	2	2	2	**11**
	Agregado Texto en OdeS	0	1	0	0	1	2	1	0	2	0	0	2	**9**
	Nota Técnica	7	13	11	12	11	9	13	10	4	4	4	4	**102**
	Certificado de Factibilidad	10	1	5	4	2	6	5	3	4	4	0	2	**46**
	RANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Modificación Tarifaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**123**	**140**	**161**	**179**	**154**	**539**	**591**	**533**	**583**	**671**	**479**	**548**	**4.701**
Cobros en Caja Distrito // Cobros por Tarjeta (On line) CAT														0
TOTAL CONTACTOS (A)		**406**	**634**	**620**	**553**	**464**	**11.172**	**12.442**	**12.878**	**12.981**	**13.359**	**11.501**	**12.480**	**89.490**
Trámites con resolución diferida														
SERVICIO MEDIDO	Asignación de Medidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Verificación - Reparación Pérdidas Internas	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	**6**
	Inspección de Medidores	4	1	5	8	5	7	7	3	5	3	4	7	**59**
	SOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Instalación Medidores	3	0	0	1	1	1	3	1	2	2	1	2	**17**
	Resol. 41/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**7**	**1**	**7**	**10**	**6**	**8**	**11**	**4**	**7**	**5**	**6**	**10**	**82**
RENTA FIJA	Verificación Parámetros Facturación	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	**5**
	Recategorización Cocheras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Unificación Complementaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Modificación Parcelaria - Sub//Anex//APIC	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	**7**
	Subdivisión // Rectificación PH	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**4**
	Solicitud Cargo por Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo Cargo por Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Independización de Facturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Operativo Post GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Rectificación Dirección Inmuebles	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
	Solicitud Modificación de Parámetros	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	**5**
	TOTAL	**2**	**1**	**5**	**0**	**2**	**5**	**3**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**22**
	Solicitud Conexiones Agua	3	2	0	1	1	3	5	3	5	5	5	0	**33**
	Solicitud Conexiones Cloacas	7	5	7	0	4	2	4	0	11	1	5	3	**49**
	Solicitud Retiro Conexión Agua	0	0	4	1	0	1	0	0	0	1	1	1	**9**
	Solicitud Retiro Conexión Cloacas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Solicitud Desconexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**2**
	Solicitud Reconexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Solicitud descuento T. Social	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	**3**
	Solic. Modif. de Dir. Inmueble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Facturación a Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Facturación Braile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo Alta Débito Pendiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Oficios Judiciales Area Servida	1	1	4	0	6	2	1	2	5	2	6	3	**33**
	Oficios Judiciales Fuera Area servida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	No Recepción Facturas (Distrito)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	No Recepción Facturas (Correo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo Aviso de Corte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: GRANDES USUARIOS

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTROS	Exención de Pago	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	**8**
	Reclamos Cargos Facturados	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Verificación Pagos	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	**2**
	Locación - Cambio de Titularidad	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	**7**
	Transferencia de Dominio	0	1	4	4	2	5	4	3	5	11	2	5	**46**
	Tarifa Social - Tratamiento de Deuda	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	**6**
	Localización de Conexión	1	0	2	1	1	1	1	1	4	3	1	3	**19**
	Negociación de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Individualización de Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Padrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Medición	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
	ERAS Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Trámite Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Certicación Propter Rem	4	4	5	7	5	20	4	18	49	52	33	5	**206**
	Inspección Inst. Internas	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Identificación de Inmueble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**17**	**15**	**28**	**20**	**23**	**36**	**22**	**29**	**81**	**78**	**54**	**24**	**427**
TOTAL TRAMITES RESUELTOS (B)		**26**	**17**	**40**	**30**	**31**	**49**	**36**	**34**	**89**	**83**	**61**	**35**	**531**

TOTAL DIRECCION (A + B)	**432**	**651**	**660**	**583**	**495**	**11.221**	**12.478**	**12.912**	**13.070**	**13.442**	**11.562**	**12.515**	**90.021**
TOTAL TRAMITES INGRESADOS NETOS	**18**	**29**	**35**	**31**	**35**	**36**	**34**	**51**	**89**	**66**	**69**	**57**	**550**
Tiempo de Resolución Promedio (días)	**26,4**	**9,2**	**15,0**	**10,3**	**14,6**	**15,7**	**14,2**	**7,4**	**4,6**	**8,8**	**9,0**	**10,8**	**10,9**

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcios + Planos

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: CAPITAL

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	31	39	29	37	36	33	31	25	53	50	33	11	**408**
	Cobro Indebido	3	3	3	3	5	8	11	6	12	13	4	6	**77**
	Pagos Duplicados	38	59	57	46	56	72	85	79	85	41	21	28	**667**
	Reiteración Errores de Factura	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
	Bloqueo de Interes	2.630	1.902	1.811	1.519	1.300	1.219	1.691	1.540	1.886	1.962	1.597	1.537	**20.594**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	4	2	3	2	2	1	3	2	4	1	1	6	**31**
	Modificación de plan de pagos	3	0	1	0	2	2	4	3	2	2	2	3	**24**
	Venta de Servicios Eventuales	41	20	22	20	19	18	13	21	22	18	13	14	**241**
	Corte de Servicio Erróneo	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	3	**10**
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo por Intereses	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	**4**
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Remesas de Pago	109	54	72	81	97	71	104	54	95	102	67	57	**963**
	Generación Plan de Pagos	679	530	525	470	568	3.180	4.177	3.596	3.659	4.312	3.393	3.186	**28.275**
	Cartas a Usuarios	0	0	1	0	2	5	1	4	2	5	5	0	**25**
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	20.022	20.022	18.620	17.899	20.927	16.329	17.350	
	TOTAL	**3.541**	**2.609**	**2.524**	**2.178**	**2.088**	**24.634**	**26.142**	**23.954**	**23.719**	**27.433**	**21.466**	**22.201**	**182.489**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	2.076	1.688	1.579	1.699	1.398	10.355	11.582	10.734	11.123	11.666	12.766	12.026	**88.692**
	Estado de Cuenta	902	1.081	673	819	1.135	28.715	33.969	30.893	32.931	33.991	24.365	28.243	**217.717**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	435.398	478.115	463.422	469.542	468.456	403.951	426.777	**3.145.661**
	Estado de Cuenta Pagadero	4.866	3.491	3.483	3.235	3.403	14.129	16.934	15.094	15.040	16.671	13.673	13.820	**123.839**
	Persona de Contacto	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**4**
	Bloqueo de Reclamación	108	100	96	99	80	77	98	97	129	121	97	130	**1.232**
	ABM Débito Automático	2.309	2.097	1.696	2.158	2.270	2.096	2.369	2.520	2.460	2.300	1.783	2.151	**26.209**
	Concurso, Quiebra y Subasta	8	1	4	3	6	4	3	2	3	4	2	3	**43**
	Propter Rem	8	3	7	10	36	277	381	1.537	1.478	1.294	1.150	1.310	**7.491**
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	677	697	669	755	1.020	1.002	946	271	301	217	106	128	**6.789**
	Factura Digital	0	1	2	0	0	12.686	14.067	12.751	12.592	13.230	16.048	15.184	**96.561**
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Libro ERAS	30	12	10	1	2	6	6	1	7	7	1	2	**85**
	TOTAL	**10.984**	**9.172**	**8.220**	**8.779**	**9.351**	**504.745**	**558.471**	**537.322**	**545.606**	**547.957**	**473.942**	**499.774**	**3.714.323**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	5.427	4.683	4.526	5.098	5.074	45.178	51.140	51.783	51.910	51.902	40.901	44.564	**362.186**
	Cambio de titularidad	402	306	299	374	282	326	303	277	263	176	119	160	**3.287**
	Consulta Débito Automático	112	117	85	115	167	111	145	150	125	119	42	52	**1.340**
	Consorcio	42	31	33	32	31	28	44	41	26	39	29	32	**408**
	Consultas de conexión	206	156	139	160	157	176	197	177	218	284	217	221	**2.308**
	Consulta de pagos	1.229	1.150	1.058	1.285	1.335	11.552	12.763	11.862	12.208	12.994	11.154	11.108	**89.698**
	Consultas SISEME	6	4	5	6	15	6	8	3	6	7	2	5	**73**
	Desvío Postal	22	25	32	34	20	33	28	37	31	26	20	16	**324**
	Facturación General	497	358	408	568	597	28.349	32.243	34.792	34.081	33.313	25.186	29.010	**219.402**
	Consultas en general	717	553	647	404	362	317	483	294	420	556	302	294	**5.349**
	Medición General	150	124	144	146	138	146	133	101	119	116	99	80	**1.496**
	Consultas oficina virtual	1.605	1.520	1.352	1.587	1.571	3.552	4.202	3.551	3.892	3.773	3.361	3.220	**33.186**
	Parámetros de Facturación	46	26	24	27	37	43	53	33	25	17	15	14	**360**
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: CAPITAL

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	No recepción de factura	3	10	5	9	7	9	8	2	25	43	28	42	**191**
	Planos	390	303	295	351	355	530	530	463	471	439	327	310	**4.764**
	Beneficio de Tarifa Social	637	524	491	554	523	493	451	358	451	480	398	611	**5.971**
	Agregado Texto en OdeS	66	65	91	78	95	76	106	98	113	106	77	95	**1.066**
	Nota Técnica	19	23	63	36	72	83	55	52	92	66	39	49	**649**
	Certificado de Factibilidad	69	54	58	40	57	42	54	60	67	57	64	47	**669**
	RANT	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**2**
	Modificación Tarifaria	0	10	7	5	10	12	10	6	0	1	0	0	**61**
	Subsidio	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	**4**
	TOTAL	**6.219**	**5.359**	**5.236**	**5.813**	**5.831**	**45.885**	**51.818**	**52.357**	**52.633**	**52.612**	**41.479**	**45.366**	**370.608**
Cobros en Caja Distrito // Cobros por Tarjeta (On line) CAT		737	799	759	688	658	551	634	561	577	688	586	532	**7.770**
TOTAL CONTACTOS (A)		**21.481**	**17.939**	**16.739**	**17.458**	**17.928**	**575.815**	**637.065**	**614.194**	**622.535**	**628.690**	**537.473**	**567.873**	**4.275.190**
Trámites con resolución diferida														
SERVICIO MEDIDO	Asignación de Medidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verificación - Reparación Pérdidas Internas	202	169	225	249	210	280	274	273	267	276	194	129	**2.748**
	Inspección de Medidores	339	396	447	492	417	463	480	423	475	423	422	255	**5.032**
	SOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalación Medidores	45	37	32	37	35	36	31	29	41	28	26	43	**420**
	Resol. 41/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**586**	**602**	**704**	**778**	**662**	**779**	**785**	**725**	**783**	**727**	**642**	**427**	**8.200**
RENTA FIJA	Verificación Parámetros Facturación	4	0	4	1	1	0	1	0	1	5	1	0	**18**
	Recategorización Cocheras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unificación Complementaria	4	3	1	5	5	2	4	2	3	3	2	3	**37**
	Modificación Parcelaria - Sub//Anex//APIC	0	1	2	2	1	3	1	2	5	3	2	0	**22**
	Subdivisión // Rectificación PH	11	18	15	28	15	15	25	17	27	29	13	17	**230**
	Solicitud Cargo por Construcción	0	1	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	**7**
	Reclamo Cargo por Construcción	2	4	4	1	3	1	1	1	6	2	2	0	**27**
	Independización de Facturas	49	45	37	54	34	57	58	87	66	45	45	42	**619**
	Operativo Post GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rectificación Dirección Inmuebles	2	1	1	1	1	1	1	1	0	4	1	2	**16**
	Solicitud Modificación de Parámetros	114	85	99	100	79	93	112	78	98	82	73	109	**1.122**
	TOTAL	**186**	**158**	**163**	**192**	**140**	**174**	**203**	**189**	**207**	**174**	**139**	**173**	**2.098**
	Solicitud Conexiones Agua	88	67	71	97	69	80	71	89	91	118	120	62	**1.023**
	Solicitud Conexiones Cloacas	52	41	41	41	25	27	40	46	39	57	55	43	**507**
	Solicitud Retiro Conexión Agua	1	1	0	1	2	0	0	3	0	2	0	1	**11**
	Solicitud Retiro Conexión Cloacas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**2**
	Solicitud Desconexión	2	6	4	4	1	3	4	6	2	13	4	5	**54**
	Solicitud Reconexión	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	**5**
	Solicitud descuento T. Social	332	357	266	297	267	399	274	187	201	119	119	450	**3.268**
	Solic. Modif. de Dir. Inmueble	1	1	3	5	4	2	3	8	4	5	4	0	**40**
	Facturación a Consorcio	0	3	3	0	0	0	9	2	3	1	0	1	**22**
	Facturación Braile	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
	Reclamo Alta Débito Pendiente	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	**5**
	Oficios Judiciales Area Servida	60	80	167	159	146	150	126	105	165	152	119	124	**1.553**

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: CAPITAL

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTROS	Oficios Judiciales Fuera Area servida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No Recepción Facturas (Distrito)	5	7	6	2	1	2	1	2	3	1	2	5	**37**
	No Recepción Facturas (Correo)	72	76	71	68	98	64	80	95	89	71	72	77	**933**
	Reclamo Aviso de Corte	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Exención de Pago	1	1	1	1	2	1	0	3	0	0	0	0	**10**
	Reclamos Cargos Facturados	53	42	40	39	59	59	50	73	61	58	50	51	**635**
	Verificación Pagos	33	48	34	19	40	45	27	34	33	33	25	39	**410**
	Locación - Cambio de Titularidad	17	17	19	20	9	14	12	17	25	16	17	18	**201**
	Transferencia de Dominio	0	2	0	3	1	2	1	1	0	0	1	1	**12**
	Tarifa Social - Tratamiento de Deuda	212	207	215	224	199	194	258	240	246	197	215	194	**2.601**
	Localización de Conexión	21	14	21	22	18	24	21	23	20	29	16	21	**250**
	Negociación de Deuda	0	0	1	3	5	6	0	1	2	1	3	1	**23**
	Individualización de Consorcio	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	ERAS Clientes	26	12	24	17	24	29	30	20	39	13	21	23	**278**
	ERAS Padrón	2	2	2	2	1	2	3	0	3	3	1	3	**24**
	ERAS Medición	15	14	18	30	31	30	18	25	17	22	14	17	**251**
	ERAS Conexión	2	2	1	4	0	3	2	2	3	2	1	1	**23**
	ERAS Pagos	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	**6**
	ERAS Trámite Institucional	0	1	2	5	6	4	4	5	2	3	4	1	**37**
	Certicación Propter Rem	1.301	1.271	1.237	1.605	1.669	1.829	2.161	5.952	7.705	7.615	6.434	1.617	**40.396**
	Inspección Inst. Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	**2**
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Identificación de Inmueble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**2.300**	**2.272**	**2.248**	**2.668**	**2.682**	**2.972**	**3.195**	**6.941**	**8.755**	**8.533**	**7.300**	**2.757**	**52.623**
TOTAL TRAMITES RESUELTOS (B)		**3.072**	**3.032**	**3.115**	**3.638**	**3.484**	**3.925**	**4.183**	**7.855**	**9.745**	**9.434**	**8.081**	**3.357**	**62.921**

TOTAL DIRECCION (A + B)	**24.553**	**20.971**	**19.854**	**21.096**	**21.412**	**579.740**	**641.248**	**622.049**	**632.280**	**638.124**	**545.554**	**571.230**	**4.338.111**
TOTAL TRAMITES INGRESADOS NETOS	**3.220**	**3.042**	**3.324**	**3.615**	**3.850**	**3.690**	**4.172**	**8.790**	**9.791**	**9.688**	**8.223**	**8.666**	**70.071**
Tiempo de Resolución Promedio (días)	**7,1**	**8,1**	**7,7**	**7,1**	**7,8**	**8,0**	**8,0**	**9,3**	**4,6**	**8,8**	**9,8**	**9,6**	**8,0**

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcios + Planos

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: NORTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	7	3	2	9	4	5	13	7	12	15	8	4	**89**
	Cobro Indebido	2	0	1	0	1	2	2	1	1	0	1	0	**11**
	Pagos Duplicados	4	1	2	0	1	1	1	2	0	6	1	1	**20**
	Reiteración Errores de Factura	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Bloqueo de Interes	654	496	606	602	464	412	535	482	557	563	368	355	**6.094**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	**6**
	Modificación de plan de pagos	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	**6**
	Venta de Servicios Eventuales	76	74	47	71	62	58	75	87	94	119	86	87	**936**
	Corte de Servicio Erróneo	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	0	0	**6**
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo por Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Remesas de Pago	23	1	15	11	6	6	20	11	19	4	12	4	**132**
	Generación Plan de Pagos	126	137	143	148	121	1.663	2.542	2.019	2.003	2.326	1.797	1.753	**14.778**
	Cartas a Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	11.609	11.609	10.486	10.287	12.218	9.401	10.058	
	TOTAL	**893**	**712**	**816**	**841**	**661**	**13.757**	**14.801**	**13.096**	**12.977**	**15.253**	**11.678**	**12.263**	**97.748**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	800	649	552	734	534	5.936	7.423	6.141	5.906	6.229	8.093	7.316	**50.313**
	Estado de Cuenta	404	325	361	174	77	13.136	15.744	13.772	15.256	15.475	11.386	13.221	**99.331**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	231.449	249.182	246.613	249.957	253.156	220.202	235.800	**1.686.359**
	Estado de Cuenta Pagadero	646	408	442	461	187	6.482	7.566	6.750	6.487	7.451	6.416	6.389	**49.685**
	Persona de Contacto	1	1	4	0	0	0	1	0	3	1	4	1	**16**
	Bloqueo de Reclamación	182	146	178	212	208	96	58	178	206	215	156	117	**1.952**
	ABM Débito Automático	618	575	608	613	566	569	705	712	657	751	581	623	**7.578**
	Concurso, Quiebra y Subasta	4	1	2	3	0	0	0	1	1	4	1	2	**19**
	Propter Rem	4	15	0	0	2	55	60	195	177	223	174	159	**1.064**
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	57	71	39	102	43	127	111	109	75	67	51	56	**908**
	Factura Digital	0	0	0	0	0	7.673	9.593	7.848	7.361	7.949	10.949	10.006	**61.379**
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Libro ERAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	TOTAL	**2.716**	**2.192**	**2.186**	**2.299**	**1.617**	**265.523**	**290.443**	**282.319**	**286.086**	**291.521**	**258.013**	**273.690**	**1.958.605**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	2.750	2.119	1.989	2.323	2.531	25.069	28.560	27.452	27.806	27.037	23.197	25.138	**195.971**
	Cambio de titularidad	152	88	100	130	79	95	138	137	138	111	109	94	**1.371**
	Consulta Débito Automático	108	89	65	76	97	106	95	97	100	120	112	115	**1.180**
	Consorcio	2	1	2	1	0	0	2	1	2	0	0	1	**12**
	Consultas de conexión	95	69	44	55	44	34	46	65	54	69	60	35	**670**
	Consulta de pagos	444	272	280	364	300	6.390	7.639	7.430	7.509	8.147	7.135	7.170	**53.080**
	Consultas SISEME	1	1	0	0	1	1	0	1	3	0	1	0	**9**
	Desvío Postal	8	2	3	4	2	6	1	2	0	5	9	3	**45**
	Facturación General	149	64	41	100	53	14.929	16.793	16.690	16.814	15.627	13.018	15.380	**109.658**
	Consultas en general	193	55	70	122	49	20	46	58	31	48	51	46	**789**
	Medición General	122	93	159	229	236	186	204	144	108	69	51	58	**1.659**
	Consultas oficina virtual	1.460	1.379	1.212	1.229	1.660	3.297	3.582	2.818	3.033	2.833	2.649	2.231	**27.383**
	Parámetros de Facturación	14	6	12	9	9	5	14	9	12	7	2	5	**104**
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: NORTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	No recepción de factura	2	0	1	4	1	0	0	0	2	1	0	0	**11**
	Planos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Beneficio de Tarifa Social	105	38	51	90	58	51	67	112	49	40	36	31	**728**
	Agregado Texto en OdeS	53	48	56	67	57	76	75	52	47	81	66	48	**726**
	Nota Técnica	4	3	6	9	6	2	5	4	1	5	4	2	**51**
	Certificado de Factibilidad	13	11	15	25	13	15	29	32	32	25	23	12	**245**
	RANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Modificación Tarifaria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
	Subsidio	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
	TOTAL	**2.925**	**2.219**	**2.117**	**2.516**	**2.666**	**25.213**	**28.736**	**27.652**	**27.936**	**27.188**	**23.326**	**25.231**	**197.725**
Cobros en Caja Distrito // Cobros por Tarjeta (On line) CAT		204	75	119	255	128	83	387	60	98	366	172	297	**2.244**
TOTAL CONTACTOS (A)		**6.738**	**5.198**	**5.238**	**5.911**	**5.072**	**304.576**	**334.367**	**323.127**	**327.097**	**334.328**	**293.189**	**311.481**	**2.256.322**
Trámites con resolución diferida														
SERVICIO MEDIDO	Asignación de Medidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Verificación - Reparación Pérdidas Internas	238	200	292	386	386	325	477	316	390	420	229	163	**3.822**
	Inspección de Medidores	289	260	330	369	304	282	328	249	328	260	229	198	**3.426**
	SOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Instalación Medidores	21	27	17	15	13	20	27	28	23	26	18	18	**253**
	Resol. 41/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**548**	**487**	**639**	**770**	**703**	**627**	**832**	**593**	**741**	**706**	**476**	**379**	**7.501**
RENTA FIJA	Verificación Parámetros Facturación	5	5	2	1	3	1	1	5	2	4	0	1	**30**
	Recategorización Cocheras	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**
	Unificación Complementaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
	Modificación Parcelaria - Sub//Anex//APIC	5	9	8	7	10	14	9	14	8	19	11	11	**125**
	Subdivisión // Rectificación PH	12	13	14	20	24	15	14	29	35	25	20	22	**243**
	Solicitud Cargo por Construcción	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	**4**
	Reclamo Cargo por Construcción	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	**6**
	Independización de Facturas	4	6	14	2	8	5	8	8	6	10	9	5	**85**
	Operativo Post GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Rectificación Dirección Inmuebles	11	11	9	8	6	3	6	11	6	14	6	1	**92**
	Solicitud Modificación de Parámetros	14	16	11	13	13	9	10	14	19	14	21	11	**165**
	TOTAL	**51**	**61**	**58**	**51**	**65**	**52**	**48**	**81**	**76**	**88**	**69**	**53**	**753**
	Solicitud Conexiones Agua	47	48	39	46	52	39	61	50	45	66	66	50	**609**
	Solicitud Conexiones Cloacas	65	40	48	53	44	61	72	61	61	80	60	49	**694**
	Solicitud Retiro Conexión Agua	5	3	3	3	2	3	2	1	3	6	1	3	**35**
	Solicitud Retiro Conexión Cloacas	7	1	1	3	1	1	0	1	1	1	2	0	**19**
	Solicitud Desconexión	2	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	**8**
	Solicitud Reconexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Solicitud descuento T. Social	20	28	27	26	21	40	27	26	16	14	15	28	**288**
	Solic. Modif. de Dir. Inmueble	17	23	19	13	16	13	23	17	27	22	15	18	**223**
	Facturación a Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	**4**
	Facturación Braile	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	**2**
	Reclamo Alta Débito Pendiente	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Oficios Judiciales Area Servida	7	23	20	35	44	29	28	18	46	38	44	28	**360**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: NORTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTROS	Oficios Judiciales Fuera Area servida	0	1	10	9	7	2	2	1	4	6	2	4	**48**
	No Recepción Facturas (Distrito)	62	68	44	47	60	28	39	27	14	40	27	42	**498**
	No Recepción Facturas (Correo)	246	185	128	169	200	138	276	179	273	313	327	241	**2.675**
	Reclamo Aviso de Corte	0	0	0	0	4	0	1	1	0	3	1	0	**10**
	Exención de Pago	0	3	0	1	1	2	1	1	4	4	1	0	**18**
	Reclamos Cargos Facturados	19	16	24	32	28	27	30	43	40	40	32	15	**346**
	Verificación Pagos	14	12	7	6	11	12	12	11	16	11	11	8	**131**
	Locación - Cambio de Titularidad	9	2	2	6	0	4	8	22	3	5	4	3	**68**
	Transferencia de Dominio	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	**3**
	Tarifa Social - Tratamiento de Deuda	51	62	88	59	84	83	73	101	98	81	81	70	**931**
	Localización de Conexión	116	90	86	96	87	89	122	83	101	135	92	89	**1.186**
	Negociación de Deuda	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
	Individualización de Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Clientes	10	12	5	11	9	10	7	8	10	6	8	9	**105**
	ERAS Padrón	0	0	0	0	2	4	0	0	2	1	1	1	**11**
	ERAS Medición	7	15	11	12	8	25	20	19	10	16	12	11	**166**
	ERAS Conexión	0	1	1	3	0	0	1	3	0	2	1	4	**16**
	ERAS Pagos	0	1	2	1	0	1	3	1	0	5	0	0	**14**
	ERAS Trámite Institucional	3	0	2	0	1	3	1	3	6	2	4	7	**32**
	Certicación Propter Rem	340	400	335	361	384	379	479	844	987	1.024	935	311	**6.779**
	Inspección Inst. Internas	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	**3**
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Identificación de Inmueble	9	0	5	5	0	4	5	8	22	7	6	3	**74**
	TOTAL	**1.071**	**1.035**	**910**	**998**	**1.070**	**997**	**1.295**	**1.531**	**1.791**	**1.930**	**1.750**	**995**	**15.373**
TOTAL TRAMITES RESUELTOS (B)		**1.670**	**1.583**	**1.607**	**1.819**	**1.838**	**1.676**	**2.175**	**2.205**	**2.608**	**2.724**	**2.295**	**1.427**	**23.627**

TOTAL DIRECCION (A + B)	**8.408**	**6.781**	**6.845**	**7.730**	**6.910**	**306.252**	**336.542**	**325.332**	**329.705**	**337.052**	**295.484**	**312.908**	**2.279.949**
TOTAL TRAMITES INGRESADOS NETOS	**1.969**	**1.883**	**1.850**	**2.155**	**2.217**	**2.169**	**2.513**	**2.746**	**3.144**	**3.051**	**2.732**	**2.440**	**28.869**
Tiempo de Resolución Promedio (días)	**5,0**	**5,2**	**5,0**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,6**	**6,0**	**2,4**	**6,3**	**5,8**	**5,8**	**5,2**

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcios + Planos

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: SUR OESTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	0	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	**7**
	Cobro Indebido	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6	0	1	**11**
	Pagos Duplicados	0	0	2	1	1	1	0	5	7	3	2	2	**24**
	Reiteración Errores de Factura	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
	Bloqueo de Interes	463	323	341	207	160	165	202	167	214	228	200	182	**2.852**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	**4**
	Modificación de plan de pagos	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	**2**
	Venta de Servicios Eventuales	66	23	26	14	17	21	28	26	26	18	12	13	**290**
	Corte de Servicio Erróneo	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	0	1	**7**
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo por Intereses	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Remesas de Pago	0	10	4	5	3	0	4	8	10	2	2	2	**50**
	Generación Plan de Pagos	131	151	130	114	105	1.011	1.618	1.264	1.293	1.576	1.233	1.123	**9.749**
	Cartas a Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	5.589	5.589	5.199	5.127	6.075	4.812	4.753	
	TOTAL	**661**	**511**	**506**	**343**	**291**	**6.791**	**7.445**	**6.672**	**6.677**	**7.908**	**6.261**	**6.079**	**50.145**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	687	734	599	472	393	2.920	3.642	3.024	3.068	3.075	4.273	3.823	**26.710**
	Estado de Cuenta	255	251	217	146	158	8.837	10.002	8.775	9.423	9.654	7.227	8.156	**63.101**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	90.289	99.792	99.017	98.420	100.758	87.019	92.507	**667.802**
	Estado de Cuenta Pagadero	467	340	404	179	148	3.222	3.742	3.282	3.216	3.524	3.259	3.006	**24.789**
	Persona de Contacto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Bloqueo de Reclamación	1	1	0	1	7	3	27	54	85	87	48	33	**347**
	ABM Débito Automático	253	263	328	285	334	294	392	383	380	368	276	423	**3.979**
	Concurso, Quiebra y Subasta	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	**5**
	Propter Rem	5	11	3	8	15	17	23	43	38	30	29	19	**241**
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	79	108	55	71	64	97	145	102	67	98	89	85	**1.060**
	Factura Digital	0	0	0	0	0	3.542	4.344	3.598	3.527	3.660	5.401	4.924	**28.996**
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Libro ERAS	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	**3**
	TOTAL	**1.747**	**1.710**	**1.606**	**1.163**	**1.119**	**109.221**	**122.109**	**118.279**	**118.226**	**121.255**	**107.622**	**112.976**	**817.033**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	698	809	868	1.067	1.111	13.307	14.833	14.699	14.498	14.933	12.490	13.639	**102.952**
	Cambio de titularidad	23	26	35	17	39	26	41	29	28	26	22	18	**330**
	Consulta Débito Automático	9	21	27	18	17	13	30	26	25	36	16	22	**260**
	Consorcio	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	**5**
	Consultas de conexión	41	55	80	45	57	74	119	75	77	94	55	83	**855**
	Consulta de pagos	177	212	298	287	342	3.383	4.303	4.150	4.115	4.533	4.000	4.052	**29.852**
	Consultas SISEME	1	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	2	**8**
	Desvío Postal	5	6	6	9	4	1	8	9	10	7	2	6	**73**
	Facturación General	37	69	52	154	57	8.714	9.090	9.277	9.167	9.202	7.216	8.401	**61.436**
	Consultas en general	74	64	108	35	66	100	110	89	75	75	93	76	**965**
	Medición General	8	19	37	17	25	17	31	20	18	14	25	17	**248**
	Consultas oficina virtual	314	325	209	480	496	969	1.087	1.010	975	930	1.050	956	**8.801**
	Parámetros de Facturación	7	12	12	3	8	9	13	11	5	11	9	5	**105**
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: SUR OESTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	No recepción de factura	1	0	3	1	0	1	0	0	3	2	2	1	**14**
	Planos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficio de Tarifa Social	60	58	70	49	76	86	120	67	62	61	51	44	**804**
	Agregado Texto en OdeS	17	21	15	19	21	12	13	12	12	14	14	7	**177**
	Nota Técnica	2	1	6	2	7	2	3	1	2	1	0	0	**27**
	Certificado de Factibilidad	5	8	1	5	4	6	5	6	6	14	3	4	**67**
	RANT	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**
	Modificación Tarifaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	**3**
	TOTAL	**782**	**897**	**961**	**1.142**	**1.219**	**13.413**	**14.976**	**14.786**	**14.580**	**15.024**	**12.558**	**13.694**	**104.032**
Cobros en Caja Distrito // Cobros por Tarjeta (On line) CAT		113	29	9	12	22	5	6	9	6	11	12	15	**249**
TOTAL CONTACTOS (A)		**3.303**	**3.147**	**3.082**	**2.660**	**2.651**	**129.430**	**144.536**	**139.746**	**139.489**	**144.198**	**126.453**	**132.764**	**971.459**
Trámites con resolución diferida														
SERVICIO MEDIDO	Asignación de Medidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verificación - Reparación Pérdidas Internas	43	50	44	73	66	76	86	74	71	75	53	49	**760**
	Inspección de Medidores	62	77	85	120	87	140	135	85	88	111	72	49	**1.111**
	SOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalación Medidores	14	11	8	8	14	8	12	10	10	15	5	9	**124**
	Resol. 41/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**119**	**138**	**137**	**201**	**167**	**224**	**233**	**169**	**169**	**201**	**130**	**107**	**1.995**
RENTA FIJA	Verificación Parámetros Facturación	5	2	2	3	0	2	3	1	3	4	6	2	**33**
	Recategorización Cocheras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unificación Complementaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modificación Parcelaria - Sub//Anex//APIC	1	2	8	4	2	3	1	3	6	3	6	5	**44**
	Subdivisión // Rectificación PH	6	5	2	1	3	5	7	4	5	4	4	5	**51**
	Solicitud Cargo por Construcción	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
	Reclamo Cargo por Construcción	6	3	3	1	6	6	9	7	9	2	5	4	**61**
	Independización de Facturas	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	**6**
	Operativo Post GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rectificación Dirección Inmuebles	14	7	10	5	6	4	12	7	11	11	4	5	**96**
	Solicitud Modificación de Parámetros	12	7	11	11	15	19	18	13	10	11	11	12	**150**
	TOTAL	**44**	**26**	**37**	**26**	**32**	**39**	**51**	**37**	**44**	**35**	**37**	**34**	**442**
	Solicitud Conexiones Agua	13	11	19	14	7	12	18	17	22	20	14	16	**183**
	Solicitud Conexiones Cloacas	15	14	14	15	19	12	22	21	18	17	18	15	**200**
	Solicitud Retiro Conexión Agua	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	**3**
	Solicitud Retiro Conexión Cloacas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Solicitud Desconexión	2	0	1	1	1	1	3	3	0	4	1	1	**18**
	Solicitud Reconexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Solicitud descuento T. Social	24	17	13	27	15	38	32	18	26	11	11	25	**257**
	Solic. Modif. de Dir. Inmueble	21	20	17	40	17	19	28	28	25	21	23	32	**291**
	Facturación a Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Facturación Braile	1	1	0	0	1	1	2	1	1	4	2	1	**15**
	Reclamo Alta Débito Pendiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oficios Judiciales Area Servida	6	24	19	32	18	34	28	20	25	31	21	22	**280**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: SUR OESTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTROS	Oficios Judiciales Fuera Area servida	0	1	1	1	1	5	2	3	3	5	3	3	**28**
	No Recepción Facturas (Distrito)	49	38	38	19	21	20	19	9	8	10	15	46	**292**
	No Recepción Facturas (Correo)	130	115	97	86	63	33	37	25	64	41	57	104	**852**
	Reclamo Aviso de Corte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Exención de Pago	3	0	0	6	1	1	0	0	3	0	1	0	**15**
	Reclamos Cargos Facturados	6	3	1	8	14	9	8	5	8	5	5	7	**79**
	Verificación Pagos	8	10	7	10	17	9	3	5	8	5	9	11	**102**
	Locación - Cambio de Titularidad	4	3	0	1	2	3	5	2	2	6	2	11	**41**
	Transferencia de Dominio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Tarifa Social - Tratamiento de Deuda	56	45	44	53	49	30	56	48	61	52	43	47	**584**
	Localización de Conexión	91	67	64	74	69	81	89	68	85	105	68	58	**919**
	Negociación de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Individualización de Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Clientes	1	2	3	6	2	2	7	1	2	6	3	3	**38**
	ERAS Padrón	0	0	3	0	1	0	1	0	2	1	0	1	**9**
	ERAS Medición	6	6	1	3	5	1	5	4	3	0	4	0	**38**
	ERAS Conexión	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	2	1	**8**
	ERAS Pagos	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	**6**
	ERAS Trámite Institucional	4	6	2	5	4	6	11	7	9	8	12	6	**80**
	Certicación Propter Rem	78	158	145	142	157	151	176	223	286	266	196	147	**2.125**
	Inspección Inst. Internas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Identificación de Inmueble	19	22	8	21	12	15	25	40	54	49	43	7	**315**
	TOTAL	**537**	**564**	**500**	**565**	**498**	**484**	**580**	**549**	**718**	**667**	**553**	**565**	**6.780**
TOTAL TRAMITES RESUELTOS (B)		**700**	**728**	**674**	**792**	**697**	**747**	**864**	**755**	**931**	**903**	**720**	**706**	**9.217**

TOTAL DIRECCION (A + B)	**4.003**	**3.875**	**3.756**	**3.452**	**3.348**	**130.177**	**145.400**	**140.501**	**140.420**	**145.101**	**127.173**	**133.470**	**980.676**
TOTAL TRAMITES INGRESADOS NETOS	**727**	**780**	**675**	**754**	**733**	**767**	**878**	**812**	**927**	**907**	**748**	**798**	**9.506**
Tiempo de Resolución Promedio (días)	**6,7**	**5,6**	**8,6**	**7,4**	**5,2**	**5,7**	**5,6**	**5,5**	**2,9**	**861,7**	**6,2**	**6,0**	**89,7**

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcios + Planos

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: SUR ESTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	5	10	5	2	4	2	1	3	3	5	3	2	**45**
	Cobro Indebido	1	0	1	0	1	3	1	0	4	2	0	2	**15**
	Pagos Duplicados	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
	Reiteración Errores de Factura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Bloqueo de Interes	969	569	352	679	352	480	596	419	702	470	345	340	**6.273**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	0	2	2	3	2	11	1	14	4	0	0	3	**42**
	Modificación de plan de pagos	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	**4**
	Venta de Servicios Eventuales	33	34	28	47	27	28	45	34	40	33	26	23	**398**
	Corte de Servicio Erróneo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo por Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Remesas de Pago	22	28	25	17	8	21	22	13	18	9	3	2	**188**
	Generación Plan de Pagos	171	188	130	114	150	1.431	2.231	1.866	1.776	1.974	1.656	1.593	**13.280**
	Cartas a Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	6.613	6.613	6.027	6.147	7.031	5.647	5.729	
	TOTAL	**1.206**	**832**	**543**	**863**	**545**	**8.589**	**9.510**	**8.376**	**8.695**	**9.524**	**7.680**	**7.694**	**64.057**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	1.254	957	678	625	616	3.655	4.540	3.999	3.927	3.866	4.993	4.534	**33.644**
	Estado de Cuenta	1.004	906	602	545	504	12.329	13.708	12.272	13.146	13.462	10.042	11.396	**89.916**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	131.645	143.415	147.653	144.198	147.756	124.457	131.780	**970.904**
	Estado de Cuenta Pagadero	433	701	300	377	171	4.736	5.599	4.813	4.774	5.175	4.630	4.314	**36.023**
	Persona de Contacto	0	1	1	33	1	3	0	1	0	0	4	1	**45**
	Bloqueo de Reclamación	11	12	11	6	12	8	6	4	3	4	2	4	**83**
	ABM Débito Automático	444	328	298	282	367	359	363	376	321	384	350	291	**4.163**
	Concurso, Quiebra y Subasta	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Propter Rem	0	0	0	3	0	24	58	39	57	71	25	72	**349**
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	5	34	48	53	53	83	89	55	44	58	38	27	**587**
	Factura Digital	0	0	0	135	1	4.332	5.331	4.819	4.576	4.601	6.392	5.919	**36.106**
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Libro ERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**3.151**	**2.939**	**1.938**	**2.060**	**1.725**	**157.174**	**173.109**	**174.031**	**171.046**	**175.377**	**150.933**	**158.338**	**1.171.821**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	1.328	1.228	925	959	1.026	17.953	20.618	20.836	21.159	20.868	17.262	18.313	**142.475**
	Cambio de titularidad	103	61	46	63	45	51	73	36	50	33	34	32	**627**
	Consulta Débito Automático	15	8	17	15	16	29	28	19	13	17	19	24	**220**
	Consorcio	1	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	**9**
	Consultas de conexión	94	87	63	52	78	66	78	50	54	108	53	49	**832**
	Consulta de pagos	308	325	198	168	194	5.175	6.278	6.383	6.375	6.571	5.987	6.021	**43.983**
	Consultas SISEME	4	5	4	7	7	4	5	4	2	10	7	6	**65**
	Desvío Postal	11	6	7	0	6	4	14	5	4	3	2	3	**65**
	Facturación General	23	53	35	16	24	11.048	12.352	12.797	12.920	12.581	9.686	11.054	**82.589**
	Consultas en general	69	63	26	42	65	83	89	89	41	51	41	36	**695**
	Medición General	45	53	59	50	58	73	89	77	90	77	43	42	**756**
	Consultas oficina virtual	585	486	429	475	478	1.380	1.565	1.337	1.586	1.395	1.367	1.030	**12.113**
	Parámetros de Facturación	63	66	32	63	52	36	37	24	13	16	11	8	**421**
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: SUR ESTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	No recepción de factura	7	11	9	8	3	4	10	13	9	6	12	8	**100**
	Planos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficio de Tarifa Social	111	89	42	41	38	64	105	74	33	54	41	31	**723**
	Agregado Texto en OdeS	5	10	5	8	9	3	8	6	6	5	1	6	**72**
	Nota Técnica	72	79	59	46	76	103	90	1	1	0	1	1	**529**
	Certificado de Factibilidad	4	8	3	11	5	9	5	3	4	10	9	4	**75**
	RANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modificación Tarifaria	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	**6**
	Subsidio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
	TOTAL	**1.520**	**1.414**	**1.034**	**1.065**	**1.154**	**18.138**	**20.827**	**20.920**	**21.203**	**20.937**	**17.314**	**18.355**	**143.881**
Cobros en Caja Distrito // Cobros por Tarjeta (On line) CAT		566	412	141	867	57	324	326	51	539	248	36	99	**3.666**
TOTAL CONTACTOS (A)		**6.443**	**5.597**	**3.656**	**4.855**	**3.481**	**184.225**	**203.772**	**203.378**	**201.483**	**206.086**	**175.963**	**184.486**	**1.383.425**
Trámites con resolución diferida														
SERVICIO MEDIDO	Asignación de Medidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verificación - Reparación Pérdidas Internas	91	107	104	143	123	114	130	126	131	143	100	76	**1.388**
	Inspección de Medidores	243	217	193	267	221	252	226	228	252	298	220	158	**2.775**
	SOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalación Medidores	31	22	25	15	25	5	24	19	22	28	14	20	**250**
	Resol. 41/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**365**	**346**	**322**	**425**	**369**	**371**	**380**	**373**	**405**	**469**	**334**	**254**	**4.413**
RENTA FIJA	Verificación Parámetros Facturación	4	4	6	12	9	11	2	0	3	12	8	0	**71**
	Recategorización Cocheras	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	**5**
	Unificación Complementaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modificación Parcelaria - Sub//Anex//APIC	6	3	3	1	2	5	1	2	7	4	9	0	**43**
	Subdivisión // Rectificación PH	8	10	5	8	6	10	8	10	10	18	8	8	**109**
	Solicitud Cargo por Construcción	0	1	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	**7**
	Reclamo Cargo por Construcción	4	6	2	5	2	2	5	3	6	6	1	1	**43**
	Independización de Facturas	4	1	2	1	2	4	3	4	3	3	5	2	**34**
	Operativo Post GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rectificación Dirección Inmuebles	8	5	9	8	12	5	7	7	5	13	4	4	**87**
	Solicitud Modificación de Parámetros	15	14	6	14	17	16	16	14	15	14	11	6	**158**
	TOTAL	**50**	**45**	**33**	**51**	**52**	**54**	**42**	**40**	**51**	**71**	**46**	**22**	**557**
	Solicitud Conexiones Agua	11	11	11	30	21	21	16	24	22	35	22	12	**236**
	Solicitud Conexiones Cloacas	19	22	11	17	11	27	25	22	21	29	26	16	**246**
	Solicitud Retiro Conexión Agua	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	**3**
	Solicitud Retiro Conexión Cloacas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Solicitud Desconexión	0	3	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	**10**
	Solicitud Reconexión	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Solicitud descuento T. Social	37	27	44	28	45	87	71	83	53	35	50	36	**596**
	Solic. Modif. de Dir. Inmueble	8	4	2	3	5	5	6	2	3	4	2	8	**52**
	Facturación a Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Facturación Braile	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	**5**
	Reclamo Alta Débito Pendiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
	Oficios Judiciales Area Servida	8	22	24	46	19	33	20	14	32	25	14	32	**289**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: SUR ESTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTROS	Oficios Judiciales Fuera Area servida	0	0	0	1	2	2	1	3	1	0	1	0	**11**
	No Recepción Facturas (Distrito)	23	16	18	16	9	8	8	6	4	9	13	21	**151**
	No Recepción Facturas (Correo)	88	90	57	70	42	23	27	43	30	48	57	102	**677**
	Reclamo Aviso de Corte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Exención de Pago	3	0	3	2	0	3	0	0	0	0	1	2	**14**
	Reclamos Cargos Facturados	12	16	12	12	15	17	20	20	23	22	21	22	**212**
	Verificación Pagos	11	12	4	4	15	6	3	15	6	12	7	10	**105**
	Locación - Cambio de Titularidad	5	2	2	3	1	6	1	0	2	2	6	2	**32**
	Transferencia de Dominio	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	**3**
	Tarifa Social - Tratamiento de Deuda	131	112	100	96	107	133	142	111	119	94	107	124	**1.376**
	Localización de Conexión	85	70	45	66	74	69	66	64	79	96	62	57	**833**
	Negociación de Deuda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**3**
	Individualización de Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Clientes	0	3	2	7	1	3	1	2	3	2	0	4	**28**
	ERAS Padrón	0	0	1	1	2	3	1	0	2	0	0	0	**10**
	ERAS Medición	7	12	12	7	10	8	6	9	8	13	4	15	**111**
	ERAS Conexión	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	1	0	**7**
	ERAS Pagos	2	1	1	1	1	1	0	1	0	2	2	2	**14**
	ERAS Trámite Institucional	0	10	4	7	9	9	5	6	9	11	4	0	**74**
	Certicación Propter Rem	171	186	228	206	241	215	240	324	415	383	331	183	**3.123**
	Inspección Inst. Internas	0	1	0	0	0	1	3	0	2	0	0	2	**9**
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Identificación de Inmueble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**622**	**625**	**583**	**625**	**634**	**682**	**665**	**754**	**835**	**825**	**731**	**651**	**8.232**
TOTAL TRAMITES RESUELTOS (B)		**1.037**	**1.016**	**938**	**1.101**	**1.055**	**1.107**	**1.087**	**1.167**	**1.291**	**1.365**	**1.111**	**927**	**13.202**

TOTAL DIRECCION (A + B)	**7.480**	**6.613**	**4.594**	**5.956**	**4.536**	**185.332**	**204.859**	**204.545**	**202.774**	**207.451**	**177.074**	**185.413**	**1.396.627**
TOTAL TRAMITES INGRESADOS NETOS	**1.129**	**1.084**	**1.042**	**1.166**	**1.147**	**1.195**	**1.272**	**1.288**	**1.463**	**1.408**	**1.179**	**1.167**	**14.540**
Tiempo de Resolución Promedio (días)	**6,0**	**4,6**	**5,1**	**5,3**	**4,9**	**5,0**	**4,4**	**5,0**	**2,6**	**5,6**	**5,1**	**4,6**	**4,8**

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcios + Planos

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: OESTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	7	0	8	10	9	19	15	12	7	0	0	1	**88**
	Cobro Indebido	0	0	1	3	0	0	2	1	2	2	2	1	**14**
	Pagos Duplicados	6	7	9	5	3	7	6	6	3	0	5	0	**57**
	Reiteración Errores de Factura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Bloqueo de Interes	897	604	860	552	525	551	453	508	739	453	619	420	**7.181**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	10	2	0	1	156	2	1	1	0	38	58	2	**271**
	Modificación de plan de pagos	1	2	0	0	3	2	1	2	0	1	1	2	**15**
	Venta de Servicios Eventuales	31	3	1	10	7	3	5	5	19	8	3	4	**99**
	Corte de Servicio Erróneo	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	**6**
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo por Intereses	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Remesas de Pago	9	8	10	12	10	8	25	16	25	17	6	7	**153**
	Generación Plan de Pagos	127	133	189	175	121	1.866	2.937	2.330	2.277	2.709	2.321	2.001	**17.186**
	Cartas a Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	13.258	13.258	11.923	12.217	15.145	11.591	11.243	
	TOTAL	**1.088**	**759**	**1.079**	**768**	**834**	**15.717**	**16.704**	**14.805**	**15.290**	**18.374**	**14.607**	**13.681**	**113.706**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	702	690	627	642	478	6.356	8.240	6.771	6.388	7.101	10.122	8.020	**56.137**
	Estado de Cuenta	73	61	125	72	50	17.541	20.709	17.924	19.666	21.003	15.636	16.450	**129.310**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	259.099	277.628	282.217	281.413	296.594	253.796	259.616	**1.910.363**
	Estado de Cuenta Pagadero	636	511	699	587	385	7.866	9.297	8.058	8.180	9.730	8.028	7.310	**61.287**
	Persona de Contacto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
	Bloqueo de Reclamación	9	10	4	2	4	7	2	1	8	4	8	9	**68**
	ABM Débito Automático	541	611	628	683	681	607	788	772	642	659	670	624	**7.906**
	Concurso, Quiebra y Subasta	4	3	3	1	3	2	1	5	10	8	6	6	**52**
	Propter Rem	2	20	8	7	8	41	31	76	83	105	104	71	**556**
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	105	147	103	125	188	224	269	272	122	121	210	173	**2.059**
	Factura Digital	1	0	1	0	0	8.893	11.171	9.429	8.909	9.781	14.522	11.640	**74.347**
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Libro ERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**2.073**	**2.053**	**2.198**	**2.119**	**1.797**	**300.636**	**328.136**	**325.525**	**325.421**	**345.106**	**303.103**	**303.919**	**2.242.086**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	2.616	2.177	2.155	2.456	2.621	29.665	33.541	33.979	34.194	34.126	29.119	29.150	**235.799**
	Cambio de titularidad	334	304	179	243	189	202	200	212	251	250	208	166	**2.738**
	Consulta Débito Automático	68	77	50	97	69	56	51	67	98	102	120	80	**935**
	Consorcio	1	8	3	5	0	0	4	1	1	0	1	3	**27**
	Consultas de conexión	138	118	129	122	103	87	81	117	120	108	94	69	**1.286**
	Consulta de pagos	1.009	799	847	979	1.090	7.531	8.857	9.057	9.057	9.731	8.897	8.643	**66.497**
	Consultas SISEME	40	10	8	11	5	3	5	5	3	8	3	6	**107**
	Desvío Postal	14	24	19	18	15	14	8	11	14	12	7	4	**160**
	Facturación General	176	138	151	180	210	19.301	21.379	22.048	22.480	21.704	17.298	18.367	**143.432**
	Consultas en general	344	238	260	278	374	373	362	326	296	374	383	310	**3.918**
	Medición General	91	111	86	115	94	116	102	107	98	74	54	61	**1.109**
	Consultas oficina virtual	398	335	420	402	463	1.967	2.427	2.005	1.749	1.716	1.971	1.426	**15.279**
	Parámetros de Facturación	2	14	3	5	5	10	45	9	12	34	74	5	**218**
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: OESTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	No recepción de factura	1	1	0	1	4	5	20	14	15	13	9	10	**93**
	Planos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficio de Tarifa Social	116	123	205	149	180	255	238	231	193	187	160	158	**2.195**
	Agregado Texto en OdeS	62	54	50	48	54	53	54	47	42	49	50	57	**620**
	Nota Técnica	1	0	0	1	2	2	4	1	1	0	1	0	**13**
	Certificado de Factibilidad	7	11	18	12	10	6	11	7	4	9	5	7	**107**
	RANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modificación Tarifaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	**3**
	TOTAL	**2.802**	**2.365**	**2.428**	**2.666**	**2.867**	**29.981**	**33.848**	**34.267**	**34.434**	**34.371**	**29.336**	**29.372**	**238.737**
Cobros en Caja Distrito // Cobros por Tarjeta (On line) CAT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CONTACTOS (A)		**5.963**	**5.177**	**5.705**	**5.553**	**5.498**	**346.334**	**378.688**	**374.597**	**375.145**	**397.851**	**347.046**	**346.972**	**2.594.529**
Trámites con resolución diferida														
SERVICIO MEDIDO	Asignación de Medidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verificación - Reparación Pérdidas Internas	146	105	121	145	162	182	207	194	193	167	127	112	**1.861**
	Inspección de Medidores	247	186	185	264	221	276	265	221	263	210	228	170	**2.736**
	SOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalación Medidores	49	22	26	28	18	18	49	40	37	39	27	40	**393**
	Resol. 41/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**442**	**313**	**332**	**437**	**401**	**476**	**521**	**455**	**493**	**416**	**382**	**322**	**4.990**
RENTA FIJA	Verificación Parámetros Facturación	5	5	4	8	3	1	0	1	3	2	3	3	**38**
	Recategorización Cocheras	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
	Unificación Complementaria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Modificación Parcelaria - Sub//Anex//APIC	2	2	4	4	6	1	8	3	9	7	7	6	**59**
	Subdivisión // Rectificación PH	31	15	24	14	11	17	16	9	23	14	16	9	**199**
	Solicitud Cargo por Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
	Reclamo Cargo por Construcción	9	2	3	0	1	1	1	4	3	2	5	1	**32**
	Independización de Facturas	4	3	2	6	4	4	6	3	6	5	3	3	**49**
	Operativo Post GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rectificación Dirección Inmuebles	2	3	3	5	7	1	5	4	3	3	7	6	**49**
	Solicitud Modificación de Parámetros	30	19	10	13	13	22	12	23	28	22	17	23	**232**
	TOTAL	**83**	**49**	**50**	**50**	**46**	**47**	**48**	**48**	**76**	**55**	**58**	**51**	**661**
	Solicitud Conexiones Agua	38	21	33	30	40	25	27	24	26	34	32	23	**353**
	Solicitud Conexiones Cloacas	33	34	33	33	27	36	37	34	46	53	47	25	**438**
	Solicitud Retiro Conexión Agua	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	**4**
	Solicitud Retiro Conexión Cloacas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
	Solicitud Desconexión	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	4	**12**
	Solicitud Reconexión	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
	Solicitud descuento T. Social	24	16	27	15	29	25	23	20	20	17	11	20	**247**
	Solic. Modif. de Dir. Inmueble	33	27	17	32	20	13	37	30	26	31	22	17	**305**
	Facturación a Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Facturación Braile	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
	Reclamo Alta Débito Pendiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
	Oficios Judiciales Area Servida	10	29	21	33	32	39	39	23	44	29	34	22	**355**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

DIRECCION REGIONAL: OESTE

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTROS	Oficios Judiciales Fuera Area servida	2	2	3	1	3	3	2	1	1	1	1	3	**23**
	No Recepción Facturas (Distrito)	67	40	49	76	52	62	62	56	95	90	113	40	**802**
	No Recepción Facturas (Correo)	361	260	274	417	286	342	381	331	487	535	461	220	**4.355**
	Reclamo Aviso de Corte	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	**4**
	Exención de Pago	0	1	2	1	6	0	5	0	6	0	0	2	**23**
	Reclamos Cargos Facturados	16	11	13	7	12	12	14	18	22	18	14	7	**164**
	Verificación Pagos	14	21	10	32	27	6	22	21	12	27	25	16	**233**
	Locación - Cambio de Titularidad	2	2	2	5	1	9	3	6	3	5	2	5	**45**
	Transferencia de Dominio	93	28	44	74	37	47	46	55	43	50	49	68	**634**
	Tarifa Social - Tratamiento de Deuda	64	56	93	72	60	85	99	113	124	109	112	67	**1.054**
	Localización de Conexión	114	97	80	96	61	92	109	83	113	88	77	89	**1.099**
	Negociación de Deuda	1	0	0	1	0	3	1	1	0	1	0	0	**8**
	Individualización de Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Clientes	11	10	6	25	13	18	15	20	18	21	11	11	**179**
	ERAS Padrón	3	0	4	2	3	2	2	0	1	1	1	3	**22**
	ERAS Medición	3	8	9	6	3	13	6	10	7	5	9	9	**88**
	ERAS Conexión	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	**6**
	ERAS Pagos	1	1	1	2	1	0	1	1	2	0	0	4	**14**
	ERAS Trámite Institucional	9	12	2	5	14	19	9	5	25	17	16	12	**145**
	Certicación Propter Rem	238	250	238	308	326	360	326	495	681	641	601	268	**4.732**
	Inspección Inst. Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Identificación de Inmueble	3	13	9	7	9	12	5	21	7	10	10	3	**109**
	TOTAL	1.143	940	971	1.282	1.065	1.225	1.273	1.372	1.814	1.784	1.649	939	15.457
TOTAL TRAMITES RESUELTOS (B)		**1.668**	**1.302**	**1.353**	**1.769**	**1.512**	**1.748**	**1.842**	**1.875**	**2.383**	**2.255**	**2.089**	**1.312**	**21.108**

TOTAL DIRECCION (A + B)	**7.631**	**6.479**	**7.058**	**7.322**	**7.010**	**348.082**	**380.530**	**376.472**	**377.528**	**400.106**	**349.135**	**348.284**	**2.615.637**
TOTAL TRAMITES INGRESADOS NETOS	**1.797**	**1.489**	**1.595**	**1.898**	**1.707**	**1.883**	**2.026**	**2.089**	**2.578**	**2.517**	**2.347**	**2.047**	**23.973**
Tiempo de Resolución Promedio (días)	**8,1**	**7,1**	**8,3**	**7,4**	**7,5**	**6,1**	**7,8**	**6,4**	**3,1**	**5,6**	**6,3**	**6,3**	**6,5**

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcios + Planos

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

TOTAL CONCESIÓN (SIN NUEVAS AREAS)

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	53	54	50	63	66	72	63	48	76	76	51	34	**706**
	Cobro Indebido	7	4	6	7	8	13	18	12	20	24	9	18	**146**
	Pagos Duplicados	689	557	513	476	509	548	876	717	726	528	345	480	**6.964**
	Reiteración Errores de Factura	1	1	3	2	0	0	1	1	0	3	1	3	**16**
	Bloqueo de Interes	5.681	4.058	4.004	3.587	2.836	2.864	3.504	3.136	4.136	3.714	3.159	2.873	**43.552**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	14	6	5	8	161	15	8	17	10	39	60	13	**356**
	Modificación de plan de pagos	6	2	1	1	5	5	6	6	5	3	6	5	**51**
	Venta de Servicios Eventuales	248	154	124	162	133	128	166	173	201	196	140	142	**1.967**
	Corte de Servicio Erróneo	4	4	8	4	4	11	14	18	25	45	29	31	**197**
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo por Intereses	5	2	2	1	3	3	1	3	0	3	3	6	**32**
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Remesas de Pago	273	223	226	276	261	265	372	264	336	287	195	183	**3.161**
	Generación Plan de Pagos	1.238	1.139	1.117	1.021	1.068	9.164	13.527	11.089	11.020	12.913	10.422	9.670	**83.388**
	Cartas a Usuarios	0	0	1	0	2	8	1	5	2	5	6	1	**31**
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	57.185	57.185	52.361	51.750	61.532	47.879	49.226	**377.118**
	TOTAL	**8.219**	**6.204**	**6.060**	**5.608**	**5.056**	**70.281**	**75.742**	**67.850**	**68.307**	**79.368**	**62.305**	**62.685**	**517.685**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	5.592	4.770	4.121	4.232	3.461	29.439	35.529	30.820	30.584	32.171	40.502	35.893	**257.114**
	Estado de Cuenta	9.642	8.217	7.740	8.585	8.715	88.046	101.156	89.780	96.524	100.113	74.265	82.099	**674.882**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	1.157.617	1.259.113	1.250.348	1.254.837	1.278.469	1.099.678	1.157.595	**8.457.657**
	Estado de Cuenta Pagadero	7.219	5.635	5.365	4.876	4.330	36.509	43.218	38.083	37.793	42.655	36.062	34.927	**296.672**
	Persona de Contacto	2	12	8	40	3	3	5	3	4	10	14	3	**107**
	Bloqueo de Reclamación	849	785	906	1.021	949	837	843	912	1.096	949	1.024	983	**11.154**
	ABM Débito Automático	6.144	5.306	5.014	5.442	5.813	5.312	6.190	6.439	6.085	5.968	4.695	5.378	**67.786**
	Concurso, Quiebra y Subasta	16	6	9	8	9	6	4	9	17	16	10	11	**121**
	Propter Rem	33	78	26	47	78	446	571	1.973	1.920	1.785	1.548	1.718	**10.223**
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	958	1.058	918	1.109	1.379	1.547	1.573	815	617	571	501	474	**11.520**
	Factura Digital	2	1	4	135	1	37.215	44.596	38.581	37.106	39.307	53.445	47.746	**298.139**
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Libro ERAS	33	14	11	5	3	7	6	2	9	8	2	2	**102**
	TOTAL	**30.490**	**25.882**	**24.122**	**25.500**	**24.741**	**1.356.984**	**1.492.804**	**1.457.765**	**1.466.592**	**1.502.022**	**1.311.746**	**1.366.829**	**10.085.477**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	54.757	44.136	39.694	46.095	46.319	163.649	187.190	185.414	190.693	192.317	161.680	169.601	**1.481.545**
	Cambio de titularidad	2.214	1.716	1.355	1.669	1.624	1.465	1.743	1.692	1.723	1.883	1.502	1.301	**19.887**
	Consulta Débito Automático	764	712	571	702	772	649	769	783	843	1.087	765	770	**9.187**
	Consorcio	205	160	167	152	142	114	166	149	151	187	142	165	**1.900**
	Consultas de conexión	2.340	1.846	1.691	1.569	1.595	1.551	1.907	1.840	2.047	2.253	1.906	1.818	**22.363**
	Consulta de pagos	31.852	24.838	21.343	25.077	25.941	55.762	65.392	62.764	67.129	71.259	62.877	62.453	**576.687**
	Consultas SISEME	56	24	26	33	32	18	19	20	19	32	15	23	**317**
	Desvío Postal	152	125	121	123	94	98	138	135	121	108	92	86	**1.393**
	Facturación General	4.007	3.245	3.335	4.690	3.737	85.065	95.201	99.028	98.696	95.603	74.915	85.154	**652.676**
	Consultas en general	4.328	3.331	3.252	3.057	3.230	3.223	4.229	3.923	4.076	4.855	5.181	5.466	**48.151**
	Medición General	2.563	2.595	2.979	3.413	3.119	3.131	3.115	2.800	3.075	2.963	2.447	2.220	**34.420**
	Consultas oficina virtual	5.403	4.800	4.169	4.739	5.263	11.673	13.522	11.386	11.980	11.298	11.085	9.523	**104.841**
	Parámetros de Facturación	280	265	188	256	225	237	304	221	193	187	209	116	**2.681**
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

TOTAL CONCESIÓN (SIN NUEVAS AREAS)

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	No recepción de factura	199	174	199	262	186	129	151	208	166	158	213	189	**2.234**
	Planos	394	305	298	353	359	534	534	465	474	444	331	317	**4.808**
	Beneficio de Tarifa Social	5.016	4.236	3.857	4.129	3.571	3.962	4.374	3.806	4.179	3.891	3.257	3.216	**47.494**
	Agregado Texto en OdeS	294	260	294	294	318	290	365	296	277	334	263	276	**3.561**
	Nota Técnica	107	119	146	107	174	201	170	69	105	77	50	56	**1.381**
	Certificado de Factibilidad	108	93	100	97	91	84	109	111	117	127	259	205	**1.501**
	RANT	82	40	21	17	15	12	8	13	4	1	0	2	**215**
	Modificación Tarifaria	101	107	126	117	82	66	122	113	85	22	7	25	**973**
	Subsidio	55	16	10	39	3	4	4	7	3	3	1	0	**145**
	TOTAL	**60.520**	**49.007**	**44.248**	**50.895**	**50.573**	**168.268**	**192.342**	**189.829**	**195.463**	**196.772**	**165.517**	**173.381**	**1.536.815**
Cobros en Caja Distrito // Cobros por Tarjeta (On line) CAT		11.628	7.626	6.255	8.484	7.693	6.969	8.603	6.818	7.576	8.741	7.307	7.227	**94.927**
TOTAL CONTACTOS (A)		**110.857**	**88.719**	**80.685**	**90.487**	**88.063**	**1.602.502**	**1.769.491**	**1.722.262**	**1.737.938**	**1.786.903**	**1.546.875**	**1.610.122**	**12.234.904**
Trámites con resolución diferida														
SERVICIO MEDIDO	Asignación de Medidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verificación - Reparación Pérdidas Internas	720	631	788	997	947	977	1.175	983	1.052	1.081	704	530	**10.585**
	Inspección de Medidores	1.184	1.137	1.245	1.520	1.255	1.420	1.441	1.209	1.411	1.305	1.175	837	**15.139**
	SOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalación Medidores	163	119	108	104	106	88	146	127	135	138	91	132	**1.457**
	Resol. 41/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**2.067**	**1.887**	**2.141**	**2.621**	**2.308**	**2.485**	**2.762**	**2.319**	**2.598**	**2.524**	**1.970**	**1.499**	**27.181**
RENTA FIJA	Verificación Parámetros Facturación	23	16	20	25	17	15	9	7	12	27	18	6	**195**
	Recategorización Cocheras	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	**8**
	Unificación Complementaria	4	3	1	5	6	2	4	2	3	4	2	3	**39**
	Modificación Parcelaria - Sub//Anex//APIC	15	17	27	18	22	27	20	24	36	36	35	23	**300**
	Subdivisión // Rectificación PH	69	62	61	71	59	62	70	69	100	90	62	61	**836**
	Solicitud Cargo por Construcción	0	2	0	1	3	4	0	2	4	3	1	0	**20**
	Reclamo Cargo por Construcción	21	16	12	7	12	13	16	15	24	12	14	7	**169**
	Independización de Facturas	61	55	56	64	48	70	76	103	81	63	63	53	**793**
	Operativo Post GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rectificación Dirección Inmuebles	37	27	32	27	32	15	31	30	25	45	22	18	**341**
	Solicitud Modificación de Parámetros	185	141	137	151	137	162	169	143	170	143	133	161	**1.832**
	TOTAL	**416**	**340**	**346**	**370**	**337**	**371**	**395**	**396**	**455**	**423**	**350**	**334**	**4.533**
	Solicitud Conexiones Agua	200	160	173	218	190	180	198	207	211	278	259	163	**2.437**
	Solicitud Conexiones Cloacas	191	156	154	159	130	165	200	184	196	237	211	151	**2.134**
	Solicitud Retiro Conexión Agua	6	5	9	5	5	4	2	5	6	11	2	5	**65**
	Solicitud Retiro Conexión Cloacas	8	1	1	3	1	2	0	1	1	1	2	1	**22**
	Solicitud Desconexión	8	11	6	7	6	5	10	11	3	18	6	13	**104**
	Solicitud Reconexión	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	**7**
	Solicitud descuento T. Social	437	445	377	395	377	589	427	334	316	196	207	559	**4.659**
	Solic. Modif. de Dir. Inmueble	80	75	58	93	62	52	97	85	85	83	66	75	**911**
	Facturación a Consorcio	0	3	3	0	0	0	9	3	5	1	1	1	**26**
	Facturación Braile	1	3	1	0	2	2	2	3	3	4	2	1	**24**
	Reclamo Alta Débito Pendiente	1	0	1	0	2	0	0	0	0	3	1	0	**8**
	Oficios Judiciales Area Servida	92	179	255	305	265	287	242	182	317	277	238	231	**2.870**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL Nº 52**

TOTAL CONCESIÓN (SIN NUEVAS AREAS)

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTROS	Oficios Judiciales Fuera Area servida	2	4	14	12	13	12	7	8	9	12	7	10	**110**
	No Recepción Facturas (Distrito)	206	169	155	160	143	120	129	100	124	150	170	154	**1.780**
	No Recepción Facturas (Correo)	897	726	627	810	689	600	801	673	943	1.008	974	744	**9.492**
	Reclamo Aviso de Corte	0	0	0	0	7	1	1	1	1	3	1	0	**15**
	Exención de Pago	8	5	6	11	10	7	6	6	14	7	3	5	**88**
	Reclamos Cargos Facturados	106	88	91	98	128	124	122	159	154	143	122	102	**1.437**
	Verificación Pagos	80	103	62	71	110	79	67	86	76	88	77	84	**983**
	Locación - Cambio de Titularidad	37	27	25	36	17	36	29	47	35	34	31	40	**394**
	Transferencia de Dominio	93	31	49	82	41	55	52	60	48	61	53	74	**699**
	Tarifa Social - Tratamiento de Deuda	514	482	540	507	499	526	630	613	648	533	558	502	**6.552**
	Localización de Conexión	428	338	298	355	310	356	408	322	402	456	316	317	**4.306**
	Negociación de Deuda	16	1	3	4	5	9	1	2	2	2	3	2	**50**
	Individualización de Consorcio	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	ERAS Clientes	48	39	40	66	49	62	60	51	72	48	43	50	**628**
	ERAS Padrón	5	2	10	5	9	11	7	0	10	6	3	8	**76**
	ERAS Medición	38	55	51	58	57	77	56	67	45	56	43	52	**655**
	ERAS Conexión	3	3	2	9	2	4	8	10	3	4	5	7	**60**
	ERAS Pagos	5	3	5	5	3	2	4	5	4	7	3	8	**54**
	ERAS Trámite Institucional	16	29	12	22	34	41	30	26	51	41	40	26	**368**
	Certicación Propter Rem	2.132	2.269	2.188	2.629	2.782	2.954	3.386	7.856	10.123	9.981	8.530	2.531	**57.361**
	Inspección Inst. Internas	0	3	2	0	1	1	3	0	3	2	0	2	**17**
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Identificación de Inmueble	31	35	22	33	21	31	35	69	83	66	59	13	**498**
	TOTAL	**5.690**	**5.451**	**5.240**	**6.158**	**5.972**	**6.396**	**7.030**	**11.176**	**13.994**	**13.817**	**12.037**	**5.931**	**98.892**
TOTAL TRAMITES RESUELTOS (B)		**8.173**	**7.678**	**7.727**	**9.149**	**8.617**	**9.252**	**10.187**	**13.891**	**17.047**	**16.764**	**14.357**	**7.764**	**130.606**

TOTAL DIRECCION (A + B)	**119.030**	**96.397**	**88.412**	**99.636**	**96.680**	**1.611.754**	**1.779.678**	**1.736.153**	**1.754.985**	**1.803.667**	**1.561.232**	**1.617.886**	**12.365.510**
TOTAL TRAMITES INGRESADOS NETOS	**8.860**	**8.307**	**8.521**	**9.619**	**9.689**	**9.740**	**10.895**	**15.776**	**17.992**	**17.637**	**15.298**	**15.175**	**147.509**
Tiempo de Resolución Promedio (días)	**7,0**	**6,3**	**7,1**	**6,5**	**6,4**	**6,3**	**6,6**	**6,6**	**3,1**	**129,2**	**6,8**	**6,7**	**21,9**

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcios + Planos

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL N° 52**

UNIDADES MOVILES DE ASISTENCIA

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cobro Indebido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pagos Duplicados	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	Reiteración Errores de Factura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bloqueo de Interes	32	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**34**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modificación de plan de pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Venta de Servicios Eventuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Corte de Servicio Erróneo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reclamo por Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Remesas de Pago	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	**5**
	Generación Plan de Pagos	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
	Cartas a Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**38**	**0**	**1**	**0**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
	Estado de Cuenta	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Estado de Cuenta Pagadero	127	0	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	**138**
	Persona de Contacto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bloqueo de Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABM Débito Automático	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	**8**
	Concurso, Quiebra y Subasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Propter Rem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	30	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	**42**
	Factura Digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Libro ERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**179**	**0**	**1**	**0**	**10**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**21**
	Cambio de titularidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consulta Débito Automático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consultas de conexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consulta de pagos	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**11**
	Consultas SISEME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
	Desvío Postal	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
	Facturación General	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	Consultas en general	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	Medición General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consultas oficina virtual	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
	Parámetros de Facturación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES	Informe de Niveles de Servicio
aysa		Año 2025
	Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	INS-IG-USU-00 / Ex PL N° 52

UNIDADES MOVILES DE ASISTENCIA

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	No recepción de factura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beneficio de Tarifa Social	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Agregado Texto en OdeS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Nota Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Certificado de Factibilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modificación Tarifaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	22	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	24
TOTAL CONTACTOS (A)		239	0	2	0	13	20	0	0	0	0	0	0	274

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcios + Planos

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio	
Año 2025	
INS-IG-USU-00	**Ex PL N° 52**

RESUMEN CONCESION	Atención Telefónica	Atención Personalizada		Total de Contactos	
		TOTAL CONCESIÓN (SIN NUEVAS AREAS)	NUEVAS AREAS		
Resolución Inmediata	452.553	431.530	32.560	916.643	
Resolución Diferida (*)	23.650	137.768	8.042	145.810	*
Cobros en Caja o Tarjeta	80.998	13.929	8.220	103.147	
Sub Total Reclamos Com. + Cobros	**557.201**	**583.227**	**48.822**	**1.165.600**	*
Reclamos Técnicos	446.561			446.561	
Total de Reclamos Com.+Cobros+Tec.	**1.005.515**	**583.227**	**48.822**	**1.612.161**	*

* Los contactos de resolución diferida son contabilizados en su totalidad como contactos personales. Ya que los contactos telefónicos de esta índole son redireccionados a las regiones.

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL N° 52**

NUEVAS AREAS

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Contactos con resolución inmediata														
PAGOS	Aplicación de Pagos	17	7	9	9	23	11	5	4	9	10	3	2	**109**
	Cobro Indebido	1	7	0	2	1	3	4	1	8	5	0	3	**35**
	Pagos Duplicados	1	1	1	3	6	5	4	4	3	2	1	1	**32**
	Reiteración Errores de Factura	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	**10**
	Bloqueo de Interes	203	318	249	204	145	125	162	140	138	196	120	130	**2.130**
	Eximición Gastos Aviso de Corte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Modificación de plan de pagos	1	0	0	0	2	1	2	0	0	2	1	2	**11**
	Venta de Servicios Eventuales	29	39	29	32	34	28	44	18	29	42	39	33	**396**
	Corte de Servicio Erróneo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Entidades Recaudadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo por Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Remesas de Pago	8	15	11	9	8	7	17	6	9	13	2	2	**107**
	Generación Plan de Pagos	47	85	97	120	74	49	92	96	88	131	92	101	**1.072**
	Cartas a Usuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Regularización pago contado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**307**	**472**	**396**	**379**	**293**	**229**	**330**	**269**	**287**	**404**	**261**	**275**	**3.902**
CLIENTES	Actualización de datos maestros	546	441	363	509	699	482	568	468	565	630	405	404	**6.080**
	Estado de Cuenta	249	263	185	328	205	245	220	143	184	218	128	153	**2.521**
	Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Estado de Cuenta Pagadero	247	287	167	226	113	125	120	94	139	200	99	75	**1.892**
	Persona de Contacto	0	0	0	0	0	13	1	1	1	0	0	0	**16**
	Bloqueo de Reclamación	6	5	15	11	10	7	1	3	8	11	23	18	**118**
	ABM Débito Automático	197	213	209	228	203	172	235	303	266	285	219	215	**2.745**
	Concurso, Quiebra y Subasta	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	**4**
	Propter Rem	1	0	0	0	0	3	1	0	7	12	18	11	**53**
	Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social	67	49	47	75	75	151	121	87	80	97	45	48	**942**
	Factura Digital	0	0	2	1	1	0	4	1	0	0	2	1	**12**
	Reclamo Libro de Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Libro ERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**1.313**	**1.258**	**988**	**1.379**	**1.307**	**1.199**	**1.271**	**1.101**	**1.250**	**1.453**	**939**	**925**	**14.383**
CONSULTAS	Consultas en General (*)	1.021	1.136	1.264	1.112	975	926	1.184	1.058	1.130	1.164	847	1.003	**12.820**
	Cambio de titularidad	54	106	93	109	43	35	46	33	51	34	29	29	**662**
	Consulta Débito Automático	9	5	12	11	12	12	9	13	5	13	9	15	**125**
	Consorcio	6	5	0	3	1	2	2	0	2	3	2	1	**27**
	Consultas de conexión	69	80	105	78	86	67	78	52	83	116	95	89	**998**
	Consulta de pagos	229	205	214	239	234	197	242	238	274	264	232	190	**2.758**
	Consultas SISEME	1	2	3	5	3	1	3	9	6	5	3	7	**48**
	Desvío Postal	10	18	17	32	10	16	14	16	18	16	12	13	**192**
	Facturación General	71	166	334	170	132	128	128	127	112	102	88	121	**1.679**
	Consultas en general	88	61	29	62	52	60	68	50	58	64	47	44	**683**
	Medición General	14	47	20	21	19	15	17	19	25	17	17	15	**246**
	Consultas oficina virtual	444	424	301	331	305	295	482	427	400	494	289	448	**4.640**
	Parámetros de Facturación	15	10	117	30	65	88	85	58	78	23	8	14	**591**
	Autoriz Tj Rechazada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio
Año 2025
INS-IG-USU-00 | **Ex PL N° 52**

NUEVAS AREAS

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	No recepción de factura	11	7	19	21	13	10	10	16	18	13	16	17	**171**
	Planos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Beneficio de Tarifa Social	38	21	33	28	38	47	63	85	88	62	85	60	**648**
	Agregado Texto en OdeS	79	67	69	78	30	62	50	44	77	64	60	45	**725**
	Nota Técnica	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	**3**
	Certificado de Factibilidad	4	7	2	7	4	7	8	5	4	12	7	2	**69**
	RANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
	Modificación Tarifaria	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	**5**
	Subsidio	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	**4**
	TOTAL	**1.143**	**1.231**	**1.369**	**1.227**	**1.047**	**1.044**	**1.306**	**1.193**	**1.300**	**1.302**	**1.003**	**1.110**	**14.275**
Cobros en Caja Distrito // Cobros por Tarjeta (On line) CAT		563	563	512	557	656	662	746	751	873	913	765	659	**8.220**
TOTAL CONTACTOS (A)		**3.326**	**3.524**	**3.265**	**3.542**	**3.303**	**3.134**	**3.653**	**3.314**	**3.710**	**4.072**	**2.968**	**2.969**	**40.780**
Trámites con resolución diferida														
SERVICIO MEDIDO	Asignación de Medidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Verificación - Reparación Pérdidas Internas	22	16	17	19	18	28	25	27	15	25	10	11	**233**
	Inspección de Medidores	31	24	26	28	29	53	47	32	27	26	33	37	**393**
	SOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Instalación Medidores	24	26	15	21	22	17	28	25	14	20	17	23	**252**
	Resol. 41/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	TOTAL	**77**	**66**	**58**	**68**	**69**	**98**	**100**	**84**	**56**	**71**	**60**	**71**	**878**
RENTA FIJA	Verificación Parámetros Facturación	5	16	10	6	5	6	6	3	1	3	3	14	**78**
	Recategorización Cocheras	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**
	Unificación Complementaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Modificación Parcelaria - Sub//Anex//APIC	33	8	2	6	6	3	3	3	5	7	3	15	**94**
	Subdivisión // Rectificación PH	8	4	3	6	14	10	8	12	10	7	5	4	**91**
	Solicitud Cargo por Construcción	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	**3**
	Reclamo Cargo por Construcción	0	1	0	0	2	3	1	2	0	0	1	0	**10**
	Independización de Facturas	1	1	2	3	0	1	1	2	1	0	2	0	**14**
	Operativo Post GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Rectificación Dirección Inmuebles	13	8	5	5	9	5	14	9	10	8	7	6	**99**
	Solicitud Modificación de Parámetros	18	19	11	11	12	14	8	12	12	11	10	14	**152**
	TOTAL	**79**	**57**	**33**	**39**	**48**	**44**	**41**	**43**	**39**	**36**	**31**	**53**	**543**
	Solicitud Conexiones Agua	25	37	23	30	21	24	30	26	36	35	35	26	**348**
	Solicitud Conexiones Cloacas	29	23	26	28	27	33	46	36	31	41	41	24	**385**
	Solicitud Retiro Conexión Agua	0	1	0	0	0	3	0	3	0	2	0	0	**9**
	Solicitud Retiro Conexión Cloacas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
	Solicitud Desconexión	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	2	**8**
	Solicitud Reconexión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Solicitud descuento T. Social	15	16	19	12	19	21	16	18	13	12	14	16	**191**
	Solic. Modif. de Dir. Inmueble	13	17	13	18	15	13	27	30	30	32	29	16	**253**
	Facturación a Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Facturación Braile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Reclamo Alta Débito Pendiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Oficios Judiciales Area Servida	0	9	7	12	19	10	16	10	21	16	14	16	**150**
	Oficios Judiciales Fuera Area servida	1	10	5	7	13	9	6	7	16	12	13	4	**103**
	No Recepción Facturas (Distrito)	41	36	42	58	62	53	65	57	57	54	40	41	**606**
	No Recepción Facturas (Correo)	66	84	64	44	62	56	77	83	105	89	84	47	**861**

aysa

CLASIFICACION DE LOS CONTACTOS CON LOS CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-IG-USU-00 | **Ex PL N° 52**

NUEVAS AREAS

Tipo de Contactos		Año 2025												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTROS	Reclamo Aviso de Corte	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	**3**
	Exención de Pago	1	1	2	0	0	1	3	1	1	3	1	1	**15**
	Reclamos Cargos Facturados	7	6	16	23	47	13	20	20	17	15	16	9	**209**
	Verificación Pagos	9	6	7	8	10	9	13	6	17	12	3	10	**110**
	Locación - Cambio de Titularidad	0	0	0	0	4	1	0	1	1	5	1	1	**14**
	Transferencia de Dominio	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	**6**
	Tarifa Social - Tratamiento de Deuda	36	30	46	51	71	57	86	89	80	112	69	38	**765**
	Localización de Conexión	43	45	39	40	31	46	55	42	51	77	45	44	**558**
	Negociación de Deuda	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	**4**
	Individualización de Consorcio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ERAS Clientes	3	5	1	6	1	1	2	6	4	4	1	6	**40**
	ERAS Padrón	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	**13**
	ERAS Medición	3	1	4	2	5	7	1	6	3	6	4	2	**44**
	ERAS Conexión	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	**5**
	ERAS Pagos	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	**4**
	ERAS Trámite Institucional	2	1	0	0	1	8	2	7	5	12	6	1	**45**
	Certicación Propter Rem	30	62	58	62	62	64	84	137	170	195	188	36	**1.148**
	Inspección Inst. Internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Subsidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Identificación de Inmueble	52	54	37	54	64	66	49	44	83	70	79	71	**723**
	TOTAL	**380**	**448**	**410**	**456**	**537**	**503**	**603**	**631**	**745**	**809**	**687**	**412**	**6.621**
TOTAL TRAMITES RESUELTOS (B)		**536**	**571**	**501**	**563**	**654**	**645**	**744**	**758**	**840**	**916**	**778**	**536**	**8.042**

TOTAL DIRECCION (A + B)		**3.862**	**4.095**	**3.766**	**4.105**	**3.957**	**3.779**	**4.397**	**4.072**	**4.550**	**4.988**	**3.746**	**3.505**	**48.822**
TOTAL TRAMITES INGRESADOS NETOS		**562**	**563**	**512**	**557**	**656**	**662**	**746**	**751**	**873**	**913**	**765**	**515**	**8.075**
Tiempo de Resolución Promedio (días)		**1,1**	**5,9**	**5,5**	**5,1**	**4,4**	**4,7**	**5,1**	**4,6**	**4,2**	**4,3**	**4,1**	**4,9**	**4,5**

(*) Consultas en General = Cambio de Titularidad + Consulta Débito Automático + Consulta de Conexión + Consulta de Pagos + Consulta SISEME + Desvío Postal + Facturación General + Consultas en General + Medición General + Parámetro de Facturación + Cartas + Consorcios + Planos

Contactos con resolución inmediata	Año 2025												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actualización de datos maestros					122	3	95	152	198	358	150	105	**1.183**
Agregado Texto en Orden Servicio													0
Aplicación de pagos													0
Bloqueo de Interes	5	7	3	6	11	5	9	5	4	20	8	27	**110**
Certificado de Factibilidad													0
Consulta de Pagos													0
Consultas de Conexión		1					1						**2**
Consultas en general		1									1		**2**
Consultas Oficina Virtual	362	363	401	593	690	465	231		1.377	1.115	1.255	518	**7.370**
Consultas SISEME													0
Estado de Cuenta					2						1		**3**
Estado de Cuenta - Oficina Virtual y Otros													0
Generación Plan de pagos										6		6	**12**
Medición General													0
Nota Técnica													0
Persona de Contacto													0
Recepción de DDJJ / Adhesion a Tarifa Social						1			1	223	13	29	**267**
Estado de Cuenta Pagadero	6	10	30	5	12	3	11	6	6	15	8	22	**134**
Factura Digital													0
Total general	**373**	**382**	**434**	**604**	**837**	**477**	**347**	**163**	**1.586**	**1.737**	**1.436**	**707**	**9.083**

aysa

CONTACTOS TELEFONICOS Y PERSONALES CON CLIENTES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual de Niveles de Servicio
20vo. Año de Concesión
Planilla INS Nº 53 - versión 2

MES	Atención Telefónica						Atención Personalizada			Contactos Totales Resueltos		
	Técnicas	Comerciales			Otros	Total Anual de Llamadas Telefónicas Recibidas	Comercial		Total Contactos Resueltos	Comercial		Total Contactos y Trámites
		Pagos con Tarjeta (On-Line)	De Resolución Diferida	Total Llamadas Comerciales			De Resolución Inmediata	De Resolución Diferida		De Resolución Inmediata	De Resolución Diferida (*)	
	[1]	[2]	[3]	[4] = [2] + [3]	[5]	[6] = [1] + [4] + [5]	[7]	[8]	[9] = [7] + [8]	[10] = [2] + [5] + [7]	[11] = [8]	[12] = [10] + [11]
Enero	37.282	10.008	1.973	11.981	38.472	87.735	42.953	8.147	51.100	**91.433**	**8.147**	**99.580**
Febrero	33.327	6.311	2.029	8.340	31.579	73.246	36.377	7.662	44.039	**74.267**	**7.662**	**81.929**
Marzo	44.964	5.227	2.075	7.302	30.563	82.829	34.014	7.687	41.701	**69.804**	**7.687**	**77.491**
Abril	35.781	6.662	2.124	8.786	34.856	79.423	35.168	9.120	44.288	**76.686**	**9.120**	**85.806**
Mayo	37.203	6.828	2.054	8.882	34.461	80.546	34.242	8.581	42.823	**75.531**	**8.581**	**84.112**
Junio	41.160	6.006	1.957	7.963	33.521	82.644	35.430	9.197	44.627	**74.957**	**9.197**	**84.154**
Julio	44.549	7.250	2.334	9.584	37.823	91.956	40.225	10.158	50.383	**85.298**	**10.158**	**95.456**
Agosto	38.207	6.137	2.219	8.356	36.088	82.651	35.829	13.858	49.687	**78.054**	**13.858**	**91.912**
Setiembre	36.287	6.356	2.429	8.785	41.086	86.158	38.090	16.961	55.051	**85.532**	**16.961**	**102.493**
Octubre	35.083	7.428	2.360	9.788	44.441	89.312	37.641	16.697	54.338	**89.510**	**16.697**	**106.207**
Noviembre	30.720	6.501	2.049	8.550	43.722	82.992	30.793	14.296	45.089	**81.016**	**14.296**	**95.312**
Diciembre	31.998	6.284	47	6.331	45.941	84.270	30.768	15.404	46.172	**82.993**	**15.404**	**98.397**
T O T A L A N U A L	**446.561**	**80.998**	**23.650**	**104.648**	**452.553**	**1.003.762**	**431.530**	**137.768**	**569.298**	**965.081**	**137.768**	**1.102.849**

(*) no suma la Columna [3] por cuanto éstos corresponden a llamadas telefónicas y creación de OdeS y no a su resolución. El tratamiento de las referidas OdeS se realiza a nivel Distrito, estando contabilizadas en la Columna [8].

ATENCION TELEFONICA: Nivel de Servicio

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio Año 2025	
INS-IG-USU-02	**Ex PL 54**

RESUMEN CONCESION

Año 2025	Llamados Entrantes			Llamados Atendidos			%
	Técnicas	Comerciales	Total	Técnicas	Comerciales	Total	Eficiencia
	[1]	[2]	[3] = [1] + [2]	[4]	[5]	[6] = [4] + [5]	[7] = [6]/[3]*100
Enero	41.175	109.900	151.075	37.282	50.453	87.735	58,1
Febrero	35.803	87.840	123.643	33.327	39.919	73.246	59,2
Marzo	58.825	86.385	145.210	44.964	37.865	82.829	57,0
Abril	39.115	101.844	140.959	35.781	43.642	79.423	56,3
Mayo	40.137	95.752	135.889	37.203	43.343	80.546	59,3
Junio	46.190	97.655	143.845	41.160	41.484	82.644	57,5
Julio	52.610	112.154	164.764	44.549	47.407	91.956	55,8
Agosto	41.294	92.596	133.890	38.207	44.444	82.651	61,7
Setiembre	38.862	111.183	150.045	36.287	49.871	86.158	57,4
Octubre	37.138	109.672	146.810	35.083	54.229	89.312	60,8
Noviembre	31.799	90.340	122.139	30.720	52.272	82.992	67,9
Diciembre	34.268	92.566	126.834	31.998	54.025	86.023	67,8
TOTAL GENERAL	**497.216**	**1.187.887**	**1.685.103**	**446.561**	**558.954**	**1.005.515**	**59,7**

1.6 PRESIÓN DEL SERVICIO

INFORME NIVELES DE SERVICIO 2025

1.6 Presiones del servicio

Dirección de Ingeniería
Gerencia Agua No Contabilizada
Mayo 2026

1 Agua Potable

1.6 Presión del Servicio

- Presiones Promedio, Mínimas y Máximas

Se consideran como puntos de control todos los puntos principales de presión (PPP) existentes en la red, una Válvula Reguladora (VR) y 2 puntos de principales de presión y caudal (PPQ).

El área de la Concesión cuenta con una red de monitoreo de presiones constituida por 323 puntos de medición en los cuales se mide la presión en forma continua.

La presión registrada en cada punto es representativa de un grupo de mallas.

En base a los valores horarios de presión se determina la presión promedio, presión mínima y presión máxima y luego se trazan planos con mallas determinados con un software específico.

En la siguiente tabla se detallan la cantidad de Puntos de Monitoreo (PPP-VR-PPQ) por Dirección Regional:

Región	AySA 2015			Nuevas Áreas	AySA Total		
	PPP	VR	PPQ	PPP	PPP	VR	PPQ
CAPITAL	61				61		
NORTE	61	1	2	11	72	1	2
OESTE	65			12	77		
SUDESTE	54			10	64		
SUDOESTE	43			3	46		
SubTotal	**284**	**1**	**2**	**36**	**320**	**1**	**2**
Total	**287**			**36**	**323**		

En los Sistemas de Alta Presión con Válvulas Reguladoras, se realizaron acciones directas sobre la gestión de presiones en la red mediante uso de tecnologías inteligentes aplicadas a la válvula que permite gestionar una oferta modulada horaria reduciendo presiones en los horarios de mínima demanda.

Ello tiene doble efecto, reducir el agua entregada al área de influencia de la válvula en horarios de mínima demanda y asegurar que la infraestructura trabaje sin estar sometida al estrés de altas presiones, todo ello sin que se disminuya la calidad de servicio percibida por el usuario.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, para el cálculo de la presión mínima promedio anual y de la presión máxima promedio anual se determina para cada distrito el promedio de los valores horarios dentro del “horario de mínima presión” y dentro de “horario de máxima presión” respectivamente a partir de grupos de PPP que presentan el mismo comportamiento.


Para determinar el mes de mínima y el mes de máxima se analiza cada PPP obteniendo un período para cada uno.
En el siguiente cuadro se muestra el horario de presión mínima y el horario de presión máxima de cada grupo de PPP por distrito y a modo informativo los meses de presión mínima promedio y presión máxima promedio de cada distrito, ya que para el análisis de la presión mínima en el mes de mínima y de la presión máxima en el mes de máxima, se determina el mes para cada punto.

REGIÓN	CONCESIÓN	DISTRITO	GRUPO	HORARIO MÍNIMA	HORARIO MÁXIMA	MES DE MÍNIMA	MES DE MÁXIMA
CAPITAL	AYSA 2015	CABALLITO	-	11:00	05:00	Junio	Enero
		CENTRO	-	11:00	04:00	Junio	Enero
		CONSTITUCIÓN	1	14:00	05:00	Julio	Noviembre
			2	23:00	05:00	Junio	Noviembre
			3	23:00	07:00	Mayo	Diciembre
		DEVOTO	-	21:00	05:00	Junio	Julio
		FLORES	-	13:00	03:00	Abril	Septiembre
		SAAVEDRA	-	21:00	05:00	Junio	Enero
NORTE	AYSA 2015	SAN FERNANDO	1	00:00	07:00	Julio	Diciembre
			2	00:00	08:00	Enero	Julio
			3	01:00	15:00	Diciembre	Octubre
		SAN ISIDRO	1	22:00	07:00	Diciembre	Julio
			2	23:00	07:00	Enero	Julio
		SAN MARTÍN	1	00:00	05:00	Diciembre	Julio
			2	20:00	05:00	Enero	Octubre
			3	23:00	07:00	Junio	Noviembre
		TIGRE	1	03:00	09:00	Diciembre	Marzo
			2	20:00	07:00	Enero	Mayo
			3	05:00	19:00	Marzo	Enero
		VICENTE LÓPEZ	1	00:00	17:00	Diciembre	Febrero
			2	12:00	05:00	Diciembre	Octubre
			3	23:00	07:00	Abril	Octubre
	NP	ESCOBAR	-	01:00	08:00	Mayo	Febrero
		JOSÉ C PAZ	-	13:00	04:00	Enero	Agosto
		MALVINAS ARGENTINAS	-	20:00	04:00	Enero	Octubre
		PILAR	-	20:00	05:00	Enero	Octubre
		SAN MIGUEL	1	20:00	08:00	Diciembre	Abril
			2	20:00	15:00	Enero	Mayo
OESTE	AYSA 2015	LA MATANZA NORTE	1	20:00	05:00	Enero	Octubre
			2	14:00	05:00	Junio	Enero
		LA MATANZA OESTE	-	20:00	04:00	Enero	Octubre
		LA MATANZA SUR	-	20:00	05:00	Enero	Septiembre
		MORÓN	1	04:00	08:00	Diciembre	Mayo
			2	00:00	07:00	Junio	Marzo
			3	11:00	04:00	Julio	Marzo
			4	06:00	10:00	Mayo	Septiembre
		TRES DE FEBRERO	1	03:00	17:00	Octubre	Junio
			2	01:00	06:00	Mayo	Diciembre
			3	20:00	07:00	Enero	Abril
			4	13:00	04:00	Mayo	Agosto
			5	21:00	05:00	Febrero	Octubre
	NP	MERLO	1	20:00	05:00	Diciembre	Abril
			2	12:00	04:00	Octubre	Febrero
			3	23:00	07:00	Septiembre	Marzo
		MORENO	-	20:00	04:00	Enero	Septiembre
SUDESTE	AYSA 2015	AVELLANEDA	1	13:00	06:00	Enero	Octubre
			2	00:00	08:00	Enero	Agosto
			3	01:00	06:00	Diciembre	Agosto
		LANÚS	1	20:00	05:00	Enero	Septiembre
			2	02:00	07:00	Junio	Octubre
		QUILMES	1	00:00	06:00	Enero	Noviembre
			2	14:00	03:00	Enero	Octubre
			3	12:00	07:00	Enero	Julio
			4	01:00	08:00	Diciembre	Octubre
			5	23:00	06:00	Diciembre	Marzo
			6	00:00	06:00	Julio	Mayo
	NP	FLORENCIO VARELA	1	01:00	17:00	Enero	Octubre
			2	20:00	06:00	Diciembre	Julio
			3	14:00	03:00	Enero	Noviembre
SUDOESTE	AYSA 2015	ALMIRANTE BROWN	1	20:00	05:00	Enero	Agosto
			2	13:00	07:00	Septiembre	Octubre
		ESTEBAN ECHEVERRÍA	1	20:00	04:00	Diciembre	Mayo
			2	20:00	04:00	Enero	Octubre
		EZEIZA	-	20:00	03:00	Enero	Septiembre
		LOMAS DE ZAMORA	-	20:00	05:00	Enero	Agosto
	NP	PRESIDENTE PERÓN	-	20:00	04:00	Enero	Noviembre


Para la representación gráfica de las presiones se desarrolló una metodología que relaciona las mallas con el área de influencia de los puntos de presión. Una vez calculada la presión promedio anual, la presión mínima promedio anual y la presión máxima promedio anual de cada sitio se ejecuta la aplicación para generar los planos por región por año.

Se adjuntan los planos que fueron determinados de acuerdo a la metodología antes descripta con los datos horarios 2025 que presentan la Presión Promedio Anual por Región, la Presión Mínima Promedio Anual por Región y la Presión Máxima Promedio Anual por Región, donde las mismas se agrupan por rangos.


Presión Promedio Anual 2025 – AySA

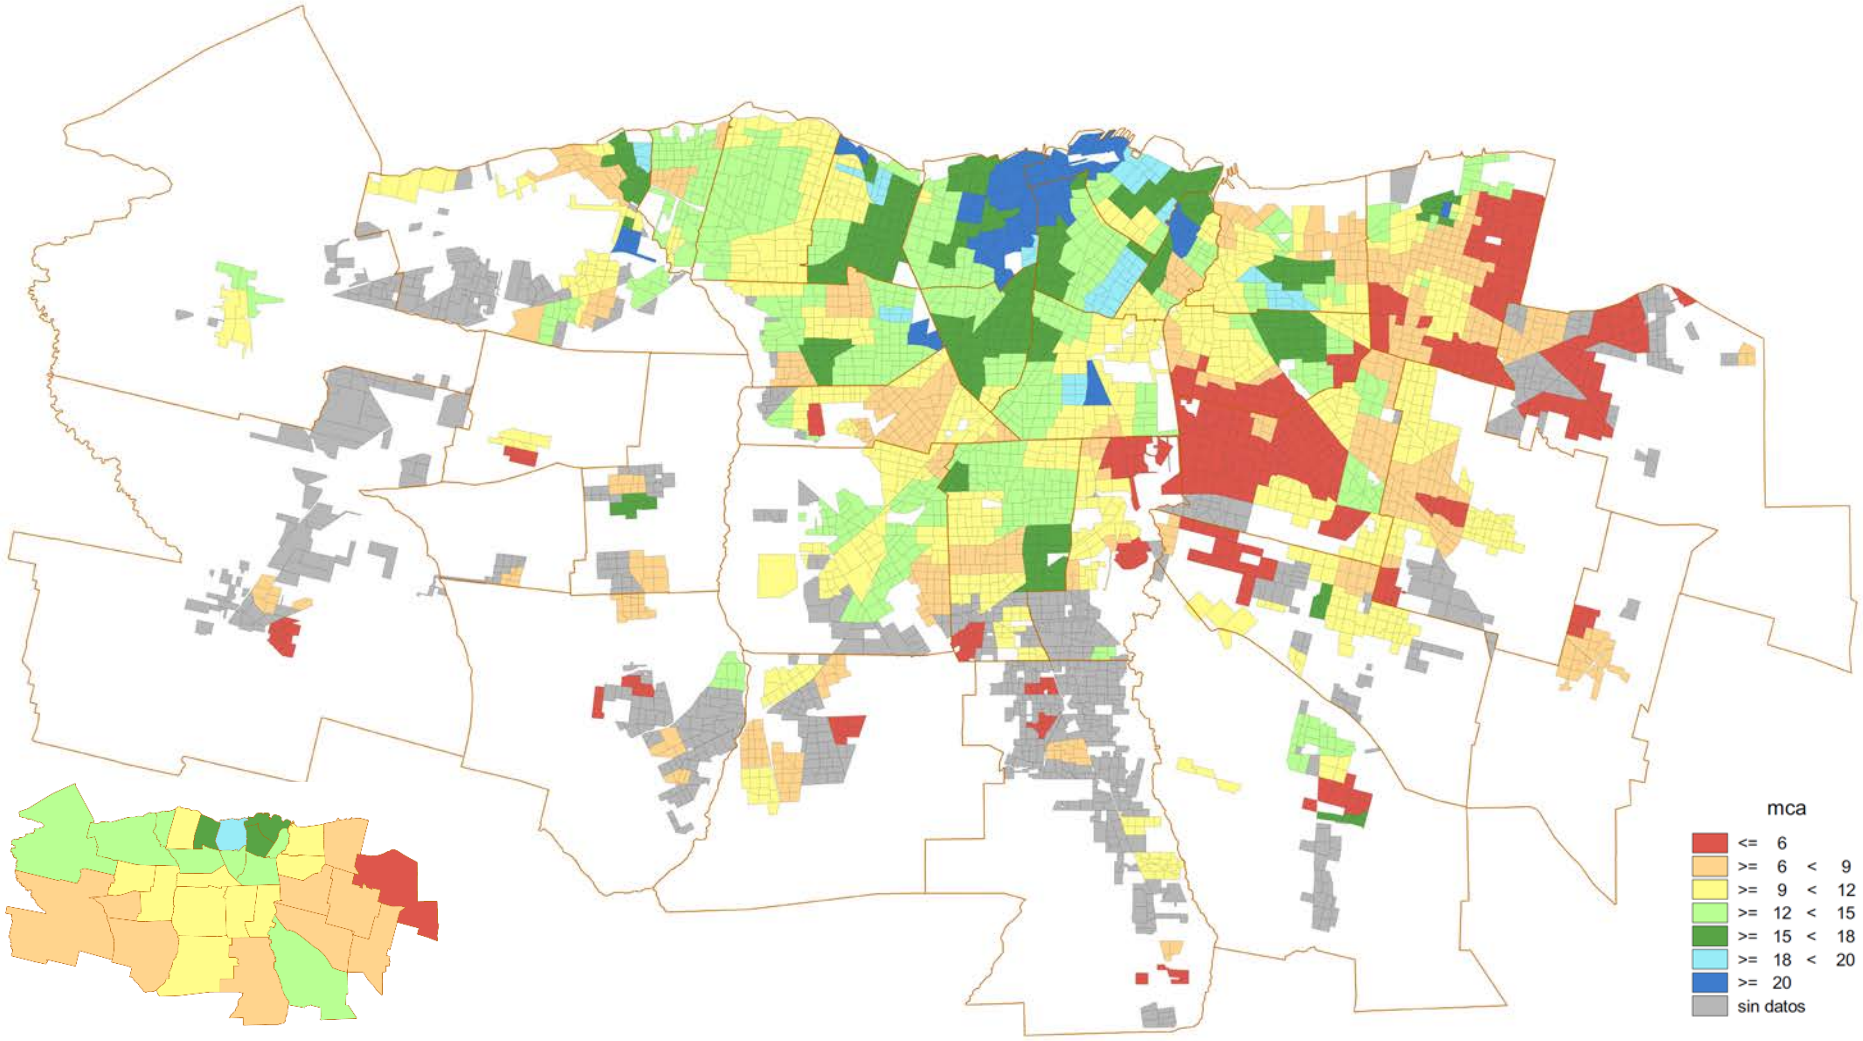


Presión Mínima Promedio Anual 2025 – AySA

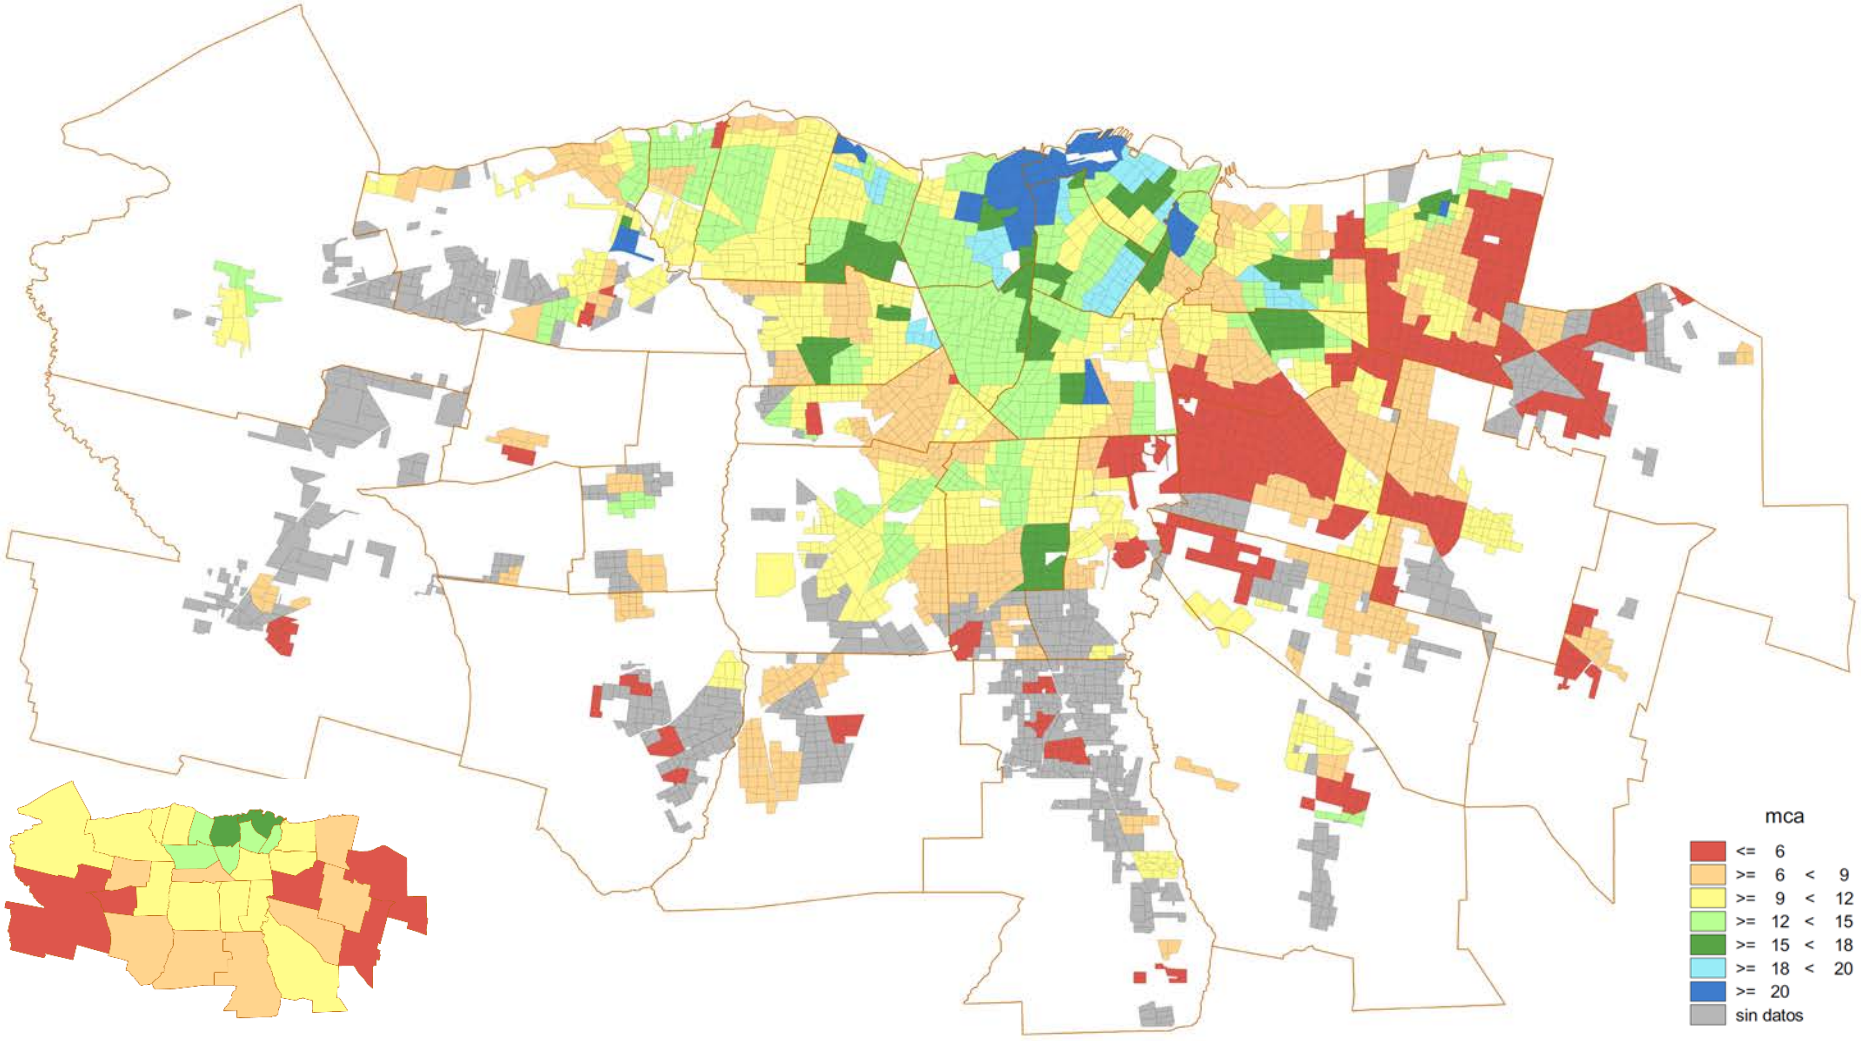

Presión Máxima Promedio Anual 2025 – AySA

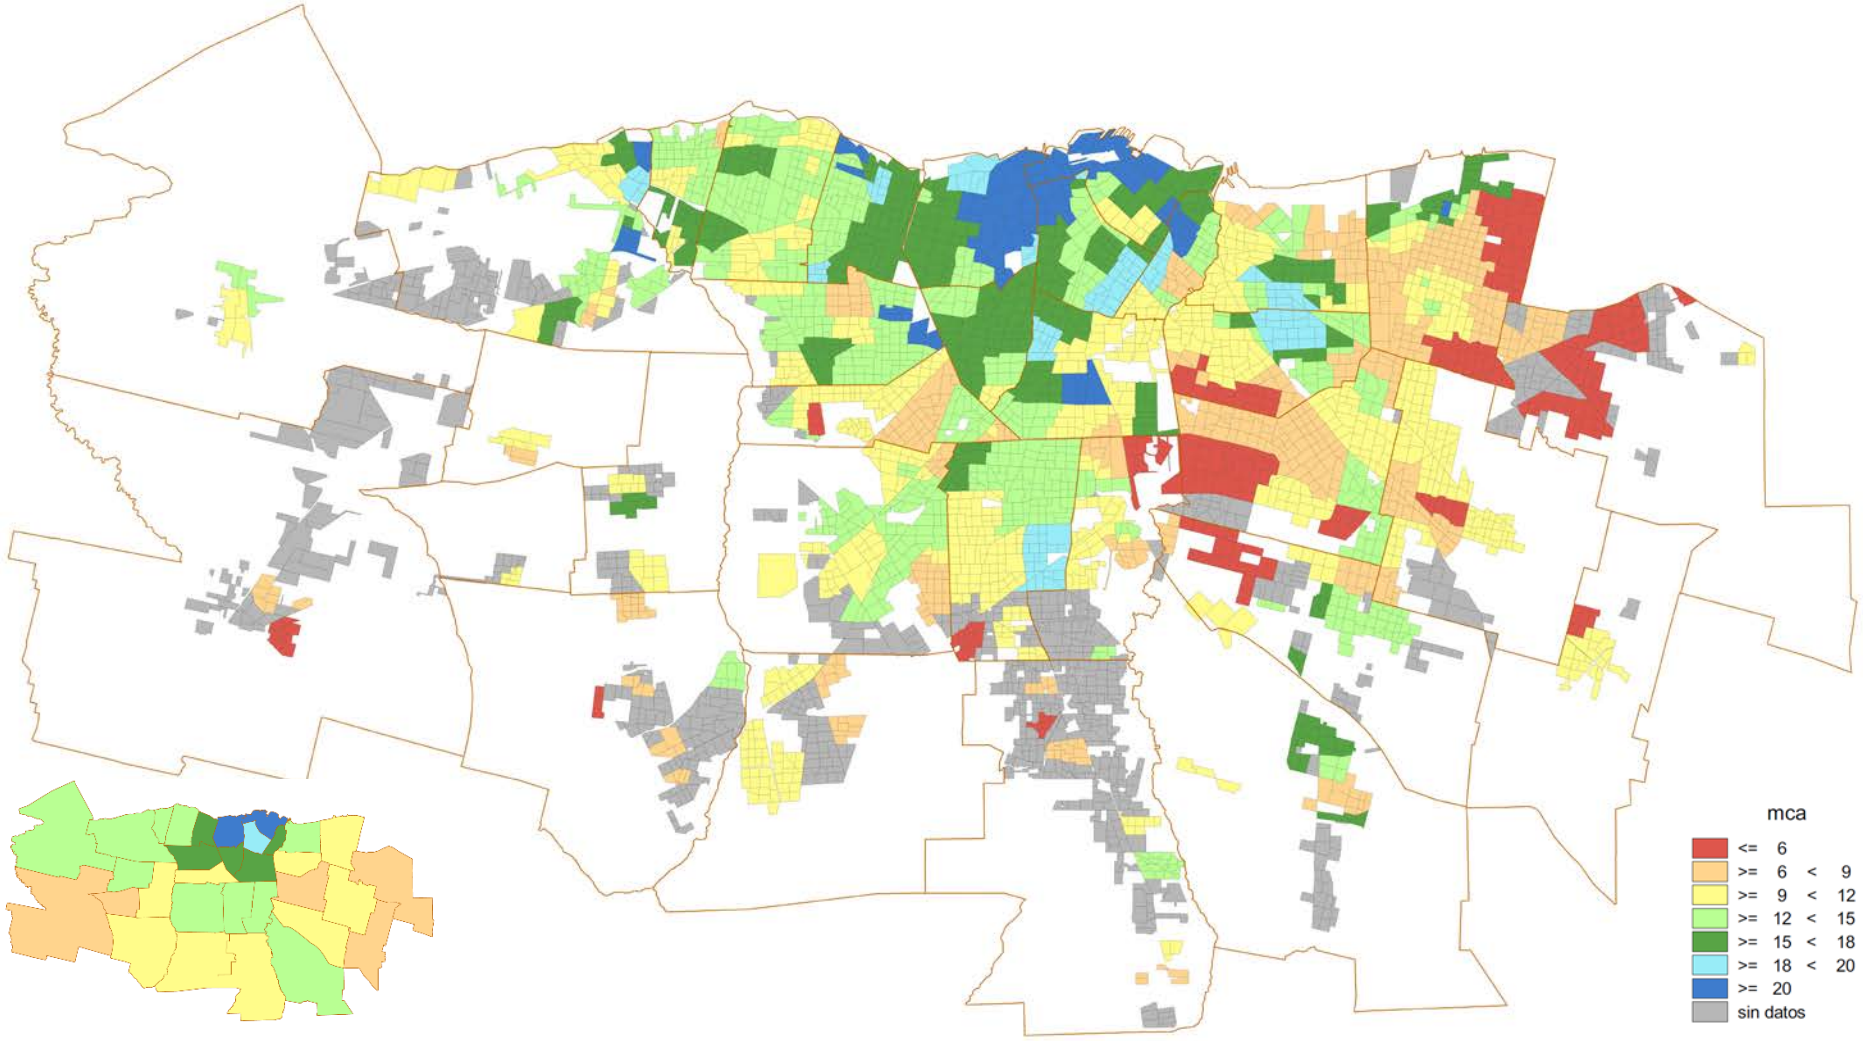


Presión Promedio Anual 2025 – Región Capital Federal

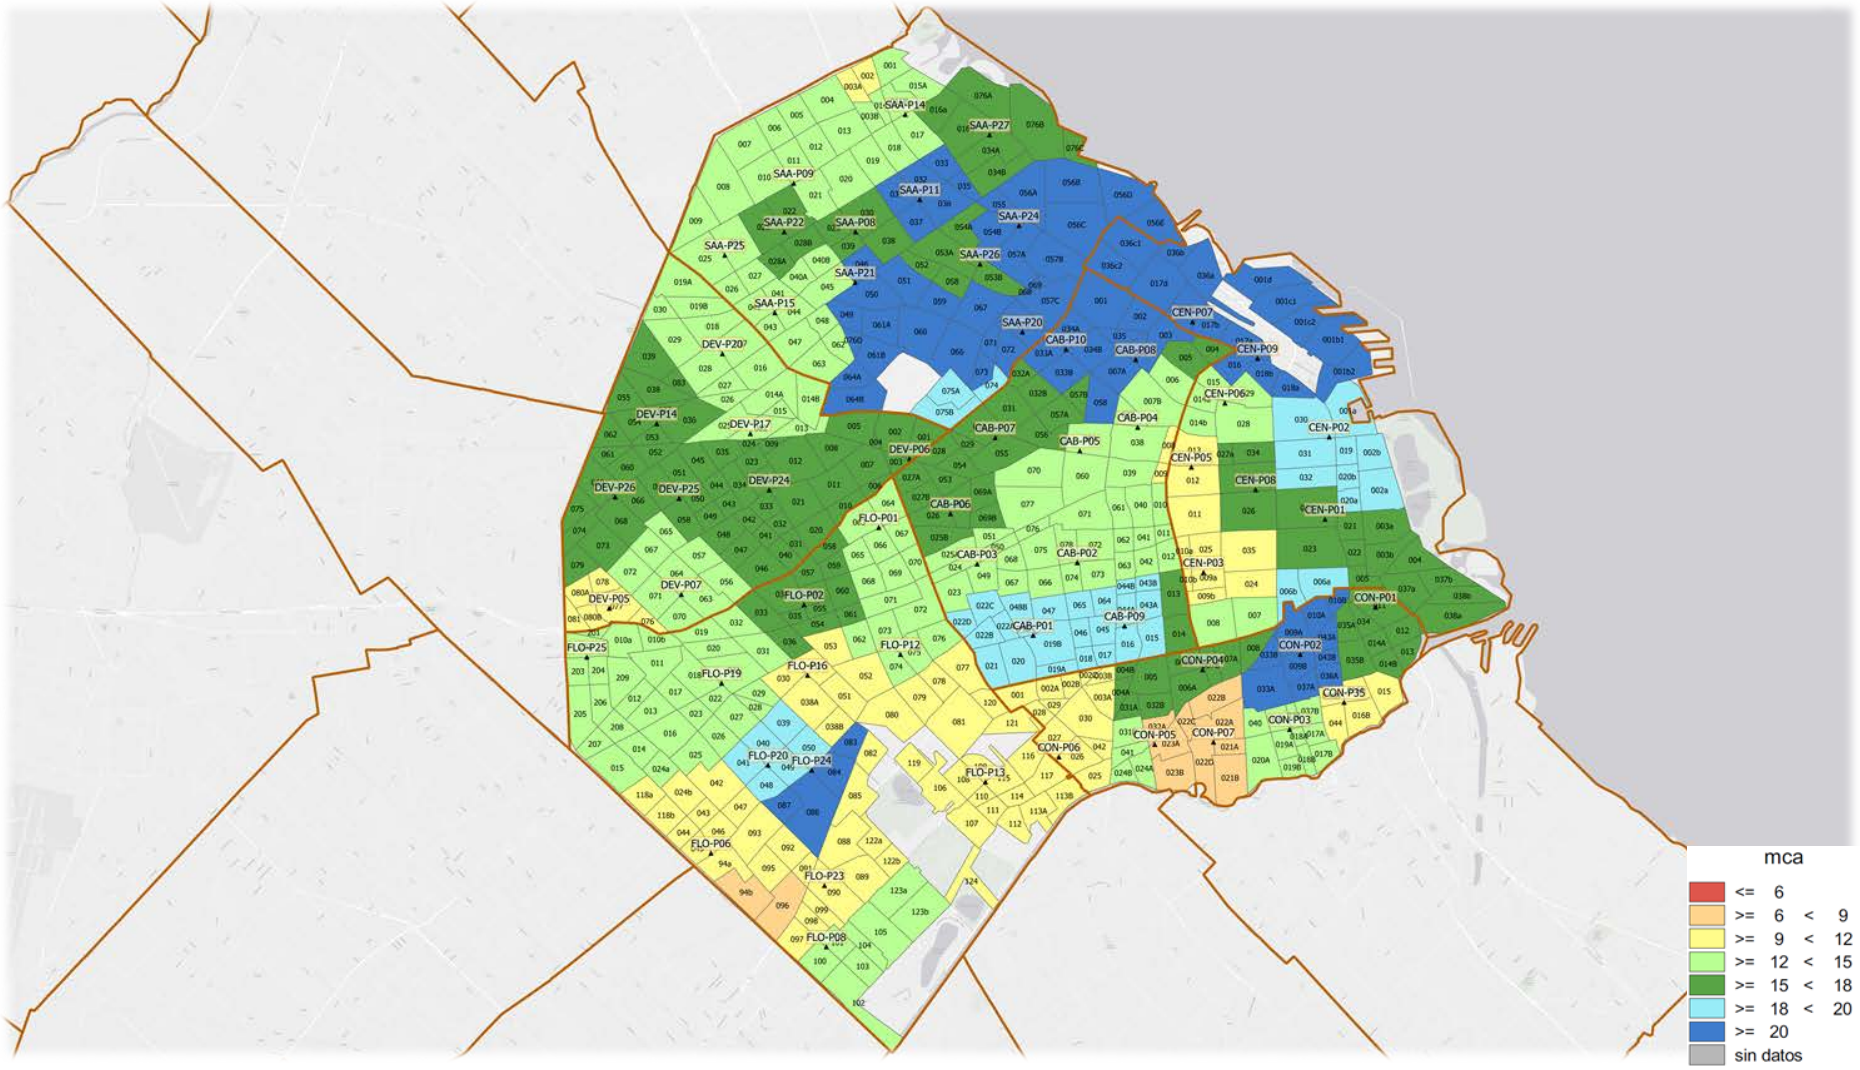


Presión Mínima Promedio Anual 2025 – Región Capital Federal




Presión Máxima Promedio Anual 2025 – Región Capital Federal




Presión Promedio Anual 2025 – Región Norte

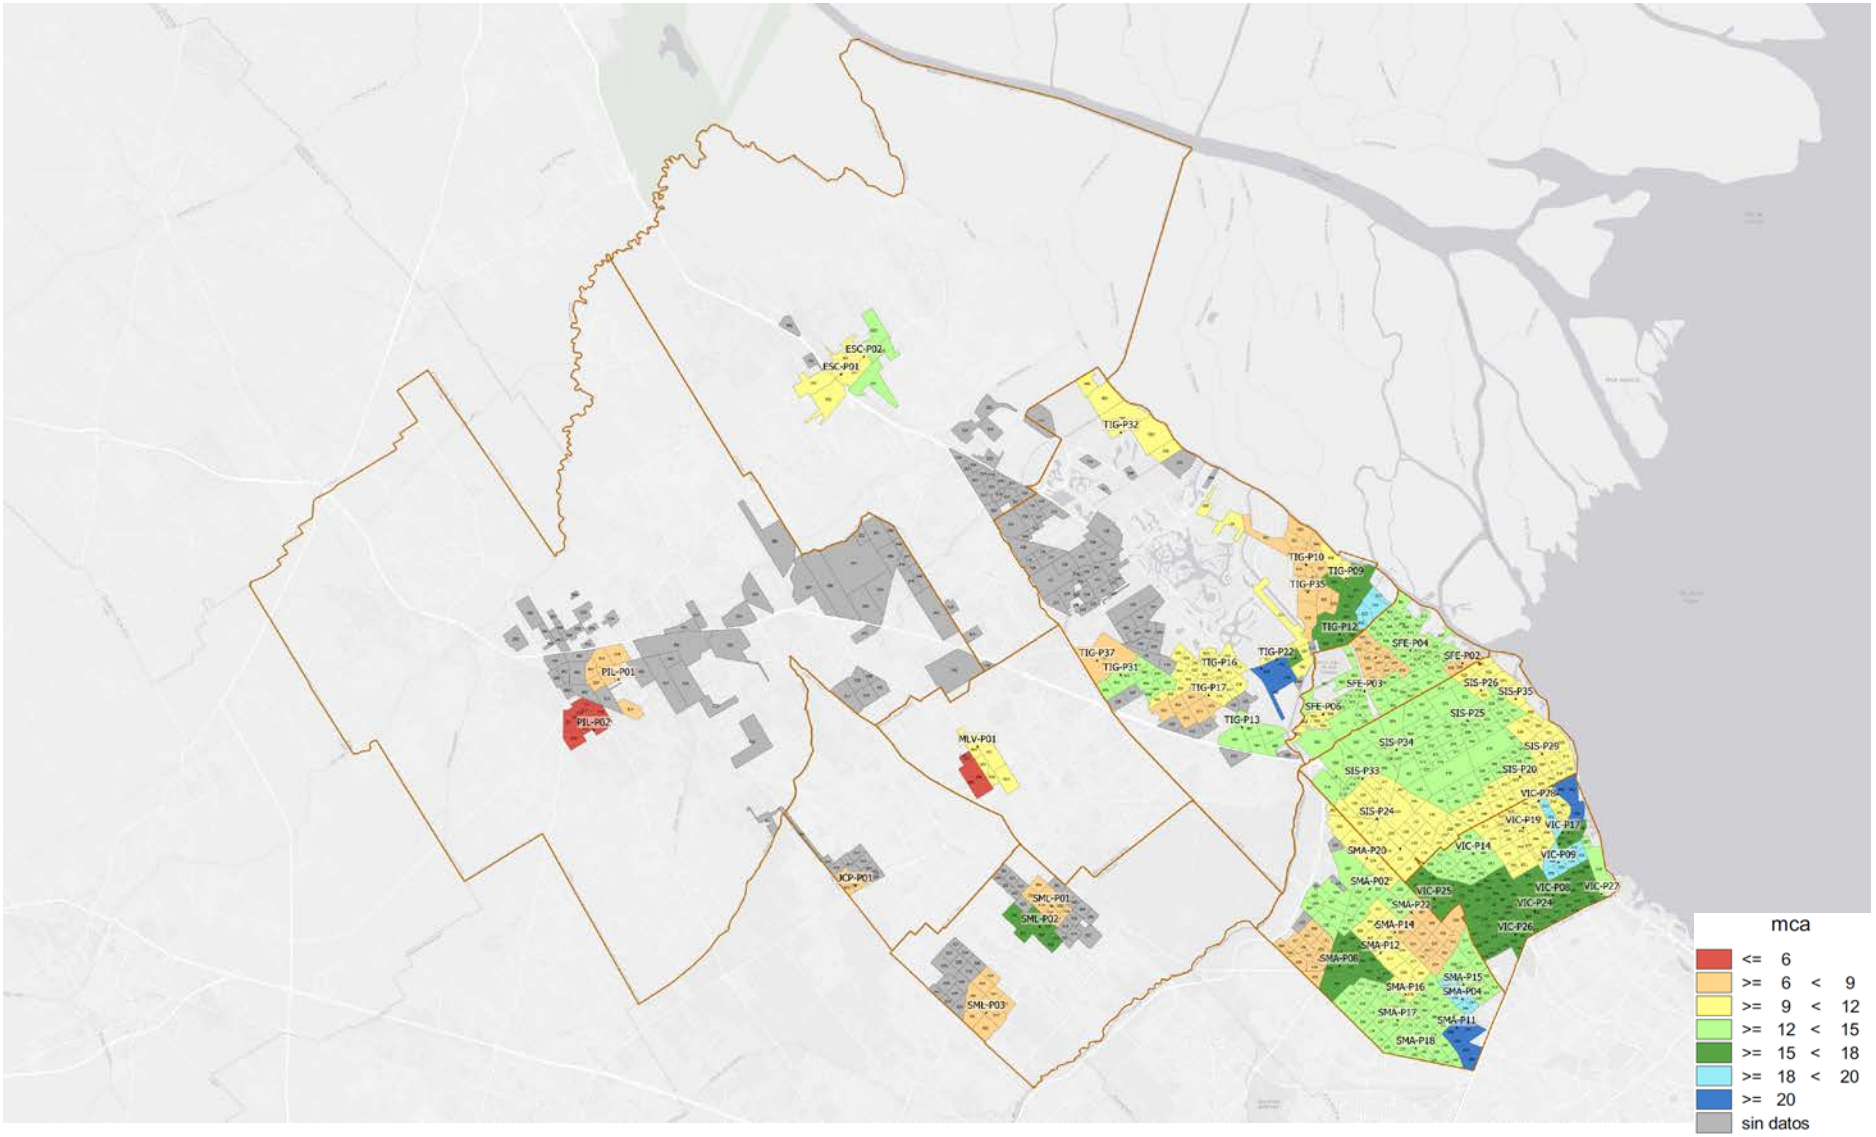


Presión Mínima Promedio Anual 2025 – Región Norte

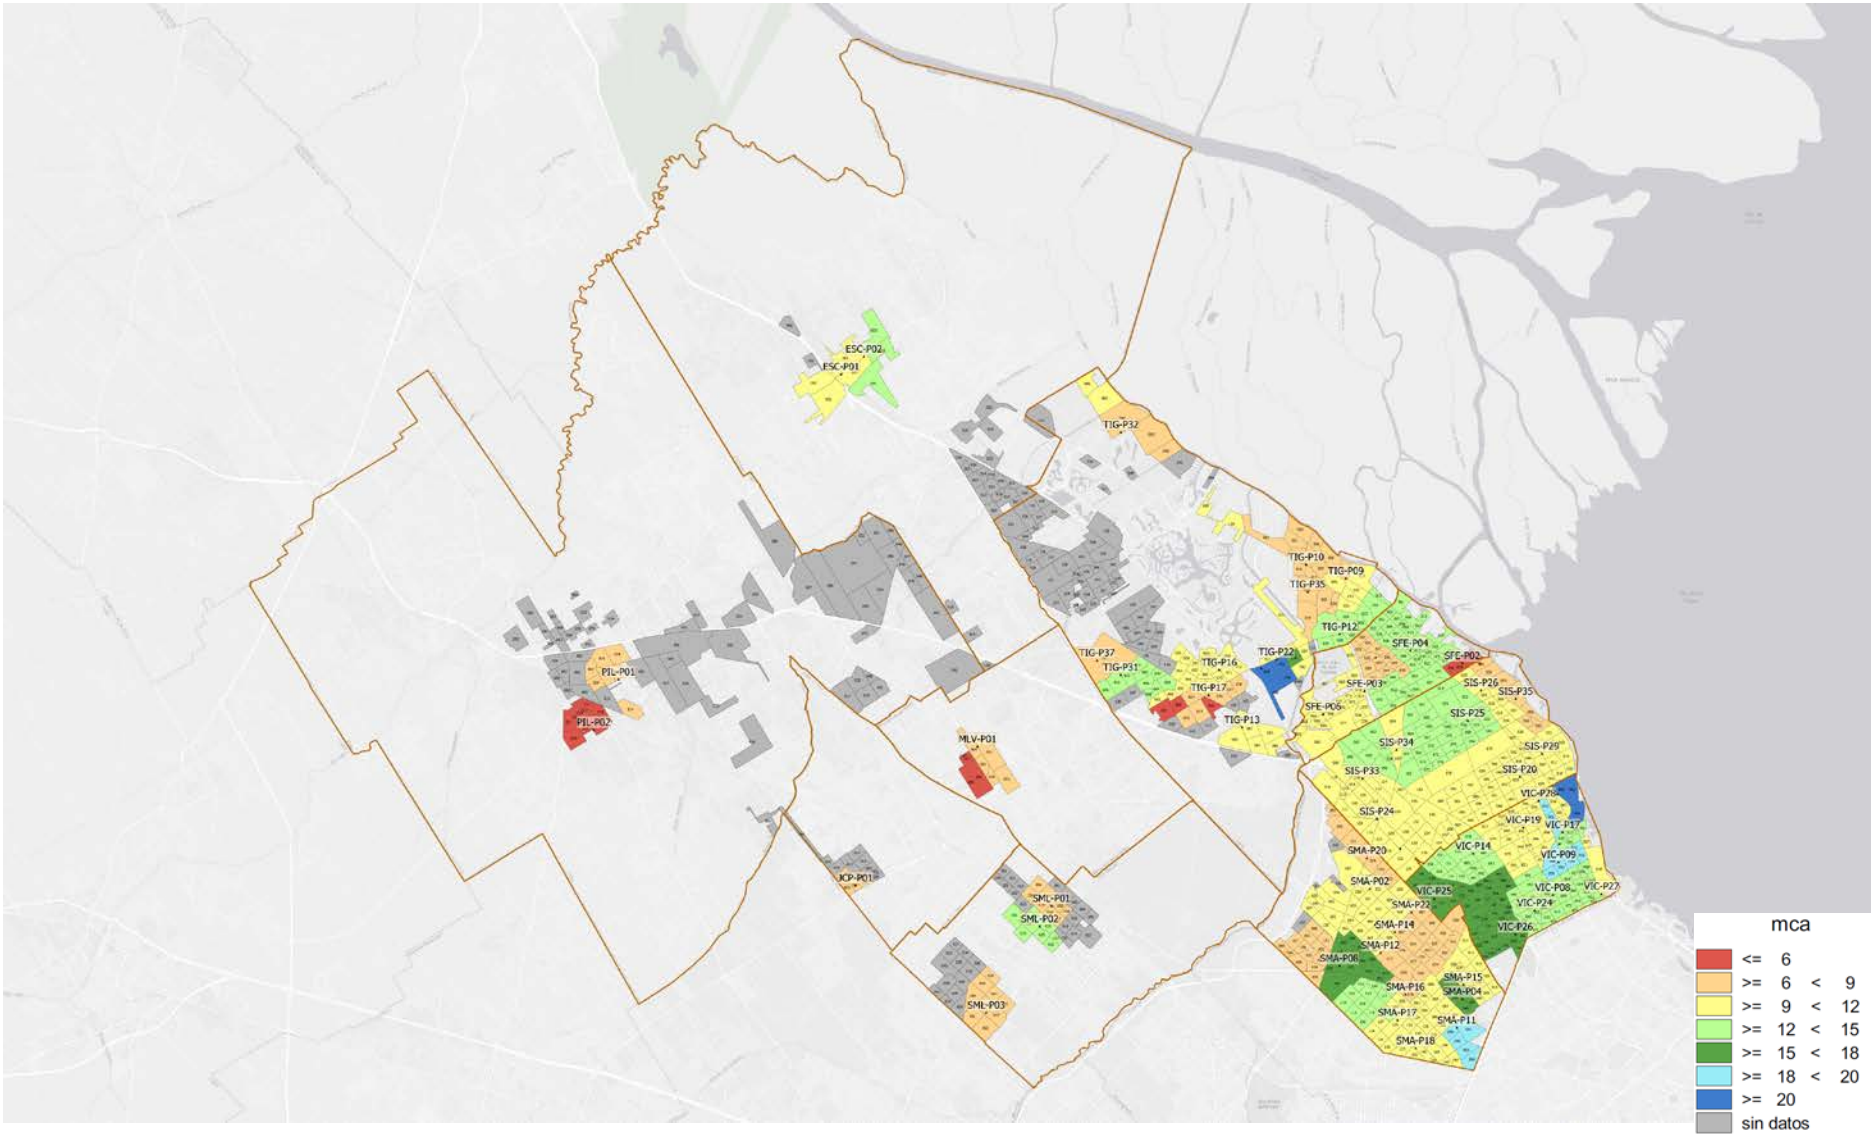


Presión Máxima Promedio Anual 2025 – Región Norte

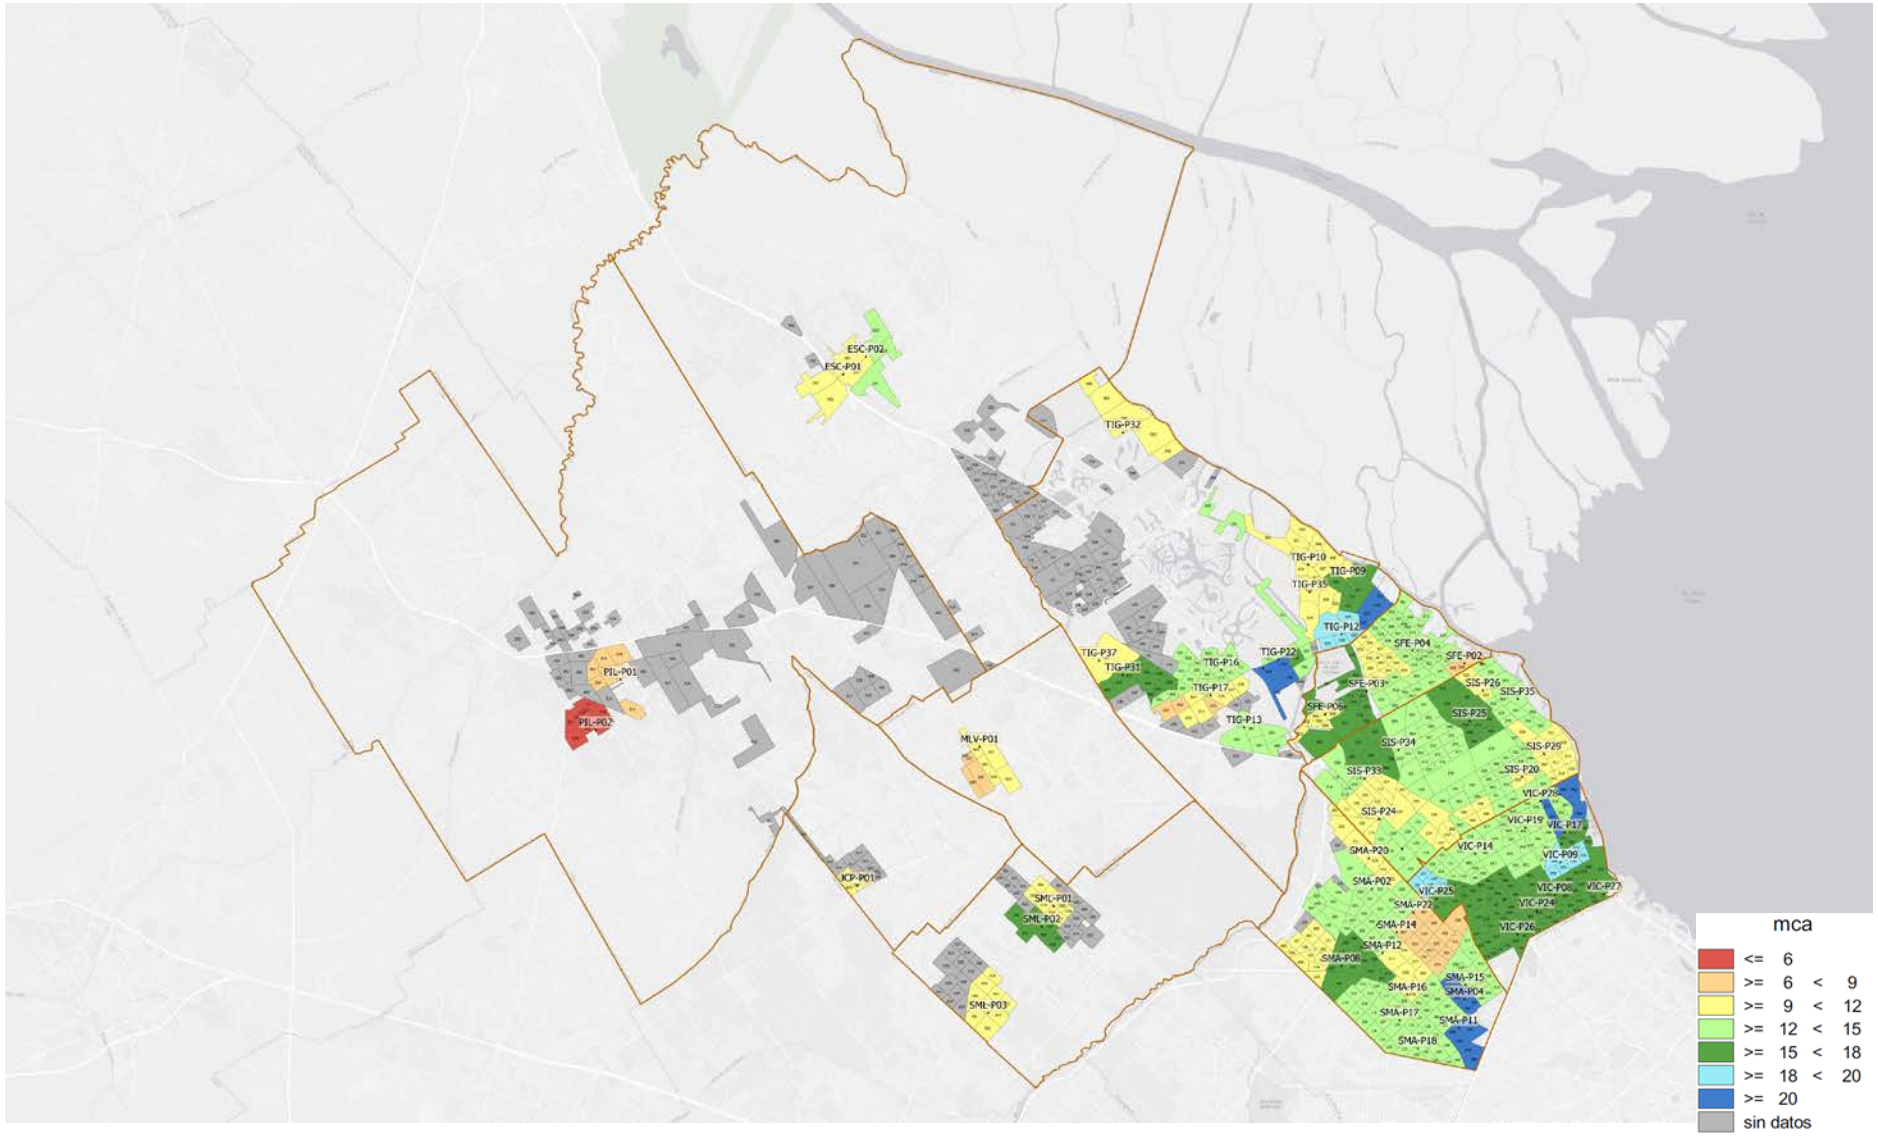


Presión Promedio Anual 2025 – Región Oeste

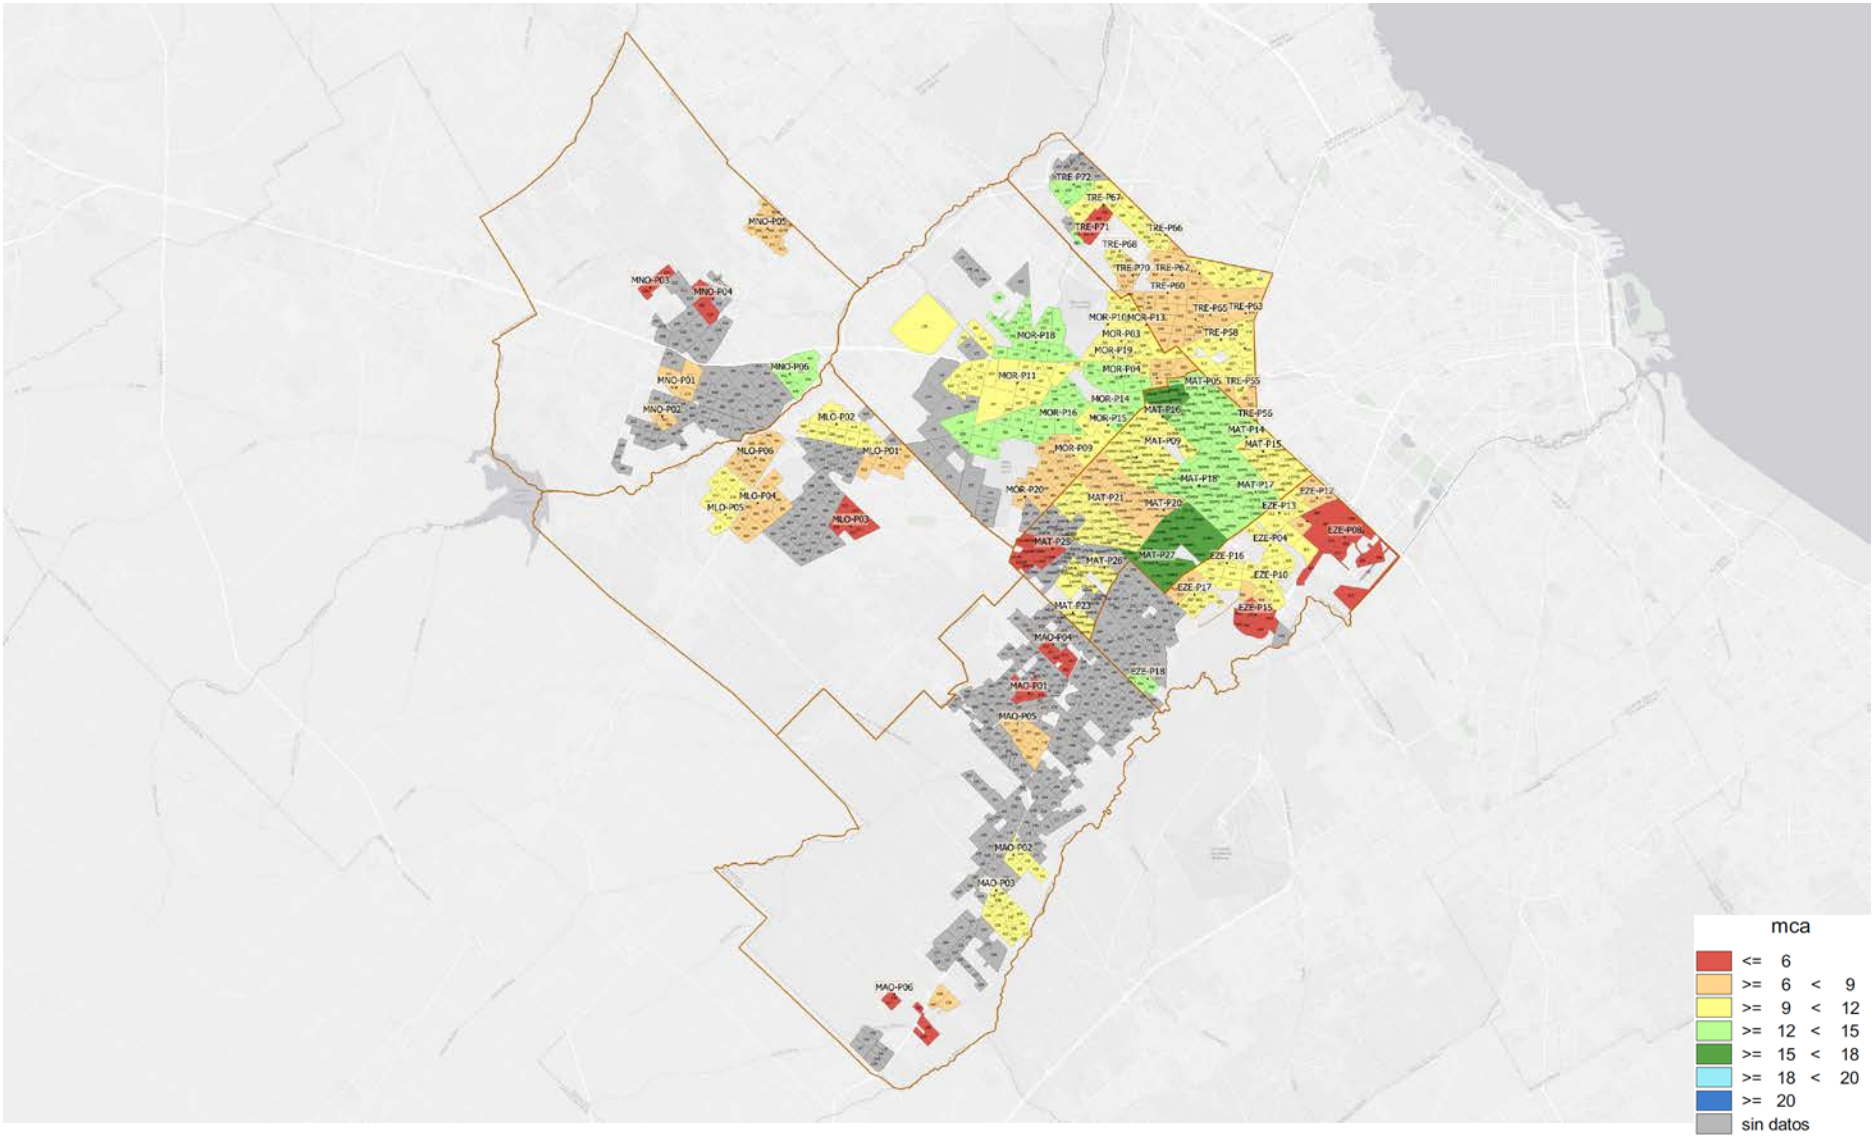


Presión Mínima Promedio Anual 2025 – Región Oeste

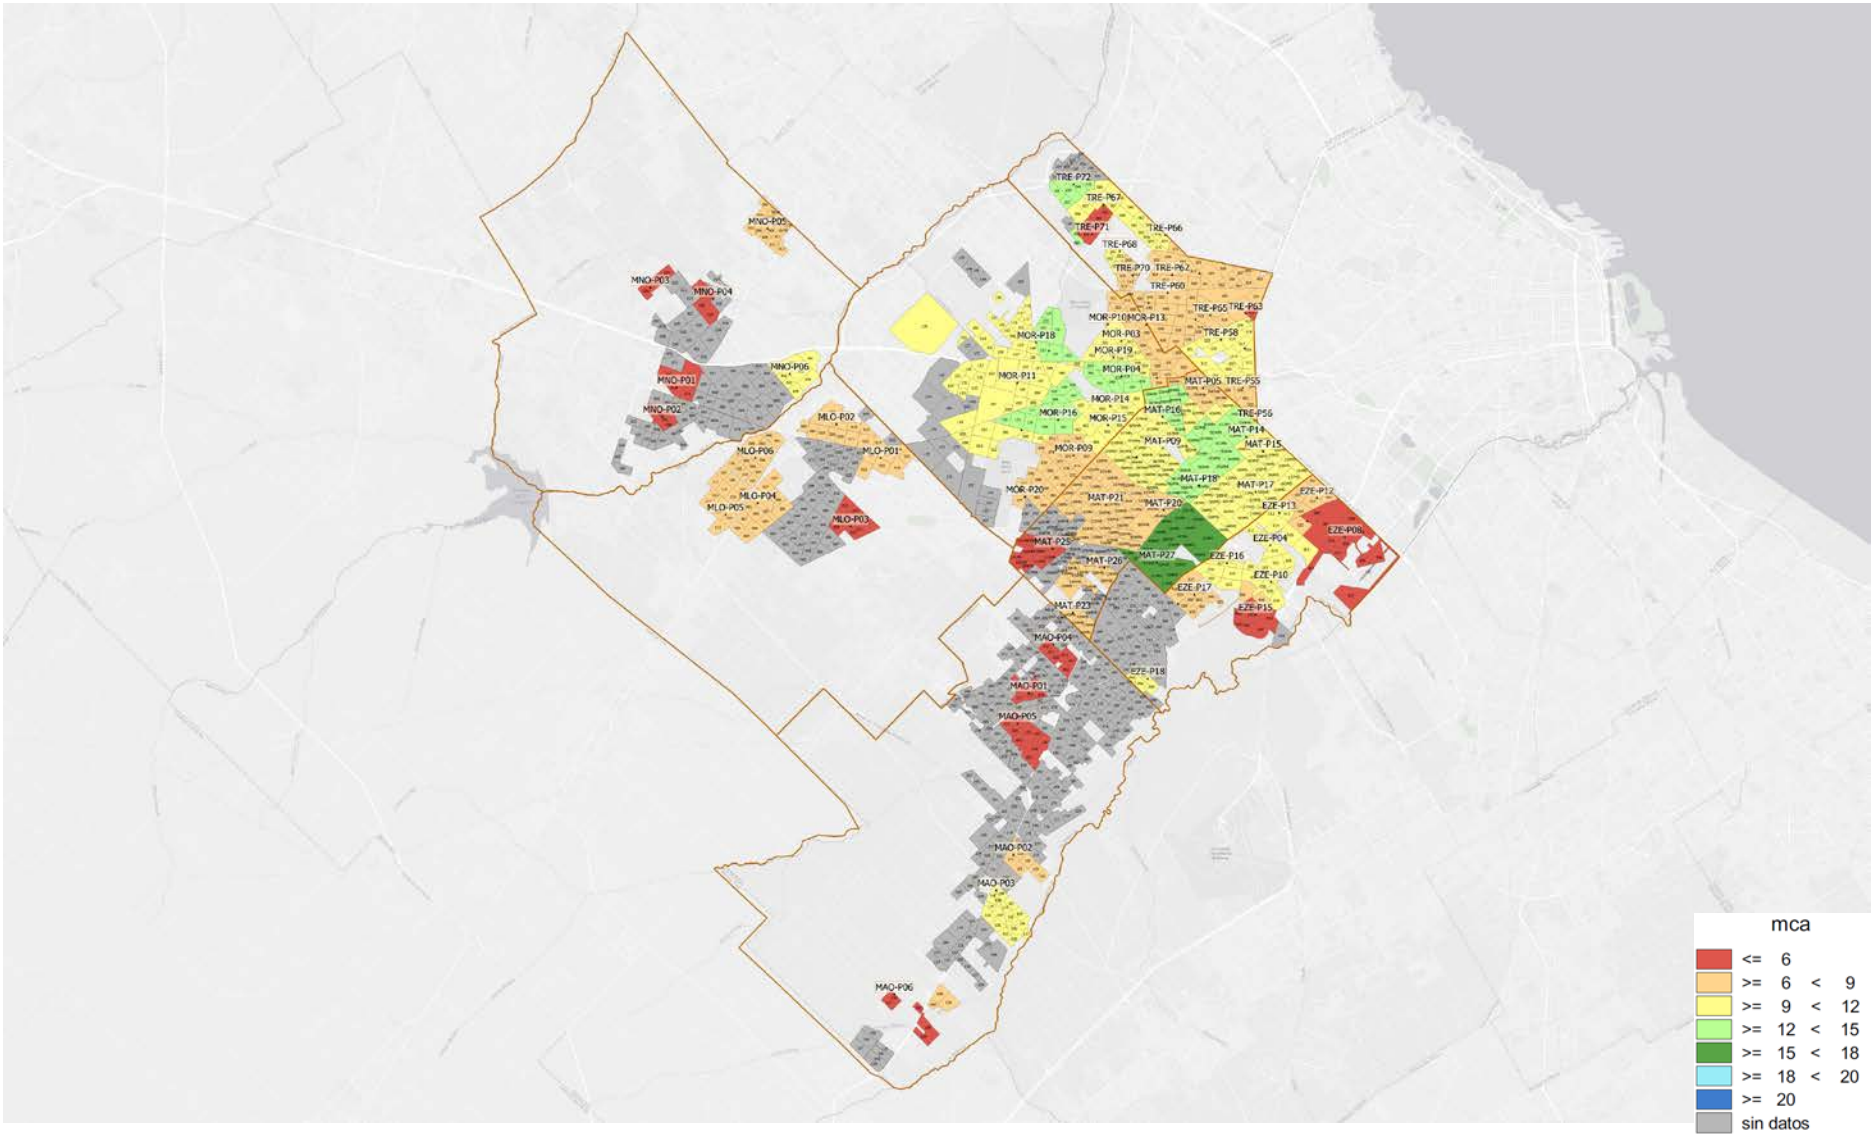


Presión Máxima Promedio Anual 2025 – Región Oeste

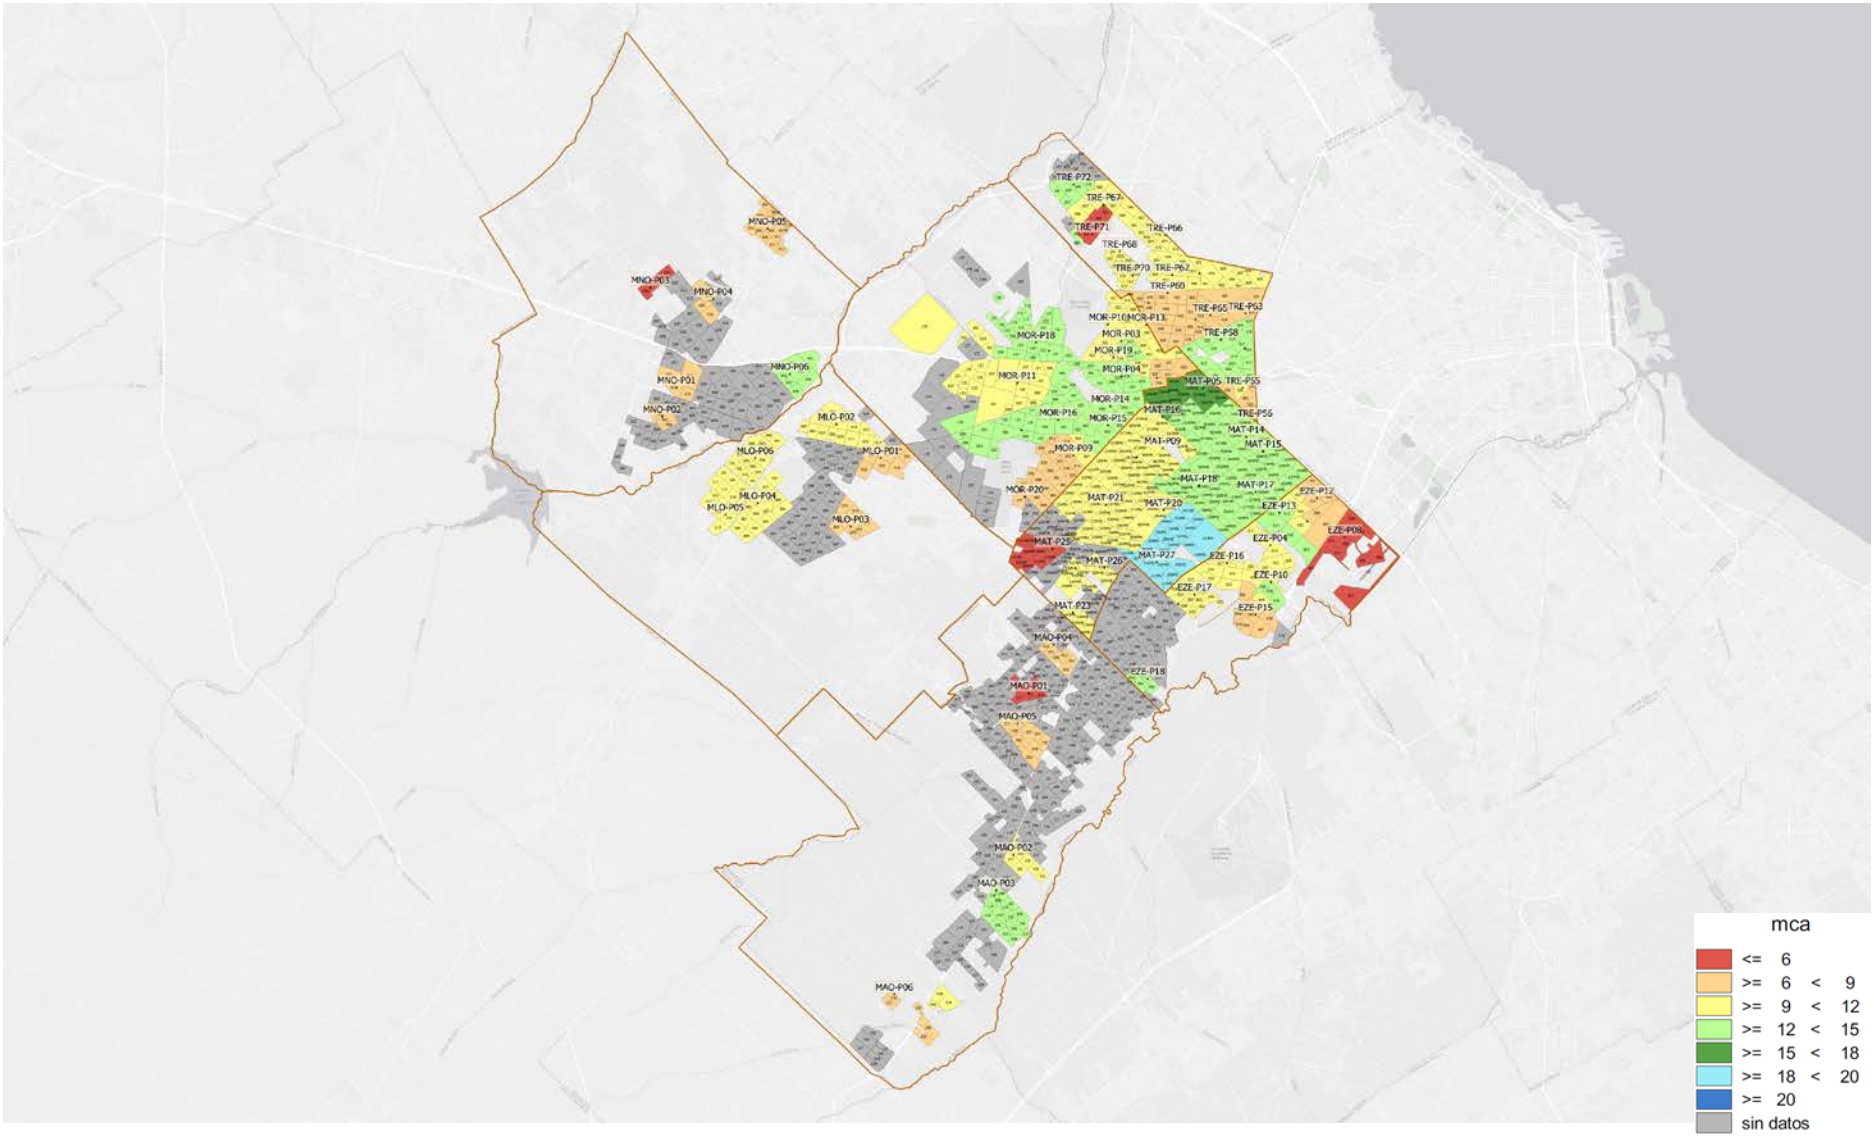


Presión Promedio Anual 2025 – Región Sudeste

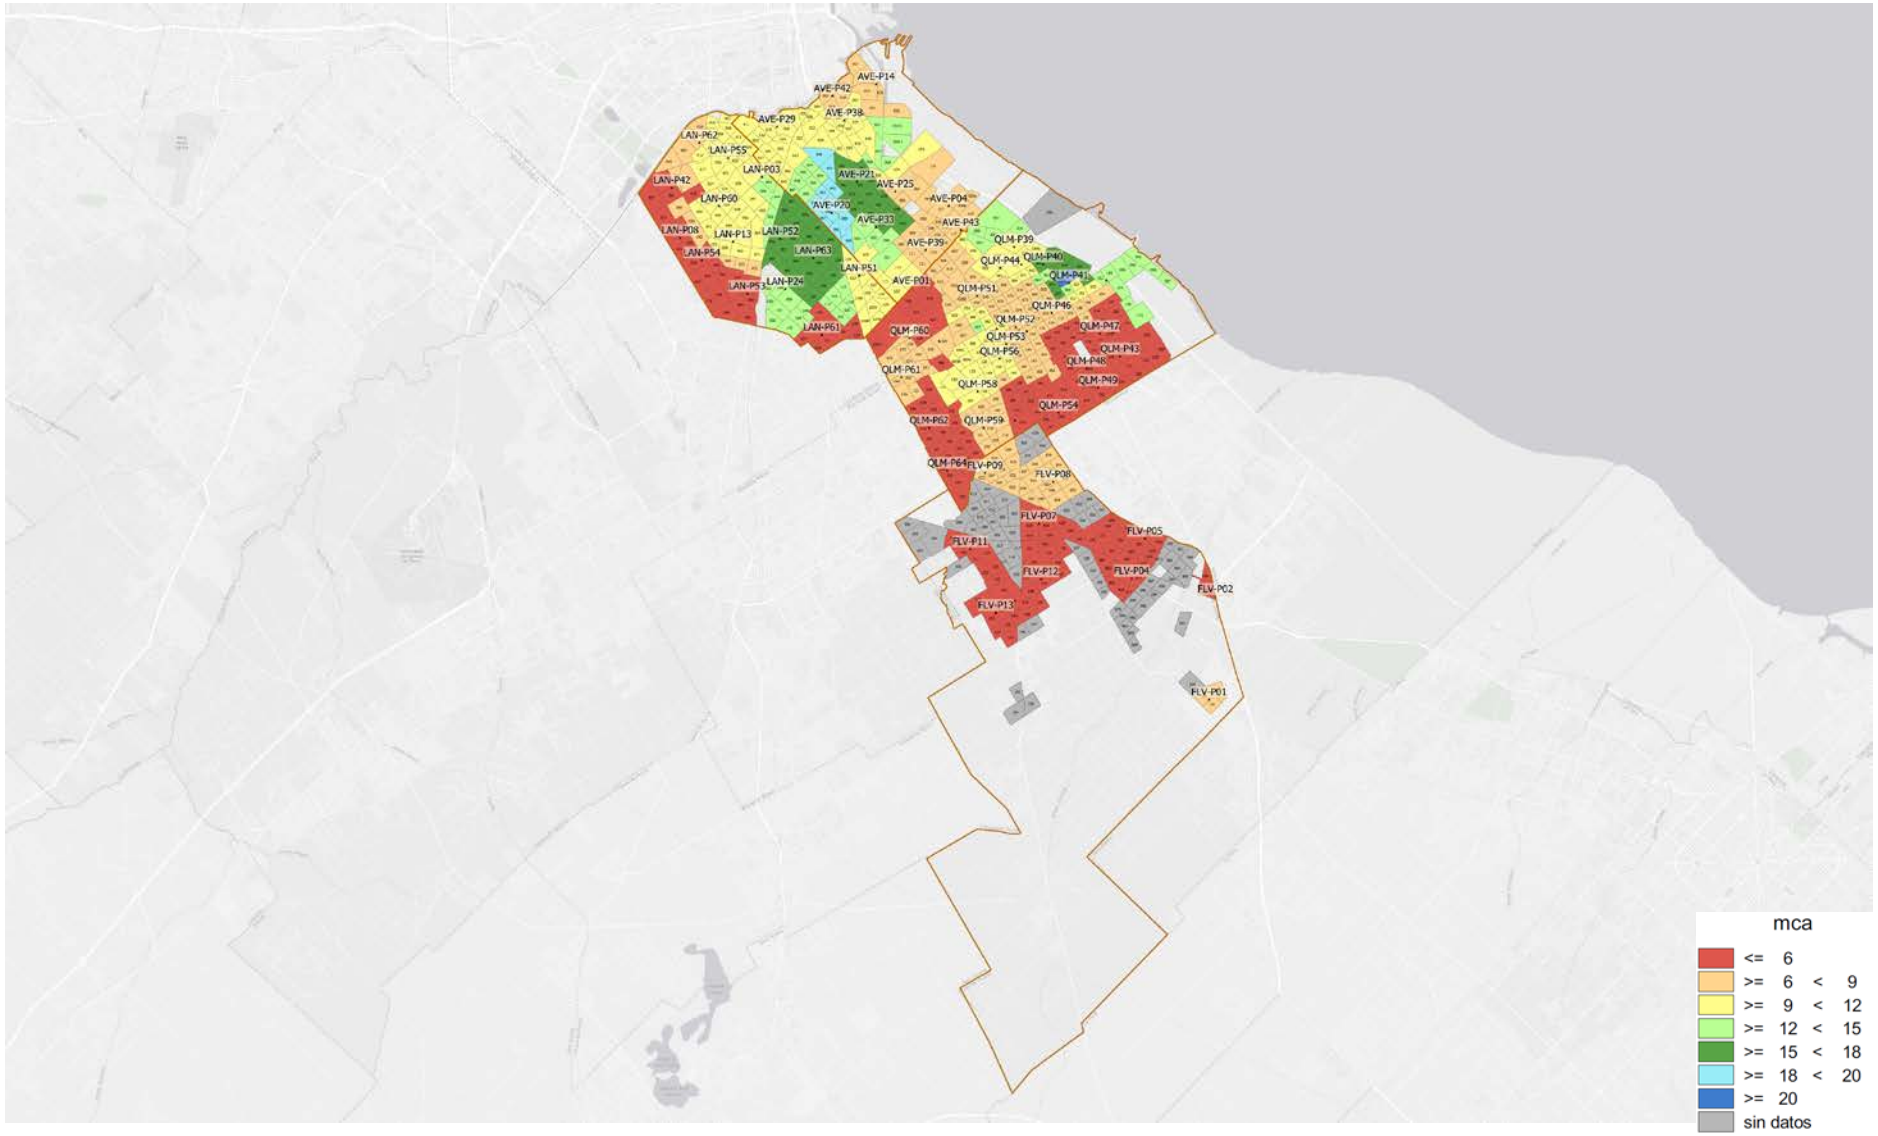


Presión Mínima Promedio Anual 2025 – Región Sudeste

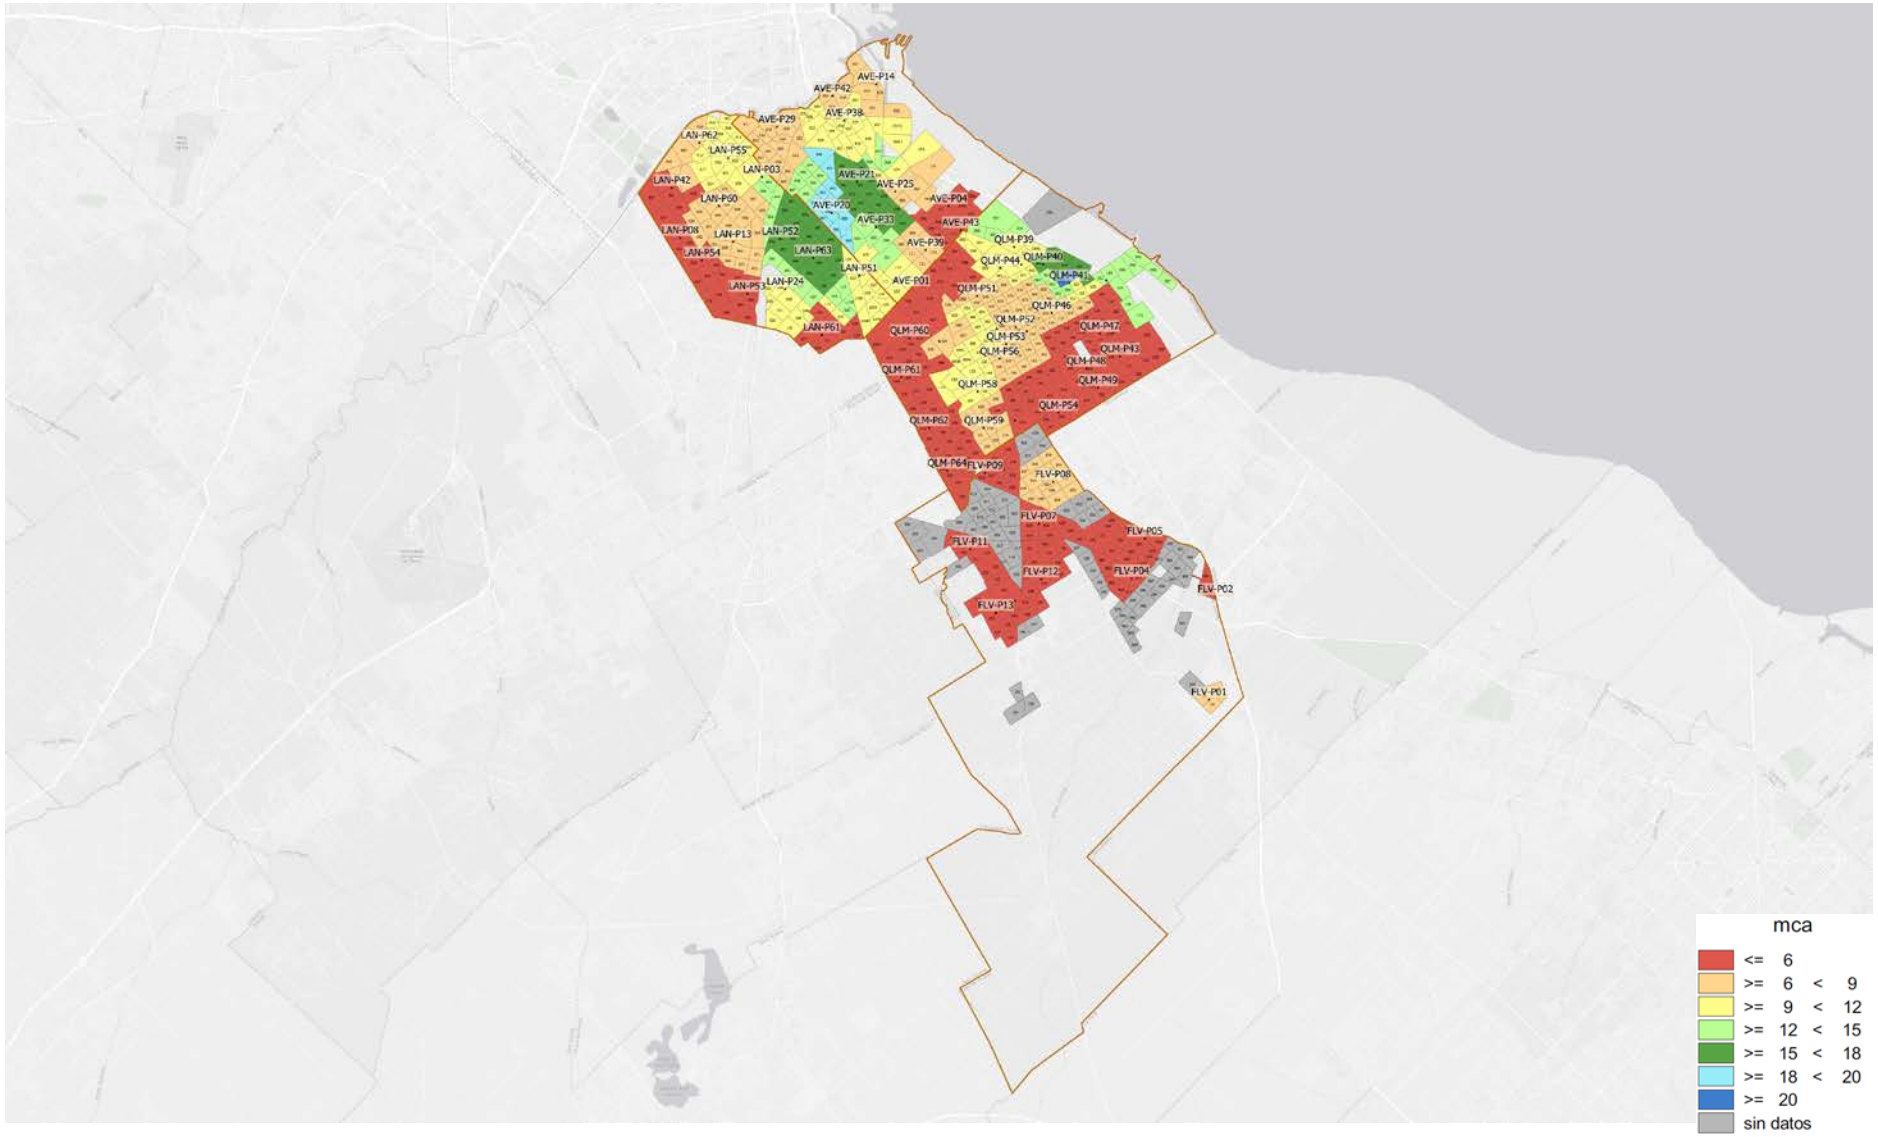


Presión Máxima Promedio Anual 2025 – Región Sudeste

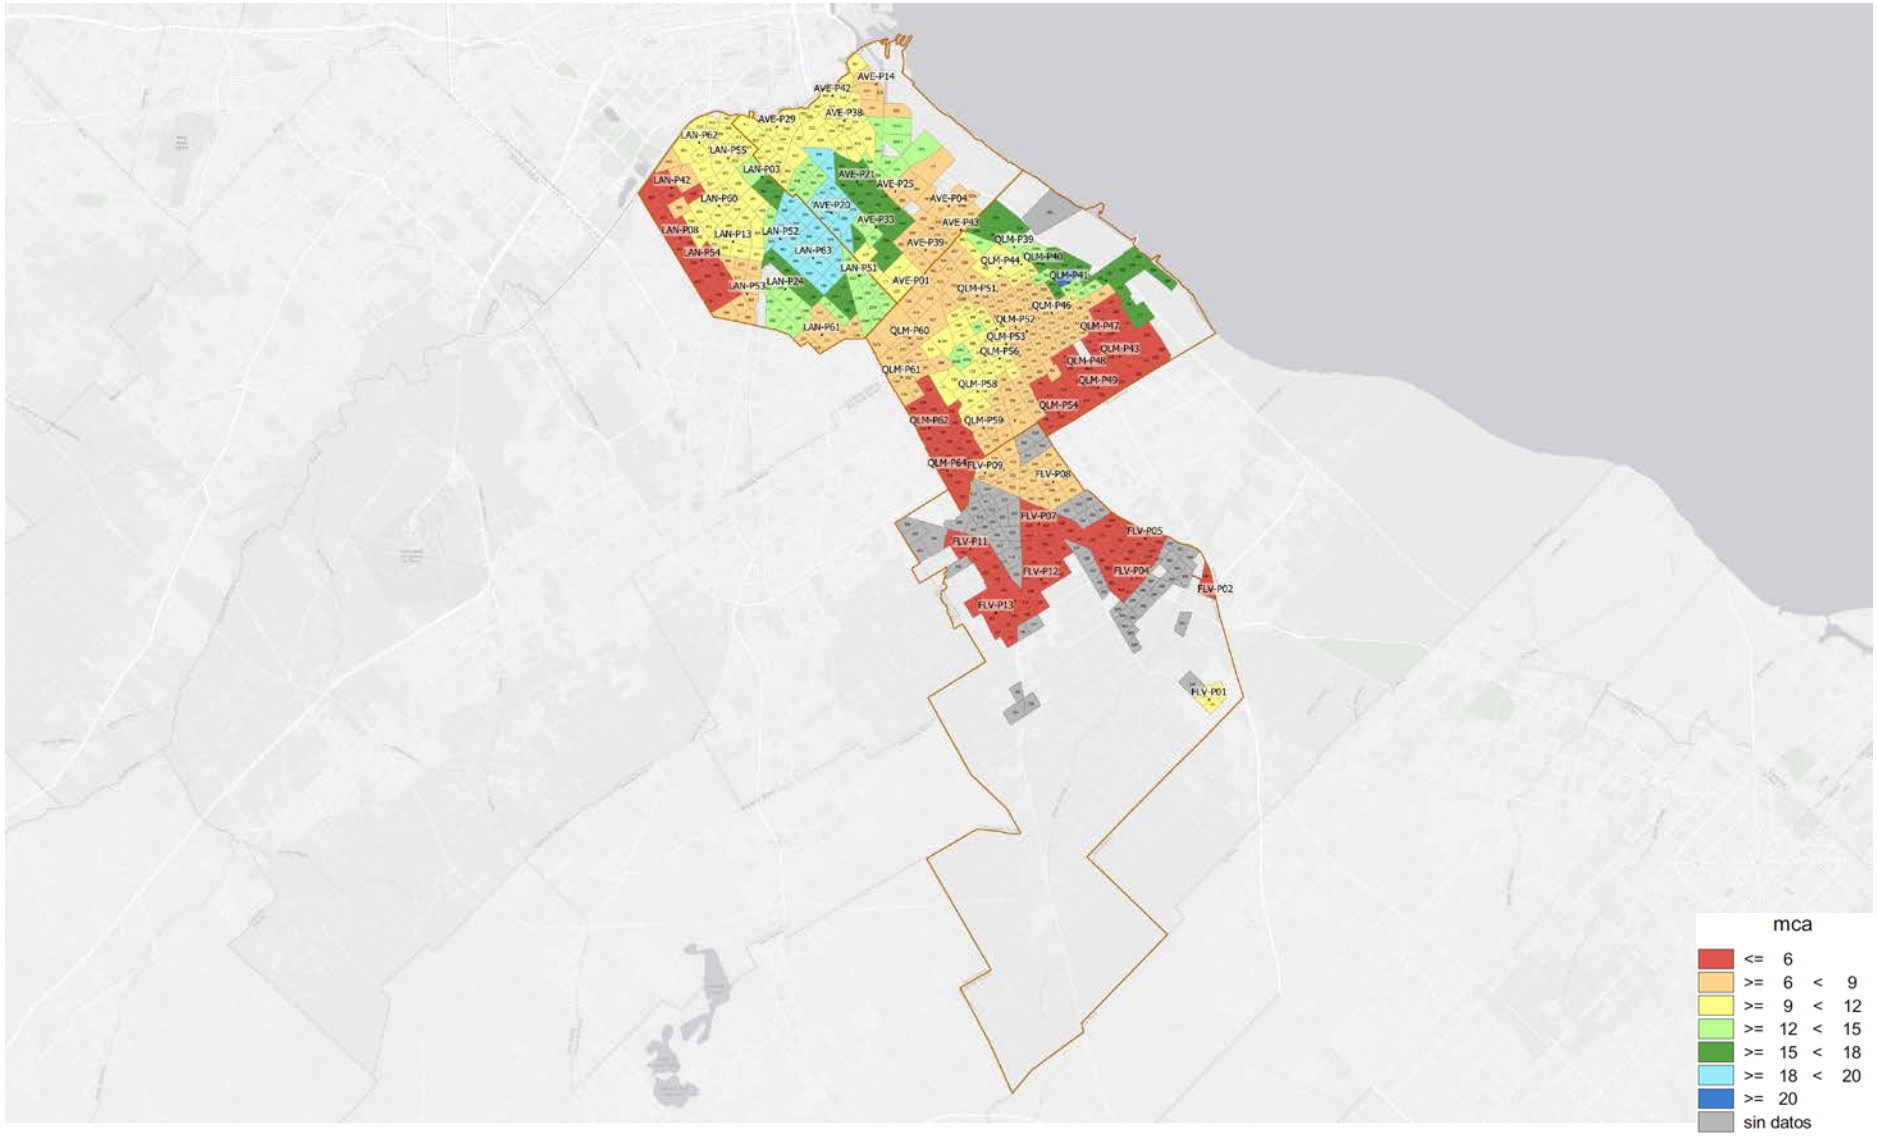


Presión Promedio Anual 2025 – Región Sudoeste

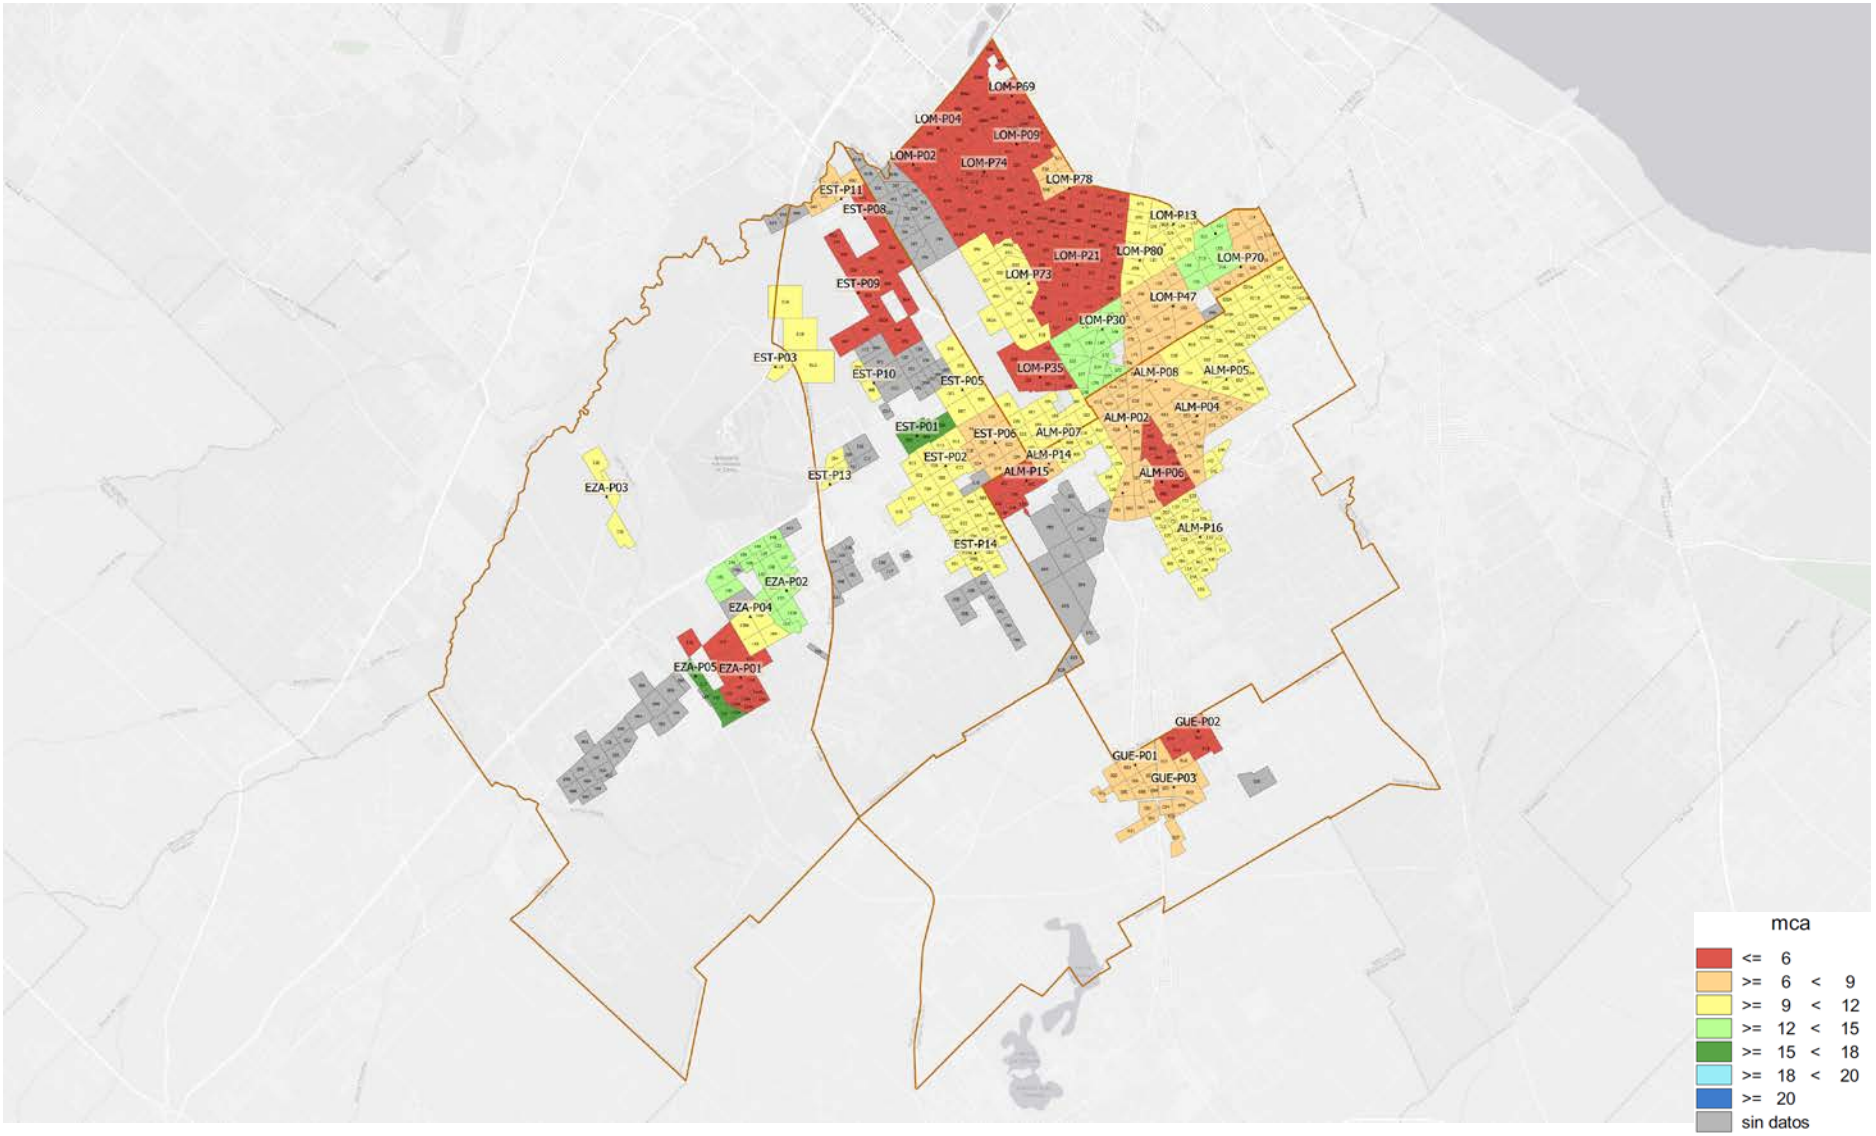

Presión Mínima Promedio Anual 2025 – Región Sudoeste

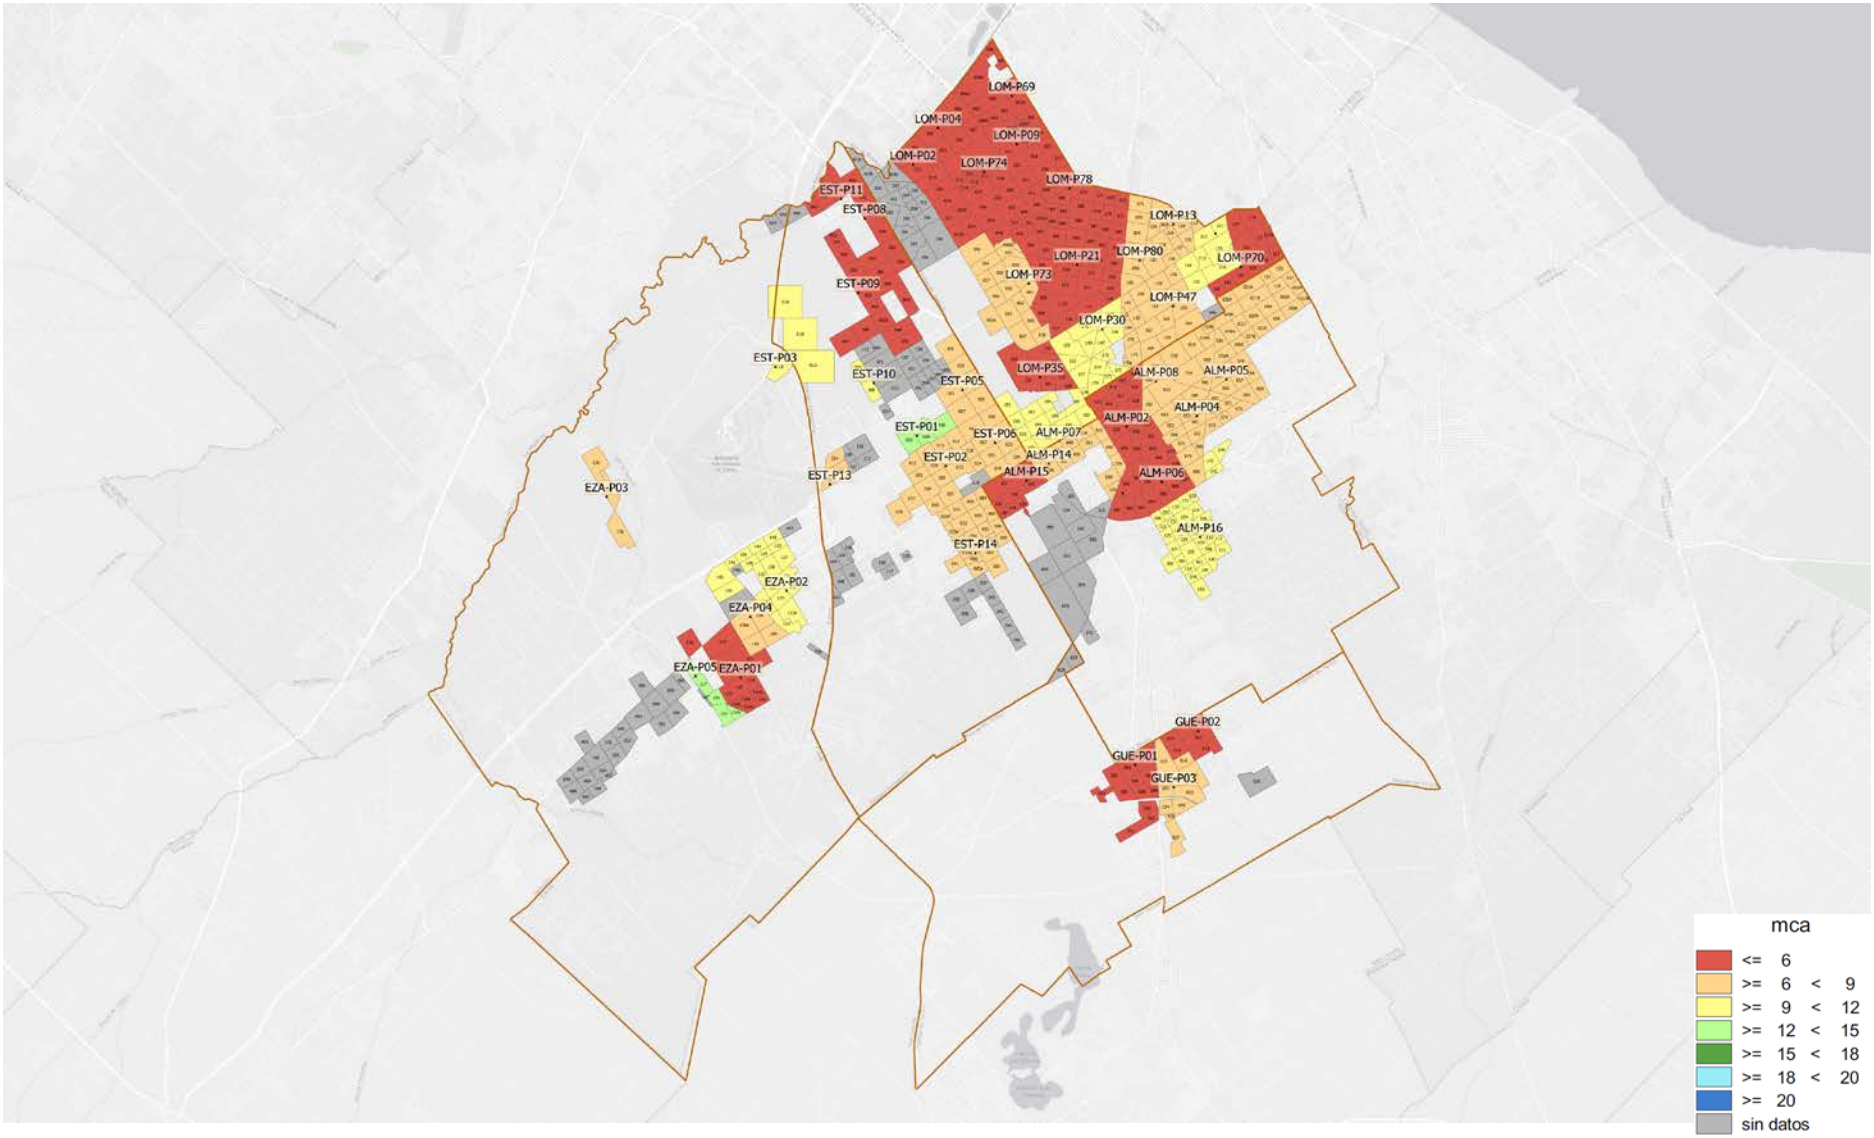

Presión Máxima Promedio Anual 2025 – Región Sudoeste

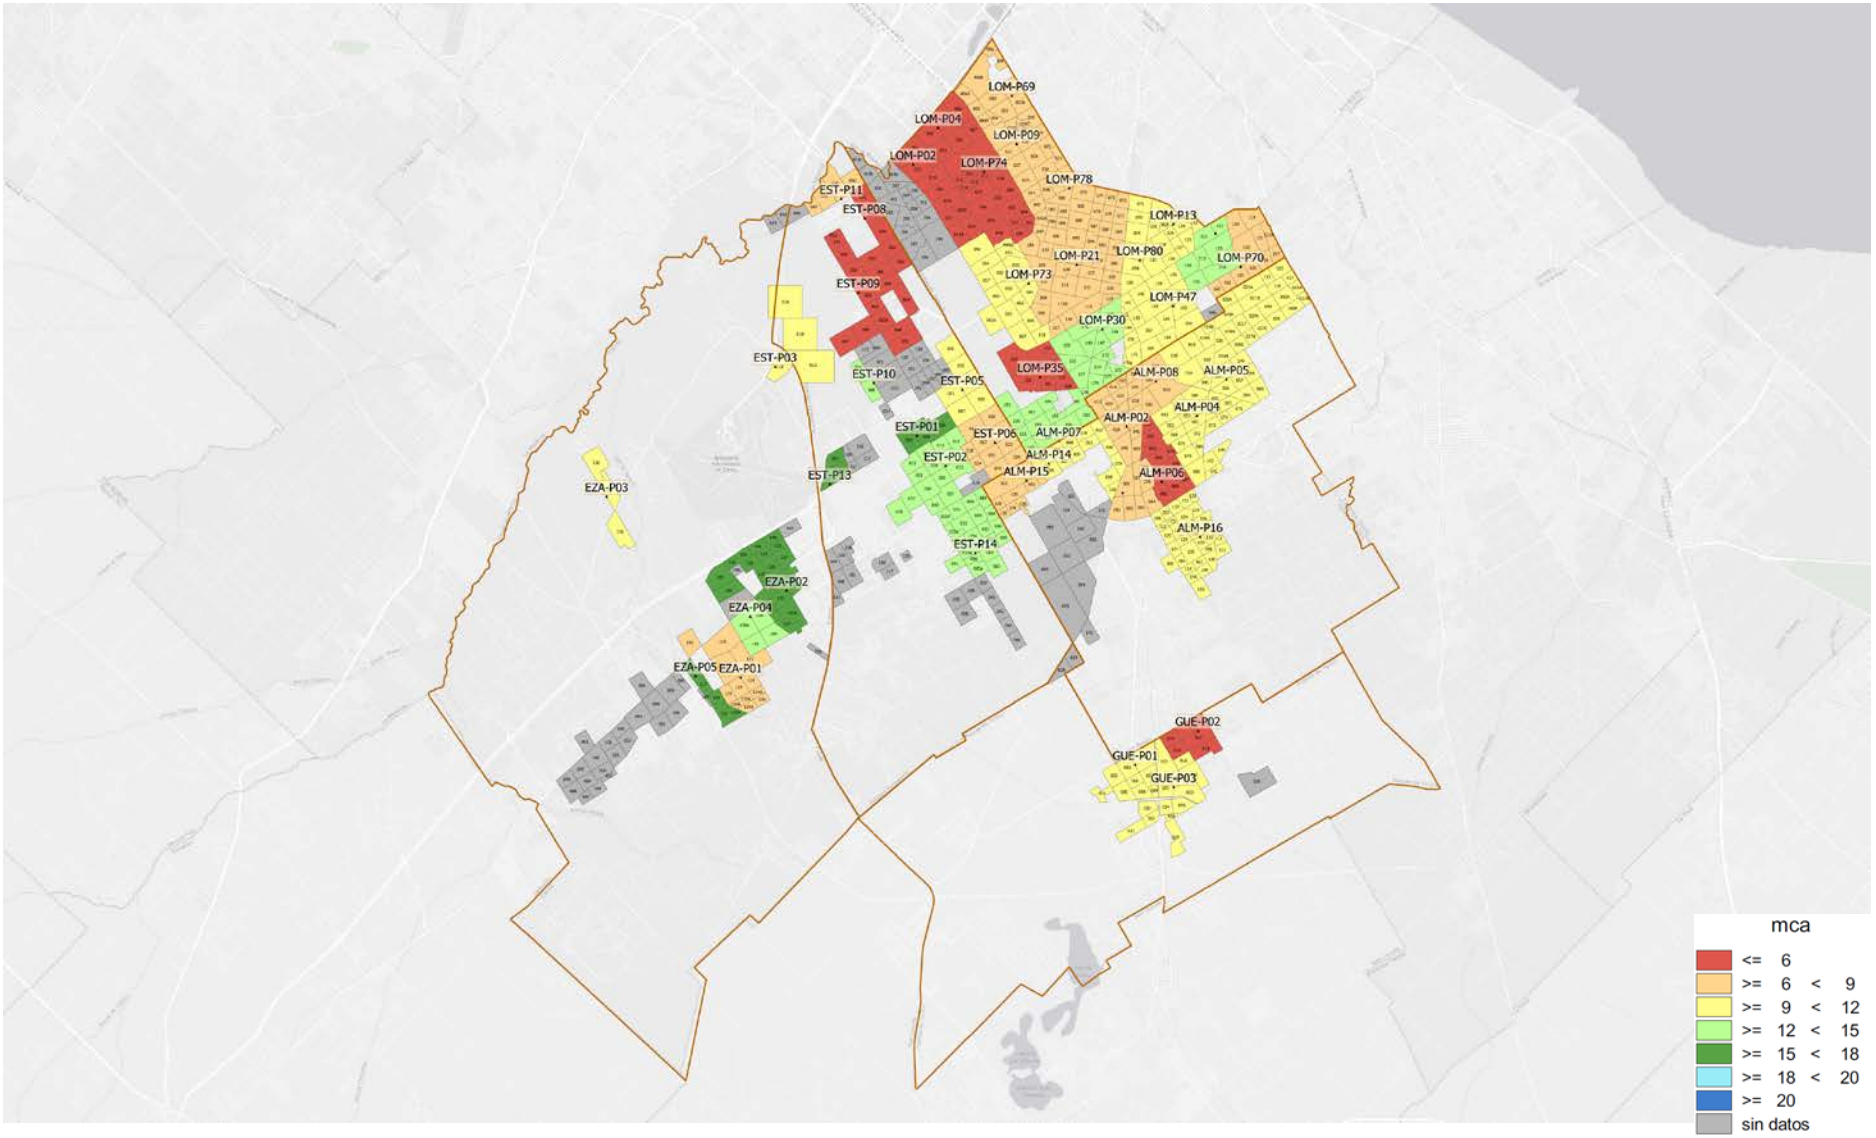



www.aysa.com.ar

1.7 REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

INFORME DE NIVELES DE SERVICIO 2025

1.7 REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

Dirección de Ingeniería
Gerencia de Agua No Contabilizada
2026

ÍNDICE

1.7. Reducción de Agua No Contabilizada 3

1.7.1. INTRODUCCIÓN 3

1.7.2. BALANCE DE AGUA 3

1.7.2.1. ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DE VARIABLES DEL BALANCE DE AGUA 5

1.7.2.1.1. ACTUALIZACIÓN DATO "POBLACIÓN ABASTECIDA" 6

1.7.2.1.2. ACTUALIZACIÓN METODOLOGÍA "AGUA ENTREGADA A LA RED" 6

1.7.2.1.3. ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA "CONSUMOS UREM" 7

1.7.2.1.4. CONSIDERACIONES PARA LA COMPARACIÓN INTERANUAL 8

1.7.2.2. RESULTADOS 2025 9

1.7.2.2.1. DOTACIÓN DE AGUA 10

1.7.2.2.2. CONSUMO AUTORIZADO 11

1.7.2.2.3. ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANC) 12

1.7.2.2.4. PÉRDIDA APARENTE O COMERCIAL 13

1.7.2.2.5. PÉRDIDA REAL O FÍSICA 13

1.7.2.2.6. ÍNDICE CONFIABILIDAD DEL AGUA ENTREGADA O BOMBEADA A LA RED 14

1.7.2.3. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES COMPONENTES DEL BALANCE DE AGUA 15

1.7.2.3.1. AGUA ENTREGADA O BOMBEADA A LA RED 15

1.7.2.3.2. CONSUMO AUTORIZADO COMERCIALIZADO 27

1.7.2.3.3. CONSUMO AUTORIZADO NO COMERCIALIZADO 30

1.7.2.3.4. SUBMEDICIÓN METROLÓGICA – CONSUMOS NO AUTORIZADOS – INEXACTITUD EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CONSUMO 31

1.7.2.4. CONCLUSIONES DE GESTIÓN DEL BALANCE DE AGUA E INDICADORES 2025 33

1.7.3. PLAN DE ACCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANC) – AVANCES 2025 33

1.7.3.1. GESTIÓN Y CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN 34

1.7.3.1.1. Programa de Macromedición Agua Entregada a la Red 34

1.7.3.1.2. Programa de Medición UREM (urbanizaciones residenciales emergentes) 36

1.7.3.1.3. Programa de Monitoreo de Presiones 39

1.7.3.2. Gestión y Control de las Presiones 40

1.7.3.3. Gestión y Control de las Pérdidas Físicas 42

1.7.3.3.1. Programa de sectorización de redes (DMA) 42

1.7.3.3.2. Gestión de las Pérdidas Aparentes dentro DMA 45

1.7.3.3.3. Innovación – Herramienta de Gestión inteligente para la detección temprana de fugas 47

1.7.3.3.4. Programa de búsqueda de fugas 51

1.7.3.3.4.1. Eliminación de Fugas en Redes de Agua mediante Prelocalización Satelital 51

1.7.3.3.4.2. Programa de localización de fugas con sensores de ruido permanente 53

1.7.3.3.4.3. Programa de localización de fugas con gas trazador helio 55

1.7.3.4. Gestión de Activos 60

1.7.3.4.1. Rehabilitación con limpieza desincrustante redes de agua de hierro fundido ... 60

1.7.3.4.2. Rehabilitación con revestimiento con resina poliurea 61

1.7.3.4.3. Renovación Estructural de Redes Distribuidoras 63

1.7.3.5. Conclusiones generales 63

1.7. REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

1.7.1. Introducción

La reducción del Agua no Contabilizada y particularmente del Agua No Comercializada genera incrementos en los ingresos de la compañía, reducción de costos operativos, mejora en la prestación del servicio y/o potencialmente posibilita abastecer a nuevos usuarios sin necesidad de realizar inversiones en nuevas plantas potabilizadoras ni de esforzar los recursos hídricos.


Para establecer metas de reducción, se requiere contar con un balance fiable y preciso que sea la herramienta para identificar donde y cuando actuar en el sistema (estructural o hidráulicamente) y que permita mensurar efectivamente el impacto de las acciones a ejecutar.

Siguiendo entonces el esquema del Balance, se han identificado estrategias de origen técnico y/o comercial que involucran el accionar de distintas áreas de la empresa con misiones y funciones específicas.

A continuación, se detallarán aspectos relacionados con el Balance de Agua y el Plan de Agua No Contabilizada enfocados principalmente a las “Estrategias Técnicas” que involucran el Agua Entregada a la Red y la Pérdida Física o Real.

1.7.2. Balance de Agua

El modelo conceptual del Balance Hídrico (ver Figura) adoptado por AySA se corresponde con el propuesto por la AWWA[1] y la IWA[2] el cual esquematiza los volúmenes de agua suministrados, los volúmenes de agua entregados a los usuarios y los volúmenes de agua perdidos, ya sea en forma real o aparente, durante un intervalo de tiempo. Para evitar el impacto de eventos puntuales se utiliza como intervalo de análisis el valor anual.

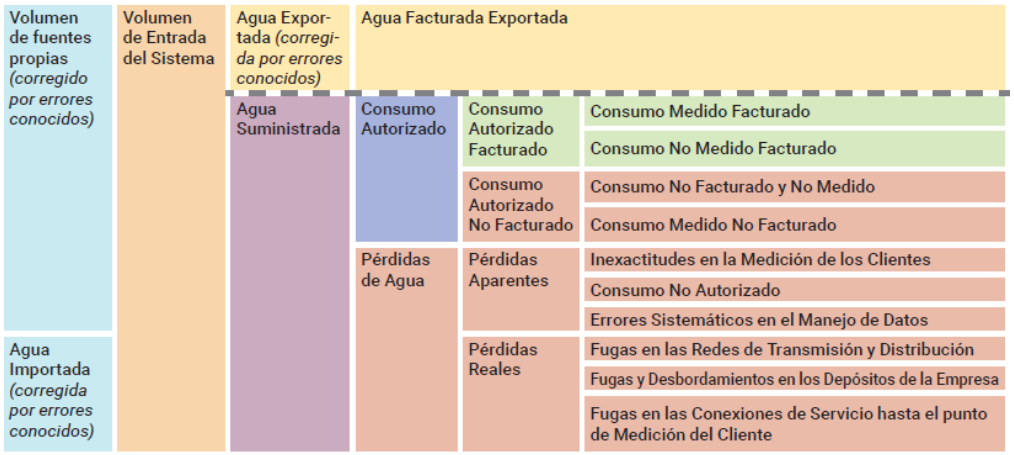

Hipótesis de cálculo:

- El balance presentado detalla las etapas del proceso desde que el agua se libera a la red de transporte y distribución – agua bombeada a la red- hasta el consumo de los usuarios.
- Los volúmenes de agua -ya sea de entrada como de salida- que no pueden ser medidos son estimados mediante métodos estadísticos.

[1] American Water Works Association

[2] International Water Association

- El período de análisis es anual.
- El balance se calcula para AySA global, divisiones regionales y distritos.
- El modelo de balance agua, sus resultados y el plan de acción de reducción de pérdidas corresponde a AySA total, incluyendo los partidos de AySA original año 2015 y los Nuevos Partidos incorporados a partir del año 2016.

Datos de entrada al Modelo:

- **Volumen de entrada al sistema**: es el volumen anual de agua tratada bombeado e introducido al sistema de distribución de agua potable, medido o estimado a las salidas de las Estaciones Elevadoras, Impelentes y Pozos, expresado en m^3/d.
- **Volumen de agua entregada a la red**: es el volumen anual de agua tratada que se bombea al sistema de distribución de agua al por menor. Es igual al volumen de entrada al sistema menos el volumen de agua exportada o de venta de agua en bloque, expresado en m^3/d.
- **Volumen de venta de agua en bloque**: es el volumen anual de agua a granel transportada y vendida por la empresa a los sistemas de agua fuera de su área de servicio y que cuentan con un sistema de distribución propio (redes) que no se encuentra bajo la operación y mantenimiento de AySA, expresado en m^3/d.
- **Consumo Autorizado Comercializado Medido:** Es el volumen anual de agua que se obtiene de sumar todos los consumos medidos de usuarios registrados que son facturados. Se obtiene del sistema de facturación de la empresa. Incluye el consumo de todos los grupos de clientes, como los domésticos, comerciales, industriales, estatales y sociales. No incluye el agua exportada o venta en bloque que se mide y se factura, éstas últimas deben ser restadas para no duplicarlas ni en el agua contabilizada ni en el agua comercializada.
- **Consumo Autorizado Comercializado No Medido:** Es el volumen anual de agua consumido por usuarios registrados no medidos que se calcula a través de una serie de regresiones lineales teniendo en cuenta diversos factores, según sea el tipo de usuario. En el cálculo se contempla la submedición metrológica por distrito y categoría. El dato es proporcionado por la Dirección Comercial.
- **Consumo Autorizado No Comercializado:** Este volumen de agua comprende el agua que está autorizado de consumir por parte de la empresa, pero que por distintas razones no es comercializado. Este segmento incluye:
    - Usos operativos propios en la red de agua y cloaca, tales como, limpieza de cañerías en servicio, agua utilizada para el lavado de nuevas cañerías, otros.
    - Usos operativos propios para el llenado de camiones cisternas al servicio de AySA.
    - Uso de agua en hidrantes por parte de Bomberos.
    - Agua proporcionada a las instituciones cívicas sin comercializar
    - Uso de agua en el espacio público, tales como el uso de agua para camiones regadores, regado de plazas, limpiezas varias
    - Consumo de agua de urbanizaciones emergentes dentro del radio servido de AySA que no son facturados.
- **Consumo No Autorizado:** Agua tomada del sistema de distribución sin la autorización de la empresa de AySA. El consumo no autorizado es uno de los componentes de las pérdidas aparentes. Puede incluir:
    - Agua extraída (sin autorización) de los hidrantes.
    - Conexiones ilegales o clandestinas
    - Fraudes, tales como derivaciones a los medidores de los usuarios (by-pass), manipulación del equipo de lectura del medidor, o acciones similares.
- **Inexactitud en la Medición de Consumo de los Usuarios o Submedición Metrológica:** son las pérdidas de agua causadas por el submedición de los medidores de agua de los clientes. Es decir, es el volumen de agua que representa el error de medición del consumo entendido como la diferencia entre el valor real consumido y el medido por el contador. Depende de los siguientes factores: características del medidor, caudal al que se realiza la medición, estado del medidor, tipo de instalación interna del usuario, tipo de consumidor, presiones de servicio, entre otras.
- **Error sistemático en la gestión de datos de consumo**: es el volumen que representa el error en el valor de consumo autorizado por inexactitudes en la gestión de los datos. En general se

producen por: uso inadecuado de consumos estimados, determinación inadecuada de los consumos estimados, cuentas de consumidores identificadas con variación de destino, cuentas de consumidores perdidas en la base de datos, datos de medición inexactos, cambios en los datos de volumen de consumo cuando las facturas se ajustan por cualquier motivo que no sea una lectura incorrecta.

- **Población abastecida:** es la totalidad de población que efectivamente es abastecida con agua potable producida, transportada y distribuida por la empresa (excluye la población asociada a agua en bloque). Se expresa en habitantes abastecidos o unidad funcional abastecida.
- **Longitud de cañerías:** es la longitud de todas las cañerías (excepto las conexiones de servicio) en el sistema a partir del punto de medición de entrada al sistema o agua suministrada.
- **Número de conexiones**: es la cantidad total de conexiones. Este número puede diferir del número de usuarios o expedientes (no incluye las conexiones de hidrantes) por la multiplicidad de conexión.

Datos de salida del Modelo:

- **Consumo Autorizado:** es el volumen anual que la empresa autoriza a consumir y se compone del volumen de agua que consumen los usuarios registrados -con medidor o sin medidor- y los consumos autorizados no comercializados.
- **Agua No Contabilizada (ANC) o Pérdidas de Agua:** Es la suma de las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. Este valor también puede obtenerse calculando la diferencia entre el volumen de entrada al sistema y el consumo autorizado.
- **Pérdida Comercial o Aparente:** este tipo de pérdidas representa el agua que es consumida pero no es correctamente contabilizada y, en consecuencia, no es facturada o comercializada. Se compone de:
  - Consumo No autorizado
  - Error sistemático en el manejo de datos generados por el sistema de lectura o facturación
  - Inexactitudes en la medición del cliente
- **Pérdida Física o Real:** Es el volumen anual perdidos por todo tipo de fugas (visibles, invisibles o semivisibles) en cañerías o artefactos de la red, depósitos de distribución administrados por la empresa y conexiones de servicio hasta el punto de medición del cliente o línea municipal.
- **Agua Comercializada:** representa la porción del Volumen de Entrada del Sistema que se comercializa. Se compone del consumo autorizado comercializado medido y no medido, y de la venta de agua en bloque.
- **Agua No Comercializada:** representa la porción de agua que no es comercializada y no genera utilidades para la empresa. Se calcula como la diferencia entre el volumen de agua entregada a la red y el Agua Comercializada.
- **Dotación de agua:** es la cantidad de agua entregada a diario a la red de distribución por cada habitante abastecido en el área de servicio. Contempla todos los consumos autorizados, las pérdidas reales (físicas) y las pérdidas aparentes (comerciales) que existen en el sistema de distribución.

1.7.2.1. Actualización metodológica de variables del Balance de Agua

Durante el año 2025 se implementaron actualizaciones metodológicas en algunas de las principales variables utilizadas para la elaboración del Balance de Agua. Estas modificaciones tuvieron como objetivo incrementar la confiabilidad y representatividad de la información empleada en el cálculo de los indicadores de gestión, incorporando nuevas fuentes de información, mejoras en los procesos de medición y actualización de las bases de referencia utilizadas.

Dado que estas variables constituyen insumos fundamentales para la determinación de indicadores tales como la Dotación de Agua, el Agua No Contabilizada, las Pérdidas Reales y las Pérdidas Aparentes, los cambios implementados fueron considerados también en la revisión y recálculo de los valores comparativos correspondientes al año 2024, a fin de asegurar la consistencia metodológica y la comparabilidad interanual de los resultados.

A continuación, se describen las principales actualizaciones realizadas.

1.7.2.1.1. Actualización dato “población abastecida”

La determinación de la población abastecida fue actualizada durante el año 2025, a partir de la disponibilidad de la información censal más reciente.

Hasta el año 2024, la estimación se sustentaba principalmente en las proyecciones demográficas derivadas del Censo Nacional 2001 y 2010, respectivamente, y en la incorporación de población asociada a la expansión del área servida mediante herramientas GIS AySA. A partir de la publicación de los resultados definitivos del Censo Nacional 2022 y de las proyecciones oficiales del INDEC para el período 2022-2035, se adoptó una nueva proyección basada en:

Fuente de información:

- Población por radio censal correspondiente al Censo 2022, incorporada al Sistema GIS mediante los archivos shapefile publicados por el INDEC.
- Coeficientes de crecimiento interanual por municipio elaborados por AySA a partir de las proyecciones oficiales del INDEC (2022-2035) y ajustes específicos de la empresa.

Metodología de cálculo:

- Identificación de los radios censales efectivamente abastecidos al año 2025.
- Obtención de la población censal 2022 correspondiente a dichos radios.
- Proyección de la población abastecida al año de análisis mediante la aplicación de los coeficientes de crecimiento adoptados para cada municipio.

Con el propósito de mantener la consistencia temporal del indicador, la población abastecida correspondiente al año 2024 también fue recalculada bajo estas premisas:

Concepto	Unidad	Valor original IA2024	Valor Recalculado 2024
Población Residente Abastecida Agua 2024	[habitantes]	11.473.228	**10.693.032**

1.7.2.1.2. Actualización metodología “agua entregada a la red”

El volumen de agua entregada a la red, también denominado agua bombeada o despachada a la red, se determina como la sumatoria de los caudales de agua introducidos al sistema de distribución desde estaciones elevadoras, estaciones impelentes y pozos de producción, considerando tanto valores medidos como estimados.

El ajuste que se detalla a continuación alcanza solo al agua de origen subterráneo.

Hasta el año 2023 inclusive, el aporte de agua de dicho origen se calculaba como la sumatoria de caudales de producción estimada individualmente para cada pozo, utilizando como variables de referencia las horas de funcionamiento y el consumo energético registrado. Esta metodología presentaba limitaciones asociadas a la incertidumbre propia de las estimaciones y no contemplaba eventuales rechazos en instalaciones de tratamiento, ni pérdidas entre la extracción y la incorporación efectiva del caudal a la red de distribución.

Durante el año 2024, la Dirección de Agua llevó adelante un proceso de revisión metodológica orientado a incrementar la confiabilidad de este componente, estructurado en dos líneas de acción principales:

- Incorporación de mediciones existentes en puntos de convergencia de pozos, tales como rebombeos, baterías de pozos, centros de mezcla, plantas de ósmosis inversa y otras instalaciones con medición continua.


- Implementación de un programa sistemático de medición y verificación de pozos y puntos de convergencia.

Como resultado, a partir del año 2025 el volumen de agua de origen subterráneo entregada a la red se determina mediante una metodología combinada que integra información proveniente de estimación de pozos no medidos, mediciones en puntos de convergencia y mediciones directas mediante caudalímetros instalados en pozos individuales.

A efectos comparativos, el valor correspondiente al año 2024 fue recalculado bajo los mismos criterios metodológicos, obteniéndose los siguientes resultados:

Concepto	Unidad	Valor original IA2024	Valor Recalculado 2024
Agua subterránea 2024	[m³/día]	1.094.613	**1.042.722**
Agua entregada a la red 2024	[m³/día]	6.092.725	**6.040.834**

A modo gráfico, en el siguiente esquema, se observa el balance original publicado en el Informe Anual 2024 y el mismo balance incorporando el valor recalculado de agua subterránea 2024.

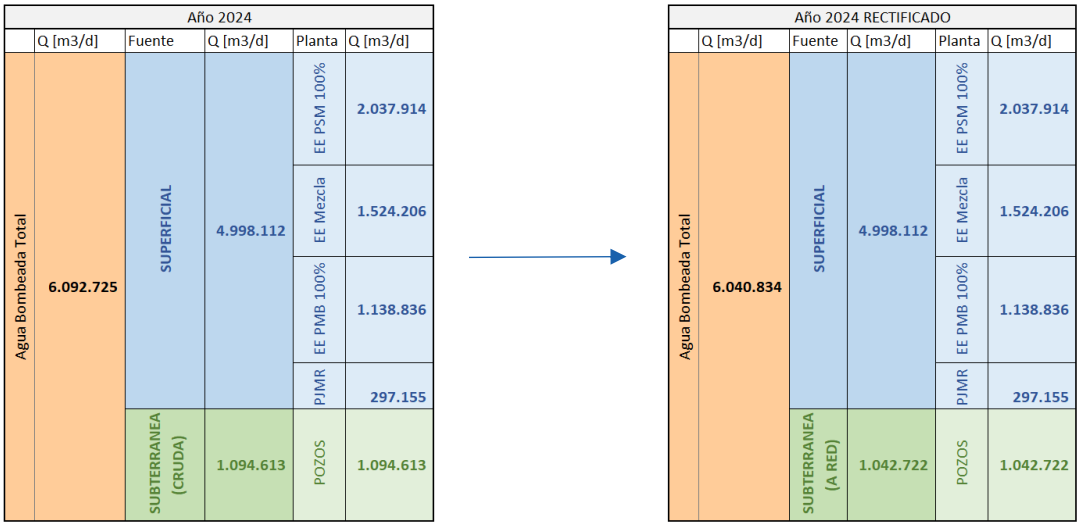

La aplicación de la nueva metodología permite obtener una estimación más representativa del volumen efectivamente incorporado al sistema de distribución, reduciendo la incertidumbre asociada al cálculo del indicador de dotación.

1.7.2.1.3. Actualización metodológica “Consumos UREM”

Durante el año 2024, se inició un proceso de confiabilización y actualización del Consumo de agua de las UREM (Urbanizaciones Residenciales Emergentes). Para ello, se desarrollaron trabajos de gabinete y de campo para medir el agua entregada en dichos sectores. Ello permitió conocer el caudal entregado en zonas emblemáticas como la Villa 31, Villa 21-24 y Villa Inflamable, entre otras. Los resultados obtenidos permitieron, además de actualizar los valores de dotación de agua de dichas UREM, redefinir los criterios de asignación de consumo al resto de las urbanizaciones. Asimismo, en el balance de agua año 2024, los volúmenes de agua de UREM dentro de radio servido abastecidos efectivamente desde la red de AySA fueron asignados a Consumos Autorizados Comercializados Medidos o No Medidos según su situación particular respecto de la medición.

El proceso de confiabilización del Consumo de UREM ubicadas dentro de radio servido y que se abastecen con agua proveniente del sistema de distribución de AySA se mantuvo durante el año 2025. Al cierre del año, contemplando avances de mesas de trabajo realizadas entre el ERAS y AySA y considerando resultados de trabajos de gabinete y campo obtenidos a lo largo del año, se definió hacer una reasignación en la segmentación de este universo en función de la posibilidad real de comercializar el consumo, a saber:

- El volumen asignado a consumo (medido o no medido) de aquellos barrios cuya facturación es reclamable se considera → **Consumo comercializado**
- El resto, que por diferentes motivos se encuentran en proceso de regularización comercial (ya sea medido o no medido) se considera → **Consumo autorizado no comercializado**

Por otra parte, como resultado del análisis del padrón de Barrios UREM, se detectaron barrios con datos demográficos inconsistentes con lo relevado en campo, especialmente en asentamientos. Ante esto, se seleccionaron los barrios con más de 10 habitantes por vivienda para ajustar sus cifras de población y unidades funcionales. En total, se actualizaron 125 urbanizaciones emergentes utilizando fuentes oficiales: prioritariamente el RENABAP (actualización 2022) y, en su defecto Censo 2022 (en casos de coincidencia total con el radio censal). Finalmente, la información se cotejó con la base comercial de AySA para validar la cantidad de viviendas.

A efectos comparativos, el valor correspondiente al año 2024 fue recalculado bajo los criterios metodológicos mencionados previamente, obteniéndose lo siguientes resultados:

Concepto	Unidad	Valor original IA2024	Valor actualizado 2024
Consumo Comercializado Medido UREM	[m^3/d]	59.081	**31.315**
Consumo Comercializado No Medido UREM	[m^3/d]	679.148	**151.985**
Consumo Autorizado No Comercializado UREM	[m^3/d]	40.821	**570.142**

El ajuste mencionado impacta en el cálculo de indicadores tales como %agua no comercializada, consumo autorizado comercializado y consumo autorizado no comercializado.

1.7.2.1.4. Consideraciones para la comparación interanual

Los indicadores derivados del Balance de Agua están sujetos al grado de confiabilidad de las variables que lo integran. En este sentido, durante los últimos años, AySA ha desarrollado distintas acciones orientadas a mejorar la calidad de la información base del modelo, algunas de las cuales ya han sido mencionadas en el punto anterior pero también se llevó a cabo confiabilización del dato relacionado con el consumo, tales como: la actualización del padrón y de consumos asociados a Urbanizaciones Residenciales Emergentes (UREM) y la revisión de los coeficientes de submedición comercial.

Estas mejoras metodológicas producen una redistribución de los volúmenes dentro del Balance de Agua, modificando la participación relativa de sus distintas componentes. Por tal motivo, las variaciones observadas en los indicadores de Agua No Contabilizada, Agua No Comercializada y Pérdidas no deben interpretarse exclusivamente como consecuencia de cambios en el desempeño físico de la infraestructura o en la gestión operativa del sistema, sino también como resultado del proceso continuo de confiabilización de la información utilizada para su determinación.

En consecuencia, la evaluación de tendencias y el análisis de resultados deben realizarse considerando simultáneamente la evolución de las variables operativas, los indicadores de desempeño de la red y las modificaciones metodológicas implementadas en cada período, a fin de asegurar una interpretación técnicamente consistente de los resultados obtenidos.

Las actualizaciones metodológicas descriptas fueron aplicadas tanto a los resultados correspondientes al año 2025 como al recálculo de los valores de referencia del año 2024. De esta forma, los análisis de evolución interanual que se presentan a continuación se realizan sobre bases metodológicas homogéneas y comparables.

Para garantizar la comparabilidad de la información, los valores 2024 fueron recalculados bajo los nuevos criterios. A continuación se presenta un resumen de los valores originales y recalculados. Estos últimos serán utilizados a lo largo del documento para evaluar la evolución.

Concepto	Unidad	Valor original IA2024	Valor Recalculado 2024
Dotación de Agua	[litros/hab/día]	530	**565**
	[m^3/b/UF]	90	**89**
Consumo autorizado comercializado	[m^3/d]	3.729.169	**3.134.284**
Consumo autorizado no comercializado	[m^3/d]	79.106	**648.381**
Consumo autorizado	[m^3/d]	3.808.274	**3.782.666**
Agua No Contabilizada	%	37,4	**37,3**
Pérdidas Reales	%	34,7	**34,6**
	m^3/km/día	83	**82**
Pérdidas Aparentes	%	2,5	**2,7**

1.7.2.2. Resultados 2025

El detalle de las componentes y del cálculo del Balance Hídrico 2025 se desarrolla en el “Informe de Segmentación del Agua Entregada a la Red 2025”. A continuación, se presentan las magnitudes del área de servicio sobre la cual se aplica el modelo y un resumen de los resultados de indicadores estratégicos.

Concepto	Unidad	Valor 2025
Habitantes servidos agua (no clandestinos)	[habitantes]	**10.726.021**
Agua Bombeada a la Red	[m^3/día]	**6.059.226**
Agua Bombeada a la Red (sin agua en bloque a Nordelta y Barrios cerrados de Merlo)	[m^3/día]	**6.045.156**
Consumo Comercializado Medido	[m^3/día]	**932.214**
Consumo Comercializado No Medido	[m^3/día]	**2.109.197**
Consumo Autorizado No Comercializado	[m^3/día]	**648.922**

Indicadores Principales	Unidad	Resultados 2025
Dotación de agua (Agua entregada a diario al sistema de distribución por cada habitante abastecido)	[litros/hab/día]	**564**
Consumo Autorizado (Agua consumida por usuarios medidos y no medidos y los consumos autorizados no comercializados)	[m3/día]	**3.690.332**
Agua No Contabilizada		

(Pérdidas en Red sobre agua bombeada a la red, incluye pérdidas reales (físicas) y aparentes (comerciales)	[m3/día]	**2.354.824**
Índice Agua No Contabilizada [%] (Pérdidas en Red sobre agua bombeada a la red, incluye pérdidas reales (físicas) y aparentes (comerciales)	%	**39,0**
Pérdidas Aparente o Comercial	%	**3,3**
	[m3/día]	**200.009**
Pérdidas Reales o Físicas	%	**35,6**
	[m3/km/día]	**84**

A continuación se detallan aspectos de los indicadores principales.

1.7.2.2.1. Dotación de agua

La **dotación de agua** representa el volumen promedio diaria de agua entregada a la red de distribución por habitante abastecido. Este indicador integra la totalidad de los consumos autorizados, así como las pérdidas reales y aparentes existentes en el sistema, constituyéndose en una métrica clave para evaluar la eficiencia global de la prestación del servicio.

El indicador se calcula como la relación entre el volumen de agua entregada a la red y la población efectivamente abastecida, tal como se expresa en la imagen siguiente.


$$\frac{Volumen\ de\ Agua\ Bombeada\ a\ la\ red\ (expresada\ en\ \frac{m3}{d})}{Población\ Total\ Abastecida\ (expresada\ en\ habitantes)}$$

Para el año 2025, los valores obtenidos fueron los siguientes:

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Dotación de agua (por habitantes)	[litros/hab/día]	564

Durante el año 2025 se introdujeron mejoras en las metodologías de determinación de sus componentes fundamentales: el volumen de agua entregada a la red, la población abastecida y las unidades funcionales. Con el objetivo de asegurar la comparabilidad interanual del indicador, fueron recalculados los resultados correspondientes al año 2024 aplicando los mismos criterios metodológicos, permitiendo efectuar un análisis de evolución homogéneo y consistente.

Las figuras siguientes presentan la evolución histórica de la dotación de agua expresada por habitante. Para el año 2024 se incluyen simultáneamente los valores originalmente publicados en el Informe Anual 2024 y los recalculados conforme a la metodología vigente.

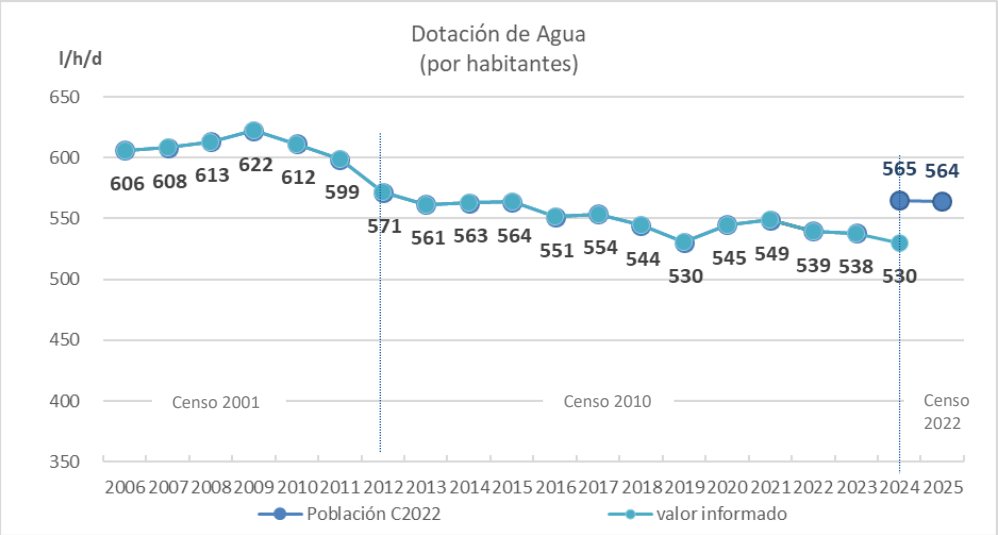

Cabe señalar que hasta el año 2021 los indicadores corresponden exclusivamente al área de servicio “AySA 2015”, mientras que a partir de 2022 se calculan para el ámbito “AySA Total”, incorporando las Nuevas Áreas de prestación.

La evolución histórica evidencia una tendencia descendente sostenida desde el año 2009, independientemente de la base poblacional utilizada para el cálculo. La única excepción se registró durante el período 2020-2021, cuando las condiciones operativas derivadas del ASPO generaron un incremento transitorio del indicador. A partir de 2022, la re-implementación de estrategias de regulación diurna y nocturna del bombeo permitió retomar la tendencia de reducción.

Durante 2025 dicha tendencia se mantuvo, impulsada principalmente por la disminución del volumen de agua entregada a la red de fuentes superficiales.

Estos resultados reflejan una evolución levemente favorable del indicador y evidencian el impacto de las acciones implementadas para mantener, en el mismo orden del año anterior, la oferta de agua.


1.7.2.2.2. Consumo Autorizado

El volumen anual que la empresa autoriza a consumir se compone del volumen de agua que consumen los usuarios registrados -con medidor o sin medidor- y los consumos autorizados no comercializados. Los consumos autorizados -medidos y no medidos- son proporcionados por la Dirección Comercial.

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Consumo Autorizado	[m^3/día]	**3.690.332**

Se registró una variación -**2,4**% respecto al año 2024 (recalculado) traccionada por la disminución del consumo comercializado. Como se detallará en apartados siguientes, los siguientes principales factores que abonaron a esta variación fueron:

- a la reducción del consumo comercializado por impacto del Plan de Medición Masiva
- y en menor medida, a la confiabilización de consumos dentro de las categorías UREM impulsado por la actualización del padrón de usuarios.

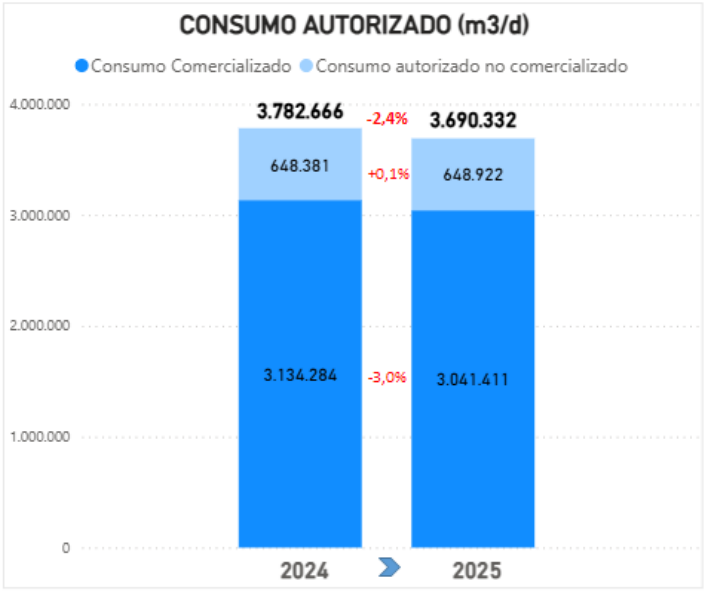

El detalle de evolución de los distintos componentes de este segmento se desarrolla en apartados siguientes.

1.7.2.2.3. Índice de Agua No Contabilizada (ANC)


Este índice representa a las pérdidas totales y se compone de las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. La metodología de balance de agua en base al modelo top-down calcula este índice como la diferencia entre el volumen de entrada al sistema y el consumo autorizado.

El Índice de Agua No Contabilizada (ANC) correspondiente al año 2025 alcanzó el siguiente valor:

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Índice de Agua No Contabilizada	%	**39,0**

Las variaciones observadas deben analizarse considerando las actualizaciones metodológicas descriptas en el apartado 1.7.2.1. y el resultado del Consumo Autorizado descripto en el apartado 1.7.2.2.2.

Las Figuras siguientes presentan la evolución histórica del indicador de ANC, así como de sus principales componentes, incluyendo las pérdidas reales expresadas en porcentaje.

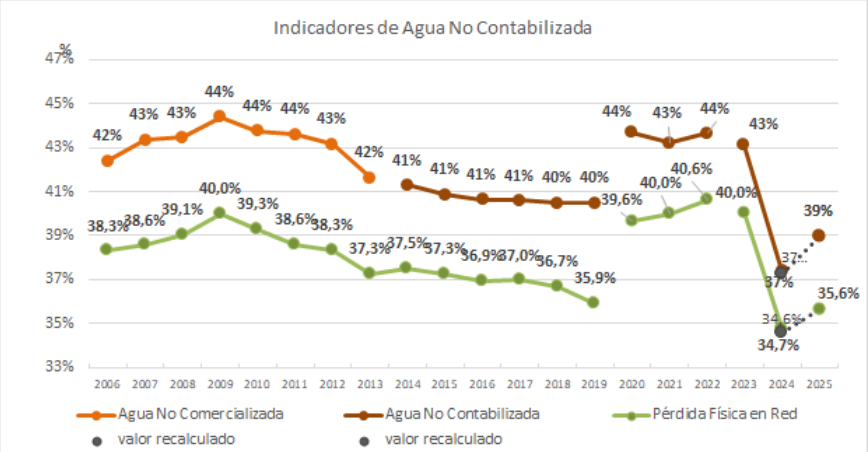

Hasta el año 2021 los resultados corresponden exclusivamente al área de servicio “AySA 2015”, mientras que desde el año 2022 se calculan para “AySA Total”, incorporando las Nuevas Áreas de prestación.

La evolución observada durante los años 2024 y 2025 se encuentra fuertemente influenciada por las mejoras implementadas en la calidad y confiabilidad de las variables de entrada del Balance de Agua. En particular, los trabajos de actualización y medición realizados en Urbanizaciones Residenciales Emergentes (UREM) permitieron mejorar significativamente la estimación de los consumos autorizados, reduciendo la incertidumbre asociada a esta componente.

En el año 2025, el incremento del índice respecto al año anterior se explica principalmente por la **disminución del Consumo Autorizado** registrada en el Balance de Agua detallada en el apartado anterior, ya que el volumen de agua entregada a la red permaneció prácticamente estable. Dado que el indicador de ANC surge de la diferencia entre ambas variables, la reducción del consumo autorizado incrementa proporcionalmente el volumen asignado a pérdidas.

No obstante, resulta importante destacar que la variación observada en el indicador no necesariamente refleja un deterioro equivalente de las condiciones físicas de la red, sino que responde en gran medida a los procesos de actualización y confiabilización de las componentes que integran el Balance de Agua. En consecuencia, el análisis de desempeño debe complementarse con la evaluación de indicadores específicos de pérdidas reales y de confiabilidad del balance, los cuales permiten interpretar con mayor precisión la evolución del sistema.

1.7.2.2.4. Pérdida aparente o comercial

Las pérdidas aparentes representan aquellos volúmenes de agua que son efectivamente consumidos por los usuarios, pero que no son registrados, medidos o facturados en forma adecuada debido a distintas causas asociadas a la medición, registración comercial o estimación de consumos. A diferencia de las pérdidas reales, estos volúmenes no corresponden a agua físicamente perdida en el sistema de distribución, sino a consumos que no generan la correspondiente recuperación económica por parte de la empresa.

Durante el año 2025, las pérdidas aparentes alcanzaron un valor **de 200.009 m³/día**, equivalente al 3,3 % del volumen total de agua ingresado al sistema.

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Pérdida Aparente o Comercial	[%]	**3,3**
	[m³/día]	**200.009**

Si bien este valor registró un incremento del 23,8 % respecto al año 2024, las pérdidas aparentes continúan constituyendo una proporción relativamente reducida dentro del Balance de Agua. No obstante, su relevancia resulta significativa desde el punto de vista económico y comercial, dado que impactan directamente sobre los ingresos asociados a la prestación del servicio.

Asimismo, la variación observada debe analizarse en conjunto con las mejoras metodológicas implementadas durante el período en la determinación de los consumos autorizados no medidos, la actualización de parámetros comerciales y la revisión de las bases de información utilizadas en el Balance de Agua. En este sentido, parte del incremento registrado responde a una mayor confiabilidad y representatividad de las variables de entrada, permitiendo una cuantificación más precisa de esta componente del Balance. En apartados posteriores se realiza un análisis particular de sus componentes.

1.7.2.2.5. Pérdida real o física


La pérdida real o física representa el volumen de agua que se pierde a través de fugas y escapes en redes, conexiones y demás componentes de la infraestructura de distribución. Se calcula como la diferencia entre el agua entregada a la red, y la suma de los consumos autorizados y de las pérdidas aparentes. En consecuencia se halla impactado por el valor resultante de las tres componentes anteriormente mencionadas.

Su evolución se presenta tanto en términos porcentuales respecto al agua entregada a la red, como mediante el indicador volumétrico expresado en m³/km/día.

Para el año 2025, los valores obtenidos fueron los siguientes:

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Pérdida física o real	%	35,6
	m³/km/día	84

La Figura siguiente muestra la evolución del indicador desde el inicio de AySA.

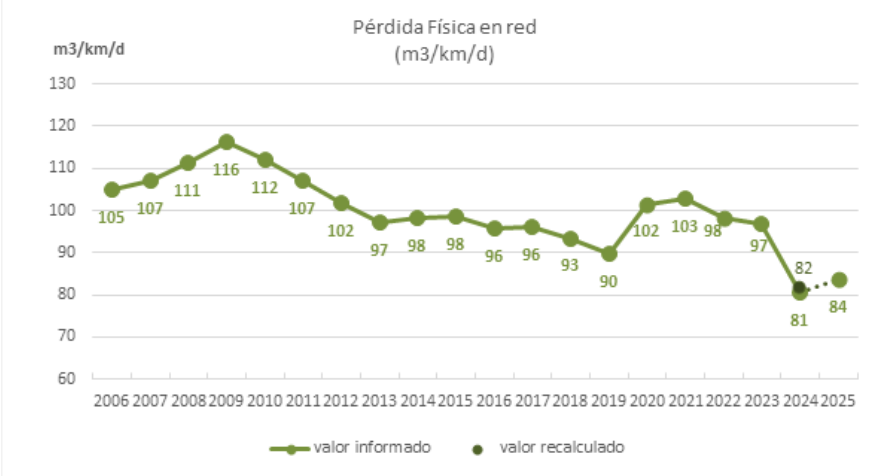

Los resultados obtenidos durante 2024 y 2025 deben interpretarse considerando además de los avances realizados en materia de gestión eficiente del bombeo y de reducción de pérdidas, como producto de la confiabilización de las componentes del Balance de Agua mencionadas a lo largo del capítulo. Estas acciones modifican la distribución de los volúmenes dentro del balance y, por tratarse de un cálculo de tipo top-down, impactan directamente sobre el valor resultante de pérdidas reales.

1.7.2.2.6. Índice Confiabilidad del Agua Entregada o Bombeada a la Red

El Índice constituye uno de los principales indicadores de calidad del modelo de Balance de Agua, ya que permite evaluar el grado de certidumbre asociado a la determinación del volumen de agua entregada o bombeada al sistema de distribución, principal variable de entrada para el cálculo de los indicadores de Agua No Contabilizada, pérdidas reales, pérdidas aparentes y dotación.

Se determina mediante la evaluación individual de cada uno de los puntos de medición utilizados en el Balance de Agua, considerando la tecnología empleada, el estado de calibración de los equipos, la disponibilidad de información y la incertidumbre asociada a cada medición. Se consideran confiables aquellos caudales medidos mediante instrumentos con incertidumbre conocida, verificable y auditable.

A diciembre de 2025, el Índice de Confiabilidad del Balance alcanzó el siguiente valor:

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Índice de Confiabilidad del Balance	%	87

En función de la fuente de abastecimiento, este indicador tiene comportamientos disímiles, a saber:

- 94% del volumen de agua de origen superficial bombeado desde plantas potabilizadoras y estaciones elevadoras es medido mediante sistemas con incertidumbre verificada de ±0,5%.

SUPERFICIAL	
Estado	% del Total SUP
ESTIMADO	6%
MEDIDO	94%

- En relación al agua de origen subterráneo, el 52% del volumen es determinado mediante mediciones con igual nivel de certidumbre.

SUBTERRANEA	
Estado	% del Total SUB
ESTIMADO	48%
MEDIDO	52%

La diferencia observada entre ambos valores se explica principalmente por la alta dispersión geográfica y la cantidad de instalaciones de producción subterránea existentes en el área de servicio, muchas de las cuales históricamente operaron mediante estimaciones indirectas de producción. En este sentido, los programas de incorporación de macromedición y confiabilización de pozos desarrollados durante los últimos años han permitido incrementar progresivamente la calidad de la información disponible para la elaboración del Balance de Agua.

La evolución favorable del indicador resulta particularmente relevante en el contexto de las actualizaciones metodológicas implementadas durante 2024 y 2025, ya que una mayor confiabilidad de la medición reduce la incertidumbre asociada al volumen de entrada al sistema y fortalece la robustez técnica de todos los indicadores derivados del Balance de Agua.

El Índice de Confiabilidad del Balance debe interpretarse como un indicador complementario de desempeño que permite valorar la calidad y representatividad de los resultados obtenidos. Un incremento de este indicador no sólo mejora la precisión de los cálculos, sino que también contribuye a una mejor identificación de oportunidades de optimización operativa y reducción de pérdidas dentro del sistema de distribución.

Finalmente, se destaca que la evolución observada durante los últimos años evidencia una mejora sostenida en la calidad de la medición del agua entregada al sistema. Los avances registrados son consecuencia de la implementación del Programa de Macromedición, la rehabilitación de puntos de control existentes, la incorporación de nuevas mediciones en instalaciones de producción subterránea y la consolidación de los procesos de calibración y auditoría metrológica. Estas acciones constituyen un elemento fundamental para incrementar la confiabilidad del Balance de Agua y mejorar la capacidad de gestión sobre los indicadores de eficiencia hidráulica del sistema.

1.7.2.3. Evolución de las principales componentes del Balance de Agua

El análisis de los resultados del Balance de Agua requiere comprender la evolución anual de las variables que determinan su comportamiento a lo largo del tiempo. Los indicadores de Agua No Contabilizada, Pérdidas Reales, Pérdidas Aparentes y Dotación constituyen el resultado de la interacción entre múltiples componentes vinculadas a la oferta de agua, la demanda de los usuarios, las características de la infraestructura de distribución y la calidad de la información utilizada para su determinación.

Por tal motivo, para el análisis específico de los indicadores resultantes, además de las mejoras que se implementaron en la confiabilidad de las componentes del Balance (ver Apartado 1.7.2.1) resulta relevante evaluar la evolución histórica de las principales variables que integran el Balance de Agua identificando también los factores operativos, tanto técnicos como comerciales, que han influido sobre su comportamiento durante el período analizado.


1.7.2.3.1. Agua entregada o bombeada a la red

El volumen de agua entregada a la red constituye la principal variable de entrada del Balance de Agua y representa la totalidad del caudal efectivamente incorporado al sistema de distribución para abastecer la demanda de los usuarios. Su evolución se encuentra influenciada por factores climáticos, operativos y


estructurales asociados a la gestión de la oferta de agua, por lo que su análisis resulta fundamental para interpretar el comportamiento de los restantes indicadores del Balance.

Durante el año 2025, el volumen promedio de agua entregada a la red alcanzó los **6.059.226 m3/d**, valor que representa un incremento de aproximadamente **0,3%** respecto al valor 2024 (recalculado).


El siguiente gráfico muestra la curva de evolución promedio mensual del Agua Total Bombeada a la Red del año 2025 y su comparativa respecto al año 2024 (recalculado).

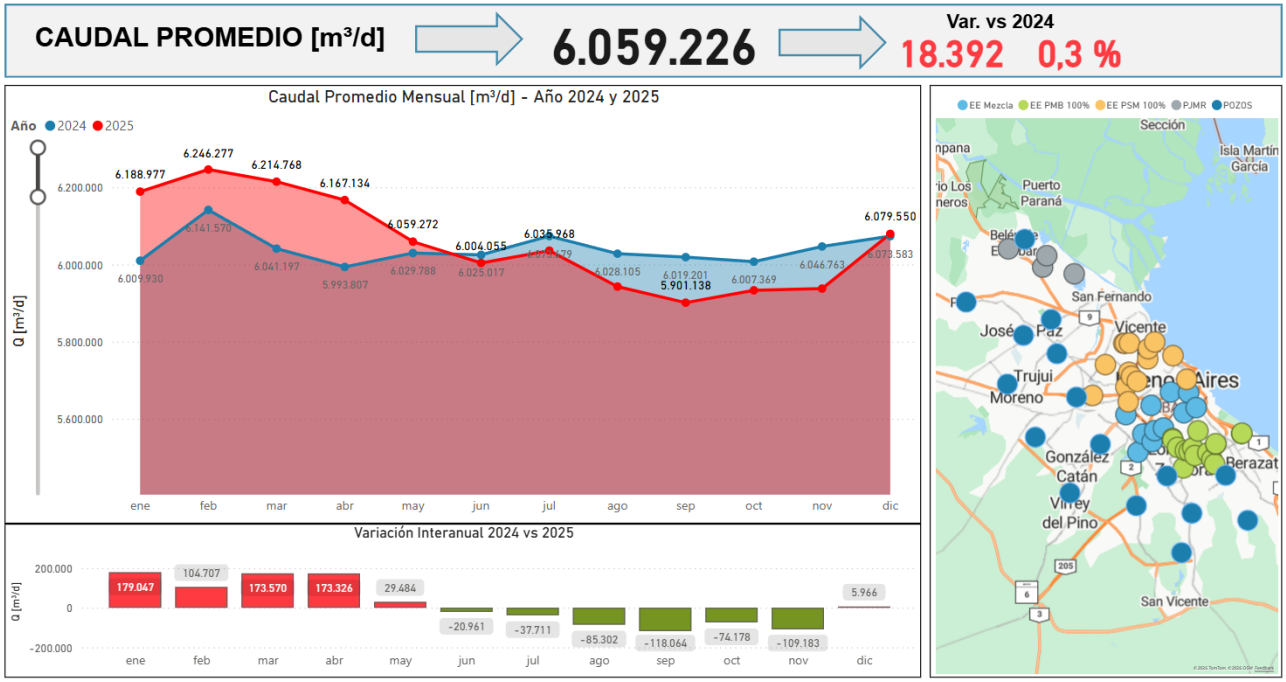

Como se puede observar en el gráfico siguiente, el bombeo de agua de fuente superficial promedio anual fue de **4.997.787 m3/d**. A nivel global, no se observa variación respecto al año 2024, no obstante, la segmentación del agua superficial por planta y/o sistema de presión registra variaciones considerables que se explican más adelante.

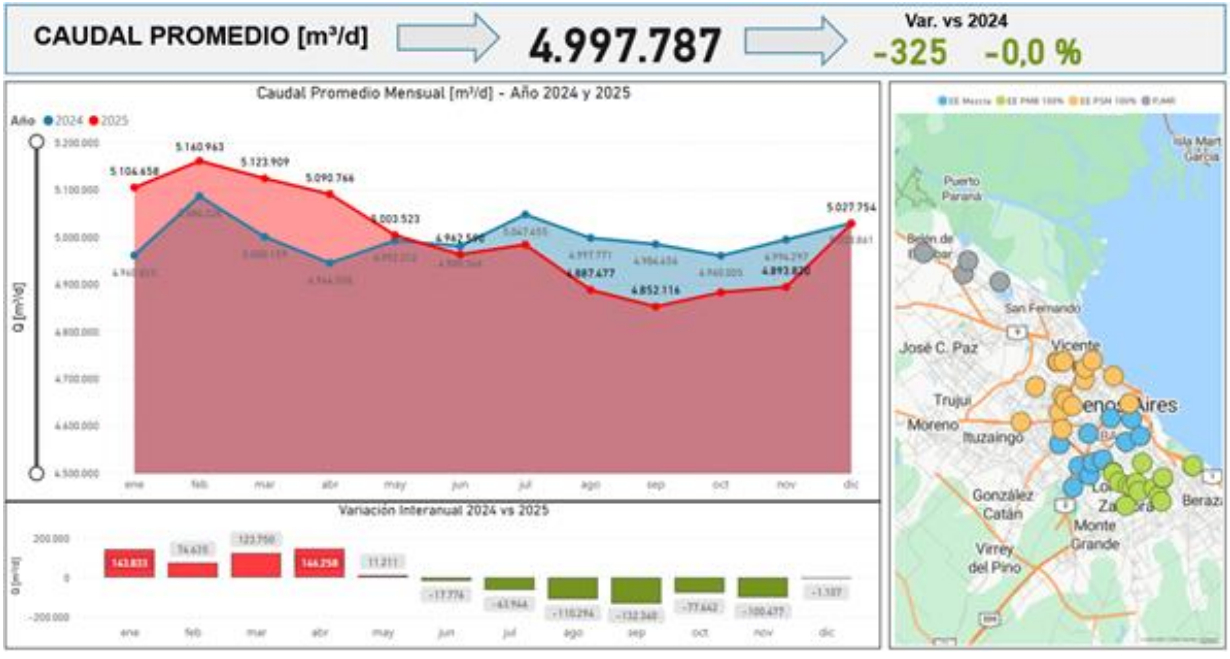

Por su parte, el bombeo de agua de origen subterráneo registró un valor promedio 2025 de **1.061.439 m3/d** y representó un incremento de **+18.717 m3/d** respecto al año 2024, siendo esta componente el principal traccionador del aumento de bombeo del año 2025.

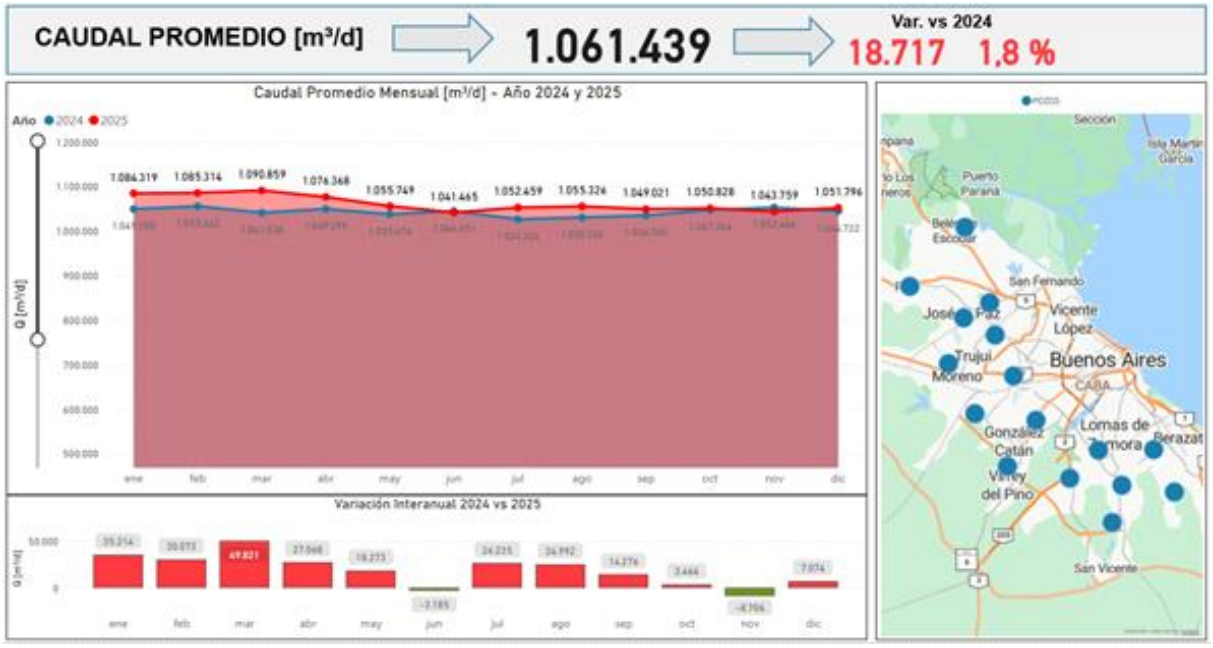

El siguiente cuadro muestra una segmentación del agua bombeada total al nivel de plantas. En el año 2025 se muestran entre paréntesis las variaciones respecto al año 2024.

Año 2024 RECTIFICADO					
	Q [m3/d]	Fuente	Q [m3/d]	Planta	Q [m3/d]
Agua Bombeada Total	6.040.834	SUPERFICIAL	4.998.112	EE PSM 100%	2.037.914
				EE Mezcla	1.524.206
				EE PMB 100%	1.138.836
				PJMR	297.155
		SUBTERRANEA (A RED)	1.042.722	POZOS	1.042.722

Año 2025					
	Q [m3/d]	Fuente	Q [m3/d]	Planta	Q [m3/d]
Agua Bombeada Total	6.059.226 (+ 18.392)	SUPERFICIAL	4.997.787 (-325)	EE PSM 100%	2.016.077 (- 21.837)
				EE Mezcla	1.532.945 (+ 8.738)
				EE PMB 100%	1.150.653 (+ 11.817)
				PJMR	(+ 958) 298.113
		SUBTERRANEA (A RED)	1.061.439 (+ 18.717)	POZOS	1.061.439 (+ 18.717)

(+XX.XXX) → mayor bombeo m3/d vs 2024

(-XX.XXX) → menor bombeo m3/d vs 2024


Durante el año 2025 se presentaron factores particulares que impactaron en el bombeo y en consecuencia en moldearon los resultados precedentes, entre ellos se destacan:

- Factores climáticos que impactaron en la demanda
- Factores estructurales asociados a la infraestructura de bombeo
- Factores operativos asociados a la gestión diurna/nocturna

A continuación se resumirán aspectos asociados a cada uno de ellos:

a) Factores climáticos: temperatura, precipitaciones y eventos singulares

La evolución del volumen de agua entregada a la red durante el año 2025 estuvo fuertemente condicionada por las diferencias climáticas registradas respecto al año 2024. En particular, con relación a la temperatura ambiente, variable que presenta una elevada correlación con la demanda de agua potable. La siguiente gráfica muestra la evolución mensual de temperaturas máximas, temperaturas mínimas y precipitación acumulada mensual para ambos períodos.

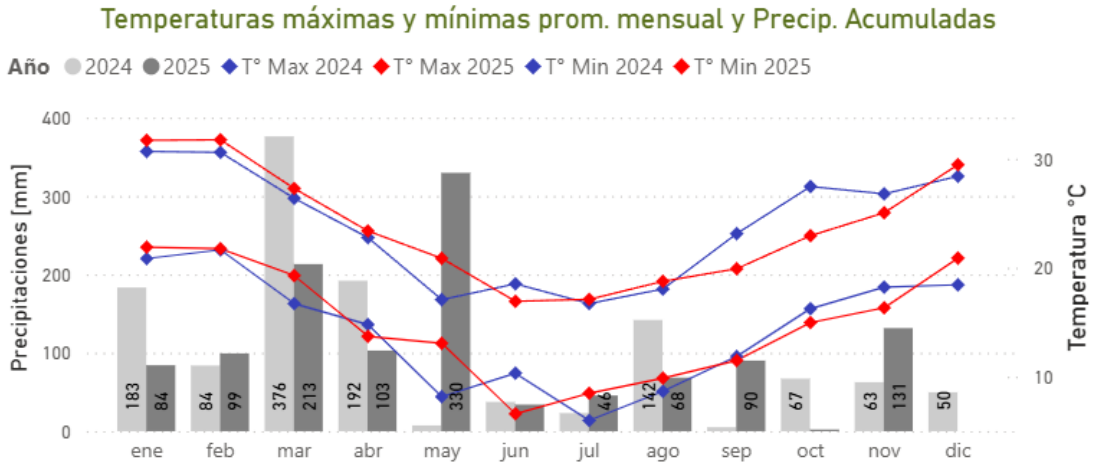

Se identifican dos períodos diferentes:

Período enero – mayo: durante los primeros cinco meses del año 2025, tanto las temperaturas máximas como las mínimas fueron en promedio, aproximadamente 1,5 °C superiores a las registradas durante igual período del año 2024. Los niveles de precipitación, en cambio, se mantuvieron en valores similares para ambos años.

Período junio – diciembre: durante este período se observó una situación inversa. Las temperaturas máximas y mínimas registradas en el año 2025 resultaron inferiores a las del año anterior, siendo particularmente significativa la diferencia observada entre septiembre y noviembre. En cuanto a las precipitaciones, no presentaron diferencias relevantes entre ambos años.

Por otra parte, durante el año 2025 se presentó un evento de bajas temperaturas en los últimos días de junio y primeros días de julio de 2025 se registró un episodio de bajas temperaturas con valores mínimos cercanos a 0 °C.

Este tipo de eventos genera habitualmente una disminución abrupta de la demanda domiciliaria. Cuando dicha reducción no puede ser compensada de manera inmediata mediante ajustes operativos de presión y bombeo, se producen incrementos transitorios de presión en determinados sectores de la red.

A esta situación se suma la contracción térmica que experimentan las cañerías metálicas, particularmente aquellas de hierro fundido de gran antigüedad, generando condiciones propicias para la aparición de fisuras,

escapes y roturas. Como consecuencia, se registró un incremento simultáneo de reclamos por faltas de agua, baja presión y escapes, especialmente en la región Capital Federal.

Para sostener los niveles de servicio y compensar las pérdidas generadas por estos eventos, fue necesario incrementar transitoriamente los volúmenes bombeados desde diversas estaciones elevadoras de la región.

Este evento se ha producido también en el año 2024, no obstante, a diferencia de lo ocurrido esa oportunidad, el incremento de bombeos quedó restringido prácticamente al mes de julio, lográndose restablecer durante agosto condiciones operativas más alineadas con la demanda real del sistema.

b) Factores estructurales: eventos en la infraestructura de gestión de presiones


Además de las condiciones climáticas, la evolución del volumen de agua entregada a la red estuvo influenciada por diversas intervenciones realizadas sobre la infraestructura de regulación y control de caudales, además de las acciones en red que se describirán en el Apartado 1.7.3. Estas acciones tuvieron como objetivo optimizar la gestión de presiones, adecuar la oferta a la demanda efectiva y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.


Estación Elevadora Caballito

A comienzos de octubre de 2025 entró en servicio definitivo un variador de frecuencia (VDF) instalado en una de las bombas de la Estación Elevadora Caballito, luego de un período de pruebas operativas. La instalación fue desarrollada íntegramente con recursos propios de AySA.

La incorporación de esta tecnología permitió adecuar de manera más precisa el caudal impulsado a las condiciones reales de demanda, reduciendo los excedentes de presión y mejorando la capacidad de regulación del sistema abastecido por la estación.

Dado que la puesta en servicio se produjo durante el último trimestre del año, el impacto sobre los valores promedio anuales resulta todavía limitado. Sin embargo, tanto el análisis de la evolución horaria de los caudales como los promedios mensuales evidencian una disminución del volumen bombeado a partir de la entrada en operación del equipo, tal como se observa en las gráficas siguientes.

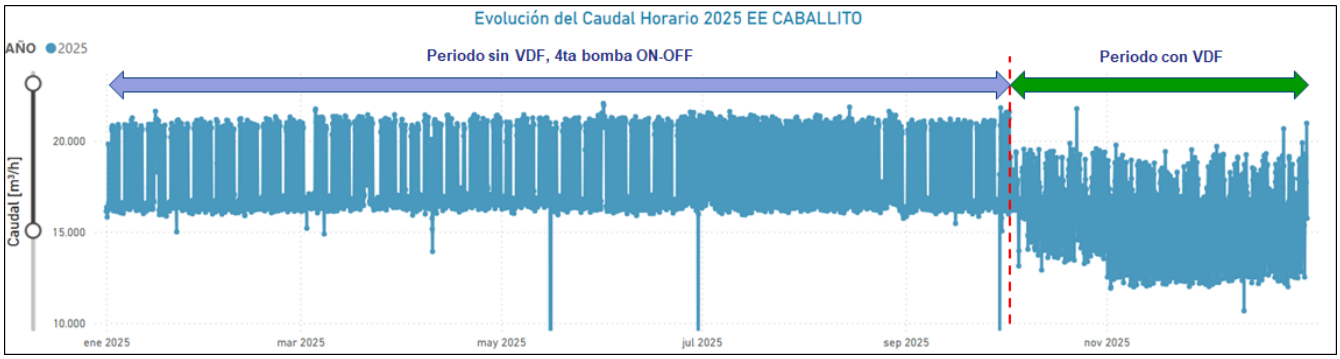

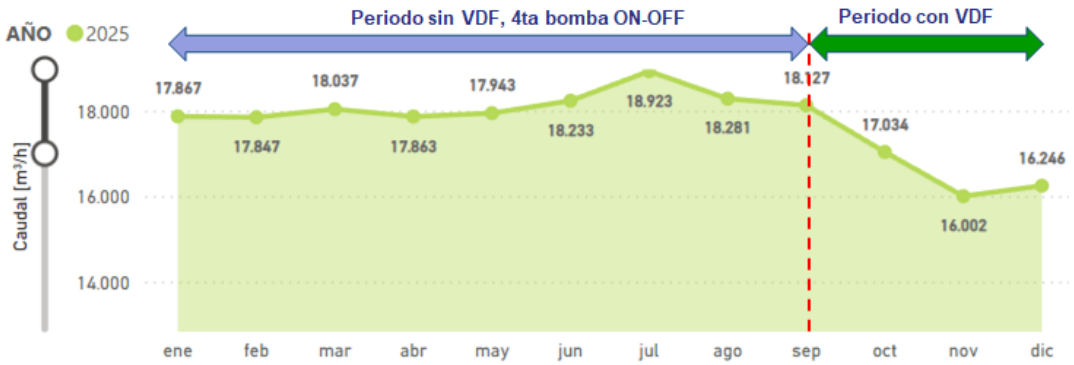

Se estima que los beneficios asociados a esta intervención puedan apreciarse con mayor claridad durante 2026, una vez completado un ciclo anual completo de funcionamiento bajo las nuevas condiciones operativas.

Estación Elevadora Centro


La Estación Elevadora Centro presentó una situación particular como consecuencia de la salida de servicio del variador de frecuencia existente a partir del 27 de enero de 2025.

Como resultado de esta condición, entre fines de enero y mediados de marzo la estación operó con un caudal prácticamente constante, cercano a 6.200 m³/h durante las 24 horas del día, reduciendo la capacidad de adaptación de la oferta a las variaciones horarias de la demanda.

Una vez finalizado el período estival y ante la disminución de los consumos, se implementaron maniobras operativas de regulación durante las horas de menor demanda, particularmente durante la madrugada, con el objetivo de reducir los volúmenes impulsados y adecuar la producción a las necesidades reales del sistema.

Durante julio, en el contexto del episodio de bajas temperaturas previamente descripto, estas maniobras debieron ser interrumpidas transitoriamente para sostener los niveles de servicio frente al incremento de pérdidas y reclamos asociados al evento.

Como consecuencia de las restricciones operativas derivadas de la situación descripta, el volumen promedio bombeado por la Estación Elevadora Centro durante el año 2025 resultó superior en aproximadamente 3.431 m³/d respecto al registrado el año anterior.

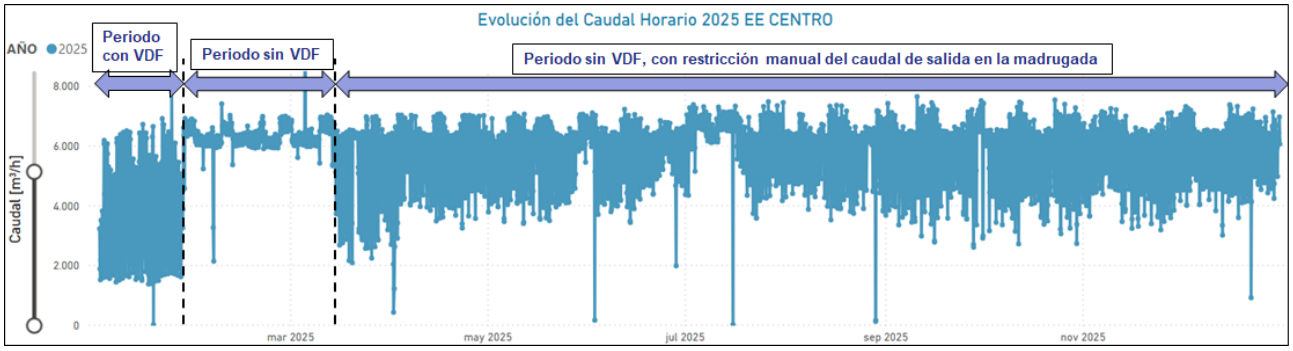

c) Factores operativos: regulación estacional y bombeos horarios

La evolución del volumen entregado a la red durante el año 2025 estuvo condicionada por las variaciones de demanda asociadas a las condiciones climáticas y a factores estructurales como los ya mencionados. No obstante, en términos positivos, existe un factor operacional que permite optimizar el sistema y adecuar la oferta de agua a los requerimientos efectivos del mismo.

Estas acciones incluyen la regulación estacional y horaria de bombeos, la gestión dinámica de presiones y la adecuación de los esquemas de abastecimiento mediante estaciones elevadoras, válvulas reguladoras y sistemas de control asociados.


En términos generales, durante los períodos de máxima demanda, particularmente en los meses estivales, la mayoría de las estaciones elevadoras operan próximas a sus condiciones máximas de bombeo, por lo que las diferencias interanuales observadas responden principalmente a factores climáticos o a modificaciones en las áreas efectivamente abastecidas.

Por el contrario, durante los períodos de menor demanda, especialmente durante el invierno y en horarios nocturnos, resulta posible implementar acciones específicas de regulación destinadas a reducir excedentes de presión, minimizar esfuerzos sobre la infraestructura y optimizar los consumos energéticos, manteniendo

simultáneamente los niveles de servicio requeridos. A continuación se describen las principales acciones realizadas durante el año 2025.

Estación Elevadora Lanús


Desde el 16 de marzo de 2025 se implementó el apagado de la quinta bomba durante horas de menor demanda nocturna. Esta maniobra se efectuó durante el año 2024 y se mantuvo durante los primeros quince días de enero de 2025. El volumen bombeado promedio 2025 no registró variación respecto al año anterior.

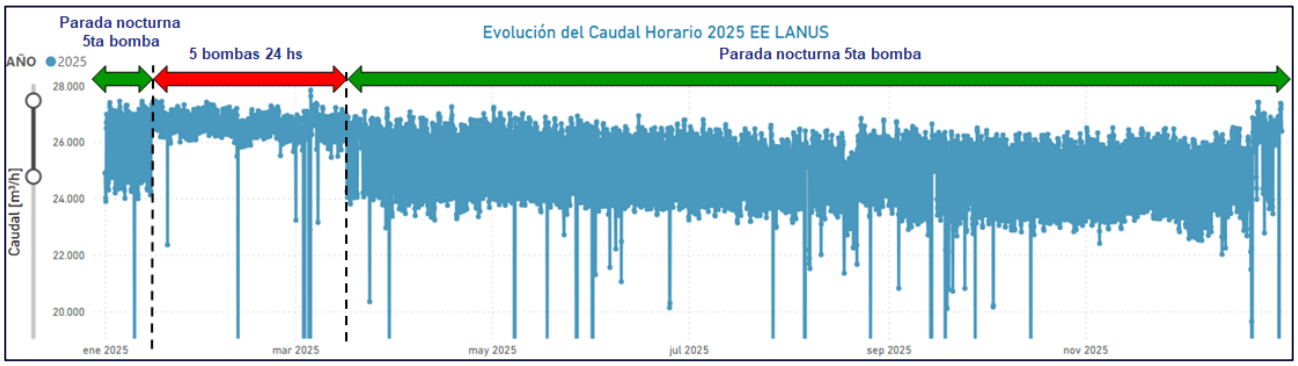

Estación Elevadora Devoto

A partir de abril 2025 se incorpora una acción de regulación al funcionamiento regular de la elevadora mediante la restricción de caudal nocturno en ambas salidas de la estación, incrementando la capacidad de adaptación de la oferta a las condiciones reales de demanda.


Las maniobras debieron suspenderse temporalmente entre el 2 de julio y el 13 de agosto de 2025 como consecuencia del evento extraordinario de bajas temperaturas, período durante el cual la estación operó con tres bombas en servicio permanente para sostener los niveles de abastecimiento. Una vez superado el evento, las regulaciones fueron reimplementadas progresivamente. Como resultado de estas acciones, la estación registró una reducción promedio anual de 5.113 m³/d respecto de 2024.

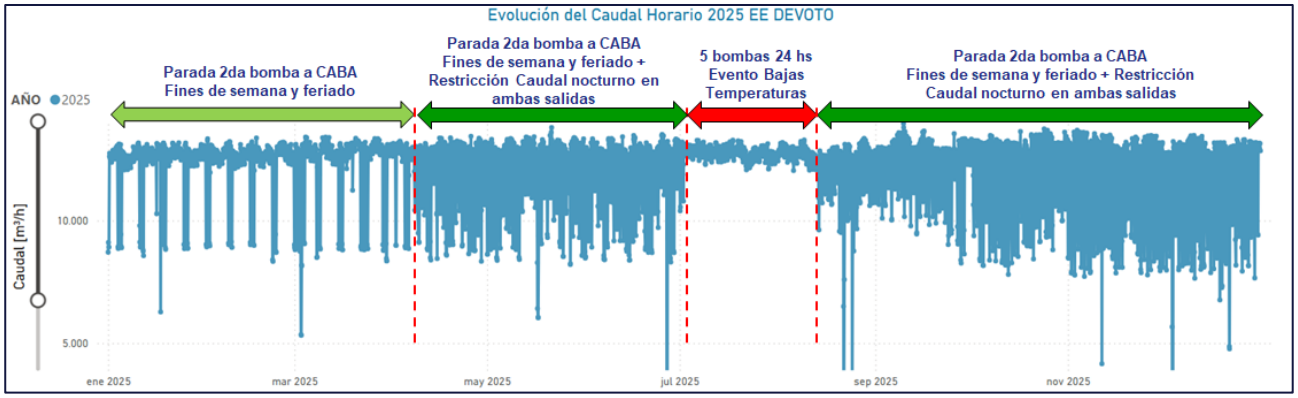

Estación Elevadora Constitución

La estación dispone desde finales de 2023 de un variador de frecuencia instalado en una de sus bombas principales, lo que permite modular el caudal impulsado en función de curvas horarias de demanda previamente definidas.

Durante 2025 el sistema mantuvo un comportamiento estable, con excepción de los días afectados por el evento de bajas temperaturas de fines de junio y principios de julio. La capacidad de modulación aportada por el variador permitió optimizar los volúmenes entregados a la red, registrándose una reducción promedio anual de 4.725 m³/d respecto a 2024.

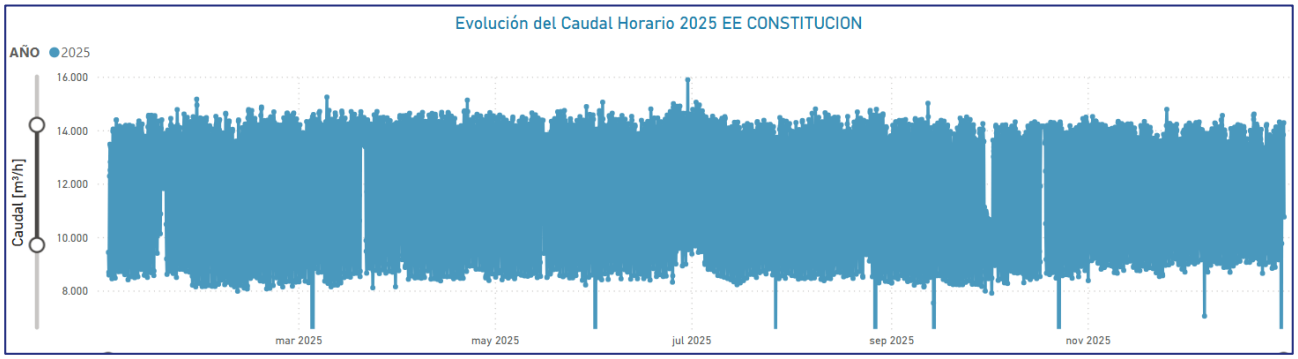


Estación Elevadora Floresta

Hasta septiembre de 2025 la estación presentó caudales similares a los registrados durante 2024. A partir de octubre se observó un incremento del volumen impulsado por dos factores concurrentes:

- la estación absorbió parcialmente la reducción de caudal registrada en la Estación Elevadora Caballito luego de la puesta en servicio de su nuevo variador de frecuencia,

- por parte, durante el mismo período se reemplazó una de las bombas existentes por un equipo de mejor rendimiento hidráulico para iguales condiciones de presión, incrementando la capacidad efectiva de producción.

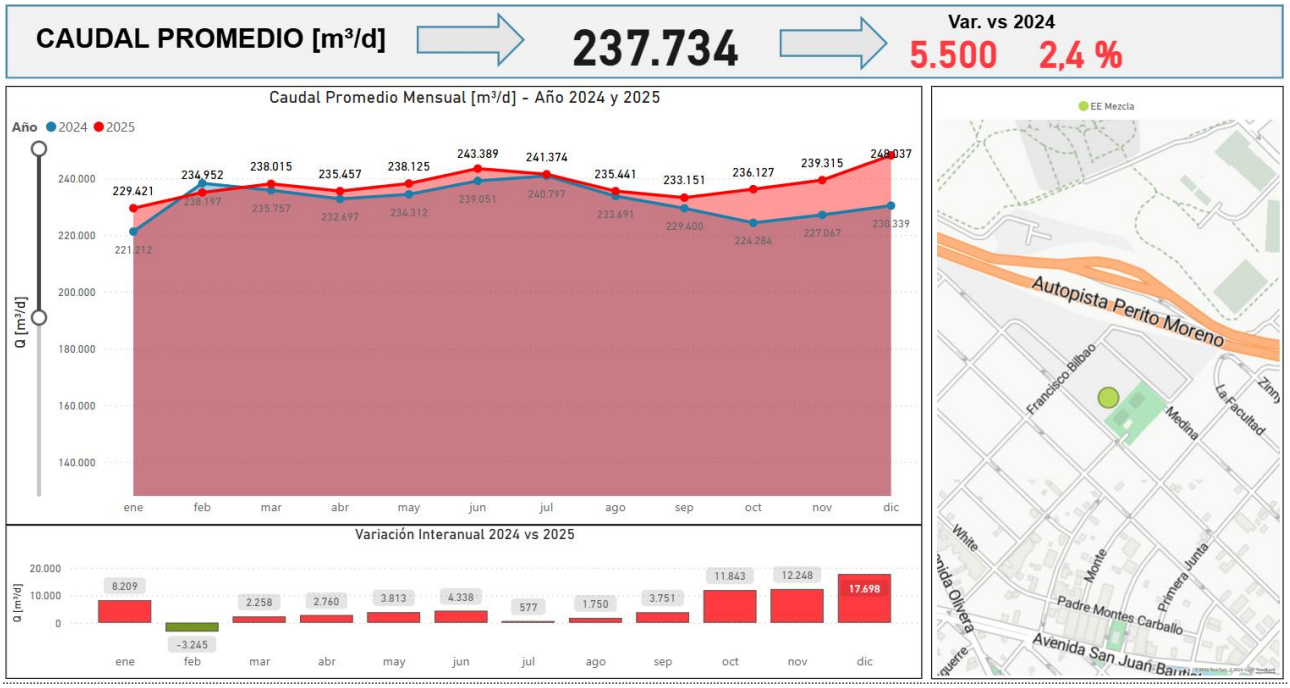


Sistema Villa Adelina

El sistema integrado por las estaciones elevadoras Villa Adelina, Villa Adelina I y Villa Adelina II constituye uno de los ejemplos más representativos de optimización operacional observados durante el año 2025.

A partir de abril, fue posible sostener presiones de salida inferiores a las registradas durante el año 2024, permitiendo una reducción sostenida de los caudales bombeados durante todo el segundo semestre sin afectar los niveles de servicio.


Entre todas las estaciones elevadoras del sistema AySA, el conjunto Villa Adelina fue el que realizó el mayor aporte a la reducción del volumen total de agua superficial bombeada durante el año, constituyéndose en uno de los principales factores que permitieron mantener prácticamente constante el volumen total de agua entregada a la red.

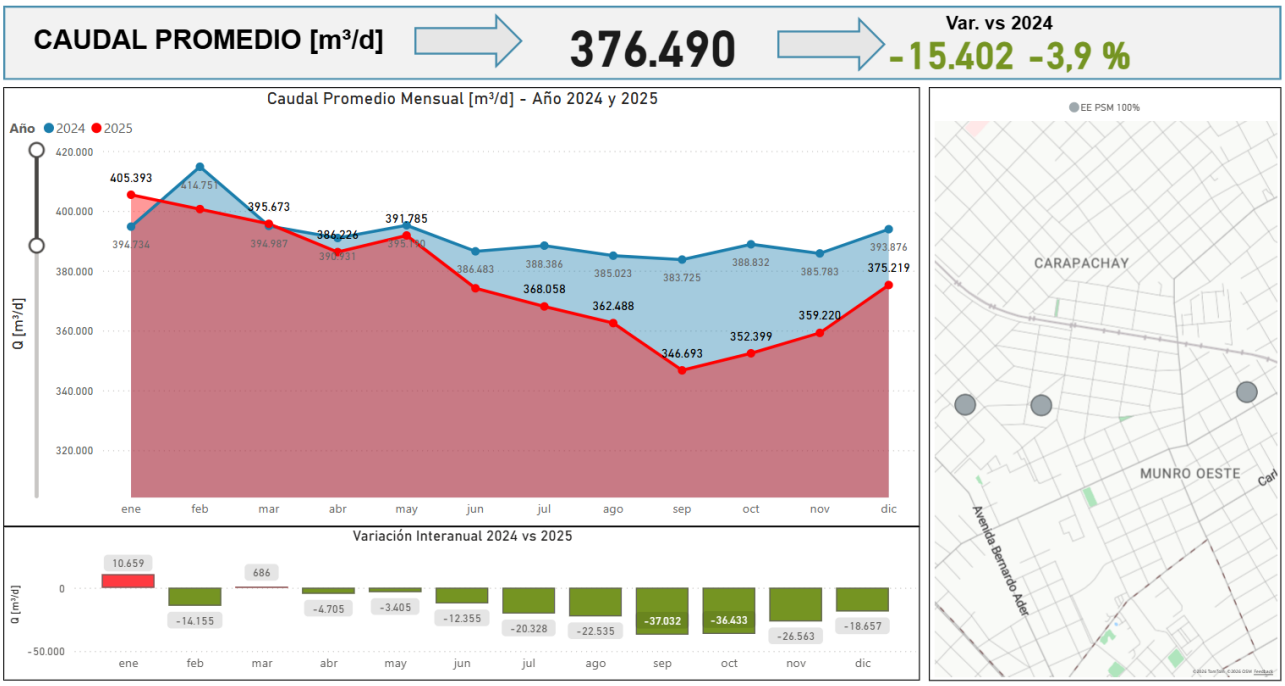

Estación Elevadora Quilmes

La estación opera normalmente con cuatro bombas, apagándose la cuarta unidad en función de las condiciones de presión registradas aguas abajo de las válvulas reguladoras.

Si bien se observaron diferencias mensuales entre ambos años, el análisis anual muestra que el volumen promedio bombeado durante 2025 resultó prácticamente equivalente al registrado en 2024.

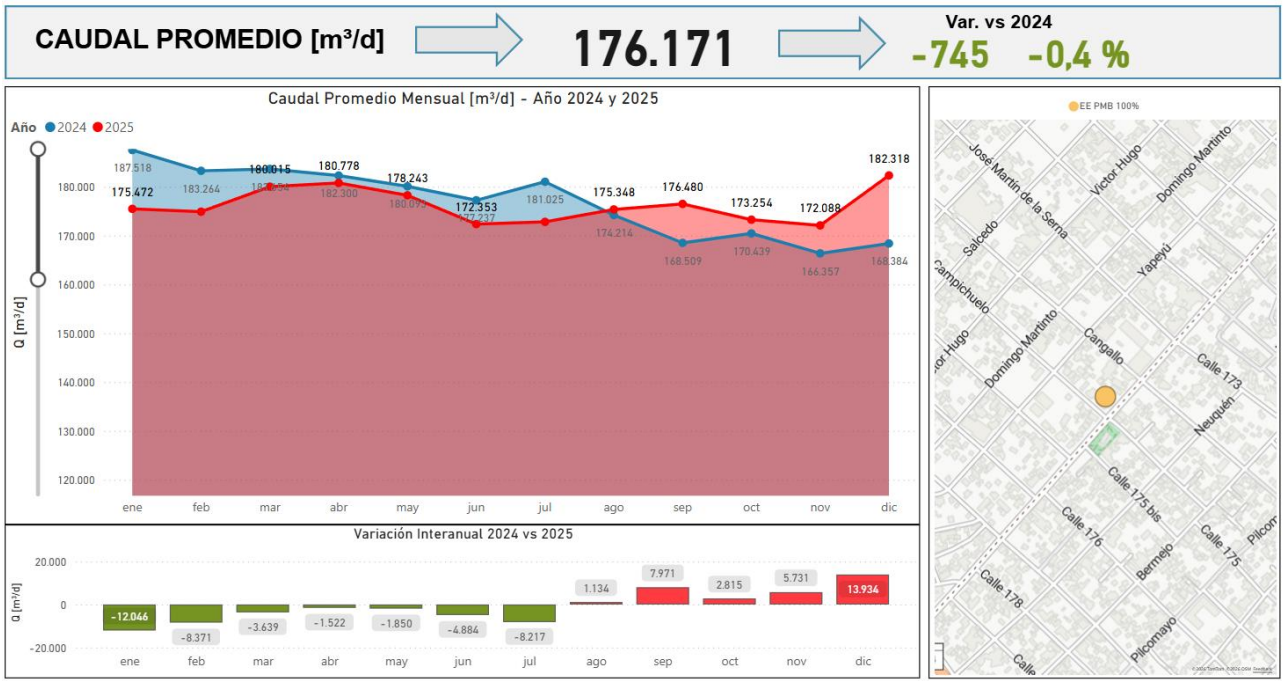


Estación Elevadora Morón - Estación elevadora Tres de Febrero

El bombeo de ambas estaciones se encuentra estrechamente vinculada al comportamiento de las válvulas reguladoras ubicadas aguas abajo.

Durante el período enero-mayo de 2025 ambas estaciones operaron con mayores caudales respecto al año anterior: A partir de junio comenzaron a evidenciarse los efectos de las regulaciones implementadas para acompañar la disminución estacional de los consumos.

No obstante, el incremento registrado durante el primer semestre determinó que ambas estaciones entregaran conjuntamente un volumen promedio anual superior en 6.358 m³/d respecto del año 2024.

EE Morón EE Tres de Febrero

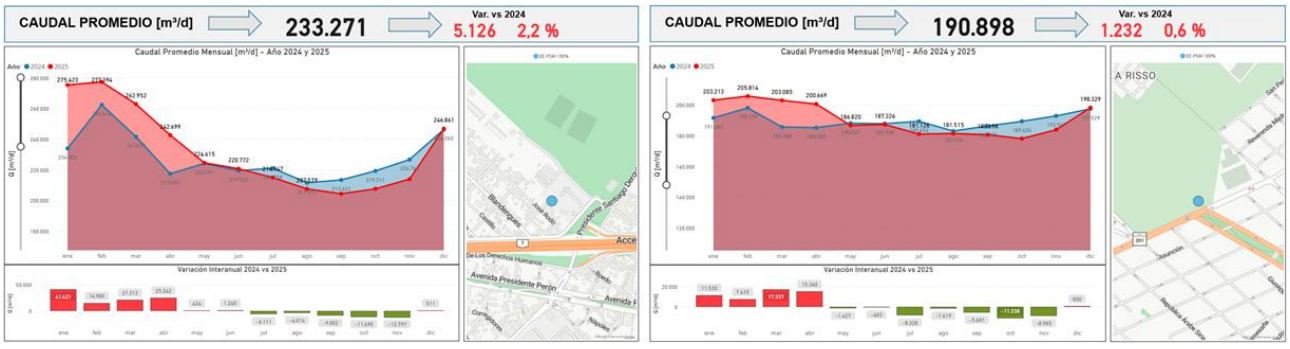

Estación Elevadora E Bernal I - Estación Elevadora Bernal IV


El bombeo de ambas estaciones está vinculado al comportamiento de las válvulas reguladoras ubicadas aguas abajo de sus sistemas de distribución.

La EE Bernal I mantuvo durante el primer semestre de 2025 un caudal prácticamente constante y superior al observado en el año 2024, mientras que las acciones de regulación comenzaron a reflejarse con mayor intensidad durante la segunda mitad del año.


Por su parte, la EE Bernal IV registró prácticamente todo el año niveles de producción superiores al año 2024, con escasa variación estacional entre invierno y verano.

En conjunto, ambas estaciones aportaron 12.368 m³/d adicionales respecto del año anterior.

EE Bernal I

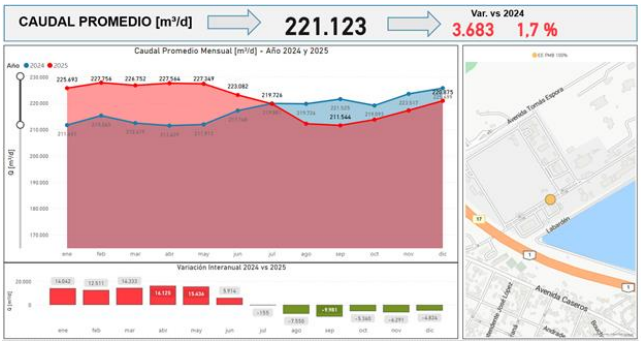

EE Bernal IV

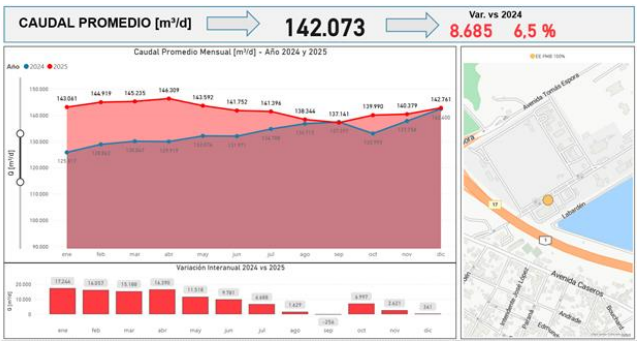


Impelentes Planta Juan Manuel de Rosas

El bombeo se encuentra condicionada por la regulación ejercida a través de las válvulas reguladoras instaladas sobre los acueductos Tigre–Centro y Pacheco–Benavídez, y en menor medida por aquellas asociadas a los acueductos Matheu y Savio.


Al igual que lo observado en otras estaciones de alta presión, el incremento de demanda registrado durante los primeros meses de 2025 fue compensado posteriormente mediante acciones de regulación implementadas a partir de mayo.

Como resultado, el volumen promedio anual impulsado durante el año 2025 resultó prácticamente equivalente al año anterior.

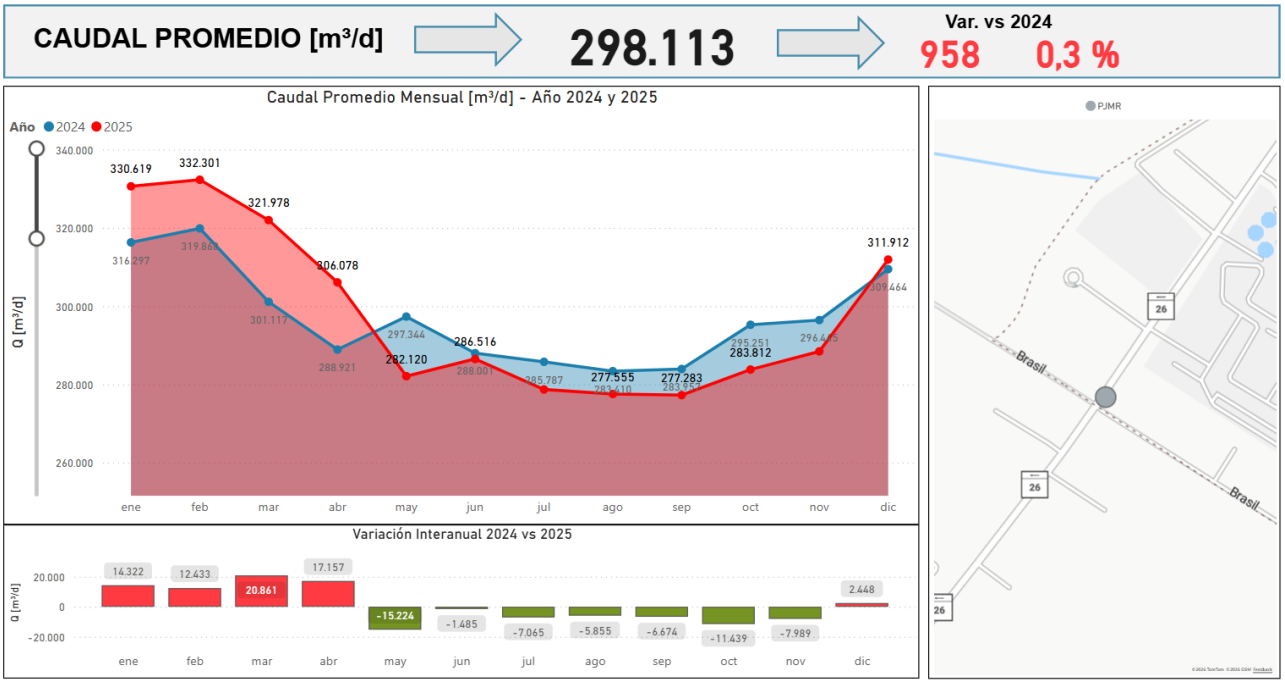

Resultado General de la Gestión del Agua Bombeada a la Red

Las condiciones climáticas del período de enero a mayo generó mayores requerimientos de abastecimiento, un mayor bombeo de las estaciones elevadoras de agua superficial, y una mayor cantidad de pozos operativos, asociados fundamentalmente al aumento de las horas de funcionamiento de los mismos. Como resultado, entre enero y mayo de 2025 se bombearon en promedio **99.937 m³/d** adicional de agua superficial y **32.090 m³/d** adicional de agua subterránea, respecto al año anterior. El siguiente gráfico muestra la distribución territorial de estas variaciones para el período mencionado.

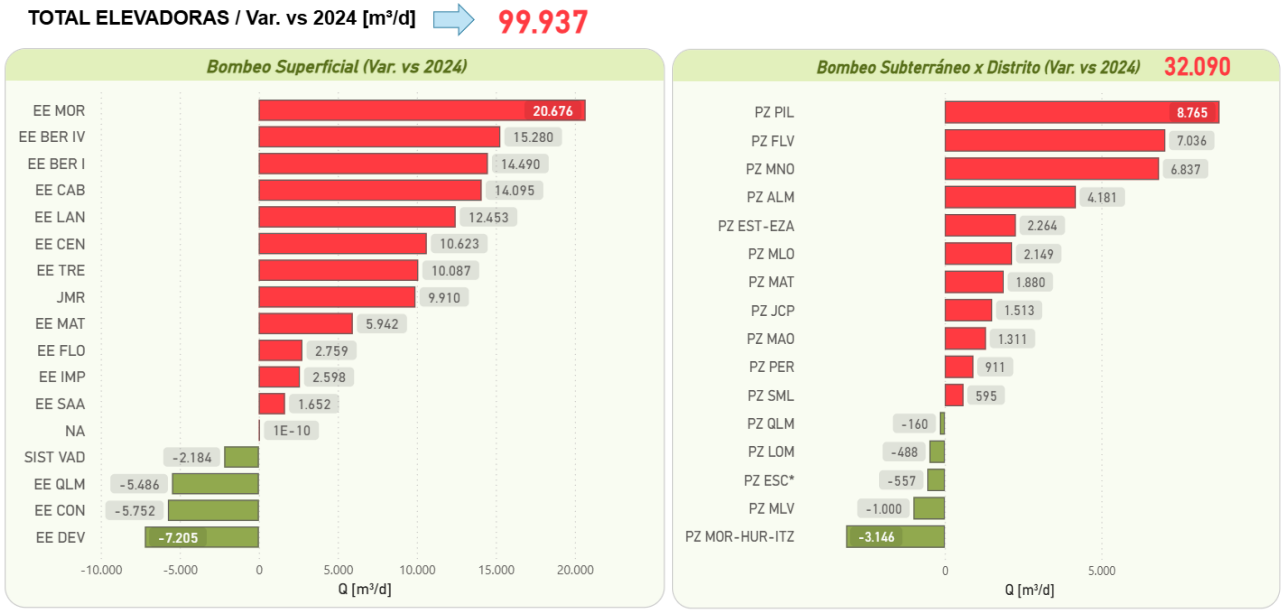

Durante el período junio-diciembre se observó la situación opuesta. Las menores temperaturas registradas durante el año 2025, la implementación del variador de velocidad de EE Caballito, el avance de los trabajos de reducción de pérdida real, el avance del programa de medición de consumo y la posibilidad de implementar estrategias de regulación del bombeo –fundamentalmente en el área abastecida por agua superficial- permitieron lograr una reducción del bombeo durante este período por un valor de 71.940 m³/d que compensó el desvío del período anterior.

La reducción se verificó en la mayoría de las estaciones elevadoras, destacándose particularmente las estaciones del sistema Villa Adelina, las estaciones impelentes de Planta San Martín y la estación elevadora Lanús.

La combinación de las regulaciones y presiones durante el segundo semestre permitió mantener prácticamente constante el volumen de agua superficial anual entregada a la red, compensando parcialmente el incremento observado en el aporte de agua subterránea.

Los casos de las estaciones elevadoras Caballito y Centro muestran cómo las modificaciones en la infraestructura de regulación pueden generar efectos significativos sobre los volúmenes entregados a la red, independientemente de las condiciones climáticas o de la evolución de la demanda.

La incorporación de nuevas herramientas de control permite mejorar la eficiencia de la operación y reducir los excedentes de presión, en contraposición, la falta de disponibilidad de estos sistemas limita la capacidad de regulación y puede traducirse en mayores volúmenes bombeados para sostener los niveles de servicio requeridos.

En este sentido, las inversiones orientadas a fortalecer la gestión dinámica de presiones constituyen una herramienta relevante para optimizar la operación del sistema y contribuir a la reducción de pérdidas reales y consumos energéticos.

1.7.2.3.2. Consumo Autorizado Comercializado

El consumo autorizado comercializado es el consumo de los usuarios debidamente registrados en la base de datos comercial, ya sea consumo medido o no medido, de todas las categorías de usuarios. Incluye el consumo de todos los grupos de usuarios, como los domésticos, comerciales, industriales, estatales y sociales. No incluye el agua exportada o venta en bloque que se mide y se factura, las cuales deben ser restadas para no duplicarlas en el agua contabilizada o en el agua comercializada.


Los consumos medidos y no medidos son proporcionados por la Dirección Comercial.

El consumo autorizado comercializado total fue de **3.041.411** m³/día, registrando una disminución de **-3,0%** en el año 2025 vs 2024 (recalculado) impulsado por el consumo comercializado no medido.

Como se detallará a continuación, los siguientes principales factores que abonaron a esta variación fueron:


- La reducción del consumo comercializado no medido asociado al Plan de Medición Masiva.
- La confiabilización de consumos dentro de las categorías NR1 y UREM impulsado por la actualización del padrón de usuarios y en consecuencia del consumo.

En la siguiente gráfica se resumen los valores globales de consumo y de unidad funcional para el año 2025 y su variación respecto al año 2024. Cabe destacar que el universo medido representa el 31% del consumo total y alcanza el 25% de las unidades funcionales existentes.

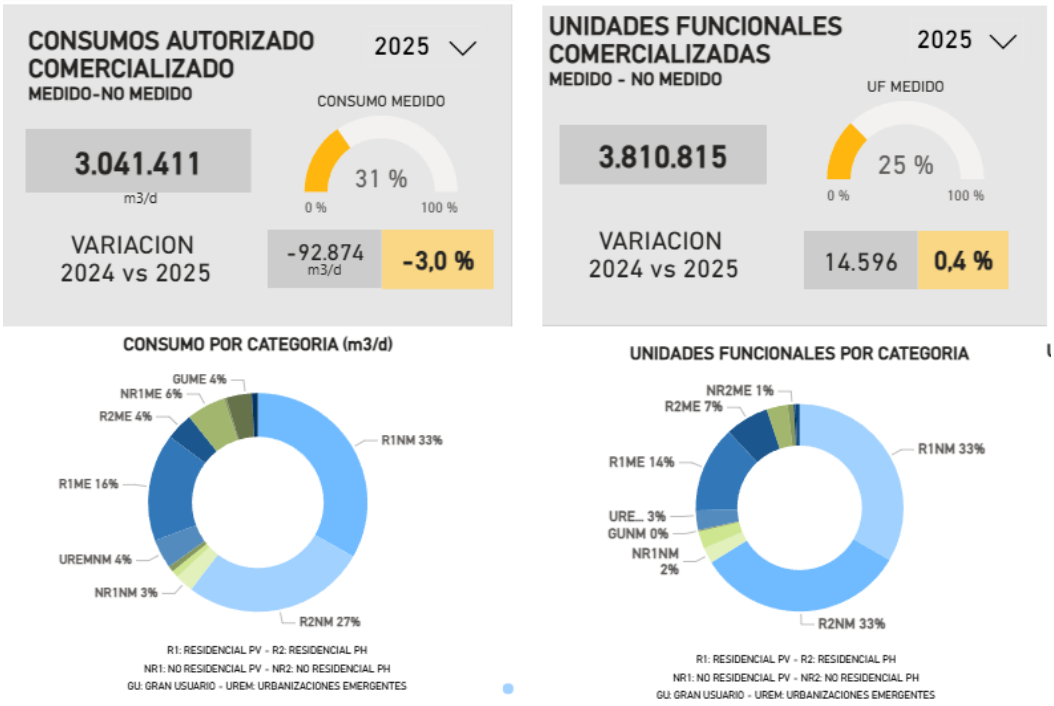

Referencias
GU: Grandes usuarios
R1: Usuario Residencial – Propiedad Vertical
R2: Usuario Residencial – Propiedad Horizontal
NR1: Usuario No residencial – Propiedad Vertical
NR2: Usuario No residencial – Propiedad Horizontal
UF: Unidades funcionales

Las Figuras siguientes permiten observar la evolución interanual segmentada por la condición de facturación medido y no medido. Como se observa, el aumento del consumo medido, no compensa la disminución del consumo no medido lo que se traduce en una disminución del global.

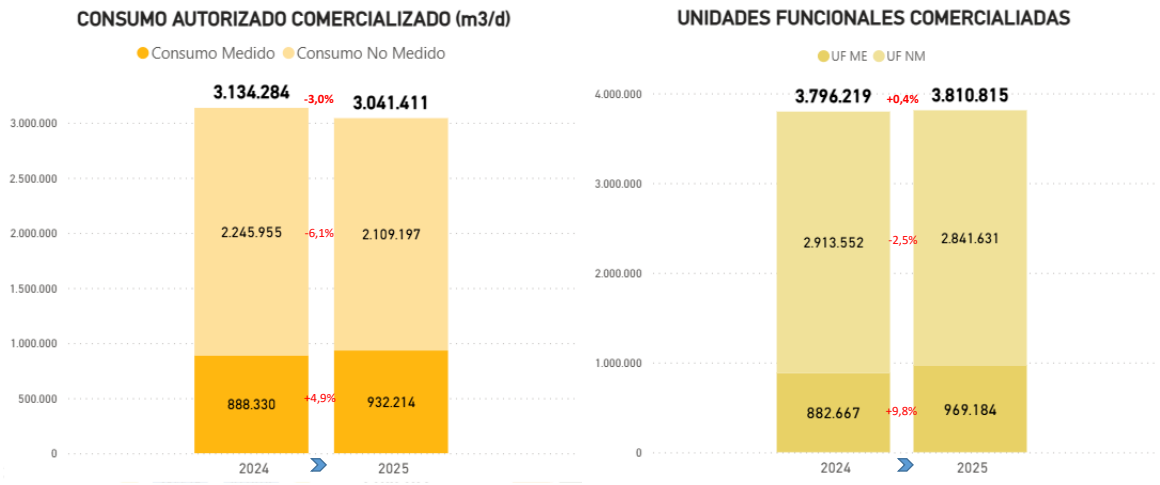


A continuación, se detalla la evolución del consumo y de las unidades funcionales segmentados por Categoría según su condición de facturación medido-no medido.


Los **consumos medidos**, representan el 31% del consumo comercializado y el 25% de total de Unidades Funcionales comercializadas.

Respecto de 2024, se registra **un incremento de 43.884 m³/d** equivalente **+4,9%**, asociado principalmente al Plan de Medición Masivo que impulsa la incorporación de usuarios bajo el régimen medido.

Este incremento está impulsado por las categorías:

- **R1 (residencial PV)** que registra un aumento del +**6,1%.** En esta categoría se incluyen los Countries que individualmente registra un incremento del **+19,6%** asociado en parte por la incorporación de usuarios (+46,3% UF),
- **R2 (residencial PH)** que registra un aumento del **19,5%.**

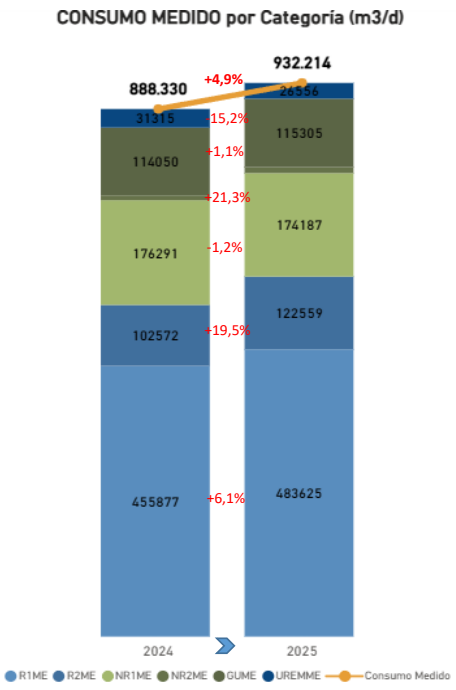


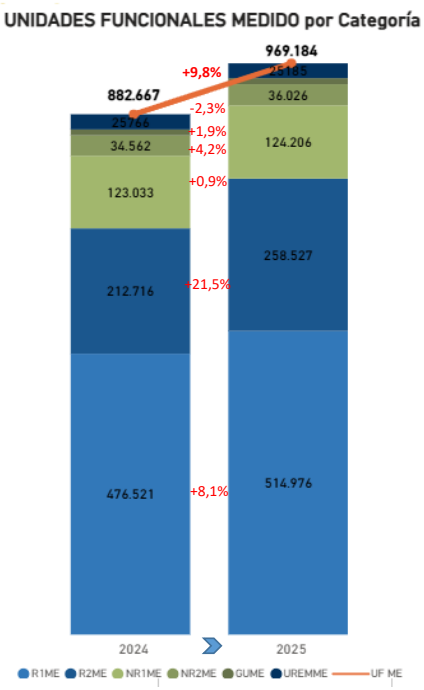

Los **consumos no medidos** registran una **disminución de 136.758 m³/d**, equivalente a **-6,1%** asociado al avance del Plan de Medición Masivo y a la actualización del padrón de usuarios.

Esta variación, está impulsado principalmente por:

- **R2 (Residencial PH)** que registra una disminución del **-7,0%** asociado al cambio a régimen medido por avance del Plan de Medición Comercial,
- **NR1 (No residencial PV)**, que varía un -**24,1%** asociada a la actualización del padrón comercial en las nuevas áreas
- **UREM** que registra una disminución del **-13,2%** producto de la actualización del padrón de barrios;

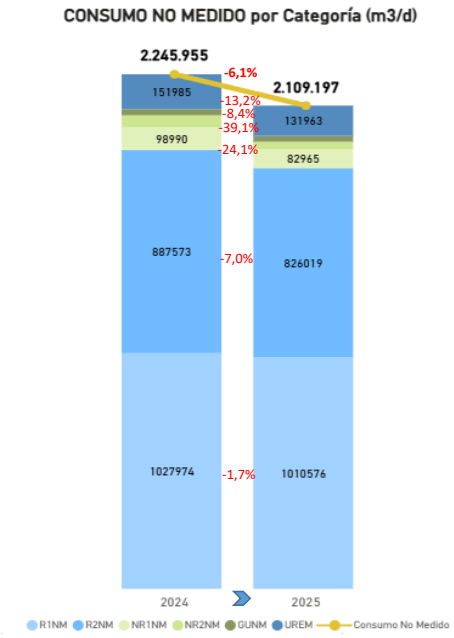



En síntesis, los resultados del año 2025 se explican, en parte por una reducción de consumo real producto del avance del Plan de Medición, y en parte por la confiabilización del dato de consumo UREM y NR1 (nuevas áreas) por actualización de su padrón de usuarios equivalentes.

1.7.2.3.3. Consumo Autorizado No Comercializado

El Consumo Autorizado No Comercializado comprende aquellos volúmenes de agua cuyo uso se encuentra legítimamente autorizado por AySA, pero que, por sus características operativas, institucionales o administrativas, no son objeto de facturación ni registran ingresos comerciales asociados. Esta componente se expresa en m³/d promedio anual y forma parte del Consumo Autorizado considerado en el Balance de Agua.

Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes usos:

- Usos operativos propios en los sistemas de agua potable y desagües cloacales, tales como limpieza y desinfección de cañerías en servicio, lavado y puesta en funcionamiento de nuevas conducciones, pruebas hidráulicas y otras tareas operativas vinculadas al mantenimiento y expansión de la infraestructura. También contempla el uso de agua por parte de camiones desobstructores.
- Agua utilizada para el abastecimiento de camiones cisterna operados por AySA, destinados a la atención de contingencias operativas, refuerzo de servicio o abastecimiento alternativo en sectores con restricciones temporales.
- Consumos realizados a través de hidrantes por parte de los servicios de emergencia, particularmente los utilizados por los cuerpos de bomberos en tareas de prevención y extinción de incendios.
- Consumos correspondientes a usuarios abastecidos desde la red de distribución que se encuentran en proceso de incorporación o regularización dentro del sistema comercial o que por alguna situación particular no tienen facturación asociada, incluye:
    - Urbanizaciones Residenciales Emergentes (UREM) abastecidas desde la red de distribución de AySA en proceso de análisis,
    - Usuarios registrados con stop de facturación por diferentes motivos o en proceso de empadronamiento comercial, tales como, inmuebles propios/concesionados, plazas
    - Consumo de un segmento de barrios cerrados de Pilar, que si bien se localizan dentro de radio servido y tienen abastecimiento de red de AySA no son usuarios directos sino que forman parte de un convenio particular.


Desde la perspectiva del Balance de Agua, esta componente permite diferenciar consumos legítimos autorizados por la empresa de aquellos volúmenes asociados a pérdidas aparentes o pérdidas reales, contribuyendo así a una mejor interpretación de los indicadores de eficiencia del sistema.

A nivel AySA, en el año 2025 se registraron **648.922 m³/d**, que representan el **17,6%** del Consumo autorizado y el **10,7%** del Agua entregada a la red. Está compuesto por:

- Usos operativos, incluyendo camiones cisternas y desobstructores: 14.237 m³/d
- Usos previsión bomberos: 36.876 m³/d
- Usuarios en proceso de regularización en el sistema comercial fue 597.809 m³/d, de los cuales:
    - 549.089 m³/d corresponden a barrios UREM,
    - 9.905 m³/d a barrios cerrados en el distrito Pilar y
    - 38.815 m³/d a usuarios con stop de facturación

Se registra una variación del **+0,1%** respecto del año 2024 impulsado por los Usos Operativos que registra un aumento del +33,5% asociado a lavados por habilitación de grandes conductos en Tigre y la incorporación de consumo en Barrios cerrados de Pilar, a su vez. En detrimento, se registra una disminución del -3,7% del

consumo UREM a raíz de la actualización del padrón de barrios mencionada previamente, tal como se observa en la Figura siguiente.

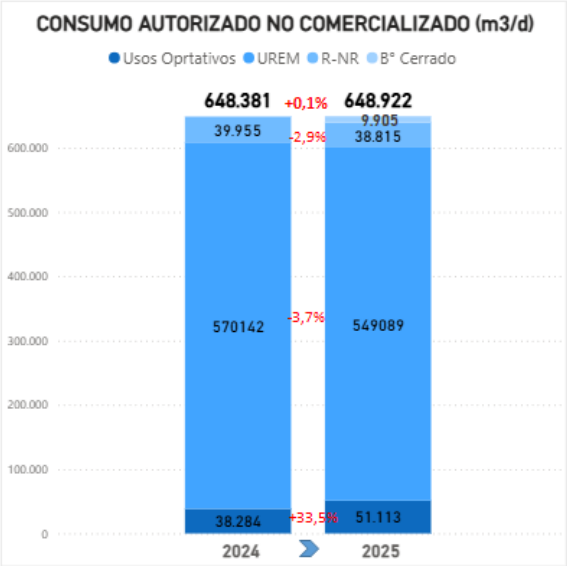

1.7.2.3.4. Submedición metrológica – Consumos No Autorizados – Inexactitud en el tratamiento de los datos de consumo

En este apartado se presentan las componentes de las Pérdidas Aparentes, cuya evolución explica los resultados del indicador en el año 2025.

a) Inexactitud en la medición de los datos - Submedición metrológica

La Dirección Comercial actualizó los coeficientes de submedición metrológica utilizados incorporando los resultados obtenidos en los ensayos y estudios desarrollados por el Laboratorio de Calibración de Medidores sobre el parque de medidores en servicio.

Esta actualización permitió ajustar la estimación de pérdidas aparentes a condiciones más representativas del comportamiento real de los equipos de medición instalados en el área de concesión.

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Inexactitud en la medición de los datos - Submedición metrológica (Fuente: Dirección Comercial)	[m^3/día]	141.907

b) Consumo No Autorizado

Este segmente es el agua tomada del sistema de distribución sin la autorización de la empresa de AySA. El consumo no autorizado es uno de los componentes de las pérdidas aparentes. Puede incluir:

a. Agua extraída (sin autorización) de los hidrantes.
b. Conexiones ilegales o clandestinas
c. Fraudes, tales como derivaciones a los medidores de los usuarios (by-pass), manipulación del equipo de lectura del medidor, o acciones similares.

Para su determinación, la Dirección Comercial utiliza coeficientes bibliográficos (0,5% del consumo total).

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Consumo No Autorizado (Fuente: Dirección Comercial)	[m^3/día]	47.660

c) Errores sistemáticos en el manejo de datos por sistema de lectura y/o facturación


El volumen de agua contemplada en este concepto se calcula a partir de coeficientes bibliográficos (0,25% del consumo total), lo que resulta en un valor de **8.958 m³/d.**, incorporándose además aquellos desvíos que son detectables y medibles.

En ese sentido, en el año 2024 se incorporaron a este segmento los denominados “Consumos Cero”, es decir, el consumo de aquellos usuarios medidos que presentan consumos registrados iguales a cero como consecuencia de incidencias que impiden efectuar una lectura válida del medidor y que no son facturados. Para estos casos, la Dirección Comercial estima los consumos utilizando como referencia los últimos consumos reales registrados por cada usuario.

Durante el año 2025, a expensas de la disponibilidad de medidores y con una fuerte estrategia operativa de recambio de medidores se ha producido una baja considerable de este segmento de pérdida registrándose para el año **1.484 m³/d** como valor promedio anual.

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Error sistemático en el manejo de datos por sistema de lectura y/o facturación (Fuente: Dirección Comercial)	[m^3/día]	10.442

En las Tablas y Figuras siguientes se presentan los valores calculados por componente y su evolución respecto al año 2024:

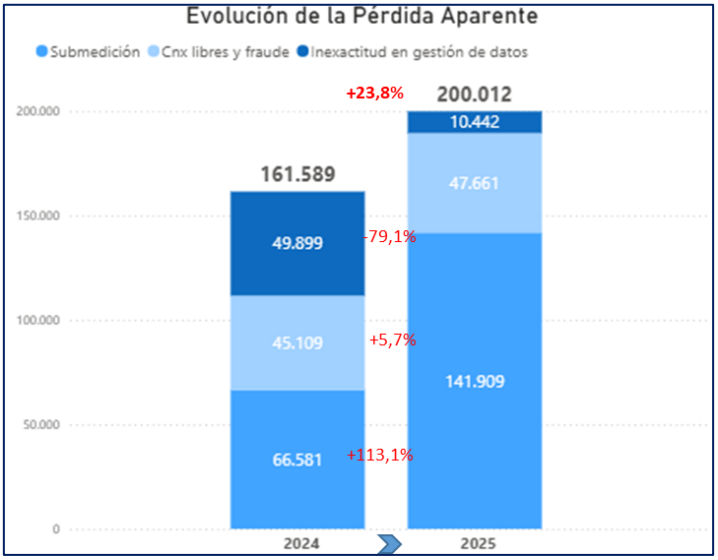

Concepto	Unidad	Valor 2024	Valor 2025	Δ2024-2025
Submedición metrológica	[m3/día]	66.581	141.907	+113,1%
Consumo no autorizado	[m3/día]	45.109	47.660	+5,7%
Error de lectura/facturación	[m3/día]	49.899	10.442	-79,1%

En resumen, la evolución interanual de las pérdidas aparentes estuvo influenciada principalmente por la actualización de los coeficientes de submedición metrológica y por el trabajo de recambio de medidores que

significaron la reducción de “consumos cero”. Por tal motivo, las diferencias observadas entre 2024 y 2025 reflejan tanto cambios en la magnitud en la calidad de la información utilizada para su determinación como de resultado de trabajos reales en campo para reducción de estos volúmenes de pérdidas.

1.7.2.4. Conclusiones de Gestión del Balance de Agua e Indicadores 2025

El Balance de Agua 2025 refleja una mejora sustancial en la calidad, consistencia y confiabilidad de la información utilizada para la determinación de los principales indicadores de gestión del sistema de distribución. La actualización de variables estructurales, la revisión de metodologías de cálculo y la validación de consumos y parámetros operativos permitieron reducir significativamente la incertidumbre asociada al Balance, incrementando la representatividad de los resultados obtenidos.

El sistema mantuvo niveles estables de agua entregada a la red, aun en un contexto de variabilidad climática y cambios en los patrones de demanda, evidenciando una mayor capacidad de gestión operativa mediante la regulación de bombeos, la gestión de presiones y el seguimiento de los consumos. Asimismo, el Índice de Confiabilidad del Balance continuó su tendencia positiva, consolidando un marco técnico más robusto para la evaluación de los indicadores de Agua No Contabilizada, pérdidas reales, pérdidas aparentes y dotación.


Los resultados alcanzados permiten disponer de una línea de base más sólida para la toma de decisiones y la priorización de inversiones, fortaleciendo el enfoque de gestión integral del binomio oferta-demanda. En este sentido, se ratifica la necesidad de profundizar las acciones de macromedición, sectorización, control activo de pérdidas, optimización energética, gestión de presiones y mejora continua de la medición comercial, como ejes estratégicos para incrementar la eficiencia hidráulica, operativa y económica del sistema, contribuyendo a la sostenibilidad del servicio en el mediano y largo plazo.

1.7.3. Plan de Acción de Agua No Contabilizada (ANC) – Avances 2025


Durante el año 2025 los trabajos asociados al Plan de ANC se enmarcaron en el “Plan de Acción de Transición”, aprobado en el Directorio de la empresa el día 16/04/2025.

Los avances del Plan de Agua No Contabilizada se ajustan a las premisas de dicho Plan. No obstante, cabe destacar que los ejes de acción continúan basándose en las estrategias propuestas por la IWA en “The IWA Water Loss Task Force. Water 21-Article n6. Assessing Real Losses, incluiding Component Analysis and Economic Considerations: A practical Approch”, habiéndose afectado fundamentalmente la temporalidad y las cantidades de los mismos.

El esquema siguiente ilustra los pilares de la gestión de pérdida real o física tendientes a controlar el agua no contabilizada y, en definitiva, ajustar la dotación de agua y llevar a cabo una gestión eficiente del sistema.

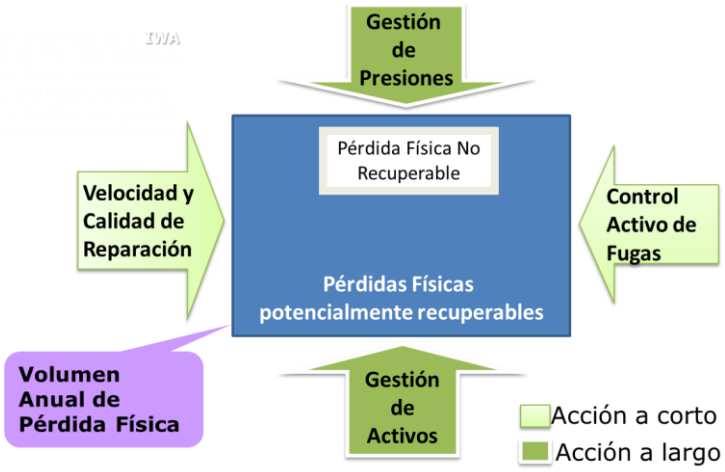

Los ejes de acción se resumen en el siguiente esquema, habiéndose afectado fundamentalmente la temporalidad y las cantidades de los mismos.

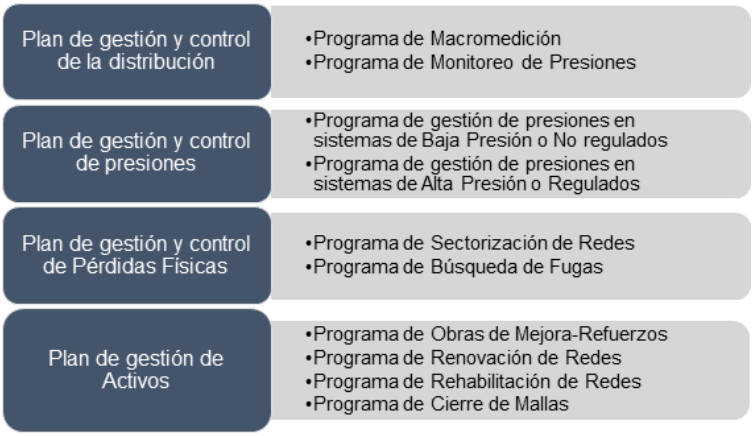

En los apartados siguientes se detallará el avance realizado durante el año 2025 en cada uno de los planes.

1.7.3.1. Gestión y Control de la Distribución

El eje está centrado en asegurar un balance confiable que permita mejorar el cálculo del rendimiento y del Volumen Actual de Pérdidas Reales Anuales del sistema de distribución, identificar donde y cuando actuar en el sistema (estructural o hidráulicamente) y mensurar efectivamente el impacto de las acciones ejecutadas. El eje contempla continuar confiabilizando el sistema de Macromedición existente e incorporar nuevos puntos estratégicos de medición -con el fin de realizar un macro-balance confiable a nivel región, distrito y sectores hidráulicos y una mejor evaluación de los niveles de servicio.

El Plan está compuesto por diferentes acciones según se trate de medición de caudales “Macromedición” o de “Monitoreo de Presiones”, y en función de donde se localiza el punto de control: Salidas de Estaciones Elevadores o Plantas, Transferencias entre Distritos, Centros de Distribución, Válvulas Reguladoras, Sector y/o Subsector Hidráulico. Tienen como objetivo:

- Asegurar la calidad de la medición de los volúmenes de agua bombeada manteniendo una certidumbre conocida y aceptable.
- Medir la demanda en cada distrito con un grado de certidumbre conocida y aceptable.
- Medir sectores y/o subsectores hidráulicos que permitan sectorizar sistemas de distribución actualmente integrados.
- Medir presiones de servicio.

1.7.3.1.1. Programa de Macromedición Agua Entregada a la Red

Este Programa tiene como objetivo mejorar el conocimiento del sistema de distribución a través de la confiabilización del sistema de Macromedición existente y la incorporación de nuevos puntos estratégicos de medición con el fin de realizar un macro-balance confiable a nivel región, distrito y sectores hidráulicos.

Los puntos de control pueden localizarse en diferentes puntos del sistema de distribución y en función de ello varía el tipo de trabajo a ejecutar, a saber:

- *en Salidas de Estaciones Elevadoras o Plantas,*
- *en Transferencia entre Distritos,*
- *en Salidas de Centros de Distribución*
- *en Válvulas Reguladoras,*

- *en sectores hidráulicos:* DMAs (District Metered Areas) o PMAs (Pressure Management Areas),
- *en puntos no permanente o móviles.*

Macromedición Fija o Permanente

En el programa se diferencian distintos grupos de puntos por lo que las acciones se definen segmentados en cada uno de ellos.

a) Macromedición Fija en Salidas de Estaciones Elevadoras o Plantas tiene como objetivo otorgar precisión y fiabilidad al cálculo de la dotación y de la segmentación del balance a partir de la confiabilización del dato de agua entregada mediante medición con tecnologías con incertidumbre menor o igual a ±0,5%.
b) Macromedición Fija en Transferencia entre Distritos tiene como objetivo otorgar precisión y fiabilidad al cálculo de la dotación y de la segmentación por Distritos utilizados para el cálculo del balance, mediante medición con tecnologías con incertidumbre entre ±0,5% a 2% y transmisión en todos los puntos.
c) Macromedición Fija en Válvulas Reguladoras tiene como objetivo otorgar precisión y fiabilidad al dato de caudal de salida de válvulas reguladoras mediante la instalación o rehabilitación de la medición con incertidumbre menor o igual a ±0,5% y transmisión en todos los puntos.

Los programas pueden contemplar la rehabilitación integral del punto, lo que incluye la provisión de equipos de medición, las obras civiles, equipamiento soporte e instalaciones eléctricas, sistema de comunicación y/o telemetría, o la rehabilitación parcial implicando algunas de las etapas anteriormente descriptas.

La tabla siguiente muestra el avance del Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Macromedición, en función de puntos instalados.

Durante el año 2025, se llevaron a cabo reemplazos de caudalímetros en válvulas reguladoras:

- Uno (1) VR Calzada: octubre 2025
- Dos (2) VR Pampa: abril 2025 / octubre 2025

Desde el inicio del programa a los efectos de mantener los logros alcanzados, se han instalado **158 macromedidores** de caudal.

Caudalimetro, Magneto Inductivo de CARRETE	Cronograma de avance anual																		
	Plan original	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total Instalados
Estacion Elevadora y Plantas	50	1	1	9	13	12	5	4	3		1		1		1				51
Transferencia entre Distritos	41			7	2	8	12	2		1	2				2				36
Valvulas Reguladoras	23				10	3	1	3	5	20	9	10	1		3	1	3	2	71
TOTALES	114	1	1	16	25	23	18	9	8	21	12	10	2	0	6	1	3	2	158

Estos puntos de control no amplían el porcentaje de confiabilidad del balance de agua global pero impactan en el mantenimiento del Índice de Confiabilidad del Balance de agua y la distribución del agua entregada, permitiendo gestionar en forma eficiente el área abastecida.

El mantenimiento de la Red de Macromedición tiene diferentes responsables según donde se ubique el punto de control. Ello implica un gran esfuerzo de coordinación al momento de asegurar el índice mencionado.

En todos los casos la responsabilidad primaria recae en los operadores de la infraestructura que contiene el punto de control, a saber: Dirección de Agua-Establecimientos (salidas de Plantas y Estaciones Elevadoras), Dirección de Agua-Control Centralizado (Transferencias entre Distritos), Dirección de Grandes Conductos (Válvulas Reguladoras), DOR y DI (DMAs-PMAs). A su vez, colaboran en el proceso la Dirección de Ingeniería (adquisición de equipos y coordinación de puesta en marcha), Dirección Grandes Conductos (montaje y piezas especiales) y DAL (comunicaciones y telemetría).

Los avances mencionados se corresponden con la macromedición de agua superficial, el eje de acción para la confiabilización del agua de origen subterráneo forma parte de un plan de acción propio de la Dirección de Agua.

Macromedición fija o permanente en DMA (District Metered Area)

Son puntos de medición de caudal y presión en puntos de INGRESO Y EGRESO de DMAs (District Metered Area, por sus siglas en inglés) en cañerías diámetros entre 150mm y 400mm.

Se utilizan caudalímetros electromagnéticos de inserción o certidumbre mayor, con datos transmitidos por telemetría. Es decir que los datos son registrados por el medidor, almacenados en el registrador y transmitidos por un sistema de comunicación 3G.

Al cierre de diciembre de 2025, se cuenta con un total de 130 puntos de monitoreo de caudal, de los cuales 43 disponen de medición continua y 64 puntos con recambio de equipo pendiente debido a la falta de stock. Los puntos restantes (23) corresponden a ingresos que fueron cerrados como parte de un proceso de optimización, quedando las cámaras disponibles para su utilización cuando resulte necesario.

En el marco del programa de mantenimiento de estos puntos de medición de caudal se realizó un total de **195 intervenciones** en el año para asegurar la disponibilidad del dato, tanto de caudal como de presión. A modo resumen se mencionan los tipos de actividad:

- Recambio de equipo por mal funcionamiento
- Retiro de equipo
- Envío forzado de datos
- Reemplazo tarjeta SIM
- Verificación configuración equipo
- Relevamiento de cámara (vaciado, estructura, otros)

La responsabilidad primaria de la actividad recae en el área Sectorización Redes de la Gerencia Agua No Contabilizada de la Dirección de Ingeniería.

Macromedición fija o móvil en estudios

Al cierre del año 2025, se cuenta con campañas de medición en puntos que no forman parte del parque de Macromedición Fija/ móvil (PPQ y PPP) o de Macromedición fija en DMA, pero que son necesarios por algún tipo de estudio, a saber:

- ✓ Línea Villa Ballester – D° San Martin / DRN
- ✓ Línea Montañeses - D° Belgrano / DRCF
- ✓ Estudos de macromedición de Válvulas reguladoras VR1 y VR2 (EE Bernal 1) - VR12 (EE Bernal 4) - D° Quilmes / DRSE
- ✓ Línea Saavedra Superí- Villa Adelina / DRN
- ✓ Medición en ocasión de maniobras TREQP06 y TREQP07 – D°Tres de Febrero / DRO
- ✓ Medición en ocasión de maniobras DN 1200 Refuerzo Devoto - San Martín / DRCF&DRN
- ✓ Mediciones en puntos estratégicos - 24 hs
- ✓ Estación de medición AVEQP06, AVEQP07, AVEQP14, CABQP09, FLOQP14, DEVQP14, FLOQP9
- ✓ Verificación de caudal salida EE Tres de Febrero.
- ✓ Verificación de caudal salida EE Quilmes
- ✓ Medición de caudal en cañería DN1100 D° San Fernando /DRN
- ✓ Medición en Acueductos - Tigre Centro y Pacheco Benavidez
- ✓ Medición con equipos ultrasonido en grandes usuarios y D° San Fernando.

1.7.3.1.2. Programa de Medición UREM (urbanizaciones residenciales emergentes)

El programa se enfoca en confiabilizar la demanda de agua en las UREM. A la fecha el consumo de este tipo de urbanizaciones se estima teniendo en cuenta la dotación de agua, población abastecida y tipología de urbanización.

En el año 2024, coordinado por el área de Desarrollo de la Comunidad, en conjunto con la Dirección de Ingeniería y las áreas regionales, se comenzó un programa para lograr la medición del agua entregada en urbanizaciones de distintas regiones. El trabajo abarca aspectos comerciales y técnicos. A continuación, se detallan las etapas llevadas a cabo desde el área técnica:

- Análisis del catastro de redes que abastecen a la UREM.
- Relevamiento de cañerías que no forman parte del patrimonio de AySA pero que pueden estar relacionados con el abastecimiento de la zona.
- Identificación de puntos a medir.
- Mediciones puntuales y balance preliminar.
- Implementación de puntos de medición permanente en los casos que pueda quedar sectorizada el área.
- Instalación de equipos de monitoreo on-line (caudal y presión).


Durante el año 2025, se trabajó en veintitrés (23) UREM lográndose medir el agua entregada en doce (12) de ellas, de las cuales a la fecha tres (3) cuentan con medición on-line.

Dirección Regional	Barrio	En estudio	Medición de caudal	
DRCF	Los Piletones	X		
	Las Palomas		X	
	Barrio Calaza		X	
	Barrio 31	X		
	Barrio 1-11-14	X		
	Rodrigo Bueno	X		
	Barrio 20	X		
	Total DRCF	**5**	**2**	**7**
DRN	Villa el Garrote		X	
	La Carcova		X	
	Sagrada Familia		X	
	San Luis	X		
	La Escondida	X		
	Martin Fierro	X		
	Barrio Esperanza		X	
	Tropezón		X	
	Total DRN	**3**	**5**	**8**
DRSE	Barrio Itati		X	
	Villa Tranquila	X		
	Villa Lujan		X	
	Villa Lujan 1	X		
	Barrio Nestor Kirchner		X	
	Villa Azul	X		
	Total DRSE	**3**	**3**	**6**
DRSO	La Herradura		X	
	Barrio 8 de Diciembre		X	
	Total DRSO	**0**	**2**	**2**
	TOTAL	**11**	**12**	**23**


Los datos obtenidos fueron incorporados al modelo de Balance de Agua tal como se ha mencionado en apartados anteriores.

Adicional a la acción mencionada, en los casos en que se cuenta medición on-line del ingreso de agua se han realizado estudios para caracterizar las curvas de demandas de dichas urbanizaciones. A continuación se presentan los resultados obtenidos:


- Villa 31 – CABA → Agua entregada promedio 2025 : 971 m³/h = 23.304 m³/día

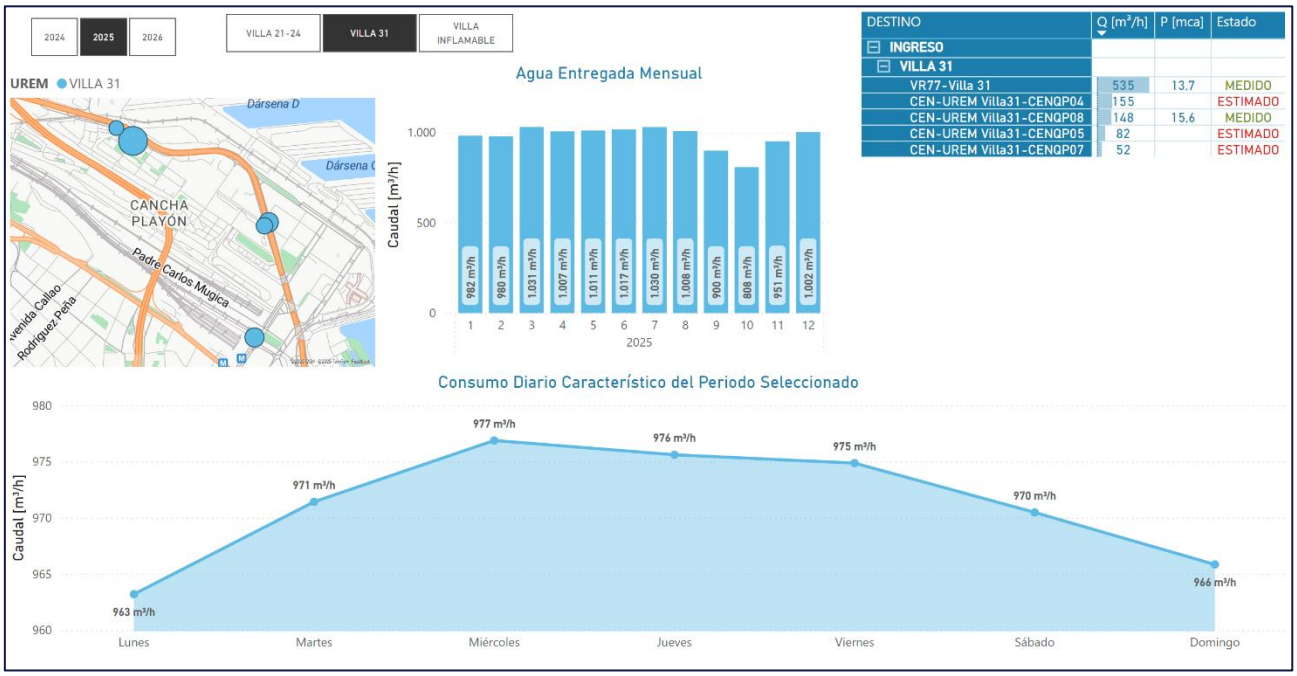

- Villa 21-24 – CABA → Agua entregada promedio 2025: 1.001 m³/h = 24.024 m³/día

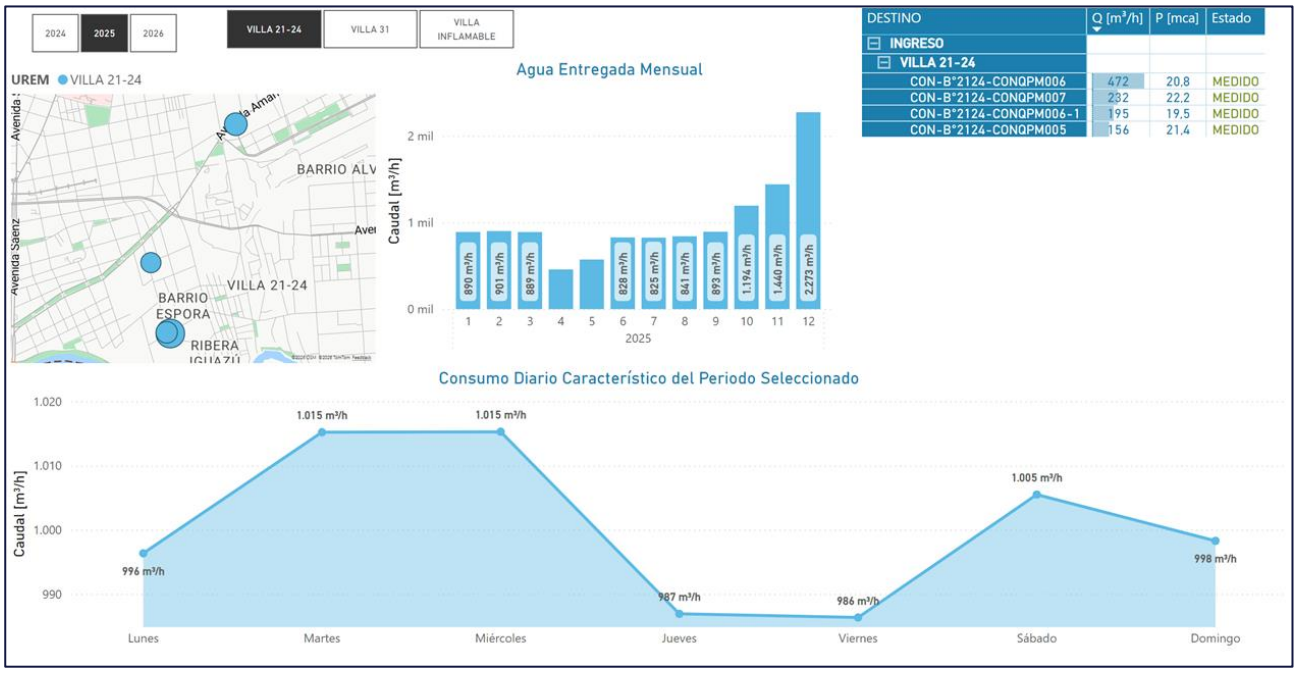

- Villa Inflamable – Avellaneda → Agua entregada promedio 2025: 75 m³/h = 1.800 m³/día

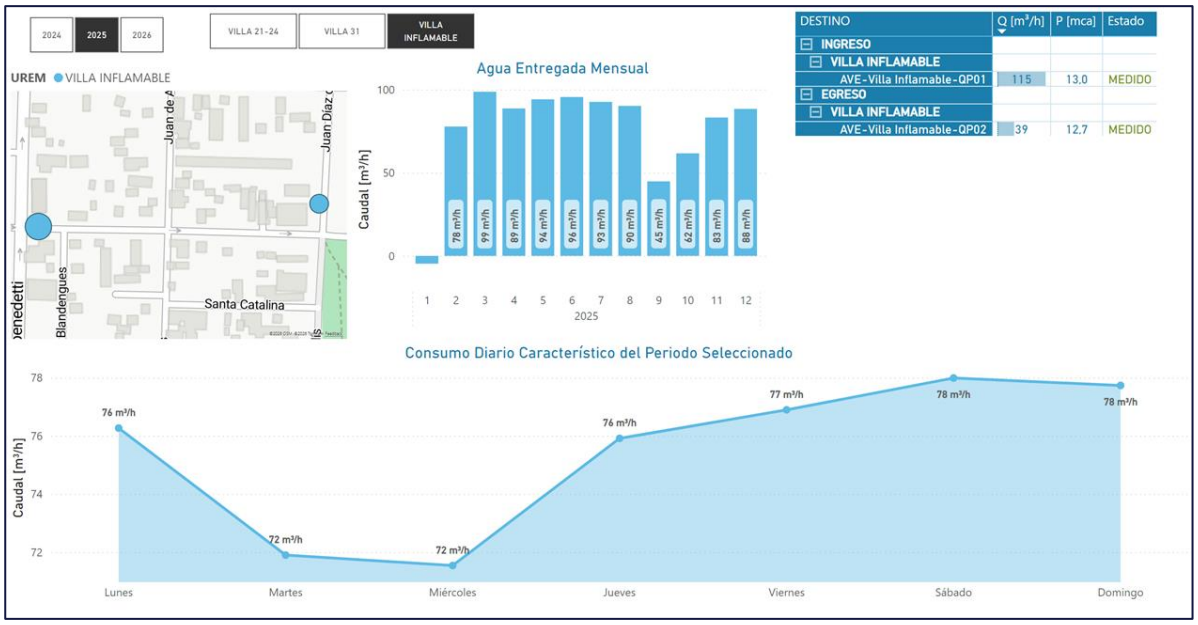

1.7.3.1.3. Programa de Monitoreo de Presiones

El monitoreo diario de las presiones de servicio y su caracterización por áreas hidráulicas (mallas, sectores, distritos, sistemas) es una variable fundamental para diagnosticar el estado de la infraestructura así como también, para evaluar el impacto de los ajustes del bombeo y del transporte de agua.

Para ello se utilizan diferentes puntos de medición de presión en el sistema de distribución algunos instalados con carácter de permanentes y otros móviles.

Para la medición de la presión continua, se utilizan sensores de presión combinados con registradores multipropósito que permiten la monitorización de presiones on-line con tecnología 3G.

Puntos permanentes de medición de presión (PPP)

En estos puntos se mide la presión en forma continua con transmisión on-line al SCADA. Cada punto de medición monitorea la presión característica de un grupo de mallas.

En la tabla siguiente se detalla la cantidad de Puntos de Monitoreo de presión existente al cierre del año 2025, según el tipo de infraestructura donde se encuentra instalado el registrador (PPP: punto permanente de presión; VR: válvula reguladora; PPQ: punto permanente de caudal) y según la distribución geográfica (por Dirección Regional):

	"AySA 2015"			"Nuevas Áreas"	AySA Total		
Región	PPP	VR	PPQ	PPP	PPP	VR	PPQ
CAPITAL	61			0	61		
NORTE	62	1	2	11	73	1	2
OESTE	65			12	77		
SUDESTE	54			10	64		
SUDOESTE	43			3	46		
SubTotal	285	1	2	36	321	1	2
Total	288			36	324		

A nivel de la red de monitoreo de presiones necesaria para el cálculo del indicador de "% Mallas con presión satisfactoria", al cierre del año 2025, el **79% de las mallas** cuenta con monitoreo de presiones, en tanto que un 21% de mallas aún tiene pendiente de tener un punto de monitoreo asociado.

Se continuará trabajando para reducir ese porcentaje de mallas sin PPP, implementando nuevos puntos de monitoreo, lo que implica la adquisición de equipamiento y la ejecución de cámaras para su instalación.

Los resultados del monitoreo se detallan en el apartado de Mapeos de Presiones del Informe Niveles de Servicio.

Puntos permanentes de presión en DMAs

En estos puntos se mide la presión con transmisión on-line al SCADA en puntos de ingreso y egreso de agua en DMAs, eventualmente puede contarse con un punto de medición de presión característico dentro de la red de la DMA. En total se cuenta con **130 puntos de monitoreo de presión** en ingresos y egresos de DMAs, de los cuales 70 poseen medición continua y 60 requieren recambio de equipos.

El programa de mantenimiento es similar al descripto en Medición Fija en DMA (District Metered Area) ya que se instalan en simultáneo el punto de medición de caudal y el punto de medición de presión. Las intervenciones mencionadas en dicho apartado corresponden a trabajos de ambos universos de medición.

1.7.3.2. Gestión y Control de las Presiones

AySA cuenta con un **Comité de Gestión de Presiones**, liderado por la Dirección de Ingeniería y la Dirección de Agua, con la participación de todas las áreas técnicas involucradas en la operación y gestión del sistema de abastecimiento. Su finalidad es consensuar e implementar estrategias operativas que permitan optimizar el funcionamiento del sistema mediante una adecuada gestión de las presiones.

El principal objetivo consiste en adecuar la curva de oferta a la curva de demanda a través de la regulación de las presiones diurnas y nocturnas, garantizando los niveles de servicio requeridos y promoviendo un uso más eficiente de la infraestructura existente.

En este marco, el Plan de Gestión de Presiones contempla acciones orientadas a la macrosectorización de las áreas de abastecimiento, la incorporación de tecnologías de regulación y monitoreo, y la implementación de medidas operativas que permitan alcanzar la presión mínima suficiente para asegurar la calidad de prestación del servicio. Estas acciones contribuyen simultáneamente a reducir la ocurrencia y magnitud de pérdidas físicas en redes y conexiones domiciliarias.

Se han previsto acciones diferenciadas según se trate de un sistema de baja presión (sistemas no regulados) o de alta presión (sistemas regulados).

- ***Programa de Gestión de Presiones en sistemas de baja presión*** se definen regulaciones estacionales y diurnas/nocturnas para la mayor parte de las Estaciones Elevadoras. En simultáneo, la Dirección de Agua ha establecido un programa de instalación de Variadores de Velocidad en una o más bombas en las diferentes Estaciones Elevadoras con el objetivo de optimizar la regulación de oferta de agua en la zona de influencia de la Estación Elevadora involucrada.
- ***Programa de Gestión de Presiones en sistemas de alta presión*** tiene como objetivo optimizar la regulación de presiones en zona de influencia de válvulas reguladoras mediante la implementación de sistemas inteligentes de regulación. lo que permitirá ajustar el agua bombeada al sistema incrementando la oferta en horarios de mayor demanda y reduciéndola en horarios de mínimos consumos.

A nivel de sistemas de Baja Presión, desde el año 2018 se adoptó como estrategia la implementación de Variadores de Velocidad. Al finalizar el año 2025, se cuenta con la instalación de motores con variador de velocidad en al menos una bomba de las siguientes Estaciones Elevadoras:

- EE Lanús-Salida Lanús-Temperley
- EE Floresta
- EE Constitución
- EE Caballito, implementada en el año 2025

- EE Centro, temporariamente fuera de servicio


Además, desde el año 2013, la Planta Juan Manuel de Rosas posee variador de velocidad en las 8 bombas de salida de las impulsiones.

La implementación del programa está a cargo de la Dirección de Agua.

A nivel de sistemas de Alta Presión, se tiene como objetivo optimizar la regulación de presiones en el área de influencia de las válvulas reguladoras existentes, mediante la implementación de nuevas tecnologías de regulación que permitan ajustar el agua bombeada a la demanda del sistema incrementando la oferta en horarios de mayor demanda y reduciéndola en horarios de mínimos consumos.

En sistemas regulados o de alta presión se ha definido como estrategia la implementación de Sistemas Inteligentes de Regulación modulada horaria mediante la instalación de PLC o Controladores con comando a distancia, emplazado sobre el piloto de válvula reguladora nueva o existente de manera tal que permita regular a demanda el funcionamiento de la válvula y en consecuencia del agua erogada por ella

La Figura siguiente detalla las válvulas de los diferentes sistemas, sus áreas de influencia y el tipo de controlador con que se regula el funcionamiento de la misma.

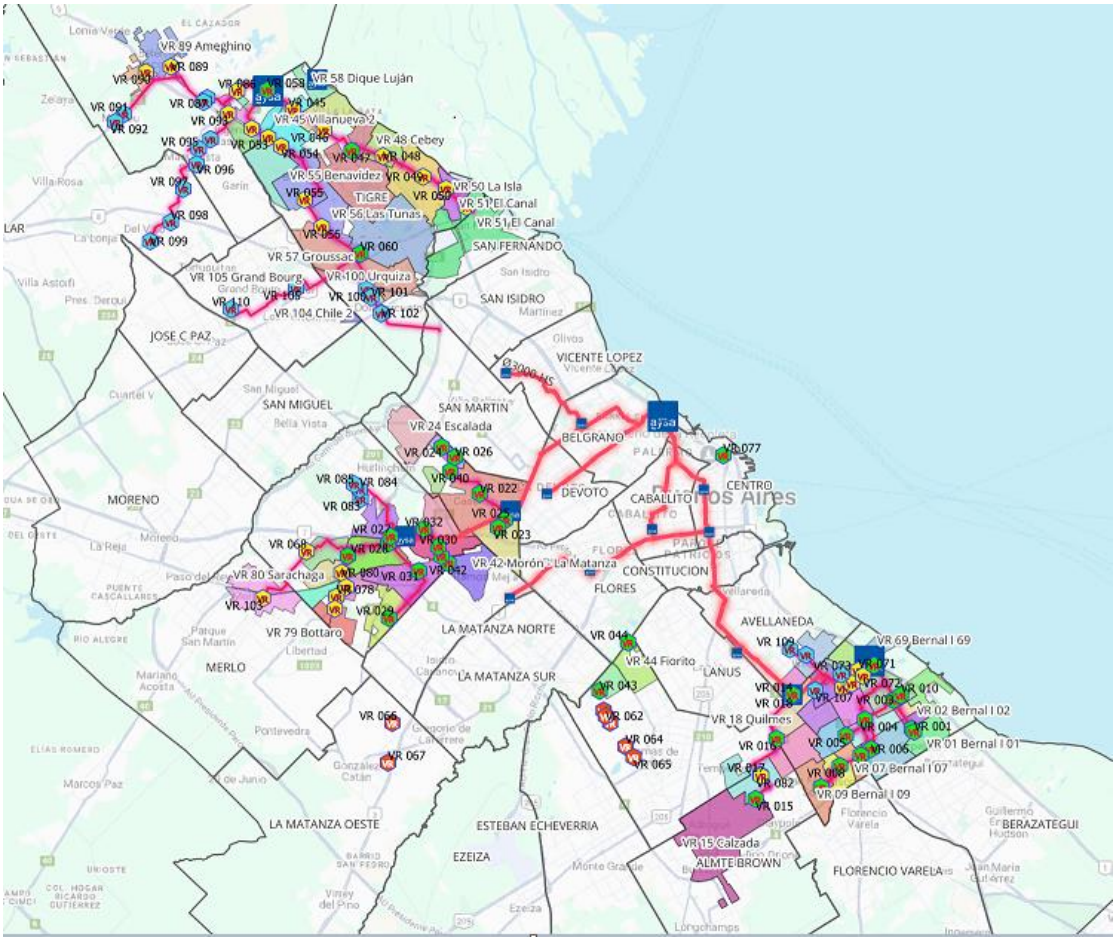


Al cierre de diciembre 2025 se cuenta con **75 válvulas reguladoras** de presión en servicio, el 92% cuenta con regulación modulada horaria y 8% con regulación piloto día/noche:

- Treinta seis (36) funcionan con Controladores Inteligentes Pegasus (verde)
- Treinta y tres (33) funcionan con PLC (amarillo)
- Seis (6) funcionan con pilotos mecánicos (rojo)

Además existen numerosas VRs en ejecución (celeste) de las cuales dos (2) VRs ya se encuentran instaladas en proceso de habilitación de las redes a las cuales abastecerán:

- Sistema PJMR – Acueducto Pacheco / Benavídez - VR Villanueva 1
- Sistema PSM - EE Morón – VR 85 Poeta Risso

Para asegurar el funcionamiento del equipamiento integral de regulación modulada horaria, durante el año 2025 se realizaron seis (6) recambios de controladores inteligentes remotos Pegasus completos más dos (2) cajas de solenoide adicionales, tres (3) caudalímetros de inserción y un (1) registrador de presión instalado en punto crítico. Para lo cual fueron realizadas 81 asistencias en terreno. En la siguiente Tabla se puede resume la actividad del año.

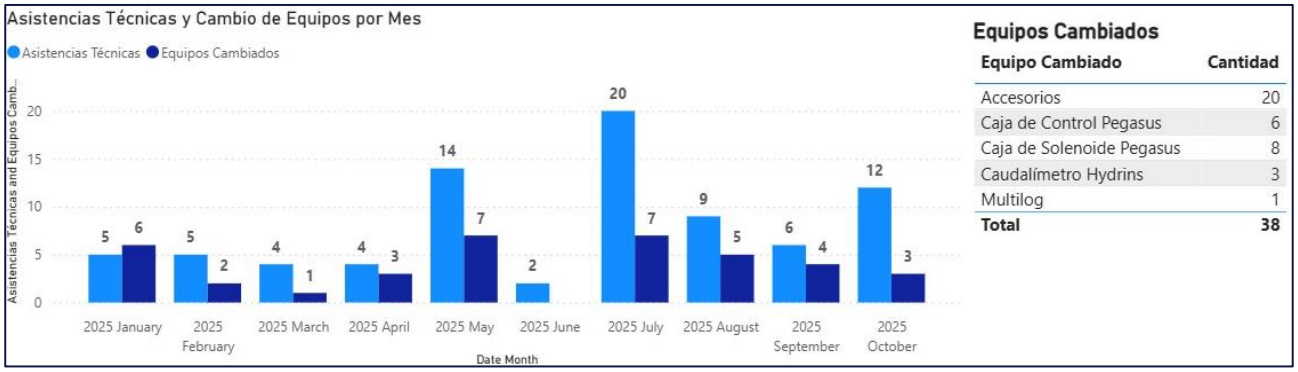

Equipos Cambiados

Equipo Cambiado	Cantidad
Accesorios	20
Caja de Control Pegasus	6
Caja de Solenoide Pegasus	8
Caudalímetro Hydrins	3
Multilog	1
Total	**38**

1.7.3.3. Gestión y Control de las Pérdidas Físicas

El Plan se centra en el desarrollo de estrategias de **sectorización** de la red para localizar las áreas con mayor potencial de pérdidas e implementar técnicas de **búsqueda y reducción de fugas** incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías para su detección y eliminación de pérdidas reales. El Plan de Acción de Transición 2024-2026 implicó un ajuste de las metas no obstante se continuaron los ejes de acción.

- ***Programa de Sectorización de redes:*** implementa la sectorización de redes por sectores hidráulicos DMAs para tener una localización temprana de fugas. El Programa contempla la elaboración de Planes de sectorización por distritos, planificación y ejecución de tareas para la puesta en funcionamiento de las DMAs, optimización del funcionamiento y monitoreo permanente de los resultados.
- ***Programa de Búsqueda y Reducción de fugas:*** implementa métodos eficientes para la detección y localización de fugas, se contemplan además las inversiones necesarias para su reparación. El programa abarca también la búsqueda de nuevas tecnologías y metodologías que permitan incrementar la eficiencia en este proceso.
-

1.7.3.3.1. Programa de sectorización de redes (DMA)

La sectorización de redes de distribución contempla la implementación de sectores hidráulicos denominados DMAs[3].

[3] District Metered Area, por sus siglas en inglés


Las DMA tienen como característica ser un área sectorizada hidráulicamente aislada del resto de la red con puntos de control de ingreso y egreso de caudal de agua y presión del servicio monitoreados en forma permanente.

El control de ingresos y egresos permite establecer un balance confiable del agua entregada a la zona, calcular las pérdidas con mayor precisión, localizar y eliminar pérdidas aparentes y pérdidas reales, y fundamentalmente monitorear la evolución de las variables hidráulicas.

El programa cuenta con varias etapas:

- Planificación - sectorización por DMA/PZA
- Implementación y optimización - planificación y ejecución de tareas para la puesta en funcionamiento
- Monitoreo y Detección temprana - monitoreo permanente de los resultados

En el año 2025, el programa de Sectorización de redes alcanza un total de **54 DMA** -en diferentes etapas-, equivalente a una longitud sectorizada acumulada de **1.324 km.**

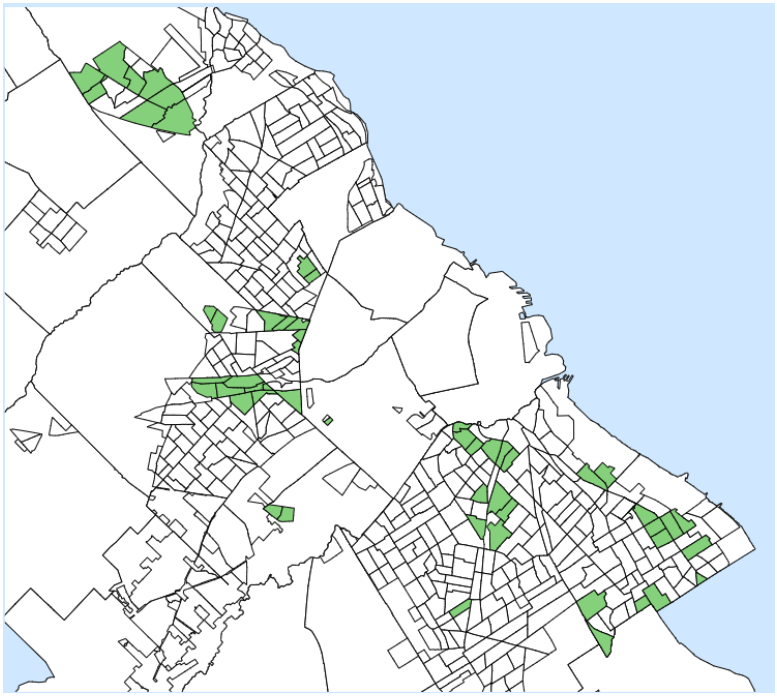

En este programa se desarrolló una Iniciativa de Eficiencia orientada a la optimización de las DMAs. Para ello se definió una estrategia de intervención focalizada sobre los distritos identificados como críticos en términos de desempeño hidráulico. A partir de dicho diagnóstico, se seleccionó un conjunto de DMA prioritarios, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y reducir el nivel de perdidas reales hasta alcanzar el valor meta de 30 m³/día/km.


La metodología de trabajo propuesta contemplo una planificación progresiva y sistemática, estableciendo como criterio inicial la concentración de los trabajos en una DMA cada dos meses por distrito, lo que permitió ordenar los recursos disponibles, evaluar resultados parciales y ajustar las acciones correctivas en función del comportamiento hidráulico observado.

Los principales trabajos realizados fueron:

- Relevamiento de obra: Verificación de perímetros, maniobrabilidad de válvulas de cierre permanente para confirmar la estanqueidad
- Pruebas de cierre de puntos de ingreso/egreso de DMA optimizando la cantidad de macromedidores
- Sectorización parcial de DMA para detección de sectores con mayor nivel de pérdidas y mejor priorización de acciones para mitigarlas.


- Prueba de funcionamiento: verificación de ingreso no medido.
- Verificación de vínculos entre Distritos/Regiones: Renovación de válvulas de cierre permanente a causa de detectarse pasaje de Caudal.
- Verificación estanqueidad en Áreas de influencia de VR conformando DMA renovadas.
- Implementación de la plataforma “Water Loss Managment” para la gestión de las DMAs

A diciembre de 2025 se completaron los trabajos de optimización en seis (6) DMAs, distribuidas cuatro (4) en DRO (LMN-DMA003, LMN-DMA004A, TRE-DMA003 yTRE-DMA016) y dos (2) en DRSE (LAN-DMA016 y AVE-DMA017).

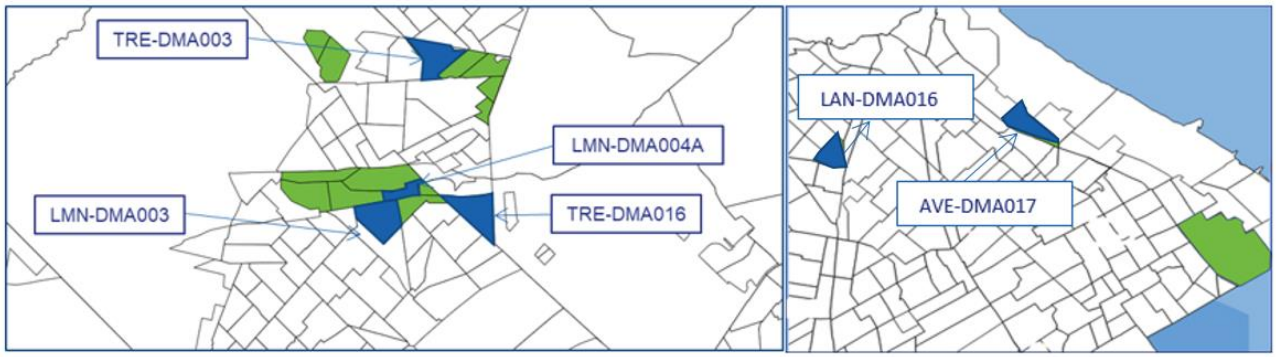


Adicionalmente, durante el segundo semestre se iniciaron trabajos en dos (2) DMA, una (1) perteneciente a la DRO y una (1) a la DRSE.

Los resultados 2025 reflejan una reducción sostenida de las pérdidas reales promedio de la Iniciativa, pasando de 148 m³/km/día → 112 m³/km/día, lo que representa una mejora significativa en el desempeño hidráulico de los sectores intervenidos.

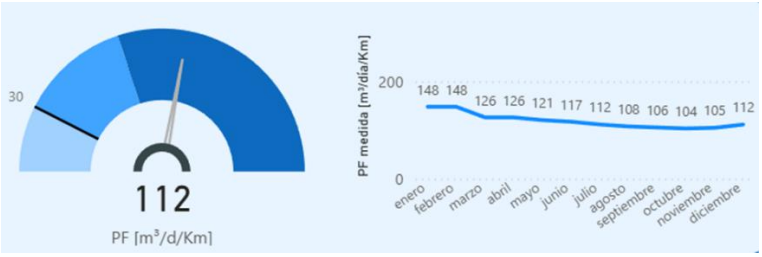

Las acciones implementadas permitieron alcanzar un volumen optimizado acumulado de **1.578.000 m³/año.** El volumen anual recuperado representa el **92 %** de la meta establecida para el período.

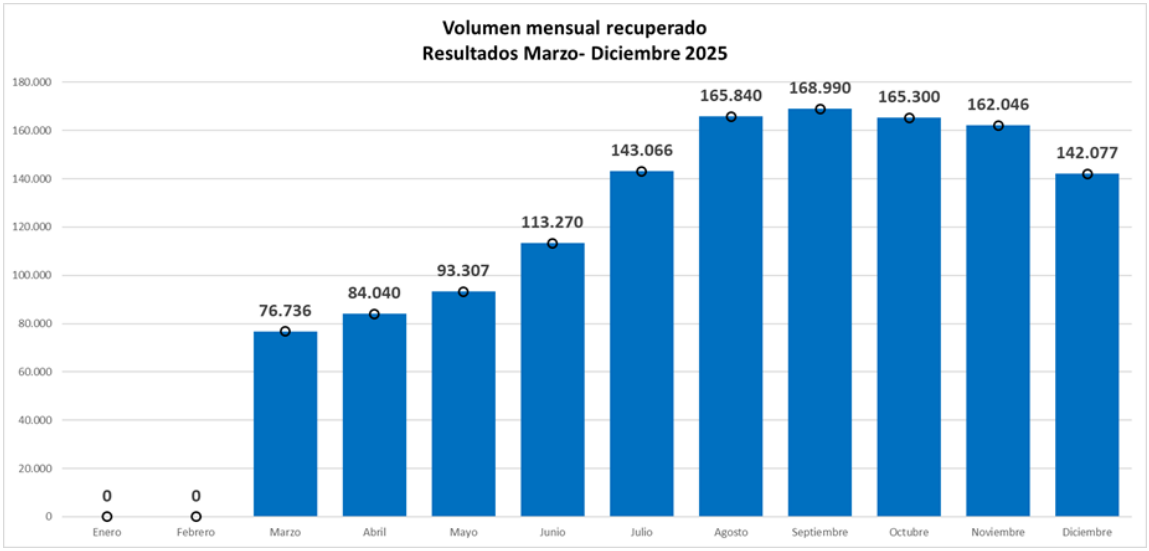

Como resultado de las acciones de detección temprana –posteriores a la optimización- se puede mencionar:

- Seis (6) fugas detectadas a partir de alertas por incremento de caudal mínimo nocturno identificadas en el monitoreo centralizado con la plataforma de gestión Water Loss Managment,
- Cuarenta y cinco (45) fugas localizadas por sensores de ruido permanente con transmisión on-line, cuarenta y tres (43) de las cuales se encontraban en conexiones y dos (2) en cañerías.

Se proyecta para el año 2026 la continuidad del monitoreo de todas las DMA con medición, continuar con los trabajos en las DMA priorizadas en el 2025 hasta alcanzar la meta de reducción de pérdidas, y sumar nuevas DMA a los trabajos de optimización.

1.7.3.3.2. Gestión de las Pérdidas Aparentes dentro DMA


En el marco de optimización de DMA, se definieron criterios que permiten el análisis y priorización de casos de interés con el objetivo de identificar y reducir las pérdidas aparentes y confiabilizar el consumo.

Criterios de análisis y priorización:

- Usuarios con consumo cero: permite identificar casos y evaluar los motivos.
- Usuarios R1-Residencial PV con consumos elevados: análisis de destino real, actualización de padrón comercial.
- Baldíos: análisis de uso real, actualización del padrón comercial y medición.
- Grandes Usuarios: análisis de destino y consumo, en caso de detectar inconsistencias se planifican acciones correctivas con las áreas correspondientes.
- Expedientes Residencial PV con superficie mayor a 10 mil m2: análisis de consumo y destino, medición y actualización de padrón comercial
- Usuarios NR-No Residenciales con mayor consumo según destino: permite identificar posibles fraudes.
- Usuarios Residencial PV con superficie cubierta igual a 0 m2: análisis de destino, actualización del padrón comercial.
- Barrios UREM: identificación y caracterización a fin de evaluar medición.
- Urbanización Cerrada: identificación y caracterización a fin de evaluar medición.

Durante 2025, se realizó análisis de 4.379 usuarios que representan el 9% del total de usuarios de 24 DMA implementada:

- Tres de Febrero: 6 DMA
- La Matanza Norte: 4 DMA
- Morón: 4 DMA
- Avellaneda: 5 DMA
- Lanús: 5 DMA

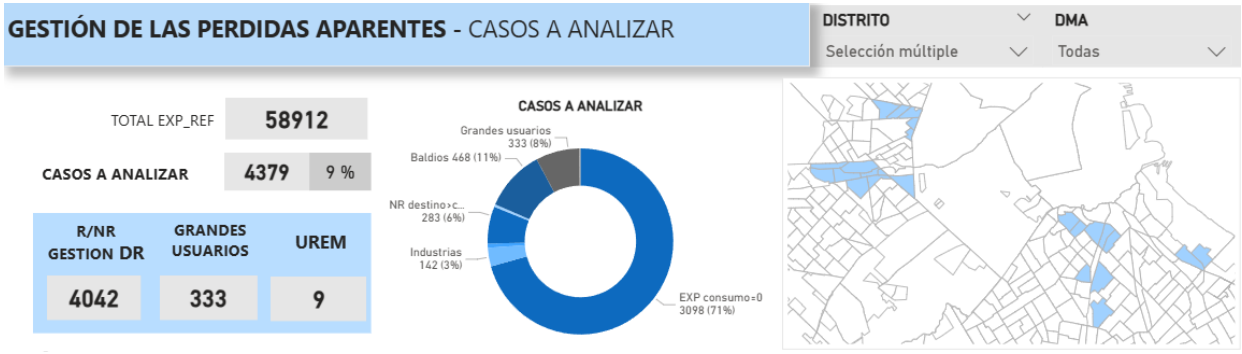

Del total de casos a analizar, los denominados “consumo cero” representan el **71%** de universo. Este universo se asocia a usuarios medidos sin medidor, a los que no se les pudo llevar a cabo el recambio del mismo, en general, por falta de stock, lo que impacta en el correcto registro del consumo.

Como resultado del trabajo coordinado con las Gerencia Comerciales de las Direcciones Regionales y la Gerencia de Grandes Usuarios, se avanzó en la confiabilización de datos comerciales. A continuación, se detallan los resultados más relevantes que impactan tanto en el registro de consumo como en la estimación:

Consumo cero: realizaron 2.014 recambios de medidores, de los cuales el 85% se concentran en DMA de la Dirección Regional Oeste que representa un recupero de **171.689 m3/año**.

Baldíos: de 306 casos analizados, se actualizó el destino de 128 casos en el padrón comercial, (42% de los casos analizados), el resto corresponde mantenerse como baldío sin consumo.

Expedientes Residencial PV con superficie >10.000 m2: se identificaron dos complejos de viviendas bajo régimen de facturación no medido:

- Vilanova Ramos Mejía – LMN-DMA003: se instaló medidor de estudio a fin de analizar comportamiento horario de este tipo de usuario.
- Vilanova Morón –MOR-DMA001: la Dirección Regional Oeste actualizó padrón catastro comercial y actualizó la estimación de consumo.

Grandes Usuarios:

- Hospital San Juan de Dios: instalación de medidor con registrador y cambio de régimen de facturación.
  Consumo no registrado → 27.756 m3/año

- Sanatorio Trinidad Ramos Mejía: como resultado del análisis del consumo medido y su relación m3/m2, la Gerencia de Grandes Usuarios detecta una conexión soterrada, que normaliza e instala medidor.
  Consumo no registrado → 21.360 m3/año.

- DIM/Atlas: durante el seguimiento y análisis de agua entregada al sector DMA, se detectó un aumento de caudal en la curva de AE de 11 m3/h, la medición del Hospital San Juan de Dios no explica ese incremento de Caudal mínimo nocturno. La Gerencia de Grandes Usuarios realizó una inspección de los usuarios próximos al hospital y detectó la conexión abierta en este predio demolido. Esta maniobra disminuyó el AE en 10 m3/h. Los escombros sobre la conexión impidieron la lectura y repaso de cálculo.
  Derroche interno → + 24.000 m3/año (Se considera el periodo de conexión abierta).

IMPACTO: REDUCCIÓN PÉRDIDA FÍSICA

El análisis y las acciones implementadas permiten confiabilizar el consumo de los usuarios y el padrón comercial, así como detectar pérdidas aparentes a fin de estimar con mayor precisión las pérdidas físicas en DMA.

1.7.3.3.3. Innovación – Herramienta de Gestión inteligente para la detección temprana de fugas

La plataforma Water Loss (WL) es la solución tecnológica para optimizar el ciclo completo de gestión de fugas dentro de una empresa de agua. WL permite aprovechar los datos de la red provenientes de múltiples fuentes de información (interfaces) para detectar fugas y mejorar los tiempos de respuesta.



Los principales desafíos que aborda la solución del WL se resumen en los siguientes apartados:

- Simplifica los cálculos de las fugas y el del balance de agua de los sectores hidráulicos.
- Mejora los tiempos de respuesta del sistema: gracias al módulo de alarmas, los operadores de red pueden detectar anomalías y problemas quasi en tiempo real, lo que mejora la respuesta del sistema.
- Mejora los procesos del Control Activo de Fugas y los procesos de Reparación de Fugas pasando de una gestión puramente reactiva a una gestión activa, anticipando los trabajos de detección antes de que se produzca un problema real o sea reportado por un cliente.
- Permite una supervisión constante de la red gracias a los módulos de Monitorización. El primer paso para resolver un problema es ser consciente de que existe un problema.

Durante el año 2025 se continuó trabajando en la implementación de la herramienta tecnológica, completando pruebas integrales y preparando la etapa de migración a producción.




En particular, se consolidaron las actividades de seguimiento, validación y análisis de la plataforma WL, orientadas a fortalecer la confiabilidad de la información generada, optimizar el monitoreo y la detección temprana de fugas en la red de distribución.


Las tareas desarrolladas abarcaron la configuración, revisión y ajuste de alarmas, el control de notificaciones emitidas por la plataforma y la verificación sistemática de datos de consumo y telemetría, evaluando su calidad y consistencia operativa. Asimismo, se mantuvo una interacción permanente con los referentes de Schneider para el análisis de funcionalidades, resolución de consultas técnicas y mejora de los criterios de configuración.


En relación a la gestión de pérdidas, se realizó el monitoreo activo de alarmas asociadas a cambios en el comportamiento de la red, posibles fugas, efectuando el seguimiento de los eventos detectados y su validación mediante consultas a los Distritos. Cuando las alarmas resultaron coincidentes con fugas o reparaciones verificadas en campo, se estimaron los volúmenes de fuga evitada, generando información relevante para evaluar el desempeño de la herramienta y la efectividad de las acciones correctivas implementadas.

La siguiente Figura muestra el centro de notificación de alarmas a la cual llegan las alertas.

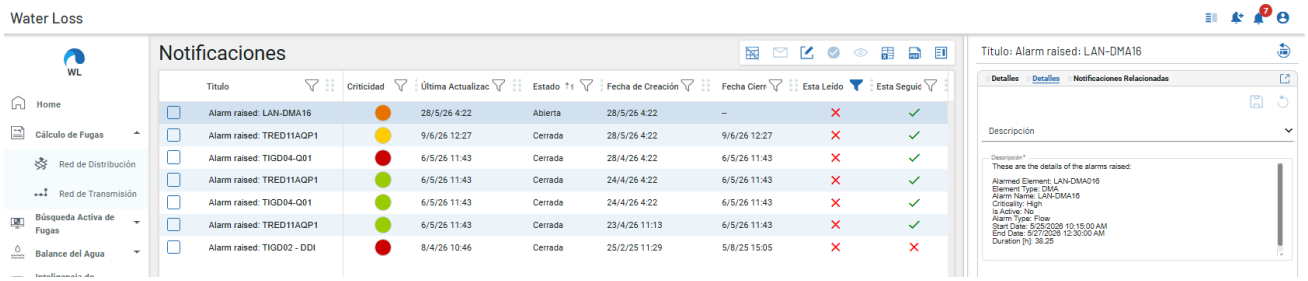



De igual forma se puede observar la misma alarma en la DMA correspondiente.

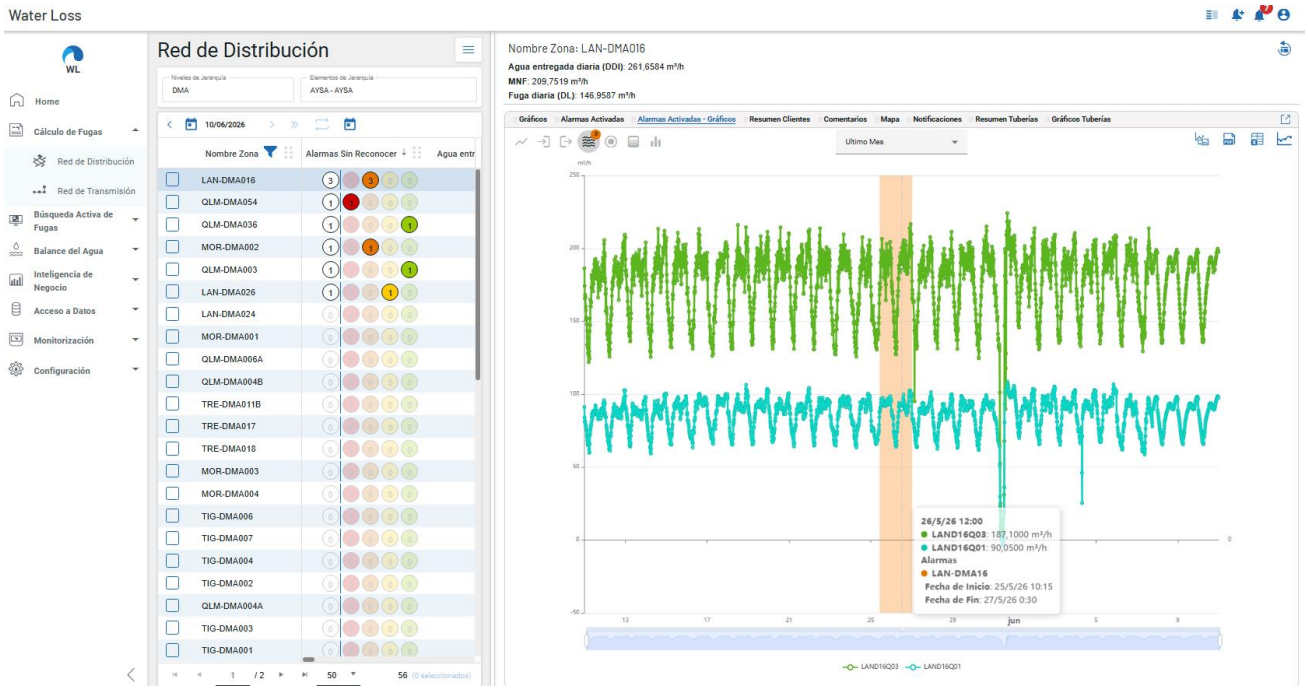


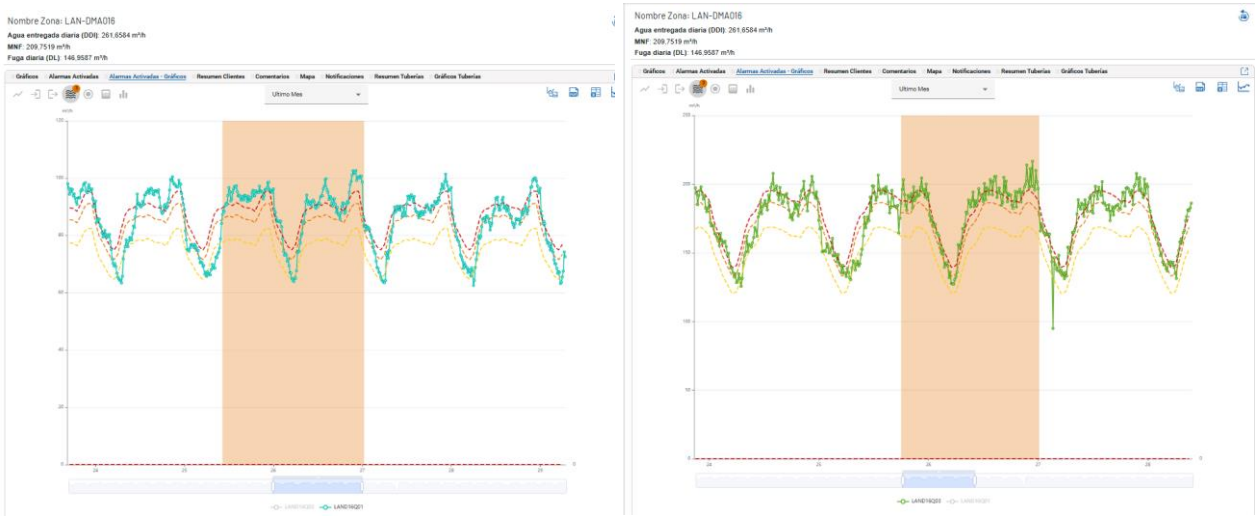

A continuación, se comparten algunos ejemplos de la detección temprana de fugas por monitoreo del caudal mínimo nocturno (QMN).

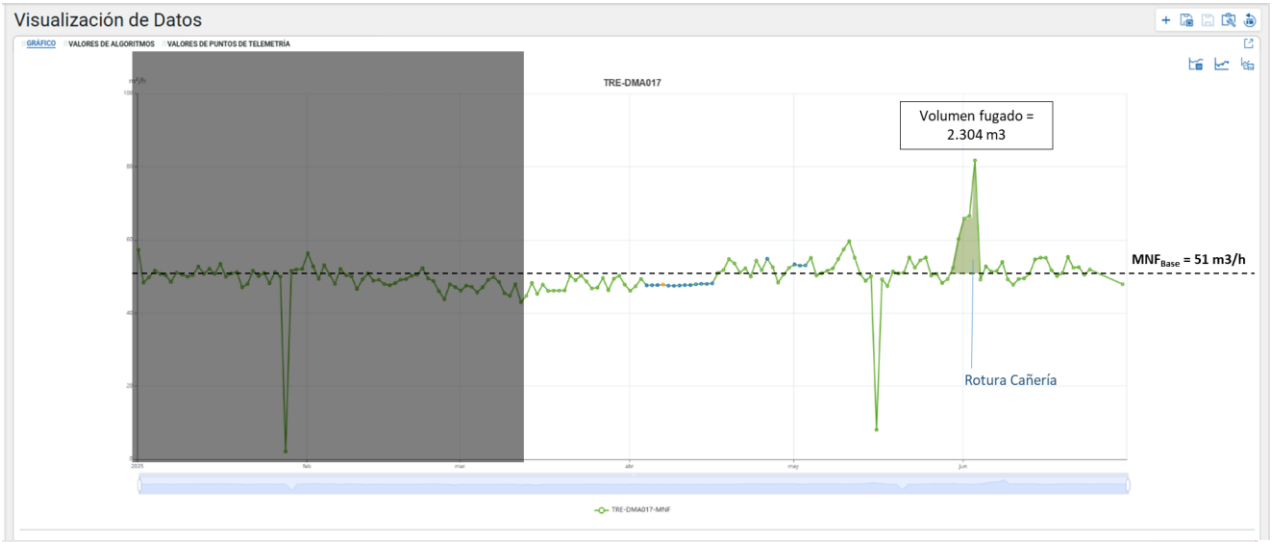

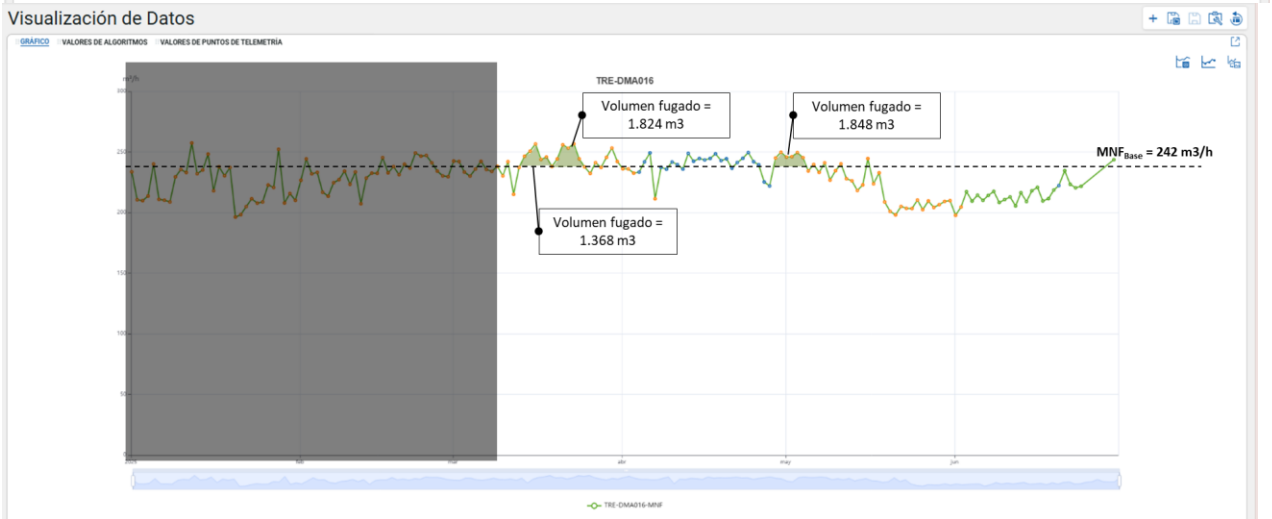

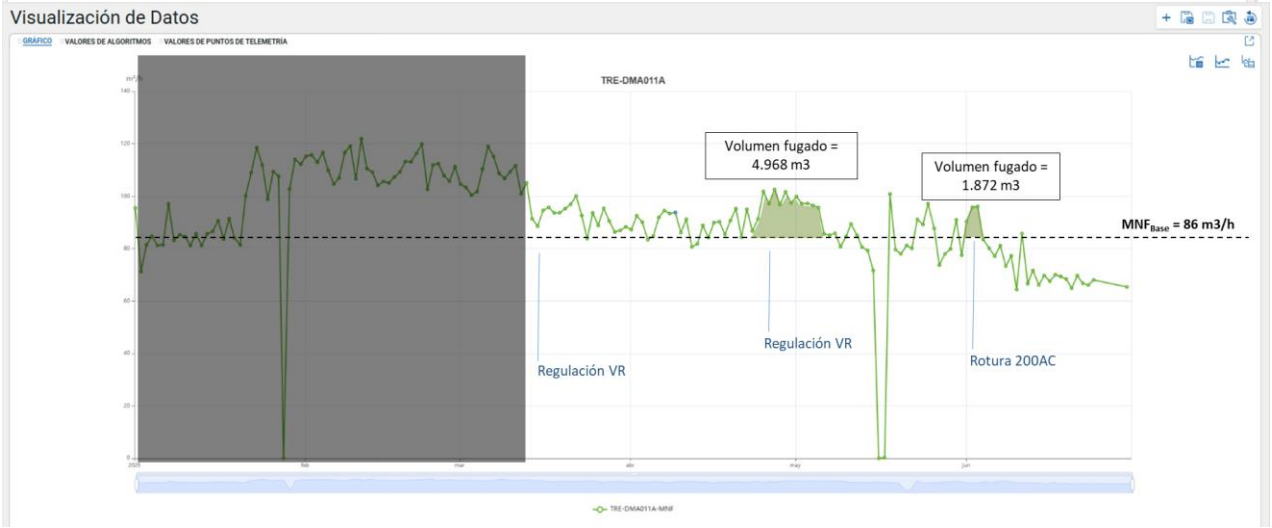

EVENTOS DETECTADOS = 6
Duración Promedio Evento = 4 días
Volumen Fuga Evitada = 21.276 m^3/año.

Los resultados obtenidos durante el año 2025 permitieron avanzar en la validación y aprovechamiento de la plataforma como herramienta de apoyo al monitoreo de las DMA y del resto de la concesión.

No obstante, continúan las tareas de optimización de los parámetros que conforman la plataforma, monitoreo de alarmas y mejora en los criterios de detección, con el objetivo de incrementar la precisión de los eventos reportados y maximizar el valor operativo del sistema.

1.7.3.3.4. Programa de búsqueda de fugas


El Plan tiene como objetivo reducir el volumen de agua que se pierde sin llegar a los hogares de los consumidores permitiendo incrementar la eficiencia del nexo AGUA-ENERGÍA. Uno de los ejes de acción es la optimización del proceso de control activo de fugas así como la velocidad y calidad de la reparación.


El tiempo sobre el que se hace foco en el presente plan es el “A” o “tiempo desde que se genera el escape hasta que se manifiesta”. Este tiempo es el más difícil de gestionar y en general se asocia al mayor volumen de pérdida. Por otra parte, optimizar este período impactará positivamente en “L” tiempo de localización” ya que incrementará la eficiencia de los equipos de búsqueda de fuga RANC que trabajan sobre este tiempo.


Se han implementado métodos eficientes para la detección y eliminación de fugas. Para ello se desarrollaron metodologías de prelocalización de fugas por métodos acústicos o satelital, geofonía y correlación de fugas.

1.7.3.3.4.1. Eliminación de Fugas en Redes de Agua mediante Prelocalización Satelital


La tecnología utiliza imágenes captadas por sensores SAR de microondas ubicados en un satélite que orbita continuamente la Tierra y permite obtener datos frecuentemente ya que con una pasada cubre áreas relativamente grandes.



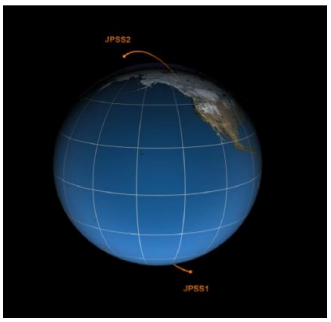




Los satélites con sensores SAR (Synthetic Aperture Radar) tienen como ventajas que pueden captar imágenes en todo tipo de clima, operan de día y noche, son sensibles a las propiedades dieléctricas y tienen penetración subsuperficial. En la imagen se grafica el proceso de captura de imagen.



La formación de imágenes del radar se lleva a cabo por un proceso por el cual el radar mide la amplitud (magnitud del eco reflejado) y la fase (posición de un punto en un momento específico en el ciclo de onda). La intensidad del eco reflejado es el coeficiente de retrodispersión (se expresa en decibeles) y es el dato utilizado en el algoritmo para la discretización de zonas con humedad (agua barrosa).

A posteriori, la tecnología completa el proceso según el siguiente esquema:

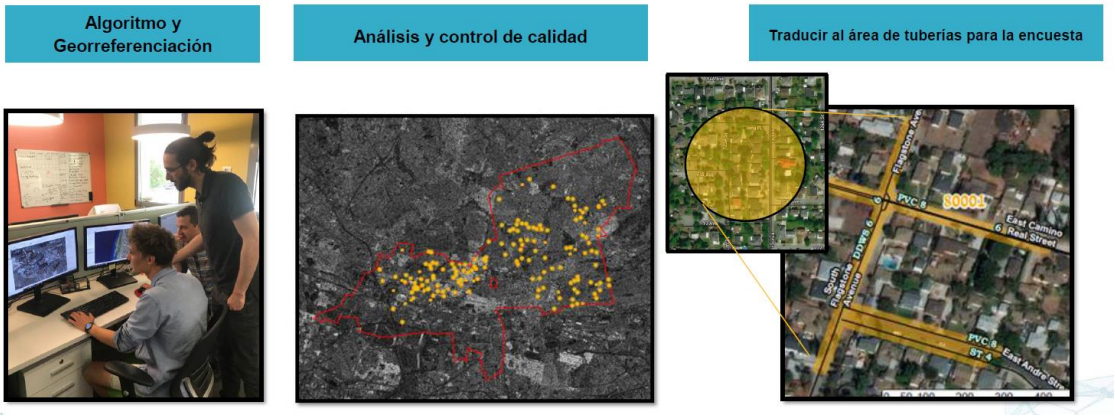

La metodología no tiene restricciones en cuanto al tiempo que demanda para llevar a cabo el diagnóstico ya que es posible realizar una evaluación de toda el área de estudio de una sola vez.

Entre las principales ventajas se destaca que, sin tener que acceder al terreno, se descartan zonas donde la existencia o densidad de fugas es baja y se pone foco en aquellos sectores con ratios elevados de fugas por kilómetro de red investigada para posteriormente ubicar la fuga con precisión y proceder a su reparación.


Si bien se realizaron pilotos durante los años 2019, 2020 y 2021, a partir del año 2023, se define aplicar la tecnología en forma sistemática. El alcance del programa contempla:

1. Diagnóstico satelital
2. Geofonia en puntos de interés
3. Reparación de fugas - conexiones y artefactos
4. Pre-localización acústica
5. Correlación acústica - RANC regional

A continuación se detallan los avances del programa

1. Diagnóstico satelital

   Durante el año 2025, se diagnosticaron **8.367 km** mediante los lotes N°6 y N°7, alcanzándose en el año la pre-localización de la totalidad de la red de AySA con un acumulado de 29.605 km a lo largo todo el contrato. Los lotes mencionados abarcaron las siguientes áreas geográficas:

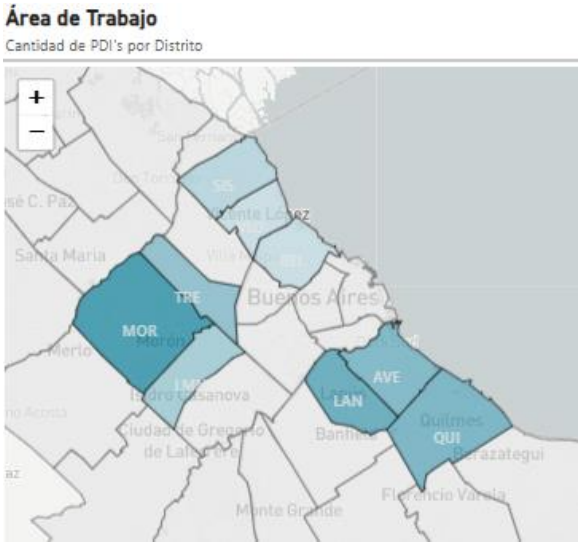

Diagnósticos Satelitales


OC 74204

Lote	Distritos	PDI's	Km Red
7	Avellaneda, La Matanza Norte, Lanus, Quilmes	388	4.000,56
6	Belgrano, Moron, San Isidro, Tres De Febrero, Vicente Lopez	772	4.367,27
5	Escobar, Jose C Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Pilar, San Fernando, San Martin, San Miguel, Tigre	65	
4	Esteban Echeverria, Ezeiza, La Matanza Oeste, Moron, Tres De Febrero		
3	Caballito, Centro, Devoto, Flores, La Matanza Norte	2	
2	Almte Brown, Constitucion, La Matanza Sur, Lomas De Zamora, Presidente Peron		
1	Avellaneda, Florencio Varela, Lanus, Quilmes	1	

Del total de longitud diagnosticada en el año, se identificaron **10% de la red con rumor de fuga positivo**.


2. Investigación con Geofonía en puntos de interés (PDI)

De los sectores con rumor de fuga positiva, se inspeccionó con geofonía de **725 km** detectándose **4.357 hallazgos**, es decir **6,0 fugas/km**. Estas fugas localizadas se pueden caracterizar según el tipo de fugas y la ubicación de las mismas.

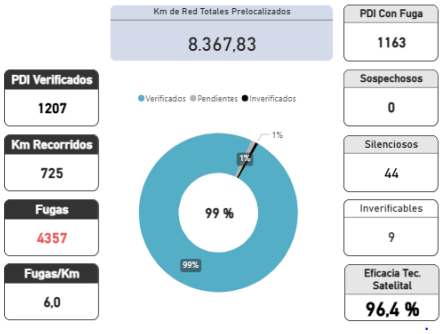

La distribución en función del tipo de fugas detectada muestra que la mayor proporción se correspondió con fugas semivisibles que representa el 91,5% del total. El resto se reparte entre fugas invisibles 3,7%, fugas visibles 0,5% y goteos 4,3%.

En relación a la ubicación de la fuga, el 99% se localizó en conexiones, 0,5% en artefactos sobre cañería y 0,2% se localizó en el tramo de conexión correspondiente al usuario.

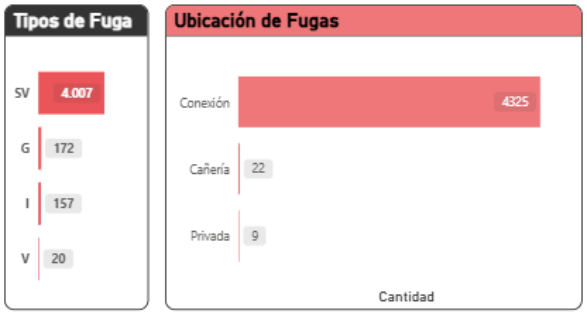

3. Reparación de fugas - conexiones y artefactos

Durante el año 2025 se realizaron **6482 reparaciones** que significo una optimización de 32.857 m^3/d. El número de posiciones reparadas fueron mayores a los detectados productos del Lote N°6 y N°7 ya que se completaron reparaciones pendientes de lotes anteriores.

1.7.3.3.4.2. Programa de localización de fugas con sensores de ruido permanente

Durante el año 2025 se llevó a cabo el piloto de una tecnología de detección temprana de fugas en las siguientes DMA de la Región Oeste, LMN-DMA003, LMN-DMA004 y LMN-DMA005 en La Matanza Norte y TRE-DMA003 y TRE-DMA004 en Tres de Febrero.






Las actividades principales incluyeron:

- Instalación de equipos: Se colocaron un total de **140 sensores** acústicos PERMANET mediante fijación magnética en válvulas e hidrantes de la red. Estos sensores tienen un rango de detección de unos 100 metros.







- Monitoreo continuo: Los sensores registran ruidos y transmiten la información diariamente a las 03:00 hs a la plataforma HWM-Permanet Web, donde se clasifican los equipos por estado: Automático (normal), Sin Transmisión o En Fuga.



- Metodología de verificación: Cuando se detecta un rumor de fuga positivo, se coordina con el equipo operativo (RANC Regional) para realizar una inspección en campo, confirmar la fuga y generar la orden de reparación correspondiente.



Matanza Norte



Tres de Febrero

- Establecimiento de Línea Base: Se midieron las pérdidas físicas iniciales en sectores específicos (DMA) para evaluar el impacto real de los sensores en la reducción de agua no contabilizada.

Los resultados globales del piloto fueron los siguientes:

Indicador	Resultado
Sensores con rumor de fuga detectado	51
Fugas confirmadas	25
Fugas desestimadas	7
Pendientes de diagnóstico	19
Total fugas reparadas	**40** (38 en conexión, 2 en cañería)
Volumen total de fuga evitada	**94.700 m³**

A nivel impacto en la Red, se observó una disminución mensual en el indicador de pérdida física por kilómetro en las áreas monitoreadas, validando la eficacia de la tecnología para detectar fugas invisibles y semivisibles, reduciendo el tiempo de detección y el volumen fugado.

1.7.3.3.4.3. Programa de localización de fugas con gas trazador helio

Durante el año 2025, se ejecutó un piloto de localización de fugas mediante gas trazador (HE-TRACER), enfocado en la detección de pérdidas en cañerías de distribución y de transporte (OC79504).

En esta tecnología el proceso de detección se basa en el fenómeno físico de desorción, que ocurre cuando existe un punto de fuga en la red. En esas ubicaciones, el helio se libera del agua y migra hacia la superficie, permaneciendo impregnado en el terreno circundante entre 4 y 5 días. Esta ventana temporal permite realizar una búsqueda sistemática y efectiva utilizando un equipo móvil de detección. La identificación de fugas se realiza mediante un equipo móvil de detección altamente especializado. Este equipo integra múltiples componentes de muestreo y análisis, incluyendo un espectrómetro de masa de helio de alta sensibilidad.



Equipo He Tracer para detección de Gas Helio (Espectrómetro de masas)

Además está diseñado para obtener muestras purificadas del aire presente en el subsuelo, permitiendo la detección inequívoca de concentraciones de helio que superan los umbrales preestablecidos, los cuales están calibrados específicamente para eliminar falsos positivos causados por el contenido natural de helio en el aire atmosférico.

La metodología de detección se explica en el siguiente diagrama:


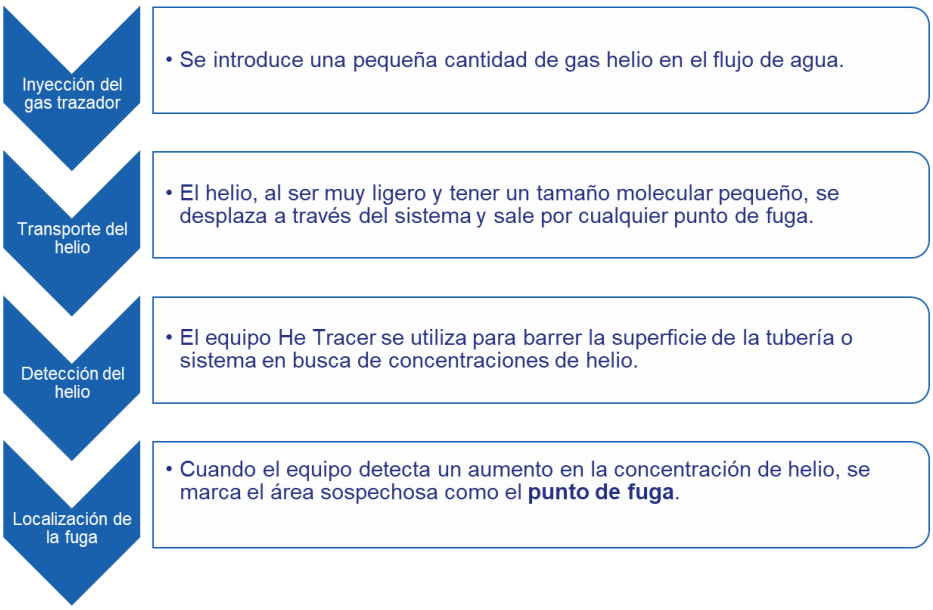


Diagrama Metodología de detección



Procedimiento de Inyección




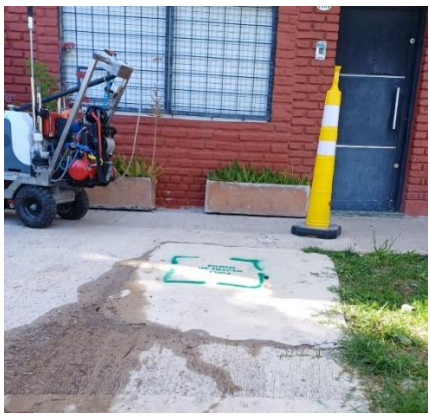


Procedimiento de Detección / Señalización de fuga detectada

Para el desarrollo del Piloto sobre redes de distribución se seleccionaron dos DMA actualmente en monitoreo, TRE-DMA011A y la LAN-DMA024 – abarcando 10 km inspeccionados por DMA:



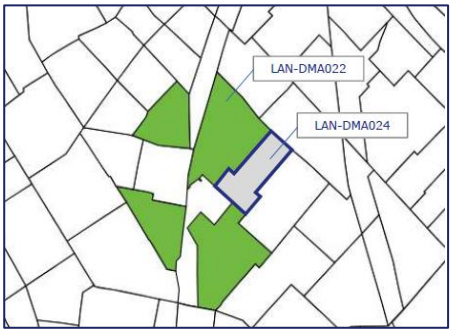

A su vez, para el Piloto en redes de transporte se seleccionó el tramo entre EE Villa Adelina y San Fernando (SISQP01):

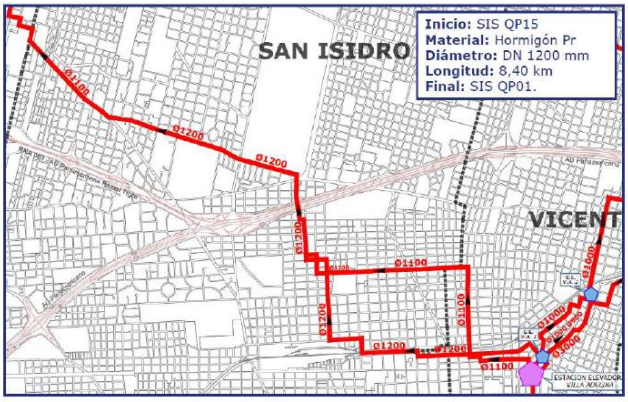




La longitud a inspeccionar en dicho piloto fue de 8,4 kilómetros

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las diferentes Pruebas Piloto, tanto en redes de distribución como en la red de transporte.


- Prueba piloto He Tracer para detección de fugas en redes de Distribución
  - LAN-DMA024

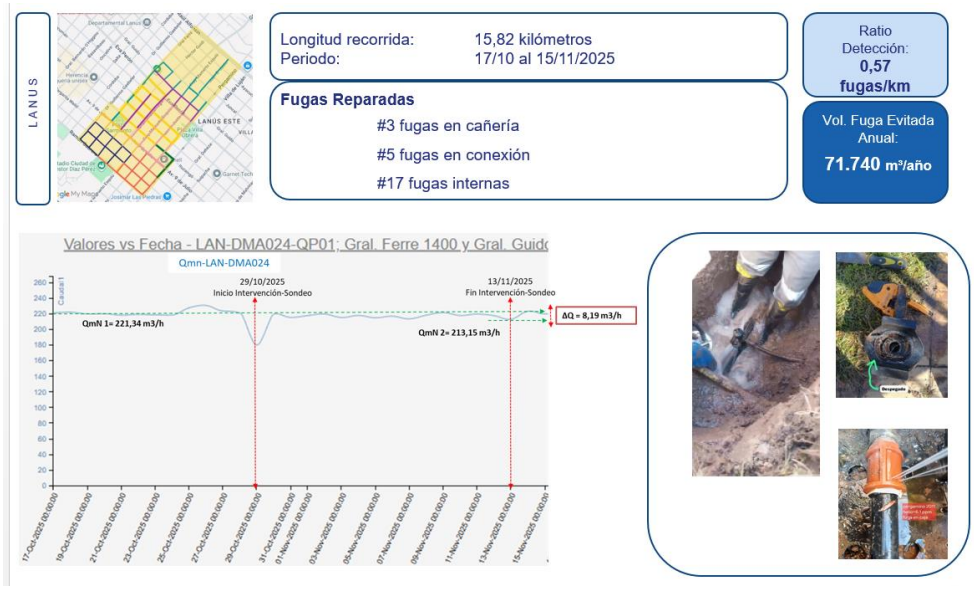

  - TRE-DMA011A



- Prueba piloto He Tracer para detección de fugas en redes de transporte Villa Adelina – San Fernando

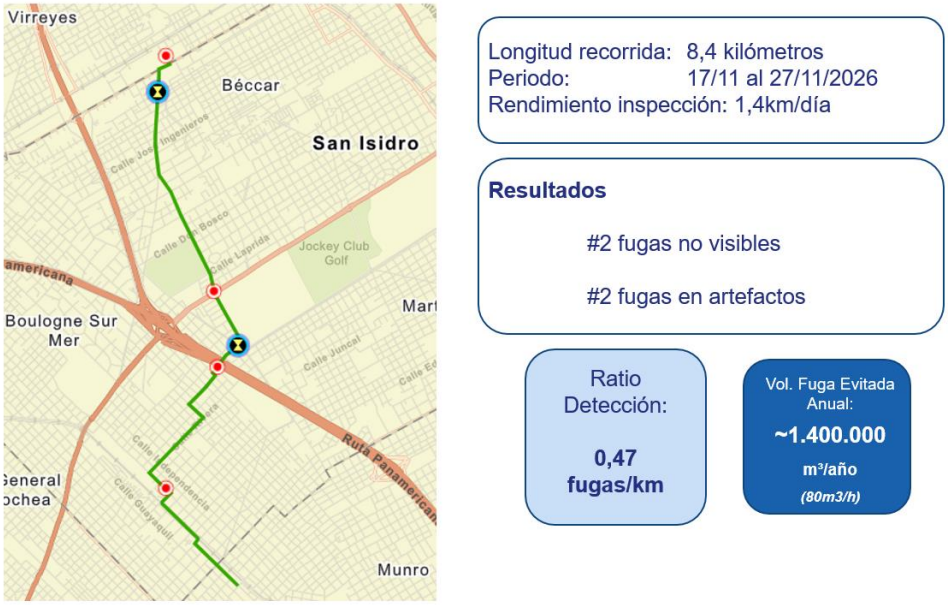

En la imagen siguiente se detallan las 4 fugas detectadas. Dos fugas verificadas corresponden a: (i) una fuga visible con salida de agua desde una cámara de desagüe (22 ppm de helio), y (ii) una fuga en el vástago de una válvula de aire (10 ppm de helio). Ambos casos confirman la capacidad del método para identificar puntos de pérdida en condiciones operativas reales de redes de transporte. Las 2 fugas no visibles se han programado para verificar en el inicio del año 2026.



1.7.3.4. Gestión de Activos

El Plan está directamente relacionado con las obras de Mejora y Mantenimiento tanto en redes como en conexiones y elementos de maniobras (renovación, instalación y rehabilitación). Tiene como objetivo mantener o, en el caso que lo requiera, mejorar los niveles de servicio actuales desde el punto de vista de continuidad, caudal y presión/niveles mediante la ejecución de trabajos u obras sobre instalaciones existentes.

A partir de la entrada en vigencia del Plan de Transición, la mayor parte de los esfuerzos estuvieron puestos en gestión, regulación y medición, en tanto que la renovación de redes, la renovación de conexiones y la rehabilitación estructural tuvieron menor protagonismo. Dado que las pérdidas reales continúan en 35,7% y 84 m³/km/día, alcanzar metas de reducción implica que esta situación se reviertan en años siguientes.

A continuación, se detallan los trabajos principales del Plan de Mejora y Mantenimiento en redes de distribución de agua ejecutados en el año 2025.

Durante el año 2025 se rehabilitaron **27.505 metros** distribuidos de la siguiente manera:

1.7.3.4.1. Rehabilitación con limpieza desincrustante redes de agua de hierro fundido

La técnica de rehabilitación mediante “desincrustación hidrocinética o mecánica” tiene como objetivo fundamental la limpieza desincrustante de las cañerías y la recuperación de la sección original del caño.

Dentro del plan de obras de rehabilitación, han sido considerados los siguientes aspectos:

- ✓ Análisis del estado estructural del caño en diferentes puntos del tramo a rehabilitar (análisis preliminar de muestras de caño).
- ✓ Identificación de zonas donde es necesario combinar la desincrustación con la renovación de cañerías fundamentalmente cuando el diámetro existente resulte insuficiente.
- ✓ Renovación de todas las piezas especiales (ramales, reducciones, curvas, etc) y válvulas existentes en el tramo. Se ha comprobado que la eficiencia de la técnica es notablemente mayor en aquellos casos en que se ha acompañado la desincrustación con la renovación de piezas.
- ✓ Lavado mediante el uso de equipos que permitan dar mayor eficiencia al proceso. En su defecto, los tiempos de operación en el terreno se extienden fuera de los plazos esperados, se dificulta lograr valores de turbiedad y cloro dentro de norma y por ende se dificulta el proceso de habilitación del servicio.

Total Rehabilitación mecánica con limpieza desincrustante: **25.535** metros.

A continuación se presenta la distribución de los trabajos por Distrito:

Etiquetas de fila	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Octubre	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre	Total general
DRCF	970		180	950	1575	2332	750	679	2200	1810	425		11871
Flores	520			600				379					1499
Centro Constitucion	450		180										630
Caballito						1187			760	784			2731
CECO				350	220	1145							1715
Fores					1355								1355
CE-CO							750	300	1440	1026	425		3941
DRN			790		130		1295	1295	550	910		595	5565
Tigre								1295	550	910			2755
Vicente Lopez							370						370
San Isidro			790		130		435						1355
San Martín							490					595	1085
(en blanco)													
DRSE	895	970		860		135	910	996	150	230	1498		6644
Quilmes	895	970		860				336			1498		4559
Avellaneda						135	910	565	150	230			1990
Total general	1865	970	1215	2260	1705	2527	2955	2970	2900	2950	2233	985	25535

1.7.3.4.2. Rehabilitación con revestimiento con resina poliurea

El Programa complementa la rehabilitación mecánica actual con el método de recubrimiento mediante resina poliurea lo cual aumenta la vida útil de las cañerías a niveles similares de las cañerías nuevas, evita desprendimientos y turbiedad post rehabilitación y lo más importante y significativo anula la re-incrustación.



Total Rehabilitación con resina: **1.970 metros**

Se realizaron 152,70 metros con un espesor de resina de 1.6mm para otorgar pasividad a la corrosión, y 1817,30 metros se le aplico un espesor de 2.1mm para otorgar resistencia estructural a la conducción.

La rehabilitación fue llevada a cabo en las localidades de Ciudadela (distrito Tres de Febrero) y en el barrio de Barracas (distrito Centro-Constitución) cubriendo 1026,50 y 943,50 metros respectivamente. Durante el año 2025 se rehabilitaron 1.970 metros (OC 70417) distribuidos de la siguiente manera:

TRAMOS REHABILITADOS - ENERO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-302	OMBÚ	MAGALLANES Y BOQUERÓN	21/1/2025	2,1	100	90,20
2	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-301	OMBÚ	RUCCI Y MAGALLANES	23/1/2025	2,1	100	70,10
3	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-300	OMBÚ	E. BELLACO Y RUCCI	28/1/2025	2,1	100	100,70
4	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-299	OMBÚ	OMBÚ 3685 hasta E. BELLACO	30/1/2025	2,1	100	84,00
5	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-305	E. BELLACO	PAMPA Y PERÍN	4/2/2025	2,1	100	98,10
							TOTAL		443,10
TRAMOS REHABILITADOS - FEBRERO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-303	BELLACO	PAMPA Y PERÍN	13/2/2025	2,1	100	119,10
2	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-305 B	BELLACO	OMBÚ Y CUEVAS	14/2/2025	2,1	100	12,00
3	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-304	BELLACO	PAMPA Y OMBÚ	20/2/2025	2,1	100	98,60
							TOTAL		229,70
TRAMOS REHABILITADOS - MARZO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-306	CONSTANCIA	PAMPA Y PERÍN	18/3/2025	2,1	100	122,00
2	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-308	CONSTANCIA	CUEVAS Y OMBÚ	20/3/2025	2,1	100	114,00
3	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-307	CONSTANCIA	OMBÚ Y PAMPA	26/3/2025	2,1	100	118,00
							TOTAL		354,00
TRAMOS REHABILITADOS - ABRIL 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	103044	CECO	TR-309	I. LA CATOLICA	CERRI Y AV. IRIARTE	29/4/2025	2,1	100	77,60
2	103044	CECO	TR-310	AV. IRIARTE	I. LA CATOLICA Y JOVELLANOS	8/5/2025	2,1	100	83,20
							TOTAL		160,80
TRAMOS REHABILITADOS - MAYO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	103044	CECO	TR-311	JOVELLANOS	CERRI Y AV. IRIARTE	9/5/2025	2,1	100	75,30
2	103044	CECO	TR-312	JOVELLANOS	CERRI Y AV. IRIARTE	14/5/2025	2,1	100	78,70
3	103044	CECO	TR-313	AZARA	CERRI Y AV. IRIARTE	20/5/2025	1,6	100	48,10
4	103044	CECO	TR-314	AV. PATRICIOS	CERRI Y AV. IRIARTE	22/5/2025	2,1	100	79,80
5	103044	CECO	TR-315	AV. MONTES DE OCA	CERRI Y AV. IRIARTE	28/5/2025	2,1	100	79,80
							TOTAL		361,70
TRAMOS REHABILITADOS - JUNIO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	103044	CECO	TR-316	CERRI	I. LA CATOLICA Y AV. MONTES DE OCA	5/6/2025	2,1	125	93,40
2	103044	CECO	TR-317	CERRI	JOVELLANOS E I. LA CATOLICA	10/6/2025	1,6	125	104,60
3	103044	CECO	TR-318	CERRI	AZARA Y JOVELLANOS	18/6/2025	2,1	125	98,50
4	103044	CECO	TR-319	CERRI	AV. PATRICIOS Y AZARA	24/6/2025	2,1	125	124,50
							TOTAL		421,00
					TOTAL METROS REHABILITADOS AÑO 2025:				1.970,30

En todos los casos se logró el objetivo de reducción de reclamos tal como se muestra en las siguientes gráficas.


a) Distrito Tres de febrero - Mallas 002 y 006.

Variación de reclamos para el período marzo-abril-mayo. Año 2024 (pre desincrustación) vs. Año 2025 (post desincrustación y rehabilitación con aplicación de resina).



b) Distrito Centro-Constitución - Malla 103044

Variación de reclamos para el período julio a diciembre. Año 2024 (pre desincrustación) vs. Año 2025 (post desincrustación y rehabilitación con aplicación de resina).

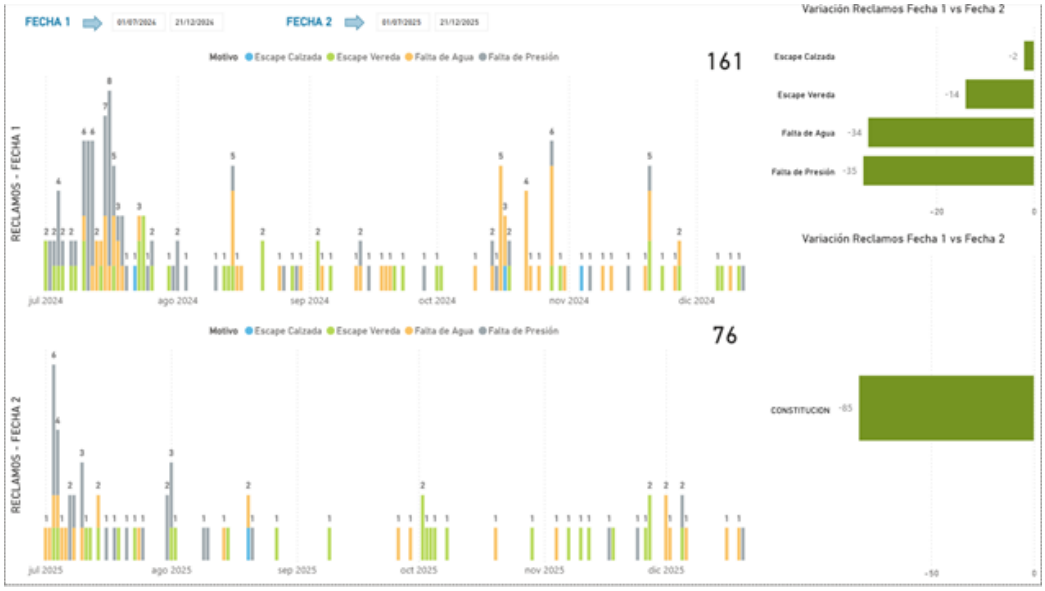

1.7.3.4.3. Renovación Estructural de Redes Distribuidoras

A lo largo del año 2025 se reiniciaron trabajos en obras de sectorización que habían sido paralizadas. No obstante no llegaron a concluirse en el año por lo que no tuvieron impacto en la reducción de fugas.

1.7.3.5. Conclusiones generales

Durante el año 2025 se continuó avanzando en la implementación de diversas acciones orientadas a mejorar la eficiencia hidráulica y comercial del sistema, incluyendo trabajos de gestión de presiones, optimización de bombeos, fortalecimiento de la macromedición, ampliación de la medición comercial y actualización de la información utilizada para la elaboración del Balance de Agua.

Las acciones desarrolladas permitieron generar avances relevantes en materia de conocimiento del sistema, capacidad de regulación operativa y confiabilidad de la información disponible para la toma de decisiones. En particular, se consolidaron herramientas de gestión que permiten adecuar con mayor precisión la oferta de agua a las condiciones reales de demanda, fortalecer el control operacional y mejorar la identificación de oportunidades de reducción de pérdidas.

En este marco, durante el año 2025 se registraron avances en los distintos ejes estratégicos del Plan de Agua No Contabilizada, entre los que se destacan:

- Confiabilización del Agua Bombeada mediante programas de mantenimiento y verificación metrológica (incertidumbre ±0,5%).
- Confiabilización de la demanda de agua en sectores UREM.
- Incorporación de nuevas tecnologías de prelocalización de fugas.
- Implementación de herramientas de gestión remota de válvulas reguladoras.
- Desarrollo del Plan de Sectorización de Redes mediante metodología DMA.
- Gestión de activos orientada a la renovación de redes e infraestructura asociada.

No obstante, los resultados obtenidos en los indicadores globales del Balance de Agua muestran que los efectos de estas acciones aún no se reflejan plenamente en reducciones significativas de los niveles de Agua No Contabilizada y pérdidas reales del sistema. Esta situación responde tanto a la magnitud y complejidad de la infraestructura operada como al impacto que las mejoras metodológicas implementadas durante el período tuvieron sobre la cuantificación de las distintas componentes del Balance.

Asimismo, debe considerarse que durante el período las inversiones estructurales asociadas a renovación de redes, rehabilitación de infraestructura y expansión de programas de reducción de pérdidas se desarrollaron a un ritmo inferior al registrado históricamente, en el marco del proceso de transición atravesado por la empresa. En consecuencia, las acciones implementadas estuvieron orientadas prioritariamente a sostener la operación, fortalecer la capacidad de gestión y mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones.

En este contexto, los trabajos desarrollados durante 2025 deben interpretarse como una etapa de consolidación de capacidades técnicas, operativas y de control que constituyen condiciones necesarias para alcanzar mejoras sostenibles en los indicadores de eficiencia durante los próximos años. Los avances logrados establecen una base más robusta para la planificación y priorización de futuras intervenciones, aunque aún resultan insuficientes para generar cambios estructurales significativos en los indicadores globales del Balance de Agua.

La materialización de reducciones sostenidas en los niveles de pérdidas físicas y aparentes requerirá complementar los avances alcanzados con programas de inversión continuos en renovación de infraestructura, rehabilitación de redes, gestión de presiones, macromedición y micromedición, permitiendo transformar las mejoras en materia de información y gestión en resultados operativos verificables sobre la eficiencia global del sistema.

Finalmente, resulta fundamental optimizar el avance de ejes de acción integrados en el binomio oferta-demanda. Para ello se requiere profundizar en la implementación coordinada de acciones técnicas, operativas y comerciales que actúen de manera integrada sobre la oferta y la demanda de agua, tanto desde una perspectiva geográfica como temporal. La articulación entre los distintos programas de gestión permite maximizar el impacto de las inversiones y mejorar la eficiencia global del sistema.

En este sentido, constituye un objetivo estratégico que los avances alcanzados mediante el Plan de Medición Masivo no sólo mejoren la determinación y gestión de los consumos, sino que también se traduzcan en una reducción efectiva de la demanda global de agua o, alternativamente, en una liberación de capacidad operativa que permita abastecer sectores con demandas insatisfechas, sostener procesos de expansión del servicio o reducir requerimientos de producción y bombeo.

La integración de dichas acciones permitirá potenciar los beneficios individuales de cada programa, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos disponibles.



www.aysa.com.ar










INFORME DE NIVELES DE SERVICIO 2025

1.7 REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

Dirección de Ingeniería
Gerencia de Agua No Contabilizada
2026

ÍNDICE

1.7. Reducción de Agua No Contabilizada 3

1.7.1. INTRODUCCIÓN 3

1.7.2. BALANCE DE AGUA 3

1.7.2.1. ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DE VARIABLES DEL BALANCE DE AGUA 5

1.7.2.1.1. ACTUALIZACIÓN DATO "POBLACIÓN ABASTECIDA" 6

1.7.2.1.2. ACTUALIZACIÓN METODOLOGÍA "AGUA ENTREGADA A LA RED" 6

1.7.2.1.3. ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA "CONSUMOS UREM" 7

1.7.2.1.4. CONSIDERACIONES PARA LA COMPARACIÓN INTERANUAL 8

1.7.2.2. RESULTADOS 2025 9

1.7.2.2.1. DOTACIÓN DE AGUA 10

1.7.2.2.2. CONSUMO AUTORIZADO 11

1.7.2.2.3. ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANC) 12

1.7.2.2.4. PÉRDIDA APARENTE O COMERCIAL 13

1.7.2.2.5. PÉRDIDA REAL O FÍSICA 13

1.7.2.2.6. ÍNDICE CONFIABILIDAD DEL AGUA ENTREGADA O BOMBEADA A LA RED 14

1.7.2.3. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES COMPONENTES DEL BALANCE DE AGUA 15

1.7.2.3.1. AGUA ENTREGADA O BOMBEADA A LA RED 15

1.7.2.3.2. CONSUMO AUTORIZADO COMERCIALIZADO 27

1.7.2.3.3. CONSUMO AUTORIZADO NO COMERCIALIZADO 30

1.7.2.3.4. SUBMEDICIÓN METROLÓGICA – CONSUMOS NO AUTORIZADOS – INEXACTITUD EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CONSUMO 31

1.7.2.4. CONCLUSIONES DE GESTIÓN DEL BALANCE DE AGUA E INDICADORES 2025 33

1.7.3. PLAN DE ACCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA (ANC) – AVANCES 2025 33

1.7.3.1. GESTIÓN Y CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN 34

1.7.3.1.1. Programa de Macromedición Agua Entregada a la Red 34

1.7.3.1.2. Programa de Medición UREM (urbanizaciones residenciales emergentes) 36

1.7.3.1.3. Programa de Monitoreo de Presiones 39

1.7.3.2. Gestión y Control de las Presiones 40

1.7.3.3. Gestión y Control de las Pérdidas Físicas 42

1.7.3.3.1. Programa de sectorización de redes (DMA) 42

1.7.3.3.2. Gestión de las Pérdidas Aparentes dentro DMA 45

1.7.3.3.3. Innovación – Herramienta de Gestión inteligente para la detección temprana de fugas 47

1.7.3.3.4. Programa de búsqueda de fugas 51

1.7.3.3.4.1. Eliminación de Fugas en Redes de Agua mediante Prelocalización Satelital 51

1.7.3.3.4.2. Programa de localización de fugas con sensores de ruido permanente 53

1.7.3.3.4.3. Programa de localización de fugas con gas trazador helio 55

1.7.3.4. Gestión de Activos 60

1.7.3.4.1. Rehabilitación con limpieza desincrustante redes de agua de hierro fundido ... 60

1.7.3.4.2. Rehabilitación con revestimiento con resina poliurea 61

1.7.3.4.3. Renovación Estructural de Redes Distribuidoras 63

1.7.3.5. Conclusiones generales 63

1.7. REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

1.7.1. Introducción

La reducción del Agua no Contabilizada y particularmente del Agua No Comercializada genera incrementos en los ingresos de la compañía, reducción de costos operativos, mejora en la prestación del servicio y/o potencialmente posibilita abastecer a nuevos usuarios sin necesidad de realizar inversiones en nuevas plantas potabilizadoras ni de esforzar los recursos hídricos.


Para establecer metas de reducción, se requiere contar con un balance fiable y preciso que sea la herramienta para identificar donde y cuando actuar en el sistema (estructural o hidráulicamente) y que permita mensurar efectivamente el impacto de las acciones a ejecutar.

Siguiendo entonces el esquema del Balance, se han identificado estrategias de origen técnico y/o comercial que involucran el accionar de distintas áreas de la empresa con misiones y funciones específicas.

A continuación, se detallarán aspectos relacionados con el Balance de Agua y el Plan de Agua No Contabilizada enfocados principalmente a las “Estrategias Técnicas” que involucran el Agua Entregada a la Red y la Pérdida Física o Real.

1.7.2. Balance de Agua

El modelo conceptual del Balance Hídrico (ver Figura) adoptado por AySA se corresponde con el propuesto por la AWWA[1] y la IWA[2] el cual esquematiza los volúmenes de agua suministrados, los volúmenes de agua entregados a los usuarios y los volúmenes de agua perdidos, ya sea en forma real o aparente, durante un intervalo de tiempo. Para evitar el impacto de eventos puntuales se utiliza como intervalo de análisis el valor anual.

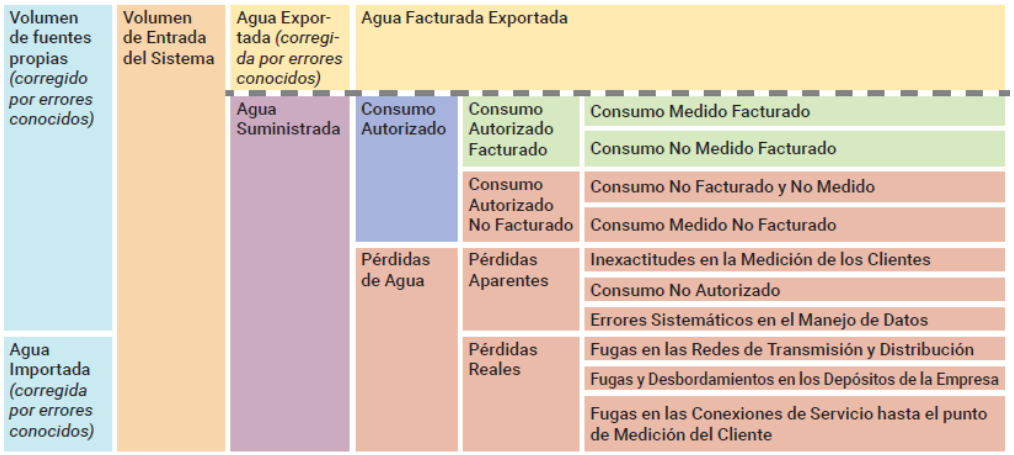

Hipótesis de cálculo:

- El balance presentado detalla las etapas del proceso desde que el agua se libera a la red de transporte y distribución – agua bombeada a la red- hasta el consumo de los usuarios.
- Los volúmenes de agua -ya sea de entrada como de salida- que no pueden ser medidos son estimados mediante métodos estadísticos.

[1] American Water Works Association

[2] International Water Association

- El período de análisis es anual.
- El balance se calcula para AySA global, divisiones regionales y distritos.
- El modelo de balance agua, sus resultados y el plan de acción de reducción de pérdidas corresponde a AySA total, incluyendo los partidos de AySA original año 2015 y los Nuevos Partidos incorporados a partir del año 2016.

Datos de entrada al Modelo:

- **Volumen de entrada al sistema**: es el volumen anual de agua tratada bombeado e introducido al sistema de distribución de agua potable, medido o estimado a las salidas de las Estaciones Elevadoras, Impelentes y Pozos, expresado en m^3/d.
- **Volumen de agua entregada a la red**: es el volumen anual de agua tratada que se bombea al sistema de distribución de agua al por menor. Es igual al volumen de entrada al sistema menos el volumen de agua exportada o de venta de agua en bloque, expresado en m^3/d.
- **Volumen de venta de agua en bloque**: es el volumen anual de agua a granel transportada y vendida por la empresa a los sistemas de agua fuera de su área de servicio y que cuentan con un sistema de distribución propio (redes) que no se encuentra bajo la operación y mantenimiento de AySA, expresado en m^3/d.
- **Consumo Autorizado Comercializado Medido:** Es el volumen anual de agua que se obtiene de sumar todos los consumos medidos de usuarios registrados que son facturados. Se obtiene del sistema de facturación de la empresa. Incluye el consumo de todos los grupos de clientes, como los domésticos, comerciales, industriales, estatales y sociales. No incluye el agua exportada o venta en bloque que se mide y se factura, éstas últimas deben ser restadas para no duplicarlas ni en el agua contabilizada ni en el agua comercializada.
- **Consumo Autorizado Comercializado No Medido:** Es el volumen anual de agua consumido por usuarios registrados no medidos que se calcula a través de una serie de regresiones lineales teniendo en cuenta diversos factores, según sea el tipo de usuario. En el cálculo se contempla la submedición metrológica por distrito y categoría. El dato es proporcionado por la Dirección Comercial.
- **Consumo Autorizado No Comercializado:** Este volumen de agua comprende el agua que está autorizado de consumir por parte de la empresa, pero que por distintas razones no es comercializado. Este segmento incluye:
    - Usos operativos propios en la red de agua y cloaca, tales como, limpieza de cañerías en servicio, agua utilizada para el lavado de nuevas cañerías, otros.
    - Usos operativos propios para el llenado de camiones cisternas al servicio de AySA.
    - Uso de agua en hidrantes por parte de Bomberos.
    - Agua proporcionada a las instituciones cívicas sin comercializar
    - Uso de agua en el espacio público, tales como el uso de agua para camiones regadores, regado de plazas, limpiezas varias
    - Consumo de agua de urbanizaciones emergentes dentro del radio servido de AySA que no son facturados.
- **Consumo No Autorizado:** Agua tomada del sistema de distribución sin la autorización de la empresa de AySA. El consumo no autorizado es uno de los componentes de las pérdidas aparentes. Puede incluir:
    - Agua extraída (sin autorización) de los hidrantes.
    - Conexiones ilegales o clandestinas
    - Fraudes, tales como derivaciones a los medidores de los usuarios (by-pass), manipulación del equipo de lectura del medidor, o acciones similares.
- **Inexactitud en la Medición de Consumo de los Usuarios o Submedición Metrológica:** son las pérdidas de agua causadas por el submedición de los medidores de agua de los clientes. Es decir, es el volumen de agua que representa el error de medición del consumo entendido como la diferencia entre el valor real consumido y el medido por el contador. Depende de los siguientes factores: características del medidor, caudal al que se realiza la medición, estado del medidor, tipo de instalación interna del usuario, tipo de consumidor, presiones de servicio, entre otras.
- **Error sistemático en la gestión de datos de consumo**: es el volumen que representa el error en el valor de consumo autorizado por inexactitudes en la gestión de los datos. En general se

producen por: uso inadecuado de consumos estimados, determinación inadecuada de los consumos estimados, cuentas de consumidores identificadas con variación de destino, cuentas de consumidores perdidas en la base de datos, datos de medición inexactos, cambios en los datos de volumen de consumo cuando las facturas se ajustan por cualquier motivo que no sea una lectura incorrecta.

- **Población abastecida:** es la totalidad de población que efectivamente es abastecida con agua potable producida, transportada y distribuida por la empresa (excluye la población asociada a agua en bloque). Se expresa en habitantes abastecidos o unidad funcional abastecida.
- **Longitud de cañerías:** es la longitud de todas las cañerías (excepto las conexiones de servicio) en el sistema a partir del punto de medición de entrada al sistema o agua suministrada.
- **Número de conexiones**: es la cantidad total de conexiones. Este número puede diferir del número de usuarios o expedientes (no incluye las conexiones de hidrantes) por la multiplicidad de conexión.

Datos de salida del Modelo:

- **Consumo Autorizado:** es el volumen anual que la empresa autoriza a consumir y se compone del volumen de agua que consumen los usuarios registrados -con medidor o sin medidor- y los consumos autorizados no comercializados.
- **Agua No Contabilizada (ANC) o Pérdidas de Agua:** Es la suma de las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. Este valor también puede obtenerse calculando la diferencia entre el volumen de entrada al sistema y el consumo autorizado.
- **Pérdida Comercial o Aparente:** este tipo de pérdidas representa el agua que es consumida pero no es correctamente contabilizada y, en consecuencia, no es facturada o comercializada. Se compone de:
  - Consumo No autorizado
  - Error sistemático en el manejo de datos generados por el sistema de lectura o facturación
  - Inexactitudes en la medición del cliente
- **Pérdida Física o Real:** Es el volumen anual perdidos por todo tipo de fugas (visibles, invisibles o semivisibles) en cañerías o artefactos de la red, depósitos de distribución administrados por la empresa y conexiones de servicio hasta el punto de medición del cliente o línea municipal.
- **Agua Comercializada:** representa la porción del Volumen de Entrada del Sistema que se comercializa. Se compone del consumo autorizado comercializado medido y no medido, y de la venta de agua en bloque.
- **Agua No Comercializada:** representa la porción de agua que no es comercializada y no genera utilidades para la empresa. Se calcula como la diferencia entre el volumen de agua entregada a la red y el Agua Comercializada.
- **Dotación de agua:** es la cantidad de agua entregada a diario a la red de distribución por cada habitante abastecido en el área de servicio. Contempla todos los consumos autorizados, las pérdidas reales (físicas) y las pérdidas aparentes (comerciales) que existen en el sistema de distribución.

1.7.2.1. Actualización metodológica de variables del Balance de Agua

Durante el año 2025 se implementaron actualizaciones metodológicas en algunas de las principales variables utilizadas para la elaboración del Balance de Agua. Estas modificaciones tuvieron como objetivo incrementar la confiabilidad y representatividad de la información empleada en el cálculo de los indicadores de gestión, incorporando nuevas fuentes de información, mejoras en los procesos de medición y actualización de las bases de referencia utilizadas.

Dado que estas variables constituyen insumos fundamentales para la determinación de indicadores tales como la Dotación de Agua, el Agua No Contabilizada, las Pérdidas Reales y las Pérdidas Aparentes, los cambios implementados fueron considerados también en la revisión y recálculo de los valores comparativos correspondientes al año 2024, a fin de asegurar la consistencia metodológica y la comparabilidad interanual de los resultados.

A continuación, se describen las principales actualizaciones realizadas.

1.7.2.1.1. Actualización dato “población abastecida”

La determinación de la población abastecida fue actualizada durante el año 2025, a partir de la disponibilidad de la información censal más reciente.

Hasta el año 2024, la estimación se sustentaba principalmente en las proyecciones demográficas derivadas del Censo Nacional 2001 y 2010, respectivamente, y en la incorporación de población asociada a la expansión del área servida mediante herramientas GIS AySA. A partir de la publicación de los resultados definitivos del Censo Nacional 2022 y de las proyecciones oficiales del INDEC para el período 2022-2035, se adoptó una nueva proyección basada en:

Fuente de información:

- Población por radio censal correspondiente al Censo 2022, incorporada al Sistema GIS mediante los archivos shapefile publicados por el INDEC.
- Coeficientes de crecimiento interanual por municipio elaborados por AySA a partir de las proyecciones oficiales del INDEC (2022-2035) y ajustes específicos de la empresa.

Metodología de cálculo:

- Identificación de los radios censales efectivamente abastecidos al año 2025.
- Obtención de la población censal 2022 correspondiente a dichos radios.
- Proyección de la población abastecida al año de análisis mediante la aplicación de los coeficientes de crecimiento adoptados para cada municipio.

Con el propósito de mantener la consistencia temporal del indicador, la población abastecida correspondiente al año 2024 también fue recalculada bajo estas premisas:

Concepto	Unidad	Valor original IA2024	Valor Recalculado 2024
Población Residente Abastecida Agua 2024	[habitantes]	11.473.228	**10.693.032**

1.7.2.1.2. Actualización metodología “agua entregada a la red”

El volumen de agua entregada a la red, también denominado agua bombeada o despachada a la red, se determina como la sumatoria de los caudales de agua introducidos al sistema de distribución desde estaciones elevadoras, estaciones impelentes y pozos de producción, considerando tanto valores medidos como estimados.

El ajuste que se detalla a continuación alcanza solo al agua de origen subterráneo.

Hasta el año 2023 inclusive, el aporte de agua de dicho origen se calculaba como la sumatoria de caudales de producción estimada individualmente para cada pozo, utilizando como variables de referencia las horas de funcionamiento y el consumo energético registrado. Esta metodología presentaba limitaciones asociadas a la incertidumbre propia de las estimaciones y no contemplaba eventuales rechazos en instalaciones de tratamiento, ni pérdidas entre la extracción y la incorporación efectiva del caudal a la red de distribución.

Durante el año 2024, la Dirección de Agua llevó adelante un proceso de revisión metodológica orientado a incrementar la confiabilidad de este componente, estructurado en dos líneas de acción principales:

- Incorporación de mediciones existentes en puntos de convergencia de pozos, tales como rebombeos, baterías de pozos, centros de mezcla, plantas de ósmosis inversa y otras instalaciones con medición continua.


- Implementación de un programa sistemático de medición y verificación de pozos y puntos de convergencia.

Como resultado, a partir del año 2025 el volumen de agua de origen subterráneo entregada a la red se determina mediante una metodología combinada que integra información proveniente de estimación de pozos no medidos, mediciones en puntos de convergencia y mediciones directas mediante caudalímetros instalados en pozos individuales.

A efectos comparativos, el valor correspondiente al año 2024 fue recalculado bajo los mismos criterios metodológicos, obteniéndose los siguientes resultados:

Concepto	Unidad	Valor original IA2024	Valor Recalculado 2024
Agua subterránea 2024	[m³/día]	1.094.613	**1.042.722**
Agua entregada a la red 2024	[m³/día]	6.092.725	**6.040.834**

A modo gráfico, en el siguiente esquema, se observa el balance original publicado en el Informe Anual 2024 y el mismo balance incorporando el valor recalculado de agua subterránea 2024.

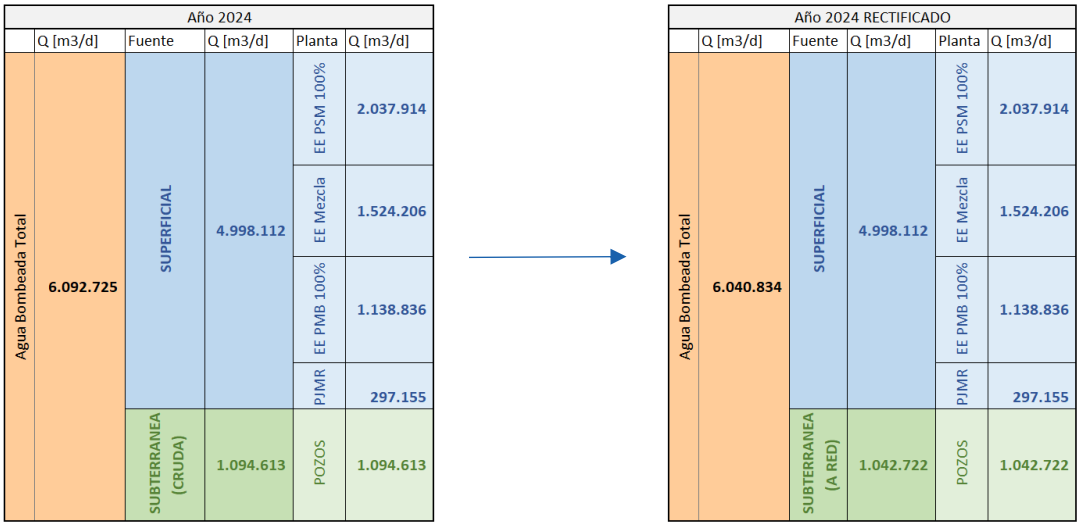

La aplicación de la nueva metodología permite obtener una estimación más representativa del volumen efectivamente incorporado al sistema de distribución, reduciendo la incertidumbre asociada al cálculo del indicador de dotación.

1.7.2.1.3. Actualización metodológica “Consumos UREM”

Durante el año 2024, se inició un proceso de confiabilización y actualización del Consumo de agua de las UREM (Urbanizaciones Residenciales Emergentes). Para ello, se desarrollaron trabajos de gabinete y de campo para medir el agua entregada en dichos sectores. Ello permitió conocer el caudal entregado en zonas emblemáticas como la Villa 31, Villa 21-24 y Villa Inflamable, entre otras. Los resultados obtenidos permitieron, además de actualizar los valores de dotación de agua de dichas UREM, redefinir los criterios de asignación de consumo al resto de las urbanizaciones. Asimismo, en el balance de agua año 2024, los volúmenes de agua de UREM dentro de radio servido abastecidos efectivamente desde la red de AySA fueron asignados a Consumos Autorizados Comercializados Medidos o No Medidos según su situación particular respecto de la medición.

El proceso de confiabilización del Consumo de UREM ubicadas dentro de radio servido y que se abastecen con agua proveniente del sistema de distribución de AySA se mantuvo durante el año 2025. Al cierre del año, contemplando avances de mesas de trabajo realizadas entre el ERAS y AySA y considerando resultados de trabajos de gabinete y campo obtenidos a lo largo del año, se definió hacer una reasignación en la segmentación de este universo en función de la posibilidad real de comercializar el consumo, a saber:

- El volumen asignado a consumo (medido o no medido) de aquellos barrios cuya facturación es reclamable se considera → **Consumo comercializado**
- El resto, que por diferentes motivos se encuentran en proceso de regularización comercial (ya sea medido o no medido) se considera → **Consumo autorizado no comercializado**

Por otra parte, como resultado del análisis del padrón de Barrios UREM, se detectaron barrios con datos demográficos inconsistentes con lo relevado en campo, especialmente en asentamientos. Ante esto, se seleccionaron los barrios con más de 10 habitantes por vivienda para ajustar sus cifras de población y unidades funcionales. En total, se actualizaron 125 urbanizaciones emergentes utilizando fuentes oficiales: prioritariamente el RENABAP (actualización 2022) y, en su defecto Censo 2022 (en casos de coincidencia total con el radio censal). Finalmente, la información se cotejó con la base comercial de AySA para validar la cantidad de viviendas.

A efectos comparativos, el valor correspondiente al año 2024 fue recalculado bajo los criterios metodológicos mencionados previamente, obteniéndose lo siguientes resultados:

Concepto	Unidad	Valor original IA2024	Valor actualizado 2024
Consumo Comercializado Medido UREM	[m^3/d]	59.081	**31.315**
Consumo Comercializado No Medido UREM	[m^3/d]	679.148	**151.985**
Consumo Autorizado No Comercializado UREM	[m^3/d]	40.821	**570.142**

El ajuste mencionado impacta en el cálculo de indicadores tales como %agua no comercializada, consumo autorizado comercializado y consumo autorizado no comercializado.

1.7.2.1.4. Consideraciones para la comparación interanual

Los indicadores derivados del Balance de Agua están sujetos al grado de confiabilidad de las variables que lo integran. En este sentido, durante los últimos años, AySA ha desarrollado distintas acciones orientadas a mejorar la calidad de la información base del modelo, algunas de las cuales ya han sido mencionadas en el punto anterior pero también se llevó a cabo confiabilización del dato relacionado con el consumo, tales como: la actualización del padrón y de consumos asociados a Urbanizaciones Residenciales Emergentes (UREM) y la revisión de los coeficientes de submedición comercial.

Estas mejoras metodológicas producen una redistribución de los volúmenes dentro del Balance de Agua, modificando la participación relativa de sus distintas componentes. Por tal motivo, las variaciones observadas en los indicadores de Agua No Contabilizada, Agua No Comercializada y Pérdidas no deben interpretarse exclusivamente como consecuencia de cambios en el desempeño físico de la infraestructura o en la gestión operativa del sistema, sino también como resultado del proceso continuo de confiabilización de la información utilizada para su determinación.

En consecuencia, la evaluación de tendencias y el análisis de resultados deben realizarse considerando simultáneamente la evolución de las variables operativas, los indicadores de desempeño de la red y las modificaciones metodológicas implementadas en cada período, a fin de asegurar una interpretación técnicamente consistente de los resultados obtenidos.

Las actualizaciones metodológicas descriptas fueron aplicadas tanto a los resultados correspondientes al año 2025 como al recálculo de los valores de referencia del año 2024. De esta forma, los análisis de evolución interanual que se presentan a continuación se realizan sobre bases metodológicas homogéneas y comparables.

Para garantizar la comparabilidad de la información, los valores 2024 fueron recalculados bajo los nuevos criterios. A continuación se presenta un resumen de los valores originales y recalculados. Estos últimos serán utilizados a lo largo del documento para evaluar la evolución.

Concepto	Unidad	Valor original IA2024	Valor Recalculado 2024
Dotación de Agua	[litros/hab/día]	530	**565**
	[m^3/b/UF]	90	**89**
Consumo autorizado comercializado	[m^3/d]	3.729.169	**3.134.284**
Consumo autorizado no comercializado	[m^3/d]	79.106	**648.381**
Consumo autorizado	[m^3/d]	3.808.274	**3.782.666**
Agua No Contabilizada	%	37,4	**37,3**
Pérdidas Reales	%	34,7	**34,6**
	m^3/km/día	83	**82**
Pérdidas Aparentes	%	2,5	**2,7**

1.7.2.2. Resultados 2025

El detalle de las componentes y del cálculo del Balance Hídrico 2025 se desarrolla en el “Informe de Segmentación del Agua Entregada a la Red 2025”. A continuación, se presentan las magnitudes del área de servicio sobre la cual se aplica el modelo y un resumen de los resultados de indicadores estratégicos.

Concepto	Unidad	Valor 2025
Habitantes servidos agua (no clandestinos)	[habitantes]	**10.726.021**
Agua Bombeada a la Red	[m^3/día]	**6.059.226**
Agua Bombeada a la Red (sin agua en bloque a Nordelta y Barrios cerrados de Merlo)	[m^3/día]	**6.045.156**
Consumo Comercializado Medido	[m^3/día]	**932.214**
Consumo Comercializado No Medido	[m^3/día]	**2.109.197**
Consumo Autorizado No Comercializado	[m^3/día]	**648.922**

Indicadores Principales	Unidad	Resultados 2025
Dotación de agua (Agua entregada a diario al sistema de distribución por cada habitante abastecido)	[litros/hab/día]	**564**
Consumo Autorizado (Agua consumida por usuarios medidos y no medidos y los consumos autorizados no comercializados)	[m3/día]	**3.690.332**
Agua No Contabilizada		

(Pérdidas en Red sobre agua bombeada a la red, incluye pérdidas reales (físicas) y aparentes (comerciales)	[m3/día]	**2.354.824**
Índice Agua No Contabilizada [%] (Pérdidas en Red sobre agua bombeada a la red, incluye pérdidas reales (físicas) y aparentes (comerciales)	%	**39,0**
Pérdidas Aparente o Comercial	%	**3,3**
	[m3/día]	**200.009**
Pérdidas Reales o Físicas	%	**35,6**
	[m3/km/día]	**84**

A continuación se detallan aspectos de los indicadores principales.

1.7.2.2.1. Dotación de agua

La **dotación de agua** representa el volumen promedio diaria de agua entregada a la red de distribución por habitante abastecido. Este indicador integra la totalidad de los consumos autorizados, así como las pérdidas reales y aparentes existentes en el sistema, constituyéndose en una métrica clave para evaluar la eficiencia global de la prestación del servicio.

El indicador se calcula como la relación entre el volumen de agua entregada a la red y la población efectivamente abastecida, tal como se expresa en la imagen siguiente.


$$\frac{Volumen\ de\ Agua\ Bombeada\ a\ la\ red\ (expresada\ en\ \frac{m3}{d})}{Población\ Total\ Abastecida\ (expresada\ en\ habitantes)}$$

Para el año 2025, los valores obtenidos fueron los siguientes:

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Dotación de agua (por habitantes)	[litros/hab/día]	564

Durante el año 2025 se introdujeron mejoras en las metodologías de determinación de sus componentes fundamentales: el volumen de agua entregada a la red, la población abastecida y las unidades funcionales. Con el objetivo de asegurar la comparabilidad interanual del indicador, fueron recalculados los resultados correspondientes al año 2024 aplicando los mismos criterios metodológicos, permitiendo efectuar un análisis de evolución homogéneo y consistente.

Las figuras siguientes presentan la evolución histórica de la dotación de agua expresada por habitante. Para el año 2024 se incluyen simultáneamente los valores originalmente publicados en el Informe Anual 2024 y los recalculados conforme a la metodología vigente.

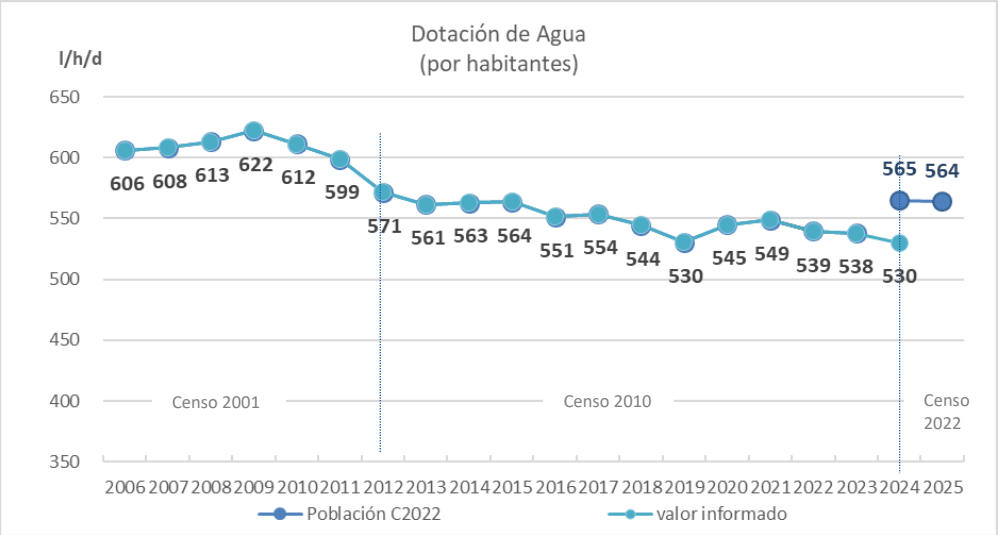

Cabe señalar que hasta el año 2021 los indicadores corresponden exclusivamente al área de servicio “AySA 2015”, mientras que a partir de 2022 se calculan para el ámbito “AySA Total”, incorporando las Nuevas Áreas de prestación.

La evolución histórica evidencia una tendencia descendente sostenida desde el año 2009, independientemente de la base poblacional utilizada para el cálculo. La única excepción se registró durante el período 2020-2021, cuando las condiciones operativas derivadas del ASPO generaron un incremento transitorio del indicador. A partir de 2022, la re-implementación de estrategias de regulación diurna y nocturna del bombeo permitió retomar la tendencia de reducción.

Durante 2025 dicha tendencia se mantuvo, impulsada principalmente por la disminución del volumen de agua entregada a la red de fuentes superficiales.

Estos resultados reflejan una evolución levemente favorable del indicador y evidencian el impacto de las acciones implementadas para mantener, en el mismo orden del año anterior, la oferta de agua.


1.7.2.2.2. Consumo Autorizado

El volumen anual que la empresa autoriza a consumir se compone del volumen de agua que consumen los usuarios registrados -con medidor o sin medidor- y los consumos autorizados no comercializados. Los consumos autorizados -medidos y no medidos- son proporcionados por la Dirección Comercial.

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Consumo Autorizado	[m^3/día]	**3.690.332**

Se registró una variación -**2,4**% respecto al año 2024 (recalculado) traccionada por la disminución del consumo comercializado. Como se detallará en apartados siguientes, los siguientes principales factores que abonaron a esta variación fueron:

- a la reducción del consumo comercializado por impacto del Plan de Medición Masiva
- y en menor medida, a la confiabilización de consumos dentro de las categorías UREM impulsado por la actualización del padrón de usuarios.

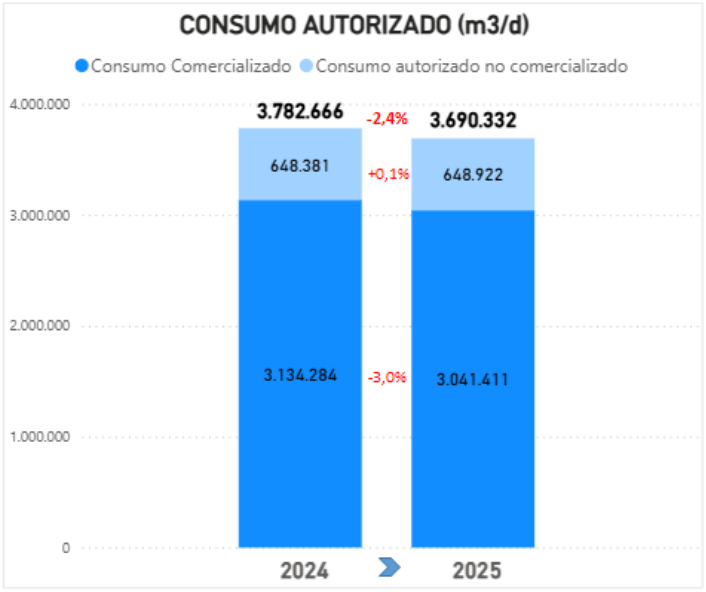

El detalle de evolución de los distintos componentes de este segmento se desarrolla en apartados siguientes.

1.7.2.2.3. Índice de Agua No Contabilizada (ANC)


Este índice representa a las pérdidas totales y se compone de las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. La metodología de balance de agua en base al modelo top-down calcula este índice como la diferencia entre el volumen de entrada al sistema y el consumo autorizado.

El Índice de Agua No Contabilizada (ANC) correspondiente al año 2025 alcanzó el siguiente valor:

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Índice de Agua No Contabilizada	%	**39,0**

Las variaciones observadas deben analizarse considerando las actualizaciones metodológicas descriptas en el apartado 1.7.2.1. y el resultado del Consumo Autorizado descripto en el apartado 1.7.2.2.2.

Las Figuras siguientes presentan la evolución histórica del indicador de ANC, así como de sus principales componentes, incluyendo las pérdidas reales expresadas en porcentaje.

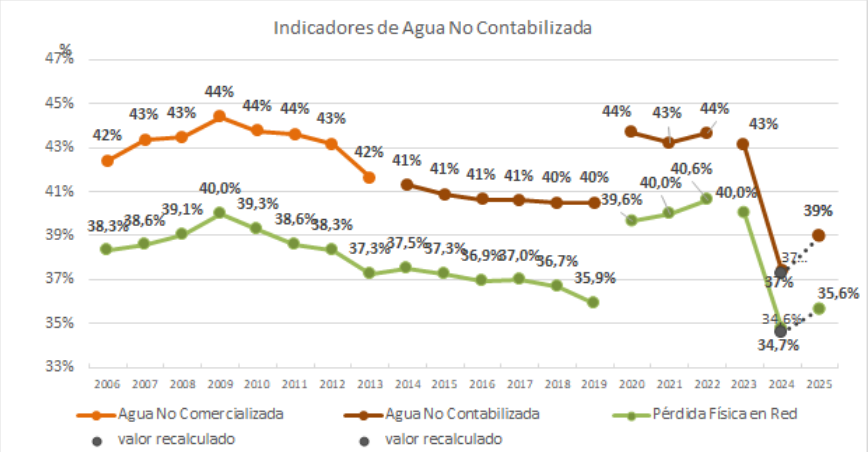

Hasta el año 2021 los resultados corresponden exclusivamente al área de servicio “AySA 2015”, mientras que desde el año 2022 se calculan para “AySA Total”, incorporando las Nuevas Áreas de prestación.

La evolución observada durante los años 2024 y 2025 se encuentra fuertemente influenciada por las mejoras implementadas en la calidad y confiabilidad de las variables de entrada del Balance de Agua. En particular, los trabajos de actualización y medición realizados en Urbanizaciones Residenciales Emergentes (UREM) permitieron mejorar significativamente la estimación de los consumos autorizados, reduciendo la incertidumbre asociada a esta componente.

En el año 2025, el incremento del índice respecto al año anterior se explica principalmente por la **disminución del Consumo Autorizado** registrada en el Balance de Agua detallada en el apartado anterior, ya que el volumen de agua entregada a la red permaneció prácticamente estable. Dado que el indicador de ANC surge de la diferencia entre ambas variables, la reducción del consumo autorizado incrementa proporcionalmente el volumen asignado a pérdidas.

No obstante, resulta importante destacar que la variación observada en el indicador no necesariamente refleja un deterioro equivalente de las condiciones físicas de la red, sino que responde en gran medida a los procesos de actualización y confiabilización de las componentes que integran el Balance de Agua. En consecuencia, el análisis de desempeño debe complementarse con la evaluación de indicadores específicos de pérdidas reales y de confiabilidad del balance, los cuales permiten interpretar con mayor precisión la evolución del sistema.

1.7.2.2.4. Pérdida aparente o comercial

Las pérdidas aparentes representan aquellos volúmenes de agua que son efectivamente consumidos por los usuarios, pero que no son registrados, medidos o facturados en forma adecuada debido a distintas causas asociadas a la medición, registración comercial o estimación de consumos. A diferencia de las pérdidas reales, estos volúmenes no corresponden a agua físicamente perdida en el sistema de distribución, sino a consumos que no generan la correspondiente recuperación económica por parte de la empresa.

Durante el año 2025, las pérdidas aparentes alcanzaron un valor **de 200.009 m³/día**, equivalente al 3,3 % del volumen total de agua ingresado al sistema.

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Pérdida Aparente o Comercial	[%]	**3,3**
	[m³/día]	**200.009**

Si bien este valor registró un incremento del 23,8 % respecto al año 2024, las pérdidas aparentes continúan constituyendo una proporción relativamente reducida dentro del Balance de Agua. No obstante, su relevancia resulta significativa desde el punto de vista económico y comercial, dado que impactan directamente sobre los ingresos asociados a la prestación del servicio.

Asimismo, la variación observada debe analizarse en conjunto con las mejoras metodológicas implementadas durante el período en la determinación de los consumos autorizados no medidos, la actualización de parámetros comerciales y la revisión de las bases de información utilizadas en el Balance de Agua. En este sentido, parte del incremento registrado responde a una mayor confiabilidad y representatividad de las variables de entrada, permitiendo una cuantificación más precisa de esta componente del Balance. En apartados posteriores se realiza un análisis particular de sus componentes.

1.7.2.2.5. Pérdida real o física


La pérdida real o física representa el volumen de agua que se pierde a través de fugas y escapes en redes, conexiones y demás componentes de la infraestructura de distribución. Se calcula como la diferencia entre el agua entregada a la red, y la suma de los consumos autorizados y de las pérdidas aparentes. En consecuencia se halla impactado por el valor resultante de las tres componentes anteriormente mencionadas.

Su evolución se presenta tanto en términos porcentuales respecto al agua entregada a la red, como mediante el indicador volumétrico expresado en m³/km/día.

Para el año 2025, los valores obtenidos fueron los siguientes:

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Pérdida física o real	%	35,6
	m³/km/día	84

La Figura siguiente muestra la evolución del indicador desde el inicio de AySA.

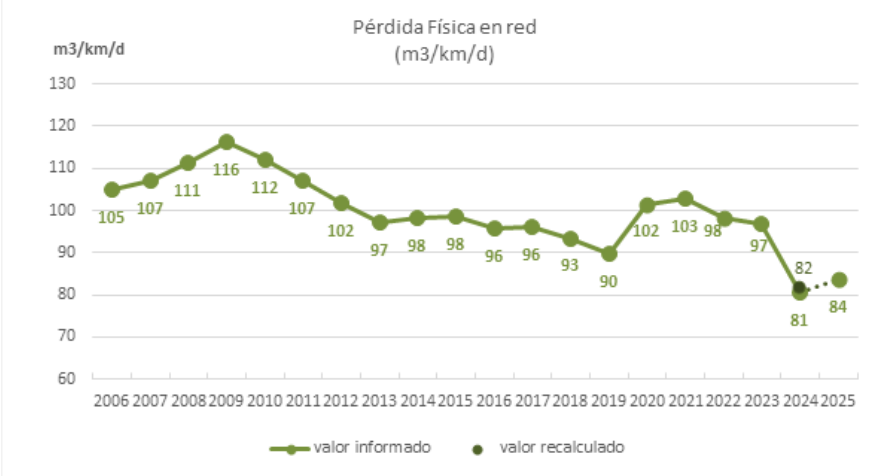

Los resultados obtenidos durante 2024 y 2025 deben interpretarse considerando además de los avances realizados en materia de gestión eficiente del bombeo y de reducción de pérdidas, como producto de la confiabilización de las componentes del Balance de Agua mencionadas a lo largo del capítulo. Estas acciones modifican la distribución de los volúmenes dentro del balance y, por tratarse de un cálculo de tipo top-down, impactan directamente sobre el valor resultante de pérdidas reales.

1.7.2.2.6. Índice Confiabilidad del Agua Entregada o Bombeada a la Red

El Índice constituye uno de los principales indicadores de calidad del modelo de Balance de Agua, ya que permite evaluar el grado de certidumbre asociado a la determinación del volumen de agua entregada o bombeada al sistema de distribución, principal variable de entrada para el cálculo de los indicadores de Agua No Contabilizada, pérdidas reales, pérdidas aparentes y dotación.

Se determina mediante la evaluación individual de cada uno de los puntos de medición utilizados en el Balance de Agua, considerando la tecnología empleada, el estado de calibración de los equipos, la disponibilidad de información y la incertidumbre asociada a cada medición. Se consideran confiables aquellos caudales medidos mediante instrumentos con incertidumbre conocida, verificable y auditable.

A diciembre de 2025, el Índice de Confiabilidad del Balance alcanzó el siguiente valor:

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Índice de Confiabilidad del Balance	%	87

En función de la fuente de abastecimiento, este indicador tiene comportamientos disímiles, a saber:

- 94% del volumen de agua de origen superficial bombeado desde plantas potabilizadoras y estaciones elevadoras es medido mediante sistemas con incertidumbre verificada de ±0,5%.

SUPERFICIAL	
Estado	% del Total SUP
ESTIMADO	6%
MEDIDO	94%

- En relación al agua de origen subterráneo, el 52% del volumen es determinado mediante mediciones con igual nivel de certidumbre.

SUBTERRANEA	
Estado	% del Total SUB
ESTIMADO	48%
MEDIDO	52%

La diferencia observada entre ambos valores se explica principalmente por la alta dispersión geográfica y la cantidad de instalaciones de producción subterránea existentes en el área de servicio, muchas de las cuales históricamente operaron mediante estimaciones indirectas de producción. En este sentido, los programas de incorporación de macromedición y confiabilización de pozos desarrollados durante los últimos años han permitido incrementar progresivamente la calidad de la información disponible para la elaboración del Balance de Agua.

La evolución favorable del indicador resulta particularmente relevante en el contexto de las actualizaciones metodológicas implementadas durante 2024 y 2025, ya que una mayor confiabilidad de la medición reduce la incertidumbre asociada al volumen de entrada al sistema y fortalece la robustez técnica de todos los indicadores derivados del Balance de Agua.

El Índice de Confiabilidad del Balance debe interpretarse como un indicador complementario de desempeño que permite valorar la calidad y representatividad de los resultados obtenidos. Un incremento de este indicador no sólo mejora la precisión de los cálculos, sino que también contribuye a una mejor identificación de oportunidades de optimización operativa y reducción de pérdidas dentro del sistema de distribución.

Finalmente, se destaca que la evolución observada durante los últimos años evidencia una mejora sostenida en la calidad de la medición del agua entregada al sistema. Los avances registrados son consecuencia de la implementación del Programa de Macromedición, la rehabilitación de puntos de control existentes, la incorporación de nuevas mediciones en instalaciones de producción subterránea y la consolidación de los procesos de calibración y auditoría metrológica. Estas acciones constituyen un elemento fundamental para incrementar la confiabilidad del Balance de Agua y mejorar la capacidad de gestión sobre los indicadores de eficiencia hidráulica del sistema.

1.7.2.3. Evolución de las principales componentes del Balance de Agua

El análisis de los resultados del Balance de Agua requiere comprender la evolución anual de las variables que determinan su comportamiento a lo largo del tiempo. Los indicadores de Agua No Contabilizada, Pérdidas Reales, Pérdidas Aparentes y Dotación constituyen el resultado de la interacción entre múltiples componentes vinculadas a la oferta de agua, la demanda de los usuarios, las características de la infraestructura de distribución y la calidad de la información utilizada para su determinación.

Por tal motivo, para el análisis específico de los indicadores resultantes, además de las mejoras que se implementaron en la confiabilidad de las componentes del Balance (ver Apartado 1.7.2.1) resulta relevante evaluar la evolución histórica de las principales variables que integran el Balance de Agua identificando también los factores operativos, tanto técnicos como comerciales, que han influido sobre su comportamiento durante el período analizado.


1.7.2.3.1. Agua entregada o bombeada a la red

El volumen de agua entregada a la red constituye la principal variable de entrada del Balance de Agua y representa la totalidad del caudal efectivamente incorporado al sistema de distribución para abastecer la demanda de los usuarios. Su evolución se encuentra influenciada por factores climáticos, operativos y


estructurales asociados a la gestión de la oferta de agua, por lo que su análisis resulta fundamental para interpretar el comportamiento de los restantes indicadores del Balance.

Durante el año 2025, el volumen promedio de agua entregada a la red alcanzó los **6.059.226 m3/d**, valor que representa un incremento de aproximadamente **0,3%** respecto al valor 2024 (recalculado).


El siguiente gráfico muestra la curva de evolución promedio mensual del Agua Total Bombeada a la Red del año 2025 y su comparativa respecto al año 2024 (recalculado).

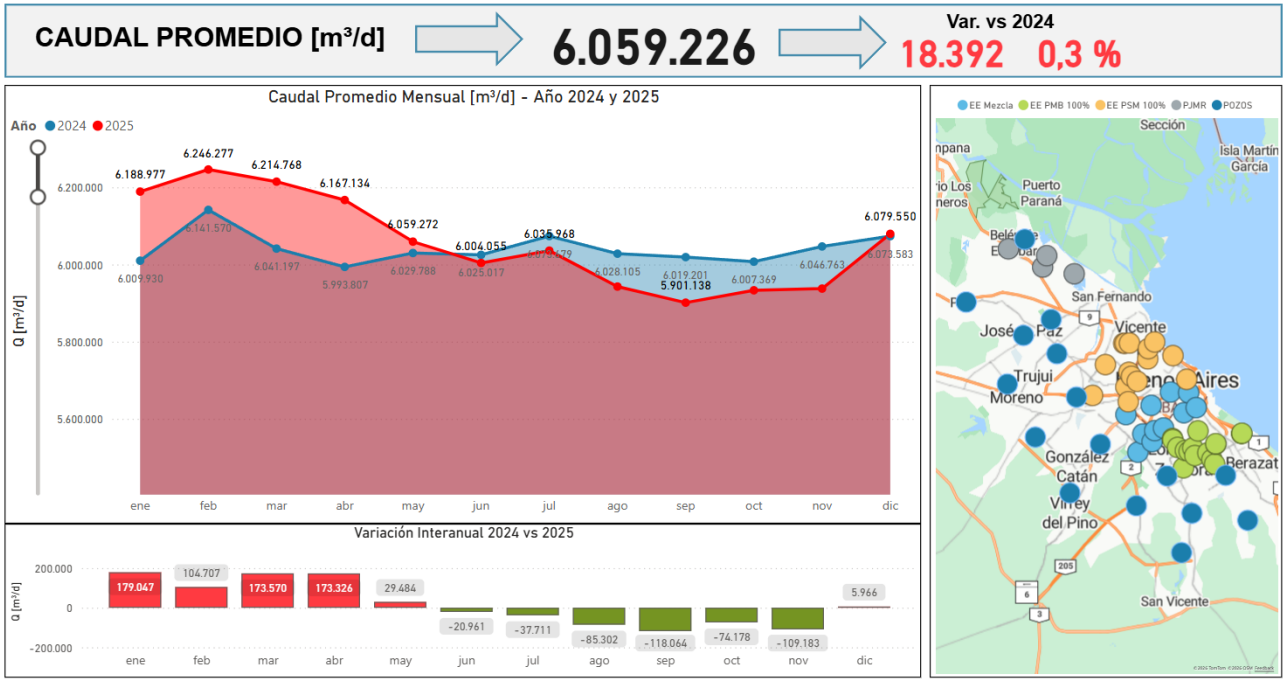

Como se puede observar en el gráfico siguiente, el bombeo de agua de fuente superficial promedio anual fue de **4.997.787 m3/d**. A nivel global, no se observa variación respecto al año 2024, no obstante, la segmentación del agua superficial por planta y/o sistema de presión registra variaciones considerables que se explican más adelante.

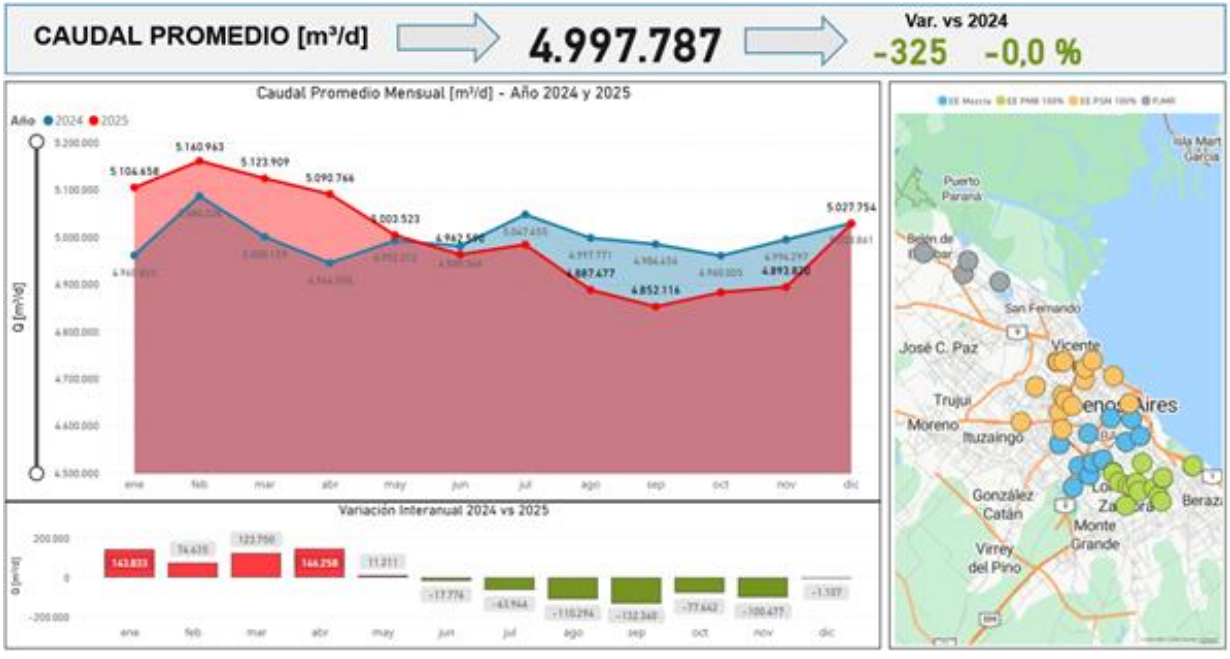

Por su parte, el bombeo de agua de origen subterráneo registró un valor promedio 2025 de **1.061.439 m3/d** y representó un incremento de **+18.717 m3/d** respecto al año 2024, siendo esta componente el principal traccionador del aumento de bombeo del año 2025.

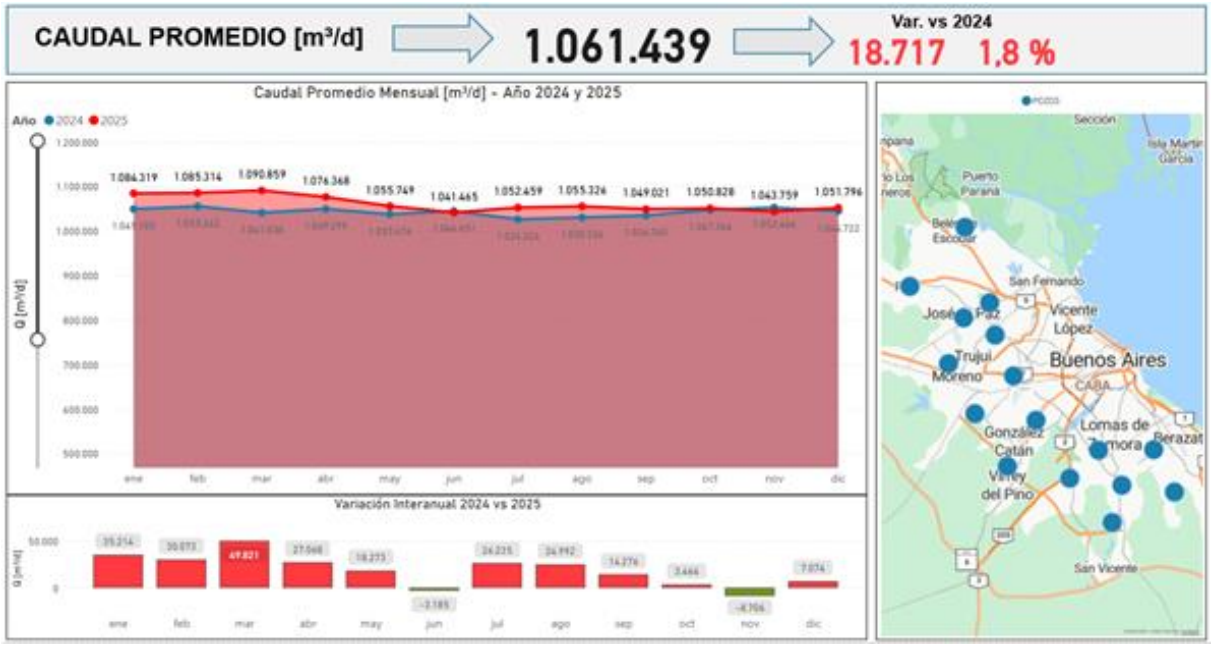

El siguiente cuadro muestra una segmentación del agua bombeada total al nivel de plantas. En el año 2025 se muestran entre paréntesis las variaciones respecto al año 2024.

Año 2024 RECTIFICADO					
	Q [m3/d]	Fuente	Q [m3/d]	Planta	Q [m3/d]
Agua Bombeada Total	6.040.834	SUPERFICIAL	4.998.112	EE PSM 100%	2.037.914
				EE Mezcla	1.524.206
				EE PMB 100%	1.138.836
				PJMR	297.155
		SUBTERRANEA (A RED)	1.042.722	POZOS	1.042.722

Año 2025					
	Q [m3/d]	Fuente	Q [m3/d]	Planta	Q [m3/d]
Agua Bombeada Total	6.059.226 (+ 18.392)	SUPERFICIAL	4.997.787 (-325)	EE PSM 100%	2.016.077 (- 21.837)
				EE Mezcla	1.532.945 (+ 8.738)
				EE PMB 100%	1.150.653 (+ 11.817)
				PJMR	(+ 958) 298.113
		SUBTERRANEA (A RED)	1.061.439 (+ 18.717)	POZOS	1.061.439 (+ 18.717)

(+XX.XXX) → mayor bombeo m3/d vs 2024

(-XX.XXX) → menor bombeo m3/d vs 2024


Durante el año 2025 se presentaron factores particulares que impactaron en el bombeo y en consecuencia en moldearon los resultados precedentes, entre ellos se destacan:

- Factores climáticos que impactaron en la demanda
- Factores estructurales asociados a la infraestructura de bombeo
- Factores operativos asociados a la gestión diurna/nocturna

A continuación se resumirán aspectos asociados a cada uno de ellos:

a) Factores climáticos: temperatura, precipitaciones y eventos singulares

La evolución del volumen de agua entregada a la red durante el año 2025 estuvo fuertemente condicionada por las diferencias climáticas registradas respecto al año 2024. En particular, con relación a la temperatura ambiente, variable que presenta una elevada correlación con la demanda de agua potable. La siguiente gráfica muestra la evolución mensual de temperaturas máximas, temperaturas mínimas y precipitación acumulada mensual para ambos períodos.

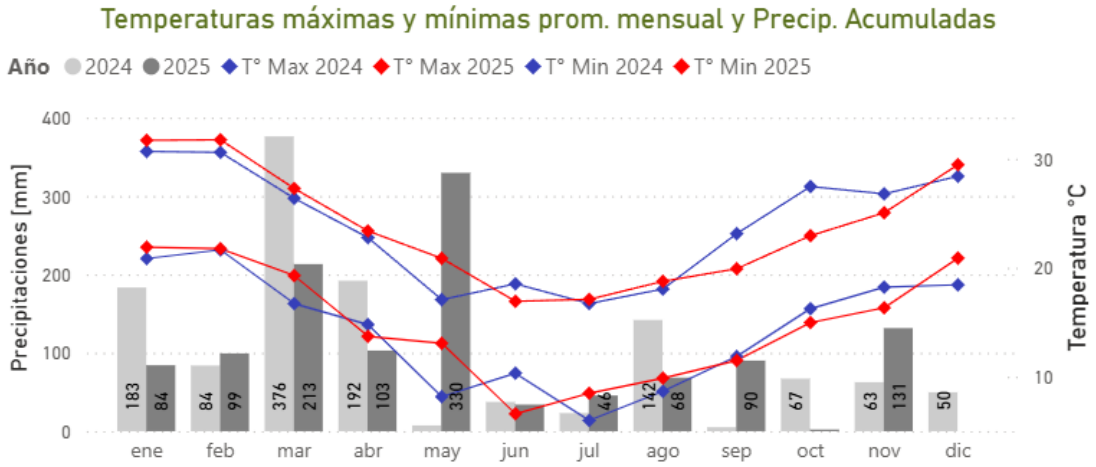

Se identifican dos períodos diferentes:

Período enero – mayo: durante los primeros cinco meses del año 2025, tanto las temperaturas máximas como las mínimas fueron en promedio, aproximadamente 1,5 °C superiores a las registradas durante igual período del año 2024. Los niveles de precipitación, en cambio, se mantuvieron en valores similares para ambos años.

Período junio – diciembre: durante este período se observó una situación inversa. Las temperaturas máximas y mínimas registradas en el año 2025 resultaron inferiores a las del año anterior, siendo particularmente significativa la diferencia observada entre septiembre y noviembre. En cuanto a las precipitaciones, no presentaron diferencias relevantes entre ambos años.

Por otra parte, durante el año 2025 se presentó un evento de bajas temperaturas en los últimos días de junio y primeros días de julio de 2025 se registró un episodio de bajas temperaturas con valores mínimos cercanos a 0 °C.

Este tipo de eventos genera habitualmente una disminución abrupta de la demanda domiciliaria. Cuando dicha reducción no puede ser compensada de manera inmediata mediante ajustes operativos de presión y bombeo, se producen incrementos transitorios de presión en determinados sectores de la red.

A esta situación se suma la contracción térmica que experimentan las cañerías metálicas, particularmente aquellas de hierro fundido de gran antigüedad, generando condiciones propicias para la aparición de fisuras,

escapes y roturas. Como consecuencia, se registró un incremento simultáneo de reclamos por faltas de agua, baja presión y escapes, especialmente en la región Capital Federal.

Para sostener los niveles de servicio y compensar las pérdidas generadas por estos eventos, fue necesario incrementar transitoriamente los volúmenes bombeados desde diversas estaciones elevadoras de la región.

Este evento se ha producido también en el año 2024, no obstante, a diferencia de lo ocurrido esa oportunidad, el incremento de bombeos quedó restringido prácticamente al mes de julio, lográndose restablecer durante agosto condiciones operativas más alineadas con la demanda real del sistema.

b) Factores estructurales: eventos en la infraestructura de gestión de presiones


Además de las condiciones climáticas, la evolución del volumen de agua entregada a la red estuvo influenciada por diversas intervenciones realizadas sobre la infraestructura de regulación y control de caudales, además de las acciones en red que se describirán en el Apartado 1.7.3. Estas acciones tuvieron como objetivo optimizar la gestión de presiones, adecuar la oferta a la demanda efectiva y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.


Estación Elevadora Caballito

A comienzos de octubre de 2025 entró en servicio definitivo un variador de frecuencia (VDF) instalado en una de las bombas de la Estación Elevadora Caballito, luego de un período de pruebas operativas. La instalación fue desarrollada íntegramente con recursos propios de AySA.

La incorporación de esta tecnología permitió adecuar de manera más precisa el caudal impulsado a las condiciones reales de demanda, reduciendo los excedentes de presión y mejorando la capacidad de regulación del sistema abastecido por la estación.

Dado que la puesta en servicio se produjo durante el último trimestre del año, el impacto sobre los valores promedio anuales resulta todavía limitado. Sin embargo, tanto el análisis de la evolución horaria de los caudales como los promedios mensuales evidencian una disminución del volumen bombeado a partir de la entrada en operación del equipo, tal como se observa en las gráficas siguientes.

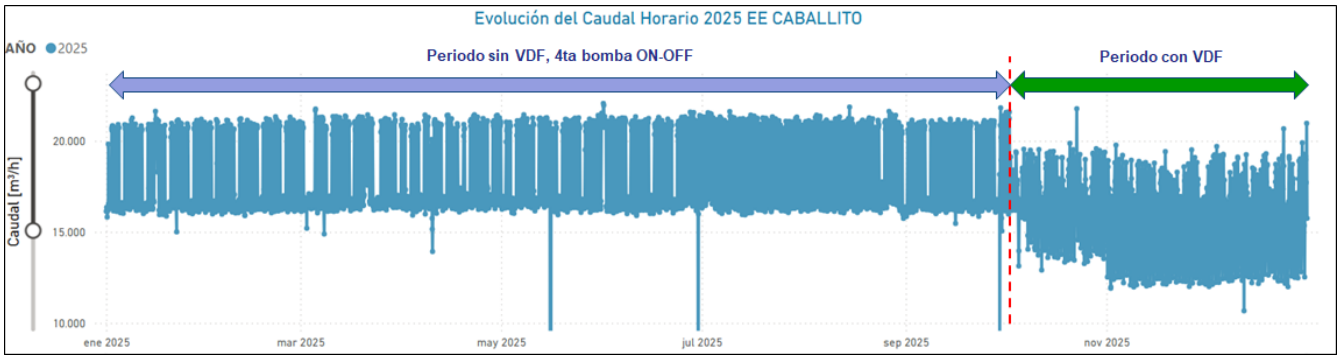

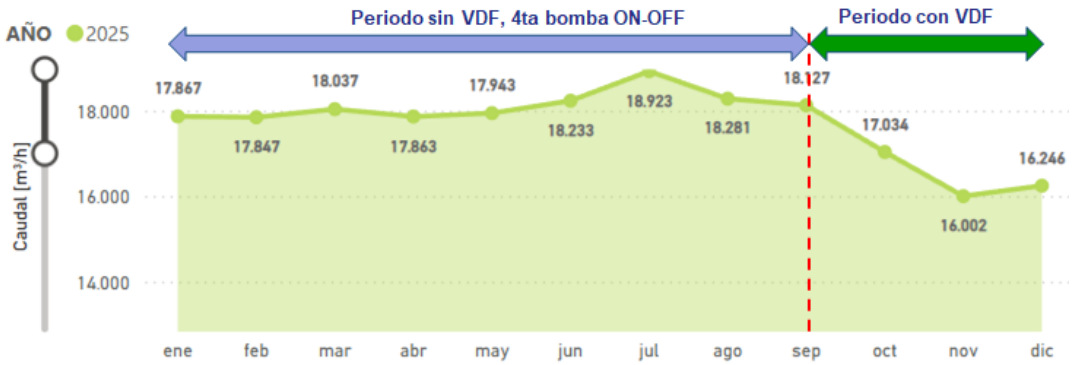

Se estima que los beneficios asociados a esta intervención puedan apreciarse con mayor claridad durante 2026, una vez completado un ciclo anual completo de funcionamiento bajo las nuevas condiciones operativas.

Estación Elevadora Centro


La Estación Elevadora Centro presentó una situación particular como consecuencia de la salida de servicio del variador de frecuencia existente a partir del 27 de enero de 2025.

Como resultado de esta condición, entre fines de enero y mediados de marzo la estación operó con un caudal prácticamente constante, cercano a 6.200 m³/h durante las 24 horas del día, reduciendo la capacidad de adaptación de la oferta a las variaciones horarias de la demanda.

Una vez finalizado el período estival y ante la disminución de los consumos, se implementaron maniobras operativas de regulación durante las horas de menor demanda, particularmente durante la madrugada, con el objetivo de reducir los volúmenes impulsados y adecuar la producción a las necesidades reales del sistema.

Durante julio, en el contexto del episodio de bajas temperaturas previamente descripto, estas maniobras debieron ser interrumpidas transitoriamente para sostener los niveles de servicio frente al incremento de pérdidas y reclamos asociados al evento.

Como consecuencia de las restricciones operativas derivadas de la situación descripta, el volumen promedio bombeado por la Estación Elevadora Centro durante el año 2025 resultó superior en aproximadamente 3.431 m³/d respecto al registrado el año anterior.

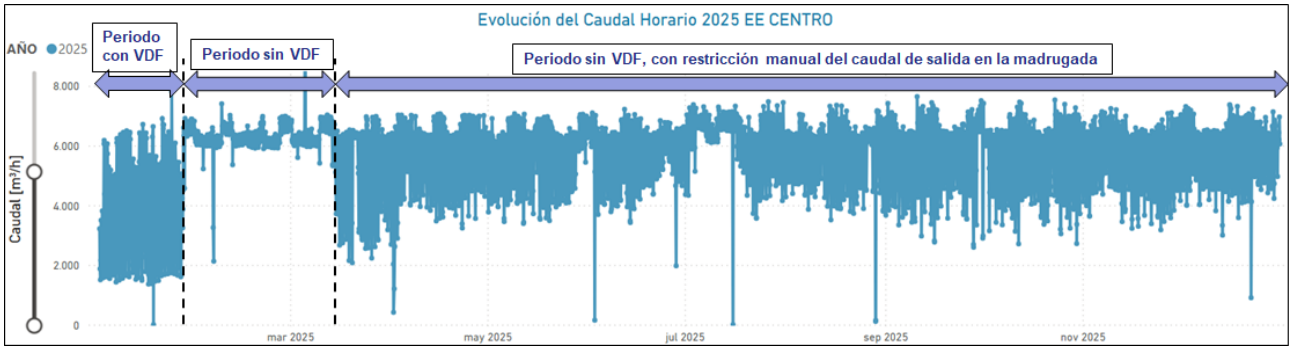

c) Factores operativos: regulación estacional y bombeos horarios

La evolución del volumen entregado a la red durante el año 2025 estuvo condicionada por las variaciones de demanda asociadas a las condiciones climáticas y a factores estructurales como los ya mencionados. No obstante, en términos positivos, existe un factor operacional que permite optimizar el sistema y adecuar la oferta de agua a los requerimientos efectivos del mismo.

Estas acciones incluyen la regulación estacional y horaria de bombeos, la gestión dinámica de presiones y la adecuación de los esquemas de abastecimiento mediante estaciones elevadoras, válvulas reguladoras y sistemas de control asociados.


En términos generales, durante los períodos de máxima demanda, particularmente en los meses estivales, la mayoría de las estaciones elevadoras operan próximas a sus condiciones máximas de bombeo, por lo que las diferencias interanuales observadas responden principalmente a factores climáticos o a modificaciones en las áreas efectivamente abastecidas.

Por el contrario, durante los períodos de menor demanda, especialmente durante el invierno y en horarios nocturnos, resulta posible implementar acciones específicas de regulación destinadas a reducir excedentes de presión, minimizar esfuerzos sobre la infraestructura y optimizar los consumos energéticos, manteniendo

simultáneamente los niveles de servicio requeridos. A continuación se describen las principales acciones realizadas durante el año 2025.

Estación Elevadora Lanús


Desde el 16 de marzo de 2025 se implementó el apagado de la quinta bomba durante horas de menor demanda nocturna. Esta maniobra se efectuó durante el año 2024 y se mantuvo durante los primeros quince días de enero de 2025. El volumen bombeado promedio 2025 no registró variación respecto al año anterior.

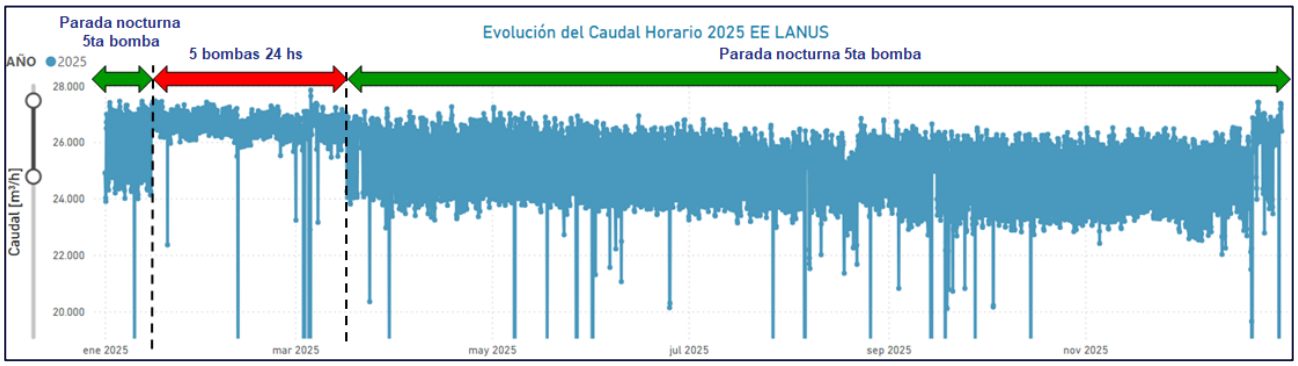

Estación Elevadora Devoto

A partir de abril 2025 se incorpora una acción de regulación al funcionamiento regular de la elevadora mediante la restricción de caudal nocturno en ambas salidas de la estación, incrementando la capacidad de adaptación de la oferta a las condiciones reales de demanda.


Las maniobras debieron suspenderse temporalmente entre el 2 de julio y el 13 de agosto de 2025 como consecuencia del evento extraordinario de bajas temperaturas, período durante el cual la estación operó con tres bombas en servicio permanente para sostener los niveles de abastecimiento. Una vez superado el evento, las regulaciones fueron reimplementadas progresivamente. Como resultado de estas acciones, la estación registró una reducción promedio anual de 5.113 m³/d respecto de 2024.

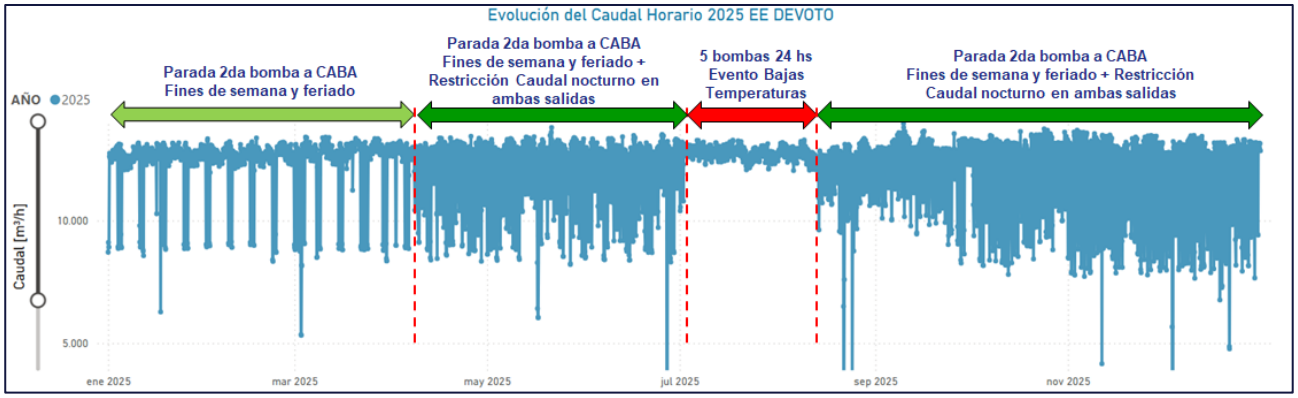

Estación Elevadora Constitución

La estación dispone desde finales de 2023 de un variador de frecuencia instalado en una de sus bombas principales, lo que permite modular el caudal impulsado en función de curvas horarias de demanda previamente definidas.

Durante 2025 el sistema mantuvo un comportamiento estable, con excepción de los días afectados por el evento de bajas temperaturas de fines de junio y principios de julio. La capacidad de modulación aportada por el variador permitió optimizar los volúmenes entregados a la red, registrándose una reducción promedio anual de 4.725 m³/d respecto a 2024.

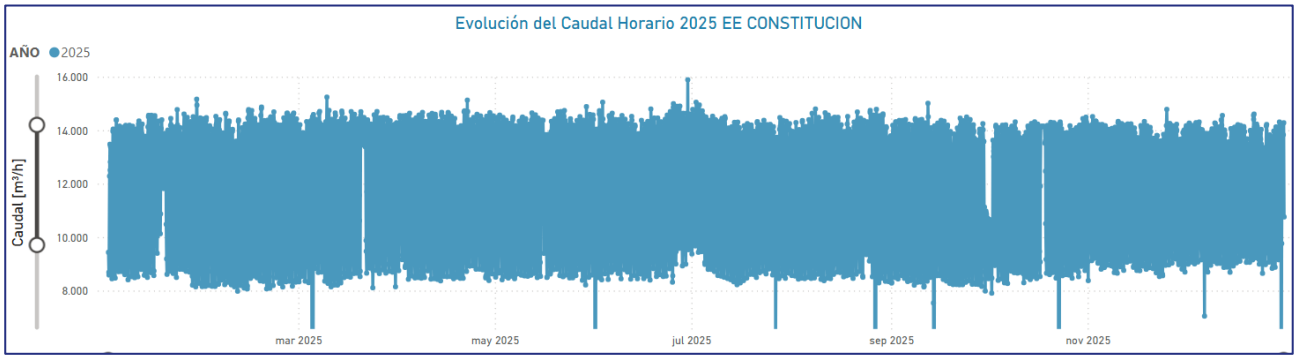


Estación Elevadora Floresta

Hasta septiembre de 2025 la estación presentó caudales similares a los registrados durante 2024. A partir de octubre se observó un incremento del volumen impulsado por dos factores concurrentes:

- la estación absorbió parcialmente la reducción de caudal registrada en la Estación Elevadora Caballito luego de la puesta en servicio de su nuevo variador de frecuencia,

- por parte, durante el mismo período se reemplazó una de las bombas existentes por un equipo de mejor rendimiento hidráulico para iguales condiciones de presión, incrementando la capacidad efectiva de producción.

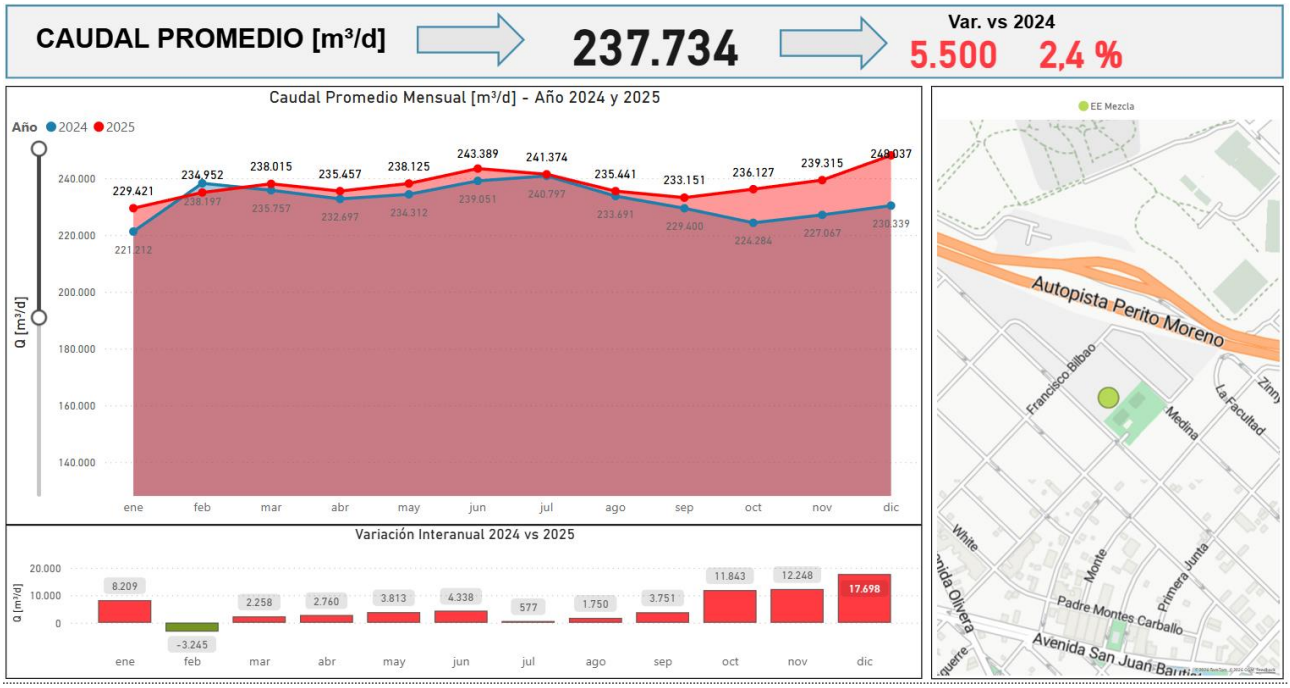


Sistema Villa Adelina

El sistema integrado por las estaciones elevadoras Villa Adelina, Villa Adelina I y Villa Adelina II constituye uno de los ejemplos más representativos de optimización operacional observados durante el año 2025.

A partir de abril, fue posible sostener presiones de salida inferiores a las registradas durante el año 2024, permitiendo una reducción sostenida de los caudales bombeados durante todo el segundo semestre sin afectar los niveles de servicio.


Entre todas las estaciones elevadoras del sistema AySA, el conjunto Villa Adelina fue el que realizó el mayor aporte a la reducción del volumen total de agua superficial bombeada durante el año, constituyéndose en uno de los principales factores que permitieron mantener prácticamente constante el volumen total de agua entregada a la red.

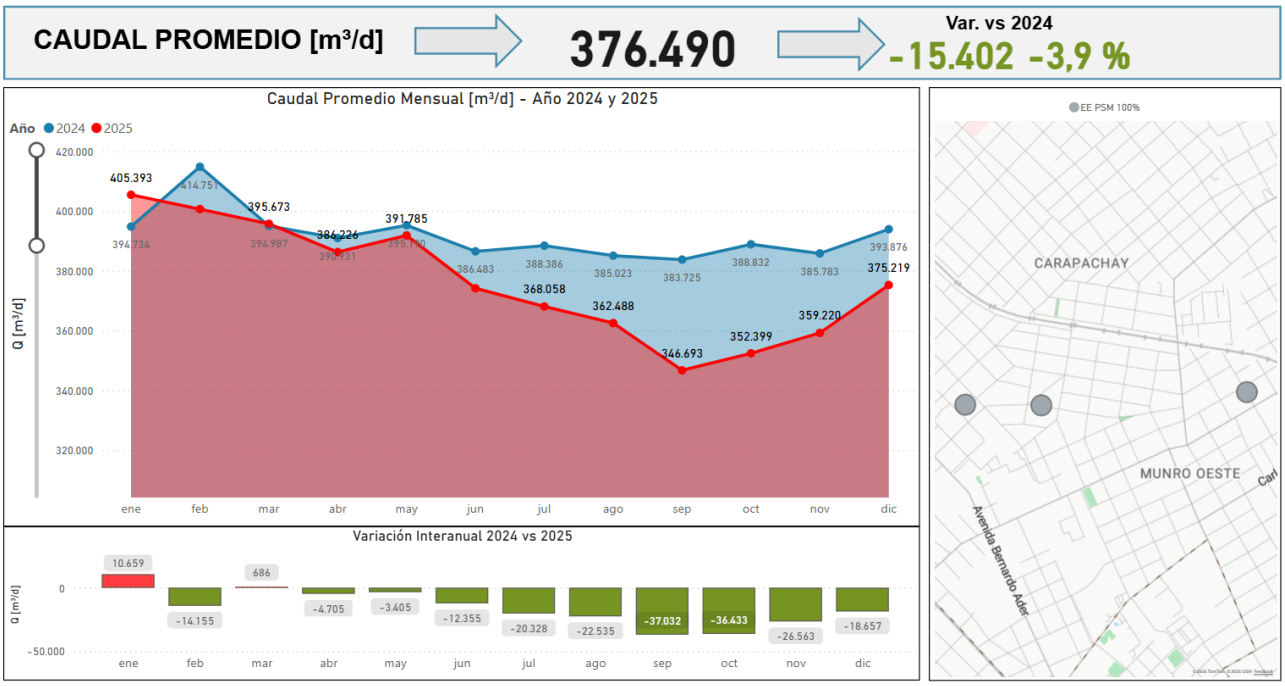

Estación Elevadora Quilmes

La estación opera normalmente con cuatro bombas, apagándose la cuarta unidad en función de las condiciones de presión registradas aguas abajo de las válvulas reguladoras.

Si bien se observaron diferencias mensuales entre ambos años, el análisis anual muestra que el volumen promedio bombeado durante 2025 resultó prácticamente equivalente al registrado en 2024.

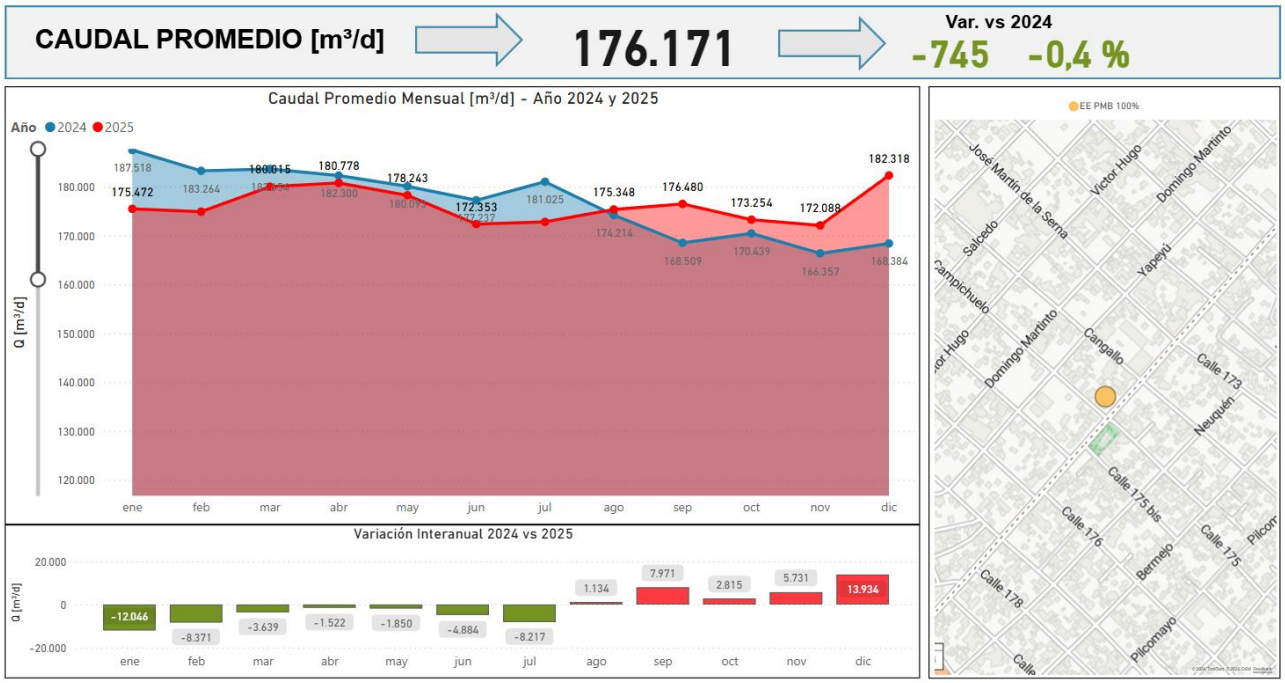


Estación Elevadora Morón - Estación elevadora Tres de Febrero

El bombeo de ambas estaciones se encuentra estrechamente vinculada al comportamiento de las válvulas reguladoras ubicadas aguas abajo.

Durante el período enero-mayo de 2025 ambas estaciones operaron con mayores caudales respecto al año anterior: A partir de junio comenzaron a evidenciarse los efectos de las regulaciones implementadas para acompañar la disminución estacional de los consumos.

No obstante, el incremento registrado durante el primer semestre determinó que ambas estaciones entregaran conjuntamente un volumen promedio anual superior en 6.358 m³/d respecto del año 2024.

EE Morón EE Tres de Febrero

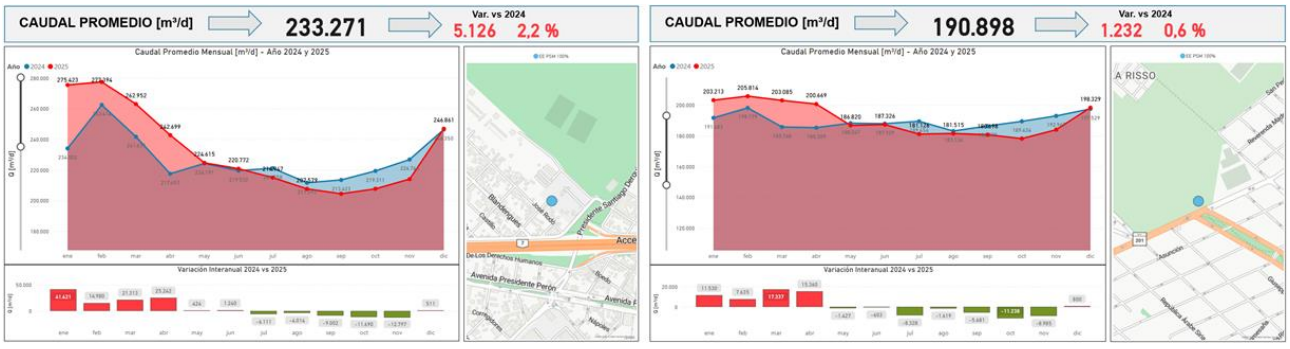

Estación Elevadora E Bernal I - Estación Elevadora Bernal IV


El bombeo de ambas estaciones está vinculado al comportamiento de las válvulas reguladoras ubicadas aguas abajo de sus sistemas de distribución.

La EE Bernal I mantuvo durante el primer semestre de 2025 un caudal prácticamente constante y superior al observado en el año 2024, mientras que las acciones de regulación comenzaron a reflejarse con mayor intensidad durante la segunda mitad del año.


Por su parte, la EE Bernal IV registró prácticamente todo el año niveles de producción superiores al año 2024, con escasa variación estacional entre invierno y verano.

En conjunto, ambas estaciones aportaron 12.368 m³/d adicionales respecto del año anterior.

EE Bernal I

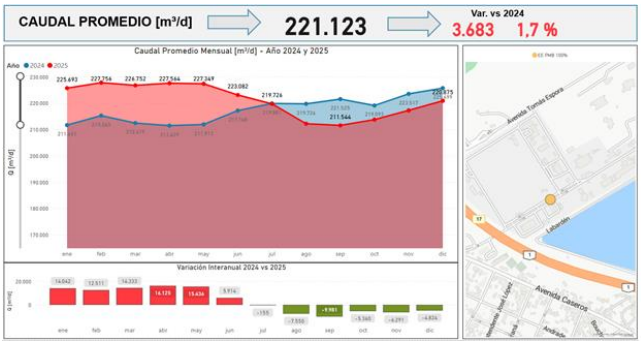

EE Bernal IV

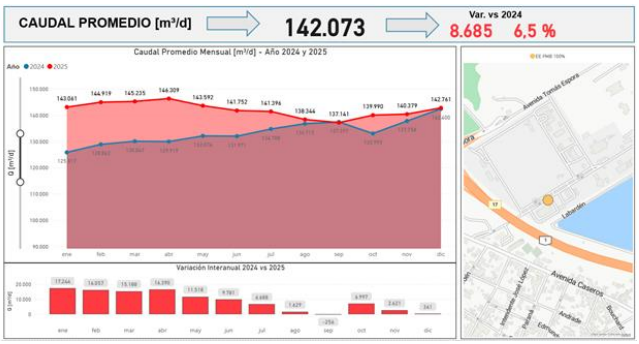


Impelentes Planta Juan Manuel de Rosas

El bombeo se encuentra condicionada por la regulación ejercida a través de las válvulas reguladoras instaladas sobre los acueductos Tigre–Centro y Pacheco–Benavídez, y en menor medida por aquellas asociadas a los acueductos Matheu y Savio.


Al igual que lo observado en otras estaciones de alta presión, el incremento de demanda registrado durante los primeros meses de 2025 fue compensado posteriormente mediante acciones de regulación implementadas a partir de mayo.

Como resultado, el volumen promedio anual impulsado durante el año 2025 resultó prácticamente equivalente al año anterior.

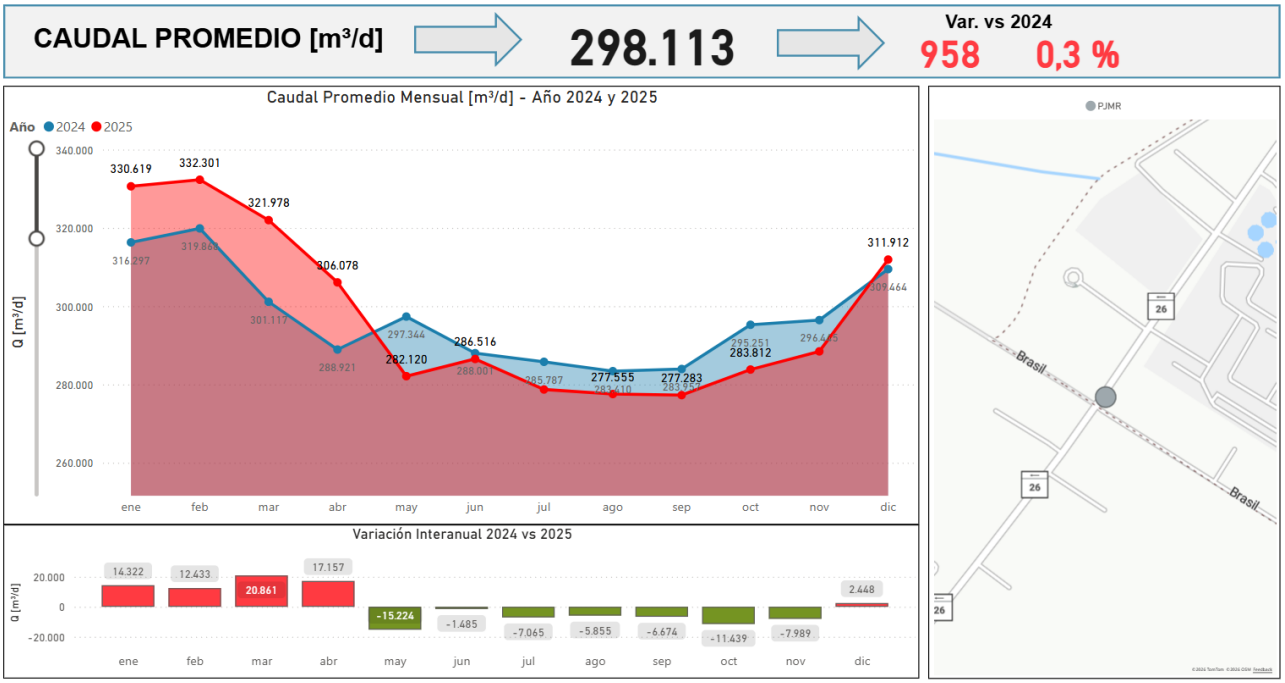

Resultado General de la Gestión del Agua Bombeada a la Red

Las condiciones climáticas del período de enero a mayo generó mayores requerimientos de abastecimiento, un mayor bombeo de las estaciones elevadoras de agua superficial, y una mayor cantidad de pozos operativos, asociados fundamentalmente al aumento de las horas de funcionamiento de los mismos. Como resultado, entre enero y mayo de 2025 se bombearon en promedio **99.937 m³/d** adicional de agua superficial y **32.090 m³/d** adicional de agua subterránea, respecto al año anterior. El siguiente gráfico muestra la distribución territorial de estas variaciones para el período mencionado.

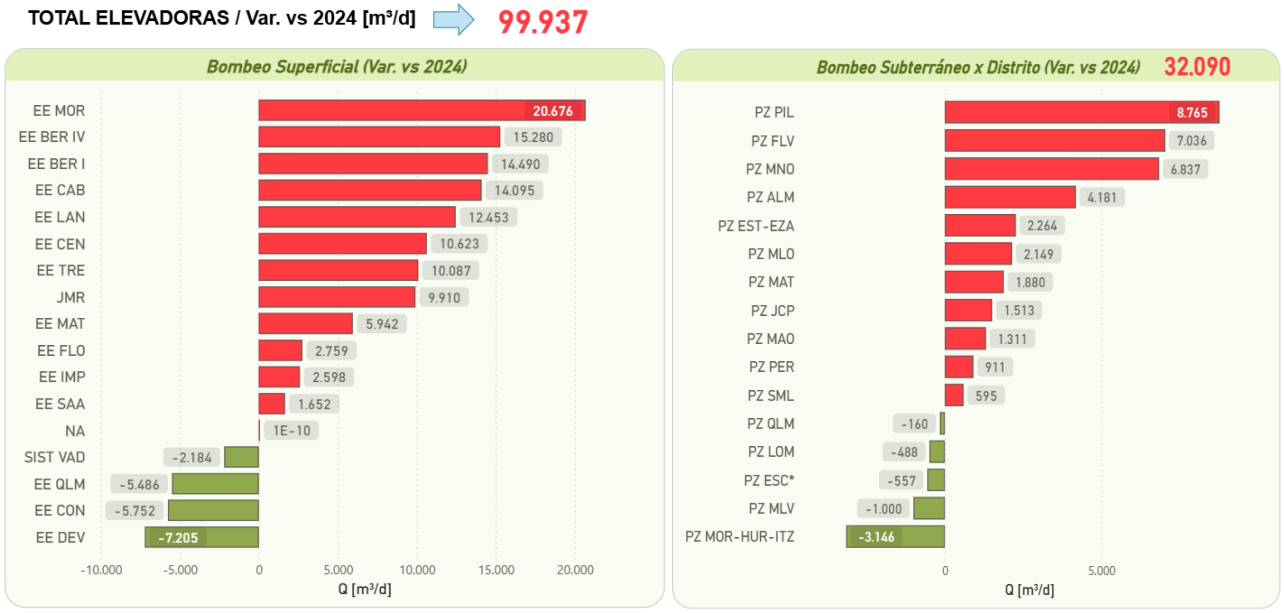

Durante el período junio-diciembre se observó la situación opuesta. Las menores temperaturas registradas durante el año 2025, la implementación del variador de velocidad de EE Caballito, el avance de los trabajos de reducción de pérdida real, el avance del programa de medición de consumo y la posibilidad de implementar estrategias de regulación del bombeo –fundamentalmente en el área abastecida por agua superficial- permitieron lograr una reducción del bombeo durante este período por un valor de 71.940 m³/d que compensó el desvío del período anterior.

La reducción se verificó en la mayoría de las estaciones elevadoras, destacándose particularmente las estaciones del sistema Villa Adelina, las estaciones impelentes de Planta San Martín y la estación elevadora Lanús.

La combinación de las regulaciones y presiones durante el segundo semestre permitió mantener prácticamente constante el volumen de agua superficial anual entregada a la red, compensando parcialmente el incremento observado en el aporte de agua subterránea.

Los casos de las estaciones elevadoras Caballito y Centro muestran cómo las modificaciones en la infraestructura de regulación pueden generar efectos significativos sobre los volúmenes entregados a la red, independientemente de las condiciones climáticas o de la evolución de la demanda.

La incorporación de nuevas herramientas de control permite mejorar la eficiencia de la operación y reducir los excedentes de presión, en contraposición, la falta de disponibilidad de estos sistemas limita la capacidad de regulación y puede traducirse en mayores volúmenes bombeados para sostener los niveles de servicio requeridos.

En este sentido, las inversiones orientadas a fortalecer la gestión dinámica de presiones constituyen una herramienta relevante para optimizar la operación del sistema y contribuir a la reducción de pérdidas reales y consumos energéticos.

1.7.2.3.2. Consumo Autorizado Comercializado

El consumo autorizado comercializado es el consumo de los usuarios debidamente registrados en la base de datos comercial, ya sea consumo medido o no medido, de todas las categorías de usuarios. Incluye el consumo de todos los grupos de usuarios, como los domésticos, comerciales, industriales, estatales y sociales. No incluye el agua exportada o venta en bloque que se mide y se factura, las cuales deben ser restadas para no duplicarlas en el agua contabilizada o en el agua comercializada.


Los consumos medidos y no medidos son proporcionados por la Dirección Comercial.

El consumo autorizado comercializado total fue de **3.041.411** m³/día, registrando una disminución de **-3,0%** en el año 2025 vs 2024 (recalculado) impulsado por el consumo comercializado no medido.

Como se detallará a continuación, los siguientes principales factores que abonaron a esta variación fueron:


- La reducción del consumo comercializado no medido asociado al Plan de Medición Masiva.
- La confiabilización de consumos dentro de las categorías NR1 y UREM impulsado por la actualización del padrón de usuarios y en consecuencia del consumo.

En la siguiente gráfica se resumen los valores globales de consumo y de unidad funcional para el año 2025 y su variación respecto al año 2024. Cabe destacar que el universo medido representa el 31% del consumo total y alcanza el 25% de las unidades funcionales existentes.

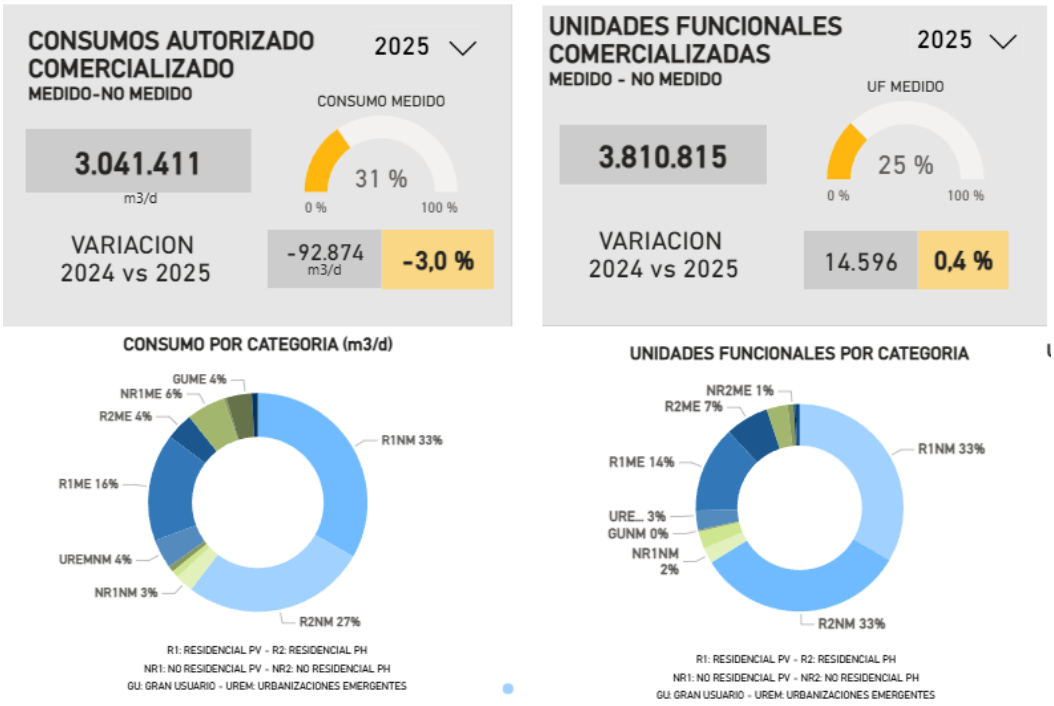

Referencias
GU: Grandes usuarios
R1: Usuario Residencial – Propiedad Vertical
R2: Usuario Residencial – Propiedad Horizontal
NR1: Usuario No residencial – Propiedad Vertical
NR2: Usuario No residencial – Propiedad Horizontal
UF: Unidades funcionales

Las Figuras siguientes permiten observar la evolución interanual segmentada por la condición de facturación medido y no medido. Como se observa, el aumento del consumo medido, no compensa la disminución del consumo no medido lo que se traduce en una disminución del global.

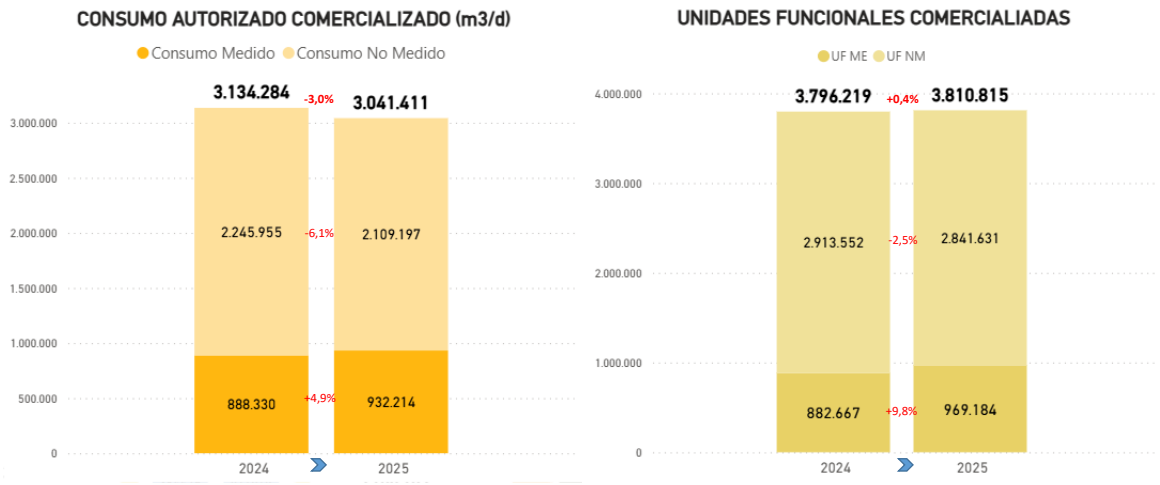


A continuación, se detalla la evolución del consumo y de las unidades funcionales segmentados por Categoría según su condición de facturación medido-no medido.


Los **consumos medidos**, representan el 31% del consumo comercializado y el 25% de total de Unidades Funcionales comercializadas.

Respecto de 2024, se registra **un incremento de 43.884 m³/d** equivalente **+4,9%**, asociado principalmente al Plan de Medición Masivo que impulsa la incorporación de usuarios bajo el régimen medido.

Este incremento está impulsado por las categorías:

- **R1 (residencial PV)** que registra un aumento del +**6,1%.** En esta categoría se incluyen los Countries que individualmente registra un incremento del **+19,6%** asociado en parte por la incorporación de usuarios (+46,3% UF),
- **R2 (residencial PH)** que registra un aumento del **19,5%.**

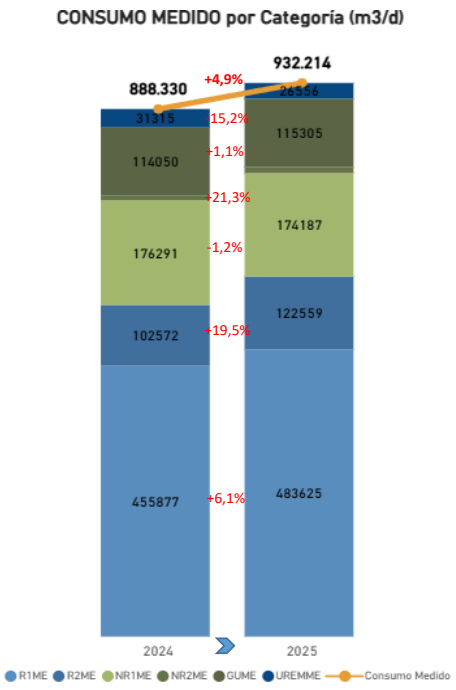


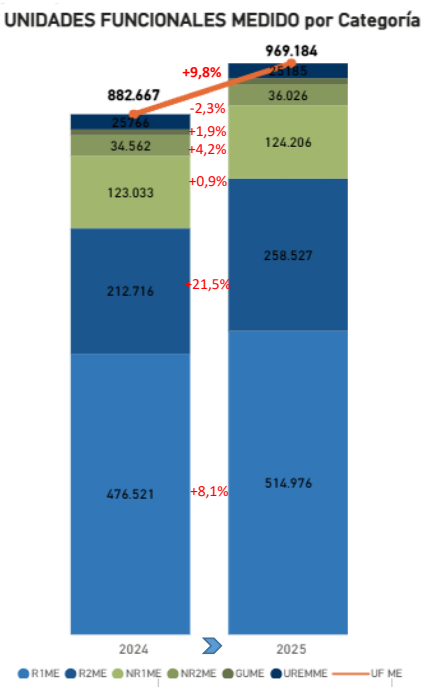

Los **consumos no medidos** registran una **disminución de 136.758 m³/d**, equivalente a **-6,1%** asociado al avance del Plan de Medición Masivo y a la actualización del padrón de usuarios.

Esta variación, está impulsado principalmente por:

- **R2 (Residencial PH)** que registra una disminución del **-7,0%** asociado al cambio a régimen medido por avance del Plan de Medición Comercial,
- **NR1 (No residencial PV)**, que varía un -**24,1%** asociada a la actualización del padrón comercial en las nuevas áreas
- **UREM** que registra una disminución del **-13,2%** producto de la actualización del padrón de barrios;

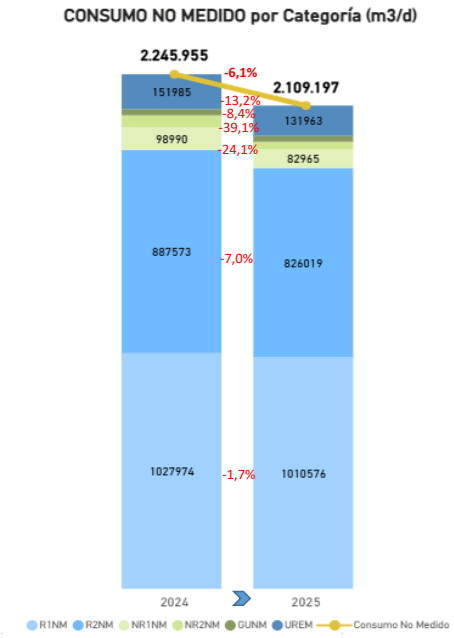



En síntesis, los resultados del año 2025 se explican, en parte por una reducción de consumo real producto del avance del Plan de Medición, y en parte por la confiabilización del dato de consumo UREM y NR1 (nuevas áreas) por actualización de su padrón de usuarios equivalentes.

1.7.2.3.3. Consumo Autorizado No Comercializado

El Consumo Autorizado No Comercializado comprende aquellos volúmenes de agua cuyo uso se encuentra legítimamente autorizado por AySA, pero que, por sus características operativas, institucionales o administrativas, no son objeto de facturación ni registran ingresos comerciales asociados. Esta componente se expresa en m³/d promedio anual y forma parte del Consumo Autorizado considerado en el Balance de Agua.

Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes usos:

- Usos operativos propios en los sistemas de agua potable y desagües cloacales, tales como limpieza y desinfección de cañerías en servicio, lavado y puesta en funcionamiento de nuevas conducciones, pruebas hidráulicas y otras tareas operativas vinculadas al mantenimiento y expansión de la infraestructura. También contempla el uso de agua por parte de camiones desobstructores.
- Agua utilizada para el abastecimiento de camiones cisterna operados por AySA, destinados a la atención de contingencias operativas, refuerzo de servicio o abastecimiento alternativo en sectores con restricciones temporales.
- Consumos realizados a través de hidrantes por parte de los servicios de emergencia, particularmente los utilizados por los cuerpos de bomberos en tareas de prevención y extinción de incendios.
- Consumos correspondientes a usuarios abastecidos desde la red de distribución que se encuentran en proceso de incorporación o regularización dentro del sistema comercial o que por alguna situación particular no tienen facturación asociada, incluye:
    - Urbanizaciones Residenciales Emergentes (UREM) abastecidas desde la red de distribución de AySA en proceso de análisis,
    - Usuarios registrados con stop de facturación por diferentes motivos o en proceso de empadronamiento comercial, tales como, inmuebles propios/concesionados, plazas
    - Consumo de un segmento de barrios cerrados de Pilar, que si bien se localizan dentro de radio servido y tienen abastecimiento de red de AySA no son usuarios directos sino que forman parte de un convenio particular.


Desde la perspectiva del Balance de Agua, esta componente permite diferenciar consumos legítimos autorizados por la empresa de aquellos volúmenes asociados a pérdidas aparentes o pérdidas reales, contribuyendo así a una mejor interpretación de los indicadores de eficiencia del sistema.

A nivel AySA, en el año 2025 se registraron **648.922 m³/d**, que representan el **17,6%** del Consumo autorizado y el **10,7%** del Agua entregada a la red. Está compuesto por:

- Usos operativos, incluyendo camiones cisternas y desobstructores: 14.237 m³/d
- Usos previsión bomberos: 36.876 m³/d
- Usuarios en proceso de regularización en el sistema comercial fue 597.809 m³/d, de los cuales:
    - 549.089 m³/d corresponden a barrios UREM,
    - 9.905 m³/d a barrios cerrados en el distrito Pilar y
    - 38.815 m³/d a usuarios con stop de facturación

Se registra una variación del **+0,1%** respecto del año 2024 impulsado por los Usos Operativos que registra un aumento del +33,5% asociado a lavados por habilitación de grandes conductos en Tigre y la incorporación de consumo en Barrios cerrados de Pilar, a su vez. En detrimento, se registra una disminución del -3,7% del

consumo UREM a raíz de la actualización del padrón de barrios mencionada previamente, tal como se observa en la Figura siguiente.

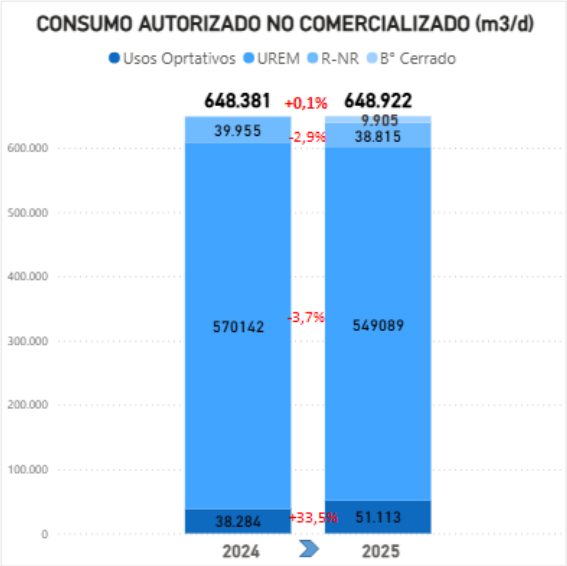

1.7.2.3.4. Submedición metrológica – Consumos No Autorizados – Inexactitud en el tratamiento de los datos de consumo

En este apartado se presentan las componentes de las Pérdidas Aparentes, cuya evolución explica los resultados del indicador en el año 2025.

a) Inexactitud en la medición de los datos - Submedición metrológica

La Dirección Comercial actualizó los coeficientes de submedición metrológica utilizados incorporando los resultados obtenidos en los ensayos y estudios desarrollados por el Laboratorio de Calibración de Medidores sobre el parque de medidores en servicio.

Esta actualización permitió ajustar la estimación de pérdidas aparentes a condiciones más representativas del comportamiento real de los equipos de medición instalados en el área de concesión.

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Inexactitud en la medición de los datos - Submedición metrológica (Fuente: Dirección Comercial)	[m^3/día]	141.907

b) Consumo No Autorizado

Este segmente es el agua tomada del sistema de distribución sin la autorización de la empresa de AySA. El consumo no autorizado es uno de los componentes de las pérdidas aparentes. Puede incluir:

a. Agua extraída (sin autorización) de los hidrantes.
b. Conexiones ilegales o clandestinas
c. Fraudes, tales como derivaciones a los medidores de los usuarios (by-pass), manipulación del equipo de lectura del medidor, o acciones similares.

Para su determinación, la Dirección Comercial utiliza coeficientes bibliográficos (0,5% del consumo total).

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Consumo No Autorizado (Fuente: Dirección Comercial)	[m^3/día]	47.660

c) Errores sistemáticos en el manejo de datos por sistema de lectura y/o facturación


El volumen de agua contemplada en este concepto se calcula a partir de coeficientes bibliográficos (0,25% del consumo total), lo que resulta en un valor de **8.958 m³/d.**, incorporándose además aquellos desvíos que son detectables y medibles.

En ese sentido, en el año 2024 se incorporaron a este segmento los denominados “Consumos Cero”, es decir, el consumo de aquellos usuarios medidos que presentan consumos registrados iguales a cero como consecuencia de incidencias que impiden efectuar una lectura válida del medidor y que no son facturados. Para estos casos, la Dirección Comercial estima los consumos utilizando como referencia los últimos consumos reales registrados por cada usuario.

Durante el año 2025, a expensas de la disponibilidad de medidores y con una fuerte estrategia operativa de recambio de medidores se ha producido una baja considerable de este segmento de pérdida registrándose para el año **1.484 m³/d** como valor promedio anual.

Concepto	Unidad	Resultado 2025
Error sistemático en el manejo de datos por sistema de lectura y/o facturación (Fuente: Dirección Comercial)	[m^3/día]	10.442

En las Tablas y Figuras siguientes se presentan los valores calculados por componente y su evolución respecto al año 2024:

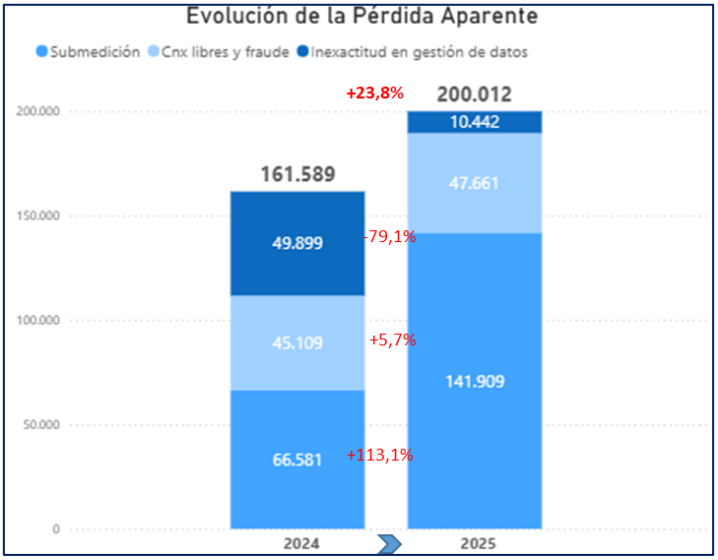

Concepto	Unidad	Valor 2024	Valor 2025	Δ2024-2025
Submedición metrológica	[m3/día]	66.581	141.907	+113,1%
Consumo no autorizado	[m3/día]	45.109	47.660	+5,7%
Error de lectura/facturación	[m3/día]	49.899	10.442	-79,1%

En resumen, la evolución interanual de las pérdidas aparentes estuvo influenciada principalmente por la actualización de los coeficientes de submedición metrológica y por el trabajo de recambio de medidores que

significaron la reducción de “consumos cero”. Por tal motivo, las diferencias observadas entre 2024 y 2025 reflejan tanto cambios en la magnitud en la calidad de la información utilizada para su determinación como de resultado de trabajos reales en campo para reducción de estos volúmenes de pérdidas.

1.7.2.4. Conclusiones de Gestión del Balance de Agua e Indicadores 2025

El Balance de Agua 2025 refleja una mejora sustancial en la calidad, consistencia y confiabilidad de la información utilizada para la determinación de los principales indicadores de gestión del sistema de distribución. La actualización de variables estructurales, la revisión de metodologías de cálculo y la validación de consumos y parámetros operativos permitieron reducir significativamente la incertidumbre asociada al Balance, incrementando la representatividad de los resultados obtenidos.

El sistema mantuvo niveles estables de agua entregada a la red, aun en un contexto de variabilidad climática y cambios en los patrones de demanda, evidenciando una mayor capacidad de gestión operativa mediante la regulación de bombeos, la gestión de presiones y el seguimiento de los consumos. Asimismo, el Índice de Confiabilidad del Balance continuó su tendencia positiva, consolidando un marco técnico más robusto para la evaluación de los indicadores de Agua No Contabilizada, pérdidas reales, pérdidas aparentes y dotación.


Los resultados alcanzados permiten disponer de una línea de base más sólida para la toma de decisiones y la priorización de inversiones, fortaleciendo el enfoque de gestión integral del binomio oferta-demanda. En este sentido, se ratifica la necesidad de profundizar las acciones de macromedición, sectorización, control activo de pérdidas, optimización energética, gestión de presiones y mejora continua de la medición comercial, como ejes estratégicos para incrementar la eficiencia hidráulica, operativa y económica del sistema, contribuyendo a la sostenibilidad del servicio en el mediano y largo plazo.

1.7.3. Plan de Acción de Agua No Contabilizada (ANC) – Avances 2025


Durante el año 2025 los trabajos asociados al Plan de ANC se enmarcaron en el “Plan de Acción de Transición”, aprobado en el Directorio de la empresa el día 16/04/2025.

Los avances del Plan de Agua No Contabilizada se ajustan a las premisas de dicho Plan. No obstante, cabe destacar que los ejes de acción continúan basándose en las estrategias propuestas por la IWA en “The IWA Water Loss Task Force. Water 21-Article n6. Assessing Real Losses, incluiding Component Analysis and Economic Considerations: A practical Approch”, habiéndose afectado fundamentalmente la temporalidad y las cantidades de los mismos.

El esquema siguiente ilustra los pilares de la gestión de pérdida real o física tendientes a controlar el agua no contabilizada y, en definitiva, ajustar la dotación de agua y llevar a cabo una gestión eficiente del sistema.

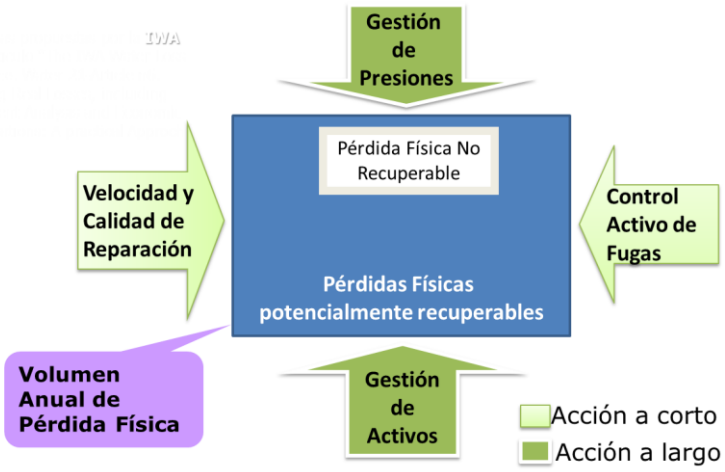

Los ejes de acción se resumen en el siguiente esquema, habiéndose afectado fundamentalmente la temporalidad y las cantidades de los mismos.

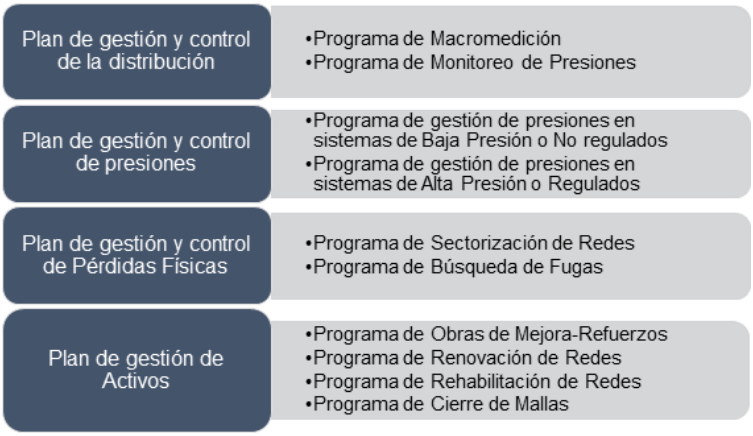

En los apartados siguientes se detallará el avance realizado durante el año 2025 en cada uno de los planes.

1.7.3.1. Gestión y Control de la Distribución

El eje está centrado en asegurar un balance confiable que permita mejorar el cálculo del rendimiento y del Volumen Actual de Pérdidas Reales Anuales del sistema de distribución, identificar donde y cuando actuar en el sistema (estructural o hidráulicamente) y mensurar efectivamente el impacto de las acciones ejecutadas. El eje contempla continuar confiabilizando el sistema de Macromedición existente e incorporar nuevos puntos estratégicos de medición -con el fin de realizar un macro-balance confiable a nivel región, distrito y sectores hidráulicos y una mejor evaluación de los niveles de servicio.

El Plan está compuesto por diferentes acciones según se trate de medición de caudales “Macromedición” o de “Monitoreo de Presiones”, y en función de donde se localiza el punto de control: Salidas de Estaciones Elevadores o Plantas, Transferencias entre Distritos, Centros de Distribución, Válvulas Reguladoras, Sector y/o Subsector Hidráulico. Tienen como objetivo:

- Asegurar la calidad de la medición de los volúmenes de agua bombeada manteniendo una certidumbre conocida y aceptable.
- Medir la demanda en cada distrito con un grado de certidumbre conocida y aceptable.
- Medir sectores y/o subsectores hidráulicos que permitan sectorizar sistemas de distribución actualmente integrados.
- Medir presiones de servicio.

1.7.3.1.1. Programa de Macromedición Agua Entregada a la Red

Este Programa tiene como objetivo mejorar el conocimiento del sistema de distribución a través de la confiabilización del sistema de Macromedición existente y la incorporación de nuevos puntos estratégicos de medición con el fin de realizar un macro-balance confiable a nivel región, distrito y sectores hidráulicos.

Los puntos de control pueden localizarse en diferentes puntos del sistema de distribución y en función de ello varía el tipo de trabajo a ejecutar, a saber:

- *en Salidas de Estaciones Elevadoras o Plantas,*
- *en Transferencia entre Distritos,*
- *en Salidas de Centros de Distribución*
- *en Válvulas Reguladoras,*

- *en sectores hidráulicos:* DMAs (District Metered Areas) o PMAs (Pressure Management Areas),
- *en puntos no permanente o móviles.*

Macromedición Fija o Permanente

En el programa se diferencian distintos grupos de puntos por lo que las acciones se definen segmentados en cada uno de ellos.

a) Macromedición Fija en Salidas de Estaciones Elevadoras o Plantas tiene como objetivo otorgar precisión y fiabilidad al cálculo de la dotación y de la segmentación del balance a partir de la confiabilización del dato de agua entregada mediante medición con tecnologías con incertidumbre menor o igual a ±0,5%.
b) Macromedición Fija en Transferencia entre Distritos tiene como objetivo otorgar precisión y fiabilidad al cálculo de la dotación y de la segmentación por Distritos utilizados para el cálculo del balance, mediante medición con tecnologías con incertidumbre entre ±0,5% a 2% y transmisión en todos los puntos.
c) Macromedición Fija en Válvulas Reguladoras tiene como objetivo otorgar precisión y fiabilidad al dato de caudal de salida de válvulas reguladoras mediante la instalación o rehabilitación de la medición con incertidumbre menor o igual a ±0,5% y transmisión en todos los puntos.

Los programas pueden contemplar la rehabilitación integral del punto, lo que incluye la provisión de equipos de medición, las obras civiles, equipamiento soporte e instalaciones eléctricas, sistema de comunicación y/o telemetría, o la rehabilitación parcial implicando algunas de las etapas anteriormente descriptas.

La tabla siguiente muestra el avance del Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Macromedición, en función de puntos instalados.

Durante el año 2025, se llevaron a cabo reemplazos de caudalímetros en válvulas reguladoras:

- Uno (1) VR Calzada: octubre 2025
- Dos (2) VR Pampa: abril 2025 / octubre 2025

Desde el inicio del programa a los efectos de mantener los logros alcanzados, se han instalado **158 macromedidores** de caudal.

Caudalimetro, Magneto Inductivo de CARRETE	Cronograma de avance anual																		
	Plan original	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total Instalados
Estacion Elevadora y Plantas	50	1	1	9	13	12	5	4	3		1		1		1				51
Transferencia entre Distritos	41			7	2	8	12	2		1	2				2				36
Valvulas Reguladoras	23				10	3	1	3	5	20	9	10	1		3	1	3	2	71
TOTALES	114	1	1	16	25	23	18	9	8	21	12	10	2	0	6	1	3	2	158

Estos puntos de control no amplían el porcentaje de confiabilidad del balance de agua global pero impactan en el mantenimiento del Índice de Confiabilidad del Balance de agua y la distribución del agua entregada, permitiendo gestionar en forma eficiente el área abastecida.

El mantenimiento de la Red de Macromedición tiene diferentes responsables según donde se ubique el punto de control. Ello implica un gran esfuerzo de coordinación al momento de asegurar el índice mencionado.

En todos los casos la responsabilidad primaria recae en los operadores de la infraestructura que contiene el punto de control, a saber: Dirección de Agua-Establecimientos (salidas de Plantas y Estaciones Elevadoras), Dirección de Agua-Control Centralizado (Transferencias entre Distritos), Dirección de Grandes Conductos (Válvulas Reguladoras), DOR y DI (DMAs-PMAs). A su vez, colaboran en el proceso la Dirección de Ingeniería (adquisición de equipos y coordinación de puesta en marcha), Dirección Grandes Conductos (montaje y piezas especiales) y DAL (comunicaciones y telemetría).

Los avances mencionados se corresponden con la macromedición de agua superficial, el eje de acción para la confiabilización del agua de origen subterráneo forma parte de un plan de acción propio de la Dirección de Agua.

Macromedición fija o permanente en DMA (District Metered Area)

Son puntos de medición de caudal y presión en puntos de INGRESO Y EGRESO de DMAs (District Metered Area, por sus siglas en inglés) en cañerías diámetros entre 150mm y 400mm.

Se utilizan caudalímetros electromagnéticos de inserción o certidumbre mayor, con datos transmitidos por telemetría. Es decir que los datos son registrados por el medidor, almacenados en el registrador y transmitidos por un sistema de comunicación 3G.

Al cierre de diciembre de 2025, se cuenta con un total de 130 puntos de monitoreo de caudal, de los cuales 43 disponen de medición continua y 64 puntos con recambio de equipo pendiente debido a la falta de stock. Los puntos restantes (23) corresponden a ingresos que fueron cerrados como parte de un proceso de optimización, quedando las cámaras disponibles para su utilización cuando resulte necesario.

En el marco del programa de mantenimiento de estos puntos de medición de caudal se realizó un total de **195 intervenciones** en el año para asegurar la disponibilidad del dato, tanto de caudal como de presión. A modo resumen se mencionan los tipos de actividad:

- Recambio de equipo por mal funcionamiento
- Retiro de equipo
- Envío forzado de datos
- Reemplazo tarjeta SIM
- Verificación configuración equipo
- Relevamiento de cámara (vaciado, estructura, otros)

La responsabilidad primaria de la actividad recae en el área Sectorización Redes de la Gerencia Agua No Contabilizada de la Dirección de Ingeniería.

Macromedición fija o móvil en estudios

Al cierre del año 2025, se cuenta con campañas de medición en puntos que no forman parte del parque de Macromedición Fija/ móvil (PPQ y PPP) o de Macromedición fija en DMA, pero que son necesarios por algún tipo de estudio, a saber:

- ✓ Línea Villa Ballester – D° San Martin / DRN
- ✓ Línea Montañeses - D° Belgrano / DRCF
- ✓ Estudos de macromedición de Válvulas reguladoras VR1 y VR2 (EE Bernal 1) - VR12 (EE Bernal 4) - D° Quilmes / DRSE
- ✓ Línea Saavedra Superí- Villa Adelina / DRN
- ✓ Medición en ocasión de maniobras TREQP06 y TREQP07 – D°Tres de Febrero / DRO
- ✓ Medición en ocasión de maniobras DN 1200 Refuerzo Devoto - San Martín / DRCF&DRN
- ✓ Mediciones en puntos estratégicos - 24 hs
- ✓ Estación de medición AVEQP06, AVEQP07, AVEQP14, CABQP09, FLOQP14, DEVQP14, FLOQP9
- ✓ Verificación de caudal salida EE Tres de Febrero.
- ✓ Verificación de caudal salida EE Quilmes
- ✓ Medición de caudal en cañería DN1100 D° San Fernando /DRN
- ✓ Medición en Acueductos - Tigre Centro y Pacheco Benavidez
- ✓ Medición con equipos ultrasonido en grandes usuarios y D° San Fernando.

1.7.3.1.2. Programa de Medición UREM (urbanizaciones residenciales emergentes)

El programa se enfoca en confiabilizar la demanda de agua en las UREM. A la fecha el consumo de este tipo de urbanizaciones se estima teniendo en cuenta la dotación de agua, población abastecida y tipología de urbanización.

En el año 2024, coordinado por el área de Desarrollo de la Comunidad, en conjunto con la Dirección de Ingeniería y las áreas regionales, se comenzó un programa para lograr la medición del agua entregada en urbanizaciones de distintas regiones. El trabajo abarca aspectos comerciales y técnicos. A continuación, se detallan las etapas llevadas a cabo desde el área técnica:

- Análisis del catastro de redes que abastecen a la UREM.
- Relevamiento de cañerías que no forman parte del patrimonio de AySA pero que pueden estar relacionados con el abastecimiento de la zona.
- Identificación de puntos a medir.
- Mediciones puntuales y balance preliminar.
- Implementación de puntos de medición permanente en los casos que pueda quedar sectorizada el área.
- Instalación de equipos de monitoreo on-line (caudal y presión).


Durante el año 2025, se trabajó en veintitrés (23) UREM lográndose medir el agua entregada en doce (12) de ellas, de las cuales a la fecha tres (3) cuentan con medición on-line.

Dirección Regional	Barrio	En estudio	Medición de caudal	
DRCF	Los Piletones	X		
	Las Palomas		X	
	Barrio Calaza		X	
	Barrio 31	X		
	Barrio 1-11-14	X		
	Rodrigo Bueno	X		
	Barrio 20	X		
	Total DRCF	**5**	**2**	**7**
DRN	Villa el Garrote		X	
	La Carcova		X	
	Sagrada Familia		X	
	San Luis	X		
	La Escondida	X		
	Martin Fierro	X		
	Barrio Esperanza		X	
	Tropezón		X	
	Total DRN	**3**	**5**	**8**
DRSE	Barrio Itati		X	
	Villa Tranquila	X		
	Villa Lujan		X	
	Villa Lujan 1	X		
	Barrio Nestor Kirchner		X	
	Villa Azul	X		
	Total DRSE	**3**	**3**	**6**
DRSO	La Herradura		X	
	Barrio 8 de Diciembre		X	
	Total DRSO	**0**	**2**	**2**
	TOTAL	**11**	**12**	**23**


Los datos obtenidos fueron incorporados al modelo de Balance de Agua tal como se ha mencionado en apartados anteriores.

Adicional a la acción mencionada, en los casos en que se cuenta medición on-line del ingreso de agua se han realizado estudios para caracterizar las curvas de demandas de dichas urbanizaciones. A continuación se presentan los resultados obtenidos:


- Villa 31 – CABA → Agua entregada promedio 2025 : 971 m³/h = 23.304 m³/día

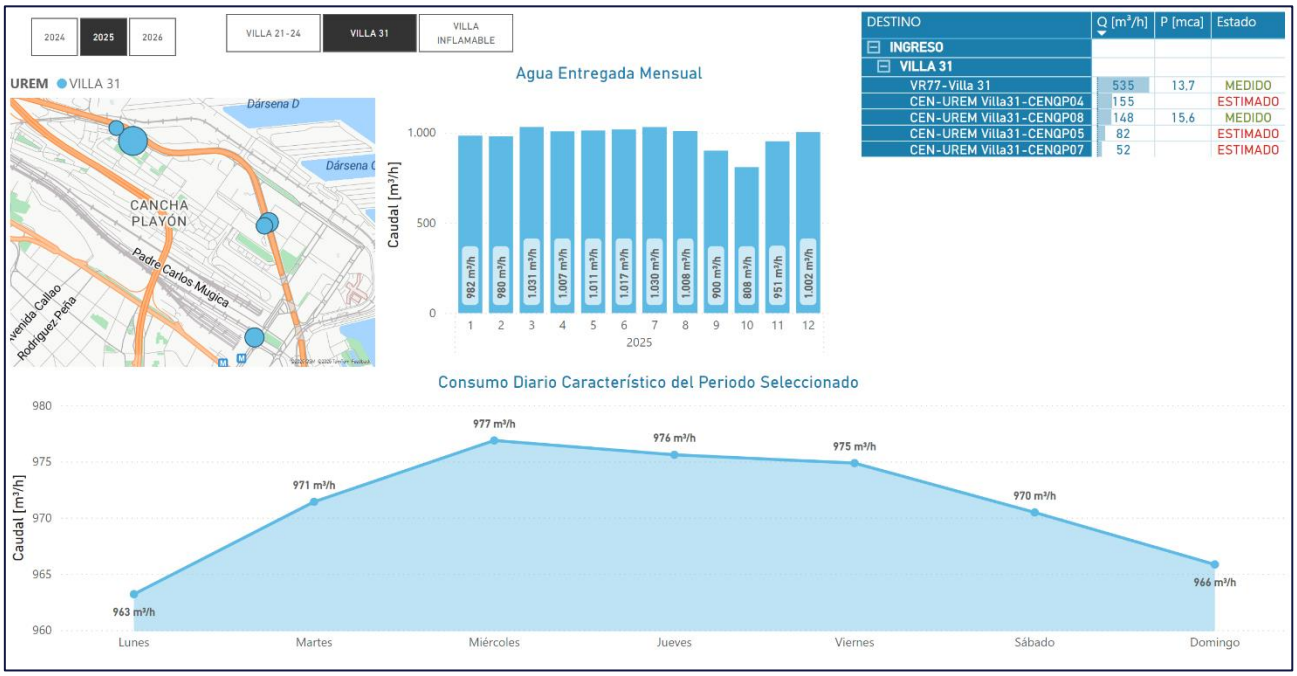

- Villa 21-24 – CABA → Agua entregada promedio 2025: 1.001 m³/h = 24.024 m³/día

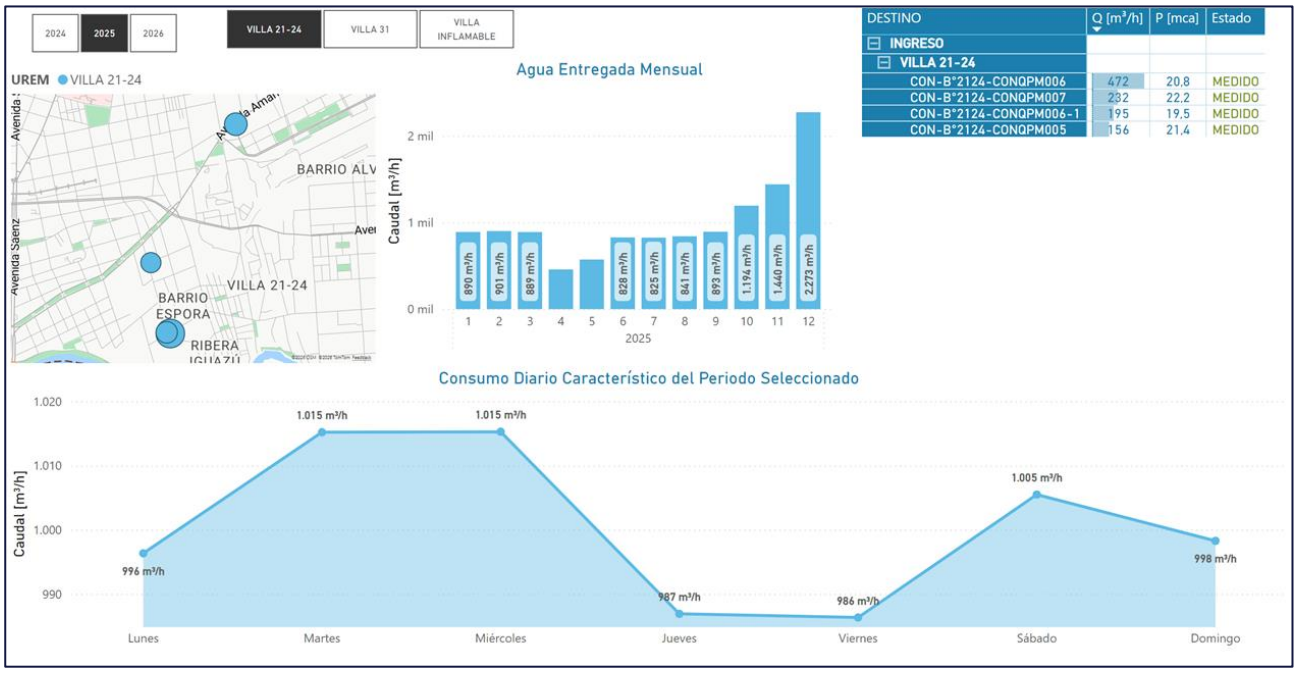

- Villa Inflamable – Avellaneda → Agua entregada promedio 2025: 75 m³/h = 1.800 m³/día

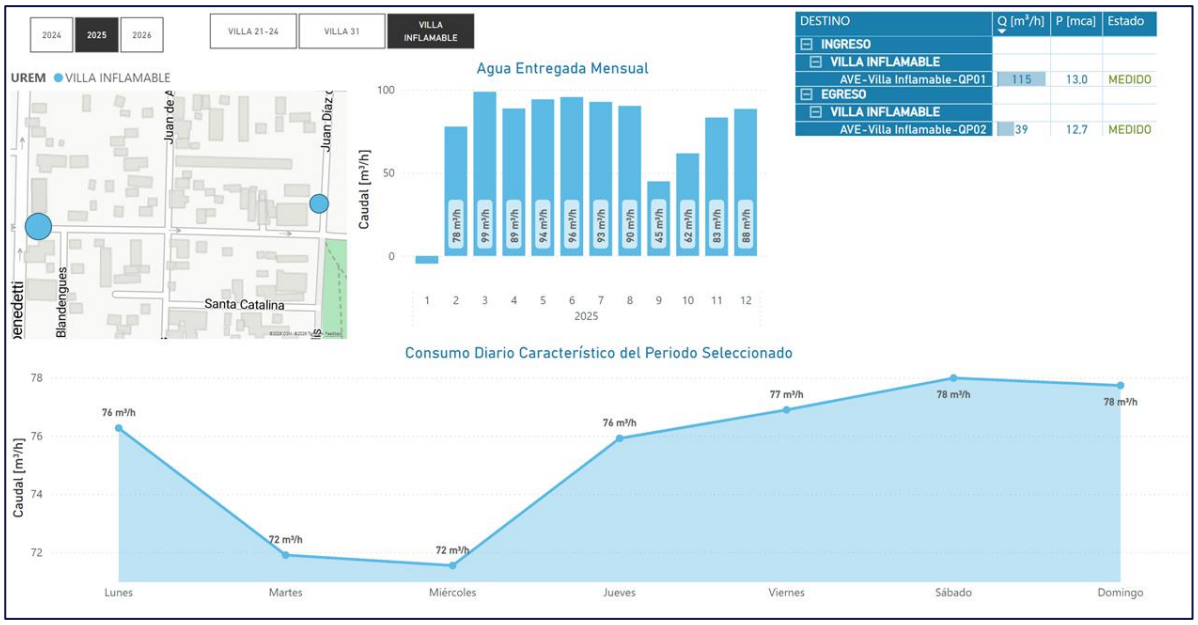

1.7.3.1.3. Programa de Monitoreo de Presiones

El monitoreo diario de las presiones de servicio y su caracterización por áreas hidráulicas (mallas, sectores, distritos, sistemas) es una variable fundamental para diagnosticar el estado de la infraestructura así como también, para evaluar el impacto de los ajustes del bombeo y del transporte de agua.

Para ello se utilizan diferentes puntos de medición de presión en el sistema de distribución algunos instalados con carácter de permanentes y otros móviles.

Para la medición de la presión continua, se utilizan sensores de presión combinados con registradores multipropósito que permiten la monitorización de presiones on-line con tecnología 3G.

Puntos permanentes de medición de presión (PPP)

En estos puntos se mide la presión en forma continua con transmisión on-line al SCADA. Cada punto de medición monitorea la presión característica de un grupo de mallas.

En la tabla siguiente se detalla la cantidad de Puntos de Monitoreo de presión existente al cierre del año 2025, según el tipo de infraestructura donde se encuentra instalado el registrador (PPP: punto permanente de presión; VR: válvula reguladora; PPQ: punto permanente de caudal) y según la distribución geográfica (por Dirección Regional):

	"AySA 2015"			"Nuevas Áreas"	AySA Total		
Región	PPP	VR	PPQ	PPP	PPP	VR	PPQ
CAPITAL	61			0	61		
NORTE	62	1	2	11	73	1	2
OESTE	65			12	77		
SUDESTE	54			10	64		
SUDOESTE	43			3	46		
SubTotal	285	1	2	36	321	1	2
Total	288			36	324		

A nivel de la red de monitoreo de presiones necesaria para el cálculo del indicador de "% Mallas con presión satisfactoria", al cierre del año 2025, el **79% de las mallas** cuenta con monitoreo de presiones, en tanto que un 21% de mallas aún tiene pendiente de tener un punto de monitoreo asociado.

Se continuará trabajando para reducir ese porcentaje de mallas sin PPP, implementando nuevos puntos de monitoreo, lo que implica la adquisición de equipamiento y la ejecución de cámaras para su instalación.

Los resultados del monitoreo se detallan en el apartado de Mapeos de Presiones del Informe Niveles de Servicio.

Puntos permanentes de presión en DMAs

En estos puntos se mide la presión con transmisión on-line al SCADA en puntos de ingreso y egreso de agua en DMAs, eventualmente puede contarse con un punto de medición de presión característico dentro de la red de la DMA. En total se cuenta con **130 puntos de monitoreo de presión** en ingresos y egresos de DMAs, de los cuales 70 poseen medición continua y 60 requieren recambio de equipos.

El programa de mantenimiento es similar al descripto en Medición Fija en DMA (District Metered Area) ya que se instalan en simultáneo el punto de medición de caudal y el punto de medición de presión. Las intervenciones mencionadas en dicho apartado corresponden a trabajos de ambos universos de medición.

1.7.3.2. Gestión y Control de las Presiones

AySA cuenta con un **Comité de Gestión de Presiones**, liderado por la Dirección de Ingeniería y la Dirección de Agua, con la participación de todas las áreas técnicas involucradas en la operación y gestión del sistema de abastecimiento. Su finalidad es consensuar e implementar estrategias operativas que permitan optimizar el funcionamiento del sistema mediante una adecuada gestión de las presiones.

El principal objetivo consiste en adecuar la curva de oferta a la curva de demanda a través de la regulación de las presiones diurnas y nocturnas, garantizando los niveles de servicio requeridos y promoviendo un uso más eficiente de la infraestructura existente.

En este marco, el Plan de Gestión de Presiones contempla acciones orientadas a la macrosectorización de las áreas de abastecimiento, la incorporación de tecnologías de regulación y monitoreo, y la implementación de medidas operativas que permitan alcanzar la presión mínima suficiente para asegurar la calidad de prestación del servicio. Estas acciones contribuyen simultáneamente a reducir la ocurrencia y magnitud de pérdidas físicas en redes y conexiones domiciliarias.

Se han previsto acciones diferenciadas según se trate de un sistema de baja presión (sistemas no regulados) o de alta presión (sistemas regulados).

- ***Programa de Gestión de Presiones en sistemas de baja presión*** se definen regulaciones estacionales y diurnas/nocturnas para la mayor parte de las Estaciones Elevadoras. En simultáneo, la Dirección de Agua ha establecido un programa de instalación de Variadores de Velocidad en una o más bombas en las diferentes Estaciones Elevadoras con el objetivo de optimizar la regulación de oferta de agua en la zona de influencia de la Estación Elevadora involucrada.
- ***Programa de Gestión de Presiones en sistemas de alta presión*** tiene como objetivo optimizar la regulación de presiones en zona de influencia de válvulas reguladoras mediante la implementación de sistemas inteligentes de regulación. lo que permitirá ajustar el agua bombeada al sistema incrementando la oferta en horarios de mayor demanda y reduciéndola en horarios de mínimos consumos.

A nivel de sistemas de Baja Presión, desde el año 2018 se adoptó como estrategia la implementación de Variadores de Velocidad. Al finalizar el año 2025, se cuenta con la instalación de motores con variador de velocidad en al menos una bomba de las siguientes Estaciones Elevadoras:

- EE Lanús-Salida Lanús-Temperley
- EE Floresta
- EE Constitución
- EE Caballito, implementada en el año 2025

- EE Centro, temporariamente fuera de servicio


Además, desde el año 2013, la Planta Juan Manuel de Rosas posee variador de velocidad en las 8 bombas de salida de las impulsiones.

La implementación del programa está a cargo de la Dirección de Agua.

A nivel de sistemas de Alta Presión, se tiene como objetivo optimizar la regulación de presiones en el área de influencia de las válvulas reguladoras existentes, mediante la implementación de nuevas tecnologías de regulación que permitan ajustar el agua bombeada a la demanda del sistema incrementando la oferta en horarios de mayor demanda y reduciéndola en horarios de mínimos consumos.

En sistemas regulados o de alta presión se ha definido como estrategia la implementación de Sistemas Inteligentes de Regulación modulada horaria mediante la instalación de PLC o Controladores con comando a distancia, emplazado sobre el piloto de válvula reguladora nueva o existente de manera tal que permita regular a demanda el funcionamiento de la válvula y en consecuencia del agua erogada por ella

La Figura siguiente detalla las válvulas de los diferentes sistemas, sus áreas de influencia y el tipo de controlador con que se regula el funcionamiento de la misma.

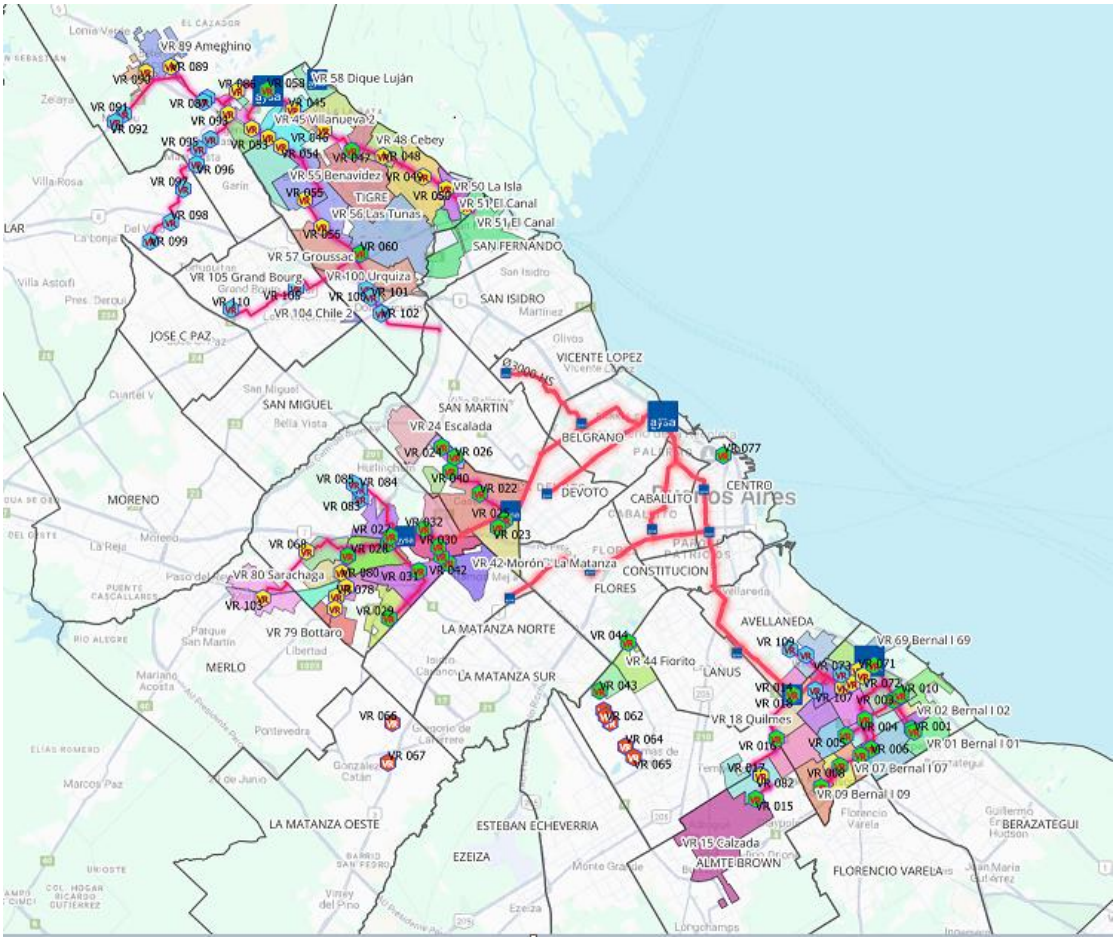


Al cierre de diciembre 2025 se cuenta con **75 válvulas reguladoras** de presión en servicio, el 92% cuenta con regulación modulada horaria y 8% con regulación piloto día/noche:

- Treinta seis (36) funcionan con Controladores Inteligentes Pegasus (verde)
- Treinta y tres (33) funcionan con PLC (amarillo)
- Seis (6) funcionan con pilotos mecánicos (rojo)

Además existen numerosas VRs en ejecución (celeste) de las cuales dos (2) VRs ya se encuentran instaladas en proceso de habilitación de las redes a las cuales abastecerán:

- Sistema PJMR – Acueducto Pacheco / Benavídez - VR Villanueva 1
- Sistema PSM - EE Morón – VR 85 Poeta Risso

Para asegurar el funcionamiento del equipamiento integral de regulación modulada horaria, durante el año 2025 se realizaron seis (6) recambios de controladores inteligentes remotos Pegasus completos más dos (2) cajas de solenoide adicionales, tres (3) caudalímetros de inserción y un (1) registrador de presión instalado en punto crítico. Para lo cual fueron realizadas 81 asistencias en terreno. En la siguiente Tabla se puede resume la actividad del año.

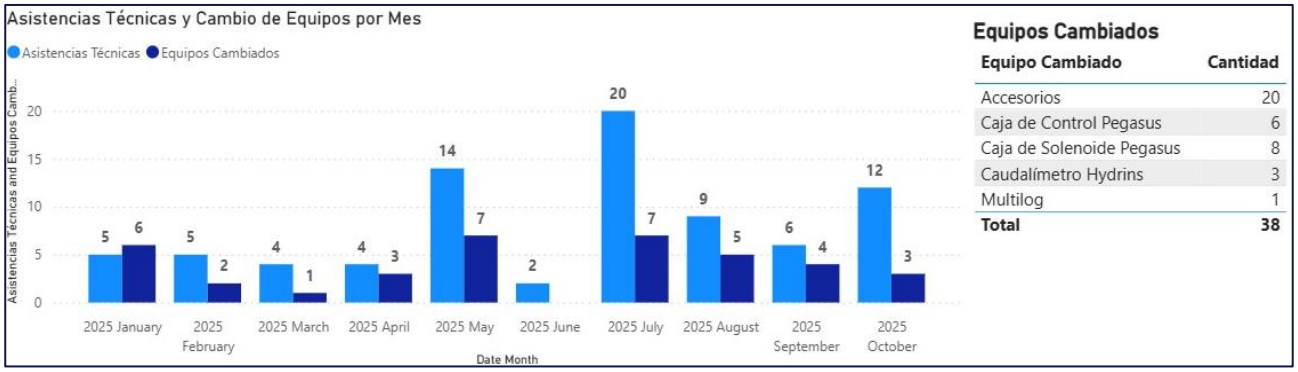

Equipos Cambiados

Equipo Cambiado	Cantidad
Accesorios	20
Caja de Control Pegasus	6
Caja de Solenoide Pegasus	8
Caudalímetro Hydrins	3
Multilog	1
Total	**38**

1.7.3.3. Gestión y Control de las Pérdidas Físicas

El Plan se centra en el desarrollo de estrategias de **sectorización** de la red para localizar las áreas con mayor potencial de pérdidas e implementar técnicas de **búsqueda y reducción de fugas** incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías para su detección y eliminación de pérdidas reales. El Plan de Acción de Transición 2024-2026 implicó un ajuste de las metas no obstante se continuaron los ejes de acción.

- ***Programa de Sectorización de redes:*** implementa la sectorización de redes por sectores hidráulicos DMAs para tener una localización temprana de fugas. El Programa contempla la elaboración de Planes de sectorización por distritos, planificación y ejecución de tareas para la puesta en funcionamiento de las DMAs, optimización del funcionamiento y monitoreo permanente de los resultados.
- ***Programa de Búsqueda y Reducción de fugas:*** implementa métodos eficientes para la detección y localización de fugas, se contemplan además las inversiones necesarias para su reparación. El programa abarca también la búsqueda de nuevas tecnologías y metodologías que permitan incrementar la eficiencia en este proceso.
-

1.7.3.3.1. Programa de sectorización de redes (DMA)

La sectorización de redes de distribución contempla la implementación de sectores hidráulicos denominados DMAs[3].

[3] District Metered Area, por sus siglas en inglés


Las DMA tienen como característica ser un área sectorizada hidráulicamente aislada del resto de la red con puntos de control de ingreso y egreso de caudal de agua y presión del servicio monitoreados en forma permanente.

El control de ingresos y egresos permite establecer un balance confiable del agua entregada a la zona, calcular las pérdidas con mayor precisión, localizar y eliminar pérdidas aparentes y pérdidas reales, y fundamentalmente monitorear la evolución de las variables hidráulicas.

El programa cuenta con varias etapas:

- Planificación - sectorización por DMA/PZA
- Implementación y optimización - planificación y ejecución de tareas para la puesta en funcionamiento
- Monitoreo y Detección temprana - monitoreo permanente de los resultados

En el año 2025, el programa de Sectorización de redes alcanza un total de **54 DMA** -en diferentes etapas-, equivalente a una longitud sectorizada acumulada de **1.324 km.**

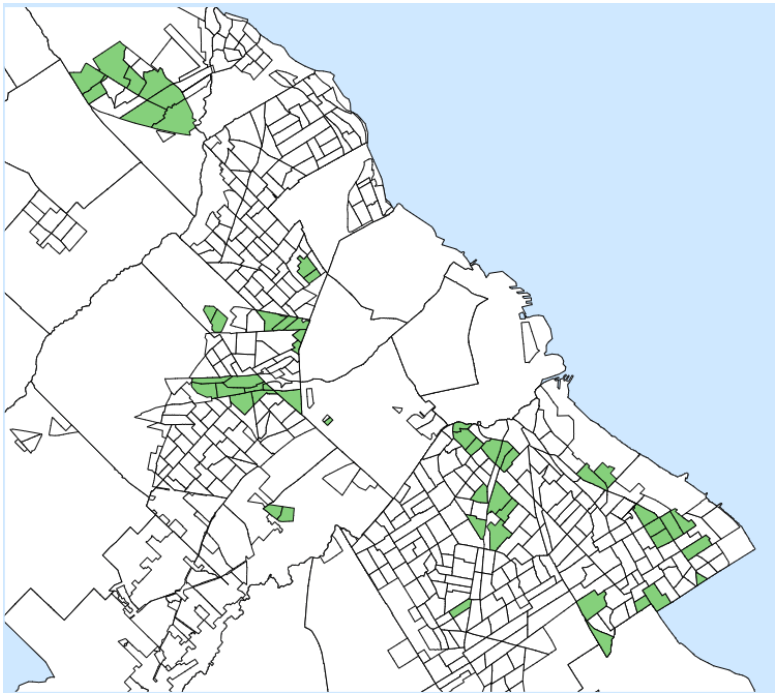

En este programa se desarrolló una Iniciativa de Eficiencia orientada a la optimización de las DMAs. Para ello se definió una estrategia de intervención focalizada sobre los distritos identificados como críticos en términos de desempeño hidráulico. A partir de dicho diagnóstico, se seleccionó un conjunto de DMA prioritarios, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y reducir el nivel de perdidas reales hasta alcanzar el valor meta de 30 m³/día/km.


La metodología de trabajo propuesta contemplo una planificación progresiva y sistemática, estableciendo como criterio inicial la concentración de los trabajos en una DMA cada dos meses por distrito, lo que permitió ordenar los recursos disponibles, evaluar resultados parciales y ajustar las acciones correctivas en función del comportamiento hidráulico observado.

Los principales trabajos realizados fueron:

- Relevamiento de obra: Verificación de perímetros, maniobrabilidad de válvulas de cierre permanente para confirmar la estanqueidad
- Pruebas de cierre de puntos de ingreso/egreso de DMA optimizando la cantidad de macromedidores
- Sectorización parcial de DMA para detección de sectores con mayor nivel de pérdidas y mejor priorización de acciones para mitigarlas.


- Prueba de funcionamiento: verificación de ingreso no medido.
- Verificación de vínculos entre Distritos/Regiones: Renovación de válvulas de cierre permanente a causa de detectarse pasaje de Caudal.
- Verificación estanqueidad en Áreas de influencia de VR conformando DMA renovadas.
- Implementación de la plataforma “Water Loss Managment” para la gestión de las DMAs

A diciembre de 2025 se completaron los trabajos de optimización en seis (6) DMAs, distribuidas cuatro (4) en DRO (LMN-DMA003, LMN-DMA004A, TRE-DMA003 yTRE-DMA016) y dos (2) en DRSE (LAN-DMA016 y AVE-DMA017).

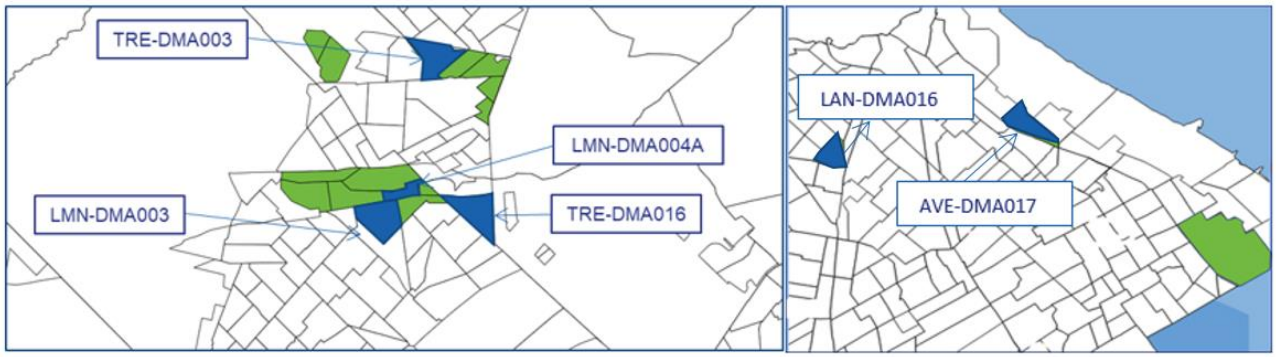


Adicionalmente, durante el segundo semestre se iniciaron trabajos en dos (2) DMA, una (1) perteneciente a la DRO y una (1) a la DRSE.

Los resultados 2025 reflejan una reducción sostenida de las pérdidas reales promedio de la Iniciativa, pasando de 148 m³/km/día → 112 m³/km/día, lo que representa una mejora significativa en el desempeño hidráulico de los sectores intervenidos.

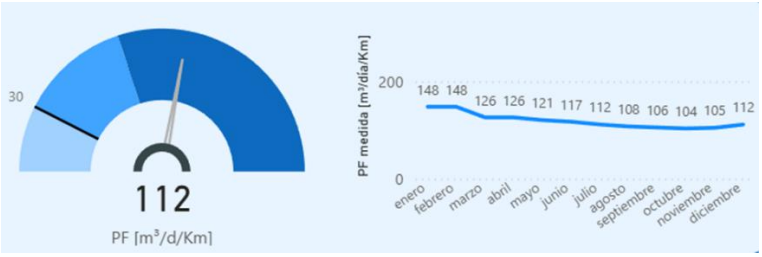

Las acciones implementadas permitieron alcanzar un volumen optimizado acumulado de **1.578.000 m³/año.** El volumen anual recuperado representa el **92 %** de la meta establecida para el período.

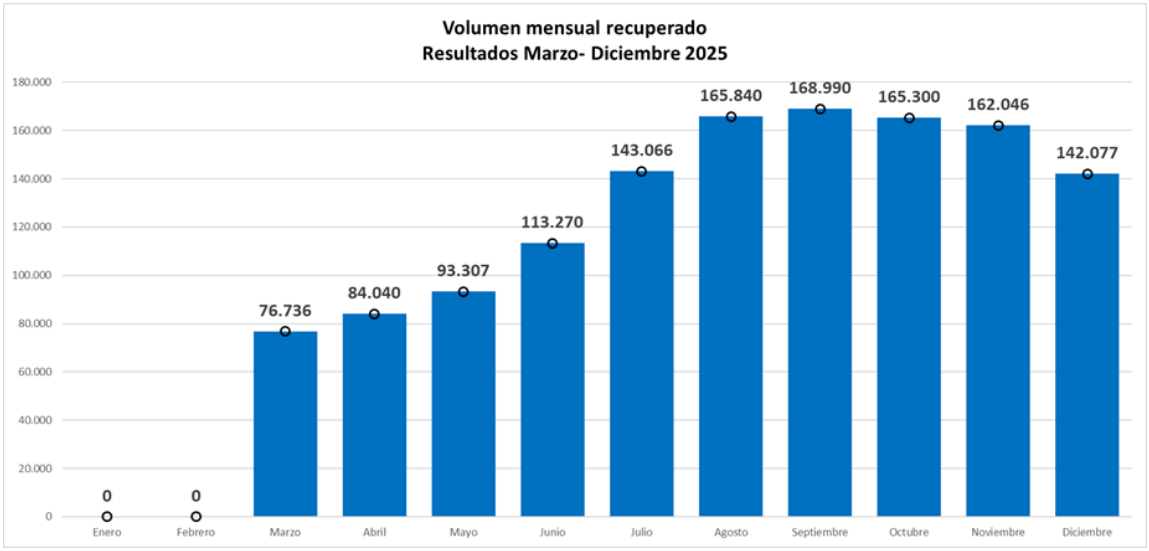

Como resultado de las acciones de detección temprana –posteriores a la optimización- se puede mencionar:

- Seis (6) fugas detectadas a partir de alertas por incremento de caudal mínimo nocturno identificadas en el monitoreo centralizado con la plataforma de gestión Water Loss Managment,
- Cuarenta y cinco (45) fugas localizadas por sensores de ruido permanente con transmisión on-line, cuarenta y tres (43) de las cuales se encontraban en conexiones y dos (2) en cañerías.

Se proyecta para el año 2026 la continuidad del monitoreo de todas las DMA con medición, continuar con los trabajos en las DMA priorizadas en el 2025 hasta alcanzar la meta de reducción de pérdidas, y sumar nuevas DMA a los trabajos de optimización.

1.7.3.3.2. Gestión de las Pérdidas Aparentes dentro DMA


En el marco de optimización de DMA, se definieron criterios que permiten el análisis y priorización de casos de interés con el objetivo de identificar y reducir las pérdidas aparentes y confiabilizar el consumo.

Criterios de análisis y priorización:

- Usuarios con consumo cero: permite identificar casos y evaluar los motivos.
- Usuarios R1-Residencial PV con consumos elevados: análisis de destino real, actualización de padrón comercial.
- Baldíos: análisis de uso real, actualización del padrón comercial y medición.
- Grandes Usuarios: análisis de destino y consumo, en caso de detectar inconsistencias se planifican acciones correctivas con las áreas correspondientes.
- Expedientes Residencial PV con superficie mayor a 10 mil m2: análisis de consumo y destino, medición y actualización de padrón comercial
- Usuarios NR-No Residenciales con mayor consumo según destino: permite identificar posibles fraudes.
- Usuarios Residencial PV con superficie cubierta igual a 0 m2: análisis de destino, actualización del padrón comercial.
- Barrios UREM: identificación y caracterización a fin de evaluar medición.
- Urbanización Cerrada: identificación y caracterización a fin de evaluar medición.

Durante 2025, se realizó análisis de 4.379 usuarios que representan el 9% del total de usuarios de 24 DMA implementada:

- Tres de Febrero: 6 DMA
- La Matanza Norte: 4 DMA
- Morón: 4 DMA
- Avellaneda: 5 DMA
- Lanús: 5 DMA

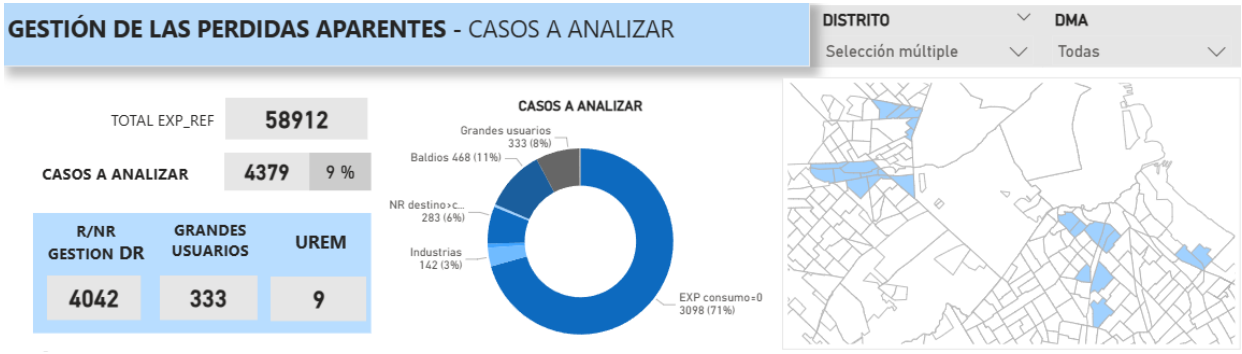

Del total de casos a analizar, los denominados “consumo cero” representan el **71%** de universo. Este universo se asocia a usuarios medidos sin medidor, a los que no se les pudo llevar a cabo el recambio del mismo, en general, por falta de stock, lo que impacta en el correcto registro del consumo.

Como resultado del trabajo coordinado con las Gerencia Comerciales de las Direcciones Regionales y la Gerencia de Grandes Usuarios, se avanzó en la confiabilización de datos comerciales. A continuación, se detallan los resultados más relevantes que impactan tanto en el registro de consumo como en la estimación:

Consumo cero: realizaron 2.014 recambios de medidores, de los cuales el 85% se concentran en DMA de la Dirección Regional Oeste que representa un recupero de **171.689 m3/año**.

Baldíos: de 306 casos analizados, se actualizó el destino de 128 casos en el padrón comercial, (42% de los casos analizados), el resto corresponde mantenerse como baldío sin consumo.

Expedientes Residencial PV con superficie >10.000 m2: se identificaron dos complejos de viviendas bajo régimen de facturación no medido:

- Vilanova Ramos Mejía – LMN-DMA003: se instaló medidor de estudio a fin de analizar comportamiento horario de este tipo de usuario.
- Vilanova Morón –MOR-DMA001: la Dirección Regional Oeste actualizó padrón catastro comercial y actualizó la estimación de consumo.

Grandes Usuarios:

- Hospital San Juan de Dios: instalación de medidor con registrador y cambio de régimen de facturación.
  Consumo no registrado → 27.756 m3/año

- Sanatorio Trinidad Ramos Mejía: como resultado del análisis del consumo medido y su relación m3/m2, la Gerencia de Grandes Usuarios detecta una conexión soterrada, que normaliza e instala medidor.
  Consumo no registrado → 21.360 m3/año.

- DIM/Atlas: durante el seguimiento y análisis de agua entregada al sector DMA, se detectó un aumento de caudal en la curva de AE de 11 m3/h, la medición del Hospital San Juan de Dios no explica ese incremento de Caudal mínimo nocturno. La Gerencia de Grandes Usuarios realizó una inspección de los usuarios próximos al hospital y detectó la conexión abierta en este predio demolido. Esta maniobra disminuyó el AE en 10 m3/h. Los escombros sobre la conexión impidieron la lectura y repaso de cálculo.
  Derroche interno → + 24.000 m3/año (Se considera el periodo de conexión abierta).

IMPACTO: REDUCCIÓN PÉRDIDA FÍSICA

El análisis y las acciones implementadas permiten confiabilizar el consumo de los usuarios y el padrón comercial, así como detectar pérdidas aparentes a fin de estimar con mayor precisión las pérdidas físicas en DMA.

1.7.3.3.3. Innovación – Herramienta de Gestión inteligente para la detección temprana de fugas

La plataforma Water Loss (WL) es la solución tecnológica para optimizar el ciclo completo de gestión de fugas dentro de una empresa de agua. WL permite aprovechar los datos de la red provenientes de múltiples fuentes de información (interfaces) para detectar fugas y mejorar los tiempos de respuesta.



Los principales desafíos que aborda la solución del WL se resumen en los siguientes apartados:

- Simplifica los cálculos de las fugas y el del balance de agua de los sectores hidráulicos.
- Mejora los tiempos de respuesta del sistema: gracias al módulo de alarmas, los operadores de red pueden detectar anomalías y problemas quasi en tiempo real, lo que mejora la respuesta del sistema.
- Mejora los procesos del Control Activo de Fugas y los procesos de Reparación de Fugas pasando de una gestión puramente reactiva a una gestión activa, anticipando los trabajos de detección antes de que se produzca un problema real o sea reportado por un cliente.
- Permite una supervisión constante de la red gracias a los módulos de Monitorización. El primer paso para resolver un problema es ser consciente de que existe un problema.

Durante el año 2025 se continuó trabajando en la implementación de la herramienta tecnológica, completando pruebas integrales y preparando la etapa de migración a producción.




En particular, se consolidaron las actividades de seguimiento, validación y análisis de la plataforma WL, orientadas a fortalecer la confiabilidad de la información generada, optimizar el monitoreo y la detección temprana de fugas en la red de distribución.


Las tareas desarrolladas abarcaron la configuración, revisión y ajuste de alarmas, el control de notificaciones emitidas por la plataforma y la verificación sistemática de datos de consumo y telemetría, evaluando su calidad y consistencia operativa. Asimismo, se mantuvo una interacción permanente con los referentes de Schneider para el análisis de funcionalidades, resolución de consultas técnicas y mejora de los criterios de configuración.


En relación a la gestión de pérdidas, se realizó el monitoreo activo de alarmas asociadas a cambios en el comportamiento de la red, posibles fugas, efectuando el seguimiento de los eventos detectados y su validación mediante consultas a los Distritos. Cuando las alarmas resultaron coincidentes con fugas o reparaciones verificadas en campo, se estimaron los volúmenes de fuga evitada, generando información relevante para evaluar el desempeño de la herramienta y la efectividad de las acciones correctivas implementadas.

La siguiente Figura muestra el centro de notificación de alarmas a la cual llegan las alertas.

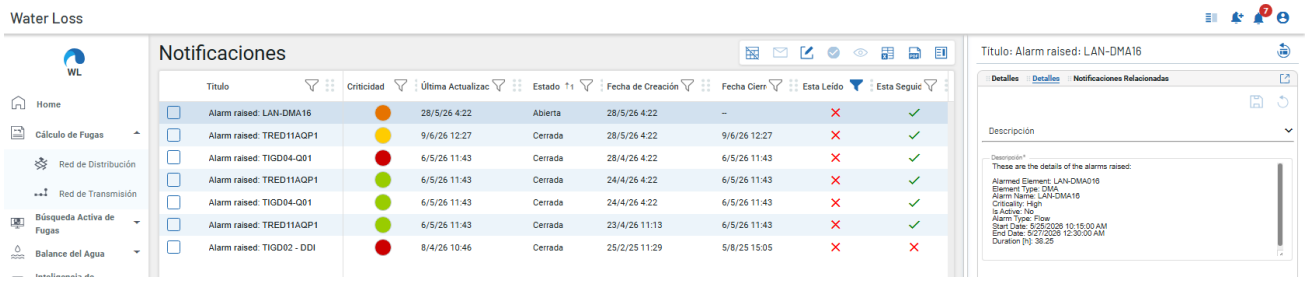



De igual forma se puede observar la misma alarma en la DMA correspondiente.

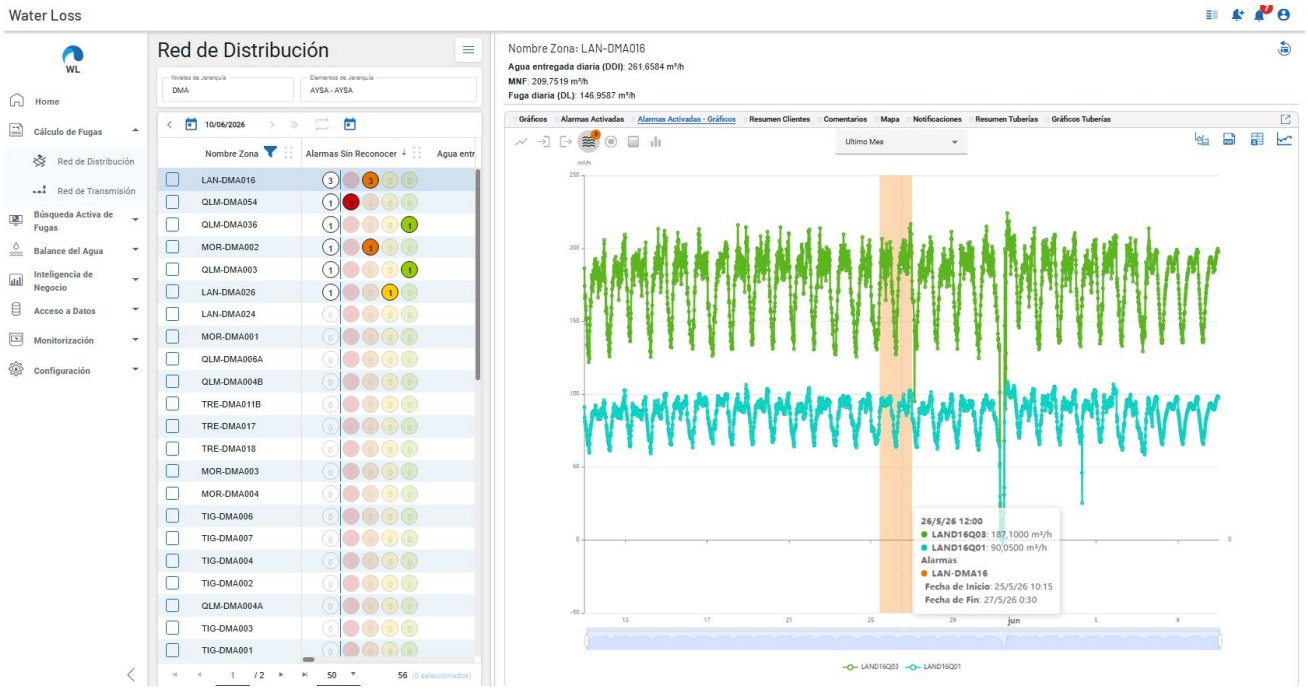


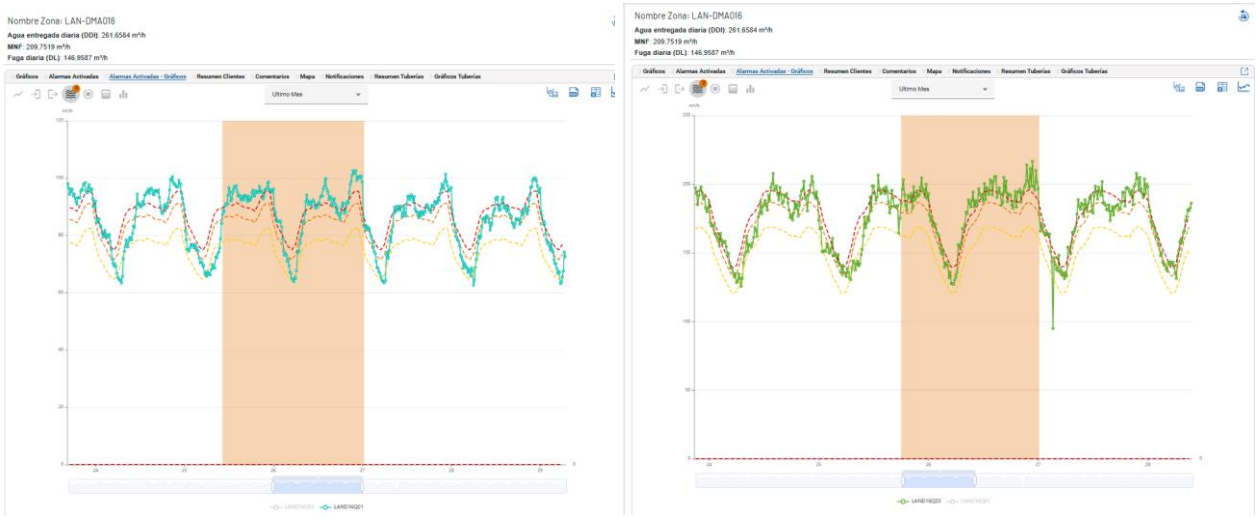

A continuación, se comparten algunos ejemplos de la detección temprana de fugas por monitoreo del caudal mínimo nocturno (QMN).

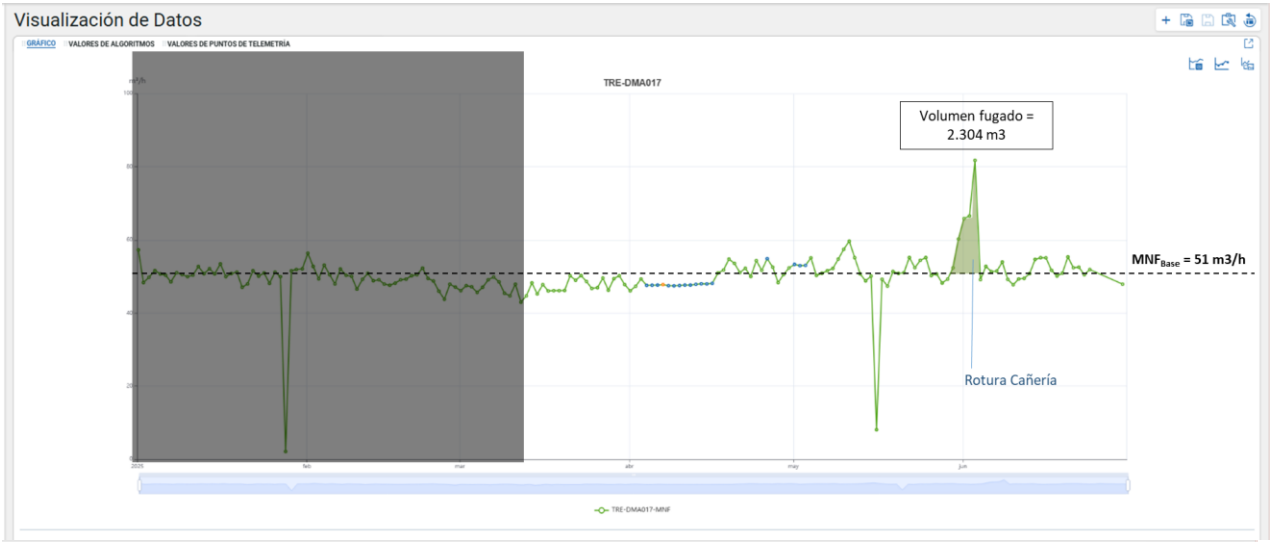

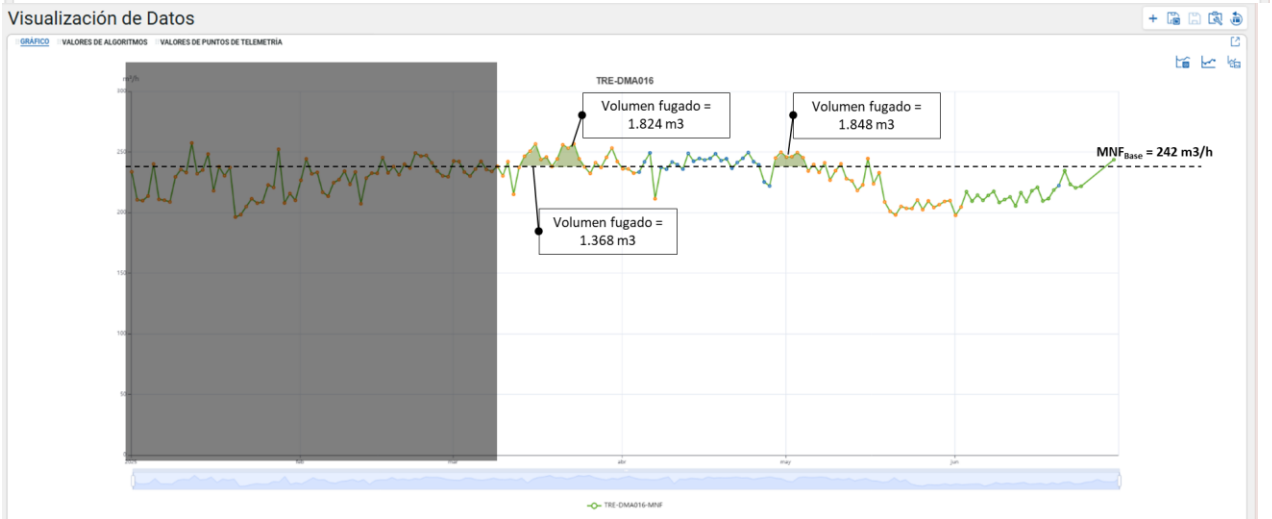

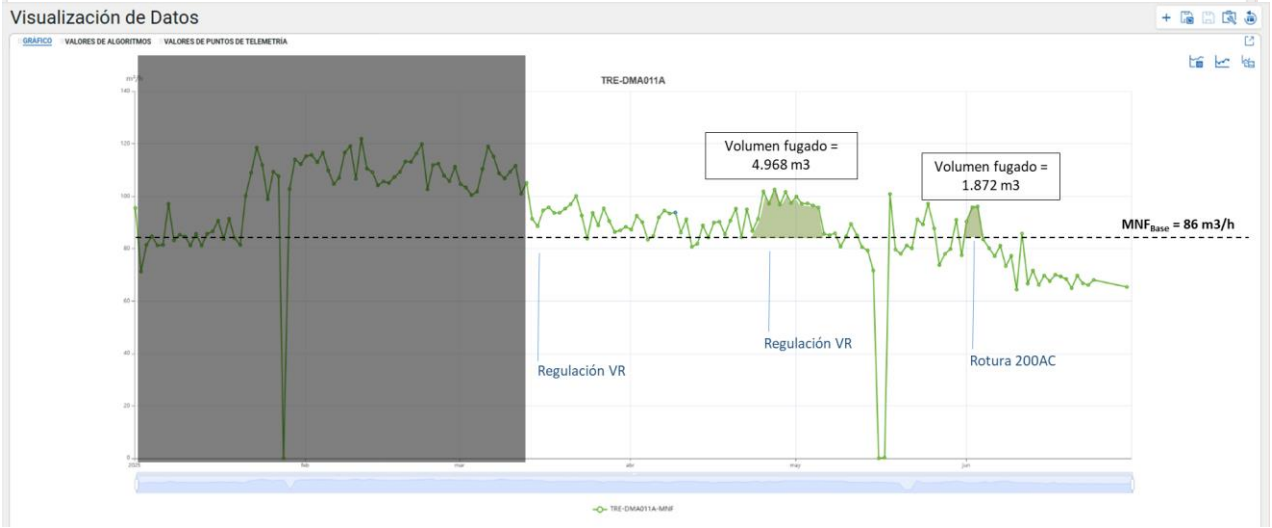

EVENTOS DETECTADOS = 6
Duración Promedio Evento = 4 días
Volumen Fuga Evitada = 21.276 m^3/año.

Los resultados obtenidos durante el año 2025 permitieron avanzar en la validación y aprovechamiento de la plataforma como herramienta de apoyo al monitoreo de las DMA y del resto de la concesión.

No obstante, continúan las tareas de optimización de los parámetros que conforman la plataforma, monitoreo de alarmas y mejora en los criterios de detección, con el objetivo de incrementar la precisión de los eventos reportados y maximizar el valor operativo del sistema.

1.7.3.3.4. Programa de búsqueda de fugas


El Plan tiene como objetivo reducir el volumen de agua que se pierde sin llegar a los hogares de los consumidores permitiendo incrementar la eficiencia del nexo AGUA-ENERGÍA. Uno de los ejes de acción es la optimización del proceso de control activo de fugas así como la velocidad y calidad de la reparación.


El tiempo sobre el que se hace foco en el presente plan es el “A” o “tiempo desde que se genera el escape hasta que se manifiesta”. Este tiempo es el más difícil de gestionar y en general se asocia al mayor volumen de pérdida. Por otra parte, optimizar este período impactará positivamente en “L” tiempo de localización” ya que incrementará la eficiencia de los equipos de búsqueda de fuga RANC que trabajan sobre este tiempo.


Se han implementado métodos eficientes para la detección y eliminación de fugas. Para ello se desarrollaron metodologías de prelocalización de fugas por métodos acústicos o satelital, geofonía y correlación de fugas.

1.7.3.3.4.1. Eliminación de Fugas en Redes de Agua mediante Prelocalización Satelital


La tecnología utiliza imágenes captadas por sensores SAR de microondas ubicados en un satélite que orbita continuamente la Tierra y permite obtener datos frecuentemente ya que con una pasada cubre áreas relativamente grandes.

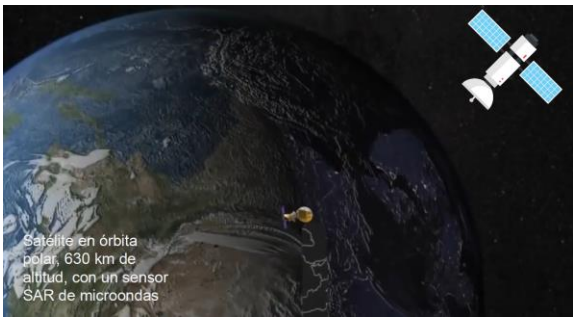

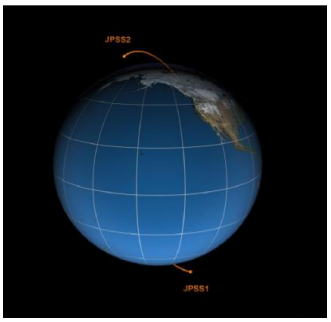




Los satélites con sensores SAR (Synthetic Aperture Radar) tienen como ventajas que pueden captar imágenes en todo tipo de clima, operan de día y noche, son sensibles a las propiedades dieléctricas y tienen penetración subsuperficial. En la imagen se grafica el proceso de captura de imagen.



La formación de imágenes del radar se lleva a cabo por un proceso por el cual el radar mide la amplitud (magnitud del eco reflejado) y la fase (posición de un punto en un momento específico en el ciclo de onda). La intensidad del eco reflejado es el coeficiente de retrodispersión (se expresa en decibeles) y es el dato utilizado en el algoritmo para la discretización de zonas con humedad (agua barrosa).

A posteriori, la tecnología completa el proceso según el siguiente esquema:

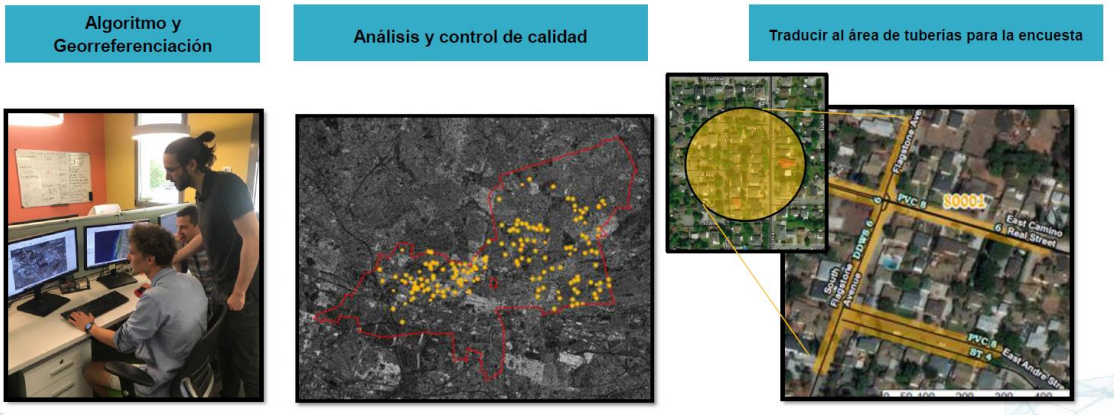

La metodología no tiene restricciones en cuanto al tiempo que demanda para llevar a cabo el diagnóstico ya que es posible realizar una evaluación de toda el área de estudio de una sola vez.

Entre las principales ventajas se destaca que, sin tener que acceder al terreno, se descartan zonas donde la existencia o densidad de fugas es baja y se pone foco en aquellos sectores con ratios elevados de fugas por kilómetro de red investigada para posteriormente ubicar la fuga con precisión y proceder a su reparación.


Si bien se realizaron pilotos durante los años 2019, 2020 y 2021, a partir del año 2023, se define aplicar la tecnología en forma sistemática. El alcance del programa contempla:

1. Diagnóstico satelital
2. Geofonia en puntos de interés
3. Reparación de fugas - conexiones y artefactos
4. Pre-localización acústica
5. Correlación acústica - RANC regional

A continuación se detallan los avances del programa

1. Diagnóstico satelital

   Durante el año 2025, se diagnosticaron **8.367 km** mediante los lotes N°6 y N°7, alcanzándose en el año la pre-localización de la totalidad de la red de AySA con un acumulado de 29.605 km a lo largo todo el contrato. Los lotes mencionados abarcaron las siguientes áreas geográficas:

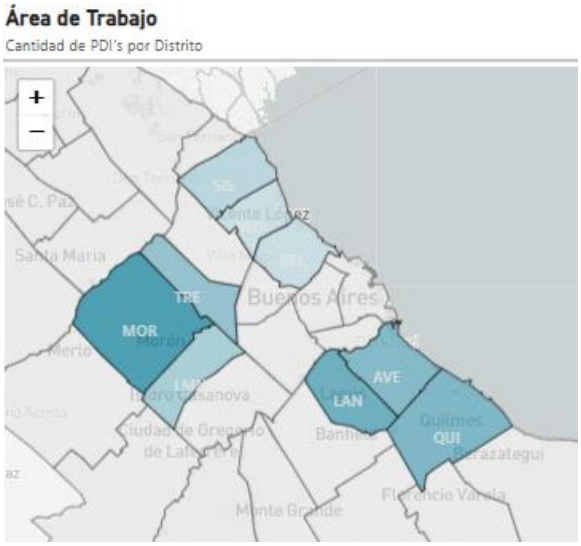

Diagnósticos Satelitales


OC 74204

Lote	Distritos	PDI's	Km Red
7	Avellaneda, La Matanza Norte, Lanus, Quilmes	388	4.000,56
6	Belgrano, Moron, San Isidro, Tres De Febrero, Vicente Lopez	772	4.367,27
5	Escobar, Jose C Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Pilar, San Fernando, San Martin, San Miguel, Tigre	65	
4	Esteban Echeverria, Ezeiza, La Matanza Oeste, Moron, Tres De Febrero		
3	Caballito, Centro, Devoto, Flores, La Matanza Norte	2	
2	Almte Brown, Constitucion, La Matanza Sur, Lomas De Zamora, Presidente Peron		
1	Avellaneda, Florencio Varela, Lanus, Quilmes	1	

Del total de longitud diagnosticada en el año, se identificaron **10% de la red con rumor de fuga positivo**.


2. Investigación con Geofonía en puntos de interés (PDI)

De los sectores con rumor de fuga positiva, se inspeccionó con geofonía de **725 km** detectándose **4.357 hallazgos**, es decir **6,0 fugas/km**. Estas fugas localizadas se pueden caracterizar según el tipo de fugas y la ubicación de las mismas.

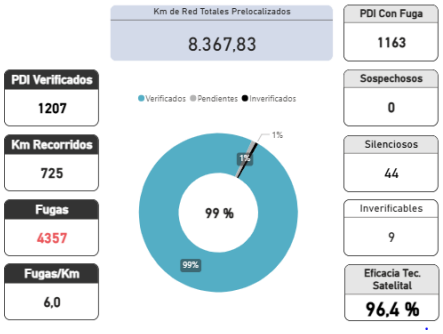

La distribución en función del tipo de fugas detectada muestra que la mayor proporción se correspondió con fugas semivisibles que representa el 91,5% del total. El resto se reparte entre fugas invisibles 3,7%, fugas visibles 0,5% y goteos 4,3%.

En relación a la ubicación de la fuga, el 99% se localizó en conexiones, 0,5% en artefactos sobre cañería y 0,2% se localizó en el tramo de conexión correspondiente al usuario.

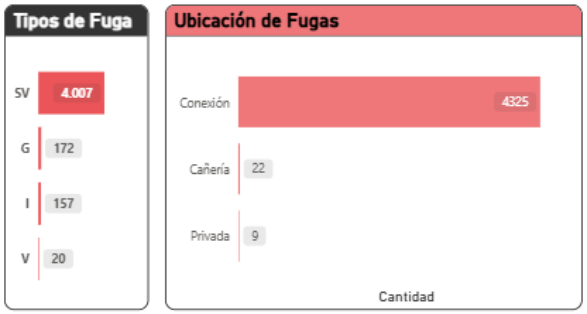

3. Reparación de fugas - conexiones y artefactos

Durante el año 2025 se realizaron **6482 reparaciones** que significo una optimización de 32.857 m^3/d. El número de posiciones reparadas fueron mayores a los detectados productos del Lote N°6 y N°7 ya que se completaron reparaciones pendientes de lotes anteriores.

1.7.3.3.4.2. Programa de localización de fugas con sensores de ruido permanente

Durante el año 2025 se llevó a cabo el piloto de una tecnología de detección temprana de fugas en las siguientes DMA de la Región Oeste, LMN-DMA003, LMN-DMA004 y LMN-DMA005 en La Matanza Norte y TRE-DMA003 y TRE-DMA004 en Tres de Febrero.






Las actividades principales incluyeron:

- Instalación de equipos: Se colocaron un total de **140 sensores** acústicos PERMANET mediante fijación magnética en válvulas e hidrantes de la red. Estos sensores tienen un rango de detección de unos 100 metros.







- Monitoreo continuo: Los sensores registran ruidos y transmiten la información diariamente a las 03:00 hs a la plataforma HWM-Permanet Web, donde se clasifican los equipos por estado: Automático (normal), Sin Transmisión o En Fuga.



- Metodología de verificación: Cuando se detecta un rumor de fuga positivo, se coordina con el equipo operativo (RANC Regional) para realizar una inspección en campo, confirmar la fuga y generar la orden de reparación correspondiente.



Matanza Norte



Tres de Febrero

- Establecimiento de Línea Base: Se midieron las pérdidas físicas iniciales en sectores específicos (DMA) para evaluar el impacto real de los sensores en la reducción de agua no contabilizada.

Los resultados globales del piloto fueron los siguientes:

Indicador	Resultado
Sensores con rumor de fuga detectado	51
Fugas confirmadas	25
Fugas desestimadas	7
Pendientes de diagnóstico	19
Total fugas reparadas	**40** (38 en conexión, 2 en cañería)
Volumen total de fuga evitada	**94.700 m³**

A nivel impacto en la Red, se observó una disminución mensual en el indicador de pérdida física por kilómetro en las áreas monitoreadas, validando la eficacia de la tecnología para detectar fugas invisibles y semivisibles, reduciendo el tiempo de detección y el volumen fugado.

1.7.3.3.4.3. Programa de localización de fugas con gas trazador helio

Durante el año 2025, se ejecutó un piloto de localización de fugas mediante gas trazador (HE-TRACER), enfocado en la detección de pérdidas en cañerías de distribución y de transporte (OC79504).

En esta tecnología el proceso de detección se basa en el fenómeno físico de desorción, que ocurre cuando existe un punto de fuga en la red. En esas ubicaciones, el helio se libera del agua y migra hacia la superficie, permaneciendo impregnado en el terreno circundante entre 4 y 5 días. Esta ventana temporal permite realizar una búsqueda sistemática y efectiva utilizando un equipo móvil de detección. La identificación de fugas se realiza mediante un equipo móvil de detección altamente especializado. Este equipo integra múltiples componentes de muestreo y análisis, incluyendo un espectrómetro de masa de helio de alta sensibilidad.



Equipo He Tracer para detección de Gas Helio (Espectrómetro de masas)

Además está diseñado para obtener muestras purificadas del aire presente en el subsuelo, permitiendo la detección inequívoca de concentraciones de helio que superan los umbrales preestablecidos, los cuales están calibrados específicamente para eliminar falsos positivos causados por el contenido natural de helio en el aire atmosférico.

La metodología de detección se explica en el siguiente diagrama:


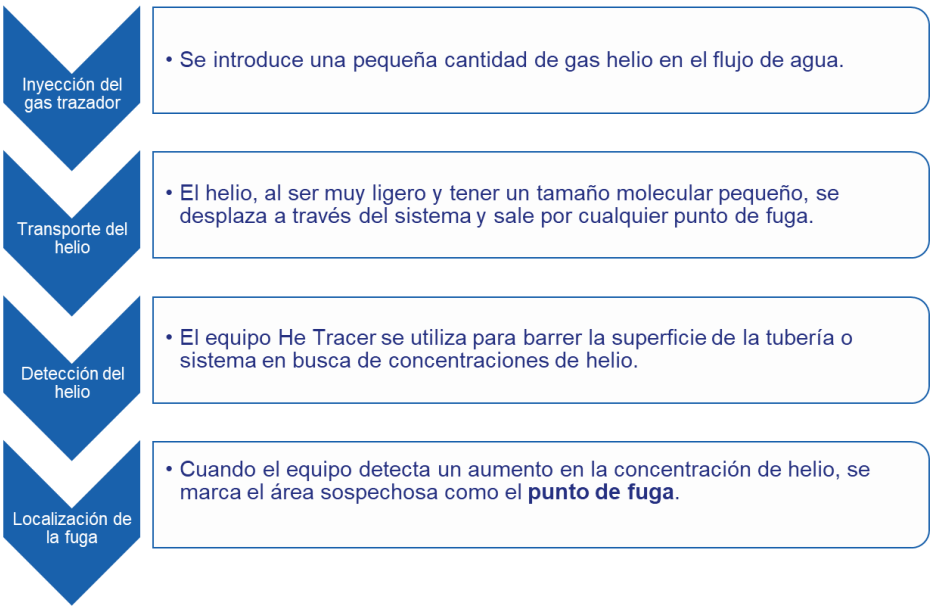


Diagrama Metodología de detección



Procedimiento de Inyección




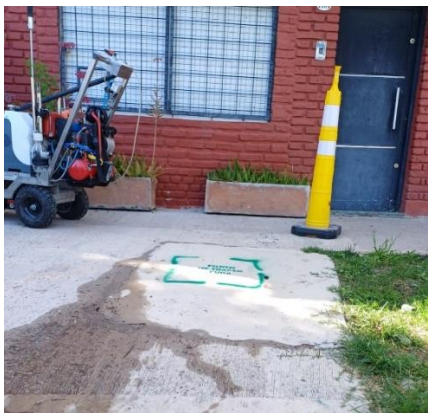


Procedimiento de Detección / Señalización de fuga detectada

Para el desarrollo del Piloto sobre redes de distribución se seleccionaron dos DMA actualmente en monitoreo, TRE-DMA011A y la LAN-DMA024 – abarcando 10 km inspeccionados por DMA:



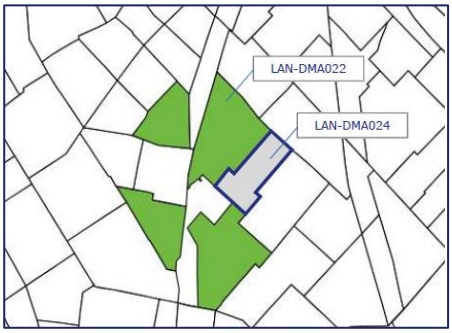

A su vez, para el Piloto en redes de transporte se seleccionó el tramo entre EE Villa Adelina y San Fernando (SISQP01):

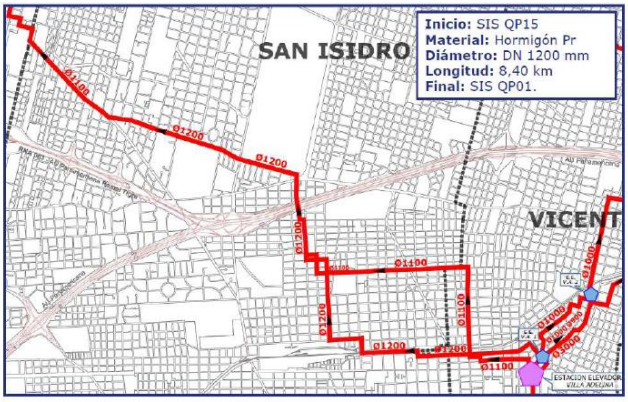




La longitud a inspeccionar en dicho piloto fue de 8,4 kilómetros

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las diferentes Pruebas Piloto, tanto en redes de distribución como en la red de transporte.


- Prueba piloto He Tracer para detección de fugas en redes de Distribución
  - LAN-DMA024

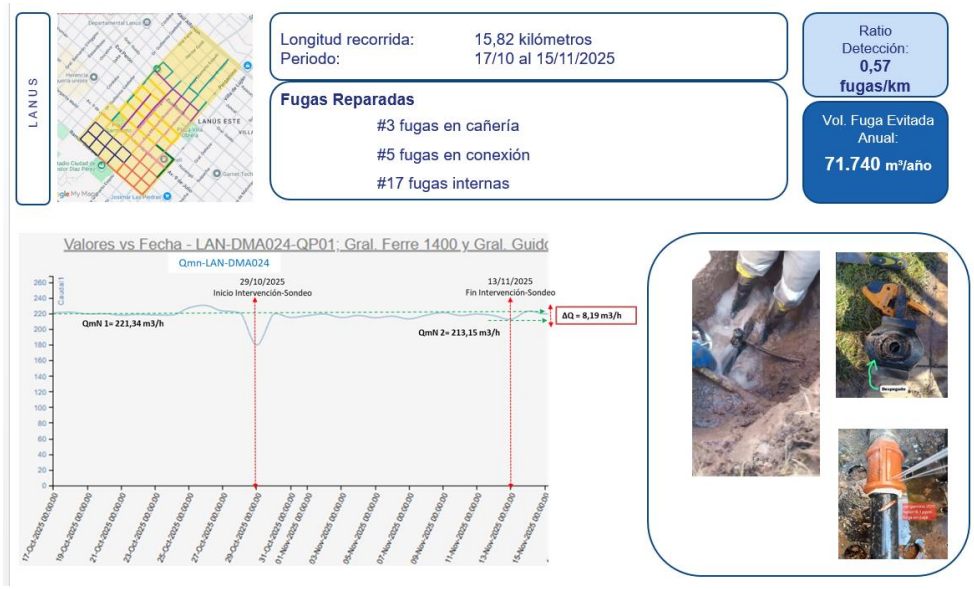

  - TRE-DMA011A



- Prueba piloto He Tracer para detección de fugas en redes de transporte Villa Adelina – San Fernando

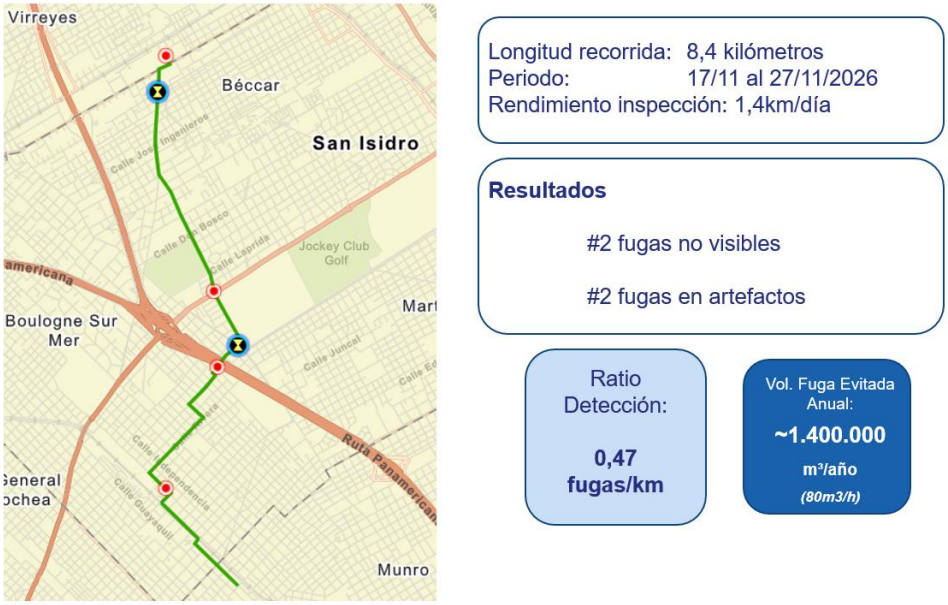

En la imagen siguiente se detallan las 4 fugas detectadas. Dos fugas verificadas corresponden a: (i) una fuga visible con salida de agua desde una cámara de desagüe (22 ppm de helio), y (ii) una fuga en el vástago de una válvula de aire (10 ppm de helio). Ambos casos confirman la capacidad del método para identificar puntos de pérdida en condiciones operativas reales de redes de transporte. Las 2 fugas no visibles se han programado para verificar en el inicio del año 2026.



1.7.3.4. Gestión de Activos

El Plan está directamente relacionado con las obras de Mejora y Mantenimiento tanto en redes como en conexiones y elementos de maniobras (renovación, instalación y rehabilitación). Tiene como objetivo mantener o, en el caso que lo requiera, mejorar los niveles de servicio actuales desde el punto de vista de continuidad, caudal y presión/niveles mediante la ejecución de trabajos u obras sobre instalaciones existentes.

A partir de la entrada en vigencia del Plan de Transición, la mayor parte de los esfuerzos estuvieron puestos en gestión, regulación y medición, en tanto que la renovación de redes, la renovación de conexiones y la rehabilitación estructural tuvieron menor protagonismo. Dado que las pérdidas reales continúan en 35,7% y 84 m³/km/día, alcanzar metas de reducción implica que esta situación se reviertan en años siguientes.

A continuación, se detallan los trabajos principales del Plan de Mejora y Mantenimiento en redes de distribución de agua ejecutados en el año 2025.

Durante el año 2025 se rehabilitaron **27.505 metros** distribuidos de la siguiente manera:

1.7.3.4.1. Rehabilitación con limpieza desincrustante redes de agua de hierro fundido

La técnica de rehabilitación mediante “desincrustación hidrocinética o mecánica” tiene como objetivo fundamental la limpieza desincrustante de las cañerías y la recuperación de la sección original del caño.

Dentro del plan de obras de rehabilitación, han sido considerados los siguientes aspectos:

- ✓ Análisis del estado estructural del caño en diferentes puntos del tramo a rehabilitar (análisis preliminar de muestras de caño).
- ✓ Identificación de zonas donde es necesario combinar la desincrustación con la renovación de cañerías fundamentalmente cuando el diámetro existente resulte insuficiente.
- ✓ Renovación de todas las piezas especiales (ramales, reducciones, curvas, etc) y válvulas existentes en el tramo. Se ha comprobado que la eficiencia de la técnica es notablemente mayor en aquellos casos en que se ha acompañado la desincrustación con la renovación de piezas.
- ✓ Lavado mediante el uso de equipos que permitan dar mayor eficiencia al proceso. En su defecto, los tiempos de operación en el terreno se extienden fuera de los plazos esperados, se dificulta lograr valores de turbiedad y cloro dentro de norma y por ende se dificulta el proceso de habilitación del servicio.

Total Rehabilitación mecánica con limpieza desincrustante: **25.535** metros.

A continuación se presenta la distribución de los trabajos por Distrito:

Etiquetas de fila	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Octubre	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre	Total general
DRCF	970		180	950	1575	2332	750	679	2200	1810	425		11871
Flores	520			600				379					1499
Centro Constitucion	450		180										630
Caballito						1187			760	784			2731
CECO				350	220	1145							1715
Fores					1355								1355
CE-CO							750	300	1440	1026	425		3941
DRN			790		130		1295	1295	550	910		595	5565
Tigre								1295	550	910			2755
Vicente Lopez							370						370
San Isidro			790		130		435						1355
San Martín							490					595	1085
(en blanco)													
DRSE	895	970		860		135	910	996	150	230	1498		6644
Quilmes	895	970		860				336			1498		4559
Avellaneda						135	910	565	150	230			1990
Total general	1865	970	1215	2260	1705	2527	2955	2970	2900	2950	2233	985	25535

1.7.3.4.2. Rehabilitación con revestimiento con resina poliurea

El Programa complementa la rehabilitación mecánica actual con el método de recubrimiento mediante resina poliurea lo cual aumenta la vida útil de las cañerías a niveles similares de las cañerías nuevas, evita desprendimientos y turbiedad post rehabilitación y lo más importante y significativo anula la re-incrustación.



Total Rehabilitación con resina: **1.970 metros**

Se realizaron 152,70 metros con un espesor de resina de 1.6mm para otorgar pasividad a la corrosión, y 1817,30 metros se le aplico un espesor de 2.1mm para otorgar resistencia estructural a la conducción.

La rehabilitación fue llevada a cabo en las localidades de Ciudadela (distrito Tres de Febrero) y en el barrio de Barracas (distrito Centro-Constitución) cubriendo 1026,50 y 943,50 metros respectivamente. Durante el año 2025 se rehabilitaron 1.970 metros (OC 70417) distribuidos de la siguiente manera:

TRAMOS REHABILITADOS - ENERO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-302	OMBÚ	MAGALLANES Y BOQUERÓN	21/1/2025	2,1	100	90,20
2	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-301	OMBÚ	RUCCI Y MAGALLANES	23/1/2025	2,1	100	70,10
3	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-300	OMBÚ	E. BELLACO Y RUCCI	28/1/2025	2,1	100	100,70
4	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-299	OMBÚ	OMBÚ 3685 hasta E. BELLACO	30/1/2025	2,1	100	84,00
5	157-MAL-TRE-002	Ciudadela	TR-305	E. BELLACO	PAMPA Y PERÍN	4/2/2025	2,1	100	98,10
							TOTAL		443,10
TRAMOS REHABILITADOS - FEBRERO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-303	BELLACO	PAMPA Y PERÍN	13/2/2025	2,1	100	119,10
2	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-305 B	BELLACO	OMBÚ Y CUEVAS	14/2/2025	2,1	100	12,00
3	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-304	BELLACO	PAMPA Y OMBÚ	20/2/2025	2,1	100	98,60
							TOTAL		229,70
TRAMOS REHABILITADOS - MARZO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-306	CONSTANCIA	PAMPA Y PERÍN	18/3/2025	2,1	100	122,00
2	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-308	CONSTANCIA	CUEVAS Y OMBÚ	20/3/2025	2,1	100	114,00
3	157-MAL-TRE-006	Ciudadela	TR-307	CONSTANCIA	OMBÚ Y PAMPA	26/3/2025	2,1	100	118,00
							TOTAL		354,00
TRAMOS REHABILITADOS - ABRIL 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	103044	CECO	TR-309	I. LA CATOLICA	CERRI Y AV. IRIARTE	29/4/2025	2,1	100	77,60
2	103044	CECO	TR-310	AV. IRIARTE	I. LA CATOLICA Y JOVELLANOS	8/5/2025	2,1	100	83,20
							TOTAL		160,80
TRAMOS REHABILITADOS - MAYO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	103044	CECO	TR-311	JOVELLANOS	CERRI Y AV. IRIARTE	9/5/2025	2,1	100	75,30
2	103044	CECO	TR-312	JOVELLANOS	CERRI Y AV. IRIARTE	14/5/2025	2,1	100	78,70
3	103044	CECO	TR-313	AZARA	CERRI Y AV. IRIARTE	20/5/2025	1,6	100	48,10
4	103044	CECO	TR-314	AV. PATRICIOS	CERRI Y AV. IRIARTE	22/5/2025	2,1	100	79,80
5	103044	CECO	TR-315	AV. MONTES DE OCA	CERRI Y AV. IRIARTE	28/5/2025	2,1	100	79,80
							TOTAL		361,70
TRAMOS REHABILITADOS - JUNIO 2025									
NUMERO	Malla	Distrito	N° DE TRAMO	CALLE	INTERSECCION	FECHA DE REHABILITACION	ESPESOR (mm)	DN	METROS REHABILITADOS
1	103044	CECO	TR-316	CERRI	I. LA CATOLICA Y AV. MONTES DE OCA	5/6/2025	2,1	125	93,40
2	103044	CECO	TR-317	CERRI	JOVELLANOS E I. LA CATOLICA	10/6/2025	1,6	125	104,60
3	103044	CECO	TR-318	CERRI	AZARA Y JOVELLANOS	18/6/2025	2,1	125	98,50
4	103044	CECO	TR-319	CERRI	AV. PATRICIOS Y AZARA	24/6/2025	2,1	125	124,50
							TOTAL		421,00
					TOTAL METROS REHABILITADOS AÑO 2025:				1.970,30

En todos los casos se logró el objetivo de reducción de reclamos tal como se muestra en las siguientes gráficas.


a) Distrito Tres de febrero - Mallas 002 y 006.

Variación de reclamos para el período marzo-abril-mayo. Año 2024 (pre desincrustación) vs. Año 2025 (post desincrustación y rehabilitación con aplicación de resina).



b) Distrito Centro-Constitución - Malla 103044

Variación de reclamos para el período julio a diciembre. Año 2024 (pre desincrustación) vs. Año 2025 (post desincrustación y rehabilitación con aplicación de resina).

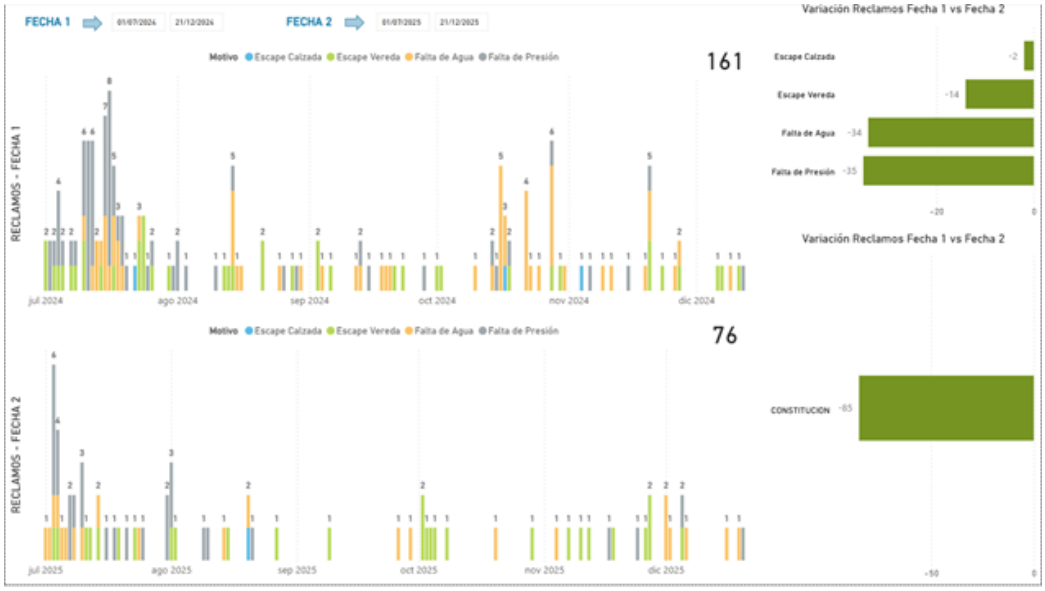

1.7.3.4.3. Renovación Estructural de Redes Distribuidoras

A lo largo del año 2025 se reiniciaron trabajos en obras de sectorización que habían sido paralizadas. No obstante no llegaron a concluirse en el año por lo que no tuvieron impacto en la reducción de fugas.

1.7.3.5. Conclusiones generales

Durante el año 2025 se continuó avanzando en la implementación de diversas acciones orientadas a mejorar la eficiencia hidráulica y comercial del sistema, incluyendo trabajos de gestión de presiones, optimización de bombeos, fortalecimiento de la macromedición, ampliación de la medición comercial y actualización de la información utilizada para la elaboración del Balance de Agua.

Las acciones desarrolladas permitieron generar avances relevantes en materia de conocimiento del sistema, capacidad de regulación operativa y confiabilidad de la información disponible para la toma de decisiones. En particular, se consolidaron herramientas de gestión que permiten adecuar con mayor precisión la oferta de agua a las condiciones reales de demanda, fortalecer el control operacional y mejorar la identificación de oportunidades de reducción de pérdidas.

En este marco, durante el año 2025 se registraron avances en los distintos ejes estratégicos del Plan de Agua No Contabilizada, entre los que se destacan:

- Confiabilización del Agua Bombeada mediante programas de mantenimiento y verificación metrológica (incertidumbre ±0,5%).
- Confiabilización de la demanda de agua en sectores UREM.
- Incorporación de nuevas tecnologías de prelocalización de fugas.
- Implementación de herramientas de gestión remota de válvulas reguladoras.
- Desarrollo del Plan de Sectorización de Redes mediante metodología DMA.
- Gestión de activos orientada a la renovación de redes e infraestructura asociada.

No obstante, los resultados obtenidos en los indicadores globales del Balance de Agua muestran que los efectos de estas acciones aún no se reflejan plenamente en reducciones significativas de los niveles de Agua No Contabilizada y pérdidas reales del sistema. Esta situación responde tanto a la magnitud y complejidad de la infraestructura operada como al impacto que las mejoras metodológicas implementadas durante el período tuvieron sobre la cuantificación de las distintas componentes del Balance.

Asimismo, debe considerarse que durante el período las inversiones estructurales asociadas a renovación de redes, rehabilitación de infraestructura y expansión de programas de reducción de pérdidas se desarrollaron a un ritmo inferior al registrado históricamente, en el marco del proceso de transición atravesado por la empresa. En consecuencia, las acciones implementadas estuvieron orientadas prioritariamente a sostener la operación, fortalecer la capacidad de gestión y mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones.

En este contexto, los trabajos desarrollados durante 2025 deben interpretarse como una etapa de consolidación de capacidades técnicas, operativas y de control que constituyen condiciones necesarias para alcanzar mejoras sostenibles en los indicadores de eficiencia durante los próximos años. Los avances logrados establecen una base más robusta para la planificación y priorización de futuras intervenciones, aunque aún resultan insuficientes para generar cambios estructurales significativos en los indicadores globales del Balance de Agua.

La materialización de reducciones sostenidas en los niveles de pérdidas físicas y aparentes requerirá complementar los avances alcanzados con programas de inversión continuos en renovación de infraestructura, rehabilitación de redes, gestión de presiones, macromedición y micromedición, permitiendo transformar las mejoras en materia de información y gestión en resultados operativos verificables sobre la eficiencia global del sistema.

Finalmente, resulta fundamental optimizar el avance de ejes de acción integrados en el binomio oferta-demanda. Para ello se requiere profundizar en la implementación coordinada de acciones técnicas, operativas y comerciales que actúen de manera integrada sobre la oferta y la demanda de agua, tanto desde una perspectiva geográfica como temporal. La articulación entre los distintos programas de gestión permite maximizar el impacto de las inversiones y mejorar la eficiencia global del sistema.

En este sentido, constituye un objetivo estratégico que los avances alcanzados mediante el Plan de Medición Masivo no sólo mejoren la determinación y gestión de los consumos, sino que también se traduzcan en una reducción efectiva de la demanda global de agua o, alternativamente, en una liberación de capacidad operativa que permita abastecer sectores con demandas insatisfechas, sostener procesos de expansión del servicio o reducir requerimientos de producción y bombeo.

La integración de dichas acciones permitirá potenciar los beneficios individuales de cada programa, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos disponibles.



www.aysa.com.ar

INFORME DE NIVELES DE SERVICIO 2025

1 de enero al 31 de diciembre









TOMO 2

aysa

Índice General del
Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 1.1

1 Agua

1.1 Calidad de Agua

1.1.1 Calidad Agua Cruda Subterránea

1.1.2 Calidad Agua Cruda Superficial

1.1.3 Calidad Agua Producida

1.1.4 Calidad Agua en Redes de Distribución

TOMO 1.2

1.2 Producción

1.3 Transporte

1.4 Insumos Químicos

1.4.1 Consumo Plantas

1.4.2 Consumo Elevadoras + Pozos + Plantas Tratamiento

1.5 Información General

1.5.1 Continuidad del Abastecimiento – Reclamos

1.5.2 Conexiones

1.5.3 Fuentes Alternativas

1.5.4 Contactos con los Usuarios

1.6 Presión del Servicio

1.7 Reducción de Agua No Contabilizada

Índice General del
Informe Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 2

2 Saneamiento

2.1 Calidad de los Efluentes

2.1.1 Redes Cloacales

2.1.2 Plantas Depuradoras

2.1.3 Descarga a Cuerpo Receptor

2.1.4 Efluentes Industriales

2.1.5 Biosólidos

2.2 Depuración

2.3 Transporte

2.4 Información General

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 1.1

1 AGUA

1.1 CALIDAD DE AGUA

1.1.1 Calidad de Agua Cruda Subterránea

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 07	**010-INS-A-CA-CRU-PS-00**	Calidad de Agua Cruda Subterránea.
PL INS 08	**020-INS-A-CA-CRU-PS-01**	Calidad de Agua Cruda Subterránea (parque de PSS - parámetros: Nitratos, Arsénico, Escherichia Coli, Pseudomonas, Coliformes Totales, Bacterias Heterótrofas, Tetracloruro de Carbono y Tricloroetileno).
PL INS 09	**030-INS-A-CA-CRU-PS-02**	Evolución Calidad Agua Subterránea producida Area Concesión.
		Gráfico de la evolución del número de pozos en funcionamiento.
		Gráfico Evolución de los Nitratos y de Sales disueltos.
		Gráfico Evolución de Arsénico y Tricloroetileno.
PL INS 69	**040-INS-A-CA-CRU-PS-03**	Listado de pozos con muestreo incompleto.
	050-INS-A-CA-CRU-PS-04	Listado puntos cercanos.

1.1.2 Calidad de Agua Cruda Superficial

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 02	**060-INS-A-CA-CRU-PSM-00**	Calidad de agua cruda superficial Planta San Martín.
PL INS 57/60/63	**070-INS-A-CA-CRU-PSM-01**	Planta San Martín: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global y por salida - número de determinaciones.
PL INS 03	**080-INS-A-CA-CRU-PMB-00**	Calidad de Agua Cruda Superficial Planta Manuel Belgrano.
PL INS 58/61/64	**090-INS-A-CA-CRU-PMB-01**	Planta Belgrano: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global y por salida - número de determinaciones.
	120-INS-A-CA-CRU-PJMR-00	Calidad de agua cruda superficial Planta Juan Manuel de Rosas
	130-INS-A-CA-CRU-PJMR-01	Planta Juan Manuel del Rosas: Valores máximos, mínimos y promedios de agua cruda y consumo global y por salida - número de determinaciones
	135-Gráficos PSM	Gráficos Planta San Martín - Agua Cruda y de Consumo. Parámetros: Turbiedad, pH, Amonio y UV254.-
	136-Gráficos PMB	Gráficos Planta Manuel Belgrano - Agua Cruda y de Consumo. Parámetros: Turbiedad, pH, Amonio y UV254.-
	137-Gráficos PJMR	Gráficos Planta Juan Manuel de Rosas - Agua Cruda y de Consumo. Parámetros: Turbiedad, pH, Amonio y UV254.-

1.1.3 Calidad de Agua Producida

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 01	**140-INS-A-CA-PR-00**	Calidad de agua producida - SIT Anual.
PL INS 05	**150-INS-A-CA-PR-01**	Calidad de agua superficial tratada (Plantas: San Martín, M. Belgrano y J.M. Rosas).

1.1.4 Calidad de Agua en Redes de Distribución (PARTE 1)

Código Anterior	Código Actual	Título
SIT REDES	**160-INS-A-CA-RED-00**	Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución.
PL INS 10	**170-INS-A-CA-RED-01**	Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución.
PL INS 11	**180-INS-A-CA-RED-02**	Calidad de Agua potabilizada en el sistema de distribución.

TOMO 1.2

1.1.4 Calidad de Agua en Redes de Distribución (PARTE 2)

Código Anterior	Código Actual	Título
	200-INS-A-CA-RED-03	Análisis y seguimiento anomalías en Red.
	210-INS-A-CA-RED-04	Análisis y seguimiento anomalías en puntos cercanos a PSS.

1.2 PRODUCCION

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 55	**220-INS-A-PR-00**	SIT - Producción de Agua.
PL INS 70	**230-INS-A-PR-01**	Almacenamiento de agua potable - instalaciones en uso.

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

1.3 TRANSPORTE

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 56	**240-INS-A-TR-00**	SIT - Transporte Agua.

1.4 INSUMOS QUIMICOS

1.4.1 Consumo Plantas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 66	**250-INS-A-IQ-PSM**	Planta San Martín: Evolución de Consumos de Insumos Químicos.
PL INS 67	**260-INS-A-IQ-PMB**	Planta Manuel Belgrano: Evolución de Consumos de Insumos Químicos.
	280-INS-A-IQ-PJMR	Planta Juan Manuel Rosas: Evolución de Consumos de Insumos Químicos.

1.4.2 Consumo Elevadoras + Pozos + Plantas Tratamiento

Código Anterior	Código Actual	Título
	290-INS-A-IQ-TR-00	Estaciones Elevadoras - Pozos de Agua - Evolución de insumos químicos.
	291-INS-A-IQ-TR-01	Plantas de Tratamiento de Agua Subterránea - Evolución de insumos químicos.

1.5 INFORMACION GENERAL

1.5.1 Continuidad del Abastecimiento - Reclamos

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 12/13/14/15 /16/17/18/40/41/42	**300-INS-A-IG-SIT-DDRR**	Continuidad del abastecimiento de Agua - Cortes Programados en el Servicio (Identificación del número y de la magnitud de los cortes).

1.5.2 Conexiones

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 19	**310-INS-A-IG-CON-00**	Agua - Solicitudes de Conexión, Reconexión y Desconexión.

1.5.3 Fuentes Alternativas

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 20	**320-INS-A-IG-FA-00**	Mantenimiento de Fuentes Alternativas (Resumen de MFA por Región y Partido).

1.5.4 Contactos con los Usuarios

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 52	**330-INS-IG-USU-00**	Clasificación de los contactos con los usuarios.
PL INS 53	**340-INS-IG-USU-01**	Contactos personales y telefónicos con usuarios.
PL INS 54	**350-INS-IG-USU-02**	Telemarketing: Nivel de Servicio.

1.6 PRESIÓN DEL SERVICIO

Código Anterior	Código Actual	Título
	360-INS 1.6	Presión del Servicio.
Planos		Presiones Máximas, Mínimas y Promedio anual. Curvas de Presión AySA y regionales.

1.7 REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

Código Anterior	Código Actual	Título
	370-INS 1.7	Reducción de Agua No Contabilizada.

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

TOMO 2

2.1 CALIDAD DE LOS EFLUENTES

2.1.1 Redes Cloacales

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 22/30/37	**2010-INS-S-CS-RED-00**	Calidad en Redes Cloacales por áreas de tratamiento.

2.1.2 Plantas Depuradoras

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 23/24/25/26/27	**2020-INS-S-CS-PD-00**	Calidad en Plantas Depuradoras: Caudal, DBO, DQO, SS 10', MES, Barros Bombeados, Biosólidos evacuados y % de eliminación de DBO, DQO, SS10' y MES. Se exponen Gráficos de DBO por planta.

2.1.3 Descarga a cuerpo receptor

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/39	**2030-INS-S-CS-CR-00**	Calidad de Efluentes - Descarga de los Establecimientos Depuradores: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. **Datos Lab. Plantas.**
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/39	**2040-INS-S-CS-CR-01**	Calidad de Efluentes - Descarga de los Establecimientos Depuradores: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. **Datos Lab. Central.**
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/39	**2050-INS-S-CS-CR-02**	Calidad de Efluentes - Descarga de Wilde - Radio Antiguo - Berazategui: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. **Datos Lab. Central.**
PL INS 28/29/31/32/33/34/ 35/36/38/40	**2060-INS-S-CS-CR-03**	Calidad de Efluentes - Descarga Radio Antiguo - Berazategui: N° de muestras, NC, %, promedio y máximo. DETALLE - **Datos Lab. Central.**

2.1.4 Efluentes Industriales

Código Anterior	Código Actual	Título
	2070-2.1.4 INS-CIC-2024	Control Integral de la Contaminación (CIC).
S/N	**2070-INS-S-CS-CIC-00**	SIT - Efluentes industriales - Anual.
PL INS 71	**2071-INS-S-CS-CIC-01**	Control de Industrias.
PL INS 72	**2072-INS-S-CS-CIC-02**	Efluentes industriales a colectoras - Operativos.
PL INS 72	**2073-INS-S-CS-CIC-03**	Efluentes industriales a colectoras - Control Directo Programado.
PL INS 72	**2074-INS-S-CS-CIC-04**	Efluentes industriales a colectoras - Control Directo No Programado.

2.1.5 Biosólidos

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 76 y 77	**2080-INS-S-CS-BS-00**	Planta Depuradora Norte - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2081-INS-S-CS-BS-02	PD Sudoeste - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2084-INS-S-CS-BS-04	PDH - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2086-INS-S-CS-BS-06	PSC - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2088-INS-S-CS-BS-08	PDEJ2 - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2090-INS-S-CS-BS-10	PDBU - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2091-INS-S-CS-BS-14	PDBV - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2092-INS-S-CS-BS-15	PDE - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2093-INS-S-CS-BS-17	PDFe - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2094-INS-S-CS-BS-20	PDG - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2095-INS-S-CS-BS-21	PDCAT - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.
	2096-INS-S-CS-BS-19	PDL - Biosólidos - Análisis Químicos - Bacteriológicos.

Indice de Detalle - Informe de Niveles de Servicio
Año 2025

2.2 DEPURACIÓN

Código Anterior	Código Actual	Título
S/N	**2100-INS-S-DP-00**	SIT - Tratamiento.
PL INS 74	**2110-INS-S-DP-01**	Volúmenes de Líquidos Cloacales Bombeados y Tratados.

2.3 TRANSPORTE

Código Anterior	Código Actual	Título
S/N	**2120-INS-S-TR-00**	SIT - Transporte.
PL INS 75	**2121-INS-S-TR-01**	Estaciones de Bombeo de Líquidos Cloacales (Región Centro, Región Norte, Región Sur).

2.4 INFORMACIÓN GENERAL

Código Anterior	Código Actual	Título
PL INS 43	**2130-INS-S-IG-CON-00**	Conexiones - Conexión, reconexión, desconexión.
PL INS 45	**2140-INS-S-IG-MDA-00**	Mantenimiento de Fuentes Alternativas (Resumen de MFA por Región y Partido).
PL INS 49/50/51	**2150-INS-S-IG-DBC-00**	Instalaciones de desborde de seguridad en red y en estaciones de bombeo.
PL INS 46/47/48	**2151-INS-S-DBC-01**	Instalaciones de desborde de seguridad.
	2160-INS-S-RES-00	Residuos de Rejas y/o Tamices
Plano		Red de Cloaca - Desbordes de Seguridad - Concesión.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Capital Federal.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Norte.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Oeste.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Sudoeste.
Plano		Instalaciones de desborde cloacal al sistema pluvial en Región Sudeste.

2 SANEAMIENTO

2.1 CALIDAD DE LOS EFLUENTES

2.1.1 Redes Cloacales

CALIDAD DE EFLUENTE CLOACAL

Macrocuencas

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2010-INS-S-CS-RED-00 (Ex 22)

Macrocuencas - Colectora Cloacal		pH	SSEE	Sulfuro	Temperatura	DBO	Oxígeno Consumido del KMnO4	Cianuros totales	Cianuros destructibles por Cloro (1)	Hidrocarburos Totales	Cromo III	Cromo VI	Detergentes	Cadmio	Plomo	Mercurio	Arsénico	Fenoles	Aldrín	Dieldrín	Heptacloro	Heptacloro epóxido	DDT	Clordano	Alfa HCH	Hexacloro benceno	Lindano	2,4 D	Metoxicloro
		UpH	mg/l	mg/l	°C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
AREA DE TRATAMIENTO PLANTA SUDOESTE	Muestras Totales	30	60	26	30	54	60	90		60	30	30	60	66	66	66	66	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8,4	63	<0,1	20	113	29	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1	<0,01	<0,1	<4	<20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE TRATAMIENTO PLANTA DEPURADORA NORTE	Muestras Totales	20	38	18	20	32	40	60		40	20	20	40	48	48	48	48	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	89%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8,1	70	1,6	26	191	45	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,4	<0,01	<0,1	<4	<20	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE TRATAMIENTO PLANTA EL JAGÜEL-BARRIO UNO	Muestras Totales	24	48	18	24	48	48	72		48	24	24	48	48	48	48	48	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	4	1	0	11	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	92%	94%	100%	77,0%	92,0%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8	630	1,8	23	440	280	<0,05		<4	1,4	<0,1	2,8	<0,01	<0,1	<4	79	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE TRATAMIENTO PLANTA HURLINGAM	Muestras Totales	12	24	10	12	24	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	7,9	48	1,5	25	149	36	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,7	<0,01	<0,1	<4	31	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUENCA BERAZATEGUI	Muestras Totales	81	157	68	81	89	158	237		156	81	81	158	226	226	226	226	71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	Muestras Deficientes	0	3	6	0	5	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	98,0%	91%	100%	94,0%	100,0%	100%		100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
	Valor Máximo	8,9	590	3	28	830	80	0,08		43,3	0,8	<0,1	3,2	<0,01	0,3	<4	31	0,16	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04	0	<5
AREA DE TRATAMIENTO PLANTA SANTA CATALINA	Muestras Totales	12	24	10	12	12	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8,5	67	6,4	29	158	35	<0,05		<4	<0,1	<0,1	3,3	<0,01	<0,1	<4	31	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE TRATAMIENTO PLANTA FIORITO	Muestras Totales	12	22	9	12	18	18	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8,5	69	0,4	28	110	68	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,5	<0,01	0,2	<4	167	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE TRATAMIENTO PLANTA LANUS	Muestras Totales	12	24	9	12	12	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	1	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	96%	100%	100%	92%	100,0%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8,4	145	0,5	28	144	48	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,5	<0,01	<0,1	<4	66	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Se informan las MAC que convergen a la entrada de las PD

(1) **El parámetro "Cianuros destructibles por cloro" se analiza sólo cuando el valor correspondiente a "Cianuros totales" es mayor a 0,05 mg/l.**

MACROCUENCAS DE PLANTAS DEPURADORAS NUEVOS PARTIDOS

Efluente en Puntos de Salida de Macrocuencas		pH	SSEE	Sulfuro	Temperatura	DBO	Oxígeno Consumido del KMnO4	Cianuros totales	Cianuros destructibles por Cloro (1)	Hidrocarburos Totales	Cromo III	Cromo VI	Detergentes	Cadmio	Plomo	Mercurio	Arsénico	Fenoles	Aldrín	Dieldrín	Heptacloro	Heptacloro epóxido	DDT	Clordano	Alfa HCH	Hexacloro benceno	Lindano	2,4 D	Metoxicloro
		UpH	mg/l	mg/l	°C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
AREA DE PLANTA BELLA VISTA	Muestras Totales	12	22	10	12	24	23	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8	62	0,8	24	153	56	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,9	<0,01	<0,1	<4	25	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE PLANTA LAS CATONAS	Muestras Totales	12	24	10	12	24	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8,1	84	0,4	26	155	48	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,2	<0,01	<0,1	<4	30	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE PLANTA CHAMPGNAT	Muestras Totales	12	24	10	12	12	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8,1	53	0,6	27	120	37	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,5	<0,01	<0,1	<4	32	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE PLANTA ESCOBAR	Muestras Totales	12	24	9	12	12	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	7,7	200	0,2	28	128	28	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,6	<0,01	<0,1	<4	<20	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AREA DE PLANTA FERRARI	Muestras Totales	12	24	10	12	16	16	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	2	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	80%	100%	94%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8	85	6	27	210	42	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,4	<0,01	<0,1	<4	46	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE PLANTA FLORENCIO VARELA	Muestras Totales	12	22	10	12	24	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	4	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8,3	76	0,8	23	235	45	<0,05		<4	<0,1	<0,1	3,4	<0,01	<0,1	<4	49	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE PLANTA GARIN	Muestras Totales	12	22	10	12	12	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	86%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8,2	325	<0,1	25	143	29	<0,05		42	<0,1	<0,1	2,3	<0,01	<0,1	9,7	31	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE PLANTA GUERNICA	Muestras Totales	12	24	10	12	24	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	7,9	95	1	24	185	64	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,9	<0,01	<0,1	<4	44	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE PLANTA MAQUINISTA SAVIO	Muestras Totales	12	24	9	12	12	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muestras Deficientes	0	1	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	96%	100%	100%	92%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Valor Máximo	8	320	<0,1	26	210	77	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,8	<0,01	0,1	<4	105	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AREA DE PLANTA MERLO NORTE	Muestras Totales	12	14	9	12	12	12	20	0	14	12	12	14	14	14	14	14	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
	Valor Máximo	8,5	41	0,7	31	140	36	<0,05	0	<4	<0,1	<0,1	1,6	<0,01	<0,1	<4	32	0,03	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04	0	<5
AREA DE PLANTA PASO DEL REY	Muestras Totales	12	14	9	12	12	12	20	0	14	12	12	14	14	14	14	14	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	Muestras Deficientes	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	93%	89%	100%	83%	92%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
	Valor Máximo	8,2	1550	2,5	29	1200	160	<0,05	0	<4	<0,1	<0,1	1,9	<0,01	<0,1	<4	36	0,03	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04	0	<5

Se informan las MAC que convergen a la entrada de las PD

[1] **El parámetro "Cianuros destructibles por cloro" se analiza sólo cuando el valor correspondiente a "Cianuros totales" es mayor a 0,05 mg/l.**

2.1.2 Plantas Depuradoras

PLANTAS DEPURADORAS

Efluentes (Caracterización de la calidad)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025


Informe de Niveles de Servicio


Año 2025


INS-S-CS-PD-00 (Ex Nº 23-24-25-26)


		Caudal tratado (m3/día)	**DBO** (kg/día)	**DQO** (kg/día)	**SS 10´** (m3/día)	**MES (Materia en suspensión)** (Kg/día)	**Biosólidos Evacuados** (ton/año)	**Biosólidos Evacuados** (TonMS/año)
Planta Norte	Promedio Efluente	176.892	1.458,8	5.172,9	17,7	1.188,1	17.441,1	3.974,2
	% Elim Trat Completo		93%	84%	96%	94%		
	% Elim Sedim Primaria		49%			46%		
Planta Sudoeste	Promedio Efluente	157.511	2.855,4	10.857,6	48,1	3.626,3	17.807,6	4.975,0
	% Elim Trat Completo		84%	83%	93%	88%		
	% Elim Sedim Primaria		48%			73%		
Planta Sudoeste 2	Promedio Efluente	83.372	464,8	2.957,3	8,7	577,3		
	% Elim Trat Completo		96%	92%	97%	96%		
	% Elim Sedim Primaria		49%			68%		
Planta Lanus	Promedio Efluente	11.241	214,6	637,1	2,7	296,7	430,0	141,4
	% Elim Trat Completo		82%	65%	84%	79%		
Planta El Jagüel 2	Promedio Efluente	34.496	702,9	2.653,2	1,7	756,9	5.589,7	1.417,6
	% Elim Trat Completo		88%	87%	100%	94%		
Planta Barrio Uno	Promedio Efluente	1.460	25,8	96,0	0,1	28,1	50,8	14,1
	% Elim Trat Completo		85%	71%	99%	86%		
Planta Hurlingham	Promedio Efluente	15.291	244,8	385,0	8,8	179,9	4.495,8	629,0
	% Elim Trat Completo		86%	90%	66%	90%		
Planta Santa Catalina	Promedio Efluente	1.510	11,2	31,5	0,1	14,3	107,3	25,6
	% Elim Trat Completo		93%	92%	88%	89%		
Planta Fiorito	Promedio Efluente	13.842	111,6	462,1	1,0	128,9	1.223,6	279,0
	% Elim Trat Completo		91%	90%	97%	94%		

aysa	**PLANTAS DEPURADORAS - Gráficos** **Efluentes (Caracterización de la calidad)** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-S-CS-PD-00 (Ex Nº 23-24-25-26)**

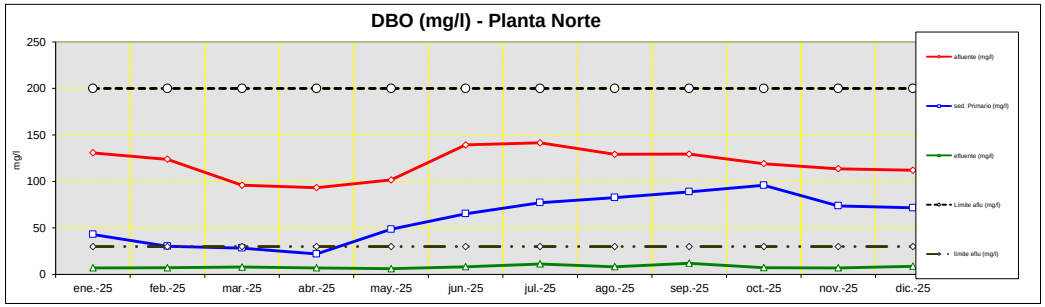


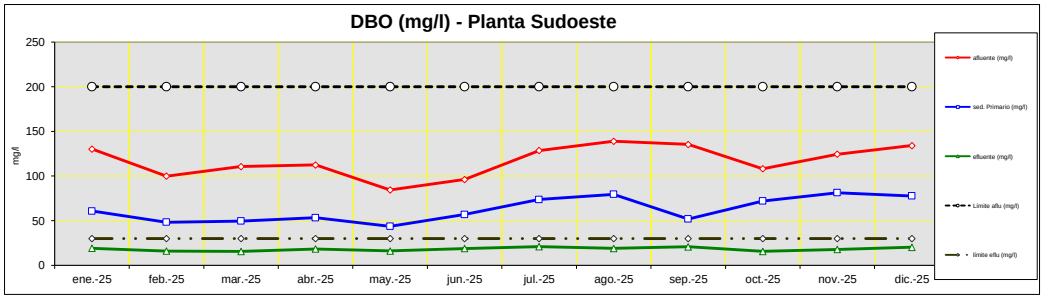


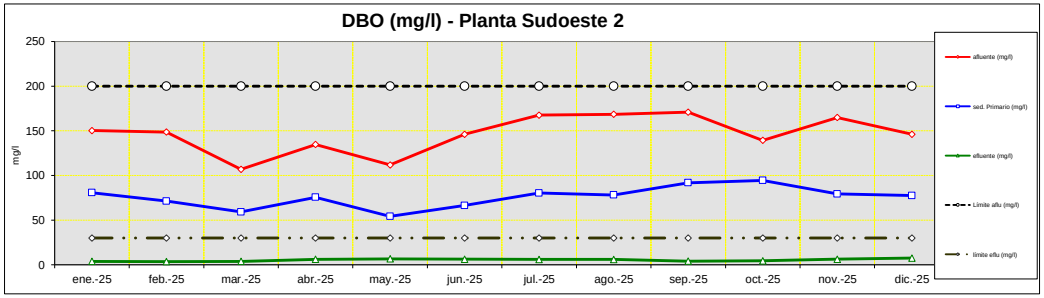


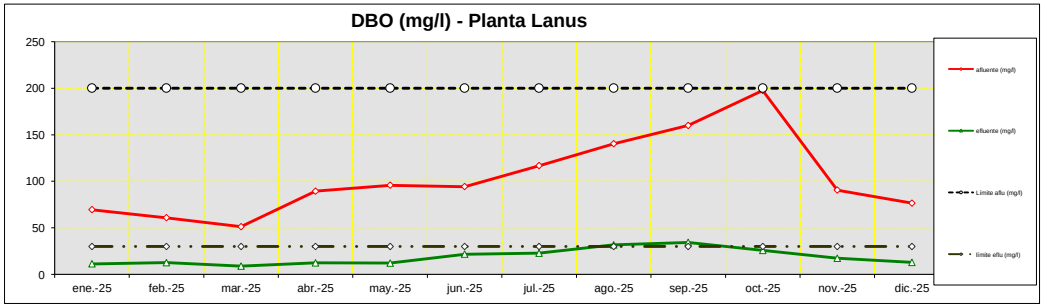


aysa	**PLANTAS DEPURADORAS - Gráficos** **Efluentes (Caracterización de la calidad)** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-S-CS-PD-00 (Ex Nº 23-24-25-26)**

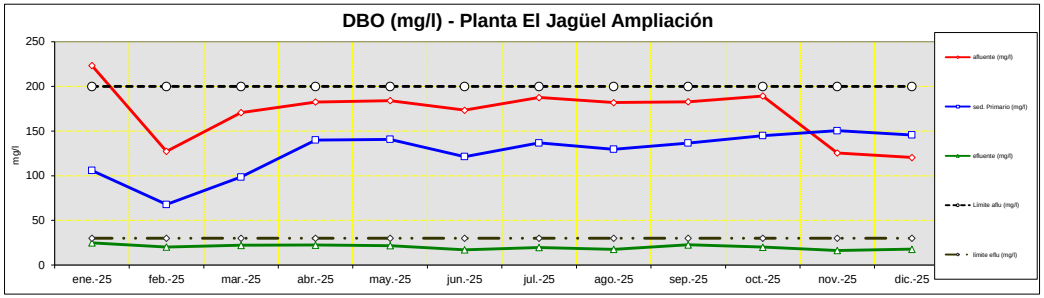


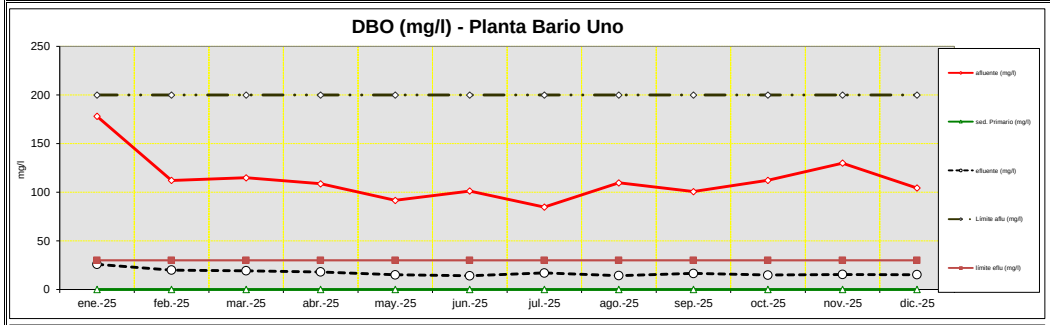

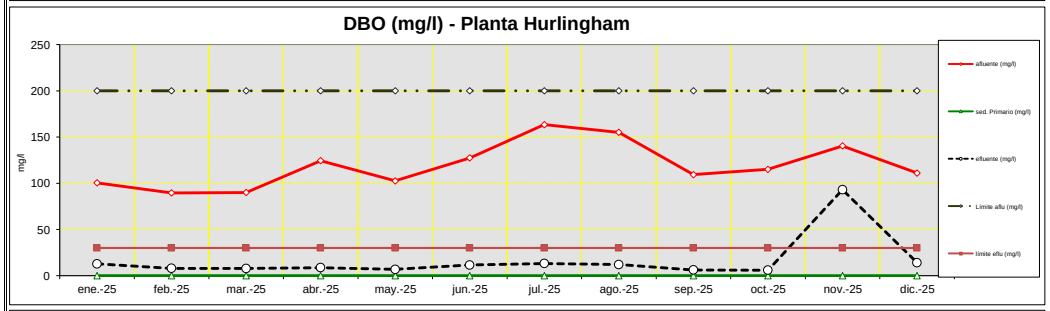

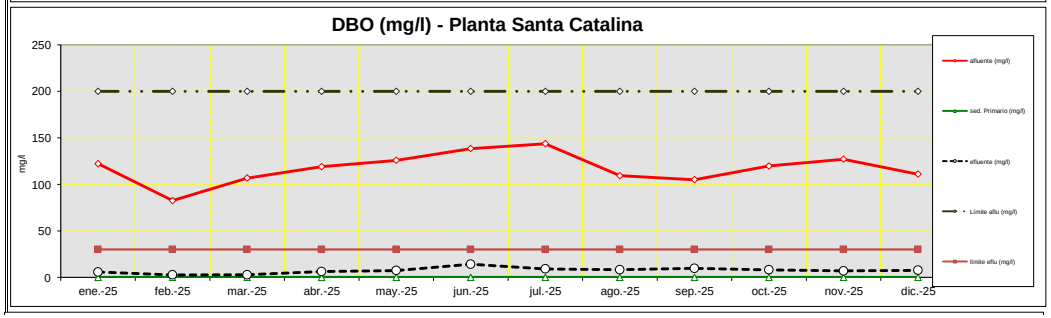

aysa	**PLANTAS DEPURADORAS - Gráficos** **Efluentes (Caracterización de la calidad)** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-S-CS-PD-00 (Ex Nº 23-24-25-26)**

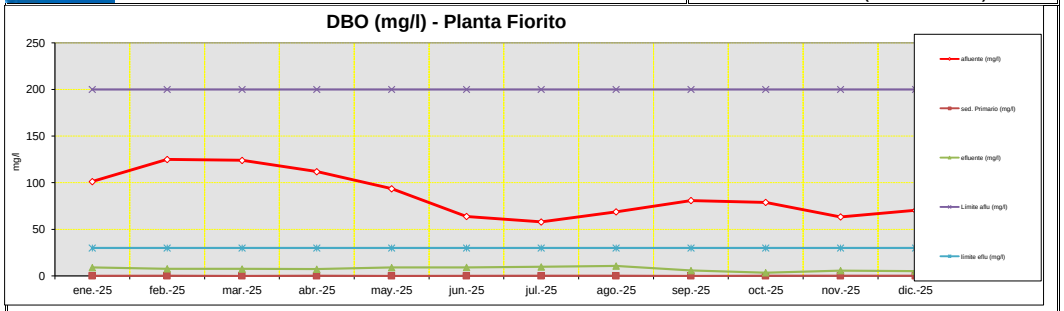

PLANTAS DEPURADORAS (AMBA)

Efluentes (Caracterización de la calidad)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025


Informe de Niveles de Servicio


Año 2025


INS-S-CS-PD-00 (Ex Nº 23-24-25-26)


		Caudal tratado (m3/día)	**DBO** (kg/día)	**DQO** (kg/día)	**SS 10´** (m3/día)	**MES (Materia en suspensión)** (Kg/día)	**Biosólidos Evacuados** (ton/año)	**Biosólidos Evacuados** (TonMS/año)
Planta Bella Vista	Promedio Efluente	35.723	736,0	1.527,1	6,3	668,5	4.808,4	975,1
	% Elim Trat Completo		89%	92%	95%	91%		
Planta Escobar	Promedio Efluente	6.846	169,1	435,2	2,2	171,4	36,3	19,0
	% Elim Trat Completo		72%	71%	82%	68%		
Planta Ferrari	Promedio Efluente	14.291	186,8	748,2	1,4	177,5	3.300,7	716,4
	% Elim Trat Completo		86%	77%	71%	90%		
Planta Garin	Promedio Efluente	1.308	24,1	52,2	0,4	21,3	215,6	22,3
	% Elim Trat Completo		81%	80%	85%	82%		
Planta Catonas	Promedio Efluente	12.168	82,5	348,8	1,2	126,9	3.147,6	631,1
	% Elim Trat Completo		94%	79%	89%	93%		

aysa	**PLANTAS DEPURADORAS - Gráficos** Efluentes (Caracterización de la calidad) Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025	Informe de Niveles de Servicio Año 2025 INS-S-CS-PD-00 (Ex Nº 23-24-25-26)

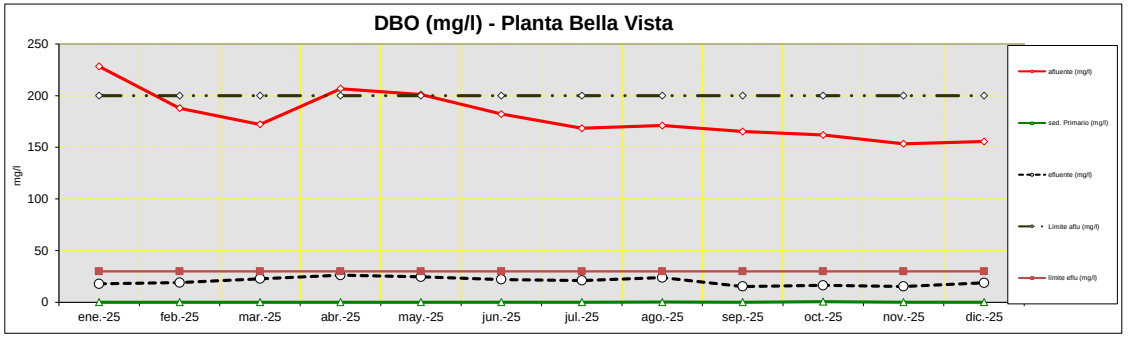


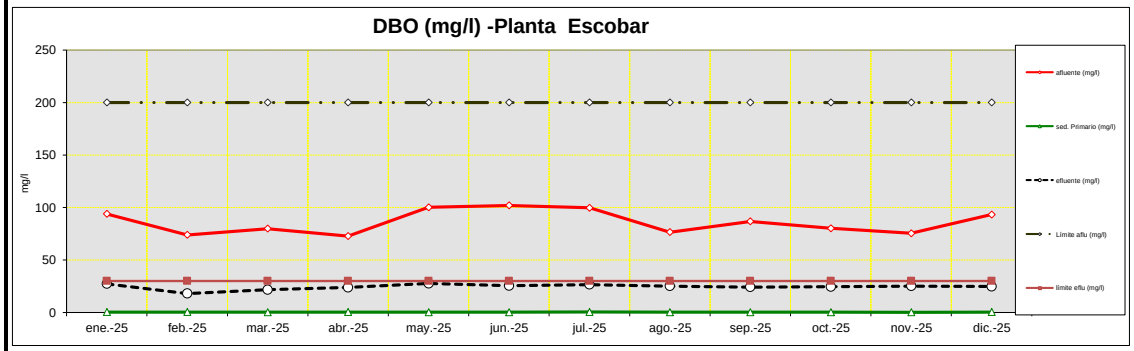

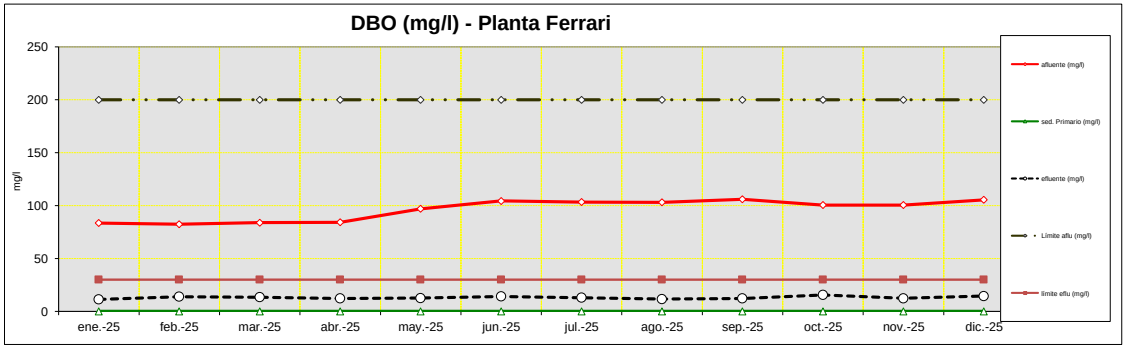

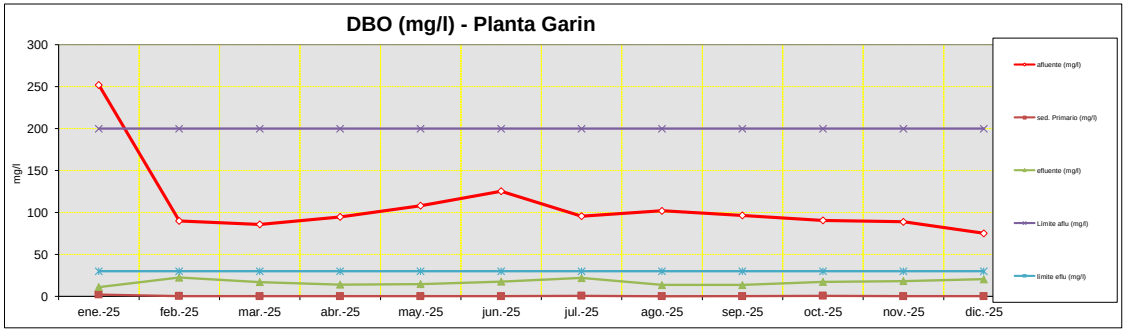

aysa	**PLANTAS DEPURADORAS - Gráficos** **Efluentes (Caracterización de la calidad)** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-S-CS-PD-00 (Ex Nº 23-24-25-26)**

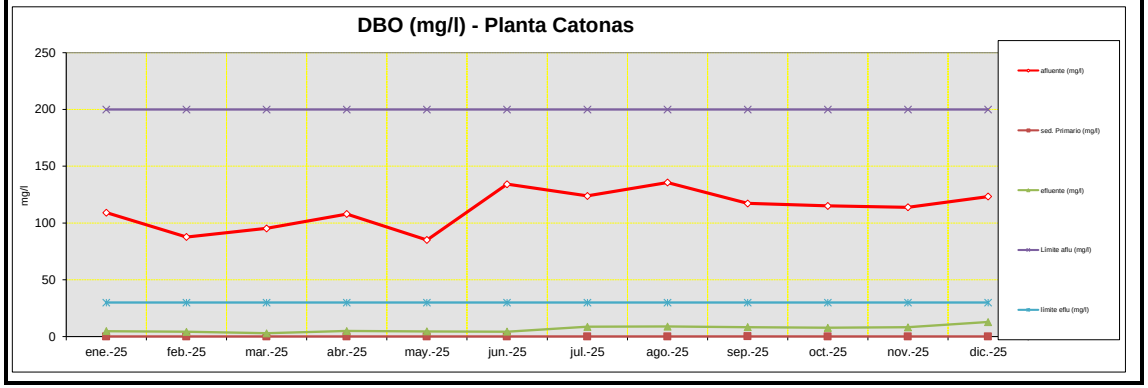

2.1.3 Descarga a Cuerpo Receptor

CALIDAD DE EFLUENTE CLOACAL

Plantas Depuradoras

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2030-INS-S-CS-CR-00 (Ex 28 A 39)

*** Datos Laboratorio de Planta**

Efluente en la salida del establecimiento depurador		pH	SSEE	Sulfuro	Temperatura	DBO	Oxígeno Consumido del KMnO4	Cianuros totales	Cianuros destructibles por Cloro	Hidrocarburos Totales	Cromo III	Cromo VI	Detergentes	Cadmio	Plomo	Mercurio	Arsénico	Fenoles	Aldrín	Dieldrín	Heptacloro	Heptacloro epóxido	DDT	Clordano	Hexacloro benceno	Lindano	2,4 D	Metoxicloro	DQO	MES
		UpH	mg/l	mg/l	°C	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l												
PLANTA NORTE	Muestras Totales	313			313	157	12																						108	364
	Muestras Deficientes																													
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	100,0%	100,0%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	100,0%
	Valor Promedio	7,3			20,8	8,2	3,6																						29,0	6,7
	Valor Máximo	7,8			26,7	28,0	7,7																						70,0	30,0
PLANTA SUDOESTE	Muestras Totales	312			312	361																							81	361
	Muestras Deficientes					1																								5
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	99,7%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	98,6%
	Valor Promedio	7,8			19,3	18,2																							69,8	23,1
	Valor Máximo	8,0			26,6	36,3																							115,0	41,0
PLANTA SUDOESTE MÓDULO II	Muestras Totales	310			311	363																							81	363
	Muestras Deficientes																													
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	100,0%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	100,0%
	Valor Promedio	7,7			18,8	5,4																							36,7	6,8
	Valor Máximo	8,0			26,9	23,3																							80,0	34,0
PLANTA LANUS	Muestras Totales	283			282	180																							46	283
	Muestras Deficientes					16																							4	33
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	91,1%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	91,3%	88,3%
	Valor Promedio	7,6			20,5	18,6																							56,4	25,4
	Valor Máximo	8,0			27,5	64,0																							162,0	203,0
PLANTA EL JAGUEL AMPLIACIÓN	Muestras Totales	312			312	316																							65	364
	Muestras Deficientes					1																								1
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	99,7%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	99,7%
	Valor Promedio	7,9			19,3	20,2																							78,5	21,8
	Valor Máximo	8,0			24,6	37,0																							120,0	39,0
PLANTA BARRIO UNO	Muestras Totales	154			155	302																							42	305
	Muestras Deficientes																													
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	100,0%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	100,0%
	Valor Promedio	7,9			18,9	17,2																							64,7	18,7
	Valor Máximo	8,0			23,7	30,0																							114,0	35,0
PLANTA HURLINGHAM	Muestras Totales	307			295	176	9																						82	360
	Muestras Deficientes					8																							2	12
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	95,5%	100,0%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	97,6%	96,7%
	Valor Promedio	7,6			21,8	15,5	4,1																						24,5	11,3
	Valor Máximo	7,9			27,7	342,0	4,5																						300,0	550,0
PLANTA STA CATALINA	Muestras Totales	279			279	145																							90	270
	Muestras Deficientes																													
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	100,0%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	100,0%
	Valor Promedio	7,0			20,2	7,4																							21,3	8,9
	Valor Máximo	7,9			27,7	26,0																							64,0	26,8
FIORITO	Muestras Totales	346			282	154																							67	358
	Muestras Deficientes																													
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	100,0%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	100,0%
	Valor Promedio	7,9			20,1	7,6																							34,2	8,8
	Valor Máximo	8,0			25,5	26,0																							63,0	34,0

CALIDAD DE EFLUENTE CLOACAL

Plantas Depuradoras (AMBA)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe Anual de Niveles de Servicio

Año 2025

2030-INS-S-CS-CR-00-NA (Ex 28 A 39)

*** Datos Laboratorio de Planta**

Efluente en la salida del establecimiento depurador		pH	SSEE	Sulfuro	Temperatura	DBO	Oxígeno Consumido del KMnO4	Cianuros totales	Cianuros destructibles por Cloro	Hidrocarburos Totales	Cromo III	Cromo VI	Detergentes	Cadmio	Plomo	Mercurio	Arsénico	Fenoles	Aldrín	Dieldrín	Heptacloro	Heptacloro epóxido	DDT	Clordano	Hexacloro benceno	Lindano	2,4 D	Metoxicloro	DQO	MES
		UpH	mg/l	mg/l	°C	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l												
BELLA VISTA	Muestras Totales	303			303	199																							105	352
	Muestras Deficientes					8																								9
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	96,0%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	97,4%
	Valor Promedio	7,5			21,7	20,2																							42,8	18,4
	Valor Máximo	7,9			27,7	84,0																							110,0	120,0
ESCOBAR	Muestras Totales	301			301	123																							27	261
	Muestras Deficientes					1																								1
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	99,2%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	99,6%
	Valor Promedio	7,6			20,7	24,7																							56,2	25,5
	Valor Máximo	7,9			26,5	35,0																							90,0	36,0
FERRARI	Muestras Totales	356			324	197																							14	358
	Muestras Deficientes																													
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	100,0%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	100,0%
	Valor Promedio	7,8			17,6	13,1																							51,9	12,4
	Valor Máximo	8,0			24,9	26,0																							84,0	32,0
GARIN	Muestras Totales	170			175	95																							25	175
	Muestras Deficientes	7				1																								1
	% de Conformidad	95,9%	n / a	n / a	100,0%	98,9%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	99,4%
	Valor Promedio	7,9			21,3	17,7																							38,9	15,6
	Valor Máximo	26,0			26,5	64,0																							73,0	77,0
CATONAS	Muestras Totales	312			312	313																							56	313
	Muestras Deficientes																													
	% de Conformidad	100,0%	n / a	n / a	100,0%	100,0%	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	n / a	100,0%	100,0%
	Valor Promedio	7,8			20,9	6,7																							27,8	10,2
	Valor Máximo	8,0			26,1	22,0																							85,0	34,0

CALIDAD DE EFLUENTES CLOACALES

Plantas Depuradoras

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-CR-01 (Ex 28 A 39)

Datos del Laboratorio Central

Efluente en la salida del establecimiento depurador		pH	SSEE	Sulfuro	Temperatura	DBO	Oxígeno Consumido del KMnO4	Cianuros totales	Cianuros destructibles por Cloro (1)	Hidrocarburos Totales	Cromo III	Cromo VI	Detergentes	Cadmio	Plomo	Mercurio	Arsénico	Fenoles	Aldrín	Dieldrín	Heptacloro	Heptacloro epóxido	DDT	Clordano	Alfa HCH	Hexacloro benceno	Lindano	2,4 D	Metoxicloro	DQO	MES	Observaciones
		UpH	mg/l	mg/l	°C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	
PLANTA NORTE	Muestras Totales	12	22	10	12	24	24	36	0	24	12	12	24	24	24	24	24	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	7,7	35	<0,1	26	2,9	6,4	<0,05	0	<4	<0,1	<0,1	0,4	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	59	<10	
PLANTA SUDOESTE MODULO I	Muestras Totales	12	24	10	12	24	24	36	0	24	12	12	24	24	24	24	24	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	7,9	31	<0,1	24	25	9,7	<0,05	0	<4	0,2	<0,1	1,4	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	97	16	
PLANTA SUDOESTE MODULO II	Muestras Totales	12	23	10	12	24	24	36	0	24	12	12	24	24	24	24	24	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	7,7	17	<0,1	25	14	8,2	<0,05	0	<4	<0,1	<0,1	0,7	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	55	<10	
PLANTA EL JAGUEL MODULO I	Muestras Totales																															
	Muestras Deficientes																															
	% de Conformidad																															
	Valor Máximo																															
PLANTA EL JAGUEL MODULO II	Muestras Totales	12	24	9	12	24	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	8	12	<0,1	23	28	15	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,2	<0,01	<0,1	<4	28	0,02	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	120	34	
PLANTA BARRIO UNO	Muestras Totales	12	24	9	12	22	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	8	14	<0,1	23	13	9	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,6	<0,01	<0,1	<4	28	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	90	32	
PLANTA HURLINGHAM	Muestras Totales	12	24	10	12	23	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	7,6	11	<0,1	26	5,9	5,8	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,4	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	69	<10	
PLANTA STA CATALINA	Muestras Totales	12	24	10	12	12	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	12	24	
	Muestras Deficientes	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3	
	% de Conformidad	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	88%	
	Valor Máximo	8,4	21	<0,1	28	7,6	7,1	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,6	<0,01	<0,1	<4	<20	0,02	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	76	335	
PLANTA FIORITO	Muestras Totales	12	22	9	12	18	18	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	18	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	2	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	89%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	75%	
	Valor Máximo	8	19	<0,1	28	43	13	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,9	<0,01	<0,1	<4	82	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	115	110	
PLANTA LANUS	Muestras Totales	12	24	9	12	12	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	12	24	
	Muestras Deficientes	1	0	0	0	2	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	7	
	% de Conformidad	92%	100%	100%	100%	83%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	83%	71%	
	Valor Máximo	8,5	23	<0,1	28	59	30	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,8	<0,01	<0,1	<4	46	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	335	140	

PLANTAS DE PURADORAS NUEVOS PARTIDOS:

Efluente en la salida del establecimiento depurador		pH	SSEE	Sulfuro	Temperatura	DBO	Oxigeno Consumido del KMnO4	Cianuros totales	Cianuros destructibles por Cloro (1)	Hidrocarburos Totales	Cromo III	Cromo VI	Detergentes	Cadmio	Plomo	Mercurio	Arsénico	Fenoles	Aldrín	Dieldrín	Heptacloro	Heptacloro epóxido	DDT	Clordano	Alfa HCH	Hexacloro benceno	Lindano	2,4 D	Metoxicloro	DQO	MES	Observaciones
		UpH	mg/l	mg/l	°C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	
PLANTA BELLA VISTA	Muestras Totales	12	22	10	12	24	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	7,6	29	<0,1	25	7,8	7	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,7	<0,01	<0,1	<4	22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	71	26	
PLANTA LAS CATONAS	Muestras Totales	12	24	10	12	21	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	7,9	19	<0,1	25	125	9,9	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1	<0,01	<0,1	<4	52	0,02	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	96	20	
PLANTA ESCOBAR	Muestras Totales	12	24	9	12	12	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	12	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	96%	
	Valor Máximo	8	37	<0,1	27	33	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	105	66	
PLANTA FERRARI	Muestras Totales	12	24	10	12	16	16	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	16	24	
	Muestras Deficientes	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	8,2	35	<0,1	29	11	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,9	<0,01	<0,1	<4	30	0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	86	76	
PLANTA FLORENCIO VARELA	Muestras Totales	12	22	10	12	22	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	14	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	8	20	0,8	25	15	7,6	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,9	<0,01	<0,1	<4	45	0,03	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	86	26	
PLANTA GARIN	Muestras Totales	12	23	10	12	9	12	36		24	12	12	24	24	24	24	24	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	12	24	
	Muestras Deficientes	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	5	
	% de Conformidad	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	92%	79%	
	Valor Máximo	8,1	29	<0,1	26	24	23	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,8	<0,01	<0,1	<4	25	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	240	260	
PLANTA GUERNICA	Muestras Totales	12	23	10	12	24	24	36		24	12	12	24	24	24	24	24	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	24	24	
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Valor Máximo	8	19	<0,1	24	20	8	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,6	<0,01	<0,1	<4	46	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	66	26	

CALIDAD DE EFLUENTES CLOACALES

Otros vuelcos a cuerpo receptor - RESUMEN

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2050-INS-S-CS-CR-02 (Ex 28 A 39)

Otros vuelcos a cuerpo receptor		pH	SSEE	Sulfuro	Temperatura	DBO	Oxígeno Consumido del KMnO4	Cianuros totales	Cianuros destructibles por Cloro (1)	Hidrocarburos Totales	Cromo III	Cromo VI	Detergentes	Cadmio	Plomo	Mercurio	Arsénico	Fenoles	Aldrín	Dieldrín	Heptacloro	Heptacloro epóxido	DDT	Clordano	Alfa HCH	Hexacloro benceno	Lindano	2,4 D	Metoxicloro	DQO	MES
		UpH	mg/l	mg/l	°C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l
RADIO ANTIGUO CE_DOB_1 (*)	Muestras Totales																														
	Muestras Deficientes																														
	% de Conformidad																														
	Valor Máximo																														
RADIO ANTIGUO CE_DOB_2 (*)	Muestras Totales																														
	Muestras Deficientes																														
	% de Conformidad																														
	Valor Máximo																														
RADIO ANTIGUO CE_TRI_1	Muestras Totales	12	11	0	12	10	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	0
	Muestras Deficientes	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	92%	100%	NA	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	NA	NA
	Valor Máximo	8,8	22	0	28	63	16	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,4	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04	0	<5	0	0
RADIO ANTIGUO CE_TRI_2	Muestras Totales	12	11	0	12	10	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	0
	Muestras Deficientes	2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	83%	100%	NA	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	NA	NA
	Valor Máximo	9	<10	0	28	64	17	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,6	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04	0	<5	0	0
RADIO ANTIGUO CE_TRI_3	Muestras Totales	12	11	0	12	10	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	0
	Muestras Deficientes	2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	83%	100%	NA	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	NA	NA
	Valor Máximo	9	12	0	28	69	13	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,5	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04	0	<5	0	0
RADIO ANTIGUO CE_UGTCHE	Muestras Totales	12	11	0	12	11	12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	0
	Muestras Deficientes	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	92%	100%	NA	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	NA	NA
	Valor Máximo	8,6	34	0	29	115	23	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,3	<0,01	<0,1	<4	<20	0,03	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04	0	<5	0	0
BERAZATEGUI	Muestras Totales	11	22	9	11	22	22	33		22	11	11	22	22	22	22	22	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	6	22	22
	Muestras Deficientes	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% de Conformidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%
	Valor Máximo	7,7	59	0,5	25	129	31	<0,05		<4	0,2	<0,1	2,3	<0,01	<0,1	<4	<20	0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04	0	<5	375	160

(*) Debido a las obras realizadas por el GCBA (instalación de compuertas fijas) no se puede acceder de una forma segura a estos puntos de muestreo.

(1) El parámetro "Cianuros destructibles por cloro" se analiza sólo cuando el valor correspondiente a "Cianuros totales" es mayor a 0,05 mg/l.

aysa

CALIDAD DE EFLUENTE CLOACAL

Otros vuelcos a cuerpo receptor - DETALLE

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2060-INS-S-CS-CR-03 (Ex 28 a 39)

Datos del Laboratorio Central.

Otros vuelcos a cuerpo receptor		pH	SSEE	Sulfuros	Temperatura	DBO	Oxigeno Consumido del KMnO4	Cianuros totales	Cianuros destructibles por Cloro	Hidrocarburos Totales	Cromo III	Cromo VI	Detergentes	Cadmio	Plomo	Mercurio	Arsénico	Fenoles	Aldrín	Dieldrín	Heptacloro	Heptacloro epóxido	DDT	Clordano	alfa-HCH	Hexacloro benceno	Lindano	2,4 D	Metoxicloro	DQO	MES
DENOMINACIÓN	**FECHA**	UpH	mg/l	mg/l	°C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	[µg/l]	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l
RADIO ANTIGUO CE_DOB_1																															
RADIO ANTIGUO CE_DOB_2																															
RADIO ANTIGUO CE_TRI_1	10/01/2025 09:30	6,9	<10		27	9,1	5,1	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	07/02/2025 11:35	6,9	<10		28		5,4	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	01/04/2025 09:15	7,2	<10		23		5,1	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,4	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	12/05/2025 10:25	7,4	15		21	63	16	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,3	<0,01	<0,1	<4	20														
	05/03/2025 09:20	7,5	10		27	10	5,7	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	16/12/2025 12:00	8,8			27	28	7,1	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	23/07/2025 11:05	7,6	<10		17	40	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,7	<0,01	<0,1	<4	<20														
	06/06/2025 09:30	8	<10		16	47	9,6	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1	<0,01	<0,1	<4	<20														
	14/08/2025 10:30	7,7	22		15	30	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	05/09/2025 09:30	8	<10		18	48	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,7	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	09/10/2025 09:15	7	10		22	49	9,3	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,4	<0,01	<0,1	<4	<20														
	07/11/2025 10:45	7,2	<10		20	22	6,5	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,3	<0,01	<0,1	<4	<20														
RADIO ANTIGUO CE_TRI_2	10/01/2025	7	<10		27	10	5,7	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	07/02/2025	6,9	10		28		5,9	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	01/04/2025	7,1	<10		23		5,6	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	12/05/2025	7,6	<10		23	64	14	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,6	<0,01	<0,1	<4	<20														
	05/03/2025	7,3	<10		27	11	5	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	16/12/2025	9			26	10	5,4	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	23/07/2025	7,6	<10		17	40	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,6	<0,01	<0,1	<4	<20														
	06/06/2025	7,9	<10		18	52	10	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,2	<0,01	<0,1	<4	<20														
	14/08/2025	7,5	<10		16	30	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,9	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	05/09/2025	8,1	<10		18	56	17	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,8	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	09/10/2025	6,9	10		21	47	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,2	<0,01	<0,1	<4	<20														
	07/11/2025	7,2	<10		20	22	7,3	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20														
RADIO ANTIGUO CE_TRI_3	10/01/2025	7,1	<10		28		5,1	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	07/02/2025	7	<10		28		6	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	01/04/2025	7	10		23	69	5,7	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	12/05/2025	7,6	<10		23	57	13	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,5	<0,01	<0,1	<4	<20														
	05/03/2025	7,2	<10		27	11	4,5	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	16/12/2025	9			27	9,2	5,8	<0,05		<4	<0,1	<0,1	<0,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	23/07/2025	7,5	<10		16	28	7,9	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,5	<0,01	<0,1	<4	<20														
	06/06/2025	7,8	12		18	54	9,8	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1	<0,01	<0,1	<4	<20														
	14/08/2025	7,5	<10		16	32	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,9	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	05/09/2025	8,1	<10		18	33	13	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,7	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	09/10/2025	7,1	<10		21	45	10	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1	<0,01	<0,1	<4	<20														
	07/11/2025	7,3	12		20	46	8	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,7	<0,01	<0,1	<4	<20														
	10/01/2025	7,1	22		28	108	16	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,9	<0,01	<0,1	<4	<20	0,03	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	07/02/2025	7,2	<10		29		4,7	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,4	<0,01	<0,1	<4	<20	0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		
	01/04/2025	7,7	26		24	69	12	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,4	<0,01	<0,1	<4	<20	0,02													
	12/05/2025	8	10		22	112	19	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,9	<0,01	<0,1	<4	<20														
	05/03/2025	7,7	<10		27	66	11	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,6	<0,01	<0,1	<4	<20	0,02	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5		

CALIDAD DE EFLUENTE CLOACAL

Otros vuelcos a cuerpo receptor - DETALLE

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2060-INS-S-CS-CR-03 (Ex 28 a 39)

Datos del Laboratorio Central.

Otros vuelcos a cuerpo receptor		pH	SSEE	Sulfuros	Temperatura	DBO	Oxigeno Consumido del KMnO4	Cianuros totales	Cianuros destructibles por Cloro	Hidrocarburos Totales	Cromo III	Cromo VI	Detergentes	Cadmio	Plomo	Mercurio	Arsénico	Fenoles	Aldrín	Dieldrín	Heptacloro	Heptacloro epóxido	DDT	Clordano	alfa-HCH	Hexacloro benceno	Lindano	2,4 D	Metoxicloro	DQO	MES
DENOMINACIÓN	**FECHA**	UpH	mg/l	mg/l	°C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	[µg/l]	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l
RADIO ANTIGUO CE_UGTCHE	16/12/2025	8,6			26	96	10	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,4	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	23/07/2025	7,7	34		16	67	12	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,1	<0,01	<0,1	<4	<20														
	06/06/2025	7,3	34		18	85	13	<0,05		<4	<0,1	<0,1	0,5	<0,01	<0,1	<4	<20														
	14/08/2025	7,5	16		19	115	23	<0,05		<4	<0,1	<0,1	2,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	05/09/2025	7,4	<10		17	61	15	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01													
	09/10/2025	7,2	10		23	84	12	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,8	<0,01	<0,1	<4	<20														
	07/11/2025	7,2	<10		20	47	9,5	<0,05		<4	<0,1	<0,1	1,2	<0,01	<0,1	<4	<20														
BERAZATEGUI	09/01/2025		22			71	15	<0,05		<4			1,1	<0,01	<0,1	<4	<20	0,02	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	210	38
	09/01/2025		34			80	25	<0,05		<4			1,5	<0,01	<0,1	<4	<20	0,02	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	285	115
	10/01/2025	7,4		0,5	25			<0,05			0,2	<0,1																		
	12/02/2025		20			59	21	<0,05		<4			1,3	<0,01	<0,1	<4	<20	0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	200	100
	12/02/2025		26			92	31	<0,05		<4			1,6	<0,01	<0,1	<4	<20	0,04	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	270	130
	13/02/2025	7,5		0,2	25			<0,05			<0,1	<0,1																		
	12/03/2025		<10			73	13	<0,05		<4			0,9	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	150	105
	12/03/2025		12			100	17	<0,05		<4			1,5	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,04	<0,04	<1	<0,1	<0,04	<0,01	<0,04		<5	270	105
	13/03/2025	7,6			22			<0,05			<0,1	<0,1																		
	22/04/2025		13			76	21	<0,05		<4			0,8	<0,01	<0,1	<4	<20	0,03												235	92
	22/04/2025		17			105	24	<0,05		<4			1,3	<0,01	<0,1	<4	<20	0,01												335	150
	23/04/2025	7,5			21			<0,05			<0,1	<0,1																		
	20/05/2025		<10			64	15	<0,05		<4			0,5	<0,01	<0,1	<4	<20													175	90
	20/05/2025		29			68	15	<0,05		<4			0,8	<0,01	<0,1	<4	<20													200	28
	21/05/2025	7,7		0,4	19			<0,05			<0,1	<0,1																		
	11/06/2025		59			75	20	<0,05		<4			1	<0,01	<0,1	<4	<20													205	78
	11/06/2025		55			125	26	<0,05		<4			1,3	<0,01	<0,1	<4	<20													275	115
	12/06/2025	7,6		0,5	18			<0,05			<0,1	<0,1																		
	09/07/2025		<10			100	26	<0,05		<4			1,5	<0,01	<0,1	<4	<20													290	88
	09/07/2025		<10			129	30	<0,05		<4			1,6	<0,01	<0,1	<4	<20													375	120
	10/07/2025	7,6		0,5	18			<0,05			<0,1	<0,1																		
	12/08/2025		10			89	19	<0,05		<4			2,3	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01												185	60
	12/08/2025		17			46	17	<0,05		<4			1,5	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01												125	44
	13/08/2025	7,5		0,2	19			<0,05			<0,1	<0,1																		
	10/09/2025		19			72	24	<0,05		<4			2	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01												155	74
	10/09/2025		23			107	26	<0,05		<4			2,2	<0,01	<0,1	<4	<20	<0,01												290	160
	11/09/2025	7,3		0,1	19			<0,05			<0,1	<0,1																		
	13/10/2025		10			47	14	<0,05		<4			1	<0,01	<0,1	<4	<20													125	84
	13/10/2025		28			84	22	<0,05		<4			1,6	<0,01	<0,1	<4	<20													160	110
	14/10/2025	7,5		0,1	22			<0,05			0,1	<0,1																		
	12/11/2025		<10			75	19	<0,05		<4			1	<0,01	<0,1	<4	<20													220	36
	12/11/2025		<10			64	22	<0,05		<4			1,2	<0,01	<0,1	<4	<20													270	86
	13/11/2025	7,4		<0,1	23			<0,05			<0,1	<0,1																		

(1) El parámetro "Cianuros destructibles por cloro" se analiza sólo cuando el valor correspondiente a "Cianuros totales" es mayor a 0,05 mg/l.

2.1.4 Efluentes Industriales

INFORME NIVELES DE SERVICIO

Plan de Muestreo Calidad de Efluentes

1. Introducción

El control de la calidad de los líquidos residuales descargados en la red de saneamiento del área servida de la Concesión de AySA, recolectados, transportados, tratados y finalmente descargados al cuerpo receptor, es llevado a cabo a través de un control integral de calidad en los diferentes puntos del sistema, éste es llamado: Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes.

El Plan controla la calidad de los vertidos en los diferentes puntos del sistema de saneamiento. El control se inicia en los líquidos volcados al sistema cloacal, cubre las etapas intermedias del proceso de transporte y tratamiento y alcanza el efluente tratado por las plantas depuradoras antes de su descarga al medio receptor.

Dicho Plan, no es un plan de prevención de la contaminación, sino de control de la misma, se planifica a partir de las exigencias emanadas del Marco Regulatorio (MR) aprobado por la Ley 26.221, es una herramienta que apunta a la detección de los vertidos fuera de norma volcados a la red de colectoras.

Es un control que aporta la información base para entre otras acciones, identificar nuevos aportes, y la ejecución de operativos de control directo no programado para identificar a los causantes de los vertidos fuera de norma.

El control indirecto en toda el área servida por desagües cloacales de la Concesión se llevó a cabo durante el año 2025 sobre un total de 270 puntos fijos de muestreo, distribuidos de la siguiente manera:

- 207 BRs correspondientes a microcuencas
- 42 BRs correspondientes a macrocuencas
- 21 puntos de afluentes de plantas

Por su parte, el Control Directo se efectuó sobre las galvanoplastias y las industrias ubicadas en microcuencas comprometidas.

Esto se ve completado a su vez por los seguimientos y operativos especiales realizados por la Gerencia de Calidad, el Laboratorio Central y las distintas Direcciones Regionales que se originan a partir de la evaluación de los resultados obtenidos de las muestras extraídas por el Control Directo y el Control Indirecto.

En su conjunto, el Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes permite dirigir de una manera más eficiente los esfuerzos que realiza el Concesionario en el monitoreo de los volcamientos de efluentes industriales a sus redes colectoras.

Del análisis realizado sobre las operaciones de muestro y resolución analítica de las muestras vinculadas a la causa de extracción que corresponde al proceso del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, resulta que se han cumplido con los aspectos requeridos por el Marco Regulatorio.

2. Control Indirecto

2.1 Microcuencas

i) Recategorización de microcuencas

Durante el mes de diciembre de 2024, se realizó la recategorización de MI de acuerdo al procedimiento vigente E-CAL-CIC-002 "Definición, Categorización y Actualización de Microcuencas y Macrocuencas".

Este procedimiento se basa en un análisis del riesgo; se evalúa la probabilidad de que existan desvíos de calidad en cada microcuenca, en función de la cantidad y tipo de establecimientos instalados en cada una, discriminando los parámetros en tres niveles de riesgo, Prioritarios, Ecotóxicos y Otros (asimilables a domiciliario) y la cantidad de establecimientos que pueden descargar cada tipo de parámetros en cada microcuenca. De esta forma se invierten los recursos humanos y económicos de una manera más eficaz para detectar e identificar los causantes de tales desvíos.

La categoría asignada a cada microcuenca es un dato dinámico que puede variar año a año por múltiples causas, ya sea expansión de la red, variaciones en los establecimientos radicados en la cuenca, en tipo y cantidad, obras que modifican el funcionamiento hidráulico de la red, etc. Se considera además para recategorizar a las microcuencas la detección reiterada de desvíos de calidad en parámetros prioritarios y/o ecotóxicos.

Este criterio es otro gran paso para mantener un sistema de control dinámico que se retroalimente y actualice periódicamente, y analizar la información obtenida en un proceso de mejora continua, dirigiendo los recursos a controlar de manera más eficaz los riesgos de desvíos.

Para proceder a la recategorización de las Microcuencas se analizó la siguiente información:

- Actualización de la Base de Industrias al 02/12/2024;
- Operativos de Control Directo No Programado realizados en la red cloacal a partir de la detección de desvíos (Período: 2023-2024);
- Información de niveles de funcionamiento de la red cloacal;
- Incorporación de áreas de expansión de la red cloacal en el área de concesión.

Inicialmente se recalculan las categorías teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos industriales de cada microcuenca y los rubros a los que pertenecen. Luego se aplica el resto de los criterios mencionados con el fin de ajustar la categorización.

El conjunto de microcuencas, luego de la recategorización efectuada al final del año 2024 quedó establecido en un total de 365, según el siguiente detalle:

Distrito	Total general	MI1	MI2	MI3	MID	MIC
Almirante Brown	4				3	1
Avellaneda	22	3			3	16
Caballito	26	7		1	11	7
Centro	4	1				3
Constitución	20		2		5	13
Devoto	20	13			3	4
Esteban Echeverría	5	2			1	2
Flores	24	9	1	3	5	6
Hurlingham	5			5		
La Matanza Norte	10	4		3	1	2
La Matanza Sur	15	4		2	6	3
Lanús	26					26
Lomas de Zamora	21				11	10
Morón	8	2		1	4	1
Quilmes	37	5			15	17
Saavedra	26	7		2	9	8
San Fernando	10	3			3	4
San Isidro	16	3			4	9
San Martín	26	4		7	4	11
Tigre	7				6	1
Tres de Febrero	7	1		4		2
Vicente López	26	4		3	7	12
Total general	**365**	**72**	**3**	**31**	**101**	**158**

ii) Muestreo en BRs de Microcuencas

Se realizaron todas las inspecciones programadas en las bocas de registro de microcuencas para dar cumplimiento al Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes 2025, y se reiteraron en todos los casos que por impedimentos técnico–operativos no se pudo instalar el equipo en la fecha programada.

Durante este período, se tomaron un total de 1.139 muestras, tanto puntuales como compuestas, en el marco del Control Indirecto Programado del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes. Los resultados indican que 96 muestras de microcuencas presentaron concentraciones superiores a los límites establecidos en el Marco Regulatorio.

En cuanto al Control Indirecto No Programado, se extrajeron 48 muestras, también entre puntuales y compuestas, de las cuales 11 registraron valores por encima de los límites regulatorios.

iii) Calidad de efluentes en Microcuencas

Los parámetros determinados han sido los siguientes:

Parámetros Prioritarios:

- **Cianuros totales** (límite 1 mg/l): se realizaron 1146 determinaciones para este parámetro, encontrándose todas las muestras dentro de norma.

- **Cianuros destructibles por cloración** (límite 0,1 mg/l): no se realizaron determinaciones.

- **Hidrocarburos totales** (límite 50 mg/l): se realizaron 761 determinaciones, encontrándose todas las muestras dentro de norma.

- **Sulfuros** (límite 1 mg/l): se realizaron 344 determinaciones, encontrándose 10 muestras fuera de norma.

- **pH** (entre 5,5 y 10) se realizaron 431 determinaciones, encontrándose 3 muestras fuera de norma.

Parámetros Ecotóxicos:

- **Cromo trivalente** (límite 2 mg/l): se realizaron 389 determinaciones, encontrándose 1 muestra fuera de norma.

- **Cromo hexavalente** (límite 0,2 mg/l): se realizaron 390 determinaciones, encontrándose 1 muestra fuera de norma.

- **Mercurio** (límite 5 µg/l): se realizaron 1145 determinaciones, sin registrarse muestras fuera de norma.

- **Cadmio** (límite 0,1 mg/l): se realizaron 1144 determinaciones, sin registrarse muestras fuera de norma.

- **Sustancias Fenólicas** (límite 0,5 mg/l): se realizaron 351 determinaciones, sin registrarse muestras fuera de norma.

- **Plomo** (límite 0,5 mg/l): se realizaron 1144 determinaciones, sin registrarse muestras fuera de norma.

- **Arsénico** (limite 500 µg/l): se realizaron 1144 determinaciones, sin registrarse muestras fuera de norma.

Otros Parámetros:

- **DBO** (límite 200 mg/l): se realizaron 392 determinaciones, encontrándose 70 muestras fuera de norma.

- **Oxidabilidad** (límite 80 mg/l): se realizaron 756 determinaciones, encontrándose 13 muestras fuera de norma.

- **Sustancias solubles en éter etílico** (límite 100 mg/l): se realizaron 748 determinaciones, encontrándose 11 muestras fuera de norma.

- **SRAO** (detergentes aniónicos, límite 5 mg/l): se realizaron 762 determinaciones, encontrándose 10 muestras fuera de norma.

iv) Operativos en Microcuencas

Cuando en alguna muestra del Control Indirecto en microcuencas se detectan parámetros fuera de norma se disparan Operativos para investigar el origen del desvío en la/s industria/s ubicadas en esa microcuenca que pudieran ser los causantes de esos vuelcos fuera de norma.

Como norma general y de acuerdo a lo establecido en el Instrumento de Vinculación, estos operativos se realizan para todos los casos de desvíos en parámetros prioritarios y/o ecotóxicos, excepto para hidrocarburos totales en microcuencas, en cuyo caso solo se realizan para valores significativos.

Respecto de los parámetros DBO, SRAO y SSEE, sólo se disparan estos operativos, si los valores detectados son significativos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento E-CAL-EFL-001.

Los resultados de los operativos asociados a los desvíos identificados generaron la actualización del padrón de industrias registradas en estas áreas. Asimismo se utiliza esta información para efectuar la categorización de las MI.

	Operativos en Microcuencas 2025				
Tipo de Microcuencas	**Domiciliaras MID**	**Industrial tipo MI1**	**Industrial tipo MI2**	**Industrial tipo MI3**	**Total**
Cantidad de operativos realizados	**1**	**2**	**0**	**7**	**10**

Durante el 2025 se realizaron Operativos de Control Directo No Programado en las siguientes microcuencas:

Punto de Muestreo	Parámetro Fuera de Norma	Fecha de Muestreo
MMS035	**DBO**	30/1/2025
MSM009	**pH**	24/2/2025
MCA018	**pH**	28/3/2025
MMS028	**SULFUROS**	21/5/2025
MHU002	**SULFUROS**	3/10/2025
MTR012	**CROMO TRIVALENTE**	17/10/2025
MAV001	**SULFUROS**	16/10/2025
MHU008	**SULFUROS**	15/10/2025
MFL039	**SULFUROS**	3/10/2025
MHU002	**SULFUROS**	14/11/2025

2.2 Macrocuencas

I. Muestreo en Macrocuencas

Se debe destacar que estos sitios de muestreo corresponden a grandes conducciones de transporte de líquido cloacal que recolectan líquidos de las microcuencas para descargar en el cuerpo receptor, por lo que cuando se detecta un parámetro fuera

de norma el área en la que se busca la posible fuente de contaminación es muy amplia, resultando en ocasiones poco efectiva la búsqueda.
Además, dado su gran diámetro y el caudal que transporta, todo resultado fuera de norma implica una descarga de contaminante muy importante. Sin embargo, en el periodo informado, se han detectado algunas de las industrias que se encontraban descargando fuera de norma y cuyo vuelco se traducía en una no conformidad en el punto de muestreo de la macrocuenca correspondiente.

II. Calidad de Efluentes en Macrocuencas

Se extrajeron durante el año 2025 un total de 970 muestras entre puntuales y compuestas. Los resultados indican que se han producido excesos de concentración respecto de los límites del MR en 52 muestras.

Los parámetros que se registraron fuera de norma son los siguientes: DBO, Oxidabilidad, SSEE, Mercurio, Sólidos totales suspendidos, Sulfuros

Se presenta la síntesis de los resultados obtenidos en los sucesivos muestreos de las macrocuencas en la planilla INS-S-CS-RED-00_2025.

III. Desvíos en Macrocuencas que originaron operativos

Para los desvíos detectados en macrocuencas se aplica el criterio definido en el procedimiento específico E-CAL-EFL-001 para la realización de un Operativo de Control Directo No Programado.

Durante el 2025 se realizaron Operativos de Control Directo No Programado en las siguientes macrocuencas:

Punto de Muestreo	Parámetro Fuera de Norma	Fecha de Muestreo
PDSA_AFLU	SSEE	2/1/2025
MACAVE0395	SULFUROS	23/1/2025
MACAVE0290	SULFUROS	23/1/2025
PDFE_AFLU	SULFUROS	10/1/2025
PDSC_AFLU	SULFUROS	4/6/2025
PDEJ2_AFLU	SSEE	2/6/2025
PDMO_AFLU	DBO	10/6/2025
PBZ_AFLU	SULFUROS	12/6/2025
PDMO_AFLU	SULFUROS	10/6/2025
PDMO_AFLU	SSEE	10/6/2025
PBZ_AFLU	SULFUROS	10/7/2025
PDH_AFLU	SULFUROS	15/7/2025
PDEJ2_AFLU	SULFUROS	7/8/2025
PDG_AFLU	SSEE	28/8/2025
PBZ_AFLU	SULFUROS	14/10/2025
PDFE_AFLU	SULFUROS	15/10/2025
MACSIS0010	SULFUROS	23/10/2025

Punto de Muestreo	Parámetro Fuera de Norma	Fecha de Muestreo
MACDEV2380	**DBO**	28/11/2025
MACSAA0009	**SULFUROS**	19/11/2025
PDG_AFLU	**MERCURIO**	4/12/2025
MACDEV2380	**SSEE**	27/11/2025

2.3 Descargas a Cuerpo Receptor

I. Muestreo de Descargas a Cuerpo Receptor

Durante el año 2025 se extrajeron 657 muestras entre compuestas y puntuales. El detalle de la cantidad de muestras extraídas es el siguiente:

Punto de Muestreo		Muestras Extraídas		
Código	**Ubicación**	**Puntuales**	**Compuestas**	**Totales**
CE_TRI_1	TRIPLE COND. N°1 (CANGALLO) BOUCHARD Y SARMIENTO	12	0	12
CE_TRI_2	TRIPLE COND. N°2 (MEXICO)ROSALES Y SARMIENTO L/P	12	0	12
CE_TRI_3	TRIPLE COND. N°3 (GARAY) ROSALES Y SARMIENTO L/R.	12	0	12
CE_UGTCHE	UGARTECHE	12	0	12
PBZ_EFLU	DESCARGA BERAZATEGUI	11	22	33
PDBU_EFLU	PLANTA BARRIO UNO	12	24	36
PDBV_EFLU	PLANTA VELLA VISTA	12	24	36
PDCA_EFLU	PLANTA LAS CATONAS	12	24	36
PDEJ2_EFLU	PLANTA EL JAGUEL AMPLIACION	12	24	36
PDES_EFLU	PLANTA ESCOBAR	14	22	36
PDFE_EFLU	PLANTA FERRARI	14	22	36
PDFI_EFLU	PLANTA FIORITO	12	24	36
PDFV_EFLU	PLANTA FLORENCIO VARELA	12	24	36
PDG_EFLU	PLANTA GARIN	14	22	36
PDGU_EFLU	PLANTA GUERNICA	12	24	36
PDH1_EFLU	PLANTA HURLINGHAM	12	24	36
PDLN_EFLU	PLANTA LANÚS	11	25	36
PDN_EFLU1	PLANTA NORTE	12	24	36
PDSC_EFLU	PLANTA SANTA CATALINA	11	25	36
PDSO1_EFLU	PLANTA SUDOESTE I	12	24	36
PDSO2_EFLU	PLANTA SUDOESTE II	12	24	36

Cabe aclarar que durante el 2025 el acceso a los puntos de muestreo del doble conducto estuvo imposibilitado durante la totalidad del año debido a las obras realizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

II. Calidad de Efluentes en Descargas a Cuerpo Receptor

Los parámetros determinados han sido los siguientes:

Descargas sin tratamiento

Descarga Radio Antiguo

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 48 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, encontrándose 6 muestras con valores fuera de norma para el parámetro pH.

Descargas con pre-tratamiento y emisario

Descarga de Berazategui

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 33 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Descargas con tratamiento secundario

Planta Depuradora Norte

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Planta Depuradora Sudoeste I

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Planta Depuradora Sudoeste II

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Planta Depuradora El Jagüel

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Planta Depuradora Barrio Uno

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Planta Depuradora Hurlingham

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Planta Depuradora Santa Catalina

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, encontrándose 4 muestras con valores fuera de norma para los parámetros: pH y sólidos totales suspendidos.

Planta Depuradora Fiorito

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, encontrándose 6 muestras con valores fuera de norma para los parámetros: DBO y sólidos totales suspendidos.

Planta Depuradora Lanús

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, encontrándose 10 muestras con valores fuera de norma para los parámetros: DBO, pH y sólidos totales suspendidos.

Planta Depuradora Bella Vista

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Planta Depuradora Las Catonas

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, encontrándose 1 muestra con valor fuera de norma para el parámetro: DBO.

Planta Depuradora Escobar

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, encontrándose 2 muestras con valores fuera de norma para los parámetros: DBO y sólidos totales suspendidos.

Planta Depuradora Ferrari

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, encontrándose 1 muestra con valor fuera de norma para el parámetro: pH.

Planta Depuradora Florencio Varela

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Planta Depuradora Garín

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, encontrándose 6 muestras con valores fuera de norma para los parámetros: DQO, pH y sólidos totales suspendidos.

Planta Depuradora Guernica

Durante el año 2025 se extrajeron un total de 36 muestras en el marco del Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes, sin detectarse desvíos.

Se presenta la síntesis de los resultados obtenidos en los sucesivos muestreos correspondientes al Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes 2025, de las descargas con tratamiento secundario en la planilla INS-S-CS-CR-01_2025.

3. Control Directo – Industrias

I. Inspecciones y Muestreo en Industrias

El Control Directo se realiza básicamente sobre 3 tipos de industrias:

- Galvanoplastias: frecuencia 4 muestras por año
- Industrias en microcuencas comprometidas: frecuencia según tipo de industria
- Búsquedas de origen de desvíos derivadas del Control Indirecto.

Las dos primeras corresponden al Control Directo Programado y la restante es consecuencia de los operativos que se realizan cuando un resultado del control de una microcuenca da fuera de norma, es decir Control Directo No Programado.

1) Industrias Galvanoplásticas:

A nivel de este tipo de industrias por Control Directo Programado y No Programado se pudieron extraer 231 muestras de las cuales el 11% (25 muestras) tuvo algún parámetro fuera de norma.

2) Industrias en Microcuencas Comprometidas (no Galvanoplásticas).

En este tipo de microcuencas se extrajeron 374 muestras de industrias, de las cuales el 35% (130 muestras) presentó algún parámetro fuera de norma.

3) Muestreos a industrias por tipo de establecimiento

Los muestreos a industrias pueden originarse por:

- Muestras correspondientes al Plan de Muestreo de Calidad de Efluentes
- Alta de Industria: Otorgamiento de ACV
- Denuncias
- Operativos por desvíos en microcuencas o macrocuencas
- Seguimiento por antecedentes

Se extrajeron 625 muestras, de las cuales el 26% (161 muestras) tienen algún parámetro fuera de norma.

La siguiente tabla resume la totalidad de las muestras extraídas por tipo de establecimiento registrado en la concesión:

Tipo de Industria	Total de Industrias Activas	Total de Muestras	
		Extraídas	Conformes
Alimenticias	920	**104**	**66**
Curtiembres	19	**8**	**4**
Estaciones de Servicio	656	**116**	**55**
Galvanoplastías	137	**231**	**206**
Fabricación de Jabones y Detergentes	12	**4**	**4**
Farmacéuticas	73	**13**	**11**
Procesamiento de Metales	114	**12**	**12**

Tipo de Industria	Total de Industrias Activas	Total de Muestras	
		Extraídas	Conformes
Industrias del Papel	16	**1**	**1**
Químicas	258	**63**	**54**
Textiles	329	**56**	**37**
Otras	219	**17**	**14**
TOTAL	**2.753**	**625**	**464**

Considerando únicamente las muestras extraídas a industrias ubicadas en Microcuencas Comprometidas y Galvanoplastías (es decir industrias bajo Control Directo Programado), se tiene el siguiente detalle:

Tipo de Industria	Total de Industrias bajo CDP	Total de Muestras	
		Extraídas	Conformes
Alimenticias	**351**	**98**	**64**
Curtiembres	**16**	**8**	**4**
Estaciones de Servicio	**258**	**115**	**54**
Galvanoplastías	**137**	**231**	**206**
Fabricación de Jabones y Detergentes	**7**	**3**	**3**
Farmacéuticas	**29**	**13**	**11**
Procesamiento de Metales	**24**	**11**	**11**
Industrias del Papel	**5**	**1**	**1**
Químicas	**93**	**59**	**50**
Textiles	**99**	**51**	**34**
Otras	**78**	**15**	**12**
TOTAL	**1.097**	**605**	**450**

En la planilla INS-CS-CIC-03 (Ex Nº 72 (D)) se presenta el detalle de inspecciones y muestras obtenidas en los establecimientos registrados en las Microcuencas Comprometidas y todas las Galvanoplastías registradas en el área de concesión.

Se incluye en este informe anual la planilla INS-CS-CIC-03 bis en la que se detallan las inspecciones y muestras obtenidas en los establecimientos registrados en el resto de las microcuencas de la concesión (MID, MI1; MI2 y MI3) excluyendo a las Galvanoplastías.

Además en la planilla INS-CS-CIC-04 (Ex N°72 (E)) se detallan las inspecciones y muestras obtenidas por Control Directo No Programado independientemente de la microcuenca en la que estén ubicados, ya sea por Alta, Seguimiento o como parte de un Operativo de Control con el objetivo de identificar el origen de un desvío.

Durante el año 2025 se cortó en forma preventiva la descarga industrial a la colectora cloacal a una industria correspondiente a la Región Capital Federal por la peligrosidad de sus vertidos a la colectora. En este establecimiento se determinó un valor fuera de norma para el parámetro cianuros destructibles por cloración.

Región	Cortes Preventivos de Servicio Cloacal
Capital Federal	1
Norte	1 (*)
Oeste	0
Sudeste	0
Sudoeste	0
TOTAL	**1**

(*) Corte en establecimiento que no tenía vuelco declarado a colectora.

II. Calidad de Efluentes en Industrias

Se extrajeron durante el año 2025 un total de 625 muestras de industrias por Control Directo Programado y No programado, de las cuales 161 muestras tuvieron valores fuera de norma. Los parámetros que superaron el límite han sido los siguientes:

Parámetros Prioritarios

- **Cianuros destructibles por cloración** (límite 0,1 mg/l): se encontró 1 muestra con este parámetro fuera de norma.
- **Cianuros totales** (límite 1 mg/l) no se encontraron muestras con este parámetro fuera de norma.
- **Sulfuros totales** (límite 1 mg/l): se encontraron 14 muestras con este parámetro fuera de norma.
- **pH in situ** (rango 5,5-10)**:** se encontraron 24 muestras con este parámetro fuera de norma.
- **Hidrocarburos totales** (límite 50 mg/l): se encontró 1 muestra con este parámetro fuera de norma.

Parámetros Ecotóxicos

- **Cromo trivalente** (límite 2 mg/l): se encontraron 11 muestras con este parámetro fuera de norma.
- **Cromo hexavalente** (límite 0,2 mg/l): se encontraron 8 muestras con este parámetro fuera de norma.
- **Mercurio** (límite 5 µg/l): se encontró 1 muestra con este parámetro fuera de norma.
- **Sustancias Fenólicas** (límite 0,5 mg/l): se encontraron 3 muestras con este parámetro fuera de norma.
- **Plomo** (límite 0,5 mg/l): se encontraron 2 muestras con este parámetro fuera de norma.
- **Cadmio** (límite 0,1 mg/l): se encontró 1 muestra con este parámetro fuera de norma.

Otros Parámetros

- **DBO** (límite 200 mg/l): se encontraron 44 muestras con este parámetro fuera de norma.
- **Sustancias solubles en éter etílico** (límite 100 mg/l): se encontraron 13 muestras con este parámetro fuera de norma.
- **SRAO** (detergentes aniónicos, límite 5 mg/l): se encontraron 73 muestras con este parámetro fuera de norma.
- **Oxidabilidad** (límite 80 mg/l): no se encontraron muestras con este parámetro fuera de norma.
- **Temperatura** (límite 45°C): no se encontraron muestras con este parámetro fuera de norma.


Inspecciones

Durante el año 2025 se realizaron un total de 2253 inspecciones a industrias bajo Control Directo Programado y No Programado según el siguiente detalle:

Con Muestras	Sin Muestras	Total de inspecciones
625	1.628	2.253

Causas de no Extracción de Muestras (C.D.P. + C.D.N.P.)

Causa de no-extracción de muestras	Total de inspecciones
Cámara con precinto	2
Industria clausurada	3
No se permitió la extracción de muestras	4
Falta de cámara de toma de muestras	7
En la dirección relevada no se encontró establecimiento	12
Ingresada por error	26
Cámara de toma de muestras en carga	28
No se permitió el ingreso	39
Retira efluentes por terceros	39
El firmante manifiesta que no genera efluentes	42
Otros	60
Industria cerrada	111
Industria inactiva	162
No estaba volcando	1093
Total general	**1628**

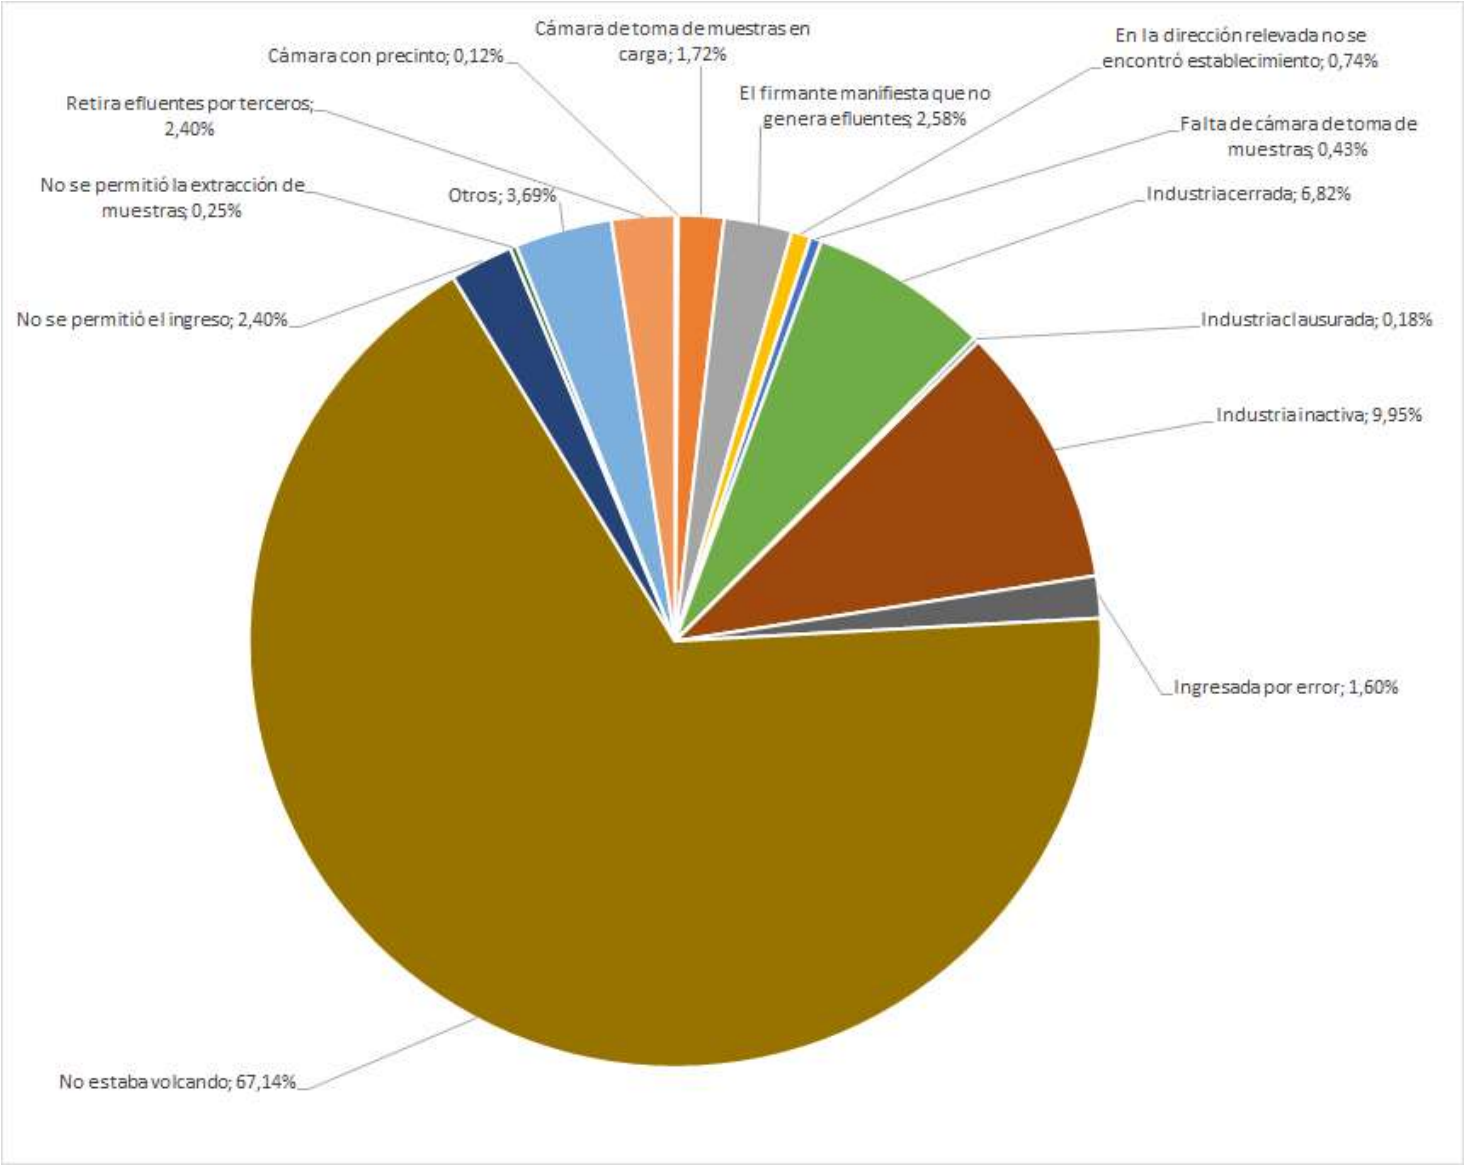
Cámara de toma de muestras en carga; 1,72%
Cámara con precinto; 0,12%
En la dirección relevada no se encontró establecimiento; 0,74%
Retira efluentes por terceros; 2,40%
El firmante manifiesta que no genera efluentes; 2,58%
Falta de cámara de toma de muestras; 0,43%
No se permitió la extracción de muestras; 0,25%
Otros; 3,69%
Industria cerrada; 6,82%
No se permitió el ingreso; 2,40%
Industria clausurada; 0,18%
Industria inactiva; 9,95%
Ingresada por error; 1,60%
No estaba volcando; 67,14%

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE EFLUENTES INDUSTRIALES

ERAS 2025

SIT-CIC-CALIDAD-EF-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-EF-01-DRCF-01	Control de Calidad efluentes industriales - DRCapital	**Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado**	**N°**	14	20	21	19	34	14	24	9	20	21	18	20	
CA-EF-01-DRCF-02	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRCapital	**Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	78,57%	90,00%	61,90%	73,68%	67,65%	85,71%	70,83%	100,00%	55,00%	52,38%	55,56%	55,00%	
CA-EF-01-DRCF-03	Control de Calidad efluentes industriales - DRCapital	Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales - Control Directo No Programado	**N°**	0	1	0	0	5	5	0	1	2	0	2	10	
CA-EF-01-DRCF-04	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRCapital	Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales - Control Directo No Programado	**%**	N/A	100,00%	N/A	N/A	40,00%	80,00%	N/A	100,00%	0,00%	N/A	50,00%	90,00%	
CA-EF-01-DRN-01	Control de Calidad efluentes industriales - DRNorte	**Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado**	**N°**	21	16	6	15	5	12	7	20	27	10	17	10	
CA-EF-01-DRN-02	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRNorte	**Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	85,71%	75,00%	100,00%	46,67%	100,00%	66,67%	71,43%	75,00%	85,19%	80,00%	94,12%	60,00%	
CA-EF-01-DRN-03	Control de Calidad efluentes industriales - DRNorte	Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales -Control Directo No Programado	**N°**	0	2	0	2	1	4	0	4	2	1	1	0	
CA-EF-01-DRN-04	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRNorte	Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales - Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales - Control Directo No Programado	**%**	N/A	50,00%	N/A	100,00%	100,00%	50,00%	N/A	75,00%	50,00%	100,00%	100,00%	N/A	
CA-EF-01-DRSE-01	Control de Calidad efluentes industriales - DRSudeste	**Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado**	**N°**	9	4	11	11	5	3	10	0	6	5	8	3	
CA-EF-01-DRSE-02	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRSudeste	**Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	66,67%	75,00%	63,64%	72,73%	100,00%	66,67%	70,00%	N/A	66,67%	80,00%	87,50%	66,67%	
CA-EF-01-DRSE-03	Control de Calidad efluentes industriales - DRSudeste	Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**N°**	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-01-DRSE-04	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRSudeste	Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**%**	N/A	N/A	0,33	0,00	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CA-EF-01-DRSO-01	Control de Calidad efluentes industriales - DRSudoeste	**Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado**	**N°**	3	4	3	0	3	6	4	5	2	4	3	6	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE EFLUENTES INDUSTRIALES

ERAS 2025

SIT-CIC-CALIDAD-EF-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-EF-01-DRSO-02	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRSudoeste	**Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	100,00%	50,00%	66,67%	N/A	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	83,33%	
CA-EF-01-DRSO-03	Control de Calidad efluentes industriales - DRSudoeste	Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**N°**	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
CA-EF-01-DRSO-04	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRSudoeste	Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales - Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales - Control Directo No Programado	**%**	0,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	
CA-EF-01-DRO-01	Control de Calidad efluentes industriales - DROeste	**Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado**	**N°**	15	7	5	1	0	3	6	15	9	10	13	3	
CA-EF-01-DRO-02	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DROeste	**Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	80,00%	57,14%	100,00%	100,00%	N/A	66,67%	100,00%	93,33%	66,67%	80,00%	76,92%	100,00%	
CA-EF-01-DRO-03	Control de Calidad efluentes industriales - DROeste	Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**N°**	7	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
CA-EF-01-DRO-04	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DROeste	Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales - Control Directo No Programado	**%**	100,00%	0,00	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	
CA-EF-01-AA-01	Control de Calidad efluentes industriales - Concesión	**Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado**	**N°**	62	51	46	46	47	38	51	49	64	50	59	42	
CA-EF-01-AA-02	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRConcesión	**Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC -Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	80,65%	76,47%	71,74%	65,22%	76,60%	71,05%	76,47%	87,76%	71,88%	68,00%	77,97%	64,29%	
CA-EF-01-AA-03	Control de Calidad efluentes industriales - Concesión	Control de calidad efluentes industriales Def: Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**N°**	8	5	3	5	7	10	0	7	4	2	4	11	
CA-EF-01-AA-04	Conformidad de Calidad de efluentes industriales - DRConcesión	Conformidad respecto Anexo B Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**%**	87,50%	60,00%	33,30%	60,00%	57,14%	70,00%	N/A	85,71%	25,00%	100,00%	75,00%	90,91%	
CA-EF-02-DRCF-01	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DRCapital	**Control de Cianuros Totales Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**N°**	9	20	7	2	4	6	6	9	10	8	7	3	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE EFLUENTES INDUSTRIALES

ERAS 2025

SIT-CIC-CALIDAD-EF-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-EF-02-DRCF-02	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DRCapital	**Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
CA-EF-02-DRCF-03	Cortes de servicio por Cianuros - DRCapital	**Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados**	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
CA-EF-02-DRCF-04	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DRCapital	**Control de Cianuros Totales Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado**	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
CA-EF-02-DRCF-05	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DRCapital	Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**%**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	
CA-EF-02-DRCF-06	Cortes de servicio por Cianuros - DRCapital	Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRN-01	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DRNorte	**Control de Cianuros Totales Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**N°**	17	16	5	4	3	8	6	20	23	5	15	3	
CA-EF-02-DRN-02	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DRNorte	**Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CA-EF-02-DRN-03	Cortes de servicio por Cianuros - DRNorte	**Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados**	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRN-04	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DRNorte	**Control de Cianuros Totales Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado**	**N°**	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRN-05	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DRNorte	Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**%**	N/A	1,00	N/A	1,00	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	
CA-EF-02-DRN-06	Cortes de servicio por Cianuros - DRNorte	Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRSE-01	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DRSudeste	**Control de Cianuros Totales Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**N°**	7	4	6	6	2	2	5	0	0	0	3	1	
CA-EF-02-DRSE-02	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DRSudeste	**Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE EFLUENTES INDUSTRIALES

ERAS 2025

SIT-CIC-CALIDAD-EF-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-EF-02-DRSE-03	Cortes de servicio por Cianuros - DRSudeste	**Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados**	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRSE-04	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DRSudeste	**Control de Cianuros Totales** **Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado**	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRSE-05	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DRSudeste	Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**%**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CA-EF-02-DRSE-06	Cortes de servicio por Cianuros - DRSudeste	Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRSO-01	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DRSudoeste	**Control de Cianuros Totales** **Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**N°**	2	4	1	0	1	0	3	5	2	2	3	1	
CA-EF-02-DRSO-02	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DRSudoeste	**Conformidad con cianuros en efluentes industriales** **Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
CA-EF-02-DRSO-03	Cortes de servicio por Cianuros - DRSudoeste	**Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados**	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRSO-04	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DRSudoeste	**Control de Cianuros Totales** **Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado**	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRSO-05	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DRSudoeste	Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**%**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CA-EF-02-DRSO-06	Cortes de servicio por Cianuros - DRSudoeste	Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRO-01	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DROeste	**Control de Cianuros Totales** **Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**N°**	10	7	5	1	0	2	5	15	9	9	13	3	
CA-EF-02-DRO-02	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DROeste	**Conformidad con cianuros en efluentes industriales** **Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	100,00%	100,00%	100,00%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CA-EF-02-DRO03	Cortes de servicio por Cianuros - DROeste	**Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados**	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-DRO-04	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - DROeste	**Control de Cianuros Totales** **Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado**	**N°**	1	1	0	1	0	0	0	0	9	0	1	0	
CA-EF-02-DRO-05	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales-DROeste	Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**%**	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	100,00%	N/A	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

CALIDAD DE EFLUENTES INDUSTRIALES

ERAS 2025

SIT-CIC-CALIDAD-EF-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CA-EF-02-DRO-06	Cortes de servicio por Cianuros - DROeste	Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-02-AA-01	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - Concesión	**Control de Cianuros Totales Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**N°**	45	51	24	13	10	18	25	49	44	24	41	11	
CA-EF-02-AA-02	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales- Concesión	**Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales por CIC - Control Directo Programado**	**%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	
CA-EF-02-AA-03	Cortes de servicio por Cianuros - Concesión	**Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados**	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
CA-EF-02-AA-04	Control de Cianuros Totales en Efluentes industriales - Concesión	**Control de Cianuros Totales Def: Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado**	**N°**	1	3	0	2	1	0	0	2	0	0	2	0	
CA-EF-02-AA-05	Conformidad de Cianuros en Efluentes Industriales- Concesión	Conformidad con cianuros en efluentes industriales Def: 100 x Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado conformes / Cantidad total de muestras extraídas para Cianuros en establecimientos industriales Control Directo No Programado	**%**	100,00%	100,00%	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	
CA-EF-02-AA-06	Cortes de servicio por Cianuros - Concesión	Def: Cantidad de Cortes por Cianuros realizados	**N°**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CA-EF-03-AA	Ensayos NC	**Ensayos NC Def. 100 x N° de muestras conformes extraídas en MIC y MAC / N° de muestras totales extraídas en MIC y MAC Valor referencia: 100% Valor límite: los establecidos en el MR**	**%**	91,6%	88,3%	95,6%	98,32%	97,6%	90,8%	92%	92%	92%	92%	93%	92%	

CONTROL DE INDUSTRIAS

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-CIC-01 (Ex Nº 71)

REGION	INDUSTRIAS							
	REGISTRADAS	INSPECCIONADAS	MUESTREADAS	% MUESTREADAS	FUERA DE NORMA		DENUNCIAS REALIZADAS	CORTES PREVENTIVOS DE SERVICIO CLOACAL
					CANTIDAD INDUSTRIAS MUESTREADAS FUERA DE NORMA	%		
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=100*(3)/(2)*	*(5)*	*(6)=100*(5)/(3)*		
CAPITAL FEDERAL	**1.058**	**557**	**176**	**32%**	**62**	**35%**	**68**	**1**
NORTE	**591**	**208**	**83**	**40%**	**33**	**40%**	**69**	**1 (*)**
SUDESTE	**246**	**157**	**53**	**34%**	**14**	**26%**	**21**	**0**
SUDOESTE	**116**	**59**	**27**	**46%**	**9**	**33%**	**10**	**0**
OESTE	**742**	**142**	**42**	**30%**	**14**	**33%**	**22**	**0**
TOTAL CONCESION	**2.753**	**1.123**	**381**	**34%**	**132**	**35%**	**190**	**1**

(*) Corte en establecimiento que no tenía vuelco declarado a colectora.

Efluentes Industriales a Colectora

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Planilla INS-S-CS-CIC-02 (Ex Nº 72 (A)y(B))

CONTROL INDIRECTO PROGRAMADO

Región	MID					MI1					MI2					MI3					MIC Comprometidas
	N°	Cantidad de Muestras Puntuales		Cantidad de Muestras Compuestas		N°	Cantidad de Muestras Puntuales		Cantidad de Muestras Compuestas		N°	Cantidad de Muestras Puntuales		Cantidad de Muestras Compuestas		N°	Cantidad de Muestras Puntuales		Cantidad de Muestras Compuestas		N°
		Conforme	No Conforme	Conforme	No Conforme		Conforme	No Conforme	Conforme	No Conforme		Conforme	No Conforme	Conforme	No Conforme		Conforme	No Conforme	Conforme	No Conforme	
Capital Federal	33	30	3	61	5	37	58	22	156	4	3	7	2	18		6	17	7	47	1	41
Norte	24	23	2	48	2	14	28		56							10	29	11	60	4	37
Sudeste	18	17	1	36		8	15	1	32												59
Sudoeste	15	13	3	32		2	3		6										1		13
Oeste	11	7	4	20	2	11	15	7	41	3						15	51	9	116	3	8
TOTAL	**101**	**90**	**13**	**197**	**9**	**72**	**119**	**30**	**291**	**7**	**3**	**7**	**2**	**18**	**0**	**31**	**97**	**27**	**224**	**8**	**158**

CONTROL INDIRECTO NO PROGRAMADO

Región	MID					MI1					MI2					MI3					MIC Comprometidas
	N°	Cantidad de Muestras Puntuales		Cantidad de Muestras Compuestas		N°	Cantidad de Muestras Puntuales		Cantidad de Muestras Compuestas		N°	Cantidad de Muestras Puntuales		Cantidad de Muestras Compuestas		N°	Cantidad de Muestras Puntuales		Cantidad de Muestras Compuestas		N°
		Conforme	No Conforme	Conforme	No Conforme		Conforme	No Conforme	Conforme	No Conforme		Conforme	No Conforme	Conforme	No Conforme		Conforme	No Conforme	Conforme	No Conforme	
Capital Federal	33					37	11	1			3	1				6	1	4			41
Norte	24					14										10	2	1			37
Sudeste	18					8	1														59
Sudoeste	15	2	1			2	2														13
Oeste	11	2				11	2	2								15	11	2	2		8
TOTAL	**101**	**4**	**1**	**0**	**0**	**72**	**16**	**3**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**31**	**14**	**7**	**2**	**0**	**158**

Efluentes Industriales a Colectora - CIC

Control Directo Programado (Industrias ubicadas en MIC y Galvanoplastías)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-CS-CIC-03 (Ex Nº 72 (D))

Tipo de Industria	Región															Total de Industrias		Total de Muestras	
	Capital Federal			Norte			Sudeste			Sudoeste			Oeste						
	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Extraídas	Conformes
Alimenticias	201	205	45	57	70	17	57	47	12	22	24	11	14	17	2	**351**	**363**	**98**	**64**
Curtiembres	0		0	0		0	15	30	5	0		0	1	4	0	**16**	**34**	**8**	**4**
Estaciones de Servicio	143	281	53	39	86	16	38	67	5	22	39	8	16	32	5	**258**	**505**	**115**	**54**
Galvanoplastías	23	141	9	47	275	27	5	26	5	3	21	3	59	316	23	**137**	**779**	**231**	**206**
Fabricación de Jabones y Detergentes	1	2	0	1	2	0	5	9	2	0		0	0		0	**7**	**13**	**3**	**3**
Farmacéuticas	12	11	6	7	6	2	7	7	4	2	2	1	1	1	0	**29**	**27**	**13**	**11**
Procesamiento de Metales	13	24	2	5	17	3	2	6	1	3	6	0	1	2	0	**24**	**55**	**11**	**11**
Industrias del Papel	3	6	0	1		0	0		0	0		0	1	1	1	**5**	**7**	**1**	**1**
Químicas	66	133	30	11	23	3	10	20	4	1	2	0	5	10	0	**93**	**188**	**59**	**50**
Textiles	57	71	22	16	21	7	14	16	9	5	7	2	7	8	1	**99**	**123**	**51**	**34**
Otras	46	37	5	12	11	2	18	15	5	1	2	1	1	1	0	**78**	**66**	**15**	**12**
TOTAL	**565**	**911**	**172**	**196**	**511**	**77**	**171**	**243**	**52**	**59**	**103**	**26**	**106**	**392**	**32**	**1.097**	**2.160**	**605**	**450**

Efluentes Industriales a Colectora - CIC

Control Directo (Industrias ubicadas en MID, MI1, MI2, MI3 - excluyendo Galvanoplastías)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-CS-CIC-03 bis

Tipo de Industria	Región															Total de Industrias		Total de Muestras	
	Capital Federal			Norte			Sudeste			Sudoeste			Oeste						
	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Industrias muestreadas	Registradas Act.	Inspecciones realizadas	Extraídas	Conformes
Alimenticias	169	5	0	116	3	1	29	1	0	23	1	1	232	22	4	**569**	**32**	**6**	**2**
Curtiembres			0			0	2		0			0	1		0	**3**	**0**		
Estaciones de Servicio	123	1	0	67	1	1	18		0	28		0	162	6	0	**398**	**8**	**1**	**1**
Fabricación de Jabones y Detergentes			0	3		0			0			0	2	2	1	**5**	**2**	**1**	**1**
Farmacéuticas	10		0	6		0	5		0	2		0	21	3	0	**44**	**3**		
Procesamiento de Metales	9		0	32	2	0	2		0			0	47	7	1	**90**	**9**	**1**	**1**
Industrias del Papel			0	7		0			0	1		0	3		0	**11**	**0**		
Químicas	74	6	2	52	4	0	2		0			0	37	3	1	**165**	**13**	**4**	**4**
Textiles	53	2	0	83	8	2	7		0	3		0	84	4	2	**230**	**14**	**5**	**3**
Otras	55	4	0	29	3	1	10		0			0	47	5	1	**141**	**12**	**2**	**2**
TOTAL	**493**	**18**	**2**	**395**	**21**	**5**	**75**	**1**	**0**	**57**	**1**	**1**	**636**	**52**	**10**	**1.656**	**93**	**20**	**14**

Efluentes Industriales a Colectora - CIC

Control Directo No Programado (Industrias dadas de Alta, Seguimientos, Operativos de Control Directo No Programado)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-CS-CIC-04 (Ex Nº 72 (E))

Tipo de Industria	Región														
	Capital Federal			Norte			Sudeste			Sudoeste			Oeste		
	Inspecciones realizadas	Muestras		Inspecciones realizadas	Muestras		Inspecciones realizadas	Muestras		Inspecciones realizadas	Muestras		Inspecciones realizadas	Muestras	
		Extraídas	Conformes		Extraídas	Conformes		Extraídas	Conformes		Extraídas	Conformes		Extraídas	Conformes
Alimenticias	19	6	4	7	2		2	1		3	3	2	18	3	2
Curtiembres	0			0			3	2		0			3		
Estaciones de Servicio	10	7	2	9	6	4	3			0			4		
Galvanoplastías	3	1	1	10	4	3	1	1	1	1	1	1	7		
Fabricación de Jabones y Detergentes	0			0			0			0			2	1	1
Farmacéuticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Procesamiento de Metales	0			3	1	1	0			0			7	1	1
Industrias del Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Químicas	12	8	8	5	2	2	3	3	2	0			3	1	1
Textiles	8	4	3	6	1		0			1			6	5	5
Otras	5			4	2	2	0			0			5	1	1
TOTAL	**57**	**26**	**18**	**44**	**18**	**12**	**12**	**7**	**3**	**5**	**4**	**3**	**58**	**12**	**11**

2.1.5 Biosólidos

PLANTA DEPURADORA NORTE

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-00.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
16/01/2025	Laboratorio Central	7923442/R	Arcillex	--	51,3	40,9	--	--	<0.50	306
13/02/2025	Laboratorio Central	7963573	Arcillex	--	20,7	64,6	--	--	<0.50	293
13/03/2025	Laboratorio Central	8002434	Arcillex	--	23,9	62,1	--	--	<0.50	228
15/04/2025	Laboratorio Central	8048684	Arcillex	--	23,8	63	--	--	<0.50	229
15/05/2025	Laboratorio Central	8091483	Arcillex	--	22,1	64,5	--	--	<0.50	254
12/06/2025	Laboratorio Central	8132118	Arcillex	--	22,4	64	--	--	<0.50	240
10/07/2025	Laboratorio Central	8173161	Arcillex	--	24,4	66	--	--	<0.50	165
14/08/2025	Laboratorio Central	8223522	Arcillex	--	23,1	66,7	--	--	<0.50	185
16/09/2025	Laboratorio Central	8270992	Arcillex	--	23,2	58,7	--	--	<0,50	119
16/10/2025	Laboratorio Central	8315417	Arcillex	--	23,1	61,3	--	--	<0,50	243
13/11/2025	Laboratorio Central	8356798	Arcillex	--	22	62,4	--	--	<0.50	226
18/12/2025	Laboratorio Central	8409391	Arcillex	--	22,7	63,1	--	--	<0,50	201

PLANTA DEPURADORA NORTE

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-00.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
16/01/2025	Laboratorio Central	7923442/R	Arcillex	1022	--	25	72,1	--	18,0	53,7	2,75
13/02/2025	Laboratorio Central	7963573	Arcillex	1043	--	24	71,5	--	15	52,1	2,07
13/03/2025	Laboratorio Central	8002434	Arcillex	940	--	29	60,8	--	13	62,8	1,79
15/04/2025	Laboratorio Central	8048684	Arcillex	918	--	27	72,1	--	16	65,7	2,02
15/05/2025	Laboratorio Central	8091483	Arcillex	1137	--	35	68,3	--	15	87,4	0,64
12/06/2025	Laboratorio Central	8132118	Arcillex	1009	--	25	68,2	--	16	107,0	0,20
10/07/2025	Laboratorio Central	8173161	Arcillex	646	--	19	73,4	--	9,1	81,0	2,30
14/08/2025	Laboratorio Central	8223522	Arcillex	792	--	16	50,8	--	11	36,6	1,23
16/09/2025	Laboratorio Central	8270992	Arcillex	347	--	101	59.8	--	12	397,0	1.65
16/10/2025	Laboratorio Central	8315417	Arcillex	885	--	21	62.9	--	14	55.7	2.56
13/11/2025	Laboratorio Central	8356798	Arcillex	809	--	21	54,6	--	12	63,9	2,37
18/12/2025	Laboratorio Central	8409391	Arcillex	615	--	20	49,1	--	12	48,2	1.00

PLANTA DEPURADORA NORTE

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-00.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
16/01/2025	Laboratorio Central	7923442/R	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13/02/2025	Laboratorio Central	7963573	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13/03/2025	Laboratorio Central	8002434	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15/04/2025	Laboratorio Central	8048684	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15/05/2025	Laboratorio Central	8091483	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12/06/2025	Laboratorio Central	8132118	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10/07/2025	Laboratorio Central	8173161	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14/08/2025	Laboratorio Central	8223522	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16/09/2025	Laboratorio Central	8270992	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16/10/2025	Laboratorio Central	8315417	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13/11/2025	Laboratorio Central	8356798	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18/12/2025	Laboratorio Central	8409391	Arcillex	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLANTA DEPURADORA NORTE

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-01 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
16/01/2025	Planta Norte	7923442/R	Arcillex	3136452	--	9
13/02/2025	Planta Norte	7963573	Arcillex	443478	--	6
13/03/2025	Planta Norte	8002434	Arcillex	3841004	--	2
15/04/2025	Planta Norte	8048684	Arcillex	385714	--	29
15/05/2025	Planta Norte	8091483	Arcillex	415385	--	9
12/06/2025	Planta Norte	8132118	Arcillex	155357	--	2
10/07/2025	Planta Norte	8173161	Arcillex	142326	--	2
14/08/2025	Planta Norte	8223522	Arcillex	696537	--	12
16/09/2025	Planta Norte	8270992	Arcillex	69.353	--	2
16/10/2025	Planta Norte	8315417	Arcillex	103.896	--	14
13/11/2025	Planta Norte	8356798	Arcillex	158.182	--	2
18/12/2025	Planta Norte	8409391	Arcillex	2.387.665	--	<2

PLANTA DEPURADORA SUDOESTE

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-02.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
08/01/2025	PLANTA SUDOESTE	7912673	Arcillex	-	27,4%	51,4%	-	-	<0,50	475
06/02/2025	PLANTA SUDOESTE	7953832	Arcillex	-	26,7%	53,0%	-	-	<0,50	628
12/03/2025	PLANTA SUDOESTE	8001033	Arcillex	-	26,5%	50,4%	-	-	<0,50	429
09/04/2025	PLANTA SUDOESTE	8040804	Arcillex	-	26,3%	49,6%	-	-	<0,50	469
08/05/2025	PLANTA SUDOESTE	8081781	Arcillex	-	26,4%	50,9%	-	-	<0,50	480
04/06/2025	PLANTA SUDOESTE	8120880	Arcillex	7,3	23,8%	48,7%	-	1557	<0,50	84
02/07/2025	PLANTA SUDOESTE	8162029	Arcillex	-	26,0%	51,2%	-	-	<0,50	568
20/08/2025	PLANTA SUDOESTE	8231659	Arcillex	-	28,0%	49,0%	-	-	<0,50	308
10/09/2025	PLANTA SUDOESTE	8262764/R	Arcillex	-	26,7%	50,7%	-	-	<0,50	406
08/10/2025	PLANTA SUDOESTE	8304114/R	Arcillex	-	27,3%	48,9%	-	-	<0,50	349
06/11/2025	PLANTA SUDOESTE	8346979	Arcillex	-	27,1%	47,0%	-	-	<0,50	412
4/12/2025	PLANTA SUDOESTE	8387840	Arcillex		30,0%	42,5%			<0,50	239

PLANTA DEPURADORA SUDOESTE

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-02.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
08/01/2025	PLANTA SUDOESTE	7912673	Arcillex	1241		102	76.8		15	326	2.52
06/02/2025	PLANTA SUDOESTE	7953832	Arcillex	1601		105	92.5		16	365	2.55
12/03/2025	PLANTA SUDOESTE	8001033	Arcillex	1539		92	78.0		13	340	2.16
09/04/2025	PLANTA SUDOESTE	8040804	Arcillex	1522		96	78.5		13	352	2.59
08/05/2025	PLANTA SUDOESTE	8081781	Arcillex	1744		112	82.7		15	397	1.13
04/06/2025	PLANTA SUDOESTE	8120880	Arcillex	154	<o,5	<10	61.5	<1,2	2,3	11.2	<0.20
02/07/2025	PLANTA SUDOESTE	8162029	Arcillex	1864		110	82.7		16	435	2.91
20/08/2025	PLANTA SUDOESTE	8231659	Arcillex	1001		52	52.4		8,9	181	2.10
10/09/2025	PLANTA SUDOESTE	8262764/R	Arcillex	1491		420	76.9		14	3470	2.96
08/10/2025	PLANTA SUDOESTE	8304114/R	Arcillex	1354		390	77.2		13	3070	2.50
06/11/2025	PLANTA SUDOESTE	8346979	Arcillex	1292		64	65,6		11	287	
4/12/2025	PLANTA SUDOESTE	8387840	Arcillex	662		40	42,1		7,1	167	0,83

PLANTA DEPURADORA SUDOESTE

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-02.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
08/01/2025	PLANTA SUDOESTE	7912673	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/02/2025	PLANTA SUDOESTE	7953832	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/03/2025	PLANTA SUDOESTE	8001033	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/2025	PLANTA SUDOESTE	8040804	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/05/2025	PLANTA SUDOESTE	8081781	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06/2025	PLANTA SUDOESTE	8120880	Arcillex	<2	0,31	0,09	0,5	<50	0,5	<0,10	<20	-	-	<0,02
02/07/2025	PLANTA SUDOESTE	8162029	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/2025	PLANTA SUDOESTE	8231659	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/09/2025	PLANTA SUDOESTE	8262764/R	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/10/2025	PLANTA SUDOESTE	8304114/R	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/11/2025	PLANTA SUDOESTE	8346979	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/12/2025	PLANTA SUDOESTE	8387840	Arcillex											

PLANTA DEPURADORA SUDOESTE

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-2 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
08/01/2025	PLANTA SUDOESTE	7912673	Arcillex	1270073		12
06/02/2025	PLANTA SUDOESTE	7953832	Arcillex	4082397		21
12/03/2025	PLANTA SUDOESTE	8001033	Arcillex	6071698		2
09/04/2025	PLANTA SUDOESTE	8040804	Arcillex	912548		2
08/05/2025	PLANTA SUDOESTE	8081781	Arcillex	3477273		8
04/06/2025	PLANTA SUDOESTE	8120880	Arcillex	14621849	14621849	3
02/07/2025	PLANTA SUDOESTE	8162029	Arcillex	618846		28
20/08/2025	PLANTA SUDOESTE	8231659	Arcillex	1935714		7
10/09/2025	PLANTA SUDOESTE	8262764/R	Arcillex	202996		4
08/10/2025	PLANTA SUDOESTE	8304114/R	Arcillex	1274725		4
06/11/2025	PLANTA SUDOESTE	8346979	Arcillex	3387454		10
4/12/2025	PLANTA SUDOESTE	8387840	Arcillex	536333		215

PLANTA DEPURADORA FIORITO

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-04.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
25/03/2025	Laboratorio central	8018771	Landfarming	-	43,9	18,1	-	-	<0,5	114
25/06/2025	Laboratorio central	8151882	Landfarming	-	26,1	39,3	-	-	<0,5	177
15/07/2025	Laboratorio central	8179942	Landfarming	-	21,8	40,8	-	-	<0,5	50
14/10/2025	Laboratorio central	8312319	Landfarming	-	17,7	50,9	-	-	<0,5	155

PLANTA DEPURADORA FIORITO

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-04.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
25/03/2025	Laboratorio central	8018771	Landfarming	601	-	24	57,5	-	28	45,7	1,75
25/06/2025	Laboratorio central	8151882	Landfarming	970	-	26	81,5	-	58	64,9	2,14
15/07/2025	Laboratorio central	8179942	Landfarming	272	-	<10	23,30	-	2,3	26,2	1,11
14/10/2025	Laboratorio central	8312319	Landfarming	836	-	29	61,70	-	47	27,9	2,50

PLANTA DEPURADORA FIORITO

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-04.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
15/07/2025	Laboratorio Central	8179942	Landfarming	<2 (µg/l)	1,9	<0,050	0,18	<50 (µg/l)	<0,100	<0,1	25	-	-	<0,02

aysa

PLANTA DEPURADORA FIORITO

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-04 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
25/03/2025	Laboratorio central	8018771	Landfarming	39.180	-	1
25/06/2025	Laboratorio central	8151882	Landfarming	6.164.751	-	54
15/07/2025	Laboratorio central	8179942	Landfarming	1.100.917	-	295
14/10/2025	Laboratorio central	8312319	Landfarming	1.355.932	-	2

PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-04.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
09/01/2025	Laboratorio Central	7914048	Arcillex	-	18,5	67,7	-	-	<0,5	159
11/02/2025	Laboratorio Central	7960558	Arcillex	-	15,8	64,6	-	-	<0,5	175
13/03/2025	Laboratorio Central	8002426	Arcillex	-	12,7	63,7	-	-	<0,5	172
15/04/2025	Laboratorio Central	8048720	Arcillex	-	11,6	68,2	-	-	<0,5	174
06/05/2025	Laboratorio Central	8078792	Arcillex	-	18,2	67,6	-	-	<0,5	174
10/06/2025	Laboratorio Central	8129161	Arcillex	-	12,6	68,4	-	-	<0,5	175
15/07/2025	Laboratorio Central	8179938	Arcillex	-	12,6	71,7	-	-	<0,5	81
05/08/2025	Laboratorio Central	8210942	Arcillex	-	15,5	70,1	-	-	<0,5	74
16/09/2025	Laboratorio Central	8270991	Arcillex	7	12,4	67,9	-	-	<0,5	71
16/10/2025	Laboratorio Central	8315313	Arcillex	-	11,9	64,7	-	-	<0,5	175
04/11/2025	Laboratorio Central	8344190	Arcillex	-	13,8	66,2	-	-	<0,5	156
09/12/2025	Laboratorio Central	8394811	Arcillex	-	15,7	64,5	-	-	<0,5	181

PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-04.B (Ex 76 -B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
09/01/2025	Laboratorio Central	7914048	Arcillex	606	-	49	30,5	-	9,0	43,1	1,02
11/02/2025	Laboratorio Central	7960558	Arcillex	642	-	59	37,1	-	5,4	40,7	1,01
13/03/2025	Laboratorio Central	8002426	Arcillex	667	-	55	38,9	-	6,6	46,2	1,07
15/04/2025	Laboratorio Central	8048720	Arcillex	633	-	53	38,5	-	8,3	67,4	1,13
06/05/2025	Laboratorio Central	8078792	Arcillex	649	-	54	37,3	-	8,5	60,9	0,39
10/06/2025	Laboratorio Central	8129161	Arcillex	752	-	50	40,8	-	9,5	81,2	0,61
15/07/2025	Laboratorio Central	8179938	Arcillex	475	-	12	14,2	-	17,0	26,7	1,06
05/08/2025	Laboratorio Central	8210942	Arcillex	284	-	24	16,1	-	6,5	27,4	0,42
16/09/2025	Laboratorio Central	8270991	Arcillex	251	-	258	29,6	<1,2	8,0	529,0	0,77
16/10/2025	Laboratorio Central	8315313	Arcillex	688	-	51	36,5	-	10,0	63,9	1,910
04/11/2025	Laboratorio Central	8344190	Arcillex	504	-	42	32,5	-	6,9	64,7	1,43
09/12/2025	Laboratorio Central	8394811	Arcillex	571	-	40	35	-	9,1	59,3	0,77

PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-04.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio (ug/l)	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
09/01/2025	Laboratorio Central	7914048	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/02/2025	Laboratorio Central	7960558	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/03/2025	Laboratorio Central	8002426	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/04/2025	Laboratorio Central	8048720	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/05/2025	Laboratorio Central	8078792	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/06/2025	Laboratorio Central	8129161	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/07/2025	Laboratorio Central	8179938	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/2025	Laboratorio Central	8210942	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/09/2025	Laboratorio Central	8270991	Arcillex	<2,0	<,2	<,050	<,05	<50	0,18	<,10	31,9	-	-	<,020
16/10/2025	Laboratorio Central	8315313	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/11/2025	Laboratorio Central	8344190	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/12/2025	Laboratorio Central	8394811	Arcillex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANTA DEPURADORA HURLINGHAM

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-05 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
09/01/2025	Laboratorio Central	7914048	Arcillex	49621622	-	11
11/02/2025	Laboratorio Central	7960558	Arcillex	17.594.937	-	53
13/03/2025	Laboratorio Central	8002426	Arcillex	27.401.575	-	3
15/04/2025	Laboratorio Central	8048720	Arcillex	2.068.966	-	17
06/05/2025	Laboratorio Central	8078792	Arcillex	50.439.560	-	48
10/06/2025	Laboratorio Central	8129161	Arcillex	1.276.984	-	10
15/07/2025	Laboratorio Central	8179938	Arcillex	430.159	-	89
05/08/2025	Laboratorio Central	8210942	Arcillex	740.323	-	32
16/09/2025	Laboratorio Central	8270991	Arcillex	1.297.581	-	3
16/10/2025	Laboratorio Central	8315313	Arcillex	2.016.807	-	10
04/11/2025	Laboratorio Central	8344190	Arcillex	33333	-	41
09/12/2025	Laboratorio Central	8394811	Arcillex	2216561	-	8

PLANTA DEPURADORA SANTA CATALINA

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-06.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
09/01/2025	Laboratorio Central	7914049	Landfarming	-	24,4	31,8	-	-	<0,5	159
16/04/2025	Laboratorio Central	8050121	Landfarming	-	26,9	30,2	-	-	<0,5	172
15/07/2025	Laboratorio Central	8179939	Landfarming	-	22,7	38,9	-	-	<0,5	52
19/11/2025	Laboratorio Central	8365199	Landfarming	-	22,5	38.1	-	-	<0,5	168

PLANTA DEPURADORA SANTA CATALINA

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-06.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
09/01/2025	Laboratorio Central	7914049	Landfarming	832	-	24	65,7	-	6,7	48,7	2,77
16/04/2025	Laboratorio Central	8050121	Landfarming	1060	-	41	75,7	-	6,7	50,2	2,93
15/07/2025	Laboratorio Central	8179939	Landfarming	8	-	19	12,7	-	3,8	29	0,5
19/11/2025	Laboratorio Central	8365199	Landfarming	795	-	24	48,9	-	4,3	70,3	2,75

PLANTA DEPURADORA SANTA CATALINA

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-06.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
09/01/25	Laboratorio Central	7914049	Landfarming	<0,50		159	832		24	65,7	6,7	48,7		2,77
16/04/25	Laboratorio Central	8050121	Landfarming	<0,50		172	1060		41	75,7	6,7	50,2		2,93
15/07/25	Laboratorio Central	8179939	Landfarming	<0,50	150	52	201	<0,5	<0,1	12,7	3,8	29		0,5
19/11/25	Laboratorio Central	8365199	Landfarming	<0,50	-	168	795	-	24	48,9	4,3	70,3	-	2,75

PLANTA DEPURADORA SANTA CATALINA

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-06 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
09/01/2025	Laboratorio Central	7914049	Landfarming	376.230	-	<1
16/04/2025	Laboratorio Central	8050121	Landfarming	5948	-	<1
15/07/2025	Laboratorio Central	8179939	Landfarming	105727	105.727	<1
19/11/2025	Laboratorio Central	8365199	Landfarming	40800	-	2

PLANTA DEPURADORA JAGÜEL - AMPLIACIÓN

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-08.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
07/01/2025	Laboratorio Central	7911180	Arcillex	-	28	40,6	-	-	<0,5	165
04/02/2025	Laboratorio Central	7951119	Arcillex	-	21,5	49,2	-	-	<0,5	225
27/03/2025	Laboratorio Central	8021264	Arcillex	-	23,9	42,9	-	-	<0,5	162
29/04/2025	Laboratorio Central	8069208	Arcillex	-	20,6	49,3	-	-	<0,5	239
28/05/2025	Laboratorio Central	8110946	Arcillex	-	28	38,2	-	-	<0,5	175
26/06/2025	Laboratorio Central	8151608	Arcillex	7,4	29,5	39,4	-	2790	<0,5	175
22/07/2025	Laboratorio Central	8191376	Arcillex	-	22,3	51,3	-	-	<0,5	156
28/08/2025	Laboratorio Central	8244266	Arcillex	-	19,6	54,8			<0,5	95
29/09/2025	Laboratorio Central	8289233	Arcillex	-	22,6	50,6	-	-	<0,5	144
23/10/2025	Laboratorio Central	8326848	Arcillex	-	26,8	42	-	-	<0,5	145
26/11/2025	Laboratorio Central	8375125	Arcillex	-	24,6	43,1	-	-	<0,5	173
30/12/2025	Laboratorio Central	8427952	Arcillex	-	30,1	36,9	-	-	<0,5	125

PLANTA DEPURADORA JAGÜEL - AMPLIACIÓN

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-08. B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
07/01/2025	Laboratorio Central	7911180	Arcillex	670	-	18	31,2	-	42	448	6,63
04/02/2025	Laboratorio Central	7951119	Arcillex	651	-	16	33,8	-	43	492	5,16
27/03/2025	Laboratorio Central	8021264	Arcillex	839	-	19	29	-	33	399	3,02
29/04/2025	Laboratorio Central	8069208	Arcillex	1227	-	28	38,6	-	50	647	2,03
28/05/2025	Laboratorio Central	8110946	Arcillex	1083	-	20	36	-	35	555	1,41
26/06/2025	Laboratorio Central	8151608	Arcillex	1052	-	22	41,8	<1,2	43	668	4,16
22/07/2025	Laboratorio Central	8191376	Arcillex	817	-	14	28,9	-	43	591	5,03
28/08/2025	Laboratorio Central	8244266	Arcillex	504		<10	18,1		27	388	3,38
29/09/2025	Laboratorio Central	8289233	Arcillex	1041	-	13	26,2	-	40	695	5,01
23/10/2025	Laboratorio Central	8326848	Arcillex	1208	-	16	29,2	-	37	604	6,78
26/11/2025	Laboratorio Central	8375125	Arcillex	891	-	15	29,9	-	40	450	3,67
30/12/2025	Laboratorio Central	8427952	Arcillex	1195	-	13	24,5	-	29	210	5,44

PLANTA DEPURADORA JAGÜEL - AMPLIACIÓN

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-08. C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
26/06/2025	Laboratorio Central	8151608	Arcillex	<2,0	1,4	0,06	0,7	<50	0,15	<0,10	113	-	-	0,06

PLANTA DEPURADORA JAGÜEL - AMPLIACIÓN

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-08 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
07/01/2025	Laboratorio Central	7911180	Arcillex	1935714	-	1
04/02/2025	Laboratorio Central	7951119	Arcillex	2520930	-	4
27/03/2025	Laboratorio Central	8021264	Arcillex	54	-	2
29/04/2025	Laboratorio Central	8069208	Arcillex	7810680	-	4
28/05/2025	Laboratorio Central	8110946	Arcillex	1242857		<1
26/06/2025	Laboratorio Central	8151608	Arcillex	3111864	311864	9
22/07/2025	Laboratorio Central	8191376	Arcillex	10762332	-	2
28/08/2025	Laboratorio Central	8244266	Arcillex	1775510	-	14
29/09/2025	Laboratorio Central	8289233	Arcillex	1061947	-	19
23/10/2025	Laboratorio Central	8326848	Arcillex	600373	-	1
26/11/2025	Laboratorio Central	8375125	Arcillex	3731707	-	2
30/12/2025	Laboratorio Central	8247952	Arcillex	1156146		<1

PLANTA DEPURADORA BARRIO UNO

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-10.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
26/11/2025	Laboratorio Central	8375126	Ladfarming		35,9	35,2			<0,50	250

PLANTA DEPURADORA BARRIO UNO

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-10. B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
26/11/2025	Laboratorio Central	8375126	Ladfarming	565		15	43		14	31,8	1,18

PLANTA DEPURADORA BARRIO UNO

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-10. C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
26/11/2025	Laboratorio Central	8375126	Ladfarming											

aysa	**PLANTA DEPURADORA BARRIO UNO** **BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos** **Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-S-CS-BS-10 (Ex 77)**

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
26/11/2025	Laboratorio Central	8375126	Landfarming	9.694	-	<1

PLANTA DEPURADORA BELLA VISTA

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-14.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
16/01/2025	Lab Central	7923340	Ceamse	-	20,6	60,2	-	-	<0,50	233
12/02/2025	Lab Central	7961967	Ceamse	-	18,9	58,7	-	-	<0,50	248
12/03/2025	Lab Central	8001320	Ceamse	-	19,7	60,3	-	-	<0,50	236
22/04/2025	Lab Central	8058065	Ceamse	-	19,1	59,4	-	-	<0,50	258
20/05/2025	Lab Central	8098292	Ceamse	-	20,0	62	-	-	<0,50	270
11/06/2025	Lab Central	8130742	Ceamse	-	19,8	63,8	-	-	<0,50	219
14/11/2025	Lab Central	8359478	Ceamse	-	19,4	66,7			<0,5	175

PLANTA DEPURADORA BELLA VISTA

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-14.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
16/1/2025	Lab Central	7923340	Ceamse	1446	-	**19**	290	-	13	66,7	2,19
12/2/2025	Lab Central	7961967	Ceamse	4543	-	18	254	-	12	66,8	1,71
12/3/2025	Lab Central	8001320	Ceamse	3893	-	20	252	-	10	72,5	1,70
22/4/2025	Lab Central	8058065	Ceamse	4258	-	19	248	-	11	86,4	1,77
20/5/2025	Lab Central	8098292	Ceamse	4989	-	21	279	-	13	86,7	0,93
11/6/2025	Lab Central	8130742	Ceamse	4054	-	19	220	-	15	73,9	0,28
14/11/2025	Lab Central	8359478	Ceamse	1655	-	15	99	-	9,8	47,7	1,59

PLANTA DEPURADORA BELLA VISTA

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-14.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
08/08/24	Lab Central	7696412	Land/CEAMSE	<2,0	<0,2	<0,050	4,70	<50	<0,1	<0,10	28,6	-	1	<0,02

PLANTA DEPURADORA Bella vista

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-14 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
16/01/2025	Lab Central	7923340	Ceamse	445.631	-	<1
12/02/2025	Lab Central	7961967	Ceamse	485.714	-	17
12/03/2025	Lab Central	8001320	Ceamse	1.218.274	-	4
22/04/2025	Lab Central	8058065	Ceamse	283.770	-	<1
20/05/2025	Lab Central	8098292	Ceamse	5.450.000	-	14
11/06/2025	Lab Central	8130742	Ceamse	8.126.263	-	14
14/11/2025	Lab Central	8359478	Ceamse	1.432.990	-	2

PLANTA DEPURADORA ESCOBAR

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-15.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
29/01/2025	Laboratorio Central	7942708	Landfarming	-	44.6	41.7	-	-	<0.50	262
27/03/2025	Laboratorio Central	8021267	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2025	Laboratorio Central	8106712	Landfarming	-	27.3	42.1	-	-	<0.50	185
08/07/2025	Laboratorio Central	8170274	Landfarming	-	39,3	39,8	-	-	<0.50	179
8/10/2025	Laboratorio Central	8304119	Landfarming	-	36,2	39,9	-	-	<0.50	91

PLANTA DEPURADORA ESCOBAR

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-15.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
29/01/2025	Laboratorio Central	7942708	Landfarming	769	-	22	59.5	-	13	48.4	2.02
27/03/2025	Laboratorio Central	8021267	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2025	Laboratorio Central	8106712	Landfarming	1208	-	18,00	57.5	<1.2	15	55.4	0.340
08/07/2025	Laboratorio Central	8170274	Landfarming	1085	-	22,00	58,8	-	16	45,4	1,70
8/10/2025	Laboratorio Central	8304119	Landfarming	508	-	114	59,6	-	14	342,0	1,92

PLANTA DEPURADORA ESCOBAR

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-15.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
29/01/2025	Laboratorio Central	7942708	Landfarming	<0,50	-	262	769	-	22	59.5	13	48.4	-	2.02
27/03/2025	Laboratorio Central	8021267	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/05/2025	Laboratorio Central	8106712	Landfarming	<0.50	249,00	185	1208	<5.0	18,00	57.5	15,00	55.4	-1	0.340
08/07/2025	Laboratorio Central	8170274	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/10/2025	Laboratorio Central	8304119	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANTA DEPURADORA ESCOBAR

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-15 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
29/01/2025	Laboratorio Central	7942708	Landfarming	780.269	-	10
27/03/2025	Laboratorio Central	8021267	Landfarming	-	-	-
26/05/2025	Laboratorio Central	8106712	Landfarming	879121	336264	<1
08/07/2025	Laboratorio Central	8170274	Landfarming	8.855	-	<1
8/10/2025	Laboratorio Central	8304119	Landfarming	96.133	-	<1

PLANTA DEPURADORA FERRARI

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-17.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
06/02/2025	Laboratorio Central	7953932	ARCILLEX	-	19,6	61,1	-	-	<0.50	220
22/08/2025	Laboratorio Central	8234485	ARCILLEX	-	16,7	62,3	-	-	<0.50	84
10/12/2025	Laboratorio Central	8396267	ARCILLEX	-	18,1	58,8			17	182

PLANTA DEPURADORA FERRARI

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-17.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
06/02/2025	Laboratorio Central	7953932	ARCILLEX	731	-	16	73,2	-	20	34,7	1,77
22/08/2025	Laboratorio Central	8234485	ARCILLEX	365	-	<10	24,1	-	10	15,9	1,00
10/12/2025	Laboratorio Central	8396267	ARCILLEX	697	-	17	39,8	-	14	51,2	1,06

PLANTA DEPURADORA FERRARI

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-17.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio (µg/l)	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
06/02/2025	Laboratorio Central	7953932	ARCILLEX	<0,50	-	220	731	-	16	73,2	20	34,7	-	1,77
22/08/2025	Laboratorio Central	8234485	ARCILLEX	<0,50	-	84	365	-	<10	24,1	10	15,9	-	1,00
10/12/2025	Laboratorio Central	8396267	ARCILLEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANTA DEPURADORA FERRARI

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-17 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
06/02/2025	Laboratorio Central	7953932	ARCILLEX	1224490	-	10
22/08/2025	Laboratorio Central	8234485	ARCILLEX	562874		10
10/12/2025	Laboratorio Central	8396267	ARCILLEX	190164	-	<1

PLANTA DEPURADORA GARIN

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-20.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
29/1/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-
27/3/2025(*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-
26/5/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-
8/7/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-
8/10/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-

(*) NO SE EXTRAJERON MUESTRAS POR SER RECHAZADAS, POR LAB. CENTRAL, REITERADAMENTE POR LA PRESENCIA DE GUSANOS.

PLANTA DEPURADORA GARIN

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-20.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
29/1/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-
27/3/2025(*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-
26/5/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-
8/7/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-
8/10/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) NO SE EXTRAJERON MUESTRAS POR SER RECHAZADAS, POR LAB. CENTRAL, REITERADAMENTE POR LA PRESENCIA DE GUSANOS.

PLANTA DEPURADORA GARIN

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-20.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
29/1/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/3/2025(*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/5/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/7/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8/10/2025 (*)	Laboratorio Central	-	Landfarming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) NO SE EXTRAJERON MUESTRAS POR SER RECHAZADAS, POR LAB. CENTRAL, REITERADAMENTE POR LA PRESENCIA DE GUSANOS.

PLANTA DEPURADORA CATONAS

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-21.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio (mg/kgMS)	Cobre (mg/kgMS)
06/02/2025	Laboratorio central	7953933	Compost	-	20,0	63,5	-	-	<0,50	200
19/05/2025	Laboratorio central	8097089	Compost	-	22,8	55,3	-	-	<0,50	181
09/10/2025	Laboratorio central	8305677	Compost	-	18,4	62,6	-	-	<0,50	138
13/11/2025	Laboratorio central	8356807	Compost	-	18,7	64,7	-	-	<0,50	127

PLANTA DEPURADORA CATONAS

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-21.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
06/02/2025	Laboratorio central	7953933	Compost	422	-	16	39,6	-	17	31,7	1,37
19/05/2025	Laboratorio central	8097089	Compost	1020	-	19	41,9	-	19	47,3	0,77
09/10/2025	Laboratorio central	8305677	Compost	686	-	16	32,60	-	16	22,9	1,78
13/11/2025	Laboratorio central	8356807	Compost	716	-	11	27,00	-	15	23,7	1,20

PLANTA DEPURADORA CATONAS

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-21 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
06/02/2025	Laboratorio central	7953933	Compost	1.200.000	-	6
19/05/2025	Laboratorio central	8097089	Compost	1.526.316	-	21
09/10/2025	Laboratorio central	8305677	Compost	1.891.304	-	4
13/11/2025	Laboratorio central	8356807	Compost	1.860.963	-	<1

PLANTA DEPURADORA LANUS

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-19.A (Ex 76-A)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)						
				pH	Materia seca (% Sól Tot.)	Materia volátil (% Sól. Seco)	Nivel de estabilización (%)	Sulfuros (mg H2S/kg)	Mercurio	Cobre
14/02/2025	Laboratorio Central	7964992	Compostaje		24,7	60,4			<0,50	178
27/05/2025	Laboratorio Central	8108235	Compostaje	7,2	21,5	61,3			<0,50	207
21/08/2025	Laboratorio Central	8233073	Compostaje		26,3	65,6			<0,50	108
20/11/2025	Laboratorio Central	8366715	Compostaje		29,4	50,5			<0,50	133

PLANTA DEPURADORA LANUS

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S- CS-BS-19.B (Ex 76-B)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Materia Seca (mg/kg MS)							
				Cinc (mg/kgMS)	PCB's (µg/kgMS)	Níquel (mg/kgMS)	Plomo (mg/kgMS)	Cianuros (mg/kg)	Arsénico (mg/kgMS)	Cromo Total (mg/kgMS)	Cadmio (mg/kgMS)
14/02/2025	Laboratorio Central	7964992	Compostaje	824		20	49,4		23	41,6	1,64
27/05/2025	Laboratorio Central	8108235	Compostaje	1007		25	56,7		24	52,4	0,84
21/08/2025	Laboratorio Central	8233073	Compostaje	394		14	33,8		17	23,3	1,33
20/11/2025	Laboratorio Central	8366715	Compostaje	475		18	36,2		17	56	1,92

PLANTA DEPURADORA LANUS
BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Químicos
Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-19.C (Ex 76-C)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Lixiviado (mg/L)										
				Mercurio	Bario	Cobre	Cinc	Selenio (µg/l)	Níquel	Plomo	Arsénico (µg/l)	Cromo Total	Sustancias fenólicas	Cadmio (mg/l)
27/05/2025	oratorio Cen	8108235	Compostaje	<2,0	0,28	<0,05	0,36	<50	<0,1	7,2	24	52,7	-	0,84

PLANTA DEPURADORA LANUS

BIOSOLIDOS: Resultados de Análisis Bacteriológicos

Período: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CS-BS-19 (Ex 77)

Fecha	Laboratorio	Partida	Destino	Bacterias coliformes fecales NMP/g	Escherichia Coli NMP/g	Salmonella/4g extracto seco
14/02/2025	Laboratorio Central	7964992	Compostaje	651.417		2
27/05/2025	Laboratorio Central	8108235	Compostaje	252.093		52
21/08/2025	Laboratorio Central	8233073	Compostaje	9.125.475		274
20/11/2025	Laboratorio Central	8366715	Compostaje	7.517.007		10

2.2 DEPURACIÓN

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
SANEAMIENTO - TRATAMIENTO
ERAS AÑO 2025

SIT-CL-DEPUR.-2025

CÓD Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
DC-02	Rendimiento DBO salida Planta Norte	% eliminación del parámetro	%	94,53%	94,59%	90,94%	91,99%	93,61%	92,74%	91,74%	93,06%	89,68%	93,57%	93,37%	92,02%	
DC-03	Rendimiento MES salida Planta Norte	% eliminación del parámetro	%	95,58%	95,73%	94,17%	95,20%	96,18%	94,76%	92,51%	93,49%	87,53%	94,96%	95,47%	93,68%	
DC-04	Rendimiento DQO salida Planta Norte	% eliminación del parámetro	%	80,11%	76,38%	75,31%	79,09%	88,69%	90,98%	89,75%	83,23%	87,64%	88,97%	88,83%	87,10%	
DC-09	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Norte	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-10	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Norte	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-11	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Norte	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-13	Biosólidos Evacuados por Planta Norte - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	439,98	301,34	315,93	329,64	345,86	308,66	311,37	304,56	299,42	325,39	345,69	346,36	
DC-17	Biosolidos Evacuados Planta Norte	Biosolidos Evacuadosmensualmente	ton/mes	1990,84	1296,10	1302,81	1413,56	1516,94	1379,20	1364,44	1313,33	1301,27	1457,86	1574,90	1529,88	
DC-26	Caudal Mensual Planta Norte	Volumen tratado en el mes	m3/mes	4675208,00	4933594,00	5842135,00	5029641,00	6185473,00	5380148,00	5269279,00	5204795,00	5553388,00	5594391,00	5255757,00	5641683,00	
DC-28	Caudal Medio Diario Planta Norte	Volumen diario tratado	m3/día	150813,16	176199,79	188455,97	167654,70	199531,39	179338,27	169976,74	167896,61	185112,93	180464,23	175191,90	181989,77	
DC-30	Caudal Máximo Diario Planta Norte	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	185687,00	200498,00	283327,00	204994,00	315705,00	201270,00	210706,00	215125,00	245606,00	254319,00	219641,00	220164,00	
DC-38	DBO afluente Planta Norte	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	130,71	123,83	95,85	93,25	101,64	139,27	141,54	129,15	129,36	119,07	113,58	112,00	
DC-39	Materia en Suspensión afluente Planta Norte	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	132,26	121,68	92,90	94,40	104,94	123,53	144,39	127,29	115,70	111,55	119,90	117,42	
DC-42	DBO efluente Planta Norte	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	7,07	7,17	7,85	7,08	6,21	8,31	11,31	8,31	12,00	7,25	7,03	8,77	
DC-43	Materia en Suspensión efluente Planta Norte	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	5,77	5,39	5,39	4,57	4,00	6,47	10,84	8,03	11,43	5,76	5,53	7,39	
DC-47	DQO afluente Planta Norte	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	319,40	302,11	260,70	252,33	259,56	314,00	328,63	307,20	253,30	169,80	188,44	221,60	
DC-48	DQO efluente Planta Norte	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	34,00	34,00	32,11	29,50	28,78	28,00	34,00	30,22	31,25	18,89	21,04	28,55	
DC-55	Rendimiento DBO salida Planta Sudoeste	% eliminación del parámetro	%	85,57%	81,90%	85,93%	83,84%	77,42%	80,43%	80,43%	86,25%	84,53%	84,41%	85,62%	85,01%	
DC-56	Rendimiento MES salida Planta Sudoeste	% eliminación del parámetro	%	89,93%	84,08%	90,56%	88,07%	82,08%	86,37%	84,59%	88,73%	88,63%	86,69%	88,98%	90,34%	
DC-57	Rendimiento DQO salida Planta Sudoeste	% eliminación del parámetro	%	80,25%	84,48%	86,23%	84,23%	85,54%	80,46%	83,33%	78,86%	79,22%	49,65%	85,23%	86,46%	
DC-62	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Sudoeste	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-63	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Sudoeste	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	96,77%	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%	100,00%	96,67%	96,77%	100,00%	96,77%	
DC-64	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Sudoeste	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-66	Biosolidos Evacuados por Planta Sudoeste - Mat Seca	Biosólidos Evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	474,53	346,06	375,62	466,74	401,46	353,68	410,63	393,65	405,10	548,53	380,83	418,16	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
SANEAMIENTO - TRATAMIENTO
ERAS AÑO 2025

SIT-CL-DEPUR.-2025

CÓD Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
DC-69	Biosolidos Evacuados Planta Sudoeste	Biosólidos evacuados mensualmente	Ton/mes	1744,58	1267,62	1336,72	1592,36	1434,56	1319,20	1518,62	1408,42	1394,48	1968,88	1352,38	1469,79	
DC-78	Caudal Mensual Planta Sudoeste	Volumen tratado en el mes	m3/mes	4621423,00	4728413,00	5323293,00	4612403,00	5338018,00	5001167,00	4773976,00	4799674,00	4754290,00	4696840,00	4460908,00	4381142,00	
DC-80	Caudal Medio Diario Planta Sudoeste	Volumen diario tratado	m3/día	149078,16	168871,89	171719,13	153746,77	172194,13	166705,57	153999,23	154828,19	158476,33	151510,97	148696,93	141327,16	
DC-82	Caudal Máximo Diario Planta Sudoeste	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	172612,00	213649,00	181117,00	168327,00	262146,00	172899,00	171837,00	174723,00	167177,00	169341,00	157694,00	158120,00	
DC-90	DBO afluente Planta Sudoeste	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	130,26	99,87	110,62	112,44	84,43	96,17	128,57	138,97	135,40	108,23	124,44	134,07	
DC-91	Materia en Suspensión afluente Planta Sudoeste	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	215,47	162,64	193,35	189,10	167,29	177,93	203,35	207,94	240,55	185,55	209,52	240,26	
DC-94	DBO efluente Planta Sudoeste	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	19,07	16,03	15,60	18,30	16,16	18,92	20,96	19,05	20,81	15,65	17,80	20,22	
DC-95	Materia en Suspensión efluente Planta Sudoeste	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	22,10	21,07	18,23	22,76	23,63	24,53	25,63	23,58	27,13	22,23	22,93	23,52	
DC-99	DQO afluente Planta Sudoeste	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	490,67	421,75	451,89	389,38	378,11	374,44	414,86	388,20	407,00	323,75	352,40	500,25	
DC-100	DQO efluente Planta Sudoeste	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	97,33	65,75	62,33	62,00	54,89	73,33	69,00	81,60	83,50	70,75	51,80	68,25	
DC-106	Rendimiento DBO salida Planta Jagüel	% eliminación del parámetro	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DC-107	Rendimiento MES salida Planta Jagüel	% eliminación del parámetro	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DC-108	Rendimiento DQO salida Planta Jagüel	% eliminación del parámetro	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DC-111	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Jagüel	% de Muestras dentro de Norma	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DC-112	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Jagüel	% de Muestras dentro de Norma	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DC-113	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Jagüel	% de Muestras dentro de Norma	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
DC-115	Biosólidos Evacuados por Planta Jagüel - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DC-117	Biosólidos Evacuados Planta Jagüel	Biosólidos evacuados mensualmente	ton/mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DC-127	Caudal Mensual Planta Jagüel	Volumen tratado en el mes	m3/mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DC-129	Caudal Medio Diario Planta Jagüel	Volumen diario tratado	m3/día	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DC-131	Caudal Máximo Diario Planta Jagüel	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DC-139	DBO afluente Planta Jagüel	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DC-140	Materia en Suspensión afluente Planta Jagüel	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DC-143	DBO efluente Planta Jagüel	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DC-144	Materia en Suspensión efluente Planta Jagüel	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planta El Jagüel en tareas de mantenimiento, con derivación de caudal a Ampliación el Jagüel.

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
SANEAMIENTO - TRATAMIENTO
ERAS AÑO 2025

SIT-CL-DEPUR.-2025

CÓD Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
DC-148	DQO afluente Planta Jagüel	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DC-149	DQO efluente Planta Jagüel	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DC-153	Duración Cortes Programados AYSA en Plantas de Tratamiento	Duración Cortes Programados AYSA	Minutos	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DC-157	Duración Cortes Emergencias AYSA en Plantas de Tratamiento	Duración Cortes Emergencias AYSA	Minutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1089,00	720,00	0,00	
DC-164	Número de camiones atmosféricos que ingresan al vaciadero	Es el número de camiones que ingresan al vaciadero de la PDSO	N°	2090,00	1779,00	2023,00	2179,00	2441,00	2377,00	2742,00	2617,00	2877,00	2841,00	2494,00	2683,00	
DC-165	Volumen descargado por los camiones que ingresan al vaciadero	Es el volumen de los camiones que ingresan al vaciadero de la PDSO	m3	32249,00	27199,00	31791,00	35108,00	39731,00	38931,00	45035,00	42219,00	47093,00	46480,00	40854,00	43761,00	
DC-166	Descargas en Vaciadero PDSO	Descargas en Vaciadero PDSO Def: 100 x N° de muestras conformes / N° muestras	%	99,95%	99,78%	99,95%	99,91%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	99,97%	100,00%	99,96%	99,96%	
DC-168	Rendimiento DBO salida Planta Barrio Uno	% eliminación del parámetro	%	85,54%	85,09%	83,40%	82,76%	83,84%	83,87%	79,94%	86,94%	83,74%	87,04%	88,19%	85,09%	
DC-169	Rendimiento MES salida Planta Barrio Uno	% eliminación del parámetro	%	91,27%	86,76%	84,17%	85,37%	82,36%	83,50%	79,42%	87,64%	80,66%	86,03%	90,98%	84,35%	
DC-170	Rendimiento DQO salida Planta Barrio Uno	% eliminación del parámetro	%	71,95%	75,05%	77,72%	95,58%	61,74%	71,00%	67,07%	59,55%	55,04%	72,47%	80,52%	60,73%	
DC-171	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Barrio Uno	% de Muestras dentro de Norma	%	74,07%	100,00%	100,00%	92,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-172	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Barrio Uno	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-173	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Barrio Uno	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-174	Biosólidos Evacuados por Planta Barrio Uno - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	0,00	4,94	3,86	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DC-175	Biosólidos Evacuados Planta Barrio Uno	Biosólidos evacuados mensualmente	ton/mes	0,00	19,00	10,44	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DC-184	Caudal Mensual Planta Barrio Uno	Volumen tratado en el mes	m3/mes	46075,00	37145,00	43890,00	41895,00	47500,00	33725,00	43510,00	49210,00	48640,00	49440,00	45980,00	45843,00	Se informa Caudal estimativo en base a Informes de Análisis de Caudal realizados
DC-186	Caudal Medio Diario Planta Barrio Uno	Volumen diario tratado	m3/día	1486,29	1326,61	1415,81	1396,50	1532,26	1124,17	1403,55	1587,42	1621,33	1594,84	1532,67	1478,81	
DC-188	Caudal Máximo Diario Planta Barrio Uno	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	1615,00	1615,00	1615,00	1615,00	1805,00	2375,00	1710,00	1710,00	1710,00	1805,00	1805,00	1710,00	
DC-733	DBO afluente Planta Planta Barrio Uno	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	178,00	112,17	114,92	108,73	91,63	101,26	84,74	109,72	100,62	112,32	129,92	104,30	
DC-734	DBO efluente Planta Planta Barrio Uno	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	25,85	20,00	19,23	18,04	15,07	14,11	17,00	14,24	16,54	14,84	15,46	15,26	
DC-191	Materia en Suspensión afluente Planta Barrio Uno	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	265,93	109,61	126,54	148,31	90,15	117,61	95,41	140,60	93,69	119,19	217,56	108,30	
DC-193	Materia en Suspensión efluente Planta Barrio Uno	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	23,54	18,57	20,16	19,35	16,16	16,47	19,56	17,28	18,46	17,07	19,90	16,70	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
SANEAMIENTO - TRATAMIENTO
ERAS AÑO 2025

SIT-CL-DEPUR.-2025

CÓD Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
DC-194	DQO afluente Planta Barrio Uno	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	255,00	250,50	159,50	259,00	152,00	249,50	224,22	175,50	152,75	229,60	347,50	180,75	
DC-195	DQO efluente Planta Barrio Uno	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	70,50	62,50	35,00	11,50	55,00	69,00	74,67	71,25	68,25	69,00	63,75	69,75	
DC-197	Rendimiento DBO salida Planta Hurlingham	% eliminación del parámetro	%	87,69%	91,25%	91,31%	87,46%	92,95%	90,89%	92,04%	91,88%	94,49%	95,04%	35,86%	87,98%	
DC-198	Rendimiento MES salida Planta Hurlingham	% eliminación del parámetro	%	90,31%	95,57%	80,24%	96,79%	95,14%	91,89%	95,26%	89,16%	97,11%	96,67%	66,52%	91,73%	
DC-199	Rendimiento DQO salida Planta Hurlingham	% eliminación del parámetro	%	88,39%	91,65%	92,48%	93,06%	92,34%	92,15%	93,95%	68,00%	93,80%	94,34%	72,13%	93,92%	
DC-202	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Hurlingham	% de Muestras dentro de Norma	%	94,44%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	91,67%	Diciembre: Picos de caudal provenientes de EBC
DC-203	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Hurlingham	% de Muestras dentro de Norma	%	96,77%	100,00%	96,77%	100,00%	100,00%	96,67%	100,00%	93,33%	100,00%	100,00%	80,00%	96,77%	Diciembre: Picos de caudal provenientes de EBC
DC-204	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Hurlingham	% de Muestras dentro de Norma	%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	
DC-206	Biosólidos Evacuados por Planta Hurlingham - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	51,88	54,94	60,57	57,04	52,12	53,34	51,51	53,09	52,36	40,99	47,15	53,98	
DC-208	Biosólidos Evacuados Planta Hurlingham	Biosólidos evacuados mensualmente	ton/mes	373,22	389,68	412,04	393,40	367,02	386,54	357,70	393,28	385,00	310,52	345,14	382,26	
DC-218	Caudal Mensual Planta Hurlingham	Volumen tratado en el mes	m3/mes	528671,00	478283,00	485992,00	532741,00	407097,00	513217,00	528654,00	424800,00	359851,00	354385,00	490732,00	476650,00	
DC-220	Caudal Medio Diario Planta Hurlingham	Volumen diario tratado	m3/día	17053,90	17081,54	15677,16	17758,03	13132,16	17107,23	17053,35	13703,23	11995,03	11431,77	16357,73	15375,81	
DC-222	Caudal Máximo Diario Planta Hurlingham	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	46128,00	19082,00	20646,00	21916,00	17665,00	19097,00	20039,00	17595,00	14401,00	18182,00	19491,00	18014,00	
DC-230	DBO afluente Planta Hurlingham	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	100,50	89,50	89,93	124,44	102,63	127,44	163,41	155,08	109,33	115,00	140,33	111,08	
DC-231	Materia en Suspensión afluente Planta Hurlingham	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	126,52	109,64	116,84	124,28	126,07	123,67	148,40	144,62	123,15	134,08	131,36	117,11	
DC-234	DBO efluente Planta Hurlingham	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	12,83	7,88	7,80	8,71	6,82	11,56	13,22	12,00	6,17	5,91	93,00	14,08	
DC-235	Materia en Suspensión efluente Planta Hurlingham	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	12,35	4,74	22,10	3,97	5,83	10,57	7,24	12,15	3,36	4,58	37,92	10,16	
DC-239	DQO afluente Planta Hurlingham	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	304,00	227,50	209,25	320,38	204,25	286,67	359,89	369,50	275,75	279,60	307,25	278,40	
DC-240	DQO efluente Planta Hurlingham	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	36,00	18,88	15,75	22,13	15,63	22,56	21,78	21,50	17,00	16,00	88,50	17,40	
DC-244	Rendimiento DBO salida Planta Santa Catalina	% eliminación del parámetro	%	95,58%	96,31%	97,54%	94,61%	94,00%	89,77%	93,82%	92,04%	91,07%	93,22%	94,46%	93,11%	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
SANEAMIENTO - TRATAMIENTO
ERAS AÑO 2025

SIT-CL-DEPUR.-2025

CÓD Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
DC-245	Rendimiento MES salida Planta Santa Catalina	% eliminación del parámetro	%	92,31%	85,79%	91,24%	93,23%	86,55%	84,03%	86,82%	90,94%	91,00%	86,50%	95,27%	93,90%	
DC-246	Rendimiento DQO salida Planta Santa Catalina	% eliminación del parámetro	%	89,53%	86,31%	92,52%	94,42%	86,41%	88,79%	91,54%	95,64%	93,85%	94,09%	94,70%	94,19%	
DC-249	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Santa Catalina	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-250	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Santa Catalina	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-251	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Santa Catalina	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-253	Biosólidos Evacuados por Planta Santa Catalina - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	1,71	0,00	0,00	0,00	2,61	5,42	4,19	2,16	2,56	2,41	2,47	2,05	
DC-255	Biosólidos Evacuados Planta Santa Catalina	Biosólidos evacuados mensualmente	ton/mes	6,72	0,00	0,00	0,00	10,42	21,50	18,26	9,66	11,36	10,52	10,10	8,78	
DC-265	Caudal Mensual Planta Santa Catalina	Volumen tratado en el mes	m3/mes	26379,79	28969,40	30212,70	42254,38	79922,54	45463,48	50045,04	55007,63	45728,92	51765,45	49419,30	46093,80	Red controlada por el municipio (Las maniobras de variacion de caudal no son manejadas por el sector).
DC-267	Caudal Medio Diario Planta Santa Catalina	Volumen diario tratado	m3/día	850,96	1034,62	974,60	1408,48	2578,15	1515,45	1614,36	1774,44	1524,30	1669,85	1704,11	1486,90	
DC-269	Caudal Máximo Diario Planta Santa Catalina	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	1356,00	3638,00	3027,83	3364,65	9031,44	1918,50	2068,44	3975,00	1994,80	3089,90	2554,00	2178,50	
DC-277	DBO afluente Planta Santa Catalina	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	122,21	82,58	106,69	119,00	125,75	138,38	143,64	109,33	104,93	119,67	127,00	110,88	
DC-278	Materia en Suspensión afluente Planta Santa Catalina	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	85,92	61,22	69,42	94,56	107,26	97,96	88,46	112,17	99,09	105,58	106,19	123,78	
DC-281	DBO efluente Planta Santa Catalina	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	5,71	2,58	2,77	6,14	7,33	14,15	9,10	8,17	9,71	8,11	7,00	7,50	
DC-282	Materia en Suspensión efluente Planta Santa Catalina	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	6,70	9,35	5,34	7,34	13,15	15,45	9,33	9,28	8,97	6,33	5,13	7,66	
DC-286	DQO afluente Planta Santa Catalina	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	169,10	153,89	202,67	303,13	242,00	339,44	336,11	297,75	200,00	258,50	372,33	397,50	
DC-287	DQO efluente Planta Santa Catalina	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	17,60	23,11	16,00	17,22	30,63	38,11	28,78	12,38	12,60	15,25	19,67	23,00	
DC-291	Rendimiento DBO salida Planta Sudoeste 2	% eliminación del parámetro	%	97,40%	97,57%	96,36%	94,13%	93,95%	95,68%	96,42%	96,33%	92,63%	96,85%	96,21%	94,88%	
DC-292	Rendimiento MES salida Planta Sudoeste 2	% eliminación del parámetro	%	97,67%	97,59%	97,19%	92,81%	94,18%	96,26%	96,64%	97,41%	94,54%	97,78%	97,07%	95,83%	
DC-293	Rendimiento DQO salida Planta Sudoeste 2	% eliminación del parámetro	%	91,04%	92,02%	94,22%	92,62%	93,37%	92,37%	93,34%	90,53%	90,03%	89,09%	93,40%	90,09%	
DC-298	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Sudoeste 2	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-299	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Sudoeste 2	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-300	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Sudoeste 2	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-302	Biosólidos Evacuados por Planta Sudoeste 2 - Mat Seca	BiosólidosEvacuados mensualmente	(tonMS/mes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Los datos se veran reflejados en Planta Sudoeste I (Puesta en marcha Planta Sudoeste Barros).
DC-305	Biosólidos Evacuados Planta Sudoeste 2	Biosólidos Evacuadosmensualmente	m3/mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
SANEAMIENTO - TRATAMIENTO
ERAS AÑO 2025

SIT-CL-DEPUR.-2025

CÓD Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
DC-314	Caudal Mensual Planta Sudoeste 2	Volumen tratado en el mes	m3/mes	1807492,00	1675142,00	1949983,00	2568990,00	3018802,00	2726234,00	2573187,00	2621443,00	2686271,00	2892035,00	2942093,00	2969190,00	
DC-316	Caudal Medio Diario Planta Sudoeste 2	Volumen diario tratado	m3/día	58306,19	59826,50	62902,68	85633,00	97380,71	90874,47	83006,03	84562,68	89542,37	93291,45	98069,77	95780,32	
DC-318	Caudal Máximo Diario Planta Sudoeste 2	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	72373,00	81523,00	87932,00	100284,00	113018,00	97009,00	92641,00	104009,00	98000,00	101202,00	105864,00	116230,00	
DC-326	DBO afluente Planta Sudoeste 2	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	150,26	148,59	106,90	134,63	111,86	146,19	167,54	168,54	170,90	139,27	164,87	146,15	
DC-327	Materia en Suspensión afluente Planta Sudoeste 2	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	238,80	235,07	146,13	205,80	183,81	216,13	228,84	240,58	232,00	194,52	236,40	207,42	
DC-330	DBO efluente Planta Sudoeste 2	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	3,80	3,54	3,87	6,16	6,63	6,30	5,95	6,00	4,02	4,41	6,27	7,54	
DC-331	Materia en Suspensión efluente Planta Sudoeste 2	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	5,55	5,76	4,14	7,82	10,66	8,04	7,70	6,09	5,23	4,30	6,88	8,92	
DC-335	DQO afluente Planta Sudoeste 2	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	548,22	470,75	423,33	412,50	457,44	445,11	532,29	517,60	456,75	395,50	439,20	495,75	
DC-336	DQO efluente Planta Sudoeste 2	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	49,44	36,75	24,78	30,13	30,22	33,89	35,43	49,20	45,50	43,25	29,00	49,75	
DC-343	Rendimiento DBO salida Planta Jagüel 2	% eliminación del parámetro	%	88,90%	84,15%	87,01%	87,68%	87,99%	90,05%	89,38%	90,26%	87,59%	89,48%	87,03%	85,26%	
DC-344	Rendimiento MES salida Planta Jagüel 2	% eliminación del parámetro	%	93,99%	89,39%	90,83%	92,80%	93,58%	94,29%	95,69%	96,36%	94,40%	96,16%	86,64%	85,20%	
DC-345	Rendimiento DQO salida Planta Jagüel 2	% eliminación del parámetro	%	80,40%	80,14%	84,37%	94,57%	88,96%	87,74%	88,41%	89,35%	84,82%	88,62%	84,78%	77,17%	
DC-348	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Jagüel 2	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-349	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Jagüel 2	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-350	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Jagüel 2	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
DC-352	Biosólidos Evacuados por Planta Jagüel 2 - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	163,12	121,52	93,57	83,48	101,08	148,53	159,62	144,01	115,80	96,60	75,08	115,14	
DC-354	Biosólidos Evacuados Planta Jagüel 2	Biosólidos evacuados mensualmente	ton/mes	665,80	482,22	368,40	355,24	414,28	477,60	570,06	626,14	490,66	395,92	303,96	439,46	
DC-364	Caudal Mensual Planta Jagüel 2	Volumen tratado en el mes	m3/mes	1149136,00	986320,00	1169919,00	1054059,00	1109475,00	1038626,00	979598,00	976968,00	952352,00	1076984,00	1036071,00	1061484,00	
DC-366	Caudal Medio Diario Planta Jagüel 2	Volumen diario tratado	m3/día	37068,90	35225,71	37739,32	35135,30	35789,52	34620,87	31599,94	31515,10	31745,07	34741,42	34535,70	34241,42	
DC-368	Caudal Máximo Diario Planta Jagüel 2	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	41952,00	41912,00	44864,00	38296,00	46376,00	37674,00	36312,00	34717,00	34640,00	42064,00	35560,00	38728,00	
DC-376	DBO afluente Planta Jagüel 2	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	223,37	127,30	170,70	182,56	184,04	173,35	187,59	181,92	182,81	189,23	125,52	120,48	
DC-377	Materia en Suspensión afluente Planta Jagüel 2	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	430,71	218,07	247,68	315,45	362,29	302,83	521,48	556,32	445,90	574,77	139,10	135,68	
DC-380	DBO efluente Planta Jagüel 2	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	24,85	20,22	22,15	22,44	21,81	17,15	19,74	17,65	22,62	20,04	16,28	17,74	
DC-381	Materia en Suspensión efluente Planta Jagüel 2	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	25,53	23,36	22,79	22,69	23,01	17,23	21,99	20,03	24,93	21,97	18,60	20,10	
DC-385	DQO afluente Planta Jagüel 2	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	557,50	290,00	268,50	433,00	829,00	653,00	759,22	775,25	682,00	826,78	345,75	292,56	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS
SANEAMIENTO - TRATAMIENTO
ERAS AÑO 2025

SIT-CL-DEPUR.-2025

CÓD Nuevo	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
DC-386	DQO efluente Planta Jagüel 2	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	110,50	57,00	42,00	23,50	79,00	80,67	85,67	82,75	103,44	94,11	52,63	67,44	
DC-391	Rendimiento DBO salida Planta Lanus	% eliminación del parámetro	%	83,84%	78,33%	83,27%	85,74%	86,56%	77,01%	80,84%	76,67%	78,43%	87,03%	80,36%	82,69%	
DC-392	Rendimiento MES salida Planta Lanus	% eliminación del parámetro	%	84,23%	85,89%	82,79%	82,62%	87,44%	80,81%	79,08%	78,92%	67,30%	75,49%	73,14%	79,29%	
DC-393	Rendimiento DQO salida Planta Lanus	% eliminación del parámetro	%	84,41%	88,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,64%	61,00%	35,59%	73,12%	55,32%	66,04%	No se tienen datos identificados
DC-396	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Lanus	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,57%	66,67%	77,78%	76,92%	93,33%	Diciembre: Efluente con arrastre de sólidos. La planta sólo tiene una centrífuga en operación debido a esto no se puede purgar la candidad necesaria de lodos por lo que se van acumulando dentro del proceso y se producen las fugas. Fuera de norma DBO
DC-397	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Lanus	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	66,67%	72,00%	45,45%	88,00%	Diciembre: Efluente con arrastre de sólidos. La planta sólo tiene una centrífuga en operación debido a esto no se puede purgar la candidad necesaria de lodos por lo que se van acumulando dentro del proceso y se producen las fugas. Fuera de norma DBO
DC-398	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Lanus	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	80,00%	75,00%	100,00%	
DC-400	Biosólidos Evacuados por Planta Lanus - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	5,01	13,80	6,67	13,64	11,85	9,38	15,15	14,80	17,65	15,33	7,63	10,51	
DC-404	Biosólidos Evacuados Planta Lanus	Biosólidos Evacuados mensualmente	ton/mes	15,18	39,72	21,68	41,26	40,07	26,11	49,38	43,06	52,68	45,26	23,58	31,99	
DC-413	Caudal Mensual Planta Lanus	Volumen tratado en el mes	m3/mes	263403,00	303707,00	361542,00	332449,00	404022,00	313620,00	311672,00	358905,00	368737,00	361591,00	373988,00	349346,00	
DC-415	Caudal Medio Diario Planta Lanus	Volumen diario tratado	m3/día	8496,87	10846,68	11662,65	11081,63	13032,97	10454,00	10053,94	11577,58	12291,23	11664,23	12466,27	11269,23	
DC-417	Caudal Máximo Diario Planta Lanus	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	12405,00	14501,00	15504,00	14311,00	21360,00	13324,00	14555,00	19473,00	17654,00	18001,00	16067,00	15088,00	
DC-425	DBO afluente Planta Lanus	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	69,47	60,82	51,27	89,33	95,73	94,23	116,75	140,29	159,93	197,56	90,54	76,53	
DC-426	Materia en Suspensión afluente Planta Lanus	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	105,25	129,73	106,27	130,17	137,67	88,87	126,00	129,08	145,17	129,76	133,09	137,92	
DC-429	DBO efluente Planta Lanus	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	11,29	12,64	8,87	12,33	12,07	21,69	22,81	31,71	34,27	25,72	17,31	12,87	
DC-430	Materia en Suspensión efluente Planta Lanus	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	16,45	18,09	18,36	22,74	17,21	17,17	27,00	27,17	44,25	32,52	35,86	26,88	
DC-434	DQO afluente Planta Lanus	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	240,00	254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	147,00	177,50	198,40	159,00	131,80	
DC-435	DQO efluente Planta Lanus	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	39,33	28,50	34,00	56,50	47,50	54,25	58,40	60,50	113,50	53,00	73,00	45,60	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

SANEAMIENTO - TRATAMIENTO

ERAS AÑO 2025 Nuevas Plantas

SIT-CL-DEPUR.NP-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio Mensual	OBSERVACIONES
DC-440	Rendimiento DBO salida Planta Ferrari	% eliminación del parámetro	%	86,4%	83,1%	84,0%	85,4%	87,1%	86,4%	87,5%	88,8%	88,4%	84,3%	87,8%	86,42%		
DC-441	Rendimiento MES salida Planta Ferrari	% eliminación del parámetro	%	97,2%	95,5%	90,0%	89,7%	89,7%	89,9%	88,3%	85,7%	87,6%	91,6%	91,2%	84,63%		
DC-442	Rendimiento DQO salida Planta Ferrari	% eliminación del parámetro	%										78,5%	81,4%	73,01%		
DC-445	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Ferrari	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-446	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Ferrari	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-447	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Ferrari	% de Muestras dentro de Norma	%										100,0%	100,0%	100,00%		
DC-449	Biosólidos Evacuados por Planta Ferrari - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	59,8	50,76	64,71	66,44	65,73	56,97	64,17	65,69	67,80	68,52	36,71	49,06		
DC-453	Biosólidos Evacuados Planta Ferrari	Biosólidos Evacuados mensualmente	ton/mes	253,0	227,54	292,80	298,20	296,62	256,96	303,10	296,56	330,08	333,94	179,86	232,08		
DC-462	Caudal Mensual Planta Ferrari	Volumen tratado en el mes	m3/mes	396837,0	371932,00	422594,00	397524,00	463757,00	425391,00	435811,00	449937,00	447923,00	475873,00	479232,00	449550,00		
DC-464	Caudal Medio Diario Planta Ferrari	Volumen diario tratado	m3/día	12801,2	13283,29	13632,06	13250,80	14959,90	14179,70	14058,42	14514,10	14930,77	15350,74	15974,40	14501,61		
DC-466	Caudal Máximo Diario Planta Ferrari	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	15050,0	16710,00	16997,00	15572,00	18883,00	21208,00	20883,00	21425,00	21374,00	26265,00	24037,00	18885,00		
DC-474	DBO afluente Planta Ferrari	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	83,5	82,40	83,81	84,18	96,94	104,35	103,29	103,12	105,94	100,53	100,50	105,50		
DC-475	Materia en Suspensión afluente Planta Ferrari	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	124,9	140,54	126,84	105,53	115,61	129,27	137,03	120,35	120,87	120,35	115,00	108,55		
DC-478	DBO efluente Planta Ferrari	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	11,3	13,93	13,38	12,24	12,59	14,12	12,94	11,59	12,18	15,53	12,31	14,44		
DC-479	Materia en Suspensión efluente Planta Ferrari	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	3,6	6,43	12,81	10,83	12,61	13,03	15,84	17,48	15,60	10,63	10,37	16,76		
DC-483	DQO afluente Planta Ferrari	Medida del parámetro en el afluente	mg/l										185,00	201,25	277,00		
DC-484	DQO efluente Planta Ferrari	Medida del parámetro en el efluente	mg/l										40,00	37,50	75,20		
DC-489	Rendimiento DBO salida Planta Catonas	% eliminación del parámetro	%	95,6%	95,0%	96,9%	95,6%	94,6%	96,8%	93,0%	93,8%	92,9%	93,5%	92,8%	89,44%		
DC-490	Rendimiento MES salida Planta Catonas	% eliminación del parámetro	%	96,9%	95,3%	98,5%	97,0%	95,6%	95,7%	91,0%	92,7%	88,9%	91,6%	91,8%	87,33%		
DC-491	Rendimiento DQO salida Planta Catonas	% eliminación del parámetro	%									82,6%	85,5%	77,9%	68,89%		
DC-494	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Catonas	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-495	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Catonas	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-496	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Catonas	% de Muestras dentro de Norma	%						100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-498	Biosólidos Evacuados por Planta Catonas - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	44,2	43,60	52,30	59,56	60,52	51,57	54,46	53,80	63,32	60,43	36,90	50,40		
DC-502	Biosólidos Evacuados Planta Catonas	Biosólidos Evacuados mensualmente	ton/mes	257,2	210,62	229,40	270,84	275,34	235,48	272,32	288,02	337,16	315,72	193,00	262,48		
DC-511	Caudal Mensual Planta Catonas	Volumen tratado en el mes	m3/mes	321304,4	314249,06	345170,00	374718,00	387912,49	339818,77	352079,16	401827,00	401610,00	419884,73	404128,00	378722,00		
DC-513	Caudal Medio Diario Planta Catonas	Volumen diario tratado	m3/día	10364,7	11223,18	11134,52	12490,60	12513,31	11327,29	11357,39	12962,16	13387,00	13544,67	13470,93	12216,84		
DC-515	Caudal Máximo Diario Planta Catonas	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	13318,0	16010,00	14641,00	14553,00	15674,00	13219,00	13439,00	30933,00	30494,00	28949,00	25593,00	16461,00		
DC-523	DBO afluente Planta Catonas	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	109,1	87,67	95,31	107,92	85,04	134,19	123,89	135,65	117,27	115,04	113,92	123,30		
DC-524	Materia en Suspensión afluente Planta Catonas	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	179,7	152,88	184,88	174,15	116,54	146,12	122,81	178,92	145,77	146,37	151,20	159,15		
DC-527	DBO efluente Planta Catonas	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	4,8	4,29	2,96	4,85	4,58	4,31	8,67	8,85	8,35	7,70	8,24	12,85		
DC-528	Materia en Suspensión efluente Planta Catonas	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	5,7	6,75	2,77	5,35	5,04	6,35	10,96	14,23	17,54	14,44	13,44	19,89		
DC-532	DQO afluente Planta Catonas	Medida del parámetro en el afluente	mg/l									232,25	204,80	177,50	172,00		
DC-533	DQO efluente Planta Catonas	Medida del parámetro en el efluente	mg/l						18,38	23,85	25,92	40,25	29,60	38,25	51,50		
DC-538	Rendimiento DBO salida Bella Vista	% eliminación del parámetro	%	92,1%	89,7%	86,7%	86,8%	88,0%	87,8%	87,4%	85,3%	90,6%	89,5%	89,9%	87,99%		
DC-539	Rendimiento MES salida Bella Vista	% eliminación del parámetro	%	93,3%	92,5%	90,1%	90,2%	87,8%	89,6%	91,2%	88,6%	90,7%	91,9%	91,0%	90,14%		
DC-540	Rendimiento DQO salida Bella Vista	% eliminación del parámetro	%								90,5%	91,6%	92,7%	93,0%	91,75%		
DC-543	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Bella Vista	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	81,3%	100,0%	88,9%	100,0%	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%	94,4%	100,0%	100,00%		
DC-544	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Bella Vista	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	100,0%	100,0%	93,1%	96,8%	100,0%	100,0%	93,1%	93,3%	93,3%	100,0%	100,00%		
DC-545	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Bella Vista	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-547	Biosólidos Evacuados por Planta Bella Vista - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	60,0	74,09	99,57	45,55	66,46	92,62	94,75	95,18	109,77	94,21	79,29	63,65		
DC-551	Biosólidos Evacuados Planta Bella Vista	Biosólidos Evacuados mensualmente	ton/mes	306,1	370,46	469,68	214,84	322,60	449,62	464,46	475,88	546,14	468,72	398,42	321,44		
DC-560	Caudal Mensual Planta Bella Vista	Volumen tratado en el mes	m3/mes	1061943,0	981206,00	1095964,00	1095965,00	1146517,00	1077117,00	1069057,00	1138401,00	1147197,00	1180089,00	1136259,00	909272,00		
DC-562	Caudal Medio Diario Planta Bella Vista	Volumen diario tratado	m3/día	34256,2	35043,07	35353,68	36532,17	36984,42	35903,90	34485,71	36722,61	38239,90	38067,39	37875,30	29331,35		
DC-564	Caudal Máximo Diario Planta Bella Vista	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	40972,0	40475,00	43758,00	49533,00	50473,00	42174,00	39598,00	48226,00	43488,00	43829,00	41983,00	37106,00		
DC-572	DBO afluente Planta Bella Vista	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	228,2	187,82	172,15	206,67	201,08	182,18	168,42	171,06	165,33	161,94	153,40	155,58		
DC-573	Materia en Suspensión afluente Planta Bella Vista	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	252,8	226,96	202,94	218,58	208,81	195,66	194,48	184,34	182,30	182,60	170,74	163,29		
DC-576	DBO efluente Planta Bella Vista	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	17,9	19,13	22,85	26,30	24,69	22,12	21,16	23,94	15,39	16,50	15,33	18,89		
DC-577	Materia en Suspensión efluente Planta Bella Vista	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	16,9	16,60	20,14	21,02	24,79	20,37	17,19	20,52	16,65	14,34	15,13	15,99		
DC-581	DQO afluente Planta Bella Vista	Medida del parámetro en el afluente	mg/l								329,29	335,25	338,00	385,56	360,45		
DC-582	DQO efluente Planta Bella Vista	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	51,75	48,00	64,25	52,10	60,88	52,50	48,40	32,88	28,00	24,50	27,11	31,36		
DC-587	Rendimiento DBO salida Planta Fiorito	% eliminación del parámetro	%	91,1%	95,0%	93,7%	93,6%	89,5%	85,7%	83,3%	82,9%	92,7%	95,9%	91,2%	92,62%		
DC-588	Rendimiento MES salida Planta Fiorito	% eliminación del parámetro	%	93,8%	96,7%	95,7%	95,6%	93,6%	91,2%	84,2%	88,2%	95,4%	92,9%	92,7%	92,99%		
DC-589	Rendimiento DQO salida Planta Fiorito	% eliminación del parámetro	%		93,0%	90,9%	93,1%	93,6%	88,1%	85,7%	86,3%	88,9%	87,6%	85,7%	88,44%		
DC-592	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Fiorito	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-593	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Fiorito	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-594	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Fiorito	% de Muestras dentro de Norma	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

SANEAMIENTO - TRATAMIENTO

ERAS AÑO 2025 Nuevas Plantas

SIT-CL-DEPUR.NP-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio Mensual	OBSERVACIONES
DC-596	Biosólidos Evacuados por Planta Fiorito - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	6,98	12,73	5,94	7,87	31,44	30,12	15,14	15,52	32,38	39,70	38,11	43,12		
DC-600	Biosólidos Evacuados Planta Fiorito	Biosólidos Evacuados mensualmente	ton/mes	22,08	32,98	14,48	22,48	136,70	125,52	68,82	76,44	149,90	216,96	162,16	195,12		
DC-609	Caudal Mensual Planta Fiorito	Volumen tratado en el mes	m3/mes	317822,0	405711,00	469121,00	379757,00	621829,00	378344,00	383292,00	447596,00	403414,00	442642,00	408570,00	394088,00		
DC-611	Caudal Medio Diario Planta Fiorito	Volumen diario tratado	m3/día	10252,3	14489,68	15132,94	12658,57	20059,00	12611,47	12364,26	14438,58	13447,13	14278,77	13619,00	12712,52		
DC-613	Caudal Máximo Diario Planta Fiorito	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	26046,0	34749,00	31920,00	16650,00	97572,00	17059,00	18596,00	40537,00	21647,00	30556,00	25001,00	17741,00		
DC-621	DBO afluente Planta Fiorito	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	101,2	125,00	124,00	111,86	93,54	63,83	58,00	68,77	80,92	78,93	63,33	70,36		
DC-622	Materia en Suspensión afluente Planta Fiorito	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	205,9	256,21	246,29	162,27	178,16	79,03	81,48	104,19	111,33	105,03	75,10	87,42		
DC-625	DBO efluente Planta Fiorito	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	9,1	7,67	7,58	7,29	9,00	9,17	9,71	10,69	5,85	3,43	5,64	5,25		
DC-626	Materia en Suspensión efluente Planta Fiorito	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	12,5	9,71	11,13	7,17	9,79	7,00	12,90	12,19	5,23	6,74	5,52	6,13		
DC-630	DQO afluente Planta Fiorito	Medida del parámetro en el afluente	mg/l		629,00	470,00	507,40	368,25	312,25	243,78	322,50	300,40	258,00	260,00	220,60		
DC-631	DQO efluente Planta Fiorito	Medida del parámetro en el efluente	mg/l		34,00	41,50	35,10	23,25	37,75	34,78	40,25	33,40	32,00	37,25	26,40		
DC-636	Rendimiento DBO salida Planta Escobar	% eliminación del parámetro	%	70,8%	77,8%	73,6%	67,8%	72,5%	75,3%	73,3%	67,6%	72,4%	69,4%	66,6%	73,45%		
DC-637	Rendimiento MES salida Planta Escobar	% eliminación del parámetro	%	57,5%	60,1%	71,4%	67,9%	74,7%	72,9%	66,3%	69,0%	69,0%	64,8%	66,5%	67,69%		
DC-638	Rendimiento DQO salida Planta Escobar	% eliminación del parámetro	%	79,63%	58,1%	78,1%	82,0%	62,9%	62,8%	53,2%	56,5%	75,9%	69,4%	66,4%	74,05%		
DC-641	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Escobar	% de Muestras dentro de Norma	%	90,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-642	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Escobar	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	95,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-643	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Escobar	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-645	Biosólidos Evacuados por Planta Escobar - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00		
DC-649	Biosólidos Evacuados Planta Escobar	Biosólidos Evacuados mensualmente	ton/mes	0,0	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00		
DC-658	Caudal Mensual Planta Escobar	Volumen tratado en el mes	m3/mes	183719,0	178509,00	208505,00	138644,00	208020,00	189720,00	212433,50	204255,00	208954,50	249081,00	246202,00	270713,00		
DC-660	Caudal Medio Diario Planta Escobar	Volumen diario tratado	m3/día	5926,4	6375,32	6725,97	4621,47	6710,32	6324,00	6852,69	6588,87	6965,15	8034,87	8206,73	8732,68		
DC-662	Caudal Máximo Diario Planta Escobar	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	7650,0	7990,00	8160,00	6715,00	8610,00	7140,00	7140,00	7565,00	9600,00	8760,00	8760,00	8760,00		
DC-670	DBO afluente Planta Escobar	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	93,9	73,88	79,90	72,77	100,17	101,92	99,67	76,56	86,75	80,20	75,50	93,33		
DC-671	Materia en Suspensión afluente Planta Escobar	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	70,3	56,41	75,38	77,60	105,26	87,76	87,67	83,78	81,31	67,58	67,63	85,88		
DC-674	DBO efluente Planta Escobar	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	27,3	18,00	21,70	23,77	27,67	25,54	26,58	25,11	24,13	24,50	25,13	24,78		
DC-675	Materia en Suspensión efluente Planta Escobar	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	29,3	23,00	21,29	24,20	26,81	24,12	29,44	26,28	26,06	23,68	22,75	27,76		
DC-679	DQO afluente Planta Escobar	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	216,00	155,00	155,00	261,00	167,00	172,00	124,00	165,50	215,75	161,00	170,00	238,80		
DC-680	DQO efluente Planta Escobar	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	44,00	65,00	34,00	47,00	62,00	64,00	58,00	72,00	53,75	49,40	57,00	62,00		
DC-685	Rendimiento DBO salida Planta Garin	% eliminación del parámetro	%		75,0%	80,3%	85,3%	86,4%	86,0%	76,9%	86,6%	85,7%	80,9%	79,2%	72,85%		
DC-686	Rendimiento MES salida Planta Garin	% eliminación del parámetro	%	86,8%	74,6%	77,3%	83,9%	88,6%	88,3%	82,8%	91,6%	87,4%	81,8%	78,6%	69,40%		
DC-687	Rendimiento DQO salida Planta Garin	% eliminación del parámetro	%		82,1%	72,6%	94,6%		67,8%	80,0%	95,3%	83,4%	77,7%	78,1%	70,99%		
DC-690	Cumplimiento Norma DBO Efluente Planta Garin	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-691	Cumplimiento Norma MES Efluente Planta Garin	% de Muestras dentro de Norma	%	100,0%	94,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-692	Cumplimiento Norma DQO Efluente Planta Garin	% de Muestras dentro de Norma	%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%		
DC-694	Biosólidos Evacuados por Planta Garin - Mat Seca	Biosólidos evacuados mensualmente	(tonMS/mes)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	3,88	0,00		
DC-698	Biosólidos Evacuados Planta Garin	Biosólidos Evacuados mensualmente	ton/mes	0,0	49,68	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	117,92	24,00	0,00		
DC-707	Caudal Mensual Planta Garin	Volumen tratado en el mes	m3/mes	19484,0	44800,00	45169,00	42357,00	41685,00	35559,00	38679,00	41387,00	39633,00	44574,00	40834,00	43222,00		
DC-709	Caudal Medio Diario Planta Garin	Volumen diario tratado	m3/día	628,5	1600,00	1457,06	1411,90	1344,68	1185,30	1247,71	1335,06	1321,10	1437,87	1361,13	1394,26		
DC-711	Caudal Máximo Diario Planta Garin	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	1600,0	1600,00	1787,00	1519,00	1783,00	1421,00	1476,00	1400,00	1540,00	1589,00	1480,00	1501,00		
DC-719	DBO afluente Planta Garin	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	252,0	89,90	85,75	94,73	108,14	125,40	95,64	102,00	96,43	90,60	88,88	75,22		
DC-720	Materia en Suspensión afluente Planta Garin	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	299,3	80,74	76,19	92,33	128,50	115,72	97,90	94,33	77,60	87,72	72,00	66,07		
DC-723	DBO efluente Planta Garin	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	11,0	22,50	17,00	14,00	14,71	17,60	21,91	13,67	13,57	17,30	18,25	20,44		
DC-724	Materia en Suspensión efluente Planta Garin	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	12,8	20,53	17,50	14,94	13,83	13,66	16,55	8,00	9,47	16,00	15,21	19,87		
DC-728	DQO afluente Planta Garin	Medida del parámetro en el afluente	mg/l	312,00	162,00	168,00	312,00	13,83	180,00	180,00	404,00	189,00	165,40	190,00	178,80		
DC-729	DQO efluente Planta Garin	Medida del parámetro en el efluente	mg/l	24,00	29,00	46,00	17,00		58,00	36,00	19,00	31,50	38,00	42,00	51,80		

VOLUMENES DE LIQUIDOS CLOACALES
BOMBEADOS Y TRATADOS

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2110-INS-S-DP-01 (Ex 74)

ESTACIONES	Volúmenes Bombeados				Cota nivel aspiración sobre nivel 0 de OSN	
	Caudal bombeado	Caudal promedio diario	Día pico	Factor día pico	Cota promedio	Cota mínima
	m 3	m 3 (2)	m 3	m 3	m	m
Wilde	664.788.000	1.821.337	2.352.000	1,3	8,6	8,2
Estaciones De Bombeo Cloacal (1)	466.172.494	1.277.185	N/A	N/A	N/A	N/A
Boca-Barracas	67.153.801	345.975	530.400	1,5	7,8	6,4
TOTAL BOMBEADO	**1.198.114.295**	**3.444.497**				

PLANTAS DE TRATAMIENTO	Volúmenes Tratados			
	Caudal bombeado	Caudal promedio diario	Día pico	Factor día pico
	m 3	m 3 (2)	m 3	m 3
Sudoeste	57.491.547	157.511	262.146	1,7
Sudoeste 2	30.430.862	83.372	116.230	1,4
Norte	64.565.492	176.892	315.705	1,8
Barrio uno	532.853	1.460	2.375	1,6
Lanus	4.102.982	11.241	21.360	1,9
Ampliación El Jagüel	12.590.992	34.496	46.376	1,3
Hurlingham	5.581.073	15.291	46.128	3,0
Santa Catalina	551.262	1.510	9.031	6,0
Fiorito	5.052.186	13.842	97.572	7,0
Berazategui	430.694.969	1.220.099	1.309.176	1,1
TOTAL TRATADO	**611.594.218**	**1.715.713**		

Quilmes - Berazategui - Florencio Varela (*)	151.372.800	414.720

VOLUMEN TOTAL A CUERPO RECEPTOR (**)	**1.216.873.760**	**3.709.208**

(*) Valor estimado de 4,8 m3/seg.

(**) La sumatoria Incluye a partir del mes de junio la puesta en marcha de la Planta Dock Sud con un caudal promedio -de tiempo seco- estimado en 10,5 m³/s. Además, incluye las plantas de los Nuevos Partidos (Ferrari, Catonas, Bella Vista, Escobar y Garín).

Nota (1): Corresponde al total de la concesión, no siendo posible desdoblar caudales de EBC originales y ampliación.

Nota (2): El caudal promedio diario se calcula en base a los días de funcionamiento de cada Planta o Establecimiento.

VOLUMENES DE LIQUIDOS CLOACALES (AMBA)

BOMBEADOS Y TRATADOS

Período: 01 Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-DP-01 (Ex 74)

PLANTAS DE TRATAMIENTO	Volúmenes Tratados			
	Caudal bombeado	Caudal promedio diario	Día pico	Factor día pico
	m 3	m 3	m 3	m 3
Ferrari	5.216.361	14.291	26.265	1,8
Catonas	4.441.424	12.168	30.933	2,5
Bella Vista	13.038.987	35.723	50.473	1,4
Escobar	2.498.756	6.846	9.600	1,4
Garin	477.383	1.308	219.947	168,2
TOTAL TRATADO	**25.672.911**	**70.337**		

NOTA: El caudal promedio diario se calcula en base a los días de funcionamiento de cada Planta y Establecimiento

2.3 TRANSPORTE

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

SANEAMIENTO - TRANSPORTE

ERAS 2025

SIT-CL-TRANSP.-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
TC-01	Caudal Mensual Wilde	Volumen bombeado en el mes	m3/mes	65.251.000	62.883.000	70.633.000	68.496.000	70.477.000	58.675.000	56.290.000	42.779.000	43.197.000	43.627.000	42.554.000	39.926.000	Reduccion de bombeo por derivacion del caudal del CMI a Planta Dock sud (Etapa puesta en marcha Planta Dock sud)
TC-04	Caudal Medio Diario Wilde	Volumen diario bombeado	m3/día	2.104.871	2.245.821	2.278.484	2.283.200	2.273.452	1.955.833	1.815.806	1.379.968	1.439.900	1.407.323	1.418.467	1.287.935	Reduccion de bombeo por derivacion del caudal del CMI a Planta Dock sud (Etapa puesta en marcha Planta Dock sud)
TC-05	Caudal Máximo Diario Wilde	Máximo Volumen diario bombeado	m3/día	2.328.000	2.328.000	2.328.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.284.000	2.328.000	2.043.000	2.162.000	1.983.000	1.634.000	
TC-07	Caudal Mensual Boca Barracas	Volumen bombeado en el mes	m3/mes	14.016.800	10.884.700	10.666.000	11.345.600	10.617.600	7.169.701	775.500	0	1.120.800	293.600	183.900	79.600	Parada de bombeo en Establecimiento por pruebas del Colector Margen Izquierdo.
TC-10	Caudal Medio Diario Boca Barracas	Volumen diario bombeado	m3/día	452.155	388.739	344.065	378.187	342.503	377.353	110.786	0	140.100	58.720	91.950	39.800	Parada de bombeo en Establecimiento por pruebas del Colector Margen Izquierdo.
TC-11	Caudal Máximo Diario Boca Barracas	Máximo Volumen diario bombeado	m3/día	530.400	477.600	443.400	446.100	477.900	458.201	159.400	0	340.800	93.600	128.700	59.700	Parada de bombeo en Establecimiento por pruebas del Colector Margen Izquierdo.
TC-16	Caudal Mensual Total Pozos	Volumen bombeado en el mes	m3/mes	35.476.865	36.248.616	39.769.222	35.713.438	44.235.893	38.160.443	39.572.285	38.216.578	**38.675.218**	40.816.753	39.710.111	39.588.343	
TC-25	Caudal Mensual Bombeado	Volumen Mensual Bombeado por todos los establecimientos (TC01+TC07+TC16)	m3/mes	114.744.665	110.016.316	121.068.222	115.555.038	125.330.493	**104.005.144**	**96.637.785**	80.995.579	**82.993.018**	**84.737.353**	82.448.011	79.593.943	
TC-26	Caudal Mensual Volcado a Cuerpo Receptor (No incluye TC-131)	Volumen Mensual volcado a los cuerpos receptores (Wilde+PN+PSO+PEJ+B1+PH+PSC+PSO2+PEJ2+PLA)	m3/mes	78.368.788	76.054.573	85.839.967	82.710.432	87.067.310	100.943.200	98.943.121	85.393.003	85.182.258	86.827.631	84.424.948	83.020.632	A partir del mes de junio se inició la puesta en marcha de la Planta Dock Sud. En el presente indicador se incorpora un caudal promedio de 10,5 m³/s en tiempo seco, estimado para esta etapa de puesta en marcha. Desde la etapa de Puesta en Marcha y hasta la finalización del Período de Observación, la operación de la planta permanece bajo responsabilidad del Contratista.
TC-27	Caudal Mensual Tratado	Volumen Mensual Tratado por las plantas Depuradoras (No incluye Berazategui)	m3/mes	13.117.788	13.171.573	15.206.967	14.214.432	16.590.310	15.052.200	14.529.921	14.490.803	14.769.258	15.077.431	14.656.652	14.971.432	
TC-29	Cortes Programados AYSA en estaciones de Bombeo	Cantidad de Cortes Programados AYSA	N°	6	16	12	14	5	3	15	13	22	27	12	9	
TC-35	Cortes Emergencias AYSA en estaciones de Bombeo	Cantidad de Cortes Emergencias AYSA	N°	18	12	19	14	18	9	19	9	23	14	20	14	
TC-45	Total de Cortes de Servicio en Estaciones de Bombeo y Plantas Depuradoras	Total de Cortes de Servicio	Cortes	32	47	44	31	32	21	45	29	52	53	40	30	
TC-47	Total de Cortes de Servicio Programados AYSA en Estaciones de Bombeo y Plantas Depuradoras	Total de Cortes de Servicio Programados AYSA	Cortes	6	16	12	14	6	4	15	13	22	27	12	9	
TC-49	Total de Cortes de Servicio de Emergencia AYSA en Estaciones de Bombeo y Plantas Depuradoras	Total de Cortes de Servicio de Emergencia AYSA	Cortes	18	12	19	14	18	9	20	9	23	15	21	14	
TC-51	Total de Cortes de Servicio acción externa en Estaciones de Bombeo y Plantas Depuradoras	Total de Cortes de Servicio de por acción Externa	Cortes	7	18	13	3	7	8	10	7	7	10	7	6	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

SANEAMIENTO - TRANSPORTE

ERAS 2025

SIT-CL-TRANSP.-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
TC-90	Caudal Mensual Planta Norte	Volumen tratado en el mes	m3/mes	4.675.208	4.933.594	5.842.135	5.029.641	6.185.473	5.380.148	5.269.279	5.204.795	5.553.388	5.594.391	5.255.757	5.641.683	
TC-91	Caudal Medio Diario Planta Norte	Volumen diario tratado	m3/día	150.813	176.200	188.456	167.655	199.531	179.338	169.977	167.897	185.113	180.464	175.192	181.990	
TC-92	Caudal Máximo Diario Planta Norte	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	185.687	200.498	283.327	204.994	315.705	201.270	210.706	215.125	245.606	254.319	219.641	220.164	
TC-93	Caudal Mensual Planta Sudoeste	Volumen tratado en el mes	m3/mes	4.621.423	4.728.413	5.323.293	4.612.403	5.338.018	5.001.167	4.773.976	4.799.674	4.754.290	4.696.840	4.460.908	4.381.142	
TC-94	Caudal Medio Diario Planta Sudoeste	Volumen diario tratado	m3/día	149.078	168.872	171.719	153.747	172.194	166.706	153.999	154.828	158.476	151.511	148.697	141.327	
TC-95	Caudal Máximo Diario Planta Sudoeste	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	172.612	213.649	181.117	168.327	262.146	172.899	171.837	174.723	167.177	169.341	157.694	158.120	
TC-96	Caudal Mensual Planta Jagüel	Volumen tratado en el mes	m3/mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planta Jaguel Fuera de servicio
TC-97	Caudal Medio Diario Planta Jagüel	Volumen diario tratado	m3/día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TC-98	Caudal Máximo Diario Planta Jagüel	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TC-99	Caudal Mensual Planta Barrio Uno	Volumen tratado en el mes	m3/mes	46.075	37.145	43.890	41.895	47.500	33.725	43.510	49.210	48.640	49.440	45.980	45.843	
TC-100	Caudal Medio Diario Planta Barrio Uno	Volumen diario tratado	m3/día	1.486	1.327	1.416	1.397	1.532	1.124	1.404	1.587	1.621	1.595	1.533	1.479	
TC-101	Caudal Máximo Diario Planta Barrio Uno	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	1.615	1.615	1.615	1.615	1.805	2.375	1.710	1.710	1.710	1.805	1.805	1.710	
TC-102	Caudal Mensual Planta Hurlingham	Volumen tratado en el mes	m3/mes	528.671	478.283	485.992	532.741	407.097	513.217	528.654	424.800	359.851	354.385	490.732	476.650	
TC-103	Caudal Medio Diario Planta Hurlingham	Volumen diario tratado	m3/día	17.054	17.082	15.677	17.758	13.132	17.107	17.053	13.703	11.995	11.432	16.358	15.376	
TC-104	Caudal Máximo Diario Planta Hurlingham	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	46.128	19.082	20.646	21.916	17.665	19.097	20.039	17.595	14.401	18.182	19.491	18.014	
TC-105	Caudal Mensual Planta Santa Catalina	Volumen tratado en el mes	m3/mes	26.380	28.969	30.213	42.254	79.923	45.463	50.045	55.008	45.729	51.765	49.419	46.094	Red controlada por el municipio (Las maniobras de variacion de caudal no son manejadas por el sector.
TC-106	Caudal Medio Diario Planta Santa Catalina	Volumen diario tratado	m3/día	851	1.035	975	1.408	2.578	1.515	1.614	1.774	1.524	1.670	1.704	1.487	
TC-107	Caudal Máximo Diario Planta Santa Catalina	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	1.356	3.638	3.028	3.365	9.031	1.919	2.068	3.975	1.995	3.090	2.554	2.179	
TC-108	Caudal Mensual Planta Sudoeste 2	Volumen tratado en el mes	m3/mes	1.807.492	1.675.142	1.949.983	2.568.990	3.018.802	2.726.234	2.573.187	2.621.443	2.686.271	2.892.035	2.942.093	2.969.190	
TC-109	Caudal Medio Diario Planta Sudoeste 2	Volumen diario tratado	m3/día	58.306	59.827	62.903	85.633	97.381	90.874	83.006	84.563	89.542	93.291	98.070	95.780	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

SANEAMIENTO - TRANSPORTE

ERAS 2025

SIT-CL-TRANSP.-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
TC-110	Caudal Máximo Diario Planta Sudoeste 2	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	72.373	81.523	87.932	100.284	113.018	97.009	92.641	104.009	98.000	101.202	105.864	116.230	
TC-111	Caudal Mensual Berazategui	Volumen tratado en el mes	m3/mes	38.373.440	34.693.502	38.338.247	37.049.506	37.810.122	36.266.110	38.037.911	37.597.882	36.770.220	37.572.365	20.613.664	37.572.000	Trabajos de mantenimiento en el sistema de bombeo. Noviembre: Trabajos en los Tamices N°1, N°4, N°7 y N°8.
TC-114	Caudal Medio Diario Berazategui	Volumen diario tratado	m3/día	1.237.853	1.239.054	1.236.718	1.234.984	1.219.681	1.208.870	1.227.029	1.212.835	1.225.674	1.212.012	1.145.204	1.212.000	Noviembre: Trabajos en los Tamices N°1, N°4, N°7 y N°8.
TC-115	Caudal Máximo Diario Berazategui	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	1.251.262	1.309.176	1.257.498	1.257.498	1.240.272	1.245.767	1.257.498	1.256.316	1.254.731	1.240.272	1.240.272	0	
TC-128	Caudal Mensual El Jagüel II	Volumen tratado en el mes	m3/mes	1.149.136	986.320	1.169.919	1.054.059	1.109.475	1.038.626	979.598	976.968	952.352	1.076.984	1.036.071	1.061.484	
TC-129	Caudal Medio Diario El Jagüel II	Volumen diario tratado	m3/día	37.069	35.226	37.739	35.135	35.790	34.621	31.600	31.515	31.745	34.741	34.536	34.241	
TC-130	Caudal Máximo Diario El Jagüel II	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	41.952	41.912	44.864	38.296	46.376	37.674	36.312	34.717	34.640	42.064	35.560	38.728	
TC-131	Caudal Mensual - Pdos F.Varela, Quilmes y Berazategui	Volumen Vuelco Berazategui / F. Varela / Quilmes (Estimativo 4.80 m3/seg BASE = ENE-18)	m3/mes	12.856.320	11.612.160	12.856.320	12.441.600	12.856.320	12.441.600	12.856.320	12.856.320	12.441.600	12.856.320	12.441.600	12.856.320	
TC-132	Caudal Mensual Total Volcado a Cuerpo Receptor (TC-26 + TC-131)	Volumen Mensual volcado a los cuerpos receptores - Incluye Volumen Vuelco Berazategui / F. Varela / Quilmes (TC-26 + TC-131)	m3/mes	91.225.108	87.666.733	98.696.287	95.152.032	99.923.630	113.384.800	111.799.441	98.249.323	97.623.858	99.683.951	96.866.548	95.876.952	A partir del mes de junio se inició la puesta en marcha de la Planta Dock Sud. En el presente indicador se incorpora un caudal promedio de 10,5 m³/s en tiempo seco, estimado para esta etapa de puesta en marcha. Desde la etapa de Puesta en Marcha y hasta la finalización del Período de Observación, la operación de la planta permanece bajo responsabilidad del Contratista.
TC-133	Caudal Mensual Planta Lanus	Volumen tratado en el mes	m3/mes	263.403	303.707	361.542	332.449	404.022	313.620	311.672	358.905	368.737	361.591	373.988	349.346	
TC-134	Caudal Medio Diario Planta Lanus	Volumen diario tratado	m3/día	8.497	10.847	11.663	11.082	13.033	10.454	10.054	11.578	12.291	11.664	12.466	11.269	
TC-135	Caudal Máximo Diario Planta Lanus	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	12.405	14.501	15.504	14.311	21.360	13.324	14.555	19.473	17.654	18.001	16.067	15.088	

SISTEMA DE INDICADORES TÉCNICOS

SANEAMIENTO - TRANSPORTE

ERAS AÑO 2025 Nuevas Áreas

SIT-CL-TRANSP.NP-2025

CÓD N°	INDICADOR DE DESEMPEÑO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
TC-136	Caudal Mensual Planta Ferrari	Volumen tratado en el mes	m3/mes	396.837	371.932	422.594	397.524	463.757	425.391	435.811	449.937	447.923	475.873	479.232	449.550	
TC-137	Caudal Medio Diario Planta Ferrari	Volumen diario tratado	m3/día	12.801	13.283	13.632	13.251	14.960	14.180	14.058	14.514	14.931	15.351	15.974	14.502	
TC-138	Caudal Máximo Diario Planta Ferrari	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	15.050	16.710	16.997	15.572	18.883	21.208	20.883	21.425	21.374	26.265	24.037	18.885	
TC-139	Caudal Mensual Planta Catonas	Volumen tratado en el mes	m3/mes	321.304	314.249	345.170	374.718	387.912	339.819	352.079	401.827	401.610	419.885	404.128	378.722	
TC-140	Caudal Medio Diario Planta Catonas	Volumen diario tratado	m3/día	10.365	11.223	11.135	12.491	12.513	11.327	11.357	12.962	13.387	13.545	13.471	12.217	
TC-141	Caudal Máximo Diario Planta Catonas	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	13.318	16.010	14.641	14.553	15.674	13.219	13.439	30.933	30.494	28.949	25.593	16.461	
TC-142	Caudal Mensual Planta Bella Vista	Volumen tratado en el mes	m3/mes	1.061.943	981.206	1.095.964	1.095.965	1.146.517	1.077.117	1.069.057	1.138.401	1.147.197	1.180.089	1.136.259	909.272	
TC-143	Caudal Medio Diario Planta Bella vista	Volumen diario tratado	m3/día	34.256	35.043	35.354	36.532	36.984	35.904	34.486	36.723	38.240	38.067	37.875	29.331	
TC-144	Caudal Máximo Diario Planta Bella Vista	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	40.972	40.475	43.758	49.533	50.473	42.174	39.598	48.226	43.488	43.829	41.983	37.106	
TC-145	Caudal Mensual Planta Fiorito	Volumen tratado en el mes	m3/mes	317.822	405.711	469.121	379.757	621.829	378.344	383.292	447.596	403.414	442.642	408.570	394.088	
TC-146	Caudal Medio Diario Planta Fiorito	Volumen diario tratado	m3/día	10.252	14.490	15.133	12.659	20.059	12.611	12.364	14.439	13.447	14.279	13.619	12.713	
TC-147	Caudal Máximo Diario Planta Fiorito	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	26.046	34.749	31.920	16.650	97.572	17.059	18.596	40.537	21.647	30.556	25.001	17.741	
TC-148	Caudal Mensual Planta Escobar	Volumen tratado en el mes	m3/mes	183.719	178.509	208.505	138.644	208.020	189.720	212.434	204.255	208.955	249.081	246.202	270.713	
TC-149	Caudal Medio Diario Planta Escobar	Volumen diario tratado	m3/día	5.926	6.375	6.726	4.621	6.710	6.324	6.853	6.589	6.965	8.035	8.207	8.733	
TC-150	Caudal Máximo Diario Planta Escobar	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	7.650	7.990	8.160	6.715	8.610	7.140	7.140	7.565	9.600	8.760	8.760	8.760	
TC-151	Caudal Mensual Planta Garin	Volumen tratado en el mes	m3/mes	19.484	44.800	45.169	42.357	41.685	35.559	38.679	41.387	39.633	44.574	40.834	43.222	
TC-152	Caudal Medio Diario Planta Garin	Volumen diario tratado	m3/día	629	1.600	1.457	1.412	1.345	1.185	1.248	1.335	1.321	1.438	1.361	1.394	
TC-153	Caudal Máximo Diario Planta Garin	Máximo Volumen diario tratado	m3/día	1.600	1.600	1.787	1.519	1.783	1.421	1.476	1.400	1.540	1.589	1.480	1.501	

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALE

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.A (Ex 75-A)

Región: CENTRO

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Instaladas	Disponibles	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
CAPITAL FEDERAL										
ZC	15	LUGANO I - II	3	3	305	2460,0	642,7	3.239.000	3.950	268.878
ZC	16	LUGANO I - V	5	5	126,0	1575,0	862,4	4.346.685	13.799	237.690
ZC	17	CILDAÑEZ	3	2	132,0	2100,0	1304,6	6.575.100	9.393	377.250
ZC	18	SOLDATI	3	2	132,0	1086,0	296,1	1.492.526	4.123	173.097
ZC	19	LA QUEMA	2	2	18,0	358,0	106,5	537.000	3.000	28.382
ZC	20	FATIMA	2	2	22,5	520,0	158,1	1.385.180	6.208	54.213
ZC	21	PLANETARIO	2	2	6,2	130,0	6,8	59.435	1.427	2.842
ZC	22	PUERTO I	3	2	17,7	180,0	27,3	239.400	3.990	18.107
ZC	23	PUERTO II	3	2	270,0	3900,0	278,4	2.438.800	1.876	156.408
ZC	24	PUERTO III	3	2	17,7	180,0	13,8	120.780	2.013	9.975
ZC	28	AEROPARQUE	1	1	4,2	18,0	1,6	13.650	750	1.117
ZC	36	VILLA OLIMPICA	2	2	66,0	240,0	40,0	350.720	4.384	59.312
ZC	35	NEBA	2	2	66,0	1080,0	34,0	297.720	827	19.876
ZC	72	SAN BLAS	3	3	30,0	1152,0	131,5	1.152.000	2.000	26.720
PARTIDO LA MATANZA										
ZF	1	ALAS	2	2	27,0	434,0	131,8	1.154.657	5.321	55.328
ZF	2	MUNICIPAL	3	3	90,0	900,0	273,2	2.393.100	7.977	218.102

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALE

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.A (Ex 75-A)

Región: CENTRO

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Instaladas	Disponibles	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
ZF	3	SARMIENTO	3	3	40,5	651,0	412,6	3.614.786	16.658	178.969
ZF	4	SAN ALBERTO	3	3	90,0	900,0	298,1	2.611.500	8.705	209.619
ZF	5	EVITA	5	5	700,0	8500,0	1743,1	15.269.400	8.982	1.034.774
ZF	6	EL BAJO	5	5	700,0	8500,0	1350,5	11.830.300	6.959	843.582
ZF	7	ALGARROBO	2	2	37,0	152,0	36,4	319.012	2.392	42.515
ZF	8	VENEZUELA	2	2	74,0	602,0	52,0	455.588	1.580	51.639
ZF	9	LA CANDELA	2	2	15,0	400,0	114,4	1.002.110	5.830	35.290
ZF	10	LAFERRERE CENTR(	3	3	55,5	420,0	217,4	1.904.420	11.290	139.492
ZF	11	LOS CEDROS	3	3	90,0	1278,0	192,1	1.683.126	3.951	110.481
PARTIDO MORON										
ZT	10	PALOMAR	2	2	27,0	210,0	160,5	1.405.950	13.390	138.318
ZT	67	DERQUI	3	3	55,5	720,0	184,7	1.618.080	6.742	147.794
ZF	12	MORON	2	2	27,0	434,0	3,10	27.125	125	2.123
ZF	13	CASTELAR SUR	2	2	30,0	600,0	141,5	1.239.300	4.131	44.121
ZF	14	MERLO	2	2	60,0	280,0	13,1	114.380	817	27.961
ZF	15	TUYUTÍ	3	2	27,0	420,0	0,06	560	4	1.742
ZF	16	IBAÑEZ	3	2	27,0	420,0	0,26	2.240	16	8.606
PARTIDO SAN MARTIN										

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALE

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.A (Ex 75-A)

Región: CENTRO

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Instaladas	Disponibles	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
ZC	13	CHILAVERT	4	4	220,0	1100,0	589,8	5.166.975	18.789	628.145
ZC	25	CHILAVERT II	2	2	6,2	200,0	81,2	711.300	7.113	17.709
ZC	45	V. BALLESTER	2	2	60,0	200,0	64,5	565.300	5.653	159.669
ZC	64	TUPUNGATO	2	2	9,4	252,0	42,0	367.668	2.918	53.965
PARTIDO TRES DE FEBRERO										
ZT	7	CASEROS	2	2	11,8	200,0	72,76	637.400	6.374	27.556
ZT	8	DE LA VEGA	3	3	90,0	840,0	251,39	2.202.200	7.865	188.600
ZT	9	17 DE AGOSTO	2	1	5,9	300,0	108,68	952.050	6.347	20.230
ZT	11	LA CAUTIVA	3	2	44,0	570,0	150,96	1.322.400	6.960	92.699
ZT	12	JUAN XXIII	2	2	11,8	200,0	23,28	203.900	2.039	11.714
ZT	14	LOMA HERMOSA	2	2	27,0	190,0	62,24	545.205	5.739	57.529
ZT	26	CEDEM 1	2	1	2,0	200,0	16,53	144.770	1.489	1.973
ZT	27	CHURRUCA	2	2	6,2	200,0	71,87	629.600	6.296	15.689
ZT	30	LOMA HERMOSA II	3	3	750,0	2880,0	723,95	6.341.760	6606,0	665.187
ZT	46	SAN MARTIN A HURL	3	2	360,0	4800,0	1380,27	12.091.200	7557,0	1.177.151
PARTIDO HURLINGHAM										
ZT	29	WILLIAM MORRIS	4	3	220,0	4320,0	154,00	665.280	616	31.497
ZT	31	HURLINGHAM	4	4	60,0	920,0	372,04	3.259.100	14.170	217.709

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALE

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.A (Ex 75-A)

Región: CENTRO

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Instaladas	Disponibles	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
ZT	32	VILLA CLUB	2	2	11,8	150,0	29,96	262.425	3.499	17.154
ZT	33	HIPODROMO I	2	2	6,2	200,0	7,97	69.800	698	2.038
ZT	54	HIPODROMO II (PAV(	2	2	14,8	60,0	9,18	80.400	2.680	18.974
ZT	37	VILLA TESEI	3	3	90,0	2430,0	593,17	5.196.150	6.415	230.787
ZT	38	WILLIAM MORRIS II	4	4	560,0	9200,0	3179,83	27.855.300	12111,0	1.619.410
PARTIDO ITUZAINGO										
ZT	34	NUEVA ITUZAINGO	2	2	280,0	2690,0	238,9	2.092.820	1.556	85.122

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.B (Ex 75-B)

Región : NORTE

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada (kW)	Q Teórico m3/h	Q Mensual m3/h	Q Total Acumulado m3/año	Funcionamiento horas/año	Consumo kWh
			Instaladas	Disponibles						
PARTIDO VICENTE LOPEZ										
ZN	25	VICENTE LOPEZ	4	4	180,0	2840,0	1384,82	12.131.060	17.086	638.030
ZN	22	POCITOS	2	2	6,2	180,0	66,08	578.880	6.432	9.655
ZN	26	ENAMUR	2	2	6,2	110,0	14,98	131.230	2.386	6.297
ZN	23	CARAPACHAY	2	2	27,0	280,0	53,00	464.240	3.316	31.281
ZN	21	ROCA								
ZN	48	BARRIO YRIGOYEN	3	3	9,3	270,0	173,91	1.523.430	16.927	36.128
ZN	41	REGATAS	2	2	6,2	140,0	66,51	582.610	8.323	16.515
ZN	42	LOS CEIBOS	2	2	4,8	30,0	3,70	32.445	2.163	4.450
ZN	50	U-11	3	3	110,0	1050,0	182,43	1.598.100	4.566	137.163
PARTIDO SAN ISIDRO										
ZN	16	TOMKINSON	2	2	10,6	160,0	62,44	546.960	6.837	22.499
ZN	12	BAJO SAN ISIDRO	3	3	17,7	450,0	182,96	1.602.750	10.685	40.370
ZN	13	BARCO CENTENERA	2	2	11,8	230,0	157,15	1.376.665	11.971	45.459
ZN	15	LOS SAUCES	2	2	6,2	120,0	45,36	397.320	6.622	13.789
ZN	14	LOS ROSALES	2	2	5,1	160,0	116,21	1.017.980	12.715	11.638
ZN	17	SANTA RITA	2	2	6,2	120,0	47,21	413.580	6.893	14.925
ZN	20	BOULOGNE CHICO	2	1	6,2	110,0	27,20	238.260	4.332	11.218
ZN	18	BOULOGNE GRANDE	4	3	315,0	2920,0	550,42	4.821.650	6.605	440.002

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.B (Ex 75-B)

Región : NORTE

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada (kW)	Q Teórico m3/h	Q Mensual m3/h	Q Total Acumulado m3/año	Funcionamiento horas/año	Consumo kWh
			Instaladas	Disponibles						
ZN	19	MARTINEZ	2	2	210,0	860,0	146,43	1.282.690	2.983	210.346
ZN	24	BAJO BOULOGNE	2	1	44,0	1600,0	548,04	4.800.800	6.001	102.334
ZN	27	CAMINO REAL	2	2	11,8	340,0	26,76	234.430	1.379	6.888
ZN	33	TOMKINSON 2	2	2	18,0	170,0	28,64	250.920	2.952	24.501
ZN	34	SUCRE	2	2	2,6	100,0	18,91	165.650	3.313	5.419
ZN	35	BEIRÓ	2	2	18,0	260,0	79,07	692.640	5.328	28.112
ZN	43	BOULOGNE OESTE	2	2	27,0	320,0	24,02	210.400	1.315	9.020
PARTIDO SAN FERNANDO										
ZN	09	VACIADERO	2	2	27,0	240,0	150,00	1.314.000	10.950	138.694
ZN	10	QUIRNO COSTA	2	2	27,0	400,0	284,95	2.496.200	12.481	122.853
ZN	07	E.B.7	5	2	900,0	6000,0	1705,21	14.937.600	12.448	1.588.360
ZN	11	VIRREYES	2	2	11,8	200,0	97,93	857.900	8.579	27.945
ZN	08	E.B.8	3	3	210,0	3240,0	1824,66	15.984.000	14.800	1.495.881
ZN	28	BAJADA LANUSSE	2	2	14,8	180,0	118,25	1.035.900	11.510	57.084
ZN	30	COMPLEMENTO SAN FERN	2	2	27,0	160,0	261,77	2.293.120	14.332	136.646
ZN	29	PUNTA CHICA	2	2	14,8	320,0	35,06	307.120	3.839	21.975
ZN	31	DEL ARCA	2	1	11,8	84,0	18,11	158.634	3.777	21.763
ZN	32	TRES HORQUETAS	2	1	3,6	80,0	10,68	93.520	2.338	5.248

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALES

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

2121-INS-S-TR-01.B (Ex 75-B)

Región : NORTE

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada (kW)	Q Teórico m3/h	Q Mensual m3/h	Q Total Acumulado m3/año	Funcionamiento horas/año	Consumo kWh
			Instaladas	Disponibles						
ZN	36	BARRIO PERÓN	2	2	14,8	160,0	65,05	569.840	7.123	22.448
ZN	37	BARRIO SAN MARTÍN	1	1	13,5	145,0	20,24	177.335	1.223	28.464
PARTIDO TIGRE										
ZN	01	TIGRE I	2	2	27,0	180,0	107,18	938.880	10.432	96.211
ZN	02	TIGRE II	2	2	27,0	180,0	116,98	1.024.740	11.386	109.197
ZN	03	TIGRE III	2	2	27,0	180,0	149,14	1.306.440	14.516	143.063
ZN	04	TIGRE IV	2	2	27,0	210,0	178,56	1.564.185	14.897	169.599
ZN	06	TIGRE VI	2	1	27,0	520,0	220,23	1.929.200	7.420	105.614
ZN	05	TIGRE V	3	3	66,0	600,0	219,93	1.926.600	9.633	139.575
ZN	47	SARGENTO CABRAL	2	2	74,0	480,0	151,92	1.330.800	5.545	59.485
ZN	44	RECONQUISTA 1	2	2	27,0	300,0	34,11	298.800	1.992	20.061
ZN	45	RECONQUISTA 2	2	2	27,0	260,0	38,30	335.530	2.581	23.733
ZN	51	BENAVIDEZ	4	4	124,0	3400,0	887,55	7.774.950	9.147	249.624
ZN	52	LAS TUNAS	4	2	500,0	7688,0	672,26	5.889.008	3.064	339.932
ZN	53	ELEFANTE BLANCO	5	5	1075,0	6000,0	961,92	8.426.400	7.022	449.620
PARTIDO SAN MARTIN										
ZN	54	VILLA HIDALGO	3	3	66,0	600,0	49,3	432.200	2.161	47.188

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOA

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 202

2121-INS-S-TR-01.C (Ex 75-C)

Región : SUR

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Instaladas	Disponibles	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
PARTIDO AVELLANEDA										
ZS	01	ISLA MACIEL	2	2	27,0	400,0	126,4	728.200	3.641	38.919
ZS	02	DOCK SUD	2	2	27,0	500,0	267,6	2.344.000	9.376	121.127
ZS	03	DOCK SUD II	2	2	27,0	400,0	107,2	939.400	4.697	48.750
ZS	07	ARGAÑARAZ	2	2	27,0	340,0	131,1	1.148.860	6.758	64.211
ZS	08	ROCA	2	2	27,0	450,0	135,1	1.183.725	5.261	64.458
ZS	09	WILDE	2	2	27,0	380,0	58,7	513.950	2.705	34.129
ZS	11	TRES SARGENTOS	1	1	1,8	20,0	3,4	29.800	1.194	2.665
ZS	12	WILDE ESTE	2	2	27,0	360,0	128,3	1.124.100	6.245	73.871
ZS	33	DEFENSA	2	2	27,0	220,0	32,8	287.155	2.432	26.895
ZS	34	SANTO DOMINGO	2	2	6,2	130,0	13,8	121.030	1.862	5.312
ZS	36	LAS FLORES	2	2	11,8	230,0	74,9	656.420	5.708	30.545
ZS	83	VILLA DOMINICO	3	3	40,5	450,0	163,5	1.432.500	9550	100.632
ZS	90	RAMAL AVELLANEDA	5	4	1550,0	17250,0	2467,4	21.614.250	6.265	432.000
ZS	93	GENERAL PINTO	2	2	180,0	468,0	19,5	170.586	729	31.120
ZS	96	AVELLANEDA OESTE	3	3	90,0	165,0	14,8	129.800	2.360	71.400
ZS	99	SARMIENTO	2	2	18,0	420,0	0	0	0	2.557

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOA

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 202

2121-INS-S-TR-01.C (Ex 75-C)

Región : SUR

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Instaladas	Disponibles	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
PARTIDO EZEIZA										
ZG	12	SPEGAZZINI	2	2	74,0	300,0	80,8	707.400	4.716	96.680
ZG	27	5 ESQUINAS	2	2	37,0	156,0	33,32	291.876	3.742	38.161
PARTIDO LANUS										
ZG	1	VILLA DIAMANTE	2	2	9,4	240,0	96,92	849.000	7.075	23.202
ZG	2	FRAY LAGOS	2	2	200,0	2400,0	623,42	5.461.200	4.551	327.360
ZG	3	ITAPIRU	2	2	4,0	170,0	76,32	668.525	7.865	11.219
ZG	4	PIÑEYRO	2	2	11,8	250,0	72,15	632.000	5.056	20.724
ZG	6	LAS COLONIAS	2	2	14,8	180,0	25,17	220.500	2.450	14.588
ZS	82	MONTE CHINGOLO	2	2	37,0	300,0	23,25	203.700	1.358	24.607
ZS	95	VILLA GONNET	2	2	14,8	134,0	19,34	169.443	2.529	13768
PARTIDO LOMAS DE ZAMORA										
ZS	41	LOMAS ESTE	3	2	45,0	900,0	206,95	1.812.900	6.043	91.559
ZV	80	PASCO ESTE	2	2	37,0	420,0	82,49	722.610	3.441	66400
ZG	7	LAVALLOL	3	3	154,0	1320,0	466,72	4.088.480	9.292	350340
ZG	8	OBRANOR	2	2	60,0	200,0	95,24	834.300	8.343	178520
ZG	15	ALMAFUERTE	2	2	11,8	300,0	57,19	501.000	3.340	19.935

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOA

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 202

2121-INS-S-TR-01.C (Ex 75-C)

Región : SUR

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Instaladas	Disponibles	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
ZG	20	TURDERA II	2	2	13,0	220,0	94,79	830.390	7.549	40173
ZG	23	MANZANA 70	2	2	8,4	80,0	3,73	32.640	816	3710
ZG	28	MAGDALENA	4	4	1000,0	6048,0	2100,75	18.402.552	12.171	1.105.500
PARTIDO ALTE. BROWN										
ZG	9	ALTE BROWN	3	3	40,5	210,0	104,95	919.380	13.134	129.804
ZG	14	SAN JAVIER	2	2	27,0	430,0	41,77	365.930	1.702	19.717
ZG	22	ADROGUE SUR II	2	2	11,8	148,0	7,68	67.266	909	6.045
ZG	24	RAFAEL CALZADA II	3	2	27,0	606,0	136,53	1.196.042	5.921	42.209
ZG	25	BALCARCE SUR	3	2	465,0	990,0	189,52	1.660.230	5.031	204.200
PARTIDO E. ECHEVERRIA										
ZG	10	COCA COLA	3	2	17,7	375,0	58,11	509.000	4.072	12.126
ZG	11	LA UNIÓN	2	2	74,0	200,0	98,86	866.000	8.660	87.440
ZG	13	LUIS GUILLÓN	3	3	315,0	3300,0	1230,34	10.777.800	9.798	332.100
ZG	16	ALTOS 2	3	3	111,0	1350,0	108,13	947.250	2.105	76.560
ZG	21	CONSTANZO	3	3	10,5	264,0	295,94	2.592.400	6.481	105.120
ZG	31	MONTECARLO	2	2	9,0	82,0	7,89	69.126	1.686	6.956
ZG	32	ADROGUE SUR I	3	3	90,0	1200,0	9,59	84.040	955	5.415
PARTIDO QUILMES										

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 202

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.C (Ex 75-C)

Región : SUR

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Instaladas	Disponibles	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
ZS	13	ALBERDI	3	3	90,0	1140,0	806,16	7.061.920	18.584	523.840
ZS	15	DON BOSCO NORTE	3	3	20,8	60,0	29,45	257.940	7.479	32.851
ZS	16	DON BOSCO SUR	2	2	11,8	230,0	50,25	440.220	3.828	22.641
ZS	17	FALUCHO	4	4	560,0	4496,0	2580,74	22.607.280	18.470	1.983.600
ZS	23	VILLA ALCIRA	3	3	40,5	225,0	106,25	930.775	10.885	93.024
ZS	24	VILLA CRAMER	2	2	11,8	140,0	31,08	272.230	3.889	19.305
ZS	28	FALUCHO ESTE	2	2	12,1	150,0	65,82	576.600	7.688	39.290
ZS	37	ESTE AVELLANEDA	4	4	1240,0	10000,0	3896,12	34.130.000	13.652	1.748.880
ZV	14	CALCHAQUI	3	3	40,5	651,0	350,25	3.068.163	14.139	146.727
ZV	18	FERROVIARIO	2	2	18,0	434,0	305,39	2.675.176	12.328	133.744
ZV	19	LOS ALAMOS	2	2	11,8	230,0	14,52	127.190	1.106	5.228
ZV	20	NAVAL	2	2	6,2	140,0	21,95	192.290	2.747	5.657
ZV	21	SOCORRO	3	3	40,5	651,0	190,10	1.665.258	7.674	85.594
ZV	22	SOLANO LA FLORIDA	7	4	735,0	4130,0	1216,64	10.657.760	18.064	1.527.120
ZV	25	EZPELETA	2	2	6,2	140,0	20,02	175.350	2.505	5.946
ZV	64	QUILMES NORTE	3	3	66,0	882,0	466,57	4.087.188	13.902	240.800
ZV	65	RAMAL QUILMES SUR	4	4	300,0	4400,0	959,86	8.408.400	7.644	437.550

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOA

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 202

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.C (Ex 75-C)

Región : SUR

Estación Bombeo			N° de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Instaladas	Disponibles	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
ZV	87	LAS PIEDRAS	3	3	40,5	690,0	23,03	201.710	877	13.720
ZV	91	RIO ATUEL	2	2	18,0	258,0	10,66	93.396	724	8.120

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.NA(Ex 75)

Región : (AMBA)

Estación Bombeo			Nº de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Totales	Dispon.	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
PARTIDO DE ESCOBAR										
ZN	55	ING. MASCHWITZ	3	3	40,5	690,0	78,8	690.230	3.001	50.322
ZN	49	FLENI	2	1	14,8	110,0	12,9	112.750	2.050	10.878
BELLA VISTA										
ZO	19	LEBENSOHN	3	3	19,5	450,0	30,5	267.450	1.783	13.360
ZO	21	BARRUFALDI	3	3	45,0	216,0	4,8	41.760	580	11.892
ZO	22	LOS BERROS	4	4	300,0	2016,0	241,2	2.113.200	3.522	111.988
LIBERTAD										
ZO	4	GOLF	3	3	17,7	495,0	9,0	79.200	480	6.224
MARIANO ACOSTA										
ZO	13	COLOMBRES	2	2	2,2	40,0	1,8	15.680	784	1.071
ZO	14	DOLORES	2	2	4,0	120,0	14,8	129.480	2.158	3.538
MERLO										
ZO	3	ARGENTINA	4	3	220,0	2284,0	408,5	3.578.457	6.267	330.467
ZO	7	CIPOLLETTI	3	3	45,0	840,0	78,1	683.760	2.442	51.722
ZO	8	VIEDMA	4	3	60,0	1240,0	126,1	1.104.840	3.564	51.410
ZO	9	25 DE MAYO	2	2	2,4	30,0	2,0	17.490	1.166	2.125
ZO	10	CORCOBA	2	2	4,0	90,0	17,3	151.740	3.372	7.054
ZO	11	BRISTOL	2	2	4,0	140,0	27,4	240.240	3.432	5.154
ZO	12	VELLOSO	2	2	4,0	120,0	7,5	66.120	1.102	1.624
MORENO										
ZO	1	MENDELSON	3	3	17,7	495,0	81,4	713.220	3.968	29.350
ZO	2	BARKER	3	3	111,0	1245,0	53,1	465.215	1.121	24.544
ITUZAIGO										
ZO	5	9 de SEPTIEMBRE	2	2	11,8	150,0	48,4	423.825	5.651	24.492
ZO	6	AERONAUTICO	2	2	30,0	300,0	44,3	388.500	2.590	39.106
ZO	15	RESTO 11	3	3	22,5	1923,0	201,8	1.767.878	2.758	34.765
ZO	20	EL PILAR	2	2	40,5	440,0	100,0	876.160	4.105	34.885
SAN MIGUEL										
ZO	16	REPETTO	2	2	27,0	290,0	41,8	365.980	2.524	22.889
ZO	17	GABOTO	2	2	14,8	136,0	4,6	40.732	599	4.706
ZO	18	ROSA MISTICA	3	3	40,5	459,0	7,1	61.965	405	8.279

ESTACIONES DE BOMBEO DE LIQUIDOS CLOACALES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2121-INS-S-TR-01.NA(Ex 75)

Región : (AMBA)

Estación Bombeo			Nº de Bombas		Potencia Instalada	Q Teórico	Q Mensual	Q Total Acumulado	Funcionamiento	Consumo
			Totales	Dispon.	(kW)	m3/h	m3/h	m3/año	horas/año	kWh
PTE. PERON										
ZG	17	SANTA ELENA	2	2	6,2	200,0	62,2	544.800	5.448	15.160
ZG	18	RUCCI	2	2	60,0	500,0	471,6	4.131.000	16.524	416.800
ZG	19	LA YAYA	2	2	2,6	120,0	56,2	491.940	8.199	23.902
ZG	26	AMERICA UNIDA	2	2	44,0	440,0	104,6	915.860	4.163	25.678
ZG	29	PARQUE AMERICANO	2	2	11,8	136,0	3,3	28.628	421	2.733
FLORENCIO VARELA										
ZV	62	SAN JORGE	3	3	33,0	120,0	12,2	17.600	440	4.456
ZV	71	RIVADAVIA	1	1	2,0	76,0	43,5	381.326	5.044	9.254
ZV	73	PLANIFICADO	3	2	90,0	900,0	150,7	1.320.000	4.400	85.080
ZV	74	EL MOLINO	2	2	9,0	180,0	43,5	380.870	3.542	12.033
ZV	75	VILLEGAS	2	1	11,8	230,0	46,7	409.170	3.558	16.926
ZV	76	HERNANDARIAS	2	2	11,8	230,0	36,6	320.505	2.787	12.909
ZV	77	DEFENSA Y JUSTICIA	3	2	66,0	1140,0	439,6	3.850.920	10.134	217.680
ZV	78	SENZABELLO	3	2	122,0	930,0	332,4	2.911.715	8.940	399.800
ZV	79	MONTEVERDE	3	2	114,0	540,0	89,3	782.460	4.347	141.600

2.4 INFORMACIÓN GENERAL

aysa

TRAMITES - CLOACAS

SOLICITUDES DE CONEXION, RECONEXION Y DESCONEXION

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

INS-S-CON-00 (Ex Nº 43)

REGIONES (Partidos / Distritos)	Conexión de CLOACA						Reconexión de CLOACA						Desconexión de CLOACA					
	Pedidos Ingresados	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >30 días	Pedidos Ingresados	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >10 días	Pedidos	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >10 días
Caballito	100	4	96	4	10,80	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro-Constitución	54	0	54	4	13,00	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belgrano	241	7	237	8	7,39	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Devoto	72	5	61	8	9,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flores	82	9	72	4	17,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL FEDERAL	**549**	**25**	**520**	**28**	**10**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
San Fernando-Tigre	273	12	260	139	10	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Isidro	242	9	225	161	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Martín	173	13	159	77	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vicente López	81	4	80	59	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORTE	**769**	**38**	**724**	**436**	**11**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
La Matanza	137	4	131	5	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Morón-Hurlingham-Ituzaingó	231	7	230	6	9	21	2	1	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Tres de Febrero	112	8	101	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OESTE	**480**	**19**	**462**	**15**	**14**	**23**	**2**	**1**	**1**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pdo. A. Browm	50	3	42	5	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pdo. E. Echeverría	65	3	64	2	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pdo. Ezeiza	31	2	29	2	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Brown-E. Echeverría	146	8	135	9	38,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lomas de Zamora	81	6	71	9	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUDOESTE	**227**	**14**	**206**	**18**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avellaneda	95	7	91	1	9,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanús	58	5	52	1	7,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quilmes	109	7	104	3	13,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUDESTE	**262**	**19**	**247**	**5**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GRANDES CLIENTES	**54**	**3**	**47**	**4**	**17**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL CONCESION	**2.341**	**118**	**2.206**	**506**	**13**	**129**	**2**	**1**	**1**	**0**	**-**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**-**	**0**

TRAMITES - CLOACAS

SOLICITUDES DE CONEXION, RECONEXION Y DESCONEXION - NUEVAS ÁREAS

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

2130-INS-S-CON-00 (Ex Nº 43) - NA

REGIONES (Partidos / Distritos)	Conexión de CLOACA						Reconexión de CLOACA						Desconexión de CLOACA					
	Pedidos Ingresados	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >30 días	Pedidos Ingresados	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >10 días	Pedidos	Anulados	Resueltos	Pendientes	Plazo Medio (días)	Nº Interv. >10 días
SMi/JCP/MA	150	10	147	70	9,54	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escobar	52	1	49	27	11,31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pilar	52	0	53	28	8,36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORTE	**254**	**11**	**249**	**125**	**9,6**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Merlo	36	1	35	1	9,1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
Moreno	67	4	59	6	12,1	13	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
OESTE	**103**	**5**	**94**	**7**	**11,0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Presidente Perón	10	0	12	0	12,8	1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
SUDOESTE	**10**	**0**	**12**	**0**	**12,8**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**
Florencio Varela	39	2	36	2	8,75	0												
SUDESTE	**39**	**2**	**36**	**2**	**8,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**
TOTAL NUEVAS ÁREAS	**406**	**18**	**391**	**134**	**10,0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

aysa	**SANEAMIENTO** **MANTENIMIENTO DE DESAGÜES ALTERNATIVOS (MDA)** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2140-INS-S-IG-MDA-00 (Ex Nº 45)**

REGION	Solicitud de MDA			Observaciones
	Cantidad de solicitudes	Autorizadas	En trámite	
CAPITAL FEDERAL	0	0	0	
NORTE	0	0	0	
OESTE	0	0	0	
SUDESTE	0	0	0	
SUDOESTE	0	0	0	
TOTAL	**0**	**0**	**0**	

aysa	**SANEAMIENTO** **MANTENIMIENTO DE DESAGÜES ALTERNATIVOS (MDA) En Nuevos Partidos** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2140-INS-S-IG-MDA-00 (Ex Nº 45) - Nuevas Áreas**

REGION	Solicitud de MDA			Observaciones
	Cantidad de solicitudes	Autorizadas	En trámite	
NORTE	0	0	0	
OESTE	0	0	0	
SUDESTE	0	0	0	
SUDOESTE	0	0	0	
TOTAL	**0**	**0**	**0**	

INSTALACIONES DE DESBORDE CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL

Correspondencia de los desbordes con los puntos de muestreo

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Planilla INS-S-DBC-00 (Ex Nº 49-50-51)

DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO Y EN RED

Código	Estación de Bombeo // Cloaca Máxima	Ubicación del desborde		Punto de Muestreo	Observaciones
		Dirección	Distrito	Código	
DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO					
	EBC ZC 06 Morón	Gral. Juan José Valle 1708 (y vías del Ferrocarril)	Morón		
	EBC ZC 07 Caseros	Quintana y Bonifacini	Tres de Febrero		
ETF01	EBC ZC 08 De La Vega	A. De La Vega 685	Tres de Febrero	FLO2230	
	EBC ZC 09 17 de Agosto	Av. Campo de Mayo 6900 y 17 de Agosto	Tres de Febrero	FLO2230	
ETF02/03	EBC ZC 11 La Cautiva	La Cautiva y Juan XXIII	Tres de Febrero	FLO2230	
	EBC ZC 12 Juan XXIII	AV. Campo de Mayo y Juan XXIII	Tres de Febrero	FLO2230	
ESM01	EBC ZC 13 Chilavert	Esmeralda y Rawson	San Martín	DEV2310	
	EBC ZC 14 Loma Hermosa	Av. Gral. Lavalle y A. Magaldi	Tres de Febrero	FLO2230	
	EBC ZC 16 LUGANO I - V	Av. Cnel. Roca 5355	Villa Lugano	C. Aut. de Bs. As.	Nuevo por obra de margen izq.
EFL35	EBC ZC 17 Cildañez	Lasalle y Eva Perón	Flores	FLO2240	
	EBC ZC 19 La Quema	Av. Amancio Alcorta 2925	C.A.B.A.		
EFL56	EBC ZC 20 Fátima	Av Riestra entre Mariano Acosta y Martinez Castro	Flores	CON0310	
	EBC ZC 25 Chilavert II	Esmeralda 6681esq. Rawson	San Martín		
	EBC ZC 29 W,Morris	Fernandez de Enciso 2139 Esq. Cañuelas	Hurlingham		
	EBC ZC 30 Loma Hermosa Ii	Churruca Y Río III	Hurlingham		
	EBC ZC 31 Hurlingham	Av. Marquez y Av. Roca	Hurlingham		
	EBC ZC 32 Villa Club	Paso Morales 100 entre Achupallas y Combate de Pavon	Hurlingham		
	EBC ZC 33 Hipodromo	Combate de Pavon 1499 Esq. Congreso de Tucuman	Hurlingham		
	EBC ZC-72 SAN BLAS	Iguazú & Pedro de Luján	C.A.B.A.		
	EBC ZN 01 Tigre	Paseo Victorica y Patagones	Tigre		
	EBC ZN 02 Tigre	Moreno y Quintana	Tigre		
	EBC ZN 03 Tigre	J. M. Estrada 287 y Sgto. Díaz	Tigre		
	EBC ZN 04 Tigre	Montes de Oca 400 (esq. Italia)	Tigre		
ESI09	EBC ZN 07 E.B. 7	Udaondo y Cayena	San Isidro	SFE6010	
	EBC ZN 08 E.B. 8	Pocitos y Av. Ascurraín	San Fernando	SFE3110	
	EBC ZN 10 Quirno Costa	Quirno Costa 835	San Fernando	SFE3110	
ESI08	EBC ZN 12 Bajo San Isidro	España y De La Ribera(ex Mitre)	San Isidro	SAA0390	En BR con VE cerrada antes de la cámara.
ESI06	EBC ZN 15 Los Sauces	Los Sauces y De La Ribera(ex El Fomentista)	San Isidro	SAA0390	En BR antes de la cámara
	EBC ZN 18 Boulogne Grande	Bomberos Voluntarios y Gorriti	San Isidro	SAA0390	
	EBC ZN 19 Martinez	Dardo Rocha y Fleming	San Isidro	SAA0390	
	EBC ZN 21 Roca	Gral. Roca y Bartolomé Cruz	Vicente Lopez	SAA0390	**EBC DESAFECTADA**
EVL09	EBC ZN 22 Pocitos	Blas Parera y Lavalle	Vicente Lopez	SAA0390	En BR antes de la cámara
	EBC ZN 23 Carapachay	Paraná y Gobernador Castro	Vicente Lopez	SAA0390	

INSTALACIONES DE DESBORDE CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL

Correspondencia de los desbordes con los puntos de muestreo

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Planilla INS-S-DBC-00 (Ex Nº 49-50-51)

DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO Y EN RED

Código	Estación de Bombeo // Cloaca Máxima	Ubicación del desborde		Punto de Muestreo	Observaciones
		Dirección	Distrito	Código	
	EBC ZN 30 Complemento San Fernando	Fournier y Miguel Cané	San Fernando	SFE3110	
	EBC ZS 04 Villa Diamante	Yatay y 25 de Mayo	Lanús	AVE6550	
	EBC ZS 05 Lavallol	Antártida Argentina 1230	Lomas de Zamora	LOM6310	
	EBC ZS 10 Alte. Brown	Canale y Py Margall	Almirante Brown	LAN2390	
	EBC ZS 17 Falucho	Misiones y calle 165	Quilmes		
	EBC ZS 18 Ferroviario	Cte. Carbonari y Arroyo Gimenez	Quilmes		
	EBC ZS 22 Solano La Florida	Calle 835 y Calle 887	Quilmes		
	EBC ZS 28 Falucho Este	Victorica 1700 y Bermejo	Quilmes	QUI6410	
	EBC ZS 31 Barrio Coca Cola	Los Camalotes Y Cabo San José (Arroyo Ortega)	E. Echeverria		
	EBC ZS 33 Defensa	Defensa y Quiroga	Avellaneda		
	EBC ZS 37 Este Avellaneda	C. Larralde y Cnel Lynch	Avellaneda		
	EBC ZS 38 La Union	Ruta 205 y Matienzo	Tristan Suarez		Posee. Arroyo lindero a las EBC
	EBC ZS 42 Magdalena	Presbitero Jose Malabia & Gral. Levalle	Remedios de Escalada		Posee. Frente a la EBC en mitad de la calle. Caño DN 800
	EBC ZS 43 Luis Guillon	Sardi esq.Alfredo Fox	Luis Guillon		Posee. Sardi y Dora Catalinas Fleitas aprox. Arroyo entubado
	EBC ZS 84 Constanzo	Presbiterio Orencio Antonio Mainer y Chimondegui.	Monte Grande		Posee. Arroyo lindero a las EBC
	EBC ZS 90 Ramal Avellaneda	Centenario Uruguayo e/Carabelas y Cangallo	Avellaneda		Nuevo
	EBC ZF 01 Alas	El Quebracho y el Guaira	La Matanza		a 300 mts. De la EBC, sobre calle El Quebracho
	EBC ZF-02 Municipal	Av. Cristianía y calle 600	La Matanza	MAS2575	
	EBC ZF-03 Sarmiento	Pablo VI n° 1000 & cura brochero	La Matanza		Posee con VE antes de la camara aprox. Arroyo
	EBC ZF-04 San Alberto	Av. Cristianía 4932 e/Danubio y Asamblea	Isidro Casanova	La Matanza	Posee
	EBC ZF-06 El Bajo	Av. Rojo (Rta Prov. N° 21) 651,entre Marconi y Ant.Argent.	Laferrere	La Matanza	Posee
	EBC ZF 10 Laferrere Centro	Ventura Bosh 2149 e/Victor Hugo	La Matanza		a 300 mts. De la EBC, sobre calle Ezeiza Arroyo

DESBORDES DE SEGURIDAD EN RED

DCO01	2da. Cloaca Máxima	Diógenes Taborda y Riachuelo	Constitución	CON0260	
ECO34	3er. Cloaca Máxima	Av. Riestra y A. De Vedia	Constitución	CON0310	
ECO35	Intermedia 1-3	Av. Chiclana y Av. La Plata	Constitución	CON0310	
ECO36	Intermedia 1-3	Av. Chiclana y Av. Caseros	Constitución	CON0310	
ECO37	Intermedia 1-3	Iriarte y G. Díaz	Constitución	CON0260	
ECE04	Costanero	Av. Córdoba y Alem	Centro	CON6310	
DSA02	Costanero-Ribereño	Arcos y Jaramillo	Saavedra	SAA0009	
DSA03	Costanero	O'Higgins y Manzanares	Saavedra	SAA0009	
ESA32	3er. Cloaca Máxima	Av. Del Tejar y Galván	Saavedra	SAA0390	
ESF06	Ribereño	Uruguay y J. D. Perón	San Fernando	SFE0010	

INSTALACIONES DE DESBORDE CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL

Correspondencia de los desbordes con los puntos de muestreo

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Planilla INS-S-DBC-00 (Ex Nº 49-50-51)

DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO Y EN RED

Código	Estación de Bombeo // Cloaca Máxima	Ubicación del desborde		Punto de Muestreo	Observaciones
		Dirección	Distrito	Código	
DSF01	Ribereño	Quintana y J.D. Perón	San Fernando	SFE0010	
2°-TE-01	2da. Cloaca Máxima	Sáenz y Achala	Constitución	CAB0280	
2°-TE-02	2da. Cloaca Máxima	Almafuerte y Achala	Constitución	CAB0280	
1°-SD-01	1er. Cloaca Máxima	Av. Mitre y Chascomús	Avellaneda	AVE0190	
1°-SI-01	1er. Cloaca Máxima	Av. Mitre y Nicaragua	Avellaneda	AVE0190	
2°-SD-02	2da. Cloaca Máxima	Av. Mitre y Boulevard de Los Italianos	Avellaneda	AVE0290	

aysa	**INSTALACIONES DE DESBORDE CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL EN NUEVAS ÁREAS** **Correspondencia de los desbordes con los puntos de muestreo** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2150-INS-S-DBC-00 (Ex Nº 49-50-51) - Nuevas Áreas**

DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO Y EN RED -AREAS NUEVAS

Código	Estación de Bombeo // Cloaca Máxima	Ubicación del desborde		Punto de Muestreo	Observaciones
		Dirección	Distrito	Código	
DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO					
	EBC ZS 73 Planificado	435-El Malambo	Florencio Varela		
	EBC ZS 77 Defensa y Justicia	Ruta Prov 36 N°4403 e/ Santa Isabel y Av. Bosques	Florencio Varela		
	EBC ZP 01 Agustoni	Interseccion de Calle Chile y San Salvador	Pilar		
	EBC ZP 31 La Montura	Av. Patricias Argentinas 4350	Pilar		
	EBC ZP 26 Highland	Colombia 5180	Pilar		
	EBC ZP 17 Mapuche	Presidente Derqui	Pilar		Arroyo al lado de EBC
	EBC ZP 37 Ayres Nexo Pinazo	Barrio Cerrado	Pilar		Arroyo al lado de EBC
	EBC ZP 16 Los Fresnos	Presidente Derqui	Pilar		Arroyo al lado de EBC
	EBC ZP 22 Pilarica	Posadas	Pilar		Arroyo al lado de EBC
	EBC ZP 20 Las Condes	Las Madreselvas	Pilar		Arroyo al lado de EBC
	EBC-ZO-01 Mendelson	Felix Mendelson y el Jilguero	Moreno		
	EBC-ZO-07 Cipoletti	Calle Cipolleti n°899	Merlo		Arroyo al lado de EBC
	EBC-ZO-08 Viedma	Figueroa alcorta n° 7300	Merlo		Arroyo al lado de EBC
	EBC-ZO-09 25 de mayo	Ameguino n° 901 esq- 25 de mayo	Merlo		
	EBC-ZO-03 Argentina	av. Argentina y castelle	Merlo		
	EBC-ZO-10 Corcova	Corcova 998	Merlo		Arroyo al lado de EBC
	EBC-ZO-11 Bristol	Bristol 5099	Merlo		
	EBC-ZO-14 Dolores	Cassaux y dolores	Merlo		Arroyo al lado de EBC
	EBC-ZO-17 Gaboto	Gaboto esq- Giambiaggi	San Miguel		
	EBC-ZO-22 Los Berros	Gaspar Campos	San Miguel		
DESBORDES DE SEGURIDAD EN RED					

aysa	**INSTALACIONES DE DESBORDE CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL EN NUEVAS ÁREAS** **Correspondencia de los desbordes con los puntos de muestreo** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2150-INS-S-DBC-00 (Ex Nº 49-50-51) - Nuevas Áreas**

DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO Y EN RED -AREAS NUEVAS

Código	Estación de Bombeo // Cloaca Máxima	Ubicación del desborde		Punto de Muestreo	Observaciones
		Dirección	Distrito	Código	

aysa	**INSTALACIONES DE DESBORDE** **CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL** **Informe al 31 de Diciembre de 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2151-INS-S-DBC-01-A (Ex INS Nº 46-47-48)**

PLAN AYSA DE ELIMINACION DE DESBORDES

REGION CAPITAL FEDERAL

CODIGO	DISTRITO	UBICACION	ESTADO		OBRAS ASOCIADAS			
		Dirección	Abierto	En condiciones eventuales de funcionar al 31/12/25	SI	NO	%AVANCE	OBSERVACIONES
ECO 03	Centro-Constitución	Crespo y Tabaré		cerrado	x		RC002 46% RC004 12% RC005 46%	Interconexiones cerradas/obturadas por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. según inspección de Junio 2012.Genera sobrecargas de la red y desbordes en la vía publica. Condicionado a los niveles de sobrecarga de la 3ra Cloaca Máxima, está asociado a la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo integrado por el Colector Margen Izquierdo (RC002), Planta Riachuelo (RC004) y Emisario Capital (RC005)
		A. Luppi y Erezcano		cerrado	x			
		M. del Buen Ayre y Río Cuarto		cerrado	x			
TOTAL REGION					**3**			

aysa	**INSTALACIONES DE DESBORDE** **CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL** **Informe al 31 de Diciembre de 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2151-INS-S-DBC-01-A (Ex INS Nº 46-47-48)**

PLAN AYSA DE ELIMINACION DE DESBORDES

REGION NORTE

CODIGO	DISTRITO	UBICACION	ESTADO		OBRAS ASOCIADAS			
		Dirección	Abierto	En condiciones eventuales de funcionar al 31/12/25	SI	NO	% AVANCE	OBSERVACIONES
DVL 07	Vicente López	Roma y las vías (Borges)	X			X		
DVL 06		Libertador y Sturiza	X			X		
DVL 08		Villate y Solís	X			X		
DVL 05		Villate y Libertador	X			X		
DVL 02		Vernet y Libertador	X			X		
DVL 01		Las Heras y Libertador	X			X		
DVL10		Zufriategui y Av. De los Constituyentes	X			X		
DSMA02	San Martín	Juarez y Saavedra		X		X		Se trata de una cañería de cloaca que interfiere con un pluvial pero no genera descarga en él. Estimamos que la obra de anulación será desestimada ya que no es posible su ejecución sin modificar las trazas de ambos conductos. Considerando que no produce obstrucción al pluvial por su ubicación y que su conflictividad es baja, la Municipalidad no está de acuerdo con la obra. Por todo ello, se eliminará de este plan.
ESF01	San Fernando	Lavalle y Quintana	X			X		
ESF02		Belgrano y Avellaneda	X			X		
ESF06		Perón y Uruguay		X		X		Anulado con hormigón.
ESF07		Lavalle y Garibaldi	X			X		
ESF08		Rivadavia y San Gines	X			X		
ESI01	San Isidro	Irigoyen y P. Rico	X			X		
ESI04		Fondo de la Legua y Cordoba	X			X		
ESI05		Santa Ana y Tomkinson	X			X		
ESI10		Bomberos Voluntarios y Gorriti	X		X			Se colocó una válvula de cierre.
TOTAL REGION			**15**		**1**			

aysa	**INSTALACIONES DE DESBORDE** **CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL** **Informe al 31 de Diciembre de 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2151-INS-S-DBC-01-A (Ex INS Nº 46-47-48)**

PLAN AYSA DE ELIMINACION DE DESBORDES

REGION OESTE

CODIGO	DISTRITO	UBICACION	ESTADO		OBRAS ASOCIADAS			
		Dirección	Abierto	En condiciones eventuales de funcionar al 31/12/25	SI	NO	%AVANCE	OBSERVACIONES
	La Matanza	Boulogne Sur Mer y Lobería	x		x		100%	BR sobre colector de DN 800 mm correspondiente a la DGC. Punto topográficamente bajo proclive a la ocurrecia de desbordes. El vuelco se produce hacia conducto pluvial. Tareas de limpieza del colector DN 800/1000 de calle B. Sur Mer + modelo DN900x1300 de Colectora de Au. Ricchieri OC 28673 (Grandes Conductos) ejecutado por DGC finalizada.
	Morón	Int. Garcla Silva y Gral. Guido	x		x		0	Instalación de red colectora de DN 160 mm. Obra OC 70025. Proyecto elaborado. Contrato Rescindido en 2025.
		Sarmiento y Cda. De Ruiz	x		x		0	Instalación de 340 m de colectora DN 200/315 mm. Obra OC 70028. Proyecto Elaborado. Contrato Rescindido en 2025.
TOTAL REGION			3		3			

aysa	**INSTALACIONES DE DESBORDE** **CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL** **Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2151-INS-DBC-01-A (Ex INS Nº 46-47-48)**

PLAN AYSA DE ELIMINACION DE DESBORDES

REGION: DIRECCION REGIONAL SUDESTE

CODIGO	DISTRITO	UBICACION	ESTADO		OBRAS ASOCIADAS			
		Dirección	Abierto	En condiciones eventuales de funcionar al 31/12/24	SI	NO	% AVANCE	OBSERVACIONES
	Lanús	REMEDIOS DE ESCALADA Y PAMPA (VALENTIN ALSINA	**X**		**X**		11%	La obra que estaba asociada para eliminación del espiche: SC614 **"Renovación Red Cloacal El Pueblito**" fue rescindida.
	Quilmes	Cerrito y Calle 165	**X**		**X**		100%	Obras Asociadas: SC 386 - Ampliación de la EBC y SCP008 Modificación Impulsión EBC Falucho, ambas en servicio. **El espiche se dejó operativo por problemas técnicos de la EBC.**
TOTAL REGION								

aysa	**INSTALACIONES DE DESBORDE** **CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL** **Informe al 31 de Diciembre de 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2151-INS-S-DBC-01-A (Ex INS Nº 46-47-48)**

PLAN AYSA DE ELIMINACION DE DESBORDES

REGION SUDOESTE

CODIGO	DISTRITO	UBICACION	ESTADO		OBRAS ASOCIADAS			
		Dirección	Abierto	En condiciones eventuales de funcionar al 31/12/25	SI	NO	% AVANCE	OBSERVACIONES
ELO06	Lomas de Zamora	Av. Santa Fe (Frias) y Rodriguez Peña	X		x		n/a	La anulación de las mismas está condicionada a la construcción y Puesta en Servicio de las Obras del Plan Director: SC70222 - RPC Alivador Estrada la cual se encuentra en estado de proyecto realizado. SC70256 - RPC Fiorito-Llavallol Tramo 1 la cual se encuentra finalizada en proceso de puesta en servicio.
		Glade y Santa Fe	X		x			
		French y Payro	X		x			
		Ameghino y Rosetti	X		x			
		Frias y Oliver	X		x			
		Frias y Loria	X		x			
ELO 02		Araoz y Alem		X	x			
		Sixto Fernandez y Subre	X		x			
		Bustamante y Sucre	X		x			
TOTAL REGION			**8**	**1**	**9**			

aysa	**INSTALACIONES DE DESBORDE** **CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL** **Informe al 31 de Diciembre de 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **2151-INS-S-DBC-01-NA**

PLAN AYSA DE ELIMINACION DE DESBORDES

REGION NORTE - NUEVAS AREAS

CODIGO	DISTRITO	UBICACION	ESTADO		OBRAS ASOCIADAS			
		Dirección	Abierto	En condiciones eventuales de funcionar al 31/12/25	SI	NO	% AVANCE	OBSERVACIONES
SMI02	San Miguel	Pringles y Dorrego	X		X		0	Colectora rota cruzando dentro de desague pluvial,, Es necesario realizar una obra para cambiar el sentido de escurrimiento de la red en este punto o plantear una solución alternativa.
SMI04		Saavedra y Santa Ana	X		X			Repotenciación estacion de bombeo Los Berros fuera de servicio NC70175
SMI05		L. Alem y Callao	X		X			Expansion Red Cloacal Rosa Mistica NC70184(Municipio San Miguel-Dipac) finalizada, falta puesta en servicio . Se realizo desborde de seguridad por desbordes en Roca y Sarmiento.
ESC01	Escobar	San Lorenzo y Don Bosco	X					
ESC02		Pasteur y 3 de Febrero	X					
ESC04		Av. San Martín y Lamadrid	X		X			Entre calles La Madrid y San Martin. En este punto se encuentra un pluvial importante que se denomina “EL TAJAMAR”.
PIL01	Pilar	San Salvador y Santa Agüeda (Canal Agustoni)	X		X			
PIL02		Las Madreselvas y Arroyo Brazo B1	X		X			
TOTAL REGION NORTE Nuevas Áreas			**8**		**6**			

aysa	**INSTALACIONES DE DESBORDE** **CLOACAL AL SISTEMA PLUVIAL - Nuevas Áreas** **Informe al 31 de Diciembre de 2025**	**Informe de Niveles de Servicio** **Año 2025** **INS-S-DBC-01-A (Ex INS Nº 46-47-48)**

PLAN AYSA DE ELIMINACION DE DESBORDES

REGION OESTE

CODIGO	DISTRITO	UBICACION	ESTADO		OBRAS ASOCIADAS			
		Dirección	Abierto	En condiciones eventuales de funcionar al 31/12/25	SI	NO	% AVANCE	OBSERVACIONES
	Merlo	Azopardo esquina Alberti		x	x		100%	Al tomar el servicio se encontró desmoronamiento de boca de registro sobre conducto cloacal de diámetro 700 mm en Venecia y Madero, lo cual generaba desbordes importantes aguas arriba. Se solicitó obra de emergencia a Cloacas Máximas, quien realizó la reparación del conducto. Para paliar los desbordes en tanto se realizaba la obra, se ejecutó este desborde de seguridad colocando VE, la cual esta cerrada a la fecha.
TOTAL REGION				1	1			

RESIDUOS DE REJAS Y/O TAMICES

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Planilla INS-S-RR-01

INSTALACIONES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total año (T)
Berazategui (*)	3.980,00	9.500,00	7.040,00	5.840,00	13.520,00	4.860,00	3.820,00	4.180,00	2.040,00	2.140,00	2.240,00	540,00	59.700,00
Wilde	51,34	45,64	55,58	54,50	56,90	58,17	72,38	48,86	53,44	49,49	44,04	32,00	622,34
Boca-Barracas	25,00	24,00	26,00	27,00	20,00	15,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	15,00	227,00
EBC (**)	4,69	3,47	10,97	12,65	2,87	16,94	5,04	16,28	16,67	14,61	16,40	31,28	151,87
Sudoeste I	10,30	10,32	11,20	10,72	17,91	12,74	14,51	13,78	17,40	14,70	15,06	13,10	161,74
Sudoeste II	13,28	17,88	11,30	83,08	51,30	25,40	34,54	51,04	77,76	63,14	81,34	42,38	552,44
Norte (***)	60,00	133,00	177,00	127,00	145,00	110,00	148,00	175,00	106,00	111,00	123,00		1.415,00
El Jagüel I													
El Jagüel II	15,02	28,20	57,06	30,26	18,56	7,46	8,56	15,58	38,74	49,78	24,54	30,48	324,24
Lanus	2,30	9,50	2,00	1,00	5,30	0,70	6,00	0,30	0,50	7,00	0,20		34,80
Barrio Uno (****)	0,80	0,96	0,50	0,96	1,00	0,50	0,80	0,70	0,60	1,10	0,75	1,00	9,67
Hurlingham	25,68	34,94	41,06	32,02	33,50	33,50	33,50	3,50	33,50	33,50	40,08		344,78
Santa Catalina	0,60	1,20	0,80	0,80	0,80	0,40	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60	0,40	8,20
Fiorito	1,24	1,31	0,53	1,40	0,90	1,22	0,28	0,92	0,56	1,32	0,38		10,06
Vaciadero Sudoeste	5,88	2,52	6,30	7,66	1,76	6,18	5,96	7,32	6,54	6,18	3,18	4,76	64,24
Sudoeste III (BARROS)	30,04	41,54	20,46	14,38	44,16	35,46	13,24	21,18	16,64	35,04	35,64	35,82	343,60
Total de Residuos Dispuestos (Toneladas)	**4.226,17**	**9.854,48**	**7.460,76**	**6.243,43**	**13.919,96**	**5.183,67**	**4.180,41**	**4.551,26**	**2.423,95**	**2.541,46**	**2.638,21**	**746,22**	**63.969,98**

RESIDUOS DE REJAS Y/O TAMICES (AMBA)


Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Informe de Niveles de Servicio

Año 2025

Planilla INS-S-RR-01

INSTALACIONES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total año (T)
Bella Vista	5,06	3,16	6,34	2,10	6,27	4,80	1,12	0,00	3,00	5,63	3,04	4,60	45,12
Escobar	0,75	0,60	0,30	0,45	0,30	0,45	0,90	0,90	0,90	0,45	0,45	0,90	7,35
Ferrari	1,00	1,10	1,30	1,50	0,60	0,60	1,32	1,06	0,50	1,70	1,70	1,60	13,98
Garin	0,45	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15	0,45	0,30	0,15	0,00	0,45	0,75	3,45
Catonas	0,97	1,75	1,35	1,50	2,10	0,90	1,20	1,20	1,95	1,05	1,50	2,10	17,57
Total de Residuos Dispuestos (Toneladas)	**8,23**	**6,91**	**9,44**	**5,70**	**9,42**	**6,90**	**4,99**	**3,46**	**6,50**	**8,83**	**7,14**	**9,95**	**87,47**



DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO Y EN RED

Código	Estación de Bombeo // Cloaca Máxima	Ubicación del desborde		Punto de Muestreo
		Dirección	Distrito	Código
DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO				
	EBC ZC 06 Morón	Gral. Juan José Valle 1708 (y vías del Ferrocarril)	Morón	
	EBC ZC 07 Caseros	Quintana y Bonifacini	Tres de Febrero	
ETF01	EBC ZC 08 De La Vega	A. De La Vega 685	Tres de Febrero	FLO2230
	EBC ZC 09 17 de Agosto	Av. Campo de Mayo 6900 y 17 de Agosto	Tres de Febrero	FLO2230
ETF02/03	EBC ZC 11 La Cautiva	La Cautiva y Juan XXIII	Tres de Febrero	FLO2230
	EBC ZC 12 Juan XXIII	AV. Campo de Mayo y Juan XXIII	Tres de Febrero	FLO2230
ESM01	EBC ZC 13 Chilavert	Esmeralda y Rawson	San Martín	DEV2310
	EBC ZC 14 Loma Hermosa	Av. Gral. Lavalle y A. Magaldi	Tres de Febrero	FLO2230
	EBC ZC 16 LUGANO I - V	Av. Cnel. Roca 5355	Villa Lugano	C. Aut. de Bs. As.
EFL35	EBC ZC 17 Cildañez	Lasalle y Eva Perón	Flores	FLO2240
	EBC ZC 19 La Quema	Av. Amancio Alcorta 2925	C.A.B.A.	
EFL56	EBC ZC 20 Fátima	Av Riestra entre Mariano Acosta y Martinez Castro	Flores	CON0310
	EBC ZC 25 Chilavert II	Esmeralda 6681esq. Rawson	San Martín	
	EBC ZC 29 W.Morris	Fernandez de Enciso 2139 Esq. Cañuelas	Hurlingham	
	EBC ZC 30 Loma Hermosa Ii	Churruca Y Río III	Hurlingham	
	EBC ZC 31 Hurlingham	Av. Marquez y Av. Roca	Hurlingham	
	EBC ZC 32 Villa Club	Paso Morales 100 entre Achupallas y Combate de Pavon	Hurlingham	
	EBC ZC 33 Hipodromo	Combate de Pavon 1499 Esq. Congreso de Tucuman	Hurlingham	
	EBC ZC 37 EL BAJO	Av. Rojo (Rta Prov. N° 21) 651,entre Marconi y Ant.Argent.	Laferrere	La Matanza
	EBC ZC 41 Laferrere Centro	Ventura Bosh 2149 e/Victor Hugo	La Matanza	
	EBC ZC-72 SAN BLAS	Iguazú & Pedro de Luján	C.A.B.A.	
	EBC ZN 01 Tigre	Paseo Victorica y Patagones	Tigre	
	EBC ZN 02 Tigre	Moreno y Quintana	Tigre	
	EBC ZN 03 Tigre	J. M. Estrada 287 y Sgto. Díaz	Tigre	
	EBC ZN 04 Tigre	Montes de Oca 400 (esq. Italia)	Tigre	
ESI09	EBC ZN 07 E.B. 7	Udaondo y Cayena	San Isidro	SFE6010
	EBC ZN 08 E.B. 8	Pocitos y Av. Ascurraín	San Fernando	SFE3110
	EBC ZN 10 Quirno Costa	Quirno Costa 835	San Fernando	SFE3110
ESI08	EBC ZN 12 Bajo San Isidro	España y De La Ribera(ex Mitre)	San Isidro	SAA0390
ESI06	EBC ZN 15 Los Sauces	Los Sauces y De La Ribera(ex El Fomentista)	San Isidro	SAA0390
	EBC ZN 18 Boulogne Grande	Bomberos Voluntarios y Gorriti	San Isidro	SAA0390
	EBC ZN 19 Martinez	Dardo Rocha y Fleming	San Isidro	SAA0390
	EBC ZN 21 Roca	Gral. Roca y Bartolomé Cruz	Vicente Lopez	SAA0390
EVL09	EBC ZN 22 Pocitos	Blas Parera y Lavalle	Vicente Lopez	SAA0390
	EBC ZN 23 Carapachay	Paraná y Gobernador Castro	Vicente Lopez	SAA0390
	EBC ZN 30 Complemento San Fernando	Fournier y Miguel Cané	San Fernando	SFE3110
	EBC ZS 04 Villa Diamante	Yatay y 25 de Mayo	Lanús	AVE6550
	EBC ZS 05 Lavallol	Antártida Argentina 1230	Lomas de Zamora	LOM6310
	EBC ZS 10 Alte. Brown	Canale y Py Margall	Almirante Brown	LAN2390
	EBC ZS 17 Falucho	Misiones y calle 165	Quilmes	
	EBC ZS 18 Ferroviario	Cte. Carbonari y Arroyo Gimenez	Quilmes	
	EBC ZS 22 Solano La Florida	Calle 835 y Calle 887	Quilmes	
	EBC ZS 28 Falucho Este	Victorica 1700 y Bermejo	Quilmes	QUI6410
	EBC ZS 31 Barrio Coca Cola	Los Camalotes Y Cabo San José (Arroyo Ortega)	E. Echeverria	
	EBC ZS 33 Defensa	Defensa y Quiroga	Avellaneda	
	EBC ZS 37 Este Avellaneda	C. Larralde y Cnel Lynch	Avellaneda	
	EBC ZS 38 La Union	Ruta 205 y Matienzo	Tristan Suarez	
	EBC ZS 42 Magdalena	Presbitero Jose Malabia & Gral. Levalle	Remedios de Escalada	
	EBC ZS 43 Luis Guillon	Sardi esq.Alfredo Fox	Luis Guillon	
	EBC ZS 84 Constanzo	Presbiterio Orencio Antonio Mainer y Chimondegui.	Monte Grande	
	EBC ZS 90 Ramal Avellaneda	Centenario Uruguayo e/Carabelas y Cangallo	Avellaneda	
	EBC ZC 01 Alas	El Quebracho y el Guaira	La Matanza	
	EBC ZF-03 Sarmiento	Pablo VI n° 1000 & cura brochero	La Matanza	
	EBC ZF-02 Municipal	Av. Cristianía y calle 600	La Matanza	MAS2575
	EBC ZF-04 San Alberto	Av. Cristianía 4932 e/Danubio y Asamblea	Isidro Casanova	La Matanza
DESBORDES DE SEGURIDAD EN RED				
DCO01	2da. Cloaca Máxima	Diógenes Taborda y Riachuelo	Constitución	CON0260
ECO34	3er. Cloaca Máxima	Av. Riestra y A. De Vedia	Constitución	CON0310
ECO35	Intermedia 1-3	Av. Chiclana y Av. La Plata	Constitución	CON0310
ECO36	Intermedia 1-3	Av. Chiclana y Av. Caseros	Constitución	CON0310
ECO37	Intermedia 1-3	Iriarte y G. Díaz	Constitución	CON0260
ECE04	Costanero	Av. Córdoba y Alem	Centro	CON6310
DSA02	Costanero-Ribereño	Arcos y Jaramillo	Saavedra	SAA0009
DSA03	Costanero	O'Higgins y Manzanares	Saavedra	SAA0009
ESA32	3er. Cloaca Máxima	Av. Del Tejar y Galván	Saavedra	SAA0390
ESF06	Ribereño	Uruguay y J. D. Perón	San Fernando	SFE0010
DSF01	Ribereño	Quintana y J.D. Perón	San Fernando	SFE0010
2°-TE-01	2da. Cloaca Máxima	Sáenz y Achala	Constitución	CAB0280
2°-TE-02	2da. Cloaca Máxima	Almafuerte y Achala	Constitución	CAB0280
1°-SD-01	1er. Cloaca Máxima	Av. Mitre y Chascomús	Avellaneda	AVE0190
1°-SI-01	1er. Cloaca Máxima	Av. Mitre y Nicaragua	Avellaneda	AVE0190
2°-SD-02	2da. Cloaca Máxima	Av. Mitre y Boulevard de Los Italianos	Avellaneda	AVE0290

DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO Y EN RED - AMBA

Código	Estación de Bombeo // Cloaca Máxima	Ubicación del desborde		Punto de Muestreo
		Dirección	Distrito	Código
DESBORDES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE BOMBEO				
	EBC ZS 73 Planificado	435-El Malambo	Florencio Varela	
	EBC ZS 77 Defensa y Justicia	Ruta Prov 36 N°4403 e/ Santa Isabel y Av. Bosques	Florencio Varela	
	EBC ZP 01 Agustoni	Interseccion de Calle Chile y San Salvador	Pilar	
	EBC ZP 31 La Montura	Av. Patricias Argentinas 4350	Pilar	
	EBC ZP 26 Highland	Colombia 5180	Pilar	
	EBC ZP 17 Mapuche	Presidente Derqui	Pilar	
	EBC ZP 37 Ayres Nexo Pinazo	Barrio Cerrado	Pilar	
	EBC ZP 16 Los Fresnos	Presidente Derqui	Pilar	
	EBC ZP 22 Pilarica	Posadas	Pilar	
	EBC ZP 20 Las Condes	Las Madreselvas	Pilar	
	EBC-ZO-01 Mendelson	Felix Mendelson y el Jilguero	Moreno	
	EBC-ZO-07 Cipoletti	Calle Cipolleti n°899	Merlo	
	EBC-ZO-08 Viedma	Figueroa alcorta n° 7300	Merlo	
	EBC-ZO-09 25 de mayo	Ameguino n° 901 esq- 25 de mayo	Merlo	
	EBC-ZO-03 Argentina	av. Argentina y castelle	Merlo	
	EBC-ZO-10 Corcova	Corcova 998	Merlo	
	EBC-ZO-11 Bristol	Bristol 5099	Merlo	
	EBC-ZO-14 Dolores	Cassaux y dolores	Merlo	
	EBC-ZO-17 Gaboto	Gaboto esq- Giambiaggi	San Miguel	
	EBC-ZO-22 Los Berros	Gaspar Campos	San Miguel	

INFORME ANUAL 20 - AÑO 2025

DESBORDES DE SEGURIDAD

AREA DE ACCION AYSA

FECHA: 05-03-2026

PLANO: S-DESB-020


VTE. LOPEZ
AVELLANEDA
SAN MARTIN
LANUS
TRES DE FEBRERO
LOMAS DE ZAMORA
AV. GRAL PAZ
AV. LUGONES
AV. DEL LIBERTADOR
AV. CONSTITUYENTES
AV. CRISOLOGO LARRALDE
AV. DE MAYO
AV. MITRE
AV. SAN MARTIN
AV. RIVADAVIA
AV. CABILDO
AV. TRIUNVIRATO
AV. CRAMER
AV. OLAZABAL
AV. DORREGO
AV. CORRIENTES
AV. CORDOBA
AV. ALVAREZ JONTE
AV. ALVAREZ THOMAS
AV. ESTADOS UNIDOS
AV. PEDRO GOYENA
AV. ALVAREZ CONDARCO
AV. ALVAREZ GESTO
AV. DE LOS CORRALES
AV. DE LOS INCAS
AV. DE LOS CONSTITUYENTES
AV. DE LOS CONSTITUYENTES
AV. PTE. FIGUEROA ALCORTA
AV. PRESIDENTE CASTILLO
AV. DEL LIBERTADOR
AV. DEL LIBERTADOR
AV. DEL LIBERTADOR

DIRECCION REGIONAL NORTE - **SISTEMA DE SANEAMIENTO 2025 - DESBORDES**

OBRAS

SISTEMAS DE REDES

- CAÑERIA PRIMARIA EXISTENTE
- CAÑERIA SECUNDARIA EXISTENTE
- CAÑERIA IMPULSION EXISTENTE
- CAÑERIA IMPULSION EXISTENTE PRIVADA
- CAÑERIA IMPULSION DESVINCULADA

ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO

- ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO EN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRADOS POR AySA
- ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO EN FUNCIONAM. ADMINISTRADOS EN FORMA PRIVADA
- ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO EN FUNCIONAMIENTO MIXTOS
- ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO FUERA DE FUNCIONAMIENTO
- ESTACIONES DE BOMBEO DE RELEVANCIA PRINCIPAL
- ESTACIONES DE BOMBEO DE RELEVANCIA SECUNDARIA

DESBORDES DE SEGURIDAD

- DESBORDE ANULADO
- DESBORDE ABIERTO
- DESBORDE CERRADO
- DESBORDE ADICIONAL AL PLAN
- DESBORDE DE SEGURIDAD EXISTENTE EN E.B.
- DESBORDE DE SEGURIDAD EXISTENTE EN RED
- DESBORDE DE SEGURIDAD PROYECTADOS

VICENTE LOPEZ

TIPO	CODIGO	UBICACION
DESBORDE EN RED	DVL07	ROMA Y LAS VIAS (BORGES)
DESBORDE EN RED	DVL06	LIBERTADOR Y STURZA
DESBORDE EN RED	DVL08	VILLATE Y SOLIS
DESBORDE EN RED	DVL05	VILLATE Y LIBERTADOR
DESBORDE EN RED	DVL02	VERNET Y LIBERTADOR
DESBORDE EN RED	DVL01	LAS HERAS Y LIBERTADOR
DESBORDE EN RED	DVL10	ZUFRATEGUI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES

SAN MARTIN

TIPO	CODIGO	UBICACION
DESBORDE EN RED	DSMA02	JUAREZ Y SAAVEDRA

SAN FERNANDO

TIPO	CODIGO	UBICACION
DESBORDE EN RED	ESF01	LAVALLE Y QUINTANA
DESBORDE EN RED	ESF02	BELGRANO Y AVELLANEDA
DESBORDE EN RED	ESF06	PERON Y URUGUAY
DESBORDE EN RED	ESF07	LAVALLE Y GARIBALDI
DESBORDE EN RED	ESF08	RIVADAVIA Y SAN. GINES

SAN ISIDRO

TIPO	CODIGO	UBICACION
DESBORDE EN RED	ESI01	IRIGOYEN Y P. RICO
DESBORDE EN RED	ESI04	T. DE LA LEGUA Y CORDOBA
DESBORDE EN RED	ESI05	SANTA ANA Y TOMKINSON

AREAS SERVIDAS
SISTEMA CLOACAL - **2025**

DIRECCION REGIONAL NORTE - **SISTEMA DE SANEAMIENTO 2025 - DESBORDES AREAS NUEVAS**

ESCOBAR

P.D. ESCOBAR

ESC04 · ESC02 · ESC01

RN 9 - AU Panamericana

P.D. SAVIO

EBPI027 · EBPI026 · EBPI032 · EBPI031 · EBPI033 · EBPI040 · EBPI030 · EBPI029 · EBPI028 · EBPI051 · EBPI034 · EBPI050 · EBPI035 · EBPI052 · EBPI036 · EBPI037

LAGOMARSINO

MANUEL ALBERTI

MALVINA

Linea Mitre (FCGBM) a Capilla del Señor

RP 25 - Av. D.F. Sarmiento

RP 26 - Av. Constitución

RP 26 - Av. Ing. E. Mosconi

RN 8 - AU Panamericana Ramal Pilar

ZELAYA

EBPI043 · EBPI039 · EBPI044 · EBPI046 · EBPI047 · EBPI045 · EBPI038 · EBPI--- · EBPI041

RP 25 - Av. Dr. Honorio Pueyrredón

Linea Belgrano Norte (FFCC)

DEL VISO

RP 8 - Av. Arturo Illia

PILAR

EBPI016 · EBPI017 · EBPI053 · EBPI019 · EBPI014 · EBPI018 · EBPI011 · EBPI012 · EBPI015 · EBPI021 · EBPI024 · EBPI025

LA LONJA

VILLA ROSA

JOSE C PAZ

RP24 - Av. Presidente Hipólito Yrigoyen

RP 8 - Av. Sgto. Cayetano Ballera

CAMPANA

RIO LUJAN

CANAL AGUSTONI

EBPI004 · EBPI006 · EBPI001 · EBPI042 · EBPI003 · EBPI007 · EBPI022 · EBPI023 · EBPI013 · EBPI010 · EBPI005 · EBPI008 · EBPI048 · EBPI009 · EBPI002 · EBPI049

PILAR CENTRO

P.D. CHAMPAGNAT

RP 8 - Estanislao Lopez

RP 25 - Fragata Argentina

RP 25 - Dardo Rocha

RP 34 - 40 Leguas

RP 28 - Venancio Castro

VILLA ASTOFI

FATIMA

PILAR SUR

SAN MIGUEL

SM02 · SM05 · SM04

P.D. BELLA VISTA

P.D. HURLINGHAM

EBSMI01

Ferrocarril General Urquiza (FCGU)

RP 8 - Av. Arturo Illia

RP 8 - Av. Dr. Ricardo Balbín

RIO DE LA RECONQUISTA

MOR

Ferrocarril General San Martín (FCGSM)

Ferrocarril General Urquiza (FCGU)

N

OBRAS

SISTEMAS DE REDES

- CAÑERIA PRIMARIA EXISTENTE
- CAÑERIA SECUNDARIA EXISTENTE
- CAÑERIA IMPULSION EXISTENTE
- CAÑERIA IMPULSION EXISTENTE PRIVADA
- CAÑERIA IMPULSION DESVINCULADA

ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO

- ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO EN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRADOS POR AySA
- ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO EN FUNCIONAM. ADMINISTRADOS EN FORMA PRIVADA
- ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO EN FUNCIONAMIENTO MIXTOS
- ESTACIONES Y POZOS DE BOMBEO FUERA DE FUNCIONAMIENTO
- ESTACIONES DE BOMBEO DE RELEVANCIA PRINCIPAL
- ESTACIONES DE BOMBEO DE RELEVANCIA SECUNDARIA

DESBORDES DE SEGURIDAD

- DESBORDE ANULADO
- DESBORDE ABIERTO
- DESBORDE CERRADO
- DESBORDE ADICIONAL AL PLAN
- DESBORDE DE SEGURIDAD EXISTENTE EN E.B.
- DESBORDE DE SEGURIDAD EXISTENTE EN RED
- DESBORDE DE SEGURIDAD PROYECTADOS

SAN MIGUEL

TIPO	CODIGO	UBICACION
DESBORDE EN RED	SM02	PRINGLES Y DORREGO
DESBORDE EN RED	SM04	SAAVEDRA Y SANTA ANA
DESBORDE EN RED	SM05	L. ALEM Y GALLAO


ESCOBAR

TIPO	CODIGO	UBICACION
DESBORDE EN RED	ESC01	DON BOSCO Y SAN LORENZO
DESBORDE EN RED	ESC02	3 DE FEBRERO Y PASTEUR
DESBORDE EN RED	ESC04	AV. SAN MARTIN Y LAMADRID

aysa
DIRECCION REGIONAL NORTE

AREAS SERVIDAS
SISTEMA CLOACAL - **2025**

DIRECCION REGIONAL OESTE
SISTEMA DE SANEAMIENTO - 2025
DESBORDES DE CLOACAS A PLUVIALES

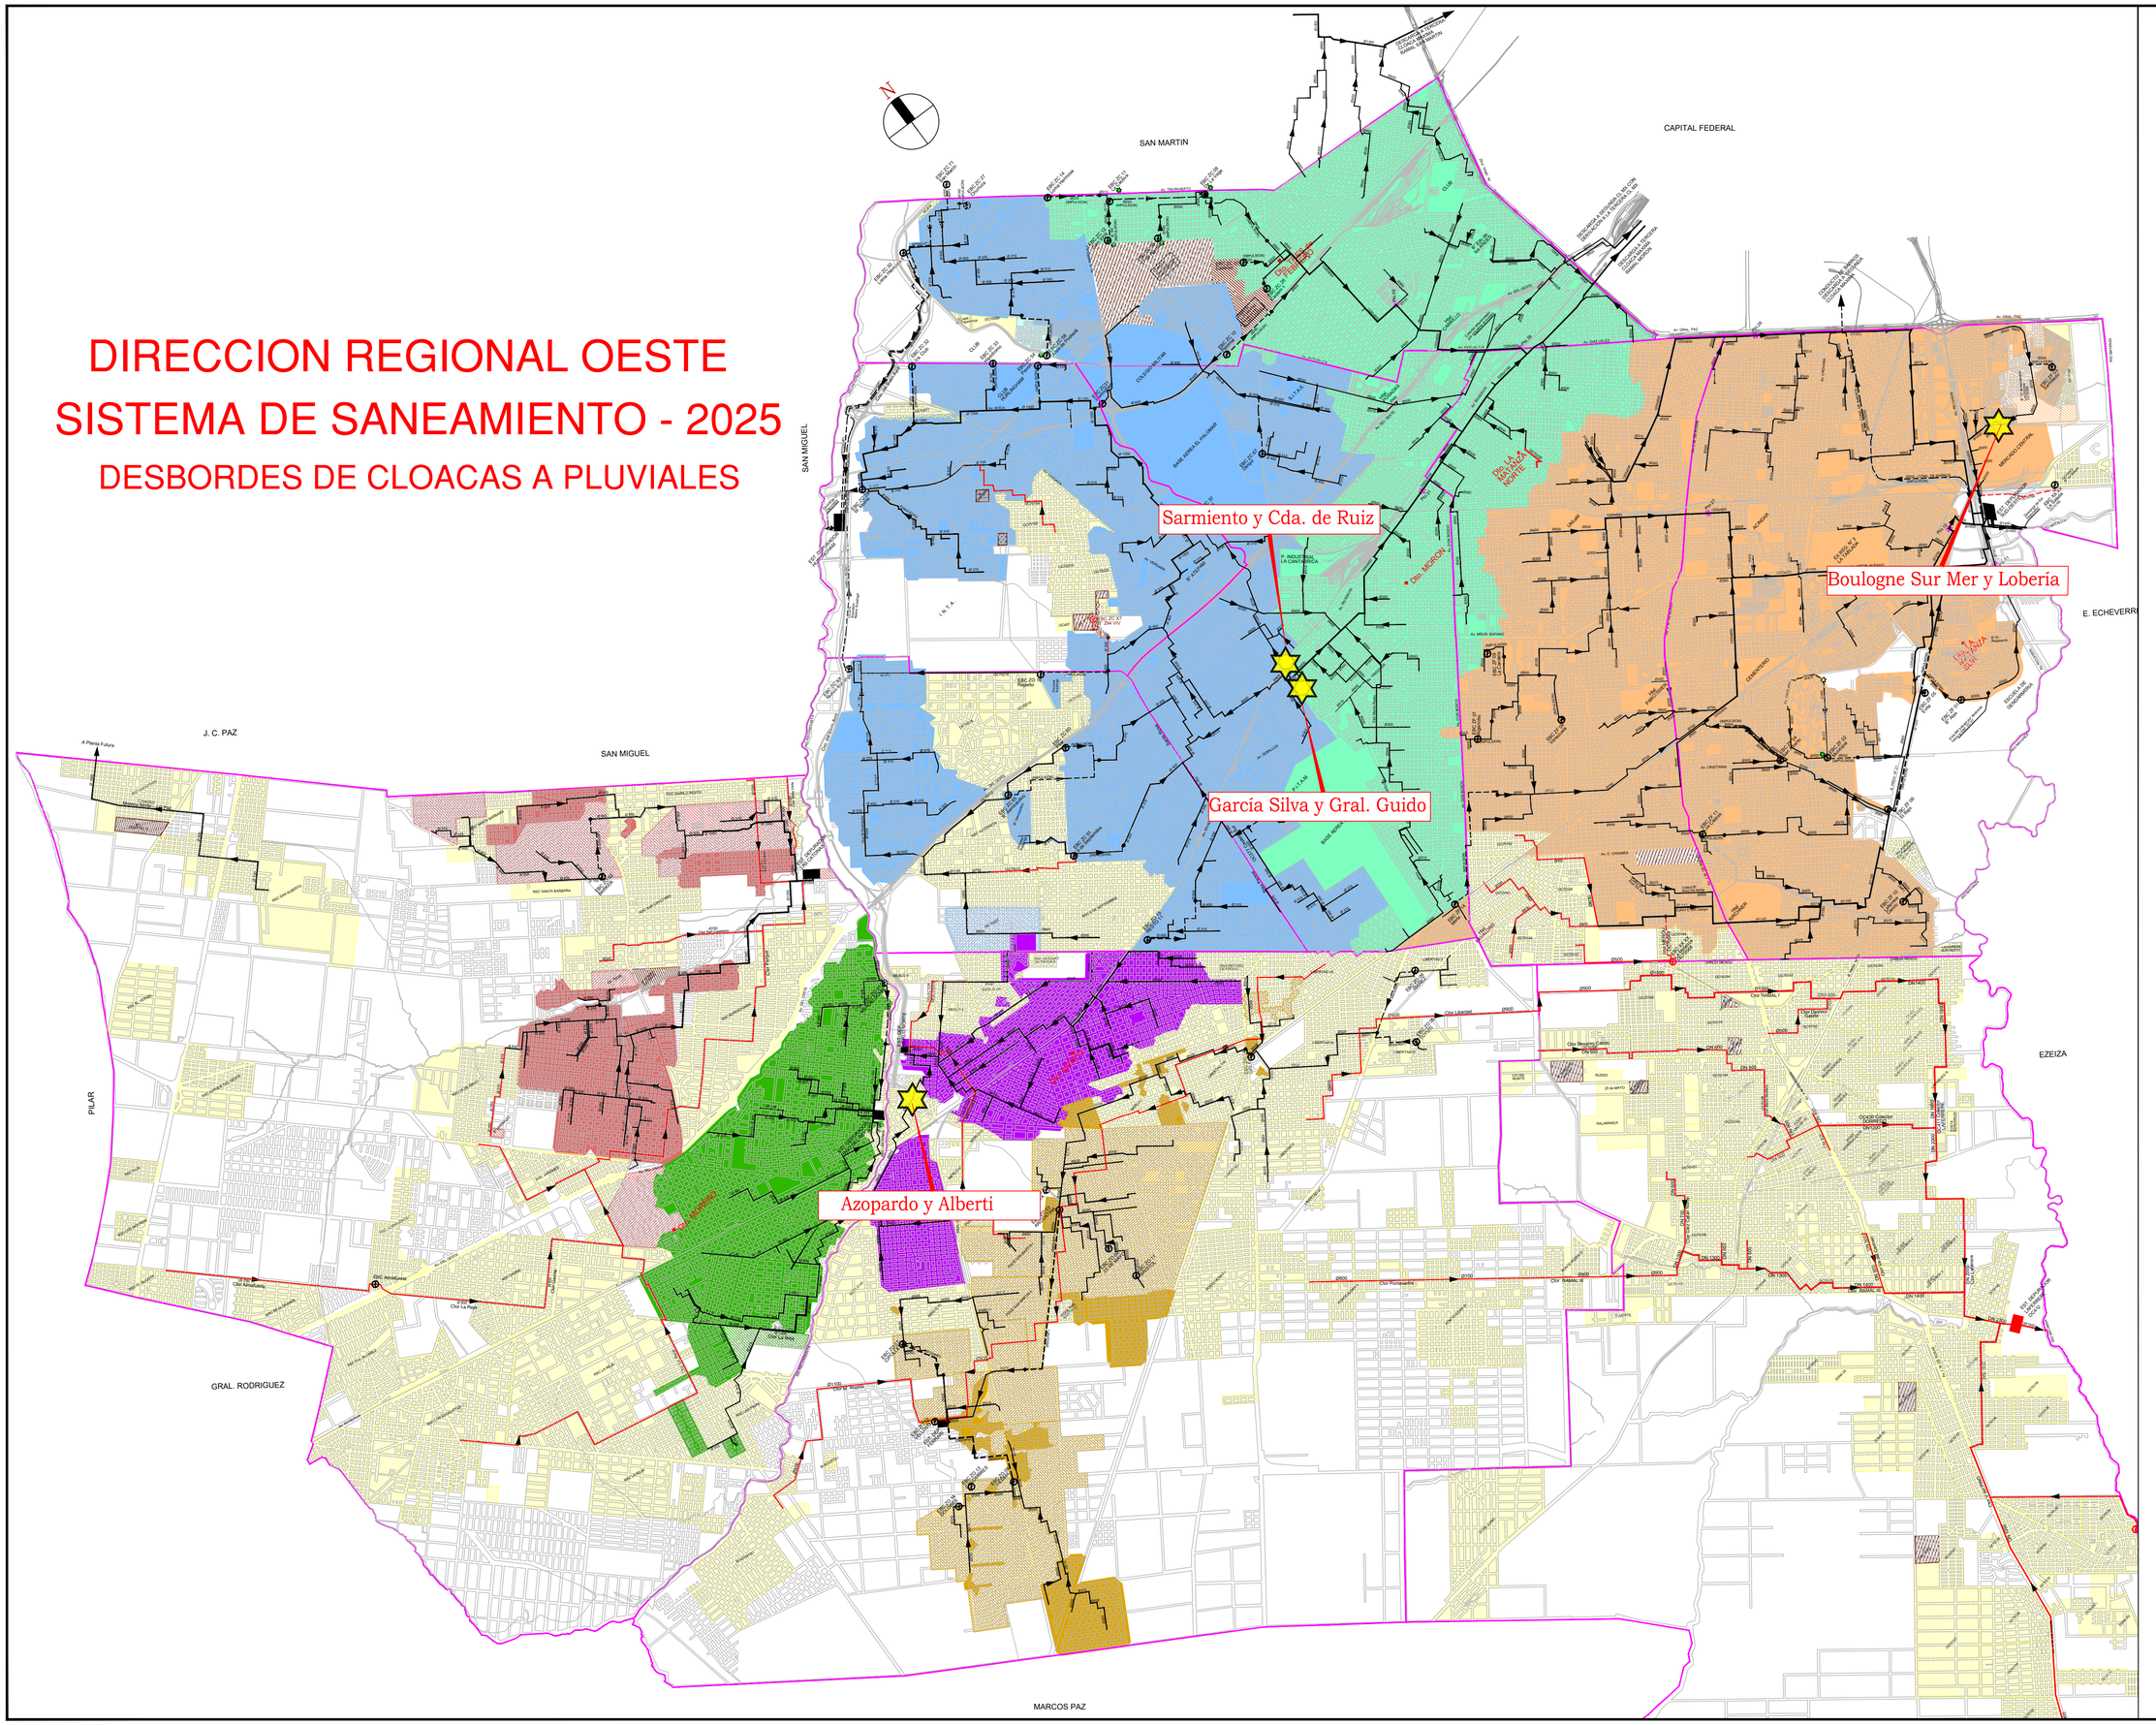

REFERENCIAS

- CUENCA HACIA 3ra CL. MAXIMA c/ DESCARGA HACIA CAP.FED.
- CUENCA HACIA ESTABLECIMIENTO DEPURADOR SUD OESTE
- CUENCA HACIA ESTABLECIMIENTO DEPURADOR HURLINGHAM
- CUENCA HACIA ESTABLECIMIENTO DEPURADOR LAS CATONAS
- CUENCA HACIA ESTABLECIMIENTO DEPURADOR PASO DEL REY
- CUENCA HACIA ESTABLECIMIENTO DEPURADOR MERLO
- CUENCA HACIA ESTABLECIMIENTO DEPURADOR FERRARI
- ÁREAS DE EXPANSIÓN

- DESBORDE SEGURIDAD EN RED
- DESB. SEGURIDAD EN EST. ELEVADORA

aysa

DIRECCION REGIONAL OESTE
REDES CLOACALES

DESBORDES DE CLOACAS A PLUVIALES

DRO_Repiches 2025.dwg Ultima actualización ENERO 2026

CONSTITUCION

FLORES

LOMAS DE ZAMORA

ESTEBAN ECHEVERRIA

ALMIRANTE BROWN

BERAZATEGUI

ZS 01 ISLA MACIEL

ZS 33 DEFENSA

ZS 02 DOCK SUD

ZS 03 DOCK SUD

ZS 07 ARGAÑARAZ

ZG 03 ITAPIRU

ZS 08 ROCA

REMEDIOS DE ESCALADA Y PAMPA

ZG 01 VILLA DIAMANTE

ZG 04 PIÑEIRO

ZS 11 TRES SARGENTOS

ZS 83 VILLA DOMINICO

ZS 96 AVELLANEDA OESTE

ZG 02 FRAY LAGOS

ZS 93 GRAL PINTO

ZS 12 WILDE ESTE

ZS 15 DON BOSCO NORTE

ZS 23 VILLA ALCIRA

ZS 34 SANTO DOMINGO

ZS 16 DON BOSCO SUR

ZS 24 VILLA CRAMER

ZS 90 RAMAL AVELLANEDA

ZS 09 WILDE

ZS 17 FALUCHO

ZS 13 ALBERDI

ZS 37 ESTE AVELLANEDA

ZS 28 FALUCHO ESTE

ZG 25 BALCARCE SUR

ZG 06 LAS COLONIAS

ZS 95 VILLA GONNET

CERRITO Y CALLE 185

ZS 82 MONTE CHINGOLO

ZS 64 RAMAL QUILMES NORTE

ZS 25 EZPELETA

ZG 28 MADGALENA

ZS 91 RIO ATUEL

ZS 20 NAVAL

ZS 18 FERROVIARIO

ZS 65 RAMAL QUILMES SUR

ZS 14 CALCHAQUI

ZS 19 LOS ALAMOS

SZ 87 LAS PIEDRAS NORTE

ZS 22 SOLANO-LA FLORIDA

ZS 21 SOCORRO

ZS 79 MONTEVERDE

ZS 78 SENZABELLO

ZS 74 EL MOLINO

ZS 77 DEFENSA Y JUSTICIA

ZS 71 RIVADAVIA

ZS 76 HERNANDARIAS

ZS 75 VILLEGAS

REFERENCIAS

- ABIERTO A DICIEMBRE 2024
- ADICIONAL AL PLAN
- ASOCIADO AL ALIVIADOR DEL COLECTOR MAGDALENA/PSI
- RED CLOACAL >= 1000 mm.
- RED CLOACAL 300 mm. =< DIAM < 1000 mm.
- CAÑERIA DE IMPULSION
- LIMITE DE DISTRITO
- EBC – ESTACION DE BOMBEO CLOACAL

aysa

INSTALACIONES DE DESBORDE CLOACAL AL SIST. PLUVIAL

RED DE CLOACA

AREA DE ACCION AySA_REGIONAL

REGION SUDESTE

DICIEMBRE 2025

23-12-2025

ICCZSE2025-DRSE




N

REFERENCIAS


- ABIERTO AL 31/12/2025
- EN CONDICIONES EVENTUALES DE FUNCIONAR AL 31/12/2025
- ADICIONAL AL PLAN
- ASOCIADO AL ALIVIADOR DEL COLECTOR MAGDALENA/PSI
- RED CLOACAL >= 1000 mm.
- RED CLOACAL 300 mm. =< DIAM < 1000 mm.
- CAÑERIA DE IMPULSION
- CAMBIO DE DIAMETRO
- ESTACION ELEVADORA
- LIMITE DE DISTRITO

Sección — Medidas interiores (en mm.)

Mod 600x1200



OV 900x1350



aysa

INSTALACIONES DE DESBORDE CLOACAL AL SIST. PLUVIAL

RED DE CLOACA

AREA DE ACCION AySA

REGION SUDOESTE

AÑO 2025

FECHA: 31-12-2025

ICCZS0020

A1





